Neiva, 19 de mayo de 2026

Ingeniero:
JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR

Ciudad

Asunto: Informe de seguimiento convenio interadministrativo No 491 de 2025

Cordial Saludo,

Adjunto remito Informe de seguimiento a la ejecución física del convenio interadministrativo No 491 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM y el municipio de San Agustín – Huila cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre la Corporación Autónoma Regional del Ato Magdalena y el municipio de San Agustín Huila, para la realización de actividades de aislamiento de áreas de conservación que contribuyan en la protección y conservación de los ecosistemas en el municipio".

Cordialmente,

ADRIANA MARIA CALDERON VARGAS
Contratista CAM -SGA

INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIO N° 491 DE 2025.

Se realizó el seguimiento a la ejecución física del convenio interadministrativo No 491-2025, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre la Corporación Autónoma Regional del Ato Magdalena y el Municipio De San Agustín Huila, para la realización de actividades de aislamiento de áreas de conservación que contribuyan en la protección y conservación de los ecosistemas en el municipio”

Mediante la realización de visitas de campo acompañadas por profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio, se efectuó la verificación del establecimiento de tres mil trescientos ochenta y ocho mil (3.388) metros lineales de aislamiento nuevo, localizados en predios de reserva forestal adquiridos por el municipio de San Agustín con fines de conservación del recurso hídrico, conforme a lo indicado en la Tabla N.° 1.

Verificación de implementación de aislamiento- Convenio No 491 de 2025						
Municipio	Vereda	Predio	Metros Lineales	Área del predio (Has)	E	N
San Agustín	Los Cauchos	Los Andes	262	16	761414	691009
	El Retiro	Pr evidencia Lote 1	118	15	757117	694572
	Alto del Obispo	Las Brisas	408	4	757934	693810
	El Retiro	San Francisco	400	15	756557	691888
	El Palmar	Parcela 18	2200	11	753250	709276
	Total ejecutado a la fecha 3.388 metros lineales					

Municipio: San Agustín
Vereda: Los Cauchos (zona rural)
Predio: Los Andes
Metros lineales: 262
Fecha de la visita: 10 de abril de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El 10 de abril de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento a la ejecución del aislamiento, con el acompañamiento de profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio. Durante el recorrido se evidenció el establecimiento de doscientos sesenta y dos (262) metros lineales de aislamiento nuevo de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, a una distancia de 2.5 metros entre postes de madera rolliza, un (1) pie de amigo cada 30 metros o cuando las condiciones topográficas o de alineación así lo requieren, tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14 y una (1) cuerda de alambre galvanizado nuevo calibre No 12.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento se ejecutó de la siguiente manera: limpieza general de la franja, con un (1) metro de ancho a lado y lado del aislamiento; hincado de ciento cinco (105) postes a una distancia de 2.5 metros entre sí, nueve (9) pie de amigos, ubicados cada 30 metros o según lo requirieron las condiciones topográficas; tanto los postes como los pie de amigos son de madera rolliza de la especie *Eucalyptus grandis.* El aislamiento cuenta con la instalación de tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14, y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12 debidamente templadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpia general de la franja (manual o mecánica) del aislamiento de 1 metro de ancho a lado y lado del cerco.





Instalación de postes y pie de amigos de madera rolliza





Tres (3) cuerdas en alambre de púas y una (1) en alambre liso galvanizado

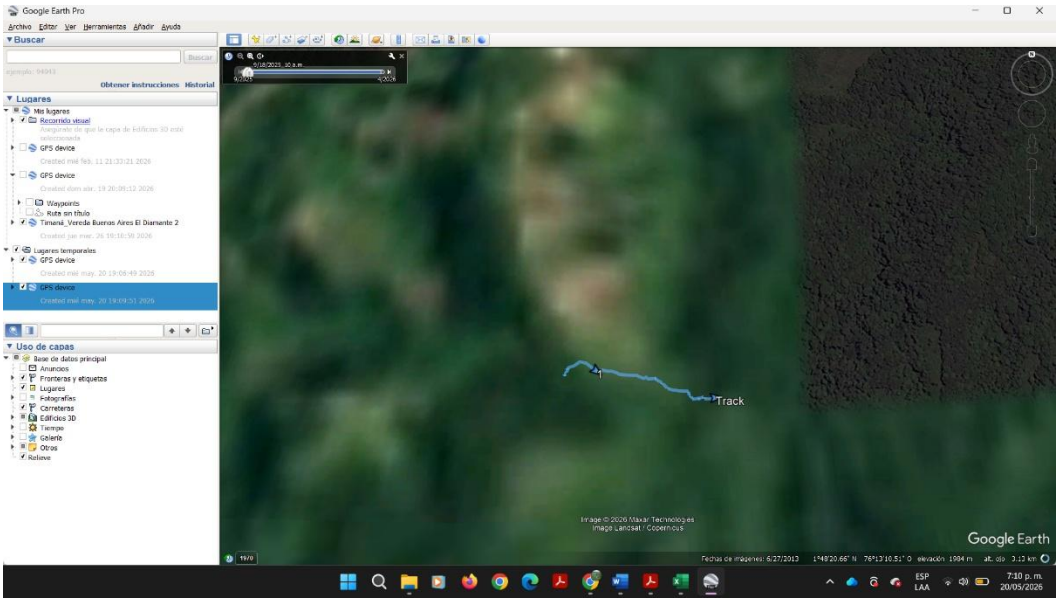


Imagen satelital del predio objeto de aislamiento

SIG | cam ¡Cuida tu naturaleza!

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 10-04-2026	**Municipio:** San Agustín	**Vereda:** Los Cauchos	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín	**Teléfono:**	**Cedula o Nit:**	**Correo electrónico:**
Dirección:			
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Los Andes	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 761414	**Y:** 691009
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Restauración Pasiva			
Objetivo de la Visita: Verificación de implementación de aislamiento.				

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita técnica para la verificación de 762 metros lineales de aislamiento con postes en madera rolliza a una distancia de 2.5 mts pie de amigos cada 30 metros, 3 cuerdas de alambre calibre #14 y 1 de alambre liso galvanizado calibre #12.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se evidencia la implementación de 762 metros lineales de aislamiento a cada con las especificaciones técnicas

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:** Erika Daniela Tejada Quiñonez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:** Erika Adriana Cano Caldas.

Municipio: San Agustín
Vereda: El Retiro (zona rural)
Predio: La Providencia 1
Metros lineales: 118
Fecha de la visita: 10 de abril de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El 10 de abril de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento a la ejecución del aislamiento, con el acompañamiento de profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio. Durante el recorrido se verificó el establecimiento de ciento dieciocho (118) metros lineales de aislamiento nuevo de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, a una distancia de 2.5 metros entre postes de madera rolliza, un (1) pie de amigo cada 30 metros o cuando las condiciones topográficas o de alineación así lo requieren, tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14 y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento se ejecutó de la siguiente manera: limpieza general de la franja, con un (1) metro de ancho a lado y lado del aislamiento; hincado de cuarenta y siete (47) postes a una distancia de 2.5 metros entre sí, cuatro (4) pie de amigos, ubicados cada 30 metros o según lo requirieron las condiciones topográficas; tanto los postes como los pie de amigos son de madera rolliza de la especie *Eucalyptus grandis.* El aislamiento cuenta con la instalación de tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14, y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12 debidamente templadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpia general de la franja (manual o mecánica) del aislamiento de 1 metro de ancho a lado y lado del cerco





Instalación de postes y pie de amigos de madera rolliza



Tres (3) cuerdas en alambre de púas y una (1) en alambre liso galvanizado

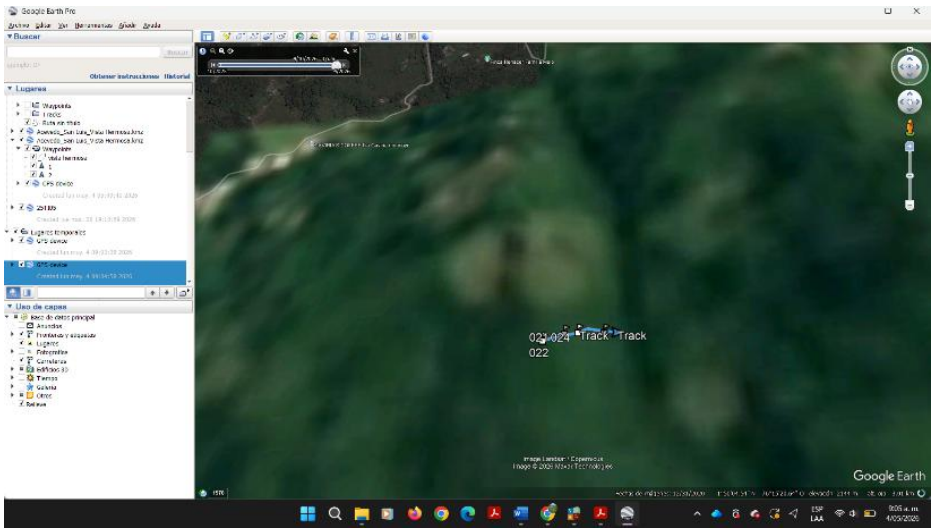


Imagen satelital del predio objeto de aislamiento

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 10-04-2026	Municipio: San Agustin	Vereda: Vereda El Retiro

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustin		Cedula o Nit:
Dirección:	Teléfono:	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Providencia Lote 1	Área Total del Predio:	Coord: X: 757379	Y: 694140	
Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Restauracion Pasiva.			

Objetivo de la Visita: Verificacion de implementacion de aislamiento

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica, para la verificacion de 118 metros lineales de aislamiento con postes en madera rolliza, a una distancia de 2,5M y pie de amigos a 30m o en donde la topografía asi lo requiere, 3 cuerdas de alambre de pua calibre #14 y una cuerda de alambre liso calibre #12.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se evidencia la implementacion de 118 metros lineales de aislamiento a cordo con las especificaciones técnicas.

__Nota:__ En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:** Erika Daniela Tejada Quiñonez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:** Africana Maria Calderon Vargas.

Municipio: San Agustín
Vereda: Alto del Obispo (zona rural)
Predio: Las Brisas
Metros lineales: 408
Fecha de la visita: 12 de mayo de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El 12 de mayo de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento a la ejecución del aislamiento, con el acompañamiento de profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio. Durante el recorrido se realizó la verificación del establecimiento de cuatrocientos ocho (408) metros lineales de aislamiento nuevo de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, a una distancia de 2.5 metros entre postes de madera rolliza, un (1) pie de amigo cada 30 metros o cuando las condiciones topográficas o de alineación así lo requieren, tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14 y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado calibre No 12.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento se ejecutó de la siguiente manera: limpieza general de la franja, con un (1) metro de ancho a lado y lado del aislamiento; hincado de ciento sesenta y tres (163) postes a una distancia de 2.5 metros entre sí, catorce (14) pie de amigos, ubicados cada 30 metros o según lo requirieron las condiciones topográficas; tanto los postes como los pie de amigos son de madera rolliza de la especie *Eucalyptus grandis.* El aislamiento cuenta con la instalación de tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14, y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12 debidamente templadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpia general de la franja (manual o mecánica) del aislamiento de 1 metro de ancho a lado y lado del cerco





Instalación de postes y pie de amigos de madera rolliza



Tres (3) cuerdas en alambre de púas y una (1) en alambre lizo galvanizado

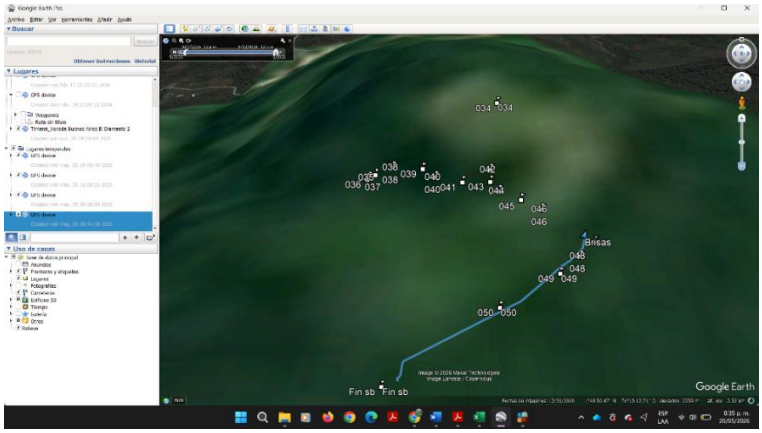


Imagen satelital del predio objeto de aislamiento

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Visita: 12-05-2026 | Municipio: San Agustín | Vereda: Alto del Ouspo

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín | Cedula o Nit: | Teléfono: | Correo electrónico:

Dirección:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Las Brisas | Área Total del Predio: 4ha | Coord: X: 757934 Y: 6738810

Asistencia Técnica | Ambiental | Social: | Productiva: | Otro:

Tipo de beneficio: Restauración Pasiva.

Objetivo de la Visita: Seguimiento en territorio convenio # 491-25.

DESARROLLO DE LA VISITA

En conjunto con profesional del DAGA San Agustín y delegado del CPGA Agrosur ejecutor del convenio, se recibió la verificación en territorio de 408 metros lineales de aislamiento nuevo, con postes y pie de amigo en madera rolliza y tres cuerdas en alambre de púas: calibre # 14 y una en alambre liso calibre # 12.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la verificación en territorio de 408 metros lineales de aislamiento nuevo, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Erika Jojoa 1007397345	Adriana María Calderón Vargas
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**
Luisa María 12165886	Nora Alejandra Parra L

Vereda: El Retiro (zona rural)
Predio: San Francisco
Metros lineales: 400
Fecha de la visita: 13 de mayo de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El 13 de mayo de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento a la ejecución del aislamiento, con el acompañamiento de profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio. Durante el recorrido se efectuó la verificación del establecimiento de cuatrocientos (400) metros lineales de aislamiento nuevo de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, a una distancia de 2.5 metros entre postes de madera rolliza, un (1) pie de amigo cada 30 metros o cuando las condiciones topográficas o de alineación así lo requieren, tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14 y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado calibre No 12.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento se ejecutó de la siguiente manera: limpieza general de la franja, con un (1) metro de ancho a lado y lado del aislamiento; hincado de ciento sesenta y cuatro (160) postes a una distancia de 2.5 metros entre sí, catorce (14) pie de amigos, ubicados cada 30 metros o según lo requirieron las condiciones topográficas; tanto los postes como los pie de amigos son de madera rolliza de la especie *Eucalyptus grandis.* El aislamiento cuenta con la instalación de tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14, y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12 debidamente templadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpia general de la franja (manual o mecánica) del aislamiento de 1 metro de ancho a lado y lado del cerco





Instalación de postes y pie de amigos de madera rolliza





Tres (3) cuerdas en alambre de púas y una (1) en alambre lizo galvanizado

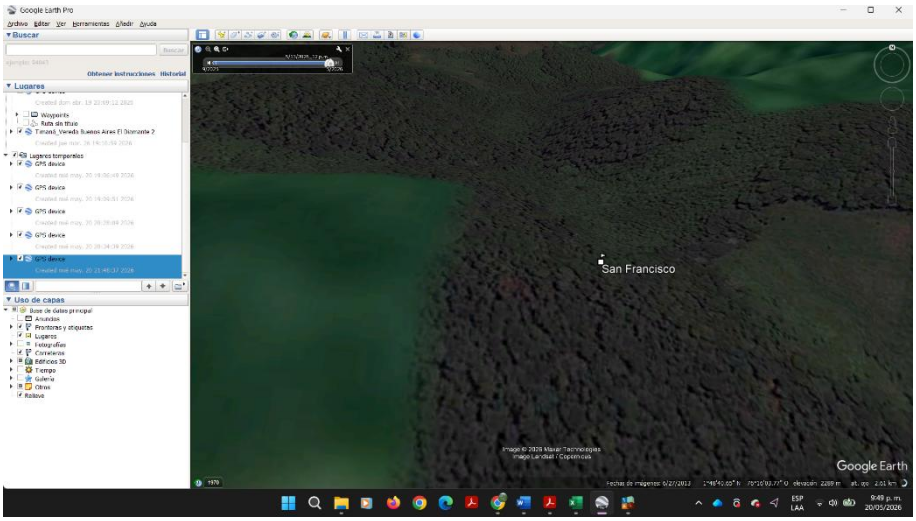


Imagen satelital del predio objeto de aislamiento

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 19-05-2026.	Municipio: San Agustín	Vereda: El Retiro.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín		Cedula o Nit:
Dirección:	Teléfono:	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: San Francisco	Área Total del Predio: 15 hs	Coord: X: 756557	Y: 6918688	
Asistencia Técnica	Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Restauración pasiva			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento en territorio - convenio # 491-25			

DESARROLLO DE LA VISITA

En conjunto con profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA Asejovur, ejecutor del convenio, se realizó la verificación en territorio de 400 metros lineales de cerramiento nuevo, con postes y pie de amigos en madera rolliza, tres cuerdas en alambre de púa calibre # 14 y una cuerda de alambre liso calibre # 12

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la verificación en territorio de 400 metros lineales de cerramiento nuevo a cordo con las especificaciones técnicas establecidas en el conve

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Erika Jay 1007372374	**Nombre de quién realiza la visita:** Adriana Mónica Calderón Noreña
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

Jesus Andres 12165886

Maria Alejandra Parra L.

Vereda: El Palmar (zona rural)
Predio: Parcela 18
Metros lineales: 2200
Fecha de la visita: 14 de mayo de 2026

SITUACIÓN ENCONTRADA:

El 14 de mayo de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento a la ejecución del aislamiento, con el acompañamiento de profesionales del DAMA municipio de San Agustín y delegados del CPGA AGROSUR, ejecutor del convenio. Durante el recorrido se efectuó la verificación del establecimiento de dos mil doscientos (2200) metros lineales de aislamiento nuevo de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, a una distancia de 2.5 metros entre postes de madera rolliza, un (1) pie de amigo cada 30 metros o cuando las condiciones topográficas o de alineación así lo requieren, tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14 y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado calibre No 12.

CONCLUSIONES

La instalación del aislamiento se ejecutó de la siguiente manera: limpieza general de la franja, con un (1) metro de ancho a lado y lado del aislamiento; hincado de ochocientos ochenta (880) postes a una distancia de 2.5 metros entre sí, setenta y cuatro (74) pie de amigos, ubicados cada 30 metros o según lo requirieron las condiciones topográficas; tanto los postes como los pie de amigos son de madera rolliza de la especie *Eucalyptus grandis.* El aislamiento cuenta con la instalación de tres (3) cuerdas de alambre de púas nuevo calibre No 14, y una (1) cuerda de alambre liso galvanizado nuevo calibre No 12 debidamente templadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpia general de la franja (manual o mecánica) del aislamiento de 1 metro de ancho a lado y lado del cerco





Instalación de postes y pie de amigos de madera rolliza





Tres (3) cuerdas en alambre de púas y una (1) en alambre lizo galvanizado

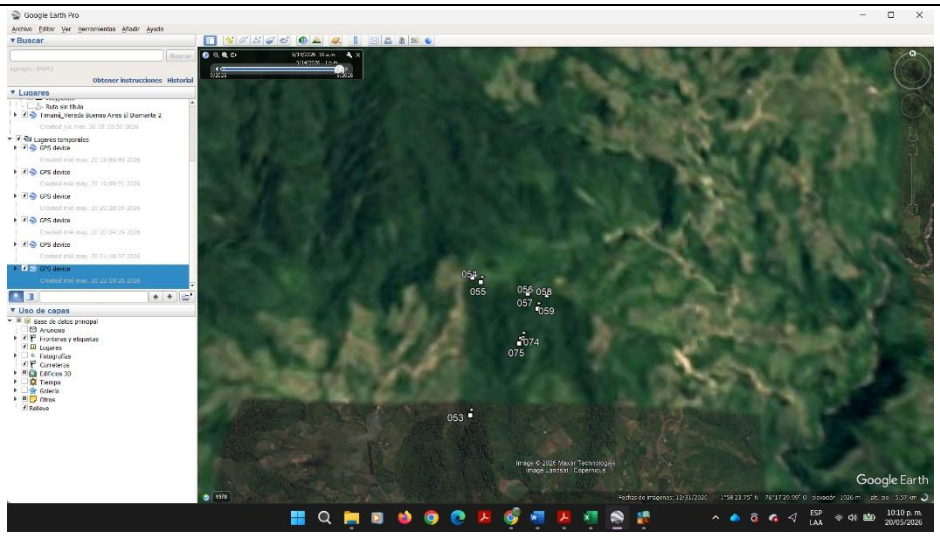


Imagen satelital del predio objeto de aislamiento

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 14-05-2026.	Municipio: San Agustín	Vereda: El Palmar	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín		Cédula o Nit:	
Dirección:	Teléfono:	Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Parcela # 18	Área Total del Predio: 11hr	Coord: X: 753250	Y: 709276
Asistencia Técnica: Ambiental: X	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio: Restauración pasiva.			
Objetivo de la Visita: Seguimiento en territorio convenio # 491 de 2025.			

DESARROLLO DE LA VISITA

En conjunto con profesionales del UMATA San Agustín y delegado de Agrosur por parte del ejecutor, se realizó la verificación en territorio de 2200 metros lineales de aislamiento nuevo, con postes y pie de amigos en madera rolliza, tres cuerdas de alambre de púa calibre # 14 y una de alambre liso galvanizado calibre # 12.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizó la verificación en territorio de 2200 metros lineales de aislamiento nuevo a cargo con las especificaciones técnicas establecidas en el Convenio

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Erika Daniela Ipali Q. 1007392374	**Nombre de quién realiza la visita:** Africa María Cabezas Vargas
Firma de quién recibe la visita: Yubistendy Correa 1084330366	**Firma de quién realiza la visita:** Jesus Arenas 12165886
