2026 jul 15 15,916,160.00

GEAGOR SAS BIC

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

PESOS MC.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2026000762
Fecha: 15/07/2026

A Favor de GEAGOR SAS BIC **NIT** 900544313
Dirección TV 19 A 98 28 OF 502 ED CENTRO EMPRESARIAL **Tipo Ident.**
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 14/08/2026 **Cheque por valor de** 15,916,160.00
Por valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000540-ACTA FINAL CTO
Detalle FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - CUNDINAMARCA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000112	2026000156	2.3.2.01.01.001.03.16 .024 VTAB 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativa	99999999999999	18,743,425.00
				TOTAL	18,743,425.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes y servicios / GEAGOR SAS BIC	15,916,160.00	00.00
111005001	Bogotá Cta Cte. 632000204 / GEAGOR SAS BIC	00.00	15,916,160.00
		Débitos 15,916,160.00	**Créditos** 15,916,160.00	**Valor Cheque** 15,916,160.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Adulto Mayor	3.00	15,750,778.00	472,523.00	COM	2026000540
EJF	Estampilla para la Justicia Familiar	2.00	15,750,778.00	315,016.00	COM	2026000540
FUE	Retención en la Fuente	6.00	15,750,778.00	945,047.00	COM	2026000540
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	15,750,778.00	94,505.00	COM	2026000540
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,992,647.00	448,897.00	COM	2026000540
PRO	Estampilla procultura	1.00	15,750,778.00	157,508.00	COM	2026000540
RDP	Retencion deportes	2.50	15,750,778.00	393,769.00	COM	2026000540

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
DIANAG			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002274139
Generado por: DIANA MILENA GUTIERREZ PRATO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/07/15	2026/07/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB	Beneficiario	GEASOR SAS BIC
Nro. Autorización	17290419	Valor a Pagar	$15,916,160.00
Fecha de Emisión	2026/07/15	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CC0204	Producto Destino	03164941344
Nro. Producto	******0204	Tipo Pago	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2026/07/15	Referencia / Nro. Factura	1
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Información Adicional	ACTA FINAL
Nro. Identificación	9005443131	Estado	En Proceso

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000540

Fecha: 02/jul./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GEAGOR SAS BIC

Tipo Identificación: **No:** 900544313 **Teléfonos:** 3143456775

Dirección: TV 19 A 98 28 OF 502 ED CENTRO EMPRESARIAL

Concepto: ACTA FINAL CTO 072/2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

Detalle: FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - CUNDINAMARCA

No. documento : FACT. FE-66 **Valor:** 18,743,425.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000112	2026000156	2.3.2.01.01.001.03.16 024 VTAB 005	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativa	9999999999999999	18,743,425.00	0

TOTAL 18,743,425.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
750302003	Estudios y Proyectos / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	75030102 / OPERA	15,750,778.00	00.00
750302003	Estudios y Proyectos / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	75030102 / OPERA	2,992,647.00	00.00
240101001	Bienes y servicios / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	15,916,160.00
243603003	Honorarios consultoria obra publica declarantes 6% / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	945,047.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido Regimen comun / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	448,897.00
243627332	Actividad de arquitectura e ingeniería y otras-Análisis Tecn / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	94,505.00
243690102	Estampilla Pro Adulto Mayor / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	472,523.00
243690104	Tasa Pro-Deporte y Recreación / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	393,769.00
243690105	Estampilla para la Justicia Familiar / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	315,016.00
243690106	Estampilla procultura 2025 / GEAGOR SAS BIC / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	157,508.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000540

Fecha: 02/jul./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Adulto Mayor	3.00	15,750,778.00
Estampilla para la Justicia Familiar-Bae $17.509.050	2.00	15,750,778.00
Honorarios consultoria obra publica declarantes 6%	6.00	15,750,778.00
Act arquitectura e ingenier-Otras consultoria técn-Análisis	0.60	15,750,778.00
Rete iva 15%	15.00	2,992,647.00
Estampilla procultura 2026 1 * 1000 Base 15.712.200	1.00	15,750,778.00
Tasa Pro-deporte y recreación	2.50	15,750,778.00

Sumas Iguales	18,743,425.00	18,743,425.00

Total : $ 15,916,160.00

Valor en letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: DIANAG

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

	SOLICITUD DE PAGO	CODIGO: GF-F002
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2021

NUMERO DE SOLICITUD	ACTA FINAL	FECHA DE SOLICITUD	2/07/26
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	NUMERO COMPROMISO	072 DE 2025
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	NIT	NUMERO ID	900.544.313-1
NOMBRE /RAZON SOCIAL	GEAGOR SAS - BIC	TIPO DE PERSONA	JURIDICA
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	BANCO BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 031-648413-44

DETALLE DEL PAGO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO GANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO GANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2026000156	2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua / VENTA AGUA EN BLOQUE / Operativo	N/A	N/A	024 VTAB	$ 18.743.425,00
TOTAL						$ 18.743.425,00

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ALCANTARILLADO	75030102 OPERACIÓN	$ 18.743.425,00
TOTAL		18.743.425,00

SOPORTES ANEXOS			
	SOLICITUD DE PAGO	INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICACION BANCARIA
	ACTA DE RECIBO FINAL	CERTIFICACION PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES	
	FACTURA	CERTIFICACION DE PAGO (Supervisor)	

RESPONSABLE

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA

SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO

SUBGERENTE O SUPERVISOR

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

FECHA DE RADICACION	02/07/2026
QUIEN RECIBE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO	SI [X] NO [ ]
OBSERVACIONES	
Elaboró:	FERNANDO LEGUIZAMÓN - PROFESIONAL DE APOYO A SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	FORMATO ACTA DE CORTE PARCIAL	CÓDIGO: GF-F006
		VERSIÓN: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

ACTA FINAL

ORDEN DE SERVICIOS: 072 - 2026

CONTRATISTA: GEAGOR SAS - BIC

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 99.000.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	06 DE JULIO DE 2026
VALOR ACTA No. 1:	$ 80.256.575
VALOR ACTA FINAL:	$ 18.743.425
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE JULIO DE 2026

En Tocancipá a los dos (02) días del mes de julio del año 2026, se reunieron en la Empresa de servicios Públicos, la subgerente Técnico-operativa ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA, en su calidad de supervisor del contrato número 072 de 2026 y ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, en calidad de representante legal de **GEAGOR SAS - BIC** empresa CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, con el objeto de suscribir la presente Acta Final y efectuar el pago correspondiente al 100% de ejecución de la obra y correspondiente cobro de interventoría, por cuanto se ha recibido a entera satisfacción.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($18.743.425) M/CTE.** Con el presenta acta se acumula el monto equivalente al 100% del valor total del contrato.

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO
Elva Jeannette Cuevas Bautista
Supervisor del contrato
ESPT S.A.

GEAGOR SAS - BIC R/L ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ.

Elaboró. Fernando Leguizamón – Profesional apoyo área técnica operativa.

GEAGOR S A S - BIC

NIT: 900544313-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 19 A 98 28 OF 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143456775

Autorización facturación electrónica No. 18764076217844 válida desde 2024-07-31 hasta 2026-07-31 rango desde FE1 hasta FE200

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900227413
Nombre o Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
Dirección:	CL 10 6 63, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia, CP 251010
Teléfono:	3103082275
Email:	atencionalusuario@esptocancipa.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FE66
Fecha Emisión	02/07/2026 10:45:30
Fecha Vencimiento	02/08/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	02/08/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM	% V/R	MONTO		
1	184	ACTA DE CORTE FINAL CONTRATO 072 DE 2026 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA.	WSD	1,00	$15.750.778,00	IVA	19%	2992647	0,00	$15.750.778,00

Impuestos			
	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$15.750.778,00	19,00%	$2.992.647,00

Subtotal:	$15.750.778,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$2.992.647,00
Total:	$18.743.425,00

CUFE:	749a963c9a28f1e79a349f7e1ec98b9cf9bb4026465d635af45ff4bba16c36d3f8c27ca73b78e052310c427f159d9c69
Total con letra:	(dieciocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos)

Firma Digital: WH63+U4UfLUbBp5/r3w0XaefTQ2rVsQTR4dTjp1wPoxaSoAmtXu8kOQXSmuqbtn
zUlZaDnL5qpuPjQzPnUCpeQ4kHadzmPMBbK48mXTDbAX
OMevpLaeRNPEWmC IDbcdDs+yPWaXqbwbK0BhXA2JkTVjYmgBqjVw8WvU4aMZG0BUPI0VY7ab10AVh N8BpxrGWWLR1R6BXWOFV+V3P15EUTQIMuNM
uBbOMWbbvAjTMTOFRgpUo66ZbTMlt M2vpQJTOFn2bK6tXpeaK7t0UuPUZWBT5RLCBRoobGQpLrcSja2cdfaK4aHTK GkbG6NBYGsPu+DF2os
uQpw

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.830.059.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

GEAGOR S A S - BIC

NIT: 900544313-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 19 A 98 28 OF 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143456775

Autorización facturación electrónica No. válida desde hasta rango desde hasta

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900227413
Nombre o Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
Dirección:	CL 10 6 63, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia, CP 251010
Teléfono:	3103082275
Email:	atencionalusuario@esptocancipa.gov.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NC27
Fecha Emisión	01/07/2026 14:04:57
Fecha Vencimiento	25/07/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	25/07/2026
Total de Líneas:	1

DOCUMENTOS RELACIONADOS					
No.:	FE65	Tipo:	Factura	Fecha:	25/06/2026
CUFE / CUDE:	75512dc65ee6f1437f5202f36102edbc22497c6b53bb6dc1e291d8283dd57fa210e56907d734c3f5a41f916af8dbe8e5c				

CONCEPTOS DE LA NOTA	
Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	ERROR EN LA NOTA DE DETALLE

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% IVA	MONTO		
1	184	ACTA DE CORTE FINAL CONTRATO 072 DE 2026 OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	WSD	1,00	$15.750.778,00	IVA	19%	2992647	0,00	$15.750.778,00

Impuestos			
Impuesto	Base	Tarifa / Valor por unidad	Importe
01 IVA	$15.750.778,00	19,00%	$2.992.647,00

Subtotal:	$15.750.778,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$2.992.647,00
Total:	$18.743.425,00

CUDE:	2e872b137f5a13be870672852276a20d054630a4358b78a8a684d30e5373141f8648a4472e4f07ff0787eda83b2ae251
Total con letra:	(dieciocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos)

Firma Digital: GqeQuCUXZLZopDPTCDVSvNtlcTSCOoVA6bNNPSG89QAdOR0fvn1HDavkTZMEC
R KnvRZ8bNOrQdBgkqvDwG0DrOn7m5SGcrQjwBNvQjeAMMDY4
KSrQbSbaEfkcV 4m3k+6hEgaTgacAPFWbzpSDBBaEbIyRTVvN U5ghZAQ3UJmfbDSvmGsSg cXcgOXfEaMVkvdeeA2AbzCCgUavaNDTJX
1DeRobhQSxc564/qoZywuXdBeExc7 JGem14BLa1GdFQFMXEqKfNdBDDCDboyKx+SvPB4127eRoyyt6Zxq/RXgcA/Mo r3ECfgauqbrfWhAJ6MbP
Wee

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830435334-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP.	Hoja 1 / 2
		Fecha: 24/11/2025
	SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA	Contrato: 072 de 2026

FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072-2026

CONTRATISTA:	GEAGOR SAS – BIC

I. OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

El presente informe tiene como objetivo exponer el estado actual de la supervisión técnica, del contrato de interventoría No. 072 de 2026 el cual supervisa el contrato de obra No. 071 – 2026 el cual lleva por objeto "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA" de la red de alcantarillado sanitario del sector, dentro del periodo del 20 de mayo de 2026 al 15 de junio de 2026, realizado por el contratista y por lo que se expone el recibo de lo que se menciona en el informe.

En el marco del Contrato de Obra No. 072 de 2026, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra 071 – 2026 cuyo objeto es obras para la rehabilitación del alcantarillado sanitario en el sector Las Mercedes del municipio de Tocancipá, se adelantaron las actividades correspondientes a perforación dirigida sin zanja, instalación de tubería, construcción de estructuras complementarias y otras, con el fin de

garantizar la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales domésticas de la zona de intervención.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al acta No. 2, por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio, el cual se encuentra con un avance del 100% de Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo de ejecución se logró avanzar de manera satisfactoria en las actividades programadas para la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en el sector Las Mercedes - Tocancipá. Las obras realizadas cumplen con los parámetros técnicos establecidos, aportando al mejoramiento de la infraestructura de saneamiento básico del municipio y al bienestar de la comunidad beneficiada.

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe desde el 21 de mayo al 15 de junio de 2026.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Actividades ejecutadas:

Perforación dirigida sin zanja.
Se realizaron perforaciones sin zanja con profundidad variable según diseño, cumpliendo con las especificaciones técnicas y las medidas de seguridad requeridas.

Las perforaciones fueron apoyadas con sistema de protección del personal y la estabilidad de la zanja.

Instalación de tubería.

Se instaló tubería de polietileno de alta densidad de 16" pulgadas (240 mm) de diámetro, destinada a la conducción del alcantarillado sanitario.

La tubería se dispuso siguiendo las pendientes y alineamientos existentes en los planos de diseño.

Se aplicaron pruebas de nivelación y alineación antes de puesta en funcionamiento.


Para garantizar la estabilidad de los trabajos y la seguridad laboral, se implementó las perforaciones por tramos para gárantizar las pendientes existentes.

Posteriormente, el lanzamiento de la tubería con perforación dirigida sin zanja por tramos establecidos de aproximadamente 90 metros lineales donde en total se realizaron 3 lanzamientos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en los pliegos del contrato.

Construcción de un pozo de inspección nuevo.

Adecuación de pozos intervenidos, dejándolos operativos sin filtraciones.

Red trabajando con total normalidad manteniendo flujo constante sin represamientos en pozos ni tubería nueva instalada.

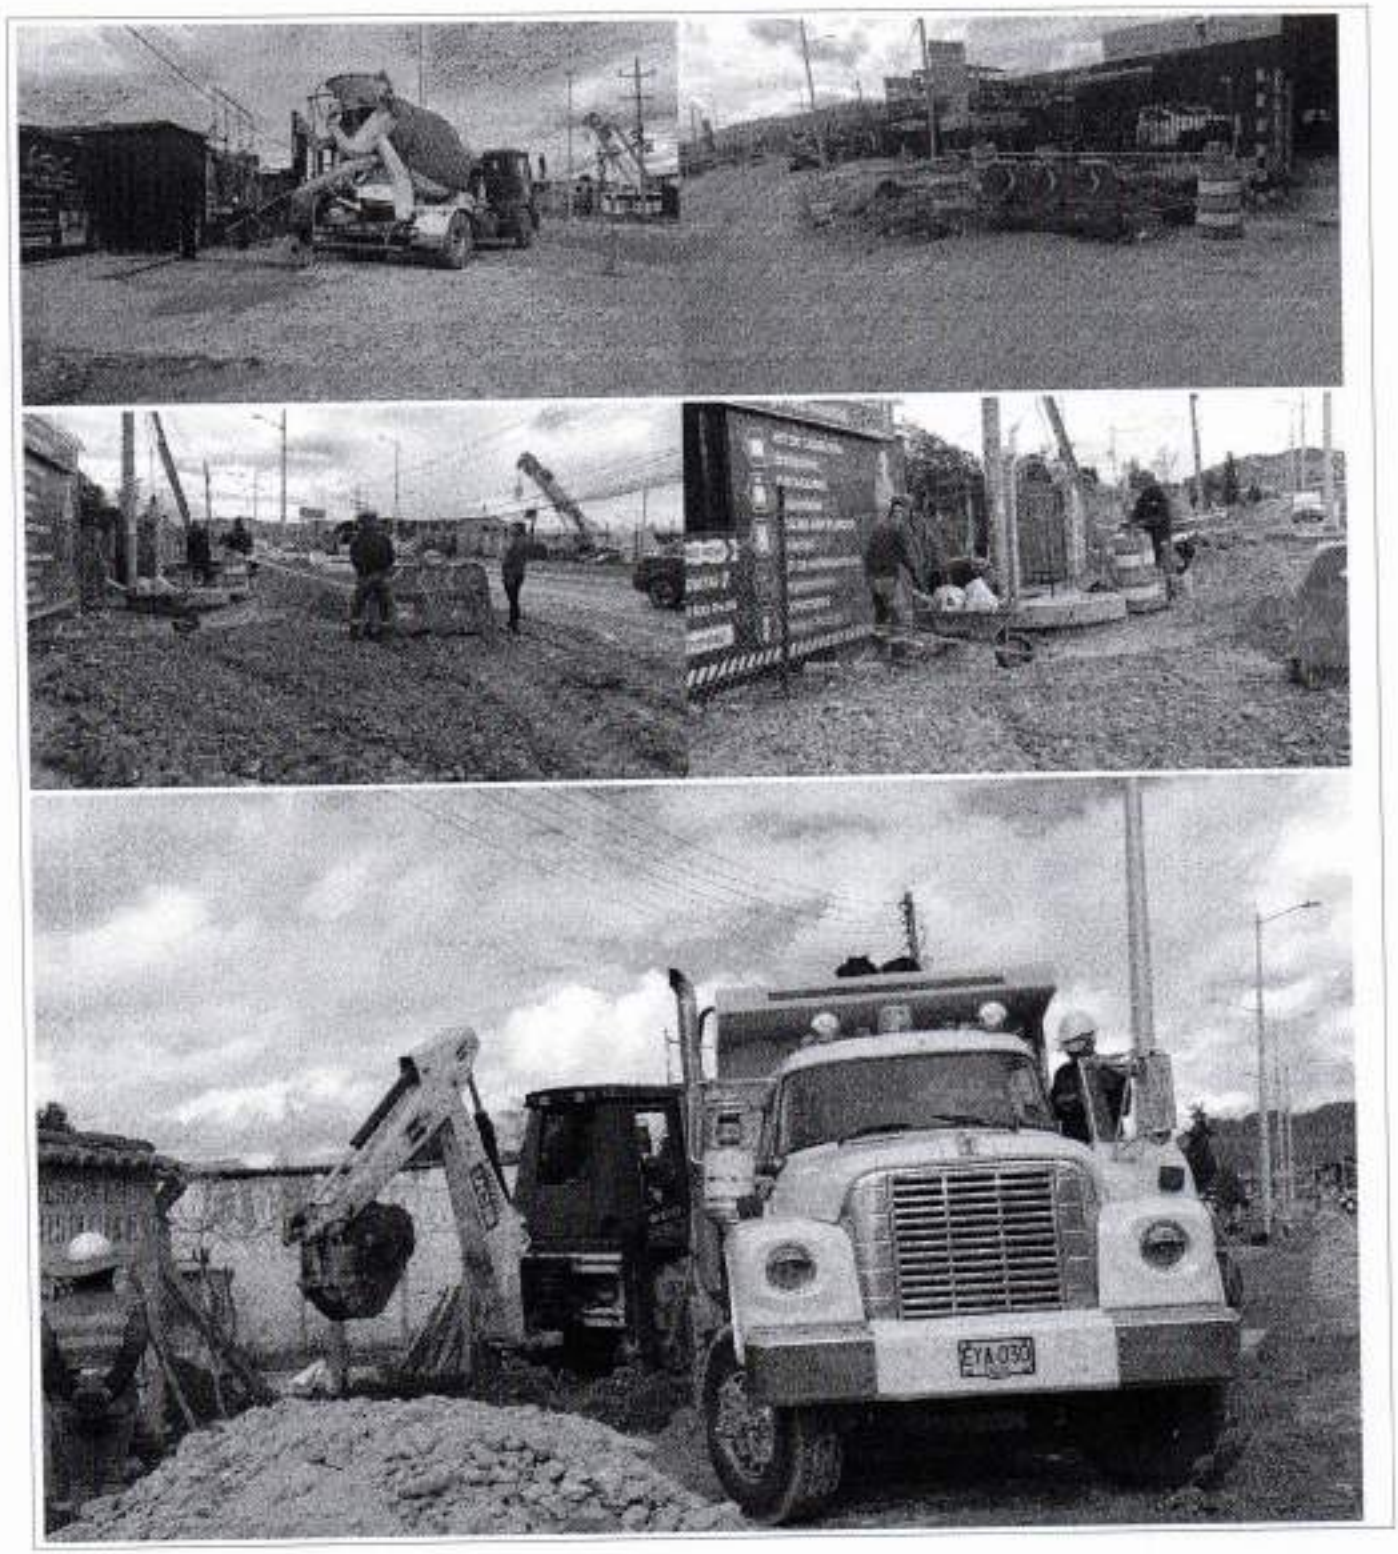
EYA 030

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista tiene un cumplimiento del 100%, el contratista ha cumplido con las obligaciones en el contrato, dentro del periodo del 20 de mayo al 15 de junio de 2026, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR:

Proyectó: Fernando Leguizamón – Profesional de Apoyo Área Técnico Operativa

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141060288637

(415)7707212489984(8020) 000014106028863 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 4 4 3 1 3 | 6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 9 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: GEAGOR S A S - BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla: GEAGOR S A S

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: TV 19 A 98 28 OF 502 ED CENTRO EMPRESARIAL 98 28

42. Correo electrónico: gerencia@geagor.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 3 4 5 6 7 7 5

45. Teléfono 2: 6 0 1 4 5 5 3 6 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 1 2 0 7 2 9	4 2 9 0	2 0 1 2 0 7 2 9	4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

64. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ | 60. No. de Folios

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: PALACIOS LEON ANNIE ZORAYA

965. Cargo: Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060288637

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 9	2 0 2 4 0 6 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 1 0	2 0 2 4 0 6 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 2 2 4 2 8 1 8	0 2 2 4 2 8 1 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 7 2 9
81. Hasta	2 0 5 2 0 7 2 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	4 9	2 0 1 2 0 8 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060288637

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900543133 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 13. Buzón electrónico: 32

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2012_07_28

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 13 | 101. Número de identificación: 1077968979 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: AGUIRRE | 105. Segundo apellido: ORTIZ | 106. Primer nombre: ELBER | 107. Otros nombres: RAMIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

2

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

3

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

4

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

5

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GEAGOR SAS BIC

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Los abajo firmantes en condición de Representante Legal y contador público de **GEAGOR S.A.S. BIC** con Nit. **900.544.313-1**, empresa debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, de los últimos seis (06) anteriores a la fecha de expedición del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto 1828 de 2013 la compañía es exenta de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus Empleados.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de junio del año 2026.

Atentamente,

SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA
C.C. No. 52.372.721 de BOGOTA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 164900-T

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.077.968.979 de Villeta
Representante Legal
GEAGOR S.A.S. BIC

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.968.979

AGUIRRE ORTIZ

APELLIDOS

ELBER RAMIRO

NOMBRES



Elber Aguirre O.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1989

VILLETA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

03-JUL-2007 VILLETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1532800-00092070-M-1077968979-20061010 0004171225A 1 25657829

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.372.721

SOSA PEÑALOSA

APELLIDOS

SANDRA YASMIN

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00134662-1-0052372721 20081207 0007624324A 2 1980098656



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164900-T

SANDRA YASMIN
SOSA PEÑALOSA
C.C. 52379721
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175071



FIRMA DEL TITULAR 91788

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

676FD36AE58335 5B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52372721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación
Bancaria

Martes, 28 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que GEAGOR SAS GEAGOR SAS identificado(a) con NIT 900544313, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	03164941344	2016-09-01	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP	CERTIFICADO SUPERVISOR	CÓDIGO: GF-F005
		VERSIÓN: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

LA SUSCRITA SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ SA ESP

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por **GEAGOR SAS - BIC**, según contrato No. 072 – 2026, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."** donde se incluyen valores ejecutados pendientes de pago y cantidades ejecutadas llegando al 100% del total del contrato ejecutado, por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la obra ejecutada.

La presente se expide en Tocancipá, a los dos (02) días del mes de julio del año 2026 de acuerdo al Acta Final y autoriza el pago de la suma de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($18.743.425) M/CTE.**

Cordialmente,

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
Subgerente Técnico Operativo
ESPT S.A. ESP

Elaboró. Fernando Leguizamón – Profesional apoyo área técnica operativa.

GEAGOR SAS BIC

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Los abajo firmantes en condición de Representante Legal y contador público de **GEAGOR S.A.S. BIC** con Nit. **900.544.313-1**, empresa debidamente Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, de los últimos seis (06) anteriores a la fecha de expedición del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto 1828 de 2013 la compañía es exenta de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus Empleados.

Dada en Bogotá D.C. a los 02 días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA
C.C. No. 52.372.721 de BOGOTA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 164900-T

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.077.968.979 de Villeta
Representante Legal
GEAGOR S.A.S. BIC

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUALES	CODIGO:	AL-F049
		VERSION:	02
		FECHA:	AGOSTO DE 2021

CONTRATO No. 072	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

DESCRIPCIÓN	Contratista	Interventoría	ESTADO			ENTREGA	OBSERVACIONES
			SI	NO	N/A		
1. INTRODUCCIÓN			X				
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO			X				
4. CONTRATO DE INTERVENTORIA			X				
4.1 Información del contrato de interventoria			X				
4.2 Estado legal del contrato de interventoria			X				
4.3 Actividades ejecutadas en el periodo			X				
4.4 Estado Financiero del contrato de interventoria			X				
4.5 Personal de la Interventoria AL-F033 RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.			X				
4.6 AL-F031 Información de seguridad social interventoria			X				
4.7 Equipos de la Interventoria - AL-F034 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (puede ser presentado en el numeral 3.8)			X				
4.8 Relación de actas de comité del contrato (adjuntar documentos en medio físico, generadas en el periodo)			X				
4.9 Relación de informes semanales generados en el periodo.			X				
4.10 Relación de correspondencia del periodo.			X				
4.11 Conclusiones y recomendaciones			X				
REGISTRO FOTOGRAFICO			X				
ACTAS DE VENCIBILIDAD (En el periodo que apliquen)			X				
COPIA DE LA BITACORA DE OBRA DEL PERIODO			X				
AL F-035 Condiciones climatológicas			X				

REVISO:
Nombre (s): IVAN FERNANDEZ

ELABORO:
Nombre (s): SEBASTIAN BOHORQUEZ

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO:	AL-F052
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	JUNIO DE

ACTA FINAL

CONTRATO No.:	072 de 2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	GEAGOR S.A.S BIC
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 99.000.000,00
REPRESENTANTE LEGAL:	ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
NIT:	900644313-1
SUPERVISOR:	ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
PLAZO DE EJECUCION:	TRES MESES
FECHA DE INICIACION:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	06 DE JULIO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 DE JUNIO DE 2026

En la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipá S.A ESP a los diecinueve (19) días del mes de JUNIO del AÑO 2026, se reunieron , ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA como Supervisora del Contrato de Interventoria No. 072 de 2026, ELBER AGUIRRE ORTIZ en

PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO BÁSICO MENSUAL	% DEDIC.	FM	VALOR MES	VALOR CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
					TIEMPO MESES	TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL			TIEMPO MESES	TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL
Director de Interventoria	5.000.000,00	30,00%	2,00	$ 3.000.000	3,0	$ 9.000.000,00	2,65	7.950.000,00	0,35	1.050.000,00	3,00	9.000.000,00	0,00	-
Residente de interventoria	3.500.000,00	100,00%	2,00	$ 7.000.000	3,0	21.000.000,00	2,65	18.550.000,00	0,35	2.450.000,00	3,00	21.000.000,00	0,00	-
Profesional SST	3.000.000,00	100,00%	2,00	$ 6.000.000	3,0	18.000.000,00	2,65	15.900.000,00	0,35	2.100.000,00	3,00	18.000.000,00	0,00	-
Asesor hidraulico	5.000.000,00	30,00%	2,00	$ 3.000.000	3,0	9.000.000,00	2,65	7.950.000,00	0,35	1.050.000,00	3,00	9.000.000,00	0,00	-
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL						$ 57.000.000,00		50.350.000,00		6.650.000,00		$ 57.000.000,00		$ -

PERSONAL TÉCNICO	VALOR SUELDO BÁSICO MENSUAL	% DEDIC.	FM	VALOR MES	VALOR CONTRATADO		ACTA PARCIAL No.01		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
					TIEMPO MESES	TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL			TIEMPO MESES	TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL
Topógrafo	2.500.000,00	50,00%	2,00	$ 1.500.000	3,0	4.500.000,00	2,65	3.975.000,00	0,35	525.000,00	3,00	4.500.000,00	0,00	-
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO						$ 4.500.000,00		3.975.000,00		525.000,00		$ 4.500.000,00		$ -
TOTAL PERSONAL						$ 61.500.000,00		54.325.000,00		7.175.000,00		$ 61.500.000,00		$ -

OTROS COSTOS	VALOR CONTRATADO				ACTA PARCIAL No.01		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
	UNIDAD	VALOR MES	CANTIDAD MES	VALOR TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL			TIEMPO MESES	TOTAL	TIEMPO MESES	TOTAL
alquiler de oficina	MES	$ 2.000.000,00	3	6.000.000,00	2,65	5.300.000,00	0,35	700.000,00	3,00	6.000.000,00	0,00	-
transporte	MES	$ 1.000.000,00	3	3.000.000,00	2,65	2.650.000,00	0,35	350.000,00	3,00	3.000.000,00	0,00	-
equipos de oficina	MES	$ 1.000.000,00	3	3.000.000,00	2,65	2.650.000,00	0,35	350.000,00	3,00	3.000.000,00	0,00	-
papeleria	MES	$ 950.000,00	3	2.850.000,00	2,65	2.517.500,00	0,35	332.500,00	3,00	2.850.000,00	0,00	-
ensayos de control de calidad	GLB	$ 1.843.278,00	1	1.843.278,00	-	-	1,00	1.843.278,00	1,00	1.843.278,00	0,00	-
equipos de topografia	GLB	$ 5.000.000,00	1	5.000.000,00	-	-	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	0,00	-
SUBTOTAL OTROS COSTOS				$ 21.693.278,00		13.117.500,00		8.575.778,00		$ 21.693.278,00		$ -

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL	$	82.193.278,00	$	67.442.500,00	$	10.750.778,00	$	82.193.278,00	$	-
IVA 19%	$	15.896.722,00	$	12.914.975,00	$	2.982.647,00	$	15.896.722,00	$	-
AJUSTE AL PESO	-$	0,00	$	-	-$	0,00	-$	0,00		
VALOR TOTAL	$	98.090.000,00	$	80.356.975,00	$	13.743.425,00	$	98.090.000,00	$	-

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	99.000.000,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01	$	80.256.975,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$	18.743.425,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	99.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA		100%

En constancia se firma en Tocancipá a los 19 días del mes de JUNIO del año DOS MIL VEINTISEIS (2026).

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
RL GEAGOR S.A.S BIC
CONTRATISTA

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
SUPERVISOR

FABIAN MAX ORTIZ
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
RU ALCANTARILLADO

GEAGOR SAS BIC

NIT. 900.544.313-1

INFORME FINAL
20 de Mayo al 15 de Junio
2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.

INFORME FINAL

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."



ELABORADO POR

ING. SEBASTIÁN BOHÓRQUEZ

INGENIRO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

GEAGOR SAS



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4
3.2. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 5
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO 5
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 9
3.6. INFORME DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA 9
3.7. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 9
3.8. ACTAS DE COMITÉ 10
3.9. INFORMES SEMANALES 10
3.10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 11
3.10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 11
3.10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 11
3.11. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 12
4. ANEXOS 12

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final de Interventoría tiene como objetivo consolidar y presentar los resultados del seguimiento, control y verificación efectuados durante toda la ejecución del contrato de obra cuyo objeto corresponde a las "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA".

Durante el desarrollo del contrato, la interventoría ejerció el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social a las actividades ejecutadas por el contratista, realizando el respectivo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, la normatividad vigente aplicable y los estándares de calidad requeridos para la correcta ejecución de las obras.

El presente documento consolida la información correspondiente a la ejecución física y financiera del proyecto, el control y seguimiento de la programación de obra, la supervisión de los procedimientos constructivos implementados, la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST), el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y la gestión de los aspectos sociales derivados de la intervención realizada sobre el corredor vial objeto del contrato.

Asimismo, se presentan las observaciones, verificaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría durante la ejecución contractual, así como la evaluación del desempeño del contratista en relación con el cumplimiento de las actividades programadas, la disponibilidad y utilización de personal, maquinaria y equipos, y la atención de las novedades y situaciones relevantes registradas durante el desarrollo del proyecto.

Las actividades desarrolladas durante el presente mes estuvieron orientadas a dar continuidad a las obras de rehabilitación y optimización de la red de alcantarillado sanitario existente, mediante la ejecución de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones hidráulicas y operativas del sistema, fortalecer la funcionalidad de la infraestructura sanitaria y contribuir al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico del sector intervenido.

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@gcagur.com

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras objeto de intervención se encuentran ubicadas sobre el costado oriental de la vía nacional Carrera Cuarta, en el sector comprendido entre La Hormiga y Las Mercedes Segunda Etapa del municipio de Tocancipá, Cundinamarca, correspondiendo a la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario municipal sobre la cual se ejecutan actividades de rehabilitación orientadas al mejoramiento funcional, hidráulico y estructural de la red sanitaria existente y sus estructuras asociadas.



Ilustración 1 Localización del proyecto



Fuente: Google Earth

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información General Del Contrato De Interventoría

A continuación, se describe la información del contrato de interventoria celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá y la empresa GEAGOR SAS BIC:

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	072 DE 2026
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.
NIT.	900.227.413-9
CONTRATISTA:	GEAGOR SAS-BIC
NIT.	900.544.313-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	1.077.968.979 DE VILLETA
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 19^{A} No 98 – 28 OFICINA 502 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98 -28 BOGOTA, D, C
TELÉFONOS	4553671-3143456775
E-MAIL	GERENCIA@GEAGOR.COM
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($99.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	TRES (3) MESES
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN:	TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

3.2.ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se relaciona pólizas de suscripción y actualizadas a acta de inicio. A la fecha no se han generado actos administrativos al contrato.

3.2.1.POLIZA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

ASEGURADORA	NÚMERO DE POLIZA	GARANTIA	VALOR ASEGURADO	INICIO	FIN
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-45-101134937	CUMPLIMIETO	$19.800.000,00	26-03-2026	26-06-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$19.800.000,00	26-03-2026	26-06-2027
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$4.950.000,00	26-03-2026	26-06-2029

3.2.2. POLIZA ACTA DE INICO

ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	GARANTIA	VALOR ASEGURADO	INICIO	FIN
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-45-101134937	CUMPLIMIETO	$19.800.000,00	07-04-2026	08-07-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$19.800.000,00	07-04-2026	08-07-2027
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$4.950.000,00	07-04-2026	08-07-2029

3.3.ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO


A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo:

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

MANEJO DE AGUA	 
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR	 
ENTIBADO METÁLICO	 

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

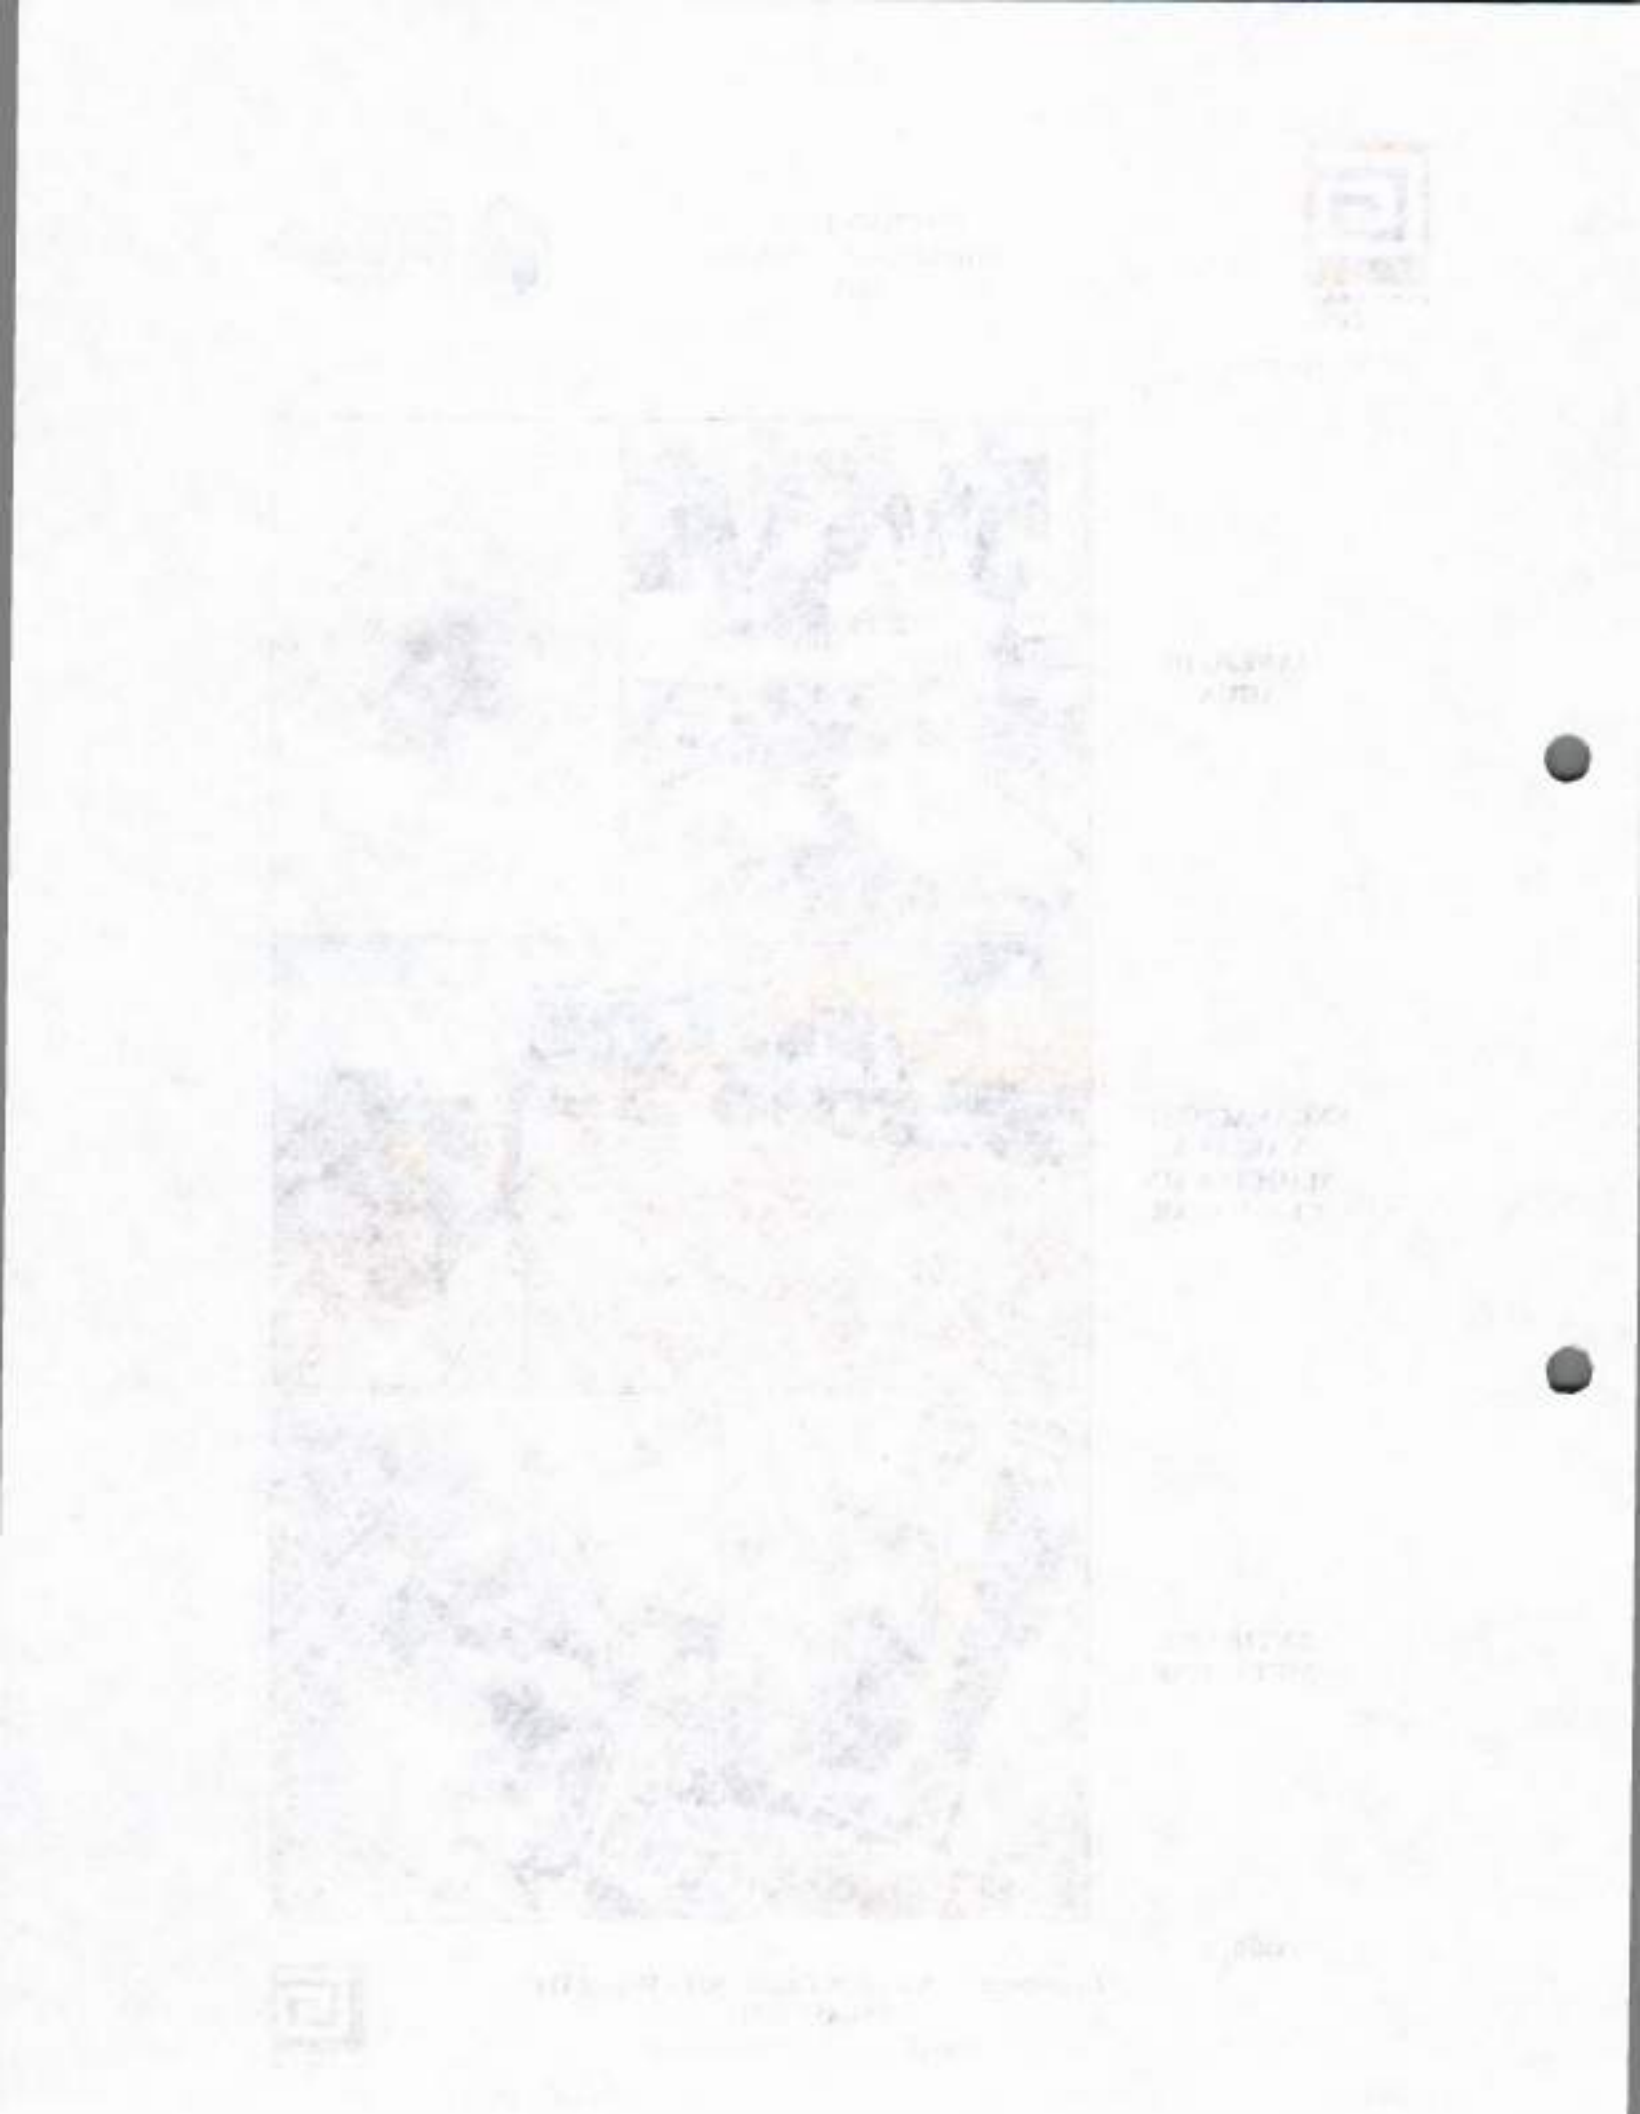

PLACA FONDO DE POZO	 
PLACA CUBIERTA DE POZO	 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN POLIPROPILENO	

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@eagor.com

NIT. 900. 544.313-1

SUBBASE GRANULAR	
SECCIÓN CILÍNDRICA DE POZO	
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geogor.com



TRANSPORTE DE MATERIALES	

Fuente: GEAGOR SAS-BIC

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR
VALOR CONTRATADO	$ 99.000.000,82
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 80.256.575,00
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 18.743.425,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 99.000.000,82
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe se conto con el personal mínimo requerido para verificar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de obra, el cual se relaciona en formato **AL-F033**.

3.6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA.

Revisar anexos, formato **AL-F031**.

3.7. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el equipo de medición requerido en el proyecto según contrato de obra 072 de 2026:

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

Equipo Utilizado por la Interventoria						
Nombre del Equipo	**Actividad en la que se usa**	**No. Serie / ID**	**Precisión**	**No. Certificado de Calibración y/o verificación**	**Fecha Certificado**	**Certificado Vigente hasta**
NIVEL RUIDE	CONTROL NIVELACIÓN	X261337	2mm/Km	HA 095	16-may-26	16-nov-26
ESTACIÓN TOPCON	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	4F0840	2mm + 2ppm	3115	24-ene-26	24-jul-26

3.8. ACTAS DE COMITÉ

Durante el periodo se realizaron comités de seguimiento al avance y ejecución de actividades, se relacionan a continuación:

FECHA	NUEMRO DE ACTA	LUGAR DEL COMITÉ
17 de abril de 2026	01	Obra
23 de abril de 2026	02	Obra
30 de abril de 2026	03	Obra
7 de mayo de 2026	04	Obra
14 de mayo de 2026	05	Obra
21 de mayo de 2026	06	Obra
28 de mayo de 2026	07	Obra
4 de junio de 2026	08	Obra
11 de junio de 2026	09	Obra

3.9. INFORMES SEMANALES

En cumplimiento a los estándares de calidad de la empresa, se diligencia formato AL-F029, en el cual se consolida información de avance fisico y financiero del proyecto y las actividades desarrolladas en el periodo.

NUMERO DE INFORME SEMANAL	PERIODO
01	Del 07 al 12 de abril de 2026
02	Del 13 al 19 de abril de 2026
03	Del 20 al 26 de abril de 2026
04	Del 27 de abril al 03 de mayo de 2026
05	Del 04 al 10 de mayo de 2026
06	Del 11 al 17 de mayo de 2026
07	Del 18 al 24 de mayo de 2026
08	Del 25 al 31 de mayo de 2026
09	Del 01 al 07 de junio de 2026
10	Del 08 al 14 de junio de 2026

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@cador.com

Se anexan informes semanales en formato **AL-F029**.

3.10. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se relaciona cuadro de correspondencia enviada y recibida por la presente interventoría

3.10.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

NUMERO DE OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO
RMH-001	Solicitud de aprobación de cambio de Director de Interventoría – Contrato No. 072 de 2026	ESPT
RMH-002	Requisitos para ingreso al proyecto de personal operativo, administrativo, maquinaria y equipos. – contrato de obra no. 071 – 2026	BYM INGENIERIA SAS
RMH-003	Solicitud de documentos al contratista	BYM INGENIERIA SAS
RMH-004	Solicitud de documentos al contratista	BYM INGENIERIA SAS
RMH-005	Entrega de Póliza de cumplimiento 14-45-101134937 Cumplimiento Particular.	ESPT
RMH-006	Entrega de Póliza de cumplimiento 14-45-101134937 Cumplimiento particular actualizada a acta de inicio.	ESPT
RMH-007	Respuesta solicitud de cambio de Residente de Obra – Contrato No. 071 de 2026	BYM INGENIRIA SAS
RMH-008	Aval de Acta Parcial de Obra No.001	BYM INGENIERIA SAS
RMH-009	Aval del Acta No.2 Terminación y Recibo Final	BYM INGENIRIA SAS

3.10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

NUMERO DE OFICIO	ASUNTO	ORIGEN
COMTOCANCIPA-001	Entrega de Pólizas de inicio del contrato.	BYM INGENIERIA SAS
COMTOCANCIPA-002	ASUNTO: Entrega de pólizas conforme al acta de inicio del contrato.	BYM INGENIERIA SAS
COMTOCANCIPA-003	Notificación avería en máquina para perforación dirigida de tubería de 16" PN 6.	BYM INGENIERIA SAS
COMTOCANCIPA-005	Notificación cambio de profesional asignado al Contrato No. 071 de 2026.	BYM INGENIERIA SAS

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@geagor.com

COMTOCANCIPA-006	Informe Corte de Obra N° 1 del periodo comprendido entre 07 de abril y 08 de mayo de 2026	BYM INGENIERIA SAS
COMTOCANCIPA-009	Informe CORTE DE OBRA 02 del periodo comprendido entre 08 de mayo a 10 de junio de 2026 y LIQUIDACIÓN.	BYM INGENIERIA SAS

3.11. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Las actividades de rehabilitación ejecutadas sobre la red de alcantarillado sanitario ubicada en el costado oriental de la vía nacional Carrera Cuarta, sector La Hormiga – Las Mercedes Segunda Etapa del municipio de Tocancipá, se desarrollaron conforme al alcance contractual, los estudios y diseños aprobados y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
- Las intervenciones realizadas permitieron mejorar las condiciones funcionales, hidráulicas y estructurales de la infraestructura sanitaria existente, contribuyendo al fortalecimiento de la operación del sistema de alcantarillado del sector intervenido.
- Durante la ejecución del contrato, la interventoria efectuó el seguimiento y control permanente de las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de los procedimientos técnicos, los estándares de calidad y la normatividad aplicable.
- Se realizaron los respectivos comités de obra y actividades de coordinación entre las partes, permitiendo efectuar el seguimiento al avance del proyecto y la atención oportuna de las situaciones presentadas durante la ejecución de las obras.

ING. ESP - IVAN DARIO HERNANDEZ NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

4. ANEXOS

- AL- F033 RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA
- AL - F031 INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA
- AL – F034 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
- AL - F013 ACTAS DE COMITÉ
- AL – F029 INFORME SEMANAL
- CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
- AL- F039 REGISTRO FOTOGRAFICO
- ACTAS DE VECINDAD
- COPIA BITACORA DE OBRA
- AL – F035 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Transversal 19 A # 98-28 Oficina 503 – Bogotá D.C.
601 455 3671
E-mail gerencia@eagor.com

	RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	AL-F033
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No. 071

OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072
PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

No	NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES PERIODO MAYO (Cantidad de horas trabajadas en el día)																													
			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Daniel Sebastian Caballero Torres	ESP hidráulico Interventoría	F	S	D	8	8	8	8	8	5	D	8	8	8	8	8	5	D	F	8	8	8	8	8	D	8	8	8	8	8	8	D
2	Karen Lizeth Herrera López	Profesional SST Interventoría	F	S	D	8	8	8	8	8	5	D	8	8	8	8	8	5	D	F	8	8	8	8	8	D	8	8	8	8	8	8	D
3	Iván Darío Hernández Niño	Director de Interventoría	F	S	D	8	8	8	8	8	5	D	8	8	8	8	8	5	D	F	8	8	8	8	8	D	8	8	8	8	8	8	D
4	Nixon Fabian Díaz Godoy	Topografo Interventoría	F	S	D	8	8	8	8	8	5	D	8	8	8	8	8	5	D	F	8	8	8	8	8	D	8	8	8	8	8	8	D
5	Sebastian Bohorquez Maldonado	Residente Interventoría	F	S	D	8	8	8	8	8	5	D	8	8	8	8	8	5	D	F	8	8	8	8	8	D	8	8	8	8	8	8	D

ELABORÓ: _____

PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

APROBÓ: _____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	CODIGO:	AL-F033
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No. 071

OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072
PERIODO: 01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUINICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

No	NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES PERIODO JUNIO (Cantidad de horas trabajadas en el día)																															
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Daniel Sebastian Caballero Torres	ESP hidráulico Interventoria	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9																				
2	Karen Lizeth Herrera López	Profesional SST Interventoria	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9																				
3	Iván Dario Hernández Niño	Director de Interventoria	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9																				
4	Nixon Fabian Diaz Godoy	Topografo Interventoria	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0																				
5	Sebastian Bohorquez Maldonado	Residente Interventoria	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9																				

ELABORÓ: _____

PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

APROBÓ: _____

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	AI-F031
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No. 071

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072

OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

PERÍODO: 8 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2020

No.	CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARL			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCIÓN ESPECIFIQUELA
		NOMBRE	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELÉFONO	NOMBRE	FECHA DE AFILIACIÓN	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	
1	CONTRATISTA	Daniel Sebastian Caballero Torres	1072154830	30	ESP Petrolero - Interventoría	Chia - Cantón	3043837207	SURA	8/1/2020	1/05/2020	FAMISANAR	1/05/2020	PORVENIR S.A	1/05/2020	8/1/2020	NA	N/A	
2	CONTRATISTA	Karen Lizeth Herrera Lopez	1071630803	27	Profesional SST - Interventoría	Cajicá - Aurora	3133483411	SURA	1/4/2020	3/6/2020	SALUD TOTAL	3/6/2020	PROTECCION	3/6/2020	31/5/2020	NA	N/A	
3	CONTRATISTA	Iván Dario Hernandez Niño	1032452867	31	Director Interventoría	Cajicá - Capellanía	3210339417	SURA	1/4/2020	5/6/2020	SALUD TOTAL	5/6/2020	PROTECCION	5/6/2020	31/5/2020	NA	N/A	
4	CONTRATISTA	Sebastian Bohorquez Maldonado	1072219419	31	Residente Interventoría	Cajicá - Sambrero de Cajicá	3118688551	SURA	1/4/2020	3/6/2020	FAMISANAR	3/6/2020	PORVENIR S.A	3/6/2020	31/5/2020	NA	N/A	
5	CONTRATISTA	Wilson Fabian Diaz Godoy	80156155	42	Topografia	Tocancipá	3043410008	COLPATRIA	13/4/2020	13/5/2020	FAMISANAR	13/5/2020	PROTECCION	13/5/2020	13/4/2020	N/A	N/A	

Aprobado por: Iván Hernández Niño
DIRECTOR INTERVENTORÍA

(Nombre) Elaborado por: Karen Lizeth Herrera Lopez
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344113	1	GRAGOR S.A.S	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRAGOR -PROYECTOS	TRANSVERSAL 19 A #99-38	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4553671	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	34/66/15537	93859771220	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCOLOMBIA	0	$3,745,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GRAGOR -PROYECTOS (4 Afiliados)					$12,095,530	$1,935,400			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$842,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTOS (4 Afiliados)					$12,095,530	$1,935,400			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$842,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$12,095,530	$1,935,400			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$842,000		$0	$0
1	CC	1070[illegible]4748	BONORQUEZ MALDONADO SEBASTIAN	22/05/	30	$3,200,000	$512,000	EPS017	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$121,600	30	$0	$0
2	CC	1073630853	HERRERA LOPEZ KAREN LIZETH	2/02/20	30	$1,750,905	$280,145	EPS002	30	$1,750,905	$70,036	COF14	30	$1,750,905	$70,036	14-11	30	$1,750,905	$221,900	30	$0	$0
3	CC	79937263	MORA BARON AMEAD, ALFONSO	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$276,400	30	$0	$0
4	CC	1032719022	REY MORENO YUDI CAROLINA	2/05/20	30	$1,144,625	$183,355	EPS047	30	$1,144,625	$125,864	CCF24	30	$1,144,625	$123,864	14-11	30	$1,144,625	$216,900	30	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$12,095,530	$1,935,400			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$483,900			$12,095,530	$842,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,935,400	$0	$0	$1,935,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,015,200	$0	$0	$1,015,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$842,000	$0	$0	$842,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$842,000	$0	$0	$842,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$483,900	$0	$0	$483,900
COMFENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$483,900	$0	$0	$483,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$483,900	$0	$0	$483,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$253,800	$0	$0	$253,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				4	$3,745,200	$0	$0	$3,745,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AGROPECUARIA ALIAR S. A. identificado(a) con NI 890207037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIEL SEBASTIAN CABALLERO TORRES identificado(a) con CC 1072704830

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vst	vsp			
9504612172	302731708	E	2026-05-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X										$7,256,001	4%	$290,300
9504612172	302731708	E	2026-05-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X										$7,256,001	16%	$1,161,000
9504612172	302731708	E	2026-05-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X										$7,256,001		$36,300
9504612172	302731708	E	2026-05-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X										$7,256,001		$36,300
9504612172	302731708	E	2026-05-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X										$0	0%	$0
9504612172	302731708	E	2026-05-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X										$0	0%	$0
9504612172	302731708	E	2026-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X										$7,256,001	1.044%	$75,800
9504612172	302731708	E	2026-05-12	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X										$7,256,001	4%	$290,300
9502467606	220445408	E	2026-04-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X										$7,256,001	4%	$290,300
9502467606	220445408	E	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X										$7,256,001	16%	$1,161,000
9502467606	220445408	E	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X										$7,256,001		$36,300
9502467606	220445408	E	2026-04-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X										$7,256,001		$36,300
9502467606	220445408	E	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X										$0	0%	$0
9502467606	220445408	E	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X										$0	0%	$0
9502467606	220445408	E	2026-04-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X										$7,256,001	1.044%	$75,800
9502467606	220445408	E	2026-04-14	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X										$7,256,001	4%	$290,300
9501247499	128092377	E	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X										$7,256,001	4%	$290,300
9501247499	128092377	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X										$7,256,001	16%	$1,161,000
9501247499	128092377	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30									X										$7,256,001		$36,300
9501247499	128092377	E	2026-03-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30									X										$7,256,001		$36,300

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **INACAR SA**, identificado con **NI** número **800086042**, aportó por **NIXSON FABIAN DIAZ GODOY**, identificado(a) con **CC** número **80158135** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2026-04** y salud **2026-05** de la siguiente manera:

CCF33	Colsubsidio Caja de Compensación Fliar							X							0		28	$5.539.710	$261.200	$0	$0	Abril - 2026	80473493	12/05/2026	5	0	0	
CCF32	Colsubsidio Caja de Compensación Fliar											L			0		1	$134.367	$6.400	$0	$0	Abril - 2026	80473494	12/05/2026	5	0	0	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio							X							0		28	$5.539.710	$261.200	$0	$0	Mayo - 2026	80473494	12/05/2026	4	0	0	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio											L			0		1	$261.362	$12.320	$0	$0	Mayo - 2026	80473493	12/05/2026	5	0	0	
230301	Protección (RG + Protección)							X							0		28	$5.539.710	$1.044.800	$0	$0	Abril - 2026	80473493	12/05/2026	5	0	0,16000	
230301	Protección (RG + Protección)											L			0		1	$261.362	$41.800	$0	$0	Abril - 2026	80473493	12/05/2026	5	0	0,16000	
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.							X							0		28	$5.539.710	$454.300	$0	$0	Abril - 2026	80473493	12/05/2026	5	0,0086000	0	
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.											L			0		1	$261.362	$0	$0	$0	Abril - 2026	80473493	12/05/2026	5	0,0000000	0	

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Mayo de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901729663-3	CONSTRUCTORA SANTOSP SAS	CARRERA 48 # 153-42 OFICINA 504	3197642302	construccionessantosp@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	E - MIPYMI	CASA CONTI 011	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMEHORA/FE)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMEHORA/FE)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87938562	05/05/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$31,376,213	$7,163,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS052	Salud Total EPS	800130907-4	137.900	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS002	Sanitas EPS	800251440-6	230.100	0		0		0	0	0	0	230.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	284.900	0		0		0	0	0	0	284.900	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	208.400	0		0		0	0	0	0	208.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RAIS + Protección)	800225739-6	548.900	0	0	0	0	0	0		548.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.337.800	0	0	0	0	0	0		2.337.800	6
231001	Colfondos	860227940-6	356.800	0	0	0	0	0	0		356.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	561.400	0	0	0	0	0	0		561.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830031793-5	1.584.000				1.584.000	0	0	1.584.000			15.840	1.584.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	910.800	0	0	910.800	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradores	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	931.400	931.400
Pensión	4	3.737.000	3.737.000
Riesgos Laborales	1	1.584.000	1.584.000
CCF	1	910.800	910.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.163.200	7.163.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901725653-5	CONSTRUCTORA SANTOSP SAS		CARRERA 45 # 103-62 OFICINA 264	3157642582	constructorasantosp@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYMI	TABIO CONTOTI	011	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87508582	03/03/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	RPS PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	0	$33,318,212	$7,193,280	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				INDICADORES LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Inclusión	Retiro	Traslado Desde Otra Entidad	Traslado Hacia Otra Entidad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA				Cód. Entidad	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Ajuste a Peso / Valor UPC	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Ajuste a Peso	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte otros
CC 1017600604	HERNANDEZ CHISPIRENA OMAR PEDRO	1	0										1											EPS037	1,683,000	30	202,800	0	0	0	0	EPS037	1,683,000	30	72,900	14-11	1,683,000	30	0	126,700	CCF24	1,683,000	30	12,600	0	0	0	0	0
CC 1018685717	AREVALO OJAYA HENRY	1	0			1																		EPS002	1,317,451	28	242,900	0	0	0	0	EPS002	1,317,451	28	66,700	14-11	1,317,451	28	0	165,700	CCF24	1,317,451	28	60,700	0	0	0	0	0
CC 1018685713	AREVALO OJAYA HENRY	1	0							1														EPS030	116,727	2	16,100	0	0	0	0	EPS030	116,727	2	4,700	14-11	116,727	2	0	0	CCF24	116,727	2	0	0	0	0	0	0
CC 1018685117	AREVALO OJAYA HENRY	1	0								1													EPS030	58,364	1	7,100	0	0	0	0	EPS030	58,364	1	0	14-11	58,364	1	0	0	CCF24	58,364	1	0	0	0	0	0	0
CC 1044618565	HERNANDEZ GIRALDO ELIBERTO CATERINE	1	0																					EPS037	1,700,000	30	205,200	0	0	0	0	EPS037	1,700,000	30	75,100	14-11	1,700,000	30	0	141,900	CCF24	1,700,000	30	72,100	0	0	0	0	0
CC 1033867615	VELASQUEZ ROMERO WILDAN OMAR	1	0																					EPS037	1,675,815	27	202,800	0	0	0	0	EPS037	1,675,815	27	63,700	14-11	1,675,815	27	0	139,700	CCF24	1,675,815	27	63,700	0	0	0	0	0
CC 1033867615	VELASQUEZ ROMERO WILDAN OMAR	1	0										1											EPS037	115,051	4	28,100	0	0	0	0	EPS037	115,051	4	0	14-11	115,051	4	0	0	CCF24	115,051	4	0	0	0	0	0	0
CC 1062402067	HERNANDEZ NIÑO HAIS DAVID	1	0																					EPS005	1,700,905	30	394,200	0	0	0	0	EPS005	1,700,905	30	75,100	14-11	1,700,905	30	0	127,900	CCF24	1,700,905	30	72,100	0	0	0	0	0
CC 1072758736	VELASQUEZ OSETO YEIMAR CAROLINA	1	0									1	1											EPS040	2,626,330	27	324,400	0	0	0	0	EPS040	2,626,330	27	91,100	14-11	2,626,330	27	0	147,600	CCF24	2,626,330	27	91,100	0	0	0	0	0
CC 1072758736	VELASQUEZ OSETO YEIMAR CAROLINA	1	0										1											EPS005	220,000	3	36,300	0	0	0	0	EPS005	220,000	3	0	14-11	220,000	3	0	0	CCF24	220,000	3	0	0	0	0	0	0
CC 1067400598	CASTRO BRAVO EDWIN DAVID	1	0										1											EPS041	1,700,919	30	201,200	0	0	0	0	EPS041	1,700,919	30	75,100	14-11	1,700,919	30	0	122,000	CCF24	1,700,919	30	72,200	0	0	0	0	0
CC 1084727381	OROZCO OSORIO ANTONIO	1	0										1											EPS041	1,700,919	30	201,200	0	0	0	0	EPS041	1,700,919	30	75,100	14-11	1,700,919	30	0	122,000	CCF24	1,700,919	30	72,200	0	0	0	0	0
CC 1113622278	NAVAS JULIAN BERNARDO	1	0										1											EPS032	1,600,000	30	204,900	0	0	0	0	EPS032	1,600,000	30	72,000	14-11	1,600,000	30	0	120,700	CCF24	1,600,000	30	72,000	0	0	0	0	0
CC 1134403883	GONZALEZ YORIS SEBASTIAN	1	0										1											EPS002	1,611,032	30	202,800	0	0	0	0	EPS002	1,611,032	30	72,500	14-11	1,611,032	30	0	126,100	CCF24	1,611,032	30	72,500	0	0	0	0	0
PT 6084432	RAMIREZ TORREALBA DEYvelina	1	0										1											EPS041	1,692,542	28	270,900	0	0	0	0	EPS041	1,692,542	28	67,600	14-11	1,692,542	28	0	117,900	CCF24	1,692,542	28	67,600	0	0	0	0	0
PT 6084432	RAMIREZ TORREALBA DEYvelina	1	0										1											EPS047	58,364	1	7,100	0	0	0	0	EPS047	58,364	1	0	14-11	58,364	1	0	0	CCF24	58,364	1	0	0	0	0	0	0
CC 1026010979	CASTELLANOS ESPINOSA LAURA SOFIA	1	0																					EPS041	1,700,905	30	205,200	0	0	0	0	EPS041	1,700,905	30	75,100	14-11	1,700,905	30	0	131,900	CCF24	1,700,905	30	72,100	0	0	0	0	0
CC 1082004714	ROMERO GADDIEL AVID CARLOS	1	0																					EPS005	1,700,905	30	392,200	0	0	0	0	EPS005	1,700,905	30	75,100	14-11	1,700,905	30	0	131,900	CCF24	1,700,905	30	72,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	CONTROL DE EQUPOS DE MEDICIÓN	CODIGO:	AL-F034
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No. 071 del 2026 — **OBJETO:** OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072 del 2026 — **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

PERIODO: 20 de Mayo al 15 de Junio de 2026

Equipo Utilizado por el Contratista							Equipo Utilizado por la Interventoría				
Nombre del Equipo	Actividad en la que se usa	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta
ESTACIÓN TOPCON	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	8R0599	1 mm + 2ppmXD	HA 125	16-may-26	16-nov-26					
NIVEL TOPCON	VERIFICACIÓN NIVELES DIRIGIDO EN SALIDA Y LLEGADA EN LOS POZOS	RZ1542	2mm/km	HA 117	16-may-26	16-nov-26					
NIVEL RUIDE	REVISIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA						X261337	2mm/km	HA 118	16-may-26	16-nov-26
ESTACIÓN TOPCON	REVISIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA						4F0840	2 mm + 2ppm	3115	24-ene-26	24-jul-26

ALBERTO SANTOS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA

IVAN HERNANDEZ NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HERNANDEZ ASOCIADOS

TOPCON Nikon SOKKIA Leica Geosystems

HERNANDEZ ASOCIADOS
CERTIFICADO DE CALIBRACION DE NIVEL TOPOGRAFICO

USUARIO: ANGIE ORTIZ
DOMICILIO: Cajica Cundinamarca
TELEF.: 3046497260
INTRUMENTO: Nivel Sokkia
MODELO: C24
SERIAL: D10380
PRECISION EN DISTANCIA: 2mm/km

CERTIFICADO No.
HA 119

FECHA DE CALIBRACION:
16 DE MAYO DEL 2026.

FECHA DE VENCIMIENTO:
16 DE NOVIEMBRE DEL 2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aumento del telescopio 32x
Distancia mínima 0.0m
Desviación estándar 0.7 mm/km

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR WILD LEICA DE PRECISION 0.001mm

AJUSTES EJECUTADOS

Nivel tubular y ojo pollo
Base Nivelación
Óptica General
Movimientos Laterales
Compensador Automático
Ajustes de sistemas de Colimación
Ajustes de Sistemas de enfoque

HERNANDEZ ASOCIADOS, certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de CALIDAD ISO 9001.

HERNÁNDEZ ASOCIADOS
Equipos de Topografía
Asesorías - Compra y Venta

Vo. Bo.
LEONEL HERNANDEZ HERNANDE

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS:
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA, DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Bogotá D.C., enero 24 de 2026

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN

No.: 3115

EQUIPO: Estación **MARCA: Topcon** **REF.: GPT-3007N** **SERIAL: 4F0840**

CLIENTE: Grupo Proyectar Geomática y Construcción **DIRECCION:** Calle 6b No. 18-12 Zipaquirá

Teléfono: 852-0354 **Celular:** 3123018876

Fax: **Email:** proyectos@gproyectar.com.co

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.
DIAGNÓSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	2	**Lente interno**	6
Tornillos nivelantes	1	**Base del reticulo**	3
Movimiento horizontal	2	**Reticulo**	2
Movimiento vertical	2	**Objetivo**	3
Displays	3	**Teclados**	3
Plomada Láser	NA	**Verticalidad**	2
Plomada óptica	2	**Compensador**	2
Nivel circular	2	**Batería**	6
Nivel tubular	2	**Cargador**	NA

1. Cambio de grasas 2. Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5. Cambio 6. En buen estado (O.k.)
Otros:

Parámetro o componente	**Error permitido**	**Ajuste**
Plomada óptica o láser	1mm o menos	si_x_ no_____
Nivel tubular	¼ o menos de los límites	si_x_ no_____
	Extremos de la escala de nivel	
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel	si_x_ no_____
Perpendicularidad de la línea de	10" o menos	si____ no_x_
la Plomada		
Doble centrado	10" o menos	si____ no_x_
Mira de colimación	20'	si____ no_x_
Excentricidad entre el standard	10" o menos	si____ no_x_
Y el circulo de vertical		
Posición de instalación del circulo	+ o – 3 grados desde el "O"	si____ no_x_
Vertical.	Posición.	
Compensador	Punto cero + o – 30" exactitud	si_____no_x_
	+ 00.03'00"	

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79'327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA, DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL

Error antes de calibración ángulo Horizontal: 10"

REFERENCIA	A
P1	00.00'00"
P2	180.00'00"
ERROR	00.00'00"

TEST DE EXACTITUD ANGULO VERTICAL

Error antes de calibración ángulo Vertical: 15"

P1	90.00'00"
P2	270.00'00"
ERROR	00.00'00"

Error máximo permitido 10" respectivamente

TEST DE EXACTITUD DEL DISTANCIOMETRO

Pista patrón (m)	M1	M2	M3	M4	M5	Promedio	Error	Ajuste	Distancia final
5.080	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	1mm	------	5.079

Tolerancia permitida: : +/- (2mm + 2ppm)

Patrón utilizado: Colimador marca South LF-3C y pistas patronadas

Nota: Este equipo sale en óptimas condiciones operativas y de funcionamiento.

La validez de este certificado es de seis meses a partir de la fecha de expedición.
Fecha de Caducidad: julio 24 de 2026

Jorge Enrique Díaz

ING. JORGE DIAZ
Ingeniero Servicio Técnico

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.001	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		17	4	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento a la suspensión temporal de las actividades de perforación horizontal dirigida por falla técnica del equipo y revisar las acciones para la reanudación de la obra.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

RECORRIDO DE OBRA.

Durante el recorrido de obra, la interventoría evidenció la ejecución de actividades preliminares correspondientes a la instalación del campamento, localización y replanteo de pozos de inspección, levantamiento topográfico del terreno actual, manejo de aguas y localización de redes existentes. Así mismo, se verificó la llegada de maquinaria, equipos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, así como la implementación de la señalización y aislamiento de las áreas de trabajo mediante cinta de seguridad, postes tubulares, conos guía y señales preventivas y reglamentarias, garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades en obra.

AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 12-04-2026:

Porcentaje Programado: 0,00%

Porcentaje Ejecutado: 0,75%

Avance a la fecha: 0,75%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Inspección de pozos de inspección existentes.

Limpieza de pozos de inspección.

Manejo y control de aguas en los frentes de trabajo.

Verificación de condiciones operativas de maquinaria y equipos en obra.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.001	HOJA: 1 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reúnen en campo, contratista de obra, supervisión e interventoría, con el fin de verificar el avance de obra y realizar seguimiento a las condiciones generales de ejecución de las actividades del proyecto.

Durante el comité, el contratista informó la novedad presentada en el equipo de perforación horizontal dirigida, el cual registró una falla técnica en el transmisor, componente encargado de emitir la señal de posicionamiento, inclinación y profundidad durante el proceso de perforación. Esta situación se presentó en el tramo comprendido entre los pozos de inspección PZ-1280 y PZ-1290, lo que impide la continuidad de la actividad bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.

El contratista manifestó que, como medida preventiva, se procedió a la suspensión temporal de las actividades de perforación horizontal dirigida mientras se gestiona la reparación o sustitución del componente afectado, estimando un tiempo aproximado de inactividad de ocho (8) días calendario.

La interventoría deja constancia de la situación presentada y requiere al contratista adelantar de manera prioritaria las gestiones necesarias para la pronta solución de la falla, garantizando la continuidad del frente de obra y la actualización oportuna del cronograma de actividades, una vez se restablezca la operatividad del equipo.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- FO13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.031	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA
El contratista se compromete a informar la fecha de retorno y puesta en operación de la maquinaria una vez se realice la reparación del equipo.	21/04/2026

PRÓXIMO COMITÉ:	23/04/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	JOSE LUIS SANTOS	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- 0013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.002	HOJA: 1 DE 3
CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA: DÍA 23 / MES 4 / AÑO 2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra y a las condiciones de ejecución de las actividades del proyecto.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

Se da lectura al acta anterior y se verifica el compromiso relacionado con la información de la fecha de retorno de la maquinaria de perforación horizontal dirigida Se deja constancia de que el contratista no realizó la notificación dentro del plazo establecido; sin embargo, en el desarrollo del presente comité se informa que la maquinaria ya se encuentra en obra y disponible para reinicio de actividades

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidencia el avance de la perforación piloto en el tramo comprendido entre los pozos PZ-1290 y PZ-2102, encontrándose en etapa de culminación para dar inicio a el barrido del rimel y posterior a esto la instalación de la tubería correspondiente.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 19-04-2026

Porcentaje Programado: 2,50%

Porcentaje Ejecutado: 1,59%

Avance a la fecha: 2,34%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Termofusión de tubería en PE100 PN16 de 16" para instalación en perforación horizontal dirigida.

Manejo de aguas y lodos generados en el proceso constructivo.

Implementación de señalización preventiva en los frentes de obra.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- 9013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.082	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reúnen en campo con el fin de realizar seguimiento al avance general de obra, así como a la ejecución de las actividades asociadas a la perforación horizontal dirigida en el tramo actualmente intervenido, verificando el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas del proyecto.

Se deja constancia que no se dio cumplimiento al compromiso establecido en el acta anterior, relacionado con la notificación formal de la llegada, disponibilidad y puesta en operación de la maquinaria de perforación horizontal dirigida, toda vez que dicha comunicación no fue remitida oportunamente a la interventoría. En este sentido, se evidencia una debilidad en el flujo de información entre el contratista y la interventoría, lo cual afecta el adecuado seguimiento y control del desarrollo de las actividades programadas.

Durante el comité, la interventoría deja constancia que, con el fin de mitigar el retraso generado por la indisponibilidad temporal del equipo, se deberán intensificar las actividades en campo, optimizando los recursos disponibles y ajustando la programación operativa, de manera que se logre la recuperación del tiempo perdido y se garantice el cumplimiento del cronograma de obra aprobado. En este sentido, se requiere al contratista asegurar el avance continuo y eficiente de las actividades de perforación horizontal dirigida y sus actividades complementarias, bajo criterios técnicos y de productividad.

La interventoría deja registro de lo anterior y reitera la necesidad de dar cumplimiento estricto a los compromisos establecidos en comité, así como de garantizar la notificación oportuna de cualquier novedad que pueda impactar la programación, el rendimiento o la continuidad de las actividades del proyecto.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No. 002	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	30/04/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	JOSE LUIS SANTOS	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- PR13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.003	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		30	4	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Verificacion en campo de avance de obra y revision de acometidas sanitarias afectadas.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido en campo de las actividades realizadas a la fecha

El contratista de obra informa que se termino la perforacion dirigida de PZ1290 A 2102 y la instalación de tuberia PEAD 16" PE100 PN6 con una longitud de 88,25 metros y se esta adelantando el tramo de PZ2102 hasta PZ1280.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 26-04-2026

Porcentaje Programado: 5,00%

Porcentaje Ejecutado: 28,52%

Avance a la fecha: 30,86%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Limpieza de PZ1280 Y PZ238

Manejo de Aguas

Señalización y Aislamiento de Áreas de Trabajo

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.003	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reunen en campo contratista de obra, supervision e interventoria con el fin de verificar la ejecución de actividades a la fecha y novedades que se han presentado

Contratista de obra informa que la comunidad de predios vecinos entre martes y miercoles realizaron preguntas sobre el estado de la acometida sanitaria a razon de las obras ejecutadas, se direccionan a los propietarios a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipa y desde alli se genera directriz

Supervizor delegado plantea en campo una posible solucion para conexión de acometidas sanitarias de los predios que presentaron la solicitud ante la empresa de servicios públicos. Dicha solucion posiblecontempla la instalación de una red paralela en tuberia PVC de 8" dirigida a la camara de caida del PZ1290 con construccion previa de caja de inspección

Contratista de Obra elevara la viabilidad de esta posible solucion en aspectos tecnicos y financieros y socializara con interventoria, sin plantear ejecución de la red de 8"

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No. 003	HOJA: 3 DE 3

COMPROMISOS	FECHA
Oficio de evaluación tácnica de camara de caida	4/05/2027

PRÓXIMO COMITÉ:	7/05/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- FR13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.804	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		7	5	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra y socializar la respuesta técnica relacionada con las acometidas sanitarias.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

Se realiza la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento del compromiso establecido, correspondiente al envío del oficio de evaluación de la cámara de caída.

Se deja constancia de que el contratista dio cumplimiento al compromiso dentro del plazo establecido, remitiendo el respectivo oficio para revisión y trazabilidad del proceso.

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidencia la instalación del tramo comprendido entre los pozos PZ-1290 y PZ-1280, correspondiente a la red proyectada, ejecutado conforme a las condiciones técnicas establecidas para el proyecto. Así mismo, se constata el avance de la perforación horizontal dirigida en el tramo comprendido entre los pozos PZ-1280 y PZ-238, encontrándose en ejecución de las actividades de perforación, de acuerdo con la secuencia constructiva prevista.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 03-05-2026:

Porcentaje Programado: 5,00%

Porcentaje Ejecutado: 26,91%

Avance a la fecha: 57,67%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Dirigido PZ1280 hasta PZ238

Manejo de Aguas y Lodos

Señalización de areas de trabajo

Control Topografico

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- FO13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2025
	COMITÉ DE OBRA No.004	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reúnen en campo el contratista de obra, la supervisión del proyecto y la interventoría, con el fin de realizar seguimiento al avance general de obra y a la ejecución de las actividades del proyecto, incluyendo la revisión de las conexiones de acometidas sanitarias y el control de las condiciones operativas en los frentes de trabajo.

El contratista manifiesta que las actividades ejecutadas han presentado un avance productivo, logrando cumplir y superar el porcentaje de ejecución previsto en el cronograma de obra, evidenciándose un desempeño favorable en la ejecución de los frentes activos y en la continuidad de las actividades constructivas.

Por su parte, la supervisión informa que, en relación con las conexiones de acometidas sanitarias, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá dispondrá del suministro de materiales y del apoyo de mano de obra requerida para la ejecución de dichas actividades, con el fin de garantizar su correcta implementación.

La interventoría reitera la importancia del cumplimiento estricto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), dejando constancia de que durante las actividades de ejecución se han identificado hallazgos en campo asociados a su aplicación, por lo cual se solicita reforzar las medidas de control, señalización y seguridad vial en los frentes de obra, garantizando la adecuada protección de los usuarios y del personal en intervención.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No. 004	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	14/06/2020

ABISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIÁN BOHÓRQUEZ M	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- 1013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.005	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		14	5	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidenció la ejecución de actividades de limpieza y bombeo en los pozos PZ-1280 y PZ-238, así como el avance en la construcción del pozo de inspección PZ-1280, mediante la excavación, instalación de entibado metálico, placa de fondo y cilindros prefabricados, de acuerdo con las especificaciones y la secuencia constructiva establecida.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 10-05-2026:

Porcentaje Programado: 5,00%

Porcentaje Ejecutado: 25,23%

Avance a la fecha: 82,90%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Instalación de tuberia PEAD 16" entre PZ1280 hasta PZ238

Manejo de Aguas y Lodos

Señalización de areas de trabajo

Control Topografico

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLORIDABLANCA E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- FO13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.005	HORA: 8 DE 8

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El contratista informa que durante la jornada se realizaron actividades de limpieza y bombeo de agua en los pozos de inspección PZ-1280 y PZ-238, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la ejecución de las labores programadas. Así mismo, se efectuó la revisión de las cotas de entrada y salida de la tubería de 16" PN6 en el pozo PZ-1280, verificando su correspondencia con los niveles establecidos en el diseño del proyecto. Adicionalmente, se avanzó en la construcción del pozo de inspección PZ-1280 mediante la ejecución de excavación mecánica, instalación de entibado metálico, colocación de la placa de fondo y montaje de cilindros prefabricados, actividades desarrolladas conforme a la secuencia constructiva prevista y orientadas a dar continuidad al avance de las obras.

La interventoría recomienda al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista realizar una verificación permanente de los elementos e insumos utilizados para la delimitación y señalización de los frentes de obra. Durante la visita se evidenció que uno de los barriles de señalización se encontraba ubicado en la mitad de la vía, mientras que la retroexcavadora permanecía apagada, por lo que no cumplía una función efectiva de advertencia o control del tránsito. Esta condición obligaba a los vehículos a invadir el carril contrario para continuar su recorrido, generando un riesgo potencial de accidente de tránsito por obstrucción parcial de la vía pública.

En consecuencia, se solicita reforzar las medidas de señalización, control y seguridad vial, garantizando una adecuada canalización del tráfico y la protección de los usuarios de la vía.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- FR13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.005	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	21/05/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- R13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.006	HOJA: 1 DE 3

		FECHA		
CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	DÍA	MES	AÑO
		21	5	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidenció el avance en la construcción de los pozos de inspección PZ-1280 y PZ-238, mediante la instalación de los elementos correspondientes a la cámara de caída, la colocación de geotextil y atraques en concreto, así como el retiro del entibado metálico y el inicio de las actividades de lleno con material granular compactado. De igual manera, se constató la instalación de los pasos de acceso en el pozo PZ-238, conforme a la secuencia constructiva del proyecto.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 17-05-2026.

Porcentaje Programado: 10,00%

Porcentaje Ejecutado: 3,42%

Avance a la fecha: 86,32%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Instalación de tubería y accesorios de 10" en pozo de inspección PZ 1280 para cámara de caída

Instalación de geotextil perimetral al pozo de inspección y atraques en concreto para accesorios de cámara de caída

Retiro de entibado metálico en pozo de inspección y se inicia el lleno con material granular compactado mecánicamente

Instalación de pasos en polipropileno en los pozos de inspección

Señalización de áreas de trabajo

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- 1413 VERSION: 01 FECHA: AGOSTO 2025
	COMITÉ DE OBRA No.003	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El contratista informa que durante la jornada se dio continuidad a las actividades constructivas programadas en los pozos de inspección PZ-1280 y PZ-238, ejecutando la instalación de tuberías y accesorios de 10" correspondientes a la cámara de caída, así como la colocación de geotextil perimetral y atraques en concreto para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de los elementos instalados. De igual manera, se realizó el retiro del entibado metálico y se inició el lleno con material granular compactado mecánicamente en el pozo PZ-1280, avanzando en las actividades de conformación y terminación de la estructura. Adicionalmente, se efectuó la instalación de los pasos de acceso en el pozo de inspección PZ-238, permitiendo dar continuidad al proceso constructivo conforme a la programación establecida para el proyecto.

Por su parte, la interventoría solicita al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista la suspensión temporal de las actividades en el tramo correspondiente al Pozo 3, debido a las condiciones de inestabilidad evidenciadas en la bancada como consecuencia de las labores de excavación ejecutadas en el sector. Durante la inspección se observó desprendimiento de material y riesgo potencial de deslizamiento, situación que podría comprometer la seguridad del personal y generar incidentes o accidentes de trabajo. En este sentido, se requiere implementar de manera inmediata las medidas preventivas, correctivas y de estabilización necesarias, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades antes de autorizar la reanudación de los trabajos en el frente de obra.

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL-7013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.008	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	28/05/2020

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- FO10 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.007	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		28	5	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidenció el avance en la construcción de los pozos de inspección PZ-2102 y PZ-1290, mediante actividades de excavación, instalación de entibado metálico, placa de fondo y cilindros prefabricados. Así mismo, se constató la ejecución de labores de limpieza y bombeo en los pozos PZ-1290, PZ-1280 y PZ-2102, así como la verificación de las cotas de la tubería de 16" PN6 en el pozo PZ-2102, de acuerdo con la secuencia constructiva prevista para el proyecto.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 24-05-2026:

Porcentaje Programado: 10,00%

Porcentaje Ejecutado: 3,03%

Avance a la fecha: 89,35%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1290, PZ1280 y PZ2102"

Se revisión de las cotas de tubería de 16" PN6 de entrada y salida en los pozos de inspección PZ2102

Se realiza excavación mecánica para pozos de inspección PZ 2102 - PZ 1290 y la manija hidraulica de llegada al pozo de inspeccion PZ 1280

Se realiza instalación de entibado metálico en pozo de inspeccion PZ 2102

Se realiza instalación de placa de fondo para pozo de inspección PZ 2102

Se realiza instalación de cilindros prefabricados para pozo de inspección PZ 2102 - PZ 1290

Señalización de áreas de trabajo

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- FE13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.007	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El contratista informa que durante la jornada se ejecutaron actividades de limpieza y bombeo de agua en los pozos de inspección PZ-1290, PZ-1280 y PZ-2102, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la continuidad de los trabajos. Así mismo, se realizó la verificación de las cotas de entrada y salida de la tubería de 16" PNR en el pozo de inspección PZ-2102, verificando su conformidad con los niveles establecidos en el diseño del proyecto. Adicionalmente, se avanzó en la construcción de los pozos de inspección PZ-2102 y PZ-1290 mediante la ejecución de excavaciones mecánicas, la instalación de entibado metálico, la colocación de la placa de fondo y el montaje de cilindros prefabricados, así como en las labores asociadas a la manja hidráulica de llegada al pozo PZ-1280, dando continuidad al desarrollo de las actividades programadas y al avance constructivo del proyecto.

La interventoría recomienda realizar el correcto cubrimiento y protección del material pétreo almacenado en obra, con el fin de prevenir su deterioro por la exposición a condiciones climáticas adversas y garantizar que conserve las características técnicas requeridas para su posterior utilización. Así mismo, se solicita mantener condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo de los materiales, contribuyendo a la calidad de las actividades ejecutadas y al adecuado desarrollo del proyecto.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.007	HOJA: 3 DE 3

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	4/06/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.S.E.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL-1613 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.008	HOJA: 1 DE 3

CONTRATO No. 671 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		4	6	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

Durante la visita se evidenció el avance en los pozos de inspección PZ-2102 y PZ-1290, mediante la instalación de geotextil perimetral, el retiro del entibado metálico y el inicio del lleno con material granular compactado. Así mismo, se verificaron labores de limpieza y bombeo en los pozos PZ-1280 y PZ-2102, la revisión de cotas de la tubería de 16" PN6 y la excavación para la maniobra hidráulica en el pozo PZ-2102, conforme a la secuencia constructiva del proyecto.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 31-05-2026

Porcentaje Programado: 10,00%

Porcentaje Ejecutado: 4,93%

Avance a la fecha: 94,28%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Se realiza excavación mecánica para la manja hidráulica de llegada al pozo de inspección PZ 2102

Se realiza la instalación de geotextil perimetral al pozo de inspección PZ 2102 - PZ 1290

Se realiza retiro de entibado metálico en pozo de inspección PZ 2102 e inicia el lleno con material granular compactado mecánicamente

Se realiza la instalación de los pasos del pozo de inspección PZ 238

Señalización de áreas de trabajo

	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.008	HOJA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Durante el recorrido de campo se efectuó la inspección de los diferentes frentes de obra, evidenciando el avance en la construcción de los pozos de inspección PZ-2102 y PZ-1290, donde se ejecutaron actividades de instalación de geotextil perimetral, retiro del entibado metálico y el inicio del lleno con material granular compactado mecánicamente en el pozo PZ-2102, en concordancia con la secuencia constructiva establecida. Así mismo, se verificaron las labores de limpieza y bombeo realizadas en los pozos PZ-1280 y PZ-2102, las cuales permitieron mantener condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades posteriores. De igual manera, se realizó la revisión de las cotas de la tubería de 16" PN6 en el pozo PZ-2102, corroborando su correspondencia con los niveles de diseño, adicionalmente, se constató el avance de la excavación correspondiente a la manija hidráulica de llegada al mismo pozo y la instalación de los pasos en el pozo de inspección PZ-238, evidenciando la continuidad operativa de las actividades conforme a la programación del proyecto.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL-FR15 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.008	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:	11/09/2026

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHÓRQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- FR13 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020		
	COMITÉ DE OBRA No.009	HOJA: 1 DE 3		
CONTRATO No. 071 del 2026	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		11	6	2026

LUGAR DEL COMITÉ:	OBRA

OBJETO DEL COMITÉ

Realizar seguimiento al avance general de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

TEMAS A TRATAR

1. RECORIDO DE OBRA.

Se realiza recorrido de campo con el fin de observar el avance de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo del proyecto y verificar sus condiciones de desarrollo.

El presente comité de obra corresponde a la última sesión de seguimiento del proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en instancias finales de ejecución.

En este sentido, las actividades desarrolladas durante la jornada evidencian el cierre progresivo de los diferentes frentes de trabajo, dando cumplimiento a las intervenciones pendientes y a las labores de terminación establecidas dentro de la programación general de la obra.

2. AVANCE.

Se tiene un porcentaje de programado vs ejecutados la fecha 07-06-2026.

Porcentaje Programado: 10.00%

Porcentaje Ejecutado: 2.06%

Avance a la fecha: 96,34%

3. ACTIVIDADES EN CURSO.

Se realiza instalación de placa superior para pozos de inspección PZ 1280, PZ 1290 y PZ 2102

Se realiza lleno con concreto fluido en salida y entrada de perforación horizontal de tubería de 16"

Se realiza la construcción de las cañuelas para los pozos de inspección PZ 1280, PZ 1290 y PZ 2102

Se realizan reparaciones a predios afectados en la ejecución de la obra.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AI- F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.009	HOJA: 2 DE 4

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Durante el recorrido de campo se verificó el avance de las actividades finales del proyecto, evidenciando la instalación de la placa superior en los pozos de inspección PZ-1280, PZ-1290 y PZ-2102, así como la ejecución del lleno con concreto fluido en los puntos de entrada y salida de la perforación horizontal de tubería de 16". De igual manera, se constató la construcción de las cañuelas en los mencionados pozos de inspección, garantizando las condiciones hidráulicas de diseño. Adicionalmente, se observaron las labores de reparación y restitución de los predios afectados durante la ejecución de la obra, orientadas a la recuperación de las condiciones iniciales del área intervenida. En general, las actividades evidencian que el proyecto se encuentra en su etapa de cierre, proyectándose la culminación total de la ejecución durante la presente semana, conforme a lo programado.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	ACTA COMITÉ DE OBRA	CODIGO: AL-F013 VERSION: 03 FECHA: AGOSTO 2020
	COMITÉ DE OBRA No.009	HOJA: 1 DE 1

COMPROMISOS	FECHA

PRÓXIMO COMITÉ:

ASISTENTES AL COMITE

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD	FIRMA
1	DANIEL ALEJANDRO CABULLA	RESIDENTE DE OBRA	BYM INGENIERIA	
2	ALBERTO SANTOS ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	BYM INGENIERIA	
3	FABIAN MAX	APOYO A SUPERVISIÓN	E.S.P. TOCANCIPÁ	
4	SEBASTIAN BOHORQUEZ M.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GEAGOR SAS BIC	
5	IVAN DARIO HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GEAGOR SAS BIC	

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X


INFORME SEMANAL No.001

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2026

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	0%	0,75%	0,75%

	PROGRAM.	EJECUT.
SEMANA 1	0,00% 0,00%	0,75% 0,75%
SEMANA 2	2,50% 2,50%	
SEMANA 3	2,50% 5,00%	
SEMANA 4	5,00% 10,00%	
SEMANA 5	5,00% 15,00%	
SEMANA 6	10,00% 25,00%	
SEMANA 7	10,00% 35,00%	
SEMANA 8	10,00% 45,00%	
SEMANA 9	10,00% 55,00%	
SEMANA 10	10,00% 65,00%	
SEMANA 11	15,00% 80,00%	
SEMANA 12	10,00% 90,00%	
SEMANA 13	10,00% 100,00%	

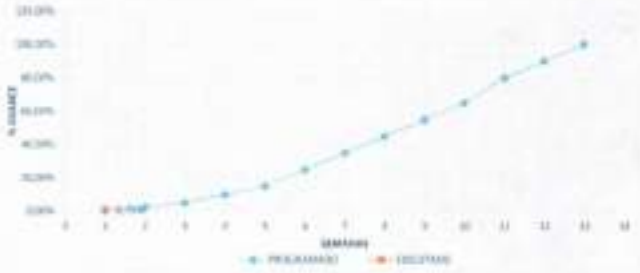

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ -	$ 8.197.600,00	$ 8.197.600,00

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 8.197.600	$ 8.197.600
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000		
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000		
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000		
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000		
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000		
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000		
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000		
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000		
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		

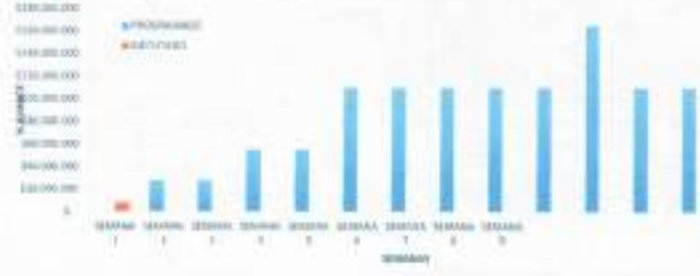

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza localizacion y replanteo de pozos de inspeccion existentes " PZ1280, PZ1290, PZ2102 y PZ238" con estacion total, es realizado con correccion de topografia.
Se realiza manejo de agua mediante bomba sumergible en pozos de inspeccion.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos en la mañana nubosidad y en la tarde lluvias leves e intermitentes.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Revision de documentacion sst
Preoperacionestas de equipos, herramientas y actividades a realizar
Señalizacion de puntos de trabajo
Supervicion de actividades
Charla de seguridad

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

instalacion de punto ecologico
Orden y aseo

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.001

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA

Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Herramienta menor
Generador eléctrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota. Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

NOMBRE: IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: SEBASTIAN SOAPORQUEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X


INFORME SEMANAL No.002

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2020

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	2,50%	2,34%	-0,16%

	PROGRAM.		EJECUT.	
SEMANA 1	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%
SEMANA 2	2,50%	2,50%	1,58%	2,34%
SEMANA 3	2,50%	5,00%		
SEMANA 4	5,00%	10,00%		
SEMANA 5	5,00%	15,00%		
SEMANA 6	10,00%	25,00%		
SEMANA 7	10,00%	35,00%		
SEMANA 8	10,00%	45,00%		
SEMANA 9	10,00%	55,00%		
SEMANA 10	10,00%	65,00%		
SEMANA 11	15,00%	80,00%		
SEMANA 12	10,00%	90,00%		
SEMANA 13	10,00%	100,00%		

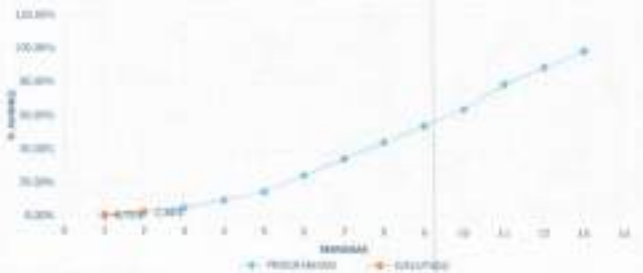

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 27.500.000,00	$ 17.487.889,90	-$ 10.012.110,10

	PROGRAM			EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$	8.197.889	$ 8.197.889
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$	17.487.890	$ 25.685.890
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000			
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000			
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000			
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000			
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000			
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000			
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000			
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000			
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000			
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000			
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000			

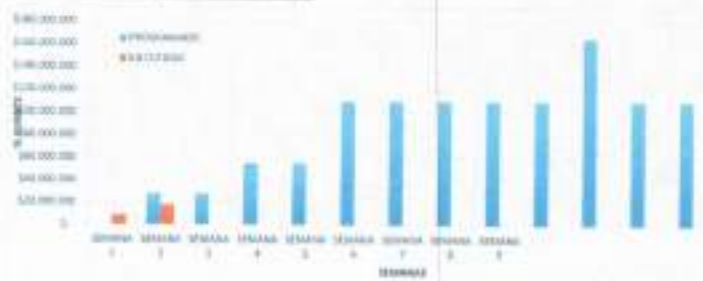

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1280, PZ1290, PZ2102 y PZ2387"
Apiques mediante excavaciones manuales para detectar tuberías en el recorrido entre pozo de inspección PZ1288 y PZ1290
Se realizo lanzamiento piloto de perforación horizontal dirigida entre los pozos de inspección PZ1280 y PZ1290.
Se realizan las adecuaciones del campamento.
Llega a obra excavadora de llanta con cargador frontal
Se revisión de las cotas de tubería de entrada y salida en los pozos de inspección "PZ1280, PZ1290, PZ2102 y PZ2387"

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos en la mañana nubosidad y en la tarde lluvias leves e intermitentes.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preparaciones de equipos, herramientas y actividades a realizar
Señalización de areas de trabajo
Supervicion de actividades
Instalación de equipos de emergencia
Charla de seguridad

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	571 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	572 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.002

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 17 de abril de 2026

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Maquina de perforacion horizontal dirigida
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficioal y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Equipo de termofusión
Generador eléctrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA
Tubería 16" de polietileno de alta densidad PAD

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

Nombre: YHAN HERNANDEZ R.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: SEBASTIAN RAMIREZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X


INFORME SEMANAL No.003

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2026

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	2,50%	28,52%	26,02%

	PROGRAM.		EJECUT.	
SEMANA 1	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%
SEMANA 2	2,50%	2,50%	1,59%	2,32%
SEMANA 3	2,50%	5,00%	26,52%	30,84%
SEMANA 4	5,00%	10,00%		
SEMANA 5	5,00%	15,00%		
SEMANA 6	10,00%	25,00%		
SEMANA 7	10,00%	35,00%		
SEMANA 8	10,00%	45,00%		
SEMANA 9	10,00%	55,00%		
SEMANA 10	10,00%	65,00%		
SEMANA 11	10,00%	80,00%		
SEMANA 12	10,00%	90,00%		
SEMANA 13	10,00%	100,00%		

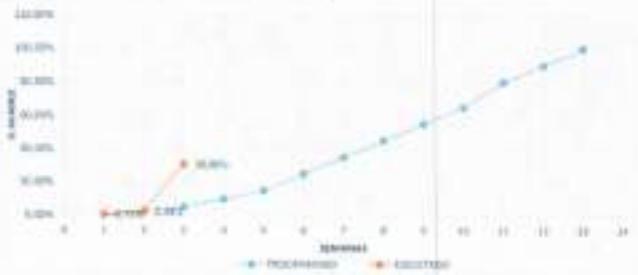

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 27.500.000,00	$ 313.757.617,13	$ 286.257.617,13

	PROGRAM			EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$	8.197.800	$ 8.197.800
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$	17.487.599	$ 25.685.399
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$	313.757.617	$ 339.443.017
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000			
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000			
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000			
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000			
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000			
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000			
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000			
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 905.000.000			
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000			
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000			

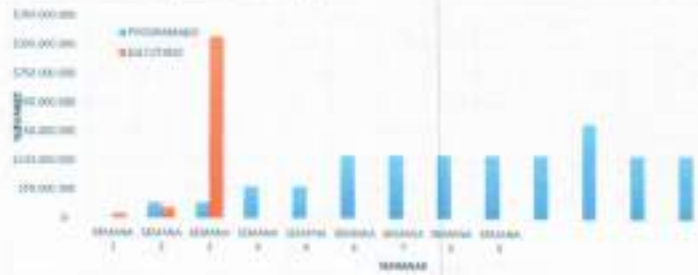

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y sombeo de agua en pozos de inspección "PZ1280, PZ1290, PZ2102 y PZ238"
Se revision de las cotas de tubería de 16" PN6 de entrada y salida en los pozos de inspección "PZ1290 y PZ2102"
Se realiza lanzamiento pilote de perforación horizontal dirigida entre los pozos de inspección PZ1290 y PZ2102.
Se realiza veja de lanzamiento para tubería de 16" PN6
Se realizan uniones tierra fundidas para la tubería de 16" PN6
Se realiza lanzamiento de tubería de 16" PN6 entre los pozos de inspección PZ1290 y PZ2102, retiro de lodos Bentoniticos y materiales provenientes de excavación a botadero.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias intensas en las horas de la tarde y dias nublados.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Señalización de areas de trabajo
Supervision de actividades
Inspección equipos de emergencia
Capacitaciones y Charla de seguridad

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.003

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 23 de abril de 2026

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Ingeniero civil residente de obra, profecional en salud y seguridad (SST)
Maquino de perforacion horizontal dirigida
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Volqueta
Herramienta menor
Equipo de lamplusion
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

Nombre: IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: SEBASTIAN SANCHEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: | DISEÑOS: | REVISIÓN DE DISEÑOS: | CONSTRUCCIÓN: X


INFORME SEMANAL No.064

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL Y EL 03 DE MAYO DE 2026

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	6,00%	26,81%	21,81%

	PROGRAM.	EJECUT.
SEMANA 1	0,00% 0,00%	0,78% 0,78%
SEMANA 2	2,50% 2,50%	1,56% 2,34%
SEMANA 3	2,50% 5,00%	28,52% 30,86%
SEMANA 4	5,00% 10,00%	26,81% 57,67%
SEMANA 5	5,00% 15,00%	
SEMANA 6	10,00% 25,00%	
SEMANA 7	10,00% 35,00%	
SEMANA 8	10,00% 45,00%	
SEMANA 9	10,00% 55,00%	
SEMANA 10	10,00% 65,00%	
SEMANA 11	15,00% 80,00%	
SEMANA 12	15,00% 95,00%	
SEMANA 13	10,00% 100,00%	

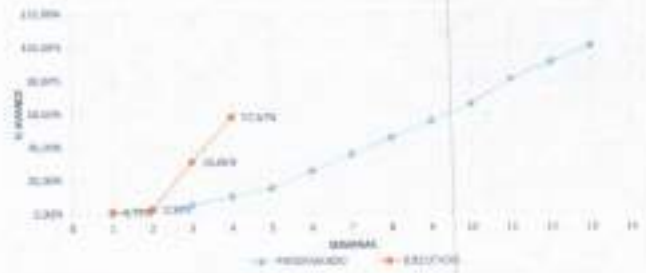

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 55.000.000,00	$ 294.929.465,00	$ 239.929.465,00

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 5.197.800	$ 5.197.800
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 17.467.800	$ 22.665.600
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$ 313.797.817	$ 336.463.617
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$ 294.929.465	$ 634.393.082
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000		
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000		
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000		
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000		
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000		
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		

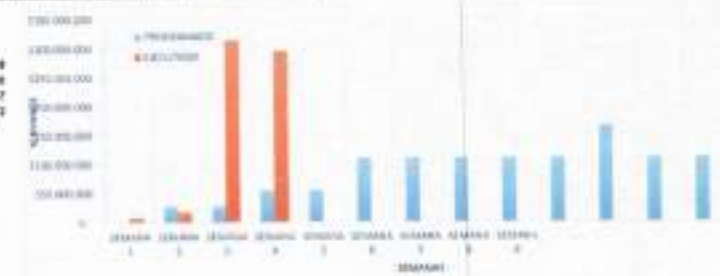

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1280, PZ2103 y PZ2196"
Se levanton de las cotes de tubería de 18" PAE de entrada y salida en los pozos de inspección "PZ1280 y PZ2103"
Se realiza lanzamiento piloto de perforación horizontal dirigida entre los pozos de inspección PZ1280 y PZ2103
Se realiza cote de lanzamiento para tubería de 18" PAE
Se realizan uniones termofundidas para la tubería de 18" PAE
Se realiza lanzamiento de tubería de 18" PAE entre los pozos de inspección PZ1280 y PZ2103, retiro de rodos Bentoniticos.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias intensas en las horas de la tarde y días nublados.


4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Señalización de areas de trabajo
Supervision de actividades
Inspección equipos de emergencia
Capacitaciones y Charla de seguridad
Instalación de fichas de seguridad

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion almacenado de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

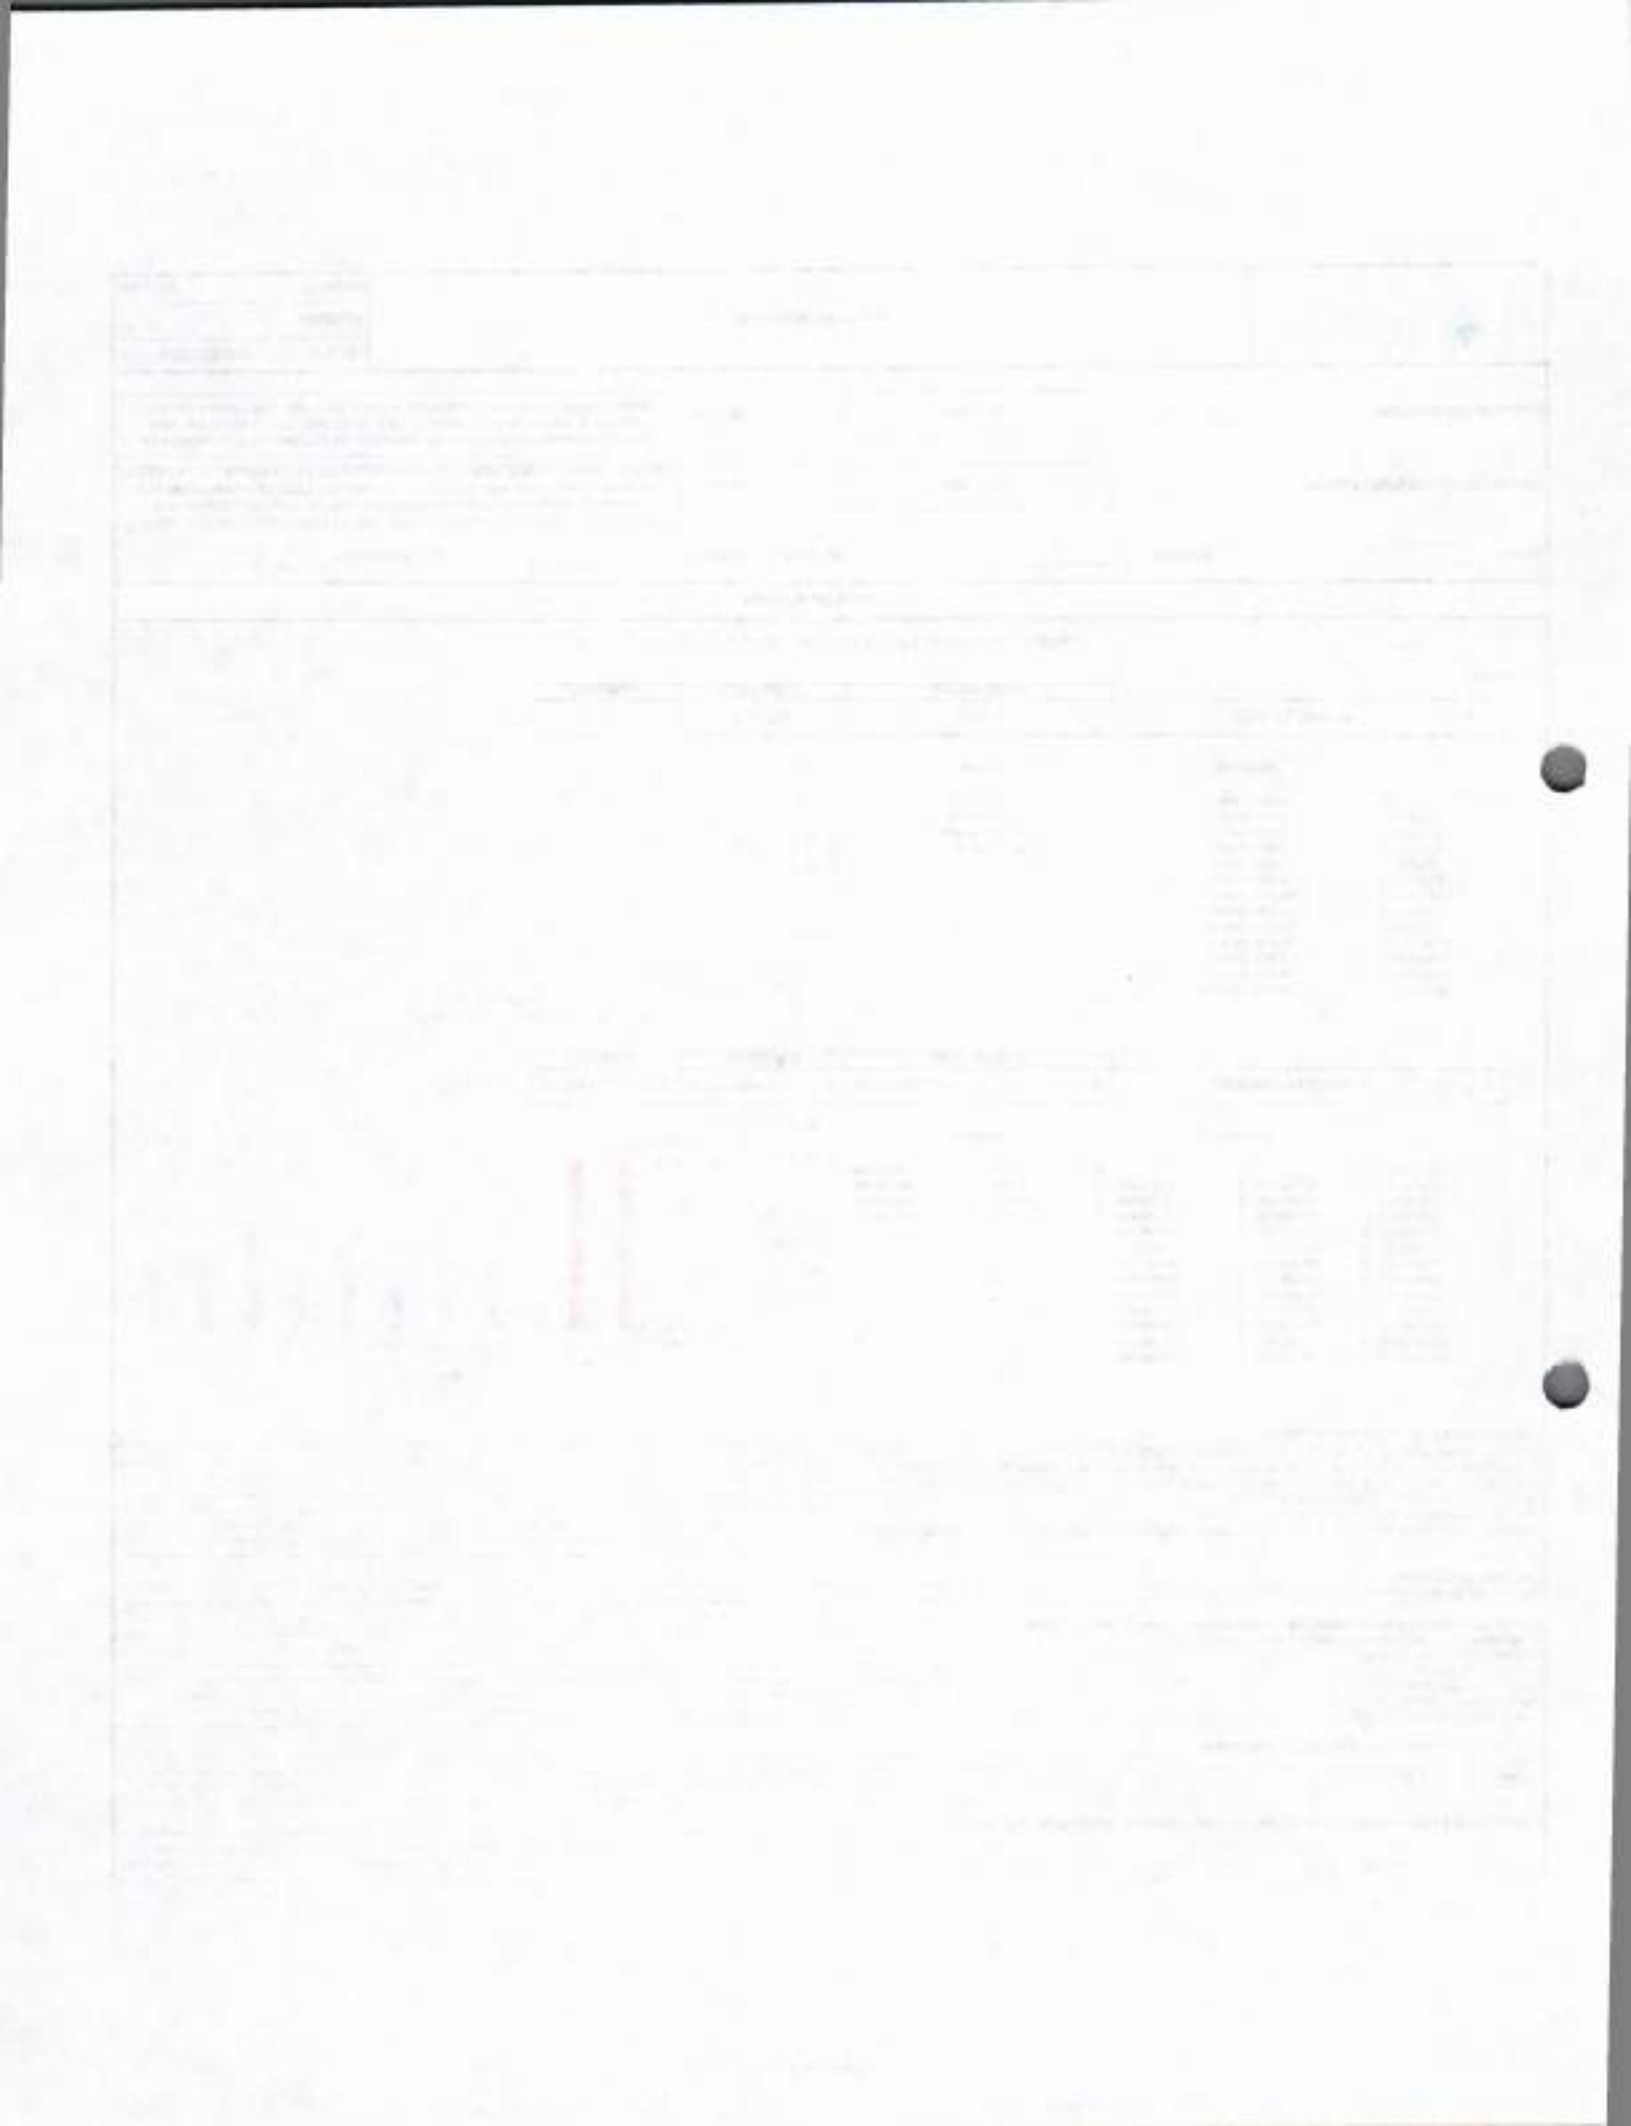

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.004

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 30 de abril de 2020.

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Maquina de perforacion horizontal dirigida
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitacora de obra de la semana y registro fotografico de la semana

Nombre: IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: SEBASTIAN SANCHEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X


INFORME SEMANAL No.008

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 AL 10 DE MAYO DE 2020

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	5,00%	25,23%	20,23%

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	5,00%	5,00%	0,79%	0,79%
SEMANA 2	2,50%	2,50%	1,98%	2,34%
SEMANA 3	2,96%	5,04%	28,03%	30,38%
SEMANA 4	5,00%	10,00%	26,81%	57,67%
SEMANA 5	5,00%	15,00%	25,23%	82,90%
SEMANA 6	10,00%	25,00%		
SEMANA 7	10,00%	35,00%		
SEMANA 8	10,00%	45,00%		
SEMANA 9	10,00%	55,00%		
SEMANA 10	10,00%	65,00%		
SEMANA 11	15,00%	80,00%		
SEMANA 12	10,00%	90,00%		
SEMANA 13	10,00%	100,00%		

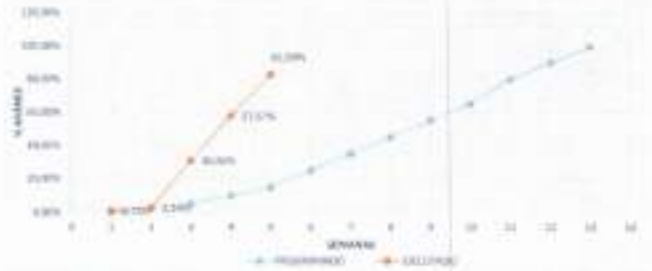

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 55.000.000,00	$ 277.478.963,00	$ 222.478.963,00

	PROGRAM			EJECUT.		
SEMANA 1	$ -	$ -	$	6.197.800	$	6.197.800
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$	17.467.800	$	23.665.600
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$	313.797.817	$	337.463.417
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$	204.026.465	$	634.359.972
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000	$	277.478.963	$	911.681.935
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000				
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000				
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000				
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000				
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000				
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000				
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000				
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000				

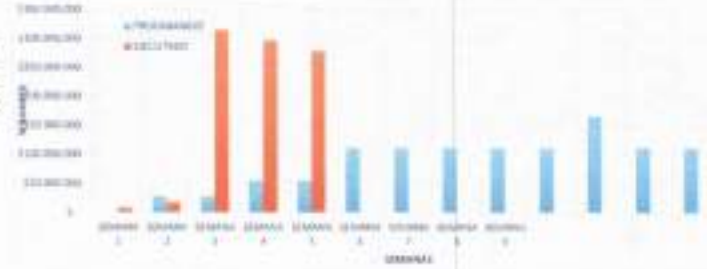

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1380 y PZ238".
Se revisión de las cotas de tubería de 18" PAE de entrada y salida en los pozos de inspección "PZ1380 y PZ238".
Se realiza lanzamiento piloto de perforación horizontal dirigida entre los pozos de inspección PZ1380 y PZ238.
Se realiza izaje de lanzamiento para tubería de 18" PAE.
Se realizan uniones termofundibles para la tubería de 18" PAE.
Se realiza lanzamiento de tubería de 18" PAE entre los pozos de inspección PZ1380 y PZ238, retiro de lodos Bentoníticos.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias intensas en las horas de la tarde y días nublados.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Señalización de áreas de trabajo
Supervisión de actividades
Inspección equipos de emergencia
Capacitaciones y Charla de seguridad

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposición adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.005

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 7 de mayo de 2020

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Maquina de perforación horizontal dirigida
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con retroflex frontal
Herramienta menor
Elevadores de cingle
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitacora de obra de la semana y registro fotografico de la semana

Nombre: IVÁN HERNÁNDEZ R.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: SEBASTIAN RICHARDEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: DISEÑOS: REVISIÓN DE DISEÑOS: CONSTRUCCIÓN: 1


INFORME SEMANAL No.006

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	10,00%	3,42%	-6,58%

	PROGRAM.	EJECUT.
SEMANA 1	0,00% 0,00%	0,78% 0,78%
SEMANA 2	0,00% 0,00%	1,56% 2,34%
SEMANA 3	2,00% 0,00%	28,63% 30,98%
SEMANA 4	3,00% 10,00%	26,01% 57,67%
SEMANA 5	5,00% 15,00%	25,33% 82,99%
SEMANA 6	10,00% 25,00%	0,42% 85,32%
SEMANA 7	10,00% 35,00%	
SEMANA 8	10,00% 45,00%	
SEMANA 9	10,00% 55,00%	
SEMANA 10	10,00% 65,00%	
SEMANA 11	15,00% 80,00%	
SEMANA 12	10,00% 90,00%	
SEMANA 13	10,00% 100,00%	

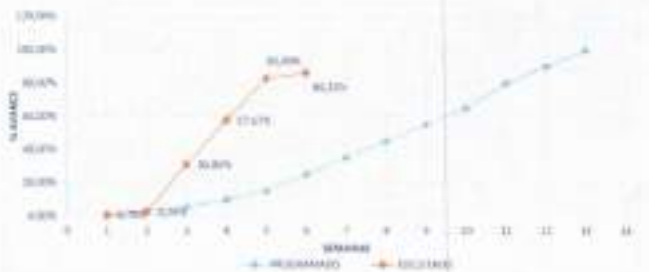

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 110.000.000,00	$ 37.620.000,00	-$ 72.380.000,00

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 8.197.800	$ 8.197.800
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 17.467.200	$ 25.665.000
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$ 313.767.817	$ 339.432.817
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$ 294.829.463	$ 634.262.972
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000	$ 277.418.963	$ 911.681.935
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000	$ 37.020.000	$ 948.481.935
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000		
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000		
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000		
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		
	$ 1.100.000.000			

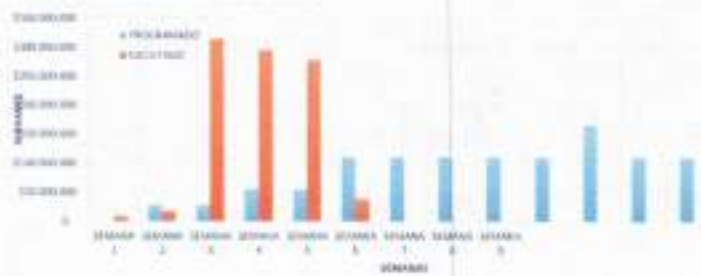

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1280 y PZ204"
Se revisión de las cotas de tubería de 16" PAM de entrada y salida en los pozos de inspección PZ1280
Se realiza excavación mecánica para pozo de inspección PZ 1280
Se realiza instalación de entibado metálico en pozo de inspección PZ 1280
Se realiza instalación de placa de fondo para pozo de inspección PZ 1280
Se realiza instalación de cilindros prefabricados para pozo de inspección PZ 1280

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias ocasional en las horas de la tarde y nos nocturnas

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Supervision de actividades
Señalizacion de areas de trabajo
Capacitaciones y Charlas de seguridad
Entrega de epp

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2026

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.005

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el día 14 de mayo de 2026

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Director de Obra, Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficinal, y ayudantes
Bomba sumergible
Retroexcavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

Nombre: JUAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: SEBASTIAN RAMIREZ GUTIERREZ M
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: DISEÑOS: REVISIÓN DE DISEÑOS: CONSTRUCCIÓN: X


INFORME SEMANAL No.007

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	10,00%	3,03%	-6,97%

	PROGRAM	EJECUT
SEMANA 1	0,00% 0,00%	0,75% 0,75%
SEMANA 2	2,50% 2,50%	1,59% 2,34%
SEMANA 3	2,50% 5,00%	28,57% 30,90%
SEMANA 4	5,00% 10,00%	26,81% 57,71%
SEMANA 5	5,00% 15,00%	23,23% 83,80%
SEMANA 6	10,00% 25,00%	3,42% 86,32%
SEMANA 7	10,00% 35,00%	3,03% 89,35%
SEMANA 8	10,00% 45,00%	
SEMANA 9	10,00% 55,00%	
SEMANA 10	10,00% 65,00%	
SEMANA 11	15,00% 80,00%	
SEMANA 12	10,00% 90,00%	
SEMANA 13	10,00% 100,00%	

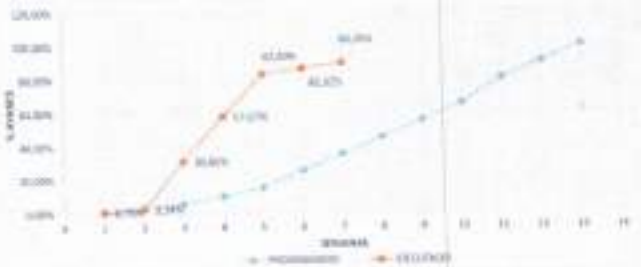

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 110.000.000,00	$ 33.330.000,00	-$ 76.670.000,00

	PROGRAM		EJECUT	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 6.197.000	$ 6.197.000
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 17.467.000	$ 23.665.000
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$ 313.797.657	$ 339.462.657
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$ 294.929.480	$ 634.392.073
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000	$ 277.478.983	$ 911.881.056
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000	$ 37.000.000	$ 948.881.056
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000	$ 33.330.000	$ 982.811.056
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000		
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000		
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		
	$ 1.100.000.000			

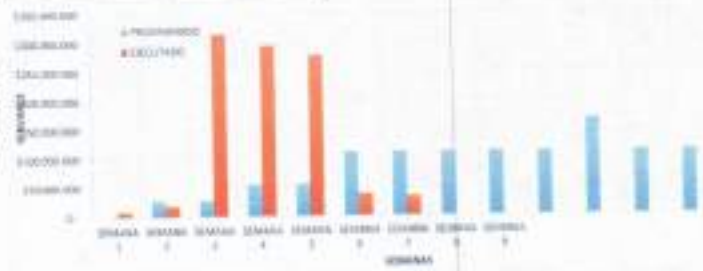

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en cavas de inspección "PZ1280 y PZ288"
Se revisión de las cotas de tubería de 18" PAD de entrada y salida en los pozos de inspección PZ-1280
Se realiza instalación de tuberías y accesorio de 12" en pozo de inspección PZ 1280 para cámara de caída
Se realiza la instalación de geotextil permeable al pozo de inspección y alrededor para accesorios de cámara de caída en pozo de inspección PZ 1280
Se realiza retiro de entibado metálico en pozo de inspección PZ 1280 e inicio el llano con material granular compactado mecánicamente
Se realiza la instalación de los pasos del pozo de inspección PZ 288

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias moderadas en las horas de la tarde y días nublados

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preparaciones de equipos, herramientas y actividades a realizar
Supervicion de actividades
Señalizacion de areas de trabajo
Capacitaciones y Charlas de seguridad
Entrega de epp

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.007

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comite en obra el dia 21 de mayo de 2020

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Director de Obra, Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota. Adjuntar al presente informe copia de la bitacora de obra de la semana y registro fotografico de la semana

Nombre: IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: SEBASTIAN VALENZUELA RODRIGUEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: DISEÑOS: REVISIÓN DE DISEÑOS: CONSTRUCCIÓN: X


INFORME SEMANAL No. 055

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	10,00%	4,93%	-5,07%

	PROGRAM.	EJECUT.
SEMANA 1	0,00% 0,00%	0,79% 0,79%
SEMANA 2	0,00% 0,00%	1,59% 2,34%
SEMANA 3	2,50% 0,00%	28,53% 30,99%
SEMANA 4	5,00% 10,00%	26,91% 57,67%
SEMANA 5	5,00% 15,00%	25,23% 82,90%
SEMANA 6	10,00% 25,00%	5,43% 88,33%
SEMANA 7	10,00% 35,00%	3,05% 90,38%
SEMANA 8	10,00% 45,00%	4,95% 94,33%
SEMANA 9	10,00% 55,00%	
SEMANA 10	10,00% 65,00%	
SEMANA 11	15,00% 80,00%	
SEMANA 12	15,00% 95,00%	
SEMANA 13	10,00% 105,00%	

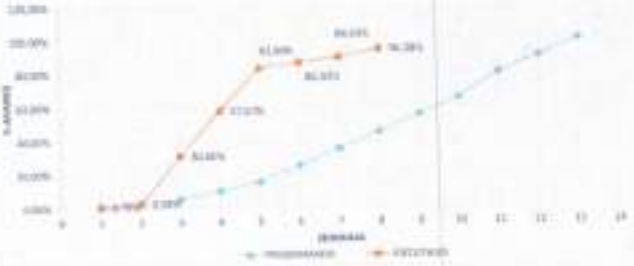

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 110.000.000,00	$ 54.230.000,00	-$ 55.770.000,00

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 5.197.600	$ 5.197.600
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 17.497.600	$ 22.695.200
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 55.000.000	$ 313.767.617	$ 336.462.817
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$ 284.029.495	$ 620.492.312
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000	$ 271.475.043	$ 891.967.355
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000	$ 57.525.000	$ 949.491.355
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000	$ 53.330.000	$ 982.911.355
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000	$ 54.230.000	$ 1.037.041.355
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000		
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		
	$ 1.100.000.000			

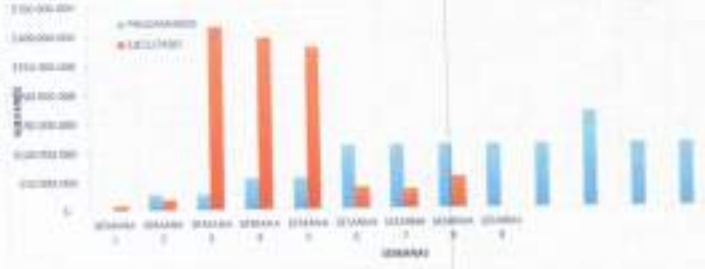

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ1280, PZ1280 y PZ3102"
Se revisión de las colas de tubería de 18" PAD de entrada y salida en los pozos de inspección PZ3102
Se realiza excavación mecanica para pozos de inspección PZ 2102 - PZ 1290 y la nueva hidraulica de llegada al pozo de inspección PZ 1280
Se realiza instalación de entibado metálico en pozo de inspección PZ 2102
Se realiza instalacion de placa de fondo para pozo de inspección PZ 2102
Se realiza instalación de cilindros prefabricados para pozo de inspección PZ 2102 - PZ 1290

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentando lluvias intensas en las horas de la tarde y días nublados

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Supervicion de actividades
Señalizacion de areas de trabajo
Inspección de equipos de emergencia
Capacitaciones y Charlas de seguridad
Entrega de EPP

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X

INFORME SEMANAL No.009

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el día 25 de mayo de 2020

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Director de Obra, Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con resaelo, oficiosl, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador eléctrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota. Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

NOMBRE IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre SEBASTIAN RAMIREZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2026	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	072 – 2026	OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCIÓN	X


INFORME SEMANAL No.009

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 07 DE MAYO DE 2026

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	10,00%	2,06%	-7,94%

	PROGRAM.		EJECUT.	
SEMANA 1	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%
SEMANA 2	2,50%	2,50%	1,09%	2,34%
SEMANA 3	2,50%	5,00%	28,52%	30,86%
SEMANA 4	5,00%	10,00%	26,81%	57,67%
SEMANA 5	5,00%	15,00%	24,23%	82,89%
SEMANA 6	10,00%	25,00%	3,43%	86,32%
SEMANA 7	10,00%	35,00%	3,03%	89,35%
SEMANA 8	10,00%	45,00%	4,83%	94,28%
SEMANA 9	10,00%	55,00%	2,06%	96,34%
SEMANA 10	10,00%	65,00%		
SEMANA 11	15,00%	80,00%		
SEMANA 12	10,00%	90,00%		
SEMANA 13	10,00%	100,00%		

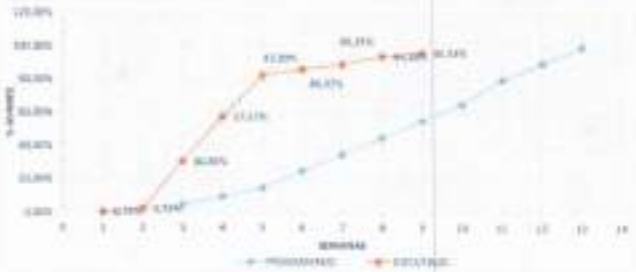

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 110.000.000,00	$ 22.660.000,00	-$ 87.340.000,00

	PROGRAM		EJECUT.	
SEMANA 1	$ -	$ -	$ 5.197.000	$ 5.197.000
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 27.500.000	$ 17.467.000	$ 22.665.000
SEMANA 3	$ 21.500.000	$ 49.000.000	$ 313.757.017	$ 336.423.017
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 110.000.000	$ 294.828.455	$ 631.252.472
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 165.000.000	$ 277.479.983	$ 911.981.455
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 275.000.000	$ 37.626.000	$ 949.181.455
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 385.000.000	$ 33.330.000	$ 982.511.455
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 495.000.000	$ 54.230.000	$ 1.037.941.455
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 605.000.000	$ 22.660.000	$ 1.059.701.455
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 715.000.000		
SEMANA 11	$ 165.000.000	$ 880.000.000		
SEMANA 12	$ 110.000.000	$ 990.000.000		
SEMANA 13	$ 110.000.000	$ 1.100.000.000		
	$ 1.100.000.000			

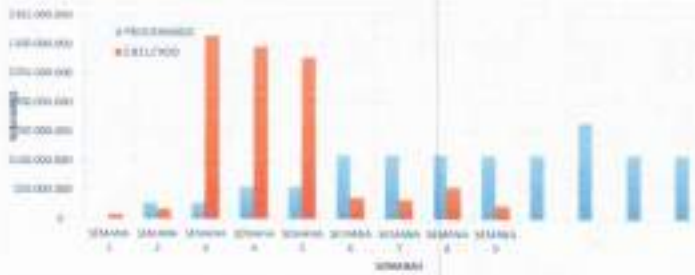

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza y bombeo de agua en pozos de inspección "PZ 1260 y PZ 2102"
Se revisión de las cajas de tuberia de VE PAR de entrada y salida en los pozos de inspección PZ2102
Se realiza excavación manualmica para la manila hidraulica de llegada al pozo de inspección PZ 2102
Se realiza la instalación de geotextil perimetral al pozo de inspeccion PZ 2102 - PZ 1260
Se realiza retiro de entibado metalico en pozo de inspeccion PZ 2102 e inicia el frena con material granular compactado mecanicamente
Se realiza la instalacion de los pasos del pozo de inspeccion PZ 258

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias intensas en las horas de la tarde y dias nublados

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preparatorias de equipos, herramientas y actividades a realizar
Supervision de actividades
Señalizacion de areas de trabajo
Inspección de equipos de emergencia
Capacitaciones y Charlas de seguridad
Entrega de epp

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL, CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA:		DISEÑOS		REVISIÓN DE DISEÑOS		CONSTRUCCION	X

INFORME SEMANAL No.009

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 04 de junio de 2020

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Director de Obra, Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficial, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de Media con zapador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

Nombre: IVÁN HERNÁNDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: SEBASTIAN RODRIGUEZ M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F020
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: | DISEÑOS: | REVISIÓN DE DISEÑOS: | CONSTRUCCIÓN: X


INFORME SEMANAL No.010

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020

1. AVANCES


		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1.	AVANCE FÍSICO	10,00%	3,66%	-6,34%

	PROGRAM.	EJECUT.
SEMANA 1	0,00%	0,79%
SEMANA 2	2,50%	1,08%
SEMANA 3	2,50%	28,52%
SEMANA 4	5,00%	38,81%
SEMANA 5	5,00%	33,33%
SEMANA 6	10,00%	5,42%
SEMANA 7	10,00%	0,69%
SEMANA 8	10,00%	6,93%
SEMANA 9	10,00%	2,05%
SEMANA 10	10,00%	5,05%
SEMANA 11	10,00%	
SEMANA 12	10,00%	
SEMANA 13	10,00%	

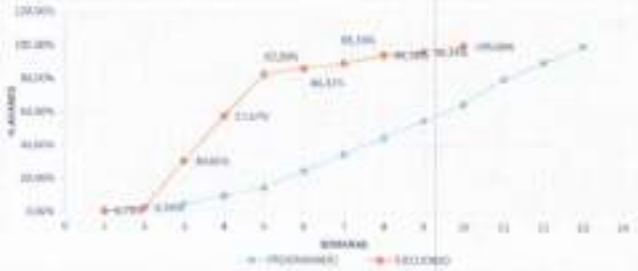

		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.	AVANCE FINANCIERO	$ 110.000.000,00	$ 40.298.066,00	-$ 69.701.936,00

	PROGRAM	EJECUT.
SEMANA 1	$ -	$ 8.197.600
SEMANA 2	$ 27.500.000	$ 17.467.600
SEMANA 3	$ 27.500.000	$ 313.787.817
SEMANA 4	$ 55.000.000	$ 284.628.468
SEMANA 5	$ 55.000.000	$ 277.476.863
SEMANA 6	$ 110.000.000	$ 32.626.800
SEMANA 7	$ 110.000.000	$ 33.536.800
SEMANA 8	$ 110.000.000	$ 56.235.200
SEMANA 9	$ 110.000.000	$ 22.080.800
SEMANA 10	$ 110.000.000	$ 49.296.960
SEMANA 11	$ 110.000.000	
SEMANA 12	$ 110.000.000	
SEMANA 13	$ 110.000.000	

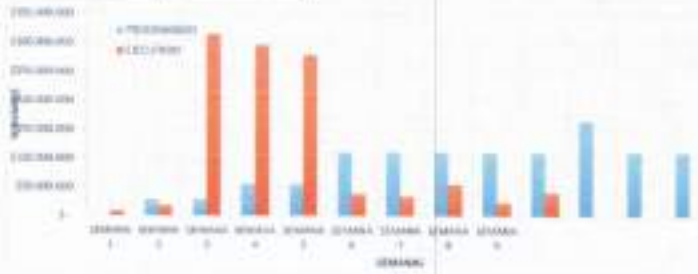

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza instalación de placa superior para pozos de inspección PZ 1280, PZ 1290 y PZ 2102
Se realiza lleno con concreto fluido en salida y entrada de perforación horizontal de tubería de 18"
Se realiza la construcción de los cañuelos para los pozos de inspección PZ 1280, PZ 1290 y PZ 2102
Se realizan reparaciones a predios afectados en la ejecución de la obra.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Presentamos lluvias intensas en las horas de la tarde y dias nublados

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Preoperacionales de equipos, herramientas y actividades a realizar
Supervision de actividades
Señalización de áreas de trabajo
Capacitaciones y Charlas de seguridad
Entrega de epp

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL

Orden y aseo
Disposicion adecuada de residuos

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN GESTIÓN DE CALIDAD (ENSAYOS, CONTROLES REALIZADOS)

	INFORME SEMANAL	CODIGO: AL-F029 VERSION: 01 FECHA: MARZO 2020

CONTRATO DE OBRA No.	071 – 2020	OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	072 – 2020	OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

ETAPA: DISEÑOS REVISIÓN DE DISEÑOS CONSTRUCCIÓN 1

INFORME SEMANAL No.019

7. COMITÉS O REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA
Se realizo comité en obra el dia 11 de junio de 2020

8. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJÓ DURANTE LA SEMANA
Director de Obra, Ingeniero civil residente de obra, profesional en salud y seguridad (SST)
Cuadrilla de trabajo con maestro, oficiales, y ayudantes
Bomba sumergible
Excavadora de llanta con cargador frontal
Herramienta menor
Excavadora de oruga
Generador electrico

9. MATERIALES QUE INGRESARON EN LA SEMANA

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Adjuntar al presente informe copia de la bitácora de obra de la semana y registro fotográfico de la semana

Nombre: IVAN HERNANDEZ N.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: SEBASTIAN BOHORQUEZ U.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 30 de marzo de 2026

COMTOCANCIPA-001

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.

C.C. GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 071 "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: Entrega de Pólizas de inicio del contrato.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito radicar ante ustedes la **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** con copia a la interventoría de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y pliegos de condiciones.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

José Luis Santos Acosta
Residente de obra
BYM Ingeniería S.A.S.

Elaboró: Ing. José Luis Santos Acosta. **RESIDENTE DE OBRA**
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Santos Acosta **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

DOCUMENTO EN ORIGINAL, COPIA Y
ARCHIVO DIGITAL.

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 10 de abril de 2026

COMTOCANCIPA-002

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP

C.C. GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 071 "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: Entrega de pólizas conforme al acta de inicio del contrato.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito radicar ante ustedes las **PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** con copia a la interventoría de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y pliegos de condiciones.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

José Luis Santos Acosta
Residente de obra
BYM Ingeniería S.A.S.

Elaboró: Ing. José Luis Santos Acosta. **RESIDENTE DE OBRA**
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Santos Acosta **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

DOCUMENTO EN ORIGINAL, COPIA Y
ARCHIVO DIGITAL.

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 16 de abril de 2026

COMTOCANCIPA-003

Señores:
GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 071 "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: Notificación avería en máquina para perforación dirigida de tubería de 16" PN 6.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se informa formalmente a la interventoría que el equipo de perforación horizontal ha quedado fuera de operación debido a un daño técnico crítico en el transmisor, componente esencial que emite la señal con los datos de posición, inclinación y profundidad de la perforación. Esta avería, detectada el día de hoy a las 1 pm en el tramo comprendido entre los pozos de inspección PZ-1280 y PZ-1290, impide continuar con la actividad de manera segura y precisa, por lo cual se ha procedido a la suspensión inmediata de la labor mientras se gestiona el reemplazo o reparación del sensor; por lo que se estima un tiempo de inactividad de aproximadamente 8 días calendario para la gestión y sustitución de este repuesto especializado quedamos a su disposición para cualquier validación técnica en sitio, los mantendremos informados sobre el tiempo estimado para la reanudación de las actividades.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

José Luis Santos Acosta
Residente de obra
BYM Ingeniería S.A.S.

Elaboró: Ing. José Luis Santos Acosta. **RESIDENTE DE OBRA**
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Santos Acosta **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

DOCUMENTO EN ORIGINAL, COPIA Y ARCHIVO DIGITAL.

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 24 de abril de 2026

COMTOCANCIPA-005

Señores:
GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato.

Respetados señores:

Por medio del presente, nos permitimos notificar los cambios de profesional asignado al **Contrato No. 071 de 2026**, celebrado entre **BYM INGENIERÍA** y **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP.**

Esta notificación se realiza conforme a lo estipulado en el clausulado contractual y con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad en la ejecución del contrato. A continuación, se relacionan el cambio efectuado:

Cargo	Profesional Saliente	Profesional Entrante	Fecha de Cambio
Residente de Obra	Jose Luis Santos Acosta	Daniel Cabulla Aldana	01/05/2026

Datos del profesional entrante Residente de Obra:

- **Nombre completo:** Daniel Alejandro Cabulla Aldana
- **Cédula de ciudadanía:** 1.014.202.674
- **Profesión:** Ingeniero Civil
- **Matricula profesional:** 25202-345421 CND
- **Fecha de inicio de actividades:** 10 de octubre de 2025

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Se adjuntan los documentos soporte del profesional entrante para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo exigido en el contrato:

1. Hoja de vida actualizada
2. Copia de cédula de ciudadanía
3. Tarjeta profesional expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería
4. Certificaciones de experiencia
5. Certificados académicos

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

BERNARDO RAMÍREZ

DOCUMENTO EN ORIGINAL.
COPIA Y ARCHIVO DIGITAL.

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 13 de mayo de 2026

COMTOCANCIPA-006

Señores:
GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 071 DE 2026– "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: Informe **CORTE DE OBRA 01** del periodo comprendido entre 07 de abril y 08 de mayo de 2026.

Cordial saludo:

Por medio del presente realizado la entre del **CORTE DE OBRA N° 1,** para su aval y visto bueno, con sus respectivos soportes y anexo los cuales se listan a continuación.

1. ACTA DE PAGO PARCIAL Y MEMORIAS DE CALCULO
2. DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES PARAFISCALES
3. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4. PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (SEGURIDAD SOCIAL)
5. INFORME DE CORTE (Anexos)
    - AL-F029 Informe Semanal
    - AL-F030 Control de inspección y ensayo
    - AL-F031 Información de seguridad social
    - AL-F032 Relación de maquinaria y equipos
    - AL-F033 Relación de personal de obra del contratista
    - AL-F034 Control de equipos de medición
    - AL-F035 Condiciones Climáticas
    - AL-F036 Control operativo de ambiental
    - AL-F037 Control operativo de calidad
    - AL-F038 Control lista de chequeo general gestión ambiental y SST
    - AL-F039 Registro Fotográfico

- AL-F041 Acta de obra con memorias de cantidades
- AL-F043 Control operativo SST
- Certificados de materiales
- Correspondencia enviada y recibida
- Informe integral de obra (gestión industrial, de seguridad y salud en el trabajo)
- PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR: Cumplimiento – Salarios y prestaciones sociales – Calidad del servicio – Estabilidad y calidad de la obra.
- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Amparo básico – Predios – Labores y Operaciones.

6. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexos)

- Inducción SG-SST y evaluación del personal.
- Certificado de afiliación ARL de las personas que ingresan a la empresa
- Pagos de seguridad social del mes octubre.
- Registro de entregas de EPP y entrega de dotación.
- Inspección de elementos de protección personal
- Inspección de botiquín y extintor.
- Informe de participación simulacro

7. GESTIÓN AMBIENTAL (Anexos)

- Informe de gestión ambiental
- Registro fotográfico y físico de las capacitaciones ambientales efectuadas en el mes.
- Registro fotográfico de: kit para residuos sólidos, baños para el uso del personal de la obra, disposición temporal de material pétreo.
- Certificación de la escombrera autorizada en la que se describa el volumen de material, tipo, lugar y fecha de disposición

8. RUT

Alberto Santos Acosta
Director de obra
BYM Ingeniería S.A.S.

Elaboró: Ing. Daniel Alejandro Cabulla A. **RESIDENTE DE OBRA**
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Santos Acosta **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

DOCUMENTO EN ORIGINAL,
COPIA Y ARCHIVO DIGITAL.

ACTA DE CORRESPONDENCIA			
CÓDIGO: ING-ACT-03	VERSIÓN: 0	FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2025	

Tocancipá, 12 de junio de 2026

COMTOCANCIPA-009

Señores:
GEAGOR SAS BIC:
Interventoría del contrato

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 071 DE 2026– "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

ASUNTO: Informe **CORTE DE OBRA 02** del periodo comprendido entre 08 de mayo a 10 de junio de 2026 y **LIQUIDACIÓN**.

Cordial saludo:

Por medio del presente realizado la entre del **CORTE DE OBRA N° 2** y **LIQUIDACIÓN,** para su aval y visto bueno, con sus respectivos soportes y anexo los cuales se listan a continuación.

1. ACTA DE PAGO PARCIAL Y MEMORIAS DE CALCULO
2. DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES PARAFISCALES
3. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4. PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (SEGURIDAD SOCIAL)
5. INFORME DE CORTE (Anexos)
    - AL-F029 Informe Semanal
    - AL-F030 Control de inspección y ensayo
    - AL-F031 Información de seguridad social
    - AL-F032 Relación de maquinaria y equipos
    - AL-F033 Relación de personal de obra del contratista
    - AL-F034 Control de equipos de medición
    - AL-F035 Condiciones Climáticas
    - AL-F036 Control operativo de ambiental
    - AL-F037 Control operativo de calidad
    - AL-F038 Control lista de chequeo general gestión ambiental y SST
    - AL-F039 Registro Fotográfico
    - AL-F041 Acta de obra con memorias de cantidades

- AL-F043 Control operativo SST
- Certificados de materiales
- Correspondencia enviada y recibida
- Informe integral de obra (gestión industrial, de seguridad y salud en el trabajo)
- PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR: Cumplimiento – Salarios y prestaciones sociales – Calidad del servicio – Estabilidad y calidad de la obra.
- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Amparo básico – Predios – Labores y Operaciones.
- Planos récord firmados.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Informe de cumplimiento del PMT.
- Actas de vecindad (sierre).

6. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexos)

- Inducción SG-SST y evaluación del personal.
- Certificado de afiliación ARL de las personas que ingresan a la empresa
- Pagos de seguridad social del mes octubre.
- Registro de entregas de EPP y entrega de dotación.
- Inspección de elementos de protección personal
- Inspección de botiquín y extintor.
- Informe de participación simulacro Informe de cumplimiento del PMT.

7. GESTIÓN AMBIENTAL (Anexos)

- Informe de gestión ambiental
- Registro fotográfico y físico de las capacitaciones ambientales efectuadas en el mes.
- Registro fotográfico de: kit para residuos sólidos, baños para el uso del personal de la obra, disposición temporal de material pétreo.
- Certificación de la escombrera autorizada en la que se describa el volumen de material, tipo, lugar y fecha de disposición

8. RUT

Alberto Santos Acosta
Director de obra
BYM Ingeniería S.A.S.

Elaboró: Ing. Daniel Alejandro Cabulla A. **RESIDENTE DE OBRA**
Revisó y aprobó: Ing. Alberto Santos Acosta **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

DOCUMENTO EN ORIGINAL,
COPIA Y ARCHIVO DIGITAL.

GEAGOR SAS BIC

Tocancipá, Cundinamarca, 09/03/2026

Señores
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá

RMH-001

Referencia: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRETO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CONTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA – LAS MERCEDE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. CUNDINAMARCA.

Asunto: Solicitud de aprobación de cambio de Director de Interventoria – Contrato No. 072 de 2026
Respetados señores,

espetados señores.

En calidad de contratista me permito solicitar formalmente la aprobación del cambio del profesional designado como Director de Interventoria.

El presente cambio obedece a un proceso de reorganización interna del equipo de trabajo, con el propósito de optimizar la ejecución del contrato y fortalecer la dirección técnica del mismo.

En este sentido, se propone la designación del siguiente profesional:

Director de Obra (propuesto):
Iván Darío Hernández Niño
Cédula de ciudadanía No. 1.052.402.667
Matrícula Profesional No. 15202-364239 BYC

El profesional propuesto cuenta con la formación, experiencia y disponibilidad necesarias, cumpliendo con los requisitos establecidos en los documentos contractuales, garantizando así la continuidad técnica, administrativa y operativa del proyecto.

De igual forma, se informa que el profesional Fabian Mongua, quien venía

desempeñando el cargo de Director de Interventoria, será relevado de dichas funciones a partir de la aprobación del presente cambio.

Se anexan los documentos soporte correspondientes, incluyendo hoja de vida, certificaciones de experiencia y carta de compromiso del profesional propuesto.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente su aprobación, con el fin de formalizar el cambio y dar continuidad a la ejecución del contrato en condiciones óptimas.

Quedamos atentos a sus observaciones. Cordialmente,

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C. Nro. 1.077.968.979
R.L. GEAGOR S.A.S. BIC
NIT. 900.544.313-1
Contratista de Interventoria

GEAGOR SAS BIC

Tocancipá, Cundinamarca, 31/03/2026

Señores
BYM INGENIERIA SAS

RMH-002

Ref. CONTRATO DE OBRA No. 071 – 2026 CUYO OBJETO ES "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA"

Asunto: REQUISITOS PARA INGRESO AL PROYECTO DE PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPOS. – Contrato de obra No. 071 – 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar los requisitos especificos de ingreso de personal a la obra, máquinas y equipos propios y contratados. Se debe tener en cuenta que se debe enviar la documentación completa en PDF legible organizada según la numeración correspondiente para asimismo poder dar aval en los tiempos correspondientes.

Cada persona que se encuentre en el proyecto debe estar debidamente carnetizada y portarlo en un lugar legible.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO

- Hoja de Vida
- Examen médico Vigente
- Recomendaciones médicas de acuerdo al examen médico
- Certificación de cursos de alturas y/o espacios (si aplica)
- Documento de identidad
- Afiliaciones Vigentes o planilla de seguridad vigente
- Registro de entrega de dotación y EPP
- Inducción SST

- Notificación de Riesgos
- Certificación o carta de idoneidad para operarios de maquinaria amarilla

REQUISITOS ESPECIFICOS DE INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO

- Hoja de Vida
- Recomendaciones médicas de acuerdo al examen medico
- Contrato
- Afiliaciones vigentes o planilla de seguridad social
- Registro de dotación y entrega de EPP
- Inducción sst
- Notificación de riesgos
- Documento de identidad
- Licencia SST en caso de que aplique
- Curso de 50hrs cuando aplique
- Tarjeta profesional en caso de que aplique
- Diploma o certificación
- Carnet

REQUISITOS INGRESO MAQUINARIA

- Ficha Técnica
- Manifiesto de Importación
- Certificado de último mantenimiento
- Cronograma de mantenimiento

REQUISITOS INGRESO DE EQUIPOS

- Hoja de vida
- Ficha Técnica
- Certificado de calibración en caso de que aplique
- Certificado de último mantenimiento
- En caso de que el equipo sea nuevo adjuntar solamente ficha técnica y factura de compra

El carnet debe ir con los siguientes datos: Nombres y apellidos, nombre de la empresa, identificación, fecha de ingreso, Foto, EPS, ARL, AFP, Grupo sanguíneo y contacto de emergencia.

Agradezco la atención prestada y atenta a sus comentarios u observaciones.

Cordialmente,

Karen Lizeth Herrera López.
Profesional SST
GEAGOR SAS

Reviso y aprobó: ING IVAN HERNANDEZ
Anexo: ninguno
Copia: ARCHIVO

GEAGOR SAS BIC

Tocancipá, Cundinamarca, 31/03/2026

Señores
BYM Ingeniería S.A.S.

RMH-003

Referencia: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRETO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CONTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA – LAS MERCEDE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

Asunto: Solicitud de documentos al contratista

Por medio de la presente se solicitan, antes del inicio de actividades, los siguientes documentos al contratista:

- Garantías de:
  - Cumplimiento
  - Pago de salarios
  - Calidad del servicio
  - Estabilidad y calidad de la obra
  - Responsabilidad contractual
- Cronograma de obra.
- Plan de manejo de tráfico (PMT).
- Plan de trabajo.
- Diseños y especificaciones técnicas firmada por el profesional.

Cordialmente.

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
C.C. Nro. 1.077.968.979
R.L. GEAGOR S.A.S. BIC
NIT. 900.544.313-1
Contratista de Interventoría

GEAGOR SAS BIC

Tocancipá, Cundinamarca, 31/03/2026

Señores
BYM Ingeniería S.A.S

RMH-004

Referencia: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRETO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CONTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA – LAS MERCEDE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

Asunto: Solicitud de documentos al contratista

Cordial saludo.
Por medio de la presente me permito enviar los requisitos específicos de ingreso de personal a la obra, máquinas y equipos propios y contratados. Se debe tener en cuenta que se debe enviar la documentación completa en PDF legible organizada según la numeración correspondiente para asimismo poder dar aval en los tiempos correspondientes.
Cada persona que se encuentre en el proyecto debe estar debidamente cametizada y portarlo en un lugar legible.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO

1. Hoja de Vida
2. Examen médico Vigente
3. Recomendaciones médicas de acuerdo al examen médico
4. Documento de identidad
5. Afiliaciones Vigentes o planilla de seguridad vigente
6. Registro de entrega de dotación y EPP
7. Inducción SST
8. Notificación de Riesgos
9. Certificación o carta de idoneidad para operarios de maquinaria amarilla

REQUISITOS ESPECIFICOS DE INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Hoja de Vida
2. Recomendaciones médicas de acuerdo al examen medico
3. Contrato
4. Afiliaciones vigentes o planilla de seguridad social
5. Registro de dotación y entrega de EPP

GEAGOR SAS
BIC

6. Inducción sst
7. Notificación de riesgos
8. Documento de identidad
9. Licencia SST en caso de que aplique
10. Curso de 50hrs cuando aplique
11. Tarjeta profesional en caso de que aplique
12. Diploma o certificación
13. Carnet

REQUISITOS INGRESO MAQUINARIA

1. Ficha Técnica
2. Manifiesto de Importación
3. Certificado de último mantenimiento
4. Cronograma de mantenimiento

REQUISITOS INGRESO DE EQUIPOS

1. Hoja de vida
2. Ficha Técnica
3. Certificado de calibración en caso de que aplique
4. Certificado de último mantenimiento

En caso de que el equipo sea nuevo adjuntar solamente ficha técnica y factura de compra

El carnet debe ir con los siguientes datos: Nombres y apellidos, nombre de la empresa, identificación, fecha de ingreso, Foto, EPS, ARL, AFP, Grupo sanguíneo y contacto de emergencia.

Cordialmente.

Ing. Sebastian Bohorquez M.
Residente de interventoria
BALER INGENIERIA SAS

Elaboró: ING SEBASTIAN BOHORQUEZ
Anexo: 1 carpeta
Copia: ARCHIVO

GEAGOR SAS
BIC

Tocancipá, Cundinamarca, 31/03/2026

Señores
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá

RMH-005

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍO 072 DE 2026 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRETO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CONTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA – LAS MERCEDE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

Asunto: Entrega de Póliza de cumplimiento 14-45-101134937 Cumplimiento particular

Cordial saludo.

Me permito la presente para formalizar la entrega de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 14-45-101134937 Anexo 0, correspondiente al contrato de interventoría identificado con el número 072 de 2026 de objeto en referencia.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

ING. SEBASTIAN BOHORQUEZ M
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GEAGOR SAS – BIC

Elaboró: Sebastian Bohorquez – Residente de interventoría
Anexo. Poliza 14-45-101134937 (7 folios)
Copia: Archivo

Tocancipá, Cundinamarca, 20/04/2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.
Cra 4 No 13A - 15
Tocancipá Cundinamarca

RMH-006

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 072 DE 2026 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRETO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CONTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA – LAS MERCEDE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

Asunto: Entrega de Póliza de cumplimiento 14-45-101134937 Cumplimiento particular actualizada a acta de inicio

Cordial saludo.

Me permito la presente para formalizar la entrega de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No 14-45-101134937 Anexo 1 y Anexo 2, correspondiente al acta de inicio del contrato de interventoría identificado con el número 072 de 2026 de objeto en referencia.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

ING. SEBASTIAN BOHORQUEZ M
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GEAGOR SAS – BIC

Elaboró: Sebastian Bohorquez – Residente de interventoria
Anexo. Poliza 14-45-101134937 anexo 1 y 2 (6 folios)
Copia: Archivo

Tocancipá, Cundinamarca, 30/04/2026

Señores
BYM INGENIERIA SAS
Cra 4 No 13A - 15
Tocancipá Cundinamarca

RMH-007

Referencia: CONTRATO DE OBRA 071 DE 2026 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA."

Asunto: Respuesta solicitud de cambio de Residente de Obra – Contrato No. 071 de 2026

Cordial saludo.

En atención al oficio COMTOCANCIPA-005 de fecha 24 de abril de 2026, mediante el cual se informa el cambio del profesional asignado al cargo de Residente de Obra dentro del Contrato No. 071 de 2026, la interventoría se permite informar que, una vez revisada la documentación allegada correspondiente al profesional Daniel Alejandro Cabulla Aldana, y realizada la verificación de los soportes académicos, profesionales y de experiencia aportados, se evidencia que el perfil presentado cumple con los requisitos mínimos exigidos dentro de la oferta y las condiciones contractuales establecidas para el cargo.

En consecuencia, esta interventoría emite concepto técnico favorable y avala el cambio del profesional propuesto para desempeñarse como Residente de Obra, a partir de la fecha indicada en su comunicación, considerando que el mismo acredita la idoneidad técnica y profesional requerida para el adecuado desarrollo de las actividades objeto del contrato.

No obstante, se recuerda al contratista que deberá garantizar la permanencia y disponibilidad del profesional aprobado durante la ejecución contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

ING. SEBASTIAN BOHORQUEZ M
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GEAGOR SAS – BIC

Elaboró: Sebastian Bohorquez – Residente de interventoria
Copia: Archivo

Tocancipá, Cundinamarca, 19 de mayo de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP
Ciudad

RMH-008

Asunto: Aval del Acta Parcial de Obra No. 1 – Contrato de Obra No. 071 de 2026

Referencia: Contrato de Obra No. 071 de 2026
Contratista: BYM INGENIERÍA S.A.S.
Objeto: Obras para la rehabilitación del alcantarillado sanitario costado oriental vía nacional Carrera Cuarta del sector La Hormiga – Las Mercedes segunda etapa en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

Cordial saludo.

Por medio del presente, en calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 071 de 2026, nos permitimos remitir aval técnico y financiero del Acta Parcial de Obra No. 1, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 13 de mayo de 2026.

De acuerdo con la revisión de las cantidades ejecutadas, memorias de obra, soportes técnicos, registro de actividades y verificación en campo, el valor reconocido en el Acta Parcial de Obra No. 1 corresponde a la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($917.012.025,00), equivalente a una ejecución acumulada del 83,36 % del valor contractual.

El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($182.987.975,00), equivalente al 16,64 % del valor total del contrato.

Las actividades reconocidas en el presente corte corresponden principalmente a localización y replanteo, instalación de campamento, manejo de aguas, señalización y aislamiento de áreas de trabajo, suministro e instalación de tubería

PE100 PN 6 de 16", perforación horizontal dirigida, excavaciones exploratorias,

cajas de lanzamiento y salida, transporte de maquinaria, transporte de material proveniente de excavación y manejo de lodos bentoníticos.

Con fundamento en la revisión técnica y contractual realizada, la interventoría avala el Acta Parcial de Obra No. 1 y conceptúa favorablemente su trámite ante la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, para los fines administrativos y financieros correspondientes.

Se anexan los soportes respectivos del corte, incluyendo acta parcial, memorias de cantidades, informe mensual de obra, registros fotográficos, formatos de control, soportes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión social y demás documentos aplicables al periodo ejecutado.

Atentamente,

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GEAGOR SAS – BIC

Elaboró y revisó : Iván hernández – director de interventoria
Copia: Archivo

Tocancipá, Cundinamarca, 15 de Junio de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP
Ciudad

RMH-009

Asunto: Aval del Acta No.2 Terminación y Recibo Final – Contrato de Obra No. 071 de 2026

Referencia: Contrato de Obra No. 071 de 2026
Contratista: BYM INGENIERÍA S.A.S.
Objeto: Obras para la rehabilitación del alcantarillado sanitario costado oriental vía nacional Carrera Cuarta del sector La Hormiga – Las Mercedes segunda etapa en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, y en calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 071 de 2026, nos permitimos remitir el aval técnico y financiero del Acta No.2 Terminación y Recibo Final, correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del contrato durante el período comprendido entre el 7 de abril y el 10 de junio de 2026.

De acuerdo con la revisión de las cantidades ejecutadas, las memorias de obra, los soportes técnicos, los registros de actividades y la verificación realizada en campo, esta interventoría certifica que el valor reconocido en el Acta No.2 Terminación y Recibo Final corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($182.987.975,00), valor que corresponde al saldo final pendiente de reconocimiento.

Con la aprobación de la presente acta se acredita una ejecución acumulada del cien por ciento (100 %) del valor contractual, equivalente a la suma total de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000,00), dando cumplimiento integral a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 071 de 2026.

Las actividades reconocidas en la presente acta corresponden principalmente a la culminación de las obras relacionadas con la localización y replanteo, instalación de campamento, manejo de aguas, señalización y aislamiento de áreas de trabajo, suministro e instalación de tubería PE100 PN 6 de 16", perforación horizontal dirigida, excavaciones exploratorias, entibado metálico, construcción de

GEAGOR SAS BIC

cajas de lanzamiento y salida, placa de fondo, placa de cubierta, relleno fluido en concreto de baja resistencia, suministro e instalación de pasos en polipropileno, sección cilíndrica de pozo, instalación de tubería de 10" y sus respectivos accesorios, suministro e instalación de geotextil, transporte de maquinaria, transporte de material proveniente de excavación y manejo de lodos bentoníticos, así como las demás actividades necesarias para la terminación, funcionamiento y recibo final de la obra contratada.

Con fundamento en la revisión técnica y contractual realizada, la interventoría avala el Acta No.2 Terminación y Recibo Final y conceptúa favorablemente su trámite ante la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, para los fines administrativos y financieros correspondientes, mencionando que el 10% que se encuentra implícito por liquidación por conceptos de entrega documental deberán ser efectuados tras la aprobación de la supervisión del componente documental asociado a la presente entrega.

Se anexan los soportes respectivos del corte, incluyendo acta final, memorias de cantidades, informe mensual de obra, registros fotográficos, formatos de control, soportes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión social y demás documentos aplicables al periodo ejecutado.

Atentamente,

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GEAGOR SAS – BIC

Elaboró y revisó : Iván hernández – director de interventoria
Copia: Archivo

GEAGOR SAS BIC

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020







FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	COMISIÓN TOPOGRÁFICA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020



FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	CAMPAMENTO 18 M2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	MANEJO DE AGUA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020




FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	ARBOLEDA - TOCANCIPA
DESCRIPCIÓN:	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020






FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE100 PN 6 16" 450MM

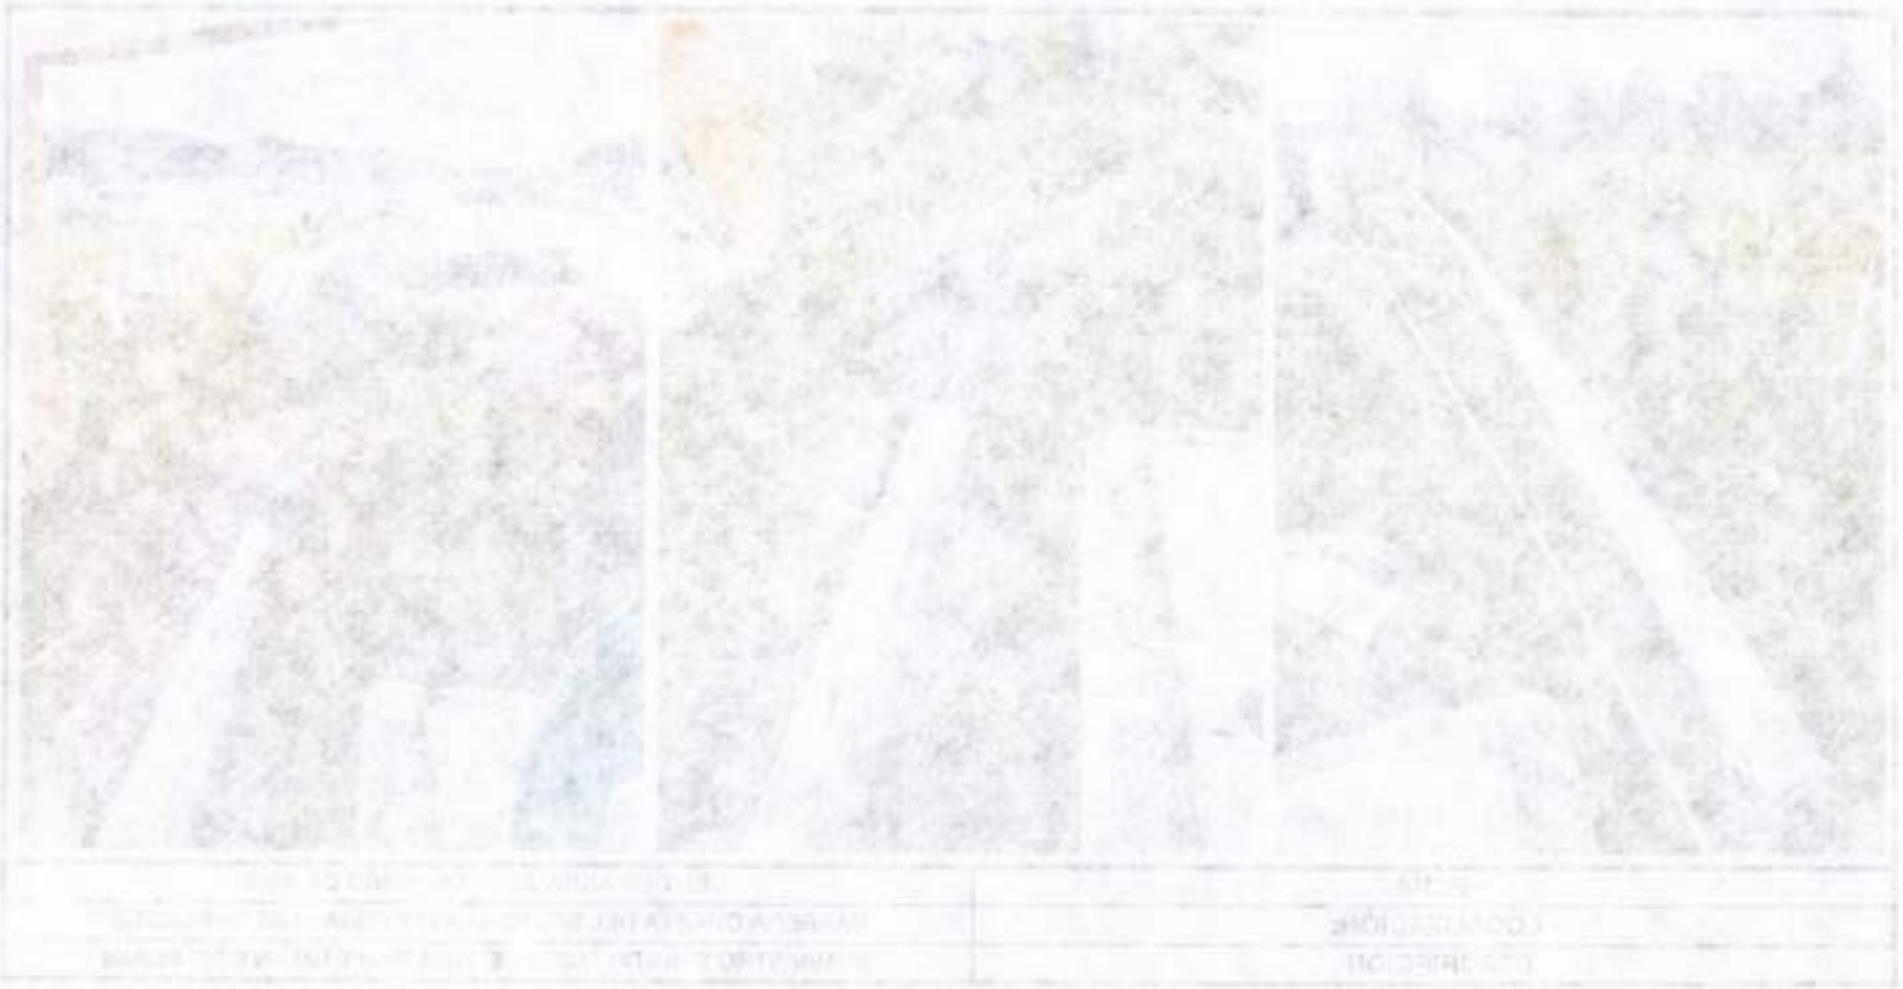


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





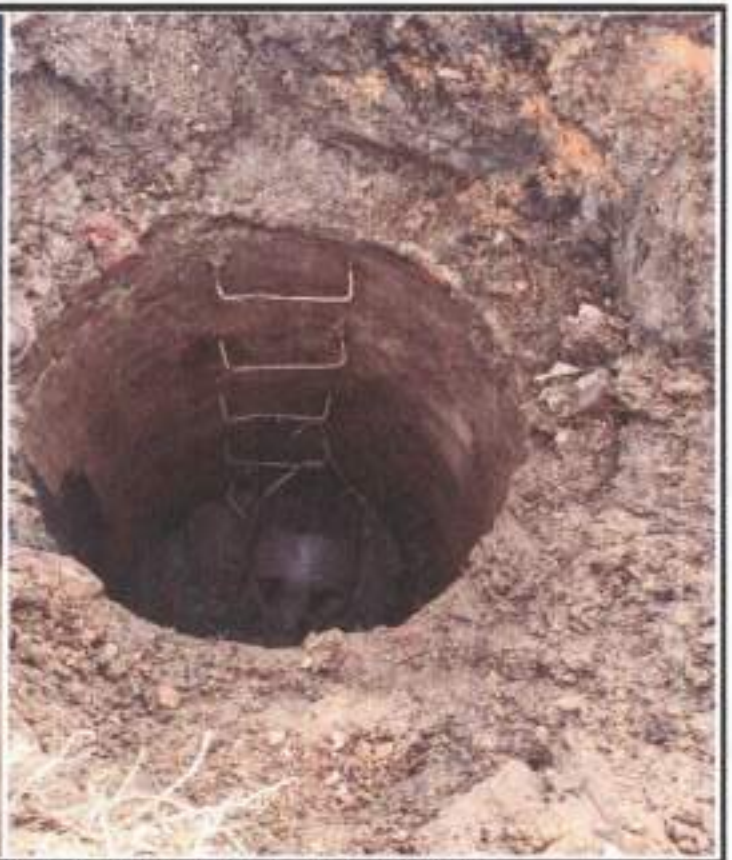

FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA TUBERÍA DE 16" PULGADAS

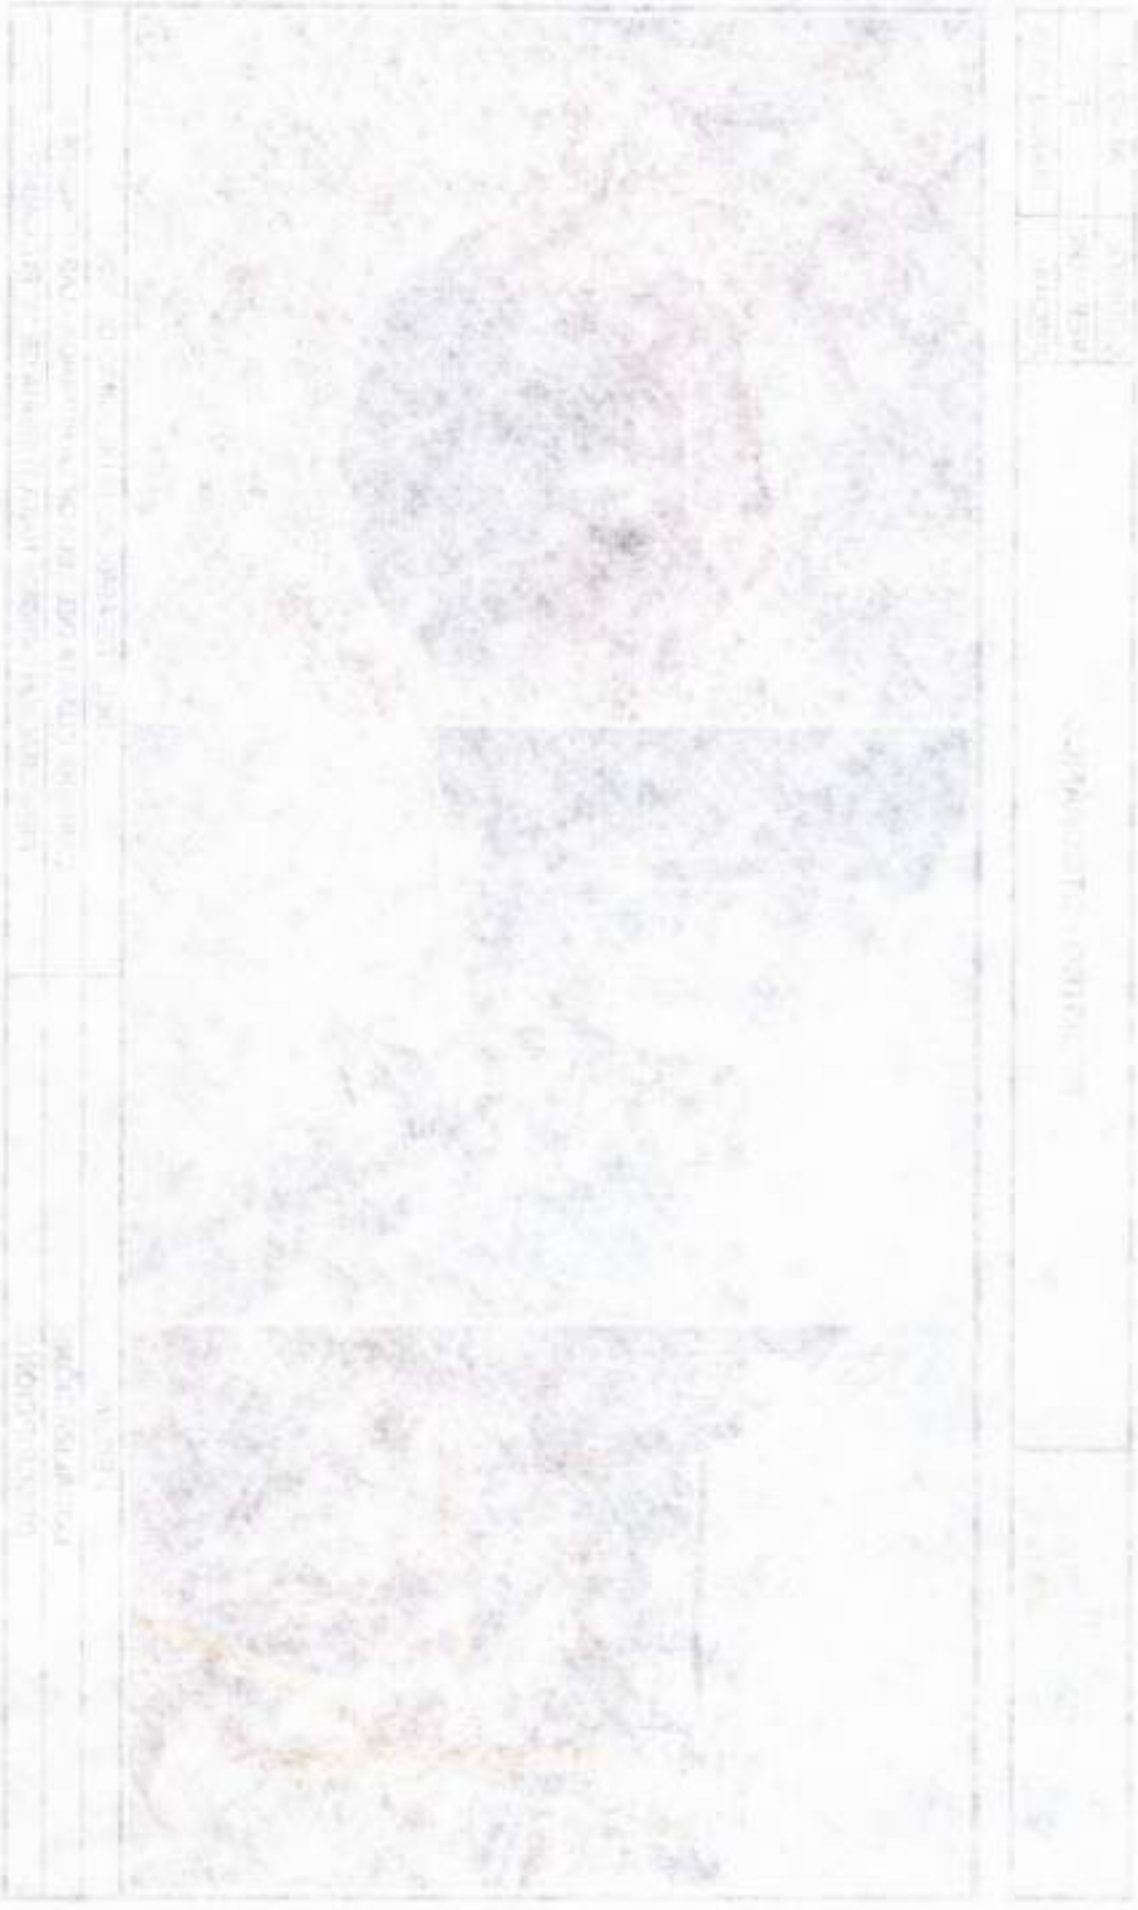

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0 2.0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5KM)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (IINCLUYE COLOCACION Y TRANSPORTE)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	CAJA DE LANZAMIENTO Y SALIDA PARA PERFORACIÓN DIRIGIDA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ E.S.P.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020






FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	PLACA FONDO DE POZO D=1,7 , PREFABRICADO, INCLUYE CAÑUELA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	PLACA CUBIERTA DE POZO D=1,7 , INCLUYE TAPA D=0,6

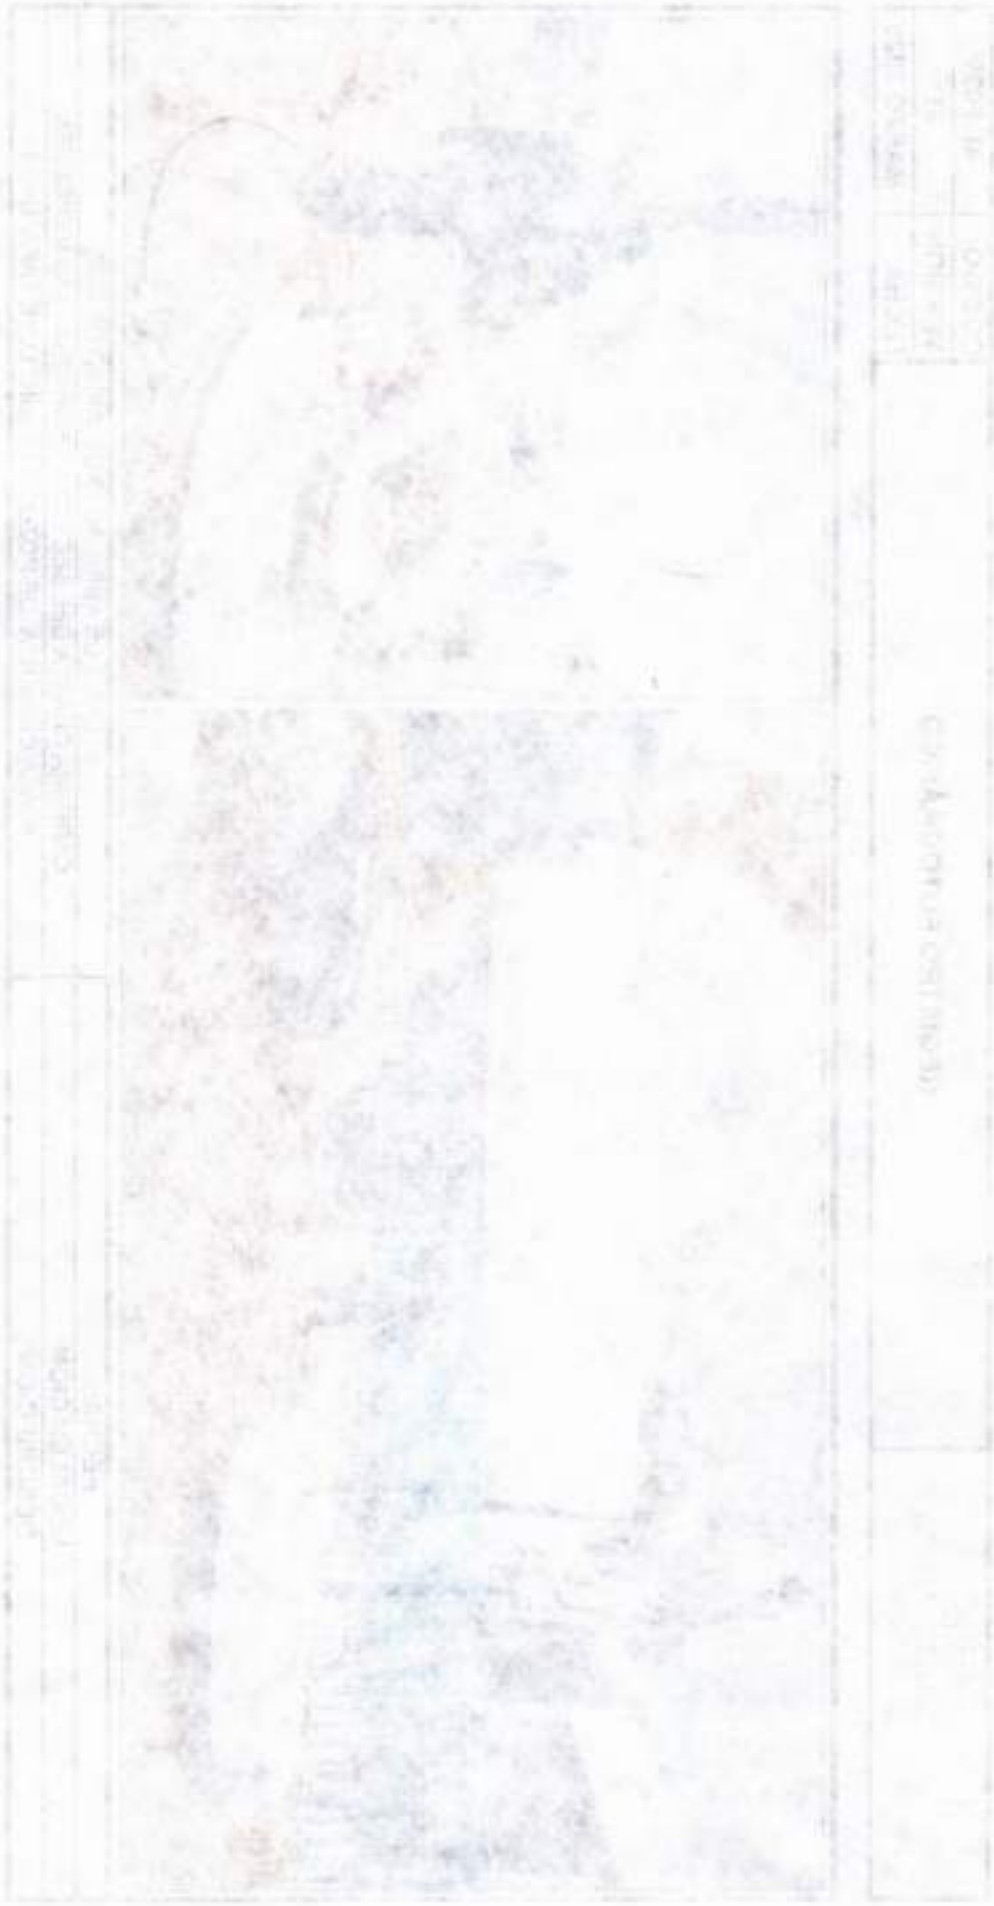

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020



FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	RELLENO FLUIDO EN CONCRETO DE BAJA RESISTENCIA CONTROLADA AUTOCOMPACTANTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN POLIPROPILENO REFORZADO ANTIADHERENTE PARA POZOS DE INSPECCIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020








FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A E.S.P	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	SECCIÓN CILÍNDRICA DE POZO H=0,50M D=120CM PREFABRICADO, INCLUYE PASOS EN ACERO

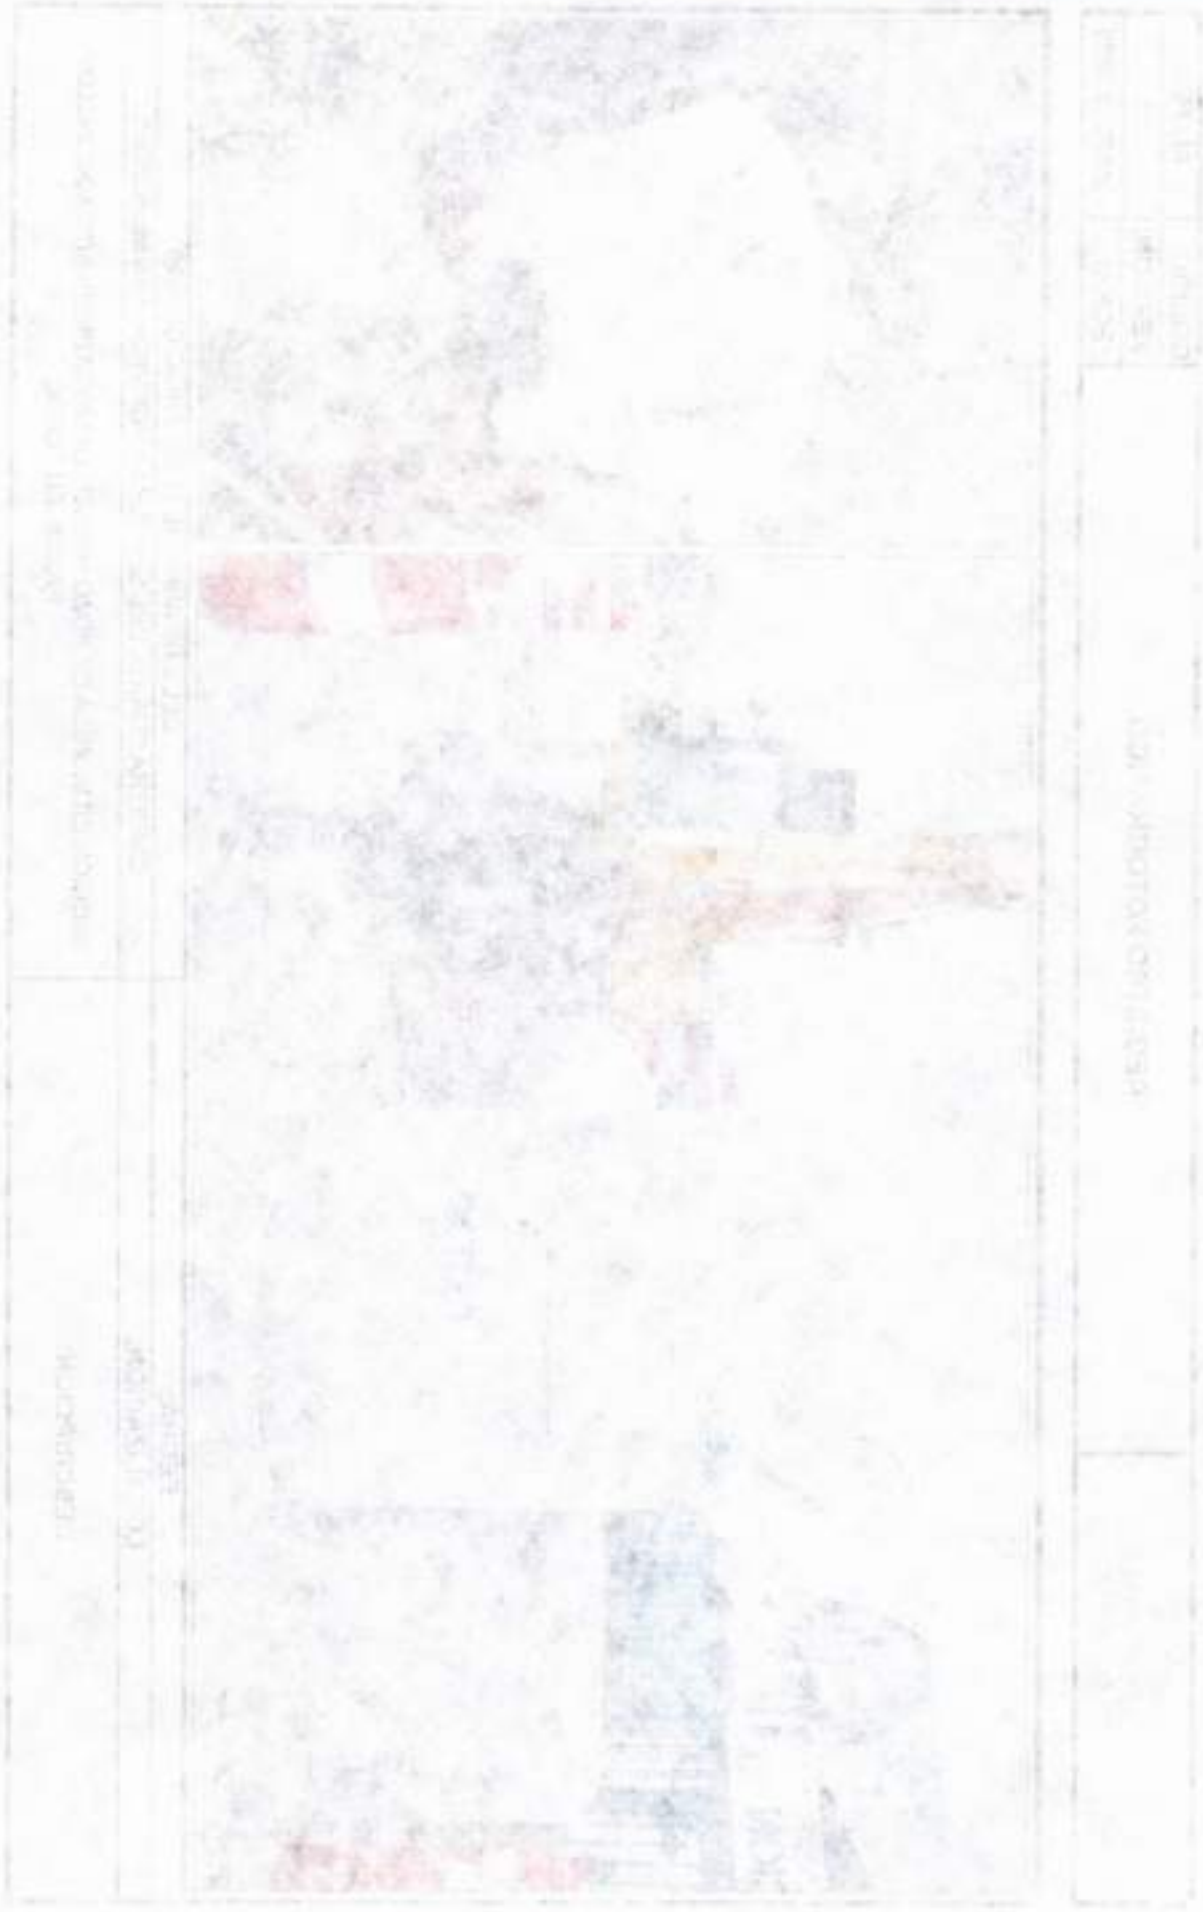

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 (ESTABILIZACIÓN FILTRO Y SEPARACIÓN)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS Y DERRUMBES (18 KM)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020





FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARÍA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CODIGO:	AL-F039
		VERSION:	01
		FECHA:	MARZO 2020







FECHA:	DEL 7 DE ABRIL AL 15 DE JUINIO DE 2026
LOCALIZACIÓN:	CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES
DESCRIPCIÓN:	MANEJO DE LODOS ESPECIALES BENTONITICOS



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo: BID-ACT-01	
Fecha de emision: 29/10/2024	
Version: 0	
INGENIERIA	

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	071 - 2026								Hoja	1	de 2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	01	FECHA	10	6	26	ELABORÓ	Carolina Camargo D.	REVISO	Daniel Cabrita		

1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Pablo Fidel Ubano		
DIRECCIÓN	Vda. Canavitet - Sector la hormiga		
TELÉFONO	3106729161	No. PISOS	2
PRESTE (AN)	3m mts	ESTRATO	2

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGIA		
TELEFONO		
GAS		
TELEVISION - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	Lote

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (MATERIAL PUERTAS, VENTANAS, PISOS, ACABADOS, OTROS, ESTADO DE LA FACHADA, ALREDEDORES, OTROS)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad de cierre donde se evidencia frente de predio los cuales fueron protegidos con cerramiento y se entregan instalados en obras igual a como estaba el predio.

Firma: [signature]
Nombre: Pablo Fidel Ubano
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 6469118

Firma: [signature]
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: [signature]
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	371 - 2021								Hoja	1	de 2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S.										
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S. BIC										
REGISTRO No.	02	FECHA	10	6	26	ELABORO	Carolina Camargo D.	REVISO	Oscar Caballa		

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE PREDIO



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Andres Aldana		
DIRECCION	Km 21 Autopista Norte		
TELEFONO	3102996949	No. PREDIO	1
PREDIO MIN	10 m	ESTRATO	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISION - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPORTE Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	

IDENTIFICACION - DESCRIPCION

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (Incluir puntos, medidas, muros, separación, postes, pozos de inspección, cajillas, etc)

Se realiza cierre de acta de vecindad donde se observa predio sin ninguna afectación al terminar el proyecto se entrega predio limpio y terminado de predio en condiciones iniciales.

Firma: _____
Nombre: Andres Aldana
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1077088033

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo:	SIG-ACT-01
Fecha de emision:	20/10/2024
Version:	0
	INGENIERIA

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	CT - 2026						Hoja	1	de 1
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S								
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S. BIC								
REGISTRO No.	03	FECHA	10	6	26	ELABORO	Carolina Camargo D.	REVISO	Daniel Cabrita.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	
DIRECCION	
TELEFONO	No PREDIO
PREDIO (Nº)	ESTRATO

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGIA		
TELEFONO		
GAS		
TELEVISION - CABLE		
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPORTE Y PARQUEADERO		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (Describa paredes, ventanas, puertas, escalones, pisos, pintura de entrada, cubierta, otros)

De acuerdo a lo visto en el acta de vecindad donde se evidencia predio sin ninguna afectación al mismo en su frente y fachada

De acuerdo a lo visto en el acta con anterioridad ya que no encontramos al propietario del predio.

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORIA
C.C. / NIT		

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo: IMG-ACT-01
Fecha de emisión: 28/10/2021
Versión: 0
INGENIERIA

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No	071 - 2020
OBJETO	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	BYM INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	GRAGOR S.A.S - BIC
REGISTRO No	04
FECHA	10 / 6 / 26
ELABORO	Cristian Camargo D
REVISO	Daniel Batalla

Pàgina 1 de 2

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE PREDIO



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCION			
TELEFONO		No PREDIO	
FRENTE (mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	SW	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGIA		
TELEFONO		
GAS		
TELEVISION CABLE		
OTRO ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
HOTELERIA		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES DESCRIPCION

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (definir puertas, ventanas, muros, medidores, gatos, pisos de entrada, cubiertas, techos)

Se realiza cierre de acta de vecindad donde se evidencia cada una de las mismas condiciones del inicio de predio

Se realiza cierre con intervención ya que no se encuentra el propietario del predio.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 071 - 2024

OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: BYM INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTOR: SEACOR S.A.S. - BIC

REGISTRO No. 05 FECHA 11 6 26 ELABORO Carolina Camargo D. REVISO Daniel Cabilla

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Nubia Lozano

DIRECCION: sector la hormiga

TELEFONO:

No. PISOS:

FRENTE MTS: 15m

ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISION - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLE NO URBANIZADO	
COMUNITARIO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO: NO ¿CUAL? Vivienda	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE REALIZAR EL PROYECTO (señale puntos vecinos, vías cercanas, pozo, sumideros, cuneta, etc)

Se realiza cierre de zona de limpieza donde se evidencia el predio sin afectación en cuanto a fachada en frente al predio y cuneta con tubo de hundimiento, se realiza resane y compactación del área.

Firma: Nubia Lozano
Nombre: Nubia Lozano
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 20933795

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo: INS-ACT-01	
Fecha de emision: 20/10/2024	
Version: 0	
INGENIERIA	

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.:	071 - 2025							Hoja	1	de	2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	06	FECHA	11	5	25	ELABORO	Carolina Arciniegas D.	REVISO	Daniel Caballa		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO:	Fredy Garcia		
DIRECCION:	CR 4 Nº 24 - Sector la hormiga		
TELEFONO:	3105338253	No PISOS:	1
FRENTE (m):	10 m	USO:	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISION - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPORTIVO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO. (Incluir puertas, ventanas, muros, andenes, pisos, zonas de antejardín, cubiertas, etc.)

Se realizo visita de vecindad de cierre de obra, predio en buenas condiciones sin afectaciones visibles, se realiza toma de fachada.

Se realiza cierre con administrador Fredy Garcia

Firma: _____
Nombre: Fredy Garcia G.
C.C. / NIT: 53 6456 3
PROPIETARIO DEL PREDIO

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo:	
Fecha de creación:	
Versión:	
	INGENIERÍA

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.:	071 - 2026							Hoja	1	de 2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA									
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S									
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S - BIC									
REGISTRO No.	07	FECHA	11	6	26	ELABORO	Cristina Camargo D.	REVISO	Daniel Cabuya	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ubaldo Triviño
DIRECCION	Cra 4 principal # 22 , local 2
TELEFONO	3183923432
No. PREDIO	
FRENTE (MS)	6,60 m
ESTRATO	2

SERVICIOS PUBLICOS

		DESCRIPCIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISION - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO		OTRO ¿CUAL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE REALIZAR EL PROYECTO (Anotar puertas, ventanas, rejas, antejardín, zonas verdes, etc.)

Se realiza acta de vecindad de cierre donde se evidencia predio comercial sin afectaciones en estado inicial igual al inicio del proyecto.

Se realiza cierre con administrador del local.

Firma
Nombre: Ubaldo Triviño PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1035673794

Firma
Nombre: REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

EYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	071 - 2025							Hoja	1	de	2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	EYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	GEAGOR BIM S.A.S										
REGISTRO No.	05	FECHA	11	6	25	ELABORO	Carolina Camargo D.	REVISO	Daniel Caballa		

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan Segura		
DIRECCION	Vereda Cundita - Vereda la Hormiga		
TELEFONO	3113202569	No. PREDIO	1
FRENTE (MN)	23 m	ESTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	SI	
GAS	NO	
TELEVISION - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
CENTRO FUNERARIO		OTRO	¿CUAL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (Vecinos, puertas, ventanas, muros, andenes, postes, jardines, antejardines, materiales, enseres)

Se realiza visita de acta de vecindad donde se evidencia predio comercial con afectaciones por construcción de muro y se realiza la instalación de cerramiento metálico y hormigón con concreto. Se procede a dejar todo con paz y salvo del predio.

Firma:	Firma:	Firma:	
Nombre: Juan Segura	Nombre:	Nombre:	
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORIA	
C.C. / NIT 79572391			

Powered by CamScanner

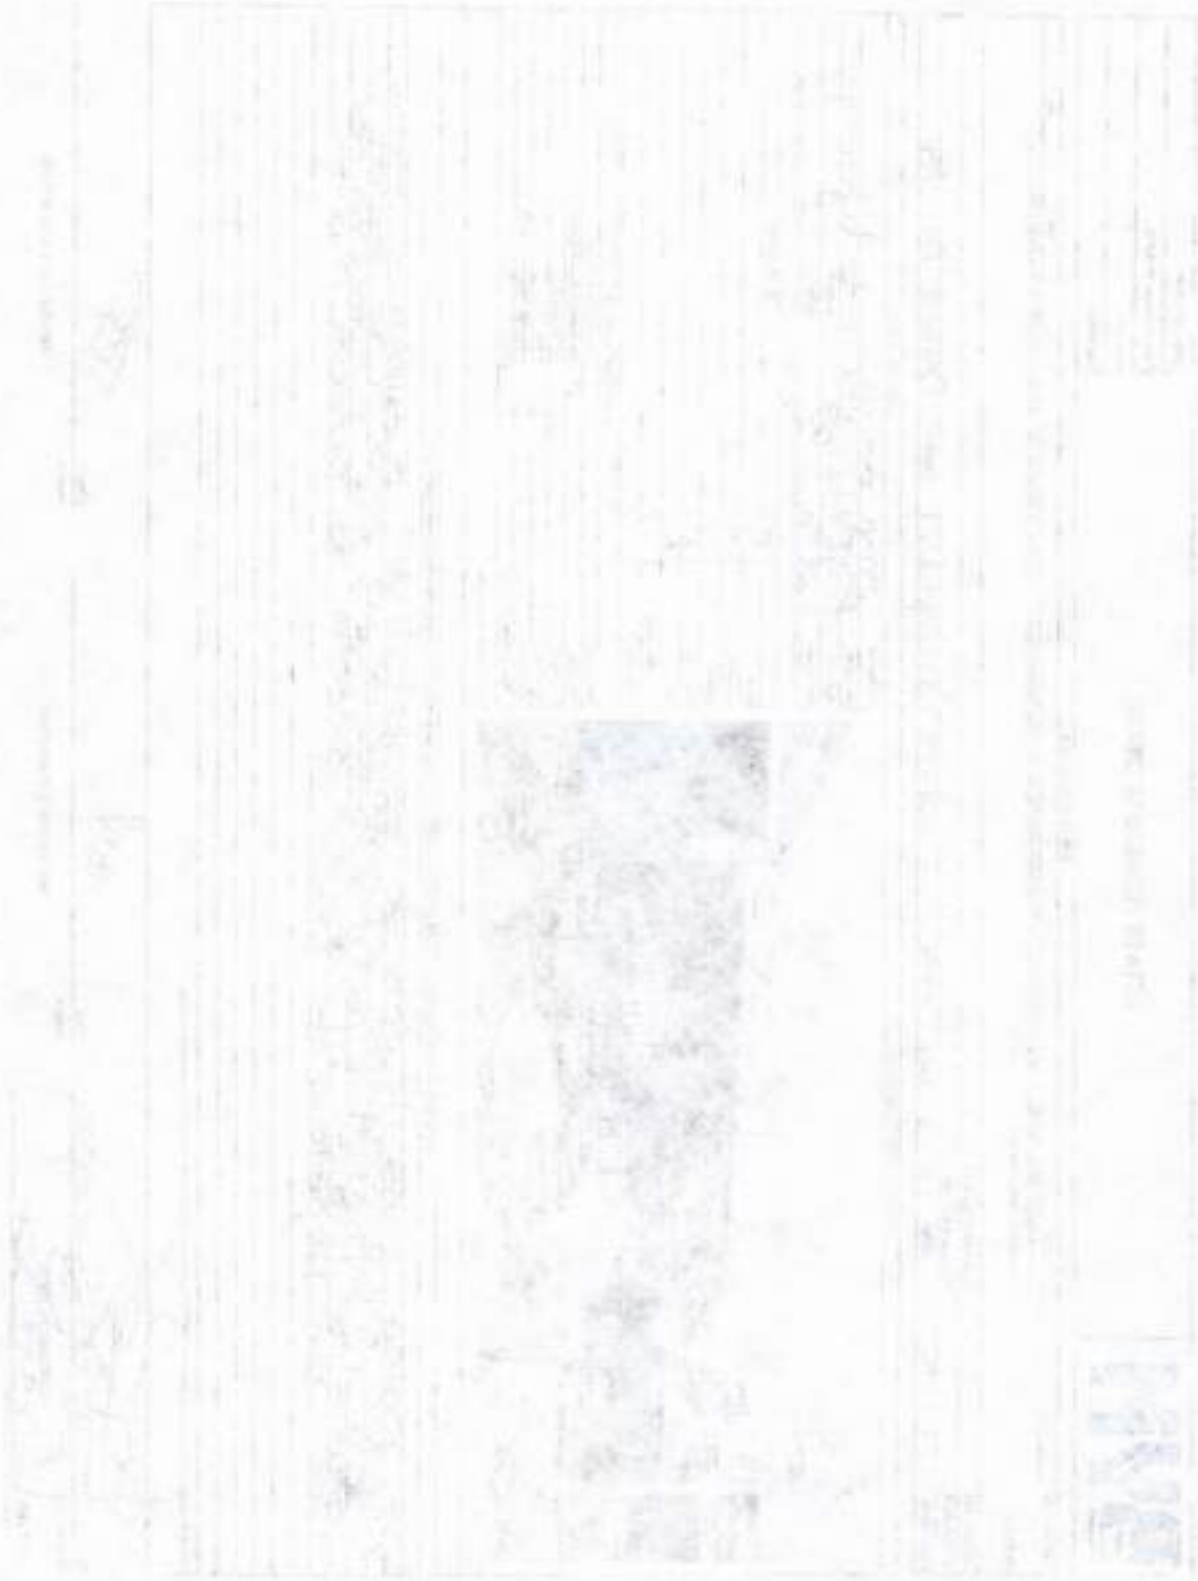

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Código: BIG-ACT-01	
Fecha de emisión: 28/10/2024	
Versión: 0	
PROCESO:	

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	SP1 - 2026								Hoja	1	de 2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CIDAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	09	FECHA	11	5	26	ELABORO	Carolina Camargo D.	REVISO	Daniel Ostella		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yadira Zabala
DIRECCION	Vereda Canavita - bodega tercera casa
TELEFONO	3225212799
No. PREDIO	12
FRENTE (m)	26 m
ESTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGIA		
TELEFONO		
GAS		
TELEVISION- CABLE		
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		RURAL NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
INSTITUCIONAL		RURAL DE EXPANSION O PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (Vereda, puntos, cantidad, muros, escalones, pisos, placa de entrega, materiales, etc)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad de predio comercial donde se evidencia afectaciones menores, se realiza cuiegle en baldosa con concreto y placa de nivelación en un de 30 cm de ancho

Firma:
Nombre: Yadira Zabala
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1083268954

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Codigo: IND-ACT-01
Fecha de emision: 23/10/2024
Version: 0
INDEMNIZACIÓN

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	071 - 2026							Hoja	1	de	2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	12	FECHA	14	5	26	ELABORO	Cristina Lamiguedo	REVISO	Daniel Caballa		

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Antonio Jotaque Leon
DIRECCION	Vda. Canutta - Sector las mercedes
TELEFONO	3143700260
No. PISOS	1
FRENTE (M)	4 mts
ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELEFONO	N	
GAS	N	
TELEVISION - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
LOTEOS Y PARCELACIONES		OTRO ¿CUAL?	Mixto

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (estado, puertas, ventanas, muros, techos, pisos, pintura de fachadas, cubiertas, otros)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad de cierre, donde se evidencia fachada sin ninguna afectación, solo el piso se restituyo adecuadamente se instala cerco de cerramiento del predio se retira toda la cerca perfil roja de vigas existente.

Firma: _____
Nombre: Antonio Sastoque
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3055325

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. :	071 - 2020							Hoja	1	de	2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S										
INTERVENTOR:	CENCOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	11	FECHA	14	6	20	ELABORÓ	Cristina Camargo O.	REVISÓ	Daniel Caballa		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE HACHAZA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
PUENTE (Nº)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELEFONO		
GAS		
TELEVISION - CABLE		
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DE ESTANCIA O PRODUCCIÓN	
DEPORTE Y RECREACIONAL		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES DESCRIPTIVAS

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO (DEBIDO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / Aplicado, pavimento, andenes, muros, escalones, postes, garajes, antejardín, cubiertas, otros)

Se realiza visita de acta de vecindad donde se evidencian afectaciones en la vía por rehabilitación de pozo de alcantarillado se hace llegar el comunicado del mismo, se realiza placa de bandeja exteriormente, para medidas.

Se realiza cierre con interventoría ya que la propietaria del predio se niega a firmar porque no se le realizo la entrega del acometido sanitario.

Firma: _____
Nombre: _____
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT: _____

Firma: _____
Nombre: _____
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: _____
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Código: IND.ACT.01
Fecha de emisión: 03/10/2024
Versión: 0
INGENIERÍA

BYM INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No.	071 - 2024
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	BYM INGENIERÍA S.A.S
INTERVENTOR:	CEAGOR S.A.S - BIC
REGISTRO No. 10	FECHA 11 / 6 / 26 ELABORÓ Carolina Camargo D. REVISÓ Daniel Caballa

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO:	Jose Rincon
DIRECCIÓN:	Vda. Laguna - Sabana la Hormiga
TELÉFONO:	3209253585 No. PREDIAL:
PERÍMETRO:	244 m ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	NO	
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUÁL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZADO NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPÓSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO (EMPLEE SU PROPIA PALABRA EL PROYECTO - Indique puntos cardinales, nuevos, existentes, pisos, alturas de antejardín, colindantes, usos)

Se realiza acta de vecindad donde se evidencia predio comercial con fachada en mampostería reforzada, lleno y compactación, placa de concreto de entrada de local comercial.

Se realiza acta con inestabilidad ya que el propietario no se encontraba disponible para el mismo.

Firma
Nombre
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Código: MEI-ACT-01
Fecha de emisión: 29/10/2024
Versión: 0
INGENIERÍA

BYM INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No.	071 - 2024							Hoja	1	de	2
OBJETO	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA	BYM INGENIERÍA S.A.S										
INTERVENTOR	GRAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	13	FECHA	14	8	25	ELABORÓ	Cristina Arango O.	REVISÓ	Daniel Obando		

1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PREDIO	
FRENTE (MS)		ESTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUÁL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPORTE Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROYECTO (NOTAS: puertas, ventanas, muros, escaleras, obras, pisos, tipo de estructura, materiales, otros)

Se realiza cierre de acta de vecindad de cierre donde se evidencia visualmente sin afectaciones teniendo presente, se evidencia predio en las condiciones iniciales al inicio predio

Se realiza cierre con inconveniente ya que no se encuentra el propietario del predio

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

Código: SIG-ACT-01
Fecha de emisión: 25/10/2021
Versión: 0
INGENIERÍA

BYM INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No. :	071 - 2025							PÁGINA	1	de	2
OBJETO:	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA:	BYM INGENIERÍA S.A.S.										
INTERVENTOR:	GEAGOR S.A.S - BIC										
REGISTRO No.	14	FECHA	11	6	26	ELABORÓ	Carolina Camargo D.	REVISÓ	Daniel Cabuya		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PREDIO	
FRENTE (Mts)		CONTRATO	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO (Incluir puertas, ventanas, muros, locativos, pisos, cielo raso, cubiertas, otros)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad del predio ubicado en la zona rural de la Hormiga afectación de cerca construcción de pozos de hace larga la compactación del suelo.

Se realiza cierre de acta con inconveniencia ya que no se puede contactar con propietario.

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORIA
C.C. / NIT		

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

BYM INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No.	CT1 - 2021
OBJETO	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VIA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	BYM INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR:	GEASOR S.A.S. - BIC
REGISTRO No. 15	FECHA 12 / 6 / 26 ELABORO Cristina Camargo O. REVISO Daniel Cabrera

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jorge Reinaldo Rocha
DIRECCION	Autopista Nte Km 29
TELEFONO	3242092396 No. PREDIO
FRENTE (m)	7m ESTRATO 2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELEFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISION - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACION DE PREDIO

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLE NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?	

OBSERVACIONES DESCRIPCION

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE FINALIZAR EL PROYECTO

Se realiza levantamiento de acta de vecindad de cierre donde se evidencia predio en buen estado. Las obras se realizaron sin novedades y se dejo el predio limpio y en el mismo estado de inicio del proyecto.

Se realiza cierre con administrador del lugar autorizado por el propietario.

Firma
Nombre Jorge Reinaldo Rocha
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

OBRA
CONTRATO N° 071 DE 2016

OBJETO DE OBRA

Obras para la rehabilitacion del alcantarillado sanitario costado oriental via nacional carrera cuarta del sector la Hormiga - Los Mercedes segunda etapa en el Municipio de Tocancipa, Cundinamarca.

INTERVENTORIA
CONTRATO N° 072 DE 2026

OBJETO DE INTERVENTORIA

Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obras para la rehabilitacion del alcantarillado sanitario, costado oriental via nacional carrera cuarta de sector la Hormiga - las Mercedes segunda etapa en el Municipio de Tocancipa, Cundinamarca.

Director Obra | Residente Obra 1 | Director Interventoria

Residente Interventoria | Supervision | Residente Obra 2

03/04/2026 Se da inicio de obra segun acta del presente dia. Clima: nublado y lluvioso. Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Topografo, Inspector SST, maestro de obra, ayudantes de obra; se realiza recorrido de obra identificando el tramo que sera intervenido verificando el estado de los pozos de inspección aguas arriba y aguas abajo del proyecto, se inicia con el levantamiento de actas de vecindad y se socializa con la comunidad. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bombas sumergibles, nivel topografico, mira y tripode.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

06/04/2026 Iniciamos actividades a las 7 am con clima nublado y presentamos lluvias en las horas de la tarde. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Profesional SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. Inicia el bombeo de agua en el pozo de inspección PZ-1290 y se realiza limpieza manual del sedimento y residuos encontrados. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y herramienta menor.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

08/04/2026 Iniciamos actividades a las 7 Am, clima: nublado y lluvioso Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, oficial de obra, maestro y ayudantes de obra. Se realiza manejo de aguas y limpieza manual de los pozos de inspeccion PZ-2102 y PZ-1280, tambien se realiza el levantamiento topografico en planimetria de los pozos de inspeccion (PZ-1290, PZ-2102, PZ-1280 y PZ-2381), accesos y cajas ubicados en el proyecto. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergibles, Nivel, mira y tripode.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

10/04/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso Personal en obra: Residente de obra, inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se realiza manejo de aguas en los pozos de inspeccion (PZ-1290, PZ-2102, PZ-1280 y PZ-2381) al igual que limpieza de pozo PZ-2381, para estos pozos de inspeccion se toman las cotas de fondo, clave y batea para la tuberia existente. Equipo y maquinaria: Bombas sumergible, generador electrico, Nivel, mira y tripode.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

8/04/2016	Iniciamos actividades a las 7 am. clima: Nublado y lluvioso, personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Topografo, Profesional SST, Inspector SST, maestro y ayudantes de obra. se realizan apques para detectar posibles redes entre los pozos de inspeccion P2-1290 y P2-2102, tambien se realiza la excavacion para los cajas de lanzamiento de la perforacion horizontal dirigida, tambien se hace manejo de aguas en estos dos pozos de inspeccion, se realizan las adecuaciones para el campamento de obra. Equipo y maquinaria: Excavadora, Generador electrico, bomba sumergible mutt, mula y tripode.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

11/04/2016	Se da inicio de actividades a las 7 Am. clima: Nublado y lluvioso, Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, ayudantes y maestro de obra. Realizamos lanzamiento piloto entre los pozo de inspeccion P2-1290 y P2-2102, manejo de aguas en estos pozos de inspeccion y verificacion de cotas de tuberia existente. Equipo y maquinaria: Retro excavadora, Bomba sumergible, maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

13/04/2016	Se da inicio de actividades a las 7 am con clima nublado y lluvioso. Personal en obra Residente de obra, Inspector SST, topografo, maestro y ayudantes de obra. Inicia la perforacion horizontal dirigido con el lanzamiento del primer Rimer de 14" entre los pozos de inspeccion P2-1290 y P2-2102, se realiza manejo de aguas en estos pozos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bombas sumergible, excavadora y maquina para perforacion horizontal dirigido.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

16/04/2016	Iniciamos actividades a las 7 am clima: lluvioso y nublado. Personal en obra: Residente de obra, maestro de obra, Inspector SST, topografo y ayudantes de obra. Continua la perforacion horizontal dirigida con el lanzamiento del segundo Rimer, se realiza manejo de aguas y lodos bentoniticos en los pozos de inspeccion P2-1290 y P2-2102, instala la union de tuberia PVC de 16" con la maquina de termo fusion. Equipo y maquinaria: Maquina de termo fusion, maquina para perforacion horizontal dirigida, retro excavadora, generador electrico, bomba sumergible.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

12/09/2026 Iniciamos actividades a las 7am clima: Nublado y lluvioso, personal en obra, Residente de obra, maestro de obra, inspector SST, topografo, ayudantes de obra. Se realiza el lanzamiento del primer de 18" con el lanzador para la perforacion horizontal dirigida entre los pozos de inspeccion PZ-1290 y PZ-2102, continua la union termo fundida para la tuberia de 16" PVC, al igual se maneja el agua en estos pozos de inspeccion y se realiza retiro de lodos, bentoniticos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bombas sumergibles, retro excavadora y maquina para termo fusion - maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

13/09/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Profesional SST, Inspector SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. Se realiza el lanzamiento de tuberia PVC de 16" entre los pozos de inspeccion PZ-1290 y el PZ-2102, tambien se realiza manejo de aguas y retiro de lodos bentoniticos entre estos dos pozos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, excavadora y maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

14/09/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am con clima nublado y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. se realizan excavaciones manuales para apiques cerca a pozos de inspeccion PZ-702 y PZ-1280 para dejar pasar redes, se realizan cajas de lanzamiento en estos pozos como tambien manejo de aguas, tambien se vierten los lodos de la tuberia existente en estos pozos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, retro excavadora.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

15/09/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana con clima nublado y lluvioso terminando la jornada soleado, Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. Inicia el lanzamiento piloto para la perforacion horizontal dirigida entre los pozos de inspeccion PZ-2102 y PZ-1280, inicia la union termo fundida para la tuberia de 16" PVC de este tramo. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, excavadora, maquina de termofusion y maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

23/04/2026 Se da inicio de actividades a la 7 de la mañana. Clima: Nublado, lluvioso y terminando la jornada soleado. Se realiza manejo de aguas en los pozos de inspeccion PZ-1280 y PZ-2102 como tambien el retiro de lodos bentoniticos, entre estos dos pozos continua la perforacion horizontal dirigida con el lanzamiento del primer Reamer de 42", continua la union termo fundida de tuberia de 16" PN6. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, excavadora, maquina de termofusion y, maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

24/04/2026 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Soleado y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Continuando con la perforacion horizontal dirigida entre los pozos de inspección PZ-2102 y PZ-1280 con el lanzamiento del Reamer de 18" y el bureador, al igual se realiza el manejo de aguas en estos pozos de inspecion y retiro de lodos bentoniticos. Equipo y maquinaria: generador electrico, bomba sumergible, excavadora, maquina para perforacion horizontal.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

27/04/2026 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Director de obra, Residentes de obra, Profesional SST, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se realiza lanzamiento de tuberia PN6 de 16" entre los pozos de inspecion PZ-2102 y PZ-1280 al igual que manejo de aguas en estos pozos de inspecion como tambien el retiro de lodos bentoniticos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, excavadora, maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

28/04/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se realizan los apiques y caja de lanzamiento para detectar tuberias en la zona del lanzamiento piloto para la perforacion horizontal dirigido entre los pozos de inspecion PZ-1280 y PZ-238 e inicia la union termo fundida de tuberia de 16" PN6. Equipo y maquinaria: maquina para perforacion horizontal dirigida, maquina de termofusion, excavadora, generador electrico, bomba sumergible.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

29/04/2016 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Continua el manejo de aguas en pozos de inspeccion PI-1180 y PI-238, como tambien la perforacion horizontal dirigida con el lanzamiento piloto y el Reimer de 14", tambien se realiza la union termo fundida de tuberia de 16" PVC. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, retro excavadora, maquina para perforacion horizontal dirigida y maquina de termo fusion.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

30/04/2016 Se da inicio de actividades a la 7 am. Clima: Nublado, lluvioso y terminando el dia soleado. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, maestro de obra y ayudantes. Se realiza manejo de aguas en los pozos de inspeccion PI-1180 y PI-238 y continua la perforacion horizontal dirigida entre estos pozos con el lanzamiento del Reimer de 18" y el barredor. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, excavadora, maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01/05/2016 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Profesional SST, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudante de obra. Inicia la union termo fundida para tuberia de 16" PVC, manejo de aguas en los pozos de inspeccion PI-1180 y PI-238, se realiza picado de asfalto y orden en obra ademas de limpieza, excavaciones abiertas y acopio de materiales. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, maquina para termofusion, excavadora y maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

05/05/2016 Iniciamos actividades a las 7 am, clima: Nublado y soleado. personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la union termo fundida de tuberia PVC de 16" para el tramo entre pozos de inspeccion PI-1180 y PI-238, tambien se realiza la union del puller al tramo de tuberia, limpieza y manejo de aguas de estos pozos. maquinaria y equipo: Generador electrico, bomba sumergible, maquina de termo fusion.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

06/05/2016 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana. Clima: Nublado y Soleado. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Continua la perforacion horizontal dirigida entre los pozos de inspeccion PI-1280 y PI-238 con el lanzamiento del barredor, al igual se realiza manejo de aguas y retiro de lodos bentonitcos. Equipo y maquinaria: Excavadora de oruga, maquina para perforacion horizontal dirigida, generador electrico y bomba sumergible.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

07/05/2016 Se da inicio de actividad a las 7 am. Clima: Nublado y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra se realiza manejo de aguas con bomba sumergible en los pozos de inspeccion PI-1280 y PI-238 y se retiran los lodos bentoniticos. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, Retro excavadora de oruga.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

08/05/2016 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Seco y lluvioso. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la instalacion de tuberia de 16" PN6 con el lanzamiento de la tuberia entre los pozos de inspeccion PI-1280 y PI-238, se realiza manejo de aguas con bomba sumergible, al igual que el retiro de lodos bentoniticos. Equipos y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, retro excavadora de oruga y maquina para perforacion horizontal dirigida.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

11/05/2016 Se da inicio de actividades a las 7 am, Clima: Mañana nublado y tarde soleado. Personal en obra: Director de obra, Profesional SST, Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra; Se realiza excavacion mecanica para la construccion del pozo de inspeccion PI-1280 y manejo de aguas con bomba sumergible. Equipos y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, retro excavadora de oruga.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

13/05/2026 Inician actividades a las 7 am. clima: nublado y soleado en las tardes. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la excavacion mecanica para la construccion del pozo de de inspección PZ-1280, se realiza la verificacion con la topografia de los niveles al igual que las tuberias de entrada y salida de 16" y se instala la placa de fondo del pozo. Equipos y maquinaria: Generador electrica, bomba sumergible, excavadora de oruga.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

14/05/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am, clima: lluvias, nublado en las horas de la mañana y soleado en la tarde. Inicia la instalacion de cilindros prefabricados en concreto para pozo de inspeccion PZ-1280 y se ajusta el entivado metalico usado para la instalacion de la placa de fondo, tambien se realiza manejo de aguas en el PZ-1280 y PZ-138 con bomba sumergible. Equipo y maquinaria: Excavadora, generador electrico, y bomba sumergible.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

15/05/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: Presentamos lluvias en las horas de la mañana, nubosidad al medio dia y termina la jornada soleado. Personal en obra, Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la instalacion de cilindros prefabricados para el pozo de inspeccion PZ-1280, se instala el ejecutivo perimetral y se maneja el agua en los pozos de inspeccion PZ-1280 y PZ-138. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y Excavadora.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

16/05/2026 Iniciamos actividades a las 7 am. clima: inicia la jornada con lluvias y nubosidad hasta el medio dia. Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Profesional SST, inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. En el pozo de inspeccion PZ-1280 se realiza la instalacion de la tuberia y accesorios novafort de 10" para la camara de caida, al igual se vacia el concreto para el anclaje de estos accesorios. Equipo y maquinaria. Generador electrico, bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

20/05/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: nublado y soleado despues de medio dia. Personal en obra: Residente de interventoria, Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina el vaciado de concreto para los pretoques realizados a los accesorios de la camara de caida vaciado en el pozo de inspeccion PZ-1280, se realiza la instalacion del geotextil perimetral al pozo PZ-1280 en la zona de la camara de caida. Equipo y maquinaria. Generador electrico, bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

21/05/2026 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Nublado con lluvias hasta el medio dia. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Inican los llenos perimetrales al pozo de inspeccion PZ-1280 con material granular compactados mecanicamente y se realiza el retiro del entibado metalico. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

22/05/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana. Clima: Se presentan lluvias hasta el medio dia y nubosidad en las horas de la tarde. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la compactacion y llenos con material granular perimetralmente al pozo de inspeccion PZ-1280 y en el pozo de inspeccion PZ-238 se instalan los pasos mediante anclaje quimico. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, pulidora de mano, taladro y excavadora.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

25/05/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: lluvias con nubosidad en la mañana y soleado desde el medio dia. Personal en obra: Director de obra, Profesionas SST, Residente de obra, Inspector SST, Maestro de obra, Topografo y auxiliares de obra. Se realiza manejo de aguas con bomba sumergible en los pozos de inspeccion PZ-1280, PZ-238 y PZ-1190, e inicia excavacion de pozos de inspeccion PZ-210 y PZ-1290. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

26/05/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana. Clima: inicia la jornada con nubosidad y lluvias. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se instala el entivado metalico en el pozo de inspeccion PZ-2102 y continua la excavacion mecanica. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

27/06/25 Se da inicio de actividades a las 7 de la mañana. Clima: lluvias en la mañana con nubosidad y soleado terminando la jornada. Se realiza la verificacion de los niveles para la instalacion de la placa de fondo del pozo de inspeccion PZ-2102 y manejo de aguas en los pozos de inspeccion PZ-1280, PZ-1280 y PZ-2102 con bomba sumergible. Equipo y maquinaria: Bomba sumergible, generador electrico y excavadora tipo oruga.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

28/05/2026 Se da inicio de actividades a las 7 am. Clima: Nublado con lluvias en la mañana. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra; se realiza la instalacion de los cilindros perforados para el pozo de inspeccion PZ-2102 y manejo de aguas con bomba sumergible en los pozos de inspeccion PZ-1280, PZ-1280 y PZ-2102. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y maquinaria excavadora tipo oruga.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

29/05/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana. Clima: Nublado y soleado despues del medio dia. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Termina la instalacion de los cilindros prefabricados del pozo de inspeccion PZ-2102 e inicia la excavacion de la manera hidraulica de llegada al pozo PZ1280. Maquinaria y equipo: generador electrico, bomba sumergible y excavadora tipo oruga.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01/06/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana, clima: Presentamos lluvias con nubosidad. Personal en obra: Director de obra, Profesional SST, Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se realiza la excavacion mecanica para la manga hidraulica de llegada al pozo de inspeccion P2-2102, manejo de aguas con bomba sumergible. Equipo y Maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible y excavado de oruga.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

02/06/2026 Se da inicio de actividades a las 7 de la mañana. Clima: Se presentan lluvias en la mañana y nubosidad durante el mismo periodo. Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra SST, Topografo, ayudantes y maestro de obra. En el pozo de inspeccion P2-2102 y P1-1280 se instala el geotextil perimetral ayudado con amarres metalicos. Maquinaria y equipo. Excavadora de oruga, generador electrico, bomba sumergible y Pulidora

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

03/06/2026 Se da inicio de actividades a las 7 Am. Clima: Se presentan lluvias iniciando la jornada y nubosidad hasta el medio dia. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Inicia el retiro del entubado metalico del pozo de inspeccion P2-2102 a medida que se avanza con los llenos en material granular al rededor del mismo comparados mecanicamente Maquinaria y equipo: Generador electrico, apisonador mecanico "Tipo canguro", Pulidora, taladro y excavadora de oruga.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

04/06/2026 Iniciamos actividades a las 7 de la mañana. Clima: La jornada empieza con lluvias leves y nubosidad. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. Se realiza manejo de aguas con bomba sumergible en los pozos de inspeccion P2-1180 y P2-2102 al igual que en el P2-338. Equipo y maquinaria: Generador electrico, Bomba sumergible y excavadora.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

05/06/2026 Se da inicio de actividades a las 7 de la mañana. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se realiza manejo de aguas en el pozo de inspeccion PZ-238 con bomba sumergible e instalacion de obturadores mecanicos en las tuberias de llegada para realizar la instalacion de los pases de este pozo con anclaje epoxico. Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, pulidora de mano, taladro y excavadora

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

09/06/2026 Iniciamos actividades a las 7 am. Clima: Nublado y seco. Personal en obra: Director de obra, Profesional SST, Residente de obra, Inspector SST, Topografo, maestro y ayudantes de obra. Se realiza la construccion de las cañuelas en los pozos de inspeccion PZ-1280, PZ-1290, PZ-2102 y PZ-238, como tambien se remataban internamente y se colocan las placas superiores (PZ-1290, PZ-1280 y PZ-2102) Equipo y maquinaria: Generador electrico, bomba sumergible, pulidora y taladro

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10/06/2026 Se da inicio de actividades a las 7 de la mañana. Clima: Nublado hasta el medio dia y seco en el resto de la tarde. Personal en obra: Residente de obra, Inspector SST, maestro de obra, Topografo y ayudantes de obra. Se vacia el concreto premezclado en los vacios generados en la salida y entrada de la tuberia de 16" en los pozos de inspeccion al momento de realizar la perforacion horizontal dirigida, tambien se realizan los reparaciones a los predios del proyecto "en el recorrido, a lo largo del proyecto". Equipo y maquinaria: Generador electrico, pulidora, taladro, mixer con concreto y excavadora.

Al finalizar la jornada, la interventoria realizó un recorrido de verificación en conjunto con el personal de obra, con el fin de revisar las actividades ejecutadas y el estado final de las obras desarrolladas dentro del alcance del proyecto. Durante la inspección se evaluaron las condiciones generales de terminación y se identificaron aspectos puntuales para el cierre definitivo.

Asimismo, se acordó gestionar la programación de una visita con la supervisión, orientada a efectuar el recibo de recibo de la obra y la suscripción formal del proyecto.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	**FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN PROYECTOS**	**CODIGO:**	**AL-F035**
		FECHA:	**01**
		VERSIÓN:	**MARZO 2020**
		OPERACIÓN	

CONTRATO DE OBRA No. 071


OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

PERIODO: MAYO

ESTADO DEL TIEMPO	HORAS DIAS DEL MES																															HORAS TOTALES
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
SECO / SOLEADO									6	0	4	4	4	1	8	5	0	1	8	4	4	8	5	0	4	4	2	3	4	3				66
NUBLADO									5	0	4	4	4	3	3	6	0	3	3	4	4	3	0	0	3	2	2	3	4	3				52
LLUVIOSO									2	0	0	0	0	4	3	5	0	4	1	8	0	3	5	0	1	2	4	2	0	3				28

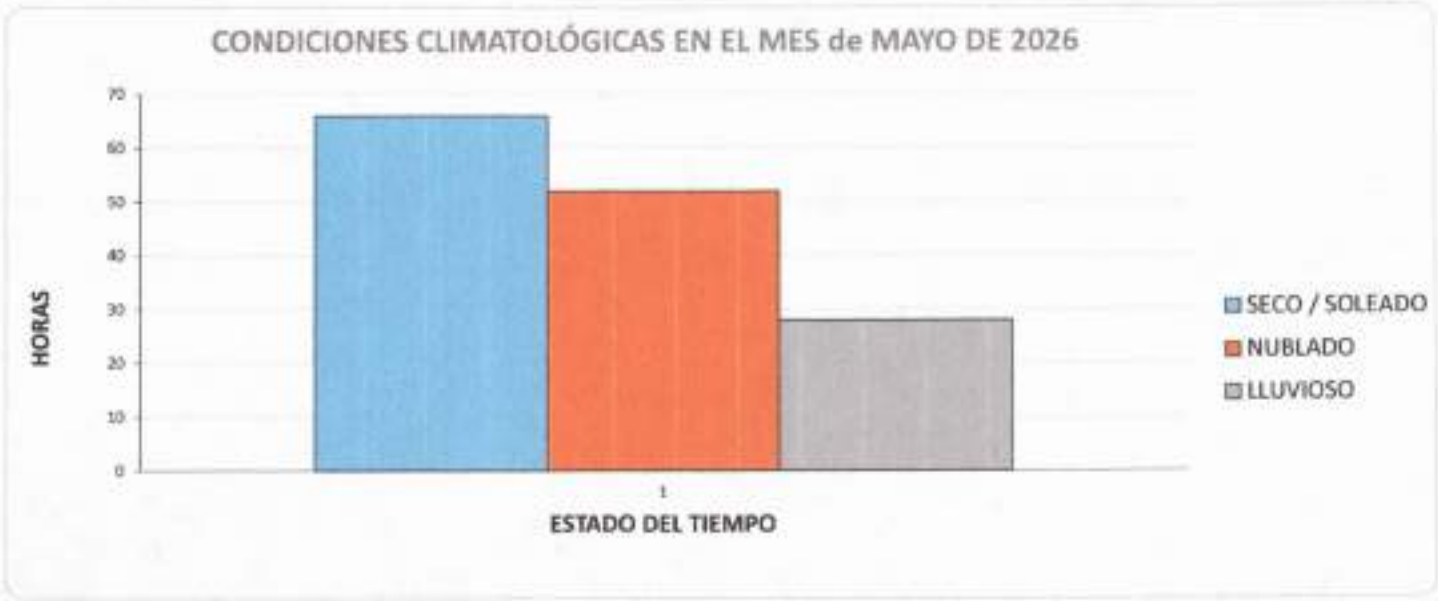

ELABORÓ:

SEBASTIAN BOHORQUEZ
Residente de Interventoría

	FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN PROYECTOS	CODIGO:	AL-F035
		FECHA:	01
		VERSIÓN:	MARZO 2020
		OPERACIÓN	

CONTRATO DE OBRA No. 071

OBJETO: OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

PERIODO: JUNIO

ESTADO DEL TIEMPO	HORAS DIAS DEL MES																															HORAS TOTALES
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SECO / SOLEADO	1	1	1	3	1	S	D	F	4	4																							15
NUBLADO	3	4	3	2	3	S	D	F	4	4																							22
LLUVIOSO	4	3	4	4	5	S	D	F	3	3																							20



ELABORÓ:

SEBASTIAN BOHORQUEZ
Residente de Interventoría

GEAGOR INGENIERIA SAS

CONTRATO OBRA
071 DE 2026

OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
072 DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 1 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DE ABRIL

VERSIÓN 1

TOCANCIPÁ, MAYO 2026

Control de revisiones y modificaciones

Versión	Fecha	Descripción Modificación
0	05/05/2026	Emisión Inicial

Emisión, Revisión y Aprobación


	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Karen Lizeth Herrera López	Profesional SST de Interventoría	
Revisó	Ing. Sebastián Bohórquez	Residente de Interventoría	
Aprobó	Ing. Ivan Dario Hernandez	Director de Interventoría	

Tabla de contenido

Contenido

1. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 4
1.1. Gestión de correspondencia 4
1.2. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes 4
1.3. Capacitación y entrenamiento 4
1.4. Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el periodo 5
1.5. Subprogramas 6
1.5.1. Elementos de protección personal 6
1.5.2. Punto de trabajo y centro de acopio 6
1.5.3. Manejo de sustancias químicas 6
1.5.4. Manejo de maquinaria/equipos y vehículos 6
1.5.5. Inspecciones de seguridad 7
1.6. Plan de emergencias y contingencias 7
1.7. Cronograma de actividades 7
2. Hallazgos en Seguridad y Salud en el Trabajo 8
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8
4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
4.1. Gestión de correspondencia. 9
4.2. Estándares mínimos. 9
4.3. Política de SG-SST. 9
4.4. Objetivos e Indicadores 9
4.5. Reglamento de HYS 9
4.6. Plan de Emergencias y MEDEVAC. 10
4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10

1. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

El Contratista de acuerdo con su Plan de Trabajo Detallado a la fecha entregó el informe SST del periodo comprendido entre el 07 de Abril de 2026 y el 07 de Mayo de 2026, el cual fue revisado y aprobado por Interventoria.



1.1. Gestión de correspondencia

El contratista a la fecha informe, presenta soportes de documentación de maquinaria y equipos, parafiscales de colaboradores. El informe mensual una vez revisado la interventoría emite aprobación.

1.2. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes

Tabla 1. Relación personal contratista en obra

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Operativos	18
Administrativos	2
Retiro de antiguos	0
Ingreso – retiro	0
TOTAL DE PERSONAL	20

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.3. Capacitación y entrenamiento

A la fecha del corte del presente informe el contratista realizó socializaciones del personal antiguo, personal nuevo y subcontratistas cumpliendo con lo determinado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, se realizaron charlas de seguridad, capacitaciones de temas SST, y ambientales.





Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo

TEMA	ACTIVIDAD	CAPACITADOR	ASISTENTES
Se realizan de acuerdo al ingreso de los colaboradores	Inducción	Inspectora SST Carolina Camargo	20
• Pausas Activas • Divulgación del código de colores para la recolección de residuos. • Sensibilización actores viales vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. • Divulgación del plan de emergencias y el MEDEVAC • Capacitación en riesgo	Charlas y capacitaciones	Inspectora SST Carolina Camargo	18

TEMA	ACTIVIDAD	CAPACITADOR	ASISTENTES
Se realizan de acuerdo al ingreso de los colaboradores	Inducción	Inspectora SST Carolina Camargo	20
ergonómico y biomecánico • Identificación de peligros y control de riesgos. • Capacitaciones en condiciones y actos inseguros. • Capacitación en prevención de caídas al mismo nivel • Capacitación en estilos de vida saludable • Capacitación en uso, mantenimiento y reposición de EPP • Inducción de personal			

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.4. Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el período

El contratista presentó evidencia correspondiente a los exámenes médicos ocupacionales de ingreso para personal nuevo, y los exámenes médicos ocupacionales periódicos junto con las recomendaciones médicas en el cual los trabajadores del presente periodo son aptos para desempeñar su labor.

A continuación, se relacionan los exámenes realizados para el periodo, informe 1.

Tabla 2. Examen médico ocupacional contratista

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	N. DE TRABAJADORES
Ingreso	0

Periódico	0
Retiro	0

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.5. Subprogramas

1.5.1. Elementos de protección personal

Se evidencian actas y soportes fotográficos de entrega de elementos de protección personal como anexo para el informe No. 01, dando cumplimiento a lo solicitado.



1.5.2. Punto de trabajo y centro de acopio

El contratista cuenta con campamento en obra acondicionado para labores administrativas y operativas, así mismo funciona como centro de acopio de material, maquinaria y equipos, también tienen acceso a agua potable, punto ecológico, dos baterías sanitarias uno para mujeres y uno para los hombres, a los cuales se les realiza lavado dos veces por semana.

1.5.3. Manejo de sustancias químicas

El contratista cuenta con acopio de sustancias químicas, se encuentra con su respectiva rotulación SGA, ficha técnica y matriz de compatibilidad. Entre aquellas sustancias que se encuentran son:

- Gasolina
- Desinfectante

- Jabón de manos
- Grasa
- Impermeabilizante
- Acelerante

1.5.4. Manejo de maquinaria/equipos y vehículos



En este periodo el contratista presentó soportes de maquinaria;

- Certificado de Operador
- Declaración de importación.
- Tarjeta de registro de maquinaria.
- Cronograma de mantenimiento
- Tarjeta de propiedad de Retroexcavadora
- Tarjeta de conducción y cédula del operario

De la misma manera, se relaciona que realizaron inspecciones preoperacionales referidos para el contrato;

- Retroexcavadora (Tipo Oruga)
- Herramientas menores
- Demoledor
- Compactador tipo canguro
- Generador de energía
- Bomba sumergible
- Motosierra
- Equipo de termofusión
- Compresor

1.5.5. Inspecciones de seguridad

Para este periodo el contratista realizó las siguientes inspecciones:

- Inspección de Botiquín Tipo A **SST-FT-010 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES**
- Inspección de Extintor Multipropósito **SST-FT-011 INSPECCION DE EXTINTOR**

1.6. Plan de emergencias y contingencias

El contratista presentó el **SST-PE-001 PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**, ajustado a las actividades que se realizan en la ejecución del proyecto. El contratista cumple con las acciones y procedimientos a seguir en caso de un desastre o situación de riesgo.

1.7. Cronograma de actividades

El contratista cumple los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado para el contrato de obra, se relaciona **SST-PLN-E.4.2.3 PLAN HSEQ.docx (1)** Evaluación y seguimiento.
En el periodo en que se presenta el informe, no se presentaron cero (0) casos de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, así mismo no se presentaron casos de ausentismo por causa médica en el periodo del presente informe.

Tabla 3. Indicadores de gestión aplicables al Contratista

NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	N° total de accidentes de trabajo en el periodo / total horas hombre trabajadas en el periodo * 240000	0%
Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	N° días de trabajo perdidos por de accidentes de trabajo + n° de días cargados en el periodo / horas hombres trabajadas en el periodo * 240000	0%
Ausentismo	N° días de ausencia con incapacidad laboral y común / n° de días de trabajo programados * 100	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	N° de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / promedio total de trabajadores en el periodo * 10	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	N° de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / promedio total de	0%

NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN	RESULTADO
	trabajadores * 10	
Mortalidad de los accidentes laborales	N° de at mortales en el periodo / total de at en el periodo *100	0%

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

2. Hallazgos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Por parte de interventoría no se evidenciaron hallazgos para notificar al contratista.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se han realizado mesas de trabajo en conjunto con el objetivo de aclarar las observaciones requeridas en las entregas realizadas.
- Reuniones de revisión documental y aclaración de inquietudes.
- Durante el periodo del presente informe que va del 07 de Abril del 2026 al 07 de Mayo del 2026 no se presentaron accidentes laborales, enfermedad laboral y ningún ausentismo reportado.
- Se recomienda y solicita al contratista de obra realizar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los planes establecidos para la ejecución de actividades relacionadas al contrato de obra.
- Se recomienda y continuar velar por el cumplimiento de implementación del Plan de Manejo de Trafico (señalización, delimitaciones, auxiliares de tráfico en caso de movimiento de maquinaria)

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. Gestión de correspondencia.

En este periodo no se realizaron envíos de oficio al contratista, realizando el desarrollo normal de las actividades, sin novedades mayores.

4.2. Estándares mínimos.

La interventoría revisó certificación generada por parte de la ARL del contratista, la cual evidencia la autoevaluación de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019 que evalúan el criterio de cumplimiento y efectividad de las políticas, procedimientos y practicas relacionadas con la seguridad laboral identificando áreas de mejora y recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

4.3. Política de SG-SST.

La interventoría revisó presentación política de seguridad y salud en el trabajo (SST-POL-E.2.1.1), por parte del contratista la cual se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente.

4.4. Objetivos e Indicadores

Entrega de Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) e Indicadores

El contratista hace entrega oficial a Interventoría de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (SST-OBJ-E.2.2.1) y los indicadores correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el proyecto.

Los objetivos SST e indicadores entregados incluyen:

- Objetivos específicos y medibles para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Indicadores clave de desempeño para evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Metas y plazos para el logro de los objetivos.

La entrega de estos objetivos e indicadores permitirá a Interventoría realizar un seguimiento efectivo del desempeño del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tomar medidas correctivas según sea necesario.

4.5. Reglamento de HYS

La interventoría revisa el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (SST REG-E.4.2.3), presentado por el contratista el cual ratifica el compromiso y el cumplimiento de las disposiciones legales para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

4.6. Plan de Emergencias y MEDEVAC.

La Interventoría recibe del contratista el Plan de Emergencias, (SST-PLN-E.5.1.1) documento que detalla las medidas y procedimientos para responder ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto.

El Plan de Emergencias incluye:

- Identificación de los riesgos y amenazas potenciales.
- Procedimientos de respuesta y mitigación para cada tipo de emergencia.
- Roles y responsabilidades del personal en caso de emergencia.
- Información de contacto para las brigadas de emergencia y servicios de socorro.

4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría deja constancia de haber recibido y revisado los documentos anteriormente enunciados correspondientes a los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presentados por el contratista. Dichos documentos cumplen con los requisitos y normativas establecidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y terceros involucrados en el proyecto.

La Interventoría considera que los documentos presentados son satisfactorios y se ajustan a los estándares mínimos exigidos. Sin embargo, se reserva el derecho de realizar seguimiento y verificación del cumplimiento efectivo de los mismos durante la ejecución del proyecto.

Se destaca la importancia de mantener actualizados y disponibles dichos documentos, así como de cumplir con las normativas y regulaciones aplicables en materia de SST.

GEAGOR INGENIERIA SAS

CONTRATO OBRA
071 DE 2026

OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
072 DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COSTADO ORIENTAL VÍA NACIONAL CARRERA CUARTA DEL SECTOR LA HORMIGA - LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 2 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DE MAYO

VERSIÓN 1

TOCANCIPÁ, JUNIO 2026

Control de revisiones y modificaciones

Versión	Fecha	Descripción Modificación
0	05/05/2026	Emisión Inicial

Emisión, Revisión y Aprobación


	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Karen Lizeth Herrera López	Profesional SST de Interventoría	
Revisó	Ing. Sebastián Bohórquez	Residente de Interventoría	
Aprobó	Ing. Ivan Dario Hernandez	Director de Interventoría	

Tabla de contenido

Contenido

1. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 4

1.1. Gestión de correspondencia 4

1.2. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes 4

1.3. Capacitación y entrenamiento 4

1.4. Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el período 5

1.5. Subprogramas 6

1.5.1. Elementos de protección personal 6

1.5.2. Punto de trabajo y centro de acopio 6

1.5.3. Manejo de sustancias químicas 6

1.5.4. Manejo de maquinaria/equipos y vehículos 6

1.5.5. Inspecciones de seguridad 7

1.6. Plan de emergencias y contingencias 7

1.7. Cronograma de actividades 7

2. Hallazgos en Seguridad y Salud en el Trabajo 8

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9

4.1. Gestión de correspondencia. 9

4.2. Estándares mínimos. 9

4.3. Política de SG-SST. 9

4.4. Objetivos e Indicadores 9

4.5. Reglamento de HYS 9

4.6. Plan de Emergencias y MEDEVAC. 10

4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10

1. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

El Contratista de acuerdo con su Plan de Trabajo Detallado a la fecha entregó el informe SST del periodo comprendido entre el 08 de Mayo de 2026 y el 08 de Junio de 2026, el cual fue revisado y aprobado por Interventoria.



1.1. Gestión de correspondencia

El contratista a la fecha informe, presenta soportes de documentación de maquinaria y equipos, parafiscales de colaboradores. El informe mensual una vez revisado la interventoría emite aprobación.

1.2. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes

Tabla 1. Relación personal contratista en obra

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Operativos	16
Administrativos	2
Retiro de antiguos	0

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Ingreso – retiro	0
TOTAL DE PERSONAL	20

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.3. Capacitación y entrenamiento

A la fecha del corte del presente informe el contratista realizó socializaciones del personal antiguo, personal nuevo y subcontratistas cumpliendo con lo determinado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, se realizaron charlas de seguridad, capacitaciones de temas SST, y ambientales.









Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo

TEMA	ACTIVIDAD	CAPACITADOR	ASISTENTES
Se realizan de acuerdo al ingreso de los colaboradores	Inducción	Inspectora SST Carolina Camargo	18
• Capacitación en Orden y aseo • Capacitación en seguridad vial y Plan estratégico de seguridad vial "Hábitos y comportamientos seguros en la via". • Capacitación en riesgo publico • Capacitación en trabajo en equipo • Divulgación de protocolo para la identificación y prevención de acoso laboral. • Divulgación en política de prevención de violencias basadas en género, acosos laboral acosos sexuales y discriminación laboral • Capacitación en adecuado mantenimiento y cuidado de equipos y herramientas de trabajo • Socialización cambio de ARL	Charlas y capacitaciones	Inspectora SST Carolina Camargo	18

TEMA	ACTIVIDAD	CAPACITADOR	ASISTENTES
Se realizan de acuerdo al ingreso de los colaboradores	Inducción	Inspectora SST Carolina Camargo	18
• Capacitación en autocuidado • Pausas activas			

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.4. Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el periodo

El contratista presentó evidencia correspondiente a los exámenes médicos ocupacionales de ingreso para personal nuevo, y los exámenes médicos ocupacionales periódicos junto con las recomendaciones médicas en el cual los trabajadores del presente periodo son aptos para desempeñar su labor.

A continuación, se relacionan los exámenes realizados para el periodo, informe 2.

Tabla 2. Examen médico ocupacional contratista

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	N. DE TRABAJADORES
Ingreso	0
Periódico	0
Retiro	0

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

1.5. Subprogramas

1.5.1. Elementos de protección personal

Se evidencian actas y soportes fotográficos de entrega de elementos de protección personal como anexo para el informe No. 02, dando cumplimiento a lo solicitado.





1.5.2. Punto de trabajo y centro de acopio

El contratista cuenta con campamento en obra acondicionado para labores administrativas y operativas, así mismo funciona como centro de acopio de material, maquinaria y equipos, también tienen acceso a agua potable, punto ecológico, dos baterías sanitarias uno para mujeres y uno para los hombres, a los cuales se les realiza lavado dos veces por semana.

1.5.3. Manejo de sustancias químicas

El contratista cuenta con acopio de sustancias químicas, se encuentra con su respectiva rotulación SGA, ficha técnica y matriz de compatibilidad. Entre aquellas sustancias que se encuentran son:

- Gasolina
- Desinfectante
- Jabón de manos
- Grasa

- Impermeabilizante
- Acelerante

1.5.4. Manejo de maquinaria/equipos y vehículos



En este periodo el contratista presentó soportes de maquinaria;

- Certificado de Operador
- Declaración de importación.
- Tarjeta de registro de maquinaria.
- Cronograma de mantenimiento
- Tarjeta de propiedad de Retroexcavadora
- Tarjeta de conducción y cédula del operario

De la misma manera, se relaciona que realizaron inspecciones preoperacionales referidos para el contrato;

- Retroexcavadora (Tipo Oruga)
- Retroexcavadora (Tipo Pajarita)
- Herramientas menores
- Demoledor
- Compactador tipo canguro

- Generador de energía
- Bomba sumergible
- Motosierra
- Equipo de termofusión
- Compresor

1.5.5. Inspecciones de seguridad

Para este periodo el contratista realizó las siguientes inspecciones:

- Inspección de Botiquín Tipo A **SST-FT-010 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES**
- Inspección de Extintor Multipropósito **SST-FT-011 INSPECCION DE EXTINTOR**

1.6. Plan de emergencias y contingencias

El contratista presentó el **SST-PE-001 PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**, ajustado a las actividades que se realizan en la ejecución del proyecto. El contratista cumple con las acciones y procedimientos a seguir en caso de un desastre o situación de riesgo.

1.7. Cronograma de actividades

El contratista cumple los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado para el contrato de obra, se relaciona **SST-PLN-E.4.2.3 PLAN HSEQ.docx (1)** Evaluación y seguimiento.
En el periodo en que se presenta el informe, no se presentaron cero (0) casos de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, así mismo no se presentaron casos de ausentismo por causa médica en el periodo del presente informe.

Tabla 3. Indicadores de gestión aplicables al Contratista

NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	N° total de accidentes de trabajo en el periodo / total horas hombre trabajadas en el periodo * 240000	0%
Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	N° días de trabajo perdidos por de accidentes de trabajo + n° de días cargados en el periodo / horas hombres trabajadas en el periodo * 240000	0%
Ausentismo	N° días de ausencia con incapacidad laboral y común / n° de días de trabajo programados * 100	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	N° de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / promedio	0%

NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN	RESULTADO
	total de trabajadores en el periodo * 10	
Incidencia de la enfermedad laboral	N° de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / promedio total de trabajadores * 10	0%
Mortalidad de los accidentes laborales	N° de at mortales en el periodo / total de at en el periodo *100	0%

Fuente: Elaboración GEAGOR S.A.S

2. Hallazgos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Por parte de interventoría no se evidenciaron hallazgos para notificar al contratista.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se han realizado mesas de trabajo en conjunto con el objetivo de aclarar las observaciones requeridas en las entregas realizadas.
- Reuniones de revisión documental y aclaración de inquietudes.
- Durante el periodo del presente informe que va del 08 de Mayo del 2026 al 08 de Junio del 2026 no se presentaron accidentes laborales, enfermedad laboral y ningún ausentismo reportado.
- Se recomienda y solicita al contratista de obra realizar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los planes establecidos para la ejecución de actividades relacionadas al contrato de obra.
- Se recomienda y continuar velar por el cumplimiento de implementación del Plan de Manejo de Trafico (señalización, delimitaciones, auxiliares de tráfico en caso de movimiento de maquinaria)

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CUANTO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. Gestión de correspondencia.

En este periodo no se realizaron envíos de oficio al contratista, realizando el desarrollo normal de las actividades, sin novedades mayores.

4.2. Estándares mínimos.

La interventoría revisó certificación generada por parte de la ARL del contratista, la cual evidencia la autoevaluación de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019 que evalúan el criterio de cumplimiento y efectividad de las políticas, procedimientos y practicas relacionadas con la seguridad laboral identificando áreas de mejora y recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

4.3. Política de SG-SST.

La interventoría revisó presentación política de seguridad y salud en el trabajo (SST-POL-E.2.1.1), por parte del contratista la cual se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente.

4.4. Objetivos e Indicadores

Entrega de Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) e Indicadores

El contratista hace entrega oficial a Interventoría de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (SST-OBJ-E.2.2.1) y los indicadores correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el proyecto.

Los objetivos SST e indicadores entregados incluyen:

- Objetivos específicos y medibles para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Indicadores clave de desempeño para evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Metas y plazos para el logro de los objetivos.

La entrega de estos objetivos e indicadores permitirá a Interventoría realizar un seguimiento efectivo del desempeño del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tomar medidas correctivas según sea necesario.

4.5. Reglamento de HYS

La interventoría revisa el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (SST REG-E.4.2.3), presentado por el contratista el cual ratifica el compromiso y el cumplimiento de las disposiciones legales para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

4.6. Plan de Emergencias y MEDEVAC.

La Interventoría recibe del contratista el Plan de Emergencias, (SST-PLN-E.5.1.1) documento que detalla las medidas y procedimientos para responder ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto.

El Plan de Emergencias incluye:

- Identificación de los riesgos y amenazas potenciales.
- Procedimientos de respuesta y mitigación para cada tipo de emergencia.
- Roles y responsabilidades del personal en caso de emergencia.
- Información de contacto para las brigadas de emergencia y servicios de socorro.

4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría deja constancia de haber recibido y revisado los documentos anteriormente enunciados correspondientes a los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presentados por el contratista. Dichos documentos cumplen con los requisitos y normativas establecidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y terceros involucrados en el proyecto.

La Interventoría considera que los documentos presentados son satisfactorios y se ajustan a los estándares mínimos exigidos. Sin embargo, se reserva el derecho de realizar seguimiento y verificación del cumplimiento efectivo de los mismos durante la ejecución del proyecto.

Se destaca la importancia de mantener actualizados y disponibles dichos documentos, así como de cumplir con las normativas y regulaciones aplicables en materia de SST.

