INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS

CONTRATO 1922 DE 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

INFORME MENSUAL No. 3

INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, BARRANQUILLA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1 Localización de los proyectos 9
2.1.1 Lote 1 9
2.1.3 Lote 3 20
2.1.4 Lote 4 24
2.1.5 Lote 5 27
2.1.6 Lote 6 30
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 31
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 34
2.4. Características técnicas del proyecto. 34
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 38
3.1 Información General del Contrato de Consultoría 38
3.1.1 Lote 1 38
3.1.2 Lote 2 39
3.1.3 Lote 3 40
3.1.3 Lote 4 41
3.1.5 Lote 5 42
3.1.6 Lote 6 43
3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes 44
3.2.1 Lote 1 44
3.2.2 Lote 2 45
3.2.3 Lote 3 46
3.2.4 Lote 4 49
3.2.5 Lote 5 50
3.2.6 Lote 6 52
3.3. Seguimiento Ítems no previstos 53
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 53
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA 56
4.1. Informes Semanales 56

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría 58
4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría. 62
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría 74
4.5. Estado general del Tiempo 80
4.6. Resumen Ensayos de laboratorio 84
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría 87
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 99
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 99
4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 99
4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones 99
4.9.3. Actas de comité y reunión 99
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 100
5.1. Información general del contrato 100
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 102
5.3. Informes de especialistas y profesionales 102
5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 102
5.5. Informe matriz de riesgos. 102
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 102
6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 103
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 103
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 104
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 105
6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría 106
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 107
6.6. Otros documentos seguimiento mensual 107
6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 107
6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 108
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 109
8. ANEXOS 111

8.1 ANEXO 1 RELACION DE CORRESPONDENCIA.....111

8.2 ANEXO 2. INFORMES SEMANALES.....122

8.3 ANEXO 3. INFORME DEL DIRECTOR DE OBRA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR. 122

8.4 ANEXO 4. PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO 122

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon.....10
Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón.....10
Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira.....11
Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira.....12
Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa.....13
Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa.....13
Figura 7 Localización del Hito 4 Miritί- Parana.....14
Figura 8 Localización del Hito 4 Miritί- Parana.....14
Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria.....15
Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria.....15
Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe 16
Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe 17
Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....18
Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....18
Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual. 19
Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual. 20
Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana.....21
Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana.....21
Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal. 22
Figura 20 Localización del Hito 3 Papanahua.....23
Figura 21 Localización del Hito 3 Papanahua.....23
Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía 24
Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía 25
Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá.....26
Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá.....26
Figura 26 Localización del Hito 1 Solita 27
Figura 27 Localización del Hito 1 Solita 28
Figura 28 Localización del Hito 2 Solano.....29
Figura 29 Localización del Hito 2 Solano.....29
Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño.....30

Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño.....31
Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1.....68
Figura 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 2.....69
Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 5.....72
Figura 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 6.....73
Figura 36 Informe financiero lote 1. 74
Figura 37. Informe financiero lote 2. 75
Figura 38 Informe financiero lote 3. 76
Figura 39 Informe financiero lote 5. 78
Figura 40 Informe financiero lote 6. 79
Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.....87
Figura 42 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.....89

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional.....32
Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025. 38
Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025. 39
Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025. 40
Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025. 41
Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025 42
Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025. 43
Tabla 8 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 1. 56
Tabla 9 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 2. 56
Tabla 10 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 3. 56
Tabla 11 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 4. 57
Tabla 12 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 5. 57
Tabla 13 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 6. 57
Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1.....62
Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2. 63
Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3. 64
Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4. 65
Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5. 66
Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6. 67

Tabla 20 Reuniones o comités de obra periodo febrero. 99
Tabla 21 Información del contrato de Interventoría. 100
Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS 101
Table 23 Relación equipos de la Interventoría. 101
Tabla 24 listado informes semanales para periodo febrero. Interventoría 110

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1. 111
Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1. 112
Anexo 3 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2. 113
Anexo 4 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2. 114
Anexo 5 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3. 115
Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3. 116
Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4. 117
Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4. 118
Anexo 9 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5. 119
Anexo 10 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5. 120
Anexo 11 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6. 120
Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6. 120

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra la estructuración de proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, incluyendo los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero. En desarrollo de dichas funciones, el INVIAS adelantó los procesos CMA-DTE-SPI-044-2025 y CMA-DTE-SPI-046-2025.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, incorpora dentro de su gestión el proyecto denominado **"Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS"**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y la operatividad de la infraestructura fluvial asociada a los muelles ubicados en la red navegable a cargo de la Entidad.

El proyecto objeto de interventoría corresponde a los **"Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6"**, mediante el cual se contempla la ejecución de estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de **Fase II – Factibilidad**, y para el Lote 6 a nivel de **Fase III – Estudios y Diseños Definitivos**.

Por lo que el Instituto Nacional de Vías suscribió con **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.)** el contrato número 1922 DE 2025, cuyo objeto es la "**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"**

Y se suscribieron los siguientes contratos cuyo objeto son:

- El contrato 1914 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE**

LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1."

- El contrato 1915 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO NAVEGABILIDAD,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2."**

- El contrato 1892 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO VÍA FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3."**

- El contrato 1882 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **TORRES Y ASOCIADOS,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4."**

- El contrato 1957 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5".**

- El contrato 1968 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.".**

Las órdenes de inicio de los contratos de Consultoría se suscribieron:

- Lote No 1 el 16 de diciembre de 2025.
- Lote No 2 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 3 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 4 el 19 de diciembre de 2025
- Lote No 5 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 6 el 16 de diciembre de 2025

La orden de inicio del contrato de Interventoría se suscribió el 16 de diciembre del 2025.

Se realizó reunión presencial en la oficina de Invias en la ciudad de Bogotá el día 16 de diciembre del 2025.

El informe mensual No. 3 de Interventoría, corresponde al período comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026. En este informe se presenta el alcance del proyecto, la información básica de los contratos de Consultoría e Interventoría y las principales actividades ejecutadas por la consultoría y la Interventoría durante este período.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los proyectos.

2.1.1 Lote 1

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la siguiente localización de los sus respectivos hitos:

HITO 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARÓN

El caserío de Pucarón se localiza al suroccidente del municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, en inmediaciones de los sectores de San Luis y Matapí. El área objeto de intervención corresponde a un punto estratégico del corredor fluvial del río Vaupés, el cual constituye un eje fundamental para el transporte de pasajeros, carga general y víveres desde el interior del país hacia el municipio de Mitú.

En este sector, la presencia de raudales genera una discontinuidad en la navegabilidad del tramo comprendido entre Calamar y Mitú, lo que obliga a la implementación de un trasbordo terrestre de aproximadamente 5,45 km. Dicho trasbordo se realiza a través de dos tramos viales: i) un tramo pavimentado en

concreto, en adecuado estado de servicio, con una longitud aproximada de 2,40 km, que conecta con los muelles de Yuruparí; y ii) un tramo carreteable no pavimentado, de aproximadamente 2,45 km, que conduce al sector de Piraybaroca, desde donde se restablece la continuidad del transporte fluvial hacia el municipio de Mitú.
Adicionalmente, este punto presenta una alta importancia funcional y social, al constituirse en un nodo de conectividad utilizado por comunidades indígenas para el acceso a servicios de educación y salud

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pucarón:

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon



Fuente: Google earth

Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón



Fuente: Google earth


El HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA

Taraira es un municipio situado en el extremo suroriente del departamento del Vaupés, en Colombia. Se localiza en la frontera con Brasil al oriente y limita al sur y occidente con el departamento del Amazonas. Forma parte de la cuenca baja del río Apaporis, en una zona de alta riqueza hídrica y selvática.

El área municipal es de 6.619 Km², equivalente al 12,23% del área departamental, y limita por el norte con el corregimiento departamental de Pacoa y la República del Brásil (municipio de Japurá); por el oriente, con la República del Brasil (municipio de Japurá); por el sur y el occidente, con el departamento del Amazonas (corregimiento departamental de La Pedrera).

En las siguientes figura se presenta la localización general de Taraira:

Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira

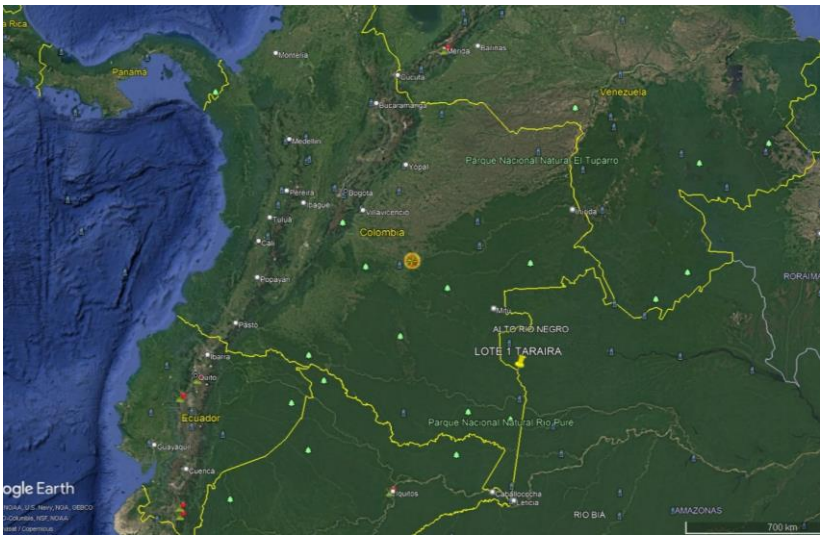

Fuente: Google earth

Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth


EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PACOA

Pacoa es una de las tres áreas no municipalizadas del departamento de Vaupés en Colombia. Su cabecera municipal es Buenos Aires de Lérida, se encuentra a una altitud de 200 m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 14.108 km² y tiene una población de 5709 habitantes. En este se encuentra el raudal de Jirijirimo, Río Apaporis.

Limita al norte con el corregimiento de Papunagua, partiendo del raudal Sabana; sobre el río Paraná Pichuna, siguiendo en línea recta en dirección noroeste hasta encontrar los nacimientos del caño Siringa; luego por el este aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Aceite, punto de concurso del departamento del Guaviare y el municipio de Carurú y el corregimiento de Papunagua.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pacoa

Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa

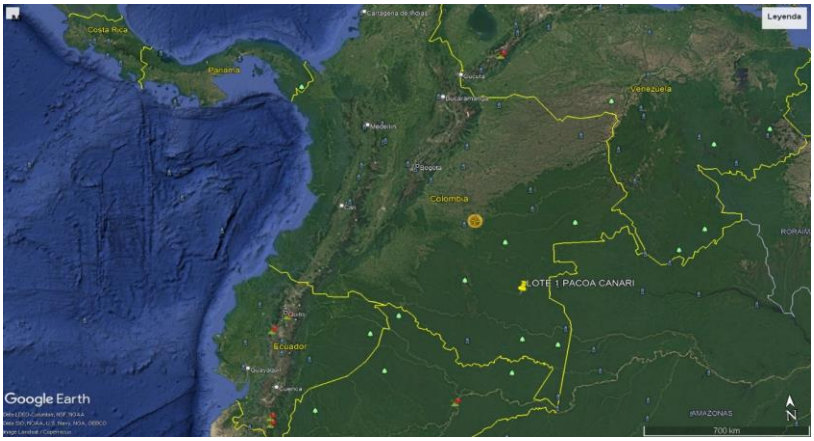

Fuente: Google earth

Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

EL HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ

Localizado en Miriti-Paraná es un área no municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas. Limita al norte con el departamento del Caquetá, el área no municipalizada de La Victoria y el departamento de Vaupés;

al este con el área no municipalizada de La Pedrera y al sur y oeste con el área no municipalizada de Puerto Santander.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Mirití Parana:

Figura 7 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

Figura 8 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

El HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE LA VICTORIA

La Victoria es un área no municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Miritíi-Paraná. Fue fundado por Fidel Wilyhes. Este se localiza sobre el margen del rio Apaporis, su extensión es de 1443 km.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Victoria:

Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Google earth

Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Elaboración diagnósticos muelles fluviales a cargo del invias (Taraira, Miriti Parana, La Victoria) en los Departamentos de Vaupés y Amazonas. (INVIAS, 2023)

2.1.2 Lote 2

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE.

La Guadalupe Está ubicado a los 01º 15´ 19" de latitud Norte y 66º 52´56" de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en la margen derecha del río Negro, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido entre los 27º y 32º y una precipitación media anual de 3.000 mm.. El Corregimiento tiene un área de 1.167 km², representando el 1,61% del total departamental. Limita por el norte con el corregimiento de San Felipe, por el oriente con la República de Venezuela y por el sur y el occidente con la República de Brasil.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Guadalupe:

Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA.

Puerto Colombia es un área no municipalizada colombiana del departamento de Guainía, ubicada a 186 km por vía fluvial de Inírida, Limita al norte con el corregimiento departamental de Cacahual y el municipio de Puerto Inírida, al oriente con la República de Venezuela, por el sur con los corregimientos de San Felipe y Paná Paná y con Brasil y por el occidente con el corregimiento de Morichal y el municipio de Inírida

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Puerto Colombia:

Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CACAHUAL

Cacahual es una área no municipalizada de Colombia, situado en el departamento de Guainía, al este del país. Compuesto por los centros poblados: *Cacahual, Merey y San Juan*. Limita al oeste y norte con la capital departamental, Inírida, al sur con Puerto Colombia, y al este con Venezuela. Se encuentra a una distancia de 68 km de Inírida.

Las vías de comunicación son principalmente fluviales y aéreas. Dista de Inírida la capital departamental 186 km por vía fluvial.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Cacahual:

Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual.



Fuente: Google earth

2.1.3 Lote 3

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA.

Mapiripana es un municipio colombiano situado en el departamento del GUAINIA a orillas del río Guaviare. Dista 116 km de San José del Guaviare al norte, 324 km de Villavicencio y 417 km de Bogotá al sur respectivamente.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Mapiripana:

Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana.



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL.

Es denominado también Garza Morichal y se halla ubicado a los 02º 14´ 34” de latitud Norte y 70º 01´04” de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está

ubicada en el río Inírida, a una altura de 163 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido promedio de 27º y una precipitación media anual de 3.000 mm.

En la siguiente figura se presenta la localización general de Morichal:

Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal.



Fuente: Google earth

HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PAPANAHUA.

se encuentra localizada en el corregimiento del Papanaua, en el área no municipalizada del departamento de Vaupés, colindante con el Rio Papanaua. Limita por el norte con los departamentos de Guaviare (municipio El Retorno) y Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el oriente, con el departamento de Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el sur con los municipios de Mitú y Carurú y por el occidente con el municipio de Carurú y el de Guaviare (municipio Miraflores).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Papanahua:

Figura 20 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

Figura 21 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

2.1.4 Lote 4

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA

El municipio de Unguía se encuentra localizado en el Urabá chocoano, en la parte noroccidental de Colombia. Tiene una extensión total de 1.190 km². La principal cuenca hidrográfica es la del Golfo de Urabá, que pertenece al río Atrato, al cual confluyen los ríos Arquía, Unguía, Tigre y Tanela. Sobre el mar Caribe se destacan la playa Tarena y la bahía de Titumate. También hay ciénagas como la de Unguía, Marriaga y Hornos.

El municipio de Unguía limita al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, al oriente con el Río Atrato, que lo separa de Turbo (Antioquia), al sur con Riosucio, y al occidente con la Comarca Emberá-Wounaan y la Provincia de Darién, (ambas en Panamá).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Unguía:

Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ.

Bajo Baudó es un municipio costero ubicado al sur del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Su cabecera municipal es **Pizarro**. Se caracteriza por su ubicación entre la serranía del Baudó y el océano Pacífico.


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Pavasá:

Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá

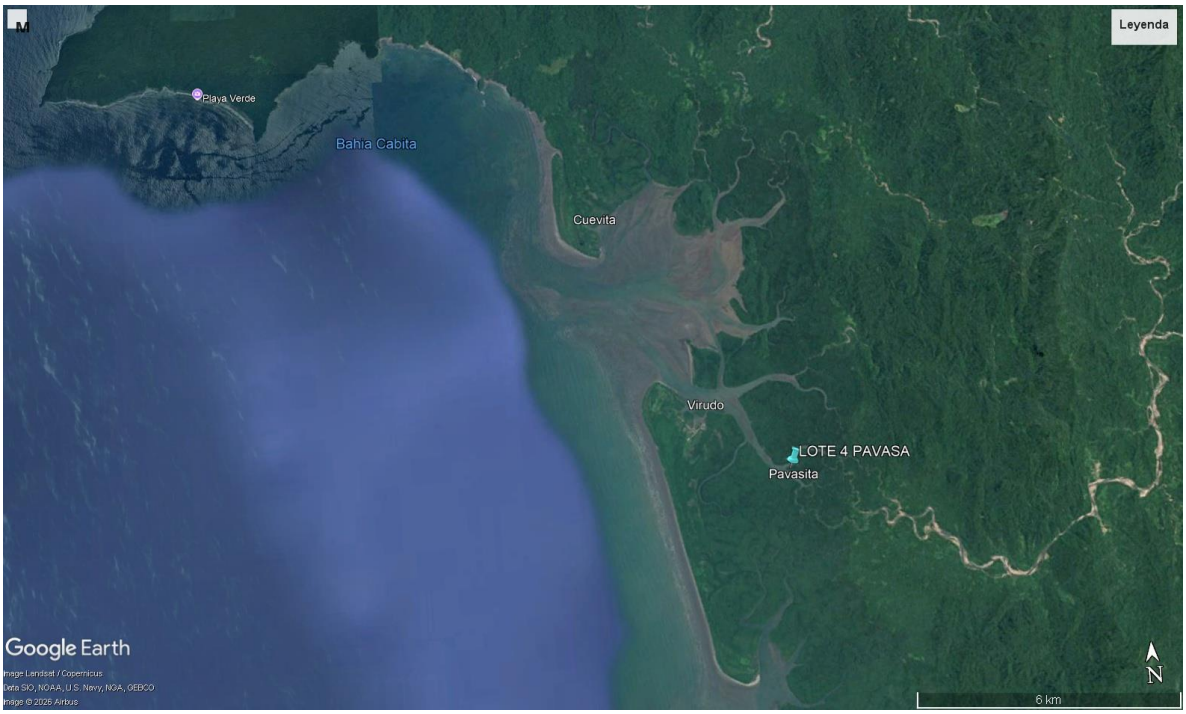

Fuente: Google earth

2.1.5 Lote 5

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA.

El municipio de Solita está ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá, a una distancia de 110 km de Florencia, capital del Departamento. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Caquetá, en límites con el departamento del Putumayo. Su temperatura promedio es de 26 ℃. y cuenta aproximadamente con 6,480 habitantes, distribuidos en un 61% en el área rural y un 39% en la zona urbana; y su economía principalmente está basada en la minería de oro, agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz), ganadería (levante y leche) y pesca.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solita:

Figura 26 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

Figura 27 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO

La cabecera municipal se localiza aproximadamente a 150 km al sureste de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre Florencia – La Montañita – San Antonio de Getucha, y desde allí por vía fluvial por el río Orteguaza; o vía terrestre Florencia – Valparaíso – Solita, y fluvial por el río Caquetá desde Solita hasta Solano.

El municipio de Solano limita con los siguientes territorios: Al norte con: Solita, Valparaíso, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, los municipios de Calamar y Miraflores del Guaviare. Al este: Con el corregimiento departamental de Pacoa del Vaupés y los Corregimientos departamentales de Mirití, Paraná y la Victoria del Amazonas. Al sur: Con los corregimientos departamentales de Santander y la Chorrera, del Amazonas. Al oeste: Con los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, del Putumayo. (Plan De Desarrollo 2020 – 2023. Por un Solano, Más Humano, Productivo y Sostenible y en Paz).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solano:

Figura 28 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

Figura 29 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth


2.1.6 Lote 6

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

El Municipio de la Tola, en el Departamento de Nariño, está ubicado a 460 km al noroccidente de Pasto. El suelo entre ondulado y plano, corresponde a la llanura del Pacífico. Tiene una población de 7.321 habitantes; una Latitud Norte 2º 24` 39", y una Longitud Oeste 78º 14` 34"; y una altitud 20 m.s.n.m; tiene una superficie de 459 kmts2, con una temperatura promedia de 28ºC. Limita al Norte con el Océano Pacífico; Por el Sur con el municipio de Roberto Payán; por el Oriente con el municipio de El Charco; y por el Occidente con el Municipio de Olaya Herrera


En las siguientes figuras se presenta la localización general del municipuio de La Tola:

Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

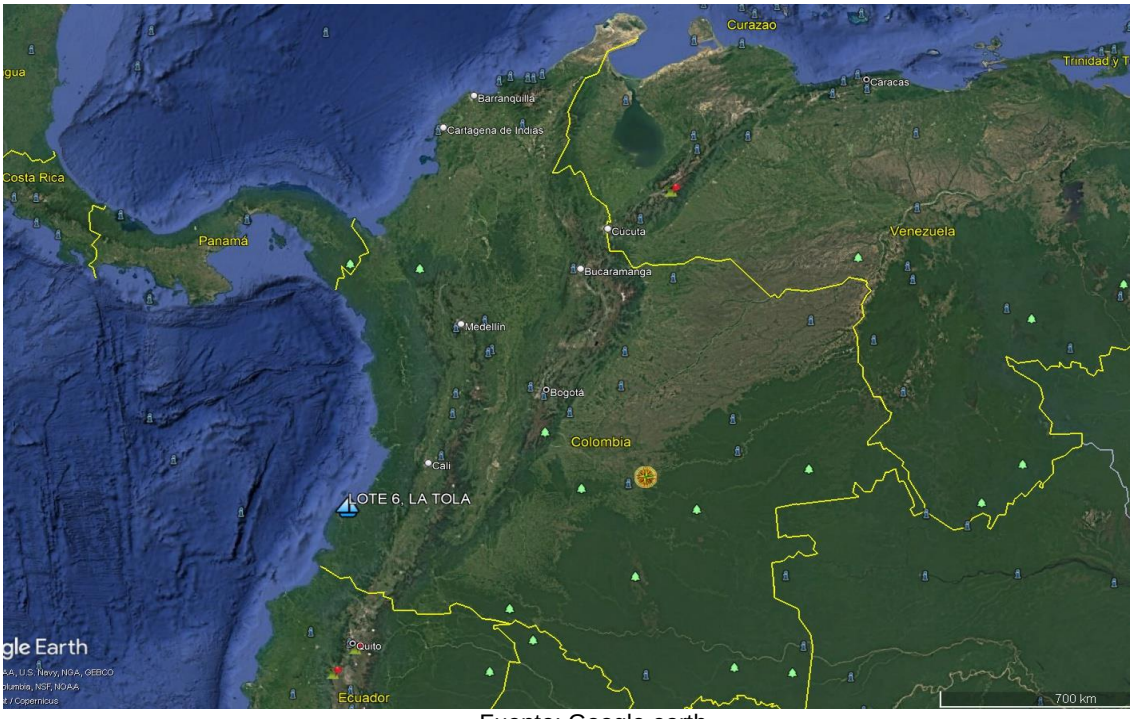

Fuente: Google earth

Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

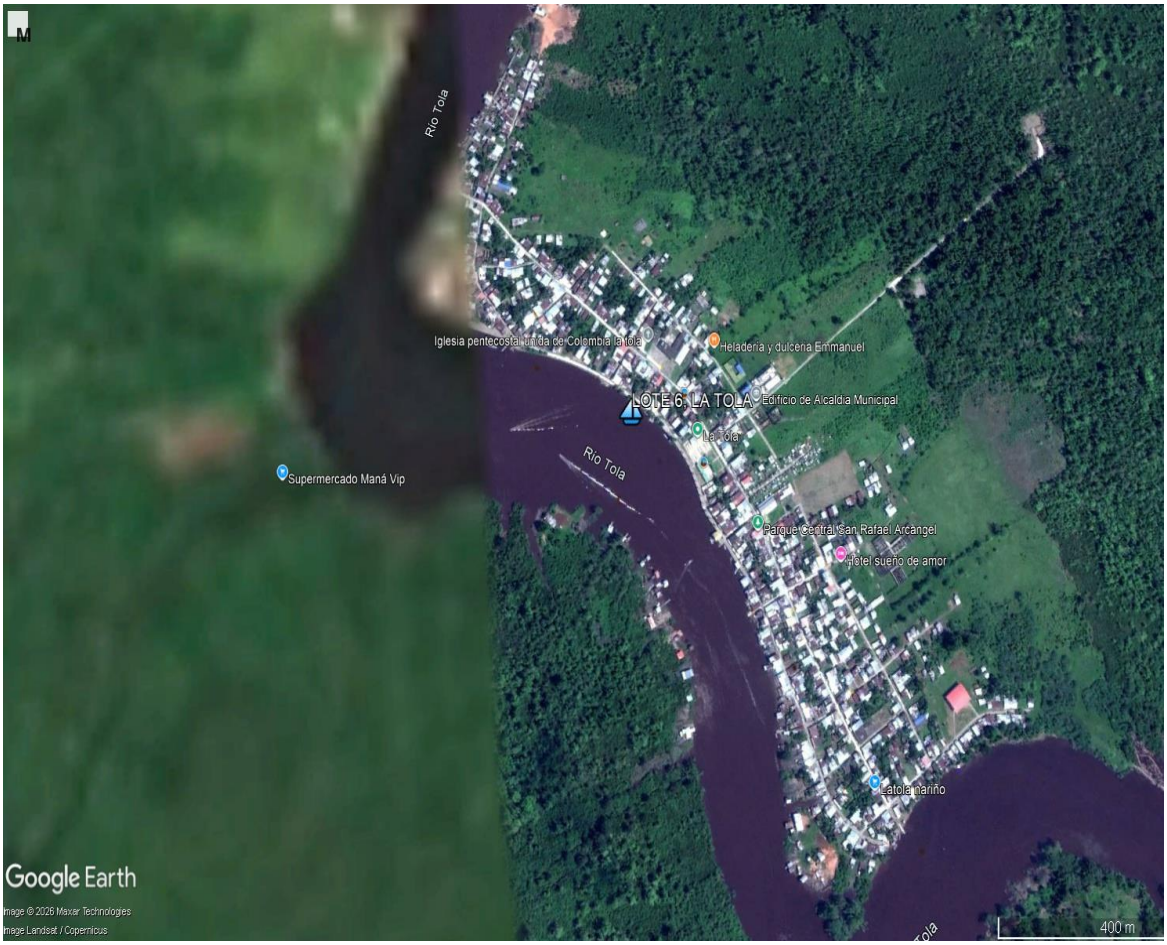

Fuente: Google earth

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Las zonas de influencia del proyecto "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6** se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
1	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Río Vaupés	Mitú	Vaupés
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Río Apaporis	Taraira	Vaupés
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Río Cananarí	Pacoa	Vaupés
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Río Miriti - Paraná	Miriti - Paraná	Amazonas
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Río Apaporis	La Victoria	Amazonas
2	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE	Río Negro	La Guadalupe	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA	Río Negro	Puerto Colombia	Guainía
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL	Río Atabapo	Cacahual	Guainía

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
3	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Río Guaviare	Mapiripana	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Río Inirida	Morichal	Guainía
4	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA	Quebrada Ipeti - Río Unguia	Unguía	Chocó
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ	Río Baudó	Bajo Baudó	Chocó
5	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA	Río Caquetá	Solita	Caquetá
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO	Río Caquetá	Solano	Caquetá

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
6	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DENAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	Río Tola	La Tola	Nariño

Con la ejecución del proyecto, se presentan los siguientes beneficios:

- Generación de empleos directos e indirectos.
- El proyecto permitirá mejorar la conectividad de territorios en los que el transporte fluvial constituye el único medio de acceso, integrándolos con las principales vías de conexión regional y nacional. Esta intervención generará beneficios socioeconómicos al aumentar la accesibilidad y la movilidad de la población, facilitar el acceso oportuno a bienes, servicios básicos y mercados, reducir costos y tiempos de transporte, y dinamizar las economías locales. Asimismo, contribuirá a disminuir las brechas territoriales de productividad, competitividad y equidad, fortaleciendo la articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y cierre de brechas.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No Aplica.

2.4. Características técnicas del proyecto.

Los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase II para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga. Estas actividades comprenden la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, geotécnica, operativa y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización del muelle y la determinación de la embarcación tipo de diseño.

Los estudios y diseños deberán incluir la definición de las áreas funcionales y de servicio, el diseño de accesos y facilidades para la accesibilidad universal, el diseño del acceso acuático y las condiciones de atraque para las embarcaciones, considerando escenarios de expansión futura. Así mismo, se deberán desarrollar los estudios y diseños de las obras civiles, la evaluación e incorporación del equipamiento requerido para la manipulación de carga conforme a la capacidad de la embarcación tipo definida, el diseño de los sistemas hidrosanitarios, redes secas, señalización, y las obras de dragado necesarias para garantizar la operatividad del muelle.

Adicionalmente, los consultores deberán evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad para la atención de emergencias en el muelle, incluyendo, entre otros, extintores, botiquines y camillas, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.
Los consultores deberán ejecutar todas las actividades adicionales requeridas por las Entidades involucradas, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase II, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables.

Las principales actividades a desarrollar por los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL

- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO
- VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO
- VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- VOLUMEN IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE
- VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILDIAD
- VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL
- VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO
- VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

El consultor del Lote 6 deberá ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III para la construcción de obras de protección de márgenes fluviales. Estas actividades comprenderán, entre otros aspectos, la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, hidrológica, geotécnica y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización de las obras de protección de orilla, la determinación de la embarcación tipo de diseño y la evaluación de las condiciones de navegabilidad.

Así mismo, los estudios y diseños deberán incluir el diseño de las obras civiles asociadas, las obras de dragado, la señalización fluvial y todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las márgenes y la seguridad de la navegación.

Adicionalmente, el consultor deberá evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad náutica requerido para atender los requerimientos de navegabilidad, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

El consultor seleccionado deberá adelantar todas las actividades adicionales que sean requeridas por las Entidades involucradas en el proyecto, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables, los cuales se presentarán en los volúmenes establecidos contractualmente y que son los siguientes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO.
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA.
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DEFINITIVA
- VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
- VOLUMEN VIII. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN IX. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN XI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO

Todas las Actividades realmente ejecutadas por las Consultorías del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad de los Consultores del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

3.1 Información General del Contrato de Consultoría

En la tabla No 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se presenta la información básica de los Contratos de Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS.**

3.1.1 Lote 1

Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1914 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Inprobrain Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$2.932.226.232,00
Anticipo	$ 1.232.027.829,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	6 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 448.675.101,00
% Ejecutado	15.3%

Fuente: Propia

3.1.2 Lote 2

Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1915 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.934.142.682,00
Anticipo	$ 812.664.992,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4.5 meses

Fecha actualizada de terminación	15 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 292.060.724,00
% Ejecutado	15.2%

Fuente: Propia

3.1.3 Lote 3

Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1892 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Vía Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.860.124.682,00
Anticipo	$ 781.564.992,50
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026

Prórroga No 1	5 meses
Fecha actualizada de terminación	31 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 334.822.442,76
% Ejecutado	18%

Fuente: Propia

3.1.3 Lote 4

Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1882 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	19 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Torres y Asociados SAS
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.362.265.442,00
Anticipo	$ 572.380.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025

Fecha de Inicio	19 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 171.645.445,69
% Ejecutado	12.6%

Fuente: Propia

3.1.5 Lote 5

Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1957 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio MNF
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.277.180.442,00
Anticipo	$ 536630.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025

Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 340.044.166,00
% Ejecutado	26.62%

Fuente: Propia

3.1.6 Lote 6

Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1968 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para las obras de protección de casco urbano del Municipio de La Tola en e Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad Projesy
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$934.498.770,00
Anticipo	$392.646.542,00

Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A FEBRERO 28 DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 137.279.329,00
% Ejecutado	14.7%

Fuente: Propia

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes

En el período comprendido entre 01 al 28 de febrero de 2026, los contratistas de consultoría ejecutaron:

3.2.1 Lote 1

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Administrativa y Contractual

- Reportes de Seguimiento: Se cumplió con la radicación de los Informes Semanales No. 7, 8, 9, 10 y 11 así como del Informe Mensual No. 3 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2026.
- Gestión Financiera: Se tramitó el Acta de Costos No. 2 y se realizaron las subsanaciones requeridas para las Actas No. 1 y No. 2 tras las observaciones de la interventoría y los compromisos del comité de seguimiento.
- Talento Humano y Logística: Se entregaron los datos personales de los profesionales y directivos encargados del proyecto. Asimismo, se gestionaron solicitudes de viáticos para el residente de campo y especialistas con el fin de ejecutar las visitas técnicas programadas.

Componente Técnico y de Campo

- Información de Muelles: Se dio respuesta a requerimientos de información adicional para los muelles de Pucarón, Taraira, Pacoa, Miritί-Paraná y La Victoria.
- Visitas de Reconocimiento: Se remitieron informes de diagnóstico inicial y visitas de campo, destacando el acercamiento a la Gobernación del Amazonas y la inspección técnica de los muelles de Pucarón y Taraira.
- Insumos Técnicos: Se presentaron cotizaciones para la adquisición de imágenes satelitales de alta resolución (empresas Procláculo y Signstudio), así como tres propuestas para los levantamientos de topografía y batimetría.
- Diagnóstico Hidráulico: Se entregó el informe de visitas del componente hidráulico tras los recorridos realizados en los cinco muelles priorizados, con el fin de recolectar insumos para futuros diseños.

Gestión Social y Comunitaria

- Documentación de Soporte: Se hizo entrega de los folletos, presentaciones y formatos metodológicos necesarios para los espacios de socialización con la comunidad.
- Convocatorias: Se emitieron invitaciones formales a las autoridades tradicionales, comunidades indígenas y administraciones municipales de Buenos Aires, Victoria Pacoa, Miritί-Paraná, Pucarón y Puerto Taraira para participar en las jornadas de socialización del proyecto.
- Cronogramas: Se establecieron y remitieron los calendarios de visitas para las socializaciones iniciales en el área de influencia del contrato.

Mesas de Trabajo y Seguimiento

- Comités: Se llevaron a cabo dos comités de seguimiento (2 y 19 de febrero) y dos mesas de trabajo (4 y 6 de febrero) en modalidades virtual y presencial.
- Temas Abordados: El enfoque principal de estas reuniones fue el seguimiento al cronograma, los avances del proyecto, los acercamientos con entes gubernamentales y la formalización de actas de costos y modificación

3.2.2 Lote 2

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Actividades de Campo y Técnicas

- Topografía y Batimetría: Se ejecutaron y finalizaron los levantamientos topográficos y batimétricos en los tres sectores mencionados, obteniendo información detallada del terreno y del lecho de los ríos para la implantación de muelles.

- Geotecnia: Se realizaron múltiples reuniones técnicas para revisar y discutir la metodología de exploración geotécnica y la caracterización del subsuelo.
- Hidráulica: Se presentaron los análisis preliminares de los aforos hidráulicos realizados en los sectores de estudio.

Gestión de Información e Institucional

- Entrevistas técnicas: Se realizaron consultas con la Capitanía Fluvial de Puerto Inírida sobre navegabilidad e infraestructura. También se entrevistó a autoridades locales de Cacahual y La Guadalupe para el estudio de oferta y demanda de transporte.
- Recopilación de datos: Se adelantaron gestiones ante la Gobernación del Guainía, la Inspección Fluvial y el Registro Nacional Fluvial para obtener información necesaria para los estudios.

Entregables y Gestión Documental

- Volumen I: Se presentó la versión ajustada de los Hitos 1, 2 y 3, la cual fue posteriormente aprobada por la Interventoría.
- Volumen II: Se realizó la entrega preliminar del estudio cartográfico, topográfico y batimétrico el 13 de febrero.
- Volumen III: Se realizó la presentación preliminar del estudio de geología y geomorfología.
- Otros documentos: Se remitió la reprogramación del cronograma de actividades (18 de febrero) y se atendieron observaciones de los Volúmenes IV y VI.

Componente Social y Seguimiento

- Comités de Seguimiento: Se llevaron a cabo reuniones periódicas (2, 9 y 19 de febrero) con el INVIAS y la Interventoría para realizar la trazabilidad de los avances y la programación de actividades.
- Socialización: Se entregó un resumen del acercamiento inicial con las comunidades y se ajustó el material de presentación para las futuras socializaciones siguiendo las observaciones recibidas

3.2.3 Lote 3

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Hito I - Mapiripaná

- **Actividades Administrativas y de Recopilación de Información:**

- Se elaboraron los documentos de seguimiento del contrato según el anexo técnico y el manual de interventoría.
- Se realizaron labores logísticas y de programación para visitas y socializaciones de inicio.
- Se atendieron requerimientos de la interventoría, incluyendo el ajuste del cronograma de trabajo.
- Se revisaron los diagnósticos suministrados por Invias y se analizaron antecedentes y documentación secundaria, como Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y planes de gobierno.

- **Trabajos de Campo y Componentes Técnicos:**
  - Los trabajos de topografía, aforos y sondeos alcanzaron un 100% de ejecución.
  - Se realizaron aforos para el estudio de transporte de pasajeros y carga, caracterizando la embarcación tipo.
  - En el área de geotecnia, se terminaron las perforaciones y sondeos, encontrándose actualmente en fase de recopilación de resultados de laboratorio y perfiles.
  - Se completó la caracterización geológica y geomorfológica regional y local, además de la elaboración de mapas de pendientes.
  - Se investigaron fuentes de materiales cercanas a San José del Guaviare y Fuente de Oro.
- **Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Dinámica Fluvial:**
  - Se realizó una visita técnica el 6 de febrero de 2026 para definir la ubicación del muelle y evaluar niveles de crecientes máximas.
  - Se consolidaron los niveles de agua básicos para el diseño y se implementó un modelo hidráulico unidimensional (Hec Ras) calibrado con datos históricos.
  - Se llevaron a cabo análisis de socavación general máxima utilizando granulometrías del lecho y datos de aforos históricos del IDEAM (2007-2022).
  - Se inició el análisis multitemporal de la dinámica fluvial basado en orillas históricas.
  - El capítulo de Hidrología del informe final presenta un avance del 95%.
- **Gestión Ambiental y Social:**

- Se identificó que la economía local depende exclusivamente de la conectividad fluvial para el abastecimiento de víveres y productos de primera necesidad.
- Se realizó una verificación del estado del internado escolar, detectando deterioros en el comedor y baños fuera de funcionamiento por movimientos de tierra.

Hito II - Morichal

- **Gestión Ambiental y Social:**
  - Se caracterizaron los medios de acceso al caserío (fluvial, terrestre en verano y aéreo) y se verificó la falta de infraestructura para el manejo de aguas residuales.
  - Se documentó que la comunidad se abastece de agua directamente del río y utiliza pozos sépticos con cal para el manejo de residuos.
  - Se identificó la existencia de paneles solares (algunos sin funcionamiento) y servicio de internet.
- **Componentes Técnicos y Geológicos:**
  - Se finalizó la caracterización geológica, geomorfológica e hidrogeológica regional y local.
  - Se procesaron imágenes de satélite para el análisis de la dinámica fluvial.
- **Estudios Hidrológicos e Hidráulicos:**
  - El 24 de febrero de 2026 se realizó la visita técnica junto a la interventoría para definir la ubicación del muelle.
  - Ante la ausencia de estaciones hidrológicas, los niveles máximos y mínimos se definieron mediante huellas existentes y testimonios de los habitantes, información que servirá para la modelación en Hec Ras.

Hito III - Papunahua

- **Gestión Ambiental y Social:**
  - Se realizó un censo visual identificando 32 unidades habitacionales y el uso de agua lluvia para el consumo.
  - Se determinó que no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales ni de residuos sólidos (estos últimos se manejan mediante quema).
  - Se verificó que la zona prevista para el muelle no afectaría significativamente la flora local.
- **Componentes Técnicos y Geológicos:**

- El informe geológico se encuentra en etapa de recopilación de información.
- Se realizaron visitas de campo y se iniciaron las labores de topografía y exploración geotécnica.

- **Estudios Hidrológicos e Hidráulicos:**
  - Se llevó a cabo una visita técnica el 24 de febrero de 2026 para precisar aspectos hídricos y la ubicación del muelle.
  - Se utilizaron las huellas de la creciente máxima del año 2025 y la información de los pobladores para definir conceptualmente los niveles de diseño, ante la falta de estaciones hidrológicas cercanas

3.2.4 Lote 4

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

El consultor centró sus esfuerzos en la organización administrativa, la gestión social en el área de influencia y la planificación técnica de las actividades de campo. Es importante resaltar que durante este periodo no se iniciaron trabajos de campo físicos (levantamientos o perforaciones), ya que las acciones fueron de carácter preparatorio y logístico.

Actividades Administrativas y de Coordinación

- Se llevaron a cabo reuniones internas de coordinación técnica entre las diversas disciplinas del proyecto para definir la programación y los requerimientos logísticos.
- Se organizaron los equipos técnicos que participarán en las etapas posteriores de la consultoría.
- Se recopiló información secundaria, incluyendo antecedentes técnicos, estudios previos, cartografía y documentación institucional suministrada por el INVIAS.

Gestión Social del Proyecto

- Se realizó un acercamiento institucional con actores clave en los municipios de Unguía y Bajo Baudó.
- Inició el proceso de caracterización social preliminar, identificando dinámicas comunitarias y posibles impactos del proyecto.

- Se avanzó en la estructuración de insumos para el Volumen X (Gestión Ambiental, Social y Sostenibilidad), preparando material de divulgación y socialización para las comunidades.

Planificación Técnica de Estudios Básicos

Topografía y Batimetría (Volumen II)

- Se definió la metodología de levantamiento, que incluirá el uso de estación total, GNSS diferencial (sistema MAGNA-SIRGAS), ecosonda integrada y apoyo fotogramétrico mediante drones.
- Se realizó un análisis preliminar de las condiciones de acceso y se evaluaron las posibles zonas de implantación de la infraestructura.

Exploración Geotécnica (Volumen IV)

- Se estructuró el plan de exploración del subsuelo, definiendo la localización tentativa de sondeos y apiques.
- Se determinaron las profundidades estimadas de perforación y el programa de ensayos de laboratorio (granulometría, límites de Atterberg, compresión, entre otros).

3.2.5 Lote 5

Durante el período, el Consultor ejecutó las siguientes actividades

Gestión Documental y Entregables

- Cumplimiento de Hitos: El 23 de febrero de 2026 se realizó la entrega formal del Volumen I (Estudio de Identificación de Necesidades, Diagnóstico y Vías de Acceso) para los municipios de Solita (Hito I) y Solano (Hito II), cumpliendo con el cronograma contractual.

Componente Topográfico y Batimétrico

- Levantamiento Topográfico (Solita): Se completó el 100% de la información del sector intervenido entre el 15 y 18 de febrero. Las labores incluyeron captura planimétrica, altimétrica y la instalación de miras de nivel para asegurar la consistencia vertical de los datos.
- Levantamiento Batimétrico (Solita): Se ejecutaron 7 kilómetros lineales de levantamiento, incluyendo aforos de caudal y secciones transversales del cauce. A pesar de condiciones climáticas adversas, la actividad culminó el 21 de febrero, procediendo luego al traslado del equipo hacia Solano.

- Georreferenciación: Se materializaron e instalaron puntos de control topográfico (deltas) para el amarre altimétrico de toda la información recolectada.

Componente Geotécnico y Geofísico

- Ensayos de Sísmica: Se realizaron caracterizaciones del subsuelo en Solita (13 de febrero) y Solano (14 de febrero). Debido al alto flujo vehicular y vibraciones, las mediciones se reprogramaron a horario nocturno para garantizar la precisión y confiabilidad técnica de los registros.
- Perforaciones Exploratorias (Solita):
  - En Agua (Punto No. 1): Se alcanzó una profundidad de 33,5 metros el 21 de febrero, superando el objetivo inicial de 30 metros a pesar de interrupciones por lluvias y tránsito peatonal.
  - En Tierra (Punto No. 2): Se ejecutó entre el 22 y 23 de febrero, alcanzando una profundidad de 33 metros.
  - Cierre de Actividades: El ciclo de perforaciones del periodo finalizó el 27 de febrero con la culminación del último punto en tierra.
  -

Componente Social

- El día 26 de febrero de 2026 se llevó a cabo la visita técnica y de acompañamiento a la **socialización** de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL – CONTRATO 1957 DE 2025” en el municipio de **SOLITA**.
- El día 27 de febrero se llevó a cabo la visita técnica y de acompañamiento a la **socialización** de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL – CONTRATO 1957 DE 2025” en el municipio de **SOLANO**.

Logística y Control de Calidad

- Gestión de Equipos: El 15 de febrero de 2026 se recibió e inspeccionó la maquinaria de perforación en el muelle municipal de Solita previo a su montaje.
- Aseguramiento de Datos: Se implementaron protocolos de control y verificación de información de campo para garantizar que los datos primarios recolectados sirvan como base confiable para los diseños posteriores.

3.2.6 Lote 6

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, el consultor llevó a cabo una serie de actividades administrativas, técnicas y de campo enfocadas en el avance del proyecto en el municipio de **La Tola**.
Las gestiones realizadas se dividen principalmente en las siguientes áreas:

Actividades Administrativas y Reportes

- Entrega de informes: Se presentaron los informes semanales del periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, así como los informes No. 7, 8 ,9 y 10 y el informe mensual de febrero de 2026.
- Gestión de costos y cronogramas: Se entregaron las Actas de Costos No. 1 y No. 2, se elaboró el acta No. 3 y se presentó el cronograma de actividades de campo.
- Trámite de información: Se remitió información técnica solicitada por la interventoría el 4 de febrero y se realizó una solicitud formal (con posterior ampliación) de datos técnicos sobre las obras de protección de La Tola.
- Actualización de documentos: Tras la visita técnica, se entregó el Volumen IV actualizado y la metodología del Volumen II ajustada.

Visita Técnica de Reconocimiento (11 al 13 de febrero)

El consultor, junto con especialistas, la interventoría y funcionarios de la Alcaldía, realizó la primera visita oficial al municipio con los siguientes objetivos:

- Inspección de estructuras: Se evaluó el estado actual, patologías y estabilidad de la muralla y el frente fluvial.
- Recorridos de campo: Se realizó una inspección visual directa sobre la estructura de contención y un recorrido fluvial en lancha para evaluar las afectaciones desde el frente hidráulico.
- Uso de tecnología: Se tomaron evidencias fotográficas y se realizaron sobrevuelos con dron, previa coordinación con la Policía Nacional para los permisos necesarios.

Coordinación Institucional y Social

- Reuniones clave: Se sostuvo una reunión de cierre para levantar el acta de visita y un encuentro con el Alcalde de La Tola en Guapi, donde se explicó el alcance del contrato y la importancia del diagnóstico técnico.

- Prevención de traslapes: Se adelantaron gestiones para conocer el alcance del nuevo terminal fluvial de La Tola y así evitar duplicidad o conflictos con el proyecto actual.
- Planificación social: Se propuso el 4 de marzo de 2026, como fecha tentativa para la socialización del proyecto con la comunidad.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

No aplica

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Lote 1: Vaupés y Amazonas (Consorcio Inprobrain Fluvial)

- Estado de Avance: Presenta un atraso del 0.6% (Programado: 15.9% vs. Ejecutado: 15.3%).
- Acciones a Seguir:
  - Exigir la entrega inmediata de los Volúmenes I (vencido el 21 de enero), II y III (ambos vencidos el 25 de febrero).
  - Validar las Actas de Costo #1 y #2, las cuales han sido devueltas con observaciones en tres ocasiones diferentes.
  - Confirmar la fecha definitiva para la socialización del muelle Miritíi-Paraná.

Lote 2: Guainía (Consorcio Navegabilidad)

- Estado de Avance: Registra un atraso del 2.8% (Programado: 18% vs. Ejecutado: 15.2%).
- Acciones a Seguir:
  - Realizar el acompañamiento y supervisión de la visita técnica y de acercamiento a los muelles de Cacahual, Puerto Colombia y Guadalupe programada del 3 al 5 de marzo.
  - Finalizar la revisión del Volumen III que se encuentra actualmente en manos de la interventoría.

- Verificar que el consultor aplique los ajustes solicitados al Volumen II del Hito III (Cacahual), el cual fue devuelto con observaciones el 18 de marzo.

Lote 3: Guainía y Vaupés (Consorcio Vía Fluvial)

- Estado de Avance: Mantiene un adelanto del 0.3% (Programado: 18.3% vs. Ejecutado: 18%).
- Acciones a Seguir:
  - Solicitar el Volumen IV (Geotecnia) del Hito I Mapiripana, cuya fecha de compromiso es el 28 de febrero, para proceder a revisión.
  - Gestionar y verificar la entrega del cronograma general actualizado que incluya trabajos de campo, pendiente desde el 23 de febrero.
  - Supervisar la programación y documentación para la socialización en Mapiripana.

Lote 4: Chocó (Torres y Asociados SAS)

- Estado de Avance: registra un atraso del 3.2% (Programado: 15.8% vs. Ejecutado: 12.6%).
- Acciones a Seguir:
  - Exigir la presentación inmediata de los informes mensuales y actas de costos que presentan incumplimiento al 28 de febrero.
  - Definir la fecha de socialización en Unguía, la cual se encuentra sin definir.
  - Validar el cronograma general ajustado, dado que la versión anterior fue entregada con errores.

Lote 5: Caquetá (Consorcio MNF)

- Estado de Avance: Registra un adelanto del 1.3% (Programado: 12.4% vs. Ejecutado: 13.7%).
- Acciones a Seguir:
  - Supervisar la preparación del Volumen III (Geología y Morfología), iniciada tras los trabajos de campo de finales de febrero.
  - Continuar con el seguimiento a los trabajos de topografía y batimetría en curso.

- Verificar los resultados de las socializaciones iniciales realizadas en Solita y Solano el 26 y 27 de febrero.

Lote 6: Nariño (Consorcio Navegabilidad Projesy)

- Estado de Avance: Presenta un atraso del 2% (Programado: 16.7% vs. Ejecutado: 14.7%).
- Acciones a Seguir:
  - Presionar por la entrega de documentos de socialización para La Tola; el consultor se ha negado a enviarlos hasta que se aclare el alcance del proyecto.
  - Requerir los informes semanales No. 10 y No. 11, cuyo plazo venció el 26 de febrero.
  - Verificar la nueva presentación de documentos para el anticipo, solicitados nuevamente mediante oficio del 26 de febrero.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Informes Semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales por LOTES, correspondientes al período comprendido del 1 al 28 de febrero de 2026:

Los informes por Lotes se adjuntan en Anexo.

Lote 1

Tabla 8 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 1.

LOTE No.	1		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	2	FEB/ FEB	8
SEMANA 9	9	FEB/ FEB	15
SEMANA 10	16	FEB/ FEB	22
SEMANA 11	23	FEB/ FEB	26

Lote 2

Tabla 9 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 2.

LOTE No.	2		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	30	ENE / FEB	5
SEMANA 9	6	FEB / FEB	12
SEMANA 10	13	FEB / FEB	19
SEMANA 11	20	FEB / FEB	26

Lote 3

Tabla 10 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 3.

LOTE No.	3		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	30	ENE / FEB	5
SEMANA 9	6	FEB / FEB	12
SEMANA 10	13	FEB / FEB	19
SEMANA 11	20	FEB / FEB	26

Lote 4

Tabla 11 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 4.

LOTE No.	4		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	6	FEB / FEB	12
SEMANA 9	13	FEB / FEB	19
SEMANA 10	20	FEB / FEB	26

Lote 5

Tabla 12 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 5.

LOTE No.	5		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	5	FEB / FEB	11
SEMANA 9	12	FEB / FEB	18
SEMANA 10	19	FEB / FEB	25
SEMANA 11	26	FEB / MAR	4

Lote 6


Tabla 13 listado informes semanales para periodo febrero. Lote 6.

LOTE No.	6		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 8	2	FEB / FEB	8
SEMANA 9	9	FEB / FEB	15
SEMANA 10	16	FEB / FEB	19
SEMANA 11	20	FEB / FEB	26
SEMANA 12	27	FEB / MAR	5

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría

Lote 1

Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 1

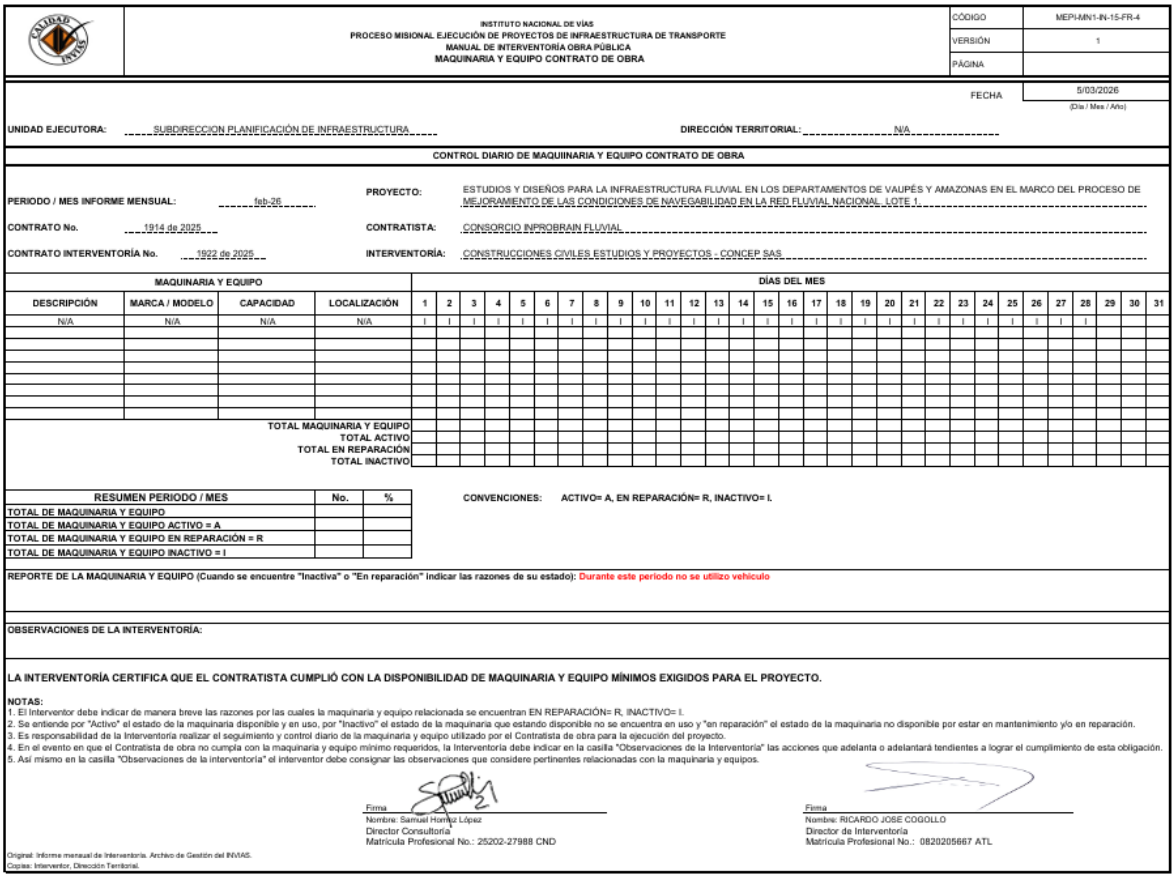

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-26 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 1

CONTRATO No. 1914 de 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025 — INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
N/A	N/A	N/A	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Durante este periodo no se utilizo vehiculo

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Samuel Hortúa López
Director Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 3

Figura 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 3

CONTRATO No. 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 **INTERVENTORÍA:** CONCEP S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación	Nikon	Mayor de 100m/330 pies Dentro de aproximadamente 6 Cm 8000 puntos	Mapiripana, Morichal y Papunaua	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I			
Nivel	Nikon AE7	30'/2 mm	Mapiripana, Morichal y Papunaua	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I			
Taladro: Petty Reforzado	ETK	22 HP	Mapiripana	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A			
Motobomba Cooled Diesel	KM186FA	10HP	Mapiripana	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	30
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	30
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El estado de inactivo se da debido a que la maquina no se encuentra trabajando en ese dia

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma
Nombre: LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.: 25202-099284 CND

Firma
Nombre:
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 4

Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 4.

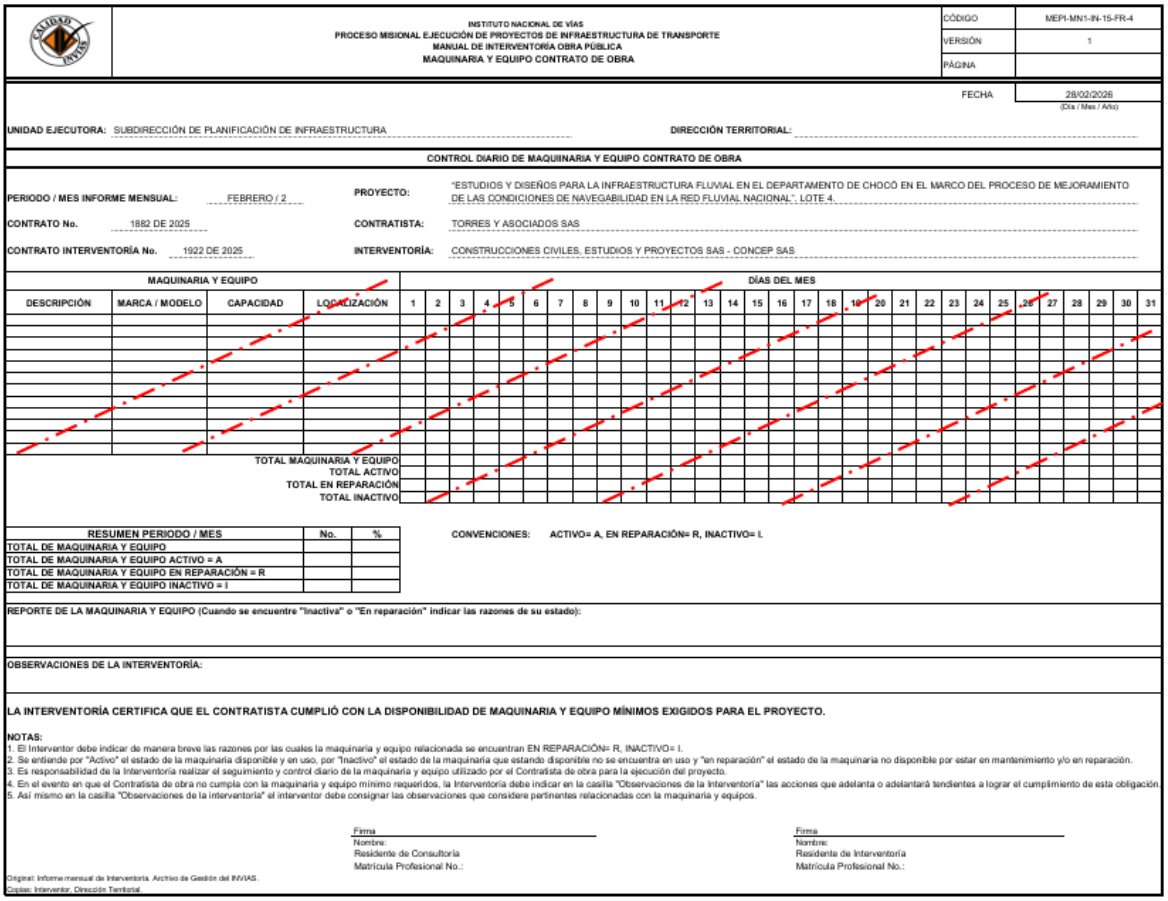

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO / 2 — PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL", LOTE 4.

CONTRATO No. 1882 DE 2025 — CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 — INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma
Nombre:
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 5

Figure 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría. LOTE 5.

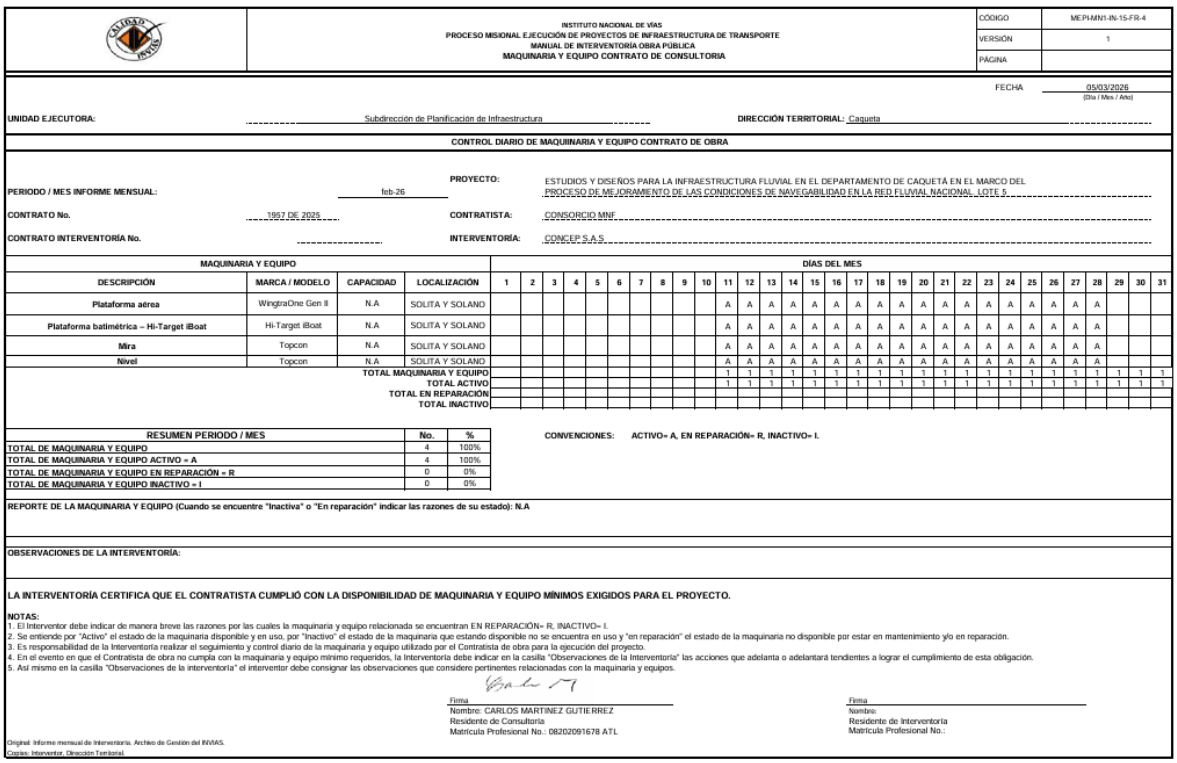

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caqueta

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-26 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

CONTRATO No.: 1957 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: — INTERVENTORÍA: CONCEP S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Plataforma aérea	WingtraOne Gen II	N.A	SOLITA Y SOLANO											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Plataforma batimétrica – Hi-Target iBoat	Hi-Target iBoat	N.A	SOLITA Y SOLANO											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Mira	Topcon	N.A	SOLITA Y SOLANO											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Nivel	Topcon	N.A	SOLITA Y SOLANO											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL ACTIVO											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): N.A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202091678 ATL

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.

A continuación, se muestra el personal presentado por la Consultoría y aprobado por la Interventoría para ejecutar cada uno de los proyectos:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 1."**

Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1

CONSULTORÍA LOTE 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
CONTRATO 1914 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	X		3/12/2025	APROBADO II-871-L1-003-2025 (03-12-25
2	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025 (02-12-25)
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	RICARDO ANDRÉS BLANCO CASTAÑEDA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	LEONARDO PACHECO NIÑO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
5	INGENIERO AUXILIAR 1	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
6	INGENIERO AUXILIAR 2	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
7	INGENIERO AUXILIAR 3	ANDRES FELIPE PRIETO LÓPEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
8	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO BOLIVAR TIBOCHA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
9	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	PAOLA ANDREA LLANES VEGA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
10	GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
11	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
12	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
13	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
14	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JORGE ANDRES ROA ROMERO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
15	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
16	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
17	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
18	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
19	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
20	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	DANIEL CAMILO SÁNCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
21	PROFESIONAL SOCIAL 1	GEORGINA ELIZABETH QUINTANA GONZALEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
22	PROFESIONAL SOCIAL 2	CLAUDIA PATRICIA GALINDO SUAREZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
23	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	MARIA DEL PILAR CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
24	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	DANIEL CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
25	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	NELSON JAVIER MORALES MELO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
26	PROFESIONAL SIG	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
27	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERNAL	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
28	PROFESIONAL NAVAL	EDWIN GIOVANNY PAIPA SANABRIA	X		30/12/2025	OFICIO CON APROBACION II-871-L1-009-2026
29	DIBUJANTE 1	WILLIAM NICOLAS PRIETO SANCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
30	DIBUJANTE 2	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
31	ESPECIALISTA EN HIDRAHILICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 2.**

Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2.

CONSULTORÍA LOTE 2 CONSORCIO NAVEGABILIDAD - CONTRATO 1915 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	SILVERIO FARIAS MENDOZA	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ALLEN BATEMAN	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CAROLINA ISABEL GARZON BUITRAGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
4	INGENIERO AUXILIAR 1	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA ARIZALA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
5	INGENIERO AUXILIAR 2	LINA GARCES RAVELO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-025-2026 CAMBIO
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FRANCISCO DE PAULA PEREZ AMAYA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	URIEL GUERRERO FARFÁN	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
8	GEOLOGO	JOSE HEYLEY VERGARA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEXANDER GÓMEZ CASSAB	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	YOHOLIMA MARTINEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	YOLIMA MARTINEZ GUERRERO	x		9/1/2002	OFICIO APROBACIÓN II-87-L2-008-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	ASTRID BLANCO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	WALTER GIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	OLGA TORRES CAMARGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	PABLO GARCIA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	FELISA ARIZALA	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	LUZ ESTELLA GUTIERREZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	NATALIA ARCILA CORTES	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIANA CATALINA BLANCO FIGUEROA	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-007-2026
24	PROFESIONAL SIG	JOHNATAN CRHISTIAN PAZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	PAOLA GALINDO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
26	PROFESIONAL NAVAL	CARLOS ORAMAS	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
27	DIBUJANTE 1	MICHAEL ANDRÉS TELLO ENCISO	X		6/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
28	DIBUJANTE2	JENY VANESSA FANDIÑO SARMIENTO	X		8/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 3.**

Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3.

CONSULTORÍA LOTE 3 CONSORCIO VIA FLUVIAL CONTRATO 1892 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026
4	INGENIERO AUXILIAR 1	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
5	INGENIERO AUXILIAR 2	JUAN CARLOS SANCHÉZ GAFARO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SANCHEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	DAVID RENGIFO SAAVEDRA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
8	GEOLOGO	VICTOR ERNESTO SEDIEL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JUAN MANUEL CEPEDA SUAREZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS GERMAN BULLA CAICEDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	PRISCILA RAMOS OCAMPO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	ALEXANDRA BERNAL SANCHÉZ	X		14/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-L3.008-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	DANIELA BRICEÑO QUINTERO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALEXANDER BARON AVILA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	SANDRA MILENA ALVAREZ ABRIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	MELANY LISETH BUSTOS RUIZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
24	PROFESIONAL SIG	JAIRO ROJAS LEAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
26	PROFESIONAL NAVAL	HECTOR ALFONSO ESCOBAR ACOSTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
27	DIBUJANTE 1	JORGE ANDRÉS FAJARDO ROJAS	X		14/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-008-2026
28	DIBUJANTE2	VALENTINA SILVA RAMOS	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 4.**

Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4.

CONSULTORÍA LOTE 4 TORRES Y ASOCIADOS SAS - CONTRATO 1882 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	X		4/12/2025	OFICIO APRONACIÓN II-871-L4 001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	MARLON MOGOLLO ROMERO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	LORENA PRASCA RAMIREZ	X		27/01/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 014-2026
7	GEÓLOGO	DIANA CAROLINA CHAPARRO PIRAJON	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	YEIMI GARCIA MORENO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	CARLOS MAURICIO FONSECA GAMBA	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
10	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	JAIME ECHEVERRIA RODRIGUEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	NESTOR CAMILO SIERRA RODRIGUEZ	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULIANA HERRERA MACIAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ	X		16/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 028-2026
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FRANCY DANIELA DUARTE	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
16	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
17	PROFESIONAL SOCIAL	EDNA RUTH GARZON ROJAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JUAN SEBASTIAN PALMA MORENO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	LAURA MAHECHA BUITRAGO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
21	PROFESIONAL SIG	IBETH MURCIA PEÑA	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
22	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
23	PROFESIONAL NAVAL	EDUARDO CUBAQUE BERNAL	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
24	DIBUJANTE	SEBASTIAN HERNANDEZ CHAVEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 5.**

Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5.

CONSULTORÍA LOTE 5 CONSORCIO MNF CONTRATO 1957 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		1/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-003-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		27/11/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ANDRES MARTINEZ	X		17/12/25	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
4	INGENIERO AUXILIAR	LARRY GONZALEZ BARRERA	X		15/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-005-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	JORGE IGNACIO VELEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	MARCELO BEDOYA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
7	GEOLOGO	MARIO ALBERTO VARGAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	EDWIN DOMIGUEZ MORENO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-009-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE MANUEL ALVAREZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MARIA EULALIA ARTETA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
16	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALBA LINARES TAFUR	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
17	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	SANDRA MURILLO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CATALINA MOLINA LOZAN	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	BRIAN RIOS BORRAEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
21	PROFESIONAL SIG	LISMAR ROSSANA MALDONADO MEDINA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
22	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	MARCO MONTENEGRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
23	PROFESIONAL NAVAL	ORLANDO CASTAÑEDA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
24	DIBUJANTE 1	MARIO MONTENEGRO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 6.**

Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6.

CONSULTORÍA LOTE 6 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO 1968 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	X		16/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-0011-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-014-2026
6	GEÓLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
7	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY RUIZ PIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA	X		16/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
10	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	X		13/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
12	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
13	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
14	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	X		13/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES OFICIO II-871-L6-008-2026
15	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	DIEGO ANDRÉS ROJAS MONTERO	X		16/01/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
16	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEIMY TORRES AFRICANO	X		13/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
17	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIEGO FERNANDO SEQUEDA	X		23/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-016-20216
18	PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
19	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	CARLOS HERNANDO RIOS FERRERIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
20	DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026

A continuación, se presentan el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, correspondientes al presente periodo.

Lote 1.

Figura 36 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 — **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO	93356517	DIRECTOR	$ 10.770.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.202-1	1	$ 28.200	V	Sanitas	61418535	$ 215.400	Colpensiones	61418535	$ 861.600	$ 215.400			
2	RICARDO ANDRES BLANCO	1049613897	RESIDENTE 1	$ 6.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.202-1	1	$ 428.100	V	Nueva EPS	61444001	$ 246.000	Porvenir	61444001	$ 984.000	$ 246.000			
3	LEONARDO PACHECO	1053607647	RESIDENTE 2	$ 6.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	902.008.292-2	1	$ 428.100	V	Sanitas	56456898	$ 246.000	Colfondos	56456898	$ 984.000	$ 246.000			
4	LINA DANIELA GUTIERREZ	1007751360	AUXILIAR 1	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.202-1	1	$ 284.700	V	Salud Total	59698226	$ 163.600	Proteccion	59698226	$ 654.400	$ 163.600			
5	CRISTIAN JAVIER	1049636984	AUXILIAR 2	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.202-1	1	$ 284.700	V	Sanitas	61444001	$ 163.600	Porvenir	61444001	$ 654.400	$ 163.600			
6	ANDRES FELIPE PRIETO	1049645409	AUXILIAR 3	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.202-1	1	$ 284.700	V	EPS Sura	61444001	$ 163.600	Porvenir	61444001	$ 654.400	$ 163.600			
7																			
8																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/02/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:Samuel Hormiz López
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 2.

Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/03/26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N.A.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1915 de 2025 **CONSULTOR:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2025 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.

CONTRATO DEINTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVERIO FARÍAS MENDOZA	19.068.998	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	$ 5.385.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	50%	WEG INGENIERIA	$ 5.385.000,00	$ 28.200	I	compensar	67062519	$ 673.200							Pensionado
2	CAROLINA GARZON BUITRAGO	30.745.228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	$ 4.920.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	80%	WEG INGENIERIA	$ 4.920.000,00	$ 362.000	V	compensar	59064051	$ 208.000	Porvenir	59064051	$ 832.000	$ 208.000			
3	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA	1.234.192.633	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 4.090.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	WEG INGENIERIA	$ 4.090.000,00	$ 284.700	V	compensar	59064051	$ 163.600	Porvenir	59064051	$ 654.400	$ 163.600			
4	LINA CRISTINA GARCÉS	1.014.237.312	INGENIERA AUXILIAR 2	$ 4.090.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	WEG INGENIERIA	$ 4.090.000,00	$ 21.350	I	compensar	83949508	$ 163.600	Protección	$ 163.600	$ 654.400	$ 163.600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 18.485.000,00**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma
Nombre: SILVERIO FARÍAS MENDOZA
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 11998 CND

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 3.

Figura 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 3.

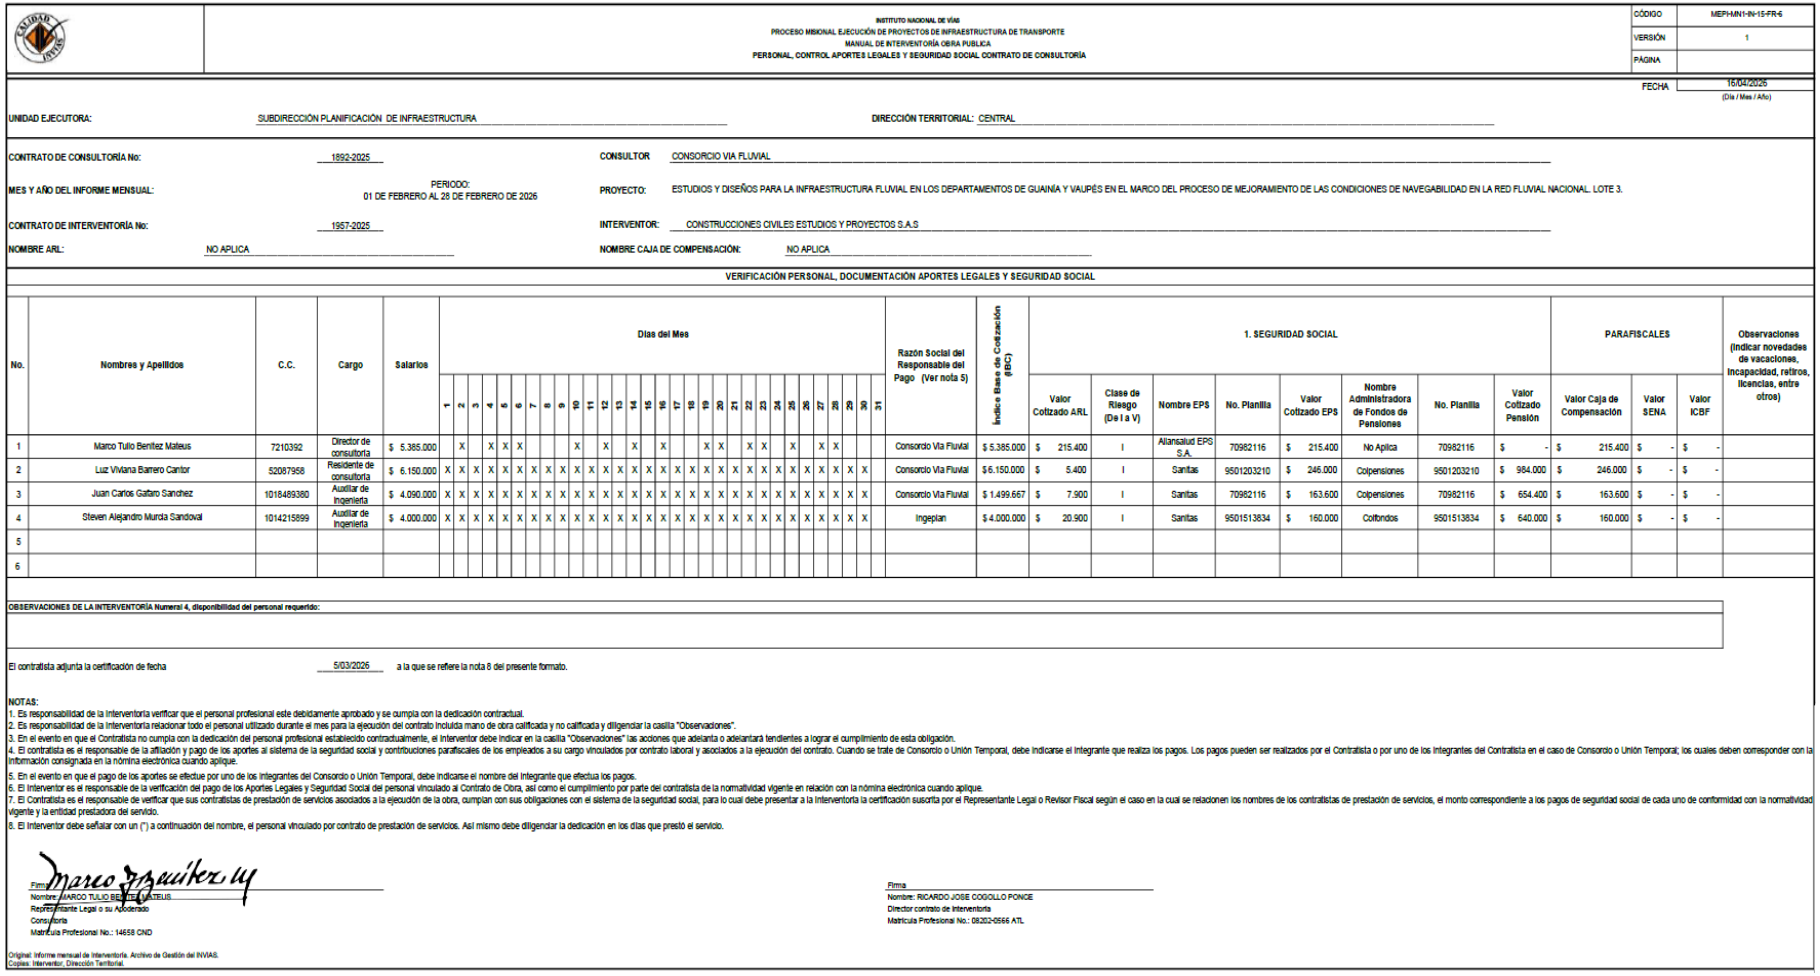

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 16/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CENTRAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1892-2025
CONSULTOR: CONSORCIO VIA FLUVIAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1957-2025
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S
NOMBRE ARL: NO APLICA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: NO APLICA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Marco Tulio Benitez Mateus	7210392	Director de consultoria	$ 5.385.000	X X X X X	Consorcio Via Fluvial	$ 5.385.000	$ 215.400	I	Alianzalud EPS S.A.	70982116	$ 215.400	No Aplica	70982116	$ -	$ 215.400	$ -	$ -	
2	Luz Viviana Barrero Cantor	52087958	Residente de consultoria	$ 6.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Via Fluvial	$ 6.150.000	$ 5.400	I	Sanitas	9501203210	$ 246.000	Colpensiones	9501203210	$ 984.000	$ 246.000	$ -	$ -	
3	Juan Carlos Gafaro Sanchez	1018489380	Auxiliar de ingenieria	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Consorcio Via Fluvial	$ 1.499.667	$ 7.900	I	Sanitas	70982116	$ 163.600	Colpensiones	70982116	$ 654.400	$ 163.600	$ -	$ -	
4	Steven Alejandro Murcia Sandoval	1014215899	Auxiliar de Ingenieria	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Ingeplan	$ 4.000.000	$ 20.900	I	Sanitas	9501513834	$ 160.000	Colfondos	9501513834	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
5																			
6																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/03/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la interventoria verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la interventoria relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS
Representante Legal o su Apoderado
Consultoria
Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 08202-0566 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 4.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1882-2025 **CONSULTOR:** TORRES Y ASOCIADOS SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 **PROYECTO:** "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DOCNCEL	19,068,998	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	$ 5,710,000.00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	50%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	$ 5,385,000.00	$ 397,500.00	V	COMPENSAR	9487234612	$ 228,400	PORVENIR	9487234612	$ 913,600	$ 228,400			
2	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	30,745,228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	$ 6,300,000.00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	$ 6,300,000.00	$ 438,500.00	V	SANITAS	9487234612	$ 252,000	PORVENIR	9487234612	$ 1,008,000	$ 252,000			
3	MARLON ALVEIRO	1,234,192,633	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 3,615,000.00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	TORRES Y ASOCIADOS SAS	$ 3,615,000.00	$ 251,700.00	V	SANITAS	9487234612	$ 144,600	PORVENIR	9487234612	$ 578,400	$ 144,600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 15,625,000.00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Karen Criado
Nombre: KAREN DAYANA CRIADO
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 5.

Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 5.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1957 de 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 28 FEBRERO/26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **SUPERVISOR:** PAOLA MAHECHA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 28)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS (4%)	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones (16%)	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Cotizado Fondo y subcuenta	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	3,745,341	Director Interventoría	$ 5.710.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 5.710.000	$ 397.500	V	SURA	9499537748	$ 713.800	NA	9499537748	Pensionado		$ -			Pensionado
2	CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	1,140,818,466	Ingeniero Residente Estudios y Campo	$ 6.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Inp Servicios sas	$ 6.300.000	$ 389.800	V	SURA	9499294513	$ 280.000	COLPENSIONES	9497682913	$ 1.190.000		$ 280.000			
3	LARRY GONZALEZ BARRERA	1,014,234,791	Ingeniero Auxiliar	$ 3.615.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 3.615.000	$ 126.525	V	SALUD TOTAL	9499003197	$ 144.600	COLPENSIONES	9499003197	$ 144.600		$ 144.600			
4	MARCO MONTENEGRO	80,067,157	Dibujante	$ 1.315.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeco	$ 1.315.000	$ 273.200	V	SALUD TOTAL	6004824865	$ 214.100	COLPENSIONES	6004824865	$ 856.400		$ 157.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/02/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE ROA MEJIA
Representante Legal Consultoria
Consorcio MNF

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
INTERVENTOR
Matricula Profesional: 082-0205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 6.

Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 6/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01-28 FEBRERO /2026 — **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE OBRA No.: 1968 DE 2025 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

NOMBRE ARL: Seguros Bolívar S.A — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1–28)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	1,066,177,766	DIRECTORA CONSULTC	$ 5,385,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	PROES LATAM	$ 5,385,000	$ 374.80	I	Salud Total EPS	46481689	$ 215.40	Porvenir	46481689	$ 861.60	$ 215.40			
2	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	1096953458	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6,150,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	PROES LATAM	$ 6,150,000	$ 90,100	I	Nueva EPS	46481689	$ 46,300	Porvenir	46481689	$ 184,900	$ 46,300			
3	LAURA KATEHERINE AGUILAR PULIDO	1,121,956,072	Ingeniera Auxiliar	$ 4,090,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	PROES COLOMBIA	$ 4,090,000	$ 284,700	I	Sanitas EPS	46899070	$ 163,600	Porvenir	46481689	$ 654,400	$ 163,600			
4	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	1072665758	Dibujante	$ 6,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	PROES CONSULTORES	$ 6,000,000	$ 31,400	I	Sanitas EPS	47823135	$ 240,000	Colpensiones	46481689	$ 960,000	$ 240,000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 21,625,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/02/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Director de consultoria
Matricula Profesional No.:22202-251355 COR
PROES INGENIERIA


Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Matricula Profesional No.:0820255667 ATL
Director del contrato de interventoria

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría

Lote 1.

Figura 42 Informe financiero lote 1.

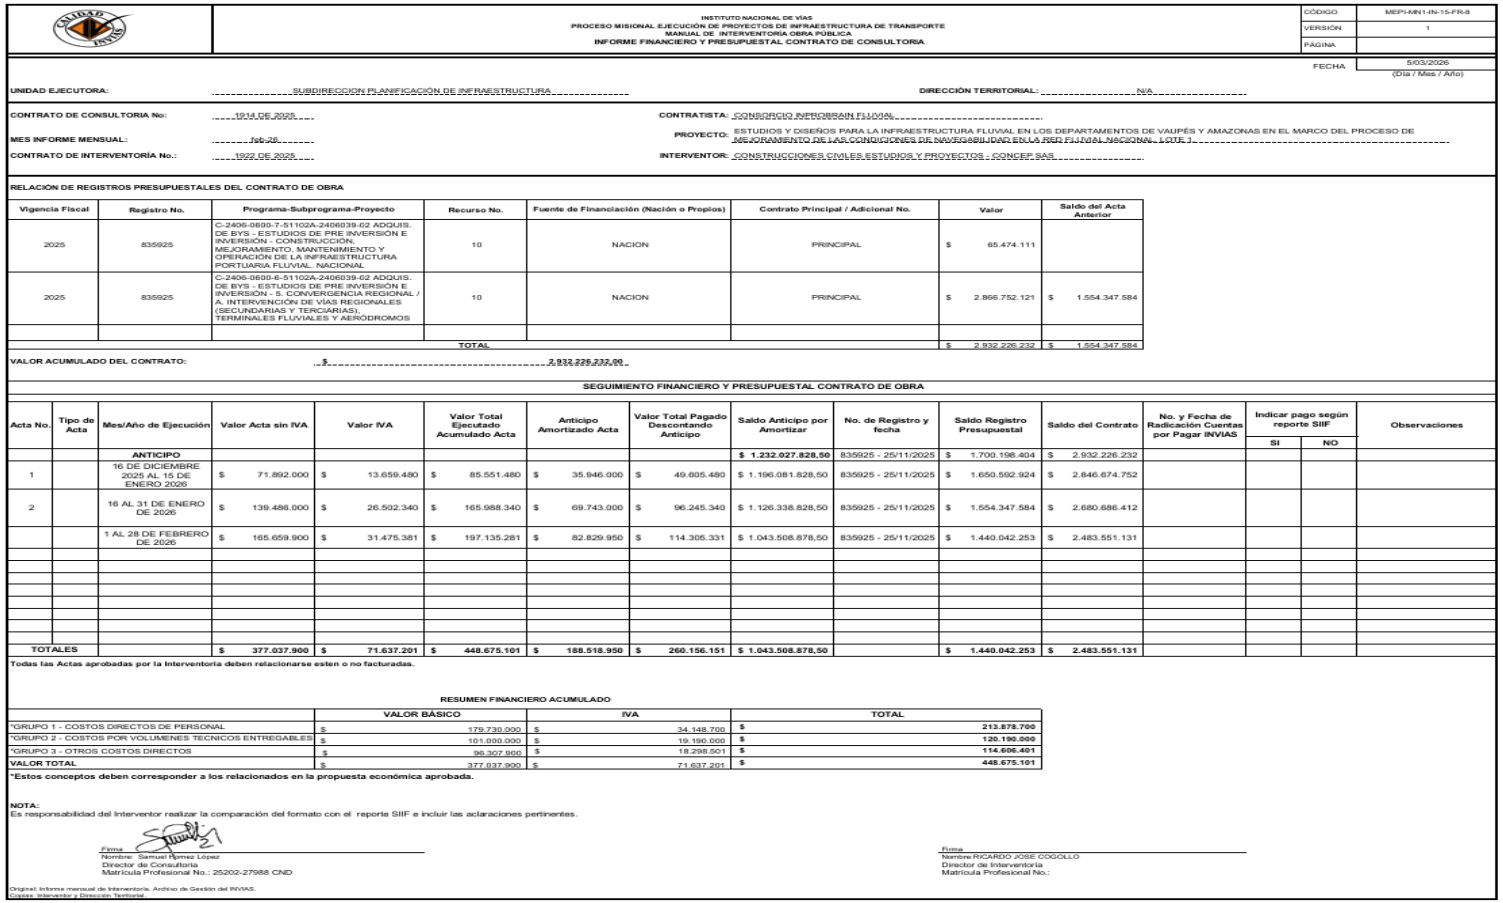

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES INFORME MENSUAL: feb-26 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL - LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	835925	C-2406-0800-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 65.474.111	
2025	835925	C-2406-0800-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCION DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	NACION	PRINCIPAL	$ 2.866.752.121	$ 1.554.347.584
				TOTAL		$ 2.932.226.232	$ 1.554.347.584

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.932.226.232,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO						$ 1.232.027.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.700.198.404	$ 2.932.226.232				
1		16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	$ 71.892.000	$ 13.659.480	$ 85.551.480	$ 35.946.000	$ 49.605.480	$ 1.196.081.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.650.592.924	$ 2.846.674.752				
2		16 AL 31 DE ENERO DE 2026	$ 139.486.000	$ 26.502.340	$ 165.988.340	$ 69.743.000	$ 96.245.340	$ 1.126.338.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.554.347.584	$ 2.680.686.412				
		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 165.659.900	$ 31.475.381	$ 197.135.281	$ 82.829.950	$ 114.305.331	$ 1.043.508.878,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.440.042.253	$ 2.483.551.131				
TOTALES			$ 377.037.900	$ 71.637.201	$ 448.675.101	$ 188.518.950	$ 260.156.151	$ 1.043.508.878,50		$ 1.440.042.253	$ 2.483.551.131				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 179.730.000	$ 34.148.700	$ 213.878.700
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 101.000.000	$ 19.190.000	$ 120.190.000
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 96.307.900	$ 18.298.501	$ 114.606.401
VALOR TOTAL	$ 377.037.900	$ 71.637.201	$ 448.675.101

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Samuel Gomez Lopez
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre:RICARDO JOSE COGOLLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 2.

Figura 43. Informe financiero lote 2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/03/26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N.A.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1915 DE 2025 **CONTRATISTA CONSULTOR:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	1098324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 43.187.756,00	
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 1.890.954.926,00	
			TOTAL			$ 1.934.142.682,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.934.142.682,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	**$ 812.664.992,50**						834125 del 28/11/2025	**$ 1.121.477.689,50**	**$ 1.934.142.682,00**				**ANTICIPO**
1	C	16 al 31 de Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.664.992,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.121.477.689,50	$ 1.934.142.682,00				
2	C	1 al 31 de enero de 2026	$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,00	$ 157.194.692,00	$ 66.050.000,00	$ 91.144.692,00	$ 746.614.992,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.030.332.997,50	$ 1.776.947.990,00				
3	C	1 al 28 de febrero de 2026	$ 113.461.300,00	$ 21.557.647,00	$ 292.213.639,00	$ 56.740.000,00	$ 78.278.947,00	$ 689.874.992,50	834125 del 28/11/2025	$ 952.054.050,50	$ 1.641.929.043,00				
TOTALES			**$ 245.557.680,00**	**$ 46.655.959,00**	**$ 292.213.639,00**	**$ 122.790.000,00**	**$ 169.423.639,00**	**$ 689.874.992,50**		**$ 952.054.050,50**	**$ 1.641.929.043,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1	$ 43.717.800,00	$ 8.306.382,00	**$ 52.024.182,00**
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES - Grupo 2	$ 51.300.000,00	$ 9.747.000,00	**$ 61.047.000,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 18.443.500,00	$ 3.504.265,00	**$ 21.947.765,00**
*			
VALOR TOTAL	**$ 113.461.300,00**	**$ 21.557.647,00**	**$ 135.018.947,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SILVERIO FARÍAS MENDOZA
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 11998 CND

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Lote 3.

Figura 44 Informe financiero lote 3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CENTRAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1892-2025 — **CONSULTOR** CONSORCIO VIA FLUVIAL

MES INFORME MENSUAL: PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 — **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1957-2025 — **INTERVENTORÍA** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	834225	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 41.534.997,00	$ 41.534.997,00
2025	834225	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 1.818.589.685,00	$ 1.037.024.692,50
			TOTAL			$ 1.860.124.682,00	$ 1.078.559.689,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.860.124.682

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 781.564.992,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	834225 de 28/11/2025	$ 1.078.559.690	$ 1.860.124.682,00				ANTICIPO
1	C	16 al 31 de diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	834225 de 28/11/2025	$ 1.078.559.689,50	$ 1.860.124.682,00				
2	C	01 al 31 de enero de 2026	$ 88.725.800	$ 16.857.902	$ 105.583.702	$ 44.362.900	$ 61.220.802	$ 720.344.191	834225 de 28/11/2025	$ 1.017.338.888	$ 1.754.540.980				
3	C	01 al 28 de febrero de 2026	$ 425.544.324	$ 80.853.422	$ 506.397.746	$ 212.772.162	$ 293.625.584	$ 487.939.409	834225 de 28/11/2025	$ 784.934.106	$ 1.248.143.234				
TOTALES			$ 514.270.124,00	$ 97.711.324,00	$ 611.981.448,00	$ 257.135.062,00	$ 354.846.386,00	$ 487.939.408,50		$ 784.934.105,50	$ 1.248.143.234,00				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - GRUPO 1	$ 59.293.800	$ 11.265.822	$ 70.559.622
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES - GRUPO 2	$ -	$ -	$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 366.250.524	$ 69.587.600	$ 435.838.124
VALOR TOTAL	$ 425.544.324	$ 80.853.422	$ 506.397.746

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.


Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Via Fluvial
Contratista

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Concep S.A.S.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 45 Informe financiero lote 4.

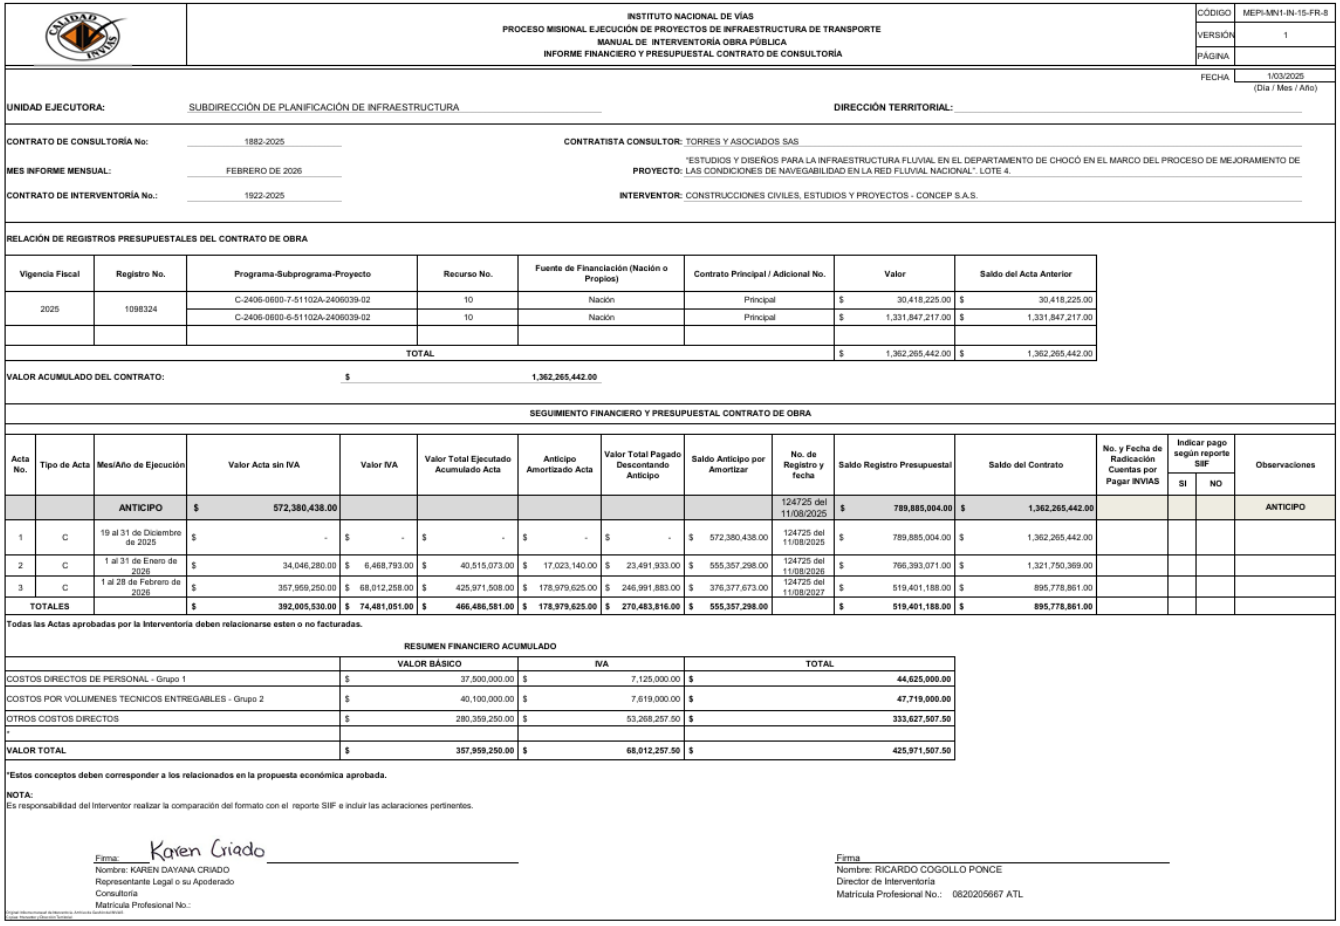

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1882-2025 — **CONTRATISTA CONSULTOR:** TORRES Y ASOCIADOS SAS

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 — **PROYECTO:** "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922-2025 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	1098324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 30,418,225.00	$ 30,418,225.00
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 1,331,847,217.00	$ 1,331,847,217.00
TOTAL						$ 1,362,265,442.00	$ 1,362,265,442.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,362,265,442.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 572,380,438.00						124725 del 11/08/2025	$ 789,885,004.00	$ 1,362,265,442.00				ANTICIPO
1	C	19 al 31 de Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 572,380,438.00	124725 del 11/08/2025	$ 789,885,004.00	$ 1,362,265,442.00				
2	C	1 al 31 de Enero de 2026	$ 34,046,280.00	$ 6,468,793.00	$ 40,515,073.00	$ 17,023,140.00	$ 23,491,933.00	$ 555,357,298.00	124725 del 11/08/2026	$ 766,393,071.00	$ 1,321,750,369.00				
3	C	1 al 28 de Febrero de 2026	$ 357,959,250.00	$ 68,012,258.00	$ 425,971,508.00	$ 178,979,625.00	$ 246,991,883.00	$ 376,377,673.00	124725 del 11/08/2027	$ 519,401,188.00	$ 895,778,861.00				
TOTALES			$ 392,005,530.00	$ 74,481,051.00	$ 466,486,581.00	$ 178,979,625.00	$ 270,483,816.00	$ 555,357,298.00		$ 519,401,188.00	$ 895,778,861.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1	$ 37,500,000.00	$ 7,125,000.00	$ 44,625,000.00
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES - Grupo 2	$ 40,100,000.00	$ 7,619,000.00	$ 47,719,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 280,359,250.00	$ 53,268,257.50	$ 333,627,507.50
-			
VALOR TOTAL	$ 357,959,250.00	$ 68,012,257.50	$ 425,971,507.50

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Karen Criado
Nombre: KAREN DAYANA CRIADO
Representante Legal o su Apoderado
Consultoria
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Lote 5.

Figura 46 Informe financiero lote 5.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO MNF
MES INFORME MENSUAL: 1 - 28 FEBRERO/26
CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO
SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2025	124725	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 1.248.662.091,00
2025	124725	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 28.518.351,00
				TOTAL			$ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.277.180.442,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 124725	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 536.630.438		$ 536.630.438	$ -	$ -	No. 124725	$ 712.031.653						
1		16- 31 DIC/25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No. 124725	$ 740.550.004	$ -	$ 1.277.180.442,00		X		
2		1- 31 ENE/26	$ 93.197.800,00	$ 17.707.582,00	$ 110.905.382,00	$ 46.598.900,00	$ 490.031.538,00	No. 124725	$ 676.243.522	$ -	$ 1.166.275.060,00		X		
3		1- 28 FEB/26	$ 236.615.800,00	$ 44.957.002,00	$ 281.572.802,00	$ 118.307.900,00	$ 418.322.538,00	No. 124725	$ 512.978.620	$ -	$ 884.702.258,00		X		
TOTALES			**$ 329.813.600,00**	**$ 62.664.584,00**	**$ 392.478.184,00**	**$ 164.906.800,00**	**$ 418.322.538,00**		**$ 512.978.620**	**$ -**	**$ 884.702.258,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	75.603.600,00	14.364.684,00	89.968.284,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES	38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00
GRUPO 3- OTROS COSTOS DIRECTOS	215.610.000,00	40.965.900,00	256.575.900,00
VALOR TOTAL	**$ 329.813.600,00**	**$ 62.664.584,00**	**392.478.184,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **JOSE EUSEBIO DE LA HOZ**
Director de Consultoria
Matrícula No.: 0820221777 ATL

Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matrícula Profesional: 082-0205667 ATL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 6.

Figura 47 Informe financiero lote 6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.: 1922 -2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 2 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1968 - 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 913,632,210	$ 868,511,201
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 20,866,560	$ -
TOTAL						$ 934,498,770	$ 868,511,201

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 934,498,770

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								837525 DE 2025-12-1	$ 868,511,201	$ 868,511,201		
1	DIC/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		837525 DE 2025-12-1	$ 868,511,201	$ 868,511,201		
2	ENE/2026	$ 55,451,739	$ 10,535,830	$ 65,987,569	$ -			837525 DE 2025-12-1	$ 802,523,632	$ 802,523,632		
3	FEB/2026	$ 53,597,042	$ 10,183,438	$ 63,780,480	$ -			837525 DE 2025-12-1	$ 738,743,152	$ 738,743,152		
TOTALES		$ 109,048,781.00	$ 20,719,268.00	$ 129,768,049.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 738,743,152	$ 738,743,152		

Todas las Actas aprobadas por el interventori del Contrato de consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 37,500,000.00	$ 7,125,000.00	$ 44,625,000.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES		$ -	$ -
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 16,097,042.00	$ 3,058,438.00	$ 19,155,480.00
VALOR TOTAL	**$ 53,597,042.00**	$ 10,183,438.00	**$ 63,780,480.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Martha Liliana De Hoyos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. Estado general del Tiempo

Lote 1.

Figura 48 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1957 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				560
Lluvias moderadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				112
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.: 25202-099284 CND

Firma
Nombre:
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 3.

Figura 49 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1957 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				560
Lluvias moderadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				112
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Firma
Nombre: LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.: 25202-099284 CND

Firma
Nombre:
Profesional Ingeniero Residente de Campo y Estudios
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 50 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 4.

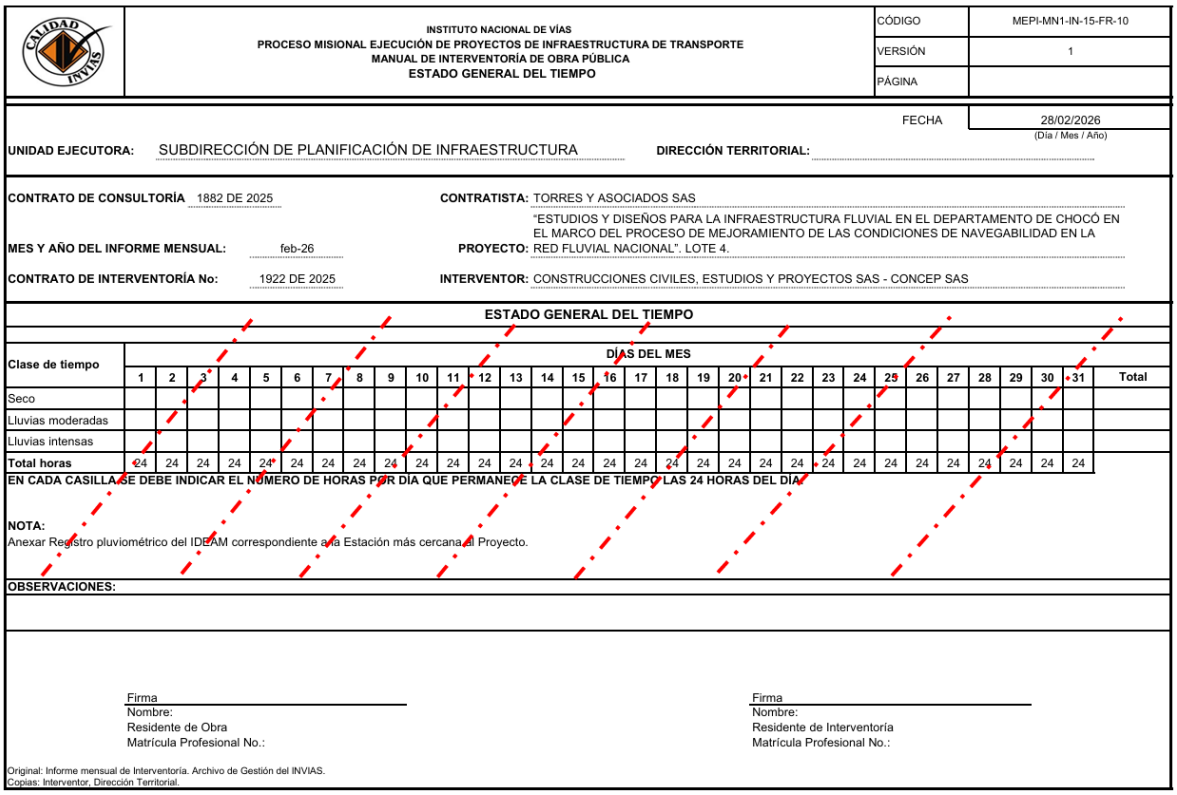

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1882 DE 2025
CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS SAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26
PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 5.

Figura 51 Formato MEPI-MN1-IN-15FR-10 Estado General del Tiempo, LOTE 5.

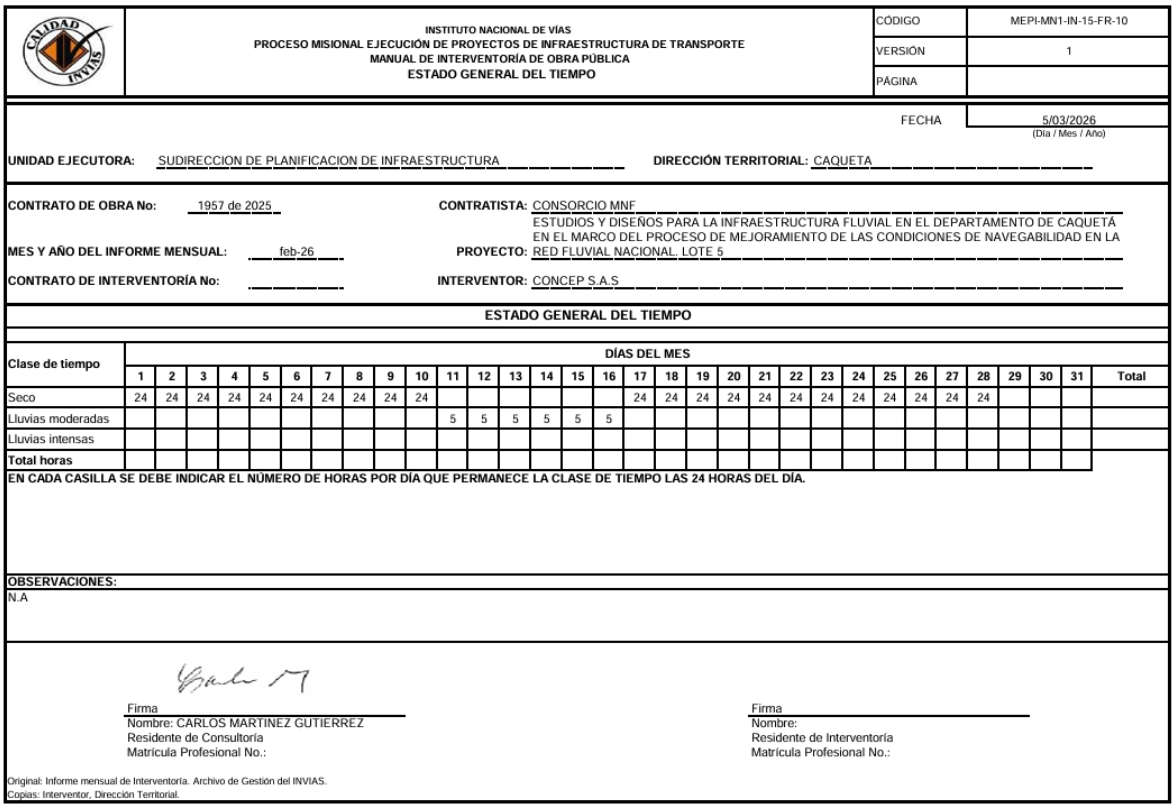

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26

PROYECTO: RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

INTERVENTOR: CONCEP S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
Lluvias moderadas											5	5	5	5	5	5																
Lluvias intensas																																
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

N.A

Firma
Nombre: CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. Resumen Ensayos de laboratorio

Lote 1.

Figura 52 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1914 DE 2026 — CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE CONSULTORIA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Durante este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.


Firma
Nombre: Samuel Homez López
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 53 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 4.

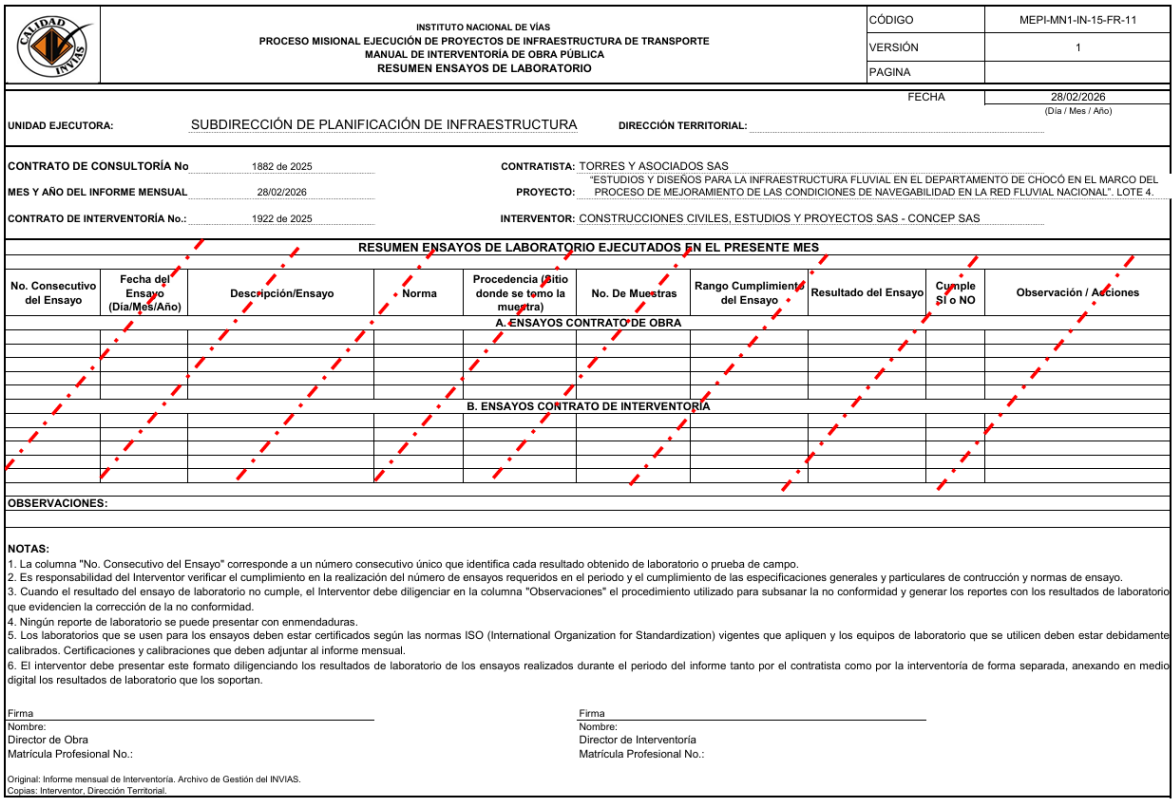

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	28/02/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1882 de 2025 — CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL 28/02/2026 — PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Lote 5.

Figura 54 Formato MEPI-MN1-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio. LOTE 5.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO CONSULTORIA No.: 1957 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MNF

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:** CONCEP SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
NO APLICA PARA ESTE PERIODO									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PERIODO

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JOSE DE LA HOZ DE CASTRO
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No. 08202094917 ATL

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082-0205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 actualizado.

Lote 1.

Figura 55 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.932.226.232,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.932.226.232,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24	11	2025	31	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24	11	2025	30	6	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Clausula vigesima primera paragrafo primero:
"Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría"

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 2.

Figura 56 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA:

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1915 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.934.142.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	16 12 2025	1/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	16 12 2025	1/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	16 12 2025	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	31 12 2025	31 12 2030
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	29	12	2025	15/11/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	29	12	2025	15/11/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	29	12	2025	15	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	15	5	2026	15	5	2031
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: **Ricardo Cogollo Ponce**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820205667ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 3.

Figura 57 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.

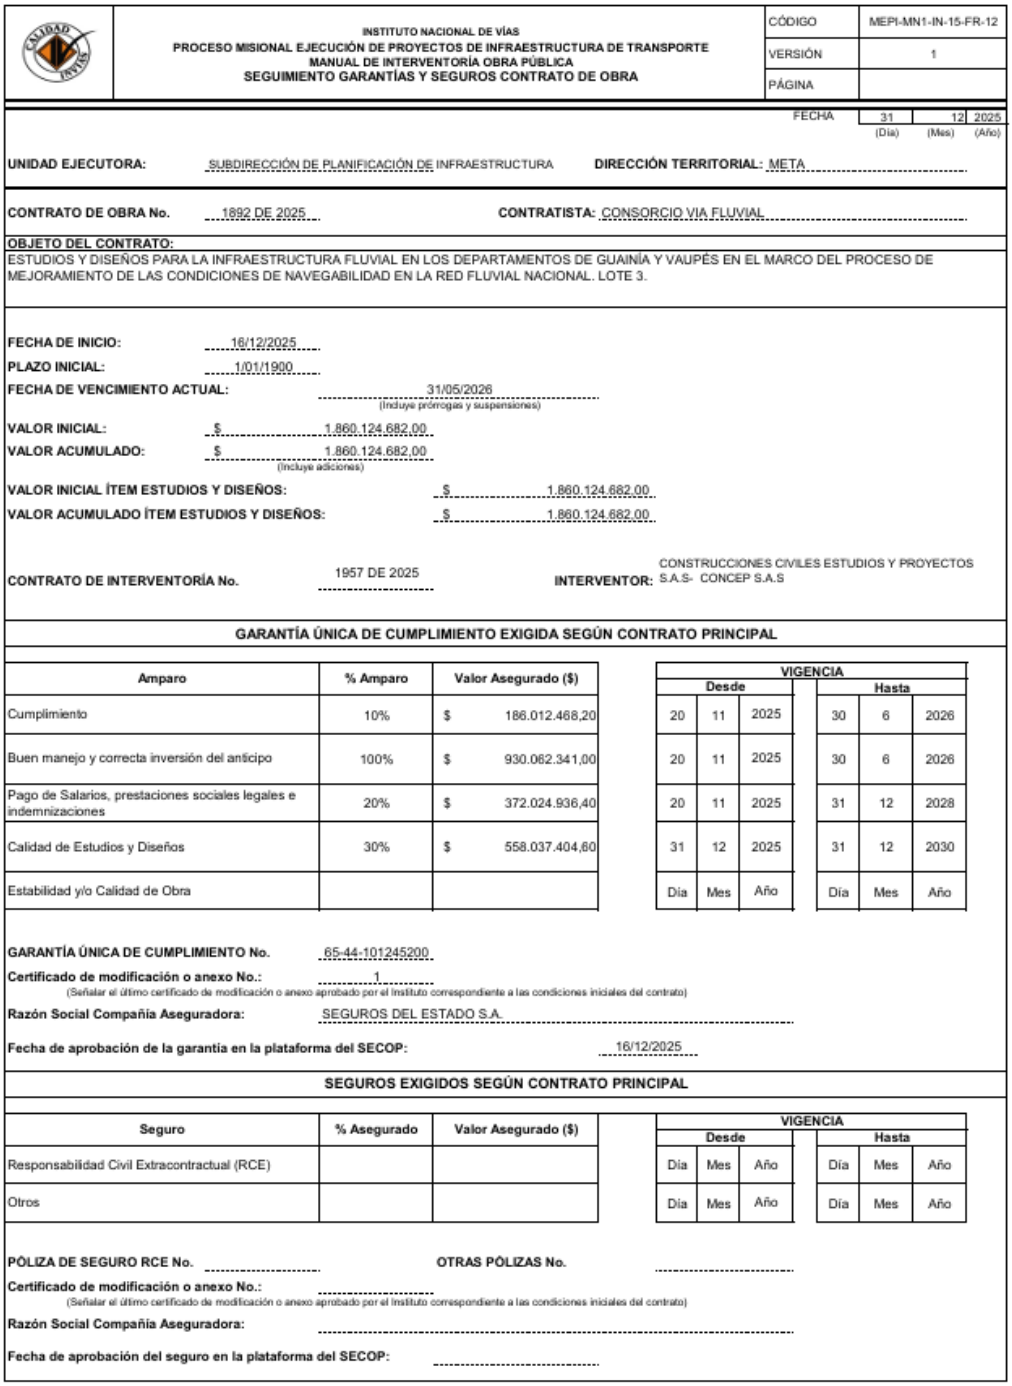

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 1/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.860.124.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S- CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20 / 11 / 2025	30 / 11 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20 / 11 / 2025	30 / 11 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20 / 11 / 2025	31 / 5 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal
Consultoria
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Delegado
Interventor:
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 58 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1882 de 2025

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

Control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1882 de 2025, Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el Departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 4.

FECHA DE INICIO: 19/12/2025

PLAZO INICIAL: 4,5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,362,265,442.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,362,265,442.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES PADRON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 681,132,721.00	20	11	2025	20	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad del servicio	30%	$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 136,226,544.20	20	11	2025	19	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 681,132,721.00	20	11	2025	19	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 272,453,088.40	20	11	2025	19	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 408,679,632.60	31	12	2025	19	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:082-02-05667 ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 5.

Figura 59 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) / 2 (Mes) / 26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1957 de 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MNF

OBJETO DEL CONTRATO:

Estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.277.180.442,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27	11	2025	30/06/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27	11	2025	30/06/2026		
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27	11	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101141984

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/12/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 26 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27	11	2025	31/10/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27	11	2025	31/10/2026		
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27	11	2025	31	4	2029
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31	12	2025	31	12	2030

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La presente se encuentra ajustada según la Prorroga No. 1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Ricardo Cogollo P.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082-02-05667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 6.

Figura 60 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1968 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 0.6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	1	7	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	1	7	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	31	12	30
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	30	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	30	10	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	30	4	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205

Certificado de modificación o anexo No.:2 .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	n/a							
Otros	n/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No aplica para el presente periodo

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de consultoría.

4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones

4.9.3. Actas de comité y reunión

En el presente período se realizaron las siguientes reuniones o comités de obra:

Tabla 20 Reuniones o comités de obra periodo febrero.

Fecha	***Lotes***	***Concepto***
02/02/2026	1,2 y 3	Reunión de seguimiento
03/02/2026	5 y 6	Reunión de seguimiento
03/02/2026	2	Reunión de geotecnia
03/02/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento
04/02/2026	5	Reunión Componente Hidráulico
04/02/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento
05/02/2026	5	Revisión Actas de Costos 1 y 2
09/02/2026	1 al 6	Reunión de seguimiento
09/02/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento
11/02/2026	4	Reunión Anticipo
13/02/2026	3	Revisión Actas de Costos
18/02/2026	Interventoría	Reunión Presencial de Seguimiento
18/02/2026	4	Reunión Presencial de Seguimiento
19/02/2026	1,2,3,5 y 6	Reunión Presencial de Seguimiento
20/02/2026	2	Reunión de geotecnia
23/02/2026	Interventoría	Reunión Necesidades de Muelles – Marítima y Fluvial
24/02/2026	Interventoría	Reunión de seguimiento Compromisos Establecidos Mesa de Seguimiento

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

En la Tabla 21 se presenta la información básica del Contrato de Interventoría.

Tabla 21 Información del contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	No. 1922 de 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16-12-2025
Objeto del contrato	Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Contratista	Construcciones civiles estudios y proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato	$ 3.940.965.840,oo
Anticipo	$ 662.347.200
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	Del 01 enero de 2026 al 30 de junio 26
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Supervisor de contrato	Patricia Morales Padrón
VALOR EJECUTADO A 28 DE FEBRERO 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 826.420.536,65

% Ejecutado	20.97 %

Fuente: Propia

En la Tabla 22 se relaciona el personal presentado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS para ejecutar el proyecto INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

Tabla 22 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS

No.	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Ricardo Cogollo Ponce
2	Especialista portuario	Layton Gonzalez rubio Merritt
3	Especialista en hidráulica e hidrología	Bladimir Salcedo
4	Ingeniero residente de campo	Pedro González Cabrera
5	Geólogo	Claudia Ramírez
6	Especialista en geotecnia	José Guardo García
7	Especialista estructural	Armando Balza
8	Especialista en tránsito y transporte	Euclides Llach
9	Especialista en evaluación económica de proyectos	María Eulalia Arteta
10	Profesional en costos y presupuesto	Oscar Londoño Higgins
11	Economista ambiental	Juan José Vargas
12	Profesional en Arqueología	Wilhen Londoño
13	Ingeniero Forestal	Serafín Benavides
14	Ingeniero Ambiental	Faurid Escobar
15	Profesional Técnico-predial	Angie Sánchez
16	Profesional Jurídico predial	Cristian Hernández
17	Ingeniero Naval	Jairo Alberto Arteta Goenaga

Fuente: Propia

Table 23 Relación equipos de la Interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de Cómputo, impresora, Plotter	1
Equipo de comunicación	1

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026:

5.3. Informes de especialistas y profesionales

En anexo, se presentan el informe del Director de Interventoría y de los Ingenieros de campo y estudios, y del ingeniero auxiliar. Durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Para el presente periodo No Aplica

5.5. Informe matriz de riesgos.

Para el presente periodo No Aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Figure 61 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-26 — **PROYECTO:** Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 — **INTERVENTORÍA:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. (CONCEP S.A.S.)

CONTRATO DE OBRA No. 1914-2025/1915-2025/1892-2025/1882-2025/1957-2025/1968-2025 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL/ CONSORCIO NAVEGABILIDAD/CONSORCIO VIA FLUVIAL/ TORRES Y ASOCIADOS SAS /CONSORCIO MNF/CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	N/A																														

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Ricardo Cogollo Ponce
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL


Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07

Figura 62 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

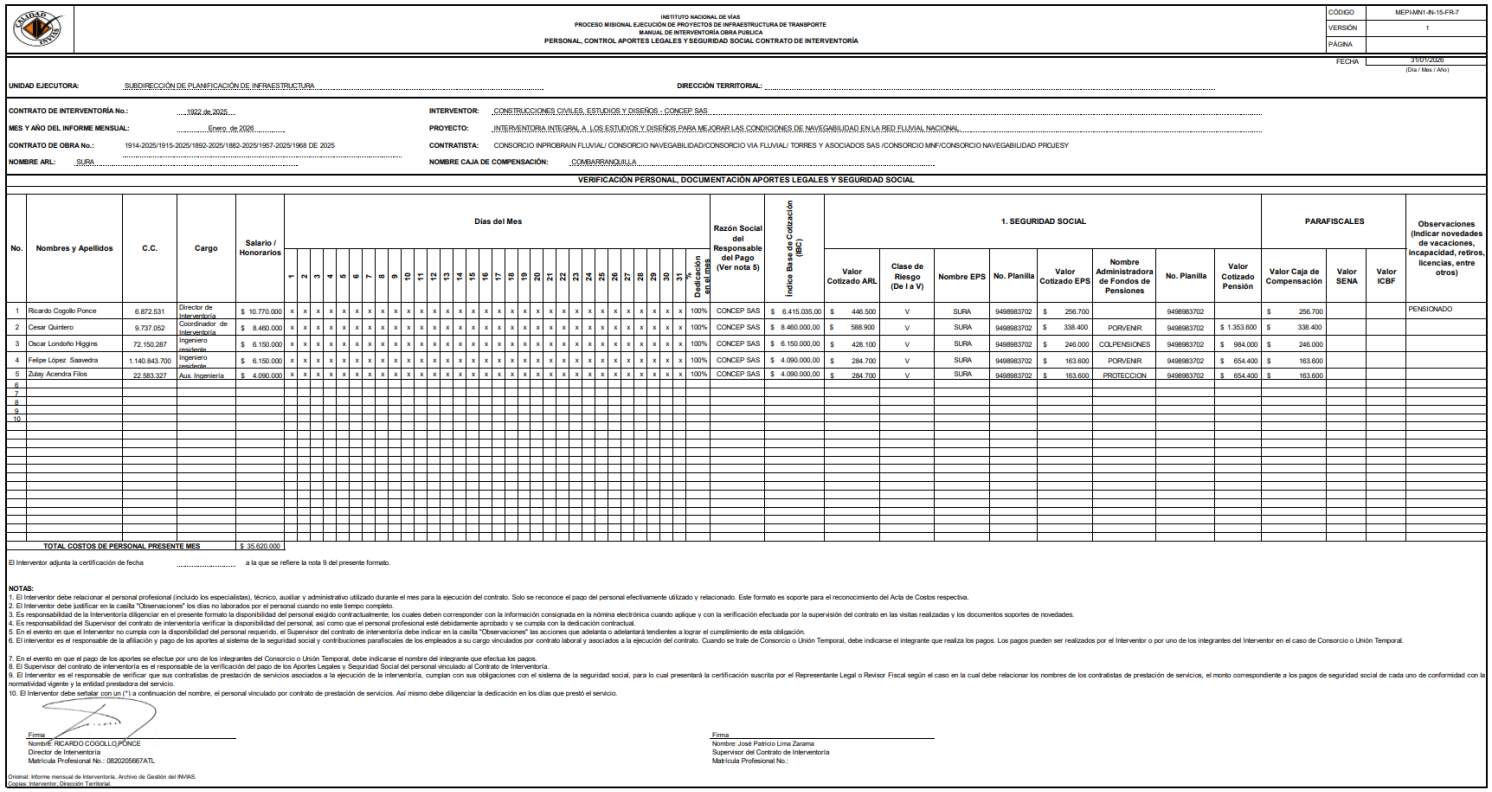

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Enero de 2026 — PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
CONTRATO DE OBRA No.: 1914-2025/1915-2025/1892-2025/1882-2025/1957-2025/1968 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INFROBRAIN FLUVIAL/ CONSORCIO NAVEGABILIDAD/CONSORCIO VIA FLUVIAL/ TORRES Y ASOCIADOS SAS /CONSORCIO MNF/CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
NOMBRE ARL: SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMBARRANQUILLA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Ricardo Cogollo Ponce	6.872.531	Director de Interventoría	$ 10.770.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	CONCEP SAS	$ 6.415.035,00	$ 446.500	V	SURA	949893702	$ 256.700		949893702		$ 256.700			PENSIONADO
2	Cesar Quintero	9.737.052	Coordinador de Interventoría	$ 8.460.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	CONCEP SAS	$ 8.460.000,00	$ 588.900	V	SURA	949893702	$ 338.400	PORVENIR	949893702	$ 1.353.600	$ 338.400			
3	Oscar Londoño Higgins	72.150.287	Ingeniero residente.	$ 6.150.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	CONCEP SAS	$ 6.150.000,00	$ 428.100	V	SURA	949893702	$ 246.000	COLPENSIONES	949893702	$ 984.000	$ 246.000			
4	Felipe López Saavedra	1.140.843.706	Ingeniero residente.	$ 6.150.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	CONCEP SAS	$ 4.090.000,00	$ 284.700	V	SURA	949893702	$ 163.600	PORVENIR	949893702	$ 654.400	$ 163.600			
5	Zuley Acendra Filos	22.583.327	Aux. Ingeniería	$ 4.090.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	CONCEP SAS	$ 4.090.000,00	$ 284.700	V	SURA	949893702	$ 163.600	PROTECCION	949893702	$ 654.400	$ 163.600			
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 35.620.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: José Patricio Lima Zarama
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Figura 63 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922-2025

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

MES INFORME MENSUAL: 16 al 31 de enero de 2026

PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No: 1914-2025/1915-2025/1892-2025/1882-2025/1957-2025/1968-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL/ CONSORCIO NAVEGABILIDAD/CONSORCIO VIA FLUVIAL/ TORRES Y ASOCIADOS SAS /CONSORCIO MNE/CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837325	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 70.000.000	$ 70.000.000
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.870.965.840	$ 3.870.965.840
			TOTAL			$ 3.940.965.840	$ 3.940.965.840

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.940.965.840

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo		$ 1.655.868.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.655.868.000,00	837325 del 01/12/2025	$ 2.285.097.840,00	$ 3.940.965.840,00		
1	16/12/2025 al 15/01/2026	$ 52.864.200,80	$ 10.044.198,15	$ 62.908.398,95	$ 26.432.100,40	$ 36.476.298,55	$ 1.629.435.899,60	837325 del 01/12/2025	$ 2.248.621.541,45	$ 3.878.057.441,05		
2	16/01/2026 al 31/01/2026	$ 202.207.700,00	$ 38.419.463,00	$ 240.627.163,00	$ 101.103.850,00	$ 139.523.313,00	$ 1.528.332.049,60	837325 del 01/12/2025	$ 2.109.098.228,45	$ 3.637.430.278,05		
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	TOTALES	$ 255.071.900,80	$ 48.463.661,15	$ 303.535.561,95	$ 127.535.950,40	$ 175.999.611,55	$ 1.528.332.049,60		$ 2.109.098.228,45	$ 3.637.430.278,05		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 102.855.100,80	$ 19.542.469,15	$ 122.397.569,95
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 147.900.000,00	$ 28.101.000,00	$ 176.001.000,00
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.316.800,00	$ 820.192,00	$ 5.136.992,00
VALOR TOTAL	**$ 255.071.900,80**	**$ 48.463.661,15**	**$ 303.535.561,95**

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: RICARDO COCOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padrón
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820544602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 actualizado.

Figura 64 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-13 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.940.965.840,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.940.965.840,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Patricia Ines Morales Padron

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	21	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	21	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	21	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	31	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	30	6	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Para el presente periodo No Aplica


6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de Interventoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1

A continuación, se presenta el formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 plan de inversión del anticipo.

Figura 65 El formato MEPI-MN-IN-3-FR-1, seguimiento a la inversión del anticipo

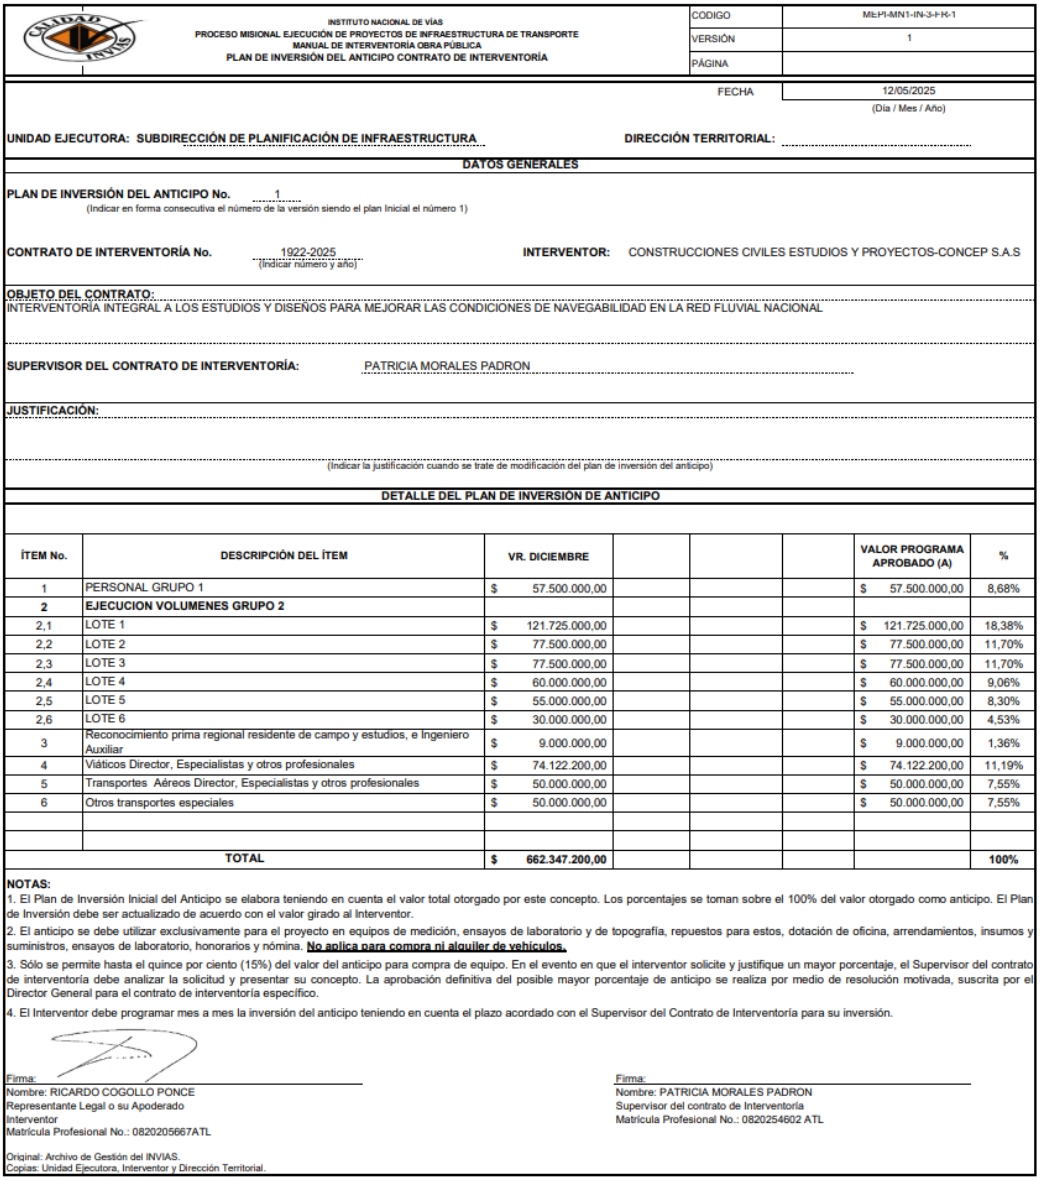

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922-2025 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS-CONCEP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA MORALES PADRON

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. DICIEMBRE				VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL GRUPO 1	$ 57.500.000,00				$ 57.500.000,00	8,68%
2	**EJECUCION VOLUMENES GRUPO 2**						
2,1	LOTE 1	$ 121.725.000,00				$ 121.725.000,00	18,38%
2,2	LOTE 2	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2,3	LOTE 3	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2,4	LOTE 4	$ 60.000.000,00				$ 60.000.000,00	9,06%
2,5	LOTE 5	$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	8,30%
2,6	LOTE 6	$ 30.000.000,00				$ 30.000.000,00	4,53%
3	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 9.000.000,00				$ 9.000.000,00	1,36%
4	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 74.122.200,00				$ 74.122.200,00	11,19%
5	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,55%
6	Otros transportes especiales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,55%
	TOTAL	**$ 662.347.200,00**					**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma:
Nombre: PATRICIA MORALES PADRON
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, no aplica para el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período objeto de seguimiento del 01 al 28 de febrero de 2026, la interventoría ejerció sus funciones de control técnico, administrativo y contractual, garantizando la supervisión continua sobre la ejecución de los contratos de Consultoría correspondientes a los Lotes 1 al 6.
- Se evidencian retrasos en la ejecución de los Lotes 1, 2, 4 y 6, siendo más significativos en los Lotes 2 y 4, lo cual pone de manifiesto debilidades en la planeación, gestión de actividades y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los consultores.
- Los Lotes 3 y 5 presentan avances acordes con la programación establecida, reflejando un adecuado desarrollo técnico y cumplimiento de los compromisos contractuales.
- Se identifican incumplimientos recurrentes en la entrega oportuna de informes, volúmenes técnicos y actas de costos, generando reprocesos y la necesidad de reiteradas devoluciones con observaciones por parte de la interventoría.
- Se observan deficiencias en la estructuración, actualización y coherencia de los cronogramas de trabajo, así como limitaciones en la planificación de actividades de socialización y coordinación en campo.
- Persisten dificultades en la gestión de comunicaciones y en la entrega de información requerida, incluyendo casos de remisión incompleta o tardía de documentación por parte de algunos consultores.

La Interventoría recomienda lo siguiente:

- Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento contractual, mediante la implementación de acciones formales frente a los incumplimientos identificados, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales.
- Requerir de manera prioritaria el cumplimiento de los entregables pendientes y vencidos, en especial aquellos relacionados con volúmenes técnicos, informes y actas de costos, a fin de evitar afectaciones en la ejecución general del proyecto.
- Exigir la actualización y ajuste de los cronogramas de trabajo, garantizando su coherencia, integralidad y alineación con las actividades efectivamente ejecutadas y programadas.
- Intensificar los espacios de seguimiento técnico con los consultores que presentan mayores niveles de atraso, estableciendo compromisos claros, medibles y con plazos definidos.
- Optimizar los procesos de comunicación y articulación entre las partes, promoviendo la claridad en los requerimientos técnicos y la calidad en la información suministrada.

- Garantizar la adecuada trazabilidad de las observaciones emitidas por la interventoría, mediante su registro formal y sistemático, como soporte para la gestión contractual.
- Fortalecer la planificación y ejecución de las actividades de socialización, asegurando la definición oportuna de cronogramas y la disponibilidad previa de los insumos requeridos.

Durante el presente periodo la Interventoría presentó cuatro (4) informes semanales que se relacionan a continuación:

Tabla 24 listado informes semanales de Interventoría para el período comprendido del 1 de febrero al 28 de febrero

Lote No.	**1 al 6**
No. Semana	Periodo
8	Del 30/01/2026 al 05/02/2026
9	Del 06/02/2026 al 12/02/2026
10	Del 13/02/2026 al 19/02/2026
11	Del 20/02/2026 al 26/02/2026

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2026.

Lote 1

Anexo 1 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1.

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
CIF-OP-2025-1914-055	2/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-015-2026 - Solicitud de datos profesionales.
CIF-OP-2025-1914-056	2/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de autorización de viáticos para el residente de campo y especialistas LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-057	2/02/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No. 7 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-058	3/02/2026	CONCEP SAS	Remisión informe mensual No.2 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-059	3/02/2026	CONCEP SAS	Remisión acta de costos No.2 Consultoría -Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-060	5/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de documentación para socialización con la
CIF-OP-2025-1914-068	9/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta comunicado II-871-L1021-2026 - Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-060 - Remisión documentos socialización con la comunidad.
CIF-OP-2025-1914-069	9/02/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No.8 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-070	11/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta comunicación II-871-L1-022-2026 - Respuesta oficio CIF-OP-1914-068 Remisión documentos socialización con la
CIF-OP-2025-1914-071	16/02/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No.9 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-072	17/02/2026	CONCEP SAS	Remisión cronograma de visitas Lote 1- Socializaciones iniciales.
CIF-OP-2025-1914-073	18/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de cotizaciones para adquisición de imágenes
CIF-OP-2025-1914-074	18/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de informes - Visitas de campo
CIF-OP-2025-1914-075	19/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de autorización de viáticos para el residente de campo y especialistas LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-076	19/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-024-2026 - Observaciones Acta de Costos No.1 y No.2, LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-077	20/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de documentos – Socialización inicial del proyecto
CIF-OP-2025-1914-078	20/02/2026	CONCEP SAS	Remisión del cronograma de visitas y actividades
CIF-OP-2025-1914-079	20/02/2026	Capitán Comunidad Buenos Aires	Invitación a socialización – Estudios y diseños para la construcción del muelle de Buenos
CIF-OP-2025-1914-080	20/02/2026	FERNANDO KALIMAN Capitán Comunidad La Victoria	Invitación a socialización – Estudios y diseños para la construcción del muelle de Victoria Pacoa
CIF-OP-2025-1914-081	20/02/2026	ANTONIO PATAPI Capitán Comunidad Mirití - Paraná	Invitación a socialización – Estudios y diseños para la construcción del muelle de Mirití - Paraná
CIF-OP-2025-1914-082	20/02/2026	FERMÍN CUÉLLAR Capitán Comunidad Yuruparí	Invitación a socialización – Estudios y diseños para la construcción del muelle Pucaron
CIF-OP-2025-1914-083	20/02/2026	HUMBERTO YUJUP MACUNA Capitán Comunidad Puerto Alegría	Invitación a socialización – Estudios y diseños para la construcción del muelle Puerto Taraira
CIF-OP-2025-1914-084	23/02/2026	CONCEP SAS	084. Remisión informe semanal No. 10 - Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-085	25/02/2026	CONCEP SAS	Remisión cotizaciones topografía y batimetría
CIF-OP-2025-1914-086	26/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-025-2026 - Observaciones Acta de Costos No.1 y No.2, LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-087	26/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de informe - Visitas de campo componente Hidráulico.

Página 1

Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1.

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L1-018	2/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-018-2026 Envió programación trabajos de campo. Lote 1
II-871-L1-019	5/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-019-2026 Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-059 Remisión acta de costos No 2 consultoría - Lote 1
II-871-L1-020	6/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud documentación - Lote 1
II-871-L1-021	6/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-060 Remisión documentación para socialización con la comunidad
II-871-L1-022	10/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta Oficio CIF-OP-2025-1914-068
II-871-L1-023	10/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud cronograma general actualizado
II-871-L1-024	10/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Observaciones Actas de costos No. 1 y No. 2
II-871-L1-025	13/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta Oficio CIF-OP-2025-1914-068
II-871-L1-026	23/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-075 - Lote 1
MAIL	23/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Remisión de cotizaciones para adquisicion de imágenes satelitales (solicitud tercera cotizacion)
II-871-L1-025	24/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	II-871-L1-025-2026 Observaciones Actas de costos No. 1 y No. 2 - Lote 1
II-871-L1-026	23/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-026-2026 Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-075 - Lote 1
II-871-L1-027	26/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	OFICIO II-871-L1-027-2026 Solicitud informe semanal No. 11 -
II-871-L1-029	27/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-029-2026 Respuesta comunicación CIF-OP-2025-1914-085 - Lote 1
II-871-L1-030	27/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-030-2026 Respuesta a la comunicación CIF-OP-2025-1914-086 - Lote 1
II-871-L1-031	28/02/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-030-2026 Respuesta a la comunicación CIF-OP-2025-1914-086 - Lote 1

Página 2

Lote 2

Anexo 3 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
CN-1915-2025-046	5/02/2026	CONCEP SAS	Entrega preliminar del Volumen VI correspondientes a los Hitos I, II y III
CN-1915-2025-047	6/02/2026	CONCEP SAS	Acercamiento preliminar y programación para socializacion inicial del proyecto
CN-1915-2025-048	6/02/2026	CONCEP SAS	Su oficio II-871-L2-021-2026 Remisión metodología componente geotécnico
CN-1915-2025-050	9/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de cambio de profesional auxiliar
CN-1915-2025-051	10/02/2026	CONCEP SAS	Su Oficio II-871-L2-024-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-048 - Lote 2
CN-1915-2025-052	11/02/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-052 Su Oficio II-871-L2-023-2026 Solicitud cronograma actualizado
CN-1915-2025-053	11/02/2026	CONCEP SAS	CN-1915-2025-053 Su Oficio II-871-L2-017-2026 Envío de programación trabajos de campo. Lote 2
CN-1915-2025-054	11/02/2026	CONCEP SAS	Informe Mensual de Consultoria No. 2
MAIL	12/02/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. resumen visita Especialista Hidraulico y presentacion
CN-1915-2025-055	13/02/2026	CONCEP SAS	Su Oficio II-871-L2-026-2026
CN-1915-2025-056	13/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta Oficio II-871-L2-018-2026 Remisión Volumen I ajustado para los Hitos I, II y III
CN-1915-2025-057	13/02/2026	CONCEP SAS	Volumen II. Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico – Hito III, sector de Cacahual.
CN-1915-2025-058	16/02/2026	CONCEP SAS	Remisión Informe Mensual de Consultoría No.1 Ajustado en atención al Oficio II-871-L2-028-2026.
CN-1915-2025-059	18/02/2026	CONCEP SAS	Su Oficio II-871-L2-023-2026 Solicitud cronograma actualizado – Lote 2.
CN-1915-2025-060	18/02/2026	CONCEP SAS	Presentación informe de resultado de aforos líquidos
MAIL	23/02/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. INFORME SEMANAL 10. 13 AL 19 DE FEBRERO
CN-1915-2025-061	23/02/2026	CONCEP SAS	Su Oficio II-871-L2-030-2026 Ajustes a presentación socialización
CN-1915-2025-062	23/02/2026	Grupo de Transporte Acuático	Suministro de informaciones de la base de datos del Registro Nacional Fluvial
CN-1915-2025-063	24/02/2026	CONCEP SAS	Volumen II. Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico – Hito III, sector de Cacahual.
CN-1915-2025-064	25/02/2026	CONCEP SAS	Presentación preliminar del Volumen III. Estudio de geología y geomorfología
CN-1915-2025-066	26/02/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-035-2026 Volumen VI, Hito 1, 2 y 3
CN-1915-2025-067	26/02/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-037-2026 Solicitud de Presentación metodología para el Volumen IV - Estudio de Geotecnia - Lote 2
CN-1915-2025-068	26/02/2026	CONCEP SAS	Consentimiento informado y Entrevista semiestructurada: gestión social y enfoque étnico-territorial
CN-1915-2025-069	26/02/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-040-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 2
MAIL	27/02/2026	CONCEP SAS	Ajuste metodologia de geotecnia (enviado por el consorcio oficio de diseños geotecnicos)

Página 1

Anexo 4 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
L2-017-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Entrega programación trabajos de ----- Lote 2
L2-018-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Observaciones Vol. 1
L2-019-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Envío de concepto geotécnico
L2-020-2026	5/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-020-2026 Oficio aprobación de metodologías 29-01-2026. Lote 2
L2-021-2026	5/02/2026	Consorcio Navegabilidad	oficio II-871-L2-021-2026 Remisión metodología componente geotécnico
L2-022-2026	6/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-022-2026 Solicitud documentación - Lote 2
L2-023-2026	10/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-023-2026 Solicitud Cronograma General Actualizado - Lote 2
L2-024-2026	10/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-024-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-048 - Lote 2
L2-025-2026	10/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-025-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-050. Solicitud de cambio de Profesional Auxiliar - Lote 2
L2-026-2026	13/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-026-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-051 y CN-1915-2025-052- Lote 2
L2-027-2026	13/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-027-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-054 - Lote 2
L2-028-2026	13/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-028-2026 Periodo del Informe Mensual No. 1 de Consultoría - Lote 2
L2-029-2026	16/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta E-mail 12-02-26 Informe Hidraulico - Lote 2
L2-030-2026	17/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Ajustes a presentación socialización - Lote 2
L2-031-2026	23/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-031-2026 Solicitud de datos crudos Topografía y Batimetría - Lote 2 (1)
L2-032	24/02/2026	Consorcio Navegabilidad	II-871-L2-032-2026 Presupuesto de Geotecnia. Lote 2
L2-033	24/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-033-2026 Aprobación Volumen I para Hito 1, Hito 2 y el Hito 3. Lote 2
L2-035	24/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-035-2026 Volumen VI, Hito 1,2 y 3
L2-036	25/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-036-2026 Observaciones al acta de costos No. 1 y No. 2 - Lote 2
L2-037	25/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-037-2026 Solicitud de Presentación metodología para el Volumen IV - Estudio de Geotecnia - Lote 2
L2-038	25/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-038-2026 Respuesta Oficio CN-1915-2025-062 - Lote 2
L2-039	26/02/2026	Consorcio Navegabilidad	OFICIO II-871-L2-039-2026 Observaciones al oficio CN-1915-2025-057 - Volumen II Estudio cartografico, topografico - hito III sector cacahual - Lote 2
L2-040	26/02/2026	Consorcio Navegabilidad	OFICIO II-871-L2-040-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 2
L2-041	27/02/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-041-2026 Respuesta oficio CN-1915-2025-066 - Lote 2

página 2

Lote 3

Anexo 5 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
MAIL	2/02/2026	CONCEP	Informe semanal No. 6
MAIL	3/02/2026	CONCEP	Punto de encuentro - VISITA MAPIRIPANA
FLU3-CE-019	4/02/2026	CONCEP	FLU3-CE-019-2026- Alcance Cronogramas V1 Hito I, II y III
MAIL	4/02/2026	CONCEP	Informe semanal No. 7
FLU3-CE-020	6/02/2026	CONCEP	Solicitud aprobación acta de modificación de costos.
FLU3-CE-021	6/02/2026	CONCEP	Remisión cronograma preliminar - visita tecnica, social y ambiental a Morichal y Papunaua
FLU3-CE-022	9/02/2026	CONCEP	Solicitud de plantilla para presentación actualizada de INVIAS par aorganización de reunion de uicio del contrato
MAIL	10/02/2026	CONCEP	Informe semanal No. 8
MAIL	11/02/2026	CONCEP	Informe mensuial No. 1 Diciembre
FLU3-CE-023	11/02/2026	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA	Solicitud del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Guaviare y estudios ambientales y socioeconómicos que existan de la zona de los Muelles de Mapiripana, Morichal y Papunahua.
FLU3-CE-024	12/02/2026	CONCEP	Alcance al comunicado FLUJ-CE-007-2026 del 9/01/2026 con el cual se radico la Metodología Volumen X GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
MAIL	12/02/2026	CONCEP	Información Ambiental OFICIOS Y SOPORTES PARA CONSULTA A ENTIDADES
MAIL	12/02/2026	CONCEP	Actas consultoria no. 1 y No. 2
FLU3-CE-025	13/02/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L3-026-2026, Documentos Lote 3 – Remisión Informes Mensuales Periodo 16 diciembre de 2025 – 31 de enero de 2026.
FLU3-CE-026	13/02/2026	CONCEP	Respuesta Oficio II-871-L3-026 y 030-2026, Documentos Lote 3 – Remisión Informe Mensual Periodo 16 diciembre de 2025 – 31 de enero de 2026.
MAIL	13/02/2026	CONCEP	Presentacion socialización inicial
MAIL	16/02/2026	CONCEP	Borrador de oficio, pieza divulgacion y formatos
MAIL	16/02/2026	INVIAS - CONCEP	RV: Borrador de oficio, pieza divulgacion y formatos
MAIL	16/02/2026	CONCEP	RV: FLU3-CE-021-2026 - Visita a Morichal - Papunaua
MAIL	16/02/2026	CONCEP	Re: FLU3-CE-020-2026- Acta de modificación de Costos
MAIL	17/02/2026	INVIAS - CONCEP	Fwd: Contrato 1892 de 2025 - Lote 3 - INT II-871-INT-019-2026 Remisión presentación socialización Lote 3
MAIL	17/02/2026	CONCEP	Solicitud especialista social
FLU3-CE-027	17/02/2026	MINISTERO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Consulta sobre la ubicación del Muelle Morichal en Reserva forestal y competencia ambiental.
FLU3-CE-028	17/02/2026	PARQUE NATURALES NACIONALES	Consulta sobre la ubicación del Muelle Morichal en Reserva forestal y competencia ambiental.
FLU3-CE-029	17/02/2026	MINISTERO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Consulta sobre la ubicación del Muelle Mapiripana en Reserva forestal y competencia ambiental.
FLU3-CE-030	17/02/2026	PARQUE NATURALES NACIONALES	Consulta sobre la ubicación del Muelle Mapiripana en Reserva forestal y competencia ambiental.
FLU3-CE-031	17/02/2026	MINISTERO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Consulta sobre la ubicación del Muelle Papanahua en Reserva forestal y competencia ambiental.
FLU3-CE-032	17/02/2026	PARQUE NATURALES NACIONALES	Consulta sobre la ubicación del Muelle Papanahua en Reserva forestal y competencia ambiental.
MAIL	18/02/2026	CONCEP	RE: FLU3-CE-021-2026- Visita a Morichal - Papunaua
MAIL	18/02/2026	CONCEP	LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DIA 19/02/2026
MAIL	19/02/2026	CONCEP	Borrador de oficio, pieza divulgacion y formatos
MAIL	19/02/2026	CONCEP	informe Semanal No. 9
MAIL	22/02/2026	CONCEP	Actas de consultoria No. 1 y No. 2
MAIL	23/02/2026	CONCEP	informe semanal No. 10
MAIL	24/02/2026	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA	Respuesta a Solicitud del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA)
MAIL	27/02/2026	CONCEP	Re: Contrato 1892 de 2025 - Lote 3 - OFICIO II-871-L3-034-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 3

Página 1

Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	**FECHA**	**ENVIADO A:**	**CONCEPTO**
II-871-L3-009	19/01/2026	INVIAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL
II-871-L3-010	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-010-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-010-2026 Remisión hojas de vida No 05
II-871-L3-011	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-011-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-012-2026 Remisión Hojas de Vida No. 06 LOTE 3
II-871-L3-011	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-011-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-010-2026 Remisión Hojas de Vida No. 05 LOTE 3
II-871-L3-012	21,/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Respuesta oficio FLU3-CE-013-2026 Visita a Mapiripana LOTE 3
II-871-L3-013	21/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-013-2026 Anexo forma de pago
II-871-L3-014	21/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Comoté de seguimiento 26 de enero de 2026 LOTE 3
II-871-L3-015	22/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-015-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-014-2026 Subsanación hojas de vida LOTE 3.
II-871-L3-016	27/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-016-2026 Respuesta Oficio FLU3-CE-013-2026 - Visita Mapiripana. Lote 3
II-871-L3-017	27/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-017-2026 Remisión cotización gastos a realizar topógrafo y lanchero. Lote 3
II-871-L3-018	28/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-018-2026 Solicitud anticipo contrato 1892. Lote 3
II-871-L3-019	28/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-019-2026 Solicitud de datos de contacto del personal aprobado para el proyecto Lote 3
II-871-L3-020	29/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-020-2026 Respuesta Oficio FLU-CE-015-2026 - Solicitud de Anticipo CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1892 de 2025
II-871-L3-021	3/02/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-021-2026 Aprobación metodología general y particulares contrato 1892-2025 Lote 3
II-871-L3-022	30/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-022-2026 Reunión de seguimiento Lote 3
II-871-L3-023	30/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	II-871-L3-023-2026 Profesional Social de Interventoría que asistirá a la visita Lote 3

Página 1

Lote 4

Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
CST- INV – 0017	4/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0017 Formatos ajustados
CST- INV – 0018	6/02/2026	CONCEP SAS	Remisión flujo de inversión ajustado conforme Acta Modificativa
CST- INV – 0019	6/02/2026	CONCEP SAS	Remisión del Programa de Inversiones en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
CST- INV – 0020	9/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0020 Remisión hojas de vida
CST- INV – 0021	12/02/2026	ALCALDIA UNGUÍA - CHOCO	Presentación de profesional social y solicitud de socialización comunitaria
CST- INV – 0023	31-02-26	CONCEP SAS	Inicio Actividades de campo
CST- INV – 0024	16/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0024 Hoja de vida Diego
CST- INV – 0025	16/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0025 Respuesta al incumplimiento
CST- INV – 0026	17/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de anticipo
CST- INV – 0027	17/02/2026	CONCEP SAS	Remisión del Programa de Inversiones en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
CST- INV – 0028	18/02/2026	CONCEP SAS	Plan de exploración geotécnico
CST- INV – 0029	18/12/2026	CONCEP SAS	Plan de trabajo topografía y batimetría
CST- INV – 0030	18/02/2026	CONCEP SAS	Plan de contingencia
CST- INV – 0031	19/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0031 Cronograma
CST- INV – 0032	19/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0032 Plan de contingencia ajustado
CST- INV – 0033	20/02/2026	CONCEP SAS	Cronograma Actividades Sociales (Relación de posiblesfechas Para espacio de reunión con actores focales de las áreas de influencia del proyecto.
CST- INV – 0035	25/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0035 Subsanación informes semanales.
CST- INV – 0036	25/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0036 Presentación social y pieza informativa.
CST- INV – 0037	27/02/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0037 Remisión de informes (informes semanales y mensual 1)
CST- INV – 0038	27/02/2026	CONCEP SAS	Aclaración Informe Semanal No. 10 – Registro fotográfico

Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L4-019	2/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-019-2026 Envió programación trabajos de campo. Lote 4
II-871-L4-020	2/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-020-2026 Respuesta Oficio CST-INV-0015 Hojas de vida. Lote 4
MAIL	4/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Re: CONCEP L4 Gmail - Reiteración compromisos Reunión del 26 de enero de 2026
II-871-L4-021	5/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Incumplimiento obligacviones contractguales. Lote 4
II-871-L4-022	5/02/2026	INVIAS	INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL
II-871-L4-023	6/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Solicitud documentación - Lote 4,
II-871-L4-024	10/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-024-2026 Solicitud Cronograma General Actualizado - Lote 4
II-871-L4-025	10/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-025-2026 Respuesta oficio CST-INV-0020 Remisión hojas de vida - Lote 4
II-871-L4-026	13/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Aprobación acta de modificación de costos contrato 1957-2025 Lote 5.
II-871-L4-027	16/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-027-2026 Respuesta Oficio CSI-INV-0023
II-871-L4-028	16/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio CST-INV-0024. Lote 4.
II-871-L4-030	20/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-030-2026 Respuesta Oficio CST-INV-003. Lote 4
II-871-L4-031	23/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio CST- INV – 0033 – Lote 4.
II-871-L4-032	23/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Aprobación plan de geotecnia de campo
II-871-L4-033	23/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-032-2026 Aprobación Plan de Geotecnia de campo - Lote 4Oficio II-871-L4-033-2026 Aprobación Plan de Contingencia - Lote 4
II-871-L4-034	24/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Respuesta oficio CST- INV – 0034 – Lote 4 (informes semanales)
II-871-L4-035	25/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-035-2026 Respuesta Oficio CST-INV-0036 - Lote 4
II-871-L4-037	27/02/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Remisión de informes semanales y mensuales

Página 1

Lote 5

Anexo 9 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
CNP-573-033	4/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-033-0356 Informe Mensual No. 1 - Consultoría Lote 5
CNP-573-034	4/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-034-0365 Informe Mensual No. 2 - Consultoría Lote 5
CNP-573-035	5/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-035-0366 - Acta de costos No. 2 - Consultoría
CNP-573-036	5/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-035-0366 - Acta de costos No. 2 - Consultoría
CNP-573-037	5/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-037-0372 Cronograma de actividades - componente batimétrico
CNP-573-038	5/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-038-0373 - Informe semanal No. 07 consultoría
CNP-573-039	6/02/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA - CAQUETA EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CINP-573-039-0383 - Solicitud de autorización para vuelos con drones
CNP-573-040	6/02/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLANO - CAQUETA EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA POLICIA NACIONAL DE	CINP-573-040-0384 - Solicitud de autorización para vuelos con drones
CNP-573-041	9/02/2026	CONCEP SAS	Información Reunión de Socializaciones
CNP-573-042	10/02/2026	INVIAS	Por medio del presente remitimos, para los fines pertinentes, oficio de la Alcaldía de Solano, en donde nos informan que el elemento flotante utilizado por el Municipio para como embarcadero, es de propiedad privada.
CNP-573-043	11/02/2026	CONCEP SAS	Socializacion Solita y Solano
CNP-573-044	11/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-045-0441 Respuesta a comunicación II-871-L5-012-2026 - Cronograma de geotecnia
CNP-573-045	11/02/2026	CONCEP SAS	CINP-573-045-0441 Respuesta a comunicación II-871-L5-013-2026 - Cronograma general del proyecto.
CNP-573-046	12/02/2026	CONCEP SAS	Remisión Volumen I
CNP-573-047	12/02/2026	CONCEP SAS	Informe semanal 8
CNP-573-048	12/02/2026	CONCEP SAS	Informe mensual 1 ajustado
MAIL	12/02/2026	CONCEP SAS	Informe para viaticos
CNP-573-049	19/02/2025	CONCEP SAS	CINP-573-049-0566 - Informe semanal No. 9 consultoría
CNP-573-050	23/02/2026	CONCEP SAS	Remisión Volumen I - Estudio de Identificación de Necesidades, Recopilación y Análisis de Antecedentes, Revisión del Diagnóstico Existente e Identificación de Vías de Acceso (Carretero y/o Fluvial) - Lote 5, Hitos I y II.
MAIL	24/02/2026	CONCEP SAS	LOTE 5 PRESENTACION SOCIALIZACION CTO 1957 - CAQUETA
CNP-573-051	24/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta a comunicación II-871-L5-014-2026 - Presentaciones para socialización.
CNP-573-052	24/02/2026	CONCEP SAS	Remisión de Cotizaciones - Ensayos de geotecnia
CNP-573-053	26/02/2026	CONCEP SAS	Informe semanal 10
CNP-573-054	27/02/2026	CONCEP SAS	Monitoreos de Calidad de Agua (SOLANO)
CNP-573-055	27/02/2026	CONCEP SAS	Monitoreos de Calidad de Agua (SOLITA)

Página

Anexo 10 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L5-010-2026	2/02/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud envío programación trabajos de campo
II-871-L5-011-2026	6/02/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud documentación (informe, Actas de costos)
II-871-L5-012-2026	9/02/2026	CONSORCIO MNF	Observaciones al cronograma trabajo de geotecnía
II-871-L5-013-2026	10/02/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud envío cronograma general actualizado
II-871-L5-014-2026	17/02/2026	CONSORCIO MNF	Ajustes presentación socialización
II-871-L5-014-2026	24/02/2026	CONSORCIO MNF	Aprobación cotización ensayos de laboratorios

Lote 6

Anexo 11 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6.

CORRESPONDENCIA ENVIADA - LOTE 6			
ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
L6-024-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Envío programación de trabajos de campo. Lote 6
L6-025-2026	4/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Solicitud documentación Lote 6
L6-026-2026	6/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Solicitud documentación Lote 6
L6-029-2026	26/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	OFICIO II-871-L6-029-2026 Solicitud informe semanal No. 11 - Lote 6
L6-030-2026	27/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Oficio II-871-L6-030-2026 Observaciones actas de costos No. 1 y No. 2 - Lote 6
L6-031-2026	26/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	OFICIO II-871-L6-031-2026 Solicitud anticipo contrato 1968-2025 - Lote 6
L6-032-2026	3/03/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Solicitud de presencia Director de consultoría en comités - LOTE 6

Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA - LOTE 6			
RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO POR:	CONCEPTO
OF-25C08-CONS-0016-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Entrega contactos del personal aprobado
OF-25C08-CONS-0019-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Información sobre visita técnica al municipio de La Tola, entre el 11 y 13 de febrero de 2026.
OF-25C08-CONS-0020-2026	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Respuesta oficio II-8/71-L6-024-2026
MAIL	2/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	RV: propuesta visita la Tola - febrero
OF-25C08-CONS-0022-2026	4/02/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Documentos solicitados según oficio II-8/71-L6-025-2025
OF-25C08-CONS-0026-26	19/02/2026		Entrega acta de costos No1 y No2.
OF-25C08-CONS-0026-28	20/02/2026	CONCEP	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAMPO.
OF-25C08-CONS-0026-29	20/02/2026	Jaime Zúñiga Coordinador General Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico	solicitud alcance de la construcción del nuevo terminal fluvial en La Tola (Nariño)
OF-25C08-CONS-0026-30	23/02/2026	CONCEP	ENTREGA DE VOLUMEN IV ACTUALIZADO
OF-25C08-CONS-0026-31	23/02/2026	CONCEP	ENTREGA DE METODOLOGIA VOLUMEN II ACTUALIZADO

Página 1

Interventoría

Anexo 13 Relación de correspondencia recibida de INVIAS.

INTERVENTORIA			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
INVIAS-2026S-VBOG-003648	9/02/2026	CONCEP SAS	solicitud de entregas y/o información lotes 1 al 6 RED FLUVIAL NACIONAL
MAIL	24/02/2026	CONCEP SAS	Remision Actas de modificacion N°1
2026S-VBOG-009573	27/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de remisión actas de costos Contrato No. 1882/2025 - Lote 4
2026S-VBOG-009587	27/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de remisión actas de costos Contrato No. 1968/2025 - Lote 6
2026S-VBOG-009589	27/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud remisión actas de costos Contrato No. 1915/2025 - Lote 2
2026S-VBOG-009588	27/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud de remisión actas de costos Contrato No. 1892/2025 - Lote 3
2026S-VBOG-009598	27/02/2026	CONCEP SAS	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001785 Aprobación de Hojas de vida de CMA-DTE-SPI-046-2025- respuesta oficio II-869 INT-001-2025
2026S-VBOG-009597	27/02/2026	CONCEP SAS	Solicitud remisión actas de costos Contrato No. 1914/2025 - Lote 1
2026S-VBOG-009600	27/02/2026	CONCEP SAS	solicitud de Anticipos Lotes 4 y 6 RED FLUVIAL NACIONAL

Anexo 14 Relación de correspondencia enviada a INVIAS.

INTERVENTORIA			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-869-INT-011	5/02/2026	INVIAS	Lote 3 - Oficio II-871-INT-011-2026 Documentación Lote No. 3
II-869-INT-012	5/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-012-2026 Documentación Lote No. 6
II-869-INT-013	10/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-013-2026 Remisión oficios de renuncia
II-869-INT-014	12/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-014-2026 Remisión presentación socialización Lote 5
II-869-INT-015	13/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-015-2026 Remisión presentación socialización Lote 2
II-869-INT-016	13/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-016-2026 Aclaración oficio CNP-573-042-0431 Consorcio MNF - Lote 5
II-869-INT-017	13/02/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-017-2026 Respuesta correo – Contrato 1922 de 2025 – INTERVENTORIA – Programación de campo (12-02-26)
II-869-INT-018	21/02/2026	INVIAS	ficio II-871-INT-018 Respuesta oficio 2026S-VBOG-003648
II-869-INT-019	16/02/2026	INVIAS	II-871-INT-019-2026 Remisión presentación socialización Lote 3
II-869-INT-020	25/02/2026	INVIAS	oficio II-871-INT-020 Remisión oficios de renuncia
II-869-INT-021	26/02/2026	INVIAS	oficio II-871-INT-021 Envió presentación socialización lote 1
II-869-INT-022	26/02/2026	INVIAS	OFICIO II-871-INT-022-2026 Remisión presentación socialización Lote 2
II-871-INT-025	27/02/2026	TODOS LOS LOTES	Oficio II-871-INT-025-2026 Entrega volumen preliminar Estudio Cartografico, topográfico y Batimétrico - L1. L2. L3. L4. L5. L6
II-871-INT-026	27/02/2026	TODOS LOS LOTES	Oficio II-871-INT-026-2026 Entrega informe geotecnia del proyecto - L1. L2. L3. L4. L5. L6

8.2 ANEXO 2. INFORMES SEMANALES

8.3 ANEXO 3. INFORME DEL DIRECTOR DE OBRA, DEL COORDINADOR Y DE LOS INGENIEROS RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS, Y DEL INGENIERO AUXILIAR.

8.4 ANEXO 4. PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO
