INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS

CONTRATO 1922 DE 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

INFORME MENSUAL No. 2

INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

ENERO 16 AL 31 DE 2026, BARRANQUILLA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1 Localización de los proyectos 9
2.1.1 Lote 1 9
2.1.3 Lote 3 21
2.1.4 Lote 4 25
2.1.5 Lote 5 29
2.1.6 Lote 6 33
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 35
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 39
2.4. Características técnicas del proyecto. 39
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 43
3.1 Información General del Contrato de Consultoría Lote 1 43
3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes 49
3.2.1 Lote 1 49
3.2.2 Lote 2 51
3.2.3 Lote 3 52
3.2.4 Lote 4 54
3.2.5 Lote 5 55
3.2.6 Lote 6 56
3.3. Seguimiento Ítems no previstos 57
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 57
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA 57
4.1. Informes Semanales 57
4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría 59
4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría 59
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría 70
4.5. Estado general del Tiempo 75

4.6. Resumen Ensayos de laboratorio 75
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría 75
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 87
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 88
4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 88
4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones 88
4.9.3. Actas de comité y reunión 88
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 89
5.1. Información general del contrato 89
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 91
5.3. Informes de especialistas y profesionales 91
5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 91
5.5. Informe matriz de riesgos. 91
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 91
6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 92
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 92
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 92
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 92
6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría 93
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 95
6.6. Otros documentos seguimiento mensual 95
6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 96
6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 97
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. ANEXOS 99
8.1 ANEXO No 1 RELACION DE CORRESPONDENCIA 99
8.3 ANEXO No 2. REGISTRO FOTOGRAFICO. 105
8.4 ANEXO No 3. INFORME DEL DIRECTOR DE OBRA Y DEL INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS. 106

8.5 ANEXO No 4 PRESENTACIÓN COMITES DE SEGUIMIENTO**¡Error! Marcador no definido.**

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon 10
Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón 11
Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira 12
Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira 12
Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa 13
Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa 14
Figura 7 Localización del Hito 4 Miritί- Parana 15
Figura 8 Localización del Hito 4 Miritί- Parana 15
Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria 16
Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria 16
Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe 17
Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe 18
Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia. 19
Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia 19
Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual 20
Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual 21
Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana 22
Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana 22
Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal 23
Figura 20 Localización del Hito 3 Papanahua 24
Figura 21 Localización del Hito 3 Papanahua 25
Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía 26
Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía 27
Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá 28
Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá 29
Figura 26 Localización del Hito 1 Solita 30
Figura 27 Localización del Hito 1 Solita 31
Figura 28 Localización del Hito 2 Solano 32
Figura 29 Localización del Hito 2 Solano 33
Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño 34
Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño 35
Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1 66

Figura 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 5..... 68
Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 6..... 69
Figura 35 Informe financiero lote 1..... 70
Figura 36. Informe financiero Lote 2. 71
Figura 37 Informe financiero Lote 3..... 72
Figura 38 Informe financiero Lote 5..... 73
Figura 39 Informe financiero Lote 6..... 74
Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1..... 76
Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2..... 78
Figura 42 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3..... 80
Figura 43 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4..... 82
Figura 44 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5..... 84
Figura 45 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6..... 86
Figura 46 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07 contrato de Interventoría. 92
Figura 47 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 93
Figura 48 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría. 94
Figure 49 El formato MEPI-MN-IN-3-FR-1, seguimiento a la inversión del anticipo..... 96

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional 36
Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025..... 43
Table 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025..... 44
Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025..... 45
Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025..... 46
Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025..... 47
Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025..... 48
Tabla 8 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 1. 58
Tabla 9 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 2. 58

Tabla 10 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 3. 58
Tabla 11 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 4. 58
Tabla 12 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 5. 59
Tabla 13 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 6. 59
Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 1 59
Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 2. 61
Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 3. 62
Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 4. 63
Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 5. 64
Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para lote 6. 65
Tabla 20 Información del contrato de Interventoría. 89
Tabla 21 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS..... 90
Tabla 22 Relación equipos de la Interventoría. 90

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1. 99
Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1. 100
Anexo 3 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 1 100
Anexo 4 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2. 100
Anexo 5 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2. 101
Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 2. 101
Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3. 101
Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3. 102
Anexo 9 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 3. 102
Anexo 10 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4..... 103
Anexo 11 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4. 103
Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 4. 103
Anexo 13 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5..... 104
Anexo 14 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5. 104
Anexo 15 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 5. 104
Anexo 16 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6..... 105
Anexo 17 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6. 105
Anexo 18 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 6. 105

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra la estructuración de proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, incluyendo los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero. En desarrollo de dichas funciones, el INVIAS adelantó los procesos CMA-DTE-SPI-044-2025 y CMA-DTE-SPI-046-2025.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, incorpora dentro de su gestión el proyecto denominado **"Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS"**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y la operatividad de la infraestructura fluvial asociada a los muelles ubicados en la red navegable a cargo de la Entidad.

El proyecto objeto de interventoría corresponde a los **"Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6"**, mediante el cual se contempla la ejecución de estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de **Fase II – Factibilidad**, y para el Lote 6 a nivel de **Fase III – Estudios y Diseños Definitivos**.

Por lo que el Instituto Nacional de Vías suscribió con **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.)** el contrato número 1922 DE 2025, cuyo objeto es la "**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"**

Y se suscribieron los siguientes contratos cuyo objeto son:

- El contrato 1914 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA**

INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1."

- El contrato 1915 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO NAVEGABILIDAD,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2."**

- El contrato 1892 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO VÍA FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3."**

- El contrato 1882 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **TORRES Y ASOCIADOS,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4."**

- El contrato 1957 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5".**

- El contrato 1968 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.".**

Las órdenes de inicio de los contratos de Consultoría se suscribieron:

- Lote No 1 el 16 de diciembre de 2025.
- Lote No 2 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 3 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 4 el 19 de diciembre de 2025
- Lote No 5 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 6 el 16 de diciembre de 2025

La orden de inicio del contrato de Interventoría se suscribió el 16 de diciembre del 2025.

Se realizó reunión presencial en la oficina de Invias en la ciudad de Bogotá el día 16 de diciembre del 2025.

El informe mensual No. 2 de Interventoría, corresponde al período comprendido entre el 16 al 31 de enero de 2026. En este informe se presenta el alcance del proyecto, la información básica de los contratos de Consultoría e Interventoría y las principales actividades ejecutadas por la consultoría y la Interventoría durante este período.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los proyectos.

2.1.1 Lote 1

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la siguiente localización de los sus respectivos hitos:

HITO 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARÓN

El caserío de Pucarón se localiza al suroccidente del municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, en inmediaciones de los sectores de San Luis y Matapí. El área objeto de intervención corresponde a un punto estratégico del corredor fluvial del río Vaupés, el cual constituye un eje fundamental para el transporte de

pasajeros, carga general y víveres desde el interior del país hacia el municipio de Mitú.

En este sector, la presencia de raudales genera una discontinuidad en la navegabilidad del tramo comprendido entre Calamar y Mitú, lo que obliga a la implementación de un trasbordo terrestre de aproximadamente 5,45 km. Dicho trasbordo se realiza a través de dos tramos viales: i) un tramo pavimentado en concreto, en adecuado estado de servicio, con una longitud aproximada de 2,40 km, que conecta con los muelles de Yuruparí; y ii) un tramo carreteable no pavimentado, de aproximadamente 2,45 km, que conduce al sector de Piraybaroca, desde donde se restablece la continuidad del transporte fluvial hacia el municipio de Mitú.
Adicionalmente, este punto presenta una alta importancia funcional y social, al constituirse en un nodo de conectividad utilizado por comunidades indígenas para el acceso a servicios de educación y salud

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pucarón:

Figura 1 Localización del Hito 1 Puracon



Fuente: Google earth

Figura 2 Localización del Hito 1 Pucarón



Fuente: Google earth

El HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA

Taraira es un municipio situado en el extremo suroriente del departamento del Vaupés, en Colombia. Se localiza en la frontera con Brasil al oriente y limita al sur y occidente con el departamento del Amazonas. Forma parte de la cuenca baja del río Apaporis, en una zona de alta riqueza hídrica y selvática.

El área municipal es de 6.619 Km², equivalente al 12,23% del área departamental, y limita por el norte con el corregimiento departamental de Pacoa y la República del Brásil (municipio de Japurá); por el oriente, con la República del Brásil (municipio de Japurá); por el sur y el occidente, con el departamento del Amazonas (corregimiento departamental de La Pedrera).

En las siguientes figura se presenta la localización general de Taraira:

Figura 3 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth

Figura 4 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth

EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PACOA

Pacoa es una de las tres áreas no municipalizadas del departamento de Vaupés en Colombia. Su cabecera municipal es Buenos Aires de Lérida, se encuentra a una

altitud de 200 m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 14.108 km² y tiene una población de 5709 habitantes. En este se encuentra el raudal de Jirijirimo, Río Apaporis.

Limita al norte con el corregimiento de Papunahua, partiendo del raudal Sabana; sobre el río Paraná Pichuna, siguiendo en línea recta en dirección noroeste hasta encontrar los nacimientos del caño Siringa; luego por el este aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Aceite, punto de concurso del departamento del Guaviare y el municipio de Carurú y el corregimiento de Papunahua.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pacoa.

Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

EL HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ

Localizado en Miriti-Paraná es un área no municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas. Limita al norte con el departamento del Caquetá, el área no municipalizada de La Victoria y el departamento de Vaupés; al este con el área no municipalizada de La Pedrera y al sur y oeste con el área no municipalizada de Puerto Santander.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Miritíí Parana:

Figura 7 Localización del Hito 4 Miritί- Parana



Fuente: Google earth

Figura 8 Localización del Hito 4 Miritί- Parana



Fuente: Google earth

El HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE LA VICTORIA

La Victoria es un área no municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Miritί-Paraná. Fue fundado por Fidel Wilyhes. Este se localiza sobre el margen del rio Apaporis, su extensión es de 1443 km.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Victoria:

Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Google earth

Figura 10 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Elaboración diagnósticos muelles fluviales a cargo del invias (Taraira, Miriti Parana, La Victoria) en los Departamentos de Vaupés y Amazonas. (INVIAS, 2023)

2.1.2 Lote 2

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE.

La Guadalupe Está ubicado a los 01º 15´ 19" de latitud Norte y 66º 52´56" de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en la margen derecha del río Negro, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido entre los 27º y 32º y una precipitación media anual de 3.000 mm.. El Corregimiento tiene un área de 1.167 km², representando el 1,61% del total departamental. Limita por el norte con el corregimiento de San Felipe, por el oriente con la República de Venezuela y por el sur y el occidente con la República de Brasil.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Guadalupe:

Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

Figura 12 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA.

Puerto Colombia es un área no municipalizada colombiana del departamento de Guainía, ubicada a 186 km por vía fluvial de Inírida, Limita al norte con el corregimiento departamental de Cacahual y el municipio de Puerto Inírida, al oriente con la República de Venezuela, por el sur con los corregimientos de San Felipe y Paná Paná y con Brasil y por el occidente con el corregimiento de Morichal y el municipio de Inírida

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Puerto Colombia:

Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

Figura 14 Localización del Hito 2 Puerto Colombia



Fuente: Google earth

HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CACAHUAL

Cacahual es una área no municipalizada de Colombia, situado en el departamento de Guainía, al este del país. Compuesto por los centros poblados: *Cacahual, Merey y San Juan*. Limita al oeste y norte con la capital departamental, Inírida, al sur con Puerto Colombia, y al este con Venezuela. Se encuentra a una distancia de 68 km de Inírida.

Las vías de comunicación son principalmente fluviales y aéreas. Dista de Inírida la capital departamental 186 km por vía fluvial.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Cacahual:

Figura 15 Localización del Hito 3 Cacahual



Fuente: Google earth

Figura 16 Localización del Hito 3 Cacahual



Fuente: Google earth

2.1.3 Lote 3

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA.

Mapiripana es un municipio colombiano situado en el departamento del GUAINIA a orillas del río Guaviare. Dista 116 km de San José del Guaviare al norte, 324 km de Villavicencio y 417 km de Bogotá al sur respectivamente.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Mapiripana:

Figura 17 Localización del Hito 1 Mapiripana



Fuente: Google earth

Figura 18 Localización del Hito 1 Mapiripana



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL.

Es denominado también Garza Morichal y se halla ubicado a los 02º 14´ 34” de latitud Norte y 70º 01´04” de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en el río Inírida, a una altura de 163 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido promedio de 27º y una precipitación media anual de 3.000 mm.

En la siguiente figura se presenta la localización general de Morichal:

Figura 19 Localización del Hito 2 Morichal



Fuente: Google earth

HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PAPANAHUA.

se encuentra localizada en el corregimiento del Papanahua, en el área no municipalizada del departamento de Vaupés, colindante con el Rio Papanahua. Limita por el norte con los departamentos de Guaviare (municipio El Retorno) y Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el oriente, con el departamento de Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el sur

con los municipios de Mitú y Carurú y por el occidente con el municipio de Carurú y el de Guaviare (municipio Miraflores).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Papanahua:

Figura 20 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

Figura 21 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

2.1.4 Lote 4

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA

El municipio de Unguía se encuentra localizado en el Urabá chocoano, en la parte noroccidental de Colombia. Tiene una extensión total de 1.190 km². La principal cuenca hidrográfica es la del Golfo de Urabá, que pertenece al río Atrato, al cual confluyen los ríos Arquía, Unguía, Tigre y Tanela. Sobre el mar Caribe se destacan la playa Tarena y la bahía de Titumate. También hay ciénagas como la de Unguía, Marriaga y Hornos.

El municipio de Unguía limita al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, al oriente con el Río Atrato, que lo separa de Turbo (Antioquia), al sur con Riosucio, y al occidente con la Comarca Emberá-Wounaan y la Provincia de Darién, (ambas en Panamá).


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Unguía:

Figura 22 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

Figura 23 Localización del Hito 1 Unguía

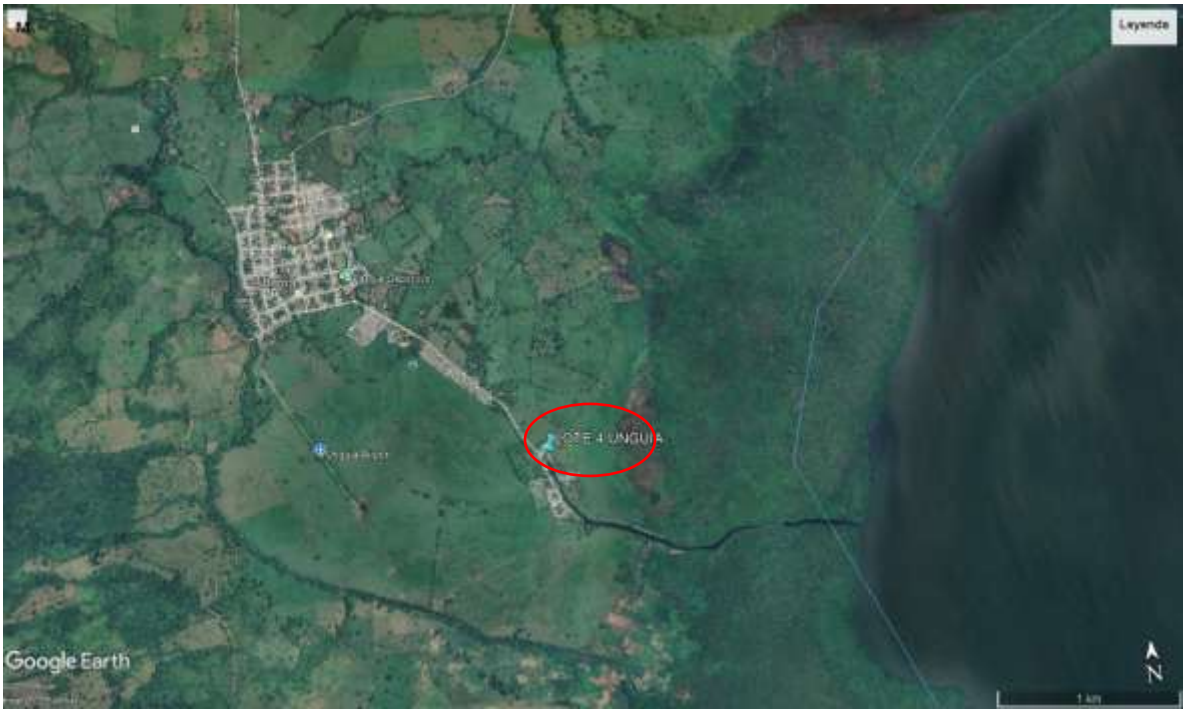

Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ.

Bajo Baudó es un municipio costero ubicado al sur del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Su cabecera municipal es **Pizarro**. Se caracteriza por su ubicación entre la serranía del Baudó y el océano Pacífico.


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Pavasá:

Figura 24 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

Figura 25 Localización del Hito 2 Pavasá

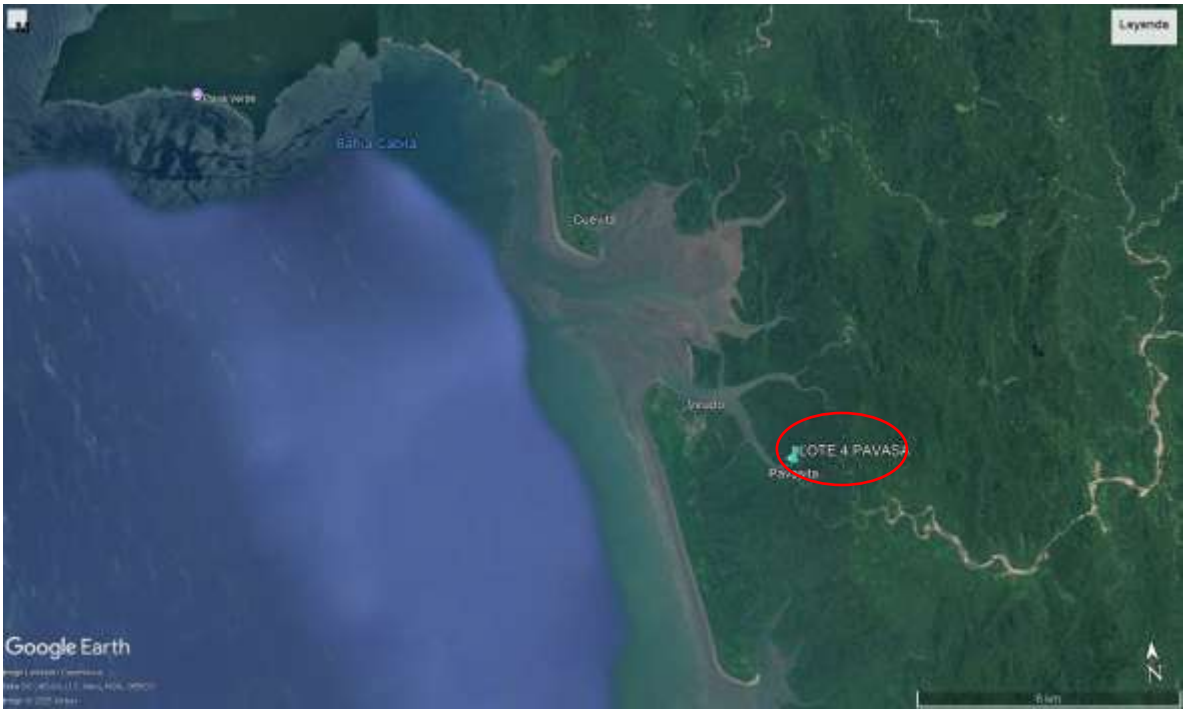

Fuente: Google earth

2.1.5 Lote 5

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA.

El municipio de Solita está ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá, a una distancia de 110 km de Florencia, capital del Departamento. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Caquetá, en límites con el departamento del Putumayo. Su temperatura promedio es de 26 ℃. y cuenta aproximadamente con 6,480 habitantes, distribuidos en un 61% en el área rural y un 39% en la zona

urbana; y su economía principalmente está basada en la minería de oro, agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz), ganadería (levante y leche) y pesca.


En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solita:

Figura 26 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

Figura 27 Localización del Hito 1 Solita

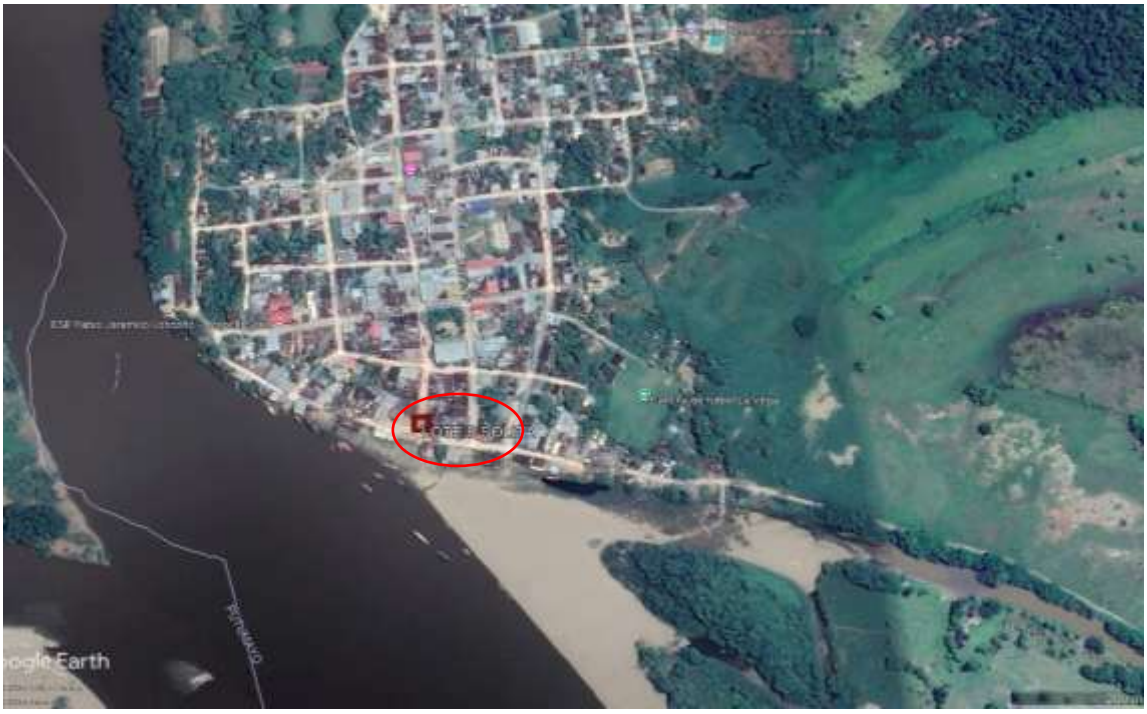

Fuente: Google earth

HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO

La cabecera municipal se localiza aproximadamente a 150 km al sureste de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre Florencia – La Montañita – San Antonio de Getucha, y desde allí por vía fluvial por el río Orteguaza; o vía terrestre Florencia – Valparaíso – Solita, y fluvial por el río Caquetá desde Solita hasta Solano.

El municipio de Solano limita con los siguientes territorios: Al norte con: Solita, Valparaíso, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, los municipios de Calamar y Miraflores del Guaviare. Al este: Con el corregimiento departamental de Pacoa del Vaupés y los Corregimientos departamentales de Mirití, Paraná y la Victoria del Amazonas. Al sur: Con los corregimientos departamentales de Santander y la Chorrera, del Amazonas. Al oeste: Con los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, del Putumayo. (Plan De Desarrollo 2020 – 2023. Por un Solano, Más Humano, Productivo y Sostenible y en Paz).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solano:

Figura 28 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

Figura 29 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

2.1.6 Lote 6

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

El Municipio de la Tola, en el Departamento de Nariño, está ubicado a 460 km al noroccidente de Pasto. El suelo entre ondulado y plano, corresponde a la llanura del Pacífico. Tiene una población de 7.321 habitantes; una Latitud Norte 2º 24` 39”, y una Longitud Oeste 78º 14` 34”; y una altitud 20 m.s.n.m; tiene una superficie de 459 kmts2, con una temperatura promedia de 28ºC. Limita al Norte con el Océano Pacífico; Por el Sur con el municipio de Roberto Payán; por el Oriente con el municipio de El Charco; y por el Occidente con el Municipio de Olaya Herrera


En las siguientes figuras se presenta la localización general del municipuio de La Tola:

Figura 30 Localización del Municipio de la Tola-Nariño



Fuente: Google earth

Figura 31 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

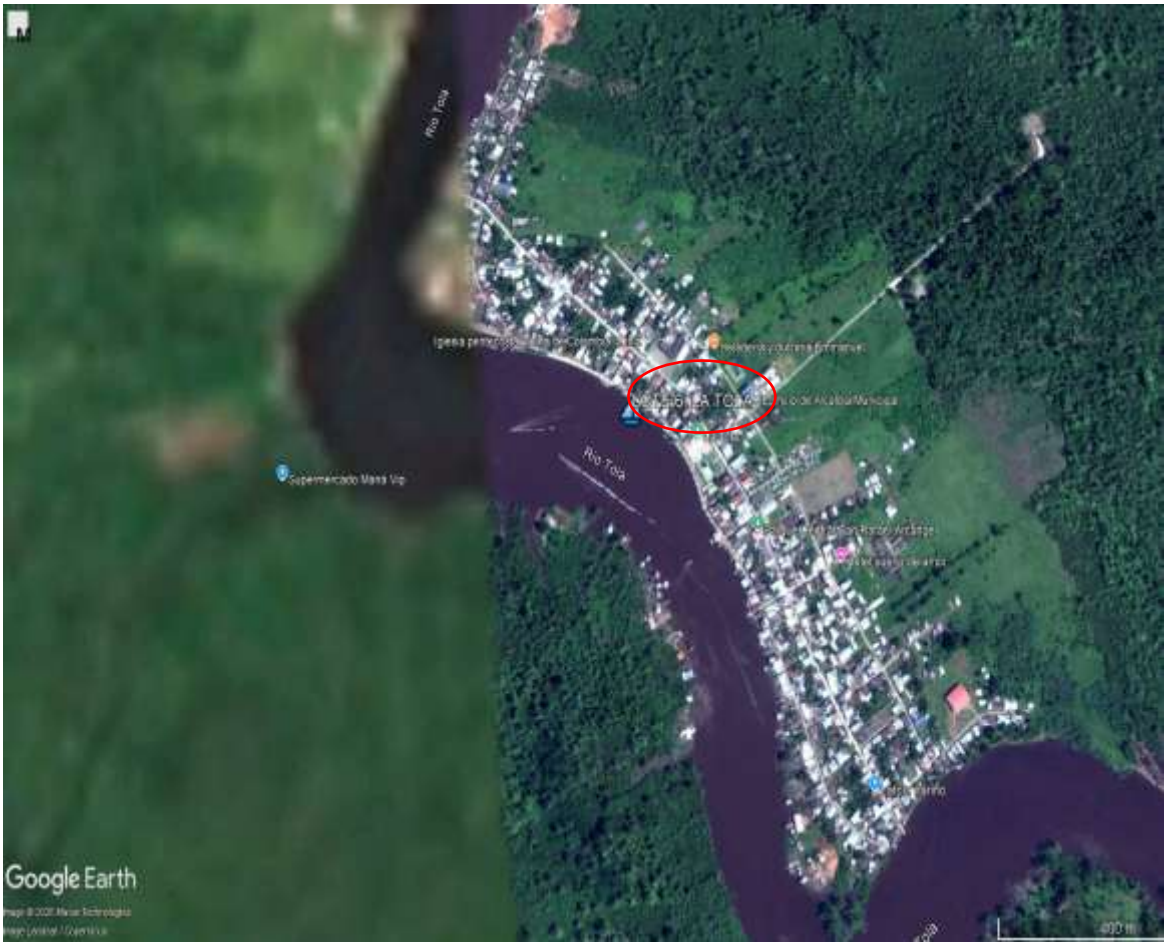

Fuente: Google earth

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Las zonas de influencia del proyecto "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6** se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
1	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Río Vaupés	Mitú	Vaupés
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Río Apaporis	Taraira	Vaupés
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Río Cananarí	Pacoa	Vaupés
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Río Miriti - Paraná	Miriti - Paraná	Amazonas
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Río Apaporis	La Victoria	Amazonas

2	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE	Río Negro	La Guadalupe	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA	Río Negro	Puerto Colombia	Guainía
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL	Río Atabapo	Cacahual	Guainía
Lote	**Objeto**	**Hitos**	**Río**	**Municipio o Área no municipalizada**	**Departamento**
3	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Río Guaviare	Mapiripana	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Río Inirida	Morichal	Guainía
4	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA	Quebrada Ipeti - Río Unguia	Unguía	Chocó
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ	Río Baudó	Bajo Baudó	Chocó

5	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA	Río Caquetá	Solita	Caquetá
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO	Río Caquetá	Solano	Caquetá
Lote	**Objeto**	**Hitos**	**Río**	**Municipio o Área no municipalizada**	**Departamento**
6	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DENAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	Río Tola	La Tola	Nariño

Con la ejecución del proyecto, se presentan los siguientes beneficios:

- Generación de empleos directos e indirectos.
- El proyecto permitirá mejorar la conectividad de territorios en los que el transporte fluvial constituye el único medio de acceso, integrándolos con las principales vías de conexión regional y nacional. Esta intervención generará beneficios socioeconómicos al aumentar la accesibilidad y la movilidad de la población, facilitar el acceso oportuno a bienes, servicios básicos y mercados, reducir costos y tiempos de transporte, y dinamizar las economías locales. Asimismo, contribuirá a disminuir las brechas territoriales de productividad, competitividad y equidad, fortaleciendo la articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y cierre de brechas.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No Aplica.

2.4. Características técnicas del proyecto.

Los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase II para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga. Estas actividades comprenden la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, geotécnica, operativa y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización del muelle y la determinación de la embarcación tipo de diseño.

Los estudios y diseños deberán incluir la definición de las áreas funcionales y de servicio, el diseño de accesos y facilidades para la accesibilidad universal, el diseño del acceso acuático y las condiciones de atraque para las embarcaciones, considerando escenarios de expansión futura. Así mismo, se deberán desarrollar los estudios y diseños de las obras civiles, la evaluación e incorporación del equipamiento requerido para la manipulación de carga conforme a la capacidad de la embarcación tipo definida, el diseño de los sistemas hidrosanitarios, redes secas, señalización, y las obras de dragado necesarias para garantizar la operatividad del muelle.

Adicionalmente, los consultores deberán evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad para la atención de emergencias en el muelle, incluyendo, entre otros, extintores, botiquines y camillas, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.
Los consultores deberán ejecutar todas las actividades adicionales requeridas por las Entidades involucradas, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase II, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables.

Las principales actividades a desarrollar por los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO
- VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO
- VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- VOLUMEN IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE
- VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILDIAD
- VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL
- VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO
- VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

El consultor del Lote 6 deberá ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III para la construcción de obras de protección de márgenes fluviales. Estas actividades comprenderán, entre otros aspectos, la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, hidrológica, geotécnica y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización de las obras de protección de orilla, la determinación de la embarcación tipo de diseño y la evaluación de las condiciones de navegabilidad.

Así mismo, los estudios y diseños deberán incluir el diseño de las obras civiles asociadas, las obras de dragado, la señalización fluvial y todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las márgenes y la seguridad de la navegación.

Adicionalmente, el consultor deberá evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad náutica requerido para atender los requerimientos de navegabilidad, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

El consultor seleccionado deberá adelantar todas las actividades adicionales que sean requeridas por las Entidades involucradas en el proyecto, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables, los cuales se presentarán en los volúmenes establecidos contractualmente y que son los siguientes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO.
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA.
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DEFINITIVA
- VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

- VOLUMEN VIII. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN IX. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN XI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO

Todas las Actividades realmente ejecutadas por las Consultorías del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad de los Consultores del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

3.1 Información General del Contrato de Consultoría Lote 1

En la tabla No 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se presenta la información básica de los Contratos de Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS.**

Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1914 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Inprobrain Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$2.932.226.232,00
Anticipo	$ 1.232.027.829,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	6 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 215.865.850,00
% Ejecutado	8.76%

Fuente: Propia

Table 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1915 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvia en el departamento de Guainía en el marco de proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.934.142.682,00
Anticipo	$ 812.664.992,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4.5 meses

Fecha actualizada de terminación	15 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 133.015.780
% Ejecutado	8.17%

Fuente: Propia

Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1892 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvia en los departamentos de Guainía y Vaupés en e marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvia Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Vía Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.860.124.682,00
Anticipo	$ 781.564.992,50
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026

Prórroga No 1	5 meses
Fecha actualizada de terminación	31 de mayo de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 93.787.799,00
% Ejecutado	6.00%

Fuente: Propia

Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1882 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	19 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvia en el departamento de Chocó en el marco de proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Torres y Asociados SAS
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.362.265.442,00
Anticipo	$ 572.380.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025

Fecha de Inicio	19 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 102.341.622,00
% Ejecutado	8.9%

Fuente: Propia

Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1957 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvia en el departamento de Caquetá en el marco de proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio MNF
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.277.180.442,00
Anticipo	$ 536630.438,00

Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 95.382.800,00
% Ejecutado	8.88%

Fuente: Propia

Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1968 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad Projesy
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025

Valor	$934.498.770,00
Anticipo	$392.646.542,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 60.045.689
% Ejecutado	7.5%

Fuente: Propia

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes

En el período comprendido entre 16 al 31 de enero de 2026, los consultores ejecutaron:

3.2.1 Lote 1

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Administrativa y Contractual

- Vigencia del Contrato: Se actualizó la póliza de cumplimiento tras la formalización de la Prórroga No. 1, estableciendo como nueva fecha de finalización el 30 de junio de 2026.
- Modificaciones: Se tramitó y entregó el Acta de Modificación No. 1 (prórroga de 6 meses) y la correspondiente solicitud de modificación de costos.

- Informes de Gestión: Se radicaron los Informes Semanales del 1 al 6 y el Informe Mensual No. 1 (diciembre 2025), cumpliendo con el reporte periódico de actividades.
- Financiero: Entrega del Acta de Costos No. 1 y del programa de inversión preliminar para el Lote 1.

Componente Técnico y Metodológico

- Metodologías de Estudio: Se presentaron y ajustaron las metodologías para los estudios hidráulicos, cartográficos, topográficos, batimétricos y de transporte.
- Ubicación de Infraestructura: Se radicó la solicitud de aprobación para la ubicación técnica de los muelles Pucarón, Taraira, Pacoa, Miritί-Paraná y La Victoria.
- Estándares de Calidad: Se integraron los lineamientos de sostenibilidad ambiental de INVÍAS en los entregables y se presentó el laboratorio encargado de los ensayos técnicos.

Gestión de Personal y Logística

- Equipo Profesional: Se completó el equipo del Lote 1 con la integración y certificación de un profesional en el área Naval.
- Actividades de Campo: Se gestionaron los viáticos y el cronograma de visitas técnicas del Ingeniero Residente para las zonas de Amazonas y Mitú.
-

Relacionamiento Institucional y Social

- Mesas de Socialización: Se solicitaron espacios de trabajo con las Gobernaciones de Vaupés y Amazonas, así como con las Alcaldías de Taraira y Mitú, para la presentación formal del proyecto.
- Recolección de Información: Se tramitaron solicitudes de datos técnicos, ambientales y de planificación territorial ante la Alcaldía de Taraira y la CDA.

Trámites Ambientales y Sociales

- Certificaciones: Se iniciaron las gestiones ante las autoridades competentes para verificar la presencia de grupos étnicos y de bienes de patrimonio histórico o arqueológico en el área de influencia.
- Gestión Hídrica: Solicitud de información sobre el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico (POMCA) para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental.

Seguimiento y Control

- Comités de Seguimiento: Se llevaron a cabo cinco reuniones (días 14, 19, 26 y 30 de enero) centradas en la validación de metodologías, verificación del cronograma y estrategias de acercamiento gubernamental

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.2 Lote 2

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestiones Administrativas y Contractuales

- Entrega de documentación: Se remitieron la metodología general, el cronograma de inversiones, el programa preliminar de actas de costo y la ficha técnica del papel.
- Gestión de personal: Se subsanaron las hojas de vida de la entrega 2 y se obtuvo la aprobación total del equipo profesional tras el aval de la especialista en sostenibilidad.
- Estado del contrato: El 16 de enero se remitió el Acta de Modificación de Costos No. 1, formalizando la prórroga del contrato hasta el 15 de mayo de 2026.
- Hitos alcanzados**:** El 23 de enero se realizó la **entrega del Volumen I** correspondiente a los hitos I, II y III.

Componente Social (Socialización en campo)

- Gestiones institucionales: Se radicaron solicitudes de información ante la Gobernación del Guainía, la CDA y la Capitanía de Puerto.
- Acercamiento comunitario: Se realizaron visitas de socialización en Cacahual (23 de enero), La Guadalupe (25 de enero) y Puerto Colombia (27 de enero).
- Clarificaciones a la comunidad: Se informó que el proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad (estudios y diseños), siendo el INVIAS la entidad responsable de la posterior estructuración y licitación para la construcción.
-

Componente Hidráulico e Hidrológico

- Condiciones del cauce: Durante las visitas del 22 al 29 de enero, los ríos Atabapo y Negro presentaron niveles de caudal superiores a los habituales.
- Morfología: Ambos ríos presentan baja sinuosidad asociada a lechos predominantemente rocosos con presencia de arenas blancas cuarcíticas y afloramientos graníticos.
- Sedimentología: Se logró recolectar material sedimentario en el río Negro (La Guadalupe y Puerto Colombia), identificando bloques rocosos de gran tamaño en este último sector.

Componente Ambiental

- Puerto Colombia y La Guadalupe: Se identificó la presencia de individuos arbóreos que podrían requerir aprovechamiento forestal, además de la necesidad de actividades de descapote y excavación.
- Restricciones normativas: Todas las intervenciones en estos sectores deben ajustarse a los lineamientos de la Reserva Forestal de la Ley Segunda.
- Infraestructura existente: En La Guadalupe se evaluará una escalinata actual para determinar si se integra al diseño definitivo o se retira.
- Cacahual: El área proyectada se encuentra sobre sustrato rocoso con vegetación de bajo porte.

Componente Geológico y Geotécnico

- Puerto Colombia: Presencia de migmatitas con alta resistencia, cubiertas por saprolito (~3 m) y depósitos arcillosos plásticos (~3 m).
- La Guadalupe: Predominio de depósitos arcillosos de alta plasticidad con taludes subverticales estables y sin evidencias de procesos erosivos significativos.
- Cacahual: Afloramientos de granitos con alta resistencia mecánica y escasa fracturación, consistentes con las características del escudo guyanés

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.3 Lote 3

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Contractual y Administrativa

- Seguimiento Contractual: Se ejecutan las labores para la elaboración y presentación de documentos de seguimiento según el anexo técnico, los requerimientos específicos y el manual de interventoría de INVIAS vigente.
- Vinculación de Personal: Se iniciaron las actividades administrativas y logísticas para la contratación del personal profesional y técnico necesario para la ejecución.
- Atención a Interventoría: Se gestionan y responden las observaciones y requerimientos realizados por la interventoría respecto a las hojas de vida del equipo profesional.

Revisión de Diagnósticos y Documentación de Soporte

- Análisis de Hitos: Los especialistas de la consultoría se encuentran en la fase de revisión de los diagnósticos suministrados por INVIAS para cada uno de los hitos del proyecto.
- Documentación Secundaria: Se analiza información proveniente de los EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial), planes de gobierno y otros datos relevantes.
- Estructuración de Entregables: Esta recopilación de antecedentes y revisión de accesos (terrestres y fluviales) servirá de base para el Volumen I (Estudio de Identificación de Necesidades) y el Volumen X (Gestión Ambiental, Social y Sostenibilidad).

Avances en Estudios Técnicos

- Geología y Geomorfología: Se consolidan las tareas de revisión de imágenes satelitales y fotografías aéreas de cada hito para la elaboración de este volumen técnico.

- Hidrología: Se han enfocado esfuerzos para avanzar en el estudio hidrológico correspondiente a cada uno de los hitos del contrato.

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.4 Lote 4

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Durante el primer mes de ejecución, las principales actividades administrativas y de gestión realizadas por el consultor se centraron en la organización inicial y el cumplimiento de requisitos para el arranque formal del contrato. Las actividades destacadas incluyen:

- Consolidación de documentos: Se trabajó en la documentación necesaria para obtener la aprobación de la Interventoría y la orden de inicio formal.

- Gestión de personal profesional: Se presentaron y gestionaron las hojas de vida del equipo propuesto, lo que incluyó la verificación de títulos académicos, tarjetas profesionales y certificaciones de experiencia según los perfiles requeridos.

- Trámites contractuales: Se elaboró y radicó la documentación para la prórroga del contrato, atendiendo requerimientos identificados desde el inicio de la relación contractual.

- Planificación técnica y cronograma: Se elaboró el cronograma general de ejecución para los catorce volúmenes técnicos, estableciendo plazos, interdependencias y fechas de entrega. También se definieron las metodologías particulares para los primeros volúmenes técnicos.

- Acercamiento institucional: Se realizó una reunión con el Secretario de Planeación de Unguía para presentar el proyecto, establecer canales de comunicación y recopilar información secundaria relevante sobre el territorio y su infraestructura.

- **Organización y logística:** El periodo se dedicó a la organización administrativa, revisión de información existente, estructuración del plan de trabajo y la **preparación logística** para futuras actividades.

Es importante notar que durante este período **no se realizaron actividades de campo**, ya que los esfuerzos estuvieron concentrados en la planificación y la organización administrativa

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.5 Lote 5

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Administrativa y Contractual

- Seguimiento con Interventoría: Se llevaron a cabo reuniones técnicas para abordar los alcances del Volumen IV (Geotecnia) y el Volumen V (Hidrología, Hidráulica, Socavación y Dinámica Fluvial). Asimismo, el 16 de enero se atendieron observaciones relacionadas con el cronograma del proyecto y el 26 de enero se realizó el Comité No. 03 de carácter presencial.
- Gestión de Cotizaciones: Se adelantaron los procesos administrativos para finiquitar las cotizaciones de los monitoreos de calidad del agua en el río Caquetá.
- Coordinación Logística: Se organizó el desplazamiento del equipo interdisciplinario para la ejecución de la primera visita técnica al territorio.

Relacionamiento Institucional y Social

- Acercamiento con Alcaldías: Se estableció contacto institucional con las administraciones de Solita y Solano para informar sobre el desarrollo del proyecto y coordinar actividades. Entre el 21 y 22 de enero, se presentaron formalmente los alcances ante las alcaldías, incluyendo al Secretario de Planeación y la Dirección de Servicios Públicos de Solano.
- Gestión de Permisos y Socialización: Se remitieron los cronogramas de actividades sociales a la interventoría y se gestionaron los permisos necesarios para el ingreso de los equipos de geotecnia en Solita.
- Autoridades Fluviales: El 23 de enero se realizó una reunión técnica con el Inspector Fluvial de Solano en la ciudad de Florencia para el intercambio de información técnica y presentación del proyecto.

Actividades de Reconocimiento y Campo

- Visita Técnica Interdisciplinaria: Se ejecutó la primera visita de reconocimiento entre el 19 y 25 de enero de 2026 en los municipios de Solita y Solano.
- Inspección de Infraestructura:
    - Solita: Reconocimiento visual del muelle existente y del muelle de carga de ganado.
    - Solano: Inspección técnica del muelle de carga y pasajeros, así como del muelle de ganado.

- Recorrido Fluvial: Se realizó el desplazamiento técnico por vía fluvial desde Solita hacia Solano para el reconocimiento del área de influencia.
-

Componente Ambiental y de Diagnóstico

- Diagnóstico del Proyecto: Durante la primera semana de enero se consolidó el documento de diagnóstico general basado en la revisión de información secundaria existente.
- Infraestructura de Saneamiento: Se realizaron visitas de inspección técnica a las plantas de tratamiento de agua en ambos municipios (Solano y Solita) como parte del levantamiento de información ambiental.

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.6 Lote 6

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Documental y Metodológica

- Estructuración Técnica: Se realizó la entrega de las metodologías generales y particulares para la totalidad de los volúmenes del contrato, las cuales definen los lineamientos y procedimientos para los estudios y diseños.
- Instrumentos de Planeación: Se desarrollaron y entregaron el cronograma de actividades, el plan de inversión y el acta modificatoria derivada de la prórroga del contrato.
- Aprobaciones: Mediante el Oficio II-871-L6-022-2026, la interventoría formalizó la aprobación de las metodologías propuestas.

Gestión de Talento Humano

- Vinculación de Profesionales: Se entregaron las hojas de vida, certificados de experiencia y soportes académicos de los responsables de cada volumen técnico.
- Estado de Aprobación: Tras los procesos de subsanación (como en el caso del topógrafo para el Lote 6), se obtuvo la aprobación del personal de consultoría según consta en el Oficio II-871-L6-008-2026.

Seguimiento y Coordinación Institucional

- Comité de Seguimiento: El 26 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones del INVIAS en Bogotá.
- Participantes: El comité contó con la asistencia del supervisor y gestor técnico de INVIAS, la dirección y residencia de la Interventoría, y el equipo directivo de la Consultoría.
- Acuerdos Técnicos: Durante la sesión se revisó el estado del contrato, se aclararon dudas sobre los tiempos de entrega y se definieron los formatos oficiales a utilizar durante el desarrollo del proyecto.

Planeación de Actividades de Campo

- Reconocimiento Territorial: Se iniciaron las gestiones para la primera visita técnica a La Tola, quedando pendiente la confirmación de la fecha definitiva para su ejecución

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

No aplica

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Informes Semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales por LOTES, correspondientes al período comprendido del 16 al 31 de enero de 2026:

Los informes por Lotes se adjuntan en Anexo.

Tabla 8 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 1.

Lote No.	**1**		
No. Semana	Periodo		
5	12	Enero/Enero	18
6	19	Enero/Enero	25

Tabla 9 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 2.

Lote No.	**2**		
No. Semana	Periodo		
6	16	Enero/Enero	22
7	23	Enero/Enero	29

Tabla 10 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 3.

Lote No.	**3**		
No. Semana	Periodo		
6	16	Enero/Enero	22
7	23	Enero/Enero	29

Tabla 11 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 4.

Lote No.	**4**		
No. Semana	Periodo		
5	16	Enero/Enero	22
6	23	Enero/Enero	29

Tabla 12 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 5.

Lote No.	5		
No. Semana	Periodo		
5	12	Enero/Enero	18
6	19	Enero/Enero	25
7	29	Enero/Febrero	4

Tabla 13 listado informes semanales para periodo de enero. Lote 6.

Lote No.	6		
No. Semana	Periodo		
5	12	Enero/Enero	18
6	19	Enero/Enero	25
7	26	Enero/Febrero	1

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría

No aplica

4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.

A continuación, se muestra el personal presentado por la Consultoría y aprobado por la Interventoría para ejecutar cada uno de los proyectos:

4.3.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.”

Tabla 14 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 1

CONSULTORÍA LOTE 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL CONTRATO 1914 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	X		3/12/2025	APROBADO II-871-L1-003-2025 (03-12-25
2	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025 (02-12-25)
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	RICARDO ANDRÉS BLANCO CASTAÑEDA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	LEONARDO PACHECO NIÑO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
5	INGENIERO AUXILIAR 1	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
6	INGENIERO AUXILIAR 2	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
7	INGENIERO AUXILIAR 3	ANDRES FELIPE PRIETO LÓPEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
8	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO BOLIVAR TIBOCHA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
9	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	PAOLA ANDREA LLANES VEGA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
10	GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
11	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
12	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
13	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
14	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JORGE ANDRES ROA ROMERO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
15	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
16	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
17	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
18	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
19	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
20	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	DANIEL CAMILO SÁNCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
21	PROFESIONAL SOCIAL 1	GEORGINA ELIZABETH QUINTANA GONZALEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
22	PROFESIONAL SOCIAL 2	CLAUDIA PATRICIA GALINDO SUAREZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
23	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	MARIA DEL PILAR CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
24	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	DANIEL CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
25	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	NELSON JAVIER MORALES MELO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
26	PROFESIONAL SIG	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
27	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERNAL	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
28	PROFESIONAL NAVAL	EDWIN GIOVANNY PAIPA SANABRIA	X		30/12/2025	OFICIO CON APROBACION II-871-L1-009-2026
29	DIBUJANTE 1	WILLIAM NICOLAS PRIETO SANCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
30	DIBUJANTE 2	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
31	ESPECIALISTA EN HIDRAHILICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025

4.3.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 2.**

Tabla 15 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 2**.**

CONSULTORÍA LOTE 2 CONSORCIO NAVEGABILIDAD - CONTRATO 1915 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	SILVERIO FARIAS MENDOZA	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ALLEN BATEMAN	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CAROLINA ISABEL GARZON BUITRAGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
4	INGENIERO AUXILIAR 1	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA ARIZALA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
5	INGENIERO AUXILIAR 2	LINA GARCES RAVELO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-025-2026 CAMBIO
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FRANCISCO DE PAULA PEREZ AMAYA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	URIEL GUERRERO FARFÁN	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
8	GEOLOGO	JOSE HEYLEY VERGARA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEXANDER GÓMEZ CASSAB	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	YOHOLIMA MARTINEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	YOLIMA MARTINEZ GUERRERO	x		9/1/2002	OFICIO APROBACIÓN II-87-L2-008-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	ASTRID BLANCO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	WALTER GIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	OLGA TORRES CAMARGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	PABLO GARCIA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	FELISA ARIZALA	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	LUZ ESTELLA GUTIERREZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	NATALIA ARCILA CORTES	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIANA CATALINA BLANCO FIGUEROA	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-007-2026
24	PROFESIONAL SIG	JOHNATAN CRHISTIAN PAZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	PAOLA GALINDO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
26	PROFESIONAL NAVAL	CARLOS ORAMAS	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
27	DIBUJANTE 1	MICHAEL ANDRÉS TELLO ENCISO	X		6/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
28	DIBUJANTE2	JENY VANESSA FANDIÑO SARMIENTO	X		8/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026

4.3.3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 3.**

Tabla 16 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 3.

CONSULTORÍA LOTE 3 CONSORCIO VIA FLUVIAL CONTRATO 1892 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026
4	INGENIERO AUXILIAR 1	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
5	INGENIERO AUXILIAR 2	JUAN CARLOS SANCHÉZ GAFARO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SANCHEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	DAVID RENGIFO SAAVEDRA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
8	GEOLOGO	VICTOR ERNESTO SEDIEL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JUAN MANUEL CEPEDA SUAREZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS GERMAN BULLA CAICEDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	PRISCILA RAMOS OCAMPO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	ALEXANDRA BERNAL SANCHÉZ	X		14/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-L3.008-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	DANIELA BRICEÑO QUINTERO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALEXANDER BARON AVILA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	SANDRA MILENA ALVAREZ ABRIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	MELANY LISETH BUSTOS RUIZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
24	PROFESIONAL SIG	JAIRO ROJAS LEAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
26	PROFESIONAL NAVAL	HECTOR ALFONSO ESCOBAR ACOSTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
27	DIBUJANTE 1	JORGE ANDRÉS FAJARDO ROJAS	X		14/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-008-2026
28	DIBUJANTE2	VALENTINA SILVA RAMOS	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026

4.3.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 4.**

Tabla 17 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 4.

CONSULTORÍA LOTE 4 TORRES Y ASOCIADOS SAS - CONTRATO 1882 DE 2025

PERSONAL CLAVE

ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	X		4/12/2025	OFICIO APRONACIÓN II-871-L4 001-2025

PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE

	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	MARLON MOGOLLO ROMERO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	LORENA PRASCA RAMIREZ	X		27/01/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 014-2026
7	GEÓLOGO	DIANA CAROLINA CHAPARRO PIRAJON	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	YEIMI GARCIA MORENO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	CARLOS MAURICIO FONSECA GAMBA	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
10	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	JAIME ECHEVERRIA RODRIGUEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	NESTOR CAMILO SIERRA RODRIGUEZ	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULIANA HERRERA MACIAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ	X		16/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 028-2026
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FRANCY DANIELA DUARTE	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
16	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
17	PROFESIONAL SOCIAL	EDNA RUTH GARZON ROJAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JUAN SEBASTIAN PALMA MORENO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	LAURA MAHECHA BUITRAGO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
21	PROFESIONAL SIG	IBETH MURCIA PEÑA	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
22	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
23	PROFESIONAL NAVAL	EDUARDO CUBAQUE BERNAL	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
24	DIBUJANTE	SEBASTIAN HERNANDEZ CHAVEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026

4.3.5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 5.**

Tabla 18 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 5.

CONSULTORÍA LOTE 5 CONSORCIO MNF CONTRATO 1957 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		1/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-003-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		27/11/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ANDRES MARTINEZ	X		17/12/25	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
4	INGENIERO AUXILIAR	LARRY GONZALEZ BARRERA	X		15/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871 LS-005-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	JORGE IGNACIO VELEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	MARCELO BEDOYA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
7	GEOLOGO	MARIO ALBERTO VARGAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	EDWIN DOMIGUEZ MORENO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-009-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE MANUEL ALVAREZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MARIA EULALIA ARTETA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871 LS-008-2025
16	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALBA LINARES TAFUR	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
17	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	SANDRA MURILLO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CATALINA MOLINA LOZAN	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	BRIAN RIOS BORRAEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
21	PROFESIONAL SIG	LISMAR ROSSANA MALDONADO MEDINA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871 LS-006-2025
22	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	MARCO MONTENEGRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871 LS-006-2025
23	PROFESIONAL NAVAL	ORLANDO CASTAÑEDA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
24	DIBUJANTE 1	MARIO MONTENEGRO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025

4.3.6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 6.**


Tabla 19 Relación del Personal aprobado para consultoría para Lote 6.

CONSULTORÍA LOTE 6 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO 1968 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	X		16/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-0011-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-014-2026
6	GEÓLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
7	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY RUIZ PIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA	X		16/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
10	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	X		13/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
12	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
13	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
14	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	X		13/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES OFICIO II-871-L6-008-2026
15	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	DIEGO ANDRÉS ROJAS MONTERO	X		16/01/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
16	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEIMY TORRES AFRICANO	X		13/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
17	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIEGO FERNANDO SEQUEDA	X		23/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-016-20216
18	PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
19	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	CARLOS HERNANDO RIOS FERRERIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
20	DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026

A continuación, se presentan el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, correspondientes al presente periodo.


Lote 1.

Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1.

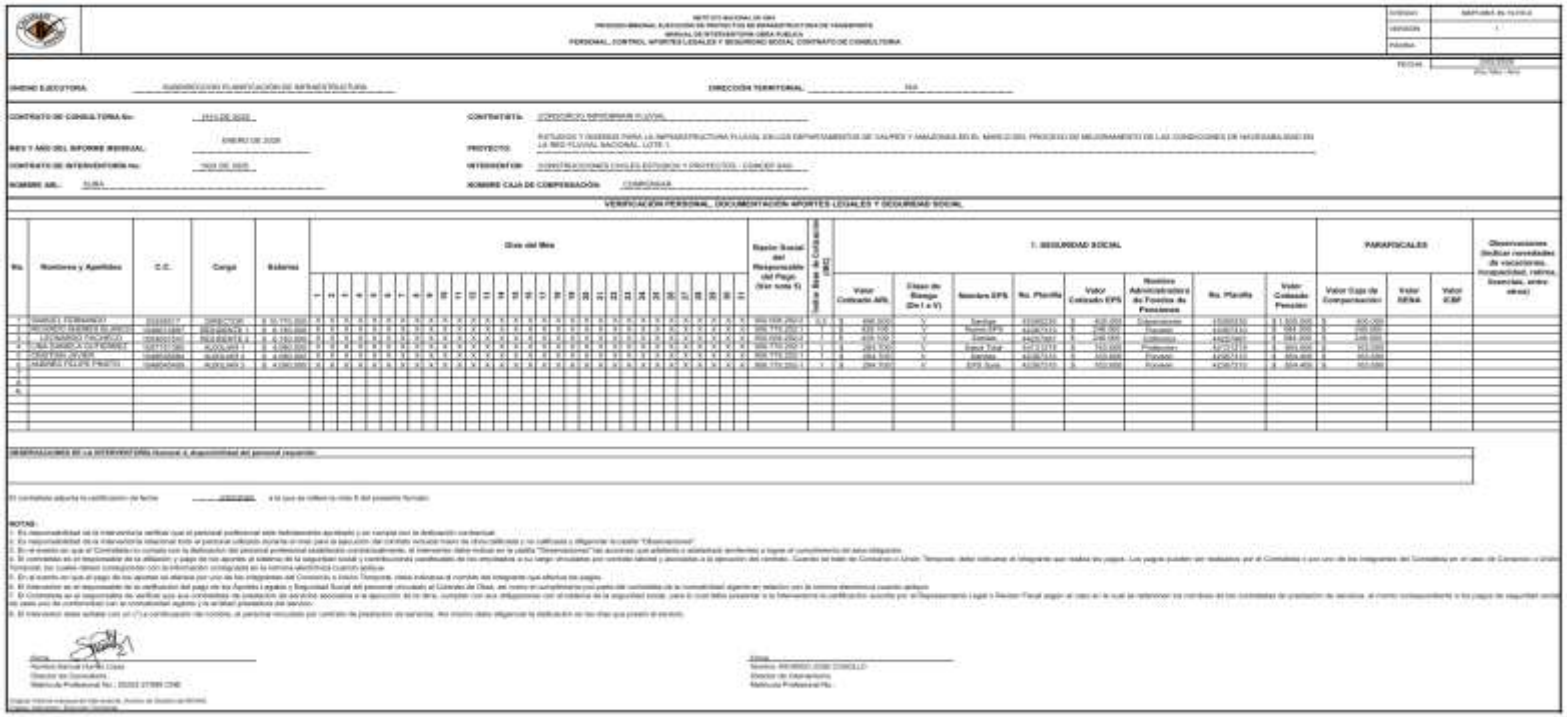

Lote 2.

Figura 33 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 2.

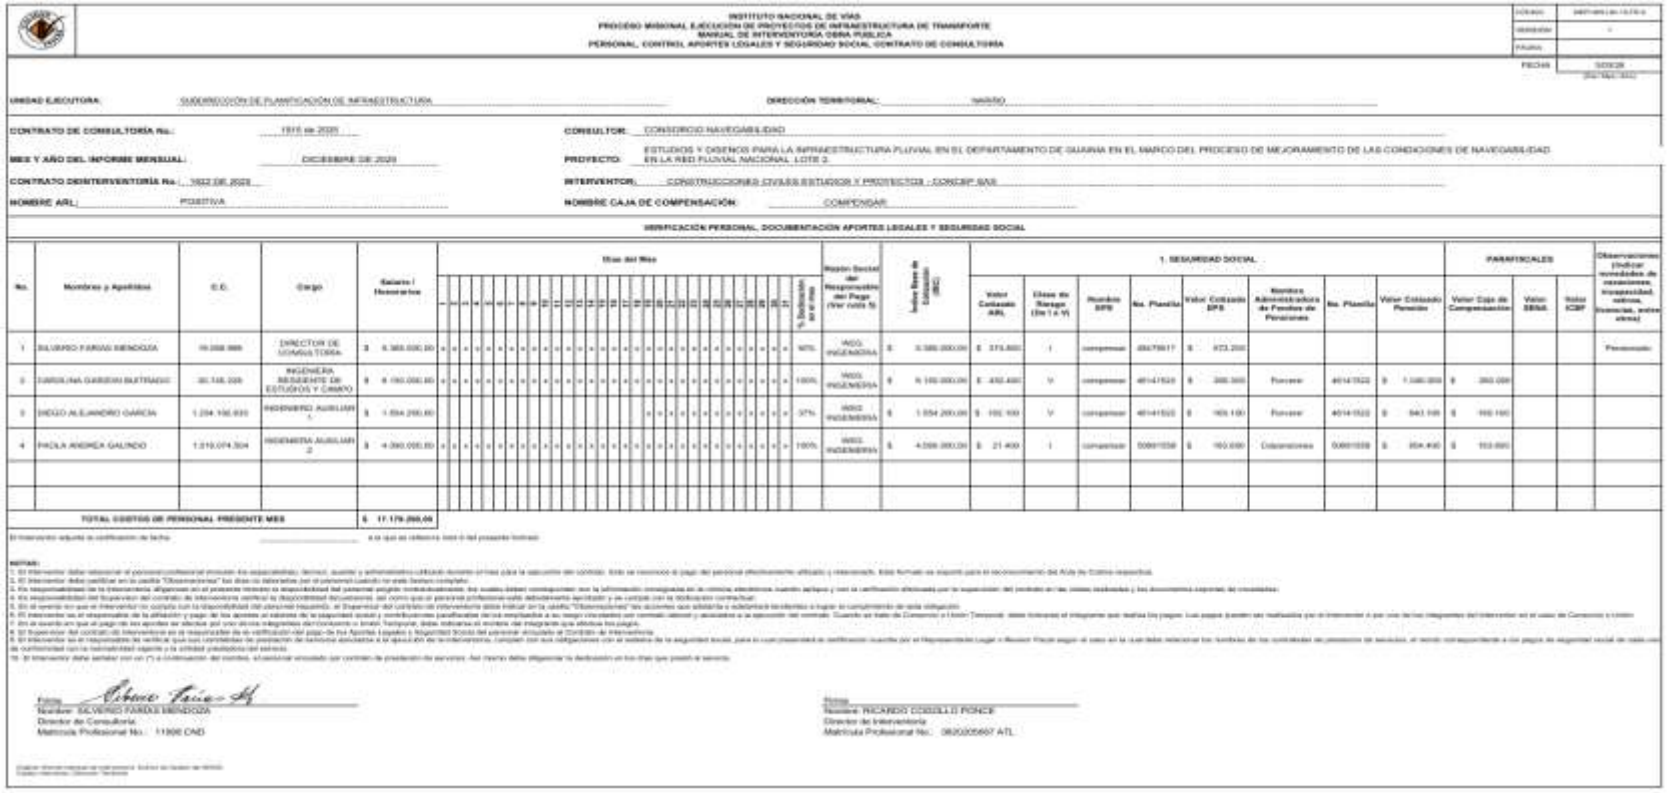

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1515 de 2020 — CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 2.

CONTRATO DEINTERVENTORÍA No.: 1602 DE 2020 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENDAR


VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Nombre Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I A V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVERIO FARIAS MENDOZA	19.358.999	DIRECTOR DE CONSULTORIA	$ 9.380.000,00	x x x

Lote 4.

Lote 5.

Figura 34 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 5.

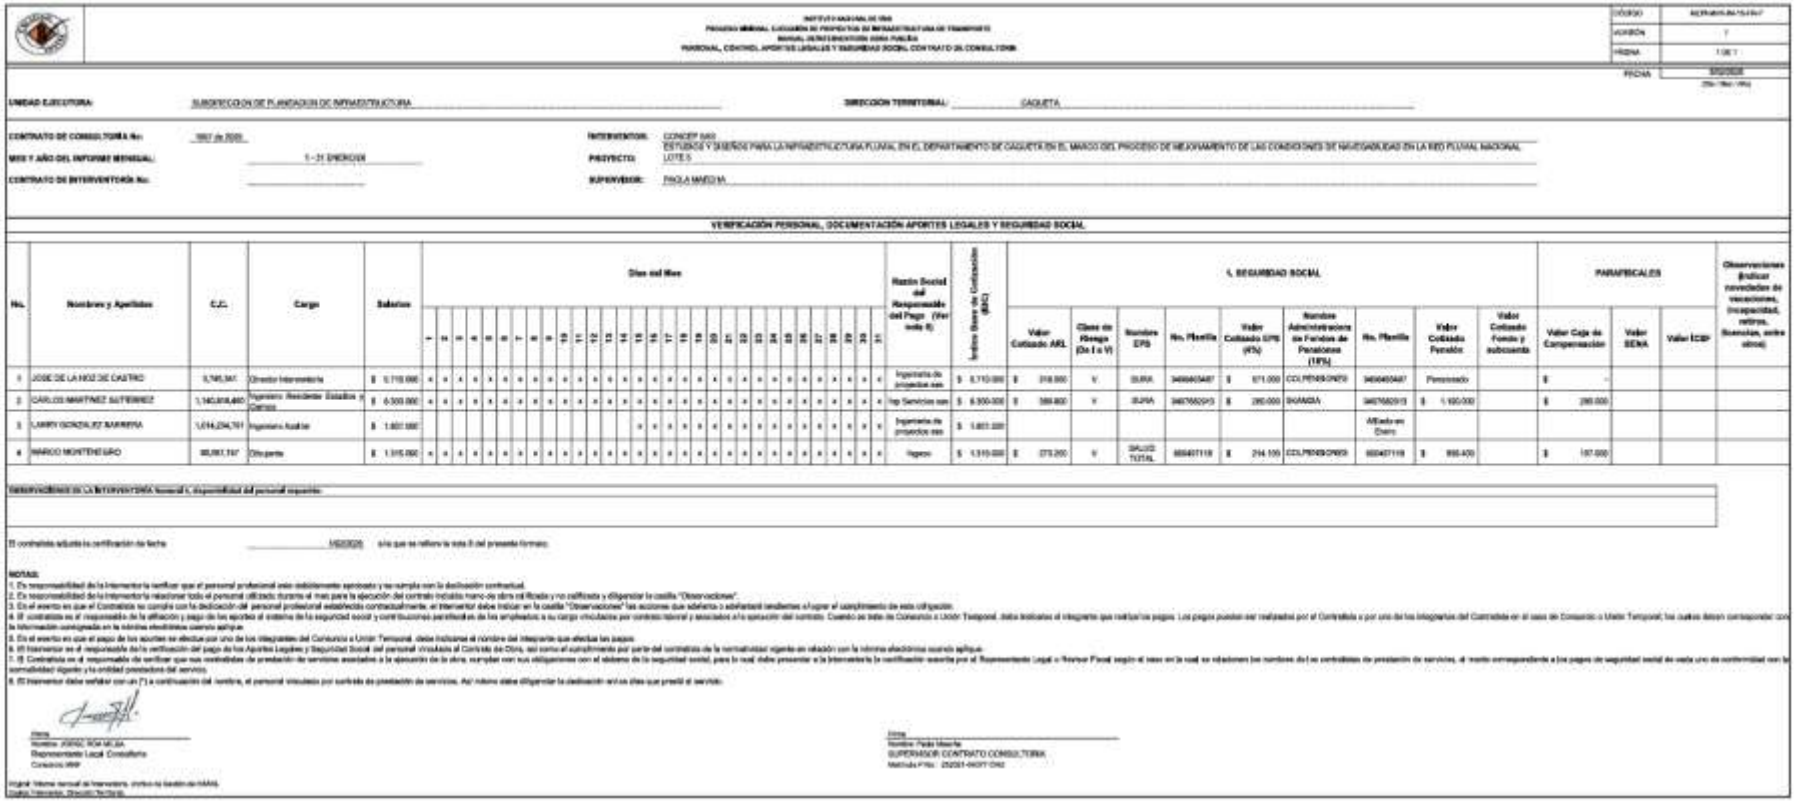

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: — INTERVENTOR: CONCEP SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 ENERO/24 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: — SUPERVISOR: PAOLA MADEIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	I. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS (4%)	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones (16%)	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Cotizado Fondo y subcuenta	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	9,745,347	Director Interventoría	$ 5.710.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 5.710.000	$ 318.000	V	SURA	9496405487	$ 571.000	COLPENSIONES	9496405487	Pensionado		$ -			
2	CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	1,140,818,480	Ingeniero Residente Estudios y Diseños	$ 6.500.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Inp Servicios sas	$ 6.500.000	$ 389.800	V	SURA	9467582913	$ 260.000	SKANDIA	9467582913	$ 1.950.000		$ 260.000			
3	LARRY GONZALEZ BARRERA	1,014,234,781	Ingeniero Auxiliar	$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 1.800.000							Afiliado en Claro						
4	MARCO MONTENEGRO	86,061,197	Ofic perito	$ 1.310.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeco	$ 1.310.000	$ 273.200	V	SALUD TOTAL	65407118	$ 214.105	COLPENSIONES	65407118	$ 655.400		$ 157.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA frente a la disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha HOY/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y no cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra no calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecida contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realizará los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la última planilla/mes cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe incluirse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la norma electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus novedades de prestación de servicios asociadas a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación exigida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma
Nombre: JORGE ROA MEJIA
Representante Legal Consultoría
Consorcio XXX

Firma
Nombre: Paola Maceira
SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORIA
Matrícula Prof.: 252021-XXXXX-CND

Original: Informe mensual de Interventoría, archivo en medio de XXXX.
Copia: Interventor, Director Técnico

Lote 6.


Figura 35 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 6.

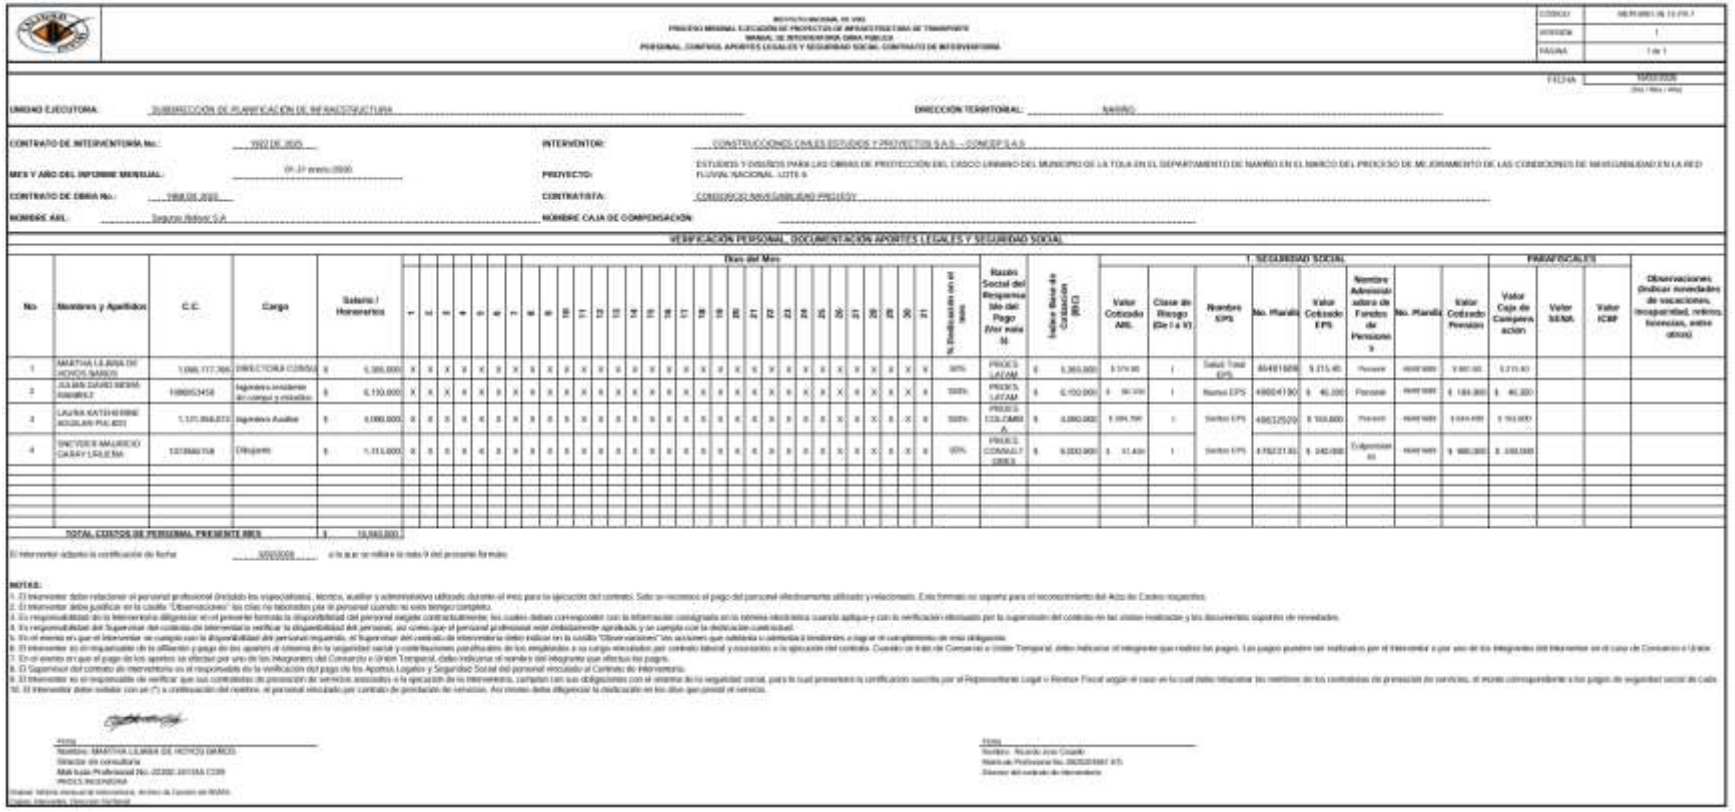

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría

Lote 1.

Figura 33 Informe financiero lote 1.

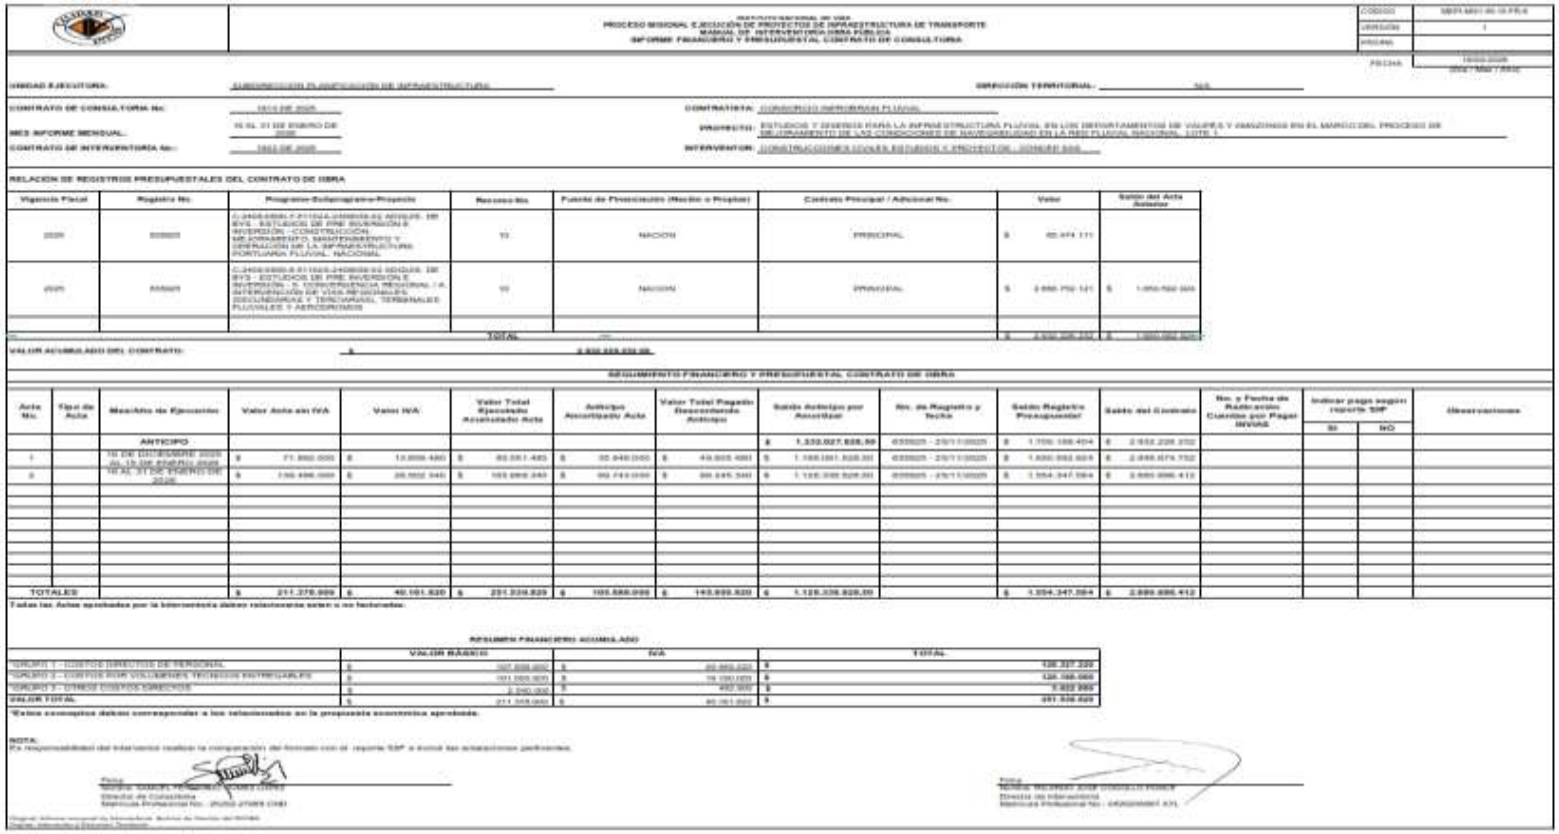

Lote 2.

Figura 34. Informe financiero Lote 2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	3/03/26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N.A.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1915 DE 2025 — **CONTRATISTA CONSULTOR:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 — **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	10683324	C-2406-0600-7-51102A-24060309-02	10	Nación	Principal	$ 43.187.756,00	
		C-2406-0600-6-51102A-24060309-02	10	Nación	Principal	$ 1.890.954.926,00	
				TOTAL		$ 1.934.142.682,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.934.142.682,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 812.664.992,50						834125 del 28/11/2025	$ 1.121.477.689,50	$ 1.934.142.682,00				ANTICIPO
1	C	16 al 31 de Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.664.992,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.121.477.689,50	$ 1.934.142.682,00				
2	C	1 al 31 de enero de 2026	$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,00	$ 157.194.692,00	$ 66.050.000,00	$ 91.144.692,00	$ 721.520.300,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.030.332.997,50	$ 1.776.947.990,00				
TOTALES			$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,00	$ 157.194.692,00	$ 66.050.000,00	$ 91.144.692,00	$ 721.520.300,50		$ 1.030.332.997,50	$ 1.776.947.990,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1	$ 40.583.680,00	$ 7.710.937,20	$ 48.294.617,20
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES - Grupo 2	$ 59.100.000,00	$ 11.229.000,00	$ 70.329.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 32.412.500,00	$ 6.158.375,00	$ 38.570.875,00
-			
VALOR TOTAL	$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,20	$ 157.194.692,20

"Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SILVERIO FARÍAS MENDOZA
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 11998 CND

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Lote 3.

Figura 35 Informe financiero Lote 3.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) FEBRERO (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CENTRAL

CONTRATO DE OBRA N°: 1892 DE 2025
MES INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1892-2025
CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.
INTERVENTOR: CONSORCIO CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	834225	C-2406-0600-7-51102A-2406036-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 41.534.997,00	
2025	834225	C-2406-0600-8-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 1.818.589.685,00	
			TOTAL			$ 1.860.124.682,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.860.124.682,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta N°	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal inicial	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
							$0,00							
1	E&D	dic-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.860.124.682,00	$ -	$ 1.860.124.682,00			X	
2	E&D	ene-26	$ 98.825.000,00	$ 18.776.750,00	$ 117.601.750,00	$ -	$ -	$ 1.742.522.932,00	$ 117.601.750,00	$ 1.742.522.932,00			X	
TOTALES			$ 98.825.000,00	$ 18.776.750,00	$ 117.601.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.825.000,00	$ 18.776.750,00	$ 117.601.750,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 98.825.000,00	$ 18.776.750,00	$ 117.601.750,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Via Fluvial
Contratista


Firma
Nombre: JOSE RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Concep S.A.S.
Interventor

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) - Copias: Interventor y Dirección Territorial

Lote 4. Durante este periodo no aplica

Lote 5.

Figura 36 Informe financiero Lote 5.

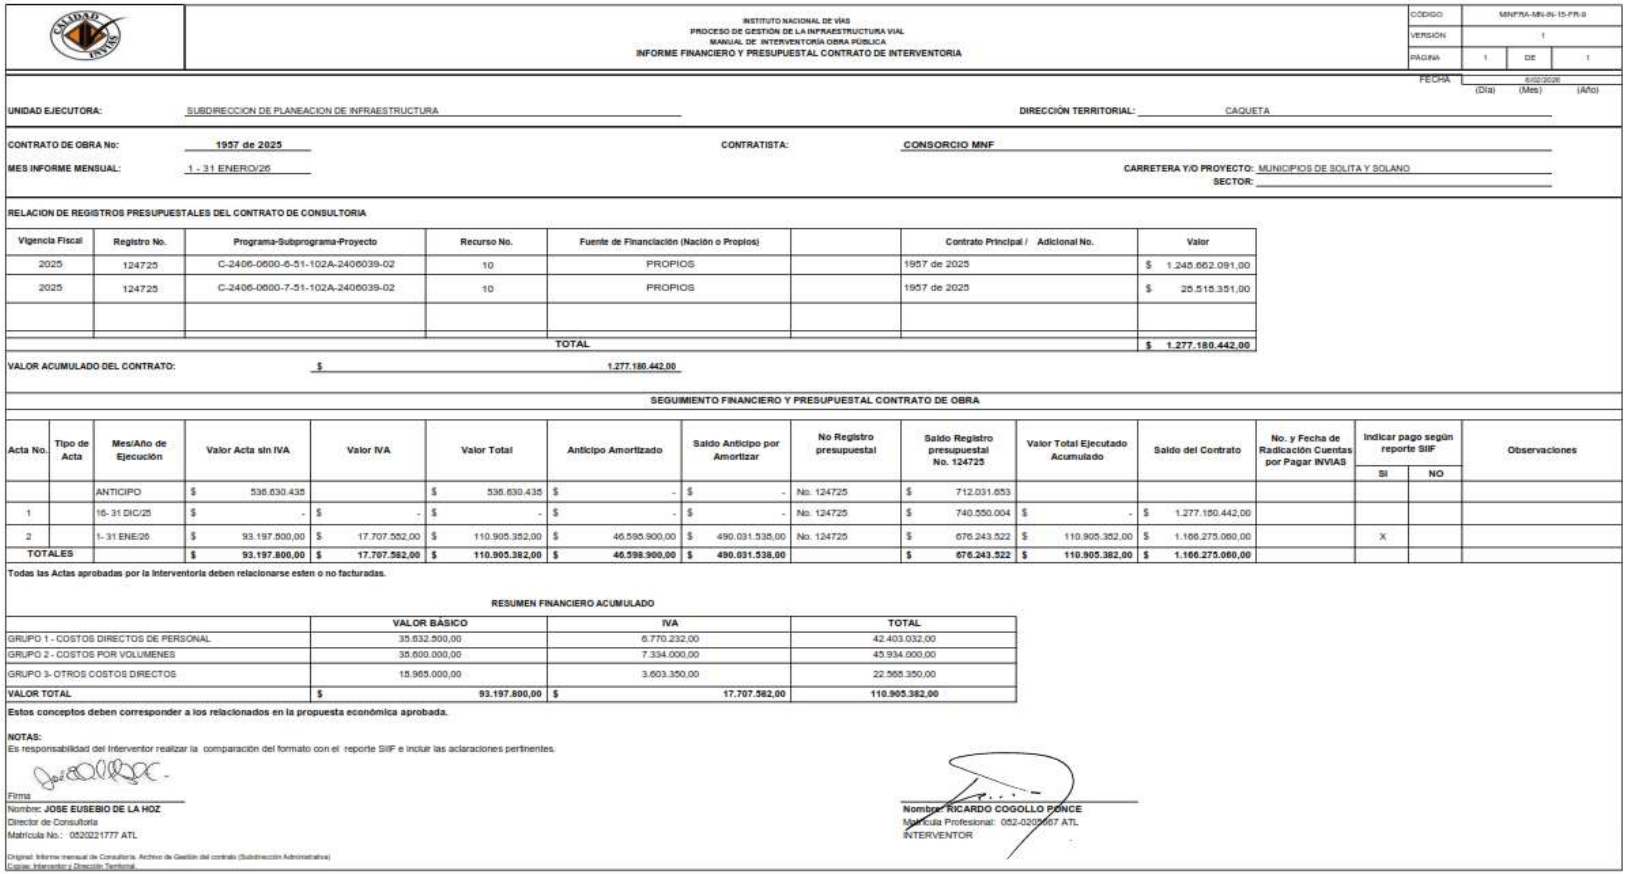

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-II		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	6/02/2026 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 ENERO/26 — CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO

SECTOR:

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2025	124725	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 1.248.662.091,00
2025	124725	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 28.518.351,00
				TOTAL			$ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.277.180.442,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 124725	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 536.630.435		$ 536.630.435	$ -	$ -	No. 124725	$ 712.031.653						
1		16- 31 DIC/25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No. 124725	$ 740.550.004	$ -	$ 1.277.180.442,00				
2		1- 31 ENE/26	$ 93.197.500,00	$ 17.707.582,00	$ 110.905.352,00	$ 46.598.900,00	$ 490.031.538,00	No. 124725	$ 676.243.522	$ 110.905.352,00	$ 1.166.275.090,00		X		
TOTALES			$ 93.197.800,00	$ 17.707.582,00	$ 110.905.382,00	$ 46.598.900,00	$ 490.031.538,00		$ 676.243.522	$ 110.905.382,00	$ 1.166.275.090,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	35.632.500,00	6.770.232,00	42.403.032,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES	38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00
GRUPO 3- OTROS COSTOS DIRECTOS	18.965.000,00	3.603.350,00	22.568.350,00
VALOR TOTAL	$ 93.197.800,00	$ 17.707.582,00	110.905.382,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


Firma
Nombre: JOSE EUSEBIO DE LA HOZ
Director de Consultoria
Matrícula No.: 0520221777 ATL

Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matrícula Profesional: 052-0205667 ATL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

Lote 6.

Figura 37 Informe financiero Lote 6.

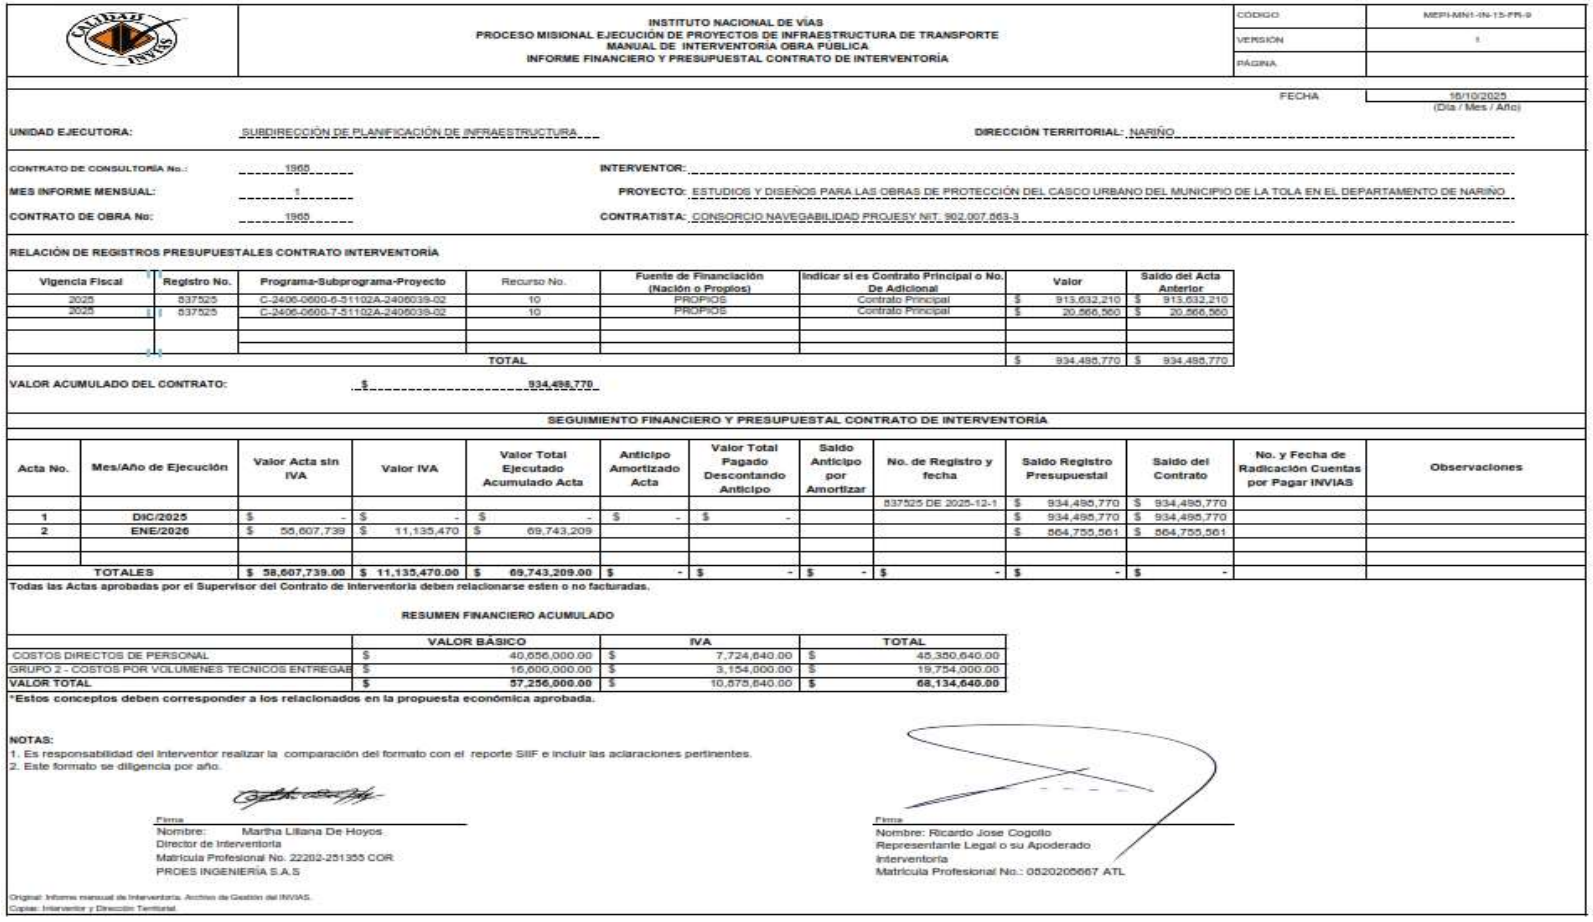

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 16/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1965
INTERVENTOR:
MES INFORME MENSUAL: 1
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No: 1965
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.563-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	Contrato Principal	$ 913,632,210	$ 913,632,210
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	Contrato Principal	$ 20,866,560	$ 20,866,560
			TOTAL			$ 934,498,770	$ 934,498,770

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 934,498,770

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								837525 DE 2025-12-1	$ 934,498,770	$ 934,498,770		
1	DIC/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 934,498,770	$ 934,498,770		
2	ENE/2026	$ 58,607,739	$ 11,135,470	$ 69,743,209					$ 864,755,561	$ 864,755,561		
	TOTALES	$ 58,607,739.00	$ 11,135,470.00	$ 69,743,209.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 40,656,000.00	$ 7,724,640.00	$ 48,380,640.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGAB	$ 16,600,000.00	$ 3,154,000.00	$ 19,754,000.00
VALOR TOTAL	$ 57,256,000.00	$ 10,878,640.00	$ 68,134,640.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Martha Liliana De Hoyos
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR
PROIES INGENIERÍA S.A.S

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

4.5. Estado general del Tiempo

No aplica.

4.6. Resumen Ensayos de laboratorio


Durante este periodo no aplica.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, para cada uno de los Consultores:

Lote 1.

Figura 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.

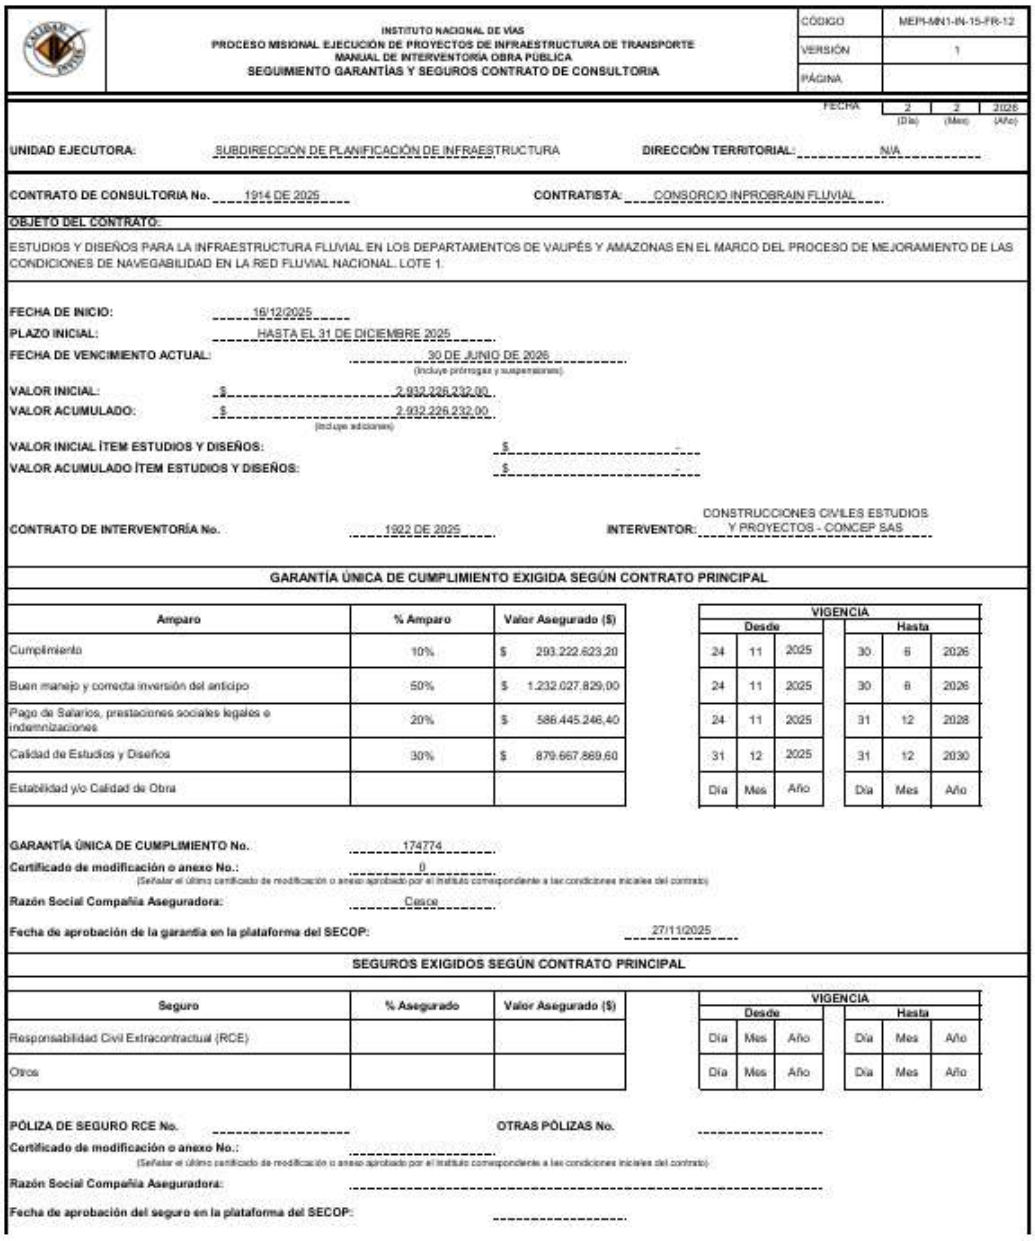

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFROBRAIN FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2.932.226.232,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.932.226.232,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ---------- **OTRAS PÓLIZAS No.** ----------
Certificado de modificación o anexo No.: ----------
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ----------
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ----------

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

Clausula vigesima primera paragrafo primero:
"Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoria"

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 2.

Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1915 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.934.142.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día Mes Año)	VIGENCIA Hasta (Día Mes Año)
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	16 12 2025	1/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	16 12 2025	1/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	16 12 2025	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	31 12 2025	31 12 2030
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día Mes Año)	VIGENCIA Hasta (Día Mes Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	29 / 12 / 2025	15/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	29 / 12 / 2025	15/11/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	29 / 12 / 2025	15 / 5 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	15 / 5 / 2026	15 / 5 / 2031
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **Ricardo Cogollo Ponce**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820205667ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 3

Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 1/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.860.124.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S- CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....
Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: .....
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	11	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal
Consultoria
Matricula Profesional No.:

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Delegado
Interventor:
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 4

Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.

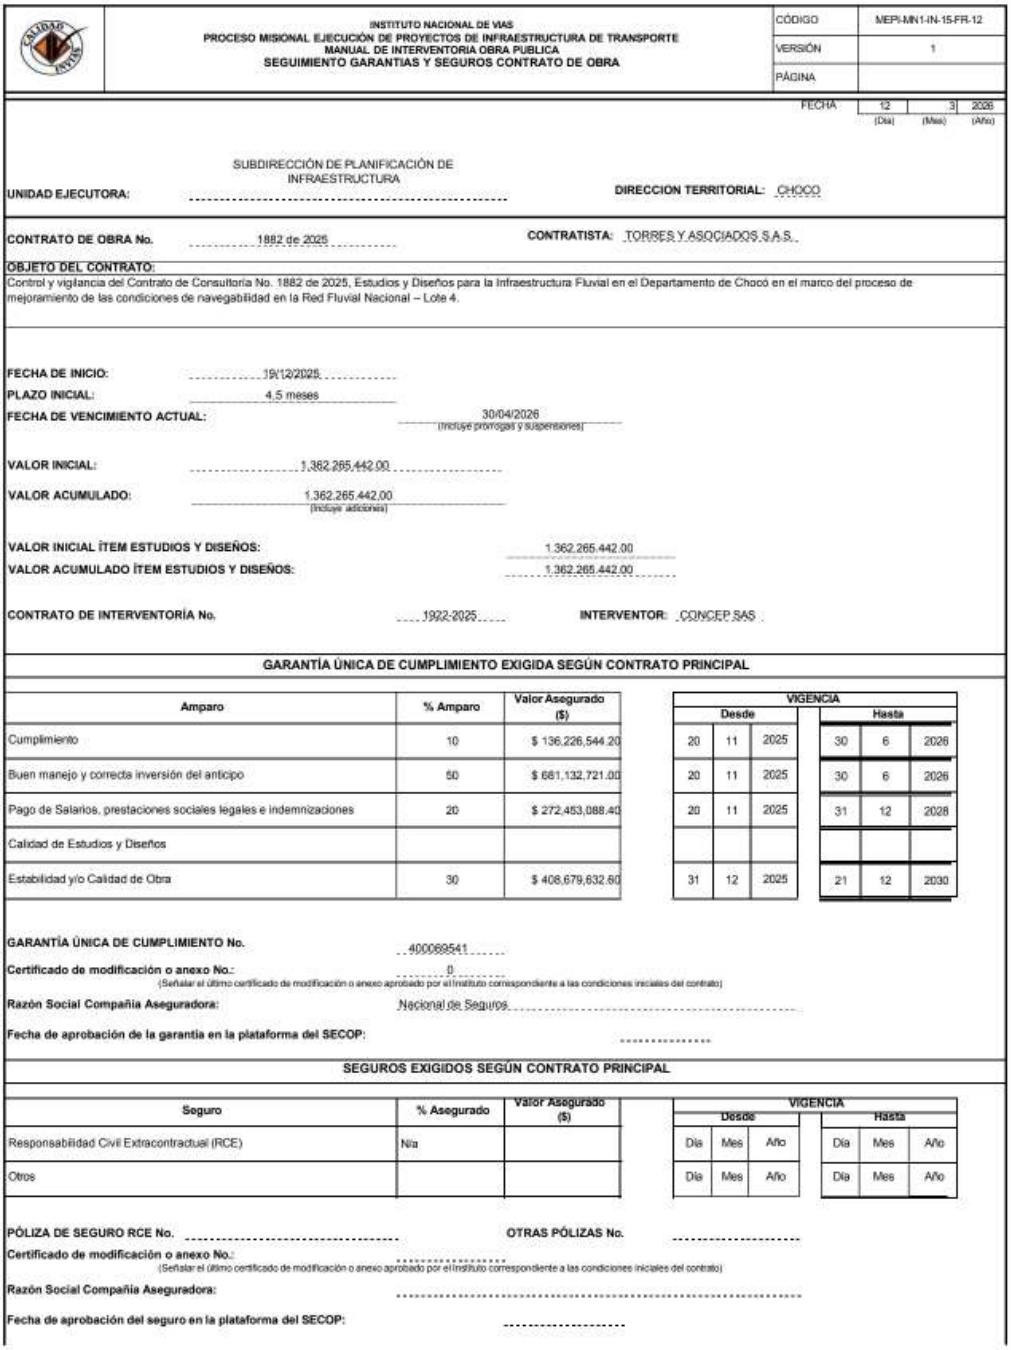

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1882 de 2025 — CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
Control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1882 de 2025, Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el Departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 4.

FECHA DE INICIO: 19/12/2025
PLAZO INICIAL: 4.5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prorrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 1.362.265.442,00
VALOR ACUMULADO: 1.362.265.442,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: 1.362.265.442,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: 1.362.265.442,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922-2025 — INTERVENTOR: CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 136.226.544,20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 681.132.721,00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 272.453.088,40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 408.679.632,60	31	12	2025	21	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.: — OTRAS PÓLIZAS No.:
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) | (Mes) | 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Cumplimiento	10	$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 681,132,721.00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/a							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069641

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo Ponce
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 5

Figura 42 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1957 de 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MNF

OBJETO DEL CONTRATO:

Estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.277.180.442,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27 11 2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27 11 2025	30/06/2026
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27 11 2025	31 12 2028
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31 12 2025	31 12 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101141984

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/12/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 26 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27	11	2025	31/10/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27	11	2025	31/10/2026		
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27	11	2025	31	4	2029
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31	12	2025	31	12	2030

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La presente se encuentra ajustada según la Prorroga No. 1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Ricardo Cogollo P.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082-02-05667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 6

Figura 43 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 6 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1968 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 0,6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	1	7	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	1	7	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	31	12	30
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	30	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	30	10	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	30	4	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205

Certificado de modificación o anexo No.:2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	n/a							
Otros	n/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No aplica para el presente periodo

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de consultoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2

4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones

Para el presente informe se entrega el programa de inversiones en el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1

4.9.3. Actas de comité y reunión

En el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones o comités de obra:

En reunión de Comité celebrada el 26 de enero de 2026 se informó a los Consultores sobre los períodos a tener en cuenta en la presentación de informes semanales y mensuales.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

A continuación, se presenta la información básica del Contrato de Interventoría.

Tabla 20 Información del contrato de Interventoría**.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	No. 1922 de 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16-12-2025
Objeto del contrato	Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Contratista	Construcciones civiles estudios y proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato	$ 3.940.965.840,oo
Anticipo	$ 662.347.200
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	Del 01 enero de 2026 al 30 de junio 26
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Supervisor de contrato	Patricia Morales Padrón
VALOR EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2026	

Valor Básico Ejecutado	$ 307.991.448
% Ejecutado	9.3%

Fuente: Propia

En la Tabla 21 se relaciona el personal presentado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS para ejecutar el proyecto **INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

Tabla 21 Relación Personal de la interventoría aprobado por el INVIAS

ITEM	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
2	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	CESAR QUINTERO
3	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	BLADIMIR SALCEDO
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	PEDRO GONZALEZ
5	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	FELIPE LOPEZ
6	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 3	OSCAR LONDOÑO
7	INGENIERO AUXILIAR 1	ZULAY MARIA ACENDRA FILOZ
8	INGENIERO AUXILIAR 2	JORGE PUCHE ORTEGA
9	INGENIERO AUXILIAR 3	ALEJANDRO GONZALEZ RUBIO

Fuente: Propia

Tabla 22 Relación equipos de la Interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de Cómputo, impresora, Plotter	1
Equipo de comunicación	1

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el periodo comprendido entre 16 al 31de enero de 2026:

5.3. Informes de especialistas y profesionales

En anexo, se presentan el informe del director de Interventoría y de los Ingenieros de campo y estudios, así como el del ingeniero auxiliar. Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de enero de 2026.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Para el presente periodo No Aplica

5.5. Informe matriz de riesgos.

Para el presente periodo No Aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA


6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07

Figura 44 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07 contrato de Interventoría.

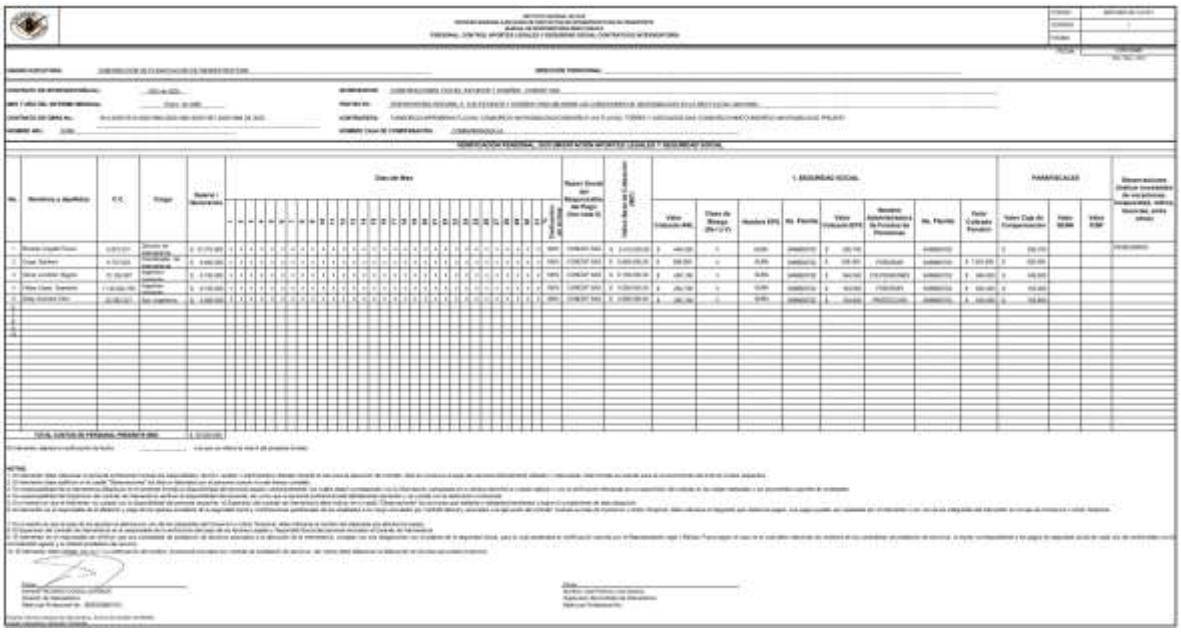


6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

El valor del contrato de Interventoría es de ($ 3.940.965.840,oo) TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

El anticipo solicitado por la Interventoría, es del 50% del valor básico del contrato de interventoría, que corresponde al valor de $ 1.655.868.000,oo Mil seiscientos cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos moneda corriente

Se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Figura 45 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

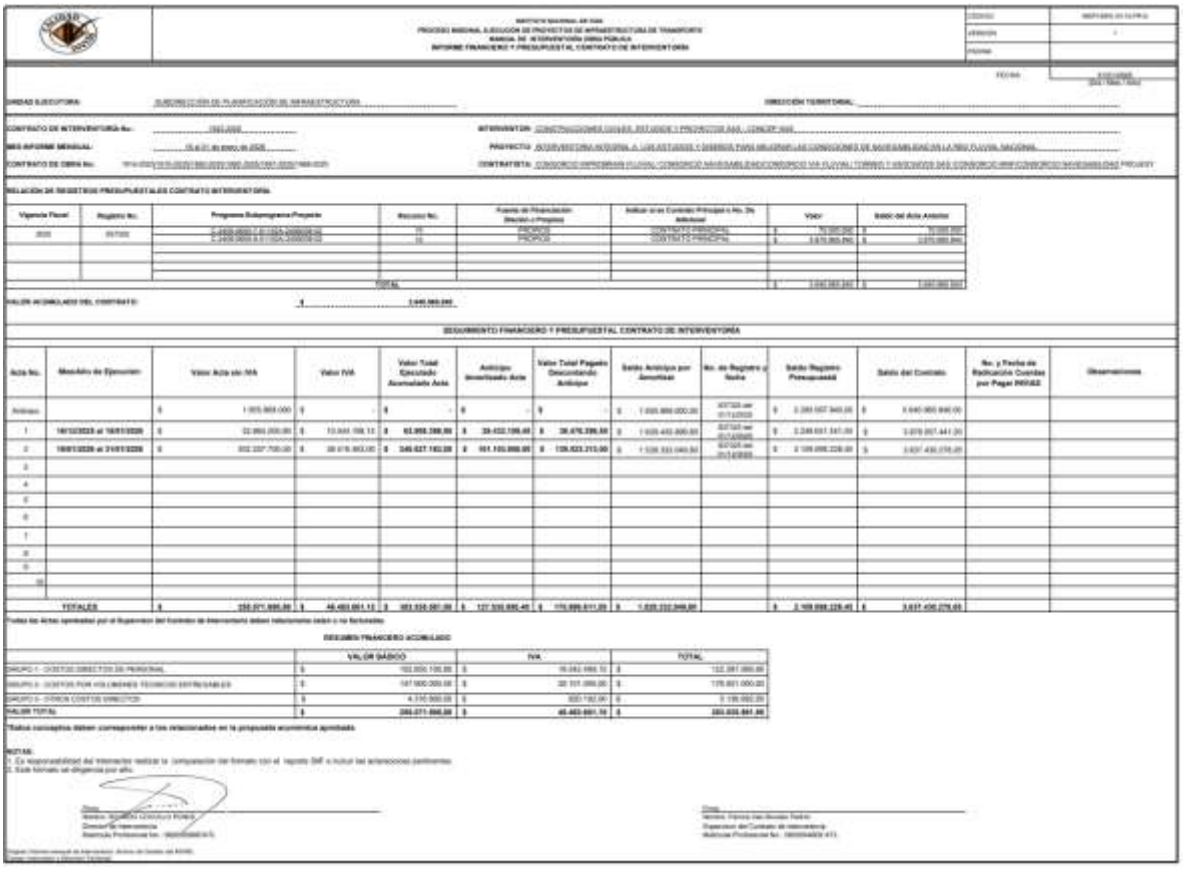

6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Figura 46 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2026 (incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.940.965.840,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.940.965.840,00 (incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Patricia Ines Morales Padron

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	21	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	21	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	21	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	31	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	30	6	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

Durante el presente período se presentaron 2 informes semanales correspondientes para cada Lote (1-6) que se relacionan a continuación. Se adjuntan en carpeta externa de este informe mensual.

INTERVENTORÍA

No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 6	16	FEB / FEB	22
SEMANA 7	23	FEB / FEB	29

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de Interventoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1

Figure 47 El formato MEPI-MN-IN-3-FR-1, seguimiento a la inversión del anticipo



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CODIGO: MEPI-MN-IN-3-FR-1
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 12/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922-2025 (Indicar número y año) — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS-CONCEP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA MORALES PADRON

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. DICIEMBRE				VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL GRUPO 1	$ 57.500.000,00				$ 57.500.000,00	8,68%
2	EJECUCION VOLUMENES GRUPO 2						
2.1	LOTE 1	$ 121.725.000,00				$ 121.725.000,00	18,38%
2.2	LOTE 2	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2.3	LOTE 3	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2.4	LOTE 4	$ 60.000.000,00				$ 60.000.000,00	9,06%
2.5	LOTE 5	$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	8,30%
2.6	LOTE 6	$ 30.000.000,00				$ 30.000.000,00	4,53%
3	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 9.000.000,00				$ 9.000.000,00	1,36%
4	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 74.122.200,00				$ 74.122.200,00	11,19%
5	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,55%
6	Otros transportes especiales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,56%
	TOTAL	$ 662.347.200,00					100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma:
Nombre: PATRICIA MORALES PADRON
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Copia: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, no aplica para el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó actividades orientadas al control administrativo, técnico y contractual de los contratos de Consultoría, por lo cual verificó, revisó y aprobó de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia que las Consultorías de los Lotes 1 al 6, entregaran las hojas de vida de los profesionales responsables de cada volumen, junto con sus respectivos certificados de experiencia y soportes académicos, para efectos de verificación y aprobación por parte de la Interventoría, así como la elaboración y entrega de la metodología general y particulares para su debida revisión y aprobación, las cuales fueron aprobadas por la Interventoría.

El Consultor del Lote 1, CONSORCIO INPROBRAIN FUVIAL. presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje programado del 8.76% correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

El Consultor del Lote 2, CONSORCIO NAVEGABILIDAD, presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje programado del 8.17% correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

El Consultor del Lote 3, CONSORCIO VIA FLUVIAL, presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje programado del 6% correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

El Consultor del Lote 4, TORRES Y ASOCIADOS SAS, presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje programado del 8.9% correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

El Consultor del Lote 5, CONSORCIO MNF, presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje

programado del 8.88%, correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

El Consultor del Lote 6, CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY, presenta un avance físico por cada volumen contratado para la Consultoría, a la fecha se lleva un porcentaje programado del 7.5% correspondiente a la entrega y aprobación de la metodología general y particulares.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO NO 1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

Lote 1

Anexo 1 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 1.

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
CIF-OP-2025-1914-036	16/01/2026	CONCEP SAS	Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 de 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños en fase II para la construcción y/o mejoramientos muelles fluviales: Municipio Tarairá
CIF-OP-2025-1914-037	16/01/2026	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	Solicitud de bienes catalogados como patrimonio historico en el área de influencia
CIF-OP-2025-1914-038	16/01/2026	MINISTERIO DEL INTERIOR	Solicitud certificaciób de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto
CIF-OP-2025-1914-039	16/01/2026	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA	Solicitud de inrmación ambiental y de ordenación del recurso hídrico (POMCA) - Contrato INVIAS No. 1914 de 2025
CIF-OP-2025-1914-040	19/01/2026	CONCEP SAS	Entrega de metodologiías particular estudios de transporte
MAIL	20/01/2026	INVIAS - CONCEP	RV: Solicitud de aprobación para la ubicación de muelles - Contrato 1914 de 2025, Lotew 1
MAIL	20/01/2026	INVIAS - CONCEP	PRESENCIAL INDELEGABLE - REUNION DE SEGUIMIENTO CTO 1914 LOTE 1 MUELLES (26-01-26 HORA 10:00-11:00)
CIF-OP-2025-1914-041	20/01/2026	ALCALDE DE MITU - VAUPES	Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 de 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños en fase II para la construcción y/o mejoramientos muelles fluviales: Muelle Pucarón en Mitu-Vaupés
CIF-OP-2025-1914-042	20/01/2026	GOBERNACION DE AMAZONAS	Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 DE 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños en fase II para la construcción y/o mejoramiento de muelles fluviales: Muelles en el departamento de Amazonas.
CIF-OP-2025-1914-043	20/01/2026	CONCEP SAS	Remision informe semanal No. 5 - Lote 1
CIF-OP-2025-1914-044	21/01/2026	GOBERNACION VAUPES	Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 de 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños fase II de muelles fluviales ubicados en Mitu, Taraira y Pacoa (Buenos Aires) en el departamento de Vaupes
CIF-OP-2025-1914-045	21/01/2026	ALCALDIA DE MITU - VAUPES	solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 de 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños fase II para la construcción y/o mejoramiento de muelles fluviales : Muelle Pucaron en Mitu - Vaupes
CIF-OP-2025-1914-046	22/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-012-2026 - Comité siguiento Lote 1
CIF-OP-2025-1914-047	22/01/2026	MUNICIPIO DE TARAIRA - VAUPES	Solicitudf información ambiental, social y de instrumentos de planiicación territorial para el desarrollo de estudios y diseños de infraestructura fluvial.
CIF-OP-2025-1914-048	22/01/2026	CONCEP SAS	Acta de modificación No. 1 Contrato de Consultoría No. 1914 de 2025 - Lote 1
CIF-OP-2025-1914-049	26/01/2026	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO - CDA	Solicitud de información sobre proveedores de agregados aprobados ambientalmente
CIF-OP-2025-1914-050	26/01/2026	CONCEP SAS	Solicitud autorizacion de viáticos para el residente de campo - Contrato 1914 de 2025
CIF-OP-2025-1914-051	26/01/2026	CONCEP SAS	Remision informe semanal No. 6 - Lote 1
CIF-OP-2025-1914-052	27/01/2026	CONCEP SAS	Alcance al comunicado CIF-OP-2025-01914-050 -Solicitud de autorización de viáticos para el residente de campo - Contrato 1914 de 2025
CIF-OP-2025-1914-053	29/01/2026	CONCEP SAS	Solicitud de modificación de costos Contrato 1914 DE 2025 - LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-054	29/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta comunicado II-871-L1-014-2026 - Respuesta acta de modificación No. 1

Página 1

Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1**.**

LOTE 1			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L1-010	20/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta Oficio CIF-OP-2025-1914-041 Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 DE 2025 LOTE 1
II-871-L1-011	21/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-011-2026 Anexo forma de pago
II-871-L1-012	21/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-012-2026 Comité de seguimiento 26 de enero de 2026 LOTE 1
II-871-L1-013	27/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-013-2026 Respuesta comunicación CIF-OP-1914-052 Lote 1
II-871-L1-014	28/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-014-2026 Respuesta comunicación CIF-OP-2025-048 Lote 1
II-871-L1-015	28/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-015-2026 Solicitud de datos de contacto del personal aprobado para el proyecto Lote 1
II-871-L1-016	29/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-016-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1914-2025 Lote 1
II-871-L1-017	30/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Asunto: Aprobación acta de modificación de costos contrato 1914-2025 Lote 1.

Página 2

Anexo 3 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 1

INTERVENTORIA LOTE 1			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-004-2026	27/01/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-004-2026 REMISION METODOLOGIAS CONTRATO 1914-2025 LOTE No 1
II-869-INT-010-2026	29/01/2026	INVIAS	oficio II-871-NIT-010-2026 solicitud modificacion de cosotos contrato 1922

Lote 2

Anexo 4 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
MAIL	16/01/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. INFORME SEMANAL 5
CN-1915-2025-026	19/01/2026	CONCEP SAS	Información inicio de labores de campo
CN-1915-2025-027	16/01/2026	CONCEP SAS	Acta modificacion de costos 1
CN-1915-2025-033	19/01/2026	CONCEP SAS	Informe Mensual de Consultoria No. 1
CN-1915-2025-041	19/01/2026	CONCEP SAS	Inicio trabajos de topografía y batimetría.
CN-1915-2025-042	21/01/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-008-2026 Forma de Pago
MAIL	22/01/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. INFORME SEMANAL 6
CN-1915-2025-043	23/01/2026	CONCEP SAS	Presentacion Volumen I correspondiente a los Hitos I, II y III
CN-1915-2025-044	28/01/2026	CONCEP SAS	Solicitus de reprogramación de reunión
CN-1915-2025-045	29/01/2026	CONCEP SAS	Datos del personal aprobado para el proyecto - Lote 2
MAIL	29/01/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. INFORME SEMANAL 7
MAIL	29/01/2026	CONCEP SAS	Reiunion seguimiento contrato
MAIL	29/01/2026	CONCEP SAS	REUNION GEOTECNIA LOTE 2

Anexo 5 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
L2-008-2026	21/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Anexo forma de pago
L2-009-2026	21/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Comité de seguimiento 26 de enero de 2026, Lote 2
L2-010-2026	23/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-042, Lote 2
L2-011-2026		Consorcio Navegabilidad	
L2-012-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Aprobación acta de modificación de costos contrato 1915-2025, Lote 2
L2-013-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Solicitud datos de contacto del personal aprobado para el proyecto
L2-014-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-046, Lote 2
L2-015-2026	29/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Aprobación metodología general y -----, Lote 2

Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 2.

INTERVENTORIA LOTE 2			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-005-2026	28/01/2026	INVIAS	28-01-26 interventoria Gmail - Oficio II-871-INT-00-2026 REMISION METODOLOGIAS CONTRATO 1915-2025 LOTE No 2
II-869-INT-010-2026	29/01/2026	INVIAS	oficio II-871-NIT-010-2026 solicitud modificacion de cosotos contrato 1922

Lote 3

Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
FLU3-CE-010	18/01/2026	CONCEP	Remisión hojas de vida No. 5 - Personal Consorcio Via Fluvial
FLU3-CE-011	21/01/2026	INVIAS	Cambio de representante legal - Consorcio Via Fluvial
FLU3-CE-012	20/01/2026	CONCEP	Remisión Hojas de Vida No. 06 - Personal Consorcio Via Fluvial
FLU3-CE-013	20/01/2026	CONCEP	Visita a Mapiripana
FLU3-CE-014	21/01/2026	CONCEP	Su oficio II-871-L3-011-2026 – Subsanación de hojas de vida – Personal Consorcio Via Fluvial
MAIL	22/01/2026	CONCEP	LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DIA 26/01/2026
MAIL	26/01/2026	CONCEP	VISITA MAPIRIPANA COTIZACIONES
MAIL	26/01/2026	CONCEP	Remisión informes Semanales
FLU3-CE-015	27/01/2026	CONCEP	Solicitud anticipo CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1892 de 2025
FLU3-CE-016	28/01/2026	CONCEP	Solicitud de reunión del componente ambiental y social para concretar detalles de la visita de campo al área del proyecto.
MAIL	28/01/2026	CONCEP	Re: Contrato 1892 de 2025 lote 3 - Oficio II-L3-018-2026 Solicitud anticipo contrato 1892, Lote 3
MAIL	28/01/2026	CONCEP	Remisión Polizas - CONSORCIO VIA FLUVIAL
MAIL	28/01/2026	CONCEP	Cotizaciones cisita Ma piripana
MAIL	30/01/2026	CONCEP	Metodología general
FLU3-CE-017	30/01/2026	CONCEP	FLU3-CE-017-2026- Solicitud cambio Hoja de vida Transporte y Geologia
FLU3-CE-018	30/01/2026	CONCEP	Alcance oficio FLU3-CE-013-2026 - Visita a Mapiripana.

Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3.

LOTE 3			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
II-871-L3-009	19/01/2026	INVIAS	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL
II-871-L3-010	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-010-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-010-2026 Remisión hojas de vida No 05
II-871-L3-011	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-011-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-012-2026 Remisión Hojas de Vida No. 06 LOTE 3
II-871-L3-011	20/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-011-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-010-2026 Remisión Hojas de Vida No. 05 LOTE 3
II-871-L3-012	21/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Respuesta oficio FLU3-CE-013-2026 Visita a Mapiripana LOTE 3
II-871-L3-013	21/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-013-2026 Anexo forma de pago
II-871-L3-014	21/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Comoté de seguimiento 26 de enero de 2026 LOTE 3
II-871-L3-015	22/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-015-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-014-2026 Subsanación hojas de vida LOTE 3.
II-871-L3-016	27/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-016-2026 Respuesta Oficio FLU3-CE-013-2026 - Visita Mapiripana. Lote 3
II-871-L3-017	27/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-017-2026 Remisión cotización gastos a realizar topógrafo y lanchero. Lote 3
II-871-L3-018	28/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-018-2026 Solicitud anticipo contrato 1892. Lote 3
II-871-L3-019	28/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-019-2026 Solicitud de datos de contacto del personal aprobado para el proyecto Lote 3
II-871-L3-020	29/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-020-2026 Respuesta Oficio FLU-CE-015-2026 - Solicitud de Anticipo CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1892 de 2025
II-871-L3-021	3/02/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-021-2026 Aprobación metodología general y particulares contrato 1892-2025 Lote 3
II-871-L3-022	30/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-022-2026 Reunión de seguimiento Lote 3
II-871-L3-023	30/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	II-871-L3-023-2026 Profesional Social de Interventoria que asistirá a la visita Lote 3

Página 1

Anexo 9 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 3.

INTERVENTORIA LOTE 3			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-002-2026	19/01/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-002-2026 Incumplimiento de requerimientos contractuales - contrato 1892 de 2025 LOTE 3
II-869-INT-010-2026	29/01/2026	INVIAS	oficio II-871-NIT-010-2026 solicitud modificacion de cosotos contrato 1922
II-871-INT-006	30/01/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-006-2026 REMISION METODOLOGIAS CONTRATO 1892-2025 LOTE No 3

Página 2

Lote 4

Anexo 10 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
CST- INV – 0012	19/01/2026	CONCEP SAS	CST- INV – 0012 Remisión Hojas de vidas pendientes
MAIL	19/01/2026	INVIAS - CONCEP	RV: Contrato 1882 de 2025 LOTE 4 - Oficio -II-871-L4-009-2026 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO LOTE 4
CST- INV – 0013	26/01/2026	CONCEP SAS	Solicitud de ingreso a reunión de seguimiento
CST- INV – 0014	26/01/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0014 Remisión hojas de vida
MAIL	29/01/2026	CONCEP SAS	Re: Contrato 1882 de 2025 Lote 4 - Oficio II-871-L4-0013-2026 Solicitud anticipo contrato 18982-2025. Lote 4
CST- INV – 0014	29/01/2026	CONCEP SAS	Remision cronograma
CST- INV – 0015	30/01/2026	CONCEP SAS	Hojas de vida
CST- INV – 0016	30/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta a Oficio II-871-L4-015-2026
CST- INV – 0017	30/01/2026	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 0017 Remisión flujo de inversión y acta de modificación de

Página 1

Anexo 11 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L4-009	20/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Oficio II-871-L4-009-2026 INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
II-871-L4-010	20/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-010-2026 Respuesta Oficio CST-INV-0012 remisión hojas de vida pendientes LOTE 4
II-871-L4-011	21/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Oficio II-871-L4-011-2026 Anexo forma de pago
II-871-L4-012	21/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Comité seguimiento 26 de enero de 2026 LOTE 4
II-871-L4-013	28/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Solicitud anticipo contrato 1882-2025. Lote 4
II-871-L4-0013	23/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Oficio II-871-L4-0013-2026 Observaciones cronograma de actividades Lote 4
II-871-L4-014	27/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Oficio II-871-L4-014-2026 Respuesta oficio CRT-INV-014 Remisión hojas de
II-871-L4-015	28/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-015-2026 Solicitud de datos de contacto del personal aprobado para el proyecto Lote 4
II-871-L4-017	30/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Aprobación cronogram contrato 1882-2025 Lote 4
II-871-L4-018	30/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Personal Lote 4
MAIL	30/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Reiteración compromisos Reunión del 26 de enero de 2026
MAIL	31/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS	Re: Reiteración compromisos Reunión del 26 de enero de 2026

Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 4.

INTERVENTORIA LOTE 4			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-001-2026	19/01/2026	INVIAS	incumplimiento de requerimientos contractuales - Contrato 1882 de 2025 LOTE 4
II-869-INT-010-2026	29/01/2026	INVIAS	oficio II-871-NIT-010-2026 solicitud modificacion de cosotos contrato 1922

Lote 5

Anexo 13 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
CNP-573-021	16/01/2026	CONCEP SAS	intinierario - Visita a Solano y Solita
CNP-573-023	19/01/2026	CONCEP SAS	CINP-573-023-0145 / Informe Semanal No. 05 Consultoría
CNP-573-024	21/01/2026	CONCEP SAS	Asistentes - Comité de seguimiento 26 de enero lote 5
CNP-573-025	27/01/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE	Solicitud de documentación para el desarrollo del contrtato 1957-2025 suscrito con invias
CNP-573-026	27/01/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE	Solicitud de documentación para el desarrollo del contrtato 1957-2025 suscrito con invias
CNP-573-027	26/01/2026	CONCEP SAS	INFORME SEMANAL No. 06 consultoria
CNP-573-028	27/01/2026	CONCEP SAS	Remision de documentación
CNP-573-029	28/01/2026	CONCEP SAS	CINP-573-029-0225 - Metodologías ajustadas geotecnia
CNP-573-030	28/01/2026	CONCEP SAS	Acta de costos No.1 - Consultoría
CNP-573-031	29/01/2026	CONCEP SAS	Información de contacto del personal aprobado
CNP-573-032	29/01/2026	CONCEP SAS	Remisión de informegeneral de viaje. Visita Tecnica municipios Solana y Solita

Anexo 14 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
II-871-L5-005-2026	21/01/2025	CONSORCIO MNF	Anexo froma de pago
II-871-L5-006-2026	21/01/2026	CONSORCIO MNF	Comité de seguimiento para 26 de enero de 2026
II-871-L5-007-2026	28/01/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud de datos de contacto del personal aprobado
II-871-L5-008-2026	29/01/2026	CONSORCIO MNF	Aprobación metodología greneral y particulares contrato 1957-2025

Anexo 15 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 5.

INTERVENTORIA LOTE 5			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-008-2026	28/01/2026	INVIAS	Oficio II-871-INT-008-2026 REMISION METODOLOGIAS CONTRATO 1957-2025 LOTE No 5

Lote 6

Anexo 16 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6.

LOTE 6			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
L6-010-2026	16/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Observaciones cronograma de actividades
L6-011-2026	16/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0008-25 Cambio de Ingeniero Auxiliar. Lote 6
L6-012-2026	16/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0007. Subsanación observaciones HV relacionadas en el oficio II-871-L6-009-2026 y entrega de metodología, plan de inversión y ficha técnica del papel. Lote 6
L6-013-2026	19/01/2026	INVIAS	Informe de presunto incumplimiento parcial contrato de Consultoría No. 1968-2025
L6-014-2026	20/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0009-26
L6-015-2026	21/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Anexo forma de pago
L6-016-2026	21/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Comité de seguimiento 26 de enero de 2026, Lote 6
L6-016-2026	23/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0011-26. Subsanación HV profesional valuatorio predial
L6-017-2026	23/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0010-25. Lote 6
L6-018-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Solictud anticipo contrato 1968-2025 Lote 6
L6-019-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0013-26. Lote 6
L6-020-2026	28/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Solicitud de datos de contacto (# telefónico y correo electrónico) del personal aprobado para el proyecto. Lote 6
L6-021-2026	29/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Planos y memorias, nuevo diseño de la Tola. Lote 6
L6-022-2026	29/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Aprobación metodología general y particulares, contrato 1968-2025. Lote 6

Anexo 17 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA - LOTE 6			
RECIBIDA			
CONSECUTIVO No.	FECHA	ENVIADO POR:	CONCEPTO
OF-25C08-CONS-0010-2025	22/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Entrega de Metodologías
OF-25C08-CONS-0012-2025	27/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Entrega cronograma de actividades
OF-25C08-CONS-0013-2025	27/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Aclaración sobre responsabilidad de entrega de informes semanales y mensuales
OF-25C08-CONS-0014-2025	27/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Entrega de Metodología Volumen IX
OF-25C08-CONS-0015-2026	29/01/2026	Consorcio Navegabilidad Proyesy	Entrega de Metodología General

Anexo 18 Relación de correspondencia enviada para INVIAS. Lote 6**.**

INTERVENTORIA			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DIRIGIDO	CONCEPTO
II-871-INT-003-2026	19/01/2002	INVIAS	Oficio II-871-INT-003-2026 incumplimiento de requerimientos contractuales - contrato 1968de 2025 LOTE 6
II-869-INT-010-2026	29/01/2026	INVIAS	oficio II-871-NIT-010-2026 solicitud modificacion de cosotos contrato 1922

8.3 ANEXO NO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Para el presente periodo no aplica el registro fotográfico.

8.4 ANEXO NO 3. INFORME DEL DIRECTOR DE OBRA Y DEL INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS Y DEL INGENIERO AUXILIAR.
