INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO N.º 1968 DE 2025.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. Lote 6.



INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 1

(16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026)

Bogotá DC

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1968-2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1922 -2025

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C. –ENERO DE 2026

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el siguiente cuadro. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director de proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		NÚMERO DE COPIAS
Copia No. 1	Interventoría: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	1 (Original)

INDICE DE MODIFICACIONES.

INDICE/ VERSION	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACION	OBSERVACIONES
0	Creación de documento	03/02/2026	Las enunciadas en el oficio de observaciones

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

VERSIÓN		0.0
ELABORADO POR:	**CONSULTORÍA CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY**	
	Nombre: JULIAN DAVID MORA RAMIREZ Firma: Julian D M♦	
RESPONSABLE PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN: **Director de Proyecto**	Nombre: MARTHA LILIANA DE HOYOS Firma:	
FECHA		03/02/2026

CONTENIDO

1 INTRODUCCION. 5

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6

2.1 Localización del proyecto. 6

2.2 Zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 7
2.2.1 Beneficios de la ejecución del proyecto 8

2.3 Características técnicas del proyecto. 8

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA. 10

3.1 Información general del contrato 10

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes 11

3.3 Estado de avance. 11
3.3.1 VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL). 13
3.3.2 VOLUMEN II: ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO. 13
3.3.3 VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 13
3.3.4 VOLUMEN IV: ESTUDIO DE GEOTECNIA. 13
3.3.5 VOLUMEN V: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL. 13
3.3.6 VOLUMEN VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA. 13
3.3.7 VOLUMEN VII: ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 14
3.3.8 VOLUMEN VIII: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD. 14
3.3.9 VOLUMEN IX: GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL. 14
3.3.10 VOLUMEN X: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS. 14
3.3.11 VOLUMEN XI: ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO. 14

4 REPORTE DE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA. 15

4.1 Informes semanales 15

4.2 Maquinaria y equipo del Contrato de consultoría 15

4.3 Personal del contrato de consultoría, control de aportes legales y seguridad social del contrato de consultoría. 15

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de consultoría 17

4.5 Estado general del tiempo. 17

4.6 Resumen de ensayos de laboratorio. 17

4.7 Seguimiento Garantías y seguros del contrato de consultoría. 18

4.8 Otros documentos de seguimiento mensual 18
4.8.1 Seguimiento la inversión del anticipo. 18
4.8.2 Seguimiento al programa de inversiones del contrato de consultoría 18
4.8.3 Relación de correspondencia. 19

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 21

6 ANEXOS 22

6.1 Anexo 1. Informes semanales. 22

6.2 Anexo 2. Reporte de ejecución mensual. 23

6.3 Anexo 3. Correspondencia enviada. 24

6.4 Anexo 4. Correspondencia recibida. 25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Información general del Contrato 10
Tabla 2: Garantías contractuales del Contrato 10
Tabla 3: Estado de avance financiero 11
Tabla 4: Avance físico del contrato 12
Tabla 5: Informes semanales radicados en el periodo 15
Tabla 6: Personal del contrato de consultoría aprobado 16
Tabla 7: Relación de actas de costos tramitadas. 17
Tabla 8: Relación de correspondencia 19

INDICE DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1: Área de intervención Cto. 1968 de 2025 7
Ilustración 2: Seguimiento al programa de inversiones 18

1 INTRODUCCION.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS convocó públicamente mediante el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DTE-SPI-044-2025, mediante el cual se contrató la ejecución de los "Estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6". En el marco de este proceso, el Lote 6, correspondiente a los Estudios y diseños para las obras de protección del casco urbano del municipio de La Tola, departamento de Nariño, fue adjudicado mediante Resolución No. 4839 del 11 de noviembre de 2025 al Consorcio Navegabilidad Projesy, ubicado en el primer orden de elegibilidad.

Como resultado de dicha adjudicación, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025, cuyo objeto es la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad (Fase III), orientados a la formulación de soluciones técnicas a mediano y largo plazo que contribuyan a mejorar las condiciones de operación, accesibilidad y funcionalidad del transporte fluvial en el área de influencia del municipio de La Tola.

El presente documento corresponde al Primer Informe Mensual de Consultoría, el cual comprende el periodo de ejecución entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Durante este periodo, las actividades se concentraron principalmente en la planeación técnica del proyecto, con énfasis en la estructuración, definición y presentación de las metodologías de trabajo para cada uno de los volúmenes contractuales, incluyendo la definición de alcances, procedimientos, productos y cronogramas, en cumplimiento de los lineamientos contractuales y la normativa vigente.

Dentro del alcance de la consultoría se contempla, entre otros, el Volumen I, correspondiente al estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes, revisión del diagnóstico existente e identificación de vías de acceso carretero y/o fluvial, el cual constituye la base técnica para el desarrollo de los estudios posteriores.

Durante el periodo reportado, la consultoría concentró sus actividades en la planeación técnica del proyecto, con énfasis en la estructuración y presentación de las metodologías de trabajo correspondientes a cada uno de los volúmenes a desarrollar, definiendo lineamientos, alcances, procedimientos, productos y cronogramas de ejecución, en concordancia con las exigencias contractuales y la normativa aplicable.

Los volúmenes contemplados dentro del alcance de la consultoría corresponden a:

Volumen I: Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial).
Volumen II: Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico.
Volumen III: Estudio de geología y geomorfología.
Volumen IV: Estudio de geotecnia.
Volumen V: Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial.
Volumen VI: Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
Volumen VII: Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
Volumen VIII: Gestión ambiental, social y sostenibilidad.
Volumen IX: Gestión predial y catastral.
Volumen X: Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuestos.
Volumen XI: Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto.

De manera complementaria, se adelantaron actividades de recopilación y análisis de información secundaria, organización de insumos base, reconocimiento preliminar del área de estudio y gestiones de articulación institucional, necesarias para la consolidación de las metodologías y la adecuada programación de las fases subsiguientes del proyecto, orientadas a la formulación de soluciones de protección del casco urbano del municipio de La Tola.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto "Estudios y Diseños para las Obras de Protección del Casco Urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño, en el Marco del Proceso de Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 6" tiene como finalidad desarrollar los estudios técnicos integrales que permitan formular, evaluar y diseñar soluciones de protección fluvial orientadas a mitigar los procesos de erosión, socavación e inestabilidad de orillas que afectan el casco urbano del municipio.

El municipio de La Tola se localiza en la subregión de la Costa Pacífica del departamento de Nariño, en zona de influencia directa de sistemas fluviales estratégicos para la conectividad y la navegabilidad regional. El área de estudio comprende el casco urbano y sus zonas ribereñas adyacentes, donde se concentran las principales afectaciones sobre infraestructura, vivienda y espacio público. Como punto de referencia geográfica, el casco urbano se ubica aproximadamente en las coordenadas Latitud 2°23' Norte y Longitud 79°12' Oeste (coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS), dentro de un entorno de planicie aluvial sujeto a alta dinámica morfológica e hidráulica.

En este contexto, la consultoría contempla el desarrollo de once (11) volúmenes técnicos que abarcan la identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes, levantamientos cartográficos, topográficos y batimétricos, estudios geológicos y geotécnicos, modelaciones hidrológicas e hidráulicas, análisis de socavación y dinámica fluvial, formulación y evaluación de alternativas de estabilización, diseños de estructuras de protección y obras complementarias, gestión ambiental y social, gestión predial y catastral, así como la estimación de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y evaluación socioeconómica del proyecto.

Los resultados de estos estudios y diseños permitirán definir la alternativa óptima de intervención, sustentada en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos, proporcionando los insumos necesarios para la futura ejecución de obras que contribuyan a la reducción del riesgo, la protección del casco urbano y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.

2.1 Localización del proyecto.

La localización del proyecto se emplaza en el casco urbano del municipio de La Tola, departamento de Nariño, en la región Pacífica colombiana, dentro de la subregión de Sanquianga. El área de intervención se sitúa aproximadamente en las coordenadas geográficas 2°24' N y 78°11' O, en un entorno de llanura costera influenciado por dinámicas fluvio-marinas del río Patía, con presencia de zonas de manglar y suelos de carácter aluvial que condicionan el desarrollo urbano. Su área de influencia comprende el perímetro urbano municipal y sectores aledaños expuestos a procesos de inundación y erosión.

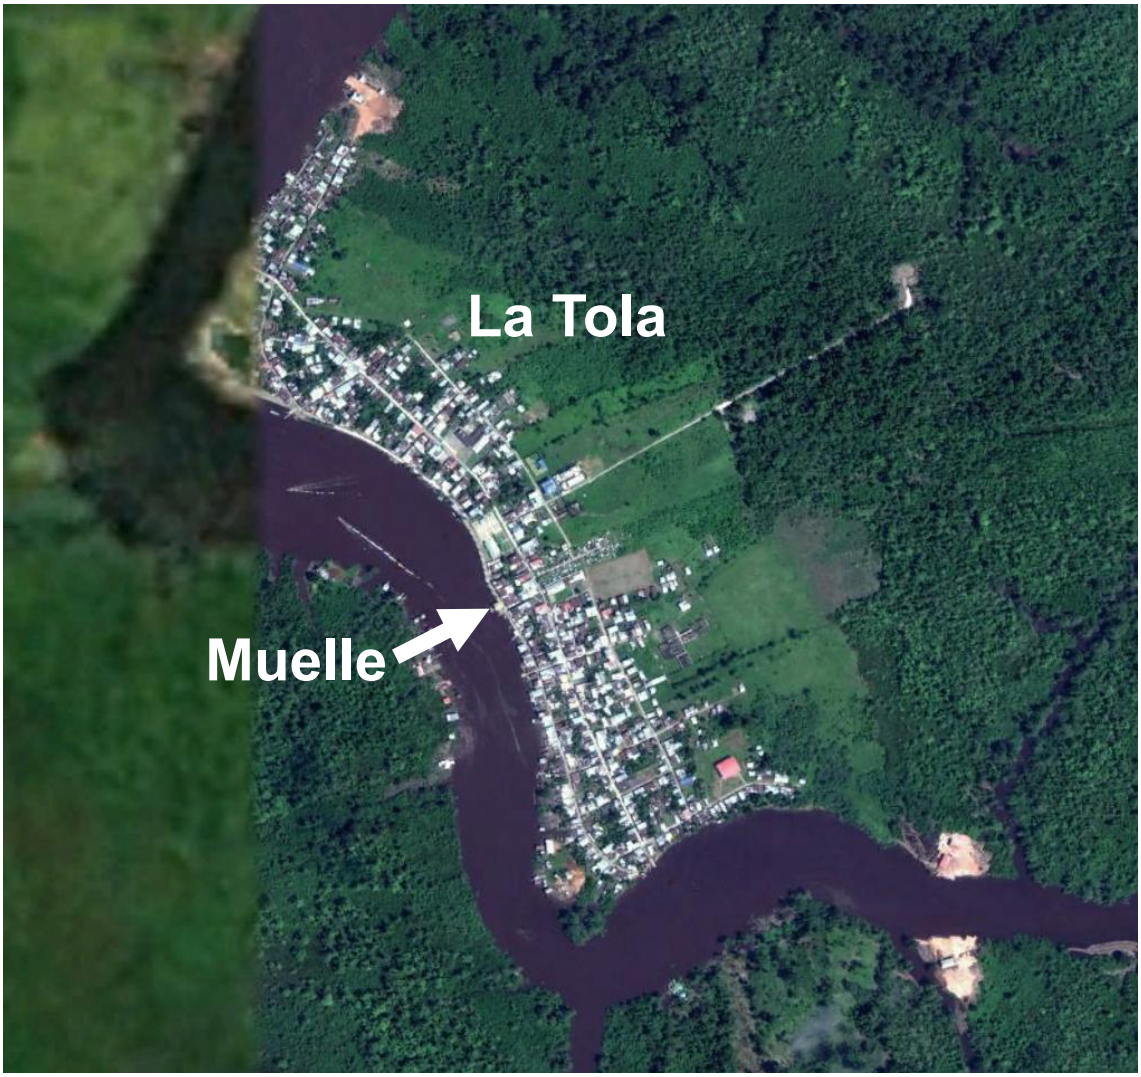


Ilustración 1: Área de intervención Cto. 1968 de 2025

2.2 Zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia del proyecto comprende el casco urbano del municipio de La Tola y sus sectores ribereños adyacentes, localizados en áreas expuestas a la dinámica fluvial del sistema hídrico circundante, particularmente frente a procesos de erosión lateral, socavación de orillas e inundaciones periódicas. Esta condición incide directamente sobre la estabilidad de viviendas, infraestructura pública, equipamientos urbanos y corredores de movilidad fluvial, los cuales constituyen la base funcional y socioeconómica del municipio. La ejecución de las obras de protección derivadas de los estudios y diseños permitirá reducir los niveles de riesgo por pérdida de banca y afectación estructural, mejorar la seguridad de la población asentada en la franja ribereña y preservar el espacio urbano consolidado. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de la navegabilidad, la conectividad regional y las actividades productivas locales, generando beneficios en términos de sostenibilidad territorial, resiliencia frente a eventos hidro morfológicos y mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia.

2.2.1 Beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto generará impactos positivos y significativos en la zona de influencia, al incidir directamente sobre las condiciones de seguridad territorial, la estabilidad del suelo urbano y la protección de los medios de vida de la población. La implementación de obras de protección fluvial reducirá la exposición de viviendas, equipamientos colectivos y áreas productivas a procesos de erosión e inundación, disminuyendo pérdidas materiales, costos de reposición de infraestructura y afectaciones recurrentes sobre la economía familiar.

La estabilización de orillas y la mitigación de procesos de socavación contribuirán a la preservación del tejido urbano existente, evitando desplazamientos de población, pérdida de predios y procesos de deterioro social asociados a escenarios de riesgo. Esto se traduce en mayor seguridad para la inversión pública y privada, fortaleciendo la confianza para el desarrollo de actividades comerciales, de servicios y de abastecimiento local.

De igual manera, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad tendrá efectos directos sobre la dinámica económica del municipio, considerando que el transporte fluvial constituye uno de los principales medios de conectividad para la movilización de personas, bienes, insumos y productos pesqueros y agrícolas. La optimización de las condiciones hidráulicas del cauce y la reducción de riesgos en las riberas favorecerán la continuidad de las rutas de transporte, disminuyendo tiempos y costos logísticos, e incentivando el intercambio comercial con otros centros poblados de la región Pacífica.

El proyecto también generará beneficios asociados a la generación de empleo durante las futuras fases de obra, priorizando mano de obra local no calificada y calificada, así como la contratación de servicios complementarios (transporte, alimentación, suministros, alojamiento, entre otros), dinamizando la economía del municipio. A mediano plazo, la protección del casco urbano propiciará condiciones más favorables para el ordenamiento territorial, la inversión en infraestructura social y el fortalecimiento de sectores como el turismo comunitario, la pesca artesanal y el comercio local.

En conjunto, estos beneficios consolidan un impacto socio-económico orientado a la reducción de la vulnerabilidad, la protección del patrimonio de la población, el fortalecimiento de la productividad local y la mejora sostenible de la calidad de vida en el área de influencia del proyecto.

2.3 Características técnicas del proyecto.

El Contrato No. 1968 de 2025 comprende la elaboración de los estudios y diseños para las obras de protección del casco urbano del municipio de La Tola, mediante el desarrollo de los siguientes volúmenes:

1. Volumen I. Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes, revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial).
2. Volumen II. Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico, orientado a la generación de información base planimétrica, altimétrica y de configuración del cauce.
3. Volumen III. Estudio de geología y geomorfología, para la caracterización de materiales, procesos morfodinámicos y condiciones del entorno físico.
4. Volumen IV. Estudio de geotecnia, enfocado en la determinación de propiedades mecánicas del suelo, estabilidad de orillas y parámetros de diseño.
5. Volumen V. Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial, que incluye análisis hidrológicos y modelaciones del comportamiento del sistema hídrico.
6. Volumen VI. Estudio de alternativas de estabilización y protección, así como la selección de la alternativa definitiva bajo criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales.

7. Volumen VII. Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias a nivel de detalle.
8. Volumen VIII. Gestión ambiental, social y sostenibilidad del proyecto, incluyendo identificación de impactos y medidas de manejo.
9. Volumen IX. Gestión predial y catastral requerida para la viabilidad de las intervenciones.
10. Volumen X. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y estructuración de presupuestos.
11. Volumen XI. Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto.

El desarrollo de estos volúmenes constituye el soporte técnico integral para la formulación, viabilidad y futura ejecución de las obras de protección fluvial objeto del contrato.

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

3.1 Información general del contrato

A continuación de presentan los aspectos generales del Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025, con el fin de presentar de manera organizada la información contractual relevante que enmarca la ejecución del proyecto. Se incluye la identificación del contrato, su objeto, entidad contratante, consultor, interventoría o supervisión, plazo de ejecución, valor contractual, fuentes de financiación y demás condiciones administrativas aplicables. La consolidación de esta información permite establecer el contexto institucional, técnico y normativo bajo el cual se desarrollan los estudios y diseños, así como facilitar el seguimiento y control de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría.

Tabla 1: Información general del Contrato

Descripción	Información
Numero de proceso	CMA-DTE-SPI-044-2025
Contrato No	1968 de 2025
Fecha de suscripción	28/11/2025
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6
Contratista	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
Integrantes	PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
Valor	NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 934.498.770) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
Fecha de inicio	16/12/2025
Prorroga No 1	Hasta el 30 de abril de 2026
Fecha de terminación	Hasta el 30 de abril de 2026
Póliza de garantía única	21-44-101486205

Adicionalmente se presentan los amparos de la última actualización de la póliza descrita

Tabla 2: Garantías contractuales del Contrato

Amparos	Inicio	Fin	Valor
Cumplimiento del contrato	28/11/2025	30/10/2026	$ 93.449.877
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	28/11/2025	30/10/2026	$ 392.646.542
Calidad del servicio	31/12/2025	31/12/2030	$ 280.249.631
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/11/2025	30/04/2029	$ 186.899.754

Nota: Ver Anexo No 1: 02 PLZA_21_44_101486205 anexo 2 04022026.pdf

.

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Durante el primer periodo de ejecución, comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la consultoría concentró sus actividades en la estructuración, desarrollo y entrega, cronograma de actividades, plan de inversión, acta modificatoria de acuerdo a la prórroga, y entrega de las metodologías correspondientes a la totalidad de los volúmenes que conforman el alcance técnico del contrato. Estas metodologías definieron los lineamientos, alcances, procedimientos y productos requeridos para la ejecución de los estudios y diseños, constituyéndose en el soporte técnico inicial para el desarrollo del proyecto. De manera complementaria, se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales responsables de cada volumen, junto con sus respectivos certificados de experiencia y soportes académicos, para efectos de verificación y aprobación por parte de la supervisión/interventoría.

Obteniendo la aprobación de las gestiones realizadas a través de los siguientes comunicados de interventoría:

APROBACION DEL PERSONAL DE CONSULTORIA: Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf.

APROBACION DE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS VOLUMENES: Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6

El día 26 de enero del 2026 se realizó comité de seguimiento al contrato de consultoría en las instalaciones del INVIAS en Bogotá, la cual contó con la asistencia de funcionarios del INVIAS (supervisor y Gestor técnico), representantes de la Interventoría (director y residente) y representantes de la firma consultora (Director, y representantes de los consorciados), en dicha reunión se revisó el estado del contrato y compromisos y se aclararon dudas con respecto a los tiempos de entrega y formatos a utilizar durante el desarrollo del contrato, de igual manera se habló de la primera visita a la Tola, del cual quedó pendiente la confirmación de fecha.

3.3 Estado de avance.

En este apartado se presenta el estado de avance del Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025 correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Durante este periodo se verificó la formulación, radicación y aprobación de las metodologías correspondientes a la totalidad de los volúmenes del alcance técnico, conforme a los lineamientos contractuales y al cronograma establecido. El cumplimiento de este hito habilita el inicio de las actividades técnicas previstas para el desarrollo de los estudios y diseños.
A continuación, se presenta los porcentajes de avance

Tabla 3: Estado de avance financiero

No de contrato	Grupo	VR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VR EJECUTADO	% EJECUTADO
1968 de 2025	G1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 43.399.657	26,69%	$ 41.866.433	25,74%
	G2 COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	$ 19.918.866	12,00%	$ 16.600.000	10,00%
	DIRECTOS G3 OTROS COSTOS	$ 2.565.847	0,56%	$ 1.015.959	0,22%
Cto		**$ 65.884.370**	8,39%	**$ 59.482.392**	7,57%

Nota: Los avances financieros mostrados no incluyen IVA y corresponden a los valores de la propuesta presentada en el presupuesto oficial del contrato de consultoría.

Tabla 4: Avance físico del contrato

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual		**PORCENTAJE DEL VOLUMEN**	**Avance Físico**	**AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**AVANCE PRESENTE INFORME**	**Total**	**DESV**
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100,00%	***Prog***	4%	9%	12%	**-2,4%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10,24%	Prog	0%	8%	8%	**2,5%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3,61%	Prog	0%	8%	8%	**2,5%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6,02%	Prog	0%	8%	8%	**2,5%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6,02%	Prog	0%	8%	8%	**2,5%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinámica fluvial	6,02%	Prog	30%	5%	35%	**-25,2%**
			Ejec	10%	0%	10%	
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18,07%	Prog	0%	5%	5%	**5,0%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9,04%	Prog	0%	5%	5%	**5,0%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30,13%	Prog	5%	14%	19%	**-8,9%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4,22%	Prog	5%	10%	15%	**-4,5%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2,41%	Prog	0%	5%	5%	**5,0%**
			Ejec	5%	5%	10%	
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4,22%	Prog	5%	9%	14%	**-3,6%**
			Ejec	5%	5%	10%	

Nota: Los porcentajes de avance físico presentados se basan en los avances obtenidos en el periodo sobre cada entregable de los volúmenes del objeto contractual

3.3.1 VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL).

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.2 VOLUMEN II: ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.3 VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.4 VOLUMEN IV: ESTUDIO DE GEOTECNIA.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.5 VOLUMEN V: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.6 VOLUMEN VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.7 VOLUMEN VII: ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.8 VOLUMEN VIII: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.9 VOLUMEN IX: GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.10 VOLUMEN X: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6**

3.3.11 VOLUMEN XI: ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO.

A fecha de corte y presentación del actual informe mensual se obtuvo la aprobación del ítem, *Metodología aprobada por Interventoría,* correspondiente al primer entregable del volumen. Mediante el comunicado **Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6.**

4 REPORTE DE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

En el presente capítulo se presentan los informes semanales correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, en los cuales se registra el seguimiento a las actividades técnicas y administrativas adelantadas por la consultoría, así como los avances relacionados con la estructuración y aprobación de las metodologías de los volúmenes del proyecto.

4.1 Informes semanales

A continuación, el Consorcio Navegabilidad PROJESY, presenta tabla resumen con el total de informes semanales remitidos a la interventoría mediante el comunicado **OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf.**

Tabla 5: Informes semanales radicados en el periodo

No de informe	Periodo	No radicado
1	001 informe semanal No 1 [16DIC2025-21DIC2025]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
2	002 informe semanal No 2 [22DIC2025-28DIC2025]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
3	003 informe semanal No 3 [29DIC2025-04ENE2026]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
4	004 informe semanal No 4 [05ENE2026-11ENE2026]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
5	005 informe semanal No 5 [12ENE2026-18ENE2026]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
6	006 informe semanal No 6 [19ENE2026-25ENE2026]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf
7	007 informe semanal No 7 [26ENE2026-01FEB2026]	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf

4.2 Maquinaria y equipo del Contrato de consultoría

Para el presente periodo la firma de consultoría no requirió el uso de ningún equipo para la ejecución del contrato

4.3 Personal del contrato de consultoría, control de aportes legales y seguridad social del contrato de consultoría.

En este apartado se presenta el personal que participó en la ejecución del Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025 durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, indicando los perfiles y roles asignados en el desarrollo de las actividades del proyecto, el cual fue previamente aprobado por la interventoría.

Tabla 6: Personal del contrato de consultoría aprobado

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE APROBACION
DIRECTORA DE CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	Oficio II-871-L6-002-2026 Respuesta TOL-0012025 HV respuesta observaciones Lote 6.pdf
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZALEZ JIMENEZ	Oficio II-871-L6-002-2026 Respuesta TOL-0012025 HV respuesta observaciones Lote 6.pdf
INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	Oficio II-871-L6-011-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0008-25 Cambio ingeniero auxiliar LOTE 6.pdf
DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	Oficio II-871-L6-014-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0009-26 Hoja de vida Especialista en Tránsito y Transporte LOTE 6. (1).pdf
GEOLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Oficio II-871-L6-006-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0003-25. LOTE 6.pdf
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY PIRA RUIZ	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AUGUSTO BAUTISTA ORTEGA	Oficio II-871-L6-012-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0007-25.
ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	Oficio II-871-L6-009-2026 Respuesta oficio espuesta OF-25C08-CONS-0006-25
ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf
PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	Oficio II-871-L6-009-2026 Respuesta oficio espuesta OF-25C08-CONS-0006-25
PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	CHRISTIAN MICHAEL CÁRDENAS BRICEÑO	Oficio II-871-L6-012-2026 Respuesta oficio Subsanación HV Profesional Valuatorio Predial LOTE 6..pdf
PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEYMI TORRES AFRICANO	Oficio II-871-L6-012-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0007-25.
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Oficio II-871-L6-006-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0003-25. LOTE 6.pdf
PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	RAFAEL ANTONIO HINCAPIÉ CARRILLO	Oficio II-871-L6-016-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0011-25 Subsanación HV Profesional valuatorio predialII. LOTE 6.pdf

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE APROBACION
PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	Oficio II-871-L6-006-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0003-25. LOTE 6.pdf
PROFESIONAL TOPOGRAFICO – BATIMETRICO	CESAR HERNANDO RIOS FERREIRA	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6.pdf

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de consultoría

El Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025 tiene un valor total de **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 934.498.770)** moneda corriente, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con corte al periodo del presente informe, se han radicado dos (2) actas de cobro por concepto de costos, por un valor acumulado de **SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 68.967.640)**, las cuales corresponden a las actividades ejecutadas y se encuentran en trámite de revisión y validación conforme a los procedimientos financieros y administrativos establecidos en el contrato.

A continuación, se presenta la relación de actas tramitadas al 31 de enero de 2026, fecha de cierre del presente informe mensual.

Tabla 7: Relación de actas de costos tramitadas.

No de acta	Periodo	Grupo	VR COSTO DIRECTO.	VR TOTAL INC IVA.
1	DICIEMBRE DE 2025	N/A	$ -	$ -
Total 1			**$ -**	**$ -**
2	ENERO DE 2026	G1: COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 40.656.000	$ 48.380.640
		G2: COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	$ 16.600.000	$ 19.754.000
		G3: OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1.015.959	$ 1.208.991
Total 2			**$ 57.956.000**	**$ 68.967.640**
Total, general			**$ 57.956.000**	**$ 68.967.640**

Nota: La diferencia en los valores mostrados respecto a lo ejecutado en el ultimo informe semanal corresponde a las fechas de corte entre los informes semanales y las actas de costos.

4.5 Estado general del tiempo.

En el presente periodo no aplica el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.6 Resumen de ensayos de laboratorio.

En el presente periodo no aplica el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESIMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 Seguimiento Garantías y seguros del contrato de consultoría.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de contratación estatal, el Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025 cuenta con las garantías debidamente constituidas por el consultor, mediante la **Póliza No. 21-44-101486205**, expedida por la compañía aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, entidad legalmente autorizada para operar en el país. Dicha garantía ampara los riesgos asociados al cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, En el formato Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-12, SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA se presenta el estado de la póliza, actualizado a la prorroga No 1 del contrato. (anexo 2)

4.8 Otros documentos de seguimiento mensual

Para la adecuada verificación administrativa, financiera y documental del Contrato de Consultoría, se presentan a continuación otros instrumentos de seguimiento que complementan el control integral a la ejecución contractual. Entre estos se incluye el informe de seguimiento a la inversión del anticipo, el cual permite evidenciar la correcta destinación y amortización de los recursos desembolsados; el seguimiento al programa de inversiones del contrato de consultoría, orientado a contrastar la programación financiera frente a su ejecución real; y la relación de correspondencia tramitada en el periodo, como soporte de las comunicaciones formales surtidas entre las partes.

4.8.1 Seguimiento la inversión del anticipo.

En el presente periodo no aplica el seguimiento del presente numeral.

4.8.2 Seguimiento al programa de inversiones del contrato de consultoría

El seguimiento al programa de inversiones del **Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025** se realiza mediante la aplicación del **formato INVÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-1 – Seguimiento al Programa de Inversiones**, el cual permite verificar el comportamiento de la ejecución financiera frente a la programación establecida. Este ejercicio de control facilita la identificación de los recursos comprometidos, ejecutados y pendientes, así como la detección de posibles desviaciones y la adopción de medidas correctivas oportunas, garantizando la coherencia entre el avance financiero y el desarrollo de las actividades técnicas del contrato.

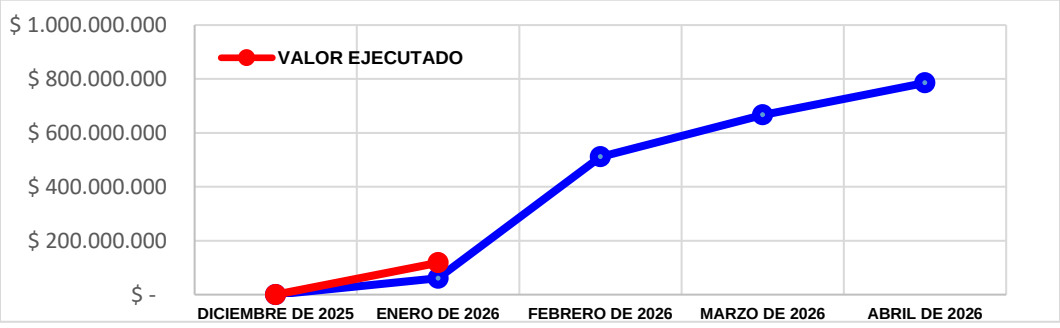


Ilustración 2: Seguimiento al programa de inversiones

4.8.3 Relación de correspondencia.

Para efectos de control y trazabilidad documental, a continuación, se presenta la relación de correspondencia generada y recibida durante el periodo objeto del presente informe. Este consolidado incluye las comunicaciones oficiales tramitadas entre la consultoría, la interventoría y la entidad contratante.

Tabla 8: Relación de correspondencia

Fecha	Persona Destino	CONSECUTIVO Y/O RADICADO	Indicar recibido / emitido
27/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-001-SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO_FF.pdf	Emitido
27/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0002-SOLICITUD PRORROGA No1 C.C. (1).pdf	Emitido
27/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0003-Respuesta OFICIO II-871-L6-004-2025 DEL 26 DIC HV.CRON.METO.pdf	Emitido
29/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0004-REESPUESTA OFICIO II-871-L6-003-2026 (1).pdf	Emitido
29/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0005-ENTREGA DE PENDIENTES PARTE 2.pdf	Emitido
30/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0006-SUBSANACION HV ENTREGA ADICIONAL HV Y METODOLOGIA.pdf	Emitido
6/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0007-SUBSANACION HV-METODOLOGIA- PLAN DE INVERSION. docx.pdf	Emitido
5/12/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0008- CAMBIO DE HV . docx.pdf	Emitido
6/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0009-ENTREGA HV ESP TRANSITO Y TRANSPORTEocx.pdf	Emitido
7/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0010-ENTREGA METODOLOGIAS.pdf	Emitido
8/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0011-ENTREGA HV PROFESIONAL VALUATORIO.pdf	Emitido
8/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0012-Entrega de Cronograma de actividades.pdf	Emitido
8/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0013-Aclaración responsabilidad de entrega de informes.pdf	Emitido
9/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0014-ENTREGA METODOLOGIA VOLUMEN IX.pdf	Emitido
13/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0015-ENTREGA METODOLOGIA GENERAL.pdf	Emitido
16/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0017-ENTREGA PLAN DE INVERSION-CRONO-ACTA MODI ACTUALIZADOS.pdf	Emitido

Fecha	Persona Destino	CONSECUTIVO Y/O RADICADO	Indicar recibido / emitido
16/01/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0018-ENTREGA ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 CTO No 1968.pdf	Emitido
6/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-001-2026 Solicitud documentación Lote 6. (1).pdf	Recibido
5/12/2025	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-002-2025 Respuesta oficio TOL-001-2025.pdf	Recibido
6/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-003-2026 Solicitud certificación Lote 6 (2).pdf	Recibido
7/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-004-2026 Solicitud informes semanales LOTE 6. (1).pdf	Recibido
8/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-005-2026 Respuesta Oficio OF-25C08-CONS-0004-25 LOTE 6..pdf	Recibido
8/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-006-2026 Remisión Hojas de vida personal Lote 6..pdf	Recibido
8/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-007-2026 Remisión metodologías Lote 6.pdf	Recibido
9/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-008-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE 6. (1).pdf	Recibido
13/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-009-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0006-25 Subsanación observaciones relacionadas en oficio II-871-L6-008-2026 y entrega adicional HV LOTE 6.pdf	Recibido
16/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-010-2026 observaciones cronograma de actividades (1).pdf	Recibido
16/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-011-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0008-25 Cambio ingeniero auxiliar LOTE 6. (1).pdf	Recibido
16/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-012-2026 Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0007-25 Subsanación observaciones HV (1).pdf	Recibido
20/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-014-2026 Respuesta OF-25C08-CONS-0009-26 Hoja de vida Especialista en Tránsito y Transporte LOTE 6. (1).pdf	Recibido
21/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-015-2026 anexo forma de pago (1).pdf	Recibido
21/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-016-2026 Comité de seguimiento 26 de enero de 2026 LOTE 6..pdf	Recibido
23/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-017-2026 Recibo oficio OF-25C08-CONS-0010-25. Lote 6.pdf	Recibido
23/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-018-2026 Respuesta oficio Subsanación HV Profesional Valuatorio Predial LOTE 6..pdf	Recibido
28/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-018-2026 Solicitud anticipo contrato 1968-2025. Lote 6 (2).pdf	Recibido
29/01/2026	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Oficio II-871-L6-022-2026 Aprobación Metodología general y particulares contrato 1968-2025 Lote 6	Recibido
2/02/2026	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	OF-25C08-CONS-0021-ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DEL 1 AL 7 No.1 CTO No 1968.pdf	Emitido

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, el Contrato de Consultoría No. 1968 de 2025 se ejecutó conforme a los lineamientos contractuales, concentrando sus actividades en la fase de planeación técnica y estructuración metodológica, la cual constituye un hito fundamental para el desarrollo integral de los estudios y diseños.

2. La consultoría formuló, radicó y obtuvo la aprobación por parte de la interventoría de las metodologías generales y particulares correspondientes a la totalidad de los once (11) volúmenes que conforman el alcance del contrato, lo cual habilita formalmente el inicio de las actividades técnicas de campo, análisis y diseño previstas para las siguientes fases del proyecto.

3. El proceso de conformación, validación y aprobación del equipo profesional se desarrolló satisfactoriamente, contando el contrato con el personal técnico y especializado requerido, debidamente aprobado por la interventoría, garantizando la idoneidad y capacidad técnica para la ejecución de los estudios.

4. El avance físico global del contrato, asociado principalmente a la aprobación de metodologías y actividades preliminares, resulta coherente con la naturaleza del periodo inicial de ejecución, evidenciando un cumplimiento adecuado de los hitos programados para esta etapa del proyecto.

5. El avance financiero registrado, correspondiente al 7.57% del valor contractual (sin IVA), guarda correspondencia con las actividades ejecutadas durante el periodo, principalmente relacionadas con costos directos de personal, elaboración de metodologías y entregables iniciales, sin presentarse desviaciones críticas frente a la programación financiera establecida.

6. Desde el punto de vista administrativo y contractual, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones en materia de garantías, seguros, informes semanales, control documental y comunicaciones formales, asegurando la trazabilidad y el adecuado seguimiento por parte de la interventoría y la entidad contratante.

6 ANEXOS

6.1 Anexo 1. Informes semanales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 1 del 16/12/2025 al 21/12/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
INTEGRANTES: PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
CONTRATO No. 1968 DE 2025 | VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | **VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1922 de 2025 | VALOR INICIAL: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84,699.00	0.011%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100,000.00	0.013%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 15,301.00	0.002%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 84,699.00	0.011%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100,000.00	0.013%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15,301.00	0.002%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 84,699.00	0.011%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100,000.00	0.013%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 0.0% | Avance o Atraso Físico %: 0.0%
Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 21/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 1 del 16/12/2025 al 21/12/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No. OF-25C08-CONS-0002-25 del 17 de diciembre de 2025, se remitió solicitud prorroga No1 al contrato de la referencia

2. Mediante comunicado No. OF-25C06-INT-002-25 del 18 de diciembre de 2025, se remitió documentos para la solcitud de anticipo del cotrato de consultoria.

3. Mediante comunicado No. OF-25C08-CONS-0002-2 del 19 de diciembre de 2025, se remitió solicitud de prorroga al contrato de consultoria.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 22/12/25 al 28/12/25 se realizaran las siguientes actividades:
1.Remisión de hojas de vida personal que hace parte del equipo de constultoria.
2.Actualiacion de polizas según prorroga.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


proes colombia — CELQO

CONSORCIO EMBALADOR PROCEL
NIT: 901.082.906-1

OF-25C08-INF-002-25

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ATT: JUAN CARLOS ROA
SUBDIRECTOR MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO

REFERENCIA: Contrato No 1843 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MIDAS, Y AMPARADO EN EL RIO MAYOR, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ", LOTE 7"
ASUNTO: Solicitud desembolso del anticipo

solicitud de anticipo

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN [illegible]-R-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 2 del 22/12/2025 al 28/12/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
INTEGRANTES: PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
CONTRATO No. 1968 DE 2025 | VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | **VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 | $ - | $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1922 | VALOR INICIAL: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO: | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 189,891.00	0.024%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100,000.00	0.013%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89,891.00)	-0.011%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189,891.00	0.024%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100,000.00	0.013%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (89,891.00)	-0.011%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 105,192.00	0.013%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100,000.00	0.013%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0.0% | Avance o Atraso Físico % 0.0%
Meta Física Ejecutada % 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual		PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO No.1968 de 2025. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-R-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 2 del 22/12/2025 al 28/12/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 29/12/25 al 06/01/26se realizaran las siguientes actividades:
1.Remisión de hojas de vida personal que hace parte del equipo de consultoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 4/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 3 del 29/12/2025 al 4/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3		
INTEGRANTES:	PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3		
CONTRATO No.	1968 DE 2025	VALOR INICIAL:	$ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO:	16/12/2025	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2025	**VALOR ACUMULADO:**	**$ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2026	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1922	VALOR INICIAL:	$ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6,575,756.00	0.837%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6,178,720.00	0.787%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (397,036.00)	-0.051%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6,575,756.00	0.837%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6,178,720.00	0.787%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (397,036.00)	-0.051%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6,385,865.00	0.813%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,380,674.00	0.813%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 0.765%
Meta Física Ejecutada % 0.602%
Avance o Atraso Físico % -0.16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual		PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	0%	0.76%	0.76%
			Ejec	0%	0.60%	0.60%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	0%	13%	13%
			Ejec	0%	10%	10%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**2 de 2**

FECHA: 4/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 3 del 29/12/2025 al 4/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No. OF-OF-25C08-CONS-0003-25 del 31 de diciembre de 2025, se remitió Respuesta OFICIO II-871-L6-004-2025 DEL 26 DIC - ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS PENDIENTES (HV- METODOLOGIA Y CRONOGRAMA)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Remisión de hojas de vida personal que hace parte del equipo de constultoria.
2. Elaboración de metodologías.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


proes.colombia programas

JESyCA

Bogotá D.C. 31 de diciembre de 2025 — OF-25C08-CONS-0003-25

Señores
CONCEP S.A.
RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
REPRESENTANTE LEGAL

REFERENCIA: Contrato No 1360 de 2025, cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.

ASUNTO: Respuesta OFICIO II-871-L6-004-2025 DEL 26 DIC

Envio de oficio . OF-OF-25C08-CONS-0003-25 del 31 de diciembre de 2025,

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**1 de 2**

FECHA: 11/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 4 del 5/01/2026 al 11/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
INTEGRANTES: PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
CONTRATO No. 1968 DE 2025 | VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | **VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1922 | VALOR INICIAL: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO: | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16,846,245.00	2.145%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16,036,160.00	2.042%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (810,085.00)	-0.103%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16,846,245.00	2.145%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16,036,160.00	2.042%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (810,085.00)	-0.103%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,270,489.00	1.308%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8,169,578.00	1.040%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1.117%
Meta Física Ejecutada % 0.602%
Avance o Atraso Físico % -0.51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	0.76%	0.35%	1.12%
			Ejec	0.60%	0.00%	0.60%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	13%	6%	19%
			Ejec	10%	0%	10%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 4 del 5/01/2026 al 11/01/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0004- del 07 de enero de 2026, se remitio RESPUESTA OFICIO II-871-L6-003-2026 propuesta de entrega de información de manera digital
2. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0005-25 del 08 de enero de 2026, se remitió Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II y Metodologías.
3. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0006-25 del 09 de enero de 2026, se remitió Subsanación observaciones relacionas en el oficio II-871-L6-008-2026 yentrega adicional de Hv y metodología.
4. Mediante comunicado No.II-871-L6-003-2026- del 06 de enero de 2026, inteventoría solcita ficha técnica del papel
5. Mediante comunicado II-871-L6-004-2026- del 07 de enero de 2026, inteventoría solcita Solicitud informes semanales LOTE 6.
6. Mediante comunicado II-871-L6-005-2026- del 08 de enero de 2026, inteventoría Respuesta Oficio OF-25C08-CONS-0004-25 LOTE 6.
7. Mediante comunicadoII-871-L6-006-2026- del 08 de enero de 2026, inteventoría solicita remisión Hojas de vida Personal Lote 6
8. Mediante comunicadoII-871-L6-007-2026- del 08 de enero de 2026, inteventoría solicita Remisión metodologías lote 6
9. Mediante comunicadoII-871-L6-008-2026- del 09 de enero de 2026, inteventorí da Respuesta OF-25C08-CONS-0005-25 Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II. LOTE6.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Subsanción Hv

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 5 del 12/01/2026 al 18/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
INTEGRANTES: PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
CONTRATO No. 1968 DE 2025 | VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | **VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1922 | VALOR INICIAL: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO: | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27,116,734.00	3.453%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24,267,360.00	3.090%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2,849,374.00)	-0.363%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27,116,734.00	3.453%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,267,360.00	3.090%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2,849,374.00)	-0.363%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,270,489.00	1.308%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9,702,797.00	1.236%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1.442%
Meta Física Ejecutada % 0.602%
Avance o Atraso Físico % -0.84%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	1.12%	0.33%	1.44%
			Ejec	0.60%	0.00%	0.60%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	19%	5.40%	23.95%
			Ejec	10%	0%	10%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	0%	0%
			Ejec	0%	0%	0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

FECHA: 18/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 5 del 12/01/2026 al 18/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0007-25 del 15 de enero de 2026, se remitió Subsanación observaciones HV relacionas en el oficio II-871-L6-009-
2. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0008-25 del 15 de enero de 2026, se remitió Cambio de Ingeniero auxiliar.
3. Mediante comunicadoII-871-L6-009-2026- del 13 de enero de 2026, inteventoría da respuesta al oficio No.OF-25C08-CONS-0006-25
4. Mediante comunicadoII-871-L6-010-2026- del 16 de enero de 2026, inteventoría da Observaciones cronograma de actividades
5. Mediante comunicadoII-871-L6-011-2026- del 16 de enero de 2026, inteventoría da Respuesta OF-25C08-CONS-0008-25 Cambio de ingeniero auxiliar LOTE 6.
6. Mediante comunicadoII-871-L6-012-2026- del 16 de enero de 2026, inteventoría da Respuesta Respuesta OF-25C08-CONS-0007- Subsanación observaciones HV relacionas en el oficio II871-L6-009- 2026 y entrega de metodología, plan de inversión y ficha técnica del papel

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1 Entrega de metodologias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**1 de 2**

FECHA: 25/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 6 del 19/01/2026 al 25/01/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3		
INTEGRANTES:	PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3		
CONTRATO No.	1968 DE 2025	VALOR INICIAL:	$ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO:	16/12/2025	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2025	**VALOR ACUMULADO:**	**$ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2026	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1922	VALOR INICIAL:	$ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 40,507,222.00	5.158%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41,924,800.00	5.339%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1,417,578.00	0.181%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40,507,222.00	5.158%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41,924,800.00	5.339%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1,417,578.00	0.181%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,390,488.00	1.705%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,502,797.00	2.229%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 3.684%
Meta Física Ejecutada % 5.301%
Avance o Atraso Físico % 1.62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual		PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	**Prog**	**1.44%**	**2.24%**	**3.68%**
			Ejec	**0.60%**	**4.70%**	**5.30%**
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	23.95%	5.85%	29.8%
			Ejec	10%	0%	10.0%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	0%	5%	4.9%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	0%	5%	4.9%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	0%	0.0%
			Ejec	0%	5%	5.0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	0%	5%	4.9%
			Ejec	0%	5%	5.0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 6 del 19/01/2026 al 25/01/2026 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No. OF-25C08-CONS-0009-26 del 19 de enero de 2026, se Entrega HV – Especialista en Tránsito y Transporte
2. Mediante comunicado No. OF-25C08-CONS-0010-26 del 20 de enero de 2026, se Entrega de Metodologías.
3. Mediante comunicado No. OF-25C08-CONS-0011-26 del 23 de enero de 2026, Subsanación HV profesional valuatorio predial.
4. Mediante comunicadoII-871-L6-014-2026- del 20 de enero de 2026, inteventoría da Respuesta OF-25C08-CONS-0009-25 . Aporbacion espscialista transito y transporte
5. Mediante comunicadoII-871-L6-015-2026- del 21 de enero de 2026, inteventoría sugiere lectura a la forma de pago
6. Mediante comunicadoII-871-L6-016-2026- del 21 de enero de 2026, inteventoría solicita nombres del personal que asistira al comité presencial para el dia 26 de enero del 2026.
7. Mediante comunicadoII-871-L6-017-2026- del 23 de enero de 2026, inteventoría acusa Recibido oficio OF-25C08-CONS-0010-25. Lote 6
8. Mediante comunicadoII-871-L6-016-2026- del 23 de enero de 2026, inteventoría espuesta oficio OF-25C08-CONS-0011-26 Subsanación HV Profesional Valuatorio Predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. comité presencial en las oficinas del INVIAS, programada para el 26 de enero del 2026.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 7 del 26/01/2026 al 1/02/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Entrega a satisfaccion de la entidad de 11 volumenes

VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
INTEGRANTES: PROES LATAM S.A.S. identificada con NIT. 901.860.103-8 & JESYCA S.A.S identificada con el Nit 900.798.949-3
CONTRATO No. 1968 DE 2025 | VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
FECHA DE INICIO: 16/12/2025 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | **VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1922 | VALOR INICIAL: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE INICIO: | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 | VALOR ACUMULADO: $ 3,940,965,840.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 934,498,770			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 934,498,770			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3,940,965,840			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,940,965,840			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 785,293,084.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65,884,369.00	8.390%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59,582,240.00	7.587%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,302,129.00)	-0.803%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65,884,369.00	8.390%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59,582,240.00	7.587%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6,302,129.00)	-0.803%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25,377,147.00	3.232%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,502,797.00	2.229%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El periodo presentado en el presente informe semanal corresponde a la primera semana de ejecucion del contrato de concultoria No 1968 de 2025

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 12.417%
Meta Física Ejecutada % 10.000%
Avance o Atraso Físico % -2.42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
	Descripción de la Meta Física Contractual	PORCENTAJE DEL VOLUMEN	Avance Físico	AVANCE ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	Total
CTO.No.1968 de 2025: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		100.00%	Prog	3.68%	8.73%	12.42%
			Ejec	5.30%	4.70%	10.00%
VOLUMEN I	Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)	10.24%	Prog	0%	8%	7.5%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN II	Estudio cartográfico, topográfico y batimétrico	3.61%	Prog	0%	8%	7.5%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN III	Estudio de geología y geomorfología	6.02%	Prog	0%	8%	7.5%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN IV	Estudio de geotecnia	6.02%	Prog	0%	8%	7.5%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN V	Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y dinamica fluvial	6.02%	Prog	29.80%	5.40%	35.2%
			Ejec	10%	0%	10.0%
VOLUMEN VI	Estudio de alternativas de estabilización y protección y selección de la alternativa definitiva.	18.07%	Prog	0%	5%	5.0%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN VII	Estudio y diseño de estructuras de protección y obras complementarias.	9.04%	Prog	0%	5%	5.0%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN VIII	Gestión ambiental, social y sostenibilidad	30.13%	Prog	5%	14%	18.9%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN IX	Gestión predial y catastral	4.22%	Prog	5%	10%	14.5%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN X	Estudio de cantidades de obras, análisis de precios unitarios y presupuestos	2.41%	Prog	0%	5%	5.0%
			Ejec	5%	5%	10.0%
VOLUMEN XI	Estudio de evaluación socio - económica del proyecto	4.22%	Prog	5%	9%	13.6%
			Ejec	5%	5%	10.0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTU DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 7 del 26/01/2026 al 1/02/2026 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0013-25 del 27 de enero de 2026, se remitió Aclaración sobre responsabilidad de entrega informes semanales ymensuales.
2. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0014-25 del 27 de enero de 2026, se entrega de Metodología volumen IX
3. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0015-25 del 29 de enero de 2026, se entrega de Metodología General
4. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0017-25 del 29 de enero de 2026, SE ENTREGA DE PLAN DE INVERSION Y ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 Y
5. Mediante comunicado No.OF-25C08-CONS-0018-25 del 30 de enero de 2026, ENTREGA ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 CTO No 1968 de 2025 DE ACUERDO A LAPRORROGA No1.
6. Mediante comunicadoII-871-L6-019-2026- del 28 de enero de 2026, inteventoria da Respuesta OF-25C08-CONS-0013-26
7. Mediante comunicadoII-871-L6-020-2026- del 28 de enero de 2026, inteventoria solicita datos de contacto (# telefónico y correo electrónico) del personalaprobado para el proyecto- LOTE 6.
8. Comité de obra ejecutado en las instalacionbes del INVIAS el día 26 de enero del 2026, con participación de la inventoria, funcionarios del INVIAS y representantes de la consultoria.
9. Envío mediante correo electrónico a la interventoria programación de primera visita a la Tola

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. programación de comité para el 3 de febrero con particiapaciónd el INVIAS, INTEVENTORIA Y CONSULTORIA
2. Programación de primera visita a la Tola

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Matrícula Profesional No.: 22202-251355 CORD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

6.2 Anexo 2. Reporte de ejecución mensual.


Cronograma

Programa de inversiones

Control de aportes


Seguimiento a garantías

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración
1		**CTO.No.1968 de 2025 - CRONOGRAMA GENERAL -ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.LT 6**	**$ 934.498.770,00**	**186 días**
2		Acta de Inicio	$ 0,00	0 días
3		**G1 CD PERSONAL MIN**	**$ 193.522.560,00**	**185 días**
4		Dibujante	$ 15.022.560,00	185 días
5		Director de Consultoría	$ 61.518.240,00	185 días
6		Ingeniero Auxiliar	$ 46.724.160,00	185 días
7		Ingeniero residente de campo y estudios	$ 70.257.600,00	185 días
8		**G2 VLMN TEC ENTREGABLES**	**$ 197.540.000,00**	**158 días**
9		**VOLUMEN I - ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VIAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**$ 20.230.000,00**	**41 días**
10		Metodología aprobada por Interventoría	$ 2.025.000,00	6 días
11		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 18.207.000,00	35 días
12		**VOLUMEN II: ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**$ 7.140.000,00**	**66 días**
13		Metodología aprobada por Interventoría	$ 714.000,00	6 días
14		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	$ 4.284.000,00	51 días
15		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 2.142.000,00	9 días
16		**VOLUMEN III: ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**$ 11.900.000,00**	**73 días**
17		Metodología aprobada por Interventoría	$ 1.190.000,00	6 días
18		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	$ 2.380.000,00	24 días
19		Informe geológico -geomorfológico- estructural del proyecto aprobado por Interventoría	$ 5.950.000,00	30 días
20		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 2.380.000,00	13 días
21		**VOLUMEN IV: ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**$ 11.900.000,00**	**73 días**
22		Metodología aprobada por Interventoría	$ 1.190.000,00	6 días
23		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	$ 7.140.000,00	55 días
24		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 3.570.000,00	12 días
25		**VOLUMEN V: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL**	**$ 11.900.000,00**	**88 días**
26		Metodología aprobada por Interventoría	$ 1.190.000,00	1 día
27		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	$ 5.355.000,00	77 días
28		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 5.355.000,00	10 días
29		**VOLUMEN VI: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA.**	**$ 35.700.000,00**	**44 días**
30		Metodología aprobada por Interventoría	$ 3.570.000,00	10 días
31		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 32.130.000,00	34 días
32		**VOLUMEN VII: ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**	**$ 17.850.000,00**	**45 días**
33		Metodología aprobada por Interventoría	$ 1.785.000,00	10 días
34		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la interventoría	$ 10.710.000,00	25 días
35		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 5.355.000,00	10 días
36		**VOLUMEN VIII: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**$ 59.500.000,00**	**116 días**
37		Metodología aprobada por Interventoría	$ 5.950.000,00	10 días
38		Documento PAGA-Aprobado por la interventoría	$ 11.900.000,00	10 días
39		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	$ 5.950.000,00	55 días
40		Informe del Área de influencia y línea baseInforme de impactos ambientales y socialesaprobado por el interventor	$ 5.950.000,00	25 días
41		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientalesaprobado por el interventor	$ 11.900.000,00	60 días
42		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 17.850.000,00	10 días
43		**VOLUMEN IX: GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**$ 8.330.000,00**	**93 días**
44		Metodología aprobada por Interventoría	$ 833.000,00	10 días
45		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	$ 7.497.000,00	83 días
46		**VOLUMEN X: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS**	**$ 4.760.000,00**	**10 días**
47		Metodología aprobada por Interventoría	$ 476.000,00	5 días
48		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 4.284.000,00	5 días
49		**VOLUMEN XI: ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**$ 8.330.000,00**	**119 días**
50		Metodología aprobada por Interventoría	$ 833.000,00	10 días
51		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	$ 7.497.000,00	109 días
52		**G3 OTROS COSTOS DIRECTOS**	**$ 543.436.210,00**	**186 días**
53		Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 29.750.000,00	90 días
54		Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 7.140.000,00	10 días
55		Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (SI/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 35.700.000,00	1 día
56		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) SI/Comprobante Pago	$ 2.380.000,00	4 días
57		Levantamiento topobatimétrico detallado (Si/comprobante) (Incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 28.560.000,00	10 días
58		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 0,00	1 día
59		Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	$ 29.750.000,00	80 días
60		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	$ 2.380.000,00	90 días
61		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (Si/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	$ 5.950.000,00	7 días
62		Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	$ 9.520.000,00	10 días
63		Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 2.856.000,00	10 días
64		Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	$ 45.220.000,00	15 días
65		Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	$ 47.600.000,00	15 días
66		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Si/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regalías, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mazc	$ 111.882.015,00	10 días
67		Ensayos de Batimetría y socavación (Si/comprobante) (Incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	$ 60.928.000,00	19,63 días
68		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (Si/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambienta	$ 44.030.000,00	90 días
69		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	$ 79.790.195,00	15 días
70		FIN	$ 0,00	0 días

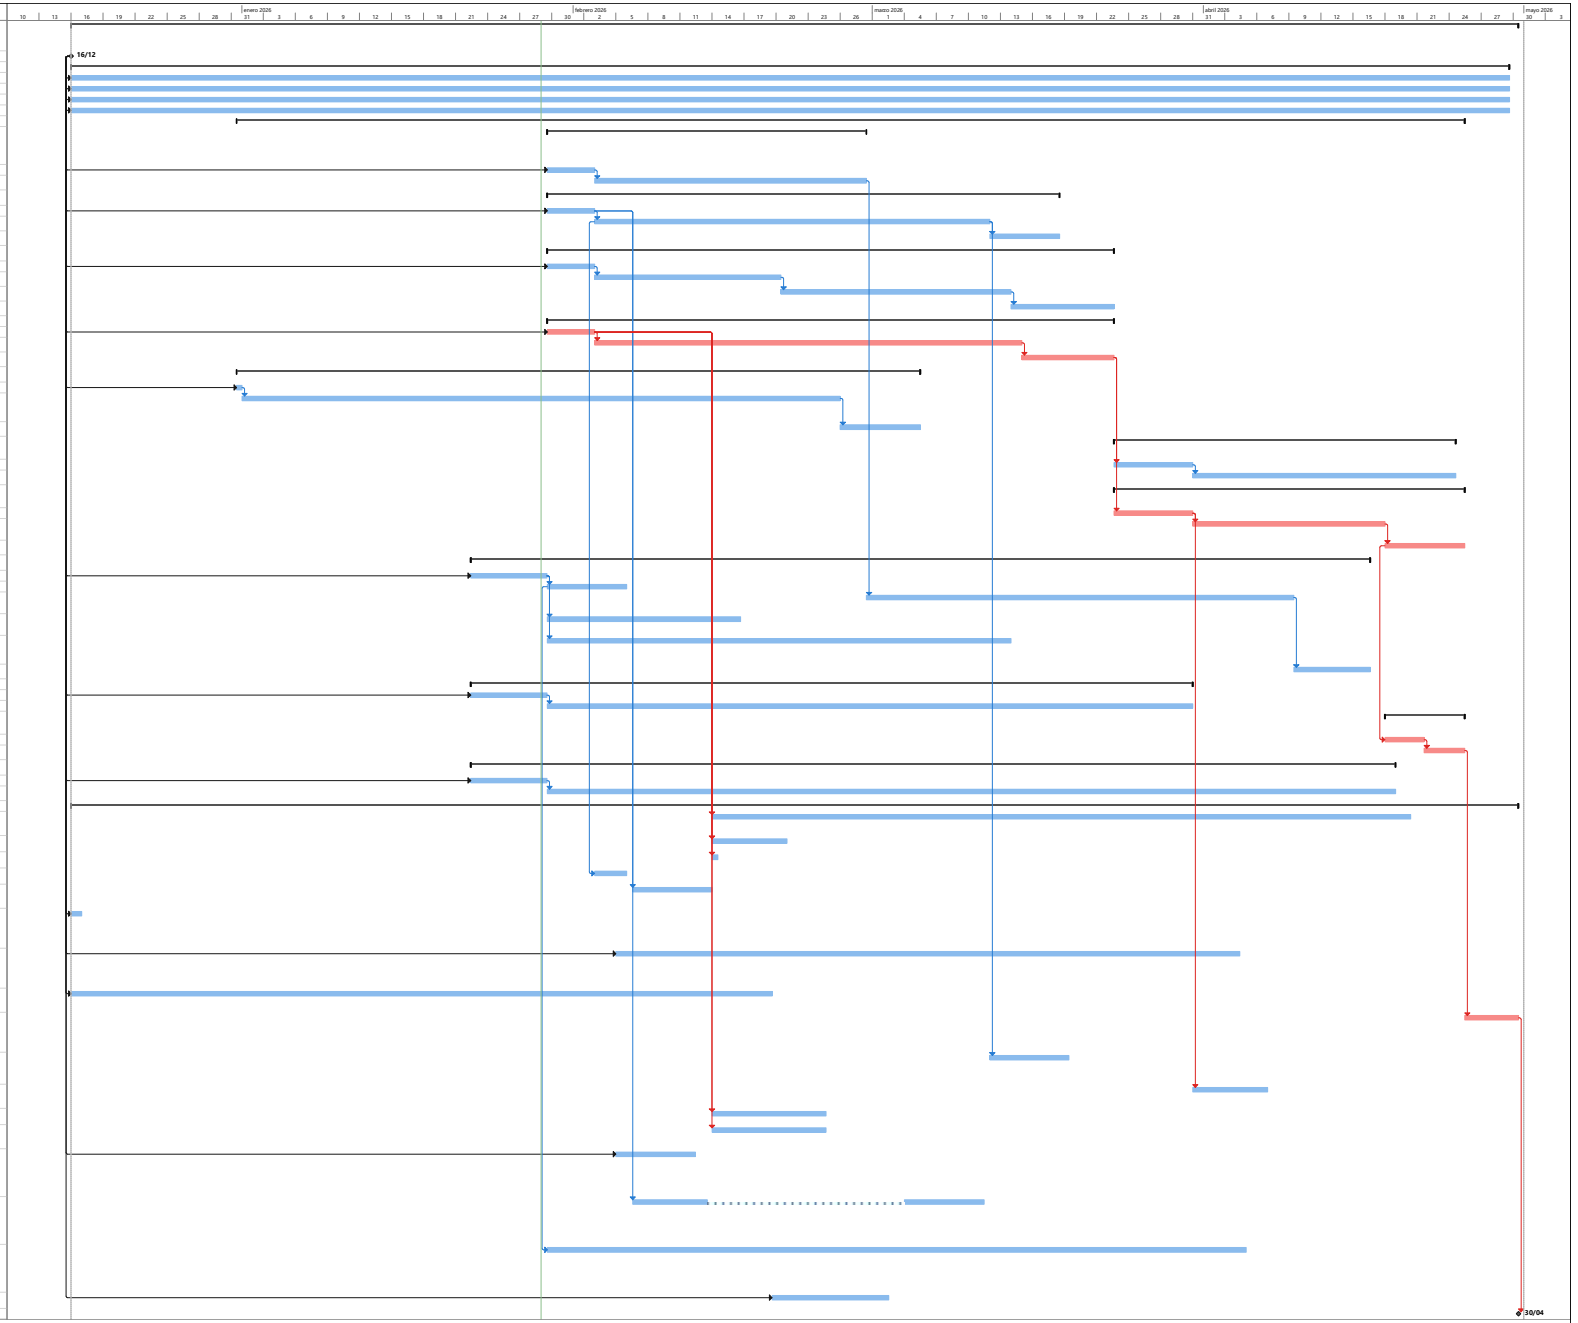

Proyecto: PROG_CTO_INV_1968
Fecha: jue 29/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso



Proyecto: PROG_CTO_INV_1968
Fecha: jue 29/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 1968 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 0,6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	1	7	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	1	7	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	31	12	30
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	30	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	30	10	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	30	4	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205

Certificado de modificación o anexo No.:2 .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	n/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	n/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101486205**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**01**	**2026**	**28**	**11**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**NIT: 902.007.863-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 98 NRO. 70 - 91 OF 516	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3150864123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1968 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/11/2025**	**30/10/2026**	**$93,449,877.00**	**$93,449,877.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**28/11/2025**	**30/10/2026**	**$392,646,542.00**	**$392,646,542.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2025**	**31/12/2030**	**$280,349,631.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/11/2025**	**30/04/2029**	**$186,899,754.00**	**$186,899,754.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO UNO (01), SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2026, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****400,663.00	$ *******8,000.00	$ ******77,646.00	$ **********486,309.00	$ ******953,345,804.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUR	103184	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101486205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101486205	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2026	28	11	2025	00:00	31	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY		**NIT: 902.007.863-3**
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 OF 516	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3150864123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LA CONSULTORIA.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101486205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101486205	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	01	2026	28	11	2025	00:00	31	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**NIT: 902.007.863-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 98 NRO. 70 - 91 OF 516	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3150864123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JESYCA S.A.S.	900798949-3	50.00
PROES LATAM S.A.S	901860103-8	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101486205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101486205, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de ENERO de 2026

21-44-101486205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
