INFORME MENSUAL No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2025 AL 15/01/2026

SOPORTES GRUPO No1 Y GRUPO No3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS

CONTRATO 1922 DE 2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

INFORME MENSUAL No. 1

INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

DICIEMBRE 16 DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026, BARRANQUILLA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1 Localización de los proyectos 9
2.1.1 Lote 1 9
2.1.3 Lote 3 20
2.1.4 Lote 4 24
2.1.5 Lote 5 27
2.1.6 Lote 6 30
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 31
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 34
2.4. Características técnicas del proyecto. 35
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 38
3.1 Información General de los Contratos de Consultoría (Lote 1- Lote 6) 38
3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes por los Consultores 44
3.2.1 Lote 1 44
3.2.2 Lote 2 46
3.2.3 Lote 3 48
3.2.4 Lote 4 49
3.2.5 Lote 5 50
3.2.6 Lote 6 51
3.3. Seguimiento Ítems no previstos 52
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 52
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOs DE CONSULTORIA 53
4.1. Informes Semanales 53
4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría 55
4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría. 55
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría 64
4.5. Estado general del Tiempo 68
4.6. Resumen Ensayos de laboratorio 68

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría 68
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....80
4.9. Otros documentos seguimiento mensual....80
4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo....80
4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones 80
4.9.3. Actas de comité y reunión 80
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....81
5.1. Información general del contrato....81
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 82
5.3. Informes de especialistas y profesionales 83
5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC....83
5.5. Informe matriz de riesgos....83
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 83
6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA....83
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 83
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 83
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 85
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 87
6.6. Otros documentos seguimiento mensual....87
6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo....88
6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 88
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89
8. ANEXOS....90
8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA 90

LISTADO DE FIGURAS

Figure 1 Localización del Hito 1 Puracon....10
Figure 2 Localización del Hito 1 Pucarón....10
Figure 3 Localización del Hito 2 Taraira....11
Figure 4 Localización del Hito 2 Taraira....12
Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa....13
Figura 6 Localización del Hito 4 Miritί- Parana....14
Figura 7 Localización del Hito 4 Miritί- Parana....14
Figura 8 Localización del Hito 5 La Victoria....15
Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria....15
Figura 10 Localización del Hito 1 La Guadalupe....16
Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe....17
Figura 12 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.....18
Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia....18
Figura 14 Localización del Hito 3 Cacahual....19
Figura 15 Localización del Hito 1 Mapiripana....21
Figura 16 Localización del Hito 1 Mapiripana....21
Figura 17 Localización del Hito 2 Morichal....22
Figura 18 Localización del Hito 3 Papanahua....23
Figura 19 Localización del Hito 3 Papanahua....23
Figura 20 Localización del Hito 1 Unguía....24
Figura 21 Localización del Hito 1 Unguía....25
Figura 22 Localización del Hito 2 Pavasá....26
Figura 23 Localización del Hito 2 Pavasá....26
Figura 24 Localización del Hito 1 Solita....27
Figura 25 Localización del Hito 1 Solita....28
Figura 26 Localización del Hito 2 Solano....29
Figura 27 Localización del Hito 2 Solano....29
Figura 28 Localización del Municipio de la Tola-Nariño....30
Figura 29 Localización del Municipio de la Tola-Nariño....31
Figura 30 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1.....62
Figura 31 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 2. Diciembre.....62
Figura 32 Informe financiero lote 1. Diciembre. 64
Figura 33 Informe financiero lote 2. Diciembre....65
Figura 34 Informe financiero lote 3. Diciembre. 65
Figura 35 Informe financiero lote 5. Diciembre. 66
Figura 36 Informe financiero lote 6. Diciembre. 67
Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.....68
Figura 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.....70

Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3. 72
Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4. 74
Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5. 76
Figura 42 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6. 78
Figura 43 El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07 Interventoría. 84
Figura 44 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 85
Figura 45 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría. 86
Figura 46 el formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 plan de inversión del anticipo. 88

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional 32
Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025. Lote 1. 38
Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025. Lote 2. 39
Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025. Lote 3. 40
Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025. Lote 4. 41
Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025. Lote 5. 42
Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025. Lote 6. 43
Table 8 Listado informes semanales. Lote 1. 53
Tabla 9 Listado informes semanales. Lote 2. 53
Tabla 10 Listado informes semanales. Lote 3. 53
Tabla 11 Listado informes semanales. Lote 4. 54
Tabla 12 Listado informes semanales. Lote 5. 54
Tabla 13 Listado informes semanales. Lote 6. 54
Tabla 14 Relación del Personal aprobado Consultoría para Lote 1. 55
Tabla 15 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 2. 56
Tabla 16 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 3. 57
Tabla 17 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 4. 58
Tabla 18 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 5. 59
Tabla 19 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 6. 60
Tabla 20 Información del contrato de Interventoría. 81
Tabla 21 Relación Personal de la Interventoría aprobado por el INVIAS. 82
Tabla 22 Relación equipos de la Interventoría. 82
Table 23 Listado informes semanales de Interventoría para periodo 16-31 diciembre de 2025 y del 1-15 de enero de 2026 – para cada Lote (1 - 6). 87

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Correspondencia recibida Consultor Lote 1 90
Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1. 91
Anexo 3 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2. 92
Anexo 4 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2. 93
Anexo 5 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3. 94
Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3. 95
Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4. 96
Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4. 97
Anexo 9 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5. 98
Anexo 10 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5. 99
Anexo 11 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6. 100
Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6. 100

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establece la promoción y desarrollo del modo fluvial y el transporte Intermodal, el cual elevará el nivel de los servicios que se prestan en la red fluvial; con el fin de generar una mayor accesibilidad de los territorios y mayor movilidad de la población de la Colombia profunda.

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra la estructuración de proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, incluyendo los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero. En desarrollo de dichas funciones, el INVIAS adelantó los procesos CMA-DTE-SPI-044-2025 y CMA-DTE-SPI-046-2025.

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a través de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, incorpora dentro de su gestión el proyecto denominado **"Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS"**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones y la operatividad de la infraestructura fluvial asociada a los muelles ubicados en la red navegable a cargo de la Entidad.

El proyecto objeto de interventoría corresponde a los **"Estudios y Diseños para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lotes 1 al 6"**, mediante el cual se contempla la ejecución de estudios para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 a nivel de **Fase II – Factibilidad**, y para el Lote 6 a nivel de **Fase III – Estudios y Diseños Definitivos**.

Por lo que el Instituto Nacional de Vías suscribió con **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.)** el contrato número 1922 DE 2025, cuyo objeto es la "**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"**

Y se suscribieron los siguientes contratos cuyo objeto son:

- El contrato 1914 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1."**

- El contrato 1915 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO NAVEGABILIDAD,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2."**

- El contrato 1892 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO VÍA FLUVIAL,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3."**

- El contrato 1882 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **TORRES Y ASOCIADOS,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL". LOTE 4."**

- El contrato 1957 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5".**

- El contrato 1968 de 2025, entre el Instituto Nacional de Vías y **CONSORCIO MNF,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6.".**

Las órdenes de inicio de los contratos de Consultoría se suscribieron:

- Lote No 1 el 16 de diciembre de 2025.
- Lote No 2 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 3 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 4 el 19 de diciembre de 2025
- Lote No 5 el 16 de diciembre de 2025
- Lote No 6 el 16 de diciembre de 2025

La orden de inicio del contrato de Interventoría se suscribió el 16 de diciembre del 2025.

Se realizó reunión presencial en la oficina de Invias en la ciudad de Bogotá el día 16 de diciembre del 2025.

El informe mensual No. 1 de Interventoría, corresponde al período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026. En este informe se presenta el alcance del proyecto, la información básica de los contratos de Consultoría e Interventoría y las principales actividades ejecutadas por la consultoría y la Interventoría durante este período.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización de los proyectos.

2.1.1 Lote 1

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL se tiene la siguiente localización de los sus respectivos hitos:

HITO 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE ALTERNO PUCARÓN

El caserío de Pucarón se localiza al suroccidente del municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, en inmediaciones de los sectores de San Luis y Matapí. El área objeto de intervención corresponde a un punto estratégico del corredor fluvial del río Vaupés, el cual constituye un eje fundamental para el transporte de pasajeros, carga general y víveres desde el interior del país hacia el municipio de Mitú.

En este sector, la presencia de raudales genera una discontinuidad en la navegabilidad del tramo comprendido entre Calamar y Mitú, lo que obliga a la implementación de un trasbordo terrestre de aproximadamente 5,45 km. Dicho trasbordo se realiza a través de dos tramos viales: i) un tramo pavimentado en concreto, en adecuado estado de servicio, con una longitud aproximada de 2,40 km, que conecta con los muelles de Yuruparí; y ii) un tramo carreteable no pavimentado, de aproximadamente 2,45 km, que conduce al sector de Piraybaroca, desde donde se restablece la continuidad del transporte fluvial hacia el municipio de Mitú.

Adicionalmente, este punto presenta una alta importancia funcional y social, al constituirse en un nodo de conectividad utilizado por comunidades indígenas para el acceso a servicios de educación y salud

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pucarón:

Figure 1 Localización del Hito 1 Puracon



Fuente: Google earth

Figure 2 Localización del Hito 1 Pucarón



Fuente: Google earth


El HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE TARAIRA

Taraira es un municipio situado en el extremo suroriente del departamento del Vaupés, en Colombia. Se localiza en la frontera con Brasil al oriente y limita al sur y occidente con el departamento del Amazonas. Forma parte de la cuenca baja del río Apaporis, en una zona de alta riqueza hídrica y selvática.

El área municipal es de 6.619 Km², equivalente al 12,23% del área departamental, y limita por el norte con el corregimiento departamental de Pacoa y la República del Brasil (municipio de Japurá); por el oriente, con la República del Brásil (municipio de Japurá); por el sur y el occidente, con el departamento del Amazonas (corregimiento departamental de La Pedrera).

En las siguientes figura se presenta la localización general de Taraira:

Figure 3 Localización del Hito 2 Taraira

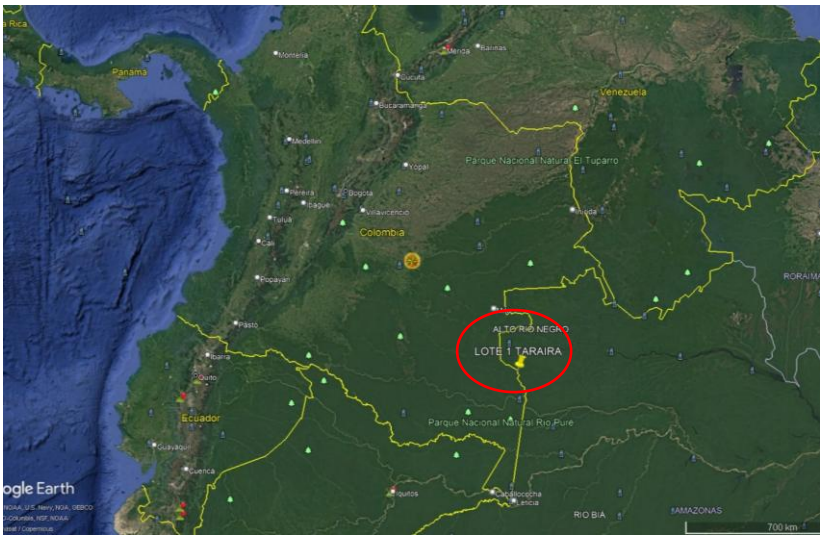

Fuente: Google earth

Figure 4 Localización del Hito 2 Taraira



Fuente: Google earth


EL HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PACOA

Pacoa es una de las tres áreas no municipalizadas del departamento de Vaupés en Colombia. Su cabecera municipal es Buenos Aires de Lérida, se encuentra a una altitud de 200 m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 14.108 km² y tiene una población de 5709 habitantes. En este se encuentra el raudal de Jirijirimo, Río Apaporis.

Limita al norte con el corregimiento de Papunagua, partiendo del raudal Sabana; sobre el río Paraná Pichuna, siguiendo en línea recta en dirección noroeste hasta encontrar los nacimientos del caño Siringa; luego por el este aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Aceite, punto de concurso del departamento del Guaviare y el municipio de Carurú y el corregimiento de Papunagua.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Pacoa

Figura 5 Localización del Hito 3 Pacoa

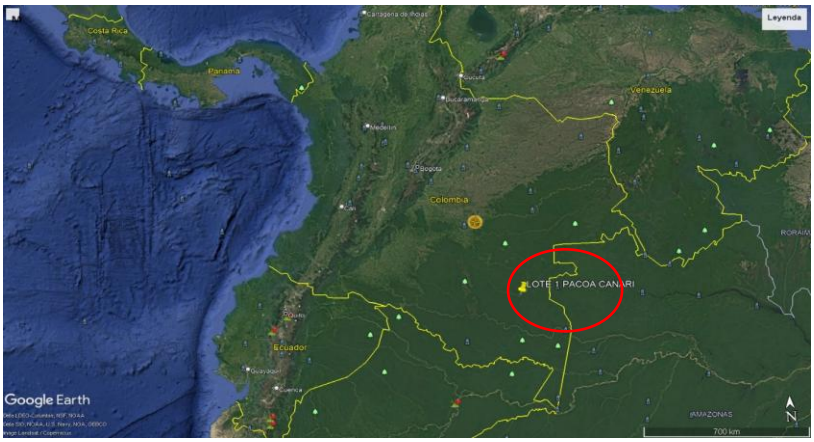

Fuente: Google earth

Figura 6 Localización del Hito 3 Pacoa



Fuente: Google earth

EL HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ

Localizado en Miriti-Paraná es un área no municipalizada colombiana, cuyo territorio se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, y se encuentra ubicado al norte del departamento de Amazonas. Limita al norte con el departamento del Caquetá, el área no municipalizada de La Victoria y el departamento de Vaupés;

al este con el área no municipalizada de La Pedrera y al sur y oeste con el área no municipalizada de Puerto Santander.

En las siguientes figura se presenta la localización general de Mirití Parana:

Figura 6 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

Figura 7 Localización del Hito 4 Mirití- Parana



Fuente: Google earth

El HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE LA VICTORIA

La Victoria es un área no municipalizada ubicada en el departamento colombiano de Amazonas. Limita al este con Pacoa, al noroeste con Solano y al sur con Miritíi-

Paraná. Fue fundado por Fidel Wilyhes. Este se localiza sobre el margen del rio Apaporis, su extensión es de 1443 km.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Victoria:

Figura 8 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Google earth

Figura 9 Localización del Hito 5 La Victoria



Fuente: Elaboración diagnósticos muelles fluviales a cargo del invias (Taraira, Miriti Parana, La Victoria) en los Departamentos de Vaupés y Amazonas. (INVIAS, 2023)

2.1.2 Lote 2

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE.

La Guadalupe Está ubicado a los 01º 15´ 19" de latitud Norte y 66º 52´56" de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en la margen derecha del río Negro, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar, presentando clima cálido entre los 27º y 32º y una precipitación media anual de 3.000 mm.. El Corregimiento tiene un área de 1.167 km², representando el 1,61% del total departamental. Limita por el norte con el corregimiento de San Felipe, por el oriente con la República de Venezuela y por el sur y el occidente con la República de Brasil.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de La Guadalupe:

Figura 10 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

Figura 11 Localización del Hito 1 La Guadalupe



Fuente: Google earth

HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA.

Puerto Colombia es un área no municipalizada colombiana del departamento de Guainía, ubicada a 186 km por vía fluvial de Inírida, Limita al norte con el corregimiento departamental de Cacahual y el municipio de Puerto Inírida, al oriente con la República de Venezuela, por el sur con los corregimientos de San Felipe y Paná Paná y con Brasil y por el occidente con el corregimiento de Morichal y el municipio de Inírida

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Puerto Colombia:

Figura 12 Localización del Hito 2 Puerto Colombia.



Fuente: Google earth

Figura 13 Localización del Hito 2 Puerto Colombia



Fuente: Google earth

HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CACAHUAL

Cacahual es una área no municipalizada de Colombia, situado en el departamento de Guainía, al este del país. Compuesto por los centros poblados: *Cacahual, Merey y San Juan*. Limita al oeste y norte con la capital departamental, Inírida, al sur con Puerto Colombia, y al este con Venezuela. Se encuentra a una distancia de 68 km de Inírida.

Las vías de comunicación son principalmente fluviales y aéreas. Dista de Inírida la capital departamental 186 km por vía fluvial.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Cacahual:

Figura 14 Localización del Hito 3 Cacahual



Fuente: Google earth

Figura Localización del Hito 3 Cacahual



Fuente: Google earth

2.1.3 Lote 3

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos:

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA.

Mapiripana es un municipio colombiano situado en el departamento del GUAINIA a orillas del río Guaviare. Dista 116 km de San José del Guaviare al norte, 324 km de Villavicencio y 417 km de Bogotá al sur respectivamente.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Mapiripana:

Figura 15 Localización del Hito 1 Mapiripana



Fuente: Google earth

Figura 16 Localización del Hito 1 Mapiripana



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL.

Es denominado también Garza Morichal y se halla ubicado a los 02º 14´ 34” de latitud Norte y 70º 01´04” de longitud Oeste. Su cabecera corregimental está ubicada en el río Inírida, a una altura de 163 metros sobre el nivel del mar,

presentando clima cálido promedio de 27º y una precipitación media anual de 3.000 mm.

En la siguiente figura se presenta la localización general de Morichal:

Figura 17 Localización del Hito 2 Morichal



Fuente: Google earth

HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PAPANAHUA.

se encuentra localizada en el corregimiento del Papanahua, en el área no municipalizada del departamento de Vaupés, colindante con el Rio Papanahua. Limita por el norte con los departamentos de Guaviare (municipio El Retorno) y Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el oriente, con el departamento de Guainía (corregimiento departamental de Paná Paná); por el sur con los municipios de Mitú y Carurú y por el occidente con el municipio de Carurú y el de Guaviare (municipio Miraflores).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Papanahua:

Figura 18 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

Figura 19 Localización del Hito 3 Papanahua



Fuente: Google earth

2.1.4 Lote 4

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA

El municipio de Unguía se encuentra localizado en el Urabá chocoano, en la parte noroccidental de Colombia. Tiene una extensión total de 1.190 km². La principal cuenca hidrográfica es la del Golfo de Urabá, que pertenece al río Atrato, al cual confluyen los ríos Arquía, Unguía, Tigre y Tanela. Sobre el mar Caribe se destacan la playa Tarena y la bahía de Titumate. También hay ciénagas como la de Unguía, Marriaga y Hornos.

El municipio de Unguía limita al norte con Acandí y el Golfo de Urabá, al oriente con el Río Atrato, que lo separa de Turbo (Antioquia), al sur con Riosucio, y al occidente con la Comarca Emberá-Wounaan y la Provincia de Darién, (ambas en Panamá).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Unguía:

Figura 20 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

Figura 21 Localización del Hito 1 Unguía



Fuente: Google earth

HITO II – ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ.

Bajo Baudó es un municipio costero ubicado al sur del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Su cabecera municipal es **Pizarro**. Se caracteriza por su ubicación entre la serranía del Baudó y el océano Pacífico.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Pavasá:

Figura 22 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

Figura 23 Localización del Hito 2 Pavasá



Fuente: Google earth

2.1.5 Lote 5

Para los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, se tienen los siguientes Hitos

HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA.

El municipio de Solita está ubicado en el suroccidente del departamento del Caquetá, a una distancia de 110 km de Florencia, capital del Departamento. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Caquetá, en límites con el departamento del Putumayo. Su temperatura promedio es de 26 ℃. y cuenta aproximadamente con 6,480 habitantes, distribuidos en un 61% en el área rural y un 39% en la zona urbana; y su economía principalmente está basada en la minería de oro, agricultura (arroz, plátano, yuca, maíz), ganadería (levante y leche) y pesca.

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solita:

Figura 24 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

Figura 25 Localización del Hito 1 Solita



Fuente: Google earth

HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE SOLANO

La cabecera municipal se localiza aproximadamente a 150 km al sureste de Florencia, desde donde se llega por vía terrestre Florencia – La Montañita – San Antonio de Getucha, y desde allí por vía fluvial por el río Orteguaza; o vía terrestre Florencia – Valparaíso – Solita, y fluvial por el río Caquetá desde Solita hasta Solano.

El municipio de Solano limita con los siguientes territorios: Al norte con: Solita, Valparaíso, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, los municipios de Calamar y Miraflores del Guaviare. Al este: Con el corregimiento departamental de Pacoa del Vaupés y los Corregimientos departamentales de Mirití, Paraná y la Victoria del Amazonas. Al sur: Con los corregimientos departamentales de Santander y la Chorrera, del Amazonas. Al oeste: Con los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, del Putumayo. (Plan De Desarrollo 2020 – 2023. Por un Solano, Más Humano, Productivo y Sostenible y en Paz).

En las siguientes figuras se presenta la localización general de Solano:

Figura 26 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

Figura 27 Localización del Hito 2 Solano



Fuente: Google earth

2.1.6 Lote 6

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

El Municipio de la Tola, en el Departamento de Nariño, está ubicado a 460 km al noroccidente de Pasto. El suelo entre ondulado y plano, corresponde a la llanura del Pacífico. Tiene una población de 7.321 habitantes; una Latitud Norte 2º 24` 39", y una Longitud Oeste 78º 14` 34"; y una altitud 20 m.s.n.m; tiene una superficie de 459 kmts2, con una temperatura promedia de 28ºC. Limita al Norte con el Océano Pacífico; Por el Sur con el municipio de Roberto Payán; por el Oriente con el municipio de El Charco; y por el Occidente con el Municipio de Olaya Herrera


En las siguientes figuras se presenta la localización general del municipio de La Tola:

Figura 28 Localización del Municipio de la Tola-Nariño



Fuente: Google earth

Figura 29 Localización del Municipio de la Tola-Nariño

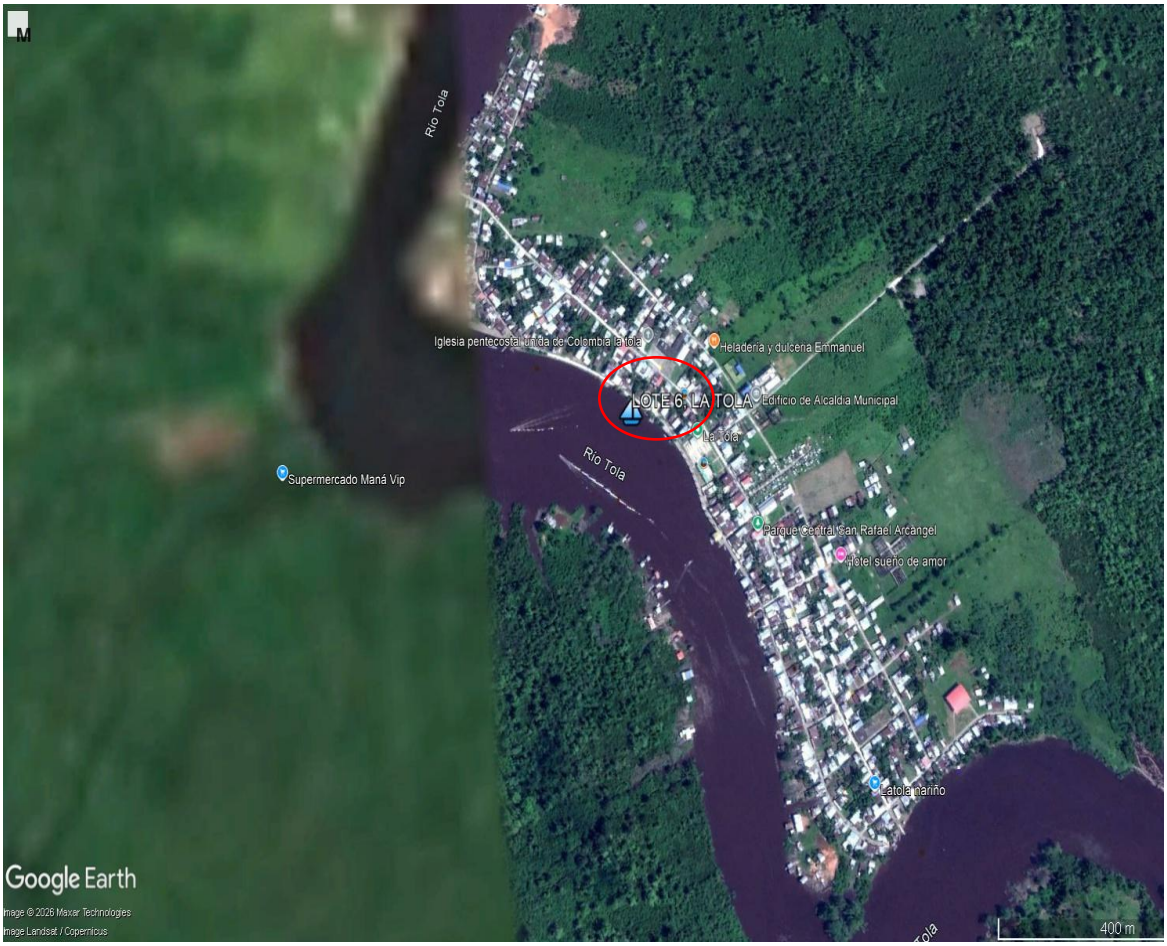

Fuente: Google earth

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Las zonas de influencia del proyecto "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6** se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Zona de influencia del Estudio y Diseño para Mejorar Las Condiciones de Navegabilidad En La Red Fluvial Nacional

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
1	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Río Vaupés	Mitú	Vaupés
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Río Apaporis	Taraira	Vaupés
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Río Cananarí	Pacoa	Vaupés
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Río Miriti - Paraná	Miriti - Paraná	Amazonas
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Río Apaporis	La Victoria	Amazonas
2	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE	Río Negro	La Guadalupe	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA	Río Negro	Puerto Colombia	Guainía
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL	Río Atabapo	Cacahual	Guainía

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
3	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Río Guaviare	Mapiripana	Guainía
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Río Inirida	Morichal	Guainía
4	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE UNGUÍA	Quebrada Ipeti - Río Unguia	Unguía	Chocó
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PAVASÁ	Río Baudó	Bajo Baudó	Chocó
5	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA	Río Caquetá	Solita	Caquetá
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO	Río Caquetá	Solano	Caquetá

Lote	Objeto	Hitos	Río	Municipio o Área no municipalizada	Departamento
6	Estudios y Diseños para las obras de protección del casco urbano del Municipio de La Tola en el Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DENAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL	Río Tola	La Tola	Nariño

Con la ejecución del proyecto, se presentan los siguientes beneficios:

- Generación de empleos directos e indirectos.
- El proyecto permitirá mejorar la conectividad de territorios en los que el transporte fluvial constituye el único medio de acceso, integrándolos con las principales vías de conexión regional y nacional. Esta intervención generará beneficios socioeconómicos al aumentar la accesibilidad y la movilidad de la población, facilitar el acceso oportuno a bienes, servicios básicos y mercados, reducir costos y tiempos de transporte, y dinamizar las economías locales. Asimismo, contribuirá a disminuir las brechas territoriales de productividad, competitividad y equidad, fortaleciendo la articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y cierre de brechas.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No Aplica.

2.4. Características técnicas del proyecto.

Los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase II para la construcción de un terminal o muelle fluvial de pasajeros y/o carga. Estas actividades comprenden la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, geotécnica, operativa y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización del muelle y la determinación de la embarcación tipo de diseño.

Los estudios y diseños deberán incluir la definición de las áreas funcionales y de servicio, el diseño de accesos y facilidades para la accesibilidad universal, el diseño del acceso acuático y las condiciones de atraque para las embarcaciones, considerando escenarios de expansión futura. Así mismo, se deberán desarrollar los estudios y diseños de las obras civiles, la evaluación e incorporación del equipamiento requerido para la manipulación de carga conforme a la capacidad de la embarcación tipo definida, el diseño de los sistemas hidrosanitarios, redes secas, señalización, y las obras de dragado necesarias para garantizar la operatividad del muelle.

Adicionalmente, los consultores deberán evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad para la atención de emergencias en el muelle, incluyendo, entre otros, extintores, botiquines y camillas, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.
Los consultores deberán ejecutar todas las actividades adicionales requeridas por las Entidades involucradas, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase II, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables.

Las principales actividades a desarrollar por los consultores de los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, y a Supervisar y hacer seguimiento por la Interventoría, están contempladas en los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA

- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO
- VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO
- VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- VOLUMEN IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE
- VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILDIAD
- VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL
- VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO
- VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

El consultor del Lote 6 deberá ejecutar la totalidad de las actividades técnicas requeridas para la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III para la construcción de obras de protección de márgenes fluviales. Estas actividades comprenderán, entre otros aspectos, la recopilación, revisión y análisis de información secundaria proveniente de estudios previamente realizados (cuando existan), la caracterización física, hidráulica, hidrológica, geotécnica y ambiental del área de intervención, la definición y justificación técnica de la localización de las obras de protección de orilla, la determinación de la embarcación tipo de diseño y la evaluación de las condiciones de navegabilidad.

Así mismo, los estudios y diseños deberán incluir el diseño de las obras civiles asociadas, las obras de dragado, la señalización fluvial y todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de las márgenes y la seguridad de la navegación.

Adicionalmente, el consultor deberá evaluar y definir el equipamiento mínimo de seguridad náutica requerido para atender los requerimientos de navegabilidad, así como realizar la evaluación, actualización y complementación del componente ambiental del proyecto.

El consultor seleccionado deberá adelantar todas las actividades adicionales que sean requeridas por las Entidades involucradas en el proyecto, con el fin de entregar al INVIAS los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los lineamientos institucionales aplicables, los cuales

se presentarán en los volúmenes establecidos contractualmente y que son los siguientes:

- VOLUMEN I: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)
- VOLUMEN II. ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO.
- VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA.
- VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTÉCNIA
- VOLUMEN V. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
- VOLUMEN VI. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DEFINITIVA
- VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
- VOLUMEN VIII. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN IX. GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN XI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO

Todas las Actividades realmente ejecutadas por las Consultorías del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad de los Consultores del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

3.1 Información General de los Contratos de Consultoría (Lote 1- Lote 6)

En las tablas No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se presenta la información básica de los Contratos de Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de Muelles Fluviales a Cargo del INVIAS.**

Tabla 2 Información del contrato de consultoría 1914-2025. Lote 1.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1914 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Vaupés y Amazonas en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Inprobrain Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$2.932.226.232,00
Anticipo	$ 1.232.027.829,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	6 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).

VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$0
% Ejecutado	0%

Fuente: Propia

Tabla 3 Información del contrato de consultoría 1915-2025. Lote 2.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1915 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Guainía en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.934.142.682,00
Anticipo	$ 812.664.992,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4.5 meses
Fecha actualizada de terminación	15 de mayo de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 0
% Ejecutado	%

Fuente: Propia

Tabla 4 Información del contrato de consultoría 1892-2025. Lote 3.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1892 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en los departamentos de Guainía y Vaupés en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Vía Fluvial
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.860.124.682,00
Anticipo	$ 781.564.992,50
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	5 meses
Fecha actualizada de terminación	31 de mayo de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$
% Ejecutado	0 %

Fuente: Propia

Tabla 5 Información del contrato de consultoría 1882-2025. Lote 4.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1882 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	19 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Torres y Asociados SAS
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.362.265.442,00
Anticipo	$ 572.380.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	19 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$
% Ejecutado	0%

Fuente: Propia

Tabla 6 Información del contrato de consultoría 1957-2025. Lote 5.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1957 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para la infraestructura fluvial en e departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio MNF
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$ 1.277.180.442,00
Anticipo	$ 536630.438,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$
% Ejecutado	0 %

Fuente: Propia

Tabla 7 Información del contrato de consultoría 1968-2025. Lote 6.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Contrato No.	No. 1968 DE 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto del contrato	Estudios y Diseños para las obras de protección de casco urbano del Municipio de La Tola en e Departamento de Nariño en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad er la Red Fluvial Nacional
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Consultor	Consorcio Navegabilidad Projesy
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor	$934.498.770,00
Anticipo	$392.646.542,00
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	16 de diciembre de 2026
Prórroga No 1	4 meses
Fecha actualizada de terminación	30 de abril de 2026.

Interventoría	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., (CONCEP S.A.S.).
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$
% Ejecutado	0%

Fuente: Propia

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el Mes por los Consultores

En el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026, los consultores ejecutaron:

3.2.1 Lote 1

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión de Personal Clave y Requerido

La consultoría dedicó gran parte de este periodo a la acreditación de su equipo de trabajo:

- Remisión y aclaración de hojas de vida: Se enviaron los perfiles del personal clave evaluable (Director y Especialista en Hidráulica e Hidrología) el 24 de noviembre, respondiendo a observaciones sobre su experiencia en fechas posteriores.
- Personal mínimo: El 12 de diciembre se entregaron las hojas de vida del personal mínimo requerido, incluyendo residentes y especialistas en tránsito, urbanismo, geotecnia, ambiental, social y jurídico.
- Subsanación y adicionales: Se corrigieron observaciones sobre perfiles de especialistas en evaluación económica, gestión del riesgo y otros el 26 de diciembre. También se entregó la hoja de vida de un Profesional Naval el 30 de diciembre y de otros profesionales el 13 de enero de 2026.

Entrega de Metodologías y Cronogramas

Se definieron las hojas de ruta técnicas para la ejecución de los estudios:

- Metodología general: Entregada inicialmente el 10 de diciembre junto con el cronograma de actividades. Las observaciones a esta metodología fueron subsanadas el 24 de diciembre.
- Metodologías particulares: Entre el 24 y el 30 de diciembre se entregaron las metodologías de:
    - Estructural, predial, cantidades de obra, presupuesto y evaluación socioeconómica.
    - Hidrología, hidráulica y socavación.
    - Diseño arquitectónico y urbanístico de muelles, gestión ambiental, social y sostenibilidad.
    - Geotecnia, geología y geomorfología.
- Actualizaciones: El 23 de diciembre de 2025 se entregó el cronograma de actividades actualizado según la orden de inicio.

Actividades Administrativas y Financieras

- Garantías: Se entregaron y actualizaron las pólizas de cumplimiento el 28 de noviembre, 18 de diciembre y 2 de enero de 2026.
- Anticipo: El 16 de diciembre se solicitó formalmente el desembolso del anticipo (50%), adjuntando certificaciones bancarias, formatos de inversión y documentación soporte como el registro presupuestal y el RUT.
- Prórroga: Se solicitó la Prórroga No. 1 para extender el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2026.
- Costos: El 9 de enero de 2026 se remitió el acta de costos No. 1 del contrato**.**

Recolección de Información y Coordinación Técnica

- Solicitudes al INVIAS: Se solicitó información sobre estudios y diseños previos (Hitos I al V) y documentación de referencia (coordenadas de muelles y directorio de actores) para los proyectos en Vaupés y Amazonas. Estas solicitudes fueron reiteradas el 30 de diciembre.
- Aprobaciones: El 8 de enero de 2026 se solicitó la aprobación para la ubicación de los muelles.
- Socialización: El 14 de enero de 2026 se pidió una mesa de trabajo para la socialización del contrato**.**

Reportes y Relación con la Interventoría

En enero de 2026, las actividades se centraron en responder a los requerimientos de la interventoría:

- Respuestas a comunicaciones sobre documentación del Lote 1, certificados de laboratorio y otras certificaciones.
- Informes: Se gestionó la entrega de informes semanales y mensuales, incluyendo el informe semanal No. 5 el 15 de enero de 2026

Mesas de Trabajo y Comités de Seguimiento

Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026, se realizaron comités de seguimiento virtuales con la interventoría, la supervisión del INVIAS y la dirección de la consultoría, abordando los siguientes puntos:

- Gestión y validación de las Pólizas de cumplimiento.
- Ajuste y seguimiento al Cronograma de actividades.
- Revisión de la Metodología general y metodologías particulares.
- Trámite de la Solicitud de Prórroga No. 1.

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.2 Lote 2

Gestión de Personal y Hojas de Vida.

La consultoría realizó un proceso continuo de acreditación de su equipo de trabajo:

- Entregas iniciales: Se enviaron las hojas de vida del equipo clave para Guainía el 22 de noviembre y se realizó una entrega preliminar adicional el 10 de diciembre.
- Segunda y tercera entrega: Se efectuó una segunda entrega de perfiles el 19 de diciembre y una tercera el 8 de enero de 2026, incluyendo en esta última al Profesional Valuatorio.
- Subsanación: El 5 de enero se radicó el subsane de las observaciones realizadas a la segunda entrega de hojas de vida.

Trámites Administrativos, Financieros y de Garantías.

- Manejo de Pólizas: Se gestionó la entrega y actualización de garantías en varias etapas: inicialmente el 26 de noviembre y 1 de diciembre, luego el 17 de diciembre (con la orden de inicio) y finalmente el 30 de diciembre (con la Prórroga 1).

- Gestión del Anticipo: Entre el 11 y el 17 de diciembre se realizaron los trámites para el desembolso, incluyendo la apertura de cuenta, la presentación del Plan de Inversión del Anticipo y el envío de los documentos soporte.
- Modificaciones al Contrato: Se solicitó una prórroga el 18 de diciembre y se tramitó una solicitud de suspensión el 30 de diciembre, la cual fue reiterada el 6 de enero y gestionada nuevamente el 9 de enero.

Componente Técnico y Metodológico.

- Metodologías y Cronogramas: El 23 de diciembre se presentó la metodología general y el cronograma del proyecto. El 2 de enero se remitieron versiones actualizadas de estos documentos junto con el programa de inversiones.
- Estudios Específicos: Se trabajó en la metodología de estudios de suelos, respondiendo a observaciones de la interventoría y entregando certificados de laboratorio el 13 de enero.
- Geotecnia: El 6 de enero se solicitó formalmente una mesa de trabajo para el área de geotecnia.

Coordinación Interinstitucional y Campo.

- Relacionamiento Externo: El 9 de enero se enviaron solicitudes de entrevista y pedidos de información a entidades clave: la Gobernación de Guainía, la DIMAR y la Inspección Fluvial de Puerto Inírida.
- Labores de Campo: El 16 de enero se notificó oficialmente el inicio de las labores de campo.
- Informes y Costos: Se entregaron los informes semanales del 1 al 5 durante el mes de enero y se presentó el acta de modificación de costos No. 1 el 16 de enero

Mesas de Trabajo y Comités de Seguimiento

Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026, se realizaron comités de seguimiento virtuales con la interventoría, la supervisión del INVIAS y la dirección de la consultoría, abordando los siguientes puntos:

- Gestión y validación de las Pólizas de cumplimiento.
- Ajuste y seguimiento al Cronograma de actividades.
- Revisión de la Metodología general y metodologías particulares.
- Trámite de la Solicitud de Prórroga No. 1.

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.3 Lote 3

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Contractual y Administrativa.

- Garantías y Seguros: Se remitieron las pólizas de cumplimiento del contrato los días 26 y 29 de noviembre de 2025.
- Gestión del Anticipo: Se tramitaron las certificaciones bancarias el 5 de diciembre y se presentó la solicitud formal de desembolso del anticipo el 18 de diciembre de 2025.
- Prórroga del Contrato: Se gestionó y suscribió la Prórroga No. 01 el 24 de diciembre de 2025, la cual extendió el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026.
- Canales de Comunicación: Se solicitó formalmente la información de contacto y los canales oficiales con la interventoría, y se notificó un cambio de representante legal el 14 de enero de 2026.

Acreditación de Personal Profesional.

Se realizaron múltiples entregas de hojas de vida para conformar el equipo necesario:

- Personal Clave: Remisión inicial el 1 de diciembre de 2025.
- Entregas sucesivas: Se realizaron tres entregas adicionales de hojas de vida del personal profesional y técnico los días 26 de diciembre, 5 de enero y 14 de enero de 2026.
- Vinculación: Se iniciaron las labores logísticas para la contratación efectiva del personal.

Actividades Técnicas y de Planificación.

- Metodologías: Se elaboró la metodología general y las específicas para cada volumen de los estudios, realizando entregas y ajustes entre el 5 y el 13 de enero de 2026.
- Recolección de Información: El 27 de noviembre se solicitaron antecedentes y diagnósticos previos de estudios y diseños en Fase II (Hitos I, II y III).

- Preparación de Campo: Se coordinó la logística para las visitas técnicas de especialistas y los trabajos de campo, que incluyen topografía, batimetría y estudios de suelos.
- Seguimiento: Se asistió a comités técnicos con la supervisión de INVIAS para definir los lineamientos de ejecución.

Seguimiento y Reportes

- Se elaboraron y presentaron oficialmente los documentos de seguimiento y los requerimientos definidos en el manual de interventoría a partir del 19 de diciembre de 2025

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.4 Lote 4

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión de Personal y Acreditación.

- Hojas de Vida: Se inició la remisión de perfiles desde el 3 de diciembre, incluyendo la del director de Proyecto el 5 de diciembre.
- Actualizaciones: El 8 de enero de 2026 se realizó una nueva remisión de hojas de vida para completar el equipo técnico.

Trámites Administrativos y Financieros.

- Apertura de Cuentas y Certificaciones: El 1 de diciembre se solicitó la apertura de la cuenta conjunta y el 16 de diciembre se entregó el certificado bancario del contrato.
- Gestión del Anticipo: Entre el 18 y el 29 de diciembre se tramitó el Plan de Inversión del Anticipo, la autorización de desembolso y la solicitud formal del anticipo por un valor de $681.132.721.
- Garantías: Se presentaron y actualizaron múltiples pólizas de cumplimiento entre el 1 y el 23 de diciembre, ajustándolas según la orden de inicio y la prórroga del contrato.

Planeación Técnica y Metodologías.

- Cronogramas y Planes: El 15 de diciembre se entregó el primer cronograma, seguido por la entrega de los Planes de Trabajo por Volúmenes y el cronograma detallado del contrato el 26 de diciembre.
- Programación de Inversiones: El 6 de enero de 2026 se presentó el Programa Preliminar de Inversiones.
- Metodologías y Fichas: El 13 de enero de 2026 se remitieron las metodologías pendientes y la ficha técnica del proyecto.

Novedades Contractuales y Seguimiento

- Prórrogas: Se gestionó y presentó la solicitud de prórroga del contrato mediante dos versiones de oficio el 20 de diciembre, con la correspondiente actualización de pólizas el 30 de diciembre.
- Presunto Incumplimiento: El 19 de diciembre de 2025, se recibió el oficio No. II-871-L4-009-2026 referente a un informe de presunto incumplimiento parcial para este lote.
- Certificaciones: Se entregaron certificados diversos y el certificado ONAC – AMCIS a principios de enero de 2026

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.5 Lote 5

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión Administrativa y Financiera.

- Anticipo: Se adelantaron los trámites para el manejo del anticipo, incluyendo la firma del interventor para la cuenta el 27 de noviembre y la solicitud formal de desembolso el 12 de diciembre de 2025.
- Garantías: Se gestionó la remisión y el cargue de la póliza de cumplimiento el 18 de diciembre, y su actualización debido a la prórroga el 29 de diciembre de 2025.
- Prórroga: El 16 de diciembre se discutieron los términos en una reunión presencial con INVIAS, radicando la solicitud formal de prórroga el 17 de diciembre de 2025.
- Reuniones de Coordinación: Se participó en mesas de trabajo virtuales (23 de diciembre) para abordar la orden de inicio y aspectos operativos con la interventoría.

Acreditación y Gestión de Personal.

- Hojas de Vida: El 27 de noviembre se presentaron los perfiles del personal y se respondió a requerimientos sobre el Director de Proyecto el 1 de diciembre.
- Ajustes al equipo: Se enviaron alcances sobre el Especialista en Redes Secas el 23 de diciembre y se notificó el cambio del Ingeniero Auxiliar de la zona el 15 de enero de 2026.

Actividades Técnicas y de Planeación

- Metodologías y Cronograma: Se consolidó y entregó la metodología general, las específicas y el cronograma detallado el 23 de diciembre. El 29 de diciembre se realizó un ajuste específico a la metodología de Hidrología, Hidráulica, Socavación y Dinámica Fluvial.
- Documentación de Calidad: En enero de 2026 se entregó el Plan de Calidad, los certificados de laboratorios y la ficha técnica de papel.
- Diagnóstico: Se inició la elaboración del documento de diagnóstico general basado en el análisis de información existente, entregando una versión preliminar el 9 de enero de 2026.
- Programación: Se presentó el programa de inversiones y el programa de actas el 9 de enero.

Socialización y Coordinación Institucional

- Gestión en Territorio: Se estableció contacto con los gobiernos municipales de Solita y Solano para informar sobre el alcance del proyecto.
- Mesas de Trabajo: Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero se realizaron sesiones de socialización con las alcaldías y sesiones de trabajo interno con el equipo interdisciplinario para planificar la ejecución técnica.

Seguimiento

- Se realizó la entrega periódica de informes semanales, reportándose la remisión de estos el 9 de enero de 2026

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.2.6 Lote 6

En el período reportado se realizaron las siguientes actividades:

Gestión de Talento Humano y Hojas de Vida

Subsanación y entregas: El 8 de enero de 2026 se realizó la subsanación de la hoja de vida del Topógrafo y se entregó la segunda parte de las hojas de vida del equipo técnico.

- Correcciones adicionales: Entre el 9 y el 15 de enero se subsanaron observaciones adicionales relacionadas con perfiles profesionales solicitados por la interventoría.
- Cambios en el equipo: El 15 de enero de 2026 se notificó oficialmente el cambio del Ingeniero Auxiliar del proyecto.

Componente Técnico y Metodológico

- Entregas de Metodología: Se realizaron entregas sucesivas y actualizaciones de las metodologías de trabajo los días 8, 9 y 15 de enero de 2026.
- Documentación Técnica: El 15 de enero se remitió la ficha técnica del papel requerida para los productos del contrato.

Gestión Administrativa y Financiera

- Plan de Inversión: El 15 de enero de 2026 se realizó la entrega del plan de inversión del contrato.
- Respuestas a Interventoría: Se dio trámite y respuesta a diversos oficios y comunicaciones enviadas por la interventoría entre el 31 de diciembre y el 7 de enero.

De esta manera, se logró un avance significativo en la alineación de criterios técnicos y planificación del proyecto.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

No aplica

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Desde la interventoría se solicitó a los consultores de todos los Lotes (1-6) la entrega de documentación, indispensable para garantizar la adecuada planificación y seguimiento técnico de los contratos. En particular, se requirió la presentación de la metodología general y las metodologías particulares, con el fin de realizar su

respectiva revisión técnica y aprobación, asegurando que los procedimientos planteados se ajusten a los lineamientos establecidos en los términos contractuales.

Igualmente, se solicitó la actualización y entrega del cronograma general de actividades, debidamente ajustado a la Prórroga No. 1 otorgada a cada uno de los contratos de consultoría, con el propósito de mantener una adecuada programación y control de los tiempos de ejecución.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE CONSULTORIA

4.1. Informes Semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales por LOTES, correspondientes al período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026.

Los informes por Lotes se adjuntan en carpeta externa a este informe.

Table 8 Listado informes semanales. Lote 1.

LOTE No.	**1**		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	21
SEMANA 2	22	DIC / DIC	28
SEMANA 3	29	DIC / ENE	4
SEMANA 4	5	ENE / ENE	11
SEMANA 5	12	ENE / ENE	18

Tabla 9 Listado informes semanales. Lote 2.

LOTE No.	**2**		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	18
SEMANA 2	19	DIC / DIC	25
SEMANA 3	26	DIC / ENE	1
SEMANA 4	2	ENE / ENE	8
SEMANA 5	9	ENE / ENE	15

Tabla 10 Listado informes semanales. Lote 3.

LOTE No.	3		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	18
SEMANA 2	19	DIC / DIC	25
SEMANA 3	26	DIC / ENE	1
SEMANA 4	2	ENE / ENE	8
SEMANA 5	9	ENE / ENE	15

Tabla 11 Listado informes semanales. Lote 4.

LOTE No.	4		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	19	DIC / DIC	25
SEMANA 2	26	DIC / ENE	1
SEMANA 3	2	ENE / ENE	8
SEMANA 4	9	ENE / ENE	15

Tabla 12 Listado informes semanales. Lote 5.

LOTE No.	5		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	21
SEMANA 2	22	DIC / DIC	28
SEMANA 3	29	DIC / ENE	4
SEMANA 4	5	ENE / ENE	11
SEMANA 5	12	ENE / ENE	18

Tabla 13 Listado informes semanales. Lote 6.

LOTE No.	6		
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	21
SEMANA 2	22	DIC / DIC	28
SEMANA 3	29	DIC / ENE	4
SEMANA 4	5	ENE / ENE	11
SEMANA 5	12	ENE / ENE	18

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría

No aplica

4.3. Personal Contrato de Consultoría, Control de Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Consultoría.

A continuación, se muestra el personal presentado por la Consultoría y aprobado por la Interventoría para ejecutar cada uno de los proyectos:

4.3.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 1."**

Tabla 14 Relación del Personal aprobado Consultoría para Lote 1.

CONSULTORÍA LOTE 1 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
CONTRATO 1914 DE 2025

PERSONAL CLAVE

ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	X		3/12/2025	APROBADO II-871-L1-003-2025 (03-12-25
2	ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025 (02-12-25)

PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE

	CARGO	NOMBRE	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	RICARDO ANDRÉS BLANCO CASTAÑEDA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	LEONARDO PACHECO NIÑO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
5	INGENIERO AUXILIAR 1	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
6	INGENIERO AUXILIAR 2	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
7	INGENIERO AUXILIAR 3	ANDRES FELIPE PRIETO LÓPEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
8	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	RICARDO BOLIVAR TIBOCHA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
9	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	PAOLA ANDREA LLANES VEGA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
10	GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
11	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	WILLIAM ALFONSO CAÑAS PRATO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
12	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
13	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
14	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JORGE ANDRES ROA ROMERO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
15	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
16	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
17	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
18	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
19	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
20	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	DANIEL CAMILO SÁNCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
21	PROFESIONAL SOCIAL 1	GEORGINA ELIZABETH QUINTANA GONZALEZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
22	PROFESIONAL SOCIAL 2	CLAUDIA PATRICIA GALINDO SUAREZ	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
23	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	MARIA DEL PILAR CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
24	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	DANIEL CAMACHO HERNANDEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
25	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	NELSON JAVIER MORALES MELO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
26	PROFESIONAL SIG	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
27	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ BERNAL	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
28	PROFESIONAL NAVAL	EDWIN GIOVANNY PAIPA SANABRIA	X		30/12/2025	OFICIO CON APROBACION II-871-L1-009-2026
29	DIBUJANTE 1	WILLIAM NICOLAS PRIETO SANCHEZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-006
30	DIBUJANTE 2	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L1-011-2025
31	ESPECIALISTA EN HIDRAHILICA E HIDROLOGIA	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	X		2/12/2025	APROBADO II-871-L1-002-2025

4.3.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 2.**

Tabla 15 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 2.

CONSULTORÍA LOTE 2 CONSORCIO NAVEGABILIDAD - CONTRATO 1915 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	SILVERIO FARIAS MENDOZA	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ALLEN BATEMAN	X		25/11/2025	APROBADO OFICIO L2-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OFICIOS OBSERVACIONES REALIZADAS
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CAROLINA ISABEL GARZON BUITRAGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
4	INGENIERO AUXILIAR 1	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA ARIZALA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
5	INGENIERO AUXILIAR 2	LINA GARCES RAVELO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-025-2026 CAMBIO
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FRANCISCO DE PAULA PEREZ AMAYA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	URIEL GUERRERO FARFÁN	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
8	GEOLOGO	JOSE HEYLEY VERGARA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ LUGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEXANDER GÓMEZ CASSAB	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2025
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	YOHOLIMA MARTINEZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	YOLIMA MARTINEZ GUERRERO	x		9/1/2002	OFICIO APROBACIÓN II-87-L2-008-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	ASTRID BLANCO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	WALTER GIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	OLGA TORRES CAMARGO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	PABLO GARCIA	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	FELISA ARIZALA	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	LUZ ESTELLA GUTIERREZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	NATALIA ARCILA CORTES	X		8/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIANA CATALINA BLANCO FIGUEROA	X		9/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-007-2026
24	PROFESIONAL SIG	JOHNATAN CRHISTIAN PAZ	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	PAOLA GALINDO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
26	PROFESIONAL NAVAL	CARLOS ORAMAS	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-005-2025
27	DIBUJANTE 1	MICHAEL ANDRÉS TELLO ENCISO	X		6/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-003-2026
28	DIBUJANTE2	JENY VANESSA FANDIÑO SARMIENTO	X		8/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L2-004-2026

4.3.3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 3.**

Tabla 16 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 3.

CONSULTORÍA LOTE 3 CONSORCIO VIA FLUVIAL CONTRATO 1892 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		2/12/2025	APROBADO OFICIO II-871-L3-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	LUZ VIVIANA BARRERO CANTOR	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026
4	INGENIERO AUXILIAR 1	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
5	INGENIERO AUXILIAR 2	JUAN CARLOS SANCHÉZ GAFARO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
6	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SANCHEZ	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2025
7	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	DAVID RENGIFO SAAVEDRA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
8	GEOLOGO	VICTOR ERNESTO SEDIEL	X		2/2/2026	OFICIO APROBACIÓN CAMBIO II-871-L3-025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	JUAN MANUEL CEPEDA SUAREZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
10	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
12	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS GERMAN BULLA CAICEDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
13	ESPECIALISTA AMBIENTAL 1	PRISCILA RAMOS OCAMPO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
14	ESPECIALISTA AMBIENTAL 2	ALEXANDRA BERNAL SANCHÉZ	X		14/1/2026	OFICIO CON OBSERVACIONES II-871-L3.008-2025
15	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
16	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	DANIELA BRICEÑO QUINTERO	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
17	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2026
18	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALEXANDER BARON AVILA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
19	PROFESIONAL SOCIAL 1	SANDRA MILENA ALVAREZ ABRIL	X		6/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-004-2025
20	PROFESIONAL SOCIAL 2	MELANY LISETH BUSTOS RUIZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
21	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
22	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CARLOS ARLEY PORTILLA OSORIO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
23	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	JAVIER ORLANDO LEAL PARDO	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
24	PROFESIONAL SIG	JAIRO ROJAS LEAL	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
25	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-011-2026
26	PROFESIONAL NAVAL	HECTOR ALFONSO ESCOBAR ACOSTA	X		29/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-006-2025
27	DIBUJANTE 1	JORGE ANDRÉS FAJARDO ROJAS	X		14/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L3-008-2026
28	DIBUJANTE2	VALENTINA SILVA RAMOS	X		22/1/2026	OFICIO APROBACION II-871-L3-015-2026

4.3.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 4.**

Tabla 17 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 4.

CONSULTORÍA LOTE 4 TORRES Y ASOCIADOS SAS - CONTRATO 1882 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	X		4/12/2025	OFICIO APRONACIÓN II-871-L4 001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	HEIVER ANDRES TORRES RINCON	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	MARLON MOGOLLO ROMERO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	CLAUDIA MARCELA FORERO CASTRO	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	LORENA PRASCA RAMIREZ	X		27/01/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 014-2026
7	GEÓLOGO	DIANA CAROLINA CHAPARRO PIRAJON	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	YEIMI GARCIA MORENO	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	CARLOS MAURICIO FONSECA GAMBA	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
10	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	JAIME ECHEVERRIA RODRIGUEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	NESTOR CAMILO SIERRA RODRIGUEZ	X		9/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 008-2026
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JULIANA HERRERA MACIAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ	X		16/02/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 028-2026
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	FRANCY DANIELA DUARTE	X		10/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 025-2026
16	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	YILMER ANDREY COBA DUARTE	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
17	PROFESIONAL SOCIAL	EDNA RUTH GARZON ROJAS	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	JUAN SEBASTIAN PALMA MORENO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	LAURA MAHECHA BUITRAGO	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
21	PROFESIONAL SIG	IBETH MURCIA PEÑA	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026
22	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	YINNETH MILENA RODRIGUEZ	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
23	PROFESIONAL NAVAL	EDUARDO CUBAQUE BERNAL	X		2/02/2026	OFICIO APROBACION II-871-L4 020-2026
24	DIBUJANTE	SEBASTIAN HERNANDEZ CHAVEZ	X		20/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L4 010-2026

4.3.5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. **LOTE 5.**

Tabla 18 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 5.

CONSULTORÍA LOTE 5 CONSORCIO MNF CONTRATO 1957 DE 2025

PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		1/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-003-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		27/11/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-001-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
CARGO		NOMBRE	APROBADO		FECHA DE APROBACION	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	CARLOS ANDRES MARTINEZ	X		7/12/25	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
4	INGENIERO AUXILIAR	LARRY GONZALEZ BARRERA	X		15/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-005-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	JORGE IGNACIO VELEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
6	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	MARCELO BEDOYA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
7	GEOLOGO	MARIO ALBERTO VARGAS	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
8	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	EDWIN DOMIGUEZ MORENO	X		23/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-009-2025
9	ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ CASTRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
10	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE MANUEL ALVAREZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
11	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
13	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	LILIANA GALLARDO PEREZ	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
14	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	MARIA EULALIA ARTETA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
15	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
16	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ALBA LINARES TAFUR	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
17	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
18	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	SANDRA MURILLO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
19	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CATALINA MOLINA LOZAN	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025
20	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	BRIAN RIOS BORRAEZ	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
21	PROFESIONAL SIG	LISMAR ROSSANA MALDONADO MEDINA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
22	PROFESIONAL TOPOGRAFO - BATIMETRICO	MARCO MONTENEGRO	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
23	PROFESIONAL NAVAL	ORLANDO CASTAÑEDA	X		17/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-006-2025
24	DIBUJANTE 1	MARIO MONTENEGRO	X		22/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-LS-008-2025

4.3.6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**. LOTE 6.**


Tabla 19 Relación del Personal aprobado Consultoría Lote 6.

CONSULTORÍA LOTE 6 CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO 1968 DE 2025						
PERSONAL CLAVE						
ITEM	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
1	DIRECTOR CONSULTORIA	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
2	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	LUIS LEONARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	X		5/12/2025	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-002-2025
PERSONAL REQUERIDO DISTINTO AL PERSONAL CLAVE						
	CARGO	NOMBRE	APROBADO		FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO		
3	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS	JULIAN DAVID MORA RAMIREZ	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
4	INGENIERO AUXILIAR	LAURA KATHERINE AGUILAR PULIDO	X		16/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-0011-2026
5	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	GERMAN FELIPE MEDIAN RUBIO	X		20/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-014-2026
6	GEÓLOGO	LUIS EDUARDO SANTAMARIA MONTOYA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
7	ESPECIAISTA EN GEOTECNIA	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JENNY MAGALY RUIZ PIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
9	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA	X		16/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
10	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	JESUS ALBERTO LUENGAS BERNAL	X		13/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA	HIBET LASSO TRIGOS	X		9/01/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
12	ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO	PABLO JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
13	PROFESIONAL EN COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	ANDRES GILBERTO VARGAS TRUJILLO	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
14	PROFESIONAL SOCIAL	ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	X		13/1/2026	OFICIO CON OBERVACIONES OFICIO II-871-L6-008-2026
15	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	DIEGO ANDRÉS ROJAS MONTERO	X		16/01/2026	OFICIO CON OBERVACIONES II-871-L6-012-2026
16	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CAROL JEIMY TORRES AFRICANO	X		13/1/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-009-20216
17	PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL	DIEGO FERNANDO SEQUEDA	X		23/01/2026	OFICIO APROBACIÓN II-871-L6-016-20216
18	PROFESIONAL SIG	MAURICIO MENDOZA CUBILLOS	X		5/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-006-2025
19	PROFESIONAL TOPOGRAFICO - BATIMETRICO	CARLOS HERNANDO RIOS FERRERIRA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026
20	DIBUJANTE	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	X		9/1/2026	APROBADO OFICIO II-871-L6-008-2026

A continuación, se presentan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, correspondientes al presente periodo.

Lote 1.

Figura 30 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 1.

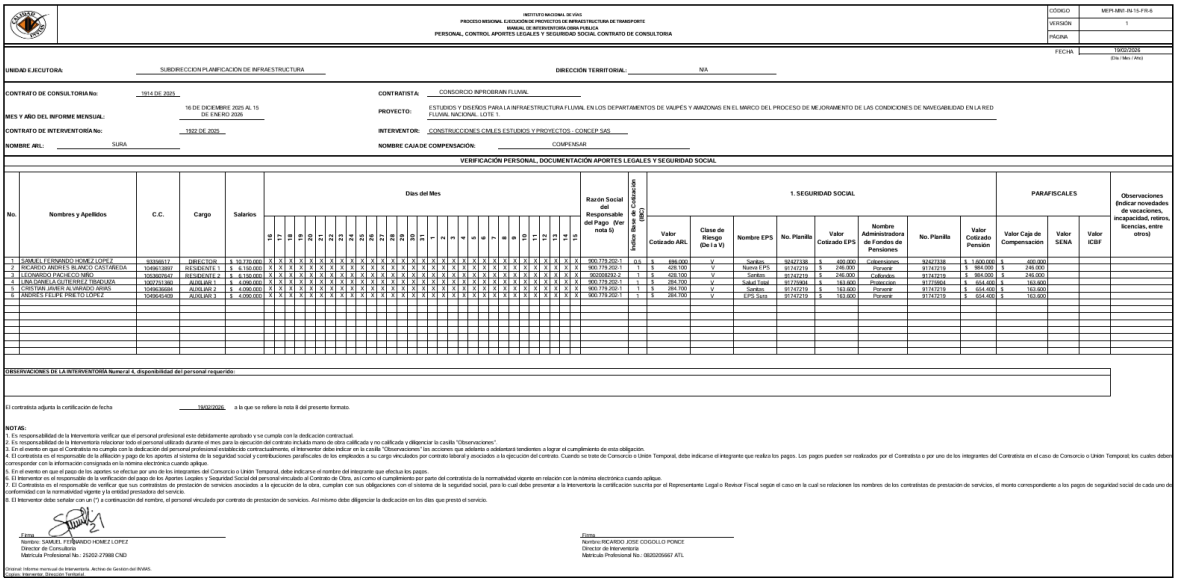

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 19/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INFROBRIAN FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1922 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (16 a 15)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota t)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93358517	DIRECTOR	$ 10.730.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.292-1	0,5	$ 486.000	V	Sanitas	92427338	$ 480.000	Colpensiones	92427338	$ 1.000.000	$ 480.000			
2	RICARDO ANDRES BLANCO CASTAÑEDA	1049613897	RESIDENTE 1	$ 6.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.292-1	1	$ 426.100	V	Nueva EPS	91747215	$ 246.000	Porvenir	91747219	$ 984.000	$ 246.000			
3	LEONARDO PACHECO MIRO	1052920947	RESIDENTE 2	$ 6.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900208282-2	1	$ 426.100	V	Sanitas	91747219	$ 246.000	Colfondos	91747219	$ 984.000	$ 246.000			
4	LINA DANIELA GUTIERREZ TRADUZA	1067210360	AUDILIAR 1	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.292-1	1	$ 284.700	V	Salud Total	91715864	$ 163.600	Proteccion	91715864	$ 654.400	$ 163.600			
5	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1049636684	AUDILIAR 2	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.292-1	1	$ 284.700	V	Sanitas	91747219	$ 163.600	Porvenir	91747219	$ 654.400	$ 163.600			
6	ANDRES FELIPE PRIETO LOPEZ	1049545439	AUDILIAR 3	$ 4.090.000	X X X X X X X X X X X X X X X X	900.779.292-1	1	$ 284.700	V	EPS Sura	91747215	$ 163.600	Porvenir	91747219	$ 654.400	$ 163.600			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 19/02/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal segun el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma
Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Lote 2.

Figura 31 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 2. Diciembre.

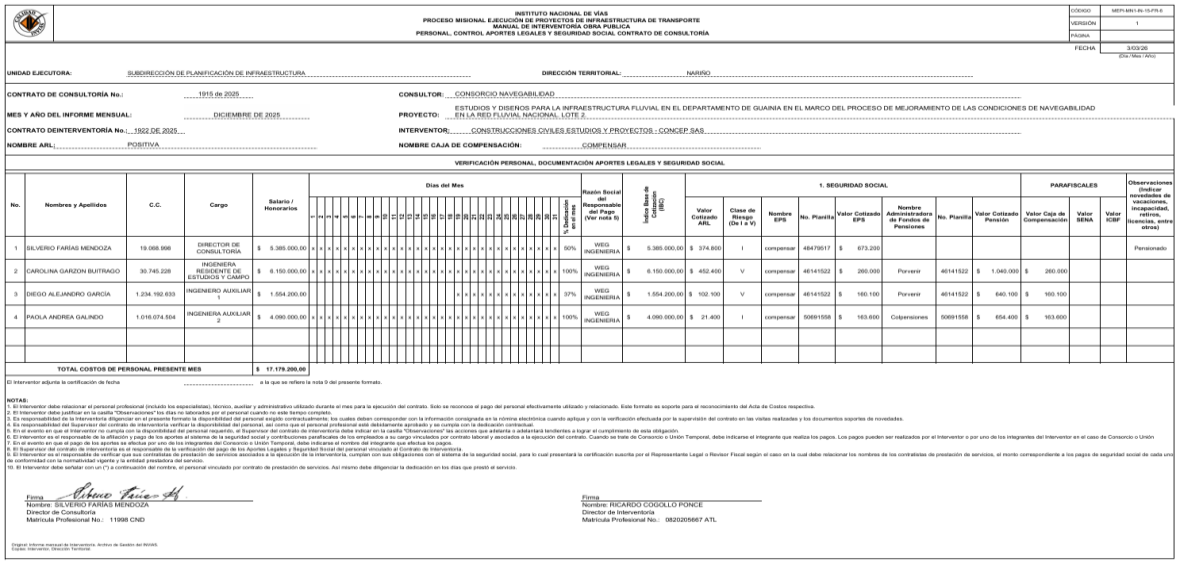

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 3/03/26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1915 de 2025 — CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 2

CONTRATO DEINTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota t)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVERIO FARIAS MENDOZA	19.088.998	DIRECTOR DE CONSULTORIA	$ 5.385.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	90%	WEG INGENIERIA	$ 5.385.000,00	$ 374.600	I	compensar	48479517	$ 673.200							Pensionado
2	CAROLINA GARZON BUITRAGO	30.745.228	INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS Y CAMPO	$ 6.150.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	WEG INGENIERIA	$ 6.150.000,00	$ 452.400	V	compensar	46141522	$ 260.000	Porvenir	46141522	$ 1.040.000	$ 260.000			
3	DIEGO ALEJANDRO GARCÍA	1.234.192.633	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 1.554.200,00		37%	WEG INGENIERIA	$ 1.554.200,00	$ 102.100	V	compensar	46141522	$ 160.100	Porvenir	46141522	$ 640.100	$ 160.100			
4	PAOLA ANDREA GALINDO	1.016.074.804	INGENIERA AUXILIAR 2	$ 4.090.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	WEG INGENIERIA	$ 4.090.000,00	$ 21.400	I	compensar	50891558	$ 163.600	Colpensiones	50891558	$ 654.400	$ 163.600			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 17.179.200,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ---------- a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.


Firma
Nombre: SILVERIO FARIAS MENDOZA
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 11998 CND

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Lote 5.

Figura 32 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Lote 5. Enero.

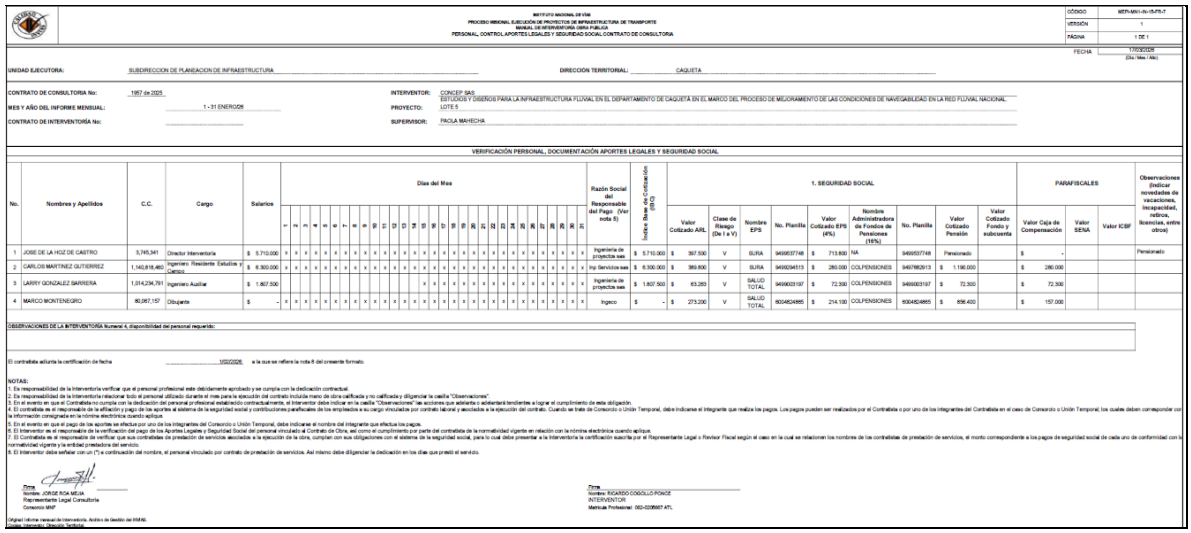

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-TR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	17/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1957 de 2025 — INTERVENTOR: CONCEP SAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 ENERO26 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL — LOTE 5
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: — SUPERVISOR: PAOLA MAHECHA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS (4%)	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones (16%)	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Cotizado Fondo y subcuenta	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	3,745,341	Director Interventoría	$ 5.710.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 5.710.000	$ 397.500	V	SURA	9495537748	$ 713.600	NA	9495537748	Pensionado		$ -			Pensionado
2	CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	1,140,818,460	Ingeniero Residente Estudios y Diseños	$ 6.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Inp Servicios sas	$ 6.300.000	$ 389.800	V	SURA	9495294515	$ 280.000	COLPENSIONES	9497882613	$ 1.190.000		$ 280.000			
3	LARRY GONZALEZ BARRERA	1,014,234,791	Ingeniero Auxiliar	$ 1.807.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 1.807.500	$ 63.263	V	SALUD TOTAL	9496003197	$ 72.300	COLPENSIONES	9496003197	$ 72.300		$ 72.300			
4	MARCO MONTENEGRO	80,087,157	Obrjeste	$ -	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeco	$ -	$ 273.200	V	SALUD TOTAL	8004824985	$ 214.100	COLPENSIONES	8004824985	$ 856.400		$ 157.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/02/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplen con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE ROA MEJIA
Representante Legal Consultoría
Consorcio MAP

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
INTERVENTOR
Matrícula Profesional: 080-220667 ATL

Original | Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría

Lote 1.

Figura 32 Informe financiero lote 1. Diciembre.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	19/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES INFORME MENSUAL: 16 AL 31 DE ENERO DE 2026 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL: LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1902 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	835925	C-2406-0603-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 65.474.111	
2025	835925	C-2406-0603-8-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	NACION	PRINCIPAL	$ 2.866.752.121	$ 1.650.592.924
				TOTAL		$ 2.932.226.232	$ 1.650.592.924

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.932.226.232,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO						$ 1.232.027.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.700.198.404	$ 2.932.226.232				
1		16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	$ 71.892.000	$ 13.659.480	$ 85.551.480	$ 35.946.000	$ 49.605.480	$ 1.196.081.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.650.592.924	$ 2.846.674.752				
2		16 AL 31 DE ENERO DE 2026	$ 139.486.000	$ 26.502.340	$ 165.988.340	$ 69.743.000	$ 96.245.340	$ 1.126.338.828,50	835925 - 25/11/2025	$ 1.554.347.584	$ 2.680.686.412				
TOTALES			$ 211.378.000	$ 40.161.820	$ 251.539.820	$ 105.689.000	$ 145.850.820	$ 1.126.338.828,50		$ 1.554.347.584	$ 2.680.686.412				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 107.838.000	$ 20.489.220	$ 128.327.220
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 101.000.000	$ 19.190.000	$ 120.190.000
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.540.000	$ 482.600	$ 3.022.600
VALOR TOTAL	$ 211.378.000	$ 40.161.820	$ 251.539.820

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


Firma
Nombre: SAMUEL FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

Lote 2.

Figura 33 Informe financiero lote 2. Diciembre.

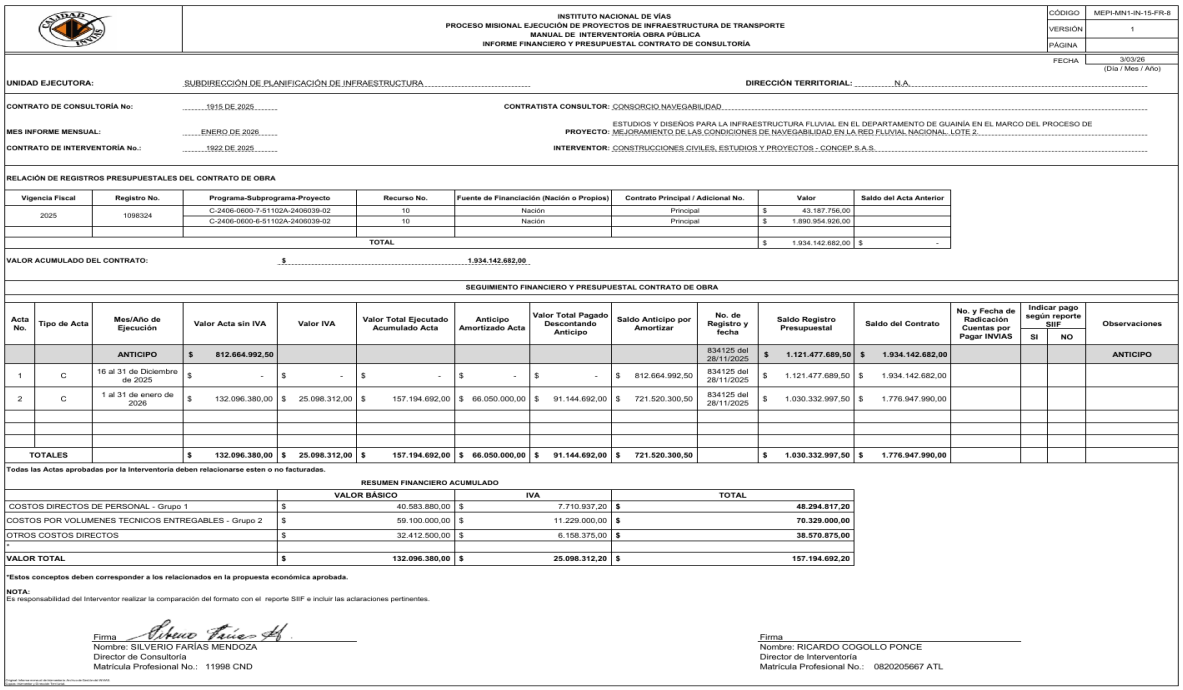

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 3/03/26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 1915 DE 2025 — CONTRATISTA CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	1098324	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 43.187.756,00	
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	Nación	Principal	$ 1.890.954.926,00	
		TOTAL				$ 1.934.142.682,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.934.142.682,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 812.664.992,50						834125 del 28/11/2025	$ 1.121.477.689,50	$ 1.934.142.682,00				ANTICIPO
1	C	16 al 31 de Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.664.992,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.121.477.689,50	$ 1.934.142.682,00				
2	C	1 al 31 de enero de 2026	$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,00	$ 157.194.692,00	$ 66.050.000,00	$ 91.144.692,00	$ 721.520.300,50	834125 del 28/11/2025	$ 1.030.332.997,50	$ 1.776.947.990,00				
TOTALES			$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,00	$ 157.194.692,00	$ 66.050.000,00	$ 91.144.692,00	$ 721.520.300,50		$ 1.030.332.997,50	$ 1.776.947.990,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - Grupo 1	$ 40.583.880,00	$ 7.710.937,20	$ 48.294.817,20
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES - Grupo 2	$ 59.100.000,00	$ 11.229.000,00	$ 70.329.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 32.412.500,00	$ 6.158.375,00	$ 38.570.875,00
-			
VALOR TOTAL	$ 132.096.380,00	$ 25.098.312,20	$ 157.194.692,20

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SILVERIO FARÍAS MENDOZA
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 11998 CND

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Lote 3.

Figura 34 Informe financiero lote 3. Diciembre.

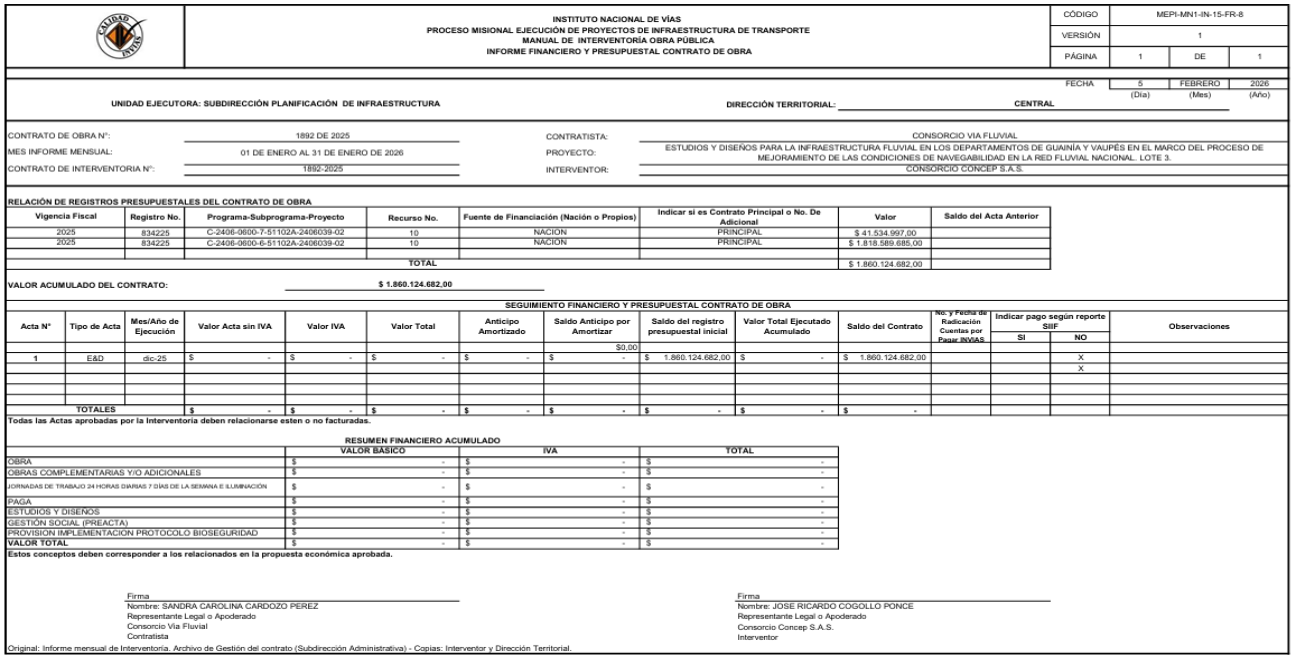

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: 1 DE 1 | FECHA: 5 (Día) FEBRERO (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CENTRAL

CONTRATO DE OBRA N°: 1892 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIA FLUVIAL

MES INFORME MENSUAL: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1892-2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO CONCEP S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	834225	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 41.534.997,00	
2025	834225	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 1.818.589.685,00	
		TOTAL				$ 1.860.124.682,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.860.124.682,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta N°	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal inicial	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
							$0,00							
1	E&D	dic-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.860.124.682,00	$ -	$ 1.860.124.682,00			X	
													X	
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Via Fluvial
Contratista

Firma
Nombre: JOSE RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Apoderado
Consorcio Concep S.A.S.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) - Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 4.

Durante este período no aplica

Lote 5.

Figura 35 Informe financiero lote 5. Diciembre.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1.5-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	5/03/2026 (Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 1957 de 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

MES INFORME MENSUAL: 1 - 28 FEBRERO/26 — CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO — SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2025	124725	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 1.248.662.091,00
2025	124725	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 28.518.351,00
				TOTAL			$ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.277.180.442,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 124725	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
		ANTICIPO	$ 536.630.438		$ 536.630.438	$ -	$ -	No. 124725	$ 712.031.653						
1		16- 31 DIC/25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No. 124725	$ 740.550.004	$ -	$ 1.277.180.442,00		X		
2		1- 31 ENE/26	$ 93.197.800,00	$ 17.707.582,00	$ 110.905.382,00	$ 46.598.900,00	$ 490.031.538,00	No. 124725	$ 676.243.522	$ -	$ 1.166.275.060,00		X		
3		1- 28 FEB/26	$ 236.615.800,00	$ 44.957.002,00	$ 281.572.802,00	$ 118.307.900,00	$ 418.322.538,00	No. 124725	$ 512.978.620	$ -	$ 884.702.258,00		X		
TOTALES			$ 329.813.600,00	$ 62.664.584,00	$ 392.478.184,00	$ 164.906.800,00	$ 418.322.538,00		$ 512.978.620	$ -	$ 884.702.258,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	75.603.600,00	14.364.684,00	89.968.284,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES	38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00
GRUPO 3- OTROS COSTOS DIRECTOS	215.610.000,00	40.965.900,00	256.575.900,00
VALOR TOTAL	$ 329.813.600,00	$ 62.664.584,00	392.478.184,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: JOSE EUSEBIO DE LA HOZ
Director de Consultoria
Matricula No.: 0820221777 ATL

Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matricula Profesional: 082-0205667 ATL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Consultoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 6

Figura 36 Informe financiero lote 6. Diciembre.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968 — INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: 1 — PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 1968 — CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	537525	C-2406-0600-6-5110ZA-2406039-02	10	PROPIOS	Contrato Principal	$ 913,632,210	$ 913,632,210
2025	537525	C-2406-0600-7-5110ZA-2406039-02	10	PROPIOS	Contrato Principal	$ 20,566,560	$ 20,566,560
		TOTAL				$ 934,498,770	$ 934,498,770

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 934,498,770

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								537525 DE 2025-12-1	$ 934,495,770	$ 934,495,770		
1	DIC/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 934,495,770	$ 934,495,770		
2	ENE/2026	$ 55,607,739	$ 11,135,470	$ 69,743,209					$ 864,755,561	$ 864,755,561		
TOTALES		$ 58,607,739.00	$ 11,135,470.00	$ 69,743,209.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 40,656,000.00	$ 7,724,640.00	$ 48,380,640.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGAB	$ 16,600,000.00	$ 3,154,000.00	$ 19,754,000.00
VALOR TOTAL	**$ 57,256,000.00**	$ 10,878,640.00	**$ 68,134,640.00**

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Martha Liliana De Hoyos
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR
PROES INGENIERÍA S.A.S

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. Estado general del Tiempo

No aplica.

4.6. Resumen Ensayos de laboratorio


Durante este período no aplica

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 actualizado.

Lote 1.

Figura 37 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 1.

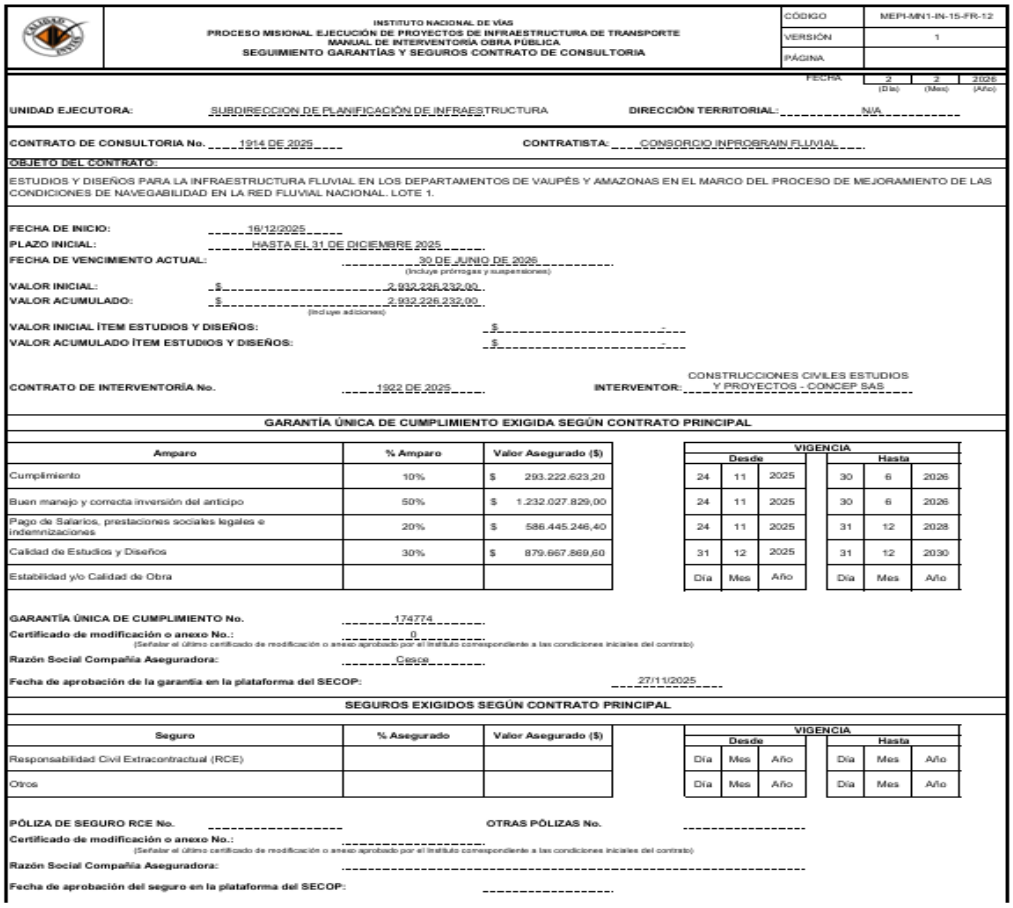

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO INFROBRAIN FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2.932.226.232,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.932.226.232,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

Clausula vigesima primera paragrafo primero:
"Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoria"

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 2.

Figura 38 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1915 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.934.142.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.934.142.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	16	12	2025	1/07/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	16	12	2025	1/07/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	16	12	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORÍA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 193.414.268,00	29	12	2025	15/11/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 812.664.993,00	29	12	2025	15/11/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 386.828.536,00	29	12	2025	15	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 580.242.805,00	15	5	2026	15	5	2031
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORÍA			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2077695

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LIBERTY SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **Ricardo Cogollo Ponce**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820205667ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 3.

Figura 39 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1892 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 1/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.860.124.682,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.860.124.682,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1957 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S- CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20 / 11 / 2025	31 / 12 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 186.012.468,20	20	11	2025	30	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 930.062.341,00	20	11	2025	30	11	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 372.024.936,40	20	11	2025	31	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 558.037.404,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101245200
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....
Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: .....
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre: SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal
Consultoria
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Delegado
Interventor:
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 4.

Figura 40 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 4.

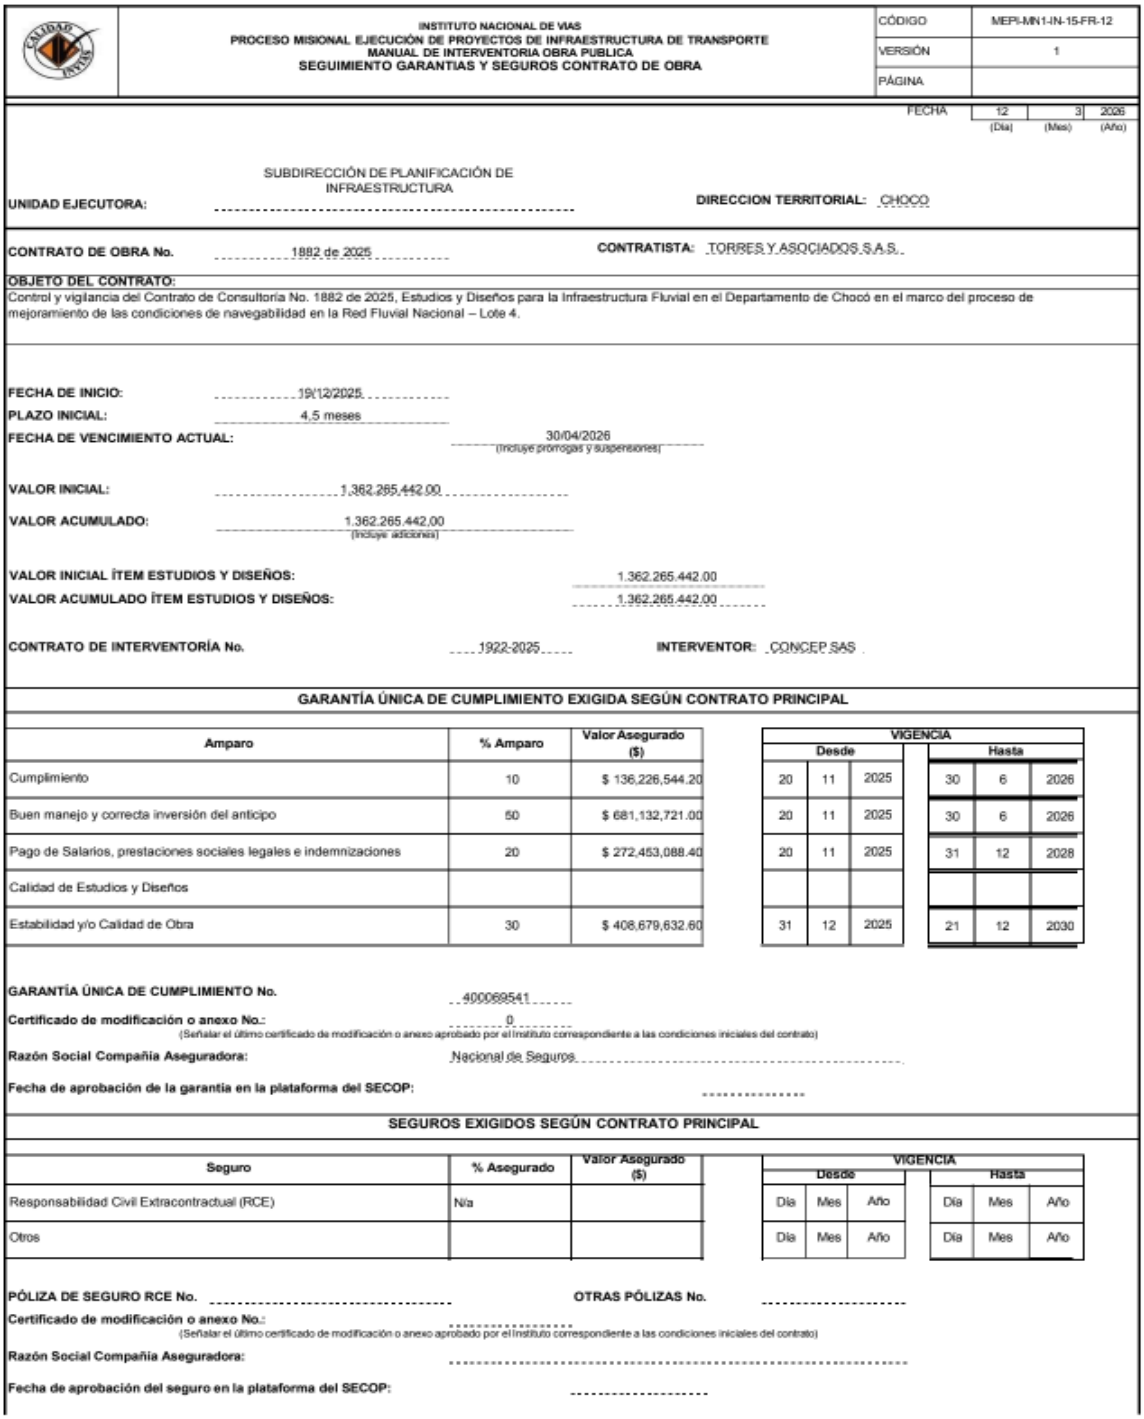

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1882 de 2025

CONTRATISTA: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
Control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1882 de 2025, Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el Departamento de Chocó en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la Red Fluvial Nacional – Lote 4.

FECHA DE INICIO: 19/12/2025
PLAZO INICIAL: 4,5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 1.362.265.442,00
VALOR ACUMULADO: 1.362.265.442,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: 1.362.265.442,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: 1.362.265.442,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922-2025 INTERVENTOR: CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 681,132,721.00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400069541
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12 (Día) | (Mes) | 2026 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 136,226,544.20	20	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 681,132,721.00	20	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 272,453,088.40	20	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/a							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 408,679,632.60	31	12	2025	21	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40006954
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....
Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: .....
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo Ponce
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Lote 5.

Figura 41 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 5.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 26 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27/11/2025	31/10/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27/11/2025	31/10/2026
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27/11/2025	31/4/2029
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31/12/2025	31/12/2030

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

La presente se encuentra ajustada según la Prorroga No. 1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Ricardo Cogollo P.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082-02-05667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1957 de 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MNF

OBJETO DEL CONTRATO:

Estudios y diseños para la infraestructura fluvial en el departamento de Caquetá en el marco del proceso de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional. Lote 5

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.277.180.442,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.277.180.442,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 127.718.044,20	27/11/2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 536.630.438,00	27/11/2025	30/06/2026
Prestaciones sociales	20%	$ 255.436.088,40	27/11/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	30%	$ 383.154.132,60	31/12/2025	31/12/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 85-44-101141984

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/12/2025

Lote 6.

Figura 42 Formato MEPI-MN1-IN-15-TR-12 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría. Lote 6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1968 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

FECHA DE INICIO: 16/12/2025
PLAZO INICIAL: 0,6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO: $ 934,498,770.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 934,498,770.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	1	7	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	1	7	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	31	12	30
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	N/A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93,449,877.00	28	11	25	30	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 392,646,542.00	28	11	25	30	10	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186,899,754.00	28	11	25	30	4	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 280,349,631.00	31	12	25	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101486205

Certificado de modificación o anexo No.:2 .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	n/a							
Otros	n/a		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No aplica para el presente periodo

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo de los contratos de consultoría. Para el presente informe no aplica el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2

4.9.2. Seguimiento al programa de inversiones

Para el presente informe no aplica la entrega el programa de inversiones formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1

4.9.3. Actas de comité y reunión

En el presente periodo se realizó una reunión de comité, realizada el 16 de diciembre de 2025 en oficina de INVIAS.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

A continuación, se presenta la información básica del Contrato de Interventoría.

Tabla 20 Información del contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	No. 1922 de 2025
Fecha de orden de inicio del contrato	16-12-2025
Objeto del contrato	Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.
Contratante	Instituto Nacional de Vías, INVIAS.
Contratista	Construcciones civiles estudios y proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
Plazo (Días calendario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor del Contrato	$ 3.940.965.840, oo
Anticipo	$ 662.347.200
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No 1	Del 1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026
Fecha actualizada de terminación	30 de junio de 2026.
Supervisor de contrato	Patricia Morales Padrón
VALOR EJECUTADO A 15 DE ENERO DE 2026	
Valor Básico Ejecutado	$ 68.688.751.60

% Ejecutado	1.74%

Fuente: Propia

En la Tabla 21 se relaciona el personal presentado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS para ejecutar el proyecto INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

Tabla 21 Relación Personal de la Interventoría aprobado por el INVIAS

ITEM	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
2	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	CESAR QUINTERO
3	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	BLADIMIR SALCEDO
4	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 1	PEDRO GONZALEZ
5	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 2	FELIPE LOPEZ
6	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS 3	OSCAR LONDOÑO
7	INGENIERO AUXILIAR 1	ZULAY MARIA ACENDRA FILOZ
8	INGENIERO AUXILIAR 2	JORGE PUCHE ORTEGA
9	INGENIERO AUXILIAR 3	ALEJANDRO GONZALEZ RUBIO

Tabla 22 Relación equipos de la Interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de Cómputo, impresora, Plotter	1
Equipo de comunicación	1

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría en el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026.

5.3. Informes de especialistas y profesionales

En anexo, se presentan el informe del director de Interventoría, del Coordinador y de los Ingenieros de campo y estudios. Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Para el presente periodo No Aplica

5.5. Informe matriz de riesgos.

Para el presente periodo No Aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para el presente periodo No Aplica

6. REPORTE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En el presente periodo no aplica el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07 en la Figura No 43

Figura 43 El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-07 Interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS . CONCEP SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.: 1914-2025/1915-2025/1892-2025/1882-2025/1957-2025/1968 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL/ CONSORCIO NAVEGABILIDAD/CONSORCIO VIA FLUVIAL/ TORRES Y ASOCIADOS SAS /CONSORCIO MNF/CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMBARRANQUILLA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Ricardo Cogollo Ponce	6.872.531	Director de interventoría	$ 10.770.000	x … x	100%	CONCEP SAS	$ 6.415.035,00	$ 446.500	V	SURA	9496645943	$ 256.700		9496645943		$ 256.700			PENSIONADO
2	Oscar Londoño Higgins	72.150.287	ingeniero residente	$ 6.150.000	x … x	100%	CONCEP SAS	$ 4.580.001,00	$ 276.300	V	SURA	9496645943	$ 183.300	COLPENSIONES	9496645943	$ 732.900	$ 183.300			
3	Felipe López Saavedra	1.140.843.700	ingeniero residente	$ 6.150.000	x … x	100%	CONCEP SAS	$ 5.972.000,00	$ 415.700	V	SURA	2021306548	$ 238.900	PORVENIR	2021306548	$ 955.600	$ 238.900			
4	Zulay Acendra Filos	22.583.327	Aux. Ingeniería	$ 4.090.000	x … x	100%	CONCEP SAS	$ 3.240.888,00	$ 17.000	I	SURA	9497759028	$ 129.700	PROTECCION	9497759028	$ 518.600	$ 129.700			
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 27.160.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: José Patricio Lima Zarama
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

El valor del contrato de Interventoría es de ($ 3.940.965.840,oo) TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

El anticipo solicitado por la Interventoría, es del 20% del valor básico del contrato de interventoría, que corresponde al valor de $662.347.200,oo Seiscientos sesenta y dos millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos pesos moneda corriente.

Figura 44 el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

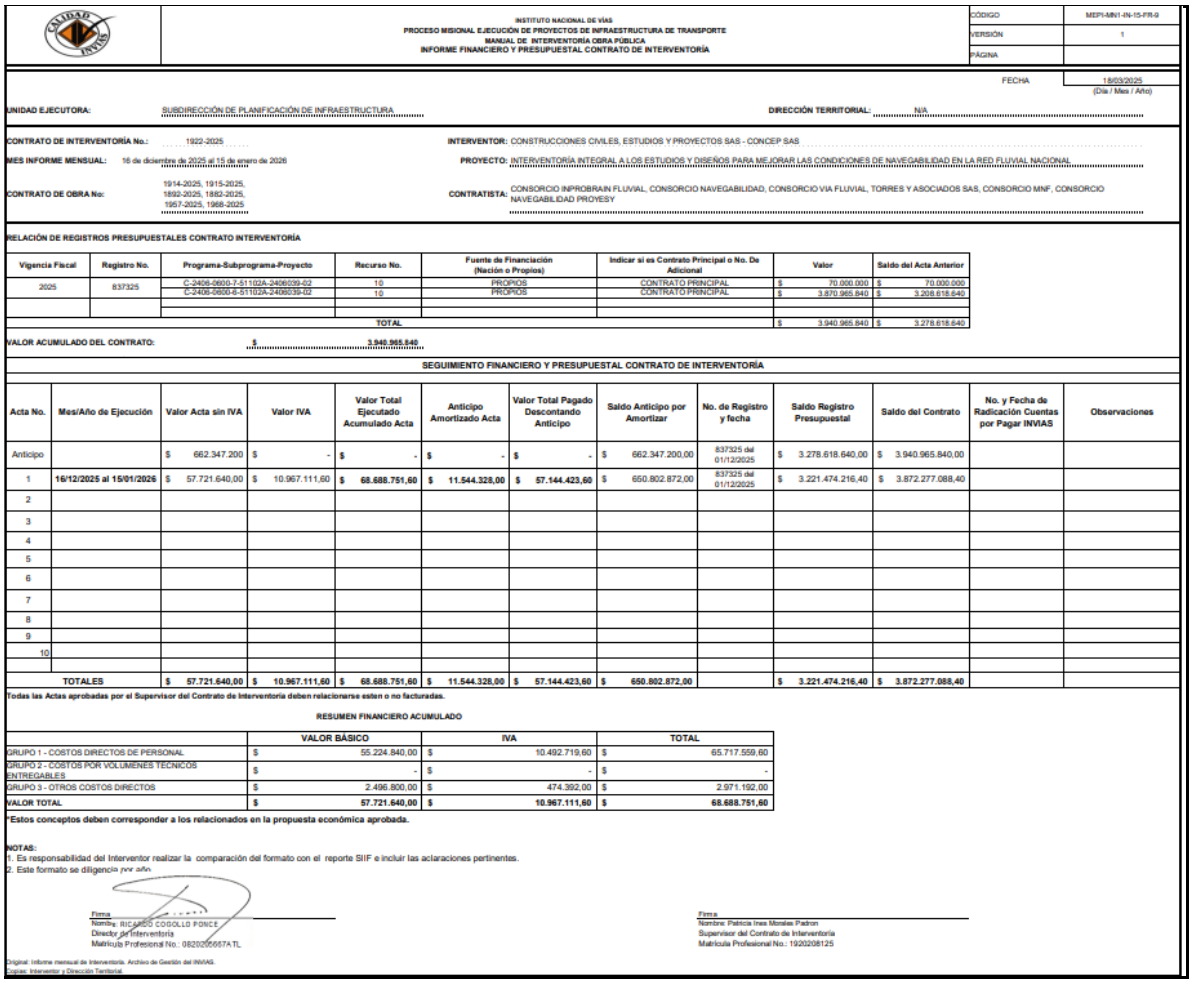

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 18/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922-2025 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS

MES INFORME MENSUAL: 16 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026 — PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No: 1914-2025, 1915-2025, 1892-2025, 1882-2025, 1957-2025, 1968-2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INFROBRAUN FLUVIAL, CONSORCIO NAVEGABILIDAD, CONSORCIO VIA FLUVIAL, TORRES Y ASOCIADOS SAS, CONSORCIO MNF, CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYESY

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837325	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 70.000.000	$ 70.000.000
		C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.870.965.840	$ 3.208.618.640
				TOTAL		$ 3.940.965.840	$ 3.278.618.640

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.940.965.840

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Anticipo		$ 662.347.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 662.347.200,00	837325 del 01/12/2025	$ 3.278.618.640,00	$ 3.940.965.840,00		
1	16/12/2025 al 15/01/2026	$ 57.721.640,00	$ 10.967.111,60	$ 68.688.751,60	$ 11.544.328,00	$ 57.144.423,60	$ 650.802.872,00	837325 del 01/12/2025	$ 3.221.474.216,40	$ 3.872.277.088,40		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTALES		$ 57.721.640,00	$ 10.967.111,60	$ 68.688.751,60	$ 11.544.328,00	$ 57.144.423,60	$ 650.802.872,00		$ 3.221.474.216,40	$ 3.872.277.088,40		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 55.224.840,00	$ 10.492.719,60	$ 65.717.559,60
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.496.800,00	$ 474.392,00	$ 2.971.192,00
VALOR TOTAL	$ 57.721.640,00	$ 10.967.111,60	$ 68.688.751,60

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205657 ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920208125

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría

En el presente periodo se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 actualizado hasta el anexo 4 (ver Figura No 22).

Figura 45 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento y seguros contrato de interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría integral a los estudios y diseños para mejorar las condiciones de navegabilidad en la red fluvial nacional.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2026 (incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.940.965.840,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.940.965.840,00 (incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Patricia Ines Morales Padron

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	21	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	21	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	21	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 394.096.584,00	16	12	2025	31	12	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.655.868.000,00	16	12	2025	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 788.193.168,00	16	12	2025	30	6	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.182.289.752,00	21	1	2026	21	1	2031



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/01/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101270027

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma
Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Para el presente periodo No Aplica

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

Durante el presente período se presentaron 5 informes semanales correspondientes para cada Lote (1-6) que se relacionan a continuación. Se adjuntan en carpeta externa de este informe mensual.

Table 23 Listado informes semanales de Interventoría para periodo 16-31 diciembre de 2025 y del 1-15 de enero de 2026 – para cada Lote (1 - 6).

INTERVENTORÍA			
No. SEMANA	PERIODO		
SEMANA 1	16	DIC / DIC	18
SEMANA 2	19	DIC / DIC	25
SEMANA 3	26	DIC / ENE	1
SEMANA 4	2	ENE / ENE	8
SEMANA 5	9	ENE / ENE	15

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de Interventoría. Para el presente informe se entrega el seguimiento a la inversión del anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1

Figura 46 el formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 plan de inversión del anticipo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: .....

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922-2025 (Indicar número y año) — INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS-CONCEP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA MORALES PADRON

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. DICIEMBRE				VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL GRUPO 1	$ 57.500.000,00				$ 57.500.000,00	8,68%
2	EJECUCION VOLUMENES GRUPO 2						
2,1	LOTE 1	$ 121.725.000,00				$ 121.725.000,00	18,38%
2,2	LOTE 2	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2,3	LOTE 3	$ 77.500.000,00				$ 77.500.000,00	11,70%
2,4	LOTE 4	$ 60.000.000,00				$ 60.000.000,00	9,06%
2,5	LOTE 5	$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	8,30%
2,6	LOTE 6	$ 30.000.000,00				$ 30.000.000,00	4,53%
3	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 9.000.000,00				$ 9.000.000,00	1,36%
4	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 74.122.200,00				$ 74.122.200,00	11,19%
5	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,55%
6	Otros transportes especiales	$ 50.000.000,00				$ 50.000.000,00	7,55%
	TOTAL	$ 662.347.200,00					100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de Interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de Interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 0820205667ATL

Firma:
Nombre: PATRICIA MORALES PADRON
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.7. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, no aplica para el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 y del 1 al 15 de enero de 2026, las Consultorías de los Lotes 1-6, concentraron sus actividades en la estructuración, desarrollo y entrega del cronograma de actividades, plan de inversión, acta modificatoria de acuerdo a la prórroga #1, y se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales responsables de cada volumen, junto con sus respectivos certificados de experiencia y soportes académicos, para efectos de verificación y aprobación por parte de la Interventoría.

En el período se solicitó a los Consultores de todos los lotes la entrega de la metodología general y particulares para su debida revisión y aprobación, así como el Cronograma general de actividades ajustados con la prórroga de cada uno de los contratos de Consultorías.

En reunión de Comité celebrada el 26 de enero de 2026 se informó a los Consultores sobre los períodos a tener en cuenta en la presentación de informes semanales y mensuales.

De manera general en desarrollo de sus funciones, la interventoría adelantó actividades orientadas al control administrativo, técnico y contractual, entre las cuales se destacan la gestión y validación de las pólizas de cumplimiento, el ajuste y seguimiento permanente al cronograma de actividades, la revisión de la metodología general y de las metodologías particulares presentadas por los consultores, así como el trámite y acompañamiento en la solicitud de la Prórroga No. 1 de los contratos de Consultoría Lotes del 1 al 6.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta la relación de la correspondencia recibida y enviada por cada uno de los Consultores durante el periodo comprendido entre el 16-31 de diciembre de 2025 y del 01 -15 de enero de 2026.

Lote 1

Anexo 1 Correspondencia recibida Consultor Lote 1

OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO POR	CONCEPTO
CIF-OP-2025-1914-001	24/11/2025	CONCEP SAS	Hojas de vida personal clave evaluable.
MAIL	26/11/2025	CONCEP SAS	26-11-25 Solicitud de documentación - interventoria CMA-DTE-SPI-046-2025 / Consultoria Lote 1 CONSORCIO INPROBRAIN
CIF-OP-2025-1914-002	28/11/2025	CONCEP SAS	Póliza de cumplimiento del contrato No.1914 de 2025 - Muelles LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-003	28/11/2025	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado L1- 001-2025- Aclaración Hojas de vida personal clave evaluable
MAIL	2/12/2025	CONCEP SAS	CUENTA BANCARIA LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-004	3/12/2025	CONCEP SAS	CIF-OP-2025-1914-004. Respuesta al comunicado II-871-L1-002-2025- Aclaración Hojas de vida personal clave evaluable.
CIF-OP-2025-1914-005	10/12/2025	CONCEP SAS	CIF-OP-2025-1914-005 Entrega cronograma de actividades y metodología general.
CIF-OP-2025-1914-006	12/12/2025	CONCEP SAS	CIF-OP-2025-1914-006 Remisión hojas de vida personal mínimo requerido adicional al clave evaluable
CIF-OP-2025-1914-007	15/12/2025	INVIAS CC CONCEP SAS	CIF-OP-2025-1914-007 - Solicitud de documentación de referencia - CONTRATO 1914 DE 2025 - LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-009	16/12/2025	CONCEP SAS	Solicitud de Prórroga No.1 Contrato 1914 de 2025 – Lote 1
CIF-OP-2025-1914-010	16/12/2025	CONCEP SAS	Remisión documentos anticipo contrato de consultoría No.1914 de 2025 – Lote 1
CIF-OP-2025-1914-012	18/12/2025	INVIAS	CIF-OP-2025-1914-012 Póliza de cumplimiento del contrato de la referencia
MAIL	18/12/2025	CONCEP SAS	RV. Solicitud de Prórroga No.1 Contrato 1914 de 2025 – Lote 1.
MAIL	22/12/2025	CONCEP SAS	20-12-25 Gmail - Subsanación Solicitud de Prórroga No.1 Contrato 1914 de 2025 – Lote 1
MAIL	23/12/2025	CONCEP SAS	Entrega cronograma de actividades CONTRATO 1914 DE 2025 LOTE 1
MAIL	26/12/2025	INVIAS	FIRMA PRORROGA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025 - LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-014	24/12/2025	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871- L1-007-2025 - Observaciones metodología general.
CIF-OP-2025-1914-015	24/12/2025	CONCEP SAS	Entrega metodologías particulares.
CIF-OP-2025-1914-016	26/12/2025	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-006-2025- Concepto hoja de vida personal del contrato.
CIF-OP-2025-1914-017	26/12/2025	CONCEP SAS	Entrega metodología particular de hidrologia, hidraulica y socavación
CIF-OP-2025-1914-018	29/12/2025	CONCEP SAS	Entrega de metodologias particulares
CIF-OP-2025-1914-019	30/12/2025	CONCEP SAS	Remision hoja de vida profesional naval
CIF-OP-2025-1914-020	30/12/2025	CONCEP SAS	Reiteración solicitud de documentación de referencia para el proyecto de infraestructura fluvial (Vaupés y Amazonas) - Cto 1914 de 2025 -Lote 1
CIF-OP-2025-1914-021	30/12/2025	INVIAS	Reiteración Solicitud de información inicial CTO No.1914 de 2025 - LOTE 1
CIF-OP-2025-1914-022	30/12/2025	CONCEP SAS	Entrega metodologías particulares.
CIF-OP-2025-1914-023	2/01/2026	INVIAS	Poliza de cumplimiento prorroga No. 1
CIF-OP-2025-1914-024	8/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-010-2025 – Metodología Hidráulica.
CIF-OP-2025-1914-025	8/01/2026	CONCEP SAS	Solicitud de aprobacion para la ubicación de muelles - contrato 1914 de 2025, Lote 1
CIF-OP-2025-1914-026	8/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-001-2026 - Solicitud documentación lote 1
CIF-OP-2025-1914-027	9/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-004-2026 - Solicitud informe semanales y mensual 1
CIF-OP-2025-1914-028	9/01/2026	CONCEP SAS	Remisión acta de costos No. 1 Consultoria Lote 1
CIF-OP-2025-1914-029	13/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-002-2026 - Solicitud Certificado laboratorio Lote 1
CIF-OP-2025-1914-030	13/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-005-2026 - Remisión hojs de vida personal clave Lote 1
CIF-OP-2025-1914-031	13/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-003-2026 - Solicitud certificacipon Lote 1
CIF-OP-2025-1914-032	14/01/2026	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL VAUPES	Solicitud mesa de trabajo para socialización del contrato 1914 DE 2025, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños en fase II de muellesfluviales ubicados en Mitú, Tarairá y Pacoa (Buenos aires) en el departamento del Vaupés.
CIF-OP-2025-1914-033	15/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-008-2026 – Respuesta oficio CIF-OP-2025- 1914-030 Hoja de vida profesional Naval LOTE 1.
CIF-OP-2025-1914-034	15/01/2026	CONCEP SAS	Respuesta al comunicado II-871-L1-006-2026 – Remisión metodologías Lote 1.
CIF-OP-2025-1914-035	15/01/2026	CONCEP SAS	Remisión informe semanal No. 4 Lote 1

Anexo 2 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 1.

OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO	CONCEPTO
oficio 24-11-25	24/11/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Doc Remisorio Doc C Inprobrain
Oficio L1-001-2025	25/11/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	CONCEPTO HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE (OBSEVACIONES NO CUMPLE)
II-871-L1-002-2025	2/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-002-2025 Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-003
II-871-L1-003-2025	3/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-004
MAIL	5/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	SOLICITUD DE REMISIÓN DE METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA LOTES 1 AL 6
II-871-L1-004-2025	15/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	II-871-L1-004-2025 Hoja de vida personal del contrato.
II-871-L1-005	16/12/2025	INVIAS	OFICIO Autorización desembolso anticipo contrato de consultoría 1914-2025 L1.
MAIL	18/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	solicitud de prorroga No. 1 contrato 1914 de 2025-lote 1
II-871-L1-006	19/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	OFICIO II-871-L1-006 concepto hojas de vida
II-871-L1-006	22/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud de Prorroga No.1 Contrato 1914 de 2025 – Lote 1.
II-871-L1-007	23/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	observaciones metodologia general
II-871-L1-008	26/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	HOJAS DE VIDA
II-871-L1-009	26/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-015
II-871-L1-010	29/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-017 lote 1
II-871-L1-011	29/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-016 lote 1 Concepto hoja de vida del personal contrato lote 1
II-871-L1-012	30/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Oficio II-871-L1-012-2025 Respuesta Oficio CIF-OP-2025-1914-019 Remisión hoja de vida profesional Naval - LOTE 1
MAIL	30/12/2025	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	enlace acceso - Estudios Anteriores LOTE 1
II-871-L1-001	6/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud de documentación Lote 1
II-871-L1-002	6/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud Certificado laboratorio LOTE 1
II-871-L1-003	6/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud Certificado LOTE 1
II-871-L1-004	7/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Solicitud informes semanales LOTE 1
II-871-L1-005	8/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Remision Hojas de vida Personal Clave Lote 1
II-871-L1-006	8/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Remision Metodogias Lote 1
II-871-L1-007	9/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta comunicación CIF-OP-1914-2025 Lote 1
II-871-L1-008	13/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-030 hoja de vida profesional naval LOTE 1
II-871-L1-009	15/01/2026	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Respuesta oficio CIF-OP-2025-1914-033 hoja de vida del profesional naval LOTE 1

Lote 2

Anexo 3 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 2.

OFICIO No.	FECHA	RECIBIDO POR	CONCEPTO
MAIL	22/11/2025	CONCEP SAS	Envio de Hojas de vida equipo clave GUANIA
CN-1915-2025-01	26/11/2025	INVIAS	Poliza
CN-1915-2025-02	1/12/2025	INVIAS	Poliza
CN-1915-2025-03	15/12/2025	CONCEP SAS	Plan de Inversión del Anticipo
CN-1915-2025-04	16/12/2025	CONCEP SAS	Contrato 1915 de 2025_solicitud desembolso del anticipo
MAIL	10/12/2025	CONCEP SAS	Lote 2_cto 1915/2025_entrega preliminar hojas de vida
MAIL	11/12/2025	CONCEP SAS	lote 2_cto 1915/2025 cuenta anticipo
MAIL	17/12/2025	CONCEP SAS	Envío de documentos desembolso anticipo
MAIL	17/12/2025	CONCEP SAS	lote 2_cto 1915-2025_expedicion garantias orden de inicio
CN-1915-2025-005	17/12/2025	INVIAS	Actualización de garantias con orden de inicio
CN-1915-2025-006	18/12/2025	CONCEP SAS	Solicitud de prórroga
CN-1915-2025-007	19/12/2025	CONCEP SAS	Segunda entrega hojas de vida personal contrato
CN-1915-2025-008	23/12/2025	CONCEP SAS	Presentación de la metodología general, cronograma general del proyecto y primera entrega de metodologias particulares
CN-1915-2025-009	30-212-25	INVIAS	Actualización de garantías con prórroga 1
CN-1915-2025-010	30/12/2025	CONCEP SAS	Solicitud de suspensión
MAIL	30/12/2025	CONCEP SAS	LOTE 2, CN-1915-2025-010 Solicitud de suspension
CN-1915-2025-011	31/12/2025	CONCEP SAS	Alcance a comunicación CN-1915-2025-008 presentación metodologías particulares
CN-1915-2025-012	2/01/2026	CONCEP SAS	Remisión metodología general y cronograma actualizado
CN-1915-2025-013	2/01/2026	CONCEP SAS	Remisión programa de inversiones
CN-1915-2025-014	5/01/2026	CONCEP SAS	Presentación ficha técnica de papel y programa mensual de actas.
CN-1915-2025-015	5/01/2026	CONCEP SAS	Subsane de Hojas de Vida – Entrega 2
MAIL	5/01/2026	CONCEP SAS	Informes semanales 1 a 3
MAIL	6/01/2026	CONCEP SAS	LOTE 2, SOLICITUD MESA DE TRABAJO GEOTECNIA
CN-1915-2025-016	6/01/2026	CONCEP SAS	Reiteración solicitud de suspensión
CN-1915-2025-017	6/01/2026	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-001-2026. Metodología estudio de suelos.
CN-1915-2025-018	8/01/2026	CONCEP SAS	Presentación de hojas de vida – Entrega 3
CN-1915-2025-019	8/01/2028	CONCEP SAS	Presentacion HV Prof. Valuatorio
CN-1915-2025-020	8/01/2028	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-006-2026. Hojas de Vida
CN-1915-2025-021	9/01/2025	CONCEP SAS	Su comunicación II-871-L2-005-2026. Solicitud de suspensión
MAIL	9/01/2026	CONCEP SAS	LOTE 2. INFORME SEMANAL 4
CN-1915-2025-022	9/01/2025	GOBERNACION DE GUAINIA	Solicitud de entrevista y suministro de información
CN-1915-2025-023	9/01/2025	DIMAR	Solicitud de entrevista y suministro de información
CN-1915-2025-024	9/01/2026	INSPECCION FLUVIAL DE PUERTO INIRIDA	Solicitud de entrevista y suministro de información
CN-1915-2025-025	13/01/2026	CONCEP SAS	Sus comunicaciones II-871-L2-002-2026 Certificado de laboratorio y II-871-L2-001-2026 Solicitud complementación metodología de estudio de suelos.

Anexo 4 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 2.

LOTE 2			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
L2-001-2025	25/11/2025	sorcio Navegabilid	Hoja de Vida personal clave del contrato
Mail	2/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Certificación bancaria Lotes 1 - 6
Mail	5/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Solicitud remisión de Metodología y cronopgrama Lotes 1 - 6
L2-002-2025	12/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Hoja de Vida personal del contrato
L2-003-2025	16/12/2025	INVIAS	Autorización de desembolso anticipo contrato de Consultoria 1915-2025 L2
L2-004-2025	23/12/2025	sorcio Navegabilid	Hoja de Vida entrega preliminar personal del contrato Lote 2
Mail	23/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Segunda entrega Hojas de Vida personal
L2-005-2025	23/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN 1915-2025-007
Mail	24/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Documentos Contraloría
L2-006-2025	26/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Hojas de Vida
L2-007-2025	26/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN 1915-2025-008 Presentación metodología general y cronograma
Mail	30/12/2025	Consorcio Navegabilidad	Estudios anteriores, Lote 2
L2-001-2026	5/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Solicitud complementación Metodología de estudios de suelos Lotes 2
L2-002-2026	6/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Solicitud certificado laboratorio L2
L2-003-2026	6/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio II-871-L2-003-2026 Hojas de vida del contrato. Respuesta oficio CN-1915-2025-015
Mail	7/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Reunión especialista geotécnia L2 Contrato de Consultoria 1915-2025
L2-004-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Oficio L2-004-2026 respuesta CN-1915-2025-018 presentación hojas de vida
L2-005-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-010 soliciud suspensión L2
L2-006-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Revisión Hojas de vida personal clave - Lote 2
L2-007-2026	9/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-019 presentación hojas de vida L2
L2-008-2026	9/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-020 presentación hojas de vida Lote 2
L2-007-2026	13/01/2026	Consorcio Navegabilidad	Respuesta oficio CN-1915-2025-021, Lote 2

Lote 3

Anexo 5 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
MAIL	26/11/2025	COPIA MAIL A INVIAS	Remisión de Pólizas cto 1892 de 2025 - Lote 3 - Consorcio Vía Fluvial
MAIL	26/11/2025	CONCEP	Solicitud de información de contacto y canales formales de comunicación Interventoría del Contrato de Consultoría 1892 de 2025.
MAIL	27/11/2025	CONCEP	Solicitud de antecedentes y diagnósticos previos – Estudios y Diseños Fase II (Hitos I, II y III) - Lote 3
MAIL	29/11/2025	COPIA MAIL A INVIAS	Remisión de Pólizas cto 1892 de 2025 - Lote 3 - Consorcio Vía Fluvial
FLU3-CE-001-2025	1/12/2025	CONCEP	HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE
MAIL	5/12/2025	CONCEP	05-12-25 Gmail - CERTIFICACIÓN BANCARIA LOTES 1 AL 6 (info cert L3)
MAIL	16/12/2025	CONCEP	16-12-25 Gmail - Solicitud de ingreso - 1612-2025 INVIAS
FLU3-CE-002-2025	17-12-25 (22:30)	CONCEP	FLU3-CE-002-2025 - Solicitud Prorroga - Consorcio Vía Fluvial
MAIL	5/12/2025	CONCEP	Certificacion bancaria lotes 1 al 6
MAIL	18/12/2025	CONCEP	Re: LOTE 3 Y LOTE 6 Solicitud de certificados de cuentas bancarias anticipo
FLU3-CE-003-2025	18/12/2025	CONCEP	Solicitud anticipo CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1892 de 2025
FLU3-CE-004-2025	26/12/2025	CONCEP	Remision hojas de vida No. 02 - Personal Consorcio Via Fluvial
FLU3-CE-005	5/01/2026	CONCEP	Remisión Metodologias - Consoercio Via Fluvial
FLU3-CE-006	5/01/2026	CONCEP	Remisión Hojas de Vida No. 3 - Personal Consorcio Via Fluvial
FLU3-CE-007	13/01/2026	CONCEP	SU oficio II-871-L3-007-2026. Remisión Metodologías - Consorcio
FLU3-CE-008	14/01/2026	CONCEP	Cambio de representante legal - Consorcio Vía Fluvial
FLU3-CE-009	14/01/2026	CONCEP	Remisioón hojas de vida No. 04 - Personal consorcio Via Fluvial

Anexo 6 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 3.

CORRESPONDENCIA ENVIADA LOTE 3			
CONSECUTIVO No.	**FECHA**	**ENVIADO A:**	**CONCEPTO**
MAIL	26/11/2025	CONSULTOR	RESPUESTA 26-11-25 CONSULTOR Gmail - Solicitud de información de contacto y canales formales de comunicación Interventoría del Contrato de Consultoría 1892 de 2025
MAIL	28/11/2025	CONSULTOR CC INVIAS	RESPUESTA 28-11-2025 Solicitud de antecedentes y diagnósticos previos – Estudios y Diseños Fase II (Hitos I, II y III) - Lote 3
MAIL	28/11/2025	CONCEP - INVIAS	SOLICITUD INFORMACION LOTE 3
II-871-L3-001-2025	1/12/2025	CONSULTOR	Oficio II-871-L3-001-2025 Respuesta Oficio FLU3-CE-001-2025 - Remision hojas de vida
MAIL	02-012-25	CONSULTOR	CERTIFICACIÓN BANCARIA LOTES 1 AL 6
MAIL	5/12/2025	CONSULTOR	SOLICITUD DE REMISIÓN DE METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA LOTES 1 AL 6
II-871-L3-002-2025	5/12/2025	CONSULTOR	OFICIO II-871-L3-002-2025 contenido de la certificación bancaria
II-871-L3-003-2025	26/12/2025	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Hojas de vida
II-871-L3-004-2025	26/12/2025	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Metodologia y Cronograma
II-871-L3-005-2025	29/12/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Respuesta Oficio FLU3-CE-004-2025
II-871-L3-006-2025	29/12/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	II-871-L3-006-2025 Respuesta FLU3-CE-004-2025 - Remisión hojas de vida N°2 - Lote 3
MAIL	30/12/2025	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Enlace de acceso - Estudios anteriores LOTE 3
II-871-L3-001	6/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-001-2026 Solicitud de documentación Lote 3.
II-871-L3-002	6/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-002-2026 Solicitud Certificado Laboratorio LOTE 3.
II-871-L3-003	6/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Solicitud de informacion lote 3
II-871-L3-004	6/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	ficio II-871-L3-004-2026 Concepto hojas de vida personal del contrato - Respuesta oficio FLU3-CE-006-2025 Remisión hojas de vida. No 3 Lote 3
II-871-L3-005	7/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Solicitud informes semanales Lote 3
II-871-L3-006	8/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	oficio II-871-L3-006-2026 Remisión HV Personal Lote 3
II-871-L3-007	8/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Remisiín metodologias Lote 3
II-871-L3-008	14/01/2026	CONSORCIO VIA FLUVIAL	Oficio II-871-L3-008-2026 Respuesta oficio FLU3-CE-009-2026 Remisión hojas de vida No 4 LOTE 3

Lote 4

Anexo 7 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 4.

LOTE 4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
OFICIO No.	**FECHA**	**ENVIADO POR**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
SOLICITUD APERTURA CUENTA CONJUNTA	1/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Oficio – Solicitud de apertura de cuenta conjunta
MAIL	1/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco - Contrato y poliza
MAIL	3/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco - Poliza actualizada
MAIL	3/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	03-12-25 Gmail - Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- Hojas de Vida
MAIL	5/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- HV director de proyecto
MAIL	15/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	INVIAS	15-12-25 Gmail - Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- Póliza
MAIL	15/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- Cronograma
MAIL	16/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- Poliza y Imágenes secop
MAIL	16/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco- Poliza firmada
MAIL	16/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 - contrato 1882 - Muelle Chocó -Certificado Bancario
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	18-12-25 Gmail - Lote No 4 - contrato 1882 - Muelle Chocó- Anticipo
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	18-12-25 Gmail - Correcciones – Plan de inversión de anticipo y autorización de desembolso
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	18-12-25 Gmail - Lote no 4 CTO 1882 - muelles Chocó - Prórroga
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	18-12-25 Gmail - ANTICIPO CTO 1882-2025 TORRES Y ASOCIADOS S.A.S NIT 829.000.727-3 CDP 124725 VALOR 681.132.721
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	18-12-25 Gmail - Re: ANTICIPO CTO 1882-2025 TORRES Y ASOCIADOS S.A.S NIT 829.000.727-3 CDP 124725 VALOR 681.132.721
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote N° 4 - Contrato 1882 -muelle choco - con centavos
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Lote No. 4 - contrato 1882 - Muelle Chocó-Autorización de desembolso y cuenta bancaria
MAIL	19/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	RV: Contrato 1882 de 2025 LOTE 4 - Oficio II-871-L4-009-2026 INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL LOTE 4
CST -INV-001	20/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	oficio CST -INV-001 oficio solicitud de prórroga V1
CST -INV-001	20/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	oficio CST -INV-001 oficio solicitud de prórroga V2
MAIL	20-102-25	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	20-12-25 Gmail - Lote nº 4 - Contrato 1882 - Muelle Choco- certificados
CST -INV-002	23/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	CST- INV – 002 pólizas Actualizadas
CST -INV-003	26/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – 003 Entrega Planes de Trabajo por Volúmenes y Cronograma del Contrato
MAIL	29/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Gmail - Contrato 1882 de 2025 Lote 4 - Oficio II-871-L4-0013-2026 Solicitud anticipo contrato 18982-2025. Lote 4
CST -INV-005	30/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	CST- INV – 005 Pólizas Actualizadas Prorroga
CST -INV-006	6/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Oficio CST- INV – CST-INV-006 Programa Preliminar de Inversiones
CST -INV-007	8/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Certificado ONAC – AMCIS
CST -INV-008	8/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Remision hojas de vida
CST -INV-009	13/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Remisión de metodologías pendientes
CST- INV – 0010	13/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	CONCEP SAS	Ficha técnica (papel)

Anexo 8 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 4.

LOTE 4			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO POR**	**CONCEPTO**
MAIL	1/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Apertura cuenta conjunta
MAIL	2/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Certificación bancaria lotes 1 al 6
II-871-L4-001	4/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Concepto hojas de vida personal clave
II-871-L4-002	5/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Concepto hoja de vida director del proyecto
MAIL	3/12/2025	INVIAS	Lote No. 4 muelles Unguiá y Pavasá Choco - Poliza actualizada
MAIL	5/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	SOLICITUD DE REMISION DE METODOLOGIA Y CRONOGRAMA LOTES 1 AL 6
MAIL	17/02/2025	INVIAS	Lote No 4-Contrato 1882 - Póliza del consultor
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Lote 4 CTO 1882 - muelles choco - prorroga
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Re: ANTICIPO CTO 1882-2025 TORRES Y ASOCIADOS S.A.S NIT 829.000.727-3 CDP 124725 VALOR 681.132.721
MAIL	18/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Re: ANTICIPO CTO 1882-2025 TORRES Y ASOCIADOS S.A.S NIT 829.000.727-3 CDP 124725 VALOR 681.132.721
MAIL	19/12/2025	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Lote no 4 CTO 1882 - muelles choco - prorroga
II-871-L4-003	19/12/2025	INVIAS	Prorroga por 6.0 meses lote 4
II-871-L4-004	26/12/2025	TORRES Y	Hojas de vida
II-871-L4-001	6/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Solicitud documentación Lote 4
II-871-L4-002	6/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Solicitud Certificado Laboratorio LOTE 4
II-871-L4-003	6/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Solicitud certificación Lote 4
II-871-L4-004	7/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Solicitud Informes semanales Lote 4
II-871-L4-005	8/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Remisión Hojas de Vida Personal Lote 4
II-871-L4-006	8/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Remisión metodologías Lote 4
II-871-L4-007	8/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Respues oficio CST-INV-006 Lote 4
II-871-L4-008	9/01/2026	TORRES Y ASOCIADOS SAS	Oficio II-871-L4-008-2026 Respuesta oficio CST-INV-008 Remisión hojas de vida LOTE 4.
MAIL	10/01/2026	CONCEP - INVIAS	Formato formato ACPA-FR-2 ajustado

Lote 5

Anexo 9 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
CNP-573-001-5072	27/11/2025	CONCEP SAS	Presentacion HV personal
MAIL	27/11/2025	CONCEP SAS	CTA MANEJO DE ANTICIPO - FIRMA DEL INTERVENTOR
CNP-573-002-5344	12/12/2025	CONCEP SAS	Solicitud desembolso anticipo
CNP-573-003-5110	1/12/2025	CONCEP SAS	Espuesta a su comunicado II-871-001-2025- HV director
CNP-573-004			
CNP-573-005-5372	17/12/2025	CONCEP SAS	Solicitus prórroga al plazo contractual y constitucion de reserva presupuestal - Contrato 1957 de 2025
CNP-573-006-5428	18/12/2025	INVIAS	Remision pololiza y cargue de poliza
CNP-573-008	23/12/2025	CONCEP SAS	Alcance a oficio CINP-573-007-5457 - Especialista en redes secas
CNP-573-009	23/12/2025	CONCEP SAS	CINP–573–009–5497 - Metodología general, específicas y cronograma
MAIL	29/12/2025	CONCEP SAS	Lote 5 / Ajuste de metodología V - ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
CNP-573-010-5524	29/12/2025	INVIAS	CINP–573–010–5524 - Poliza de cumplimiento actualizada Prorroga 1
CINP–573–014–0014	5/01/2026	CONCEP SAS	Plan de calidad
CNP-573-015-0020	6/01/2026	CONCEP SAS	Certificados Laboratorios
CNP-573-016-0021	6/01/2026	CONCEP SAS	Ficha tecnica de papel
CNP-573-017	9/01/2026	CONCEP SAS	Informes semanales
CNP-573-018	9/01/2026	CONCEP SAS	Programa de inversiones y programa de actas
CNP-573-019	9/01/2026	CONCEP SAS	Diagnostico preliminar
CNP-573-020	15/01/2026	CONCEP SAS	Cambio – Ing. Auxiliar de la zona.

Anexo 10 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 5.

LOTE 5			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	**FECHA**	**RECIBIDO**	**CONCEPTO**
II-871-L5-001-2025	27/11/2025	CONSORCIO MNF	Oficio II-855-L5-001-2025 Respuesta oficio CINP-573-001-5072 presentacion de HV personal
MAIL	27/11/2025	CONSORCIO MNF	27-11-25 Gmail - SOLICITUD DOCUMENTACION
II-871-L5-002-2025	01/12/2025	CONSORCIO MNF	DOCUMENTOS INTERVENTORIA APARTURA DE CUENTA
II-871-L5-003-2026	02/12/2025	CONSORCIO MNF	II-871-L5-003-2025 Respuesta oficio CINP–573–003–5110
MAIL	05/12/2025	CONSORCIO MNF	SOLICITUD DE REMISIÓN DE METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA LOTES 1 AL 6
II-871-L5-004-2025	12/12/2025	CONSORCIO MNF	Oficio II-871-L5-004-2025 Hojas de vida personal del contrato
II-871-L5-005-2025	16/12/2025	INVIAS	Autorización desembolso anticipocontrato de cosnultoría 1957-2025 L5
II-871-L5-006-2025	17/12/2025	CONSORCIO MNF	hojas de vida personal del contrato
II-871-L5-007-2025	19/12/2025	INVIAS	Prorroga por 4,0 meses Lote 5
II-871-L5-008-2025	22/12/2025	CONSORCIO MNF	Respuesta Oficio CINP-573-007-5457
II-871-L5-009-2025	23/12/2025	CONSORCIO MNF	Respuesta Oficio CINP-573-008-5465
II-871-L5-010-2025	26/12/2025	CONSORCIO MNF	Respuesta oficio CINP-573-009-5497
II-871-L5-001	06/01/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud de documentos lote 5
II-871-L5-002	06/01/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud certificado laboratorio
II-871-L5-003	06/01/2026	CONSORCIO MNF	Solicitus certificacion Lote 5
II-871-L5-004	07/01/2026	CONSORCIO MNF	Solicitud informes semanales lote 5

Lote 6

Anexo 11 Relación de correspondencia recibida de consultoría. Lote 6.

RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ENVIADO POR:**	**CONCEPTO**
OF-25C08-CONS-0003-2025	31/12/2025	Consorcio Navegabilidad Projesy	Respuesta oficio II-871-L6-004-2025 del 26 de diciembre de 2025
OF-25C08-CONS-0004-2025	7/01/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Respuesta oficio II-871-L6-003-2026
OF-25C08-CONS-0005-2025	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Subsanación HV Topógrafo, entrega HV parte II y Metodología
OF-25C08-CONS-0006-2025	9/01/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Subsanación observaciones relacionadas con el oficio II-871-L6-008-2026 y entrega adicional de HV y Metodología
OF-25C08-CONS-0007-2025	15/01/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Subsanación observaciones HV relacionadas con el oficio II-871-L6-009-2026 y entrega de Metodología, plan de inversión y ficha técnica del papel.
OF-25C08-CONS-0008-2025	15/01/2026	Consorcio Navegabilidad Projesy	Cambio de Ingeniero Auxiliar

Anexo 12 Relación de correspondencia enviada para consultoría. Lote 6.

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO A:	CONCEPTO
L6-001-2025	28/11/2025	Consorcio Navegabilidad P	Hoja de Vida personal clave del contrato
L6-002-2025	5/12/2025	Consorcio Navegabilidad P	Respuesta oficio TOL-001-2025
L6-003-2025	12/12/2025	Consorcio Navegabilidad P	Contenido de la certificación bancaria
L6-004-2025	26/12/2025	Consorcio Navegabilidad P	Hojas de Vida
L6-005-2025	26/12/2025	Consorcio Navegabilidad P	Solicitud de presentación metodología general y cronograma
L6-006-2025	5/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0003-2025 del 31 de diciembre de 2025 Lote 6.
L6-001-2026	6/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Solicitud de documentación Lote 6
L6-002-2026	6/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Solicitud certificado laboratorio Lote 6
L6-003-2026	6/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Solicitud certificación Lote 6
L6-004-2026	7/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Solicitud informes semanales Lote 6
L6-005-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0004-2025 Lote 6.
L6-006-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Remisión hojas de vida personal Lote 6
L6-007-2026	8/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Remisión Metodología Lote 6
L6-008-2026	9/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0005-2025 Subsanación HV Topográfo, entrega HV parte II. Lote 6.
L6-009-2026	13/01/2026	Consorcio Navegabilidad P	Respuesta oficio OF-25C08-CONS-0006-25 Subsanación observaciones relacionadas en oficio II_871-L6-008-2026 yentega adicional HV Lote 6.
