
ACTA DE AVANCE No. 1

SAMC-OP-004-2026



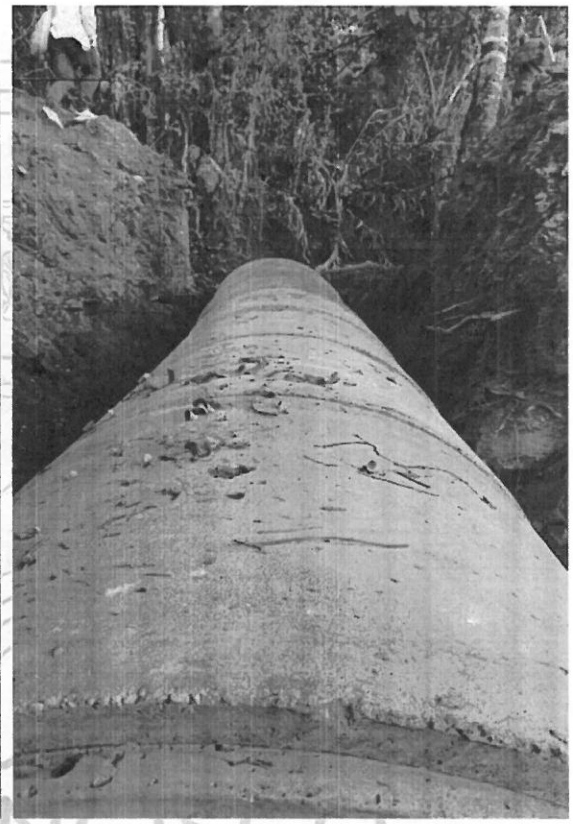

SAN FRANCISCO


MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE-MURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA:	DHE INGENIERÍA S.A.S NIT 901.394.545-0 R/L JHON HEMERSON MENDEZ NAVARRO C.C. 1.0106.781.795 CHAPARRAL TOLIMA		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTEMURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA		
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 79.529.982,00) M/CTE.		
CDP INICIAL	DIS-2026000163 y DIS-2026000189 del 14 de abril de 2026	RP	RES – 2026000292 de 28 mayo de 2026
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE MAYO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	2 DE JUNIO DE 2026		
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
VENCIMIENTO INICIAL	01 DE AGOSTO DE 2026		
PRORROGA PLAZO	UN (01) MES		
PLAZO FINAL	CUATRO (04) MESES		
VENCIMIENTO FINAL	1 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DEL MODIFICATORIO	31 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE INFORME	19 DE AGOSTO DE 2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE LA OBRA

Ítem 1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

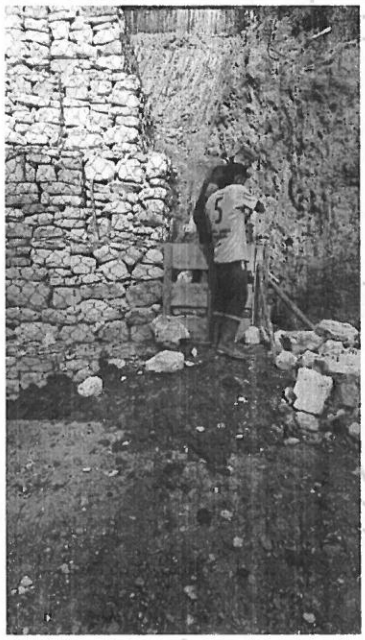




Ítem 2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)




Ítem 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)




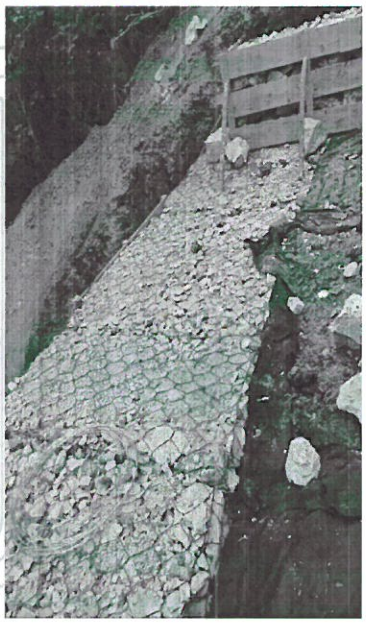


Ítem 4	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES







Ítem 5	GAVIÓN MALLA PVC

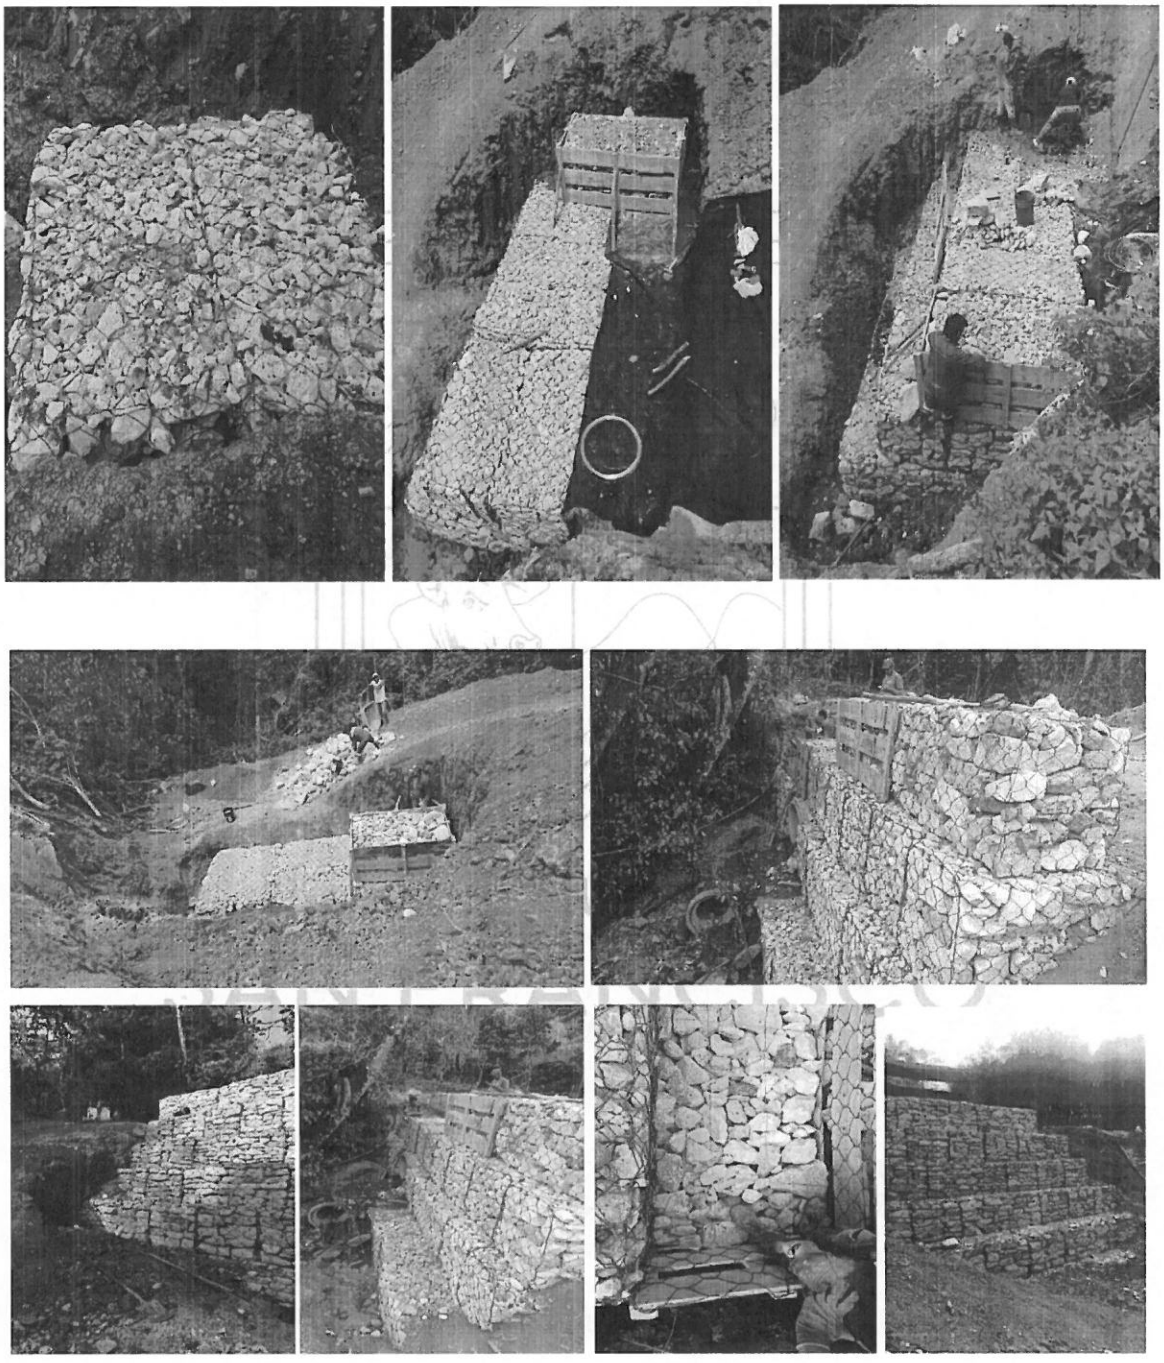

Ítem 6	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

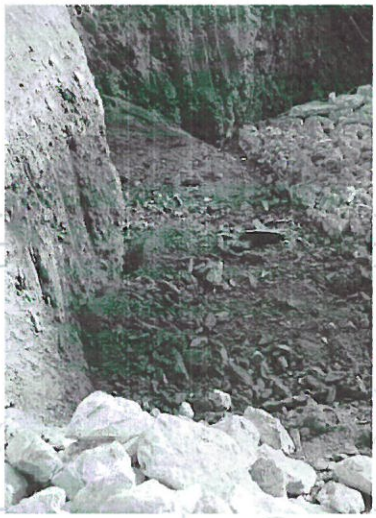
Ítem 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA

FORMULARIO 1

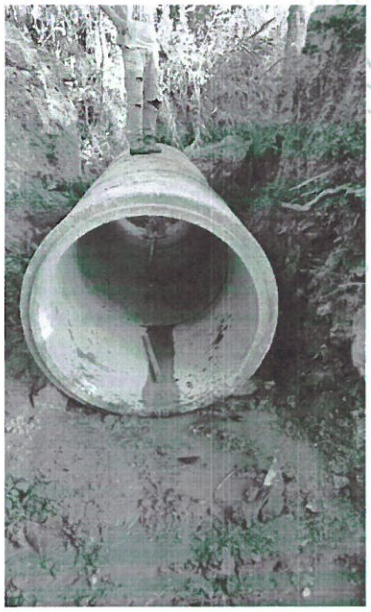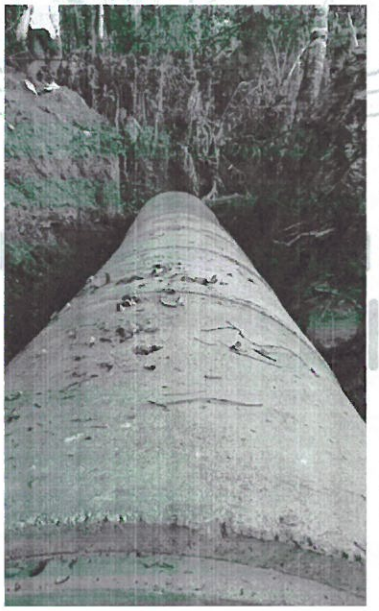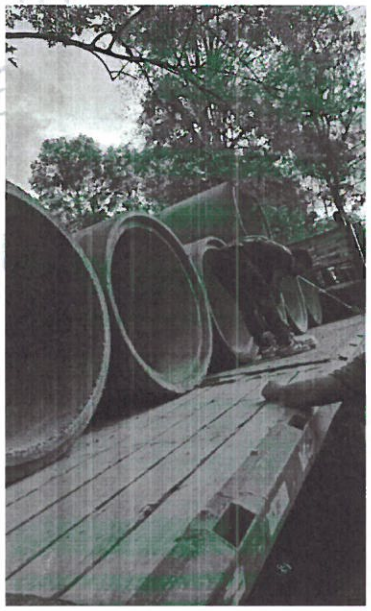PRESUPUESTO ADICION

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTE-MURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	2,13	INV 600	600.4P - 07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,00	$ 93.353,00	$ 3.920.826,00
2	16,2	N/A	N/A	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	120,00	$ 28.464,00	$ 3.415.680,00
3	4,42	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	42,00	$ 17.278,00	$ 725.676,00
4	4,24	INV 630.6-07	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	4,22	$ 766.561,00	$ 3.234.887,00
5	4,32	INV 681.1P-07	681.1P-07	GAVIÓN MALLA PVC	M3	133,09	$ 409.661,00	$ 54.521.782,00
6	16,8	N/A	N/A	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	42,00	$ 122.627,00	$ 5.150.334,00
7	4,48	INV 661.1-07	661.1-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7,00	$ 1.222.971,00	$ 8.560.797,00
							Subtotal	$ 79.529.982,00

	SUBTOTAL OBRAS	**$ 79.529.982,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 79.529.982,00**
AJUSTE		$ -
VALOR TOTAL		**$ 79.529.982,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

En cumplimiento de las labores de supervisión del contrato de obra cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS (CONSISTENTE EN OBRAS DE ARTEMURO EN GAVIÓN), EN LA VEREDA EL PEÑÓN SECTORES UNIGAS Y SANTAMARÍA Y VEREDA TORIBA SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA**, se deja constancia de que, a la fecha, se recibe un avance de obra equivalente al NOVENTA Y UNO PUNTO SESENTA Y TRES PORCIENTO (91.63%), el cual cumple con los requisitos técnicos, financieros y administrativos mínimos establecidos en el contrato y en los convenios interadministrativos mencionados.

El avance recibido corresponde a las actividades programadas dentro del cronograma vigente y ha sido verificado conforme a las especificaciones técnicas, las cantidades de obra ejecutadas y los procedimientos establecidos para la revisión documental y física del proyecto.

FACTURACION

Se realizo una factura parcial por el valor de acuerdo con avance de obra y forma de pago correspondiente al 91.63% del 100% del presupuesto oficial.

SEBASTIAN RODRIGUEZ OVALLOS
Secretario de planeación y desarrollo territorial

Proyecto: Paola Alexandra prieto Rodríguez – apoyo técnico SPDT.
