Villavicencio, 21/07/2026

Doctora:
ALBA AURORA COLINA
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: ORDEN DE SERVICIO N° 006 DEL 16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO N°. 2141 DE 14 DE MAYO DE 2026, N°. DEL PROCESO EN SECOP 2144-2026,
PERIODO No. 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE JULIO DE 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	ORDEN DE SERVICIO N°006 DEL 16 DE ABRIL DE 2026. CONTRATO 2141 DE 14 DE MAYO DE 2026.
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEYAN S.A R/L BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT:800143586-1 C.C.70119730
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION, SECTOR PORFIA, RIO OCOA Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCION, MITIGACION, DESCOLMATACION EN LOS DIFRERENTES PUNTOS CRITICOS AFECTADOS PRO LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ C.C.17.326.435 de Villavicencio.
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	14/05/2026
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SEISCIENTOS OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($608.024.149,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.
FECHA DE INICIO:	16/04/2026 ORDEN DE SERVICIO 06 26/05/2026 ACTA DE INICIO LEGALIZACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2026 ORDEN DE SERVICIO 06 25/07/2026 SEGÚN ACTA DE INICIO LEGALIZACION

	15/07/2026 SEGÚN VIGENCIA PRORROGA 01 ORDEN DE SERVICIO 06 24/08/2026 SEGÚN VIGENCIA PRORROGA 02 ORDEN DE SERVICIO 06		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS 01	30 DIAS	FECHA:	12/06/2026
PRORROGAS 02	30 DIAS	FECHA:	14//07/2026
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	131 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO 06		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	24/08/2026		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 14/05/2026, notificado personalmente con fecha 14/05/2026 y en plataforma SECOP II se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO N° 01 del 16/04/2026 al 02/07/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   El contrato se suscribió inicialmente por un valor de **$608.024.149** Al corte del Informe N°01 se presenta el (17 de julio de 2026), se reportó una ejecución del **57,95%,** equivalente a **$352.348.920.** En dicho momento, restaba por ejecutar el **42,05%** del presupuesto original, correspondiente a el saldo **$ 255.675.229.**

Las cantidades contractuales del contrato 2141-2026 son las que se relaciona en la siguiente tabla.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	10	189	$ 40.426	$ 7.640.514
1.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DISEL	DIA	10	$ 286.850	$ 2.868.500
1.3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	800	$ 367.950	$ 294.360.000
1.4	CONSTRUCCION DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARTISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	420	$ 362.600	$ 152.292.000
				SUBTOTAL	**$ 457.161.014**
				AIU 33%	**$ 150.863.135**
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	**$ 608.024.149**

TABLA 1. Descripción tabla de cantidades del contrato N° 2141-2026

Las cantidades ejecutadas en el presente periodo N°01 del 16 de abril de 2026 al 02 de julio de 2026 en la siguiente tabla.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0	$ 40.426	$ 0
1.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DISEL	DIA	0	$ 286.850	$ 0
1.3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	720	$ 367.950	$ 264.924.000
1.4	CONSTRUCCION DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARTISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	0	$ 362.600	$ 0
				SUBTOTAL	**$ 264.924.000**
				AIU 33%	**$ 87.424.920**
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	**$ 352.348.920**

TABLA 2. Descripción tabla de cantidades ejecutadas en el periodo N°1 del (16/04/2026 al 02/07/2026).

ACTIVIDAD No. 01 COMPRENDE EL ÍTEM NO. 1.3 CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	720	$ 367.950	$ 264.924.000
				SUBTOTAL	**$ 264.924.000**
				AIU 33%	**$ 87.424.920**
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	**$ 352.348.920**

TABLA 3. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado.

La cantidad de horas operativas ejecutadas durante el periodo N°1 se distribuyó de manera estratégica en diversos sectores críticos del municipio de Villavicencio. Estas intervenciones con la maquinaria tipo excavadora orugada 20T fueron coordinadas por la Oficina de Gestión del Riesgo, obedecieron a la matriz de priorización orientada a la mitigación de amenazas hidroclimatológicas y a la protección de comunidades e infraestructura de servicios.

La primera intervención que se priorizo la subcuenca del rio Guatiquia y su afluente, la quebrada Honda. Tomando en cuenta que las intervenciones se realizaron desde unos metros antes del puente de tarabita que es el que conecta las comunidades de la vereda puente Abadía y San Cristóbal hasta la garganta de la bocatoma quebrada honda, se de mencionar el rio Guatiquia actúa como el eje dinámico principal que divide geográficamente el municipio Villavicencio y presenta un comportamiento torrencial severo en épocas de altas precipitaciones. Las obras de control fluvial ejecutadas en este sector fueron determinantes para salvaguardar la infraestructura de captación y conducción del sistema de acueducto

municipal, previniendo fallas estructurales o socavaciones en la bocatoma ante futuros eventos de avenida torrencial.

La segunda intervención que se priorizo fueron la consolidados urbanamente dentro de la cuenca del río Ocoa y el caño Unión. El río Ocoa, que atraviesa la zona urbana del municipio de Villavicencio, genera dinámicas de desbordamiento complejas debido a procesos de colmatación y restricciones de flujo en su llanura de inundación. Teniendo en cuenta lo dicho se atendieron cuatro sectores de los cuales tres esta sobre el rio Ocoa el primero la Peña, la Playita y el puente la Calle 49 Porfía y el otro sector fue san Cipriano en el ultimo mediante trabajos con la comunidad de san Cipriano se desarrollaron trabajos conjuntos para realizar obra mitigación mas largo plazo fueron la construcción de tres espolones conformados por gaviones cumpliendo todo los lineamentos y se llego a iniciar las actividades necesarias para la construcción de los gaviones conformar el espolón está dentro el contrato N° 2141-2026 en el sector de la playita.

El análisis morfológico identificó que, durante los picos de creciente del río Ocoa, se presenta un fenómeno de remanso hidráulico que represa e incrementa los niveles del caño Unión, provocando su desbordamiento e inundando los asentamientos aledaños como se presentó hace muchos años. Las intervenciones mecánicas permitieron optimizar la sección transversal y el gradiente hidráulico de estos cuerpos de agua para minimizar el riesgo de inundación por reflujo.

En la siguiente tabla se puede ver con mayor grado de detalle como se realizaron las intervenciones cuantas horas se usaron por cada sector teniendo en cuenta un orden de intervención que el (1,2) fueron los lugares intervenidos por una máquina tipo excavadora orugada 20T la cual es la Kobelco N°1 y los otros sectores fueron intervenidos por el orden (3,4,5, 6) fueron ejecutados por maquina tipo excavadora orugada 20T la cual es la Kobelco N°2

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANTES DEL PUENTE TARABITA HASTA EL DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA - RIO GUATIQUIA	HR	303,30	$ 367.950	$ 111.599.235
2	DESDE LA DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA HASTA LA GARGANTA DE BOCATOMA DE QUEBRADA HONDA- QUEBRADA HONDA	HR	54,60	$ 367.950	$ 20.090.070
3	LA PEÑA - RIO OCOA	HR	204,70	$ 367.950	$ 75.319.365
4	SAN CIPRIANO HASTA LA DESEMBOCADURA AL RIO OCOA - CAÑO UNIÓN	HR	66,20	$ 367.950	$ 24.358.290
5	LA PLAYITA - RIO OCOA	HR	56,30	$ 367.950	$ 20.715.585
6	EL PUENTE LA CALLE 49 DE PORFÍA - RIO OCOA	HR	34,90	$ 367.950	$ 12.841.455
				SUBTOTAL	**$ 264.924.000**
				AIU 33%	**$ 87.424.920**
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	**$ 352.348.920**

TABLA 4. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por sectores un orden de intervenciones.

Las intervenciones se dividieron en dos máquinas de la marca Kobelco esto porque una maquina realizo la intervención de la fuente hídrica del rio Guatiquia y quebrada Honda las cuales estaba en la misma zona por lo difícil de la zona era lo mas viable y la otra maquina realizo las intervenciones de la fuente

hídrica del rio Ocoa y el caño Unión por la cercanía en cada sector las condiciones logísticas también fueron más exigentes con la máquina del rio Guatiquia que la máquina del rio Ocoa.

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANTES DEL PUENTE TARABITA HASTA EL DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA - RIO GUATIQUIA	HR	303,30	$ 367.950	$ 111.599.235

TABLA 5. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden primer sector.

1. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO ANTES DEL PUENTE TARABITA HASTA EL DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA - RIO GUATIQUIA



Fotografía 1	Imagen satelital Google earth. Vista la zona en general a intervenida en canalización en el rio Guatiquia sector antes del puente tarabita hasta la desembocadura de quebrada honda al rio Guatiquia.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició aguas abajo del puente La Tarabita (estructura de conectividad entre las veredas Puente Abadía y San Cristóbal), extendiéndose de manera continua aguas arriba hasta alcanzar la desembocadura de la quebrada Honda con el río Guatiquía. El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 3.891 metros lineales.

El plan que se contempló fue realizar actividades secuenciales de descolmatación, rectificación y canalización de la sección transversal del río Guatiquía. El volumen de material aluvial removido durante la excavación se clasificó y reutilizó in situ para la conformación y compactación de jarillones de protección lateral. Estas estructuras de tierra fueron técnicamente estratégicas en dos frentes: primero, dotaron de estabilidad margen en el sector, garantizando una barrera segura y el respaldo contra el talud de las montañas dejar un espacio para usar una vía de acceso estable para el tránsito de vehículos de apoyo y el abastecimiento logístico de combustible de la maquinaria tipo excavadora orugada 20T; segundo, permitieron obra de mitigación siendo la principal objetivo el poder crear un canal que no cauce riesgo por donde pasa el viaducto.

El objetivo prioritario de la estabilización marginal y la canalización fue el confinamiento y protección del viaducto del acueducto municipal. Se ejecutaron labores de cobertura y enterramiento de la línea de conducción que se encontraba expuesta a la intemperie. Ingenierilmente, es imperativo mantener dicha tubería confinada bajo una capa de material de filtro y protección; esto evita que, durante los eventos de avenidas torrenciales, el arrastre de sedimentos gruesos, bloques y rocas de gran tamaño impacte de forma directa la estructura del viaducto, mitigando el riesgo de falla por impacto dinámico o cizallamiento.

Es importante constatar que el rendimiento de la maquinaria y el cronograma de ejecución se vieron afectados por la fuerte dinámica hidroclimatológicas de la zona. Las precipitaciones atípicas registradas durante el periodo constructivo generaron picos de creciente súbitos que erosionaron y destruyeron tramos de Jarillón y canalización ya concluidos.

Dichas intervenciones se iniciaron el día viernes 17 de abril del 2026 se culminaron el viernes 29 de mayo del 2026 en el sector ya descrito se ejecuto un total de 303,30 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
ANTES DEL PUENTE TARABITA HASTA EL DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA - RIO GUATIQUIA				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	3.891 m	2,5 m	10 m	97.275 m3

TABLA 6. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el rio Guatiquia realizando un total de volumen movido en la canalización de 97.275 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 9 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	3.891 m	97.275 m3	38 días	2.559,9 m3	284,42 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

TABLA 7. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 38 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 38 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica del río Guatiquia, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4°14'29.90"N	73°38'40.06"O
	COORDENADA FINAL	4°16'20.29"N	73°39'19.44"O

TABLA 8. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en el rio Guatiquia.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.



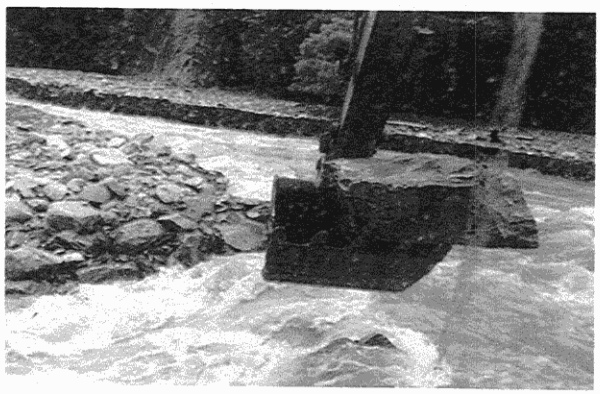
Fotografía 2

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de acceso) necesario para iniciar a realizar la actividad de canalización y descolmatación.



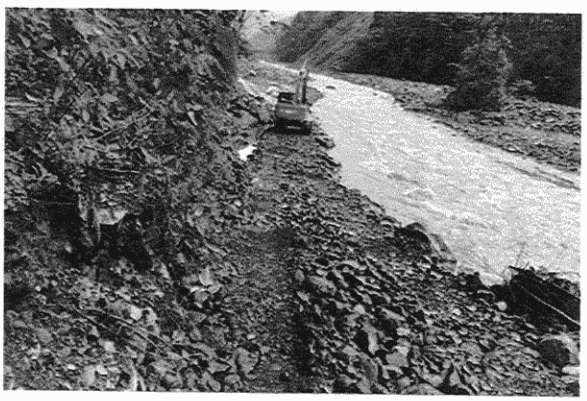
Fotografía 3

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de acceso) necesario para iniciar a realizar la actividad de canalización y descolmatación.



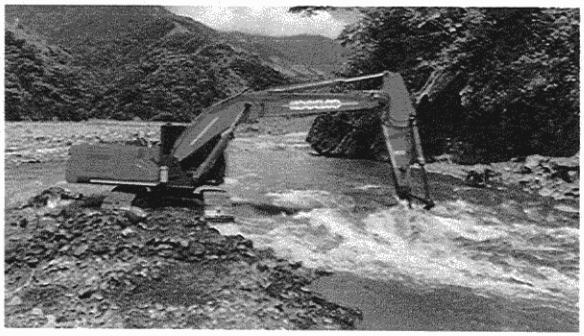
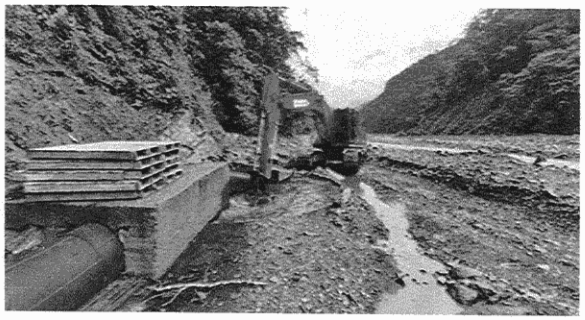
Fotografía 4

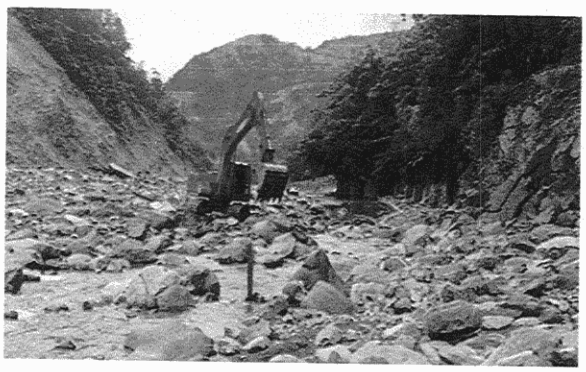
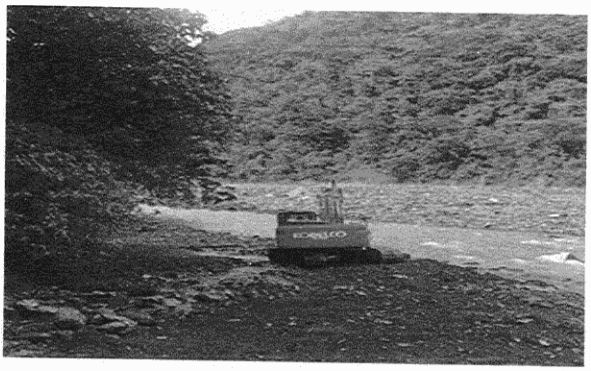
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)



Fotografía 5

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

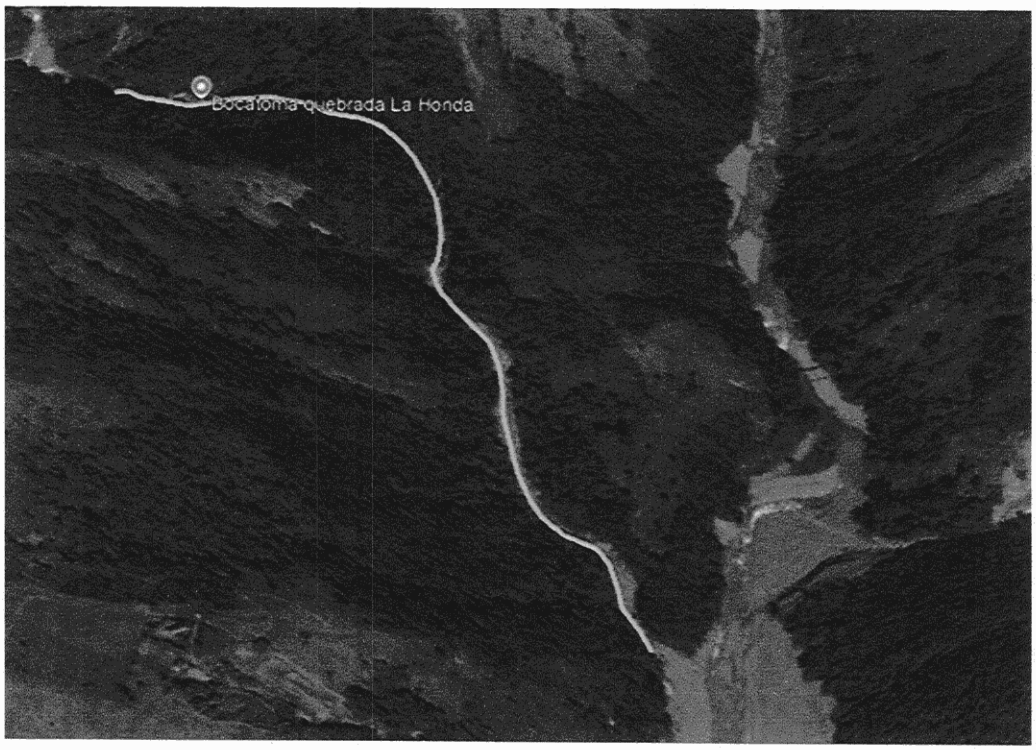
	
Fotografía 6	**Fotografía 7**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)
	
Fotografía 8	**Fotografía 9**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)
	
Fotografía 10	**Fotografía 11**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

	
Fotografía 12	**Fotografía 13**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)
	
Fotografía 14	**Fotografía 15**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DESDE LA DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA HASTA LA GARGANTA DE BOCATOMA DE QUEBRADA HONDA- QUEBRADA HONDA	HR	54,60	$ 367.950	$ 20.090.070

TABLA 9. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden segundo sector.

2. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO DESDE LA DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA HASTA LA GARGANTA DE BOCATOMA DE QUEBRADA HONDA- QUEBRADA HONDA.



Fotografía 16	Imagen satelital Google earth. Vista la zona en general a intervenida en canalización en el rio Guatiquia sector desde la desembocadura de quebrada honda al rio Guatiquia hasta la garganta de bocatoma de quebrada honda- quebrada honda.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició desde la desembocadura de quebrada honda al rio Guatiquia hasta la garganta de bocatoma de quebrada honda-quebrada honda. El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 1.277 metros lineales.

El plan que se contempló fue realizar actividades secuenciales de descolmatación, rectificación y canalización de la sección transversal de la quebrada honda. El volumen de material aluvial removido durante la excavación se clasificó y reutilizó in situ para la conformación y compactación de jarillones de protección lateral.

El objetivo prioritario de la estabilización marginal y la canalización fue el confinamiento y protección del viaducto del acueducto municipal. Se ejecutaron labores de estabilización de la garganta de la bocatoma y el talud de los cimientos los soportes del viaducto son de vital importancia para la estabilidad de la estructura.

Dichas intervenciones se iniciaron el día sábado 30 de mayo del 2026 se culminaron el viernes 05 de junio del 2026 en el sector ya descrito se ejecutó un total de 54,60 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
DESDE LA DESEMBOCADURA DE QUEBRADA HONDA AL RIO GUATIQUIA HASTA LA GARGANTA DE BOCATOMA DE QUEBRADA HONDA- QUEBRADA HONDA.				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	1.277 m	2,0 m	4 m	10.216 m3

TABLA 10. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el rio Guatiquia realizando un total de volumen movido en la canalización de 10.216 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 9 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	1.277 m	10.216 m3	6 días	1.702,67 m3	189,19 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

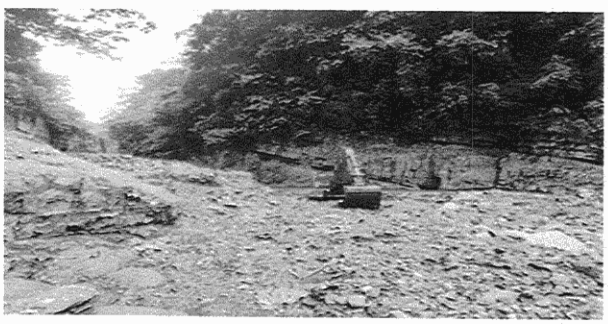
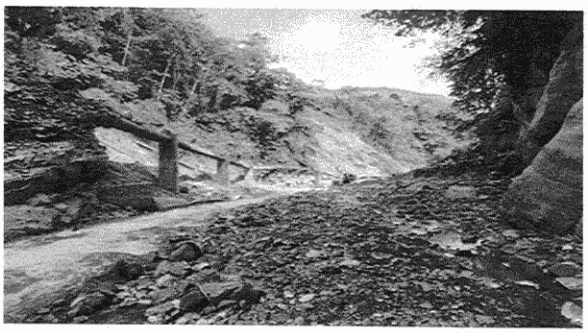
TABLA 11. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 6 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 6 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica de la quebrada honda, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

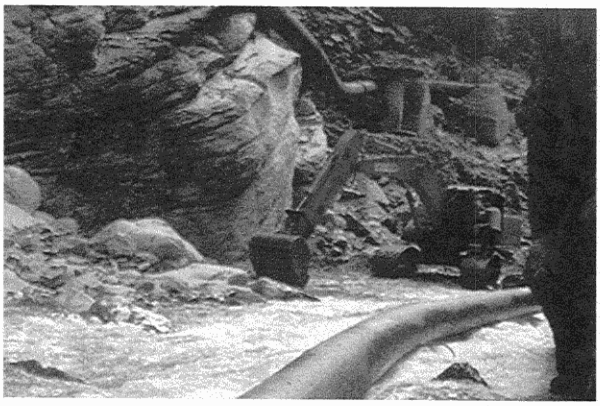
DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4°16'20.52"N	73°39'19.79"O
	COORDENADA FINAL	4°16'45.24"N	73°39'47.76"O

TABLA 12. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en la quebrada Honda.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.

	
Fotografía 17	**Fotografía 18**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

	
Fotografía 19	**Fotografía 20**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

	
Fotografía 21	**Fotografía 22**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Guatiquia, creación de Jarillón)

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	LA PEÑA - RIO OCOA	HR	204,70	$ 367.950	$ 75.319.365

TABLA 13. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden tercer sector.

3. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO LA PEÑA - RIO OCOA



Fotografía 23	imagen satelital Google earth. vista la zona en general a intervenida en canalización en el rio Ocoa en el sector la Peña.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició desde la parte alta de la peña hasta el cruce de la desembocadura del caño unió al rio Ocoa El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 830 metros lineales.

El plan que se contempló fue realizar actividades secuenciales de descolmatación, rectificación y canalización de la sección transversal retomar el cauce histórico el cual está muy colmatado se tuvo restablecer para controlar la morfología que se arrecostado al costado izquierdo aguas abajo. El volumen de material aluvial removido durante la excavación se clasificó y reutilizó in situ para la conformación y compactación de jarillones de protección lateral. Para proteger a la población de La Peña, el proyecto plantea como objetivo prioritario la estabilización morfológica del río Ocoa. Esto se logrará mediante un canal de direccionamiento del cauce que prevenga la socavación de la margen izquierda durante los periodos de altas crecientes.

Dichas intervenciones se iniciaron el día lunes 20 de abril del 2026 se culminaron el lunes 18 de mayo del 2026 en el sector ya descrito se ejecutó un total de 204,70 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
LA PEÑA - RIO OCOA				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	830 m	2,5 m	12 m	24.900 m3

TABLA 14. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el rio Ocoa realizando un total de volumen movido en la canalización de 24.900 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 8 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	830 m	24.900 m3	23 días	1.082,61 m3	135,33 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

TABLA 15. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 23 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 23 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica del rio Ocoa, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4° 4'32.26"N	73°41'16.33"O
	COORDENADA FINAL	4° 4'36.91"N	73°40'52.18"O

TABLA 16. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en el rio Ocoa.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.



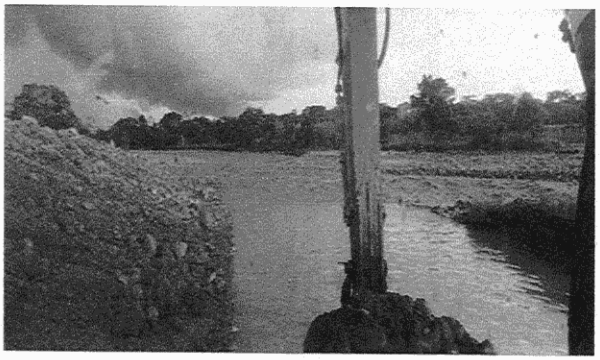
Fotografía 24

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

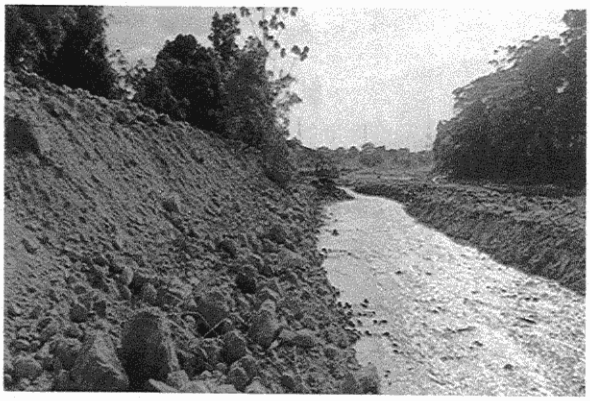


Fotografía 25

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 26	**Fotografía 27**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)
	
Fotografía 28	**Fotografía 29**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)
	
Fotografía 30	**Fotografía 31**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 32	**Fotografía 33**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 34	**Fotografía 35**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	SAN CIPRIANO HASTA LA DESEMBOCADURA AL RIO OCOA - CAÑO UNIÓN	HR	66,20	$ 367.950	$ 24.358.290

TABLA 13. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden el cuarto sector.

4. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO SAN CIPRIANO HASTA LA DESEMBOCADURA AL RIO OCOA - CAÑO UNIÓN



Fotografía 36	imagen satelital Google earth. vista la zona en general a intervenida en canalización en el caño unión en el sector San Cipriano hasta la desembocadura al rio Ocoa.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició desde la parte alta del caño unión san Cipriano hasta el cruce de la desembocadura del caño unió al rio Ocoa unos metros más adelante El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 540 metros lineales.

El plan contemplado consistió en ejecutar actividades secuenciales de descolmatación, rectificación y canalización de la sección transversal, con el fin de centrar el cauce y recuperar la capacidad hidráulica del caño Unión (sección de la Imagen 36). Esta intervención sirve de apoyo a las obras de mitigación que la Oficina de Gestión del Riesgo desarrolla en la zona. Específicamente, el material extraído se utilizó como relleno entre los espolones de gaviones previamente construidos, consolidando una barrera de mitigación eficiente para prevenir las afectaciones a la población registradas durante las crecientes de años anteriores.

Dichas intervenciones se iniciaron el día miércoles 20 de mayo del 2026 se culminaron el sábado 13 de junio del 2026 en el sector ya descrito se ejecutó un total de 66,20 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
SAN CIPRIANO – CAÑO UNIÓN				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	540 m	2,5 m	10 m	10.800 m3

TABLA 14. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el caño unión realizando un total de volumen movido en la canalización de 10.800 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 4 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	540 m	10.800 m3	18 días	600 m3	150 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

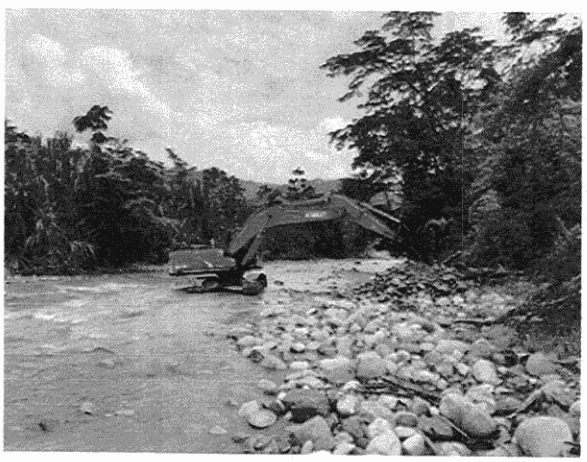
TABLA 15. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 18 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 18 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica del caño unión, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4° 4'28.79"N	73°40'56.07"O
	COORDENADA FINAL	4° 4'40.42"N	73°40'44.64"O

TABLA 16. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en el caño unión.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.



Fotografía 37

Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)

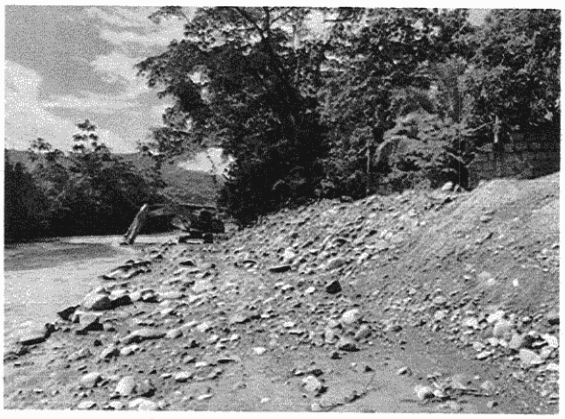


Fotografía 38

Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)

	
Fotografía 39	**Fotografía 40**
Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)
	
Fotografía 41	**Fotografía 42**
Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)
	
Fotografía 43	**Fotografía 44**
Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)

	
Fotografía 45	**Fotografía 46**
Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)

	
Fotografía 47	**Fotografía 48**
Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del caño unión, creación de Jarillón)

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	LA PLAYITA - RIO OCOA	HR	56,30	$ 367.950	$ 20.715.585

TABLA 17. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden el quito sector.

5. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO LA PLAYITA EN EL RIO OCOA.



Fotografía 48	imagen satelital Google earth. vista la zona en general a intervenida en canalización en el rio Ocoa en el sector La Playita.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició desde la parte alta del san Cipriano hasta unos metros antes del cruce de la desembocadura del caño cola pato al rio Ocoa. El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 565 metros lineales.

El plan contemplado consistió en ejecutar actividades secuenciales de descolmatación, rectificación y canalización de la sección transversal, con el fin de centrar el cauce y recuperar la capacidad hidráulica del rio Ocoa. Esta intervención sirve de apoyo a las obras de mitigación que la Oficina de Gestión del Riesgo desarrolla en la zona. Específicamente, se desarrollará la construcción de gaviones que se encuentra en el mismo contrato 2141-2026. En esta zona la playita la comunidad se ve afectada por la socavación fuerte en la margen derechas aguas abajo en la curva debido esto se fortaleció un canal, pero centrado del cauce del rio Ocoa para se comporte mejor en crecientes.

Dichas intervenciones se iniciaron el día domingo 14 de junio del 2026 se culminaron el domingo 26 de junio del 2026 en el sector ya descrito se ejecutó un total de 56,30 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
LA PLAYITA– RIO OCOA				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	565 m	2,0 m	10 m	11.300 m3

TABLA 18. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el caño unión realizando un total de volumen movido en la canalización de 11.300 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 4 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	565 m	11.300 m3	9 días	1.255,56 m3	156,94 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

TABLA 19. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 9 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 9 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica del rio Ocoa, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4° 4'40.29"N	73°40'44.83"O
	COORDENADA FINAL	4° 4'49.09"N	73°40'28.91"O

TABLA 20. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en el rio Ocoa.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.




Fotografía 49

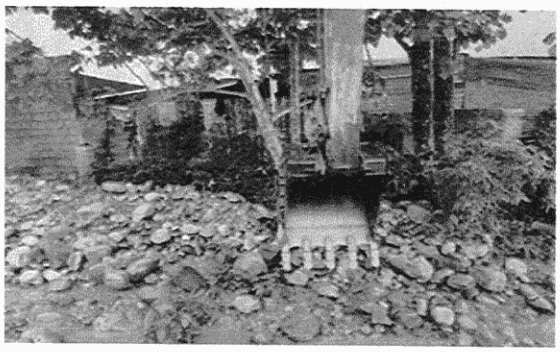
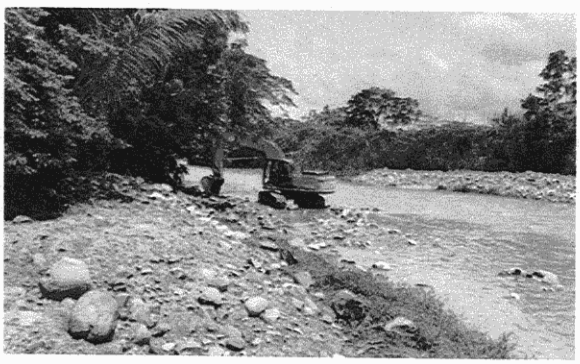
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

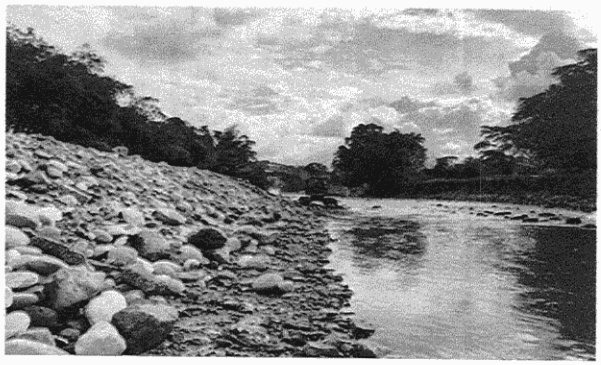


Fotografía 50

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 51	**Fotografía 52**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

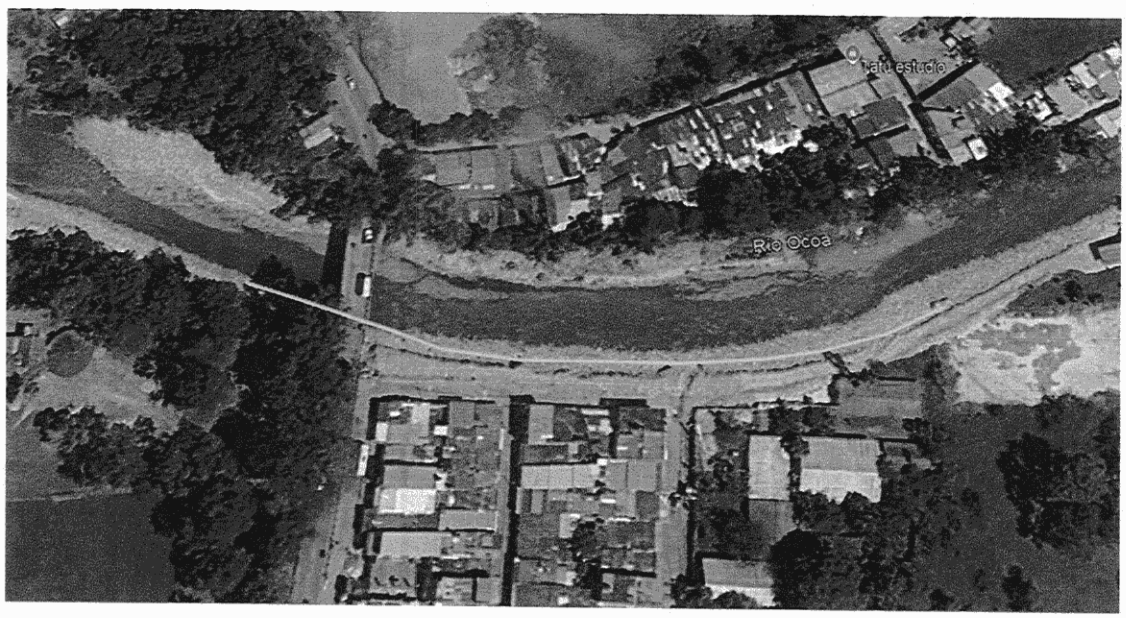
	
Fotografía 53	**Fotografía 54**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 55	**Fotografía 56**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

ORDEN	SECTOR - FUENTE HIDRICA	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	EL PUENTE LA CALLE 49 DE PORFÍA - RIO OCOA	HR	34,90	$ 367.950	$ 12.841.455

TABLA 21. Descripción del ítem 1.3 Canalización Rio (tipo excavadora orugada) 20T lo ejecutado por orden el sexto sector.

6. CANALIZACIÓN (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T EN EL SECTOR INTERVENIDO EL PUENTE LA CALLE 49 DE PORFÍA - RIO OCOA



Fotografía 57	imagen satelital Google earth. vista la zona en general a intervenida en canalización en el rio Ocoa en el sector el puente la calle 49 de porfía.

La intervención de control fluvial e hidráulico se proyectaron en un alineamiento que inició desde la parte alta del del puente de la calle 49 en porfía hasta unos metros después del colegio campestre de porfía en el rio Ocoa. El tramo intervenido consolidó un desarrollo longitudinal total de 217 metros lineales.

Se desarrollo actividades preventivas para la infraestructura de la zona como fue la limpieza de la palizada en la columnas centrales del puente la placa y los pilotes o cimientos esto se tuvo que realizar el día 19 de mayo 2026 y a partir del 27 junio del 2026 se continuo con la intervenciones de fortalecimiento en la zona ejecutando actividades secuenciales de descolmatación, ratificación y canalización en el cauce del rio Ocoa con el material removido se realizo el reforzamiento del Jarillón se encuentra en la zona para fortalecer los espacios entre los espolones en dicha zona.

Dichas intervenciones se iniciaron el día sábado 27 de junio del 2026 se culminaron el jueves 02 de julio del 2026 en el sector ya descrito se ejecutó un total de 56,30 horas efectivas de operación.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PROFUNDIDAD	ANCHO	VOLUMEN
EL PUENTE LA CALLE 49 DE PORFÍA - RIO OCOA				
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	217 m	2,5 m	10 m	5.425 m3

TABLA 22. Memoria de canalización de la kobelco 200 en el caño unión realizando un total de volumen movido en la canalización de 11.300 m3.

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL, DIAS TRABAJADOS	PROMEDIO m3 MOVIDOS AL DIA	PROMEDIO m3 MOVIDOS HORA EN 7 HORAS DIA
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	217 m	5.425 m3	5 días	1.085 m3	155 m3
Todo esto Teniendo en cuenta se tuvo realizar la disposición en forma de Jarillón o barrera de contención para la mitigación de la zona.					

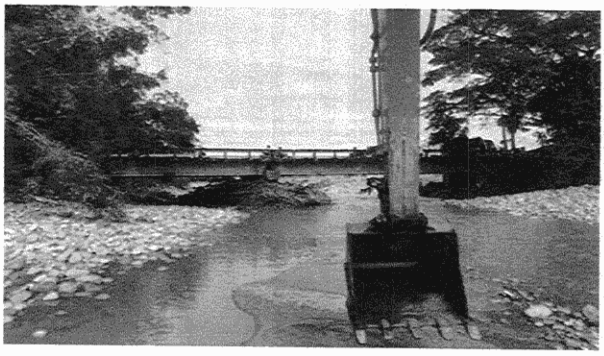
TABLA 23. Memoria de rendimiento la excavadora orugada por día y por hora tomando lo promedio los días trabajados totales fueron 5 días trabajados.

Se informa que las actividades de canalización en el Sector ya mencionado se desarrollaron en una ventana operativa de 5 días calendario se trabajó de lunes a sábado con excepto los domingos y festivos. No obstante, el rendimiento del frente de trabajo estuvo condicionado por la variabilidad climática y la dinámica hídrica del rio Ocoa, detalladas en los horómetros anexados al final del informe N°1.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS INTERVENCION	LATITUD	LONGITUD
Canalización rio (tipo excavadora orugada) 20T	COORDENADA INICIAL	4° 5'10.32"N	73°40'10.23"O
	COORDENADA FINAL	4° 5'10.20"N	73°40'3.36"O

TABLA 24. Descripción de la memoria de las coordenadas inicio y final de las intervenciones realizadas en el rio Ocoa.

Como se puede evidenciar en el registro fotográfico.



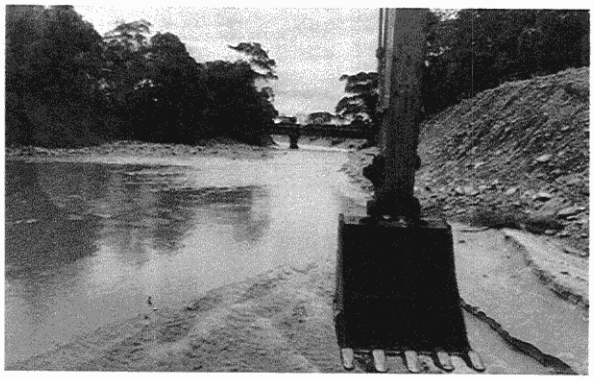
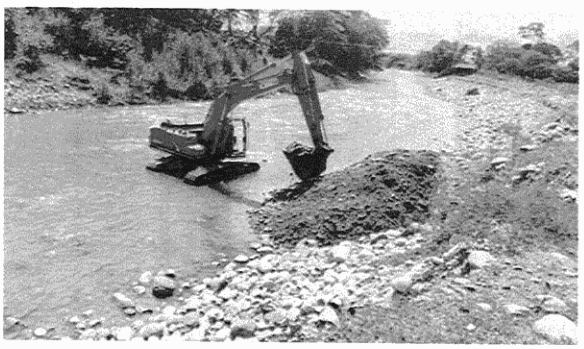
Fotografía 58

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)



Fotografía 59

Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

	
Fotografía 60	**Fotografía 61**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)
	
Fotografía 62	**Fotografía 63**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)
	
Fotografía 64	**Fotografía 65**
Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)	Actividad de canalización (centralización cauce del rio Ocoa, creación de Jarillón)

1. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	PENSIÓN ABRIL Y SALUD MAYO
Nombre del Afiliado	MORA ROSEMBERTH
No. de Identificación	1121840005
Fecha de Pago	21/05/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,035,605
Número de Planilla	9504908071
Valor pagado en SALUD	$81,500
Valor pagado en PENSIÓN	$325,700
Valor pagado en ARL	$141,700

Mes de Cotizado	PENSIÓN ABRIL Y SALUD MAYO
Nombre del Afiliado	MOLINA DAGOBERTO
No. de Identificación	1123140075
Fecha de Pago	21/05/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,274,188
Número de Planilla	9504908071
Valor pagado en SALUD	$91,000
Valor pagado en PENSIÓN	$363,900
Valor pagado en ARL	$158,300

Mes de Cotizado	PENSIÓN MAYO Y SALUD JUNIO
Nombre del Afiliado	MORA ROSEMBERTH
No. de Identificación	1121840005
Fecha de Pago	22/06/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,668,940
Número de Planilla	9506070975
Valor pagado en SALUD	$106,800
Valor pagado en PENSIÓN	$427,100
Valor pagado en ARL	$185,800

Mes de Cotizado	PENSIÓN MAYO Y SALUD JUNIO
Nombre del Afiliado	MOLINA DAGOBERTO
No. de Identificación	1123140075
Fecha de Pago	22/06/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,599,166
Número de Planilla	9506070975
Valor pagado en SALUD	$104,000
Valor pagado en PENSIÓN	$415,900
Valor pagado en ARL	$181,000

Mes de Cotizado	PENSIÓN JUNIO Y SALUD JULIO
Nombre del Afiliado	MORA ROSEMBERTH
No. de Identificación	1121840005
Fecha de Pago	21/07/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,170,455
Número de Planilla	9507941017
Valor pagado en SALUD	$86,900
Valor pagado en PENSIÓN	$347,300
Valor pagado en ARL	$151,100

Mes de Cotizado	PENSIÓN JUNIO Y SALUD JULIO
Nombre del Afiliado	MOLINA DAGOBERTO
No. de Identificación	1123140075
Fecha de Pago	21/07/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2,100,422
Número de Planilla	9507941017
Valor pagado en SALUD	$84,100
Valor pagado en PENSIÓN	$336,100
Valor pagado en ARL	$146,200

Anexo N° 2 las planillas en físico de los meses mencionados abril, mayo y junio del 2026.

3. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

4. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:** Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	cumplió

	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	cumplió

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 352.348.920 COP	N/A	16/04/2026 al 02/07/2026	57,95%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 255.675.229 COP	N/A	N/A	42,05%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$608.024.149 COP	N/A	N/A	100%

6. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 01** comprendido entre el **16 de abril de 2026 al 02 de julio de 2026,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 352.348.920 COP). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
SUPERVISOR
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3217371942
