FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 35 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0907-2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 9, 13, 14,15,16, Y 17 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO DE LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA	CONSORCIO VIALCO	**NIT**	901.984.610-3
INTERVENTOR	CGR S.A.S	**NIT**	830.076.603-9
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)		(Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor	$ 10,350,627,580.00	Valor	$ 1,700,423,323.00
Valor Adicional 1	$ 114,429,043.00	Valor Adicional 1	$ 560,407,390.00
Valor Adicional 2	$ 5,908,160,711.00	Valor Adicional 2	$ 238,580,358.00
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional 3	$ 249,907,370.00
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional 4	$ 193,476,625.00
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional 5	$ 9,496,935.00
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional 6	$ 79,919,962.00
Valor Actualizado	$ 16,373,217,334.00	Valor Adicional 7	$ 140,809,154.00
		Valor Actualizado	$ 3,173,021,117.00
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	30 días	Plazo Prorroga 1	51 Días
Plazo Prórroga 2	15 días	Plazo Prorroga 2	30 Días
Plazo Prórroga 3	3 meses	Plazo Prorroga 3	55 Días
Plazo Prórroga 3	3 meses	Plazo Prorroga 4	67 Días
Plazo Prórroga 4	N/A	Plazo Prorroga 5	10 Dias
Plazo Actualizado	8 meses	Plazo Actualizado	Hasta 31/07/2026
Fecha de Inicio	17/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Suspensión No.1	A partir del 15/02/2026	Suspensión No.1	N/A
Fecha de Reanudación	20/04/2026		
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	21/07/2026	Fecha de Terminación Actual	31/07/2026
No. de empleos generados	13	No. De empleos generados	28

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor Secretaría de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 16,373,217,334.00	7891	8612.76		
Mejoramiento de vía con Placa Huella		209			
TOTALES	$ 16,373,217,334.00	8099	8612.76	0	0

A. AVANCE GENERAL

AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado Obra (%)	4.00%	99.00%	Total Ejecutado (%)	1.00%	91.00%	-8.00%
Valor del trabajo Programado Obra ($)	$ 14,820,983.96	$ 16,419,438,425.65	Total Ejecutado ($)	$ 530,270,108.00	$ 14,088,140,485.70	$ -2,331,297,939.95
Avance Financiero Contrato obra	**$ 14,088,140,485.70**	**86.04%**	**Avance Financiero Interventoría Lote 2**	**$ 905,123,289.00**	**91.00%**	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

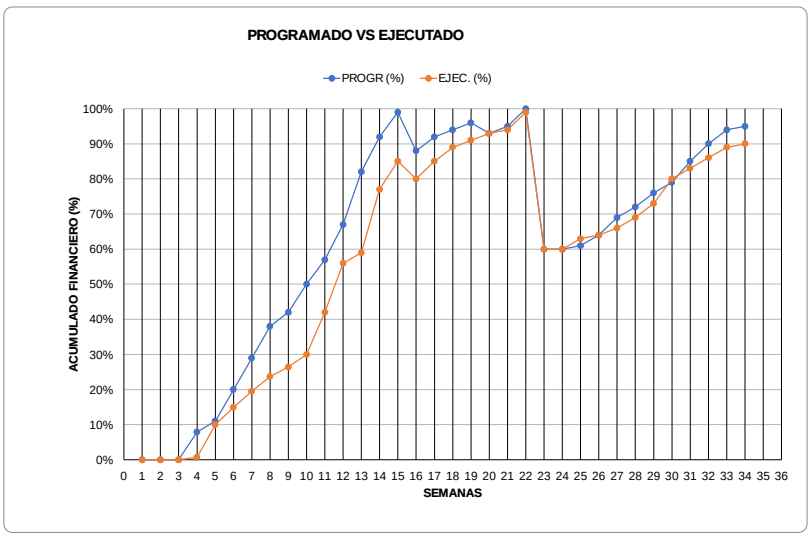

Nota: El programa de obra a partir de la semana 16, se ajusta ya que se presenta reprogramación de obra por la prorroga No.1

Nota: El programa de obra a partir de la semana 20, se ajusta ya que se presenta reprogramación de obra por la prorroga No.2

Nota: El programa de obra a partir de la semana 23, se ajusta ya que se presenta reprogramación de obra por la prorroga No.3 y adición de nuevos tramos.

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0%	0%
2	0%	0%
3	0%	0%
4	8%	1%
5	11%	10%
6	20%	15%
7	29%	20%
8	38%	24%
9	42%	26%
10	50%	30%
11	57%	42%
12	67%	56%
13	82%	59%
14	92%	77%
15	99%	85%
16	88%	80%
17	92%	85%
18	94%	89%
19	96%	91%
20	93%	93%
21	95%	94%
22	100%	99%
23	60%	60%
24	60%	60%
25	61%	63%
26	64%	64%
27	69%	66%
28	72%	69%
29	76%	73%
30	79%	80%
31	85%	83%
32	90%	86%
33	94%	89%
34	95%	90%
35	99%	91%

AVANCE EN METAS FISICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada Calzada (m/calzada)	0.00	5543.00	68.4%	Meta Física Ejecutada (m/calzada)	525.00	7889.00	97.4%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

						INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
Frente	**Comuna/Corregimiento**	**Longitud (ML)**	**Tipo de Intervención**	**Tramo Vial**	**Estado**	**Fecha de inicio programada**	**Pavimento (m)**	**Observaciones**
20	9	0	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 19 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 15	SIN INICIAR	30/11/2025	-	No se va a ejecutar
21	13	416	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 31 ENTRE 44 Y 48	FINALIZADO	4/12/2025	416.00	FINALIZADO
22	13	107	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 72 O ENTRE CARRERAS 28F y 29	FINALIZADO	5/12/2025	107.00	FINALIZADO

23	14	485.8	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL CICLOINFRAESTRUCTURA	CARRERA 27 ENTRE CALLES 103 Y 112. SENTIDO : E - W	FINALIZADO	14/12/2025	485.80	FINALIZADO
24	14	201	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 26G ENTRE CALLES 90 Y 94	FINALIZADO	28/10/2025	201.00	FINALIZADO
25	14	220	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 84 ENTRE CARRERAS 26 Y 26C	FINALIZADO	11/11/2025	220.00	FINALIZADO
26	15	1048	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 39 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 55 (AMBAS CALZADAS)	FINALIZADO	14/11/2025	1,048.00	FINALIZADO
27	15	340	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 52 ENTRE CARRERA 39E Y CARRERA 41 B	FINALIZADO	20/10/2025	340.00	FINALIZADO
28	15	87	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 51 ENTRE CARRERA 39E Y CARRERA 39 G	FINALIZADO	25/10/2025	87.00	FINALIZADO
29	15	332	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 49 ENTRE CARRERA 39E Y CARRERA 41B	FINALIZADO	26/10/2025	332.00	FINALIZADO
30	15	149.6	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 32A ENTRE AV CIUDAD CALI Y CALLE 57	FINALIZADO	27/11/2025	149.60	FINALIZADO
31	16	94	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 39A ENTRE CARRERA 46B Y CARRERA 47	FINALIZADO	9/12/2025	94.00	FINALIZADO
32	16	196	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 48A ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44	FINALIZADO	11/12/2025	196.00	FINALIZADO
33	17	141	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 65B ENTRE CALLE 10A Y CALLE 11	FINALIZADO	6/10/2025	141.00	FINALIZADO
34	17	161	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 75 ENTRE CALLES 13 y 13B	FINALIZADO	6/10/2025	161.00	FINALIZADO
35	17	117.6	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 10BIS ENTRE CARRERA 71 Y CARRERA 72	FINALIZADO	6/10/2025	117.60	FINALIZADO
36	17	220.07	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11B	FINALIZADO	6/10/2025	220.07	FINALIZADO
37-A	VILLACARMELO	84.4	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	LOURDES - LA PLANETA	FINALIZADO	20/11/2025	84.40	FINALIZADO
38-A	VILLACARMELO	124.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	ENTRADA SAN JAVIER - RESGUARDO	FINALIZADO	5/12/2025	124.10	FINALIZADO
39-A	17	150	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 72 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10A	EN EJECUCIÓN	11/05/2026	153.70	Tramo a nivel de MDC. Pendiente finalizar nivelación de camaras y sumideros y demarcación vial.
40-A	17	125	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 11 A ENTRE CARRERAS 70 Y 72	EN EJECUCIÓN	13/05/2026	125.10	Tramo a nivel de MDC. Pendiente finalizar nivelación de camaras y sumideros y demarcación vial.
41-A	17	650	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR	EN EJECUCIÓN	20/05/2026	652.60	Tramo a nivel de MDC. Pendiente finalizar nivelación de camaras y sumideros y demarcación vial.
42-A	17	460	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE	EN EJECUCIÓN	2/06/2026	481.20	Tramo a nivel de MDC. Pendiente finalizar nivelación de camaras y sumideros y demarcación vial.
43-A	17	340	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 68 ENTRE CALLE 10A1 Y CALLE 13	EN EJECUCIÓN	6/05/2026	356.20	Tramo a nivel de MDC. Pendiente demarcación vial y correcciones de obra.
44-A	17	525	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 64A ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13	EN EJECUCIÓN	4/05/2026	534.10	Tramo a nivel de MDC. Pendiente finalizar nivelación de camaras y sumideros y demarcación vial.
45-A	17	100	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 13A ENTRE CARRERA 75 Y CARRERA 73	EN EJECUCIÓN	9/06/2026	106.90	Tramo a nivel de MDC, pendiente iniciar con actividades de nivelación de cámaras y sumideros
46-A	15	560	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADAS	EN EJECUCIÓN	10/06/2026	525.00	Se da inicio a la instalación de carpeta asfáltica, pendiente culminar actividad, nivelación de camaras y sumideros y demarcación.
47-A	13	180	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 42 ENTRE CARRERA 28F Y CARRERA 29 (ORIENTAL)	EN EJECUCIÓN	17/06/2026	190.00	Tramo a nivel de MDC, pendiente iniciar con actividades de nivelación de cámaras y sumideros
48-A	13	260	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 (ORIENTAL)	EN EJECUCIÓN	19/06/2026	240.00	Tramo a nivel de MDC, pendiente iniciar con actividades de nivelación de cámaras y sumideros
49-A	15	224	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57	EN EJECUCIÓN	26/06/2026	-	Se da inicio a la instalación de base granular, pendiente culminar actividad.
	TOTAL	**8099**					**7,889.37**	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS:

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TECNICAS
46A	CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADAS	15	* Nivelación y compactación base granular. * Toma de densidades. * Imprimación base granular K0+000 a K0+276 M.I Calzada NORTE * Imprimación base granular. K0+000 a K0+276 M.I Calzada NORTE * Imprimación base granular. K0+000 a K0+200 M.D Calzada NORTE * Instalación carpeta asfáltica. K0+000 a K0+276 M.I Calzada NORTE * Instalación carpeta asfáltica. K0+000 a K0+200 M.D Calzada NORTE * Instalación carpeta asfáltica. K0+000 a K0+287 Calzada sur
49A	CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57	15	* Excavación material existente. * Escarificación subrasante * Demolición en bocacalle. * Instalación base granular K0+000 - K0+060 M.I

ACTIVIDADES GENERALES (TECNICO)

* Se hace envió de oficio C-T-141-628-2026 L2 - SOLICITUD REALIZACIÓN COMITE EXTRAORDINARIO - LOTE 2
* Se hace envió de oficio C-T-141-624-2026 L2 – APREMIO_- Solicitud incremento rendimientos de obra por atraso y solicitud plan de contingencia.
* Se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisar informe técnico e informe de calidad correspondiente la preacta No.5
* Se realizó mesa de trabajo con el contratista para identificar las cantidades del acta parcial de pago No.5.
* Se hace envió de oficio OBSERVACIONES INFORME DE IMPREVISTOS PRESENTADOS ACTA 05 DE OBRA
* Observaciones a la Cartera Tramo 50A y 51A.
* Se hace envió de oficio C-T-141-639-2026 L2 – AVAL RADICACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 005 – LOTE 2
* Seguimiento a actividades de obra.

ENTIDAD CONTRATANTE: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

SEMANA No. 35 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0907-2025** (Número de Contrato)

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

* Se continúa realizando el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

* Los frentes de obra activos cuentan con las medidas de manejo ambiental requeridas, incluyendo unidades sanitarias, puntos ecológicos, áreas de acopio temporal de residuos y kits para la atención de emergencias, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el PAGA.

* De manera conjunta con la profesional ambiental del contratista, se adelantó la revisión y ajuste del Acta del PAGA. No obstante, se encuentra pendiente la entrega del documento debidamente suscrito, con el fin de dar continuidad al trámite correspondiente ante la Secretaría de Infraestructura.

* Asimismo, esta interventoría solicitó al contratista dar continuidad al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas para la ejecución de la obra, garantizando la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de trabajo. De igual manera, se requirió mantener permanentemente el orden y la limpieza de las áreas intervenidas, evitando la acumulación de residuos, materiales sobrantes y cualquier otra condición que pueda generar impactos ambientales negativos.

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

* Se envió al contratista, mediante WhatsApp, el informe mensual correspondiente al mes de junio con las observaciones incluidas en el documento para su ajuste. Se recibió respuesta de manera oportuna y actualmente se encuentra en proceso la emisión del comunicado de aprobación.

* Se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el contratista (TOTIS) y la interventoría, en la cual se socializaron y dejaron consignadas las conclusiones derivadas del recorrido técnico realizado en los tramos 45A, 46A, 47A, 48A, 49A, 50A y 51A. Como soporte de la reunión, se elaboró el acta correspondiente, en la que quedaron registrados los aspectos analizados, las conclusiones y los compromisos adquiridos.

* Se realizó un recorrido de inspección para validar el estado de la obra en los tramos 47A y 48A, con el fin de verificar las condiciones necesarias para el inicio de las actividades de ADF.

* Asimismo, se efectuó un recorrido de verificación en los tramos 46A y 49A para revisar la implementación del PAC Móvil y el desarrollo de la capacitación impartida al personal vinculado a la obra.

* Durante la presente semana se dio inicio al proceso de cierre de las actas de fachada correspondientes a los tramos 39A, 40A, 41A, 42A, 43A y 44A.

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

* Durante la presente semana se realizó el seguimiento y la verificación del uso adecuado de la dotación y de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal de obra, tanto en las actividades rutinarias como en las labores específicas de aplicación de mezcla asfáltica. Durante la inspección se evidenció el uso adecuado de las mascarillas de protección contra gases y vapores por parte de la cuadrilla encargada de la aplicación del asfalto, garantizando la protección de la salud respiratoria de los trabajadores y el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo.
* Asimismo, se inspeccionó y verificó la presencia del personal auxiliar de tránsito en la totalidad de los puntos de cierre programados, constatando el cumplimiento de los lineamientos y esquemas establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la obra. A la fecha, el contratista dispone de siete (7) auxiliares de tránsito, los cuales son distribuidos entre los dos frentes de trabajo activos y reforzados en el frente donde se ejecutan las actividades de aplicación de mezcla asfáltica.
* De manera diaria, desde el inicio de la jornada, se verificó que los auxiliares de tránsito realizaran el traslado e instalación de los dispositivos de canalización vial en los diferentes puntos de control, ejecutando los cierres principales y de bocacalles, complementados con cinta de señalización y la instalación de la valla informativa de la Alcaldía de Cali. Lo anterior garantiza el adecuado aislamiento de la zona de trabajo, minimiza el riesgo de ingreso no autorizado y contribuye al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
* También se verificó el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante las actividades de aplicación de mezcla asfáltica, tanto en la maquinaria utilizada como en los procedimientos ejecutados, evidenciando la implementación de las medidas preventivas requeridas para este tipo de labores. Adicionalmente, se revisaron de manera aleatoria los formatos de inspección preoperacional de los equipos, verificando su correcto diligenciamiento y contribuyendo a la mitigación de los riesgos asociados a la operación de maquinaria en la vía.
* Finalmente, se inspeccionaron las carpas de emergencias de los dos frentes de trabajo activos, confirmando que cuentan con camilla, botiquín e insumos con fechas de vencimiento vigentes, así como con extintores debidamente recargados y aptos para su uso. De igual manera, se verificó la maquinaria de obra, evidenciando que cada equipo dispone de su respectivo botiquín y extintor en óptimas condiciones para la atención de emergencias.

RECOMENDACIONES:

1. Cronograma en Ms Project	SI	x
2. Registro Fotográfico	SI	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI a los VEINTE (Día en letras) 20 (Día en números) de JULIO (Mes en letras) de 2026 (Año de firma del informe)

(Nombre) - Firma del Director de Interventoría

FORMATO		
CODIGO	PROCESO	VERSION
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCION TECNICA**

SEMANA No. 35 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **4151.010.26.1.0907-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Instalación base granular



Descripción Foto 2.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Compactación base granular



Descripción Foto 3.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Compactación base granular



Descripción Foto 4.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Toma de densidades



Descripción Foto 5.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Imprimación base granular



Descripción Foto 6.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Instalación carpeta asfaltica

FORMATO		
CODIGO	PROCESO	VERSION
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCION TECNICA**

SEMANA No. 35 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0907-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 7.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Instalación carpeta asfaltica



Descripción Foto 8.

Tramo 49A CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57
Instalación de base granular



Descripción Foto 9.

Tramo 49A CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57
Instalación de base granular



Descripción Foto 10.

Tramo 49A CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57
Nivelación de base granular



Descripción Foto 11.

Tramo 49A CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57
Nivelación de base granular



Descripción Foto 12.

Tramo 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADA
Demolición en bocacalle

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

(20) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora
