FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 36 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA CONSORCIO MMC 2025 **NIT** 901.985.204-0

INTERVENTOR CGR S.A.S **NIT** 830.076.603-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 9.340.789.495,00	Valor Inicial	$ 1.700.423.323,00
Valor Adicional 1	$ 159.803.083,00	Valor Adicional 1	$ 560.407.390,00
Valor Adicional 2	$ 4.485.896.755,00	Valor Adicional 2	$ 238.580.358,00
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 3	$ 249.907.370,00
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 4	$ 193.476.625,00
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 5	$ 9.496.935,00
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 6	$ 79.919.962,00
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 7	$ 140.809.154,00
Valor Actualizado	$ 13.986.489.333,00	Valor Actualizado	$ 3.173.021.117,00
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	1.7 meses	Plazo Prorroga 1	1.7 meses
Plazo Prórroga 2	1 mes	Plazo Prorroga 2	1 mes
Plazo Prórroga 3	16 días	Plazo Prorroga 3	1,8 meses
Plazo Prórroga 4	60 días	Plazo Prorroga 4	2.2 meses
Suspensión 01	6/04/2026	Plazo Prorroga 5	10 días
Reinicio 01	1/06/2026	Suspensión 01	N/A
Plazo Actualizado	10.3 meses	Plazo Actualizado	10.5 meses
Fecha de Iniciación	22/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	31/07/2026	Fecha de Terminación Actual	31/07/2026
No. de empleos generados	20	No. De empleos generados	28

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
(Escriba el nombre del Supervisor Secretaría de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA
(Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

(Escriba el número del oficio radicado) dd-mm-aa


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 13.624.172.823,00	7082	10,764		
Mejoramiento de vía con Placa Huella	$ 362.316.510,00	203	203		
TOTALES	$ 13.986.489.333,00	7285	213,764	0	0

A. AVANCE GENERAL

AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo programado obra (%)	1,00%	99,00%	Total Ejecutado (%)	1,00%	99,00%	0,00%
Valor del Trabajo programado obra ($)	$ 490.919.732,26	$ 13.117.882.720,00	Total Ejecutado ($)	$ 456.372.832,00	$ 12.798.377.316,00	$ -319.505.404,00
Avance Financiero Obra	**$ 12.798.377.316,00**	**91,51%**	**Avance Financiero Interventoría Lote 3**	**$ 1.059.455.411,00**	**99,00%**	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

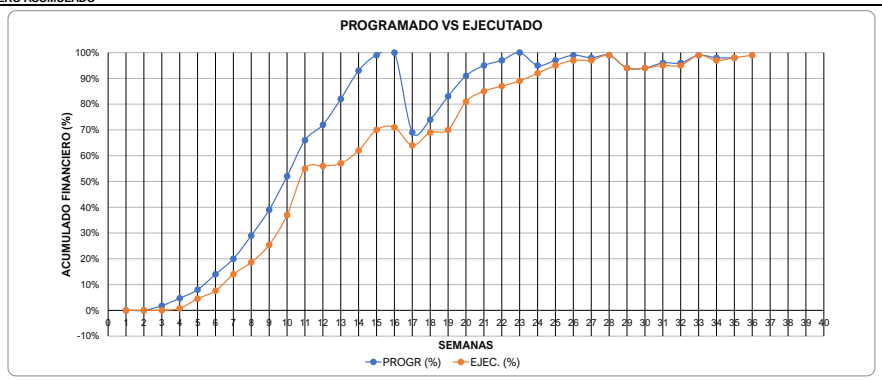

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0%	0%
2	0%	0%
3	2%	0%
4	5%	1%
5	8%	5%
6	14%	8%
7	20%	14%
8	29%	19%
9	39%	25%
10	52%	37%
11	66%	55%
12	72%	56%
13	82%	57%
14	93%	62%
15	99%	70%
16	100%	71%
17	69%	64%
18	74%	69%
19	83%	70%
20	91%	81%
21	95%	85%
22	97%	87%
23	100%	89%
24	95%	92%
25	97%	95%
26	99%	97%
27	98%	97%
28	99%	99%
29	94%	94%
30	94%	94%
31	96%	95%
32	96%	95%
33	99%	99%
34	98%	97%
35	98%	98%
36	99%	99%

Análisis de la Gráfica:

Se realiza reprogramación de obra por efecto de la prorroga No. 4 al contrato de obra, hasta el 31 de julio de 2026.

AVANCE METAS FISICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada Calzada (m/calz	81,00	6707,00	93,2%	Meta Física Ejecutada (m2)	0,00	6476,6	90,0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

						INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
Frente	Comuna/Corregimiento	Longitud (ML)	Tipo de Intervención	Tramo Vial	Estado	Fecha de inicio programada	Pavimento (m)	Observaciones
40	5	296	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3	FINALIZADO	vie 14/11/25	296,00	FINALIZADO
41	5	682	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62	FINALIZADO	vie 21/11/25	681,30	FINALIZADO
42	7	92	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 74 ENTRE CARRERA 8C Y CRA 9	FINALIZADO	mar 11/11/25	91,70	FINALIZADO
43 R	7	120	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78	FINALIZADO	lun 19/01/26	119,23	FINALIZADO
44	10	431	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14	FINALIZADO	mié 5/11/25	430,90	FINALIZADO
45	10	440	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18	FINALIZADO	lun 20/10/25	440,00	FINALIZADO

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 36 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

46	18	158	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	lun 6/10/25	157,30	FINALIZADO
47	18	160	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	lun 6/10/25	159,60	FINALIZADO
48	18	96	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 72 ENTRE CALLES 3A Y 3C	FINALIZADO	lun 6/10/25	95,10	FINALIZADO
49	18	519	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	FINALIZADO	vie 7/11/25	518,50	FINALIZADO
50	19	243	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 8A ENTRE CARRERA 42 Y CARRERA 44	FINALIZADO	lun 6/10/25	243,00	FINALIZADO
51	19	181	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	FINALIZADO	mar 14/10/25	180,50	FINALIZADO
52	20	41	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE	FINALIZADO	mié 22/10/25	40,60	FINALIZADO
53	20	72	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	DIAGONAL 48 ENTRE CALLE 12 OESTE Y CARRERA 54	FINALIZADO	mar 28/10/25	71,40	FINALIZADO
54	20	82	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	FINALIZADO	lun 12/01/26	82,00	FINALIZADO
55	21	601	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27	FINALIZADO	vie 7/11/25	601,00	FINALIZADO
56	21	225	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	FINALIZADO	mié 5/11/25	224,50	FINALIZADO
57	LA BUITRERA	203	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	FINALIZADO	lun 6/10/25	203,00	FINALIZADO
58	18	90	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 72 Y 73 - ADICIONAL	FINALIZADO	mié 10/12/25	87,70	FINALIZADO
59	19	118	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	FINALIZADO	lun 19/01/26	117,80	FINALIZADO
60	19	237	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 - TRAMO 60	FINALIZADO	mié 21/01/26	236,80	FINALIZADO
61	19	257	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 61	FINALIZADO	lun 12/01/26	256,80	FINALIZADO
62	19	1420	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (AMBAS CALZADAS) - COMUNA - TRAMO 62	EN EJECUCIÓN	1/06/2026	1.042,80	* CALZADA NORTE a nivel de carpeta asfáltica, pendiente finalizar nivelación de una camara y realizar demarcación (se envían diseños de demarcación al contratista 14/07/2026) *CALZADA SUR , Actualmente está a nivel de asfalto con avance del 50%. Pendiente, finalizar base y asfalto, nivelación de cámaras y sumideros y demarcación
63	7	103	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 72A ENTRE CARRERAS 7B Y 7C - COMUNA - TRAMO 63	FINALIZADO	lun 12/01/26	102,70	FINALIZADO
64	7	261	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA - TRAMO 64	FINALIZADO	mar 20/01/26	261,00	FINALIZADO
65	7	71	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 74 Y 74A	FINALIZADO	lun 12/01/26	70,15	FINALIZADO
TOTAL		**7199**					**6.811,4**	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TECNICAS
62	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (CALZADA NORTE) - COMUNA - TRAMO 62	20	* Nivelación de sumideros
62	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (CALZADA SUR) - COMUNA - TRAMO 62	20	* Instalación de base granular en abscisas K0+000 a K0+070 y K0+135 a K0+300 * Imprimación de base granular en abscisas K0+375 a K0+708 * Instalación de carpeta asfáltica en abscisas K0+375 a K0+708 Calzada completa * Toma de densidades de base granular * Fundida de cargues de cámaras en abscisas K0+582 eje, K0+643 costado derecho y K0+528 costado derecho * Fundida de cartera de sumideros en abscisas K0+522 costado izquierdo,K0+626 costado derecho y K0+791 costado derecho

ACTIVIDADES GENERALES (TECNICO)

* La interventoría continúa con el seguimiento y control de las actividades de obra, específicamente con la finalización de las labores de nivelación de pozos y sumideros en la calzada norte, así como con la ejecución de las actividades de excavación, conformación de base granular e instalación de carpeta asfáltica en la calzada sur.
* Se remite comunicado C-T-141-632-2026 L3 – RESPUESTA COMUNICADO "MMC 2025-272 REMISIÓN DE ENTREGA INFORME TECNICO No. 007" - LOTE 3, con observaciones del informe técnico mensual del mes de junio presentado por el contratista del 17 de julio de 2026
* El contratista presenta el Acta Parcial de Obra No. 5 con comunicado CONSORCIO MMC 2025 – 288: RESPUESTA OFICIO C-T-141-574-2026 L3 REVISIÓN Y OBSERVACIONES MMC 2025 - 266 - ACTA PARCIAL 5 - LOTE 3 del 16 de julio de 2026, la cual está en revisión por parte de la interventoría
* Se envía el diseño de demarcación y señalización horizontal al contratista (14 de julio de 2026) para su implementación en la CALZADA NORTE que ya tiene finalizada la instalación de carpeta asfáltica

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

Se continúa realizando el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

* El día 14 de julio de 2026 se realizó una visita de inspección ambiental, evidenciando el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables y establecidas en el PAGA. No obstante, durante la inspección se verificó el cubrimiento de tres (3) sumideros ubicados en la calle 66 con carrera 2A, calzada sur, actividad que debe ejecutarse previamente al inicio de las labores de fresado.
* Se verificó que el frente de obra activo (Tramo 62) cuenta con dos (2) unidades sanitarias móviles, una (1) unidad sanitaria fija y un (1) punto ecológico debidamente instalados para la atención del personal y la adecuada gestión de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, así como en el campamento de obra y la zona de almacenamiento de materiales de construcción.
* Durante la visita se evidenció la correcta instalación de la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la disponibilidad de los reguladores de tránsito y el cargue de residuos de construcción y demolición (RCD) provenientes del fresado para su aprovechamiento y posterior transporte al sitio receptor autorizado (Talleres del Municipio).
* A la fecha de corte del presente informe no se han presentado incidentes de carácter ambiental que alteren las condiciones del área de influencia directa de los proyectos de mejoramiento vial. De igual forma, no se han recibido requerimientos por parte de las autoridades ambientales por presuntos incumplimientos de la normatividad ambiental vigente.
* El día 14 de julio de 2026, esta interventoría acompañó la visita técnica realizada por el DAGMA, correspondiente a la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal (podas) presentada por la Secretaría de Infraestructura para catorce (14) árboles. Como resultado de la visita, según consta en el Acta DAGMA N.° 84430 del 14 de julio de 2026, se evidenció que los individuos forestales identificados con los números 1, 2 y del 4 al 14 no requieren intervención forestal. En cuanto al individuo forestal ID 03, correspondiente a la especie samán, se determinó que, debido a que presenta raíces de sostenimiento expuestas sobre la vía, estas deberán ser protegidas. En consecuencia, no será necesario continuar con el trámite de intervención forestal.

* Informe Trimestral Ambiental de RCD (01 de abril al 30 de junio de 2026): El contratista de obra, mediante el comunicado MMC 2025-289 del 18 de julio de 2026, realizó la entrega del Informe Trimestral N.° 2 de 2026 correspondiente a la implementación del Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Dicho documento se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de esta interventoría.

ENTIDAD CONTRATANTE: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

SEMANA No. 36 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

* Se recibió el informe mensual correspondiente al mes de junio por parte del contratista y, posteriormente, esta interventoría emitió el comunicado con las observaciones de fondo al documento para su correspondiente ajuste. A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

* Finalmente, esta interventoría continúa con la revisión de los conceptos técnicos correspondientes a las PQR Nos. 19, 20 y 21, con el fin de emitir las respuestas y adelantar las acciones necesarias para su cierre definitivo durante la siguiente semana de trabajo. A la fecha de corte del presente informe, de un total de veintitrés (23) PQR registradas, permanecen abiertas cuatro (4), correspondientes a las PQR Nos. 19 (Comuna 7), 20 (Comuna 19), 21 (Comuna 21) y 23 (Comuna 19).

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

Seguimiento al Informe Mensual N.° 008
* Se reiteró al contratista, mediante el oficio C-T-141-633-2026, la solicitud de respuesta al comunicado C-T-141-607-2026, correspondiente a las observaciones formuladas al Informe Mensual N.° 008, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026. Lo anterior, debido a que, a la fecha de corte del presente informe, el Consorcio MMC 2025 no ha presentado respuesta ni ha remitido la documentación requerida para la subsanación de las observaciones, pese a que esta interventoría otorgó un plazo de tres (3) días hábiles para tal fin.
* Mediante el citado oficio se solicitó nuevamente la atención inmediata de los requerimientos y la remisión de las respuestas punto por punto, garantizando la trazabilidad y concordancia de la información presentada. No obstante, el contratista no informó el estado del proceso de subsanación ni allegó soporte alguno que evidencie el cumplimiento de los requerimientos formulados.
* En consecuencia, esta interventoría procederá con la expedición de la Reiteración N.° 02, dejando constancia del incumplimiento en la atención oportuna de las observaciones formuladas.

Seguimiento en campo
* Durante el recorrido de seguimiento efectuado el 17 de julio de 2026 en el Tramo 62, se identificó personal del subcontratista Cachibí ejecutando actividades de pavimentación. De igual forma, se evidenció personal desarrollando labores de realce y nivelación de cámaras.
* En la inspección de obra se verificó la presencia de la siguiente maquinaria y equipos: pavimentadora, compactador neumático, minicargador y motoniveladora, los cuales se encontraban apoyando las actividades constructivas programadas para la jornada.
* Asimismo, se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), evidenciando la instalación de la señalización temporal correspondiente y la presencia de cuatro (4) auxiliares de tránsito durante la jornada de la mañana, quienes se encontraban regulando la movilidad en el frente de obra de acuerdo con las actividades ejecutadas. No obstante, se evidenció el incumplimiento del PMT aprobado, toda vez que únicamente se encontraban cuatro (4) auxiliares de tránsito en campo, cuando este establece la presencia de cinco (5) auxiliares para la ejecución de las actividades.

RECOMENDACIONES:

1. Cronograma en Ms Project	SÍ	x
2. Registro Fotográfico	SÍ	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI., a los VEINTE (Día en letras) 20 (Día en números) de JULIO (Mes en letras) de 2026 (Año de firma del informe)

(Nombre) Firma del Director de Interventoría

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 36 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

TRAMO 62. CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 - CALZADA NORTE

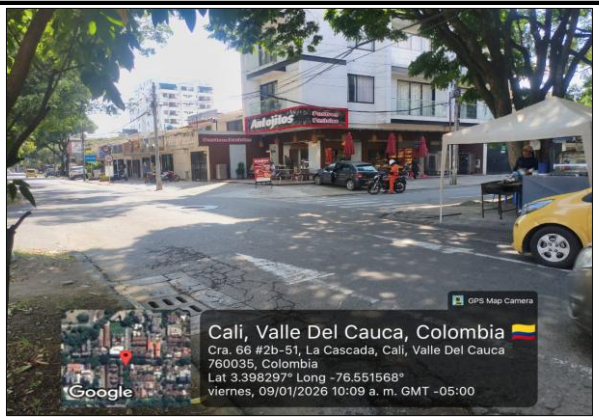

Descripción Foto 1.


Condición inicial del tramo



Descripción Foto 2.


Nivelación de Sumideros (18/07/2026)

TRAMO 62. CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 - CALZADA SUR

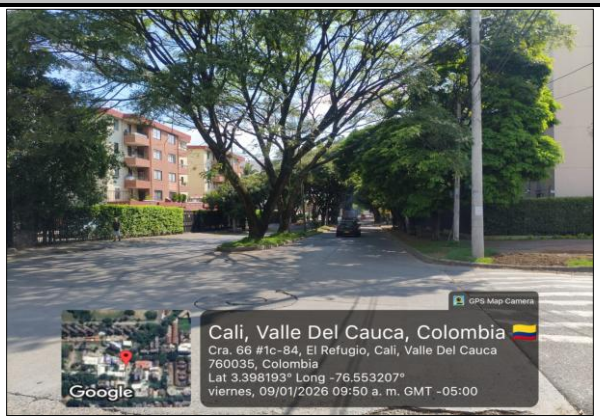


Descripción Foto 3.

Condición inicial del tramo

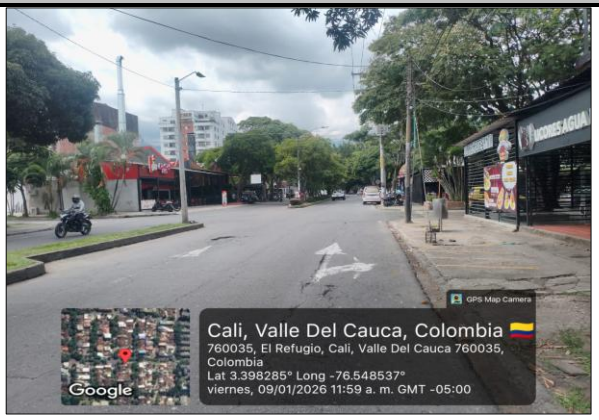

Descripción Foto 4.

Condición inicial del tramo

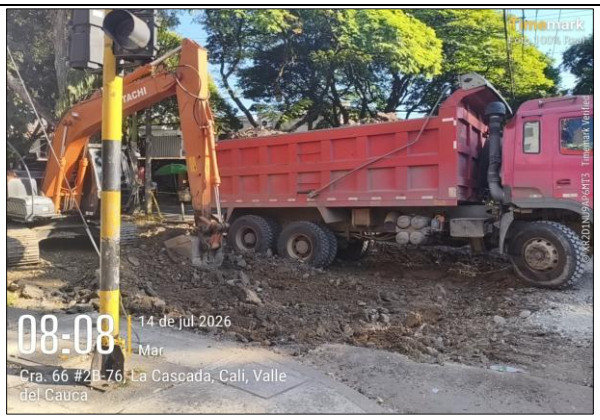

Descripción Foto 5.

Excavaciones (14/07/2026)



Descripción Foto 6.

Instalación de Carpeta Asfáltica (15/07/2026)

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 36 **DEL** 14/07/2026 **AL** 20/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)



Descripción Foto 7.

Toma de Densidades (16/07/2026)



Descripción Foto 8.

Instalación de Carpeta Asfáltica en abscisas K0+375 a K0+708 Calzada completa (17/07/2026)



Descripción Foto 9.

Imprimación de Base Granular en abscisas K0+375 a K0+708 (18/07/2026)



Descripción Foto 10.

Nivelación de Cámaras y Sumideros (20/07/2026)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) (20) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora
