Convenio No.	No. 1889 DE 2025				
Nombre del Representante Legal del municipio	ANGEL SUAREZ MARTINEZ				
Nombre del supervisor y/o interventor	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA				
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE VALENCIA-CÓRDOBA				
Fecha de suscripción del convenio	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**Fecha de inicio del convenio**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**Fecha de terminación del convenio**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Período objeto del informe:	ENERO DE 2026				
Informe número	INFORME 5				

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO		
Ubicación Del Proyecto:	casco urbano, municipio de valencia kra 3 #12-157 lote polideportivo de valencia barrio 6 de enero	
Valor Total Aportes Del Proyecto	**Aportes min – FONSECON**	$ 2.450.000.000
	Aportes entidades públicas	$ 0
Disponibilidad Presupuestal Min interior	no.46325 del 11 de septiembre de 2025	
Compromiso Vigencia Futura	no. 1825 del 11 de septiembre de 2025	
Fecha Del Acta De Inicio Ejecución Del Convenio	29 de septiembre de 2025	
Numero De Póliza Inicial	no. 54047994000036782 de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Fecha De Aprobación De Póliza Inicial	aprobado por carlos arturo sanchez medina 23-09-2025 19:11	
Valores Del Convenio	**valor de estudios y diseños**	$149.827.981
	valor de interventoría estudios y diseños	$84.123.457
	valor de obra	$ 1.846.883.748
	valor interventoría	$ 369.164.814

	valor adicional de obra	Se espera presupuesto final según los estudios y diseños por lo tanto este valor no se conoce a la fecha de este informe

2. DESEMBOLSOS Y VALOR LEGALIZADO DEL CONVENIO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS M/CTE ($490.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	29/10/2025	$ 490.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 612.500.000

TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	45%	DD/MM/AAAA	$ 612.500.000
CUARTO DESEMBOLSO	UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS M/CTE ($490.000.000) contra entrega de los siguientes productos A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%.	80%	DD/MM/AAAA	$ 490.000.000

	C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. D. Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($245.000.000,0) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes	100%	DD/MM/AAAA	$ 245.000.000

	de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE				$ 490.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO MEDIANTE INFORME FINANCIERO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				$ 490.000.000

PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540479940000036782	Cumplimiento	$ 490.000.000	23/09/2025	23/03/2027

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios , Diseños y construcción***

Informe de evaluación	INFORME PRELIMINAR		498 KB	2	30-01-2026 11:13 AM
Documento Adicional	RESOLUCION DE SANEAMIENTO		379 KB	1	29-01-2026 07:02 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA ADENDA 2		387 KB	1	29-01-2026 07:02 PM
Adendas	ADENDA 2		387 KB	1	29-01-2026 06:55 PM
Documento Adicional	RESUMEN		605 KB	1	29-01-2026 06:54 PM
Documento Adicional	ADENDA NRO 1		387 KB	1	21-01-2026 12:04 PM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO DE PROPUESTA		286 KB	1	21-01-2026 12:04 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO Y RESPUESTAS		839 KB	1	16-01-2026 11:05 AM
Documento Adicional	CRONOGRAMA		93 KB	1	07-01-2026 12:18 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	RESOLUCIÓN 005 DE ENERO 07 DE 2026		324 KB	1	07-01-2026 12:18 PM
Documento Adicional	ACUERDO MUNICIPAL 025 DE RATIFICACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS		1.37 MB	1	06-01-2026 11:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 12A Y 12B		308 KB	1	05-01-2026 06:06 PM
Documento Adicional	FORMULARIO NRO 1		230 KB	1	05-01-2026 05:56 PM

Proceso: LP MV 006-2025
Proponente: CONSORCIO CCC VALENCIA

En el marco de la revisión de la Evaluación Preliminar del proceso de Licitación Pública LP MV 006-2025, se realizó el análisis integral de los requisitos habilitantes y criterios de evaluación aplicables al proponente CONSORCIO CCC VALENCIA, identificado como Proponente N° 3.

1. Capacidad Jurídica

De acuerdo con la verificación efectuada, el proponente fue calificado como **NO HABIL** en este componente.

Si bien se evidenció el cumplimiento en la mayoría de los documentos exigidos (Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Único de Proponentes – RUP, certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, garantía de seriedad de la oferta, certificaciones de seguridad social, entre otros), se identificaron las siguientes observaciones:

- En la conformación del proponente plural se registra observación que impide su habilitación jurídica en esta etapa preliminar.

2. Capacidad Financiera y Organizacional

El proponente obtuvo resultado **HABIL**, toda vez que cumple con los indicadores financieros establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, patrimonio y rentabilidad.

Asimismo, la Capacidad Residual fue verificada y reportada como **CUMPLE**, evidenciando suficiencia para asumir la ejecución contractual.

3. Experiencia

En el componente de experiencia el proponente fue calificado como **NO HABIL**, debido a que en uno de los contratos aportados no se logra evidenciar la fecha de terminación del mismo, lo cual constituye un requisito verificable conforme a lo exigido en el proceso y debe ser objeto de subsanación.

No obstante, en términos de cuantía en SMMLV y porcentaje de participación, el proponente cumple con los valores mínimos requeridos.

4. Puntaje de Evaluación

El proponente obtuvo un total de 51,25 puntos en los criterios ponderables, destacándose el cumplimiento en plan de calidad, criterios ambientales, criterio social, industria nacional y vinculación de personas con discapacidad

- ***Contrato de interventoría de Estudios , Diseños y construcción***

Documento Adicional	CRONOGRAMA		105 KB	1	29-01-2026 06:29 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	APERTURA		432 KB	1	29-01-2026 06:29 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DEFINITIVO		8.25 MB	1	29-01-2026 06:28 PM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA		1.29 MB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	CAPACIDAD FINANCIERA		156 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	FORMATO CONFORMACION PROPONENTE PLURAL		129 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION		127 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	LINEAMIENTOS PERSONAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL		33 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	FORMATO DE EXPERIENCIA		392 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA		36 KB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGOS		1.57 MB	1	15-01-2026 05:33 PM
Documento Adicional	AVISO		439 KB	1	15-01-2026 05:26 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.57 MB	1	15-01-2026 05:26 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGOS		8.28 MB	1	15-01-2026 05:26 PM

Ítem	Descripción
Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos Tipo	Sí
Sector	Infraestructura Social – Cultura, Recreación y Deporte
¿Asociado a la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993)
Grupo	[F] Servicios

Segmento	[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801016] Gerencia de proyectos
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Funcionamiento
Cuantía del Proceso	$453.288.271
Moneda	Peso Colombiano (COP)

ETAPA PRECONTRACTUAL

Actividad	Fecha	Medio / Lugar	Soporte Normativo
Publicación aviso de convocatoria	15 de enero de 2026	SECOP	Ley 80/93 art. 30
Publicación estudios y documentos previos	15 de enero de 2026	SECOP	Decreto 1082/2015
Publicación proyecto de pliego	15 de enero de 2026	SECOP	Decreto 1082/2015
Observaciones al proyecto de pliego	Hasta el 22 de enero de 2026	Alcaldía – Secretaría de Obras Públicas / correo institucional	Art. 2.2.1.1.2.1.4 Dto. 1082/15
Manifestaciones de interés para limitar a Mipymes	Hasta el 23 de enero de 2026	SECOP	Decreto 1860/2021
Respuesta a observaciones al proyecto	23 de enero de 2026	SECOP	Decreto 1082/2015
Publicación acto administrativo de apertura	29 de enero de 2026	SECOP	Ley 80/93
Publicación pliego definitivo	29 de enero de 2026	SECOP	Decreto 1082/2015
Audiencia de asignación de riesgos (si aplica)	29 de enero de 2026	Página web Entidad	Decreto 1082/2015
Presentación de observaciones al pliego definitivo	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	SECOP	Decreto 1082/2015
Fecha límite expedición de adendas	Hasta el 3 de febrero de 2026	SECOP	Art. 2.2.1.1.2.2.1 Dto. 1082/15
Cierre del proceso	5 de febrero de 2026 – 8:00 a.m.	Despacho del Alcalde	Pliego de Condiciones
Audiencia de apertura de ofertas	5 de febrero de 2026 – 9:00 a.m.	Entidad	Pliego de Condiciones

ETAPA DE EVALUACIÓN

Actividad	Fecha
Evaluación de ofertas	Del 6 al 10 de febrero de 2026
Publicación informe inicial de evaluación	11 de febrero de 2026
Traslado para observaciones y subsanaciones	Por tres (3) días hábiles
Publicación informe final de evaluación	18 de febrero de 2026
Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	18 de febrero de 2026

ETAPA CONTRACTUAL

Actividad	Lugar	Fecha
Firma del contrato	Despacho del Alcalde – Calle 11 Carrera 15, Segundo Piso – Municipio de Valencia	Fecha definida por la Entidad
Entrega de garantías	Despacho del Alcalde	Fecha definida por la Entidad
Aprobación de garantías	Despacho del Alcalde	Fecha definida por la Entidad

|INFORME DEL SUPERVISOR

1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO

INFORME DE AVANCE

Proyecto: *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo I del municipio de Valencia, Córdoba.*

Convenio: Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025

Celebrado entre: La Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, y el Municipio de Valencia – Córdoba.

Valor total del proyecto: $2.450.000.000

Primer desembolso: $490.000.000

Porcentaje de ejecución del convenio programado: 40%

Porcentaje de ejecución de obra según cronograma : 20%

Porcentaje de ejecución del convenio ejecutado: 25%

Porcentaje de ejecución de obra ejecutado: 0%

Porcentaje de ejecución financiera: 20% solo se ha recibido el primer desembolso

Fecha de suscripción : 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de inicio y terminación convenio :

Número del Contrato	1889 DE 2025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE VALENCIA- CÓRDOBA
Tipo	Otro
Fecha de inicio del contrato:	23/09/2025 7:15:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	22/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

En relación con el avance del convenio, se evidencia que las actividades correspondientes a los componentes de estudios, diseños y construcción presentan un **retraso en su ejecución**, atribuible a situaciones de orden administrativo que afectaron el desarrollo oportuno del proceso licitatorio. No obstante, se tiene previsto subsanar dicho retraso mediante la implementación de un plan de contingencia**,** orientado a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual dentro de los términos establecidos.

Así mismo, dichas circunstancias se encuentran debidamente soportadas, razón por la cual, en caso de ser necesario, se procederá a solicitar los ajustes correspondientes al cronograma **contractual** y, de ser procedente, la prórroga del plazo de ejecución ante el Ministerio del Interior, conforme a la normatividad vigente y a los mecanismos contractuales aplicables.

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0 %
% EJECUTADO DE OBRA	0%

A la fecha, la ejecución física del proyecto no ha iniciado. Actualmente el municipio avanza en los procesos de contrataciones derivados por parte del equipo jurídico, conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior y al Convenio Interadministrativo No. 1889 de 2025.

CORRESPONDENCIA:

Se adjuntan los correos a la carpeta de anexos.

JUSTIFICACION DEL AVANCE

De acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución del convenio, que se contemplaban para el mes de enero de 2026 se debía entregar los estudios, diseños al ministerio del Interior y el inicio de ejecución de Obra .Sin embargo, al realizar el análisis del avance real, se evidencia que estas metas no pudieron ser alcanzadas dentro del periodo programado.

El desarrollo de las fases precontractuales posteriores no avanzó con la misma velocidad requerida para garantizar el cumplimiento de los hitos proyectados a continuación:

MES	sept-25				oct-25				nov-25				dic-25				ene-26			
SEMANA	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ACTIVIDADES																				
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO		■	■																	
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN			■	■																
FIRMA DE ACTA DE INICIO					■															
INCORPORACIÓN DE RECURSOS						■	■	■												
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN							■													
ELABORACIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION								■	■											
CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA										■	■	■	■	■						
CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA										■	■	■	■	■						
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS														■	■					
RECIBO Y CORRECCIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS															■	■				
ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑO AL MINISTERIO DEL INTERIOR																■	■			
EJECUCION DE OBRA																	■	■	■	■

No obstante, es importante precisar que el atraso identificado es **técnicamente recuperable**, dado que se prevé realizar un seguimiento rigurosos y solicitar al contratista el cumplimiento en el tiempo estimado, sin afectar la supervisión integral y obligatoria del proyecto. También se está evaluando la idea debido a los reportes dados por IDEAM sobre la presencia de fenómenos atípicos de realizar

un ajuste al cronograma permiten absorber el desfase inicial desde el mes de noviembre 2025 a enero de 2026

En cumplimiento de la Cláusula Segunda – Obligaciones Contractuales, se deja constancia de que el ajuste requerido en la programación obedeció a los tiempos administrativos necesarios para culminar adecuadamente el proceso de contratación y formalizar la incorporación de la vigencia futura en el presupuesto municipal. Estas actuaciones fueron indispensables para garantizar la seguridad jurídica, financiera y presupuestal del proyecto, asegurando su correcta estructuración antes del inicio de la ejecución.

Conscientes del impacto temporal generado, la administración adoptara de manera inmediata un **Plan de Recuperación con identificación de Ruta Crítica**, mediante el cual se priorizaron actividades estratégicas relacionadas con estudios, diseños y ejecución de obra, con el propósito de compensar el desfase inicial y mantener el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido.

Teniendo en cuenta que el convenio finaliza la última semana de septiembre de 2026 y que la contratación derivada se encuentra en proceso de subsanación de componentes, el margen disponible para las gestiones finales es reducido. En este contexto, podrían presentarse factores externos ajenos al control de la entidad, tales como los tiempos requeridos para la expedición de certificaciones técnicas (RETIE y RETILAP) y los procesos de conexión definitiva del servicio por parte de Afinia, los cuales eventualmente podrían incidir en la programación prevista.

En caso de evidenciarse una afectación objetiva sobre la ruta crítica del proyecto, se realizará la correspondiente evaluación técnica que permita determinar la necesidad de una eventual prórroga, debidamente justificada y sustentada. No obstante, el Municipio reitera su compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, técnicas y financieras necesarias para garantizar la culminación exitosa del proyecto dentro del marco contractual vigente.

INFORMACION CLIMATICA:

Durante el finales del mes enero de 2026 se presentó un incremento inusual de las precipitaciones en el municipio de Valencia, asociado a la influencia de frentes fríos que ingresaron al mar Caribe dentro de la temporada típica comprendida entre diciembre y marzo, según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Aunque enero corresponde climatológicamente a un periodo relativamente seco en el departamento de Córdoba, la interacción de masas de aire frío provenientes del norte con la humedad del mar Caribe generó lluvias persistentes y de intensidad variable, alterando el comportamiento normal del régimen pluviométrico.

Estas condiciones atmosféricas ocasionaron crecientes súbitas en caños y drenajes locales, así como el aumento del nivel del Río Sinú, provocando inundaciones en sectores urbanos y rurales del municipio. Se registraron anegamientos en barrios ubicados en zonas bajas y en áreas cercanas a corrientes hídricas, además de afectaciones en vías terciarias, cultivos y viviendas. La saturación de los suelos redujo significativamente la capacidad de infiltración, incrementando la escorrentía superficial y acelerando los procesos de acumulación de agua.

En el marco de la ejecución contractual, estas condiciones climáticas adversas incidieron directamente en el desarrollo normal de las actividades programadas, especialmente aquellas relacionadas con trabajos de campo, desplazamientos a zonas rurales, inspecciones técnicas, levantamientos topográficos y actividades que requieren condiciones secas del terreno. La persistencia de lluvias, los pronósticos de continuidad emitidos por las autoridades meteorológicas y la necesidad de salvaguardar la integridad del personal técnico obligaron a reprogramar actividades y suspender temporalmente labores operativas. Se deja constancia de que, una vez normalizadas las condiciones climáticas, se adoptaron medidas de ajuste y reprogramación con el fin de mitigar el impacto en los tiempos de ejecución y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

PROYECCIÓN DE AVANCE SEGÚN COMPROMISOS ACORDADOS :


En cumplimiento de la **Cláusula Sexta**, se avanza en el cumplimiento de los requisitos que soportan el **segundo desembolso**, entre ellos el alistamiento del lote y la preparación de los documentos técnicos y administrativos necesarios para la publicación de los procesos de contratación de los **estudios, diseños, ejecución de obra e interventoría**, conforme al cronograma de ejecución establecido.

El SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000), contra entrega de los siguientes productos:

C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.

SUPERVISOR
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA Supervisor Convenio No.1889 de Convenio Alcaldía de Valencia

INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

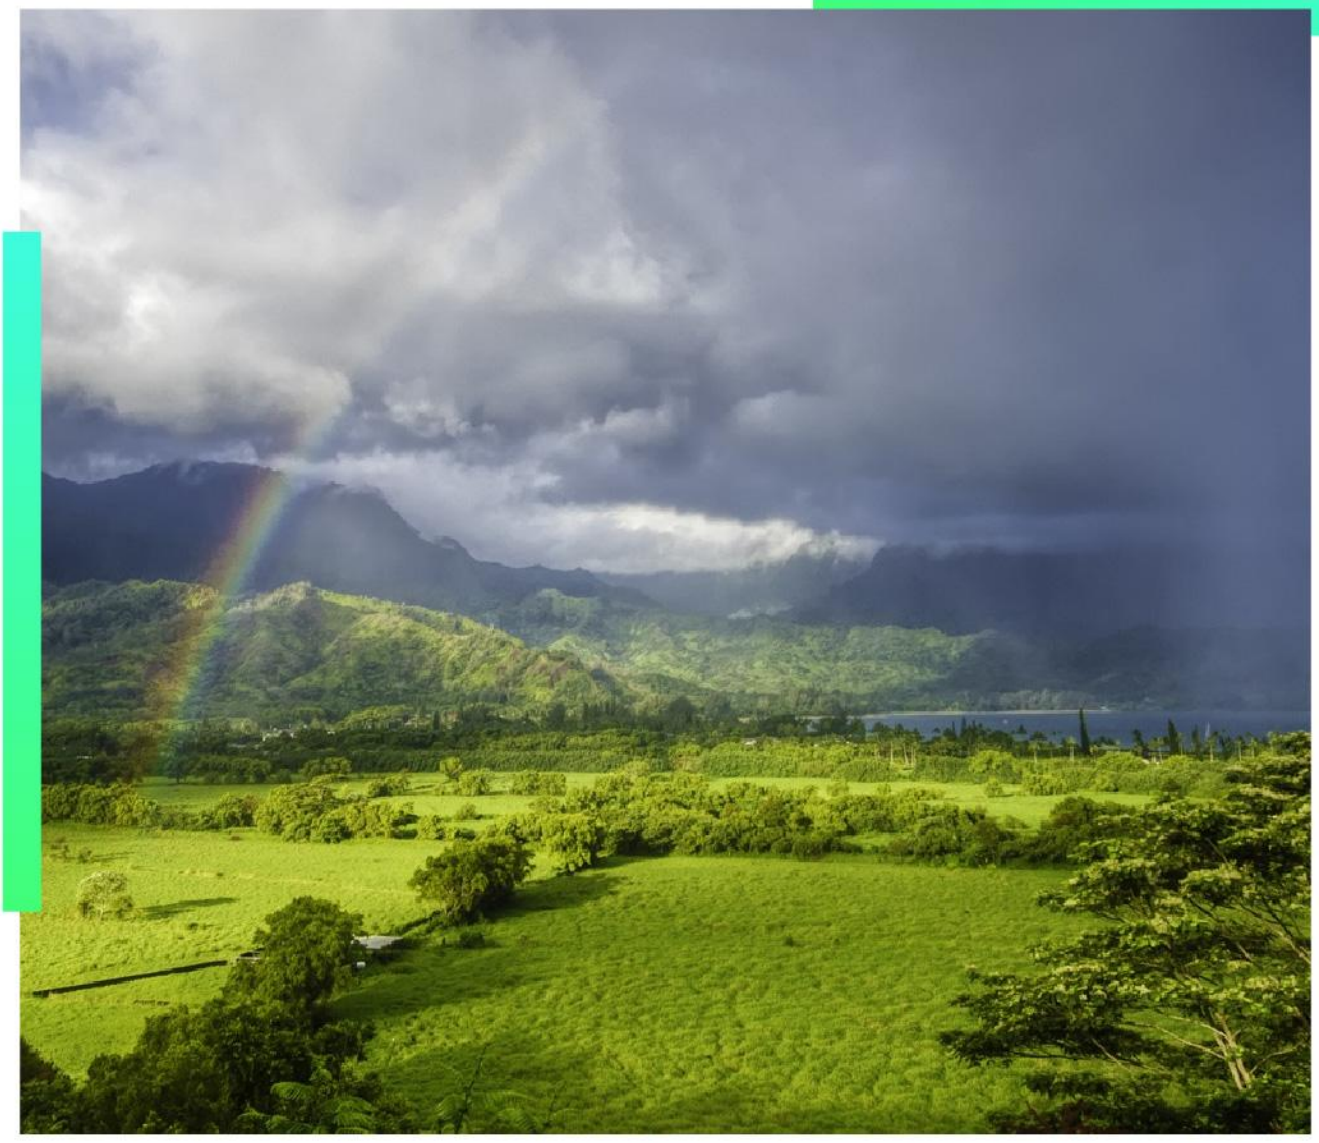

Corto plazo (enero 2026)
Mediano plazo (febrero 2026 y marzo 2026)
Largo plazo (abril, mayo y junio 2026)

Elaboró:
Oscar Julián Guerrero Molina
José Franklyn Ruiz Murcia
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima
Subdirección de Meteorología

Fecha de publicación:

17 de diciembre de 2025

IDEAM

Para referenciar, cítese como: Guerrero, O.J. & Ruiz, J.F., diciembre, 2025: Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima, Subdirección de Meteorología – IDEAM.

RESUMEN

De acuerdo con el reporte del 11 de diciembre de 2025 emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)[1], el pronóstico es favorable para que continúen las condiciones de La Niña durante el próximo mes o dos, con una transición más probable a condiciones neutrales en enero a marzo de 2026, con un 68% de probabilidad. Lo anterior se debe a que:

- Las temperaturas superficiales de la zona centro y este del Océano Pacífico Ecuatorial continuaron ubicándose por debajo de los promedios climatológicos.
- Los valores semanales más recientes del índice del Niño-3.4 estuvieron en -0.5°C, con otras regiones manteniéndose entre -0.4°C y -0.2°C.
- Las anomalías negativas de temperatura subsuperficial se debilitaron levemente (promediadas entre 180°W y 100°W), pero las temperaturas desde la superficie hasta los 200 m de profundidad en la mitad este del Océano Pacífico Ecuatorial se mantuvieron por debajo del promedio.
- En el Océano Pacífico Central se observaron anomalías de vientos del este en niveles bajos de la atmósfera, mientras que a lo largo de la mayor parte del Océano Pacífico Ecuatorial se evidenciaron anomalías de vientos del oeste en niveles altos.
- La convección reforzada persistió sobre Indonesia y la convección suprimida se ubicó cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.
- Los índices tradicional y ecuatorial de oscilación del sur presentaron valores positivos.

Las predicciones climáticas indican que las condiciones débiles de La Niña continuarán en la temporada de diciembre de 2025 a febrero de 2026 con un 54% de probabilidad; sin embargo, para el periodo de enero a marzo de 2026 se favorecerán las condiciones neutrales del ENOS. Pese a esta transición en la temperatura superficial del Océano Pacífico Ecuatorial, las condiciones de La Niña podrían mantener cierta influencia residual durante el periodo de enero a marzo de 2026.

Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climáticas del país durante el próximo semestre estén determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del año, las fluctuaciones asociadas a la oscilación de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales; así como, por la evolución de la fase fría del ENOS en lo que resta de 2025 y su tránsito a condiciones neutrales a inicios del 2026.

En cuanto a la precipitación, en enero de 2026 predominarían condiciones cercanas a los promedios climatológicos en gran parte del país, con incrementos leves a moderados en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el sur de la región Caribe, sectores de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y el sur de la Amazonía, donde se estiman cambios del 10% al 20% en zonas puntuales. Por otro lado, no se esperan variaciones significativas en el norte del Caribe y amplias áreas de la región Pacífica; sin embargo, se identifican déficits en el sur del Chocó, occidente de Nariño, el centro de la Orinoquía y el norte de Vaupés, con reducciones entre 10% y 30%. (ver Fig. 2a).

Para el trimestre consolidado de enero a marzo de 2026, se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con condiciones cercanas a los promedios climatológicos en amplias zonas del país. Se estiman incrementos en la región Andina y sectores de la región Pacífica, mientras que se proyectan déficits en áreas de la región Caribe y la Orinoquía. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Amazonía se presentarían variaciones leves, cercanas a los promedios climatológicos de referencia. (Para ver la predicción detallada mes a mes, dirigirse a la sección 2).

A más largo plazo, para el trimestre de abril a junio de 2026, se prevé que la precipitación se mantenga en general cercana a los promedios climatológicos, con mayor probabilidad de incrementos en la región Andina y sectores de la Orinoquía, mientras que se podría presentar déficits en áreas del Caribe, Pacífico sur y la Amazonía. En conjunto, las variaciones esperadas serían moderadas.

Respecto a la temperatura media del aire, para el semestre de enero a junio de 2026 se estiman anomalías positivas hasta de 1.5 °C, especialmente de abril a junio de 2026 en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Para enero las condiciones de temperatura se mantienen cerca de las condiciones climatológicas promedio (ver Fig. 3).

Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente y son difundidas entre los días 16 y 22 de cada mes, en función de la actualización de las predicciones dadas por el Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portal: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml.

[1] NOAA CPC/NCEP/NWS (2025). *EL NIÑO/SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) DIAGNOSTIC DISCUSSION*. Disponible en: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf

CONDICIONES ESPERADAS DE OCÉANO-ATMÓSFERA

El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) correspondiente al trimestre septiembre-noviembre de 2025 registró un valor de -0.6 °C, lo que indica que durante ese periodo se presentaron condiciones asociadas a La Niña. No obstante, es importante tener en cuenta que el fenómeno de La Niña se declara si las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental se mantienen por debajo de -0.5°C durante al menos cinco trimestres consecutivos.

Según el consenso oficial del Centro de Predicción Climática de la NOAA (NOAA-CPC), se favorece el desarrollo de condiciones La Niña entre los trimestres noviembre 2025 – enero 2026 (probabilidad superior al 80%) y diciembre 2025 – febrero 2026 (probabilidad cercana al 55%) con una transición a una fase neutral del ENOS a partir del trimestre enero-marzo 2026 con una probabilidad cercana al 70%.

En coherencia con lo anterior, el ensamble MME de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta para enero de 2026 temperaturas superficiales del mar en el centro de la cuenca del océano Pacífico tropical por debajo de lo normal, a niveles de La Niña, mientras que para el periodo de marzo a junio se esperan valores cercanos a los promedios climatológicos. El resto de los océanos mantendrían predominantemente anomalías con valores positivos, tal como se muestra en la Figura 1.

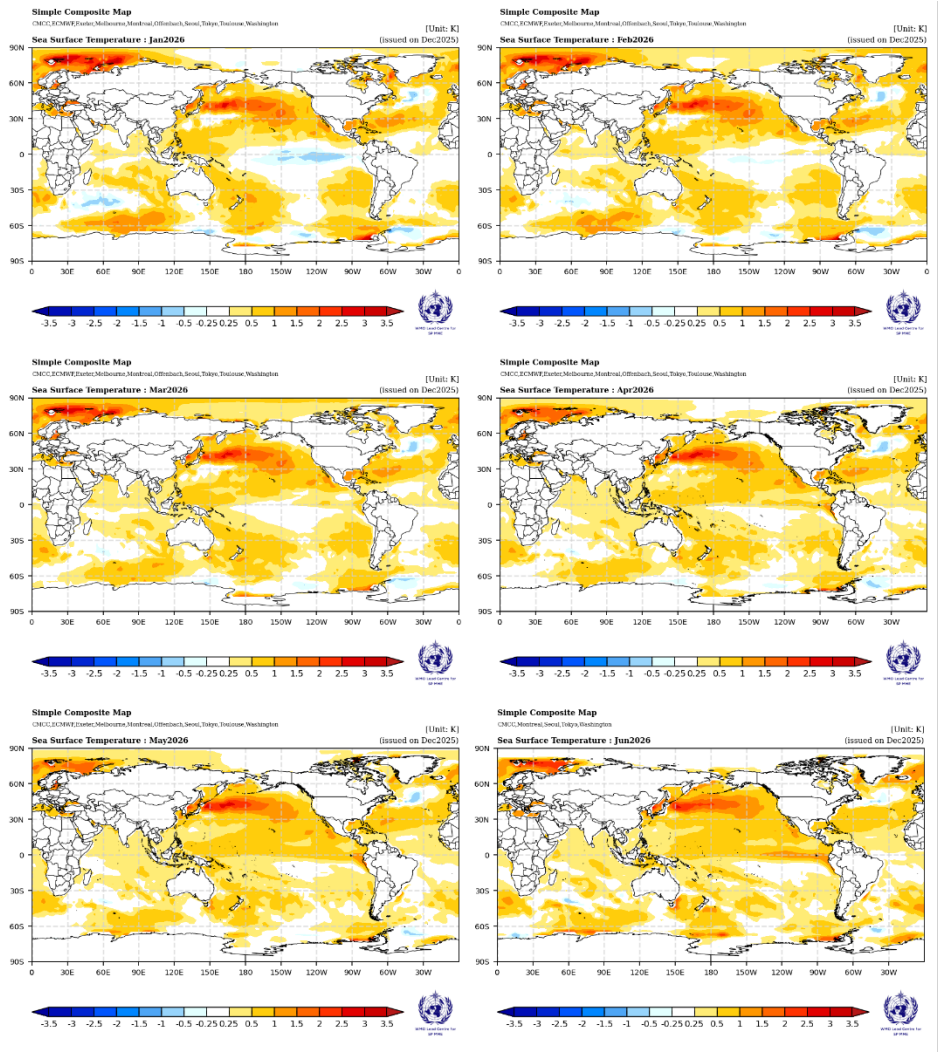


Figura 1. *Anomalía de la temperatura superficial del mar (K) pronosticada con MME para el periodo comprendido entre enero de 2026 y junio de 2026 emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).*

PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA

El pronóstico presentado en esta sección se basa en una reducción de escala dinámico-estadística, utilizando como variable explicativa (o potencial predictor) los datos de precipitación del conjunto de modelos globales que integran el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (o predictando), se emplean datos de precipitación provenientes de fuentes como CHIRPS, ERA5, la Data Library de IRI-Colombia y estaciones meteorológicas nacionales.

La predicción climática mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2c. A continuación, se describen los resultados en términos de cambio porcentual (y la anomalía) respecto a la climatología de referencia:

Enero

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre 7 mm y 10 mm por encima de los promedios climatológicos, representando un cambio cercano al 10%.
Región Caribe: Para el sur de la región se esperan precipitaciones cercanas a 7 mm por encima de los promedios climatológicos, representando cambios entre el 10% y el 20%. En el departamento de La Guajira, norte de Cesar, Magdalena y Atlántico no se esperan cambios significativos.
Región Andina: Se esperan cambios porcentuales en los volúmenes de precipitación menores a 10% con respecto a la climatología de referencia 1991–2020, con incrementos en algunas zonas cercanos a 7 mm.
Región Pacífica: Se estiman cambios porcentuales menores a 10% en relación con los promedios climatológicos. En términos absolutos, se pronostican incrementos menores a 10 mm en gran parte de la región, excepto algunas regiones en el sur del Chocó y occidente de Nariño donde se esperan déficits menores a 10%.
Orinoquía: En esta región los cambios son variados, con precipitaciones por encima de la normal climatológica en el oriente de Casanare y Meta, así como el nororiente de Vichada, con cambios entre 10% y 20%. Por otra parte, en la zona central de la región se pronostican déficits entre 20% y el 30% representando disminuciones entre 10 mm y 25 mm.
Amazonía: Se esperan incrementos de precipitación cercanos al 10% en la parte sur de la región, representando aumentos en los volúmenes entre 10 mm y 50 mm, particularmente para el departamento de Amazonas y sur de Vaupés. Por otro lado, se pronostican déficits de precipitación entre 20% y 30% al norte de Vaupés y alrededor del 10% al noroccidente de Guainía.

Febrero

San Andrés y Providencia: No se esperan cambios significativos en los volúmenes de precipitación con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020.
Región Caribe: Se pronostican déficits de precipitación en gran parte de la región con respecto a los promedios climatológicos, representando volúmenes cercanos a 10 mm. Se destacan en este comportamiento el oriente de Magdalena, centro y sur del Cesar y sur de Bolívar.
Región Andina: En general, se esperan disminuciones en los niveles de precipitación, destacándose Norte de Santander con disminuciones entre 30% y 40% y, en menor medida los demás departamentos con reducciones que oscilan alrededor de 10%. En términos de volúmenes, se pronostican déficits entre 10 mm y 25 mm.
Región Pacífica: Para esta región, en términos porcentuales, se prevé un comportamiento cercano a los promedios climatológicos 1991-2020. En cuanto a los volúmenes, las tendencias son mixtas con incrementos localizados predominantemente en la región oriental cerca al Océano Pacífico y déficits en el oriente del Chocó, los cuales son menores en relación con los volúmenes de precipitación característicos de esta zona.
Orinoquía: Se espera que los niveles de precipitación disminuyan en gran parte de la región, particularmente al norte y al oriente con déficits entre el 30% y el 60%, lo que representa reducciones en volumen entre 10 mm y 60 mm. Esto es especialmente destacado en el norte y oriente de Meta, Casanare, Arauca y el occidente de Vichada.
Amazonía: En términos porcentuales se proyectan condiciones alineadas con los promedios climatológicos 1991-2020, con incrementos y déficits de precipitación que no superan el 10%. Respecto a los volúmenes, en valores absolutos, estos no superan los 25 mm. Como áreas destacadas se prevén reducciones en las magnitudes mencionadas en el oeste del departamento de Amazonas y norte de Vaupés, e incrementos en el centro de Putumayo.

Marzo

San Andrés y Providencia: Se pronostican incrementos leves en los volúmenes de precipitación con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, los cuales son cercanos al 10% y representan un volumen de alrededor de 7 mm.

Región Caribe: De manera predominante se observan disminuciones en los niveles de precipitación en gran parte de la región con volúmenes entre 25 mm y 50 mm, correspondiendo a déficits cercanos al 50%. En este comportamiento se destacan los departamentos de Córdoba, Cesar, Sucre, norte de Magdalena y sur de Bolívar. Por otro lado, se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos en el norte de La Guajira.
Región Andina: En una parte considerable de la región se pronostica que la precipitación se presente por encima de lo normal con porcentajes de incremento entre el 20% y el 40% y volúmenes entre 10 mm y 75 mm. Se exceptúa de este comportamiento el oriente de Antioquia y el norte del departamento de Santander, donde se pronostican déficits cercanos al 20% en volúmenes entre 25 mm y 50 mm.
Región Pacífica: Para esta región el comportamiento es mixto, con déficits pronosticados de precipitación en el norte del departamento de Chocó en porcentajes entre el 40% y el 50% correspondiendo a volúmenes entre 50 mm y 150 mm. Otras zonas con menores grados de disminución respecto a los promedios climatológicos son el sur del departamento del Chocó, norte de Cauca y occidente de Nariño con porcentajes entre el 10% y el 30% representando reducciones entre 10 mm y 50 mm. Por otro lado, se pronostican incrementos de precipitación en un área significativa del Valle del Cauca y Cauca, con porcentajes entre el 10% y el 30% y volúmenes entre 10 mm y 50 mm.
Orinoquía: Se prevé un comportamiento cercano a los promedios climatológicos en gran parte de la región, con incrementos y disminuciones que no superan el 10%. Los aumentos pronosticados de precipitación se localizan en el departamento de Vichada, centro de Casanare y oriente del Meta con volúmenes entre 10 mm y 25 mm. Por su parte, las disminuciones se pronostican al occidente de la Sierra de la Macarena, sureste de Guaviare y oriente del Meta con volúmenes cercanos a los 10 mm.
Amazonía: De forma general se pronostican condiciones cercanas a los promedios climatológicos 1991-2020 con incrementos y déficits que no superan el 10% y cambios en los volúmenes, en valores absolutos, de 25 mm. Como excepción, se encuentra el centro del departamento de Putumayo, donde el déficit de precipitación mensual puede alcanzar los 50 mm.

Es importante tener en cuenta que, a más largo plazo, particularmente para el trimestre de **abril a junio de 2026**, las predicciones suelen presentar mayores niveles de incertidumbre. Por ello, deben considerarse como una referencia preliminar y no como una proyección definitiva.

Las predicciones se actualizan mensualmente, ya que tanto las condiciones iniciales como los forzantes utilizados por los modelos globales cambian mes a mes, lo que permite ajustar las proyecciones nacionales en función de dichos cambios.

Abril

San Andrés y Providencia: Se esperan déficits de precipitación entre 10% y 20%, con volúmenes cercanos a los 10 mm.
Región Caribe: Se pronostican tendencias mixtas de incremento y de disminución de los volúmenes de precipitación con respecto a los promedios climatológicos 1991 – 2020. Los aumentos se prevén en áreas del norte del Cesar, sur de Bolívar, norte de Sucre y oriente de Córdoba con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 30% y volúmenes entre 25 mm y 50 mm. Por su parte, los déficits muestran porcentajes hasta el 40% y reducciones de hasta 50 mm, especialmente en el departamento de Córdoba.
Región Andina: El pronóstico muestra un comportamiento mixto con porcentajes de incremento y de disminución de la precipitación que no superan el 10%, con excepción del área cercana al páramo de Sumapaz, donde hay una probabilidad cercana al 70% de que la precipitación se presente por debajo de los promedios climatológicos, con un porcentaje de disminución cercano al 30%, representando un déficit entre 25 mm y 50 mm. En cuanto a incrementos, como caso particular se destaca una gran parte de la extensión del departamento de Boyacá.
Región Pacífica: Se prevén tendencias de incremento y de disminución en la región con porcentajes que no exceden el 10%, con excepción del extremo norte del departamento de Chocó, donde el porcentaje de descenso llega a 30%. En términos volumétricos, se esperan déficits hasta de 75 mm en gran parte del departamento de Chocó, oriente de Cauca y occidente de Nariño, e incrementos cercanos a 250 mm en la costa pacífica del Valle del Cauca.
Orinoquía: En gran parte de la región se pronostican condiciones cercanas a la climatología de referencia 1991-2020 con porcentajes de variación que no superan el 10%. Se esperan déficits de hasta 50 mm en el centro de Casanare, Meta y sur de Vichada y, de forma excepcional, incrementos máximos de 150 mm en el piedemonte llanero del Meta.
Amazonía: En gran parte de la región se pronostica una tendencia de disminución de los niveles de precipitación con porcentajes que oscilan entre 20% y 30% con déficits entre 10 mm y 75 mm, particularmente en el norte de Vaupés. Como excepción, se prevé un incremento de precipitación en un área destacada de Putumayo hasta 100 mm.

Mayo

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitación cercanos a los promedios climatológicos 1991-2020, con variaciones que no superan el 10%, correspondiendo a máximo 10 mm.
Región Caribe: En general, en términos de porcentajes, se pronostican variaciones (incrementos y disminuciones) de la precipitación menores a 10% con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, con volúmenes que, en términos absolutos, no superan los 25 mm. Se exceptúa el norte de La Guajira, donde la disminución puede alcanzar hasta un 70%; no obstante, considerando las condiciones climatológicas de este departamento, estas reducciones no superan los 75 mm.
Región Andina: A nivel general, se proyectan variaciones de los niveles de precipitación menores a 10% en gran parte de la región, con incrementos hasta de 75 mm y déficits hasta de 50 mm, particularmente en Santander y en Norte de Santander. Por otro lado, se pronostican incrementos en áreas puntuales de los departamentos de Caldas, Huila y Tolima con volúmenes cercanos a 100 mm, así como un déficit cercano al 10%, hasta 75 mm, alrededor del Páramo de Sumapaz.
Región Pacífica: Las mayores reducciones de los volúmenes de precipitación se pronostican en el norte del Valle del Cauca, con reducciones cercanas a 30% (hasta 100 mm) respecto a los promedios climatológicos y, en menor medida, en algunas áreas del departamento de Chocó con déficits hasta de 20% (hasta 200 mm). Por otro lado, en el sur de Valle de Cauca, Cauca y Nariño se estiman incrementos entre 10% y 20% con volúmenes entre 50 mm y 400 mm; este último incremento se localiza en el municipio de López de Micay, el cual ha presentado volúmenes de precipitación significativos.
Orinoquía: Se prevén variaciones cercanas al 10% en gran parte de la región, con incrementos generalizados en la zona occidental (Arauca, Casanare, Meta y occidente de Vichada), representando volúmenes de hasta 150 mm, y reducciones al oriente de Vichada y suroriente de Meta, con volúmenes entre 10 mm y 100 mm.
Amazonía: Para gran parte de la región se espera que la precipitación presente un comportamiento cercano al promedio climatológico 1991-2020, con variaciones cercanas al 10%, lo que implica incrementos de hasta 100 mm y reducciones de hasta 200 mm. Los mayores déficits fueron observados al norte de Vaupés y los mayores incrementos en el límite entre Amazonas y Putumayo.

Junio

San Andrés y Providencia: Se pronostican condiciones de precipitación cercanas a los promedios climatológicos 1991-2020.
Región Caribe: Para esta región las tendencias son mixtas con zonas con porcentajes de incremento y disminución de la precipitación respecto a los promedios climatológicos, los cuales no superan el 10% en términos generales. Como excepción, se encuentra la Alta Guajira donde el déficit de precipitación es cercano al 30%; no obstante, es importante tener en cuenta que, en términos climatológicos, los niveles de precipitación en esta zona son relativamente bajos.
Región Andina: En el centro y sur de la región existe una probabilidad entre 45% y 70% de que la precipitación se presente por encima de los promedios climatológicos, con incrementos entre 10% y 60%, estos últimos más destacados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y, puntualmente, Norte de Santander. Para el norte de la región, particularmente Antioquia, el Eje Cafetero y Santander, se esperan condiciones más cercanas a los promedios climatológicos.
Región Pacífica: Para el sur de la región se espera que la precipitación se presente por debajo de los promedios climatológicos con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 50% e incrementos volumétricos entre 10 mm y 200 mm. En Chocó y Valle del Cauca se espera un comportamiento cercano a los promedios climatológicos 1991-2020.
Orinoquía: De forma probabilística, para toda la región se prevé que la precipitación presente un comportamiento cercano a los promedios climatológicos 1991-2020 con incrementos y déficits que no superan el 10%.
Amazonía: En general, se estiman condiciones cercanas a los promedios climatológicos en gran parte de la región, con excepción del norte de Vaupés, centro de Putumayo y el trapecio amazónico, donde se esperan déficits cercanos al 30% correspondiendo a volúmenes entre 50 mm y 100 mm.

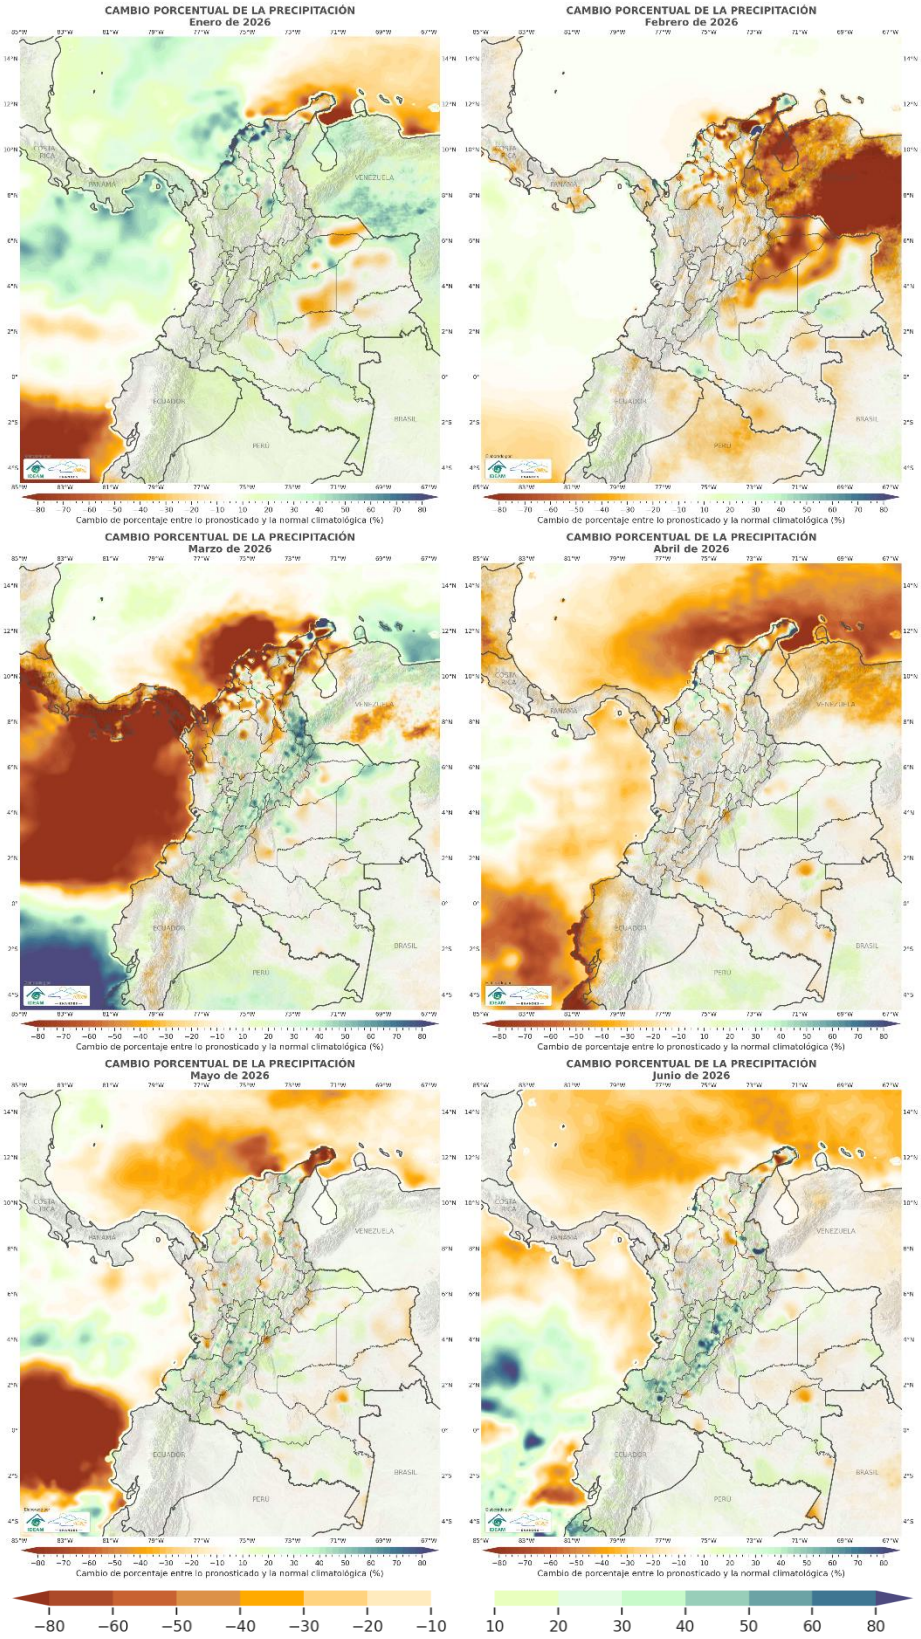


Figura 2a. *Pronóstico del cambio de porcentaje (%) de la precipitación con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre enero y junio de 2026.*

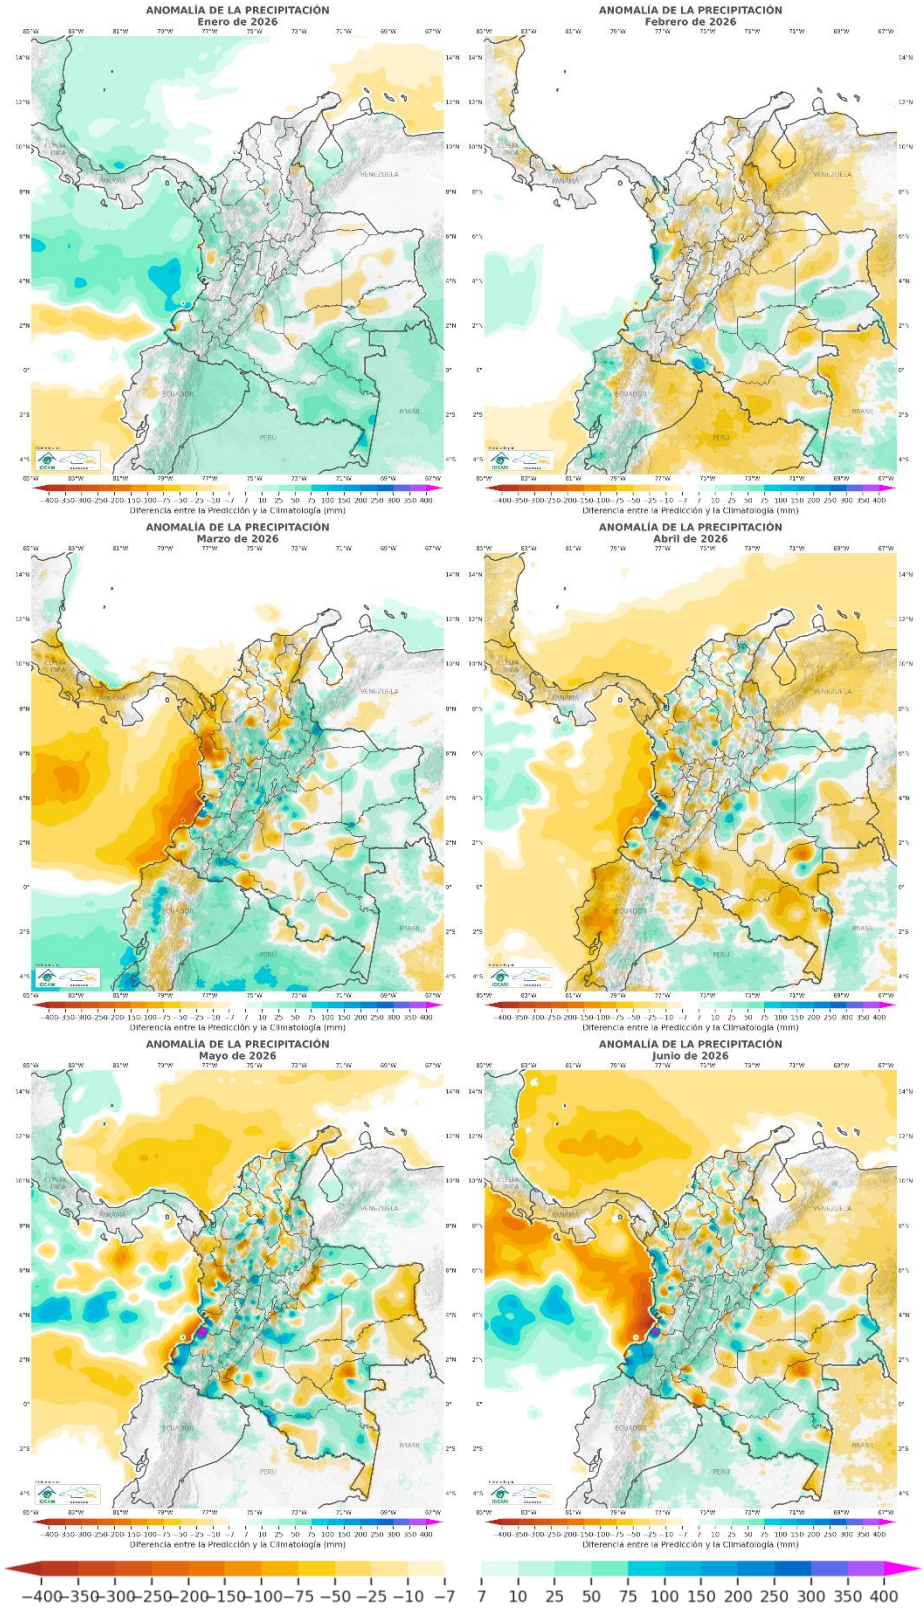


Figura 2b. *Pronóstico de la anomalía de la precipitación (mm) con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre enero y junio de 2026.*

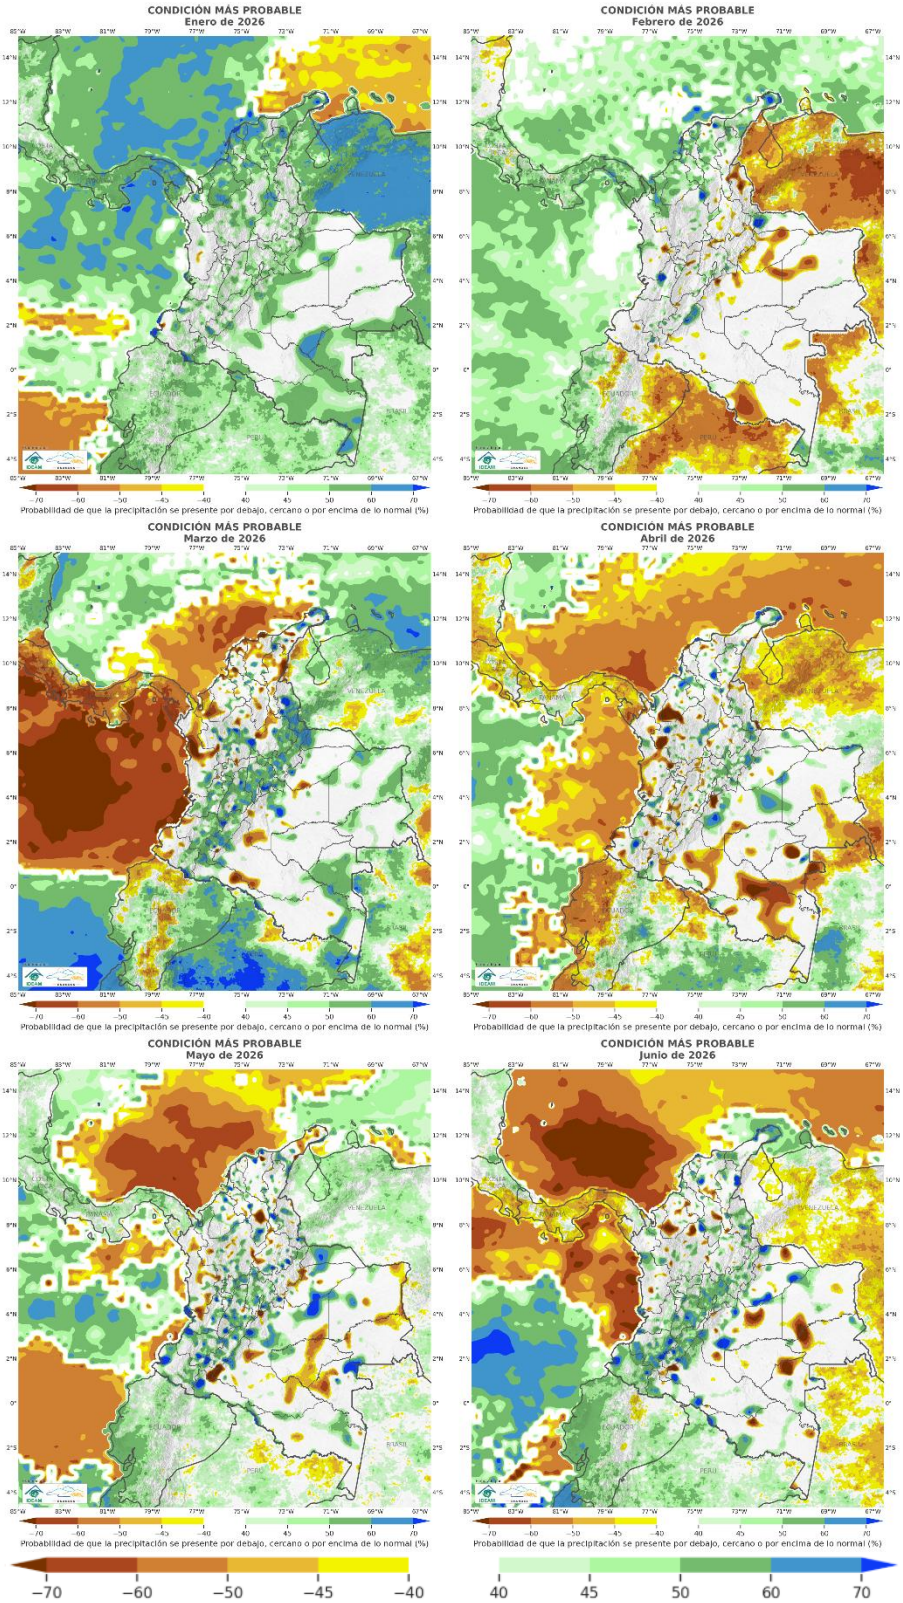


***Figura 2c**. Pronóstico de la de la condición más probable (%) con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre enero y junio de 2026. (Tonalidades Cafés-Amarillos: Probabilidad de que la precipitación se presente por debajo de lo normal. Verdes-Azules: Probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal. Blanco: Probabilidad de que la precipitación se presente cercano a lo normal).*

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN COLOMBIA

Con base en la reducción de escala dinámico-estadística realizada por el IDEAM, que utiliza como variable explicativa (o potencial predictor) los datos de temperatura del conjunto de modelos globales del ensamble norteamericano NMME (de la NOAA), y como variable a explicar (o predictando) los datos de temperatura del aire provenientes de fuentes como la Data Library – Colombia y estaciones meteorológicas nacionales, se estima que para el próximo semestre (enero de 2025 a junio de 2026) se presenten anomalías positivas de temperatura hasta de 1.5 °C, particularmente para el trimestre de abril de 2026 a junio de 2026 en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Para enero de 2026 las condiciones de temperatura se mantienen cerca de las condiciones climatológicas promedio del periodo 1991 – 2020, mientras que para febrero de 2026 se pronostican incrementos en la Orinoquía y en el occidente de Caquetá, (ver Fig. 3).

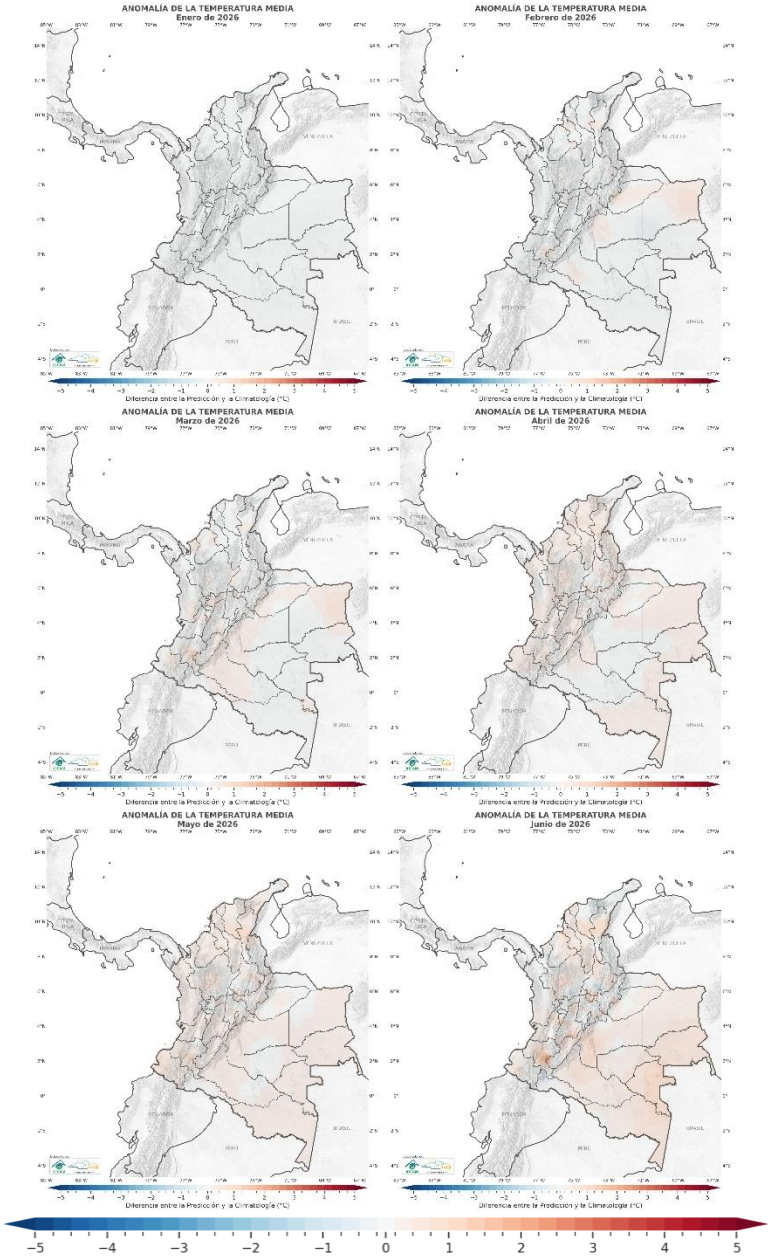


Figura 3. *Pronóstico de la anomalía de la temperatura media (°C) para el período comprendido entre enero y junio de 2026.*

BIBLIOGRAFÍA

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M. et al. *The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes*. Sci Data 2, 150066 (2015). Recuperado de: https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66.

International Research Institute for Climate and Society – IRI (2020). *Seasonal Climate Forecast*. New York, EU. Recuperado de: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/

Kirtman, B. P., Min, D., Infanti, J. M., Kinter, J. L., III, Paolino, D. A., Zhang, Q., van den Dool, H., Saha, S., Mendez, M. P., Becker, E., Peng, P., Tripp, P., Huang, J., DeWitt, D. G., Tippett, M. K., Barnston, A. G., Li, S., Rosati, A., Schubert, S. D., Rienecker, M., Suarez, M., Li, Z. E., Marshak, J., Lim, Y., Tribbia, J., Pegion, K., Merryfield, W. J., Denis, B., & Wood, E. F. (2014). *The North American Multimodel Ensemble: Phase-1 Seasonal-to-Interannual Prediction; Phase-2 toward Developing Intraseasonal Prediction*. Bulletin of the American Meteorological Society, 95(4), 585-601. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00050.1

Martínez Pedraza, Alexander & Serna Cuenca, Julieta (2018). *Propuesta de umbrales de normalidad basada en las funciones de distribución de las series de datos y análisis de eventos de extremos para las variables meteorológicas: precipitación, número de días con lluvia y la temperatura mínima, media y máxima*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Subdirección de Meteorología. NOTA TÉCNICA DEL IDEAM. IDEAM–METEO/002-2018. Bogotá – Colombia. Recuperado de: http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2018/NT_IDEAM-001-2018.pdf

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA (2025). *NMME Monthly Forecasts for International Regions*. Maryland, EU. Recuperado de: https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/International/nmme/

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA: National Weather Service – Climate Prediction Center (2025). *Cold & Warm Episodes by Season*. Recuperado de: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA: National Weather Service – Climate Prediction Center (2025). *El Niño/Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) discusión diagnóstica*. Recuperado de: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.shtml

World Meteorological Organization: WMO Lead center for Long-Range Forecast Multimodel Ensemble (2025). *Probabilistic MME*. Géneve, Switzerland. Recuperado de: https://www.wmolc.org/seasonPmmeUI/plot_PMME

Ruiz Murcia, Franklyn & Melo Franco, Jeimmy (2020). *Aspectos Metodológicos de la Predicción Climática Mensual de la Precipitación en Colombia*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Subdirección de Meteorología. NOTA TÉCNICA DEL IDEAM. IDEAM–METEO/001-2020. Bogotá – Colombia. Recuperado de: http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2020/NT_001_2020.pdf

Ruiz Murcia, J. F. y Melo Franco, J. Y. (2025). *Habilidad predictiva de los modelos de la NOAA para predecir la precipitación en Colombia*. Ideam. ISBN: 978-958-5489-41-7. Publicación aprobada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Junio de 2025, Bogotá, D. C., Colombia. Recuperado de: https://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2025/HabilidadNOAA_V3%20publicado.pdf

Directivos:
GHISLIANE ECHEVERRY PRIETO
Directora General

DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

Autores:
OSCAR JULIÁN GUERRERO MOLINA
JOSÉ FRANKLYN RUIZ MURCIA
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima
Subdirección de Meteorología

Edición
Jeimmy Melo
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima

Diagramación
Grupo de Comunicaciones

http://www.ideam.gov.co
Calle 25 D # 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: 3527160 ext. 1411 - 1412.

We're Responding: Phillipines Tropical Storm | Colombia Flooding

STATUS Crisis Alert **DATE** February 10, 2026 **REGION** Colombia

Colombia Flooding

Severe flooding caused by heavy rainfall and overflowing waterways in northern Colombia has affected more than 40,000 families, with flooded roadways isolating communities. Conditions are expected to worsen in the region with additional rain in the forecast.

A cold front that began to impact the region on Jan. 31, 2026, triggered more than 100 emergencies across 80 municipalities. Large areas of the Córdoba department remain submerged and rising waterways — including the Sinú River — threaten additional flooding. In the hardest hit areas, families are seeking refuge in temporary shelters.

In response, Americares deployed an emergency response team to support survivors and address the most urgent health needs in Canalete, Los Córdobas and Puerto Escondido, where access to clean water is critical.

An ASPEN water purification unit will be deployed across 10 communities in Canalete, Puerto Escondido and Los Córdobas to provide an immediate source of safe drinking water for local residents. At the same time, the emergency response team is working to install a potable water distribution tank in each of these 10 communities to help ensure reliable access to clean water for more than 1,000 families, with installations already underway at several sites.

In addition, the emergency response team will be distributing water purification kits to support 5,600 families for 60 days. The team is also working in coordination with local health authorities to procure and deliver 1,000 hygiene kits to help families protect their health during this difficult time.



Donate Now

Stay Informed

First Name * **Last Name** **Email *** **Mobile Number**

YourEmai

(555) 55

I wish to receive SMS accounts updates, promotional and donate messages from Americares Alerts. Message frequency varies. Text HELP to 37059 for help, Text STOP to 37059 to end. Msg&Data Rates May Apply. By opting in, I authorize Americares to deliver SMS messages using an automatic telephone dialing system and I understand that I am not required to opt in as a condition of purchasing any property, goods, or services. By leaving this box unchecked you will not be opted in for SMS messages at this time. Click to read Terms and Conditions and Privacy Notice

SIGN M

By providing your email and/or mobile number, you are agreeing to receive communications from Americares including news of our work, success stories, emergency updates and ways to get involved. View our Privacy Notice.

americaresMAKE A

Americares
Good Health, Better World

88 Hamilton Avenue,
Stamford, CT 06902
Inquiries: (203) 658-9500
Donations: (800) 905-1082
info@americares.org

DONATION

Your generous gift today will help get lifesaving medical care and training to families and communities in need.

Donate Now

WE ARE A TRUSTED CHARITY



More than 98% of our resources support health programs.

LEARN MORE →

CONTACT

- Our Offices and Locations
- Contact Us
- Report Misconduct
- Careers

ABOUT

- We are a Trusted Charity
- Our Core Values
- Privacy Notice
- Annual Reports and Financials
- Make a Donation

MEDIA

- Frequently Asked Questions
- News and Press Releases
- Newsletters
- Media Center

Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram

Americares is approved by the Internal Revenue Service as a 501 (C) (3) tax-exempt organization, and all donations are tax

deductible to the extent provided by law. Americares Federal Identification Number (EIN) is 061008595. Americares.org websites created, owned & operated by Americares Foundation. Stamford CT. We use cookies to help improve your experience. You can learn more by reading our Privacy Notice. By continuing to use our Site you agree to the terms of our policy. View Privacy Notice, Terms of Use and View legal disclosures

© 2026 Americares. All Rights Reserved.

Gmail **obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co>**

Respuesta a radicado No. 2026-2-003122-000631 – ID 688087.Traslado por competencia – Convenio Interadministrativo No. 1889 de 2025 – Municipio de Valencia (Córdoba).

obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co> 28 de enero de 2026 a las 11:11
Para: Viterbo.gomez@mininterior.gov.co, kelly.petro@mininterior.gov.co

Buenos dias;

Cordial saludo;

En atención al traslado por competencia relacionado con la solicitud presentada el 08 de enero de 2026 por la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión, y conforme a lo comunicado por el Ministerio del Interior mediante radicado No. 2026-2-003122 000631 – ID 688087, respecto del Convenio Interadministrativo No. 1889 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Valencia – Córdoba, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo I del municipio de Valencia – Córdoba”, el Municipio de Valencia – Córdoba, remite respuesta al presente oficio.

ANEXOS.zip

OI-OP-018-2026.pdf

--
Despacho Secretaría de Obras Publicas e Infraestructura
Alcaldía de valencia
Dirección: Palacio Municipal Calle 11 carrera 15
Email: obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co

Gmail **obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co>**

INFORME No.4 del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025

obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co> 27 de enero de 2026 a las 16:30
Para: kelly.petro@mininterior.gov.co, Viterbo.gomez@mininterior.gov.co

Buenos días;

Doctora:

Kelly Petro
Supervisor Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025
Ministerio del Interior – FONSECON
Bogotá

Adjunto informe 4 del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025

Por medio de la presente se remite el segundo informe del mes de DICIEMBRE

nota: los extractos bancarios tienen como clave 800096808

--

Despacho Secretaría de Obras Publicas e Infraestructura
Alcaldía de valencia
Dirección: Palacio Municipal Calle 11 carrera 15
Email: obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co

2 adjuntos

INFORME EJECUCION DIC DE 2025 (1).pdf
748K

ANEXO INFORME MINISTERIO.zip
4118K

Gmail **obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co>**

INFORMES FINANCIEROS del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025

obraspublicas @valencia-cordoba.gov.co <obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co> 28 de enero de 2026 a las 16:33
Para: hacienda hacienda <hacienda@valencia-cordoba.gov.co>

Buenas tardes:

Enviamos informes financieros del mes de octubre, noviembre y diciembre diligenciados para aprobación y firma del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1889 de 2025

--
Despacho Secretaría de Obras Publicas e Infraestructura
Alcaldía de valencia
Dirección: Palacio Municipal Calle 11 carrera 15
Email: obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co

3 adjuntos

FORMATO INFORME FINANCIERO MININTERIOR OCTUBRE .xlsx
48K

FORMATO INFORME FINANCIERO MININTERIOR NOVIEMBRE .xlsx
48K

FORMATO INFORME FINANCIERO MININTERIOR DICIEMBRE .xlsx
48K

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de Interventoría de obra pública de infraestructura social"
CODIGO: CCE-EICP-IDI-50
VERSIÓN: 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Ac+C9:H15tividad	Fecha	Lugar	Norma	[número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria pública	15 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	15 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	15 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	HASTA EL 22 DE ENERO DE 2026	EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA, CALLE 11 CARRERA 15, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRCUTURA MUNICIPAL O AL CORREO obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	[El término para presentar manifestaciones de interés para limitar la convocatoria a Mipymes es por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación]	[Enlace SECOP]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	23 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	23 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	29 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	29 DE ENERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	NA	[Enlace SECOP]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	HASTA EL 3 DE FEBRERO DE 2026	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	3 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	HASTA LAS 7:00 PM DEL 3 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	5 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 8:00 AM	DESPACHO DEL ALCALDE CALLE 11 CARRERA 15 , SEGUNDO PISO MUNUCUPIO DE VALENCIA	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	5 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 9:00 AM	[Enlace SECOP] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	DESDE EL6 AL 10 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	11 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	POR TRES DIAS HABILES	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	18 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	NA	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	18 DE FEBRERO DE 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES	E CALLE 11 CARRERA 15 , SEGUNDO PISO MU	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES	E CALLE 11 CARRERA 15 , SEGUNDO PISO MU	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES	E CALLE 11 CARRERA 15 , SEGUNDO PISO MU	Fecha definida por la Entidad.	



Colombia

Frente frío en Colombia: Ideam explica incremento anormal de lluvias en el país para inicio del año

El Ideam dio a conocer varios de los factores que han influenciado en el incremento inusual de las lluvias en el país. Frente frío, condiciones Tipo La Niña, entre otros fenómenos.



Por: Mateo Medina Escobar

2 de Feb, 2026
Actualizado: 2 De Feb, 2026

Compartir

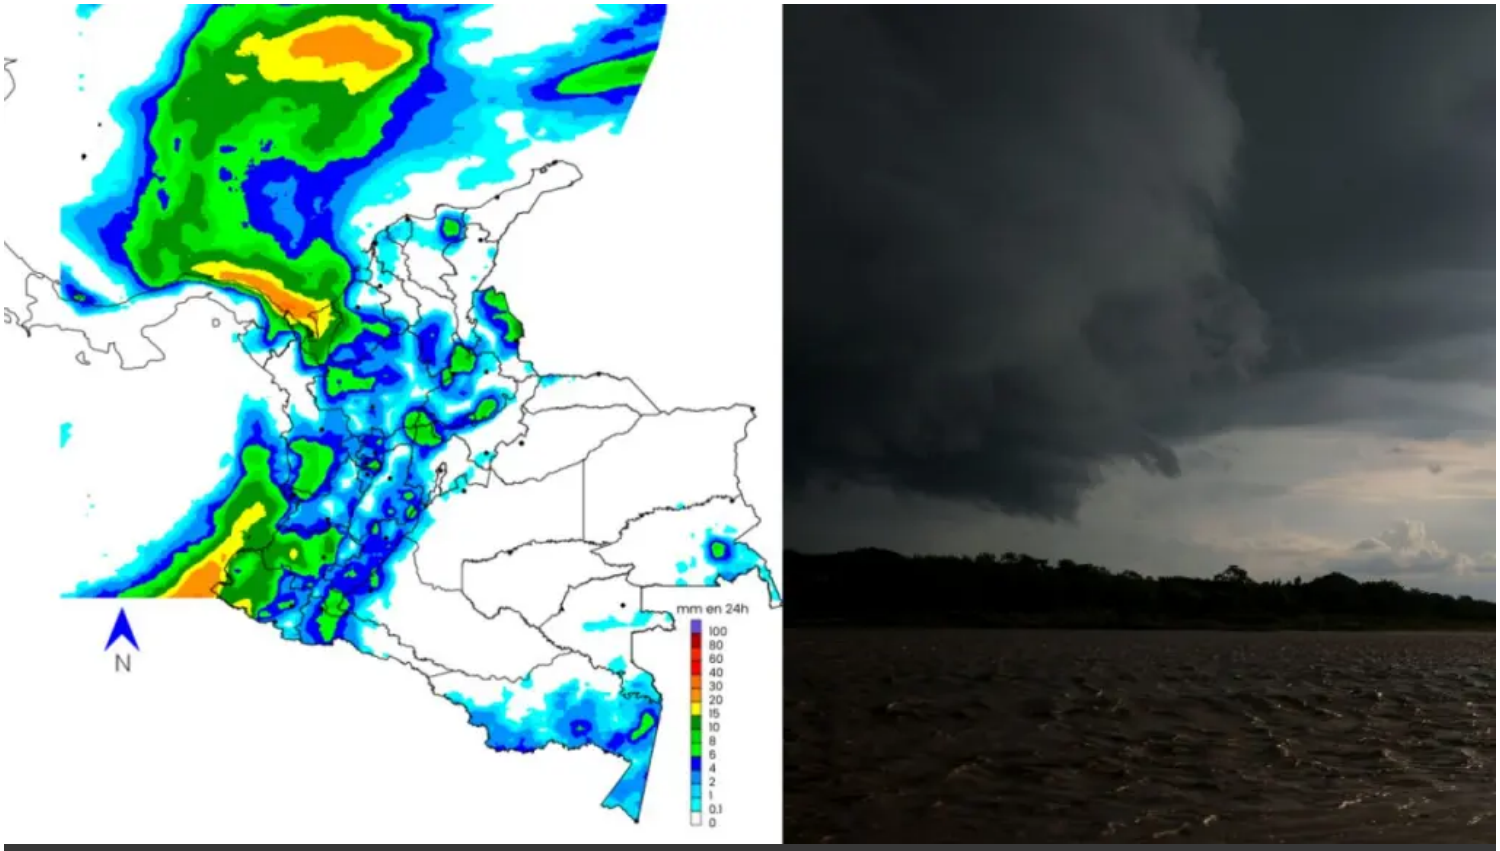


Imagen de referencia de clima en Colombia. *Ideam/Pexels*

Para el inicio de 2026, las lluvias en el país han tenido un comportamiento poco común, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Desde la entidad explicaron la **razón del incremento de las precipitaciones que han afectado** principalmente al norte, centro y occidente de Colombia.

Síganos en nuestro **WhatsApp Channel**, para recibir las noticias de mayor interés


(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias



BOGOTÁ

Reportan fuerte granizada en Bogotá: estas son las zonas más afectadas



COLOMBIA

Crimen de influencer paisa "La Traviesa": capturan a su pareja, presunto responsable del asesinato

Ghisliane Echeverry Prieto, la directora del Ideam, dijo en unas declaraciones que la razón para el incremento atípico de lluvias se debe a varios factores. "**Hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal**, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina", comenzó diciendo la funcionaria.



El Ideam estima que el **incremento de precipitaciones fue del 64,4%**. "Están sucediendo varias cosas, no debemos olvidar que estamos en el marco de una crisis climática, que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta. Esto genera, por supuesto, una inestabilidad, unas alteraciones de la atmósfera y es estos **fenómenos atmosféricos y meteorológicos inusuales como son lluvias en temporadas donde no debería haber**".

Invierte en Avianca CFD con solo $250 y comienza a obtener un segundo ingreso
InvestLab
Más información

Empieza a ganar un segundo sueldo con Avianca CFD
InvestLab
Más información

Dermatóloga: Truco casero para rostro caído (toma 7 segundos)
Truco secreto para las arrugas

Lea: Tormenta negra en Colombia: Ideam aclaró información que circula sobre supuesto fenómeno del clima

¿Cuáles son las razones para el incremento inusual de lluvias en Colombia?

De acuerdo con Echeverry Prieto, el año comenzó con unas condiciones Tipo La Niña para Colombia, fenómeno que se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera. "**Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos como la oscilación de Madden-Julian favorable para lluvias**", agregó la funcionaria sobre las "ondas que revisten gran importancia en el proceso de predicción climática, ya que pueden amortiguar o intensificar los procesos propios de la escala interanual".

PUBLICIDAD


La directora del Ideam también habló sobre el frente frío, otro fenómeno que ha influido en el incremento anormal. "**Lo que ha**

ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina (...) Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las **precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo** paulatinamente", agregó la funcionaria.

De acuerdo con los últimos reportes, la región Caribe se ven especialmente afectada por estas precipitaciones. "**La región pacífica es una región donde siempre tenemos lluvia y por supuesto también se puede exacerbar este fenómeno**. También tenemos en el oriente y norte de la Orinoquía y en el arco amazónico lluvias importantes".

PUBLICIDAD



Echeverry habló además de alerta por oleaje relacionado con aumento de los vientos. "Para el archipiélago de San Andrés también estamos pronosticando un tiempo nublado. El archipiélago se encuentra mucho más hacia la zona de Centroamérica y por supuesto **también se está viendo afectado por esta incidencia del frente frío**. Lo que ha ocurrido con estas lluvias es que también ha aumentado los vientos y por tanto se ha elevado una alerta naranja asociado a oleaje en nuestra costa Caribe".

Lea: Fuertes lluvias afectan varias localidades de Bogotá durante la tarde: así está la movilidad

Pronóstico del clima en Colombia para la semana del 2 al 6 de febrero

Lunes 2 de febrero

Para la tarde de este lunes 2 de febrero se esperan precipitaciones sectorizadas, concentradas en las regiones Caribe, Pacífico, Meta, sur de Caquetá, Guaviare y suroccidente del Amazonas. Durante las horas de la noche se prevé una disminución de las lluvias en el oriente y sur del país; sin embargo, persistirán las condiciones lluviosas hacia el suroccidente y el centro del territorio nacional, así como en algunos sectores de la región Caribe. Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en los departamentos de Córdoba, Cesar, Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y Nariño. En las regiones Orinoquía e Insular se prevé condiciones de tiempo seco.

NOTICIAS CARACOL EN VIVO

Martes 3 de febrero

Se espera una disminución en la magnitud de las precipitaciones, principalmente en la región Caribe y en algunas zonas de las regiones Andina y Amazónica. Se prevén precipitaciones de intensidad moderada en las partes alta y media de la cuenca del río Sinú (departamento de Córdoba), Urabá y occidente de Antioquia, norte del departamento del Magdalena y bajo Magdalena, así como en la cuenca del río Rionegro en Cundinamarca. Asi mismo, se esperan lluvias moderadas en el área metropolitana y en las provincias Comunera y Guanentá del departamento de Santander, oriente de Norte de Santander, el departamento del Cauca y el occidente del departamento de Nariño.

Miércoles 4 de febrero

Es posible que haya un aumento de las lluvias hacia el occidente del país, con énfasis en los departamentos de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, así como en el occidente de los departamentos de Cauca y Nariño y en el Archipiélago de San Andres,

Providencia y Santa Catalina. Por su parte, en la región Andina se pronostica la persistencia de precipitaciones de intensidad ligera al sur del departamento de Santander y en el occidente de Cundinamarca y Tolima. Para la región Amazónica podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en los departamentos de Amazonas, suroriente de Guainía y Vaupés. Hacia las regiones Caribe y Orinoquía se espera el predominio de tiempo seco

Jueves 5 de febrero

En el noroccidente y occidente del país se espera un aumento en la magnitud de las precipitaciones, especialmente en los departamentos de Sucre, Córdoba, occidente de Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hacia el centro del país, podrían presentarse incrementos de la precipitación en algunos sectores de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero y Tolima.

Viernes 6 de febrero

Las condiciones lluviosas en el noroccidente, centro y occidente del país se mantendrán, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Santander, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, sur de Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hacia la región Caribe se esperan lluvias generalizadas de intensidad ligera a moderada, exceptuando el departamento de La Guajira.

MATEO MEDINA ESCOBAR

mercado libre 3/3
Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
de Colombia y el mundo.
tales
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Noticias Deportes
Ahora no Activar
Compra ahora
Términos y condiciones en www.mercadolibre.com.co/ofertas/diasdobles-3-3
DESCUBRE Puerto Rico Vive Boricua
Explora con Expedia
Reservar
PUBLICIDAD

Lo último

- Habla esposa de Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar: "Nadie da razón"
- Graves incendios en locales de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá: ojo para que no le pase
- Hombre en Bogotá se habría tragado una joya para poder robarla: esto se sabe
- Video | Así quedó el lugar donde hizo erupción el volcán de lodo en Antioquia
- Fiscalía acusó a hombre señalado de intentar matar a su pareja en Bogotá con martillo: irá a juicio

PUBLICIDAD

Te puede interesar

Enlaces patrocinados por Taboola

Invierte en Avianca CFD con solo $250 y comienza a obtener un segundo ingreso
Una inversión en CFDs podría darte un salario extra
InvestLab |

La IA que hace dinero: ¿por qué está causando tanto ruido en la web?
Incrementa tus ingresos con IA CFD
OroLab |

Dermatóloga: Truco casero para rostro caído (toma 7 segundos)
Armonización casera que está ayudando a colombianas a eliminar la flacidez facial
Truco secreto para las arrugas |

Actor de 'Padres e Hijos' que murió luchando contra el cáncer había pedido la eutanasia
A pesar de tener apenas 26 años, el actor de 'Padres e Hijos' fue diagnosticado con un agresivo cáncer que afectó varios de sus órgan…

Empieza a ganar un segundo sueldo con Grupo Argos CFD
CFD
Tech Research View | Patrocinado

CFD de Avianca: Invierte hoy y consigue un ingreso adicional.
Empieza a ganar un segundo sueldo
Tech Research View | Patrocinado

CFD: La inteligencia artificial que genera ingresos: todos hablan de ella.
Invierte $200 con AI y obtén un segundo ingreso
Pulso Informativo | Patrocinado

Trump vuelve a arremeter contra Petro: dijo que era "el peor presidente" y con "muchos problemas"
El presidente Petro anteriormente había calificado a su homólogo estadounidense como un "grosero e ignorante con Colombia". Trump, …

PROPONENTE N°: 3	**PROPONENTE: CONSORCIO CCC VALENCIA** **R/L: JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR** **C.C.: 1.143.378.557 DE CARTAGENA**		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	**FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:**	SI APORTA	NO CUMPLE
	Nombre Representante Legal:	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	
	OBSERVACIONES:	PROPONENTE APORTA CARTA DE PRESENACION SINNEMBARGO, NO SUPRIME EL PUNTO CORRESPONDIENTES A PROCESO LLAVADOS PR SECOP II- SUBSANAR	
	REQUIERE AVAL:	SI REQUIERE AVAL	
	Nombre Profesional que Avala:	JUAN PABLO CORDOBA TINOCO	
	Matricula Profesional:	76202196275VLL	
	Certificado de Vigencia y Antecentes:	5 de enero de 2026	
CAPACIDAD JURÍDICA			
	ES PROPONENTE PLURAL	☑ SI ☐ NO	
CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES	**Tipo De Proponente Plural:**	CONSORCIO	NO CUMPLE
	Numero de Integrantes del Proponente:	2	
	Nombre Proponente Plural:	CONSORCIO CCC VALENCIA	
	Nombre Representante Legal:	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	
	Vigencia de Proponente Plural:	DURACION DEL CONTRATO Y UN AÑO MAS	
	INTEGRANTE	**PARTICIPACION (%)**	
	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	90%	100%
	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	
	INTEGRANTE(S)		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	**Tipo de sociedad :**	S.A.S- Sociedad por Acciones Simplificada	CUMPLE
	Nombre:	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	
	Fecha de Expedición:	5 de enero de 2026	
	Fecha de Renovación:	12 de marzo de 2025	
	Vigencia:	INDEFINIDA	
	Restricciones:	NO REPORTA NINGUNA PARA CONTRATAR	
	Revisor fiscal:	SORY ELAINE CARO CRUZ	
	Observaciones:		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	**Tipo de sociedad :**	S.A.S- Sociedad por Acciones Simplificada	CUMPLE
	Nombre:	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	
	Fecha de Expedición:	5 de enero de 2026	
	Fecha de Renovación:	29 de marzo de 2025	
	Vigencia:	INDEFINIDA	
	Restricciones:	NO REPORTA NINGUNA PARA CONTRATAR	
	Revisor fiscal:	JOSE EDUARDO BARRIOS RODRIGUEZ	
	Observaciones:		
	INTEGRANTE(S)		
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	**Nombre:**	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	CUMPLE
	Fecha de Expedición:	5 de enero de 2026	
	Fecha de Renovación:	28 de marzo de 2025	
	Vigente y en Firme:	CUMPLE	
	MIPYME:	MEDIANA EMPRESA	
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	**Nombre:**	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
	Fecha de Expedición:	29 de diciembre de 2025	
	Fecha de Renovación:	3 de abril de 2025	
	Vigente y en Firme:	CUMPLE	
	MIPYME:	GRAN EMPRESA	

	INTEGRANTE(S)		
CEDULA DE CIUDADANIA:	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	NUMERO DE DOCUMENTO:	1.143.378.557 DE CARTAGENA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	NUMERO DE DOCUMENTO:	1.047.440.402 DE CARTAGENA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	**NOMBRE DEL REP. LEGAL:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	NUMERO DE DOCUMENTO:	1.143.378.557 DE CARTAGENA	
	INTEGRANTE(S)		
Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la **Contraloría General de la República**	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	901465218260106104840	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la **Contraloría General de la República**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	1143378557260106104750	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la **Contraloría General de la República**	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	9006066511260106104900	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la **Contraloría General de la República**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	1047440402	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la **Contraloría General de la República**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	1143378557260106104750	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
	INTEGRANTE(S)		
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado por la **Procuraduría General de la Nación**	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	287723517	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado por la **Procuraduría General de la Nación**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	287723853	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado por la **Procuraduría General de la Nación**	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	287723694	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado por la **Procuraduría General de la Nación**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	287723982	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado por la **Procuraduría General de la Nación**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO No. :	287723853	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
	INTEGRANTE(S)		
Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la **Policía**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la **Policía**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la **Policía**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	

	INTEGRANTE(S)		
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas **RNMC**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	Registro de Validacion No. :	131829247	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas **RNMC**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	Registro de Validacion No. :	131829580	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas **RNMC**	**NOMBRE DEL REP. LEGAL:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	Registro de Validacion No. :	131829247	
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
	INTEGRANTE(S)		
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	CUMPLE
	DOCUMENTO APORTADO :	FORMATO 6	
	QUIEN SUSCRIBE:	REVISOR FISCAL	
	FECHA EXPEDICION:	16 de enero de 2026	
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	**NOMBRE DEL INTEGRANTE:**	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE
	DOCUMENTO APORTADO :	FORMATO 6	
	QUIEN SUSCRIBE:	REVISOR FISCAL	
	FECHA EXPEDICION:	16 de enero de 2026	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA		CUMPLE
	Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	N° Garantia:	595-47-994000004521	
	Vigencia Desde:	16 de enero de 2026	
	Vigencia Hasta:	16 de abril de 2026	
	Valor Asegurado:	$ 199.671.172,90	
	Tomador:	CONSORCIO CCC VALENCIA CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S 90% REDS VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%	
	Beneficiario:	MUNICIPIO DE VALENCIA	
	Observaciones:		

	INTEGRANTE(S)		
REGISTRO DE OBRAS INCONCLUSAS	29/01/2026 16:05:51 - Obras Inconclusas. Página #1  Consulta de contratista no encontrado Se ha realizado la consulta en nuestras bases de datos por Número de identificación o NIT del contratista: **9014656218** y no se encuentra registrado, de acuerdo con la información reportada por las Entidades a la fecha de corte de Hoy: 29/01/2026 16:05:51		CUMPLE
	NOMBRE DEL INTEGRANTE:	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	
REGISTRO DE OBRAS INCONCLUSAS	29/01/2026 16:06:41 - Obras Inconclusas. Página #1  Consulta de contratista no encontrado Se ha realizado la consulta en nuestras bases de datos por Número de identificación o NIT del contratista: **9006066511** y no se encuentra registrado, de acuerdo con la información reportada por las Entidades a la fecha de corte de Hoy: 29/01/2026 16:06:41		CUMPLE
	NOMBRE DEL INTEGRANTE:	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	

	INTEGRANTE(S)		
Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 1:**	JANNYS DANIELA DIAZ BOLIVAR	CUMPLE
	CERTIFICADO DE FECHA:	6 de enero de 2026	
Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	**NOMBRE DEL REP. LEGAL P. JURIDICA 2:**	HAROLD DE JESUS HERRERA ALCAZAR	CUMPLE
	CERTIFICADO DE FECHA:	19 de diciembre de 2025	
CAPACIDAD JURIDICA		HABIL/NO HABIL	NO HABIL

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

# INTEGRANTES PROPONENTE PLURAL	MEDIANA EMPRESA	GRAN EMPRESA	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S**	**REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	
Activo Corriente :	$ 13.371.659.557,00	$ 52.240.162.070,00	
Activo Total :	$ 13.445.699.557,00	$ 52.276.362.070,00	
Pasivo Corriente :	$ 3.881.040.444,00	$ 5.887.682.299,00	
Pasivo Total :	$ 3.881.040.444,00	$ 5.887.682.299,00	
Patrimonio :	$ 9.564.659.113,00	$ 46.388.679.771,00	
Utilidad/Perdida Operacional :	$ 5.794.404.577,00	$ 12.902.266.684,00	
Gastos de Intereses :	$ 13.625.190,00	$ 9.908.928,00	

		TOTALES	
CAPACIDAD FINANCIERA PROPONENTE:	**LIQUIDEZ : >= 1,1**	6,72	CUMPLE
	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO : <= 70,00%	14,86%	CUMPLE
	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS : >= 1,00	794,45	CUMPLE
	CAPITAL DE TRABAJO : >= $ 461.240.409,40	$ 55.843.098.884,00	CUMPLE
	PATRIMONIO : >= $ 461.240.409,40	$ 55.953.338.884,00	CUMPLE
	RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO : >= 0,02	0,33	CUMPLE
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO : >= 0,01	0,28	CUMPLE

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	HABIL/NO HABIL	HABIL

CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL PROPONENTE:	**CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S**	**REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	
Mejor Ingreso Operacional :	$ 18.556.975.632,00	$ 36.556.885.996,00	
LIQUIDEZ :	3,45	8,87	
Experiencia Registrada en el RUP :	$ 68.619.906.952,74	$ 321.746.302,80	
Personal Profesional Vinculado :	1	1	
Saldo Contratos En Ejecución :	$ 14.257.661.156,54	$ 18.633.260.030,96	
DICTAMEN:			
Copia de la tarjeta profesional CONTADOR:	175432-T	200169-T	
Certificado de antecedentes disciplinarios CONTADOR:	30 de octubre de 2025	6 de enero de 2026	
Copia de la tarjeta profesional REVISOR FISCAL/AUDITORL:	212603-T	191922-T	
Certificado de antecedentes disciplinarios REVISOR FISCAL/AUDITOR:	22 de noviembre de 2025	28 de noviembre de 2025	
CAPACIDAD RESIDUAL INTEGRANTE :	$ 19.144.894.981,06	$ 25.235.003.164,24	
CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTE :	**$ 44.379.898.145,30**		CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL	HABIL/NO HABIL	HABIL

EXPERIENCIA			
CONTRATO APORTADOS:	**2**		
CONTRATO N°:	**1**	**2**	
INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA :	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	
ENTIDAD CONTRATANTE :	GOBERNACION DEL CESAR	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
CONTRATISTA :	**CONSORCIO PESQUERO 2019** ANDINA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S 50% CWV CONSTRUCIONES S.A.S 50%	**CONSORCIO TECNICO JA 2021** ANDINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 60% SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA 40%	
CONSECUTIVO CONTRATO EN EL RUP :	022	033	
Actividad Principal: **EXPERIENCIA GENERAL:** CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	OBRA CIVIL DEL CDT PESQUERO EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN No 2013000100257 CONSOLIDACION DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TEGNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VERIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA : Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 1.116 m2 Área por acreditar: 781,20 m2.	AREA INTRERVENIDA = 11.575,30 M2		
	AREA AFECTADA % PART = 5.787,65 M2		
VERIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. Valor Presupuesto Oficial: 1402,68 SMMLV. Valor por acreditar: 701,34 SMMLV.	8.677,69 SMMLV		
Artículo 4 de la Resolución 219 de 2021: Por lo menos uno de los contratos deberá contener los ESTUDIO Y DISEÑO, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.		ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE COSNTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO (I) UBICADO EN LA CARRERA 15 CON CALLE 7, MUNCIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPRATAMNETO DEL ATLANTICO EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO No. 1443 DE 2020 SUSCRITO ENTRTELA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
NÚMERO DEL CONTRATO:	2020-04-0001	LP-002-2021	
INSCRITO EN EL RUP CON CODIGO: **Actividad Principal:** 721415 721433	721415	721415	
VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SMMLV) :	17355,38	1122,84	
FORMA DE EJECUCIÓN :	CONSORCIO	CONSORCIO	
% PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE:	50,0%	60%	
VALOR EN SMMLV (% PARTICIPACIÓN) :	8.677,69	673,70	
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2020	30 de abril de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2021	NO REPORTA	
OBSERVACIONES:		EN DOCUMENTACION APORTADA NO SE LOGRA EVIDENCIAR FECHA DE TERMINACION DEL CONSTRATO- SUBSANAR	
TOTAL CONTRATOS	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (SMMLV):**	9351,39	CUMPLE
EXPERIENCIA REQUERIDA		HABIL/NO HABIL	NO HABIL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD - Formato 7C - Plan de calidad (10 puntos)	Suscribe Formato 7C - Plan de calidad	SI	10
CRITERIOS AMBIENTALES - Formato 12 A- Criterio ambiental (15 puntos)	Suscribe Formato 12 A- Criterio ambiental	SI	15
CRITERIO SOCIAL - Formato 12B– Criterio social (5 puntos)	Suscribe Formato 12B– Criterio social	SI	5
PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL (20 puntos)	**Presenta Formato 9 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**	SI	20
	Presenta forotcopia de las cedulas y/o certificado de existencia y representacion legal de las empresas consorciada, acorde a lo establecido en el pliego de condicones.	SI	
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 punto)	**Suscribe el Formato 8- Vinculacion de personas con discapacidad**	SI	1
	Aporta certificado expedido por el Ministerio de Trabajo con radicado N°	05EE2025710800100008912	
	Aporta certificado expedido por el Ministerio de Trabajo con fecha de expedición.	20 de agosto de 2025	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 puntos)	**Presenta Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y sus documentos anexos, CERTIFICADO DE COMPOSICION ACCIONARIA CON AS DE 30 DIAS DE EXPEDICION A FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO**	SI	0,00
	Tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal	SI	
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 puntos)	**Presenta forotcopia de R.U.P. de las empresas consorciadas, acorde a lo establecido en el pliego de condicones.**	SI	0,25
	Tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal	SI	
	TOTAL PUNTOS		**51,25**

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
		INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	7/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO VALENCIA-CORDOBA.

CUENTA (AHORROS) No. 67789201444 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO 29 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 **$ 490.000.000,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 2 **$**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 3 **$**
GIRO 4 **$**

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 490.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 490.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31 DE OCTUBRE DE 2025	$ 8.054,83
30 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 80.555,51
31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 83.254,62
31 DE ENERO DE 2026	$ 83.268,77

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Estudios Dise?os y Construccion del cent

PALACIO MUNICIPAL

MONTERIA CORDOBA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67789201444

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	490,171,864.96	*SALDO PROMEDIO*	$	490,174,550
TOTAL ABONOS	$	83,268.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	83,268.77
SALDO ACTUAL	$	490,255,133.73	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			83,268.77	490,255,133.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
