2	CERRAMIENTO PARQUES FACA		14,22%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S		
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL	9/03/2026	AL 15/03/2026	PORCENTAJE DE AVANCE

A. DATOS GENERALES

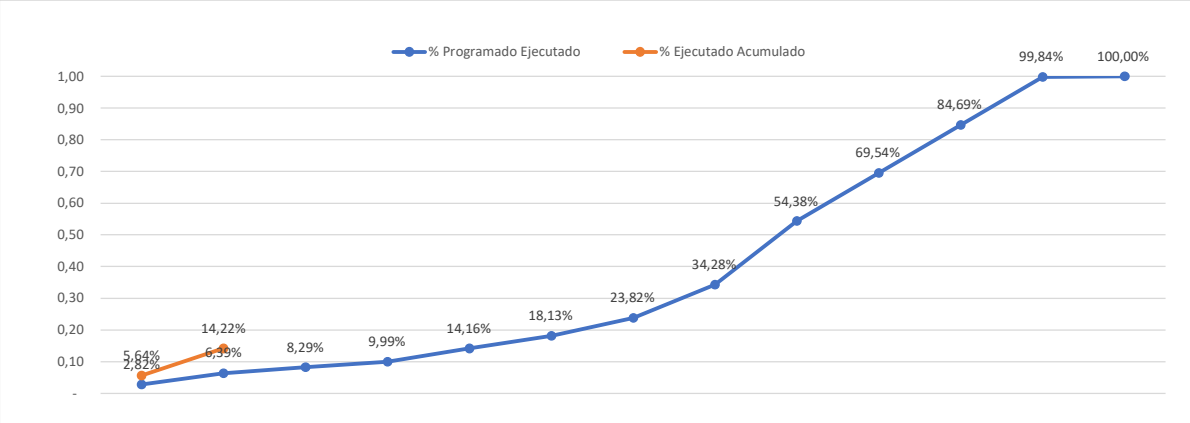
EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	**CUNDINAMARCA**		**FACATATIVA**
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	**ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	**24/02/26**	**23/05/26**	**3 MESES**

Observaciones:

En la semana (02), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se realiza localizacion y replanteo de los 3 cerramiento
- Se realiza descapote del terreno en los 3 cerramientos
- Se realiza excavacion manual para las vigas a una profundidad de 35 cm variable y para la cimentacion ciclopeo a 1 mt variable en los 3 cerramientos
- Se realiza la instalacion del concreto pobre para las bases del concreto ciclopeo paralelamente en las 3 zonas de intervencion
- Se realiza el amarre y figurado de la estructura metalica para las vigas de amarre
- Se inicia con la instalacion del concreto ciclopeo para la cimentacion

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO



D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)

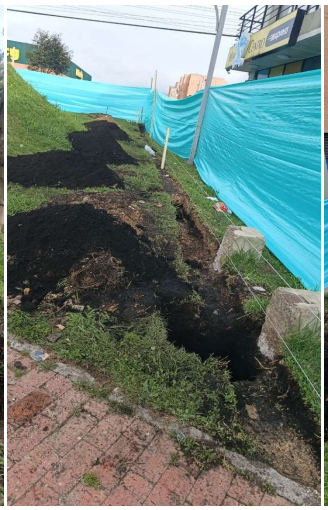
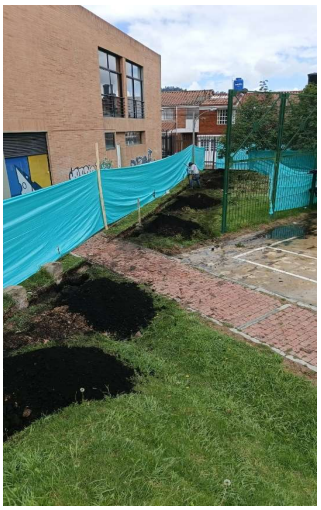




CAMPAMENTO PROVISIONALE / PLANTA ELECTRICA PROVISIONAL




REPLANTEO DE CIMIENTOS

RETIRO DE CAPA VEGETAL Y EXCAVACION DE ZANJAS






INSTALACION DE CONCRETO POBRE







INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO





AVANCES EN TALLER DE ESTRUCTURA METALICA Y ACERO DE REFUERZO

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A2061420l0-1032389525
Firma:
