3	CERRAMIENTO PARQUES FACA	ARKAN Arquitectura & Ingenieria			30,65%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		16/03/2026	AL	22/03/2026	PORCENTAJE DE AVANCE


A. DATOS GENERALES			
EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	CUNDINAMARCA		FACATATIVA
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	24/03/26	23/05/26	3 MESES

Observaciones:

En la semana (03), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se continua excavacion en los cerramientos faltantes
- Se continua instalacion de concreto pobre en los cerramientos faltantes
- Se continua instalacion de concreto ciclopeo de 2500 psi 60/40 en la cimentacion faltante
- Se instala y compacta el recebo para las bases de las vigas de amarre
- Se realiza firguracion, amarre y puesta del acero de refuerzo en los cerramientos
- Se realiza la fundicion con concreto de 3500 psi de las vigas de amarre, ubicando los parales iniciales de la estructura metalica según indicaciones de planos

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO

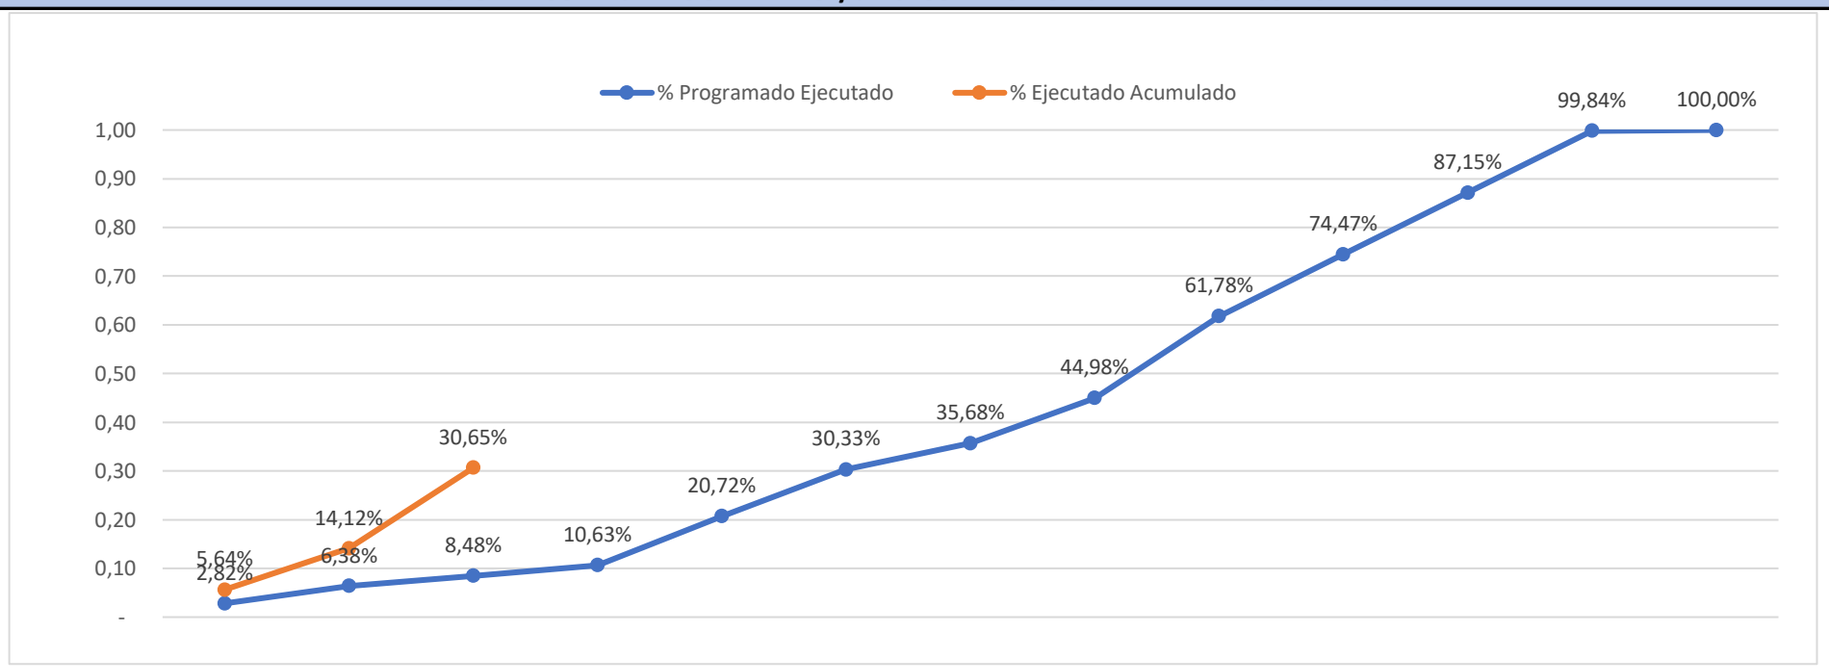

D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)



MONTECARLO	TERRANOVA	LLANOS DEL TUNJO

EXCAVACION MANUAL











MONTECARLO

CONCRETO POBRE / CONCRETO CICLOPEO










MONTECARLO | TERRANOVA

RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE

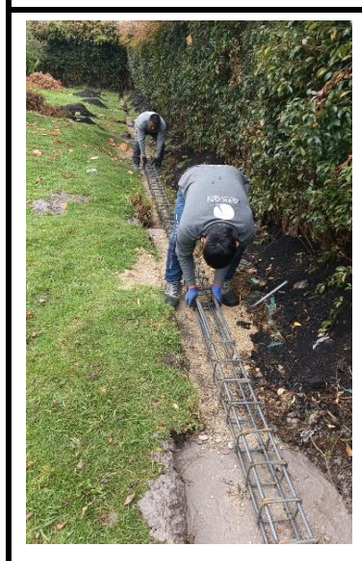

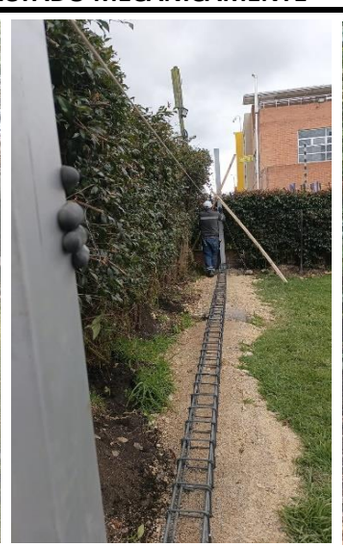


TERRANOVA

ACERO FIGURADO













TERRANOVA

PREPARACION PARA FUNDICION CON FORMALETA METALICA










TERRANOVA

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A206142010-1032389525
Firma:
