4	CERRAMIENTO PARQUES FACA				36,72%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		23/03/2026	AL	29/03/2026	PORCENTAJE DE AVANCE

A. DATOS GENERALES


EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	**CUNDINAMARCA**		**FACATATIVA**
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	**ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	**24/03/26**	**23/05/26**	**3 MESES**

Observaciones:

En la semana (04), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se terminan la instalacion de recebo compactado en los espacios faltantes de llanos del tunjo
- Se finaliza instalacion de concreto ciclopeo en llanos del tunjo y monteclaro
- Se continua la instalacion de acero de refuerzo y formaleta en las 3 areas de intervencion
- Se continua fundicion de vigas de amarre en terranoca

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO

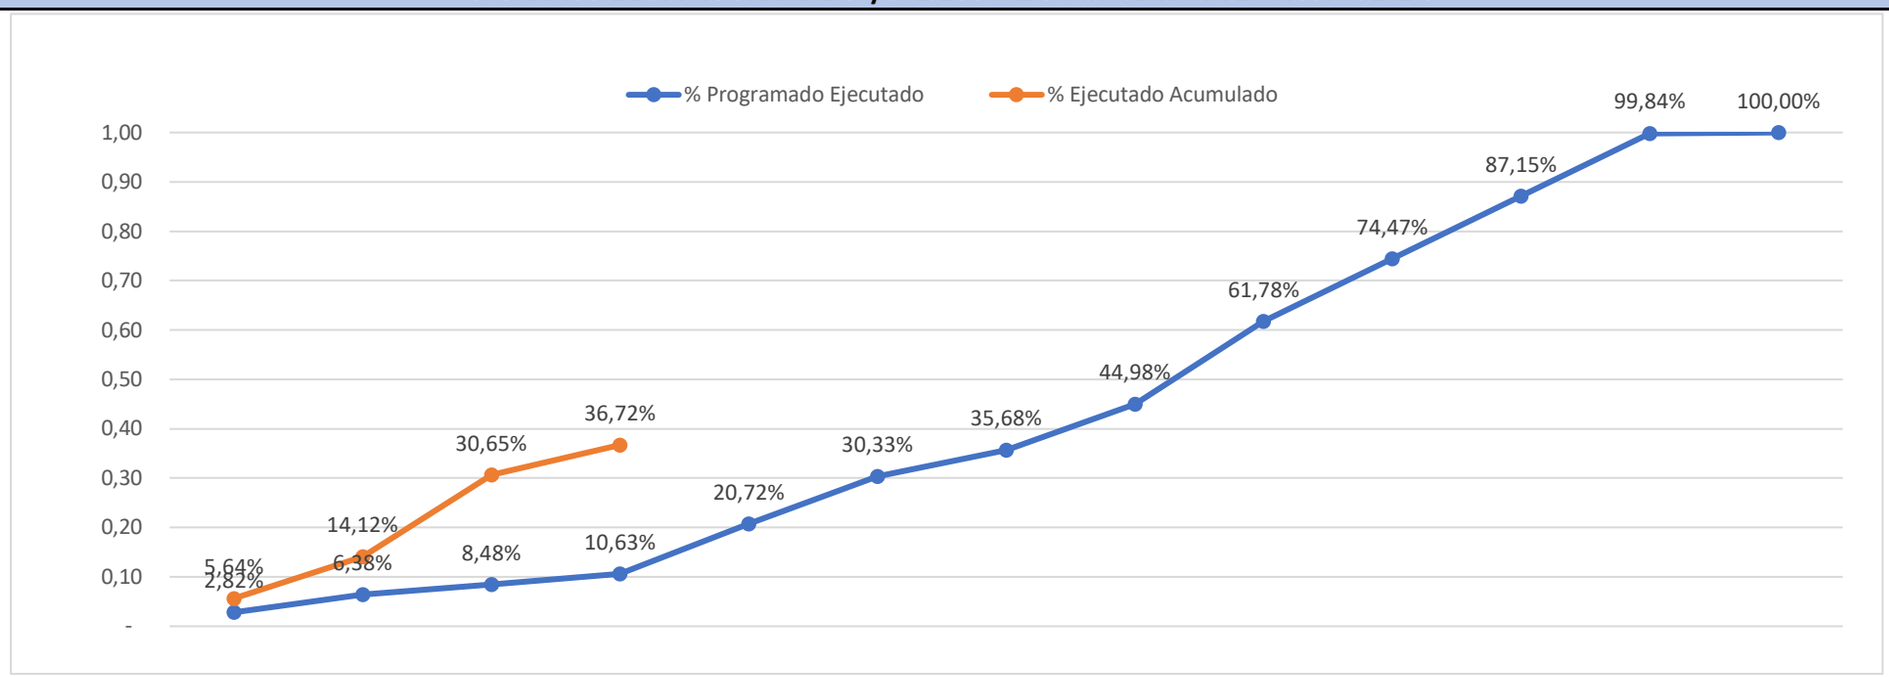

D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)






MONTECARLO

RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE



LLANOS DEL TUNJO

RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE




LLANOS DEL TUNJO

CONCRETO CICLOPEO



MONTECARLO

CONCRETO CICLOPEO

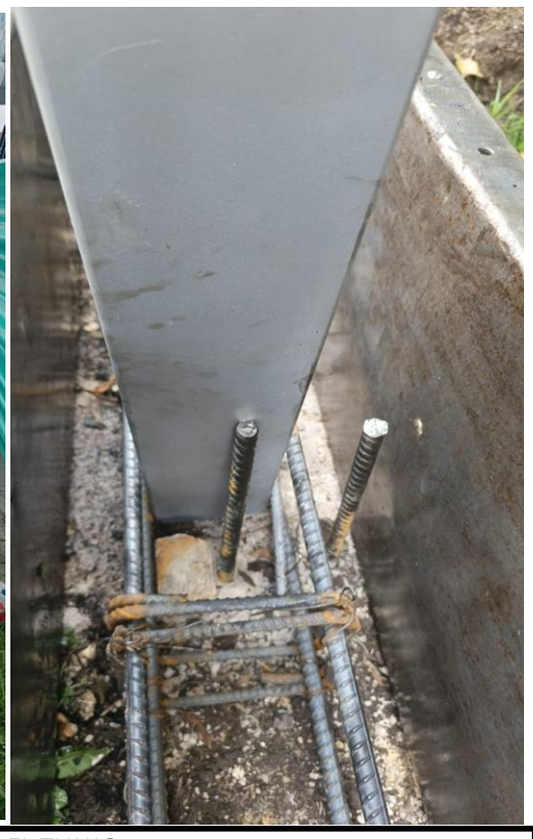

LLANOS DEL TUNJO	TERRANOVA

ACERO DE REFUERZO






TERRANOVA	MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO






TERRANOVA

ACERO DE REFUERZO



TERRANOVA	TERRANOVA

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



TERRANOVA

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A2061420l0-1032389525
Firma:
