7	CERRAMIENTO PARQUES FACA	ARKAN Arquitectura & Ingenieria			69,30%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		13/04/2026	AL	19/04/2026	PORCENTAJE DE AVANCE

A. DATOS GENERALES


EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	**CUNDINAMARCA**		**FACATATIVA**
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	**ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	**24/03/26**	**23/05/26**	**3 MESES**

Observaciones:



En la semana (06), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Inicia la instalacion de muro en cerramiento en

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO

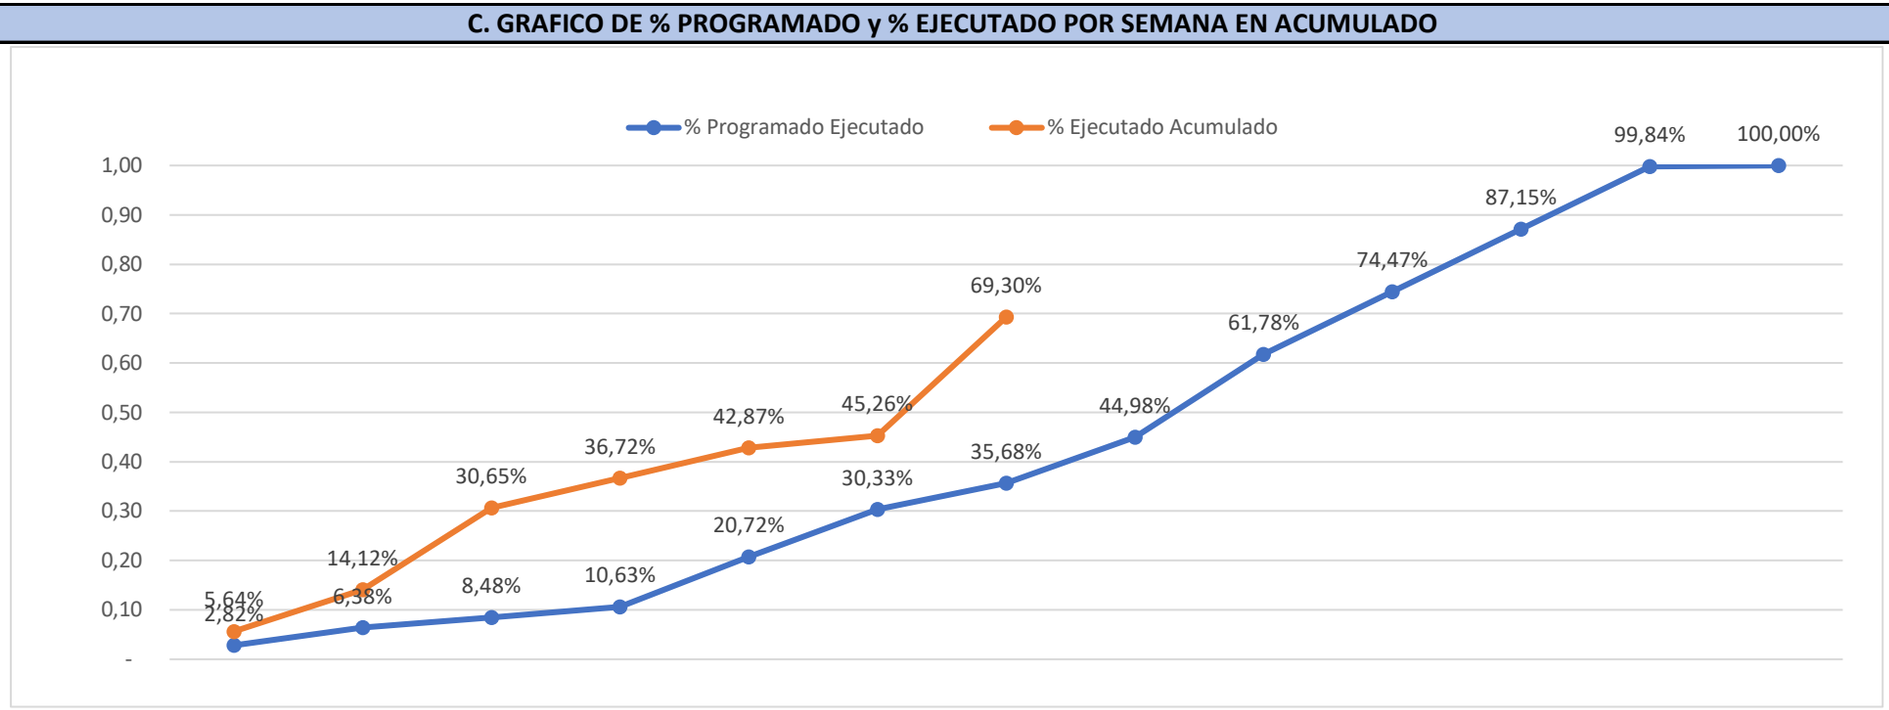

D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento y puerta en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)








MONTECLARO

CERRAMIENTO METALICO

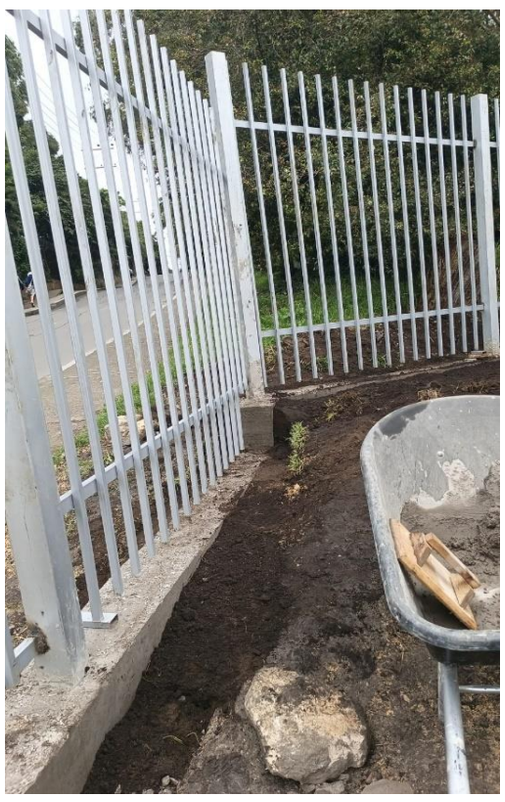

MONTECLARO

CERRAMIENTO METALICO








MONTECLARO

CERRAMIENTO METALICO

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A206142010-1032389525
Firma:
