| 8 | CERRAMIENTO PARQUES FACA | | 92,60% |
|---|---|---|---|
| | ARKAN ARQUITECTURA S.A.S | | |
| INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL | 20/04/2026 | AL 26/04/2026 | PORCENTAJE DE AVANCE |

**A. DATOS GENERALES**


| EMPRESA | DEPARTAMENTO | | MUNICIPIO: |
|---|---|---|---|
| **ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS** | **CUNDINAMARCA** | | **FACATATIVA** |
| CONTRATISTA OBRA: | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA: | | |
| **ARKAN ARQUITECTURA S.A.S** | **ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA** | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($) | FECHA INICIO: | FECHA TERMINACIÓN | PLAZO: |
| **$460.721.711** | **24/03/26** | **23/05/26** | **3 MESES** |

**Observaciones:**

En la semana (08), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se finalizan actividades de excavacion, recebo, instalacion de ciementacion tipo ciclopeo en Terranova
- Se finalizan actividades de armado de acero y fundicin de vigas de amarre en terranova
- Continua instalacion de cerramiento metalico en terranova y llanos del tunjo

**C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO**

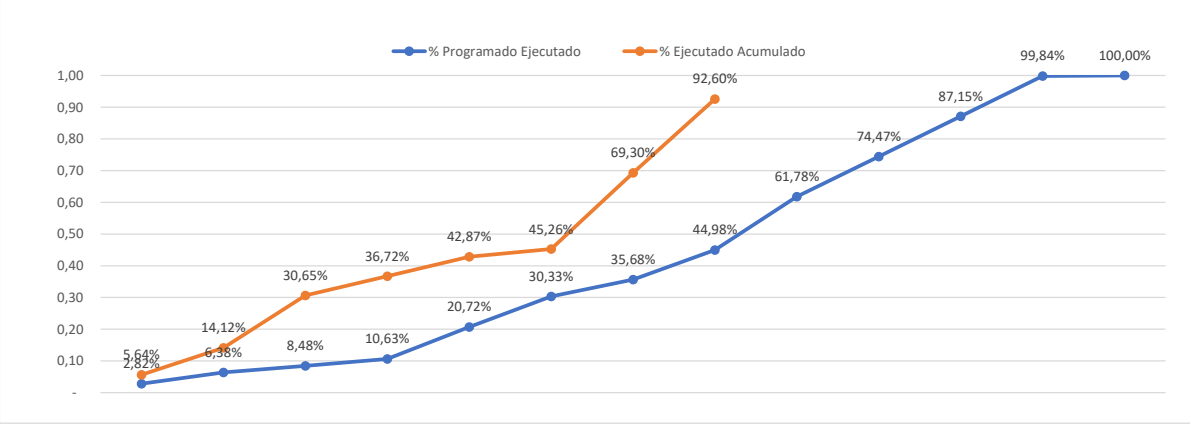


**D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO**

| OBSERVACIONES | SEMANA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias | | | | | | | |

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento y puerta en taller

**F. REGISTRO FOTOGRÁFICO** (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)








TERRANOVA

| CIMENTACION | EXCAVACION | RECEBO COMPACTADO |
|---|---|---|







TERRANOVA

**ACERO FIGURADO**

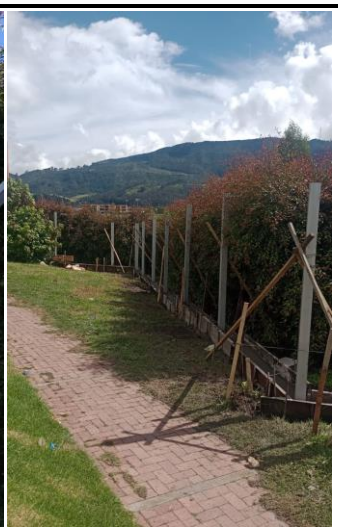

TERRANOVA

**VIGA DE AMARRE**






TERRANOVA


**VIGA DE AMARRE**









| TERRANOVA | LLANOS DEL TUNJO |
|---|---|
| **CERRAMIENTO METALICO** | |

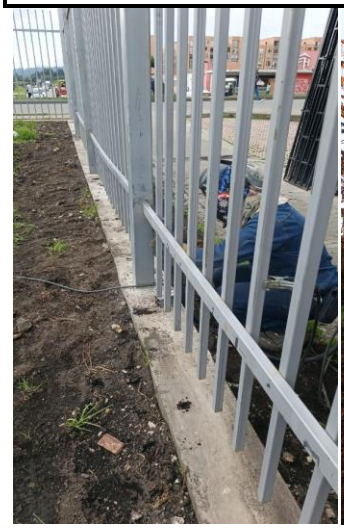

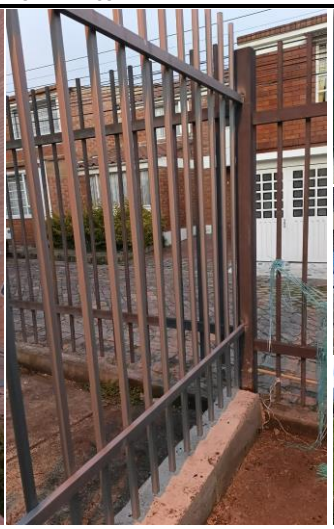

| TERRANOVA |
|---|
| **CERRAMIENTO METALICO** |

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A206142010-1032389525
Firma:
