LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE OBRA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO FORTALEZA				
Supervisor	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8154895				
Informe N°	10	Periodo del informe	6/07/2025	Hasta el	5/08/2025

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	Folio 9-10
2. Aspectos Generales Del Contrato De Obra			CUMPLE	Folio 10-11
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	Folio 11-13
Avance de cada una de las actividades programadas	SI		CUMPLE	Folio 20-50
Balance presupuestal, que incluya lo ejecutado, lo proyectado para finalizar las obras y el total, garantizando que no se excede el valor total contractual.	SI		CUMPLE	Folio 54
Reseña fotográfica del periodo diariamente	SI		CUMPLE	Folio 20-50
Seguimiento del plan de calidad técnica de la Obra.	NA		CUMPLE	
Fotocopia de la Bitácora o libro de obra.	SI		CUMPLE	Folio 107-138
Resumen de las actividades realizadas en el mes	SI		CUMPLE	Folio 20-50
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, junto con el pago de contraprestaciones y aportes parafiscales por cada uno de ellos.	SI		CUMPLE	Folio 17-19
Informe de Seguridad Industrial.	SI		CUMPLE	Folio 158-370
Informe de manejo ambiental y del PGRCD.	SI		CUMPLE	Folio 371-430
Informe de gestión social.	N.A.			
Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra, incluyendo las alertas respectivas.	SI		CUMPLE	20-59
Aspectos Técnicos				
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (cuando aplique)	N.A.		N.A.	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	N.A.		N.A.	
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	N.A.		CUMPLE	Folio 55-58
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	Folio 17-19
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	N.A.		N.A.	
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	Folio 158-370
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	Folio 249-254
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra .	Si		CUMPLE	Folio 244 - 248
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de los trabajadores de la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 249-254
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 327-370
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	Folio 258-295
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/1nBioMbuyj2OCn9EVf2ph6GzZdFKD03Fb

Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		32	Folio 62
Garantías	SI		33,34,35	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	N.A.		N.A.	
Actas parciales	N.A.		CUMPLE	Folio 55
Modificaciones	N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	Folio 97 - 106
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE OBRA	Elaboró	Revisó.
Consorcio fortaleza	Residente de obra	Director de Interventoría

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA 10

06/07/2026 – 05/08/2026

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JONATHAN GRAJALES LARGO	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA

CONSORCIO FORTALEZA

.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

Adicionalmente a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” (2024 – 2027), cumpliendo con el Programa 2024-2027 “4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno” Objetivo estratégico: “4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, estableció dentro de sus metas “Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje”.
La estructura organizacional de esta secretaría, está conformada por subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por direcciones, estando en cabeza de la subsecretaría de acceso y permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Contenido

INTRODUCCIÓN 2
TABLAS 7
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 9
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 10
2. CONTRATO SUSCRITO 10
2.1 CONTRATO DE OBRA 10
2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO 11
3. CONTROL DE PÓLIZAS INICIALES 13
4. INFORME GENERAL DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS 15
4.1 ACTAS DE VECINDAD 15
4.2 PERSONAL PARA INTERVENCIÓN 16
4.3 CERTIFICADOS DE MATERIALES 19
4.4 BITACORAS DE OBRA 19
5. INFORME DE EJECUCION DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS 20
5.1 COLEGIO JOSE JAIME ROJAS SEDE A – CIUDAD BOLIVAR 20
5.1.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 20
5.1.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 20
5.1.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 21
5.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
5.2 COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILLA SEDE D – CIUDAD BOLÍVAR 22
5.2.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 22
5.2.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 22
5.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 22
5.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
5.3 COLEGIO DON BOSCO SEDE A – CIUDAD BOLIVAR 23
5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 23
5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 23
5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 24
5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
5.5 COLEGIO BRASILIA- USME 25

5.5.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 25
5.5.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
5.5.3 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 26
5.5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 27
5.6 COLEGIO ATHABANZA SEDE A - USME 32
5.6.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 32
5.7.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 32
5.6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 32
5.6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 32
5.7 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A - USME 33
5.7.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 33
5.7.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 33
5.7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 35
5.7.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 36
5.8 COLEGIO BICENTENARIO – CIUDAD BOLIVAR..... 37
5.8.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 37
5.8.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 37
5.8.3 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 38
5.8.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 39
5.9 COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE D– CIUDAD BOLIVAR..... 40
5.9.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 40
5.9.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS 40
5.9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 41
5.9.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 41
6.0 EMERGENCIAS (ACTUALES)..... 42
6.1. COLEGIO BRASILIA - USME..... 43
6.1.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 43
6.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 44
6.2. COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS..... 44
6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 44
6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 46
6.3. IE FERNANDO GONZALEZ OCHOA..... 47
6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 47

6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 49
6.4. IE PARAISO MIRADOR SEDE B 49
6.4.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 49
6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO..... 51
7.0 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 52
8.0 BALANCE PRESUPUESTAL..... 54
9.0 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 55
ADICION 1 55
PROGRAMACIÓN GENERAL..... 55
ADICION 02. 56
PROGRAMACIÓN GENERAL..... 56
10. MATRIZ CLIMA MENSUAL 59
ANEXOS 60
ANEXO 1. CONTRATO FIRMADO SECOP..... 61
ANEXO 2. ACTA DE INICIO 62
3. POLIZA TODO RIESGO..... 62
4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO..... 63
5. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 64
6. POLIZA TODO RIESGO ADICIÓN 2..... 65
7. POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICIÓN 2..... 66
8. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADICIÓN 2..... 67
9. ACTAS DE VECINDAD 72
ACTA DE VECINDAD COLEGIOS ACTIVOS..... 72
JOSE JAIME ROJAS..... 72
..... 73
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.BIBLIOTECA 74
PARAISO MIRADOR SEDE D..... 76
FERNANDO GONZALEZ OCHOA..... 78
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. COMEDOR..... 79
..... 79
..... 79
10. FICHAS TECNICAS MATERIALES Y CERTIFICADOS CALIDAD..... 80
CERTIFICADO CALIDAD PERLIN C, ESTRUCTURA METALICA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS, MIGUEL DE CERVANTES..... 80

CERTIFICADO CALIDAD GEOTEXTIL – COLEGIO DON BOSCO, LUIS EDUARDO MORA, ATHABANZA, MIGUEL DCERVANTES, JOSE CELESTINO MUTIS 81
FICHA TECNICA GEOTEXTIL 81
FICHA TECNICA RECUBRIMIENTO COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA, BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE. 84
..... 84
FICHA TECNICA CEMENTO COLEGIO DON BOSCO, ARABIA, ATHABANZA, BRASILIA, CERVANTES, BIBLIOTECA, ... 88
FICHA TECNICA ACABADO PISO COLEGIO ARABIA, BRASILIA 89
FICHA TECNICA PISO CHIP COLEGIO ATHABANZA, LUIS EDUARDO MORA 90
FICHA TECNICA PINTURA EPOXICA COLEGIO BRASILIA 92
FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES 94
. FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES 96
11. ANEXO ACTAS DE ENTREGA. 97
ACTA DE ENTREGA COLEGIO BRASILIA BAÑOS 97
..... 97
..... 98
ACTA DE ENTREGA MIGUEL DE CERVANTES BIBLIOTECA 99
ACTA DE ENTREGA COLEGIO JOSE CELESTIMO MUTIS-EMERGENCIA 101
ACTA DE ENTREGA COLEGIO BICENTENARIO 103
ACTA DE ENTREGA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS 105
12. ANEXO BITACORAS DE OBRA 107
BITACORA DE OBRA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 107
BITACORA DE OBRA BRASILIA 124
BITACORA DE OBRA JOSE JAIME ROJAS 130
BITACORA DE BICENTENARIO 134
BITACORA RODRIGO LARA BONILLA 135
..... 135
..... 136
..... 137
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS 139
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO DON BOSCO 139
PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO BRASILIA 140

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 141
ADICIONES POR COLEGIO....142
ADICIONES 2 POR COLEGIO....145
EMERGENCIAS ACTIVAS....151
....153
....154
....155
....156
....157

ILUSTRACIONES

Ilustración 70. Detalle diseño cubierta Biblioteca 147
Ilustración 71. Programación de obra 139
Ilustración 72. Programación de obra 139
Ilustración 73. Programación Colegio Brasilia....140
Ilustración 74. Programación Colegio Miguel de Cervantes 141

TABLAS

Tabla 1 Contrato obra.... 10
Tabla 2. Obligaciones del contrato.... 12
Tabla 3. Obligaciones del contrato.... 13
Tabla 4 Control de pólizas iniciales.... 14
Tabla 5. Frentes de colegio abiertos.... 16
Tabla 6. Personal operativo contratista obra.... 17

ANEXOS

Anexo 1. Contrato firmado SECOP
Anexo 2. Acta de inicio
Anexo 3. Póliza cumplimiento
Anexo 4. Póliza RCE
Anexo 5. Póliza todo riesgo
Anexo 6. Póliza cumplimiento adición 2
Anexo 7. Póliza RCE adición 2
Anexo 8. Póliza todo riesgo adición 2
Anexo 9. Actas de vecindad
Anexo 10. Certificados de material y fichas técnicas
Anexo 11. Bitácoras de obra
Anexo 12. Detalle cerramiento metálico
Anexo 13. Detalle cubierto metálica José Jaime Rojas
Anexo 14. Programaciones de obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona sur de la localidad de ciudad de Bogotá y en la localidad de Usme, los colegios a intervenir son:

- Colegio Arabia – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio José Jaime Rojas – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio José María Vargas Villa Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio Don Bosco I – Sede A – Ciudad Bolívar
- Colegio Bicentenario – Sede C – Ciudad Bolívar
- Colegio Athabanza – Sede A – Usme
- Colegio Brasilia – Sede A – Usme
- Colegio Luis Eduardo Mora Osejo – Sede A – Usme
- Colegio Miguel de Cervantes Saavedra – Usme
- Colegio Paraíso Mirador – Sede D – Ciudad Bolívar
- Colegio Rodrigo Lara Bonilla – Sede B – Ciudad Bolívar

Igualmente, y de acuerdo con la necesidad de algunos colegios se realiza, adición en los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra, Don Bosco la Joya, José Jaime Rojas, Paraíso Mirador y Rodrigo Lara Bonilla, a la fecha se cuenta con emergencias como:

- Minuto De Buenos Aires. Entregada
- Tenerife Granada Sur. Entregada
- Fabio Lozano Simonelli Sede C. Entregada
- Santa Librada. Entregada
- Nueva Esperanza Entregada
- La Arabia Sede B. Entregada
- Gabriel García Márquez. Entregada
- José Celestino Mutis 01. Entregada
- Rafael Uribe Uribe Sede A. Entregada
- José María Vargas Vila Sede A. Entregada
- Brasilia Sede A. Entregada.
- Fernando González Ochoa Sede A. Culminada.
- José Celestino Mutis Sede 02. Entregada

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente contrato, se priorizarán sedes de acuerdo con las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1 CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Contrato obra

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8154895
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICA PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORTALEZA
NIT:	901.973.588-1

REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
CONTACTO:	CRA 25 A N° 37 - 12 - Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$2.269.368.717,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	6 OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 MARZO DE 2026
MODIFICACIÓN NO. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR MODIFICACIÓN NO. 1:	$515.000.000,00
PRÓRROGA:	1 MES Y 15 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL:	$2.784.368.717,00
MODIFICACIÓN NO. 2:	27 DE MAYO DEL 2026
VALOR MODIFICACIÓN NO. 2:	$617.000.000,00
PRÓRROGA:	3 MESES Y 15 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.401.368.717,00

La información correspondiente al contrato se encuentra debidamente suscrita en la legalización realizada en la plataforma del SECOP II, la cual se puede validar de manera más detallada en el capítulo de Anexos, Anexo No. 1_SECOP CTO. 8154895 de 2025. De igual forma, se suscribió el acta de inicio del contrato a partir del 30 de septiembre de 2025, y informe al plazo establecido de siete (7) meses para la ejecución de las obras del contrato 8154895 de 2025, se prevé fecha de terminación para el 05 de Octubre de 2026. Dicha información se ve reflejada en el capítulo de Anexos, Anexo No. 2_ACTA DE INICIO.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Obligaciones previas para la suscripción del contrato

Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar suscripción del contrato:

Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres

(3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos.

Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993.

La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).

En cumplimiento de lo anterior, el proponente seleccionado deberá entregar los siguientes documentos:

Tabla 2. Obligaciones del contrato

a. Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP para persona jurídica, al cual se anexarán los documentos soporte de la información que se registre.
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural.
c. Verificación de la definición de la situación militar del contratista persona natural y representante legal del contratista persona jurídica (cuando aplique)
d. En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión temporal y el Registro de identificación tributaria -RIT.
e. Antecedentes de la Personería de Bogotá D.C, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales que sean sus representantes.
f. Autorización firmada para poder realizar la consulta Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 2018. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta).
g. Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal y debe ser el mismo que aparece en los documentos del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio
h. Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria.
i. Fotocopia del Registro Único Tributario, vigente, actualizado y con los códigos que correspondan al objeto del contrato.
j. Declaración Proactiva bienes y renta, y conflicto de intereses aplicativo ley

2013/2019 de la persona natural o del Representante Legal del proponente singular o plural (Consorcio o Unión Temporal y el de sus integrantes (https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/).
k. Certificado expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC de NO encontrase inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM de la persona natural o del Representante Legal del proponente singular o plural (Consorcio o Unión Temporal y el de sus integrantes (https://redam.gov.co/). l.
l. De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, en caso de ser adjudicada la convocatoria a una persona natural o un consorcio o unión temporal integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas personas deberán presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando esté de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal según corresponda.
m. Estar al día en el pago de las multas conforme a los términos señalados el artículo 83 de la Ley 1801 de 2016 situación en el sistema registro nacional de medidas correctivas de la policía nacional – RNMC.

Además de los documentos relacionados anteriormente, el proponente adjudicatario debe aportar certificación bancaria que contenga la siguiente información:

Tabla 3. Obligaciones del contrato

a.	Entidad Bancaria donde tiene la cuenta
b.	Sucursal
c.	Tipo de cuenta bancaria
d.	Número de cuenta (los proponentes asociativos suministrarán esta información durante la ejecución del Contrato, en caso de ser adjudicatarios)
e.	Tipo de Régimen Tributario al que pertenece.
f.	Indicar si es responsable de ICA y la actividad económica.

3. CONTROL DE PÓLIZAS INICIALES

Las pólizas se encuentran debidamente suscritas ante una aseguradora legalmente constituida, como lo es Seguros Mundial, quienes dan cobertura al contrato de obra a través de las pólizas cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, a continuación, se presenta consolidada la información de las mismas:

Tabla 4 Control de pólizas iniciales

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No: **320 47 994000033722 ANEXO 06**			
ANEXO 6			
FECHA DE EXPEDICIÓN	**26-05-2026**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
	06-10-2025	05-06-2027	$680.273.743,40
	06-10-2025	05-10-2029	$340.136.871,70

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA N°: 320 74 994000015128 ANEXO 07			
FECHA DE EXPEDICIÓN	**26-05-2026**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
	20-06-2026	05-10-2026	$525.271.500,0

COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL				
POLIZA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN				
PÓLIZA N°: BQ-100000142_0 **Anexo 7**				
FECHA DE EXPEDICIÓN		**22-06-2026**		
COBERTURAS		**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	
		INICIAL	**FINAL**	
		06-10-2025	05-02-2027	$3.401.368.717,00

Revisar adjunto pólizas actualizadas según modificación 02.

4. INFORME GENERAL DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

4.1 ACTAS DE VECINDAD

Previo al inicio de las actividades de obra, y una vez se define con el señor rector la fecha de entrega de las áreas a intervenir, se procede a realizar el acta de estado del área o acta de vecindad. Este documento permite dejar constancia detallada de todos los elementos que se encuentran en el espacio a intervenir, incluyendo lámparas, tomacorrientes, interruptores, cortinas y mobiliario, entre otros.

Cabe resaltar que corresponde a cada institución educativa entregar los espacios totalmente desocupados o con sus elementos debidamente protegidos, ya que el contratista no asume responsabilidad por los daños que puedan presentarse en dichos elementos durante la ejecución de la obra.

En el periodo reportado en este informe, se realizaron las actas de vecindad correspondientes a los diez (10) frentes iniciales, en las fechas y colegios que se mencionan a continuación:

Tabla 5. Frentes de colegio abiertos

COLEGIO	FECHA ELABORACIÓN	ACTAS GENERADAS
1. Colegio Don Bosco la Joya	06/11/2025	10
2. Colegio José María Vargas Vila	7/11/2025	4
3. Colegio José Jaime Rojas	8/11/2025	6
4. Colegio la Arabia sede A	21/11/2025	4
5. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo	24/11/2025	9
6. Colegio Brasilia	11/12/2025	5
7. Colegio Athabanza	13/01/2026	3
8. Colegio Miguel de Cervantes	20/01/2026	4
9. Colegio Bicentenario	21/01/2026	2
10. Colegio Miguel de Cervantes Biblioteca	12/03/2026	2
11. Colegio Minuto de Buenos Aires	24/03/2026	4
12. Colegio Fabio Lozano Simonelli	06/04/2026	
13. Colegio Santa Librada	13/04/2026	
14. Colegio La Arabia Sede B		
15. Colegio Nueva Esperanza Sede A	27/04/2026	
16. Colegio Brasilia-Emergencia Bloque C	01/05/2026	
17. Colegio Gabriel García Márquez	13/05/2026	
18. Colegio José Celestino Mutis	28/05/2026	
19. Colegio Paraíso Mirador Sede D	01/06/2026	
20. Colegio Rafael Uribe Uribe-Emergencia Sede A		
21. Colegio Tenerife – Granada Sur-Emergencia Sede B		
22. Colegio José María Vargas Vila - Emergencia		

Esta información puede ser revisada en capítulo de anexos, correspondiente a Anexo No. 6_Actas de Vecindad, en la cual se encuentran las veinte dos (22) actas de vecindad relacionadas anteriormente.

4.2 PERSONAL PARA INTERVENCIÓN

Para poder ejecutar el contrato a cabalidad, Consorcio FORTALEZA cuenta con el personal idóneo y con la experiencia necesaria para desarrollar cada una de las actividades administrativas, civiles y operarias que requiere el desarrollo del proyecto y que en conjunto permiten llevar a feliz término cada una de los alcances.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operario con el cual cuenta Consorcio Construcciones FORTALEZA a la fecha del presente informe, los cuales se distribuyen por los seis (6) frentes de obra que se encuentran activos en este momento.

Tabla 6. Personal operativo contratista obra

PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA DE OBRA					
N°	**No. CEDULA**	**Empresa Contratante**	**Nombre y Apellido**	**Cargo**	**Fecha de Ingreso**
1	CC 1000178161	CONSORCIO FORTALEZA	CLAUDIA PAOLA BARBOSA GAITAN	Ayudante	2025-11-14
2	CC 1.020.716.685	CONSORCIO FORTALEZA	ESTIVEN SANTIAGO NIZO GUTIERREZ	Ayudante	2025-11-14
3	CC 1.015.407.380	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS ALEJANDRO BARBOSA GAITAN	Oficial	2025-11-14
4	CC 1.018.485.351	CONSORCIO FORTALEZA	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	2025-11-14
5	CC 79.2555.905	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	2025-11-14
6	CC 1.033.786.869	CONSORCIO FORTALEZA	YEISON ORLANDO SERRATO SILVA	Ayudante	2025-11-14
7	CC 1.012.436.533	CONSORCIO FORTALEZA	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	2025-11-14
8	CC 1.052.217.828	CONSORCIO FORTALEZA	JHON EVER ZAYAS LAZARO	Ayudante	2025-11-14
9	PPT 5.769.290	CONSORCIO FORTALEZA	ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA	Ayudante	2025-11-14
10	PEP 927566127041995	CONSORCIO FORTALEZA	JOCSAN INFANTE CONTRERAS	Ayudante	2025-11-14
11	CC 79.974.763	CONSORCIO FORTALEZA	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	2025-11-19
12	CC 1.033.764.451	CONSORCIO FORTALEZA	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	Ayudante	2025-11-19
13	CC 80.811.660	CONSORCIO FORTALEZA	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	2025-11-19
14	PPT 6499830	CONSORCIO FORTALEZA	KLAY KENI FERNANDEZ	Ayudante	2025-11-21
15	CC 1.069.258.450	CONSORCIO FORTALEZA	JHONH ALEJANDRO BEJARANO URREGO	APLICADOR	2025-11-21

16	CC 79.910.706	CONSORCIO FORTALEZA	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	2025-11-25
17	CC 1.026-580.632	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	2025-11-25
18	CC 1.024.516.278	CONSORCIO FORTALEZA	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	Oficial	2025-11-28
19	CC 1.001.058.459	CONSORCIO FORTALEZA	FAIDER ESTIVEN OCHOA TENORIO	Ayudante	2025-11-29
20	CC 1.026.255.184	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN DAVID CEDIEL VELASCO	Ayudante	2025-12-2
21	CC 1.000.793.056	CONSORCIO FORTALEZA	ALEX MARLON CAICEDO FLECHAS	Ayudante	2025-12-2
22	CC 1.023.868.733	CONSORCIO FORTALEZA	NICOLAS CAMARGO ALMANZA	Oficio	2025-12-3
23	CC 1.023.923.196	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN DAVID FONSECA LOPEZ	Auxiliar de ingenieria	2025-12-3
24	CC 3.171.723	CONSORCIO FORTALEZA	NOLBEIR VANEGAS MENDEZ	Ayudante	2025-12-3
25	CC 80.659.343	CONSORCIO FORTALEZA	ARMANDO VANEGAS MENDEZ	Ayudante	2025-12-3
26	CC 94.472.551	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS MARIO ROMERO ESPITIA	Ayudante	2025-12-15
27	CC 1.026.562.751	CONSORCIO FORTALEZA	FREDY ALONSO HENAO CLAVIJO	Oficio	2025-12-20
28	CC 1.075.241.900	CONSORCIO FORTALEZA	EDWIN SUAZA VARGAS	Ayudante	2025-12-20
29	CC 79.546.356	CONSORCIO FORTALEZA	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	Oficial de ayudante	2025-1-5
30	CC .1.004.506.950	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS DIEGO NARVAEZ	Instalador	2026-1-14
31	CC 1007867191	CONSORCIO FORTALEZA	DUVAN FELIPE FLOREZ	Instalador	2026-1-14
32	CC 85163409	CONSORCIO FORTALEZA	YIMIS SILVA LOPEZ	oficial	2026-1-14
33	CC 1044826070	CONSORCIO FORTALEZA	JESUS DAVID PINTO	Instalador	2026-1-14
34	CC 1045758628	CONSORCIO FORTALEZA	JORMAN JAIR OROZCO	Instalador	2026-1-15

35	CC 72341181	CONSORCIO FORTALEZA	JOSE JOAQUIN SANTANA	Instalador	2026-1-15
36	CC 1023888906	CONSORCIO FORTALEZA	DIEGO MAURICIO SALAZAR GOMEZ	Ayudante	2026-1-16
37	CC 1126251699	CONSORCIO FORTALEZA	JESUS NARVAEZ FLORIAN	Instalador	2026-1-24
38	CC 1085164361	CONSORCIO FORTALEZA	FERNANDO PAVA BETANCUR		

4.3 CERTIFICADOS DE MATERIALES

Dentro del alcance de los distintos frentes de intervención, la actividad principal corresponde al reemplazo de la cubierta existente. Adicionalmente, se desarrollan otras labores como impermeabilizaciones, reconstrucción de gradas, construcción de la enfermería, entre otras. Para cada una de estas actividades se emplean materiales de óptima calidad que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.

Los certificados de los materiales utilizados —como cubiertas, estructura metálica, grava, aceros, anticorrosivos y pinturas, entre otros— se encuentran disponibles para consulta en el capítulo de anexos, Anexo No. 7 certificados de Materiales.

4.4 BITACORAS DE OBRA

La Bitácora de obra corresponde al cuaderno que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra, por medio del cual queda registrado el diario de la construcción. En ella se realizan las anotaciones correspondientes a acuerdos, modificaciones o situaciones que impidan el normal desarrollo de la obra, es un instrumento importante en el control y supervisión de obra.

Con el fin de verificar las anotaciones acontecidas en el periodo del presente informe, estas se pueden revisar en detalle en capítulo anexos, Anexo No. 8_Bitácoras de Obra.

5. INFORME DE EJECUCION DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

5.1 COLEGIO JOSE JAIME ROJAS SEDE A – CIUDAD BOLIVAR

El Colegio José Jaime Rojas sede A se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar en Cra. 18 # 77a Sur 27.

5.1.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 1. Ubicación colegio José Jaime Rojas – Elaboración propia

5.1.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría, se cuenta con espacios entregados parcialmente como la biblioteca y la zona de orientación y se inician actividades en la zona de las aulas:

- **REPLANTEO:** se cuenta con 420.08 m2 ejecutados durante el mes.
- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE:** se cuenta con 348.13 m2 desmontados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA:** se cuenta con 6,771.79 KG suministrados durante el mes.
- **PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES:** se cuenta con 21.49 m2 protegidos durante el mes.
- **PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM):** se cuenta con 198.76 ml suministrados durante el mes.
- **VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS):** se cuenta con 168.60 m2 suministrados durante el mes.

5.1.3 REGISTRO FOTOGRAFICO.

		
ESTRUCTURA METALICA	**REPLANTEO**	**VINILO TIPO I**
		
ESTRUCTURA METALICA	**PAÑETE LISO**	**PAÑETE LISO**

Ilustración 2. Registro Fotográfico actividades del mes.

5.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra fue culminada en su totalidad para los frentes de obra civil y eléctrico, se realizo la respectiva entrega formal a la institución educativa, con presencia de la Interventoría y el contratista de obra.

5.2 COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILLA SEDE D – CIUDAD BOLÍVAR

El Colegio José María Vargas Villa se encuentra ubicado en la Cl**.** 81 A Sur No 6-40 Este

5.2.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 3. Ubicación Colegio José María Vargas Villa – Elaboración propia

5.2.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

ENTREGA A CONFORMIDAD SIN OBSERVACIONES

De acuerdo al alcance de este colegio se realiza entrega de la misma, se adjunta acta, donde estuvo presente rector del colegio, interventoría y contratista responsable.
Revisar Anexo acta entrega física de espacios a la IED.

Frente de obra completamente entregado.

5.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
PINTURA SOBRE POLIUREA	**MALLA NYLON**	**PANORÁMICA DE CUBIERTA**

Ilustración 4. Registro fotográfico Colegio José María Vargas Villa

5.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Sede terminada y entregada.
- Garantía 100% atendida e informada a la interventoría a través de informe de atención.

5.3 COLEGIO DON BOSCO SEDE A – CIUDAD BOLIVAR

El Colegio Don Bosco I Sede A se encuentra ubicado en la Calle 76 A Sur No 8 D 59

5.3.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 5. Ubicación colegio Don Bosco Sede A – Elaboración propia

5.3.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **EQUIPO DE BOMBEO:** Se realizo la culminación de la instalación del sistema de bombeo, de agua potable de la institución educativa.

- Se logro evidenciar el daño de una válvula de pie, la cual requiere desocupar el tanque subterráneo para la institución educativa, se esta revisando para realizar la verificación de esa válvula la semana del 10 al 14 de agosto.

5.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO.

		
EQUIPO DE BOMBEO	**EQUIPO DE BOMBEO**	**EQUIPO DE BOMBEO**

Ilustración 6. Registro Fotográfico actividades del mes.

5.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El colegio cuenta con un avance de 100%
- A La fecha del presente informe el NP de sistema de bombeo ya fue ejecutado.
- Se esta coordinando la reparación de una válvula de pie que presenta el tanque subterráneo de la institución educativa.

5.5 COLEGIO BRASILIA- USME

El Colegio Brasilia se encuentra ubicado en la Cl. 73b Sur #1 a 73b

5.5.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 7. Ubicación Colegio Brasilia - Elaboración propia

5.5.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **REPLANTEO:** se cuenta con 50.39 m2 ejecutados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA:** se cuenta con 144.29 m2 suministrados durante el mes.
- **PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4:** se cuenta con 4.31ml suministrados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI:** se cuenta con 7.72Kg suministrados durante el mes.
- **COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI:** se cuenta con 2.40 ml suministrados durante el mes.
- **ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO:** se cuenta con 1 mes de alquiler.

- **WIN DE ALUMINIO:** se cuenta con 8.65 ml suministrados durante el mes.
- **ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** se cuenta con 30.20 ml suministrados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO:** se cuenta con 32.65 m2 suministrados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO):** se cuenta con 33.22 ml ejecutados durante el mes.
- **PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES:** se cuenta con 30.20 ml suministrada durante el mes.
- **PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS:** se cuenta con 31.20 m2 suministrada durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO:** se cuenta con 11.40 ml suministradas durante el mes.

5.5.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
ENCHAPE DE PARED	**PAÑETE**	**ACERO DE REFUERZO**
		
BAÑO PORTATIL	**WIN DE ALUMINIO**	**ESTUCO FILOS**

Ilustración 8. Registro Fotográfico actividades durante el mes.

5.5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la culminación de las actividades de obra civil de la intervención de las baterías de baños del bloque de bachillerato.

- De igual forma se realizó la intervención de las baterías de baños del bloque C, tanto para niños como para niñas, realizado a través de las emergencias, la intervención realizada en la emergencia contemplo las siguientes actividades:


	COLEGIO BRASILIA (BAÑOS PRIMARIA)	
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2

1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN

4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN

11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2


CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

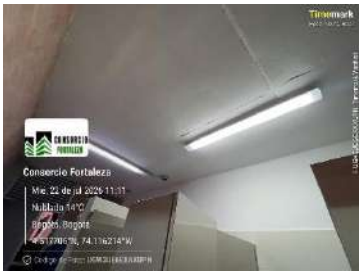		
APARATOS SANITARIOS	**PINTURA**	**PINTURA PLACA**
		
DIV ACERO INOX	**LAVAMANOS POLICUARZO**	

5.6 COLEGIO ATHABANZA SEDE A - USME

El Colegio Athabanza se encuentra ubicado en la Cl. 92 Sur #2-43

5.6.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN

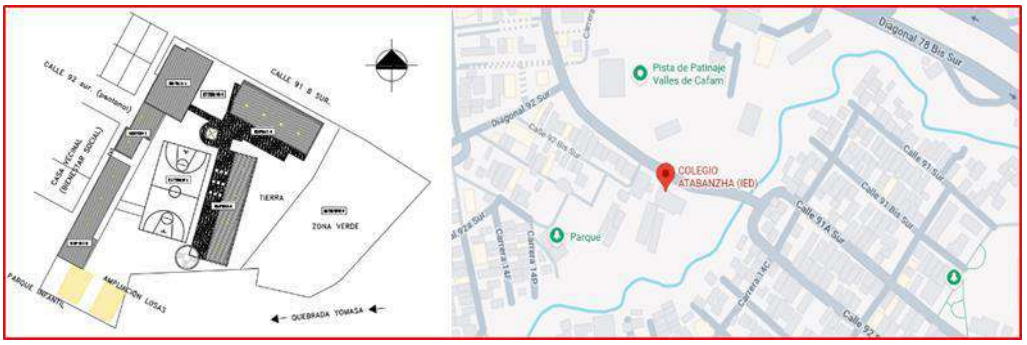

ENTREGA A CONFORMIDAD SIN OBSERVACIONES

Colegio completamente entregado a conformidad sin observaciones.

5.6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
PISO CHIP	**PISO CHIP**	**INSTALACIÓN GEOTEXTIL**

Ilustración 10. Registro fotográfico Athabanza

5.6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Sede terminada y entregada.
- Se atendió garantía solicitada por el colegio para la cerradura ubicada en el salón 105, la cual fue cambiada por una totalmente nueva para dar por culminada al 100% dicha

garantía.

5.7 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A - USME

El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, se encuentra ubicado en a 1c-30, Dg. 76b Sur #1c-2.

5.7.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 11. Ubicación Colegio Miguel Angel Cervantes Saavedra - Elaboración propia

5.7.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **REPLANTEO:** se cuenta con 535.79 m2 ejecutados durante el mes.
- **DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO:** se cuenta con 520.91 m2 demolidos durante el mes.
- **DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO:** se cuenta con 463.03 m2 demolidos durante el mes.
- **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN:** se cuenta con 137.87 m3 ejecutados durante el mes.
- **CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI:** se cuenta con 13 m2 suministrados durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA:** se cuenta con 40.01 ml suministrados durante el mes.

- **PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PS:** se cuenta con 24.93 m2 suministrados durante el mes.

- **SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI:** se cuenta con 459.78 m2 suministrados durante el mes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER:** se cuenta con 3 unidades suministrados durante el mes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS:** se cuenta con 3 unidades suministradas durante el mes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO:** se cuenta con 2 unidades suministradas durante el mes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO:** se cuenta con 8.17 m2 suministrados durante el mes.

- **VINILO TIPO 1:** se cuenta con 27.26 m2 ejecutados durante el mes.

- **PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES:** se cuenta con 7.11 m3 suministrados durante el mes.

- **AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3:** se cuenta con 16.81 m2 ejecutados durante el mes.

- **TABLETA GRES LISO:** se cuenta con 209.84 m2 suministrados durante el mes.

- **TRASIEGO CARRETILLA:** se cuenta con 127.86 m3 suministrados durante el mes.

- **DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC:** se cuenta con 15 unidades desmontadas durante el mes.

- **DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES:** se cuenta con 6 unidades suministrada durante el mes.

- **DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA:** se cuenta con 53.78 m2 demolidos durante el mes.

- **DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE:** se cuenta con 16.57 m2 suministrada durante el mes.

- **DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO:** se cuenta con 520.91 m2 demolidos durante el mes.

- **DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO:** se cuenta con 170.28 m2 destroncadas durante el mes.

- **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA:** se cuenta con 15.21 m2 suministrados durante el mes.

- **ENTREGA BAÑOS MUJERES.**

- **INICIO EJECUCION BAÑO HOMBRES Y PMR:** Se realiza en replanteo de dicho los baños en mención, se procedió al retiro de aparatos sanitarios y divisiones metálicas existentes, se procedió a realizar las demoliciones de enchape cerámico, y demolición de piso con su respectivo acabado para luego proceder a la instalación de red hidrosanitaria nueva.

- **INICIO DE ACTIVIDADES AREA DE PARQUEADERO:** Se inicio proceso de demolición de placa de contrapiso de 10 cm, y se realizó la excavación a máquina de área de parqueadero.

- **INICIO DE ACTIVIDADES AREA COMEDOR:** Se inicio proceso actividades en el área de comedor, Se realizo cerramiento en polisombra, se iniciaron a instalar correas metálicas en la zona de comedor, se realizó el retiro de cielo raso en área de cocina, desmonte de luminarias, y se inició con retiro de teja del área de comedor.

5.7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
CANAL DE AGUAS LLUVIAS	**FILTRO AREA DE PARQUEADERO**	**RELLENO MATERIAL GRANULAR PARQUEADERO**
		

ESTRUCTURA COMEDOR	ESTRUCTURA COMEDOR	CUBIERTA COMEDOR
		
PLAZOLETA CENTRAL TERMINADA	**DISPOSICION TEJA ASBESTOCEMENTO**	**CERRAMIENTO POLISOMBRA**

5.7.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ejecutaron actividades importantes en el área de comedor, realizando desmonte de cubierta existente, desmonte de cielo rasos existentes y desmonte correas existentes.
- Se registró un avance significativo en l estructura de cubierta tipo C, específicamente en la instalación de las correas que soportaran la teja tipo sándwich.
- Se instalaron elementos sanitarios y complementarios, en el baño de hombres de la biblioteca Marichuela.
- Se realizo la culminación de la intervención de la batería sanitaria hombres de la biblioteca marichuela, en todas sus actividades civiles.
- Se Continuaron con actividades de estabilización del terreno a través del filtro geodren perimetral del parqueadero, y relleno material granular del mismo con su respectiva compactación
- Se continúan actividades en área de comedor centradas especialmente en el mantenimiento de cerchas estructurales principales del comedor, instalación de perfil tipo c 200x 63, que ejerce la función de correas de soporte para la cubierta tipo sándwich, también se retiraron todos los cielo rasos existente en el área de cocina, se inició con la instalación de canal de guas lluvias y se inicio con instalación de la cubierta tipo sándwich

5.8 COLEGIO BICENTENARIO – CIUDAD BOLIVAR

El Bicentenario El tesoro de la cumbre, se encuentra ubicado en a Cl. 78 Bis A Sur #18j41 18j- a 18j

5.8.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN

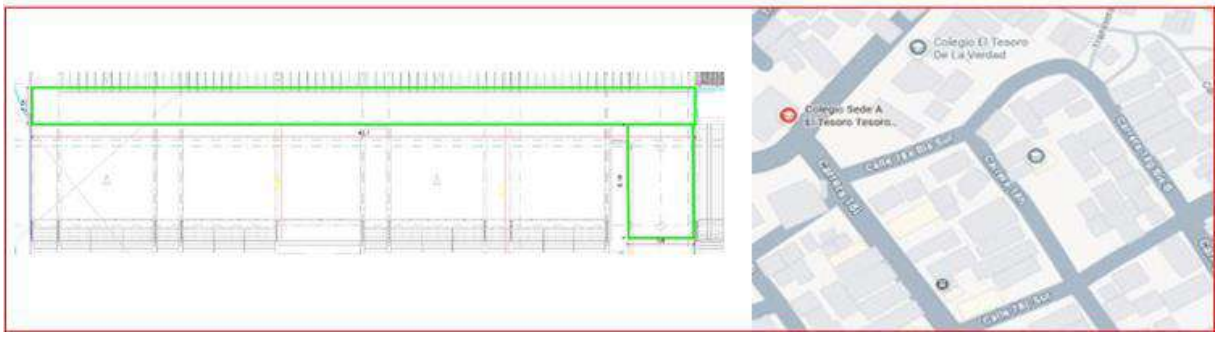


Ilustración 12. Ubicación Colegio Bicentenario - Elaboración propia.

5.8.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **CERRAMIENTO EN LONA:** se cuenta con 125.82 ml ejecutadas durante el mes.
- **DEMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE:** se cuenta con 94,12 m2 desmontado durante el mes.
- **DESTRONQUE DE PLACAS EN CONCRETO:** se cuenta con 42.82 m2 destroncadas durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:** se cuenta con 203.91 m3 suministrada durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL:** se cuenta con 94,12 m2 suministrada durante el mes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4":** se cuenta con 12.11 ml suministrada durante el mes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4":** se cuenta con 23 unidades suministradas durante el mes.

- **PINTURA VINILO SOBRE MUROS:** se cuenta con 12.11 ml suministrada durante el mes.

- **DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO:** se cuenta con 22.08 m2 destroncadas durante el mes

- **VINILO TIPO 1:** se cuenta con 12.11 ml suministrada durante el mes.

5.8.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
CERRAMIENTO EN LONA	**DESMONTE DE CERRAMIENTO**	**DESTRONQUE DE PLACAS EN CONCRETO**
		

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	**CERRAMIENTO PRIMETRAL**	**TUBERIA PVCS 4"**
		
ACCESORIOS PVC-S 4"	**PINTURA VINILO**	**DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO**
		
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA	**VINILO TIPO**	**MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA**

Ilustración 13. Registro Fotográfico actividades ejecutadas durante el mes

5.8.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la entrega formal de las actividades ejecutadas al interior de la institución educativa, el 07 de Julio del presente año con presencia de supervisión del contrato, personal de la Interventoría, contratista y personal del colegio, se hace recorrido mostrando las actividades realizadas, y realizando la entrega del manual correspondiente y de la matriz de mantenimiento.

5.9 COLEGIO PARAÍSO MIRADOR SEDE D– CIUDAD BOLIVAR

El Colegio Paraíso Mirador, se encuentra ubicado en Cl. 71p Sur #27p-34.

5.9.1 LOCALIZACIÓN INTERVENCIÓN



Ilustración 14. Ubicación Colegio Paraíso Mirador - Elaboración propia

5.9.2 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- **REPLANTEO:** se cuenta con 96.03 m2 ejecutados durante el mes.
- **CERRAMIENTO EN LONA:** se cuenta con 90.00 ml ejecutados durante el mes.
- **EXCAVACIONES:** Se realizan 12,62 m3 de excavación perimetral.
- **CERRAMIENTO METALICO:** Se realizan 240,08 m2 de cerramiento

5.9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

		
CERRAMIENTO METALICO	**CERRAMIENTO METALICO**	**CERRAMIENTO METALICO**
		
CERRAMIENTO METALICO	**CERRAMIENTO METALICO**	

Ilustración 15. Registro fotográfico de las actividades realizadas durante el mes

5.9.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se prosigue con instalación de cerramiento perimetral llegando a culminar el 100% de la instalación, solo quedando pendientes los respectivos retoques de pintura y consolidación final del mismo para poder realizar la respectiva entrega.
- Se instala de igual formal portón para colegio completamente nuevo, fabricado para la institución educativa.
- Este colegio fue incorporado dentro de la Adición No. 2 del contrato, razón por la cual las actividades ejecutadas corresponden a la programación establecida para esta ampliación del alcance de la obra.

6.0 EMERGENCIAS (ACTUALES)

En el momento se atienden emergencias en varios colegios de Ciudad Bolívar y Usme:

1. Colegio Brasilia En ejecución adecuación baños bloque C de niños y niñas, ambos completamente culminados.
2. Colegio José Celestino mutis: Se ejecuto en la totalidad en filtro para mitigar acceso e agua a aulas, al igual que la caja de inspección de direccionamiento de las mismas aguas lluvias, el colegio solicito una compuerta metálica para acceder a la zona de filtro está en fabricación. Completamente culminado
3. Colegio Fernando Gonzales Ochoa, Instalación de piso en vinilo 2 aulas y cambio de cubierta y piso en zona de jugos de pelotas, completamente culiminado.

6.1. COLEGIO BRASILIA - USME

El Colegio se encuentra ubicado en la Calle 53 Bis Sur #87-08, en la localidad de Usme.

6.1.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.13		20.13	10.68
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	10.00		10.00	1.50
DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.90		1.90	1.90
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.36		5.36	2.12
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.62		67.62	25.72
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13.00		13.00	7.00
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13.00		13.00	5.91
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	6.00		6.00	3.00
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24.86		24.86	11.31
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	1.80		1.80	1.80
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	4.00		4.00	5.00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	6.00		6.00	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00		2.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00		2.00	2.00
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	55.82		55.82	27.22
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	1.81		1.81	5.43
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	20.13		20.13	10.68
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	20.13		20.13	9.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	55.82		55.82	27.34
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14.56		14.56	14.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACANA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	14.92		14.92	14.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	4.44		4.44	2.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00		2.00	2.00

Ilustración 16. Actividades ejecutadas Colegio Brasilia

6.1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.



EMERGENCIA CULMINADA

Ilustración 17. Registro fotográfico emergencia Culminada

6.2. COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.

El Colegio se encuentra ubicado en la Vía Mochuelo / Km 10 Vía Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar.

6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo

con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

	COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS (EXTERIOR)		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	10,00
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	21,41
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	5,61
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	50,35
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	32,00
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0,64

Ilustración 18. Actividades ejecutadas Colegio Rural José Celestino Mutis

6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.

		
EMERGENCIA EJECUCION		

Ilustración 19. Registro fotográfico emergencia

6.3. IE FERNANDO GONZALEZ OCHOA

El Colegio se encuentra ubicado en la Dgl 87 D bis Sur # 56ª-43 este, en la localidad de Usme.

6.2.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	103,36
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,88
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	298,23
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,55
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00
5.1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 120 X 30CM 48 W. INCLUYE SOPORTES, MARCO PARA PANEL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	103,36
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	107,04
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	2,09
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	8,50
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	43,14
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	107,04

Ilustración 20. Actividades ejecutadas Colegio Fernando Gonzalez Ochoa

6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.





EMERGENCIA EJECUCION

Ilustración 21. Registro fotográfico emergencia

6.4. IE PARAISO MIRADOR SEDE B

6.4.1 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Una vez realizado el reconocimiento de la institución educativa a intervenir, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato y la interventoría se cuenta con el desarrollo de las siguientes actividades a la fecha:

- Demolición de enchape cerámico de pared.
- Demolición de enchape grano mármol de piso
- Desmonte de aparatos sanitarios
- Desmonte de puertas
- Demolición de mesón corrido lavamanos
- Regatas redes hidrosanitarias
- Redes Hidrosanitarias
- Pañete impermeabilizado
- Afinado de piso
- Enchape Cerámico de pared
- Win metálico

	PARAISO MIRADOR SEDE B		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21,54
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	17,60
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,05
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,09
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,48
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11,00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	8,00
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	18,05
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1,73
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	94,09

Ilustración 22. Actividades ejecutadas IED Paraíso mirador Sede B


6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.









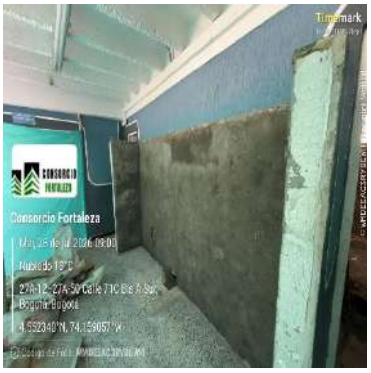




EMERGENCIA EJECUCION

Ilustración 23. Registro fotográfico emergencia

7.0 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO

Para las obras de mantenimiento a efectuar en cada uno de los nueve (9) colegios, se ha destinado un alcance de las actividades a ejecutar, un tiempo estimado en que se realizaran los proyectos y un valor presupuestado a invertir en los mismos. Con el fin de llevar la trazabilidad de la ejecución de los proyectos en sus tres componentes alcance, tiempo y costo, se realizó la programación de obra en el programa Project, el cual se encuentra autorizado por la entidad contratante para cumplir este fin.

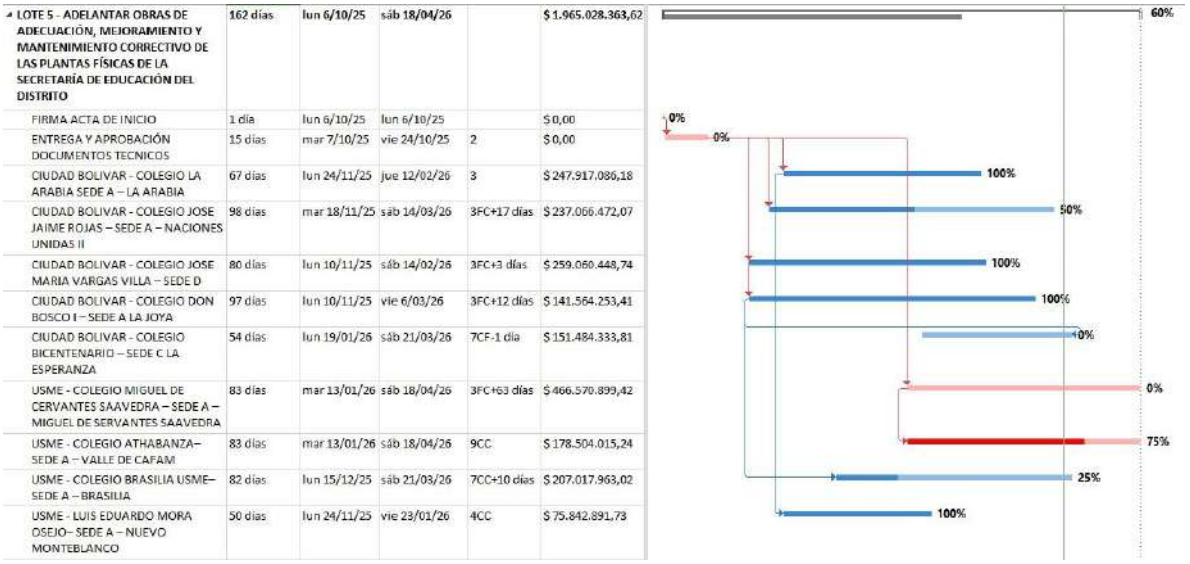

LOTE 5 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	162 días	lun 6/10/25	sáb 18/04/26		$ 1.965.028.363,62
FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	98 días	mar 18/11/25	sáb 14/03/26	3FC+17 días	$ 237.066.472,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	97 días	lun 10/11/25	vie 6/03/26	3FC+12 días	$ 141.564.253,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.963,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73

Ilustración 24. Cronograma de trabajo

Es por ello que, en dicha programación para cada una de las instituciones educativas, se encuentran desglosadas las actividades a ejecutar que componen el alcance, agrupadas por capítulos y subcapítulos. Así mismo, cada una de las tareas cuenta con un tiempo estimado de ejecución, el cual se encuentra dentro del periodo asignado a cada colegio y dicho tiempo en conjunto da la totalidad de ejecución del proyecto correspondiente a siete (7) meses.

De igual forma, todas las tareas cuentan con un valor presupuestal asignado con lo cual se estipula el valor a ejecutar para cada uno de los frentes de obra y cuya sumatoria da el rubro asignado al contrato el cual asciende a la suma de Dos Mil Doscientos Ochenta Mil Veintiocho, Trescientos Sesenta y Tres pesos M/Cte. ($2.280.028.363.62).

A continuación, se presenta una imagen resumen de la programación de obra.

En la anterior imagen se puede observar que la programación esta estipulada para los (9) frentes de obra con un tiempo total de ejecución a siete (7) meses y un costo total por el valor asignado al contrato, no obstante, esta puede presentar algunos cambios según se vayan ejecutando las obras y se vaya validando la necesidad de inició de algunos colegios.

A la fecha se han entregado finalmente los colegios, cumpliendo con las fechas estimadas inicialmente.

- José María Vargas Vila
- Luis Eduardo Mora Osejo
- Atabanzha.
- La Arabia Sede A.
- Bicentenario
- José Jaime Rojas
- Brasilia Baños Hombres y mujeres
- Biblioteca (Miguel de Cervantes) Entrega de Baños Hombres y mujeres.

Entregas Parciales:

- Miguel de Cervantes Saveedra – Plazoleta central.

Se observa un resumen de la programación, la misma se puede revisar en su totalidad en el Capítulo de anexos, Anexo No. 40_Programación de Obra.

FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	130 días	mar 18/11/25	vie 19/06/26	3FC+17 días	$ 361.768.066,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	130 días	lun 10/11/25	sáb 20/06/26	3FC+12 días	$ 331.862.659,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.963,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73




Ilustración 25. Cronograma inicial de obra

8.0 BALANCE PRESUPUESTAL

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Agosto 09 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216.308.160,00	100,00%	$ 216.308.158,83	100,00%	$ 216.308.160,00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 326.109.661,33	100,00%	$ 326.109.661,33	100,00%	$ 326.109.661,33	0,00%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 714.899.572,43	83,54%	$ 613.070.175,39	71,64%	$ 855.799.629,42	-11,90%
JOSE VARGAS VILA	$ 259.085.355,00	100,00%	$ 259.085.206,18	100,00%	$ 259.085.355,00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 154.311.171,56	100,00%	$ 154.311.171,56	100,00%	$ 154.311.171,56	ENTREGADO
DON BOSCO	$ 334.388.530,08	100,00%	$ 334.388.530,08	100,00%	$ 334.388.530,08	0,00%
BRASILIA	$ 173.127.488,07	100,00%	$ 173.127.488,07	100,00%	$ 173.127.488,07	0,00%
LUIS E MORA OSEJO	$ 71.970.813,38	100,00%	$ 71.970.813,38	100,00%	$ 71.970.813,38	ENTREGADO
BICENTENARIO - TESORO	$ 189.023.272,16	100,00%	$ 189.023.272,16	100,00%	$ 189.023.272,16	0,00%
PARAISO MIRADOR	$ 75.881.041,06	30,11%	$ 205.105.745,39	81,39%	$ 252.000.000,00	51,28%
RODRIGO LARA BONILLA	$ 16.776.136,60	25,81%	$ 34.217.071,12	52,64%	$ 65.000.000,00	26,83%
TOTALES	**$ 2.531.881.201,67**	**87,39%**	**$ 2.576.717.293,49**	**88,94%**	**$ 2.897.124.081,00**	1,55%

Ilustración 26.Balance Presupuestal

De acuerdo al avance actual se considera el siguiente balance presupuestal.

Los frentes de obra que se presentan a continuación presentan un ejecutado del 100%.

- La arabia
- José Jaime Rojas
- José Vargas Vila
- Athabanzha.
- Don Bosco
- Brasilia
- Luis E Mora Osejo
- Bicentenario

Finalmente, las sedes Miguel de Cervantes (71,64%),presenta un retraso de 11,90 % , para corregir esto se tienen trabajando al personal el mayor tiempo posible, avanzando en todos los frentes de la obra activos para poder mitigar dicho retraso en cuanto a la sede de Paraíso Mirador (81,39%) y Rodrigo Lara Bonilla (52,64%) registran niveles superiores a laa programación de obra avanzando diariamente en sus actividades y con la meta de poder terminar antes del tiempo establecido, no se han desatendido en ningún momentos las actividades de obra, ni se ha dejado de tener trabajadores en sitio.

9.0 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	%	VALOR	PAGO
1	14,04%	$ 477.513.861,00	$ 477.513.861,00
2	9,98%	$ 339.371.720,00	$ 339.371.720,00
3	8,89%	$ 302.269.474,00	$ 302.269.474,00
4	11,99%	$ 407.886.862,00	$ 407.886.862,00
5	15,86%	$ 539.615.066,00	$ 539.615.066,00
6	13,04%	$ 443.649.199,00	$ 443.649.199,00
TOTAL	73,80%	$ 2.510.306.182,00	


Ilustración 27. Estado financiero de la obra

ADICION 1

De acuerdo con los alcances y el valor adicional a ejecutar, solicito muy amablemente se adelanten las gestiones necesarias, para adicionar el presupuesto del contrato en **$288.636.662,00** y se realice una prórroga en tiempo 1.5 meses, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 20 de junio de 2026.

PROGRAMACIÓN GENERAL.

LOTE 5 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	214 días	lun 6/10/25	sáb 20/06/26		$ 2.280.028.363,62
FIRMA ACTA DE INICIO	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		$ 0,00
ENTREGA Y APROBACIÓN DOCUMENTOS TECNICOS	15 días	mar 7/10/25	vie 24/10/25	2	$ 0,00
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO LA ARABIA SEDE A – LA ARABIA	67 días	lun 24/11/25	jue 12/02/26	3	$ 247.917.086,18
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE JAIME ROJAS – SEDE A – NACIONES UNIDAS II	130 días	mar 18/11/25	vie 19/06/26	3FC+17 días	$ 361.768.066,07
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILLA – SEDE D	80 días	lun 10/11/25	sáb 14/02/26	3FC+3 días	$ 259.060.448,74
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO DON BOSCO I – SEDE A LA JOYA	130 días	lun 10/11/25	sáb 20/06/26	3FC+12 días	$ 331.862.659,41
CIUDAD BOLIVAR - COLEGIO BICENTENARIO – SEDE C LA ESPERANZA	54 días	lun 19/01/26	sáb 21/03/26	7CF-1 día	$ 151.484.333,81
USME - COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – SEDE A – MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	3FC+63 días	$ 466.570.899,42
USME - COLEGIO ATHABANZA– SEDE A – VALLE DE CAFAM	83 días	mar 13/01/26	sáb 18/04/26	9CC	$ 178.504.015,24
USME - COLEGIO BRASILIA USME– SEDE A – BRASILIA	82 días	lun 15/12/25	sáb 21/03/26	7CC+10 días	$ 207.017.903,02
USME - LUIS EDUARDO MORA OSEJO– SEDE A – NUEVO MONTEBLANCO	50 días	lun 24/11/25	vie 23/01/26	4CC	$ 75.842.891,73

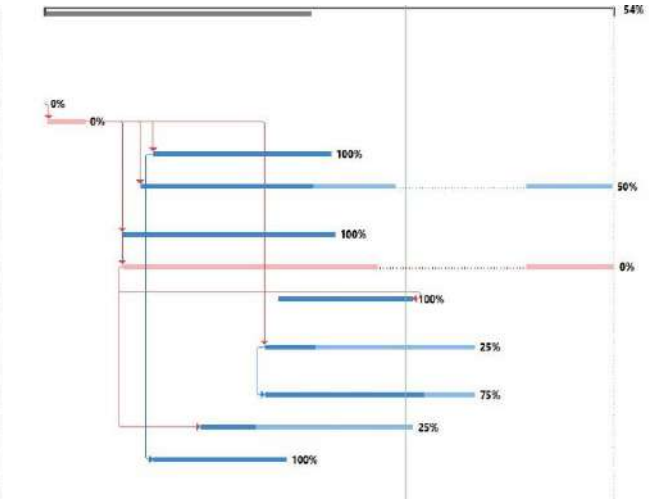

VALOR ESTIMADO ADICIÓN POR FRENTE DE OBRA

ADICION 01

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1973	CIUDAD BOLIVAR	DON BOSCO I	SEDE A – LA JOYA (DON BOSCO)	$ 163.935.068,00
1934	CIUDAD BOLIVAR	JOSE JAIME ROJAS	SEDE A – NACIONES UNIDAS II	$ 124.701.594,00
TOTAL (INCLUYE AIU)				**$ 288.636.662,00**

Ilustración 28. Valor estimado Adición 1

ADICION 02.

De acuerdo con los alcances y el valor adicional a ejecutar, solicito muy amablemente se adelanten las gestiones necesarias, para adicionar el presupuesto del contrato en **$617.00.000,00** y se realice una prórroga en tiempo 3.5 meses, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 5 de octubre de 2026.

PROGRAMACIÓN GENERAL

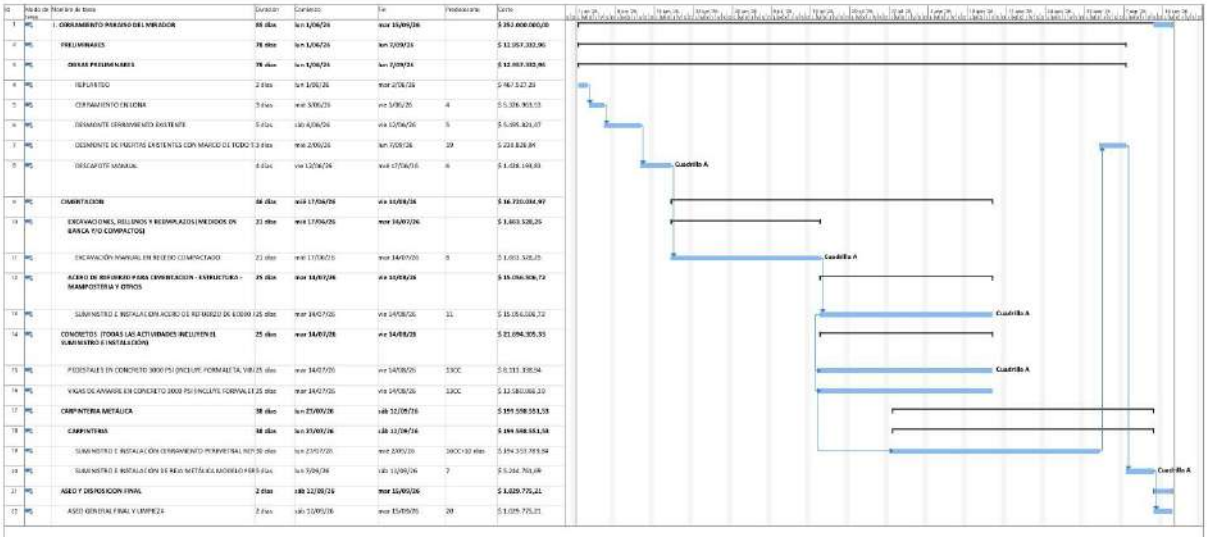
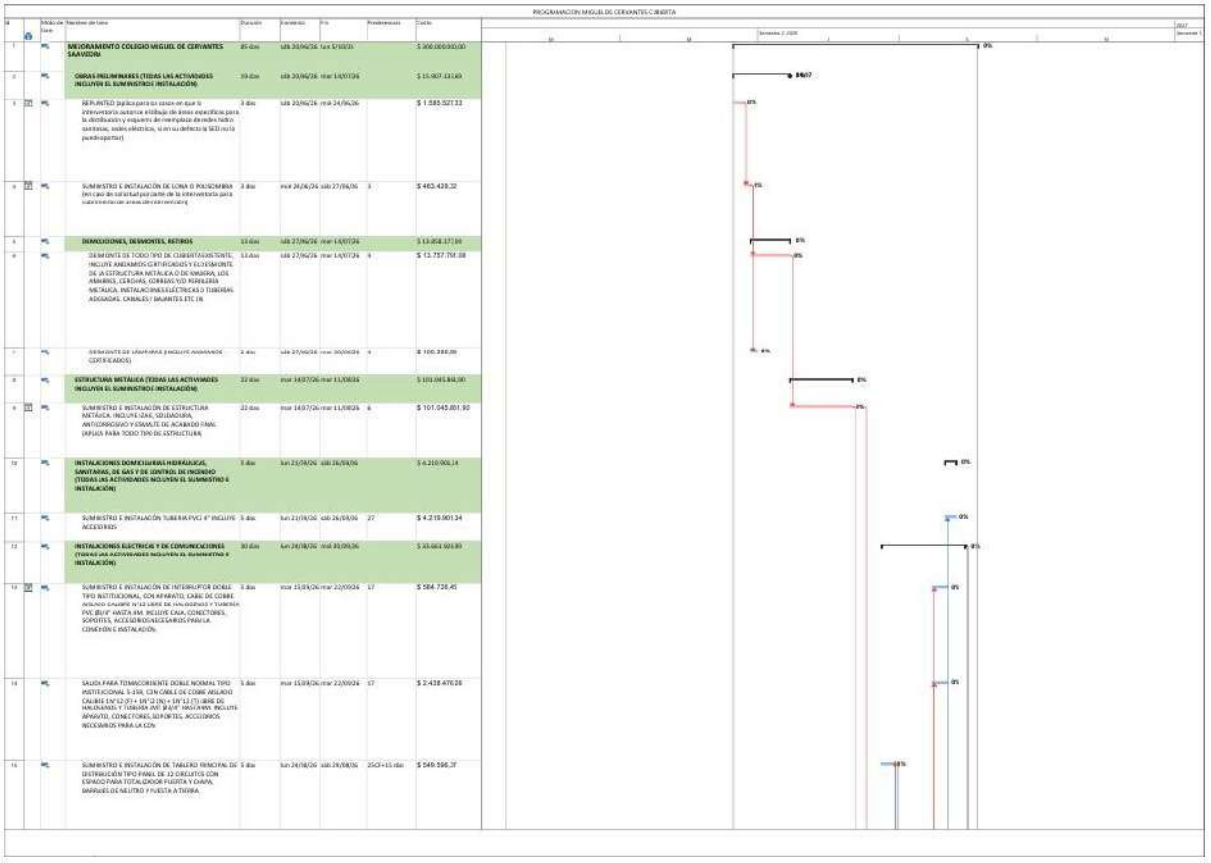


Ilustración 29. Programación Adición 2 -Colegio Paraíso Mirador



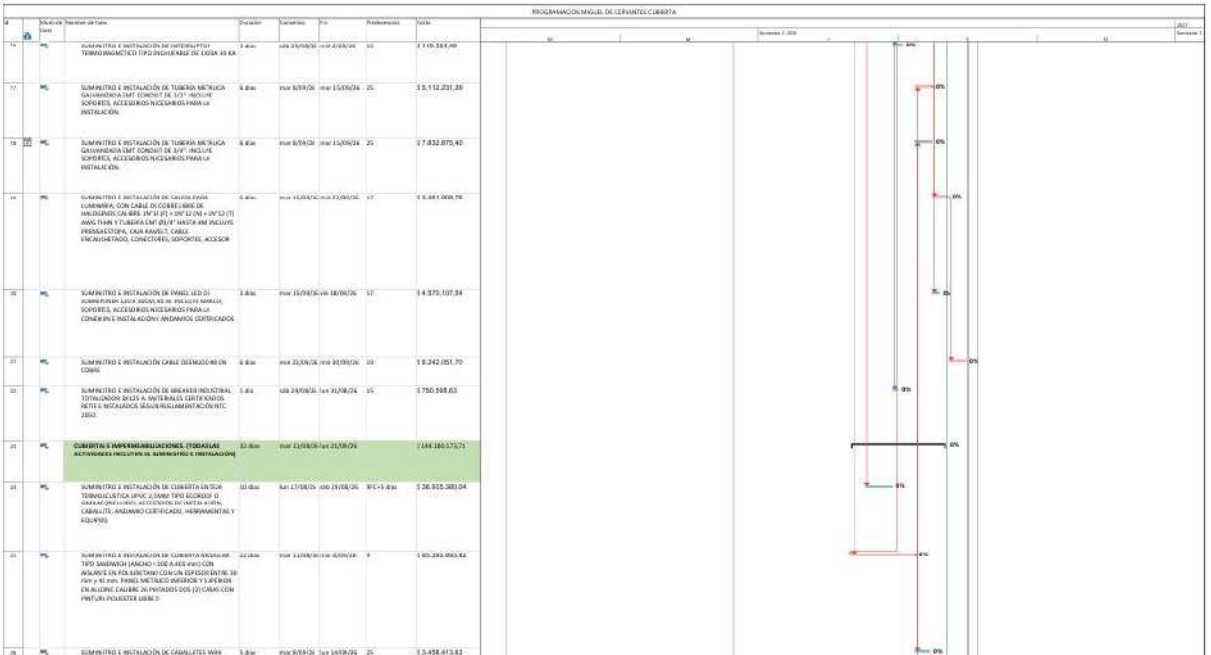


Ilustración 30. Programación Adición 2 -Colegio Miguel de Cervantes Saavedra

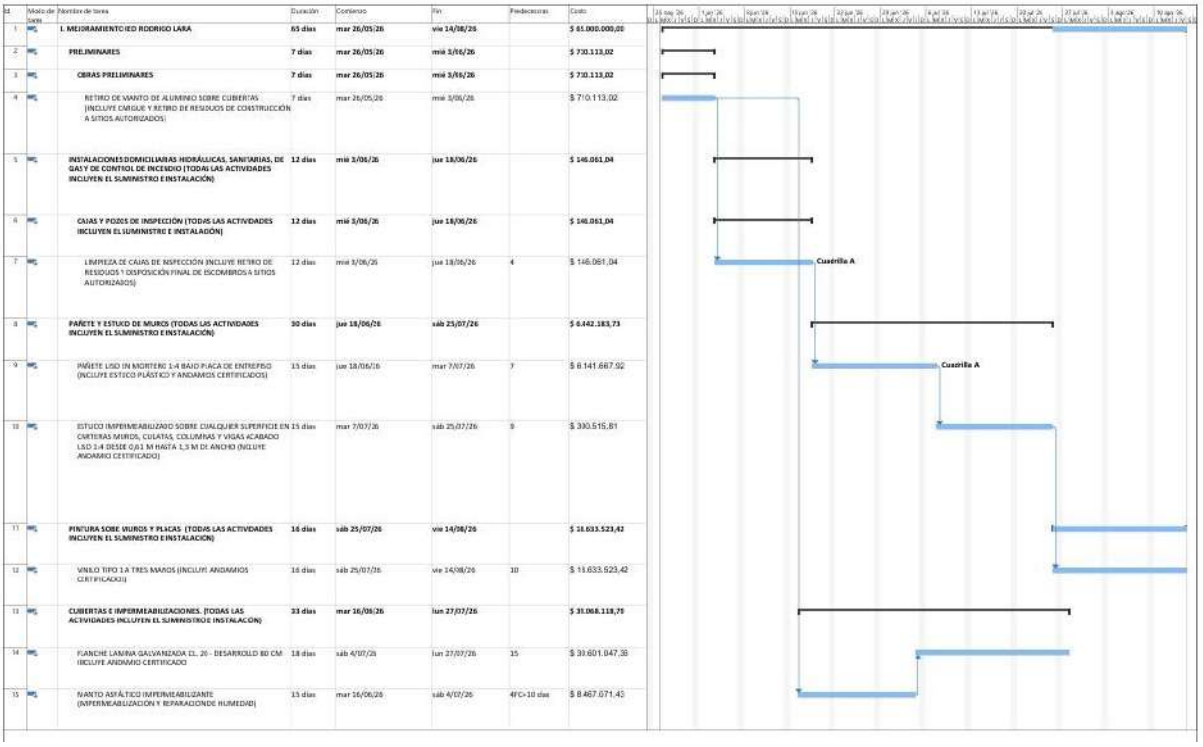


Ilustración 31. Programación Adición 2 -Colegio Rodrigo Lara Bonilla

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
540	USME	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	SEDE A – IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 300.000.000,00
1982	CIUDAD BOLIVAR	IED PARAISO MIRADOR	SEDE D– IED PARAISO MIRADOR	$ 252.000.000,00
1921	CIUDAD BOLIVAR	IED RODRIGO LARA BONILLA	SEDE B– JOSE CELESTINO MUTIS	$ 65.000.000,00

TOTAL (INCLUYE AIU)	**$ 617.000.000,00**

Ilustración 32. Valor estimado Adición 2

10. MATRIZ CLIMA MENSUAL

Durante el periodo comprendido las localidades de Usme y Ciudad Bolívar presentaron condiciones climáticas variables, predominando la temporada de lluvias característica de estos meses en Bogotá.

Se identificaron varios días con lluvias fuertes y moderadas que pudieron generar afectaciones en actividades de obra, desplazamientos, transporte de materiales, ejecución de trabajos exteriores y cronogramas de mantenimiento, lo cual se ha trabajado horarios extendidos como fines de semana para recuperación de tiempo y así no generar un atraso fuerte.


Los colegios que más afectaciones tuvieron durante las jornadas de lluvias fueron:

1. Miguel de Cervantes Saavedra: Al tener lluvias en la zona, los trabajos exteriores en parqueadero y en zona de comedor cubierta se vieron afectados, debido a la imposibilidad de realizar actividades cuando llueve, los trabajos en alturas debieron ser suspendidos, para garantizar la seguridad de los trabajos en alturas.

Las instituciones ubicadas en Usme y Ciudad Bolívar fueron expuestas a afectaciones por lluvias, principalmente por dificultades de acceso, humedad en zonas intervenidas y retrasos operativos.

ANEXOS

ANEXO 1. CONTRATO FIRMADO SECOP

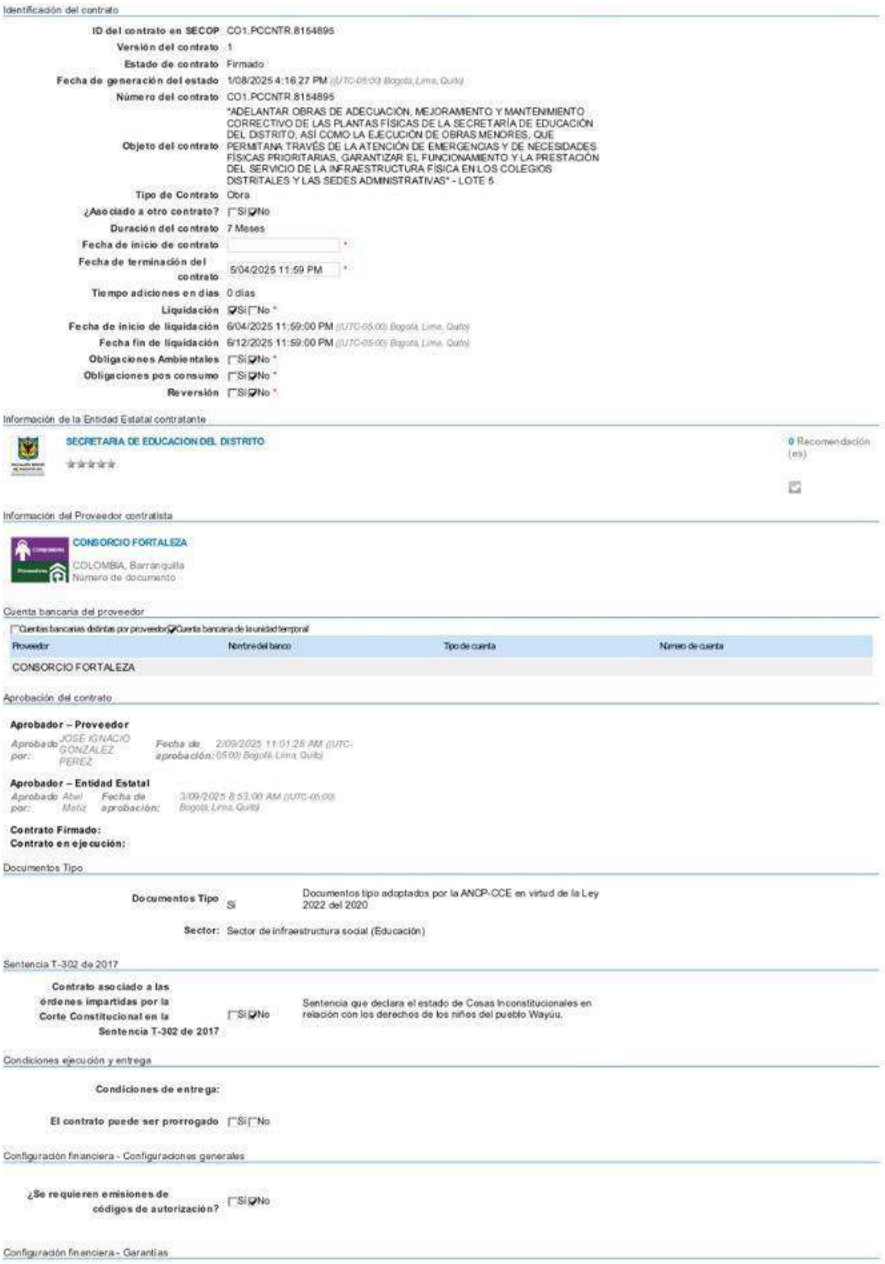

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8154895
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1/08/2025 4:16:27 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8154895
Objeto del contrato	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/04/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en dias	0 dias
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/04/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación	6/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO FORTALEZA

COLOMBIA, Barranquilla

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO FORTALEZA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JOSE IGNACIO GONZALEZ PEREZ Fecha de aprobación: 2/09/2025 11:01:28 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Abel Meliz Fecha de aprobación: 3/09/2025 8:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

Ilustración 33.Contrato firmado SECOP II

ANEXO 2. ACTA DE INICIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8154895 del 03 de Septiembre de 2025.

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO, identificado con cédula No. 1.030.676.323 de Bogotá D.C. quien funge como Representante Legal del CONSORCIO FORTALEZA, con NIT. 901.973.588-1 como Contratista de Obra y ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula No. 79.602.923 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO con NIT 901.977.271-0 como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: N° 4923 03 de septiembre 2025

APROBACION DE GARANTIA: 30 de septiembre de 2025

OBJETO: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA

VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO: Siete (7) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 05 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista de Obra
CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
C.C.1.030.676.323 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO FORTALEZA
NIT 901.973.588-1

Interventor
ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO.
NIT 901.977.271-0


11-IF-001
V1

Página: 1 de 1

Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.educacionbogota.edu.co Línea 195

Ilustración 34. Acta de inicio

3. POLIZA TODO RIESGO

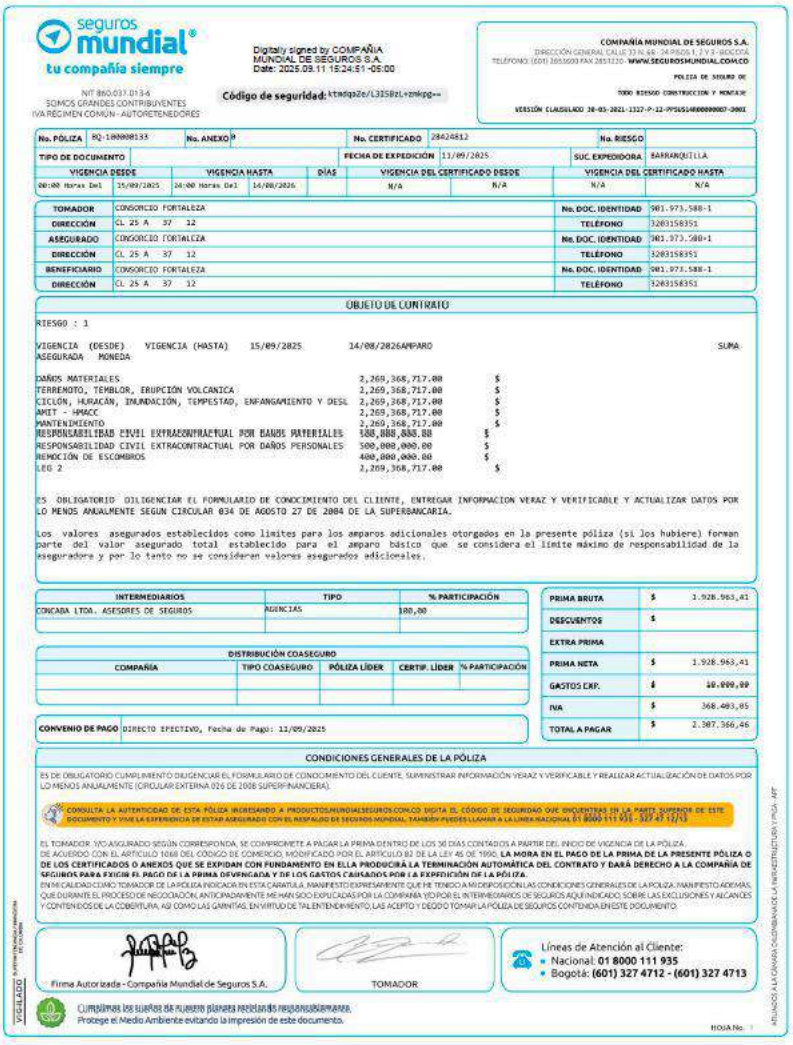

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.11 15:24:51 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: ktmdqa2e/L3IS0zL+zmkpg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 72 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO (601) 3553600 FAX 2551220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
PÓLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1327-P-12-PPSUS14000000007-2001

No. PÓLIZA	RQ-1000008133	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28424812	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	14/08/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
ASEGURADO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
BENEFICIARIO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) ASEGURADA	VIGENCIA (HASTA) MONEDA	15/09/2025	14/08/2026	AMPARO		SUMA
DAÑOS MATERIALES			2,269,368,717.00		$	
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA			2,269,368,717.00		$	
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL			2,269,368,717.00		$	
AMIT - HMACC			2,269,368,717.00		$	
MANTENIMIENTO			2,269,368,717.00		$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR BANOS MATERIALES			500,000,000.00		$	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES			500,000,000.00		$	
REMOCIÓN DE ESCOMBROS			400,000,000.00		$	
LEG 2			2,269,368,717.00		$	

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.928.963,41
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.928.963,41
GASTOS EXP.	$	10.000,00
IVA	$	368.403,05
TOTAL A PAGAR	$	2.307.366,46

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COMCOD DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRES EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 13(3)

EL TOMADOR, Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANUNCIOS A LA CARARA CIGUEMBRANDE LA INFRAESTRUCTURA Y PUDA APP

HOJA No. 1

Ilustración 35. Póliza todo riesgo

4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Los Mejores Lugares para Trabajar

Compañía de Seguros

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3202667113

PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000033722 **ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: CARRERA 47 | COD. AGENCIA: 320 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	15	09	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	15	09	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA | IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	03/09/2025	03/12/2026	453,873,743.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/09/2025	03/04/2029	226,936,871.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	453,873,743.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901372337 - BOONING S A S - PART: 50.00%
NIT 900775574 - DBD INGENIERIA S A S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8154895, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,134,684,358.50	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTOREDACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_digital/tertMogh

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE, REPRESA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/personas-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000320268711

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDA207A0908FF7B5E


Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resourcesite/1/General/2225/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2208 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ilustración 36. Póliza de cumplimiento

5. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

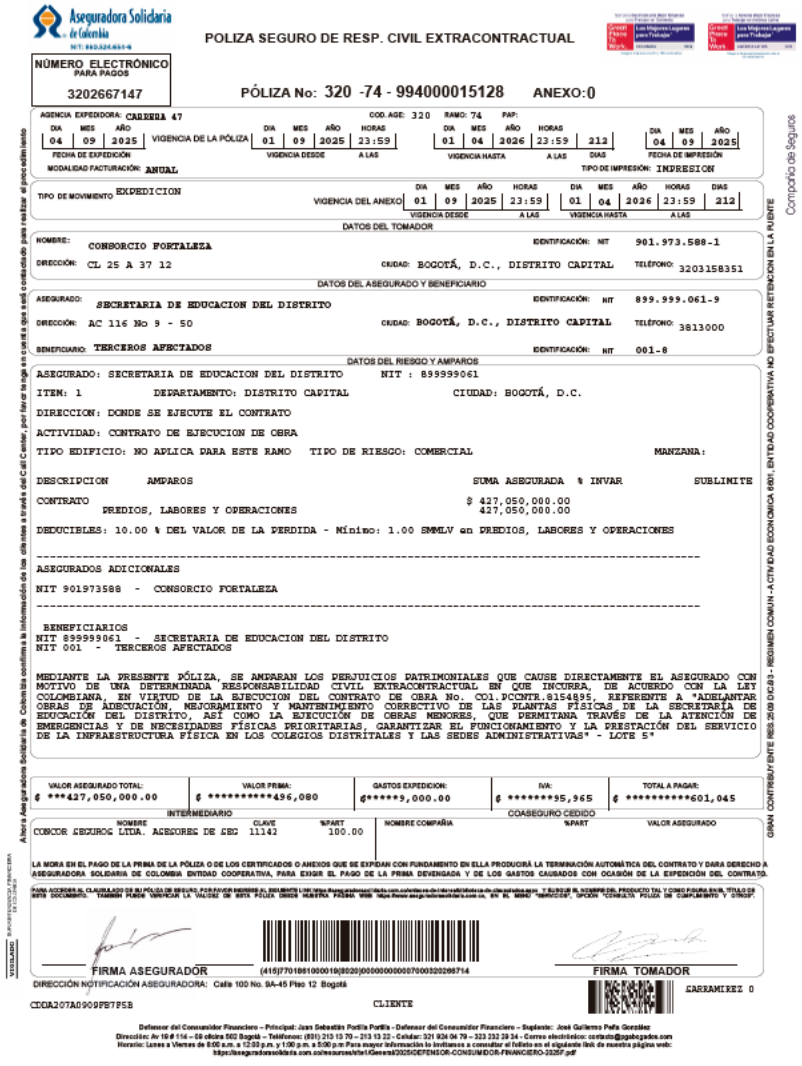

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 3202667147

PÓLIZA No: 320 -74 - 994000015128 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CARRERA 47 — COD. AGE: 320 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA MES AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE (DIA MES AÑO HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA MES AÑO HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA MES AÑO)
04 09 2025	01 09 2025 23:59	01 04 2026 23:59	212	04 09 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — VIGENCIA DEL ANEXO: 01 09 2025 23:59 (DESDE) — 01 04 2026 23:59 (HASTA) — 212 DIAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

DIRECCIÓN: AC 116 No 9 - 50 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3813000

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427,050,000.00 427,050,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901973588 - CONSORCIO FORTALEZA

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895 REFERENTE A "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 5"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***427,050,000.00	$ **********496,080	$*****5,000.00	$ *******95,965	$ **********601,045

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR — (415)7701881000019(8020)000000000007000320268714 — FIRMA TOMADOR


DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá — CLIENTE — CARRAMIREZ 0

CDOA207A0909FB7F5B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@gpabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ilustración 37. Póliza responsabilidad civil

6. POLIZA TODO RIESGO ADICIÓN 2

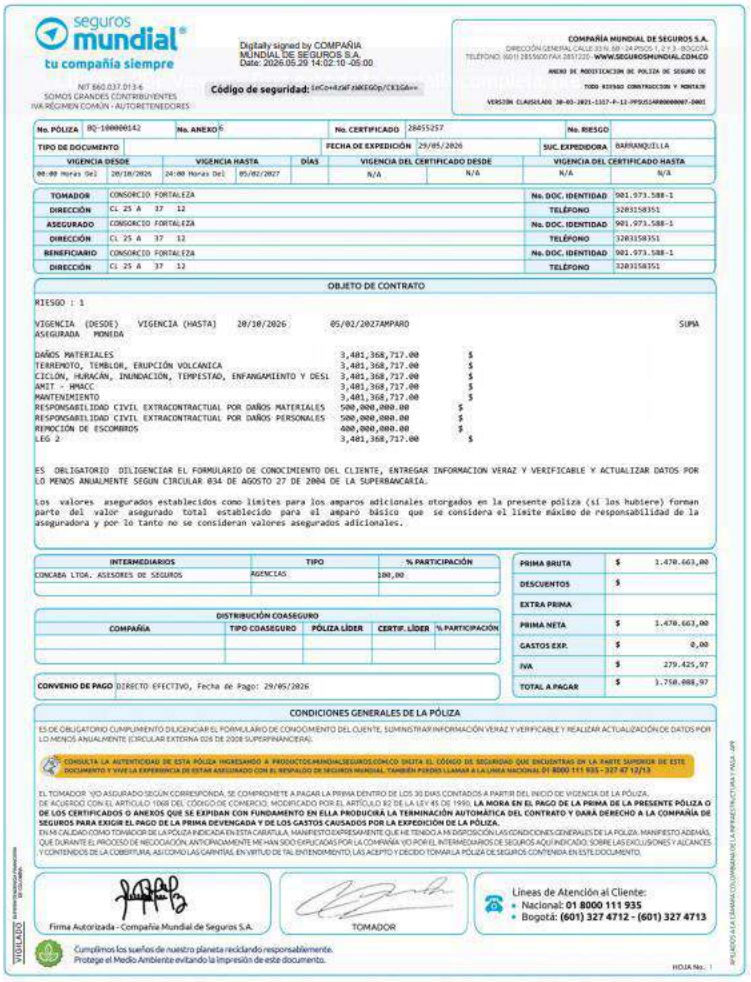

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 14:02:10 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: leCo+4zaFzWXEGOp/CE1GA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601) 2855607 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1107-P-12-PPDS1549000000007-0001

No. PÓLIZA	8Q-100000142	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28455257	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2026	24:00 Horas Del	05/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
ASEGURADO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351
BENEFICIARIO	CONSORCIO FORTALEZA	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.588-1
DIRECCIÓN	CL 25 A 37 12	TELÉFONO	3203158351

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA) 20/10/2026 05/02/2027AMPARO SUMA ASEGURADA MONEDA

DAÑOS MATERIALES	3,401,368,717.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	3,401,368,717.00	$
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	3,401,368,717.00	$
AMIT - HMACC	3,401,368,717.00	$
MANTENIMIENTO	3,401,368,717.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	500,000,000.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	500,000,000.00	$
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	400,000,000.00	$
LEG 2	3,401,368,717.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.470.663,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.470.663,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	279.425,97
TOTAL A PAGAR	$	1.750.088,97

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No. 1

Ilustración 38. Póliza Todo Riego Adición 2

7. POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICIÓN 2

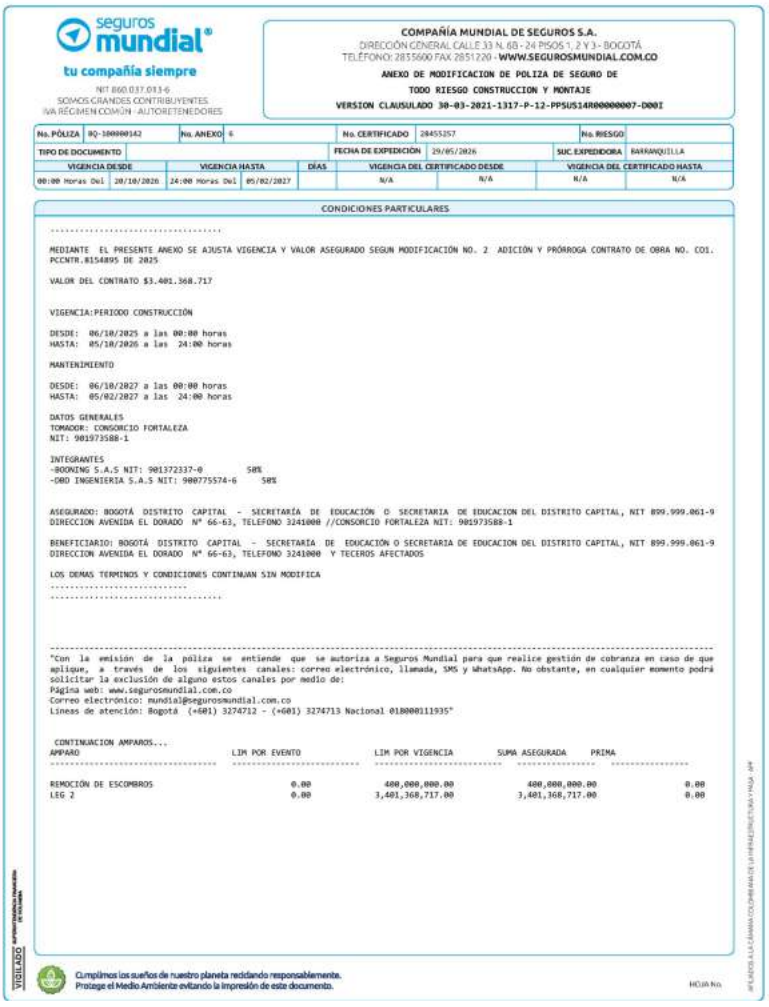

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	8Q-100000142	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28455257	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2026	24:00 Horas Del	05/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

.....

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO SEGUN MODIFICACIÓN NO. 2 ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA NO. CO1. PCCNTR.8154895 DE 2025

VALOR DEL CONTRATO $3.401.368.717

VIGENCIA:PERIODO CONSTRUCCIÓN

DESDE: 06/10/2025 a las 00:00 horas
HASTA: 05/10/2026 a las 24:00 horas

MANTENIMIENTO

DESDE: 06/10/2027 a las 00:00 horas
HASTA: 05/02/2027 a las 24:00 horas

DATOS GENERALES
TOMADOR: CONSORCIO FORTALEZA
NIT: 901973588-1

INTEGRANTES
-BOONING S.A.S NIT: 901372337-0 50%
-DBO INGENIERIA S.A.S NIT: 900775574-6 50%

ASEGURADO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, NIT 899.999.061-9
DIRECCION AVENIDA EL DORADO Nº 66-63, TELEFONO 3241000 //CONSORCIO FORTALEZA NIT: 901973588-1

BENEFICIARIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN O SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, NIT 899.999.061-9
DIRECCION AVENIDA EL DORADO Nº 66-63, TELEFONO 3241000 Y TECEROS AFECTADOS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICA
.....
.....

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
LEG 2	0.00	3,401,368,717.00	3,401,368,717.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y MGA - 2019

Ilustración 39. Póliza de Cumplimiento Adición 2

8. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADICIÓN 2

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Compañía de Seguros

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3202667113

PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000033722 **ANEXO: 6**

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	05	2026	26	05	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/06/2027	680,273,743.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/10/2025	05/10/2029	340,136,871.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	680,273,743.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901372337 - BOONING S A S - PART: 50.00%
NIT 900775574 - DBD INGENIERIA S A S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,700,684,358.50	$ ********1,488,369	$*****5,000.00	$ ******283,740	$ ********1,777,109

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00			

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070003202667111

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A070BFE7E58

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47 No POLIZA: 994000033722 ANEXO: 6

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

TEXTO ITEM 1

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE REALIZA EL PRESENTE ENDOSO PARA AMPLIAR LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS MEDIANTE MODIFICACIÓN No. 02 DE FECHA 19/05/2026.

NUEVO VALOR DE CONTRATO: $3.401.368.717
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05/10/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3202667147

PÓLIZA No: 320 -74 - 994000015128 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA — COD. AGE: 320 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
26 / 05 / 2026		20 / 06 / 2026	23:59	05 / 10 / 2026	23:59	107	26 / 05 / 2026

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	20 / 06 / 2026	23:59	05 / 10 / 2026	23:59	107

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO FORTALEZA — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1
DIRECCIÓN: CL 25 A 37 12 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3203158351

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AC 116 No 9 - 50 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3813000
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT : 899999061

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 525,271,500.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	525,271,500.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901973588 - CONSORCIO FORTALEZA

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895, REFERENTE A ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***525,271,500.00	$ **********307,967	$*****5,000.00	$ *******59,464	$ **********372,431

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CONCOR SEGUROS LTDA. ASESORES DE SEG	11142	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000320266714

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A070BFE7E57 CLIENTE SARRAMIREZ 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA COD. AGENCIA: 320 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000015128 ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO FORTALEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.973.588-1

ASEGURADO: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015.
AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
AMPARO PATRONAL.
AMPARO GASTOS MÉDICOS.
AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO FORTALEZA NIT.907.973.588-1 Y SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9

SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

SE REALIZA EL PRESENTE ENDOSO PARA AMPLIAR LA VIGENCIA ASEGURADA DEL AMPARO MEDIANTE MODIFICACIÓN No. 02 DE FECHA 19/05/2026.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05/10/2026

SE ACLARA VIGENCIA DE LA POLIZA

VIGENCIA DESDE: 06/10/2025 HASTA 05/10/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.


CLIENTE

Ilustración 40. Póliza de Responsabilidad Civil Adición 2.

9. ACTAS DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD COLEGIOS ACTIVOS

JOSE JAIME ROJAS

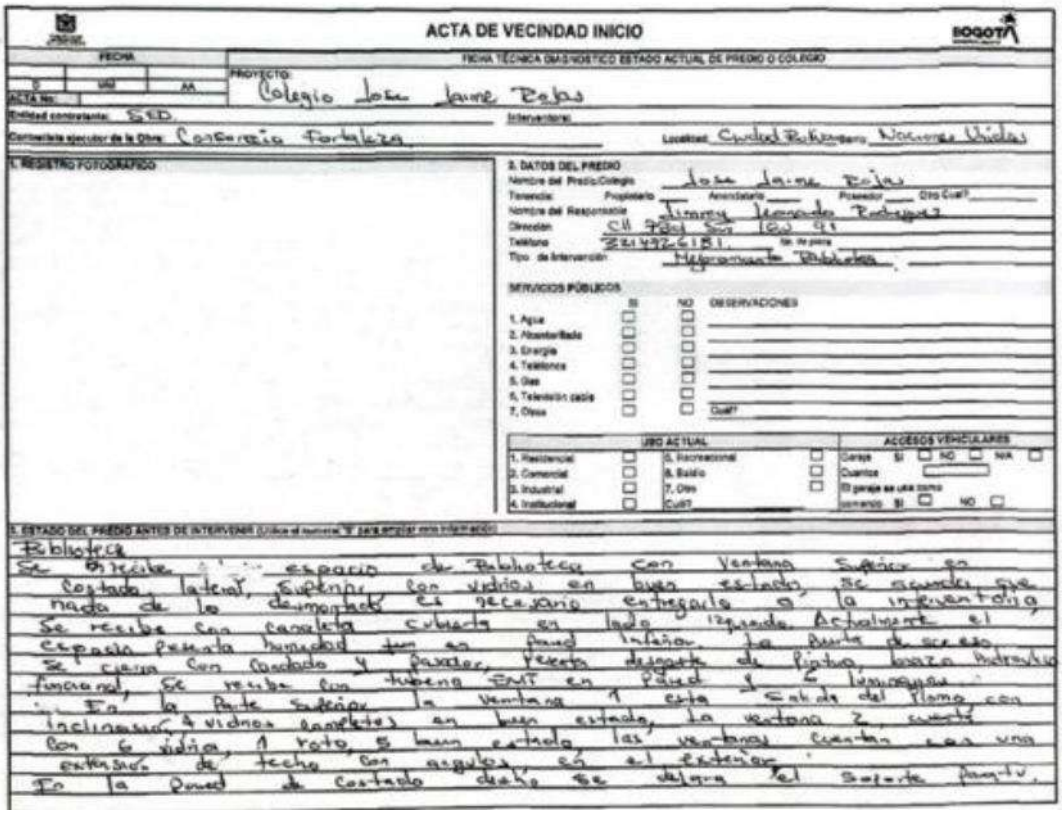

ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: Colegio Jose Jaime Rojas

Entidad contratante: SED

Interventoría:

Contratista ejecutor de la Obra: Consorcio Fortaleza

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Nuevos Horizontes

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Predio/Colegio: Jose Jaime Rojas

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Responsable: Jimmy Leonardo Rodriguez

Dirección: Cll 70bis Sur 16a 91

Teléfono: 3214926181 Tel. de pareja ___

Tipo de Intervención: Mejoramiento Biblioteca

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje	SI	NO	N/A
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos			
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como			
4. Institucional		Cual?		Semaforo	SI	NO	


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 7 para aclarar esta información)

Biblioteca

Se recibe espacio de Biblioteca con Ventana Superior en Costado lateral, Externa con vidrios en buen estado, se acuerda que nada de lo demontado es necesario entregarlo a la interventoria, Se recibe con cerradura cubierta en lado izquierdo. Actualmente el espacio presenta humedad tanto en pared interna, la puerta de acceso, Se cierra con candado y pasador, Presenta desgaste de pintura, buena ventilación natural, Se recibe con tuberia EMT en pared y [illegible]

En la Parte Superior la Ventana 1 esta Sin del Plomo con inclinacion, 4 vidrios completos en buen estado, la ventana 2, cuenta con 6 vidrios, 1 roto, 5 buen estado las ventanas Cuentan con una extension de techo con angulos en el exterior.

En la Pared de Costado donde se delimita el Sendero peatonal,

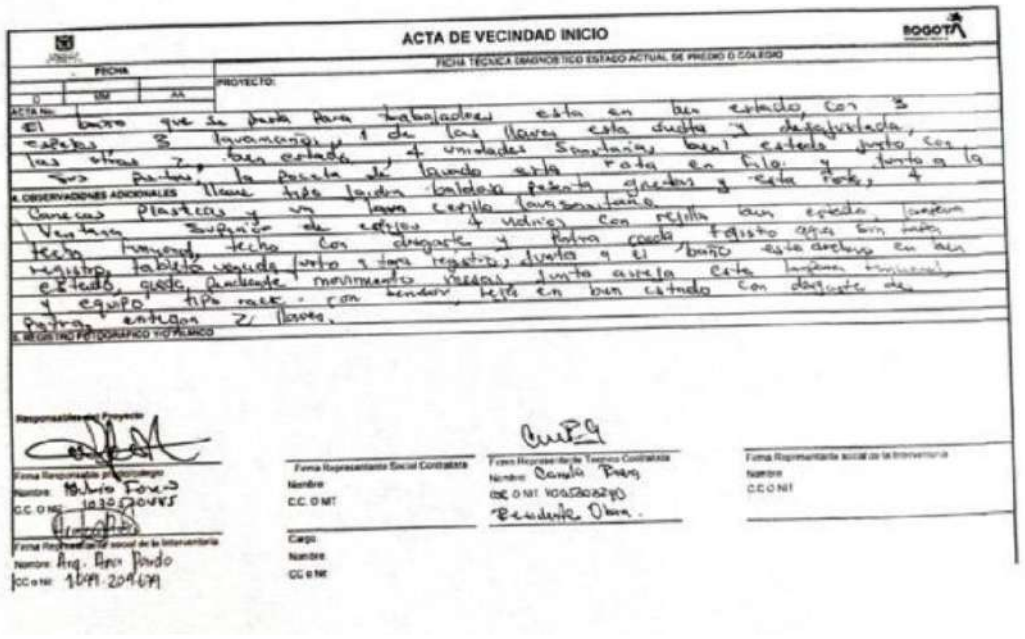

ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

FICHA

PROYECTO:

ACTA No:

El baño que la planta Alta trabajadores esta en buen estado, con 3 sanitarios 3 lavamanos y 1 de las llaves esta suelta y desajustada, las otras 2 en buen estado y 4 unidades Sanitarias bien estado junto con las puertas, la puerta de izquierda esta rota en filo y junto a la Nevera todo el baldosin baldosa pelada gruesa y esta rota, y

8. OBSERVACIONES ADICIONALES

Cenefas Plasteca y un poco cerrito lavamanitos.

Ventana Burbuja de cerrito y vidrio con rejilla buen estado cuadrada

techo Impermeabilizado techo con desgaste y Pintura cuarteada Falsito agua buen mate

registro tableta vaciada junto a las regaderas, divisiones y el baño esta cerrado en mal

estado, guarda Anchando mantenimiento general, junto a vela esta lámpara fluorescente

y equipo tipo raee - con bendix, esta en buen estado con desgaste de

pintura entregan 2 llaves.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y PLANO

Responsable del Proyecto

Firma Representante Social Contratista

Nombre

C.C. O NIT

Firma Representante Legal Contratista

Nombre Camilo Pena

CE O NIT 1026302290

Residente Obra.

Firma Representante social de la Interventoría

Nombre

C.C O NIT

Firma Responsable de Psicólogo

Nombre Nubia Forero

C.C. O NIT 1030 [illegible] 0445

Firma Representante social de la Interventoría

Nombre Arq. Ruby Pardo

CC o NIT 1049 204671


Cargo

Nombre

CC o NIT

Ilustración 41. Acta de vecindad Jose Jaime rojas

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.BIBLIOTECA

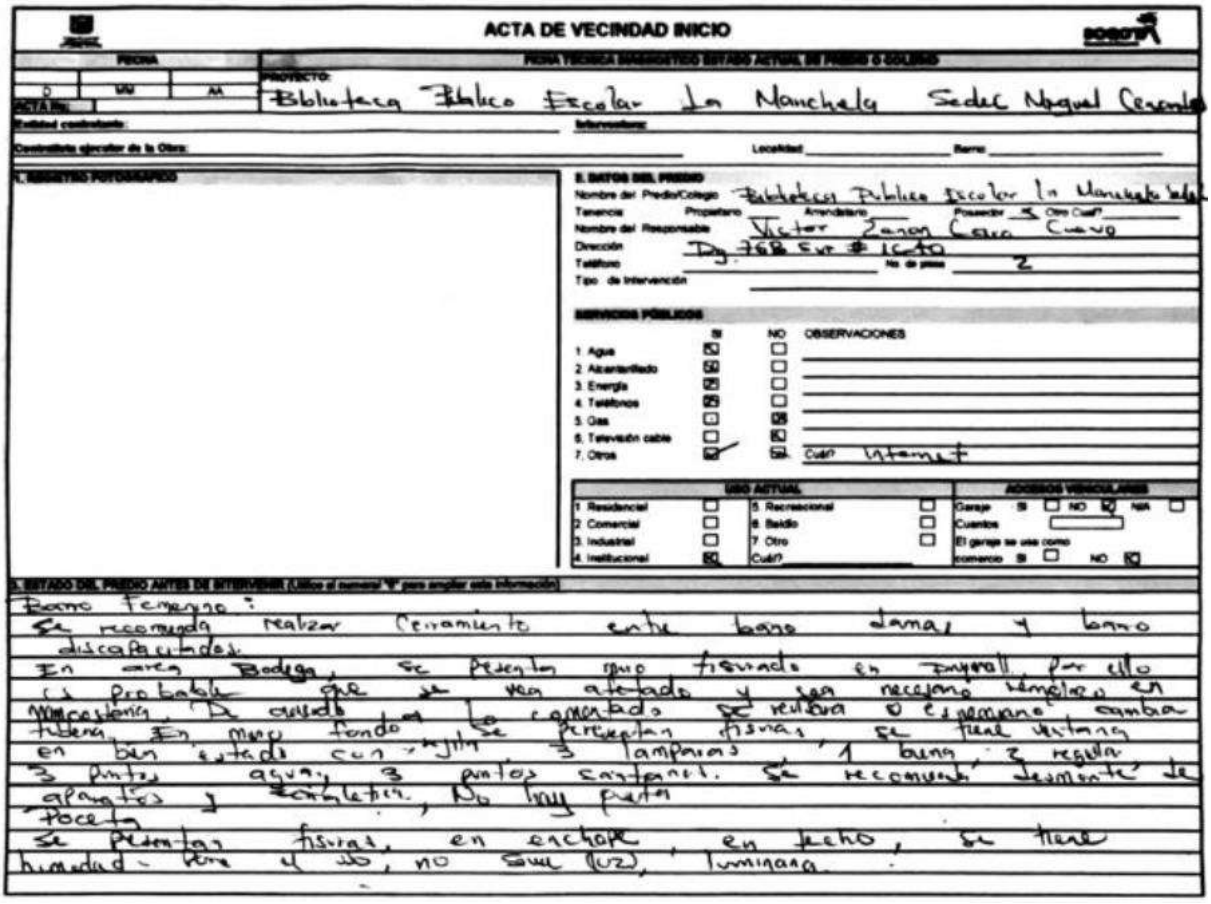

ACTA DE VECINDAD INICIO

PROYECTO: Biblioteca Publico Escolar La Manchala Sedec Miguel Cervantes

Nombre del Predio/Colegio: Biblioteca Publico Escolar La Manchala Sedec

Nombre del Responsable: Victor Zanon Cueva

Dirección: Dg 75B Sur # 16A-10

Tipo de Intervención: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

USO ACTUAL: 1 Residencial ☐ · 2 Comercial ☐ · 3. Industrial ☐ · 4. Institucional X · 5. Recreacional ☐ · 6. Baldío ☐ · 7. Otro ☐ · Cuál?

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO X NA ☐ · Cuantos · El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "9" para ampliar esta información)

Puerto Principal: Se recomienda realizar Cerramiento entre baño dama y baño discapacitados.

En area Bodega, se Presentan muro fisurado en Empaste por ello es Probable que se vea afectado y sea necesario Remplazo en Mamposteria. De ocurrir lo comentado se recibira o Escalerano cambio tubería. En muro fondo se Presentan fisuras, se Pinta Ventana en buen estado con Angulo 3 Lamparas, 1 buena, 2 regular 3 puntos agua, 3 puntos Sanitarios. Se recomienda desmonte de aparatos y Sanitarios. No hay puerta Posterior

Se Presentan fisuras, en cachope, en techo, se Nota humedad - Pone el 30, no Sirve luz, Iluminaria.

Ilustración 44. Acta de vecindad Miguel de cervantes Saavedra



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 8 MM 08 AA 25

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: B

ACTA No: 1

Piano Inscapacidad se recomienda retiro de señaletica y barras Inscapacidad, no hay funcionamiento electrico, retirar secador manos Pinta esta, buen estado, se revisara si se usa la misma, desgastes Menores.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se tiene Valeria junto a muro Superior de Camara de Vigilancia

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS

Responsables del Proyecto

Firma Responsable predial/social: Nombre Diana Marta Cordova R. CC ó NIT 1033927758.

Firma Representante social de la Interventoría: Nombre: CC o NIT:


Firma Representante Social Contratista: Nombre: CC ó NIT: Cargo: INGENIERO CIVIL SCRUM MASTER Nombre: DIEGO AGUILAR S. CC ó NIT 80.041.968

Firma Representante Tecnico Contratista: Nombre Camila Tuta CC ó NIT 1007307290

Firma Representante social de la Interventoría: Nombre Ana Pardo. CC ó NIT 1.099.209.679.

Ilustración 44. Acta de vecindad Colegio Miguel De Cervantes

PARAISO MIRADOR SEDE D

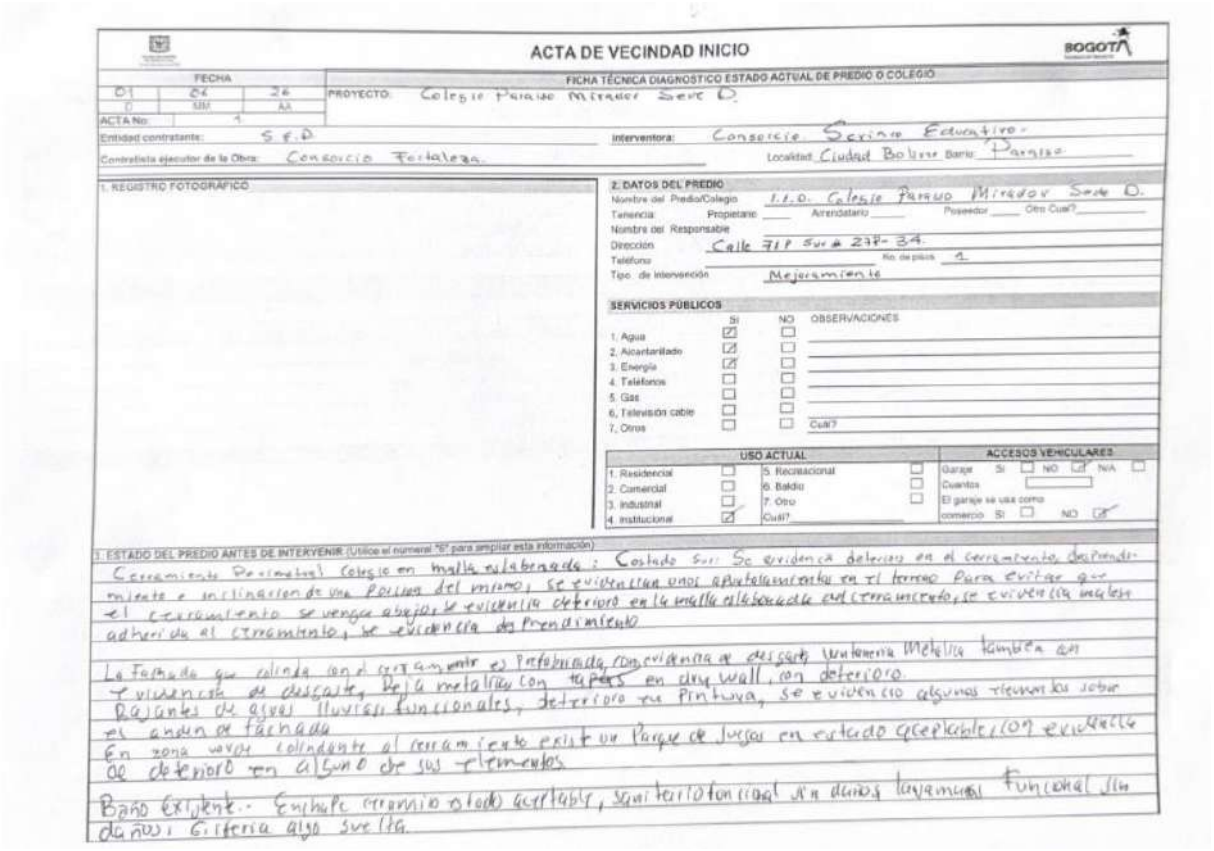

ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

FECHA: 01 (D) 04 (MM) 26 (AA) — ACTA No: 1

PROYECTO: Colegio Paraiso Mirador Sede D

Entidad contratante: S.E.D — Interventora: Consorcio Servino Educativo

Contratista ejecutor de la Obra: Consorcio Fortaleza — Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Paraiso

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Predio/Colegio: I.E.D. Colegio Paraiso Mirador Sede D.
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Responsable
Dirección: Calle 71P Sur # 27P-34.
Teléfono — No. de pisos: 1
Tipo de intervención: Mejoramiento

SERVICIOS PÚBLICOS

	Si	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje Si ☐ NO ☑ N/A ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio Si ☐ NO ☑


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "6" para ampliar esta información)

Cerramiento Perimetral Colegio en malla eslabonada: Costado Sur: Se evidencia deterioro en el cerramiento, dependiente e inclinación de una Parte del mismo, se evidencian unos apuntalamientos en el terreno Para evitar que el cerramiento se venga abajo. Se evidencia deterioro en la malla eslabonada del cerramiento, se evidencia malezas adheridas al cerramiento, se evidencia deformamiento

La Fachada que colinda con el cerramiento es Prefabricada, con evidencia de desgaste Ventaneria Metalica tambien con evidencia de desgaste, Reja metalica con tapes en dry wall, con deterioro. Bajantes de aguas lluvias funcionales, deterioro en Pintura, se evidencio algunos vidrios rotos en el anden de fachada

En zona verde colindante al cerramiento existe un Parque de Juegos en estado aceptable, con evidencia de deterioro en algunos de sus elementos

Baño Existente.- Enchape ceramico estado aceptable, Sanitario funcional sin daños Lavamanos funcional sin daños, Griferia algo suelta.

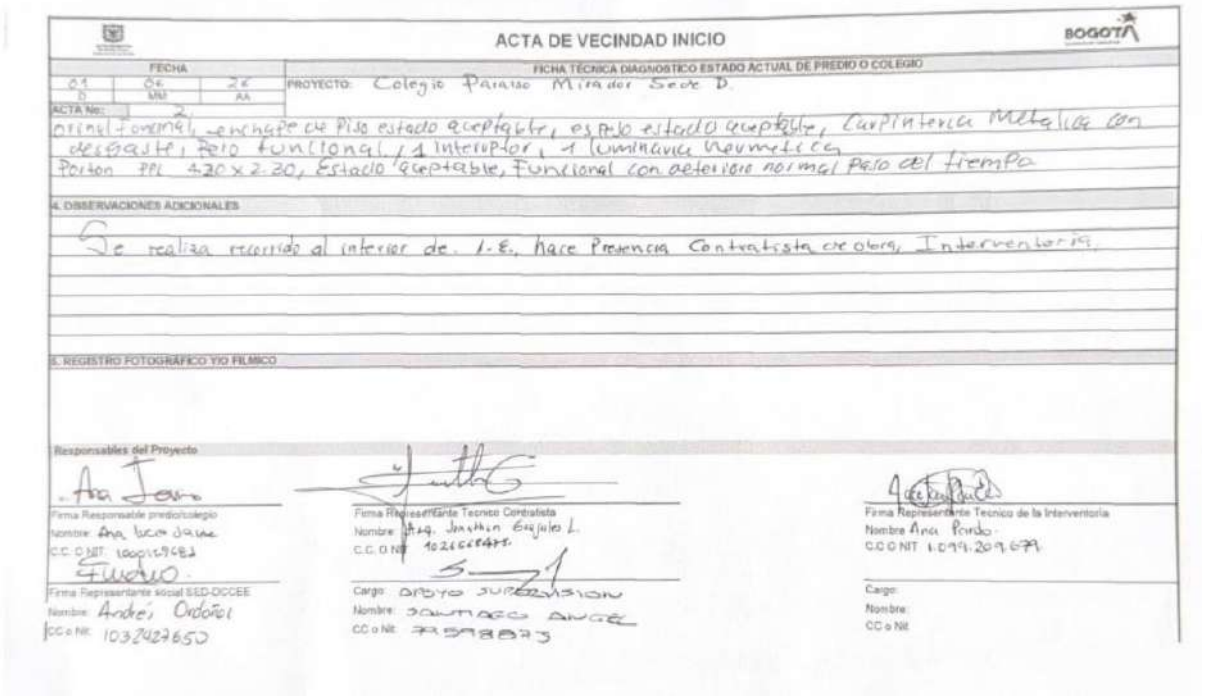

ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: 01 (D) 06 (MM) 22 (AA)

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: Colegio Paraiso Mirador Sede D

ACTA No: 2

Pisos Ceramica, enchape de Piso estado aceptable, espejo estado aceptable, Carpinteria Metalica con desgaste, Baño funcional, 1 Interruptor, 1 luminaria neumatica Porton PPL 4.20 x 2.20, Estado aceptable, Funcional con deterioro normal Paso del tiempo

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza recorrido al interior de. I.E. hace Presencia Contratista de obra, Interventoria.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO

Responsables del Proyecto

Firma Responsable predio/colegio
Nombre: Ana Lucia Jaime
C.C. o NIT: 1000179483

Firma Representante social SED-DCCEE
Nombre: Andrei Ordoñez
CC o Nit: 1032427650

Firma Representante Tecnico Contratista
Nombre: Arq. Jonathan Grajales L.
C.C. o Nit: 1026268475


Cargo: APOYO SUPERVISION
Nombre: JAIMARCO ANGEL
CC o Nit: 7598873

Firma Representante Tecnico de la Interventoria
Nombre: Ana Pardo
C.C o NIT: 1.099.209.671

Cargo:
Nombre:
CC o Nit:

Ilustración 42. Acta de vecindad Colegio Paraiso Mirador sede D

FERNANDO GONZALEZ OCHOA

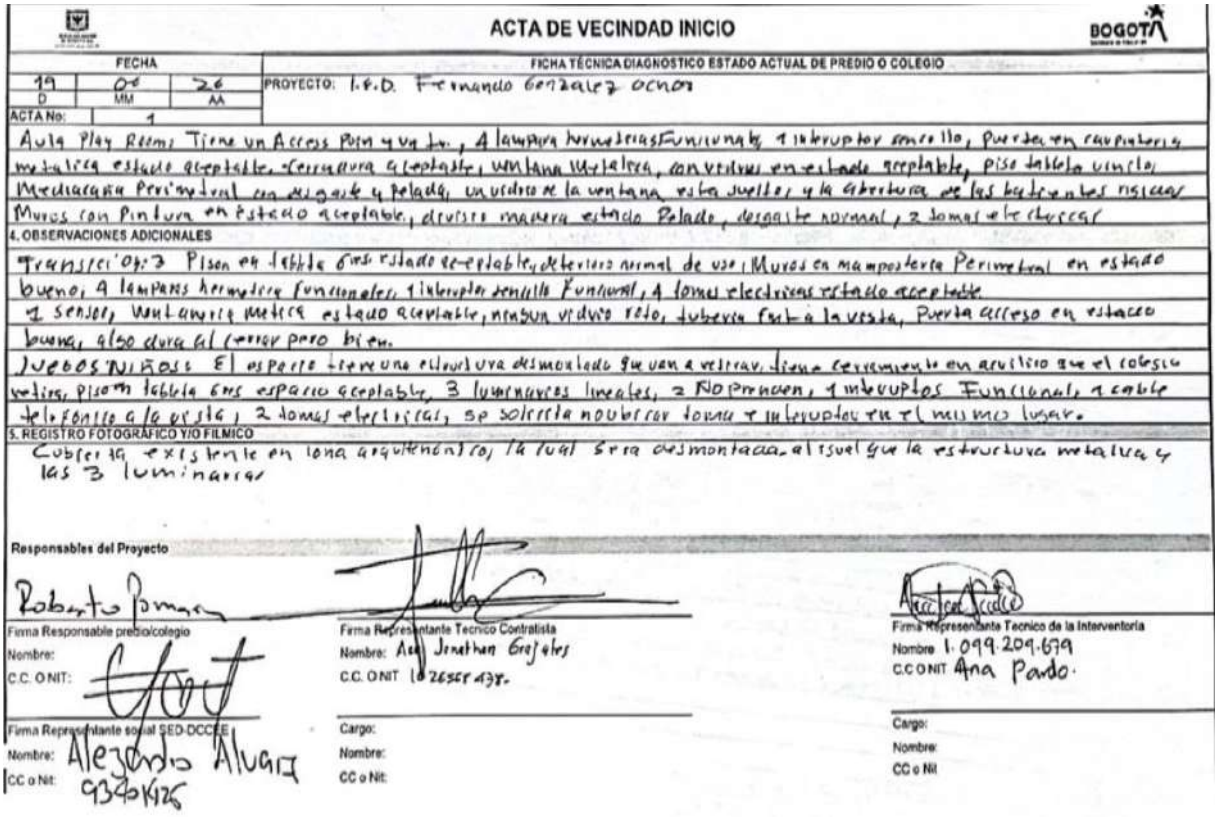

ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA D	MM	AA	FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO
19	06	26	PROYECTO: I.E.D. Fernando Gonzalez Ochoa

ACTA No: 1

Aula Play Room: Tiene un Acceso Puerta y Ventana, 4 lamparas hermeticas Funcionando, 1 interruptor sencillo, Puerta en carpintería metálica estado aceptable, cerradura aceptable, ventana Metalica, con vidrios en estado aceptable, piso tableta vinilo, Mediacaña Perimetral con desgaste y pelado, un vidrio de la ventana roto suelto, y la cobertura de los bajantes rusticas. Muros con Pintura en estado aceptable, diversos manchas estado Pelado, desgaste normal, 2 tomas electricas

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

Transición 3: Piso en tableta buen estado aceptable, deterioro normal de uso, Muros en mampostería Perimetral en estado bueno, 4 lamparas hermeticas funcionales, 1 interruptor sencillo Funcional, 4 tomas electricas estado aceptable, 1 sensor, Ventanería Metalica estado aceptable, ningun vidrio roto, tuberia fuera a la vista, Puerta acceso en estado bueno, algo dura al cerrar pero bien.

JUEGOS NIÑOS: El espacio tiene una estructura desmontable que van a retirar, tiene cerramiento en arquitectonico que el colegio retira, Piso en tableta buen estado aceptable, 3 luminarias lineales, 2 No prenden, 1 interruptor Funcional, 1 cable telefonico a la vista, 2 tomas electricas, se solicita nombrar tomas e interruptor en el mismo lugar.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO

Cubierta existente en lona arquitectonica, la cual sera desmontada al igual que la estructura metalica y las 3 luminarias

Responsables del Proyecto

Firma Responsable predio/colegio
Nombre:
C.C. O NIT:

Firma Representante social SED-DCCE
Nombre: Alejandro Alvaiz
CC o Nit: 93401425

Firma Representante Tecnico Contratista
Nombre: Ing. Jonathan Grajales
C.C. O NIT 1.026558.438.
Cargo:
Nombre:
CC o Nit:

Firma Representante Tecnico de la Interventoria
Nombre 1.099.209.679
C.C O NIT Ana Pardo.
Cargo:
Nombre:
CC o Nit

Ilustración 46. Acta de vecindad Colegio Fernando Gonzales

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. COMEDOR



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 09 MM 06 AA 16

ACTA No:

PROYECTO: I.E.D. Miguel de Cervantes

Entidad contratante: Consorcio Fortaleza 19

Interventoría: Consorcio

Contratista ejecutor de la Obra:

Localidad: Usme Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Predio/Colegio: I.E.D. Miguel de Cervantes

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Responsable

Dirección

Teléfono No. de pisos

Tipo de Intervención

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☒
5. Recreacional ☐
6. Bobilo ☐
7. Otro ☐
Cuál? ___

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐ N/A ☐
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "8" para ampliar esta información)

Cocina-Comedor: Estado actual: Piso Grano marmol Gris: con evidencia de deterioro Por uso normal algunas baldosas despicadas y fisuradas. Carpintería metálica Perimetral con evidencia de oxidacion, en la Parte Posterior se evidencian unos vidrios fracturados. Igual que en el costado lateral de fachada un vidrio roto. 4 tomas electricas que deben conservarse. 2 Puntos hidraulicos que deben conservarse. Baranda Portalija, en desgaste en su arranque, Pelores, enchape ceramico mitad Reciplatos con desgaste evidente 12, luminarias fluorescentes.

Cocina: Enchape de Piso Grano marmol con desgaste Por uso, manchas Perlas esquinas de cocina. Mesitaderia en grano marmol con desgaste evidente por uso, Manchada, Mesitaderia verticales Plasticas con desgaste. Enchape ceramico de pared con deterioro por uso algunas Piezas fisuradas.

red de Gas debidamente anclada, la tubería Presenta desgaste en Pintura, Cerramiento estructura en acero inoxidable presentado desgaste. Carpintería Pintura Epoxica con desgaste evidente, Pocos Tomacorrientes en Grano marmol con evidencia de deterioro, Muro Enmallado Pulido con manchas y algunas Fisuras, Ventanal Reciplatos con deterioro con deterioro en su remaches y en su arquitectura. Cielo raso, gripillo con deterioro y cielo raso en drywall con algunas fisuras



ACTA DE VECINDAD INICIO

BOGOTÁ

FECHA: D 29 MM 06 AA 16

ACTA No: 2

PROYECTO:

Se realiza recorrido con SED, contratista, interventoria y Rector colegio

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

- El colegio Expresa que requiere Pintada la estructura de cubierta de color amarillo Institucional.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO

Responsable del Predio

Firma Responsable predio/colegio: Tupitad

Nombre: Victor Zenon Caro Cuervo

C.C. O NIT: 4079643

Firma Representante social SED-DCEE

Nombre:

CC o Nit:

Firma Representante Técnico Contratista

Nombre: Arq. Jonathan Grajales

C.C. O NIT: 1026567937

Cargo: APOYO SUPERVISION

Nombre: SAUTARDO AUGER

CC o Nit: 79598895

Firma Representante Técnico de la Interventoría

Nombre: Ana Pardo

C.C. O NIT: 1.099.209.679

Cargo:

Nombre:

CC o Nit:

Ilustración 47. Acta de vecindad Colegio Fernando Gonzales

10. FICHAS TECNICAS MATERIALES Y CERTIFICADOS CALIDAD

CERTIFICADO CALIDAD PERLIN C, ESTRUCTURA METALICA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS, MIGUEL DE CERVANTES.

Mas Acero S.A.S.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: FERRETERIA ANDRES MARTINEZ

PRODUCTO: PERLIN EN C 220x80x2.900MMx6MTRS

ESPECIFICACION TECNICA DE MATERIA PRIMA: ASTM A-1011

FECHA LOTE: VARIOS **LOTE M. PRIMA:** VARIOS

CANTIDAD: VARIOS

LONGITUD: 6 METROS

REVESTIMIENTO: NO APLICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO AQUI DESCRITO FUE FABRICADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN REFERENCIA Y CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LAS MISMAS.

LIMITE DE FLUENCIA MINIMO OBTENIDO 42 KSI.

TOLERANCIA CUADRATURA: +/- 2% EN TODOS LOS LADOS.

TOLERANCIA DE RECTITUD:

1,00 M A 4,00 M	4MM (MAXIMO)
4,01 M A 8,00 M	10MM (MAXIMO)
LONGITUDES SUPERIORES A 8 M	18MM (MAXIMO)

COMPOSICION QUIMICA DEL LOTE:

CARBONO:	0.18% (MAXIMO)
MANGANESO:	0.080% (MAXIMO)
FOSFORO:	0.005% (MAXIMO)
AZUFRE:	0.005% (MAXIMO)

PEDRO SOLANO

Pedro Solano Chila
Director de Calidad

Autopista Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegas 6, 13-15

CERTIFICADO CALIDAD GEOTEXTIL – COLEGIO DON BOSCO, LUIS EDUARDO MORA, ATHABANZA, MIGUEL DCERVANTES, JOSE CELESTINO MUTIS

FICHA TECNICA GEOTEXTIL

GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº. Cert 055080

GEOMATRIX S.A.S
Calle 18 N 72 72
COLOMBIA
Tel: 4248999
Email: servicioalcliente@geomatrix.com.co

FECHA DE EXPEDICIÓN	CODIGO / CLIENTE	
01/11/2025	901973588	CONSORCIO FORTALEZA

Especificación para el producto

Referencia Nombre	Referencia Número	No. Orden	Uso	Factura No.
PROPYWEAVE T2400	PV52003	PC-018301	GT150	NAC020060

Nombre Prueba	U. Medida	Norma	Datos
RESISTENCIA ULTIMA A TENSIÓN - METODO TIRA ANCHA	kN/m	ASTM D4595	37,2
ELONGACIÓN A TENSIÓN ÚLTIMA	%		20,9
CARGA A LA ROTURA METODO GRAB	N	ASTM D4632	1725
ELONGACIÓN A LA ROTURA	%		20,0
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL	N	ASTM D4533	744
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO CBR	N	ASTM D6241	5401
RESISTENCIA A UV (% Retención a 500 horas)	%	ASTM D4355	>70
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE (1)	mm	ASTM D4751	0,355
PERMITIVIDAD	s^{-1}	ASTM D4491	0,239
TASA DE FLUJO	$l/m/m^2$		718

PIEZAS...# 000696374.

Observaciones:
(1) En el tamaño de abertura el tamiz utilizado es 50 US

GGM-CGCA-P-001 / V03
30/Dic/2022

Aprobado por: Omar Torres, DIRECTOR TÉCNICO

Revisado por: Elver Andres Ortega, JEFE DE CALIDAD

GEOMATRIX S.A.S. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL GEOMATRIX S.A.S.

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.
La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

QUALITY GSI GAI-LAP ASSURANCE
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

Esta información es impresa automáticamente por lo tanto no lleva firmas originales.

GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
GEOMATRIX S.A.S.

Los presentes resultados han sido obtenidos a partir de análisis estadísticos de mediciones realizadas en nuestro propio laboratorio de control de calidad de materiales, acreditado por el "Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Program – GAI-LAP", garantizando así la competencia e independencia para llevar a cabo las pruebas emitidas en el presente certificado.
La operación de GEOMATRIX se basa en un Sistema de Gestión de Calidad para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, certificado bajo la norma ISO 9001: 2015.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI - LAP
Accreditation # GAI-LAP-75-13

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación
DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE MATERIALES GEOSINTÉTICOS

Esta información es impresa automáticamente por lo tanto no lleva firmas originales.

Geotextiles Tejidos

PROPYWEAVE

GEOMATRIX
Los Expertos en Geosintéticos

PROPYWEAVE es un geotextil tejido fabricado con elementos en forma de cinta plana de polipropileno (PP), diseñada para satisfacer los requerimientos de las principales especificaciones de construcción para separación y estabilización de suelos y capas granulares.



Separación



Estabilización

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA DE ENSAYO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
			T 2400(MD)
Resistencia última a tensión - Método tira ancha	ASTM D4595	kN/m	41,0
Elongación a tensión última		%	18,0
Carga a la rotura - Método Grab	ASTM D4632	N	1780
Elongación aparente a la rotura		%	20,7
Resistencia al punzonamiento estático CBR	ASTM D6241	N	5050
Resistencia al rasgado trapezoidal	ASTM D4533		710
Estabilidad UV - Resistencia retenida después de 500 h	ASTM D4355	%	>70
PROPIEDADES HIDRÁULICAS			
Tamaño de abertura aparente	ASTM D4751	mm	0,259
Permitividad	ASTM D4491	s^{-1}	0,099
Tasa de flujo		l/min/m^2	297
PRESENTACIÓN DEL ROLLO			
Ancho(1)	Medido	m	3,80
Largo nominal			110

Observaciones:
TÍPICOS: Los datos presentados corresponden a valores promedio de los ensayos estadísticos de la producción. **MD**: Dirección de la máquina, a lo largo de los rollos. **TD**: Dirección transversal a través del largo de los rollos. (1)El ancho puede variar en un rango de +/- 1,0%.

Geomatrix se reserva el derecho de hacer, sin previo aviso, cambios en esta hoja técnica por actualización y mejora de sus productos.

Geomatrix cuenta con su propio Laboratorio acreditado por el **Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)**, el cual garantiza la competencia e independencia del Laboratorio para llevar a cabo pruebas específicas de Geosintéticos.

El alto nivel de calidad permanente se garantiza mediante un sistema de gestión de calidad, bajo la norma NTC-ISO 9001-2015, para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, y un sistema de inspección y evaluación estricto, conforme a los lineamientos de las normas ASTM D4354 y ASTM D4759 y de las especificaciones de supervivencia establecidas en FHWA NHI 07 – 092 y AASHTO M288; así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el marco del Sello de empresa comprometida con la economía circular logrando eficiencia en el uso de recursos, diseño de productos para una mayor durabilidad y promoción de la reutilización y el reciclaje.

QUALITY ASSURANCE GSI GAI - LAP

2025-01

FICHA TECNICA RECUBRIMIENTO COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA, BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE.

EUCOFLOOR UV SEALER

Recubrimiento protector de poliuretano resistente a rayos UV

Descripción

EUCOFLOOR UV SEALER es un recubrimiento de poliuretano alifático de dos componentes resistente a rayos UV, no se amarillea, mejora las propiedades físicas de los recubrimientos en resistencia a la abrasión, flexibilidad, estabilidad de color y resistencia a la intemperie. Cuando se usa como capa superior da un acabado estético, resistente, brillante y duradero.

Información Técnica

PROPIEDAD	RESULTADO
Color	• Blanco (RAL 9010) • Gris Oscuro (RAL 7004) • Gris Claro (RAL 7035) • Amarillo (RAL 1003) Otros colores especiales disponibles bajo pedido.
Apariencia	Parte A: Liquido viscoso coloreado Parte B: Líquido
Relación de mezcla en volumen (A:B)	4:1
% Sólidos	53% +/-2% según color
Tiempo de secado	30 a 60 minutos
Tiempo de repintado	60 a 90 minutos
Resistencia química* *Consulte con el área técnica para casos particulares	• Ácidos: Buena • Solventes: Buena • Aceites y grasas: Excelente • Intemperie: Excelente • Humedad: Excelente.

Los anteriores resultados son valores típicos obtenidos bajo condiciones de laboratorio, con humedad y temperatura controladas. Se espera una variación razonable bajo condiciones de campo.

Condiciones para la aplicación:

- Superficies secas.
- Humedad relativa del ambiente <85%
- Temperatura del sustrato: Mínimo 3°C por encima del punto de rocío.
- Temperatura ambiental y del sustrato: Entre 10°C y 35°C.

Tiempo de curado

- Tráfico ligero o inspección: 24 horas a 20°C.
- Puesta al servicio: 5 días.

Usos

EUCOFLOOR UV SEALER se recomienda como capa de acabado en recubrimientos epóxicos de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT o estructuras de concreto previamente imprimadas en zonas de:

- Laboratorios
- Cuartos limpios
- Bodegas
- Talleres
- Estructuras expuestas a ambientes agresivos, intemperie y/o rayos UV
- Se puede utilizar en superficies horizontales, inclinadas o verticales

ISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

EUCOFLOOR UV SEALER

TX40T977

OFICINA PRINCIPAL:
Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7 Tocancipá
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Ilustración 49. Ficha técnica Poliurea

EUCO ESMALTE URETANO

Recubrimiento protector de poliuretano resistente a rayos UV
(antes EUCOFLOOR UV SEALER / STEEL COAT UV)

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO ESMALTE URETANO

TX40T1046

Descripción

EUCO ESMALTE URETANO es un recubrimiento de poliuretano alifático de dos componentes que proporciona un acabado decorativo de alta calidad, resistente, brillante y duradero a estructuras y elementos metálicos o de concreto expuestos a la intemperie o ambientes agresivos.

Información Técnica

PROPIEDAD	RESULTADO
Color	Según referencia. Colores especiales bajo pedido.
Brillo	Mate, semimate, semibrillante y brillante
Viscosidad (Krebs @25°C)	80 – 110 KU
Peso por galón	4.0 – 4.6 kg/gal
Relación de mezcla en volumen (A:B)	4:1
Contenido de sólidos en volumen	50% – 55%
Tiempo de vida de la mezcla	Máximo 4 horas
Secado (25°C)	Al tacto: 60 – 120 min
	Al manejo: 240 - 360 min
Temperatura de aplicación	5°C – 45°C
Humedad relativa máxima para aplicación	85%

Los anteriores resultados son valores típicos obtenidos bajo condiciones de laboratorio, con humedad y temperatura controladas. Se espera una variación razonable bajo condiciones de campo.

Usos

EUCO ESMALTE URETANO se recomienda como capa de acabado en recubrimientos epóxicos de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT o estructuras de metal o de concreto previamente imprimadas en aplicaciones como:

- Laboratorios
- Cuartos limpios
- Bodegas
- Talleres
- Estructuras expuestas a ambientes agresivos, intemperie o condiciones climáticas severas
- Superficies horizontales, inclinadas o verticales
- Sistemas epóxicos e inorgánicos de Zinc

Ventajas

- Buena resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a rayos UV
- Uniformidad y retención de color y brillo
- Excelente adherencia a sistemas epóxicos
- Excelente cubrimiento y acabado
- Apto para superficies horizontales y verticales

OFICINA PRINCIPAL:
Parque Industrial Cran Sabana, Mz - Mz, Tocancipá
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Ilustración 43. Ficha técnica Poliurea

EUCOFLEX CALIENTE

Membrana de poliurea para impermeabilización, de aplicación por proyección

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y CUBIERTAS

EUCOFLEX CALIENTE

TX40T815

Descripción

EUCOFLEX CALIENTE es un sistema a base de **poliurea pura**, de dos componentes, de extra rápido curado para la aplicación de membranas elásticas, con puenteo de fisuras. Sólo se aplica por proyección mecánica en caliente.

El producto puede combinarse con diferentes geotextiles para obtener revestimientos sin juntas de aplicación continua.

Información Técnica

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN		
	COMPONENTE A	**COMPONENTE B**
Identidad química	Poliamina	Prepolímero de isocianato aromático
Estado físico	Líquido	Líquido
Contenido en sólidos	100%	100%
Punto de inflamación	>100°C	>100°C
Color	Amarillo (sin pigmentación)	Amarilliento
Densidad	T (°C) / Densidad (g/cm³): 20 / 1,02; 60 / 1,02	T (°C) / Densidad (g/cm³): 20 / 1,12; 60 / 1,10
Viscosidad Valores aproximados, Brookfield	T (°C) / Viscosidad (cP): 20 / 600; 30 / 200; 50 / 60; 70 / 40	T (°C) / Viscosidad (cP): 20 / 2000; 30 / 1000; 50 / 400; 70 / 150
Relación A/B	A = 1, B = 1.17 en peso A = 1, B = 1 en volumen	
Densidad y viscosidad de la mezcla	Rápida polimerización (ver Pot Life)	
Color	Amarillo oscuro. El componente A se pigmenta mediante la adición de pigmento de color para **EUCOFLEX CALIENTE** (EUCOFLEX PIGMENTO PS), suministrado conjuntamente con cada kit de **EUCOFLEX CALIENTE**.	
Pot Life	Tiempo de gelificación de la mezcla A + B (20 g) 4 s a 25°C 3 s a 60°C Seco al tacto 30 s a 70°C	

OFICINA PRINCIPAL:
Parque Industrial Gran Sabana, M8 - M7, Tocancipá.
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Ilustración 51.Ficha técnica Poliurea

EUCOFLEX PRIMER

Imprimante epóxico

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y CUBIERTAS

EUCOFLEX PRIMER

TX401948

Descripción

EUCOFLEX PRIMER es un sistema Epoxy de dos componentes, resina y endurecedor, para ser utilizado como imprimante en sustratos cementicios para la aplicación de resinas impermeabilizantes (poliureas / poliuretano).

Información Técnica

Apariencia Parte A : Líquido transparente.
Apariencia Parte B : Líquido transparente.
Relación de mezcla (A : B) en peso : 2.32 : 1
Densidad (A*B) : 1.08 kg/l
Pot Life : 50 minutos +/- 10 minutos.
Temperatura mínima de la base : 8°C
Temperatura máxima del sustrato : 30°C
Humedad del sustrato : 4% máximo.
Tiempo abierto : 30 minutos

Usos

EUCOFLEX PRIMER es un producto muy útil como sellador de soportes de concreto para su posterior tratamiento con resinas impermeabilizantes, como poliurea o poliuretano.

Rendimiento

Aplicación a dos capas para los sistemas EUCOFLEX. Para la primera capa, el consumo aproximado es de 0.25 kg/m². La segunda capa se aplica con un consumo aproximado de 0.2 kg/m² + espolvoreo de EUCOFILLER MEDIO de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

Nota. Los consumos son aproximados ya que dependen de la temperatura, rugosidad y porosidad del sustrato.

Aplicación

Preparación de la superficie
El concreto nuevo debe tener un mínimo de 28 días, una resistencia mínima de 280 kg/cm² y poseer una superficie abierta, porosa y texturizada, sin ningún compuesto de curado o sellado. El concreto viejo debe estar limpio y bien texturizado. Se deben eliminar aceites, tierra, basura, pintura y el concreto dañado.

Se debe preparar la superficie mecánicamente con un escarificador, desbastadora, lanzadora de perdigones o municiones o equipo similar hasta lograr un perfil igual a CSP 2-3, de acuerdo con la Guía ICRI 310.2. El paso final debe ser la completa eliminación de cualquier residuo con una aspiradora o lavado a presión.

El uso de ácido es aceptable solamente cuando la preparación mecánica es impráctica. Se recomienda que sólo los constructores experimentados utilicen este sistema de preparación de superficie. Las sales de la reacción se deben eliminar completamente con lavado a presión. Deje que el concreto se seque totalmente.

Nota. Aun siguiendo los procedimientos adecuados, una superficie tratada con ácido puede no proporcionar una adherencia igual de fuerte que los procedimientos mecánicos.

EUCOFLEX PRIMER debe ser mezclado (A+B) con taladro a baja revolución hasta completa homogeneización antes de ser aplicado.

OFICINA PRINCIPAL:
Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7 Tocancipá
PBX: (1) 869 87 87
WWW.TOXEMENT.COM.CO

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Ilustración 44. Ficha técnica Poliurea

FICHA TECNICA CEMENTO COLEGIO DON BOSCO, ARABIA, ATHABANZA, BRASILIA, CERVANTES, BIBLIOTECA,



FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 12

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Gris de Uso General" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Gris de Uso General", se destacan:

Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.

Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.

ARGOS

Ilustración 45. Ficha técnica cemento

FICHA TECNICA ACABADO PISO COLEGIO ARABIA, BRASILIA

Datos técnicos	Máxima resistencia a la rotura, tráfico pesado y abrasión profunda Producto restaurable	Tendencias	Elegancia y confort
Uso	Pisos, Pisos Institucionales, Interior	Tipo	Baldosa Terrazo
Unidad de empaque	M2	Unidad	M2
Unidades de venta (m2/caja)	1	Calidad	Calidad 1
Realidad aumentada	NO		

Ilustración 54. Ficha técnica baldosa granito.

FICHA TECNICA PISO CHIP COLEGIO ATHABANZA, LUIS EDUARDO MORA

Homogeneous Vinyl Sheet | TECHNICAL DATA SHEET

TECHNICAL DATA SHEET			
Norm /Product specification	ISO 10581(EN 649)	-	
European classification	ISO 10874(EN 685)	34 commercial heavy	class
		43 heavy duty	class
Total thickness	ISO 24346(EN 428)	4	mm
Roll width	ISO 24341(EN 426)	2	m
Roll length	ISO 24341(EN 426)	20	m
Wear group	EN 649	T	group
Color number	-	20	-
TECHNICAL INFORMATION / SAFETY CRITERIA			
Fire resistance	EN 13501-1	Bf-s1	class
	GB 8624-2012	B1(B-s1,t0)	class
Toxic testing	GB 18586-2001	OK	-
Static electrical propensity	EN 1815	<2	KV
Electrical resistance	EN 1081	10^9-10^10	Ω
Dry surface slip resistance	EN 13893	≥0.3	-
Oil wet ramp slip resistance	DIN 51130	R9	class
Abrasion resistance	EN 660.2	≤2.0	mm³
Dimensional stability	ISO 23999(EN 434)	≤0.4	%
Castor chair test	ISO 4918(EN 425)	OK	-
Residual indentation	ISO 24343-1(EN 433)	≈0.03	mm
Thermal conductivity	ISO 10456(EN 12524)	≈0.25	W/(m.K)
Colour fastness	ISO 105-B02	≥6	degree
Chemicals resistance	ISO 26987(EN 423)	OK	-
Anti-bacterial and fungicidal treatment	Trueshield Technology	OK	-
Anti-bacterial activity (E.coli-S.aureus-MRSA)	ISO 22196	>99%	-
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	<10	µg/m³

SUSTAINABILITY

This is illustrative by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of core materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as requirements for a minimal impact on the environment. We are the leaders in terms of the implementation of clean renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.

Ilustración 55. Ficha técnica piso vinilo

ESPECIFICACIONES:

Tipo de Producto:	Pisos de Seguridad en Caucho EPDM
Nombre del Producto:	TPV
Origen del Producto:	CHINA
Materiales:	Capa inferior granular gruesa negra de amortiguación hecha de Estireno-butadieno (SBR). Comúnmente llamada caucho reciclado negro proveniente de llantas y otros materiales de caucho. Granulometría : 3 a 6 mm Capa superior granular fina de colores varios en EPDM (Caucho Etileno-Propileno-Dieno) es un termopolímero que tiene buena resistencia a la abrasión y al desgaste. La composición de este material contiene entre un 45% y un 75% de etileno. Granulometría: 1 a 4 mm
Espesor en capas:	Dispositivos de juego con alturas de caida libre inferiores a 600mm sólo requieren que la superficie tenga ciertas propiedades de absorción al impacto. Para juegos infantiles con caídas críticas superiores Dispositivos de juego con alturas de caída libre inferiores a 600mm sólo requieren que la superficie tenga ciertas propiedades de absorción. Para juegos infantiles con caídas críticas superiores a los 600mm, los pisos de seguridad serán diseñados e instalados de acuerdo a la siguiente tabla de valores correspondientes a la prueba de Altura Crítica de Caída especificada por las Normas Europeas EN 1177:2008 y ASTM F 1292:99

ALTURA CRITICA DE CAIDA (Metros)	0.7	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.1
ESPESOR TOTAL (Milimetros)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
ESPESOR CAPA GRÁNULOS GRUESOS (SBR) (Milimetros)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
ESPESOR CAPA GRÁNULOS FINOS DE COLOR EPDM (Milimetros)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

*Tabla 1. Espesor del piso de seguridad de acuerdo con la altura crítica de caída del juego

LYD Proyectos SAS • Carrera 55 No.74–36 • Bogotá - Colombia • Tel. (1) 937-0193 • Cel. 3118273220

www.lydonline.com

Ilustración 56. Ficha técnica granocaucho

FICHA TECNICA PINTURA EPOXICA COLEGIO BRASILIA

Versión 3 / Marzo 2020

Pintuco
El Color de la Calidad®

PITURA EPÓXICA PROFESIONAL

Ideal para el uso profesional en pisos, muros y estructuras



DESCRIPCIÓN

Pintura epóxica base solvente de dos componentes que proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad en relación de mezcla 1:1

USOS

Ideal en pisos, muros y estructuras que requieren un mantenimiento liviano en aplicaciones en facilidades alimenticias, farmacéuticas, institucionales, comerciales, arquitectónicas e industriales. Es usada en la protección y decoración de la superficie de metal, concreto, asbesto-cemento y madera en ambientes interiores o exteriores expuesto a contaminación industrial o que requieran resistencia química.

En construcciones nuevas y de mantenimiento como recubrimiento o capa de sello de pisos que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, áreas de producción, parqueaderos, etc. Y para recubrir pisos con moderadas exigencias mecánicas y químicas, acabado liso y antideslizante agregándole arena de cuarzo o Supergrip en la proporción requerida.

Únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado; en ambientes exteriores requiere de acabado para evitar la decoloración y entizamiento con el sol. No recomendado para inmersión continua. No está recomendado su uso en interior de tanques de almacenamiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil relación de mezcla: 1:1
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- ✓ Buena dureza y resistencia mecánica
- ✓ Buena adherencia en diferentes tipos de sustratos.

Versión 3 / Marzo 2020

Pintuco® El Color de la Calidad®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Acabado	Brillante		
Sólidos por volumen (varían según el color)	49	52	%
Mezcla por volumen	1 a 1		
Espesor seco recomendado	75 (3)	200 (8)	Micrones (Mils)
Método de aplicación	Pistola, brocha o rodillo.		
Rendimiento teórico a 25 micrones película seca	50	75	m²/galón
Ajustador recomendado	Ref. 21209		
Densidad, ASTM D1475/NTC 561(varían según el color)	4,86	4,96	Kg / galón
Viscosidad, ASTM D562/NTC 559	75	85	Ku
Tiempo de vida útil de la mezcla a 25°C	6	8	h
Punto de chispa copa cerrada en la mezcla	28		°C
VOC de la mezcla (Varía Según color)	424	458	g / l

Nota: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido.

Los metales en ambientes de moderada a baja agresividad, pueden prepararse utilizando herramientas manuales o mecánicas (Norma SSPC-SP2 y SP3). En ambientes agresivos deben ser preparados con chorro abrasivo mínimo a grado comercial con remoción completa de la escama de laminación (Norma SSPC-SP6, estándar Sueco SA-2), y para mayor durabilidad deben ser preparados cerca de metal blanco (Norma SSPC-SP10).

En maderas selle bien con una mano de Pintura epóxica multiusos diluido al 20% por volumen con Ajustador Pintuco® Ref. 21209. En concreto y asbesto-cemento la alcalinidad en las paredes debe ser neutralizada con una solución de ácido muriático al 5%, y para pisos en concreto muy lisos o que tengan acabados superficiales debe garantizarse rugosidad del sustrato, eliminar cualquier contaminante sobre la superficie y debe estar completamente seco durante la aplicación. En repintes: sobre pinturas epóxicas en buenas condiciones, lije para eliminar el brillo y limpie bien. Las pinturas no epóxicas, deteriorada o en mal estado se eliminan con Removedor Pintuco® Ref. 1020 o por medio manual - mecánico y se trata la superficie según su tipo (metal, concreto, asbesto-cemento y maderas).

Preparación del producto y Aplicación

Revuelva bien con espátulas limpias cada componente hasta obtener su completa uniformidad. Mezcle 1 parte del componente A con 1 parte del componente B y revuelva bien con una espátula limpia hasta obtener una mezcla uniforme. Deje la mezcla en reposo durante 15 minutos antes de iniciar la aplicación. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a utilizar, y aplique antes de 8 horas para evitar que el producto pierda sus propiedades. Tenga en cuenta que de la exactitud de la mezcla dependen las

Ilustración 57. Ficha técnica pintura epoxica.

FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES

1.2 DIMENSIONES


TUBERÍAS SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS (AMARILLO)

Las Tuberías Sanitarias, Aguas Lluvias (amarillo) GERFOR se utilizan para la evacuación de aguas residuales hasta llegar a la red de alcantarillado, o como bajantes de aguas lluvias. Las Tuberías de Ventilación (naranja) GERFOR se utilizan para redes de ventilación únicamente.

- **Tipo de Unión:** Soldada mediante cemento solvente para PVC.
- **Presiones de trabajo:** NO APLICA.

ACCESORIOS

Dimensiones y tolerancia de campana y espigo



Campana							Campana, cuerpo y espigo	Espigo		
Diámetro Exterior Nominal del Tubo (pulg.)	Diámetro Exterior Nominal (mm)	Diámetro de entrada A		Diámetro de entrada B		Longitud de la campana mínimo en mm C	Espesor de la pared mínimo en mm E	Diámetro Externo X		Diámetro Interior Promedio
		Promedio en mm	Tolerancia en mm	Promedio en mm	Tolerancia en mm			Promedio en mm	Tolerancia en mm	
1 1/4	42	42,54	± 0,25	42,04	± 0,13	17	2,79			
1 1/2	48	48,64	± 0,25	48,13	± 0,13	17	2,79	48,26	± 0,15	17
2	60	60,71	± 0,25	60,2	± 0,13	19	2,92	60,33	± 0,15	19
3	83	82,94	± 0,25	82,42	± 0,13	38	3,18	82,56	± 0,20	38
4	114	114,81	± 0,25	114,17	± 0,13	44	3,3	114,3	± 0,23	44
6	168	168,83	± 0,38	168	± 0,25	76	4,15	168,28	± 0,28	76
8	219	219,84	± 0,76	218,7	± 0,76	101	5,33	219,08	± 0,38	101
10	273	273,8	± 0,64	272,7	± 0,38	127	9,28	273,05	± 0,38	127

1. La metodología de medición de esta longitud coincide con la especificada para el espigo en la NTC 3358.
2. El espesor de pared es un valor mínimo, excepto en una disminución hasta del 10% del valor especificado en la Tabla 1, como el resultado del movimiento del núcleo del molde. En este caso el promedio de dos valores opuestos de espesor de pared debe ser igual o superior al valor establecido en la tabla.
3. La metodología de medición de esta longitud coincide con la especificada para la campana en la NTC 3358.
4. Los gráficos son únicamente ilustrativos.
5. Los bujes tienen una función de reducción por lo que los diámetros externos e internos deben ser diferentes, por consiguiente, el diámetro externo debe ser mayor al diámetro interno.
6. Dimensiones tomadas de la ASTM D 2665 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.

Nota: El diámetro nominal de 3 pulgadas corresponde al tamaño establecido en la norma ASTM D2949 Standard Specification for 3.25-in. Outside Diameter Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.

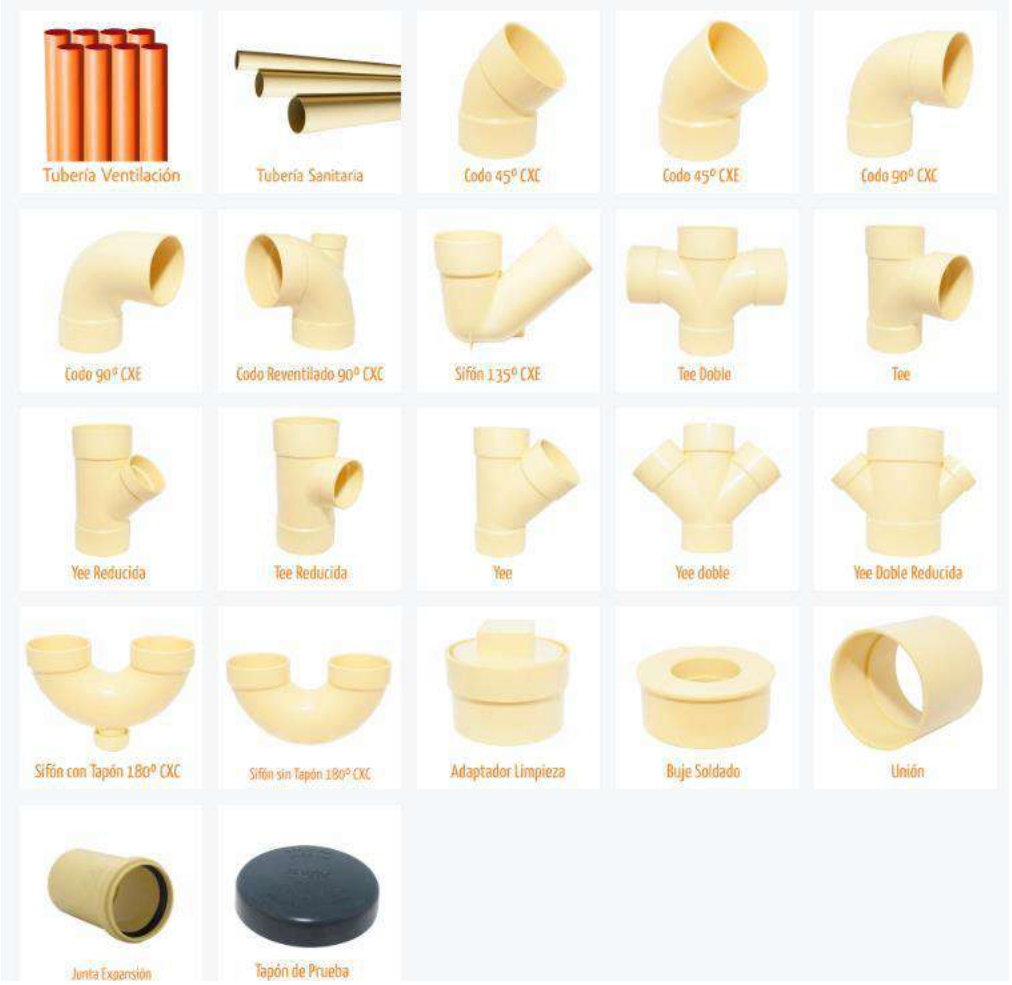


Ilustración 58. Ficha técnica tubería sanitaria

. FICHA TECNICA TUBERIA COLEGIO ATHABANZA, BRASILIA, MIGUEL DE CERVANTES



Tubos y conexiones de PVC-U

Productos de calidad para la tranquilidad de su hogar

Características técnicas de los tubos para agua fría con rosca NTP 399.166: 2008 (Revisada el 2018)

Diámetro		Longitud			Rosca NPT	Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 bar)	
Nominal	Exterior	Total	Rosca	Útil	Hilos	Espesor	Peso Aprox.
Pulg	mm	m	mm	m	Números	mm	kg/tubo
½	21.0	5.0	17.2	5	14	2.9	1.27
¾	26.5	5.0	17.5	5	14	2.9	1.66
1	33.0	5.0	21.8	5	11 ½	3.4	2.44
1 ¼	42.0	5.0	22.4	5	11 ½	3.6	3.35
1 ½	48.0	5.0	22.8	5	11 ½	3.7	3.97
2	60.0	5.0	23.7	5	11 ½	3.9	5.30

Características técnicas de los tubos para agua fría presión NTP 399.002: 2015 (Revisada el 2020)

Diámetro		Longitud		Clase 5 SDR 41 72 PSI(5 bar)		Clase 7.5 SDR 27.7 108 PSI(7.5 bar)		Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 bar)		Clase 15 SDR 14.3 215 PSI (15 bar)	
Nominal	Exterior	Total	Útil	Espesor	Peso	Espesor	Peso	Espesor	Peso	Espesor	Peso
Pulg	mm	m	m	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo	mm	Kg/tubo
½	21.0	5	4.97	-	-	-	-	1.8	0.84	1.8	0.84
¾	26.5	5	4.96	-	-	-	-	1.8	1.08	1.8	1.08
1	33.0	5	4.96	-	-	-	-	1.8	1.36	2.3	1.72
1 ¼	42.0	5	4.96	-	-	1.8	1.75	2.0	1.94	2.9	2.75
1 ½	48.0	5	4.96	-	-	1.8	2.02	2.3	2.55	3.3	3.58
2	60.0	5	4.95	1.8	2.54	2.2	3.08	2.9	4.02	4.2	5.69
2 ½	73.0	5	4.94	1.8	3.11	2.6	4.44	3.5	5.90	5.1	8.40
3	88.5	5	4.93	2.2	4.60	3.2	6.62	4.2	8.59	6.2	12.38
4	114.0	5	4.90	2.8	7.56	4.1	10.94	5.4	14.24	8.0	20.59
6	168.0	5	4.86	4.1	16.32	6.1	23.99	8.0	31.09	-	-

Los tubos 1/2"(21mm) y 3/4"(26.5mm) para PN 10 cuenta con sello SEDAPAL

Ilustración 59, Ficha técnica tubería PVC

11. ANEXO ACTAS DE ENTREGA.

ACTA DE ENTREGA COLEGIO BRASILIA BAÑOS



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio Brasilia*
DIRECCIÓN	: *Cl. 73 b sur # 1 a 73b*
LOCALIDAD	: *5 – Usme*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega física a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Brasilia*** ubicado en la Localidad ***5 – Usme*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 508***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

BLOUQE PRIMARIA – EMERGENCIA:

- Adecuación batería sanitaria primer piso baño mujeres

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de los espacios entregados y de igual forma de los elementos instalados, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantía, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 29 de julio de 2026 al 28 de julio de 2028).

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

MARCO ANTONIO TORRES RECTOR(A) COLEGIO BRASILIA	**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ** Director(a) de interventoría. Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025
CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO Director(a) de Obra. Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025	**AQR. SANTIAGO ANGEL ORIBE** Apoyo a Supervisión Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025

Página 1

07.1-IF-009
V.2.



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Fotografía No.1: Adecuación batería sanitaria primer piso baño mujeres	**Fotografía No.2:** Adecuación batería sanitaria primer piso baño mujeres
Fotografía No.3: Adecuación batería sanitaria primer piso baño mujeres	**Fotografía No.4:** Adecuación batería sanitaria primer piso baño mujeres

Página 2

07.1-IF-009
V.2.

Ilustración 46. Acta de Entrega Colegio Brasilia Baños

ACTA DE ENTREGA MIGUEL DE CERVANTES BIBLIOTECA



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A*
DIRECCIÓN	: *Cra 14B No. 76 33 Sur MJ*
LOCALIDAD	: *5 – Usme*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega fisica a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A*** ubicado en la Localidad ***5 – Usme*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 540***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

BIBLIOTECA MARICHUELA:

- Adecuación batería sanitaria baño hombres
- Adecuación batería sanitaria baño PMR (Personas con movilidad reducida)

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de los espacios entregados y de igual forma de los elementos instalados, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantía, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 29 de julio de 2026 al 28 de julio de 2028).

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

VICTOR ZENON CARO CUERVO **RECTOR(A)** **COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ** **Director(a) de Interventoría.** **Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025**
P.P. **CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO** **Director(a) de Obra.** **Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025**	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE** **Apoyo a Supervisión** **Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025**

Página 1

07.1-IF-009
V.2



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Fotografía No.1: Adecuación batería sanitaria baño hombres	**Fotografía No.2:** Adecuación batería sanitaria baño hombres
Fotografía No.3: Adecuación batería sanitaria baño hombres	**Fotografía No.4:** Adecuación batería sanitaria baño PMR (Personas con movilidad reducida)

Página 2

07.1-IF-009
V.2.

Ilustración 61. Acta de Entrega Colegio Miguel de cervantes-Biblioteca

ACTA DE ENTREGA COLEGIO JOSE CELESTIMO MUTIS-EMERGENCIA

Arinco ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Seiing S.A.S

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio rural José Celestino Mutis*
DIRECCIÓN	: *Km 10 Via Quiba Lote el Clavel, Bogotá*
LOCALIDAD	: *19 – Ciudad Bolivar*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega fisica a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio rural José Celestino Mutis*** ubicado en la Localidad ***19 – Ciudad Bolivar*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 1985-L***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

- Muro en ladrillo tolete
- Instalación de compuerta tipo persiana
- Instalación tubería para recolección de aguas lluvias
- Adecuación caja de inspección
- Filtro Ecodren.


OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de los espacios adecuados y de los elementos instalados, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantia, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantia 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 17 de julio de 2026 al 16 de julio de 2028).

- Se entrega manual de mantenimiento y matriz.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

P/P Johnny Fernando Almeciga Ortiz	
CARLOS ARTURO LOPEZ	**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ**
RECTOR(A)	Director(a) de interventoria.
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS	Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025
P.P.	
CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE**
Director(a) de Obra.	Apoyo a Supervisión
Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025	Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025

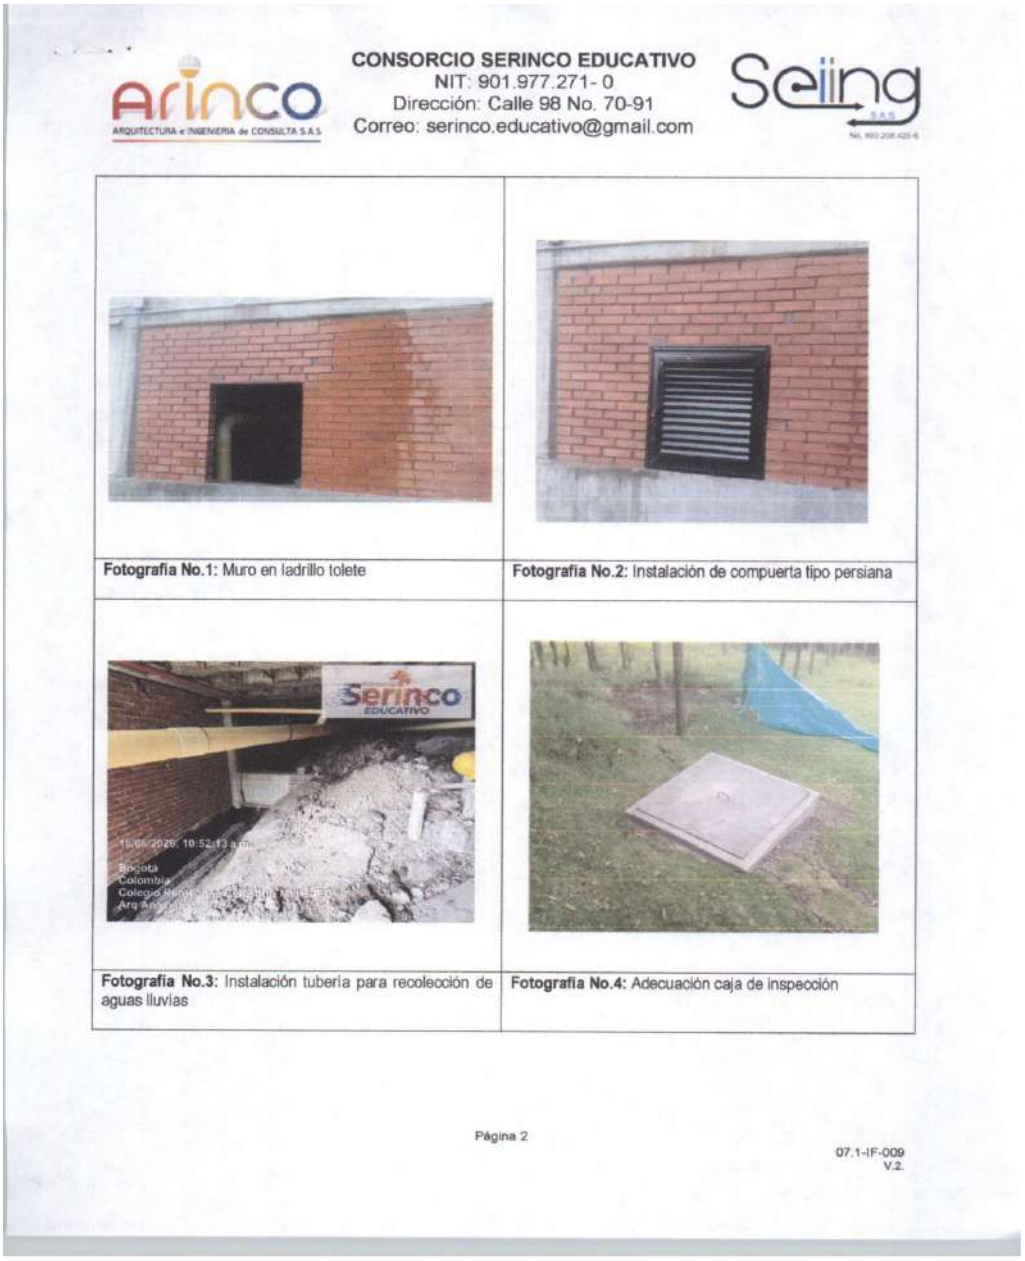

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Fotografia No.1: Muro en ladrillo tolete	**Fotografia No.2:** Instalación de compuerta tipo persiana
Fotografia No.3: Instalación tubería para recolección de aguas lluvias	**Fotografia No.4:** Adecuación caja de inspección

Página 2

07.1-IF-009
V.2.

Ilustración 62. Acta de Entrega Colegio Jose Celestino Mutis

ACTA DE ENTREGA COLEGIO BICENTENARIO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio Bicentenario Sede C*
DIRECCIÓN	: *Cl. 81 Sur No. 18M – 02*
LOCALIDAD	: *19 – Ciudad Bolívar*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega física a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Colegio Bicentenario Sede C*** ubicado en la Localidad ***19 – Ciudad Bolívar*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 1986-L***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:


- Resane y pintura en área afectadas, zona comedor.

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado del espacio intervenido, y de igual forma de la canal y bajantes instaladas, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantía, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 7 de julio de 2026 al 6 de julio de 2028).

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

JUAN SEBASTIAN DIAGO **RECTOR(A)** **COLEGIO BICENTENARIO SEDE C**	P/P **HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ** **Director(a) de interventoría.** **Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025**
P.P. **CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO** **Director(a) de Obra.** **Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025**	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE** **Apoyo a Supervisión** **Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110-2025**

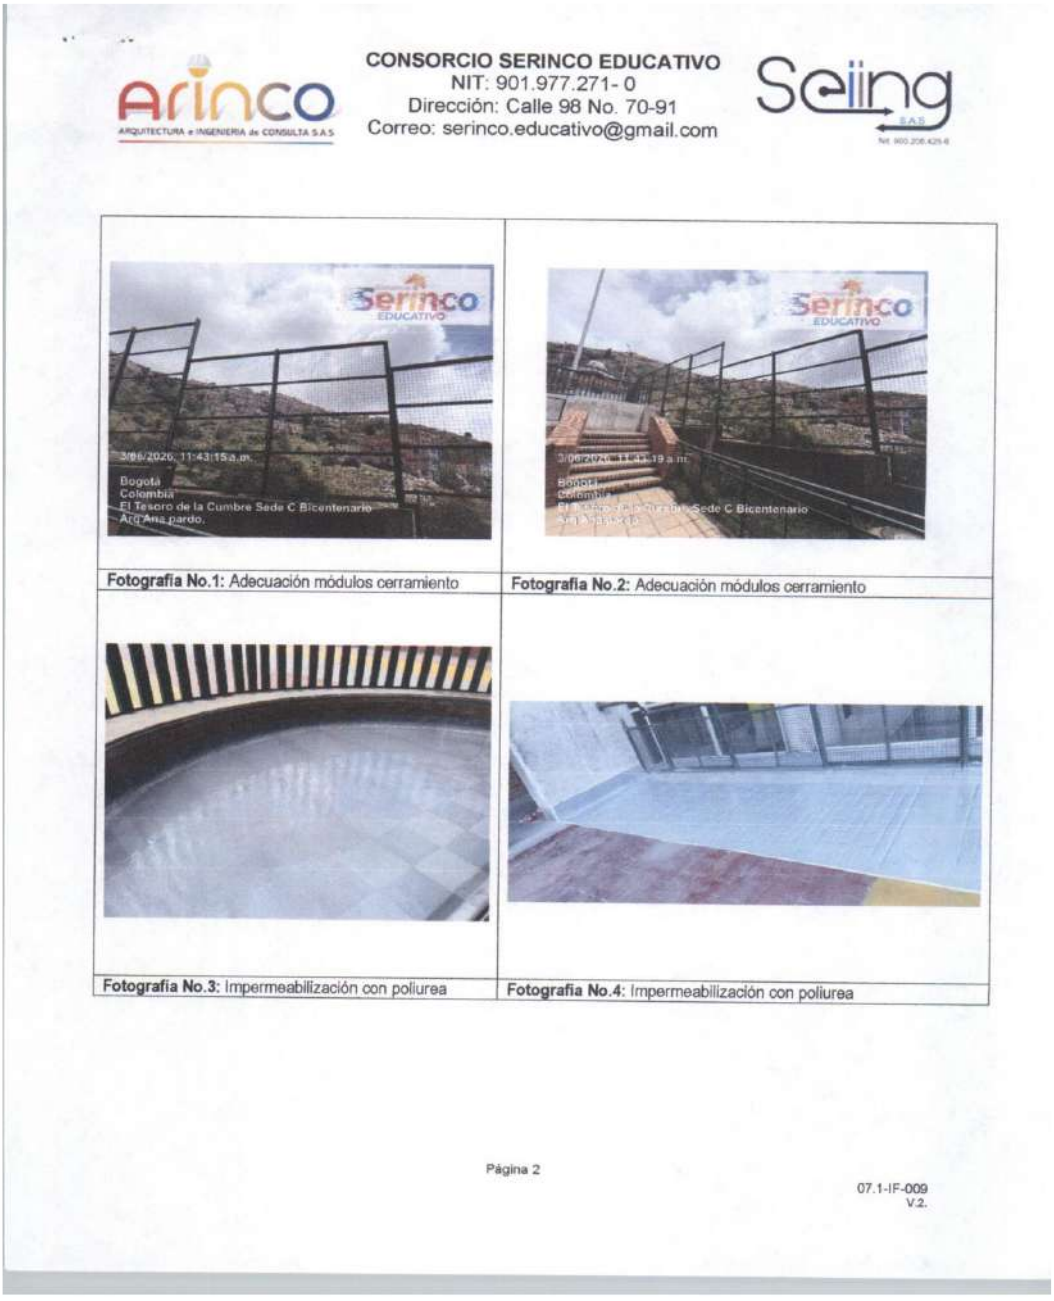

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Fotografía No.1: Adecuación módulos cerramiento	**Fotografía No.2:** Adecuación módulos cerramiento
Fotografía No.3: Impermeabilización con poliurea	**Fotografía No.4:** Impermeabilización con poliurea

Página 2

07.1-IF-009
V.2.

Ilustración 63. Acta de Entrega Colegio Bicentenario

ACTA DE ENTREGA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

CONTRATO DE OBRA	: *CO1.PCCNTR.8154895 - 2025*
CONTRATISTA	: *Consorcio Fortaleza*
COLEGIO	: *I.E.D. Colegio José Jaime Rojas*
DIRECCIÓN	: *Cra. 18 No. 77A Sur 27*
LOCALIDAD	: *19 – Ciudad Bolívar*
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: *CO1.PCCNTR.8169110 - 2025*
CONTRATISTA	: *CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*

La presente acta tiene por objeto la entrega física a satisfacción de las obras ejecutadas en el Colegio ***I.E.D. Colegio Colegio José Jaime Rojas*** ubicado en la Localidad ***19 – Ciudad Bolívar*** de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con el ***CPF 1934***

En tal sentido se reúnen las partes abajo firmantes con el fin de hacer la entrega formal de los espacios intervenidos, los cuales contaron con el siguiente alcance:

AULAS: Cambio de Cubierta
Cambio de luminarias, toma corriente e interruptores

RECTORIA: Cambio de Cubierta
Cambio de luminarias, toma corriente e interruptores
Cielo raso en PVC

OBSERVACIONES

Se recomienda a la institución educativa realizar un cuidado adecuado de la Cubierta, las Luminarias Nuevas, Interruptores, Toma Corrientes e Instalación de cielo raso en PVC, siguiendo los parámetros estipulados en el manual de mantenimiento, de lo contrario no podrá ser objeto de garantía, ya que esta no cubre el manejo inadecuado de los elementos. (Tiempo de garantía 2 años a partir de la entrega a la IED, es decir 7 de julio de 2026 al 6 de julio de 2028).

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por los que en ella intervinieron.

JYMMY LEONARDO RODRIGUEZ **RECTOR(A)** **COLEGIO JOSE JAIME ROJAS**	P/r **HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ** **Director(a) de Interventoria.** **Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**
P. P. **CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO** **Director(a) de Obra.** **Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8154895-2025**	**AQR. SANTIAGO ANGEL URIBE** **Apoyo a Supervisión** **Contrato de Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110-2025**

Página 1

07.1-IF-009
V.2.

Observaciones:
Quedan pendientes tapa ciegos (7) de los aulas 1, 2, 3 y oficinas.
Pendiente guardaescobas dellas oficinas



CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

Fotografia No.1: Cambio de Cubierta, Luminarias, Toma Corriente e interruptores - Aulas

Fotografia No.2: Cambio de Cubierta, Luminarias, Toma Corriente e interruptores - Aulas

Fotografia No.3: Cambio de Cubierta, Luminarias, Toma Corriente e interruptores, Cielo raso en PVC - Rectoria

Fotografia No.4: Cambio de Cubierta, Luminarias, Toma Corriente e interruptores, Cielo raso en PVC - Rectoria

Observaciones: Arreglo de División en Drywall
Pendiente Aseo general del baño puestado el mismo dia de obra
Pendiente arreglo de Cinco telefónica
Resane en ladrillo exterior aula 3.


Página 2

07.1-IF-009
V.2.

Ilustración 64. Acta de Entrega Colegio Fabio Lozano Simonelli

12. ANEXO BITACORAS DE OBRA

BITACORA DE OBRA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

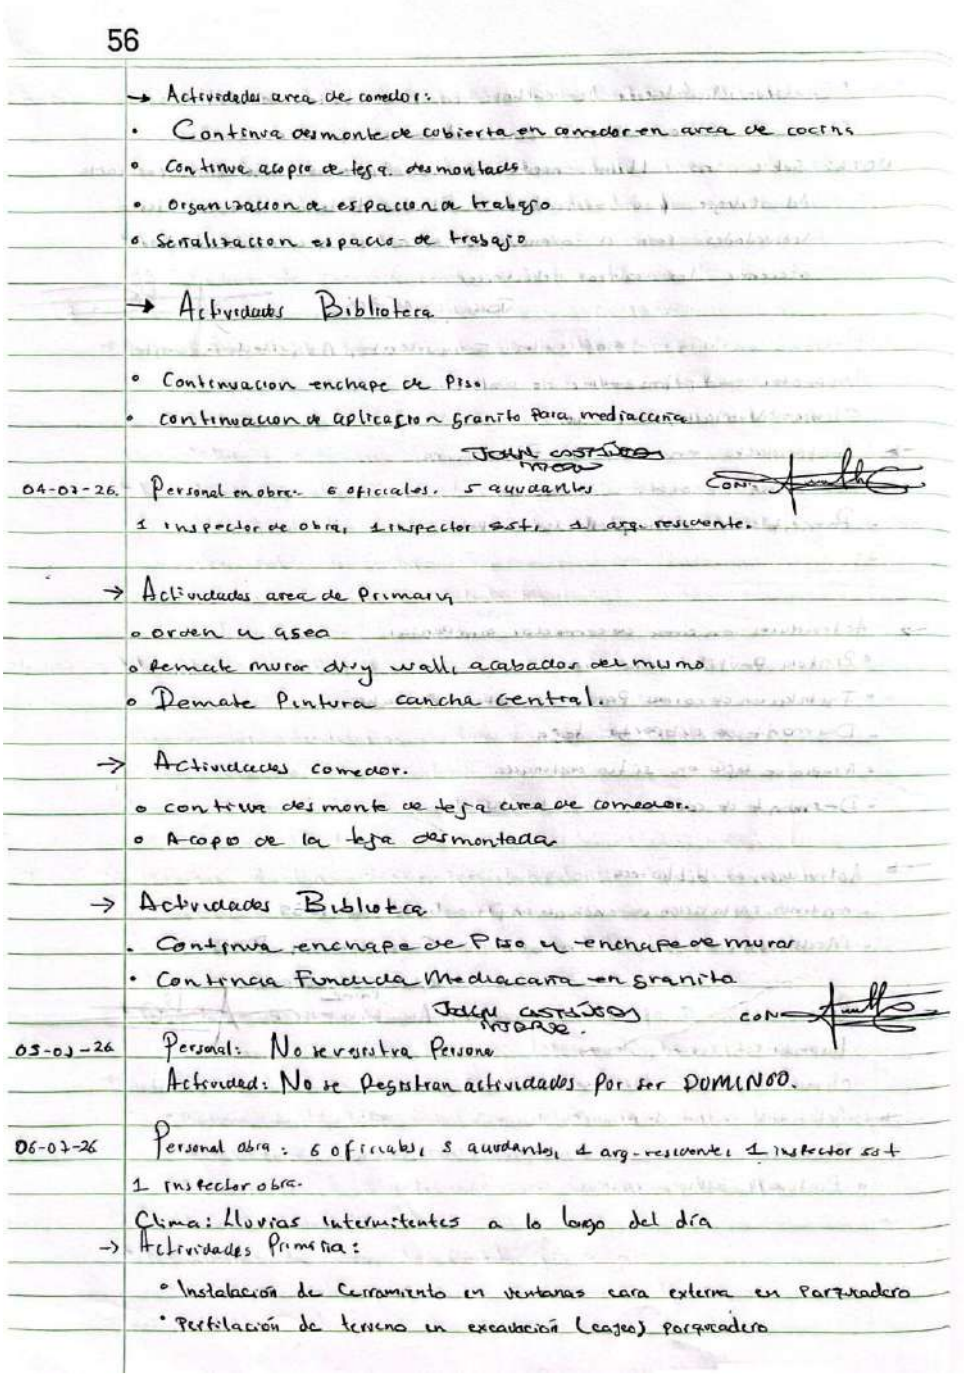

56

→ Actividades area de comedor:

- Continua desmonte de cobierta en comedor en area de cocina
- Continua acopio de teja desmontada
- Organizacion de espacio de trabajo
- Senalizacion espacio de trabajo

→ Actividades Biblioteca

- Continuacion enchape de Piso
- continuacion de aplicacion Granito para mediacaña

JOHN CASTIBLANCO INTORE CONT

04-07-26. Personal en obra: 6 oficiales. 5 ayudantes
1 inspector de obra, 1 inspector sst, 1 arq. residente.

→ Actividades area de Primaria

- orden y aseo
- Remate muro dry wall, acabados del mismo
- Demate Pintura cancha Central.

→ Actividades comedor.

- continua desmonte de teja area de comedor.
- Acopio de la teja desmontada.

→ Actividades Biblioteca

- Continua enchape de Piso y enchape de muro
- Continua Fundida Mediacaña en granito

JOHN CASTIBLANCO INTORE. CONT

05-07-26 Personal: No se registra Persona
Actividad: No se Registran actividades Por ser DOMINGO.

06-07-26 Personal obra: 6 oficiales, 5 ayudantes, 1 arq-residente, 1 inspector sst
1 inspector obra.
Clima: Lluvias intermitentes a lo largo del día
→ Actividades Primaria:

- Instalación de Cerramiento en ventanas cara externa en Parqueadero
- Perfilación de terreno en excavación (cages) parqueadero

- Excavación para profundizar filtro en parqueadero
- Trasiego de material excavado

→ Actividades en área de Comedor Compensar:

- Corte de teja existente en cubierta
- Desmonte de teja existente
- Desmonte de canal en costado sur
- Orden y aseo en obra

→ ~~Foto~~ Actividades en Biblioteca:

- Polimiento de piso baño caballeros
- Pintura en muro encima de enchape baño discapacitados.
- Orden y aseo en obra.

JOHN CASAS
IATPRO

ON

24-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.

Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico

Clima: Lluvia fuerte en la tarde, lloviznas en la mañana, Nublado.

→ Actividades en área de Primaria

- Demarcación de plazoleta Central, líneas blancas para Cancha de baloncesto y banquitas.
- Personal de aseo del Colegio realizó aseo en los salones
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Cubierta del Comedor Compensar:

- Desmonte de canales en Costado norte y sur
- Instalación de Cerramiento en Polisombra verde y madera en el costado norte parte inferior del comedor.
- Instalación de perfiles para Conformación de Correas en estructura de Cubierta.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:

- Polvda de piso y mesón de granito
- Instalación de sanitarios y orinales
- Pintura en muros parte superior del enchape
- Orden y aseo en obra.

JOHN C.
IATPRO

GU-

58

08-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector SST, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado lluvias a lo largo del día de manera intermitente.

→ Actividades en área de Primaria:
- aplicación de 3ra capa a pintura blanca de las líneas de demarcación.
- Retiro de cinta utilizada en la demarcación
- Retoque de pintura en cancha plazoleta Central.
- Corrección en dilataciones de oficina en estructura liviana
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Instalación de perfil en muro de cubata costado occidental, para Conformación de Cercha
- Desmonte de canal costado norte.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Pulida de mesón en granito
- Instalación de tapa registros y regilla de ventilación
- Orden y aseo en obra.

Jorge C. Interv. CON.

09-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector SST, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, lluvias intermitentes.

→ Actividades en área de primaria:
- Instalación de abrazaderas en tubería de bajantes aguas lluvias.
- Pintura de aros tablero de baloncesto.
- Perforación de tubo sanitario 4" Ø para filtro tipo frances en parqueadero
- Excavación en costado sur para instalación de filtro
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Instalación de perfiles para Conformación de correas
- Instalación de perfil para Conformación de Cercha

58

08-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector SST, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado lluvias a lo largo del día de manera intermitente.

→ Actividades en área de Primaria:
- aplicación de 3ra capa a pintura blanca de las líneas de demarcación.
- Retiro de cinta utilizada en la demarcación
- Retoque de pintura en cancha plazoleta Central.
- Corrección en dilataciones de oficina en estructura liviana
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Instalación de perfil en muro de cubata costado occidental, para Conformación de Cercha
- Desmonte de canal costado norte.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Pulida de mesón en granito
- Instalación de tapa registros y regilla de ventilación
- Orden y aseo en obra.

Jorge C. Interv. CON.

09-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector SST, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, lluvias intermitentes.

→ Actividades en área de primaria:
- Instalación de abrazaderas en tubería de bajantes aguas lluvias.
- Pintura de aros tablero de baloncesto.
- Perforación de tubo sanitario 4" Ø para filtro tipo frances en parqueadero
- Excavación en costado sur para instalación de filtro
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Instalación de perfiles para Conformación de correas
- Instalación de perfil para Conformación de Cercha

° Pintura en perfiles para Conformación de estructura de Cubierta.
° Orden y aseo en obra.

→ Actividades en biblioteca:
° Instalación de lavamanos
° Orden y aseo en obra

JOHN C
INTERVENTOR

CONT:

5-07-26 Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, lloviznas intermitentes.

→ Actividades en área de Primaria:
° limpieza de excavación para Instalación de filtro
° se extiende geotextil en excavación
° riego de grava, Cama para tubo
° Instalación de tubo perforado ø 4"
° relleno de tubo con ~~gato~~ grava
° Extensión de una parte de geotextil tejido en longitud de parqueadero
° Trasiego y relleno manual de material granular tipo SBG

→ Actividades en area de comedor Compensar
° Instalación de perfiles para Conformación de estructura de Cubierta
° Desmonte de cielo raso en area de Cocina
° Orden y aseo en obra.

JOHN C
INTERVENTOR

CONT:

6-07-26 Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado lluvioso

→ Actividades en area de primaria:
° Instalación de abrazaderas
° Orden y aseo en obra

→ Actividades en área de Comedor Compensar
° Instalación de perfiles para Conformación de correas de cubierta.

- Desmonte de canal costado sur
- Instalación de Cerramiento
- Desmonte de Correas existentes
- Orden y asco en obra.

INTER CON:

12-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra ya que es día de descanso, Domingo.

INTER CON:

13-07-26 Personal en obra: No se registra Personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra ya que es día festivo.

INTER CON:

14-07-26 Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes, Arquitecta residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado, llovizna intermitentes
→ Actividades en área de primaria:
- De acuerdo a visita del supervisor del SED se hace entrega formal del espacio de Andenes y corredores pero la plazoleta Central no fue recibida ya que el supervisor indica que no tiene un acabado en la superficie liso.
- Trasiego de material Granular para extensión sobre geotextil
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Se levanta Cerramiento en la parte Inferior (piso 1) ya que el viento lo había tumbado
- Aplicación de primera capa de pintura a Canales
- Instalación de Correas para Conformación de estructura de Cubierta
- Orden y aseo en obra

INTER CON

07-26 Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector tecnico.
Clima: Nublado, lluvioso
→ Actividades de obra en área de parqueadero:
° Trasiego y extensión de Material Granular.
° Descargue de Material Granular
° Orden y aseo en obra
→ Actividades de obra en área de Comedor Compensar:
° Soldadura para unión de Correas
° Instalación de Correas
° Pintura de Perfiles
° Orden y aseo en obra
→ Actividades en Biblioteca:
° Orden y aseo en patio
° se recibe puerta para Instalación en Carpintería Metálica.

Jabel C
Interno

con.

07-26 Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, lloviznas intermitentes
→ Actividades en área de parqueadero:
° Extensión y trasiego de material granular
° Recibo y descargue de Material granular
° Orden y aseo en obra.
→ Actividades de obra en Comedor Compensar:
° Pintura Capa base a perfiles tipo C
° Instalación de Correas para Conformación de estructura de Cubierta
° Orden y aseo en obra.
→ Actividades en biblioteca:
° Instalación de puerta en Cuarto de baño mujeres
° Orden y aseo en obra

Jabel C
Interno

au

62

17-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 oficiales, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de interventoría: Arquitecto residente, Inspector tecnico.
Clima: Nublado - soleado
→ Actividades en parqueadero:
- Cargue y retiro de material RCD
- Recibo de Material granular
- Trasiego de Material granular
- Orden y asco en obra

→ Actividades en Área de Comedor:
- Instalacion y soldadura de Correas para estructura de cubierta.
- Pintura en Perfiles tipo C
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Instalación de lavamanos baño de discapacitados.
- Instalación de sifones en lavamanos
- Instalación de grifos en lavamanos
- Orden y aseo en obra.

Jairo C. maestro CON:

18-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector de obra, Inspector sst.
Personal en interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, Lloviznas
→ Actividades de obra en parqueadero:
- Trasiego de Material granular
- Extensión de Material granular
- Orden y aseo en obra

→ Actividades de obra en área del Comedor
- Enlonado de escombro
- Soldadura en perfiles tipo C
- Instalacion de Correas
- orden y aseo en obra.

Jairo C. maestro CON:

17-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra debido a que es día de descanso, Domingo

Jose C
Interv

Con:

18-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra.
Actividades de obra: No se registran actividades de obra debido a que es día festivo.

Jose C
Interv

Con:

21-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnica
Clima: Nublado, Lloviznas.

→ Actividades de obra en parqueadero:
- Trasiego de Material Granular
- Expansión o extensión de Material.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Transporte de teja desmontada hasta punto de acopio
- Instalación de Correas para Conformación de estructura de Cubierta.
- Instalación de Cerramiento de acopio de teja desmontada
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Instalación de divisiones en acero Inoxidable.
- Instalación de espejos en baño ya entregado anteriormente.
- retiro de papel protector de divisiones
- Orden y aseo en obra.

Jose C
Interv

Con:

22-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.

17-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra debido a que es día de descanso, Domingo

Jose C
Interv

Con:

18-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra.
Actividades de obra: No se registran actividades de obra debido a que es día festivo.

Jose C
Interv

Con:

21-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnica
Clima: Nublado, Lloviznas.

→ Actividades de obra en parqueadero:
- Trasiego de Material Granular
- Expansión o extensión de Material.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Transporte de teja desmontada hasta punto de acopio
- Instalación de Correas para Conformación de estructura de Cubierta.
- Instalación de Cerramiento de acopio de teja desmontada
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Instalación de divisiones en acero Inoxidable.
- Instalación de espejos en baño ya entregado anteriormente.
- retiro de papel protector de divisiones
- Orden y aseo en obra.

Jose C
Interv

Con:

22-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.

° Aseo en baños En intervención, caballeros y discapacitados.
° Instalación de orfones en lavamanos.
° Orden y aseo en obra.

NOTA: Llega a obra equipo para Compactación del Material granular, tipo Benitin y sale equipo Compactador tipo Canguro de Propiedad Consorcio Fortaleza.

Interventoría Cons

24-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado - soleado

→ Actividades de obra en parqueadero:
° Levantamiento de Muros anivel de fundida en Cajas de Inspección de aguas servidas y aguas lluvias.
° fundida de tapa para caja de Inspección.
° Recibo de Material granular
° Compactación de Capa 1 en material granular
° Estabilización con Cemento puro tipo UG en areas afectados por lluvia.
° Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de comedor Compensar.
° Instalación de Canal Costado sur
° Instalacion de soportes Para Canal Costado Norte
° Orden y aseo en obra

Interventoría Cons

25-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Lluvioso

→ Actividades en parqueadero:
° Compactación de capa 1 de material granular
° En la portería Principal se repararon unas tabletas que

fueron afectadas la primera vez que ingresó el mini cargador
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Maniobras de descargue de tejas desmontadas
- Traslado de tejas a punto de acopio
- Traslado de estructura metálica desmontada hasta punto de acopio
- orden y aseo en obra

→ Actividades en plazoleta Central
- Aplicación de 3 capas de Emulsión Asfáltica.

26-07-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra debido a que es día de descanso, Domingo.

27-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado - soleado

→ Actividades en parqueadero
- Escarificación y retiro de Material granular que estaba saturado por fuertes lluvias.
- Trasiego y llenado en zona escarificada
- Compactación de Material Granular
- Orden y aseo en obra
- Cobertura de Material granular instalado

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de Correas para Conformación de estructura de Cubierta
- Instalación de Canal Costado sur
- Recibo y descargue de teja tipo sandwiche
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:
- Brillado de Pisos en baños de caballeros y discapacitados.
- Aseo final para entrega de los baños

- Instalación de espejos en baño de Caballeros
- Orden y aseo en obra.

Jorge C. INGENIERO CON.

28-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: soleado

→ Actividades de obra en Parqueadero:
- Trasiego y extensión de material granular
- Compactación de Material con Benitin.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de Correas para estructura de cubierta
- Instalación de canal para recolección de aguas lluvias.
- Retiro y disposición final de Chatarra
- Desmonte de Canal existente costado sur.

→ Actividades el plazoleta Central: Pintura y delineación de Concha
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:
- Reparación en piso entrada a baño de Damas.
- Instalación de 3 tabletas faltantes
- Pintura en zonas afectadas por transito de personas
- Orden y aseo en obra.

Jorge C. INGENIERO CON:

29-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, llovizna intermitentes

→ Actividades en parqueadero:
- Trasiego de Material Granular
- Cargue en Material granular Capa base
- Compactación de Material
- Orden y aseo en obra.

68

→ Actividades en área de Comedor Compensar

- Arreglo de Cerramiento de pasillo de ingreso
- Transporte o traslado de teja hasta cerca de la Instalación.
- Instalación y soldadura de Correas
- Pintura de estructura.
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en biblioteca:

- Se realiza recorrido con el supervisor del SED, Interventoría y Contratista con la finalidad de hacer entrega de la obra finalizada la cual fue recibida a satisfacción.

Jorge C. INTERVENTOR CONSTRUCTOR

30-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector de obra, Inspector SST, personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, soleado, llovizna leve.

→ Actividades en parqueadero:

- Trasiego de Material Granular
- Cerco de Material
- Compactación de Material granular
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en plazoleta Central:

- Pintura 3ra Capa para acabado final
- Delineación de concha
- Retoque de pintura en puntos afectados
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:

- Retiro y disposición final de teja de asbesto desmontada.
- Pintura en Correas y Cerchas
- Soldadura de refuerzo en estructura de Cubierta.
- Instalación de bajantes para aguas lluvias
- Orden y aseo en obra

Jorge C. INTERVENTOR CONSTRUCTOR

31-07-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: soleado, Lloviznas leves.

→ Actividades de obra en parqueadero
- Excavación para instalacion de Cárcamo
- Trasiego de Material excavado
- Llegada de elementos que existían en otros Colegios que ya finalizaron obra.
- Salida de vibrocompactador tipo Benitin.
- Orden y aseo en obra

→ Actividades en área de Comedor Compensar
- Pintura de estructura metálica para cubierta
- soldadura de Correas
- Orden y aseo en obra.

Interventor Con.

01-08-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: soleado, Nublado, Lloviznas intermitentes.

→ Actividades en parqueadero:
- Llegada de Compactador tipo Canguro
- Compactación de bordes de difícil acceso para el equipo anterior
- Excavación para Cárcamo y filtro Inferior
- Orden y aseo en obra.
- Cambio de tabletas en Piso de Portería Principal

→ Actividades en área de Comedor Compensar
- Soldadura de Correas para Conformación de estructura de cubierta.
- Se estaba Aplicando Pintura pero se debió suspender la actividad por fuertes lluvias.
- Orden y aseo en obra.

Interventor Con.

02-08-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades de obra: No se registran actividades de obra ya que es día de descanso del personal, Domingo.

JOHN C
Interventor

Cons

03-08-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 ayudantes, 2 soldadores, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado, soleado

→ Actividades en área de Primaria y parqueadero:
- Se realiza la entrega de la Cancha, Plazoleta Central, se entrega por parte del Contratista a Interventoría quien a su vez realiza entrega al Colegio quienes reciben a Conform
- Se despeja el área entregada de material sobrante.
- Se realiza excavación para instalación de filtro frances
- Se Compacta Nuevamente con equipo Compactador tipo canguro toda la superficie del parqueadero.
- Orden y aseo en obra


→ Actividades en Comedor Compensar:
- Inicia la instalación de teja tipo sandwiche.
- Pintura en un costado de la Cubierta
- Orden y aseo en obra.

JOHN C
Interventor

Cons.

04-08-26 Personal en obra: 5 oficiales, 4 oficiales, Arquitecto residente, 2 soldadores, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspecto, técnico
Clima: soleado.

→ Actividades en Parqueadero:
- Excavación para filtro frances.
- pertilamiento de excavación
- Perforaciones en tubos para filtro frances
- Instalación de geotextil
- Agregado grava entre geotextil
- Instalación de tubería para filtro
- pega de accesorios para tubería de filtro

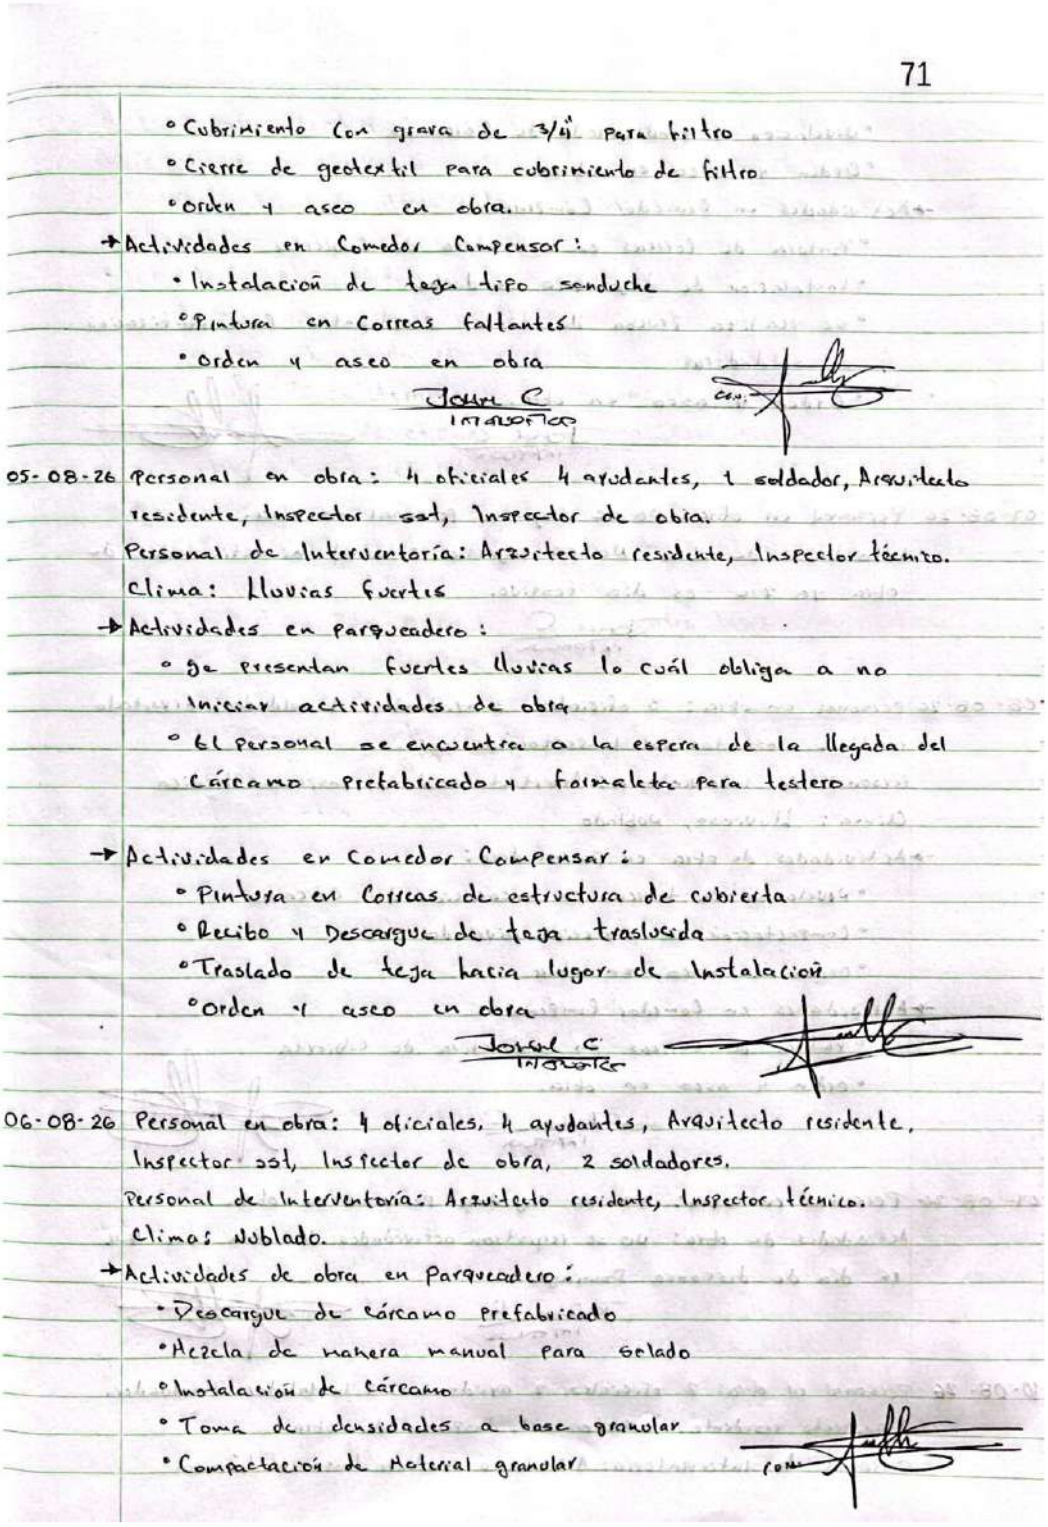

71

- Cubrimiento con grava de 3/4" para filtro
- Cierre de geotextil para cubrimiento de filtro
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de teja tipo sanduche
- Pintura en Correas faltantes
- Orden y aseo en obra

Jorge C. Interventor

05-08-26 Personal en obra: 4 oficiales 4 ayudantes, 1 soldador, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Lluvias fuertes

→ Actividades en Parqueadero:
- Se presentan fuertes lluvias lo cuál obliga a no iniciar actividades de obra
- El personal se encuentra a la espera de la llegada del Cárcamo Prefabricado y formaleta para testero

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Pintura en Correas de estructura de cubierta
- Recibo y Descargue de teja traslucida
- Traslado de teja hacia lugar de Instalación
- Orden y aseo en obra


Jorge C. Interventor

06-08-26 Personal en obra: 4 oficiales, 4 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra, 2 soldadores.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado.

→ Actividades de obra en Parqueadero:
- Descargue de cárcamo prefabricado
- Mezcla de manera manual para solado
- Instalación de cárcamo
- Toma de densidades a base granular
- Compactación de Material granular

Ilustración 65.Bitacora Colegio Miguel de Cervantes Saavedra

BITACORA DE OBRA BRASILIA

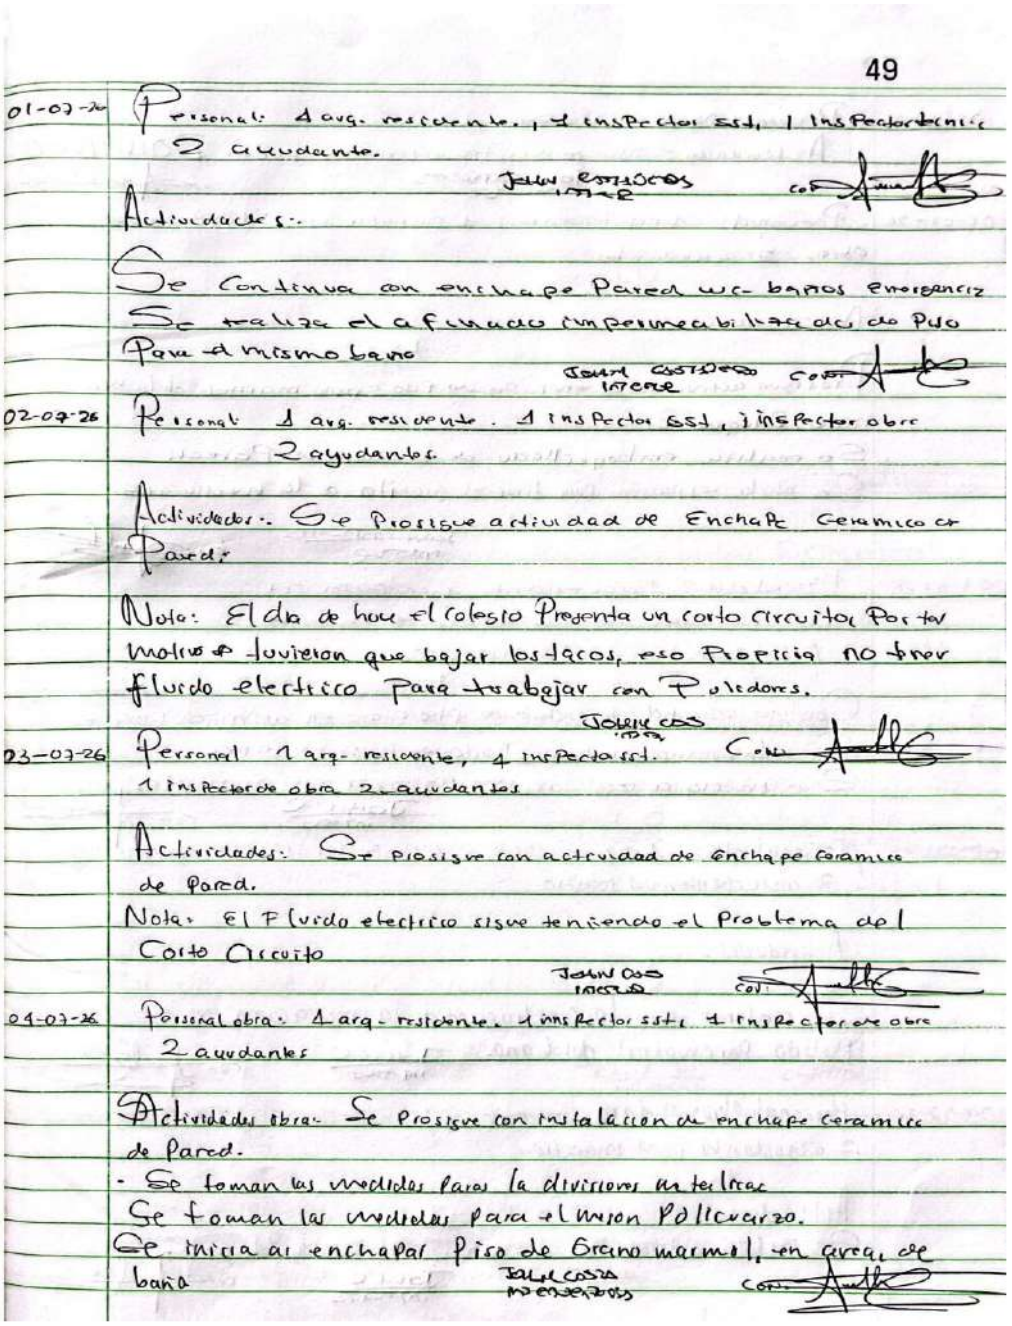

49

01-07-26 Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico 2 ayudantes.

JOHN CASTAÑEDA INTER

Actividades:

Se continua con enchape Pared wc- baños emergencia

Se realiza el aplicado impermeabilizante de piso para el mismo baño

JOHN CASTAÑEDA INTER

02-07-26 Personal 1 arq. residente. 1 inspector sst, 1 inspector obra 2 ayudantes.

Actividades: Se prosigue actividad de Enchape Ceramico en Pared.

Nota: El dia de hoy el colegio Presenta un corto circuito, por tal motivo tuvieron que bajar los tacos, eso Propicia no tener fluido electrico para trabajar con Poleadores.

JOHN CASTAÑEDA INTER

23-07-26 Personal 1 arq. residente, 4 inspector sst. 1 inspector de obra 2 ayudantes

Actividades: Se prosigue con actividad de Enchape Ceramico de Pared.

Nota: El Fluido electrico sigue teniendo el Problema del Corto Circuito


JOHN CASTAÑEDA INTER

04-07-26 Personal obra: 1 arq. residente. 1 inspector sst, 1 inspector de obra 2 ayudantes

Actividades obra: Se Prosigue con instalacion de enchape ceramico de Pared.

- Se toman las medidas para la divisiones en ladrillos
Se toman las medidas para el mesón Policuarzo.
Se inicia al enchapar Piso de Grano marmol, en area de baño

JOHN CASTAÑEDA INTER

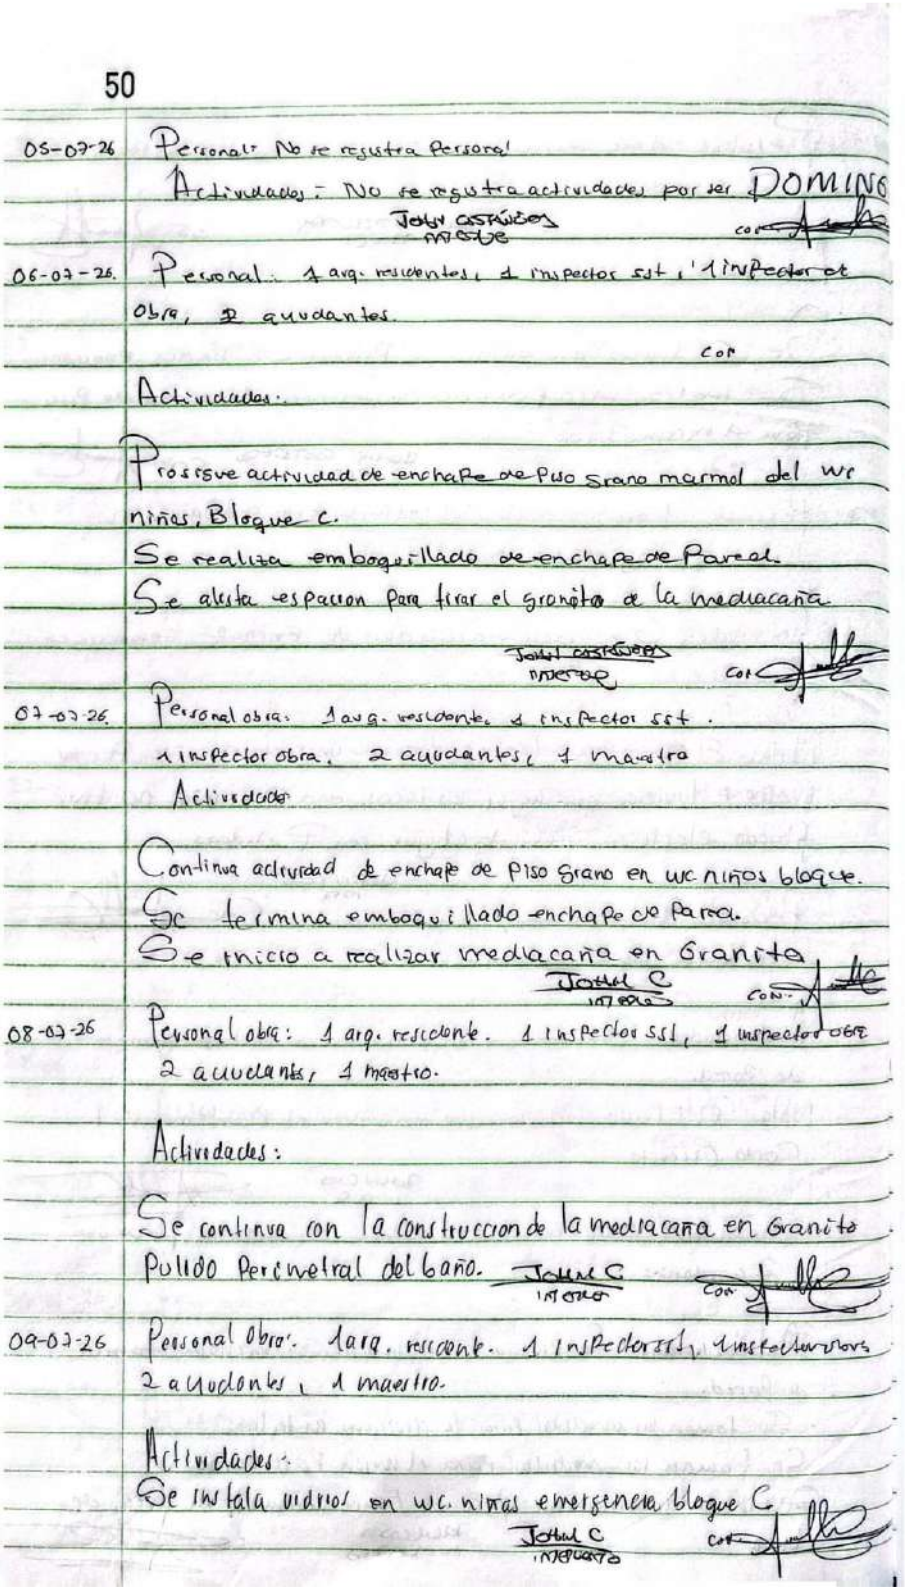

50

05-07-26 Personal: No se registra Personal

Actividades: No se registra actividades por ser DOMINGO

John Castiblanco Maestro con

06-07-26. Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector de obra, 2 ayudantes.

con

Actividades:

Prosigue actividad de enchape de Piso Grano marmol del wc niños, Bloque C.

Se realiza emboquillado de enchape de Pared.

Se alista espacion para fijar el granito de la mediacaña.

John Castiblanco Maestro con

07-07-26. Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst. 1 inspector obra, 2 ayudantes, 1 maestro

Actividades

Continua actividad de enchape de piso Grano en wc niños bloque.

Se termina emboquillado enchape de pared.

Se inicio a realizar mediacaña en Granito

John C Maestro con

08-07-26 Personal obra: 1 arq. residente. 1 inspector SST, 1 inspector obra 2 ayudantes, 1 maestro.

Actividades:

Se continua con la construccion de la mediacaña en Granito Pulido Perimetral del baño.

John C Maestro con

09-07-26 Personal Obra: 1arq. residente. 1 inspector SST, 1 inspector obra 2 ayudantes, 1 maestro.

Actividades:

Se instala vidrios en wc. niñas emergencia bloque C

John C Maestro con

10-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST 2 ayudantes, 1 maestro. Actividades: Se remate construccion de mediacaña Perimetral. Se instalan Sanitarios en wc. ninas emergencia Jorge C INGENIERO CON:
11-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST. 2 ayudantes, 1 maestro Actividades: Se inicia el pulido del Piso y Mediacaña en wc. ninas Emergencia. Jorge C INGENIERO CON:
12-07-26	Personal obra: No se registra Personal Actividades: No se desarrollan actividades por ser DOMINGO.
13-07-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST 2 ayudantes, 1 maestro. Actividades: Se continua pulido de Piso y Mediacaña. . En taller se continua Fabricacion de divisiones en acero inoxidable. y construccion de lavamanos en Policuarzo Jorge C INGENIERO CON:
14-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST 2 ayudantes, 1 maestro Actividades: • Se termina el Pulido del Piso. • En taller continua Fabricacion divisiones en acero inoxidable. y del lavamanos Policuarzo. Jorge C INGENIERO CON:
15-07-26	Personal obra: 1 arq. residente. 1 inspector obra, 1 inspector SST. 2 ayudantes, 1 maestro. • Se aplica tellador en Piso Grano marmol • Llegan Puerta Pendiente. de wc ninas 2 Piso contractual Jorge C INGENIERO CON:

52

16-07-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector SST x 1, 1 inspector de obra; 2 ayudantes
Personal de interventor: Ing Residente x 1, Inspector x 1

Actividades:
Se realiza, retoques y remates en la puerta instalada de baño niñas 2 Piso bloque bachillerato.

Jhon C INTERVENTOR CON:

17-07-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector SST x 1, 1 inspector de obra; 2 ayudantes.
Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector tecn

Actividades:

Se realiza el retiro de las 12 ventanas ubicadas en l baños de bachillerato y son reemplazadas por ventan tipo persiana en aluminio.

Jhon C INTERVENTOR

18-07-26 Personal obra: NO se registra Personal
Actividades: NO se registran actividades, se continua fabricacion de divisiones en acero y meson en Policuarzo.

19-07-26 Personal: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades por se Domingo.

20-07-26 Personal: No se registra Personal
Actividades: No se registran Por ser Festivo.

21-07-26 Personal obra: 1 arq. residentes, 1 inspector sst, 1 inspector de obra, 2 ayudantes.

Actividades: Llegan a obra, divisiones en acero inoxidable para el wc. niñas bloque C.

Jhon C INTERVENTOR CON:

22-07-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 Prof SST, 1 inspector
2 auxiliar.

Se inicia con la instalacion de la divisiones en acero inoxidable en wc. niñas bloque C.

Con:

23-07-26 Personal obra: 1 arq. residente. 1 Prof SST, 1 inspector.
2 auxiliares

Se Prosigue actividad de instalacion de divisiones en acero inoxidable.

Con:

24-07-26 Personal obra: 1 arq. residente. 1 Prof SST, 1 inspector.
2 auxiliares.

Actividades: Se Prosigue actividad de instalacion de divisiones en acero inoxidable.
- Se inicia la instalacion de espejos biselados.

25-07-26 Personal obra: 1 arq. residente 1 Prof SST, 1 inspector
2 auxiliares
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector tecnico


Actividades de obra:
Llega a obra Meson en Policuarzo para el wc. baños niñas bloque C.

Con:

26-07-26 Personal obra: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades por ser DOMINGO

27-07-26 Personal de obra: 1 arq. residente, 1 inspector SST, 1 inspector obra
2 auxiliares
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector

Actividades:
Se instala Meson Policuarzo.

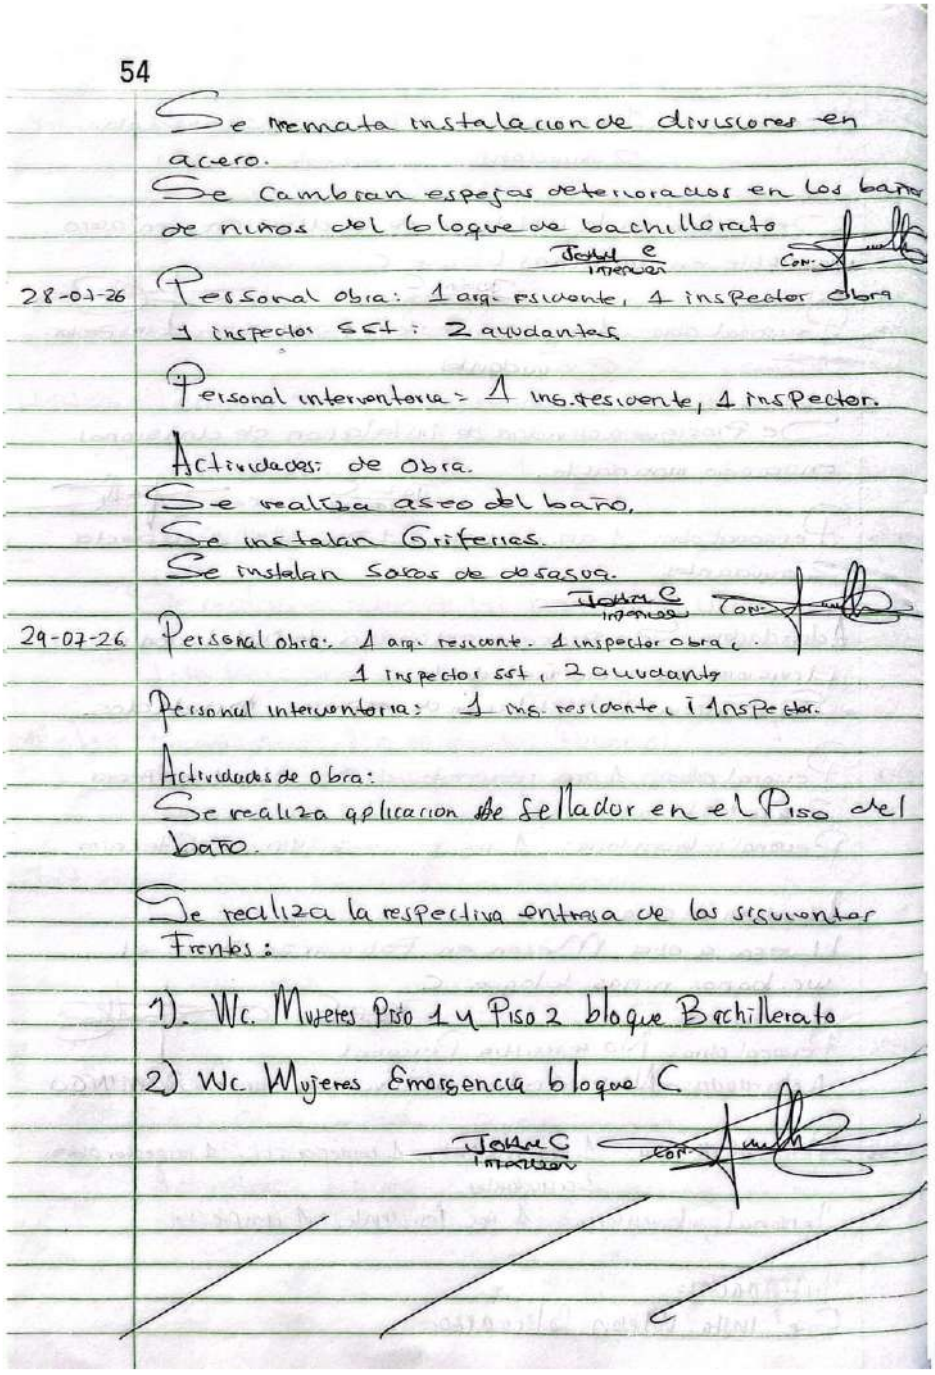

54

Se remata instalacion de divisiones en acero.
Se cambian espejos deteriorados en los baños de niños del bloque de bachillerato

28-07-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra 1 inspector SST: 2 ayudantes

Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades: de Obra.
Se realiza aseo del baño.
Se instalan Griferias.
Se instalan Sabas de de sasuq.

29-07-26 Personal obra: 1 arq. residente. 1 inspector obra, 1 inspector SST, 2 ayudante

Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector.

Actividades de obra:
Se realiza aplicacion de sellador en el Piso del baño.


Se realiza la respectiva entrega de los siguientes Frentes:

1). Wc. Mujeres Piso 1 y Piso 2 bloque Bachillerato

2) Wc. Mujeres Emergencia bloque C.

Ilustración 66. Bitácora Colegio Brasilia

BITACORA DE OBRA JOSE JAIME ROJAS

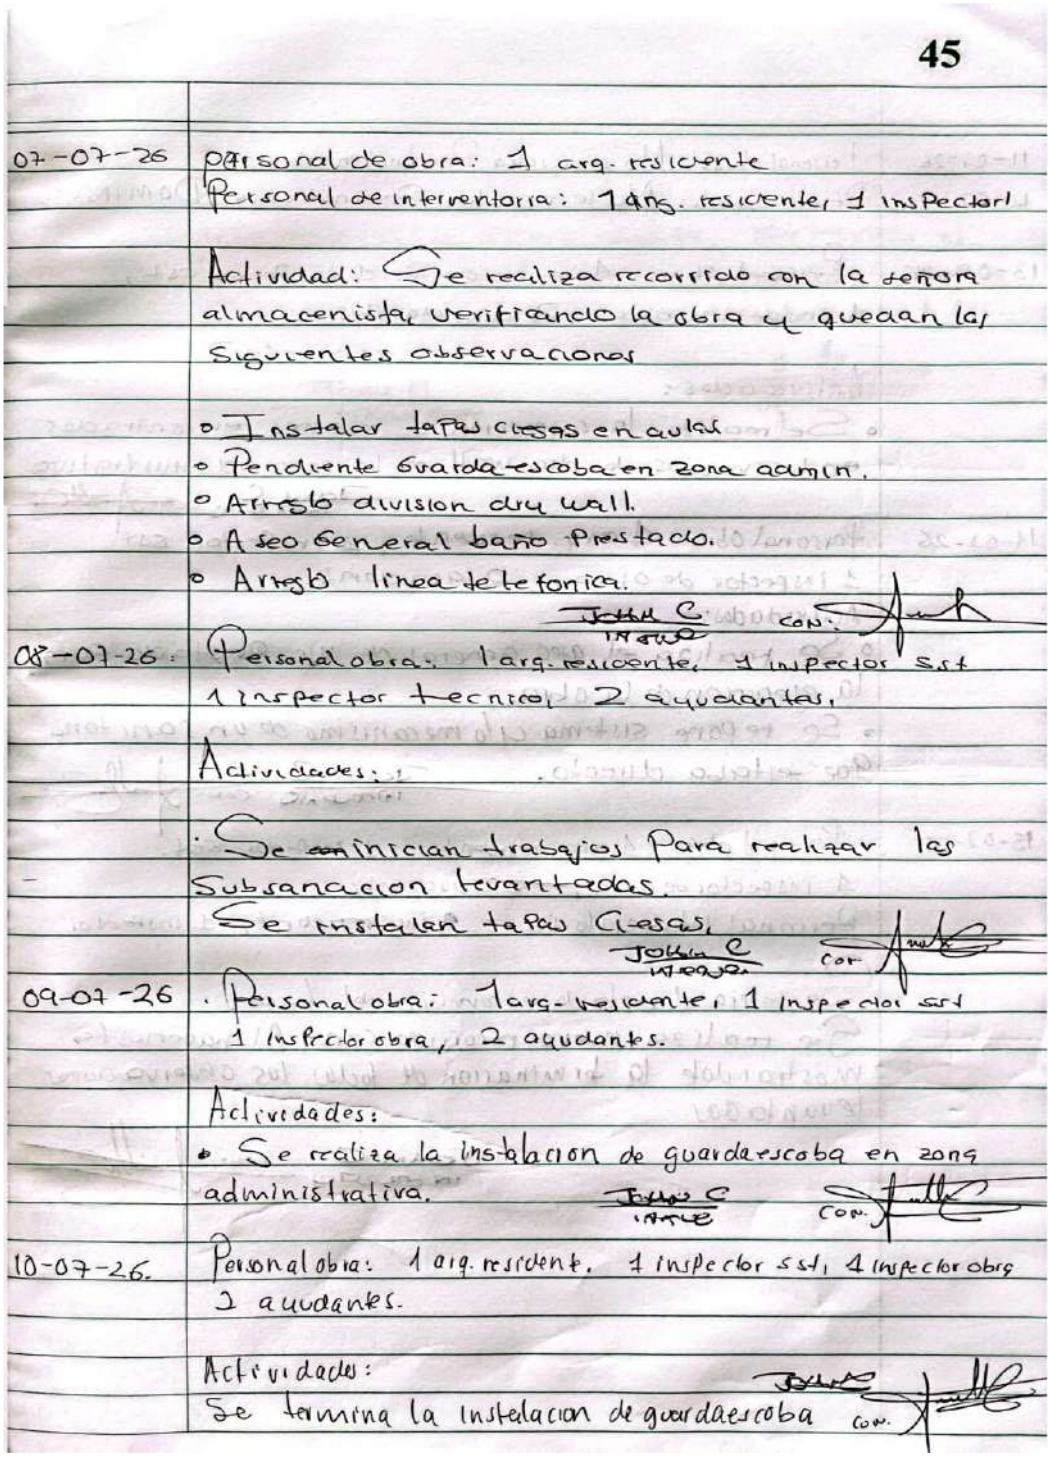


45

07-07-26	Personal de obra: 1 arq. residente Personal de interventoria: 1 arq. residente, 1 inspector Actividad: Se realiza recorrido con la señora almacenista, verificando la obra y quedan las siguientes observaciones • Instalar tapas cisgas en aulas • Pendiente guarda-escoba en zona admin. • Arreglo division dry wall. • Aseo general baño prestado. • Arreglo linea telefonica. Jaime C. INTVR. CON:
08-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst 1 inspector tecnico, 2 ayudantes. Actividades: • Se inician trabajos para realizar las subsanacion levantadas. Se instalan tapas Cisgas. Jaime C. INTVR. CON:
09-07-26	• Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst 1 inspector obra, 2 ayudantes. Actividades: • Se realiza la instalacion de guardaescoba en zona administrativa. Jaime C. INTVR. CON:
10-07-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra 2 ayudantes. Actividades: Se termina la instalacion de guardaescoba CON:

07-07-26	Personal de obra: 1 arq. residente Personal de interventoria: 1 arq. residente, 1 inspector Actividad: Se realiza recorrido con la señora almacenista, verificando la obra y quedan las siguientes observaciones • Instalar tapas ciegas en aulas • Pendiente guarda escoba en zona admin. • Arreglo division dry wall. • Aseo general baño prestado. • Arreglo linea telefonica. INTVE CON:
08-07-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst 1 inspector tecnico, 2 ayudantes. Actividades: . Se ~~con~~ inician trabajos para realizar las subsanacion levantadas. Se instalan tapas ciegas. INTVE CON:
09-07-26	. Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst 1 inspector obra, 2 ayudantes. Actividades: • Se realiza la instalacion de guardaescoba en zona administrativa. INTVE CON:
10-07-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra 1 ayudantes. Actividades: Se termina la instalacion de guardaescoba CON:

11-07-26.	Personal obra: No se registra Personal en obra
12-07-26	Personal obra: No se registra Personal obra DOMINGO.
13-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra, 2 ayudantes. Actividades: • Se realiza la correccion a resanes encontrados en los muros de dry wall de la zona administrativa JOHN C INTERVENTO CONT
14-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst 1 inspector de obra, 2 ayudante. Actividades: • Se realiza el aseo general de WC Prestado para la ejecucion de la obra. • Se repone sistema y/o mecanismo de un sanitario que estaba directo. JOHN C INTERVENTO CONT
15-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst. 1 inspector de obra, 2 ayudantes Personal interventoria: 1 ins. residente, 1 inspector Se retira el resto de escombro del lugar. Se realiza nuevo recorrido con Almacenista mostrandole la terminacion de todas las observaciones levantadas JOHN C INTERVENTO CONT

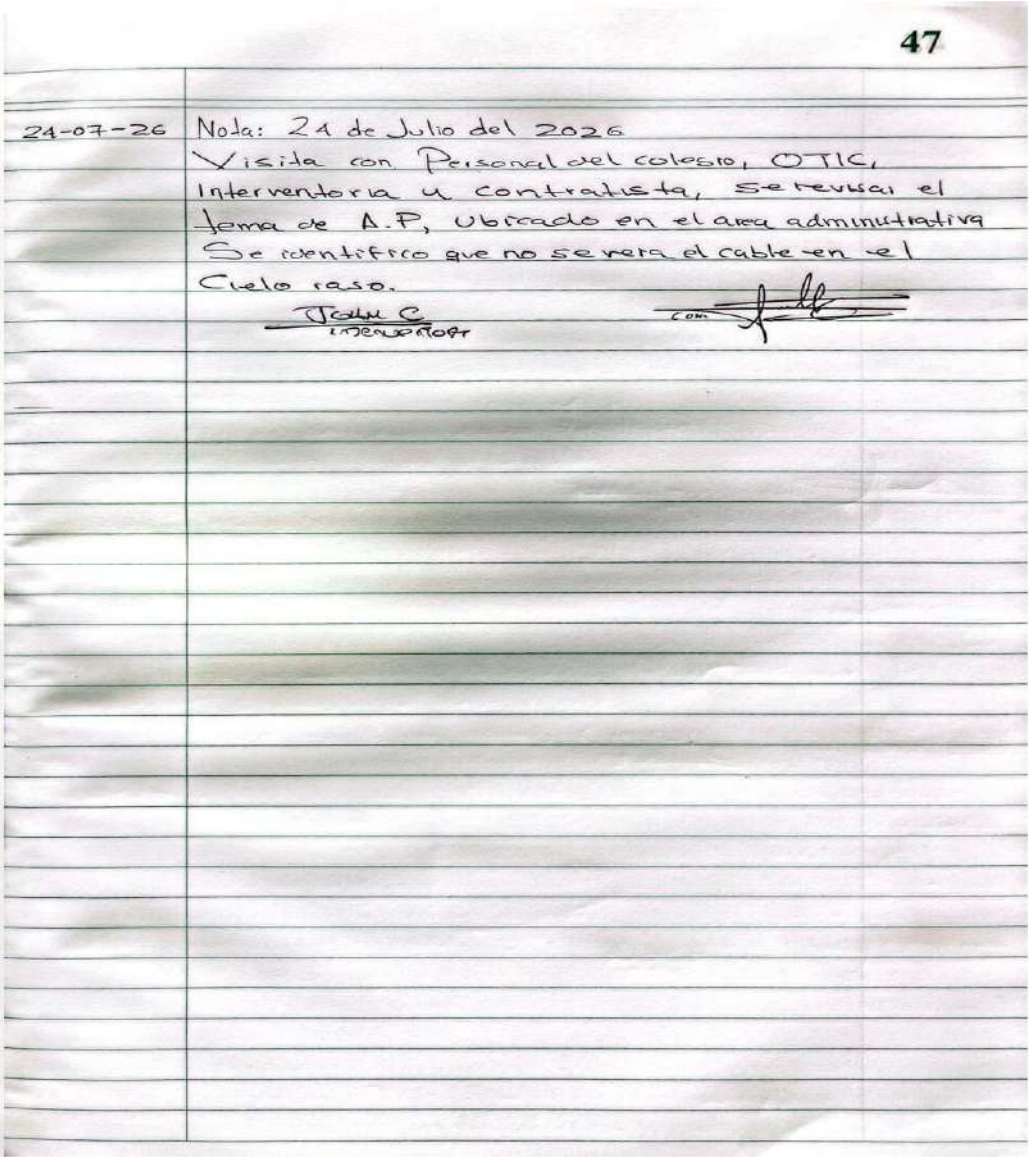


47

21-07-26	Nota: 21 de Julio del 2026 Visita con Personal del colegio, OTIC, Interventoria y contratista, se revisa el tema de A.P, ubicado en el area administrativa Se identifico que no se vera el cable en el Cielo raso.

Ilustración 67. Bitácora Colegio José Jaime Rojas

BITACORA DE BICENTENARIO

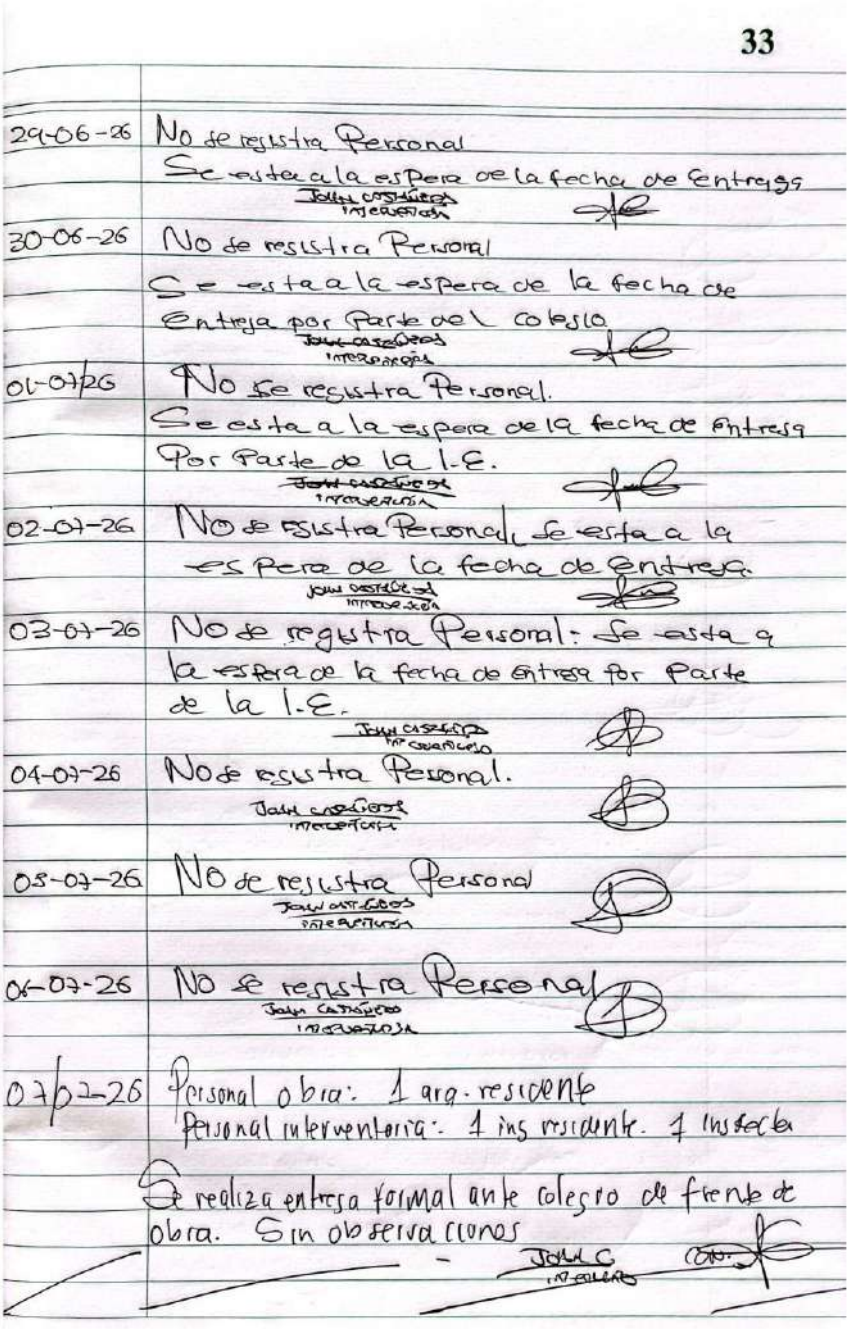


33

29-06-26	No se registra Personal Se esta a la espera de la fecha de Entrega
30-06-26	No se registra Personal Se esta a la espera de la fecha de Entrega por Parte del Colegio
01-07-26	No se registra Personal. Se esta a la espera de la fecha de Entrega Por Parte de la I.E.
02-07-26	No se registra Personal, se esta a la espera de la fecha de entrega.
03-07-26	No se registra Personal: se esta a la espera de la fecha de entrega por Parte de la I.E.
04-07-26	No se registra Personal.
05-07-26	No se registra Personal
06-07-26	No se registra Personal
07-07-26	Personal obra: 1 arq. residente Personal interventoria: 1 ing residente. 1 Inspector Se realiza entrega formal ante colegio de frente de obra. Sin observaciones

Ilustración 68. Bitácora Colegio Bicentenario.

BITACORA RODRIGO LARA BONILLA

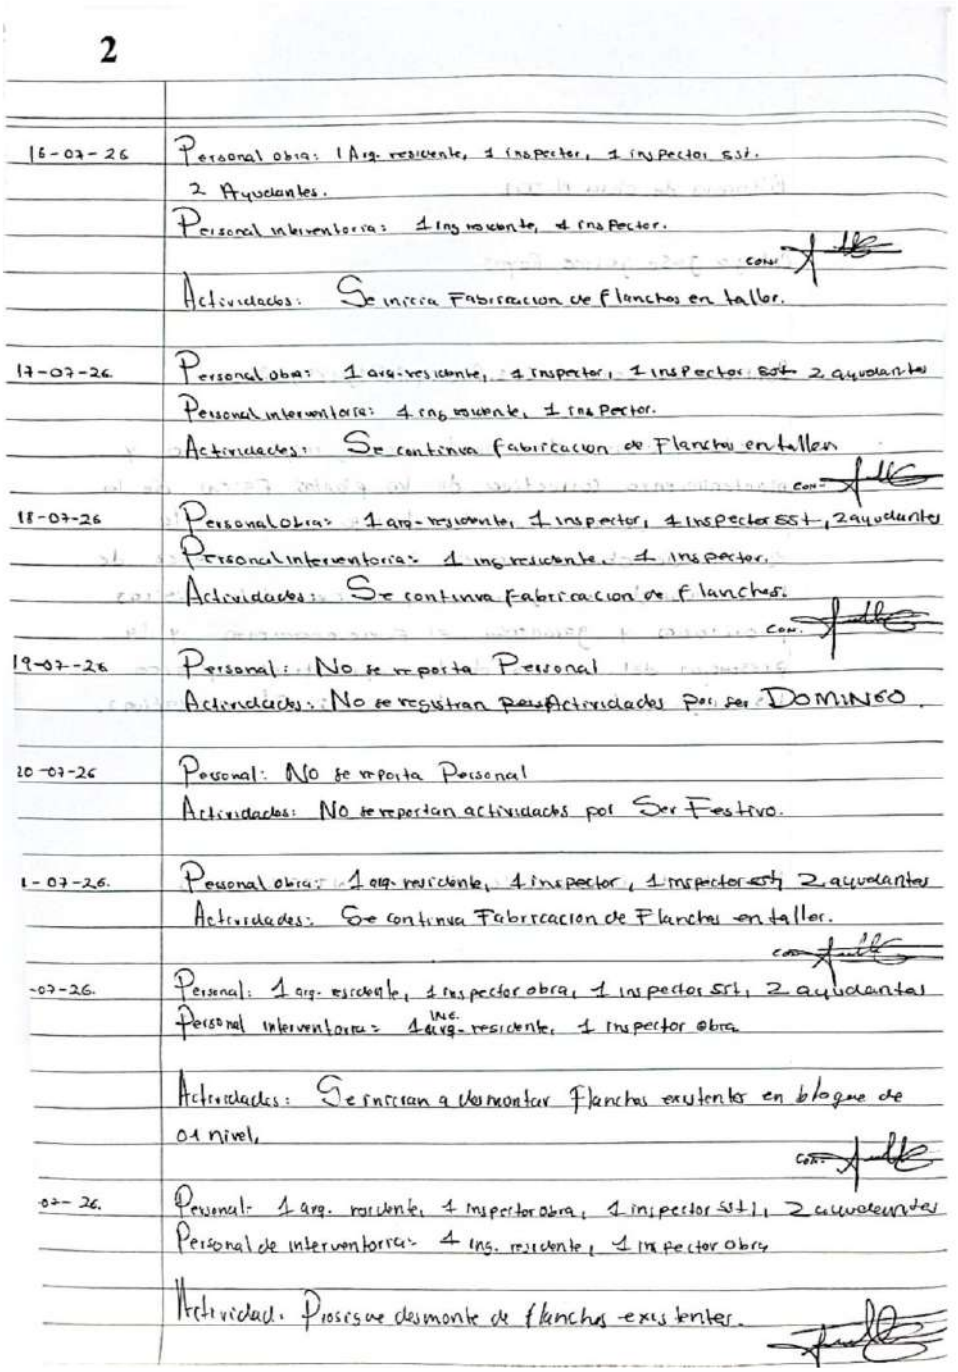


2

16-07-26	Personal obra: 1 Arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST. 2 Ayudantes.
	Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.
	Actividades: Se inicia Fabricacion de Planchas en taller.
17-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST 2 ayudantes
	Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.
	Actividades: Se continua fabricacion de Planchas en taller
18-07-26	Personal Obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 2 ayudantes
	Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector.
	Actividades: Se continua fabricacion de Planchas.
19-07-26	Personal: No se reporta Personal
	Actividades: No se registran ~~Personal~~ Actividades por ser DOMINGO.
20-07-26	Personal: No se reporta Personal
	Actividades: No se reportan actividades por Ser Festivo.
21-07-26.	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 2 ayudantes
	Actividades: Se continua Fabricacion de Planchas en taller.
22-07-26.	Personal: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST, 2 ayudantes
	Personal interventoria: 1 ing. arq. residente, 1 inspector obra
	Actividades: Se inician a desmontar Planchas existentes en bloque de 01 nivel,
23-07-26.	Personal: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST, 2 ayudantes
	Personal de interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector obra
	Actividad. Prosigue desmonte de Planchas existentes.

24-07-26	Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes y Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector. Actividades: Se inicia a instalar 7 lanchas en zona cloaca Previamente se desmontaron flanchas existentes. CON.
25-07-26	Personal obra: 1 arqi residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudante Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector Actividades: Se continua a instalar flanchas de desarrollo 1.00 natural en bloque de un nivel de la LED. CON.
26-07-26.	Personal: No se registra Personal Actividades No se desarrollan actividades por ser DOMINGO. CON
27-07-26	Personal: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspecta sst, 2 ayudantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades: Se prosigue con instalacion de flanches. CON.
28-07-26	Personal: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades. Se sigue desmontando flanchas de inmediato instalando mas nuevo 7 lanchas. CON.
29-07-26	Personal obra: 1 arq residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes. Personal interventoria: 1 ing residente. 1 inspector. Actividades: Prosigue actividades de instalacion de flanche Metalica. Con.

30-07-26	Personal Obra: 1 arq-residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 auxiliantes Personal interventoria: 1 ing residente, 1 inspector. Actividades: Se Prosigue actividad de instalacion de Plancha Con
31-07-26	Personal obra: 1 arq-residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 auxiliantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades: Se Prosigue con la actividad de instalacion de Plancha. Con
01-08-26.	Personal obra: 1 arq-residente, 1 inspector sst, 1 inspector, 2 auxiliantes Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector Actividades: Se remata instalacion de Plancha en bloque 01, Se Inicia a desmontar Plancha en bloque 02. Con
02-08-26	Personal: No se registra Personal Personal Interventoria: N/A. Actividades: No se desarrollan actividades por ser Domingo.
03-08-26	Personal de Obra: 1 arq-residente, 1 inspector sst, 1 inspector, 2 auxiliantes Personal Interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades: Se Prosigue actividad en bloque 02, desmontando Plancha de bloque. Con
04-08-26	Personal Obra: 1 arq-residente, 1 inspector sst, 1 inspector, 2 auxiliantes Personal de interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector. Actividades: Se instalan Planchas en bloque 02 Con

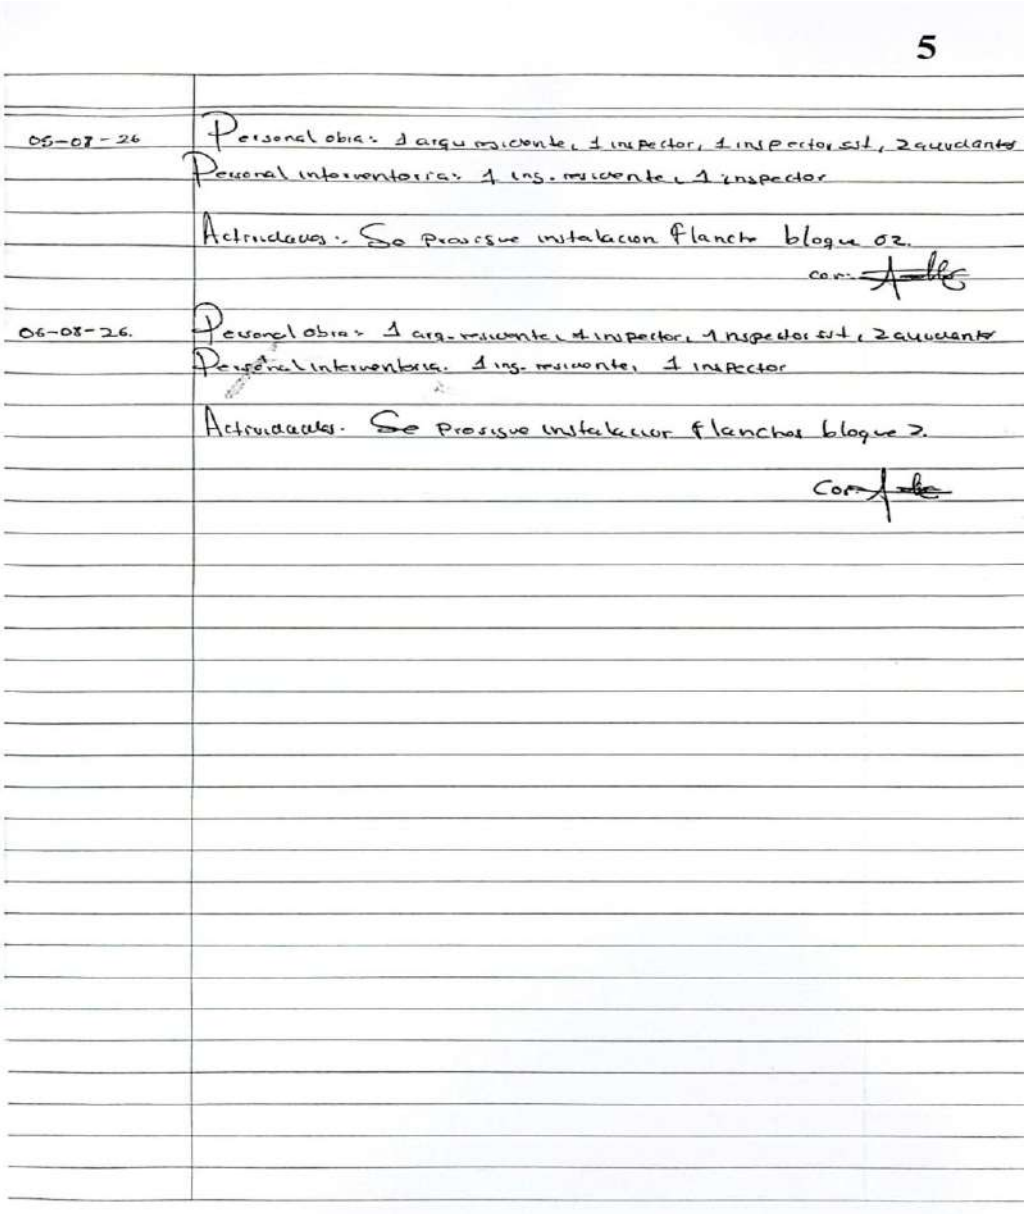

5

05-08-26 Personal obra: 1 arq residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes
Personal interventoria: 1 ing. residente, 1 inspector

Actividades: Se prosigue instalacion planchas bloque 02.


06-08-26. Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector, 1 inspector sst, 2 ayudantes
Personal interventoria. 1 ing. residente, 1 inspector

Actividades. Se prosigue instalacion planchas bloque 2.

Ilustración 69. Bitácora Colegio Rodrigo Lara Bonilla

13. PROGRAMACIONES DE OBRA


PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO JOSE JAIME ROJAS

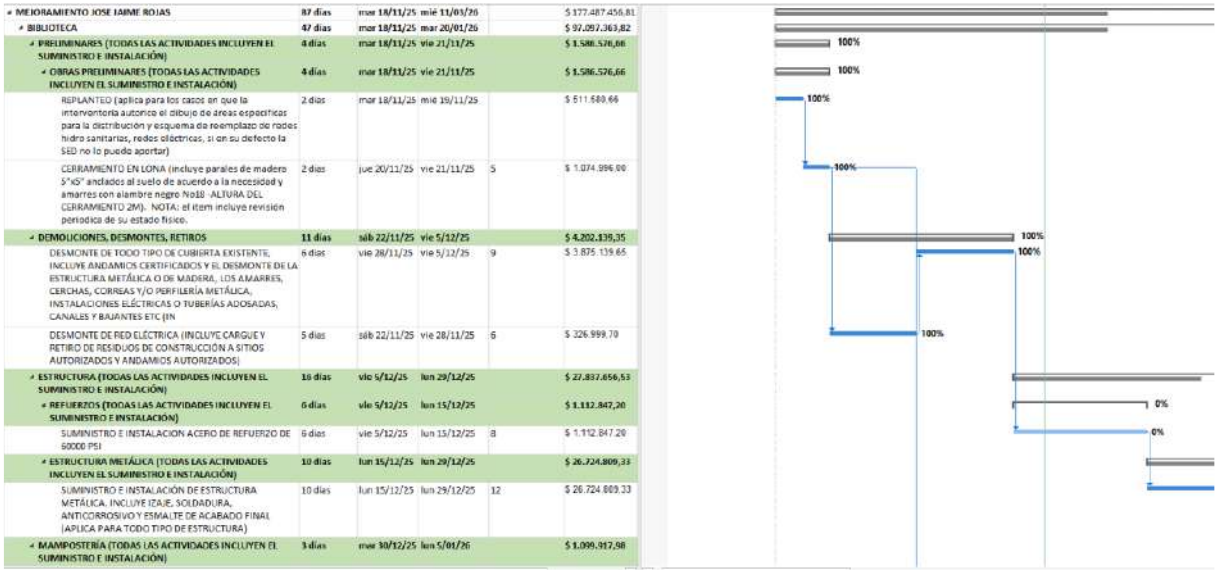

MEJORAMIENTO JOSE JAIME ROJAS	87 días	mar 18/11/25	mié 11/01/26			$ 177.487.456,81
BIBLIOTECA	47 días	mar 18/11/25	mar 20/01/26			$ 97.097.363,82
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25			$ 1.586.576,66
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25			$ 1.586.576,66
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25			$ 611.680,66
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	5		$ 1.074.896,00
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	11 días	sáb 22/11/25	vie 5/12/25			$ 4.202.139,35
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	6 días	vie 28/11/25	vie 5/12/25	9		$ 3.875.139,65
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25	6		$ 326.999,70
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	18 días	vie 5/12/25	lun 29/12/25			$ 27.837.656,53
REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25			$ 1.112.847,20
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	6 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25	8		$ 1.112.847,20
ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	lun 15/12/25	lun 29/12/25			$ 26.724.809,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	10 días	lun 15/12/25	lun 29/12/25	12		$ 26.724.809,33
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26			$ 1.099.917,98

Ilustración 70. Programación de obra

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO DON BOSCO

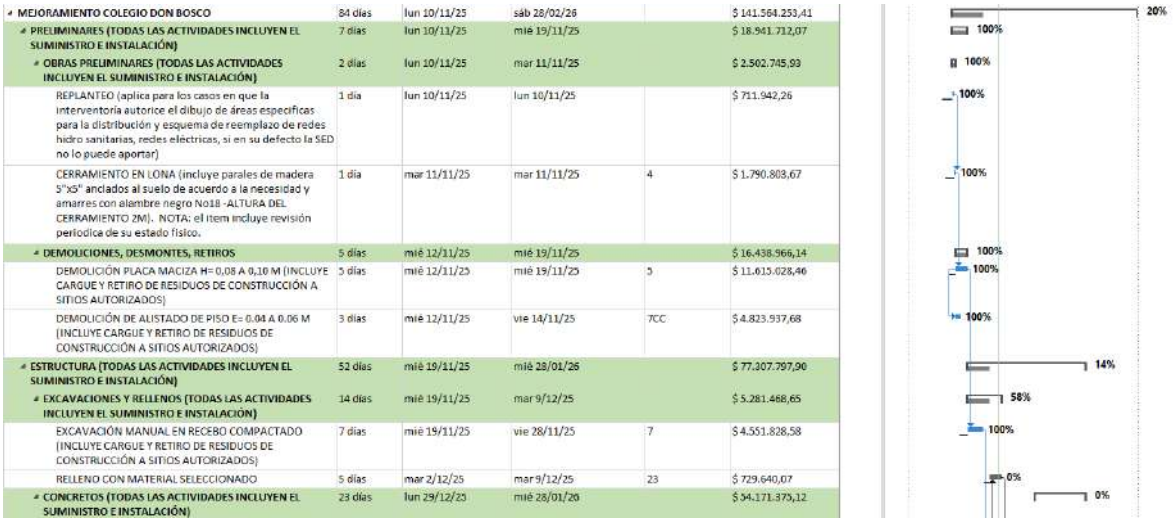

MEJORAMIENTO COLEGIO DON BOSCO	84 días	lun 10/11/25	sáb 28/02/26			$ 141.564.253,41
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25			$ 18.941.712,07
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25			$ 2.502.745,93
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25			$ 711.942,26
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	4		$ 1.790.803,67
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	5 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25			$ 16.438.966,14
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	5		$ 11.615.028,46
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	7CC		$ 4.823.937,68
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	52 días	mié 19/11/25	mié 28/01/26			$ 77.307.797,90
EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	mié 19/11/25	mar 9/12/25			$ 5.281.468,65
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	mié 19/11/25	vie 28/11/25	7		$ 4.551.828,58
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	5 días	mar 2/12/25	mar 9/12/25	23		$ 729.640,07
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	23 días	lun 29/12/25	mié 28/01/26			$ 54.171.375,12

Ilustración 71. Programación de obra

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO BRASILIA

MEJORAMIENTO COLEGIO BRASILIA	74 días	lun 15/12/25	vie 20/03/26	
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	17 días	lun 15/12/25	mié 7/01/26	
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	2 días	mié 17/12/25	jue 18/12/25	4
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	13 días	vie 19/12/25	mié 7/01/26	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	5
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	5
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	4 días	mié 31/12/25	mié 7/01/26	10
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	4 días	vie 26/12/25	mié 31/12/25	11
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	13CC

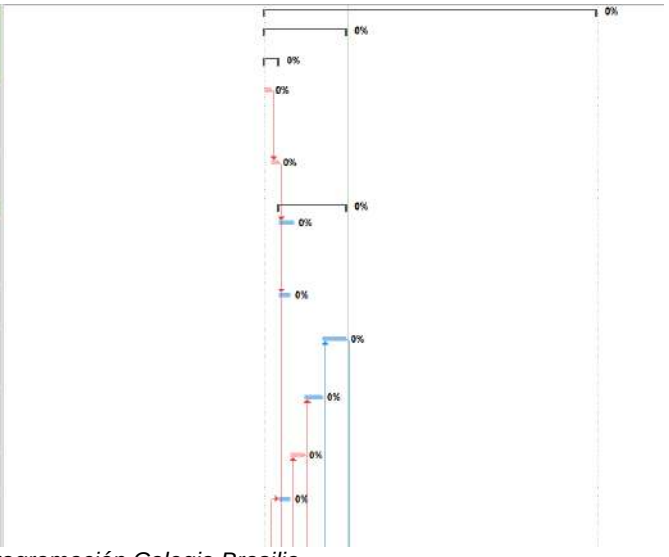


Ilustración 72. Programación Colegio Brasilia

PROGRAMACION DE OBRA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

MEJORAMIENTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	84,13 días	mar 13/01/26	vie 1/05/26		$ 466.570.899,42
OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13 días	mar 13/01/26	mié 28/01/26		$ 71.062.989,89
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	24 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26		$ 77.650.713,11
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26	7	$ 12.052.676,49
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	5 días	jue 29/01/26	jue 5/02/26	30	$ 2.843.646,71
CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26		$ 37.756.261,18
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26	17FF	$ 37.756.261,18
ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26		$ 2.894.359,90
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	10 días	sáb 7/02/26	vie 20/02/26	19	$ 2.894.359,90
REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2 días	jue 5/02/26	sáb 7/02/26		$ 22.103.768,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	2 días	jue 5/02/26	sáb 7/02/26	25	$ 22.103.768,83
ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20 días	sáb 31/01/26	mié 25/02/26		$ 102.179.764,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	20 días	sáb 31/01/26	mié 25/02/26	8	$ 102.179.764,76
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26		$ 9.291.582,49

Ilustración 73. Programación Colegio Miguel de Cervantes


ADICIONES POR COLEGIO

1. COLEGIO DON BOSCO I - SEDE A – LA JOYA (CPF - 1973)

Alcance Físico:

- Adecuación Piso CHIP en área de juegos infantiles
- Suministro e instalación de motobombas

Áreas de Intervención:

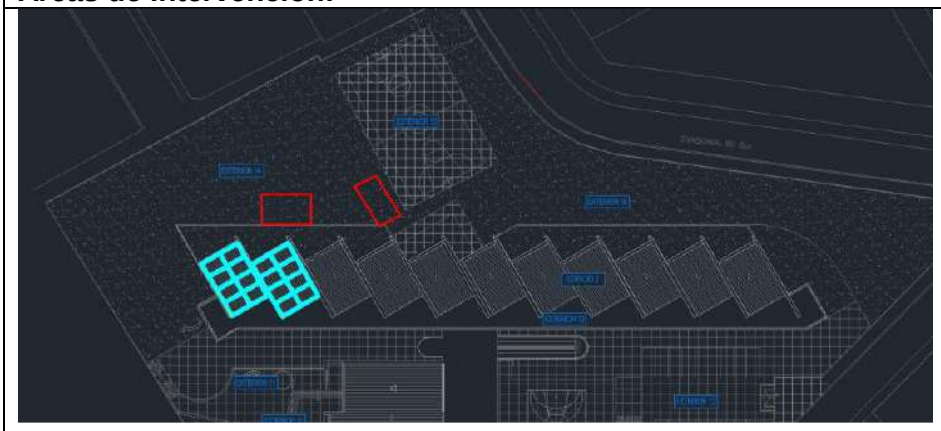

Registro Fotográfico:








2. COLEGIO JOSE JAIME ROJAS - SEDE A – NACIONES UNIDAS II (CPF - 1934)

Alcance Físico:

-Cambio de cubierta y mejoramiento eléctrico en bloque de aulas

Áreas de Intervención:

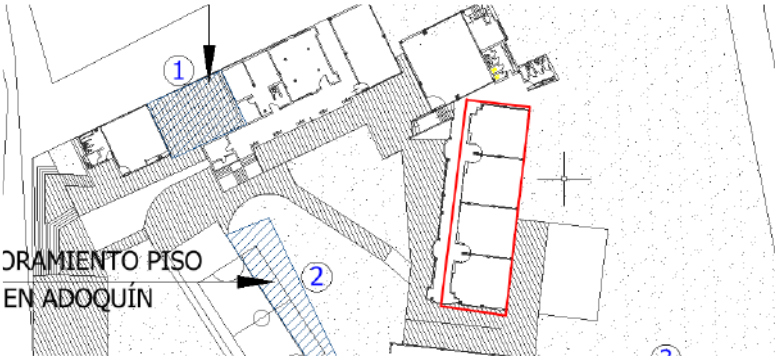


Registro Fotográfico:






PROGRAMACION ADICION COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

MEJORAMIENTO JOSE JAIME ROJAS	165 días	mar 18/11/25	vie 19/06/26		$ 361.768.066,15
BIBLIOTECA	47 días	mar 18/11/25	mar 20/01/26		$ 97.097.363,82
ORIENTACION	54 días	mié 31/12/25	mié 11/03/26		$ 80.390.092,99
AULAS	48 días	lun 20/04/26	vie 19/06/26		$ 184.280.609,34
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	lun 20/04/26	vie 24/04/26		$ 1.947.821,85
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	16 días	vie 24/04/26	jue 14/05/26	86	$ 13.306.807,93
ESTRUCTURA METALICA	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26		$ 64.331.943,49
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26	95	$ 64.331.943,49
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26		$ 10.699.740,00
PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	lun 8/06/26	vie 12/06/26		$ 10.044.708,65
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	11 días	vie 22/05/26	vie 5/06/26		$ 81.456.882,70
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	44 días	vie 24/04/26	vie 19/06/26		$ 2.492.704,72
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	5 días	vie 12/06/26	vie 19/06/26	110;106	$ 982.466,68
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	2 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	88	$ 1.510.238,04

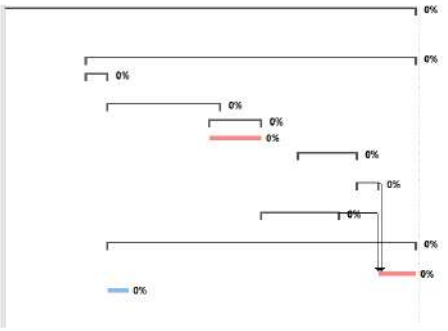

PROGRAMACION ADICION COLEGIO DON BOSCO

COLEGIO DON BOSCO	173 días	lun 13/11/25	sáb 29/08/26		$ 331.862.659,40
MEJORAMIENTO COLEGIO DON BOSCO	81 días	lun 13/11/25	sáb 21/02/26		$ 141.566.253,41
ADICIONALES	58 días	jue 9/04/26	sáb 29/08/26		$ 190.298.405,99
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4 días	jue 9/04/26	mar 14/04/26		$ 670.818,00
ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	21 días	mar 14/04/26	mié 13/05/26		$ 5.716.048,28
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26		$ 322.405,42
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20 días	mié 13/05/26	lun 8/06/26		$ 94.464.116,11
ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	29 días	mié 13/05/26	lun 8/06/26		$ 94.464.116,11
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	10 días	mié 13/05/26	mar 26/05/26	43	$ 8.220.194,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS RUNDABLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	10 días	mar 26/05/26	lun 8/06/26	51	$ 88.244.121,65
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	54 días	mar 14/04/26	sáb 29/08/26		$ 85.119.217,22
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL E	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	36	$ 3.424.438,11
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	2 días	lun 8/06/26	mié 10/06/26	48	$ 880.969,98
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Dúplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS CJP 4H, CON TANQUE HIDRONEUMATICO Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBER	3 días	mié 17/06/26	sáb 29/08/26	52FF+30 días	$ 85.014.568,73

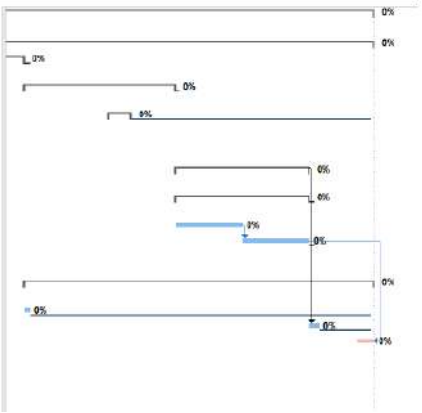

ADICIONES 2 POR COLEGIO

1. Colegio **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - CPF 540**

Alcance Físico:

- Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina

Áreas de Intervención:



Registro Fotográfico:








2. Colegio **IED PARAISO MIRADOR SEDE D- CPF 1982**

Alcance Físico:

- Adecuación y mejoramiento cerramiento perimetral

Áreas de Intervención:

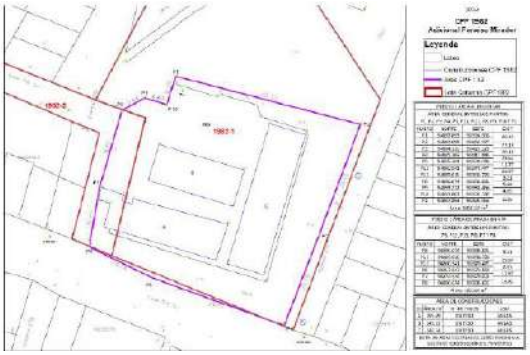

Registro Fotográfico:






3. Colegio **IED RODRIGO LARA BONILLA SEDE B – CPF 1921**

Alcance Físico:

- Mantenimiento flanches cubierta
-Tratamiento de humedades en aulas y batería de baño primer piso

Áreas de Intervención:

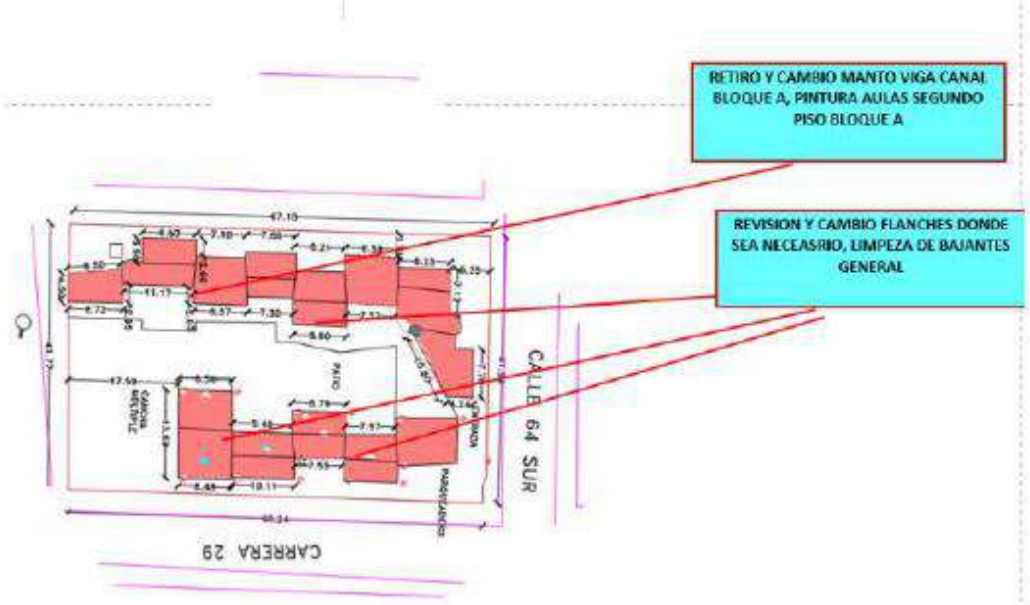


Registro Fotográfico:







PROGRAMACION ADICION COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

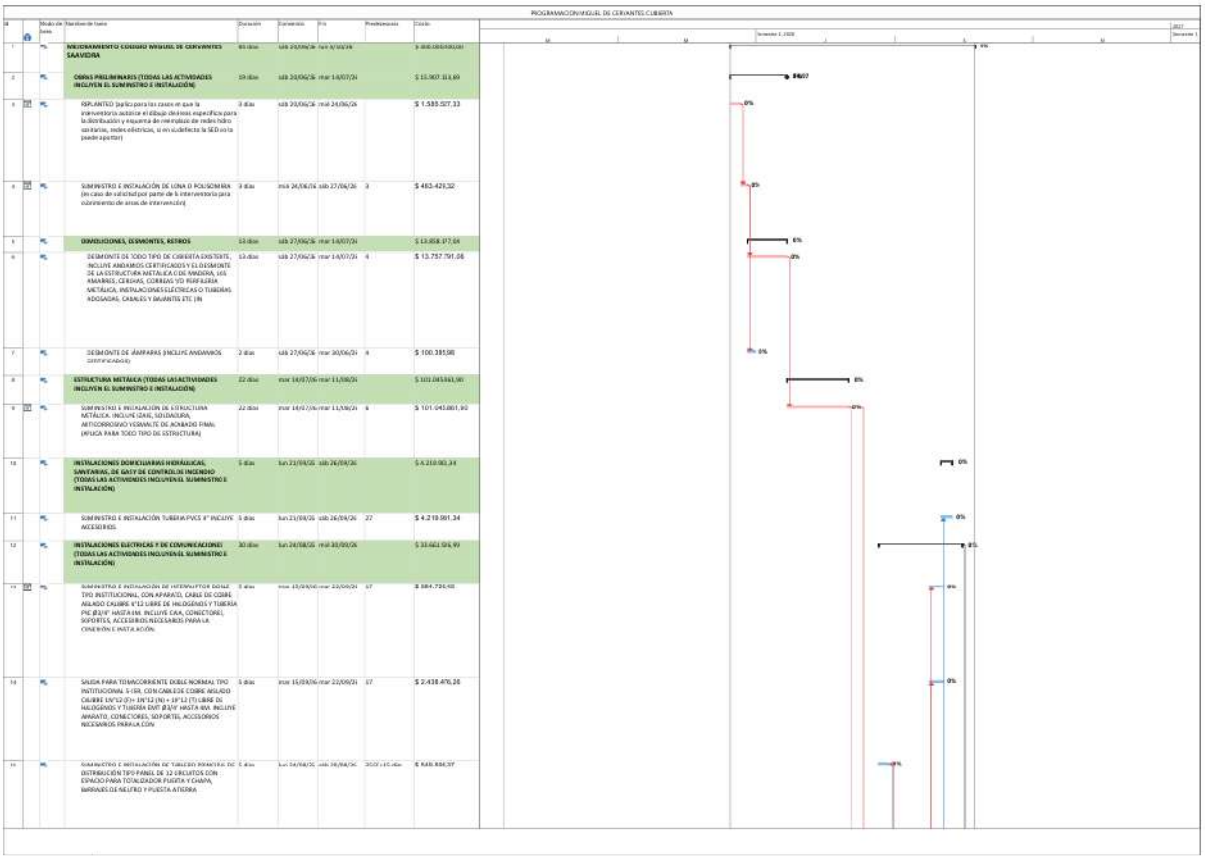


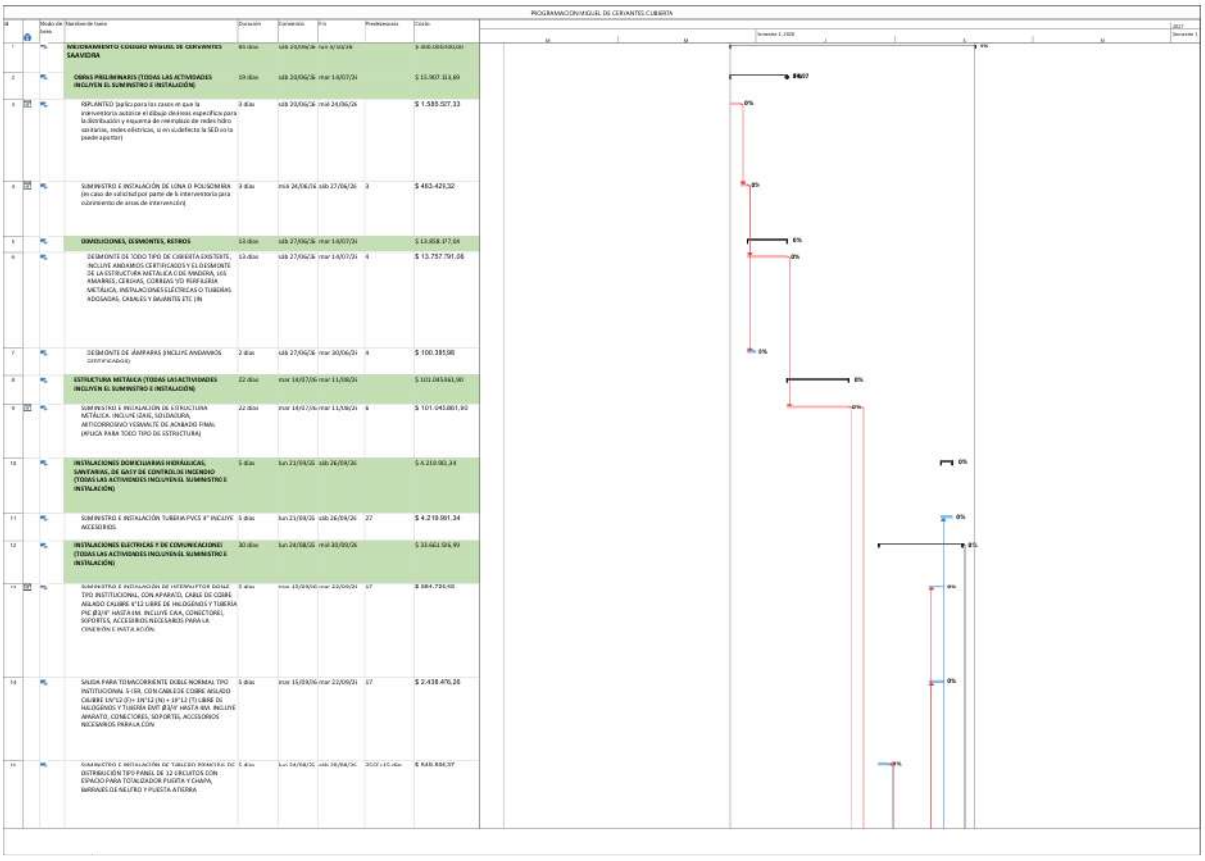

PROGRAMACION ADICION COLEGIO PARAISO MIRADOR

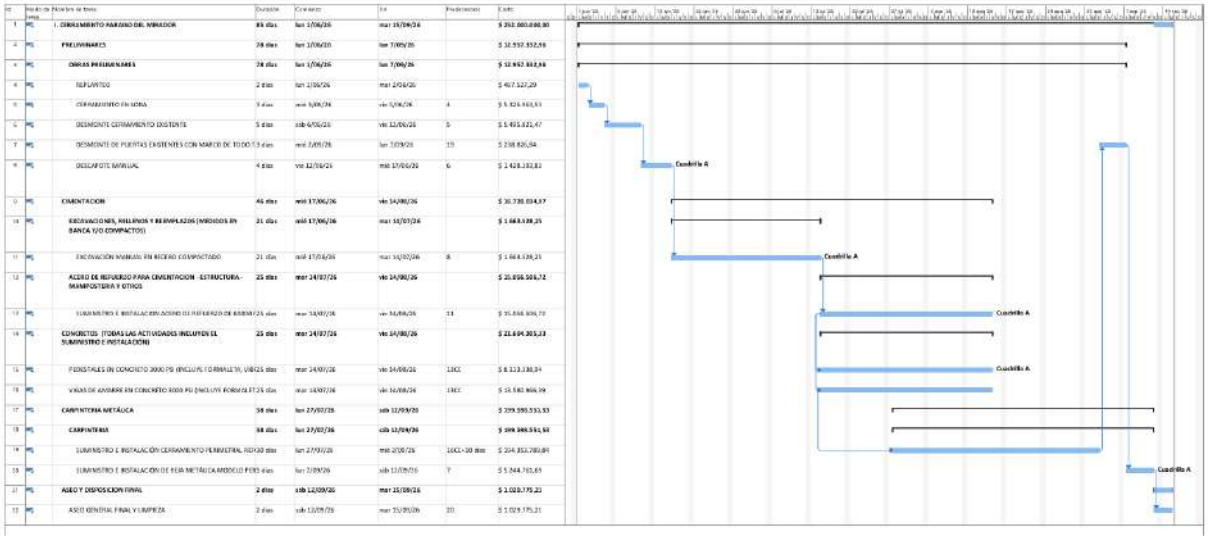

PROGRAMACION ADICION COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA

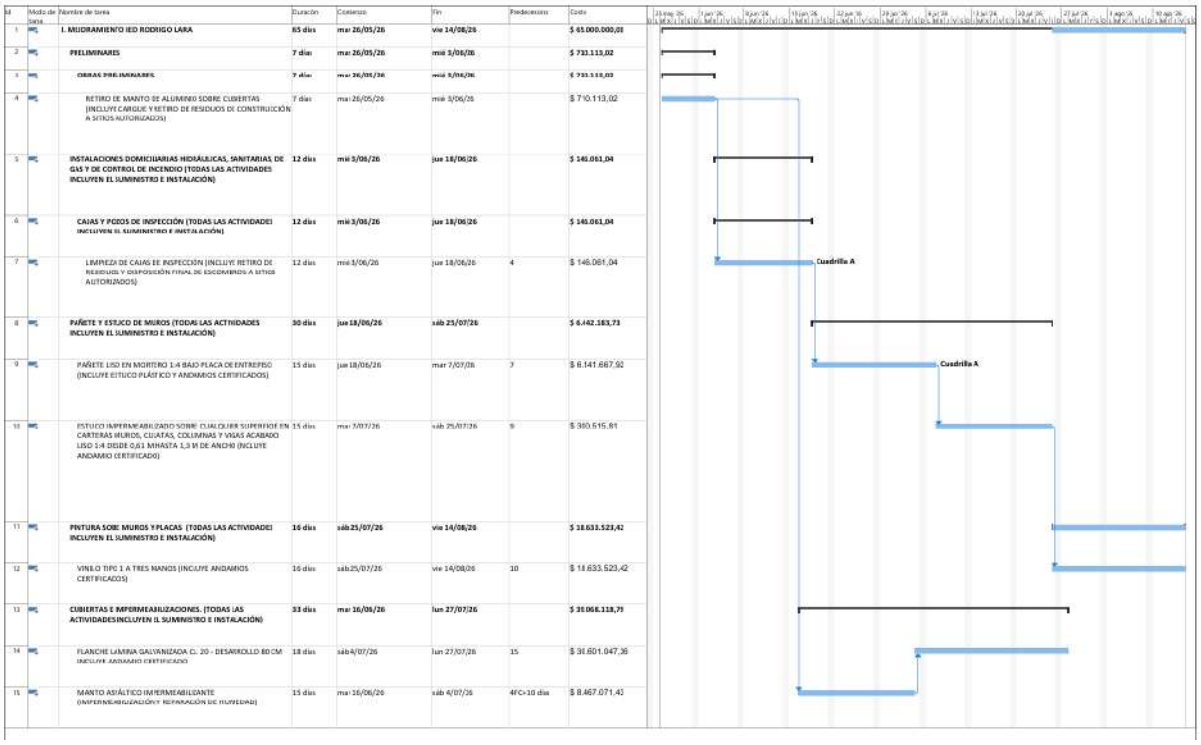

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**I. MUDRAMIENTO IED RODRIGO LARA**	**65 días**	**mar 26/05/26**	**vie 14/08/26**		**$ 65.000.000,01**
2		**PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 26/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 710.113,02**
3		**OBRAS PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 26/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 710.113,02**
4		RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	mar 26/05/26	mié 3/06/26		$ 710.113,02
5		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**mié 3/06/26**	**jue 18/06/26**		**$ 146.061,04**
6		**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**mié 3/06/26**	**jue 18/06/26**		**$ 146.061,04**
7		LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	12 días	mié 3/06/26	jue 18/06/26	4	$ 146.061,04
8		**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 25/07/26**		**$ 6.442.183,73**
9		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	15 días	jue 18/06/26	mar 7/07/26	7	$ 6.141.667,92
10		ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CUATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,01 MHASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	15 días	mar 7/07/26	sáb 25/07/26	9	$ 360.515,81
11		**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**	**sáb 25/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 18.633.523,42**
12		VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16 días	sáb 25/07/26	vie 14/08/26	10	$ 18.633.523,42
13		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADESINCLUYEN IL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**33 días**	**mar 16/06/26**	**lun 27/07/26**		**$ 39.068.118,79**
14		FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA C. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18 días	sáb 4/07/26	lun 27/07/26	15	$ 30.601.047,36
15		MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	15 días	mar 16/06/26	sáb 4/07/26	4FC+10 días	$ 8.467.071,43

EMERGENCIAS ACTIVAS


COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS 02

VISITA DE INSPECCIÓN
CONSORCIO FORTALEZA

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CPF	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL
1985	IE JOSE CELESTINO MUTIS	A	Sede A El Clavel (Mochuelo)	$ 5.179.895,00	$ 7.017.203,76
ALCANCE ESPECIFICO			Generar un fitro sobre terreno para evitar que el agua que cae por escorrentia dentro del colegio se filtre por los muros de dos aulas academicas, debido al diseño aterrazado del colegio u direccionar esas aguas a un canal de aguas lluvias existente.		

REGISTRO FOTOGRAFICO:





ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

Durante la visita efectuada el dia 25 de mayo del 2026,en las instalaciones de la IE JOSE CELESTINO MUTIS sede A, se logro evidenciar que existe filtracion de aguas lluvias en dos aulas academicas, todo debido a que al ser un proyecto aterrazado , las aguas lluvias por escorrentia pasan debajos de las placas y se acumulan en los cambio de nivel y alli empiezan a filtrar por los muros.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	15/06/2026	16/06/2026
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17/06/2026	19/06/2026
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	20/06/2026	22/06/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	23/06/2026	25/06/2026
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	26/06/2026	30/06/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1/07/2026	11/07/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	12/07/2026	14/07/2026

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	60,20	$ 3.001,00	$ 180.660,0
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	13,22	$ 65.179,00	$ 861.927,0
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	7,61	$ 15.378,00	$ 117.057,0
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	$ 64.896,00	$ 1.297.920,0
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 620.659,00	$ 620.659,0
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	30,10	$ 63.213,00	$ 1.902.711,0
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60,20	$ 3.305,00	$ 198.961,0
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 5.179.895,00**
	ADMINISTRACIÓN (29,47%)				$ 1.526.515,06
	IMPREVISTOS (1%)				$ 51.798,95
	UTILIDAD (5%)				$ 258.994,75
	TOTAL				**$ 7.017.203,76**

COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA

VISITA DE INSPECCIÓN
CONSORCIO FORTALEZA

CONSORCIO FORTALEZA

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CPF	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL
510	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA	A	SEDE PPL	$ 38.878.478,00	$ 52.668.674,15
ALCANCE ESPECIFICO			Se requiere Piso en vinilo para dos aulas academicas y un cambio de cubierta en area de juegos para niños		

REGISTRO FOTOGRAFICO:






ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en el Colegio Fernando Gonzales Ochoa el dia 18 de mayo del 2026, se evidenció que por solicitud de la institucion educativa y por necesidad de los estudiantes, se requiere instalar un piso en vinilo en dos salones de la institucion educativa, en el salon play room y salon transicion 03, de igual forma en el area donde tienen ubicada la piscina de pelotas, requieren hacer el cambio de la cubierta existente, por una cubierta adecuada para un espacio de la institucion educativa.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	23/06/2026	24/06/2026
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	25/06/2026	28/06/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	29/06/2026	4/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	5/07/2026	7/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8/07/2026	11/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	12/07/2026	14/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	15/07/2026	17/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	18/07/2026	20/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #8 EN COBRE	21/07/2026	23/07/2026
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	24/07/2026	27/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	28/07/2026	5/08/2026
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	6/08/2026	8/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	9/08/2026	14/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	15/08/2026	17/08/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	18/08/2026	19/08/2026

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	113,60	$ 3.001,00	$ 340.914,0
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	81,08	$ 26.040,00	$ 2.111.323,0
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	395,16	$ 16.326,00	$ 6.451.330,0
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	5,00	$ 64.896,00	$ 324.480,0
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 89.920,00	$ 89.920,0
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 10.782,00	$ 323.460,0
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 127.774,00	$ 383.322,0
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	$ 137.326,00	$ 411.978,0
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #8 EN COBRE	ML	30,00	$ 10.269,00	$ 308.070,0
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	113,60	$ 30.220,00	$ 3.432.992,0
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	113,60	$ 168.077,00	$ 19.093.547,0
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	ML	24,66	$ 12.205,00	$ 300.975,0
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,52	$ 94.640,00	$ 3.077.693,0
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	8,56	$ 216.475,00	$ 1.853.026,0
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	113,60	$ 3.305,00	$ 375.448,0
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 38.878.478,00**
ADMINISTRACIÓN (29,47%)					$ 11.457.487,47
IMPREVISTOS (1%)					$ 388.784,78
UTILIDAD (5%)					$ 1.943.923,90
TOTAL					**$ 52.668.674,15**

CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B

VISITA DE INSPECCIÓN
CONSORCIO FORTALEZA

CONSORCIO FORTALEZA

INFORME PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTICO

CPF	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	TOTAL COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL
1935	COLEGIO PARAISO MIRADOR SEDE B	B	SEDE B	$ 40.119.799,00	$ 54.350.291,71
ALCANCE ESPECIFICO			Se requiere realizar el mejoramientos de dos baterias sanitarias existentes.		

REGISTRO FOTOGRAFICO:






ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

De acuerdo con la inspección realizada en el PARAISO MIRADOR SEDE B el dia 03 de julio del 2026, se evidenció que por solicitud de la institucion educativa y por necesidad de los estudiantes, se requiere realizar el mejoramiento de dos baterias sanitarias a nivel general, ya que el enchape ceramico presenta ya deterioro por el uso normal y el paso del tiempol, al igual que la pintura perimetral y aparatos sanitarios, de igual forma las baterias no poseen mediacaña perimetral por temas de asepcia.

PROGRAMACIÓN ESTIMADA

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	14/07/2026	15/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	15/07/2026	16/07/2026
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	16/07/2026	18/07/2026
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	18/07/2026	19/07/2026
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	19/07/2026	20/07/2026
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	20/07/2026	21/07/2026
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	21/07/2026	23/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	23/07/2026	24/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	24/07/2026	26/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	26/07/2026	28/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	28/07/2026	31/07/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	31/07/2026	2/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	2/08/2026	3/08/2026
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	3/08/2026	5/08/2026
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	5/08/2026	9/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	9/08/2026	14/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	14/08/2026	17/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	17/08/2026	19/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	19/08/2026	20/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	20/08/2026	22/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	22/08/2026	24/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	24/08/2026	25/08/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	25/08/2026	27/08/2026
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	27/08/2026	30/08/2026
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	30/08/2026	1/09/2026
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	1/09/2026	3/09/2026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	3/09/2026	4/09/2026
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	4/09/2026	5/09/2026

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154895

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 5

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	22,96	$ 3.001,00	$ 68.903,0
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	14,91	$ 1.629,00	$ 24.288,0
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,09	$ 8.962,00	$ 843.199,0
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00	$ 19.330,00	$ 289.950,0
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,68	$ 23.094,00	$ 500.678,0
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,79	$ 23.506,00	$ 159.709,0
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	25,00	$ 13.242,00	$ 331.050,0
4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UN	1,00	$ 77.228,00	$ 77.228,0
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	$ 45.017,00	$ 360.136,0
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00	$ 45.017,00	$ 135.051,0
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	8,00	$ 128.844,00	$ 1.030.752,0
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00	$ 68.939,00	$ 551.512,0
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00	$ 48.891,00	$ 244.455,0
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	21,68	$ 30.220,00	$ 655.170,0
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	ML	48,14	$ 56.644,00	$ 2.726.842,0
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	21,68	$ 149.176,00	$ 3.234.136,0
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	95,65	$ 69.597,00	$ 6.657.238,0
NP	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	8,00	$ 581.266,00	$ 4.650.128,0
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	$ 437.052,00	$ 1.311.156,0
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	2,98	$ 799.466,00	$ 2.382.409,0
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5,00	$ 29.143,00	$ 145.715,0
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	$ 286.690,00	$ 860.070,0
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6,79	$ 701.003,00	$ 4.762.895,0
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	95,65	$ 29.195,00	$ 2.792.621,0
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,51	$ 8.875,00	$ 341.794,0
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	6,00	$ 641.491,00	$ 3.848.946,0
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38,51	$ 22.693,00	$ 873.953,0
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,11	$ 87.337,00	$ 183.932,0
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	22,96	$ 3.305,00	$ 75.883,0
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 40.119.799,00**
	ADMINISTRACIÓN (29,47%)				$ 11.823.304,77
	IMPREVISTOS (1%)				$ 401.197,99
	UTILIDAD (5%)				$ 2.005.989,95
	TOTAL				**$ 54.350.291,71**

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Construcción

Contratista:
CONSORCIO FORTALEZA

Entidad Contratante:

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Objeto Contractual:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Lote 5

Fecha: 6 de julio de 2026 al 5 de agosto de 2026

Informe No. 9

Elaborado por:	Aprobado por:
	
Zuneile Paola Arias Botello Lic: 27668 de 22/07/2025	Cristian Adolfo Neira
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante legal

Tabla de contenido

1. Introducción 3
1.1. Objetivo: 3
1.2. Alcance: 3
2. Marco Normativo 4
3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4
4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 5
5. Planificación y Programas de Gestión salud 6
5.1. Objetivos y metas en seguridad y salud 6
5.2. Programación de actividades preventivas y correctivas. 6
5.3. Relación de personal en obra aprobado 7
5.4. Relación de Exámenes ocupacionales 7
6. Implementación y Control de Medidas 7
6.1. Acciones realizadas en el período: 7
6.2. Cuadro de seguimiento de actividades: 8
7. Trabajo en Alturas 8
7.1. Control documental 8
8. Incidentes, Accidentes y Acciones Correctivas 18
9. Indicadores de Gestión SST 20
10. Planillas de Seguridad Social. 21
10.1. Control documental 21
11. Conclusiones 23
12. Recomendaciones 24

1. Introducción

1.1. Objetivo: Presentar el seguimiento, el control y gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades realizadas en las sedes educativas.

1.2. Alcance: Aplicable a todas las actividades realizadas en las sedes educativas.

Localidad	Colegio	Sede Educativa
CIUDAD BOLÍVAR	LA ARABIA	SEDE A - LA ARABIA
CIUDAD BOLÍVAR	JOSÉ JAIME ROJAS	SEDE A - NACIONES UNIDAS II
USME	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	SEDE A - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
CIUDAD BOLÍVAR	JOSÉ MARIA VARGAS VILLA	SEDE D- JOSÉ MARIA VARGAS VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS
USME	ATHABANZA	SEDE A VALLE DE CAFAM
CIUDAD BOLÍVAR	DON BOSCO I	SEDE A - LA JOYA (DON BOSCO I)
USME	BRASILIA USME	SEDE A - BRASILIA
USME	LUIS EDUARDO MORA OSEJO	SEDE A NUEVO MONTEBLANCO
CIUDAD BOLÍVAR	BICENTENARIO	SEDE C LA ESPERANZA – EL TESORO LUCERO LA JOYA

2. Marco Normativo

Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) - Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6
Resolución 0312 de 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST)
Resolución 4272 de 2021 (Trabajo Seguro en Alturas)
Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas (GTC)

3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consorcio Fortaleza declara su compromiso con la protección y promoción de la salud de sus trabajadores y contratistas. Nos comprometemos a:

I. Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación del SG-SST.

II. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

III. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los respectivos controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la propiedad.

IV. Capacitar a todo el personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.

V. Promover la participación activa de los trabajadores en la gestión del sistema.

VI. Mejorar continuamente el desempeño del SG-SST.

Liderazgo:

- **Responsable SGSST**: Residente SST (Zuneile Paola Arias Botello).
- **Aprobación**: Representante Legal (Cristian Adolfo Neira Rubiano).

4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Durante el periodo del presente informe se realizaron análisis de trabajo seguros de las actividades ejecutadas.

Actividad	Riesgos / Peligros Identificados	Actividades de Alto Riesgo
1. Pintura de perfiles metálicos	• Trabajos en altura con riesgo de caída a distinto nivel, caída de materiales, cortes con paneles metálicosuso de andamios o plataformas.	Trabajos en altura, trabajos en caliente.
2. Instalación de perfiles metálicos	• Trabajos en altura con riesgo de caída a distinto nivel, caída de materiales, cortes con paneles metálicosuso de andamios o plataformas.	Trabajos en altura, trabajos en caliente.
3. Orden y aseo	• Cortes y laceraciones por herramientas• Resbalones • Caídas al mismo nivel • Caída de objetos • Superficies irregulares	No aplica.
4. Desmonte de cubierta	• Trabajos en altura con riesgo de caída a distinto nivel, caída de materiales, cortes con paneles metálicos, uso de andamios o plataformas.	Trabajos en altura, trabajos en caliente.
5. Perfilado y nivelación del terreno	• Cortes y laceraciones por herramientas• Resbalones • Caídas al mismo nivel • Caída de objetos • Superficies irregulares	No aplica.

Ver Anexo 1. ATS.

Planificación y programas de gestión de salud

4.1. Objetivos y metas en seguridad y salud

Objetivo general	Meta cuantificable	Indicador	Responsable
Reducción de la accidentalidad	Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales	Indicadores de accidentalidad	Residente SST
Capacitación integral	Capacitar al 100% del personal en los procedimientos de trabajo seguros específicos por actividad.	% de trabajadores capacitados vs. total	Residente SST
Respuesta ante emergencias	Realizar inspecciones a equipos de emergencias .	% de inspecciones	Residente SST
Cumplimiento normativo	Lograr un 100% de cumplimiento en las inspecciones programadas y en la entrega de EPP	% de cumplimiento vs. plan anual	Residente SST

Ver Anexo 2. Inspecciones

5.2. Programación de actividades preventivas y correctivas.

Durante el periodo de ejecución de actividades se registran las siguientes actividades:

Actividad	Tipo	Periodicidad	Responsable	Evidencia esperada
Capacitación en trabajo seguro	Preventiva	Mensual	Residente SST	Listas de asistencia
Entrega y verificación de EPP	Preventiva	Inicial y según renovación	Residente SST	Formatos de entrega firmados
Inspecciones planeadas de SST	Preventiva	Mensual	Comité SST / Vigía	Registro de inspección

Anexo 3. Capacitaciones /Anexo 4

5.3. Relación del personal en obra aprobado

Durante el periodo de ejecución de actividades se presentan los documentos del personal.

Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de ingreso
Rogelio Moncada Pardo	Oficial	2026-7-16
Marlon Esteven Bustos Virguez	Instalador de Cubierta	2026-7-22

Ver Anexo 5. Formato de seguimiento del personal en obra

5.4. Relación de exámenes ocupacionales

Se relacionan los exámenes médicos realizados al personal que ejecuta labores en el periodo.

Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de examen	Resultado del examen (APTO/NO APTO)
Rogelio Moncada Pardo	Oficial	2026-7-16	Apto
Marlon Esteven Bustos Virguez	Instalador de Cubierta	2026-7-22	Apto

Ver Anexo 6. Exámenes médicos

6. Implementación y Control de Medidas

6.1. Acciones realizadas en el período:

Durante el periodo de ejecución de actividades se registran las siguientes actividades:

Charlas de seguridad

Inspecciones planeadas

Permisos en caliente

Ingreso de personal

Seguimiento al ingreso de personal

Control de seguridad social

Pausas activas

6.2. Cuadro de seguimiento de actividades:

Actividad	Cantidad	Responsable	Estado
Inspecciones	34	Adriana Forero	Realizado
Capacitación	9	Adriana Forero	Realizado
Entrega de EPP	2	Adriana Forero	Realizado
Analisis de trabajo seguro	8	Adriana Forero	Realizado
Trabajo en altura	4	Adriana Forero	Realizado
Trabajo en caliente.	6	Adriana Forero	Realizado

Ver Anexo 2. Inspecciones

7. Trabajo en Alturas
7.1. Control documental

Durante el periodo de ejecución de actividades se verifica la competencia de los trabajadores.

Nombre	Cédula	Formación	Fecha	Intensidad (horas)
Luis Alberto Rodriguez Rojas	79255905	Trabajo En Alturas Trabajador Autorizado	17/05/2026 a 20/05/2026	32
Juan Rene Rodriguez Rojas	79546356	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	14/02/2026	8
William Romero Garzon	80.811.660	Trabajo En Alturas Trabajador Autorizado	04/07/2025 a 07/07/2025	32
Johan Fernando Vera Diaz	1.013.669.495	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	01/04/2026 a 01/04/2026	8

Nombre	Cédula	Formación	Fecha	Intensidad (horas)
Deyby Alexander Torres Saiz	1.024.516.278	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	20/05/2026 a 20/05/2026	8
Erick Fabian Rodriguez Diaz	1.012.436.533	Trabajo En Alturas Reentrenamiento Sectorial 4272	01/04/2026 a 01/04/2026	8
Yazmin Adriana Forero Hernadez	1234644444	Trabajo En Alturas Trabajador Autorizado Coordinador Trabajo En Alturas	25 de febrero de 2026 26 de febrero al 07 de marzo 2026	32 80

Certificación del personal

Nombre	Cédula	Examen Médico	Fecha	Concepto
Luis Alberto Rodriguez Rojas	79255905	Concepto Médico Ocupacional (Pre Ingreso - Alturas)	04/11/2025	Apto Para Trabajar En Alturas
Juan Rene Rodriguez Rojas	79546356	Concepto Médico Ocupacional (Pre Ingreso - Alturas)	27/12/2025	Apto Para Trabajar En Alturas
William Romero Garzon	80.811.660	Evaluación Ocupacional De Pre Ingreso - Alturas	14/11/2025	Apto Sin Recomendaciones Para La Ocupacion / Apto Para Trabajar En Alturas
Johan Fernando Vera Diaz	1.013.669.495	Ingreso / Alturas / Espacios Confinados	27/02/2026	Sin Restricción Para El Cargo - Sin Restricción Para Trabajo En Alturas - Apto Para Trabajar En Espacios Confinados

Nombre	Cédula	Examen Médico	Fecha	Concepto
Deyby Alexander Torres Saiz	1.024.516.278	Evaluación Ocupacional De Pre Ingreso - Alturas	25/11/2025	Apto Con Recomendaciones Para La Ocupacion / Apto Para Trabajar En Alturas (Uso De Corrección Visual)
Erick Fabian Rodriguez Diaz	1.012.436.533	Evaluación Ocupacional De Pre Ingreso - Alturas	21/10/2025	Apto Sin Recomendaciones Para La Ocupacion / Apto Para Trabajar En Alturas
Yazmin Adriana Forero Hernadez	1234644444	Concepto Médico Ocupacional (Pre Ingreso - Alturas)	13/01/2026	Apto Para Trabajar En Alturas

Concepto médico ocupacional: énfasis en alturas.

Fceha	Descripción	Actividad
7 de julio de 2026	Trabajo en alturas/caliente	Pintura de perfiles metálicos
14 de julio de 2026	Trabajo en alturas/caliente	Instalación de perfiles metálicos
21 de julio de 2026	Trabajo en alturas/caliente	Instalación de perfiles metálicos

Ver el anexo 7. Trabajo en altura/ caliente.

7.2 Registros Fotográficos

Actividad: Disposicion final teja de asbesto	
	
Registro 1: Disposición del material.	Registro 2:Disposición del material.
	
Registro 3: Disposición del material.	Registro 4: Disposición del material.

Actividad: Entrega de EPP	
	
Registro 1: Entrega de EPP	Registro 2: Entrega de EPP
	
Registro 3: Entrega de EPP	Registro 4: Entrega de EPP

Actividad: Inspecciones de EPPC	
	
Registro 1: Inspección	Registro 2: Inspección
	
Registro 3: Inspección	Registro 4:Inspección

Actividad: Nivelación de terreno	
	
Registro 1: Nivelación	Registro 2: Nivelación
	
Registro 3: Nivelación	Registro 4: Nivelación

Actividad: Instalación de perfiles metalicos	
	
Registro 1: Instalación	Registro 2: Instalación
	
Registro 3: Instalación	Registro 4: Instalación

Actividad: Pintura de perfiles metálicos	
	
Registro 1: Pintura	Registro 2: Pintura
	
Registro 3: Pintura	Registro 4: Pintura

Actividad: Inspeccion de herramienta	
	
Registro 1: Inspección	Registro 2: Inspección
	
Registro 3: Inspección	Registro 4: Inspección

Anexo 8. Registro fotográfico

8. Incidentes, Accidentes y Acciones Correctivas

N° Trabajadores	N° Accidentes	Índices de Accidentalidad del SG-SST	Análisis de Causas (Si aplica)	Medidas Correctivas / Preventivas Implementadas
28	1	• Tasa de Accidentalidad: 3.57% (1 AT / 28 trab.) • Frecuencia de Accidentalidad (IF): 48.70 • Severidad de Accidentalidad (IS): 146.10 (3 días inc. / 4.928 HHT * 240.000) • Proportion de Accidentes Mortales: 0.00% (0 mortales / 1 AT) • Días de Incapacidad Generados: 3 días (Incapacidad médica inicial)	• ACCIDENTADO: Jose Joaquin Santana Osorio (C.C. 72341181 - Instalador) • FECHA ACCIDENTE: 29/07/2026 (Caída de altura ~3m por colapso de cubierta) 1. ACTOS INSEGUROS: - Transitar sobre una superficie frágil sin verificar previamente su resistencia. - Iniciar el proceso de anclaje estando expuesto al riesgo de caída antes de estar asegurado a un punto de anclaje efectivo. 2. CONDICIONES INSEGURAS: - Cubierta con baldosas frágiles o deterioradas que no soportaron el peso del trabajador. - Ausencia de	1. Inspeccionar la cubierta antes de iniciar trabajos en altura e identificar zonas frágiles. - Resp: Coordinador SST / Residente de obra | Plazo: Inmediato 2. Verificar que el trabajador permanezca conectado al sistema de protección contra caídas desde el inicio hasta el final de la labor. - Resp: Supervisor de trabajo en alturas | Plazo: 15 días 3. Reforzar la capacitación en trabajo seguro en alturas y desplazamiento sobre cubiertas frágiles. - Resp: Coordinador SST | Plazo: Permanente 4. Actualizar el análisis de riesgos (ARL/ATS) y el permiso de trabajo en altura para este tipo de actividades. - Resp: Coordinador SST | Plazo: 15 días

			superficie de tránsito segura (pasarelas o plataformas) sobre la cubierta. - Riesgo no controlado de caída a diferente nivel. 3. FACTORES DEL TRABAJO: - Planeación insuficiente para desplazamiento sobre cubierta frágil. - Deficiencias en identificación y control de riesgo de caída por colapso de superficie. - Falta de medidas de protección colectiva.	

Interpretación: Durante el periodo evaluado, la empresa registró una Tasa de Accidentalidad del 3,57% (1 accidente entre 28 trabajadores), con un Índice de Frecuencia (IF) de 48,70 accidentes por cada 240.000 horas-hombre trabajadas y un Índice de Severidad (IS) de 146,10 días perdidos a causa de los 3 días de incapacidad médica otorgados, manteniendo una Proporción de Accidentes Mortales del 0,00%. En conclusión, aunque el impacto en tiempo perdido fue bajo en este evento particular, los indicadores reflejan una frecuencia proyectada considerable para la escala de la operación, lo que pone de manifiesto el elevado riesgo latente en los trabajos en cubierta; al haber sido provocado por el tránsito sobre superficies frágiles y el anclaje extemporáneo.

Ver el anexo de la investigación de accidentes

9. Indicadores de Gestión SST

CATEGORÍA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDICIÓN DEL PERIODO
Capacitación	% de asistencia a charlas de SST	Mensual	30% (julio 2026)
Análisis de trabajo seguro	% de tareas con Análisis de trabajo seguro completados	Diario / Semanal	100%(julio 2026)
Entrega de EPP	% de trabajadores con EPP entregado y firmado	Mensual	100%(julio 2026)
Inspección de Equipos	% de equipos inspeccionados en buen estado	Semanal	100%(julio 2026)
Orden y Aseo	% de cumplimiento en inspecciones de orden y aseo	Mensual	100%(julio 2026)
Permisos de Trabajo	% de trabajos críticos con permiso emitido	Diario	100%(julio 2026)

1. Cumplimiento en Análisis de trabajo seguro y Permisos de Trabajo

Indicador: 100% en ATS y permisos de trabajo críticos.

Interpretación: Esto demuestra una cultura preventiva sólida y un compromiso con la identificación y control de riesgos antes de ejecutar tareas críticas (trabajo en alturas, pintura, soldadura, etc.).

Impacto: Reduce significativamente la probabilidad de incidentes graves o fatales.

2. Entrega y Registro de EPP al 100%

Indicador: Todos los trabajadores tienen EPP entregado y firmado.

Interpretación: La organización garantiza la protección básica del personal y mantiene un registro formal, lo cual es esencial para cumplir con normativas y evitar sanciones.

3. Competencia Técnica Certificada

Indicador: 100% de trabajadores en alturas

Interpretación: Se evidencia una inversión en capacitación formal y se asegura que los trabajadores críticos cuenten con las competencias necesarias, reduciendo riesgos operativos y de calidad.

Aspectos por Mejorar (Oportunidades)

4.Asistencia a Capacitaciones (30%)

Meta: 90%

Interpretación: no se alcanzó la meta del 90%. Esto puede deberse a rotación de personal, falta de coordinación o priorización operativa sobre la formación.

Recomendación: Revisar horarios de charlas, implementar sesiones repetitivas y vincular la asistencia a indicadores de desempeño.

5. Inspecciones de Orden y Aseo (95%)

Meta: 90%

Interpretación: Si bien se supera la meta, el 5% de no conformidades puede reflejar áreas específicas de mejora como almacenamiento, señalización o limpieza en zonas operativas.

Recomendación: Focalizar acciones en áreas con hallazgos recurrentes.

10. Planillas de Seguridad Social.

10.1. Control documental

Durante el periodo de ejecución de actividades se realiza el control documental de los los trabajadores.

Ver Anexo 9. Planillas de seguridad social

ESPACIO EN BLANCO

11. RETIRO DE PERSONAL

Durante el período evaluado, se retirará al siguiente personal:

Nombre	Cédula (o PPT)	Fecha de retiro
Oscar Stevens Bedoya Alvarez	1. 033.693.324	04 de agosto de 2026
Edinson Calderon Avilés	80.197.344	04 de agosto de 2026
Julio Cesar Guavita Molina	80.095.515	04 de agosto de 2026

Ver Anexo 10. Paz y salvos

ESPACIO EN BLANCO

12. Conclusiones

1. Se evidencia un alto compromiso en el cumplimiento documental y operativo previo a la ejecución de tareas críticas, alcanzando un 100% de cumplimiento en la elaboración de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), permisos de trabajo, entrega de EPP e inspección de equipos.

2. Durante el periodo evaluado se presentó 1 accidente de trabajo (tasa de accidentalidad del 3,57% y 3 días de incapacidad) debido al colapso de una cubierta frágil y a la falta de anclaje previo al desplazamiento. Esto evidencia la necesidad crítica de reforzar la prevención en tareas en altura sobre este tipo de superficies.

3. Aunque los controles documentales y operativos muestran un buen desempeño, existe una importante oportunidad de mejora en la cobertura formativa, ya que la asistencia a las charlas de SST fue del 30%, ubicándose significativamente por debajo de la meta establecida del 90%.

.

13. Recomendaciones

1. Fortalecer la planeación y los sistemas de protección para trabajos en cubierta: Implementar de manera obligatoria la inspección previa de la estabilidad de las superficies, el uso de pasarelas o plataformas de tránsito seguro y la verificación del anclaje continuo a líneas de vida desde el inicio hasta el final de la labor.

2. Estrategias para incrementar la asistencia a capacitaciones de SST: Reestructurar los horarios de las charlas de seguridad, implementar sesiones breves o repetitivas e integrar la participación en formaciones dentro de los indicadores de desempeño operativo para alcanzar la meta del 90% de cobertura.

3. Actualización de la matriz de riesgos y procedimientos operacionales: Actualizar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y los permisos de trabajo específicos para incluir procedimientos detallados sobre el tránsito en cubiertas frágiles, reforzando las competencias del personal mediante reentrenamientos en trabajo seguro en alturas.

Anexo 1.
ATS

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea:	Tarea Crítica (riesgo fatal):
Desmonte de cubierta	Caida diferente nivel
Fecha: 30-08-2026 Turno: 700 AM	Lugar: I.E.O. Miguel de Cervantes Saavedra

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
Juan Rodriguez			
Luis Rodriguez			
Johan Vera			
Deiby Torres.			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI X NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO X	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO X	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI X NO
5 CONTACTO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI X NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI X NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI X NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI X NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI X NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI X NO	11 EXPLOSION	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI X NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI X NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI X NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI X NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI X NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI X NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI X NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI X NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI X NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI X NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI X NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI X NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI X NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI X NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI X NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI X NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI X NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI X NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI X NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI X NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI X NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI X NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó


ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
	✓	Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
	✓	Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift	✓	Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
	✓	Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
	✓	Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera	✓	Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador	✓	Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea:	Tarea Crítica (riesgo fatal):
Instalación de perfiles metálicos	Caída distinto nivel (Soldadura)
Fecha: 06-07-2026 Turno: 7:00 A.m	Lugar: Mz. 21 de Cervantes Izquierda

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
William Romero	Deyby Torres.		
Johan vera			
Tello ortega			
Luis Rodriguez			
Juan Rodriguez			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ✗	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI ✗ NO ✓	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI ✓ NO ✗	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI ✗ NO ✓
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI ✗ NO ✓	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI ✗ NO ✓	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI ✓ NO ✗	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI ✗ NO ✓
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI ✓ NO ✗	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI ✓ NO ✗	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI ✓ NO ✗	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI ✓ NO ✗
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI ✓ NO ✗	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI ✗ NO ✓	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI ✗ NO ✓	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI ✗ NO ✓
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI ✓ NO ✗	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI ✓ NO ✗	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI ✓ NO ✗	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI ✗ NO ✓
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI ✗ NO ✓	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI ✓ NO ✗	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI ✓ NO ✗	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI ✗ NO ✓
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI ✗ NO ✓	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI ✓ NO ✗	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI ✓ NO ✗	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI ✗ NO ✓
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI ✓ NO ✗	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI ✓ NO ✗	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI ✗ NO ✓	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI ✗ NO ✓

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-65 Rev 0 Fecha 13/1/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUI OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
	✓	Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift	✓	Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
	✓	Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
	✓	Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	✓	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera	✓	Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador	✓	Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Perfilado y nivelacion del terreno para obra.

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A.

Fecha: 06-07-2026 **Turno:** 7:00 A.M **Lugar:** Mojoé de cardonal Sacaojosa.

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Daniel Salcedo	Adm.
Julio Bracho	
Nolbeir Vanegas	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1	TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?	SI NO	2	ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?	SI NO	3	IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?	SI NO	4	AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles?	SI NO
5	CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?	SI NO	6	ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?	SI NO	7	CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?	SI NO	8	AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)	SI NO
9	MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?	SI NO	10	ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)	SI NO	11	EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?	SI NO	12	DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?	SI NO
13	MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?	SI NO	14	RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?	SI NO	15	CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?	SI NO	16	RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?	SI NO
17	RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?	SI NO	18	CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?	SI NO	19	AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?	SI NO	20	RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)	SI NO
21	CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?	SI NO	22	RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?	SI NO	23	RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?	SI NO	24	RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)	SI NO
25	RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?	SI NO	26	RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?	SI NO	27	RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)	SI NO	28	RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?	SI NO
29	RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?	SI NO	30	CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?	SI NO	31	RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?	SI NO	32	RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?	SI NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede l[illegible] forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analisis del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, camaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (camaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA / [illegible]	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Instalacion de Perfiles metalicos

Tarea crítica (riesgo fatal): Caida de distinto nivel

Fecha: 14-07-2026 **Turno:** 7 A.M **Lugar:** Miguel de Cervantes Saavedra.

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
Luis Rodriguez			
Deyby Torres			
Juan Rodriguez			
William Romero			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas? SI NO	2 ARCO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico? SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico? SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico? SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas? SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área? SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Rios, quebradas, embalses, canales, otros) SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos? SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros) SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales? SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido? SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos? SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar? SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual? SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos? SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros? SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica) SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente? SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ? SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir? SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva) SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado? SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO? SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente) SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación? SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados? SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito? SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial? SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico? SI NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SSST-05 Rev: 0 Fecha: 13/6/2024 Página 1 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo y [illegible] en SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
	✓	Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift	✓	Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
	✓	Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
	✓	Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
	✓	Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	✓	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera	✓	Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador	✓	Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F.SGSST 05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea:	Tarea Crítica (riesgo fatal):
Parilado y Nivelacion del terreno	N/A.
Fecha: 14-07-2026 Turno: 7:00 A.m	Lugar: Miguel de cervantes Saavedra

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea	Firma SST
Daniel Salazar	
Nolberto Vanegas	
Julio Guevara	

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede realizar de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARQUE EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, camaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (camaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: instalacion de perfiles metalicos.

Tarea Critica (riesgo fatal): caida distinto nivel

Fecha: 21-01-2026 **Turno:** **Lugar:**

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
William Romero			Ahmed
Jairo Buitrago			
Juan Rodriguez			
Luis Rodriguez			
Juan manuel Caballero.			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ⊗	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI ✓ NO ⊗	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI ⊗ NO ✓	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____  SI ⊗ NO ✓
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI ✓ NO ⊗	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI ⊗ NO ✓	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI ⊗ NO ✓	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI ⊗ NO ✓
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI ⊗ NO ✓	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI ⊗ NO ✓	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? SI ⊗ NO ✓	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI ⊗ NO ✓
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI ⊗ NO ✓	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI ⊗ NO ✓	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI ✓ NO ⊗	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI ✓ NO ⊗
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI ⊗ NO ✓	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI ✓ NO ⊗	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI ✓ NO ⊗	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI ✓ NO ⊗
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI ✓ NO ⊗	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI ⊗ NO ✓	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI ⊗ NO ✓	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI ⊗ NO ✓
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI ✓ NO ⊗	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI ⊗ NO ✓	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI ⊗ NO ✓	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI ✓ NO ⊗
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI ⊗ NO ✓	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI ⊗ NO ✓	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI ⊗ NO ✓	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI ✓ NO ⊗

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST	

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó							
ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)						
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
	✓	Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift	✓	Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha	✓	Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
	✓	Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
	✓	Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, camaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	✓	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera	✓	Usar delantal (camaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador	✓	Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: Pintura de perfiles metalicos.

Tarea Crítica (riesgo fatal): Caida distinto nivel.

Fecha: 27-07-2026 **Turno:** 7:00 A.m **Lugar:** Restaurantes escolar.

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
Willian Romero			
Johan vera			
Luis Rodriguez			
Juan Manuel Caballero			
Jose Santana			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas? SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico? SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico? SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ____ SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico? SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas? SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área? SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros) SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos? SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros) SI NO	11 EXPLOSION	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales? SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido? SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos? SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar? SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual? SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos? SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros? SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica) SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente? SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ? SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir? SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva) SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado? SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO? SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente) SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación? SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados? PELIGRO ALTA PRESION SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito? SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial? SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico? RIESGO BIOLOGICO SI NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
 **Ambiente de Trabajo** (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
 **Herramientas / Equipos** (Selección y uso de herramientas o equipos)	✓	Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
	✓	Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
	✓	Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
 **Procesos** (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)	✓	Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
	✓	Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
 **Gente** (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)	✓	Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
	✓	Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa	✓	Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO		Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tela tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Consorcio Fortaleza	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/6/2024 Pág 1 de 2

Nombre de la tarea: perfilado y nivelacion del terreno para obra.

Tarea Critica (riesgo fatal): N/A.

Fecha: 27-01-2026 **Turno:** 7:00 A-m **Lugar:** Miguel de Cervantes Savedra

Nombres de las Personas que ejecutan la tarea			Firma SST
Nolbeli Vanegas			
Daniel Salazar			
Julio Guavita			

Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

1 TRABAJO EN ALTURA	¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO	2 ARCO ELECTRICO	¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO	3 IZAJE DE CARGA	¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO	4 AISLAMIENTO	¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____  SI NO
5 CONTACTO ELÉCTRICO	¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO	6 ESPACIO CONFINADO	¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO	7 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO	8 AHOGAMIENTO	¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO
9 MATERIALES PELIGROSOS	¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO	10 ANIMALES PONZOÑOSOS	¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO	11 EXPLOSIÓN	¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO	12 DESLIZAMIENTO	¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO
13 MATERIALES FUNDIDO	¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO	14 RIESGO QUIMICO	¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO	15 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO	16 RIESGO BIOMECANICOS	¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO
17 RIESGO MECANICO	¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO	18 CAIDA DE OBJETOS	¿Me puedo exponer a caida o proyección de objetos?  SI NO	19 AMBIENTAL	¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO	20 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO
21 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO	22 RIESGO MECANICO	¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO	23 RIESGO DE INTERFERENCIA	¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO	24 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO
25 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO	26 RIESGO QUIMICO	¿Me puedo exponer a CO?  SI NO	27 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO	28 RIESGO FISICO	¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO
29 RIESGO FISICO	¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO	30 CONDICIONES DE SEGURIDAD	¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO	31 RIESGO PSICOSOCIAL	¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO	32 RIESGO BIOLOGICO	¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO

	ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA	Código: F-SGSST-05 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pág 2 de 2

REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: SI la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó

ELEMENTO	MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN)					
Ambiente de Trabajo (Diseño de facilidades y controles en el área)		Barrera dura		Puesta a tierra/Aterrizar		Punto Ecológico
		Acordonamiento		Camilla	✓	Poli sombra/carpa
	✓	Avisos Preventivos		Extintor		Clasificación de residuos
	✓	Orden y aseo		Ruta de evacuación		Liberar energía residual
		Baranda		Punto de encuentro		Tapetes dieléctricos
		Distancia de seguridad		Kit de derrame		Planificar el trabajo
		Bloquear		Coordinar/Informar		Iluminación
		Inspección del área		Parada de emergencia		Medición de atmosfera
		Biombos/mamparas		Verificar nivel de tormenta		Otro:
		Ventilación mecánica		Punto de hidratación		
		Verificar alarmas en el área		Respetar señales de transito		
Herramientas / Equipos (Selección y uso de herramientas o equipos)		Inspección y uso de arnés		Inspección y uso de grúa		Inspección y uso de ventilador
		Inspección y uso de andamio		Inspección y uso de carro boom		Inspección y uso equipo oxicorte
		Inspección y uso de punto de anclaje		Inspección y uso de man Lift		Inspección y uso de equipo de soldar
	✓	Inspección y uso de herramientas manuales		Inspección y uso de garrucha		Inspección y uso de extensiones eléctricas
		Inspección y uso de equipos eléctricos		Inspección y uso de señorita		Inspección y uso de canasta para izaje personas
		Inspección y uso herramientas aisladas		Inspección y uso de malacate		Inspección y uso de trípode
		Inspección y uso de línea de vida		Inspección y uso de punto de izaje		Inspección y uso de tula de rescate
		Inspección y uso de aparejos		Inspección y uso de plataforma hidráulica		Inspección y uso de sujeta herramienta
		Inspección y uso de equipos a intervenir		Inspección y uso de diferencial		Inspección y uso de vehículo
		Inspección y uso de carro canasta		Inspección y uso de vehículo		Otro:
Procesos (Manuales, procedimientos, permisos, riesgos)		Diligenciar analises del dia a dia		Diligenciar permiso trabajos gas natural		Diligenciar plan de emergencia
		Diligenciar permiso altura		Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable		Diligenciar plan de izaje
		Diligenciar permiso eléctrico		Diligenciar permiso red contra incendio		Diligenciar tarjeta para bloqueo
		Diligenciar permiso espacio confinado		Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro		Aplicar procedimiento/paso a paso
		Diligenciar permiso trabajos en caliente		Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio)		Diligenciar bitácora
		Diligenciar permiso no verificación cero energías		Diligenciar liberación de andamio		Portar y conocer hoja de seguridad
		Diligenciar permios adición de casing		Diligenciar lista de chequeo		Otro:
Gente (Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos)		Usar arnés de seguridad	✓	Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro)		Entrenado en animales ponzoñosos
		Usar línea de vida (vertical/horizontal)		Usar visor(claro/oscuro)		Certificado para trabajar en alturas
		Bloquear fuente de energía peligrosa		Usar barbuquejo		Entrenado en seguridad eléctrica
		Usar línea de vida retráctil (Yoyo)	✓	Usar protección respiratoria		Entrenado en RCP
		Portar malla abejera		Usar delantal (carnaza / nitrilo)		Entrenado en espacios confinados
		Usar radio comunicación		Ropa FR (Anti flama)		Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
		Portar medidor de CO	✓	Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho)		Inducción de CO
		Portar auto rescatador		Usar careta para soldar		Realizar gimnasia laboral
		Usar Bloqueador solar		Usar chaqueta	✓	Pausas activas
		Usar capucha		Usar tele tubi	✓	Trabajo en equipo
	✓	Usar gafas de seguridad	✓	Usar casco de seguridad		Otro:
	✓	Usar Tapones Auditivos				

Anexo 2. inspecciones

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra | **LUGAR DE UBICACION:** Restaurante escolar

OPERADO POR: Juan Rene Rodriguez | **REFERENCIA DEL EQUIPO:** ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 30-06-2026

		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado del depósito de combustible (tanque)				✓		✓		✓		✓		✓		
3	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Fuente de energia			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?			Si		Si		Si		Si		Si			
	Firma del operador:			Firma		Firma		Firma		Firma		Firma			
	Firma quien realiza la inspeccion:			✓		✓		✓		✓		✓			

Juan Rene Rodriguez
FIRMA DEL OPERADOR

Adriana Perez
FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION				

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra — LUGAR DE UBICACION: Restaurante escolar.

OPERADO POR: Juan Rodriguez — REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 06-07-2026

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado del depósito de combustible (tanque)				✓		✓		✓		✓		✓		
3	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?			Si		Si		Si		Si		Si			
	Firma del operador:			Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez			
	Firma quien realiza la inspeccion:			✓		✓		✓		✓		✓			

Juan Rodriguez
FIRMA DEL OPERADOR

Admin.
FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION				

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de Cervantes Secundaria.	LUGAR DE UBICACION: Restaurante escolar.
OPERADO POR: Jairo Buitrago	REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB
SEMANA DE INSPECCION: 14-07-2026 – 18-07-2026.	

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)			✓		✓									
2	Estado del depósito de combustible (tanque)				✓		✓								
3	Funcionamiento del panel de control			✓		✓									
4	Funcionamiento de motor			✓		✓									
5	Radiador			✓		✓									
6	Fuente de energía			✓		✓									
7	Condición de los cables			✓		✓									
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓									
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)			✓		✓									
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓									
11	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓									
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?			Si		Si									
	Firma del operador:			[signature]		[signature]									
	Firma quien realiza la inspeccion:			[signature]		[signature]									

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION				

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra. | LUGAR DE UBICACION: Restaurante escolar.

OPERADO POR: Juan Rodriguez | REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 14-07-2026

		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado del depósito de combustible (tanque)				✓		✓		✓		✓		✓		
3	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Fuente de energia			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?			Si		Si		Si		Si		Si			
	Firma del operador:			Fernando		Fernando		Fernando		Fernando		Fernando			
	Firma quien realiza la inspeccion:														

Juan Rodriguez
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION	✓		✓	✓

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra.	LUGAR DE UBICACION: Restaurante escolar
OPERADO POR: William Romero.	REFERENCIA DEL EQUIPO: Dewalt

SEMANA DE INSPECCION: 21-07-2026

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)			✓		✓									
2	Estado del depósito de combustible (tanque)				✓		✓								
3	Funcionamiento del panel de control			✓		✓									
4	Funcionamiento de motor			✓		✓									
5	Radiador			✓		✓									
6	Fuente de energía			✓		✓									
7	Condición de los cables			✓		✓									
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓									
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)			✓		✓									
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓									
11	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓									
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?			Si		Si									
	Firma del operador:														
	Firma quien realiza la inspeccion:														

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION				

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

CONSORCIO FORTALEZA	IP.TEQUIPO DE SOLDADURA	Codigo:	F-SGSST-019
		Fecha:	13/8/2024
		Versión:	1

PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra | LUGAR DE UBICACION: Restaurante escolar

OPERADO POR: Juan Rodriguez | REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 21-0 -2026

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del encendido (arranque)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
2	Estado del depósito de combustible (tanque)	✓			✓		✓		✓		✓		✓		
3	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Sistema de conexión (enchufes, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	Si		Si		Si						✓			
	Firma del operador:	Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez			
	Firma quien realiza la inspeccion:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Juan Rodriguez.
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	FECHA DE ENVIO	FECHA VERIFICACIÓN
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:		✓		
ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION	✓		✓	✓

REALIZADO POR:		RESPONSABLE DEL ÁREA	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO		CARGO:	

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de cervantes saavedra.

Inspeccionado por: Juan René Rodriguez Fecha: 06-07-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	¿Cuenta con polo a tierra?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	¿Cuenta con aislamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Libre fisuras o rotura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Libre de quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Libre de añadiduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Validación responsable de la inspección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cargo		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz			

Observaciones: Extension electrica de 30 metros.

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de Cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Juan Rene Rodriguez Fecha: 30-06-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓		✓		✓		✓			
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Libre de quemaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Libre de añadiduras			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
Validación responsable de la inspección				Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez			
Cargo				Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor			

Observaciones: Extensión de 30 metros.

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de cervantes saavedra.

Inspeccionado por: Jairo Buitrago Fecha: 14-07-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓									
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓									
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓									
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓									
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓									
6	Libre de quemaduras			✓		✓									
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓									
8	Libre de añadiduras			✓		✓									
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓									
Validación responsable de la inspección				[signature]		[signature]									
Cargo				Soldador		Soldador									

Observaciones:
Extension de 30 metros.

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de cervantes

Inspeccionado por: Juan Rene Rodriguez Fecha: 14 - 07 - 2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓		✓		✓		✓			
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Libre de quemaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Libre de añadiduras			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
Validación responsable de la inspección				Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez			
Cargo				Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz		Aprendiz			

Observaciones:
Extension electrica de 30 metros.

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de Cervantes Saavedra

Inspeccionado por: William Romero

Fecha: 21-07-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓									
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓									
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓									
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓									
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓									
6	Libre de quemaduras			✓		✓									
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓									
8	Libre de añadiduras			✓		✓									
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓									
Validación responsable de la inspección				[signature]		[signature]									
Cargo				SOLDADOR		SOLDADOR									

Observaciones:
Extension de 40 metros.

Consorcio Fortaleza	Inspección de instalaciones eléctricas	Código	F-SGSST-15
		Fecha	12/11/2025
		Versión	1

Proyecto: Miguel de cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Juan Rene Rodriguez Fecha: 21-07-2026

No.	Aspecto a verificar	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
1	Estado del cable de la extensión			✓		✓		✓		✓		✓			
2	¿Cuenta con polo a tierra?			✓		✓		✓		✓		✓			
3	¿Cuenta con aislamiento?			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Libre fisuras o rotura			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Libre de quemaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
7	La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Libre de añadiduras			✓		✓		✓		✓		✓			
9	Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
Validación responsable de la inspección				Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez		Juan Rodriguez			
Cargo				Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor		Supervisor			

Observaciones: Extension de 30 metros.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de Cervantes FECHA: 04-07-2026 ÁREA: Planta Central

OBRA O PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra RESPONSABLE: Daniel Salazar

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portán adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL ÁREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jose Daniel S.
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 08-07-2026 ÁREA: Parqueadero

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Daniel Salazar

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jose Daniel J.
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 11-07-2026 AREA: Corredor Escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Lejos Rodriguez

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	/				
	Se encuentran en buen estado?	/				
	Se guardan y portan adecuadamente?	/				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	/				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?					
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	/				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	/				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	/				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	/				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jvi Alberto D
FIRMA		FIRMA	Alberto D
CARGO	Inspectora SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 11-07-2026 ÁREA: Palqueadero.

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Nolber Vanegas

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?					
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Nolber Vanegas
FIRMA	Adrf	FIRMA	
CARGO	Inspectora SST	CARGO	OFICIAL

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 18-07-2026 ÁREA: Parqueadero

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesus Torres

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheñidos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jesus Torres
FIRMA	Adri	FIRMA	Torres
CARGO	Insp. SST	CARGO	Aux

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS	Código: F-SGSST-17 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 1

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 25-07-2026 AREA: Restaurante escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Seiquera RESPONSABLE: Juan Rene

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
MANUALES	Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio?	✓				
	Se encuentran en buen estado?	✓				
	Se guardan y portan adecuadamente?	✓				
	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos?	✓				
	Se usan presas de banco para sujetarlas?				✓	
DE CORTE	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo?					
	Los cinceles se encuentran afilados?					
	Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos?					
	Los mangos están en buen estado?					
	Se cuenta con fundas para guardar las herramientas?					
DE TORSION - LLAVES	Se usan las llaves para golpear?					
	Las herramientas presentan signos de golpes o huellas?					
	Las mordazas están en buen estado?					
	Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente?					
	La punta y mango de los destornilladores están en buen estado?					
	Las herramientas son anti chispas?					
GENERAL	Se almacenan apropiadamente?	✓				
	Se manejan apropiadamente?	✓				
	Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas?	✓				
	Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas?	✓				
	Se les hace limpieza y mantenimiento?	✓				
	Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas?	✓				
	Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Juan Rondon
FIRMA		FIRMA	
CARGO	INSP. SST	CARGO	Sd Mayor.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código F-[illegible]T-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA 04-07-2026 AREA: Restaurante cocina

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Juan Rodriguez

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? ✓				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jorge Rozo Vil
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Almacen.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Cód. F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/09/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 11-07-26 ÁREA: Parqueadero.

OBRA O PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesús Torres.

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los amrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o locker) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA						
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jesus Torres
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Conductor

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/09/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 11-07-2026 ÁREA: Restaurante escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Luis Rodriguez

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran flores de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Torero	NOMBRE	Luis Alberto N
FIRMA	Adw	FIRMA	Alberto N
CARGO	Insp. SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 18-04026 ÁREA: Parqueadero

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Daniel Salgado

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? ✓				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA						
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jose Daniel S.
FIRMA		FIRMA	
CARGO	INSP. SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Area comedor escolar FECHA: 18-07-2026 ÁREA: Restaurante escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes RESPONSABLE: Juan Rene

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13
		Rev. 0
		Fecha: 13/08/2024
		Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jose Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Manager

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Mirador del Paraiso FECHA: 25-01-2026 ÁREA: Baños

OBRA O PROYECTO: Mirador del Paraiso RESPONSABLE: Robelio Moncada

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS ADMINISTRATIVAS					
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	ROGELIO MONCADA
FIRMA	Adrf	FIRMA	ROGELIO MONCADA
CARGO	INSP. SST	CARGO	OF 491

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 26-01-2026 ÁREA: Parqueadero

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Daniel Salazar

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VIAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? ✓				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13
		Rev. 0
		Fecha: 13/08/2024
		Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Jose Rueda S.
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	Oficial

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Cód. FOR-SST-15 Rev. 0 Fecha 15/06/2016 Pág 1 de 2

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 27-06-2016 ÁREA: Restaurante escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Deivy Tovar

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACION B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
SUPERFICIES DE TRABAJO	¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos?	✓				
	¿Las paredes y techos están en buen estado?				✓	
	¿Existe señalización y demarcación de áreas?	✓				
VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS	¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas?	✓				
	¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos?	✓				
	¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras?				✓	
SITIOS DE ALMACENAMIENTO	¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento?				✓	
	¿Están clasificados y señalizados los de productos?	✓				
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos?				✓	
	¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería?				✓	
ORDEN Y ASEO GENERAL	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	✓				
	¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias?	✓				
	¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo?	✓				
	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?				✓	
	¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado?	✓				
	¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza?	✓				
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo?				✓	
	¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad?				✓	
	¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
	¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje?	✓				
SANIDAD	¿Existen servicios sanitarios separados por genero?	✓				
	¿Se cuenta con suficientes de baños?	✓				
	¿Los baños están debidamente dotados?	✓				
	¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños?	✓				
	¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente?				✓	

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS	Código: F-SGSST-13 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

	ASPECTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN B	R	M	N/A	OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA					
ALMACÉN	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?				✓	
	¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)?	✓				
	¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén?				✓	
	¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados?				✓	
	¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro?				✓	
	¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento?				✓	
	¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén?				✓	
	¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados?				✓	
ÁREAS DE TRABAJO	¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor?	✓				
	¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	✓				
	¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames?				✓	
	¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello?	✓				
	¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados?	✓				
	¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades?	✓				
	¿El área de trabajo está señalizada y demarcada?	✓				
	¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente?	✓				
	¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación?	✓				
	¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación?	✓				

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		RESPONSABLE DEL AREA	
NOMBRE	Adriana Forero	NOMBRE	Diana Torres
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Insp. SST	CARGO	

Anexo 3. capacitación

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/5/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Tabaquismo

FECHA	HORARIO	DURACION	No. ASISTENTES
02-07-2026	7:25 A.m	5 minutos	6

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	José Daniel S	1007064665	Oficial	operativo	
2	Julio Guauta	80055515	Auxiliar	operativo	JULIO CESP.
3	Luis alberto R	79255905	oficial	operativo	Luis A
4	Jesus Torres	5607434	Aux	operativo	
5	Fernando Flores	3560164	AU	Operativo	
6	Wolber Vanegas	3791723	oficial	operativo	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

IED. Miguel de cervantes Saavedra.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Riesgos Ambientales.

FECHA: 06-07-2026 | HORARIO: 7:30 A.m | DURACION: 5 minutos | No ASISTENTES: 5

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Luis Alberto R	7925595	oficial	operativo	Luis A
2	Jose Daniel S	1001064686	Oficial	Operativo	
3	JULIO CESAR	8009557	Auxiliar	Operativo	JULIO CESA
4	Jesus Torres	5607434	Aux	operativo	
5	Fernando Flores	35600164	A4	Operativo	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

I.E.D. Miguel de Cervante Saavedra.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Riesgo psicosocial

FECHA: 14-07-2026	HORARIO: 7:40 A.m	DURACION: 5 minutos	No. ASISTENTES: 5

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	JUAN Rondon	79546356	ANALISTA	OPERATIVO	
2	Luis Alberto R	79955905	oficial	operativo	LUIS A
3	DEYBY Alexander T	1024516278	OFICIAL	Operativo	
4	Johan Vera	1013669495	Oficial	Operativo	Johan Vera
5	Jose Santana O	72341181	Oficial	Operativo	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

IED. Miguel de cervantes saavedra.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: uso obligatorio EPCC

FECHA	HORARIO	DURACIÓN	No. ASISTENTES
16-07-2026	7:15 A.m	5 minutos	2

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 Luis Alberto N	79265908	oficial	operativo	Luis A
2 DEYBY Alexander T	1024516277	Oficial	operativo	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Orden y Aseo.

FECHA: 18-07-2026 | HORARIO: 7:40 A.m | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES: 3

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Luis Alberto R	7935905	oficial	operativo	Luis A
2	Wolbeir Arregocs	3171221	OFICIAL	operativo	
3	Juan Rondon	79546350	soldado	operativo	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes saavedra.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/5/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: uso obligatorio EPCC.

FECHA	HORARIO	DURACION	No. ASISTENTES
4-07-2026	8:50 A.M	5 Minutos	6

EXPOSITOR: Adriana Pereyo

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	William BANERA	8001660	INSTALADOR	OPERATIVO	
2	Johan Vera	1013669440	Oficial	Operativo	Johan Vera
3	TOLEDO	1082257	A Y	OPERATIVO	
4	Luis alberto R	7925596	oficial	operativo	Luis A
5	Juan Bermudez	74546156	MENSAJERO	OPERATIVO	
6	DEYBY TORRES	1.024561	OFICIAL	Operativo	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes saavedra

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Incidentes y Accidentes.

FECHA	HORARIO	DURACION	No ASISTENTES
24-07-2026	8:20 A.m	5 minutos	3

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Juan Rodriguez	79'546.358	Soldado	Operativo	
2	Deyby A. Torres	1024.516.238	Oficial	Operativo	
3	Johan F. Vera	1013669495	Oficial	Operativo	Johan Vera.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

I.E.D. Miguel de Cervantes Scavadro.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/9/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Peligros y Riesgos.

FECHA	HORARIO	DURACIÓN	No. ASISTENTES
29-01-2026	7:20 A.M	5 minutos	4

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Wilmar Rodero	80811660	Instalador	operativo	
Jose Santana o	72341181	Pintor	operativo	
Juan manuel caballero T.	1026580632	Soldador	operativo	Juan manuel C.
Luis Alber Tafur	79255905	oficial	operativo	Luis A

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra.

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: F-SGSST-01 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Actos y condiciones inseguras en Alturas.

FECHA: 31-07-2026 | HORARIO: 12:11 pm | DURACION: 5 minutos | No ASISTENTES: 5

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	William Bonilla	80811660	instalador	operativo	
2	Jaira Botrago R.	791/076	Armador	operativo	
3	Johan F. Vera	1013669448	Oficial	Operativo	Johan Vera
4	Juan Rodriguez	9954635C	Armador	operativo	
5	Juan manuel caballero	1026580632	soldador	operativo	Juan manuel.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra.

Anexo 4.
EPP

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Rodriguez
No. IDENTIFICACION	79255905.
CARGO	Oficial

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 Tapaboca	01-07-2026	Bgta	N/A	LUIS RODRIGUEZ	
1 guante carnaza	14-07-2026	Bgta	10	LUIS RODRIGUEZ	
1 gafas	14-07-2026	Bgta	N/A	LUIS RODRIGUEZ	
1 Tapaboca	28-07-2026	Bgta	N/A	LUIS RODRIGUEZ	

Powered by CamScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Wolber Vanegas Mendez
No. IDENTIFICACION	3171723 silvania cund
CARGO	Oficial

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 par guante nitrilo	08-07-2026	Bgta	9		
1 Tapaboca	08-07-2026	Bgta	N/A		
1 par guante nitrilo	22-07-2026	Bgta	9		
1 Tapaboca	22-07-2026	Bgta	N/A		

Powered by CamScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev: 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Julio cesar Guavita
No. IDENTIFICACION	80095515
CARGO	Auxiliar

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 Tapaboca	14-07-2026	Bgta	N/A	JULIOCESA	
1 par guante nitrilo	14-07-2026	Bgta	9	JULIOCESA	
1 gafas	14-07-2026	Bgta	N/A	JULIOCESA	
1 Tapaboca	28-07-2026	Bgta	N/A	JULIOCESA	
1 guante nitrilo	28-07-2026	Bgta	9	JULIOCESA	

Powered by CamScanner

Consorcio Fortaleza	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Código: F-SGSST-03 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 1

DATOS DEL COLABORADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jose Daniel Salazar Guavita
No. IDENTIFICACION	1001064685
CARGO	Oficial

DESCRIPCION	FECHA	CDAD	TALLA	FIRMA	OBSERVACIONES
1 Tapaboca industrial	08-0 . 26	Bgta	N/A	Jose Daniels.	
1 par guante Nitrilo	08-0 . 26	Bgta	9	Jose Daniels.	
1 gafas	16-07-26	Bgta	N/A	Jose Daniels	
1 par de guante	28-07-26	Bgta	9	Jose Daniels.	
1 tapaboca	28-07-26	Bgta	N/A	Jose Daniels.	






Powered by CamScanner

Anexo 5. Personal


OBJETO CONTRACTUAL	**"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".**	**FORMATO DE SEGUIMIENTO PERSONAL EN OBRA- SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**FT-0040-2025** **FECHA: 01/11/2025** **V-0**
COLEGIOS	**LA ARABIA - SEDE A – LA ARABIA** **JOSE JAIME ROJAS - SEDE A – NACIONES UNIDAS II** **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** **JOSE MARIA VARGAS VILLA - SEDE D - JOSE MARIA VARGAS VILLA – BELLAFLOR** **LA TORRE – EL PORVENIR – LAS MARGARITAS** **ATHABANZA - SEDE A- VALLE DE CAFAM** **DON BOSCO I - SEDE A – LA JOYA (DON BOSCO)** **BRASILIA USME - SEDE A – BRASILIA**		
LOTE Y CONTRATISTA	**LOTE 5 - CONSORCIO FORTALEZA**		
FECHA DE INICIO:	**11/3/2025**		

N°	Empresa Contratante	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de Ingreso	Afiliado a EPS SI/NO	Afiliado a AFP SI/NO	Afiliado a ARL SI/NO	Examen Ocupacional (Si/No)	Examen Trabajo en Alturas (Si/No)	Resultado Examen APTO/NO APTO	Antecedentes Diciplinarios Procuraduria	Antecedentes Fiscales Contraloria	Antecedentes Judiciales Policia	Antecedentes delitos sexuales	Observaciones	Firma Verificación Interventoría
1	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	2025-11-14	Otro	Colfondos	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
2	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	2025-11-14	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
3	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	2025-11-14	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
4	CONSORCIO FORTALEZA	P.T.5769290	ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA	Ayudante	2025-11-14	Compensar	Otro	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
5	CONSORCIO FORTALEZA	P.T. 1426983	JOCSAN INFANTE CONTRERAS	Ayudante	2025-11-14	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
6	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	2025-11-19	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
7	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1033164451	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	Ayudante	2025-11-19	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
8	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.80811660	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	2025-11-19	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
9	CONSORCIO FORTALEZA	C1022942714	LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA	INSPECTOR DE OBRA	2025-11-19	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
10	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	2025-11-25	Otro	Colfondos	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
11	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	2025-11-25	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
12	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1024516278	DEIBY ALEXANDER TORRES SAIS	Oficial	11/28/2025	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
13	CONSORCIO FORTALEZA	C3171723	NOLBEIR VANEGAS MENDEZ	Ayudante	2025-12-3	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
14	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1023923196	JUAN DAVID FONSECA LOPEZ	Auxiliar de ingeniería	12/3/2025	Otro	Protección	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
15	CONSORCIO FORTALEZA	C.C.54972551	LUIS MARIO ROMERO	Instalador de cubierta	2025-12-12	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
16	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	OFICIAL	1/5/2026	Otro	Otro	Positiva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
17	CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA	INSTALADOR	1/15/2026	Otro	Otro	Otra	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
18	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA CRUZ	PINTOR	2026-3-10	Otro	Otro	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
19	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 93.436.168	CESAR AUGUSTO RAMOS PRADO	TECNICO ELECTRICISTA	3/21/2026	Compensar	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
20	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 79.850.016	JHON JAIRO NOVOA	SOLDADOR	3/31/2026	Otro	Porvenir	Otra	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
21	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1.001.064.685	JOSE DANIEL SALAZAR GUAVITA	OFICIAL	4/9/2026	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
22	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 10.820.597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	OFICIAL	2026-6-17	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
23	CONSORCIO FORTALEZA	CC.1.014.267.107	BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO	AUXILIAR DE OBRA	2026-6-17	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
24	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 9.870.916	JUAN CARLOS ARIAS MARTINEZ	TECNICO ELECTRICISTA	2026-6-19	Otro	Porvenir	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
25	CONSORCIO FORTALEZA	CC.79.714.830	RUBEN DARIO HERNANDEZ	TECNICO ELECTRICISTA	2026-6-19	Otro	Porvenir	Colmena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
26	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1.098.170.535	ROGELIO MONCADA PARDO	OFICIAL	2026-7-16	Otro	Porvenir	Sura	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí		
27	CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1.018512685	MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ	INSTALADOR DE CUBIERTA	2026-7-22	Otro	Colfondos	Sura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		




Road Derj

Empresa Contratante	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	Nombre y Apellido	Cargo	Salario	Firma
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	Ayudante	$ 1.850.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	Oficial	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	Oficial	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	Instaladores de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1033164451	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	Ayudante	$ 1.850.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.80811660	WILIAM ROMERO GARZON	Instaladores de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO	SOLDADOR	$ 2.600.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	SOLDADOR	$ 2.600.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.1024516278	DEIBY ALEXANDER TORRES SAIS	Oficial	$ 1.850.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C.54972551	LUIS MARIO ROMERO	Instalador de cubierta	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	OFICIAL	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA	INSTALADOR	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA CRUZ	PINTOR	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	CC. 79.850.016	JHON JAIRO NOVOA	SOLDADOR	$ 2.100.000	
CONSORCIO FORTALEZA	CC. 10.820.597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	OFICIAL	$ 2.500.000	
CONSORCIO FORTALEZA	CC.1.014.267.107	BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO	AUXILIAR DE OBRA	$ 2.100.000	

IES INGENIERÍA

Empresa Contratante	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	Nombre y Apellido	Cargo	Salario	Firma
CONSORCIO FORTALEZA	C3171723	NOLBEIR VANEGAS MENDEZ	Ayudante	$ 1.750.950	
CONSORCIO FORTALEZA	C.C. 1023923196	JUAN DAVID FONSECA LOPEZ	Auxiliar de ingeniería	$ 1.750.950	
CONSORCIO FORTALEZA	CC. 1.001.064.685	JOSE DANIEL SALAZAR GUAVITA	OFICIAL	$ 1.750.950	

FORTALEZA

N°	Empresa Contratante	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Salario	Firma
1	CONSORCIO FORTALEZA	CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO	DIRECTOR	10306762323	$ 1.800.000	
3	CONSORCIO FORTALEZA	DIEGO ALEXANDER SOTELO PINEDA	ESTRUCTURAL	1023012294	$ 1.800.000	
4	CONSORCIO FORTALEZA	TATIANA EDIRLEY PARRA CHAVARIA	AMBIENTAL	1019093502	$ 1.500.000	
5	CONSORCIO FORTALEZA	ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO	PROF. SST	1032423397	$ 1.200.000	
6	CONSORCIO FORTALEZA	HARBEY AGUILAR SARMIENTO	ESP. ELÉCTRICO	80147403	$ 3.000.000	
7	CONSORCIO FORTALEZA	YAMEL ARANGO PINILLA	ESP. HIDROSANITARIO	93286678	$ 3.000.000	
8	CONSORCIO FORTALEZA	LUIS FELIPE SOTELO PINEDA	PROF. DE COSTOS	1022986602	$ 3.000.000	
9	CONSORCIO FORTALEZA	YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ	TÉCNICO SST 1	1234644444	$ 1.800.000	
10	CONSORCIO FORTALEZA	LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA	INSPECTOR DE OBRA 1	10229422714	$ 1.800.000	
11	CONSORCIO FORTALEZA	ALEXANDER JOSE GOMEZ LAGUNA	Ayudante	PPT5769290	$ 1.750.950	
12	CONSORCIO FORTALEZA	JOCSAN INFANTE CONTRERAS	Ayudante	PPT1426983	$ 1.750.950	
13	CONSORCIO FORTALEZA	ROGELIO MONCADA PARDO	Oficial	1.098.170.535	$ 1.800.000	

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS

N°	Empresa Contratante	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Salario	Firma
1	CONSORCIO FORTALEZA	MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ	INSTALADOR	CC. 1.018512685	$ 1.750.950	

Anexo 6. examenes medicos

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEDE:CENDIATRA NORTE 86A **DIRECCIÓN:**Cra 21 no 86A-24 **CIUDAD DE LA SEDE:**BOGOTÁ

TELÉFONO:6017425327 - 6016224464 **EMAIL:**citas.norte2@cendiatra.com **FECHA EXAMEN:**2026-02-11

Nombres y apellidos:MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ
Fecha de nacimiento:12/07/1999
Empresa:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS S.A.S
Empresa usuaria:
Cargo:INSTALADOR
Departamento:BOGOTÁ D.C.
ARL:COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS VIDA
Fondo de Pensiones:COLFONDOS

CC:1018512685
Edad:26 **Sexo:**MASCULINO
Fecha ingreso:2026-02-11 / 08:50:13
Fecha salida:2026-02-11 / 11:01:40
Actividad Económica:121 - CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
EPS:E.P.S. FAMISANAR LTDA. CAFAM-COLSUBSIDIO



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS
:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Karolina Erazo Giraldo.
Médico R.M 1010221917 LIC.SST 21725
Esp. Seguridad y salud en el trabajo

LEIDY KAROLINA ERAZO GIRALDO
CC: 1010221917
RM: 1010221917
LIC-SST: 21725
Firma y sello del médico

MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ
CC: 1018512685
Firma del paciente

De acuerdo al Decreto 2345 de 2007se certifica que por parte del trabajador, que todos los datos consignado en la historia ocupacional y medica son veridicos. se autoriza informar a la empresa, las conclusiones generales del estado de salud de la poblacione examinada, informacion que sera consignada en el diagnostico de salud de la empresaa la cual pertenezca, y se utilizara para el cumplimiento de los subprogramas (art 15) de medicina preventiva y del trabajo, segun art. 10 de la resolucion 1015 de 1989, o la norma que la notifique, adicione o sustituya.



INFORMACION GENERAL

FECHA EXAMEN: **21/11/2025** CIUDAD: **META - GUAMAL**

Empresa: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SHS** Proyecto: **NI 901726864 CONSORCIO INFRAESTRUCTUR**

INFORMACION DEL TRABAJADOR

Documento Identidad: **CC 1098170535**	NOMBRE: **ROGELIO MONCADA PARDO**	
Edad: **39 Años**	Cargo: **MAESTRO DE OBRA**	Evaluacion Medica de: **Ingreso**

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIODICO		EXAMEN DE RETIRO	
Cumple con los requisitos necesarios para el perfil del cargo	X	Satisfactorio		Satisfactorio	
Presenta condiciones de salud que no disminuye su capacidad laboral		Signos y Sintomas de enfermedad general que deber ser valorados por su EPS		Condiciones de salud que deben ser valoradas por su EPS	
Presenta condiciones de salud que pueden comprometer su productividad		Se debe reasignar funciones, reubicar, analizar puesto de trabajo		Continuar manjeo por ARL	
Presenta condicones de salud que deben ser tratadas antes de ingresar		Secuela de accidente de trabajo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS	
No cumple con los requisitos del perfil del cargo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS		Valoración medica laboral para evaluación y calificación	
Proceso no terminado		Proceso no terminado		Proceso no terminado	

Observaciones:

EXAMENES ANEXOS	SI/ NO	Apto / No AP	EXAMENES ANEXOS	SI/ NO	EXAMENES ANEXOS	SI/ NO
REQUIERE PARA EXAMENES EN ALTURAS	NO	NA	OSTEOMUSCULAR	SI	NEUROLOGICO	
REQUIERE PARA MANIPULAR ALIMENTOS	NO	NA	RESPIRATORIO		DERMATOLOGICO	
REQUIERE PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	NO	NA	CARDIOVASCULAR	NO	MANIPULAR CARGAS	

RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGUN IMC		MANEJO POR EPS / ARL		RECOMENDACIONES		SVC / (Incluir en)	
Dieta		Control periodico PP o EPS		Control Periodico Ocupacional		Visual	
Ejercicio Regular		Se Prescribe Tratamiento		Higiene Postural	X	Auditivo	
Dieta y Ejercicio Regular	X	Remi. a EPS manejo medico		Utilizacion de EPP	X	Respiratorio	
Valoracion Nutricion por EPS		Continuar Manejo Medico		Utilizacion de Ayudas Ergono.		Ergonomico	
Descartar Altera. Metabolicas		Remision ARL para manejo		Medidas Anti Varices		Cardiovascular	
Dieta, Ejecicios y Med.		Uso Proteccion Solar FiltroUV		Evaluacion Puesto de Trabajo		Psicolaboral	
				Pausas Activas Cada 3 Horas		Quimico	
				Pausas Ergonomicas	X	Biologico	

RECOMENDACIONES: ESTILO DE VIDA SALUDABLE
USO DE EPP.

Dra. Claudia Diazgranados F
C.C. 57.460.951
Medica y Cirujano
Salud Ocupacional
E.U.A.A. Resolucion 8755 de 2025

Medico **CLAUDIA YOLIMA DIAZGRANADOS FLORIAN**
R.M: **509590**

Paciente: **ROGELIO MONCADA PARDO**
CC 1098170535

Anexo 7. Tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICION	dd	mm	aa	Hora
Desde	30	06	26	7:00
Hasta	04	07	26	3:00

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: maceta, Equipo de soldadura

Tipo de actividad a realizar: Desmonte de cubierta **Sección o Área:** Restaurante escolar

Descripción del Trabajo a Realizar: se realiza desmonte de cubierta **Altura máxima del trabajo a desarrollar:** 5 metros.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

	Nombres	Tipo y No Documento	Firma		Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1	Luis Alberto	74235905	Luis	6			
2	Dayra Torres	1024516355		7			
3	Jhon Rivera	79546356		8			
4	Johan Vera	1136694495	Johan Vera	9			
5				10			

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓													
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓												
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓												
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓													
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓		✓												
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓		✓													


REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

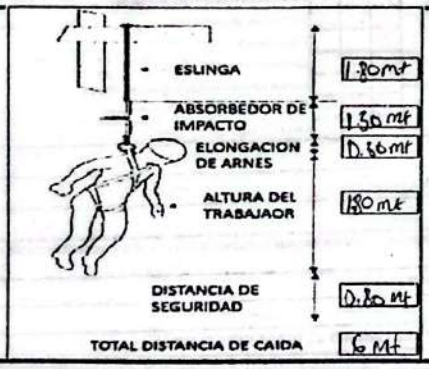

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		
MONOGAFAS	✓		
GUANTES	✓		
BOTAS CON PUNTERA	✓		
OVEROL	✓		
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		
OTROS:	✓		

¿Cuál? Careta para soldar, epcc

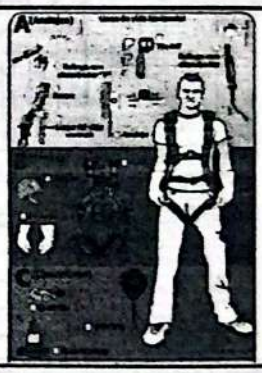

PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:	SI	NO
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:	SI	NO
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:	SI	NO
TRABAJOS EN CALIENTE:	SI	NO

EN CASO DE RESCATE

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE? SI NO

SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS? SI NO

SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD? SI NO

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN	SI	NO	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	SI	NO
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA	SI	NO	ANDAMIO COLGANTE	SI	NO
ESCALERA FIJA	SI	NO	MANLIFT	SI	NO
OTROS	SI	NO			

CUAL ? _____

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?				✓			✓			✓			✓			✓					
En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ?				✓			✓			✓			✓			✓					
La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenes condiciones ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente				✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha realizado un analisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar al trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ?				✓			✓			✓			✓			✓					
El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o lineas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir?				✓			✓			✓			✓			✓					

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	N.A		C	NC	N.A	
		✓	Presencia de gases y vapores	✓			Contacto con sustancias quimicas
		✓	Contacto con partes en movimiento	✓			Manipulación manual de cargas
		✓	Presencia de tráfico vehicular	✓			Movimientos repetitivos
✓			Caidas de diferente nivel	✓			Adopción de posturas inadecuadas
		✓	Derrames, fugas	✓			Colapsos estructurales
		✓	Cambios bruscos de temperatura	✓			Caida de objetos
✓			Contacto con corriente electrica	✓			Manejo de herramientas manuales
		✓	Riesgo de explosión o implosión	✓			Proyección de particulas
✓			Agentes infecciosos	✓			Exposición a ruido
		✓	Presencia de fuentes de ignición	✓			Condición de orden y aseo
✓			Caidas al mismo nivel	✓			Golpes con elementos colgado en alturas
✓			Manipulación de elementos cortantes	✓			Riesgo psicosocial
✓			Contacto con objetos a temperaturas extremas			✓	Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS

Uso obligatorio de EPP. EPCC, Orden y Asco.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUPENDIDO POR: (Nombre Completo)	
RAZON DE LA SUSPENSION		

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ?				Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ?			
Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ?			✓	El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ?			✓
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo (Candados), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ?	✓			La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ?	✓		

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (dd/mm/aa)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
30/06/2026	Adriana Forero	Adriana Forero
FECHA CIERRE (dd/mm/aa)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
04/07/2026	Adriana Forero	Adriana Forero.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: Restaurante escuela ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

FECHA DE INSPECCIÓN 30-06-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE								
	NÚMERO	1		2		3		4								
	NORMA	ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014								
REVISE ARNES Y CINTAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X							
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X							
DESGARROS			X		X		X		X							
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X							
QUEMADURAS			X		X		X		X							
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS																
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			X		X		X		X							
GRIETAS, BORDES FILOSOS			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
ARNES - HEBILLAS																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X							
GRIETAS			X		X		X		X							
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Luis Alberto		Deiby		Juan Rodriguez		Johan Velez								

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE								
	NÚMERO	1		2		3		4								
	NORMA	ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014		ANSI-Z359-11-2014								
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X							
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X							
DESGARROS			X		X		X		X							
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X							
QUEMADURAS			X		X		X		X							
ESLINGA - MOSQUETONES																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X							
GRIETAS			X		X		X		X							
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Luis Alberto		Deiby		Juan Rodriguez		Johan Velez								


Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE							
	NÚMERO	1		1		1		1							
	NORMA	ANSI-Z359 11-2014		ANSI-Z359 11-2014		ANSI-Z359 11-2014		ANSI-Z359 11-2014							
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X		X		X						
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X		X		X						
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X		X		X						
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X		X		X						
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?			X		X		X		X						
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X		X		X						
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X		X		X						
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X		X		X						
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X		X		X						
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Luis Alberto		Deyby		Jhan Kevin		Johan Vera Johan Vera							

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA									
	NOMBRE	Luis		Deyby		Jhan Kevin			
	FIRMA	Alberto							

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS

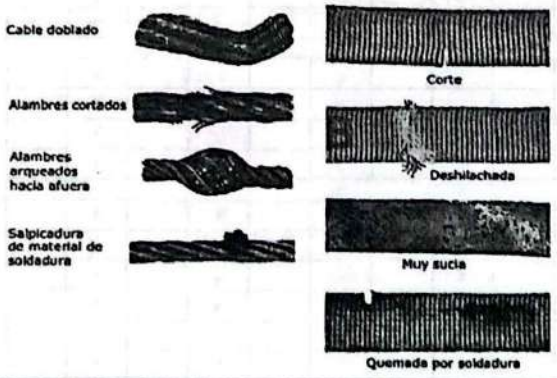

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 30-06-26 AL 04-07-26 PROYECTO: Mejoramiento de viviendas saludables.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA NOMBRE			Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			
FIRMA			Alberto		Alberto		Alberto		Alberto		Alberto			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
FIRMA			Adrf		Adrf		Adrf		Adrf		Adrf			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 30-06-26 AL 04-07-26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA **NOMBRE**			Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			
FIRMA			Alberto		Alberto		Alberto		Alberto		Alberto			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA **NOMBRE**			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
FIRMA			Adrf		Adrf		Adrf		Adrf		Adrf			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 30-06-26 AL 04-07-26 PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE			DEYBY I		DEYBY		DEYBY		DEYBY		DEYBY			
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE			ADRIANA FONS		ADRIANA FONS		ADRIANA FONS		ADRIANA FONS		ADRIANA FONS			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 30-06-26 AL 04-07-26 PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE			Jhon Fredy		Jhon Fredy		Jhon Fredy		Jhon Fredy		Jhon Fredy			
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA			Adsl		Adsl		Adsl		Adsl		Adsl			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Desmonte de cubierta

SEMANA DEL 09-06-26 AL 04-07-26 PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE			Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera			
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA			Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA			Admi		Admi		Admi		Admi		Admi			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	Hora
Desde	06	07	26	7:00
Hasta	11	07	26	3:00

Herramientas y/o Equipos a Utilizar:
Maceta
Equipo de soldadura
Brocha, rodillo

Tipo de actividad a realizar: Pintura de Perfiles e instalación Sección o Área:

Descripción del Trabajo a Realizar: Pintura de perfiles e instalacion. Altura máxima del trabajo a desarrollar: 6 Mt -


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

	Nombres	Tipo y No Documento	Firma		Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1	William Barrero	80811600		6	DEYBY TOLES	1.024516278	
2	Johan Vera	1013669495	Johan Vera	7			
3	JULIO OLIVOS	1082005**		8			
4	Luis Alber R	74755905	Luis A	9			
5	JUAN ROMERO	79546356		10			

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓									
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓									
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓		✓		✓		✓									

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

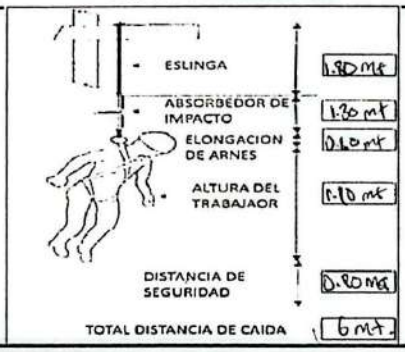

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		
MONOGAFAS	✓		
GUANTES	✓		
BOTAS CON PUNTERA	✓		
OVEROL	✓		
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		
OTROS:	✓		

¿Cual? Careta para soldar, EPCC



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

	SI	NO
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:		
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:		
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:		
TRABAJOS EN CALIENTE:		

EN CASO DE RESCATE

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?	SI	NO
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?	SI	NO
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?	SI	NO

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN	SI	NO	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	SI	NO
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA	SI	NO	ANDAMIO COLGANTE	SI	NO
ESCALERA FIJA	SI	NO	MANLIFT	SI	NO
OTROS	SI	NO	CUAL ?		

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o pesonas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o líneas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	N.A		C	NC	N.A	
		✓	Presencia de gases y vapores				Contacto con sustancias químicas
		✓	Contacto con partes en movimiento				Manipulación manual de cargas
		✓	Presencia de tráfico vehicular				Movimientos repetitivos
✓			Caidas de diferente nivel				Adopción de posturas inadecuadas
		✓	Derrames, fugas				Colapsos estructurales
		✓	Cambios bruscos de temperatura				Caida de objetos
✓			Contacto con corriente eléctrica				Manejo de herramientas manuales
		✓	Riesgo de explosión o implosión				Proyección de partículas
✓			Agentes infecciosos				Exposición a ruido
		✓	Presencia de fuentes de ignición				Condición de orden y aseo
✓			Caidas al mismo nivel				Golpes con elementos colgado en alturas
✓			Manipulación de elementos cortantes				Riesgo psicosocial
✓			Contacto con objetos a temperaturas extremas				Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUPENDIDO POR: (Nombre Completo)	
RAZON DE LA SUSPENSION		

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ?				Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ?			
Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ?				El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ?			
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo (Candados), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ?				La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ?			

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (dd/mm/aa)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
06-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero
FECHA CIERRE (dd/mm/aa)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
11-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: Restaurante escolar. ACTIVIDAD: Pintura e instalacion de perfiles metalicos

FECHA DE INSPECCIÓN: 06-07-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE			
	NÚMERO	1		2		5		4		6		3			
	NORMA	ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-11			
REVISE ARNES Y CINTAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X		X		X		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X		X		X		
DESGARROS			X		X		X		X		X		X		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X		X		X		
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X		X		X		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X		X		X		
QUEMADURAS			X		X		X		X		X		X		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS															
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			X		X		X		X		X		X		
GRIETAS, BORDES FILOSOS			X		X		X		X		X		X		
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X		X		X		
CORROSION			X		X		X		X		X		X		
ARNES - HEBILLAS															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X		X		X		
GRIETAS			X		X		X		X		X		X		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X		X		X		
CORROSION			X		X		X		X		X		X		
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William Gil		Johan Vera		TULIO		LUIS A		DEYBY		JUAN Rodriguez			
				Johan Vera		Tulio		Alberto							

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE			
	NÚMERO	1		2		5		4		6		3			
	NORMA	ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4			
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X		X		X		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X		X		X		
DESGARROS			X		X		X		X		X		X		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X		X		X		
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X		X		X		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X		X		X		
QUEMADURAS			X		X		X		X		X		X		
ESLINGA - MOSQUETONES															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X		X		X		
GRIETAS			X		X		X		X		X		X		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X		X		X		
CORROSION			X		X		X		X		X		X		
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William Gil		Johan Vera		TULIO		LUIS A		DEYBY		JUAN Rodriguez			
				Johan Vera		Tulio		Alberto							


Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE			
	NÚMERO	1		2		5		4		6		3			
	NORMA	ANSI Z359 2014-11		ANSI Z359 2014-11		ANSI Z359 2014-11		ANSI Z359 2014-11		ANSI Z359 2014-11		ANSI Z359 2014-11			
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X		X		X		X		X		
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X		X		X		X		X		
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X		X		X		X		X		
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X		X		X		X		X		
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?			X		X		X		X		X		X		
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X		X		X		X		X		
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X		X		X		X		X		
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X		X		X		X		X		
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X		X		X		X		X		
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Johan Vera		WILLIAM R				LUIS		DEYBY					
		Johan Vera						ALBERTO							

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA									
	NOMBRE	Johan Vera	WILLIAM R		LUIS	DEYBY			
	FIRMA	Johan Vera			ALBERTO				

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS

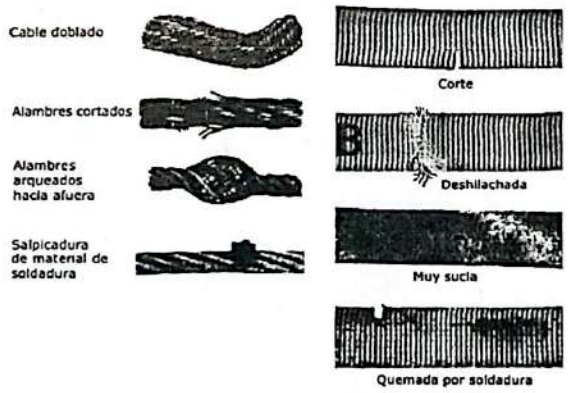

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Pintura e instalacion de Perfiles metalicos

SEMANA DEL 06.01.26 AL 10.01.26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS		NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			NO		NO										
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			NO		NO										
DESGARROS			NO		NO										
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			NO		NO										
DETERIORO GENERAL			NO		NO										
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			NO		NO										
QUEMADURAS			NO		NO										
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS															
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			NO		NO										
GRIETAS, BORDES FILOSOS			NO		NO										
DETERIORO GENERAL			NO		NO										
CORROSION			NO		NO										
OTROS			NO		NO										
ARNES - HEBILLAS															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			NO		NO										
GRIETAS			NO		NO										
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			NO		NO										
CORROSION			NO		NO										
OTROS			NO		NO										
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			NO		NO										
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			NO		NO										
DESGARROS			NO		NO										
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			NO		NO										
DETERIORO GENERAL			NO		NO										
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			NO		NO										
QUEMADURAS			NO		NO										
ESLINGA - MOSQUETONES		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			NO		NO										
GRIETAS			NO		NO										
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			NO		NO										
CORROSION			NO		NO										
OTROS			NO		NO										
QUIEN INSPECCIONA	NOMBRE	Willington B.		Willington B.											
	FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA	NOMBRE	Adriana Forero		Adriana Forero											
	FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: pintura e instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 05-08-26 AL 10-08-26 PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO				NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO				NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO				NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO				NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO				NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO				NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO				NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		NO		NO		NO				NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS		NO		NO		NO				NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO				NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO				NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO				NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO				NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO				NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO				NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO				NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO				NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO				NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO				NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO				NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO				NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO				NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO				NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO				NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO				NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO				NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO				NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO				NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO				NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA NOMBRE	Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera				Johan Vera		Johan Vera			
FIRMA	Johan Vera		Johan Vera		Johan Vera				Johan Vera		Johan Vera			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA NOMBRE	Adriana Rivera		Adriana Rivera		Adriana Rivera				Adriana Rivera		Adriana Rivera			
FIRMA	Adm		Adm		Adm				Adm		Adm			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	**PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS**	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: plantura e instalacion de perfiles metalicos.

SEMANA DEL 06-01-26 AL 09-01-26 PROYECTO: Mgud de cervantes Jaramillo.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO						NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO						NO		NO		
DESGARROS		NO		NO						NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO						NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO						NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO						NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO						NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		NO		NO						NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS		NO		NO						NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO						NO		NO		
CORROSION		NO		NO						NO		NO		
OTROS		NO		NO						NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO						NO		NO		
GRIETAS		NO		NO						NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO						NO		NO		
CORROSION		NO		NO						NO		NO		
OTROS		NO		NO						NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO						NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO						NO		NO		
DESGARROS		NO		NO						NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO						NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO						NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO						NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO						NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO						NO		NO		
GRIETAS		NO		NO						NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO						NO		NO		
CORROSION		NO		NO						NO		NO		
OTROS		NO		NO						NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**	Tello		Tello						Tello		Tello			
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**	Tello		Tello						Tello		Tello			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**	Adriana Forero		Adriana Forero						Adriana Forero		Adriana Forero			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**	Adm		Adm						Adm		Adm			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Pintura e instalación de perfiles

SEMANA DEL 26-01-26 AL 01-02-26 PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE	Luis		Alberto Luis				Luis		Luis		Luis			
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA	Luis		Alberto Luis				Alberto		Alberto		Alberto			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE	Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA	Adrf		Adrf		Adrf		Adrf		Adrf		Adrf			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Pintura e instalación de perfiles metalicos

SEMANA DEL 06/01/26 AL 11/01/26 PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE	Jesus Rodriguez	Jesus Rodriguez	Jesus Rodriguez	Jesus Rodriguez	Jesus Rodriguez	Jesus Rodriguez								
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero								
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	**PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS**	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: pintura e instalacion de perfiles

SEMANA DEL 06-07-26 AL 11-07-26 PROYECTO: Miguel de cervantes Bucaramanga

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				N/O		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA **NOMBRE**			DEYBY T		DEYBY T		DEYBY T		DEYBY T		DEYBY T			
FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA **NOMBRE**			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
FIRMA			Adm		Adm		Adm		Adm		Adm			

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	Hora
Desde	14	07	26	7:00
Hasta	18	07	26	8:00

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Equipo de soldadura.

Tipo de actividad a realizar: instalacion de perfiles metalicos Sección o Área: Restaurante escolar.

Descripción del Trabajo a Realizar: se realiza instalacion de perfiles metalicos Altura máxima del trabajo a desarrollar: 6 mt.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

	Nombres	Tipo y No Documento	Firma		Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1	LUIS ALBERTO	7425590	LUIS	6			
2	DEYBY TORRES	1024516255		7			
3	JEAN RUEDA	79546356		8			
4	WILLIAM BONILLA	80811660		9			
5				10			

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓													
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓												
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓												
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓													
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓		✓												
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓		✓													

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

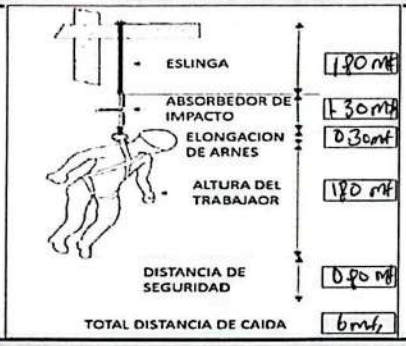

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	/		
MONOGAFAS	/		
GUANTES	/		
BOTAS CON PUNTERA	/		
OVEROL	/		
PROTECCIÓN AUDITIVA	/		
OTROS:	/		

¿Cual? Cuerda para sobol, 16 pcs



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

	SI	NO
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:		
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:		
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:		
TRABAJOS EN CALIENTE:		

EN CASO DE RESCATE

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?	SI	NO
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?	SI	NO
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?	SI	NO

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN	SI	NO	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	SI	NO
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA	SI	NO	ANDAMIO COLGANTE	SI	NO
ESCALERA FIJA	SI	NO	MANLIFT	SI	NO
OTROS	SI	NO	CUAL ?		

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?				✓			✓			✓			✓			✓					
En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ?				✓			✓			✓			✓			✓					
La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente				✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido Inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ?				✓			✓			✓			✓			✓					
El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o lineas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir?				✓			✓			✓			✓			✓					

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	N.A		C	NC	N.A	
		✓	Presencia de gases y vapores	✓			Contacto con sustancias químicas
		✓	Contacto con partes en movimiento	✓			Manipulación manual de cargas
		✓	Presencia de tráfico vehicular	✓			Movimientos repetitivos
✓			Caídas de diferente nivel	✓			Adopción de posturas inadecuadas
		✓	Derrames, fugas	✓			Colapsos estructurales
		✓	Cambios bruscos de temperatura	✓			Caída de objetos
✓			Contacto con corriente eléctrica	✓			Manejo de herramientas manuales
		✓	Riesgo de explosión o implosión	✓			Proyección de partículas
✓			Agentes infecciosos	✓			Exposición a ruido
		✓	Presencia de fuentes de ignición	✓			Condición de orden y aseo
✓			Caídas al mismo nivel	✓			Golpes con elementos colgado en alturas
✓			Manipulación de elementos cortantes	✓			Riesgo psicosocial
✓			Contacto con objetos a temperaturas extremas			✓	Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUPENDIDO POR: (Nombre Completo)	

RAZON DE LA SUSPENSION

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ?				Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ?			
Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ?				El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ?			
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo (Candados), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ?				La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ?			

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR, HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (dd/mm/aa)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
14-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero
FECHA CIERRE (dd/mm/aa)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
18-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero.

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion perfiles metalico

FECHA DE INSPECCIÓN 14-07-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE								
	NÚMERO	1		2		3		4								
	NORMA	ANSI-E359 2014-11		ANSI-E359 2014-11		ANSI-E359 2014-4		ANSI-E359 2014-4								
REVISE ARNES Y CINTAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X							
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X							
DESGARROS			X		X		X		X							
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X							
QUEMADURAS			X		X		X		X							
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS																
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			X		X		X		X							
GRIETAS, BORDES FILOSOS			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
ARNES - HEBILLAS																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X							
GRIETAS			X		X		X		X							
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Luis Alberto		DERBY		Juan Rodriguez		William								

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO																
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE								
	NÚMERO	1		2		3		4								
	NORMA	ANSI-E359 2014-11		ANSI-E359 2014-11		ANSI-E359 2014-4		ANSI-E359 2014-11								
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS			X		X		X		X							
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS			X		X		X		X							
DESGARROS			X		X		X		X							
ESTIRAMIENTO EXCESIVO			X		X		X		X							
DETERIORO GENERAL			X		X		X		X							
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS			X		X		X		X							
QUEMADURAS			X		X		X		X							
ESLINGA - MOSQUETONES																
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES			X		X		X		X							
GRIETAS			X		X		X		X							
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			X		X		X		X							
CORROSION			X		X		X		X							
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		Luis Alberto		DERBY		Juan Rodriguez		William								


Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE							
	NÚMERO	1		2		3		4							
	NORMA	ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-4		ANSI-Z359 2014-4							
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X		X		X						
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X		X		X						
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X		X		X						
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X		X		X						
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?			X		X		X		X						
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X		X		X						
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X		X		X						
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X		X		X						
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X		X		X						
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		LUIS ALBERTO		DERBY		JUAN PABLO		WILLIAM R							

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA															
	NOMBRE	LUIS		DERBY		JUAN PABLO		WILLIAM R							
	FIRMA	ALBERTO													

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS

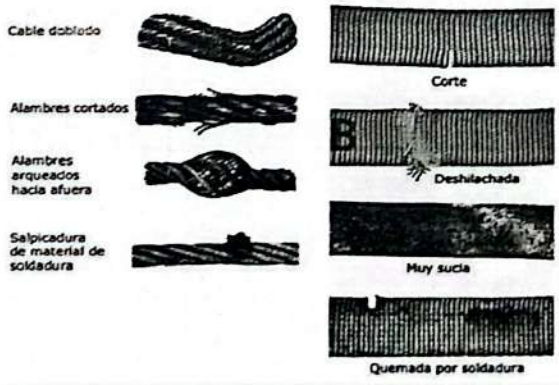

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL [illegible].26 AL 18.07.26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE			Luis	Luis	Luis	Luis	Luis							
FIRMA			Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE			Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero	Adriana Forero							
FIRMA			Admf	Admf	Admf	Admf	Admf							

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el día en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar - ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 14.07.26 AL 18.07.26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA NOMBRE			DEYBY I		DEYBY		DEYBY		DEYBY		DEYBY			
FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 04-03-26 AL 08-03-26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saaveda -

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO						
DESGARROS				NO		NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO						
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO						
QUEMADURAS				NO		NO		NO						
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO						
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO						
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO						
CORROSION				NO		NO		NO						
OTROS				NO		NO		NO						
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO						
GRIETAS				NO		NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO						
CORROSION				NO		NO		NO						
OTROS				NO		NO		NO						
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO						
DESGARROS				NO		NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO						
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO						
QUEMADURAS				NO		NO		NO						
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO						
GRIETAS				NO		NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO						
CORROSION				NO		NO		NO						
OTROS				NO		NO		NO						
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**			Jhon Pe		Jhon Pe		Jhon Pe							
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**			Adriana Flores		Adriana Flores		Adriana Flores							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**			Admf		Admf		Admf							

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla segun su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	**PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS**	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar. **ACTIVIDAD:** Instalación perfiles metalicos.

SEMANA DEL 17/07/26 AL 18/07/26 **PROYECTO:** Miguel de cervantes Saavedra

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO										NO				
GRIETAS, BORDES FILOSOS										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS										NO				
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS										NO				
DESGARROS										NO				
ESTIRAMIENTO EXCESIVO										NO				
DETERIORO GENERAL										NO				
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS										NO				
QUEMADURAS										NO				
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES										NO				
GRIETAS										NO				
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										NO				
CORROSION										NO				
OTROS										NO				
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**									William					
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**									Adriana					
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 2 Fecha: 13/8/2024 Pág 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN	dd	mm	aa	Hora
Desde	21	08	26	7:00
Hasta	25	08	26	3:00

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Equipo de soldadura.

Tipo de actividad a realizar: Instalacion de perfiles metalicos Sección o Área: Restaurante escolar

Descripción del Trabajo a Realizar: Soldadora de perfiles metalicos. Altura máxima del trabajo a desarrollar: 6mts.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

	Nombres	Tipo y No Documento	Firma		Nombres	Tipo y No Documento	Firma
1	WILMER BALDERO	80811660		6			
2	Jairo Buitrago	79910706		7			
3	Juan Rodriguez	79546356		8			
4	Luis A	79955405	Luis-A	9			
5	Juan manuel caballero	1076580632	Juanmc.	10			

1.2 ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓											
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓										
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓										
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓											
Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas?		✓		✓		✓		✓		✓										
Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS?	✓		✓		✓		✓		✓											

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

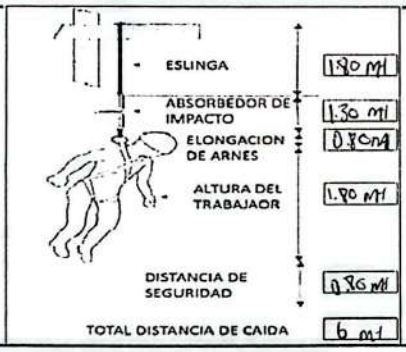

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	Cumple	No Cumple	No Aplica
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		
MONOGAFAS	✓		
GUANTES	✓		
BOTAS CON PUNTERA	✓		
OVEROL	✓		
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		
OTROS:	✓		

¿Cual? Careta para soldar



PERMISOS ADICIONALES

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

	SI	NO
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS:		
TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS:		
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS:		
TRABAJOS EN CALIENTE:		

EN CASO DE RESCATE

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE?	SI	NO
SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS?	SI	NO
SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD?	SI	NO

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN	SI	NO	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	SI	NO
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA	SI	NO	ANDAMIO COLGANTE	SI	NO
ESCALERA FIJA	SI	NO	MANLIFT	SI	NO
OTROS	SI	NO	CUAL ?		

Consorcio Fortaleza	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: F-SGSST-10 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pág 2 de 2

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social?				/			/			/			/			/					
Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?				/			/			/			/			/					
En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ?				/			/			/			/			/					
La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ?				/			/			/			/			/					
Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ?				/			/			/			/			/					
Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ?				/			/			/			/			/					
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente				/			/			/			/			/					
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ?				/			/			/			/			/					
Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ?				/			/			/			/			/					
El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o líneas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ?				/			/			/			/			/					
Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ?				/			/			/			/			/					
Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ?				/			/			/			/			/					
Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ?				/			/			/			/			/					
Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad?				/			/			/			/			/					
Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir?				/			/			/			/			/					

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

C	NC	N.A		C	NC	N.A	
		✓	Presencia de gases y vapores	✓			Contacto con sustancias quimicas
		✓	Contacto con partes en movimiento	✓			Manipulación manual de cargas
		✓	Presencia de tráfico vehicular	✓			Movimientos repetitivos
✓			Caídas de diferente nivel	✓			Adopción de posturas inadecuadas
		✓	Derrames, fugas	✓			Colapsos estructurales
		✓	Cambios bruscos de temperatura	✓			Caída de objetos
✓			Contacto con corriente eléctrica	✓			Manejo de herramientas manuales
		✓	Riesgo de explosión o implosión	✓			Proyección de partículas
✓			Agentes infecciosos	✓			Exposición a ruido
		✓	Presencia de fuentes de ignición	✓			Condición de orden y aseo
✓			Caídas al mismo nivel	✓			Golpes con elementos colgado en alturas
✓			Manipulación de elementos cortantes	✓			Riesgo psicosocial
✓			Contacto con objetos a temperaturas extremas			✓	Otros cuáles?

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)

FECHA Y HORA	SUPENDIDO POR: (Nombre Completo)	

RAZON DE LA SUSPENSION

NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.

4. CIERRE DEL PERMISO

Aspecto	S	N	NA	Aspecto	S	N	NA
El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ?				Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ?			
Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ?				El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ?			
Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo (Candados), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ?				La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ?			

5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA APERTURA (dd/mm/aa)	NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)	NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS
21-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero
FECHA CIERRE (dd/mm/aa)	**NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, Jefe Inmediato)**	**NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS**
25-07-2026	Adriana Forero	Adriana Forero

Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 1 de 2

ÁREA DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos

FECHA DE INSPECCIÓN 2-01-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE						
NÚMERO	1		4		3		2		5						
NORMA	ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11						
REVISE ARNES Y CINTAS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		X		X		X		X		X					
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		X		X		X		X		X					
DESGARROS		X		X		X		X		X					
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		X		X		X		X					
DETERIORO GENERAL		X		X		X		X		X					
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		X		X		X		X		X					
QUEMADURAS		X		X		X		X		X					
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS															
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		X		X		X		X					
GRIETAS, BORDES FILOSOS		X		X		X		X		X					
DETERIORO GENERAL		X		X		X		X		X					
CORROSION		X		X		X		X		X					
ARNES - HEBILLAS															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		X		X		X		X		X					
GRIETAS		X		X		X		X		X					
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		X		X		X		X					
CORROSION		X		X		X		X		X					
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA	William R		Juan Rodriguez		Juan Rivera		Luis A Alberto		Juan marulanda Juan G.						

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO															
MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE						
NÚMERO	1		4		3		2		5						
NORMA	ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11		ANSI-Z359 2014-11						
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS		X		X		X		X		X					
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS		X		X		X		X		X					
DESGARROS		X		X		X		X		X					
ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		X		X		X		X					
DETERIORO GENERAL		X		X		X		X		X					
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS		X		X		X		X		X					
QUEMADURAS		X		X		X		X		X					
ESLINGA - MOSQUETONES															
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES		X		X		X		X		X					
GRIETAS		X		X		X		X		X					
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		X		X		X		X					
CORROSION		X		X		X		X		X					
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA	William R		Juan Rodriguez		Juan Rivera		Luis A Alberto		Juan marulanda Juan G.						


Consorcio Fortaleza	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: F-SGSST-11 Rev. 0 Fecha: 13/8/2024 Pag 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO														
	MARCA	INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE		INSAFE				
	NÚMERO	1		1		1		1		1				
	NORMA	ANSI-E359 2014-1		ANSI-E359 2014-1		ANSI-E359 2014-1		ANSI-E359 2014-1		ANSI-E359 2014-1				
LINEA DE VIDA		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN?			X		X		X		X		X				
CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS?			X		X		X		X		X				
FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS?			X		X		X		X		X				
ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS?			X		X		X		X		X				
DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO?			X		X		X		X		X				
OJETES DEFORMADOS O ROTOS?			X		X		X		X		X				
DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS?			X		X		X		X		X				
APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE?			X		X		X		X		X				
INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE?			X		X		X		X		X				
RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA		William Jairo B.R.		Jairo Juan		Luis Alberto		Juan manuel Juan mc.							

OBSERVACIONES

QUIEN INSPECCIONA											
	NOMBRE	William Jairo B.R.		Jairo Juan		Luis		Juan manuel			
	FIRMA	William Jairo B.R.		Jairo Juan		Alberto		Juan mc.			

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS

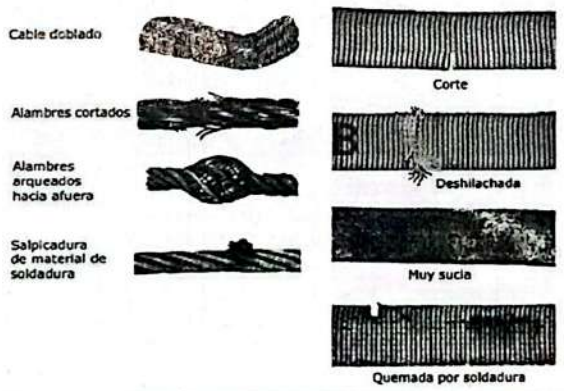

Consorcio Fortaleza	**PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS**	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: Instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 21.07.26 AL 25.07.26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO								
DESGARROS				NO		NO								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO								
QUEMADURAS				NO		NO								
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO								
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO								
GRIETAS				NO		NO								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO								
DESGARROS				NO		NO								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO								
QUEMADURAS				NO		NO								
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO								
GRIETAS				NO		NO								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**			William B		William B									
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**			Adriana Forero		Adriana Forero									
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y tiene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar. ACTIVIDAD: instalacion perfiles metalicos

SEMANA DEL 21 04 26 AL 25 04 26 PROYECTO: Miguel de cervantes Bagovia.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO								
DESGARROS				NO		NO								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO								
QUEMADURAS				NO		NO								
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO								
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO								
GRIETAS				NO		NO								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO								
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO								
DESGARROS				NO		NO								
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO								
DETERIORO GENERAL				NO		NO								
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO								
QUEMADURAS				NO		NO								
ESLINGA - MOSQUETONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO								
GRIETAS				NO		NO								
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO								
CORROSION				NO		NO								
OTROS				NO		NO								
QUIEN INSPECCIONA NOMBRE			David B. T.		Jairo B. R.									
FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero									
FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla segun su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Codigo: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 21 de 26 AL 25 01 26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS, BORDES FILOSOS				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS				NO		NO		NO		NO		NO		
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DESGARROS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESTIRAMIENTO EXCESIVO				NO		NO		NO		NO		NO		
DETERIORO GENERAL				NO		NO		NO		NO		NO		
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUEMADURAS				NO		NO		NO		NO		NO		
ESLINGA - MOSQUETONES	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES				NO		NO		NO		NO		NO		
GRIETAS				NO		NO		NO		NO		NO		
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				NO		NO		NO		NO		NO		
CORROSION				NO		NO		NO		NO		NO		
OTROS				NO		NO		NO		NO		NO		
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE			Juan Pablo		Juan Pablo		Juan Pablo		Juan Pablo		Juan Pablo			
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA														
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE			Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero		Adriana Forero			
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA														

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos.

SEMANA DEL 26 al 26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS						NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS						NO		NO						
DESGARROS						NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS						NO		NO						
QUEMADURAS						NO		NO						
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO						NO		NO						
GRIETAS, BORDES FILOSOS						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES						NO		NO						
GRIETAS						NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS						NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS						NO		NO						
DESGARROS						NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS						NO		NO						
QUEMADURAS						NO		NO						
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES						NO		NO						
GRIETAS						NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
QUIEN INSPECCIONA — NOMBRE					LUIS		LUIS							
QUIEN INSPECCIONA — FIRMA					ALBERTO		ALBERTO							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — NOMBRE					Adriana Polanc		Adriana Polanc							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — FIRMA					Adrianf		Adrianf							

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Consorcio Fortaleza	PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS	Código: F-SGSST-20 Rev. 0 Fecha: 13/08/2024 Pag 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Restaurante escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles metalicos

SEMANA DEL 21.07.26 AL 25.07.26 PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra -

DIA DE LA INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
REVISE ARNES Y CINTAS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS						NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS						NO		NO						
DESGARROS						NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS						NO		NO						
QUEMADURAS						NO		NO						
ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS														
DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO						NO		NO						
GRIETAS, BORDES FILOSOS						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
ARNES - HEBILLAS														
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES						NO		NO						
GRIETAS						NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA:**													
FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS						NO		NO						
COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS						NO		NO						
DESGARROS						NO		NO						
ESTIRAMIENTO EXCESIVO						NO		NO						
DETERIORO GENERAL						NO		NO						
DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS						NO		NO						
QUEMADURAS						NO		NO						
ESLINGA - MOSQUETONES	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON:**													
DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES						NO		NO						
GRIETAS						NO		NO						
DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO						NO		NO						
CORROSION						NO		NO						
OTROS						NO		NO						
QUIEN INSPECCIONA — **NOMBRE**					Juan manuel c.		Juan manuel c.							
QUIEN INSPECCIONA — **FIRMA**					Juan mc.		Juan mc.							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **NOMBRE**					Adriana Forero		Adriana Forero							
PERSONAL SST/JEFE DE AREA — **FIRMA**					Adm		Adm							

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

SI	NO

Bogotá D.C., junio 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79255905, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: LINA STEPHANY GIRALDO GARZON
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 17/05/2026 a 20/05/2026
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 2 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
04 DÍA	11 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALBERTO	Masculino	64 Años	CC (Tipo)	79255905 (Número)

Cargo **OFICIAL DE OBRA**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
CONTROL ANUAL POR MEDICO GENERAL	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEGÚN ÁREA DE TRABAJO.
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y TRABAJO EN ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma: Tayde Avila Garcia — MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL L.S.O 3274-2022
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: Luis Alberto Rodriguez
Nombre: RODRIGUEZ ROJAS LUIS ALBERTO
CC 79255905

Bogotá D.C., junio 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79546356, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TRABAJO EN ALTURAS SAS
ENTRENADOR: JOHN JAIRO GUACANEME GONZALEZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TRABAJO EN ALTURAS SAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 14/02/2026 a 14/02/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 2 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
27 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE	Masculino	55 Años	CC (Tipo)	79546356 (Número)

Cargo **OFICIAL DE OBRA**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCI"N ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEG"N "REA DE TRABAJO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
" REALIZAR LAVADOS DE MANOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA OMS
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACI"N EN HIGIENE POSTURAL Y ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL"GICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" H"BITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma: Tayde Avila Garcia MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL LIC/S.O 3274-2022

Nombre: TAYDE AVILA GARCIA

R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: Juan Rene Rodriguez

Nombre: RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE

CC 79546356

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que WILLIAM ROMERO GARZON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 80811660, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: LINA STEPHANY GIRALDO GARZON
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS S.A.S
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCI?N
FECHAS DE FORMACIÓN: 04/07/2025 a 07/07/2025
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 4 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
14 DÍA	11 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ROMERO GARZON WILLIAM	Masculino	41 Años	CC (Tipo)	80811660 (Número)

Cargo **INSTALADOR**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCI"N ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEG"N "REA DE TRABAJO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
" REALIZAR LAVADOS DE MANOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA OMS
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACI"N EN HIGIENE POSTURAL Y ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL"GICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" H"BITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma:
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma:
Nombre: ROMERO GARZON WILLIAM
CC 80811660

Bogotá D.C., junio 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOHAN FERNANDO VERA DIAZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1013669495, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 01/04/2026 a 01/04/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día junio 2 de 2026

ConstruSaludIPS SAS
NIT: 901128984-8
Dir CL 27 sur # 19 B - 53
Bogota, Colombia
Cel 3241059590

Valide su certificado en:
www.construsaludips.com

Autenticación QR - Escanea

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Empresa **ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7**
Paciente **JOHAN FERNANDO VERA DIAZ**
Doc Identidad **1013669495**
Ocupacion **PINTOR**
Eps **FAMISANAR**

Fecha **27/FEBRERO/2026**
Edad **29 Años**
Peso **70 Kg**
Estatura **1.67 cm** RH **B +**



TIPO DE EXAMEN INGRESO: ☑ RETIRO: ☐ PERIODICO: ☐ ALTURAS: ☑ CASO OCUPACIONAL: ☐ ESPACIOS CONFINADOS: ☑

Servicios realizados

- Medicina Ocupacional ✔
- Audiometría ✔
- Visiometría ✔
- Espirometría ✔
- Psicotest De Alturas ✔
- Enfasis Osteomuscular Prueba Vestibular Fuera Muscular. ✔

Pruebas de laboratorio

- Perfil Lipidico ✔
- Glicemia ✔

Concepto

Sin restricción para el cargo - Sin restricción para trabajo en alturas.

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO
Apto para el Cargo	☑	☐
Apto sin Restricciones Medicas Para Trabajar en Alturas	☑	☐
Apto para Trabajar en Espacios Confinados	☑	☐
Apto para Participar En la Brigada	☐	☐
Apto para el Requerimiento del Cargo de la Empresa o Contratista.	☑	☐

EXAMEN PERIODICO	SI	NO
Apto Para Continuar Desempeñando el Cargo Sin Limitaciones.	☐	☐
Apto para Trabajar En Espacios Confinados	☐	☐
Apto sin Restricciones Medicas Para Trabajar en Alturas	☐	☐
Requiere Restricciones de Actividades	☐	☐
Requiere Reubicacion Laboral Temporal	☐	☐
Apto para el Requerimiento del Cargo de la Empresa o Contratista.	☐	☐

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de Enfermedad	☐	☐
Secuelas de Accidente de Trabajo	☐	☐
Enfermedad Comun	☐	☐

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Control De Peso.
Evitar Fumar.
Ejercicio Frecuente.
Lavado de Manos Frecuente.

RECOMENDACIONES MEDÍCAS

Control Medico Anual.
Pausas Activas Durante Jornada Laboral.
Control Auditivo Anual.

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

Usar Elementos de Proteccion Temporal EPP.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

VISUAL: ☐ AUDITIVO: ☐ RESPIRATORIO: ☐ CARDIOVASCULAR: ☐ PSICOSOCIAL: ☐ ERGONOMICO: ☐ OTROS: ☐

ANALISIS: La certificación de las condiciones de salud para realizar trabajos en alturas, está reglamentada por uso de los EPP frente a la pandemia del COVID - 19 seleccionados en funcion del peligro para el trabajador NO presenta morbilidades preexistentes segun circular 030 del 2020.

Valoración Medica Ocupacional y Paraclinicos Segun Resolucion N.4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo y establece que todo trabajador que vaya a realizar este tipo de tareas se debe realizar un Examen Médico Ocupacional para certificar la conformidad con los requisitos establecidos.

MÉDICO

Dr. Nicolas Chaparro Sanmiguel
Médico Esp. SST Reg. 258855/11
Lic. 1362115

Firma:
Nombre: NICOLAS CHAPARRO SANMIGUEL
R.M.: 25885511 L.S.O.: 1362115
Medico Salud Ocupacional

Aspirante o Trabajador

Johan Vera

Firma:
Nombre: JOHAN FERNANDO VERA DIAZ
CC: 1013669495

* Firma autorizada desde el consentimiento informado

Bogotá D.C., agosto 4 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1024516278, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 20/05/2026 a 20/05/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día agosto 4 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
25 DÍA	11 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
TORRES SAIZ DEYBY ALEXANDER	Masculino	34 Años	CC (Tipo)	1024516278 (Número)

Cargo **OFICIAL**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	USO DE CORRECCION VISUAL.

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
" USAR ELEMENTOS DE PROTECCI"N ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEG"N "REA DE TRABAJO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
" REALIZAR LAVADOS DE MANOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA OMS
" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.
" CAPACITACI"N EN HIGIENE POSTURAL Y ALTURAS
" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL"GICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES
RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)
" H"BITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma:
Nombre: TAYDE AVILA GARCIA
R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma:
Nombre: TORRES SAIZ DEYBY ALEXANDER
CC 1024516278

Bogotá D.C., agosto 4 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1012436533, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: INSTITUTO RR
ENTRENADOR: DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: INSTITUTO RR SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: ROAD DERJ SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 01/04/2026 a 01/04/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día agosto 4 de 2026

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
21 DÍA	10 MES	2025 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ROAD DERJ SAS NIT: 901951520-7

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN	Masculino	29 Años	CC (Tipo)	1012436533 (Número)

Cargo **OFICIAL**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	OPTOMETRIA	✔
PERFIL LIPIDICO	✔	GLICEMIA	✔
OSTEOMUSCULAR	✔		

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

" USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN FORMA CORRECTA SEGÚN ÁREA DE TRABAJO.

" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.

" CAPACITACIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y TRABAJO EN ALTURAS

" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)

" HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma: Tayde Avila Garcia — MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL LIC/S.O 3274-2022

Nombre: TAYDE AVILA GARCIA

R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: ERIC RODRIGUEZ

Nombre: RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN

CC 1012436533

Curso Coordinadora alturas

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

empresalud OCUPACIONAL

Calle 35 N° 15-56 Teusaquillo.
Tel. (091) 8 05 24 68
E-mail. empresaludocupacional@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia



TRABAJO EN ALTURAS - OSTEOMUSCULAR

Certificado de aptitud: 1234644444-254247

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	13/01/2026 - BOGOTA D.C	**Tipo de Examen:**	PRE - INGRESO
Paciente:	YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ	**Identificación:**	1234644444
Género	FEMENINO **Edad:** 26	**Teléfono**	**Móvil:** 3219154185
Fecha Nacimiento:	12/05/1999	**Cargo:**	COORDINADOR DE ALTURAS
Estado Civil:	UNION LIBRE	**EPS:**	NUEVA E.P.S
Dirección	DIAF 50 A SUR NO 54 23	**Escolaridad:**	TECNÓLOGO
Empresa	CONSORCIO FORTALEZA		

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
OPTOMETRIA	USO DE EPP, CONTROL ANUAL
MEDICINA OCUPACIONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CAPACITACION EN RIESGOS LABORALES, CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA
PERFIL LIPIDICO	REALIZADO
GLICEMIA BASAL	REALIZADO
PRUEBA DE EMBARAZO	REALIZADO
PRUEBA DE VERTIGO	REALIZADO

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL

Observaciones:

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica o Programa de Prevención y Promoción

NO

Información de Remisiones

NO

Se entrega certificado de APTITUD LABORAL, Señor(a) trabajador(a) a partir de la fecha, usted cuenta con un mes para seguir y realizar las recomendaciones que son registradas en este documento por el Médico Ocupacional.

'CONSENTIMIENTO INFORMADO - POLITICA DE PROTECCION DE DATOS.
EMPRESALUD OCUPACIONAL. Se acoge a las disposiciones de la ley 1581 de 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de proteccion de datos personales.

Yo en calidad de paciente previamente informado(a) de forma libre y voluntaria acepto: que los datos que he suministrado sean incorporados en la base de datos, ademas, autorizo la realizacion del examen medico ocupacional y paraclinicos registrados en este documento; he recibido informacion de la naturaleza y proposito de estos examenes. Certifico que la informacion dada por mi en la historia clinica ocupacional es veridica y completa.'

Dra. Tatiana Martelo Forero
Esp. Salud Ocupacional y t...
R.M. 52.961.403
Lic. S.O. 2987/2019

TATIANA MARTELO FORERO	2987/2019 52961403	YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ	1234644444
Médico Especialista en Seguridad y Salud en el		Firma y cédula del Paciente	

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:
YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ

Identificado con
Cédula de ciudadanía Nº 1234644444

EMPRESA: CONSORCIO FORTALEZA
NIT: 901973588-1
R. LEGAL: NEIRA RUBIANO CRISTIAN ADOLFO
ARL: SURA

Cursó y aprobó la acción de formación en

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Realizado en Bogotá del (25) del mes de febrero de 2026 al (25) del mes de febrero de 2026 con una intensidad de 8 horas.

DAYANN STEPHANIE SANCHEZ PEREZ
1000619268
Licencia SO N° 5103

Edwin Johan Rivera
C.C. 1.023.911.376
Representante Legal
Instituto Educativo RR

17348

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (25) del mes de febrero de 2026

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2024220000000051285 del 31 de Octubre de 2024 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad #30.512-1 emitida por CELAC con acreditación 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional LIC. SST Nº 17245 DE 7/05/2014 que autoriza a la empresa INSTITUTO RR S.A.S ubicada en Bogotá D.C en Cr 72D No.38 B Sur 57, con NIT 901807119. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.

VERIFICACIÓN correo Rr.edusas@gmail.Com

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS

INSTITUTO RR

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:
YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ

Identificado con
Cédula de ciudadanía Nº 1234644444

EMPRESA: CONSORCIO FORTALEZA
NIT: 901973588-1
R. LEGAL: NEIRA RUBIANO CRISTIAN ADOLFO
ARL: SURA

Cursó y aprobó la acción de formación en

COORDINADOR PARA TRABAJO EN ALTURAS

Realizado en Bogotá del (26) del mes de febrero de 2026 al (07) del mes de marzo de 2026 con una intensidad de 80 horas.

EDWIN ORLANDO SAAVEDRA PAEZ
1022964049
Licencia SO N° 6846

Edwin Johan Rivera
C.C. 1.023.911.376
Representante Legal
Instituto Educativo RR

17648

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (07) del mes de marzo de 2026

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2024220000000051285 del 31 de Octubre de 2024 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad #30.512-1 emitida por CELAC con acreditación 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional LIC. SST Nº 17245 DE 7/05/2014 que autoriza a la empresa INSTITUTO RR S.A.S ubicada en Bogotá D.C en Cr 72D No.38 B Sur 57, con NIT 901807119. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.

VERIFICACIÓN correo Rr.edusas@gmail.Com

Trabajo en caliente

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 30 | MES (mm) 06 | AÑO (aa) 2026 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 04 | MES (mm) 07 | (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Restaurante escolar — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Desmonte de cubierta y canal.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de soldadura.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médica ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada ca

COMO **EJECUTOR:** He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO **EMISOR:** He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
30-06-2026	7:00 A.M - 5:00 PM	Admin - 1234444444	79546356
01-07-2026	7:00 A.M - 5:00 PM	Admin - 1234444444	79546356
02-07-2026	7:00 A.M - 5:00 PM	Admin - 1234444444	79546356
03-07-2026	7:00 A.M - 5:00 PM	Admin - 1234444444	79546356
04-07-2026	7:00 A.M - 5:00 PM	Admin - 1234444444	79546356

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [✓] El trabajo ha sido terminado
- [✓] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [✓] Entrego el área limpia y libre de desechos y

79546356
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EMISOR/EJECUTOR EXCEDIDO: Personalmente he verificado que:

- [✓] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [✓] Se ha terminado satisfactoriamente el
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admin - 1234444444
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 01-07-2026 3:20 pm

OBSERVACIONES:

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 06 | MES (mm) | AÑO (aa) — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 11 | MES (mm) 07 | (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Restaurante escolar — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: instalacion de perfiles metalicos.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de soldadura.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos — SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
06-07-2026	7:00 A.m - 5:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356
07-07-2026	7:00 A.m - 5:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356
08-07-2026	7:00 A.m - 5:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356
09-07-2026	7:00 A.m - 5:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356
10-07-2026	7:00 A.m - 5:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356
11-07-2026	7:00 A.m - 3:00 p.m	Adriana - 1234644444	79'546'356

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada caso)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [SI] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y

Jean Rodriguez 79'546'356
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EJECUTOR EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Adriana - 1234644444
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 11-07-26 - 3:00 pm

OBSERVACIONES:

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 14 | MES (mm) 07 | AÑO (aa) 2016 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 18 | MES (mm) 07 | (aa)

ÁREA O LUGAR: Restaurante escolar — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalacion perfiles metalicos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de Soldadura.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
14-07-16	7:00 AM - 5:00 PM	Admt - 1234.644444	79546356
15-07-16	7:00 Am - 5:00 pm	Admt - 1346444444	79546356
16-07-16	7:00 A.m - 5:00 PM	Admt - 1234644444	79546356
17-07-16	7:00 A.m - 5:00 Pm	Admt - 1234644444	79546256
18-07-16	7:00 A.m - 300 pm	Admt - 1234644444	79546256

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada caso)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [Si] El trabajo ha sido terminado
- [Si] El sitio y los equipos quedan en condiciones
- [Si] Entrego el área limpia y libre de desechos y

79546356

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EJECUTOR EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [Si] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [Si] Se ha terminado satisfactoriamente el
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admt - 1234644444

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm)

18-07-16 - 3:00 pm

OBSERVACIONES:

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 14 MES (mm) 01 AÑO (aa) 16 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 18 MES (mm) 01 (aa) 2016

ÁREA O LUGAR: Restaurante exterior — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalación de cubierta - perfiles.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de soldadura.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1 Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]

2 Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]

3 Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.
14-01-16	7:00 AM - 5:00 pm	Adonit - 1234444444	[illegible] 3991716
15-01-16	7:00 AM - 5:00 pm	Adonit - 1234444444	[illegible] 3991716

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada caso)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [SI] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

[illegible] 3991716.

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EJECUTOR EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [SI] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Adonit - 1234444444.

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm)

01-01-2016 - 3:00 pm

OBSERVACIONES:

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 21 MES (mm) 01 AÑO (aa) 2026 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 25 MES (mm) 01 (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Restaurante segundo piso — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: instalacion perfiles metalicos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de Soldadura.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
21-01-2026	7:00 A.M - 5:00 pm	Admf - 1234644444	80811680
22-01-2026	7:00 A.M - 5:00 pm	Admf - 1234644444	80811680

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada ca

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [SI] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y

80811680
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EJECUTOR EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admf - 1234644444
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm)
22-01-2026 : 5:00 pm

OBSERVACIONES:

Consorcio Fortaleza

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 11 MES (mm) 07 AÑO (aa) 2026 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 25 MES (mm) 07 (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Restaurante cocina — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: instalacion perfiles metalicos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de soldadura

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [✓] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	✓		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			✓
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	✓		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			✓
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	✓		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	✓		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	✓		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			✓
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	✓		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	✓		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	✓		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			✓
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			✓
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			✓
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			✓
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			✓

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	✓		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELECTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	✓	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [✓] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [✓]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [✓]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [✓]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
11-07-2026	7:00 Am - 5:00 pm	Admt - 1234644444	79'546 356
12-07-2026	7:00 A.m - 5:00 pm	Admt - 1234644444	79'546 356
13-07-2026	7:00 A.m - 5:00 pm	Admt - 1234644444	79'546 356
14-07-2026	7:00 A.m - 5:00 pm	Admt - 1234644444	79'546 356
25-07-2026	7:00 Am - 3:00 pm	Admt - 1234644444	79'546 356

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada ca

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [SI] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y

79'546 356

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

EJECUTOR EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admt - 1234644444

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (a.m o p.m): 25-07-26. 5:00 pm

OBSERVACIONES:

Anexo 8. registro fotografico

7.2 Registros Fotográficos

Actividad: Disposicion final teja de asbesto	
	
Registro 1: Disposición del material.	Registro 2:Disposición del material.
	
Registro 3: Disposición del material.	Registro 4: Disposición del material.

Actividad: Entrega de EPP	
	
Registro 1: Entrega de EPP	Registro 2: Entrega de EPP
	
Registro 3: Entrega de EPP	Registro 4: Entrega de EPP

Actividad: Inspecciones de EPPC	
	
Registro 1: Inspección	Registro 2: Inspección
	
Registro 3: Inspección	Registro 4:Inspección

Actividad: Nivelación de terreno	
	
Registro 1: Nivelación	Registro 2: Nivelación
	
Registro 3: Nivelación	Registro 4: Nivelación

Actividad: Instalación de perfiles metalicos	
	
Registro 1: Instalación	Registro 2: Instalación
	
Registro 3: Instalación	Registro 4: Instalación

Actividad: Pintura de perfiles metálicos	
	
Registro 1: Pintura	Registro 2: Pintura
	
Registro 3: Pintura	Registro 4: Pintura

Actividad: Inspeccion de herramienta	
	
Registro 1: Inspección	Registro 2: Inspección
	
Registro 3: Inspección	Registro 4: Inspección

Anexo 8. Registro fotográfico

Anexo 9. Planillas de seguridad

Planilla Fortaleza

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973588	1	CONSORCIO FORTALEZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL2	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536572672	9509084790	E	2026/08/25	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,808,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1234644444	FORERO HERNANDEZ YAZMIN ADRIANA																		230301	30	$1,908,000	$305,300	EPS037	30	$1,908,000	$76,400	CCF24	30	$1,908,000	$76,400	14-11	30	$1,908,000	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
2	PT	5769290	GOMEZ LAGUNA ALEXANDER JOSE		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	PT	1426983	INFANTE CONTRERAS JOCSAN MEHIR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1123114000	JARAMILLO MERA MAICOL ANDRES																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1022942714	LOPEZ PARRA LEXON ALEXANDER																		230301	30	$1,908,000	$305,300	EPS017	30	$1,908,000	$76,400	CCF24	30	$1,908,000	$76,400	14-11	30	$1,908,000	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
Total	**Afiliados(5)**																						$9,068,715	$1,451,200			$9,068,715	$363,100			$9,068,715	$363,100			$9,068,715	$631,300		$0	$0		$2,808,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973588	1	CONSORCIO FORTALEZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL2	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536572672	9509084790	E	2026/08/25	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,808,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,451,200	$0	$0	$1,451,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$890,800	$0	$0	$890,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$631,300	$0	$0	$631,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$631,300	$0	$0	$631,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$363,100	$0	$0	$363,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$363,100	$0	$0	$363,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$363,100	$0	$0	$363,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$146,500	$0	$0	$146,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,400	$0	$0	$76,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**5**	**$2,808,700**	**$0**	**$0**	**$2,808,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274445	8	HINCA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 25 A 37 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	536588793	9509085258	E	2026/08/13	2026/08/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,338,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																								**$13,152,715**	**$2,104,600**			**$13,152,715**	**$526,300**			**$13,152,715**	**$526,300**			**$13,152,715**		**$181,700**		**$0**	**$0**		**$3,338,900**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$121,900**		**$0**	**$0**		**$542,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$121,900**		**$0**	**$0**		**$542,300**
1	CC	1098170535	MONCADA PARDO ROGELIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																								**$11,401,810**	**$1,824,400**			**$11,401,810**	**$456,200**			**$11,401,810**	**$456,200**			**$11,401,810**		**$59,800**		**$0**	**$0**		**$2,796,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								**$11,401,810**	**$1,824,400**			**$11,401,810**	**$456,200**			**$11,401,810**	**$456,200**			**$11,401,810**		**$59,800**		**$0**	**$0**		**$2,796,600**
2	CC	80122243	BALLESTEROS MORENO HECTOR JULIO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1030685145	FERIA OSPINA JEIFRY STIVEN																			230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
4	CC	1030676323	NEIRA RUBIANO CRISTIAN ADOLFO																			230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1000834492	RAMIREZ GALINDO JUAN DANIEL																			230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
6	CC	1023012294	SOTELO PINEDA DIEGO ALEXANDER																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1022933112	SOTELO PINEDA MONICA ALEJANDRA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(7)**																					$13,152,715	$2,104,600			$13,152,715	$526,300			$13,152,715	$526,300			$13,152,715		$181,700		$0	$0		$3,338,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,104,600	$0	$0	$2,104,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,256,200	$0	$0	$1,256,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$848,400	$0	$0	$848,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$181,700	$0	$0	$181,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$181,700	$0	$0	$181,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$526,300	$0	$0	$526,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$526,300	$0	$0	$526,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$526,300	$0	$0	$526,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$316,000	$0	$0	$316,000
TOTAL				**7**	**$3,338,900**	**$0**	**$0**	**$3,338,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019093502		PARRA CHAVARRIA TATIANA EDIRLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 55a#128a-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7045486	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476113465	9506445844	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCOLOMBIA	12	$539,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
1	CC	1019093502 PARRA TATIANA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$534,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$400	$0	$35,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$400	$0	$35,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
TOTAL				**1**	**$534,200**	**$4,900**	**$0**	**$539,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110710-1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CL 73 14 A 16 SUR	3236461269	contabilidad.arco41@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94101464	04/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3.501.810	$1.102.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	243.800				243.800	0	0	243.800			3.438	243.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	140.200	0	0	140.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	69	0	0	0
ICBF				
0	69	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	437.800	437.800
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	243.800	243.800
CCF	1	140.200	140.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.102.000	1.102.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110710-1	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CL 73 14 A 16 SUR	3236461269	contabilidad.arco41@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94101464	04/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3.501.810	$1.102.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 7303829	SOTELO CASTILLO LUIS ENRIQUE	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1022986602	SOTELO PINEDA LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205	3275199	GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37990167	E	2026-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.104.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
21	37990167	2026-07-21	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 71266057	ALZATE MONTOYA JUAN DAVID	5.500.000	F	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.200.000	88.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
2	CC 1032423397	ARIAS BOTELLO ZUNEILE PAOLA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001
3	CC 18616136	ARISTIZABAL VARGAS EDISON	6.200.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	206.667	33.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	206.667	8.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	206.667	8.300	206.667	14.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	64.100	S	5711001
4	CC 10104180	CASTRILLON TRUJILLO ENRIQUE	14.200.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	14.200.000	568.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	14.200.000	568.000	14.200.000	988.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	2.124.400	S	5711001
5	CC 30305509	CUARTAS GOMEZ ADRIANA	4.800.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	6.780.000	271.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	6.780.000	271.200	6.780.000	471.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	1.014.300	S	5711001
6	CC 1070023689	FARFAN QUIMBAYO DAVID ANTONIO	2.860.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.860.000	457.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.860.000	114.400	COMPENSAR-CCF24	2.860.000	114.400	2.860.000	199.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	885.500	S	5711001
7	CC 14280853	GALEANO DUCUARA ALONSO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	149.400	S	1711001
8	CC 18511603	GIL ESCOBAR CARLOS HUGO	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	6.200.000	248.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	6.200.000	248.000	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.919.600	S	5711001
9	CC 73102171	LICERO ARZUZA CARLOS ENRIQUE	5.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	822.800	S	5711001
10	CC 43615303	MARIN DUQUE MARIA CATALINA	7.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	7.200.000	1.152.000	36.000	36.000	EPS SURA-EPS010	7.200.000	288.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	7.200.000	288.000	7.200.000	501.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.301.200	S	5711001
11	CC 24604191	NARANJO RIOS MARLENY	6.200.000	F	X	X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.200.000	248.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.366.700	254.700	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.926.300	S	5711001
12	CC 13716808	NEWBALL CHRISTIE ROBERTO	2.000.000	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	CAJASAI-CCF64	2.333.300	93.400	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	632.600	S	5711001
13	CC 1035850444	OCHOA ESCOBAR ALEJANDRA	2.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.750.000	440.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.750.000	110.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.750.000	110.000	2.750.000	191.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	851.400	S	5711001
14	CC 38870864	PALACIOS MONTOYA MARIA ELENA	2.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.450.000	392.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.450.000	98.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.450.000	98.000	2.450.000	170.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	758.600	S	5711001
15	CC 10106946	PERALTA RUIZ JAVIER IVAN	4.900.000	F										X						0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	10.900.000	436.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	10.900.000	436.000	10.900.000	758.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	1.630.700	S	5711001
16	CC 1010049783	PEREZ MARIN JUAN CAMILO	2.850.000	F		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	1.330.000	212.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.330.000	53.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.923.800	77.000	1.330.000	92.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	435.600	S	5711001
17	CC 35852448	RENTERIA LOZANO MARIA DIANNI	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	EPS SURA-EPS010	6.200.000	248.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.200.000	248.000	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.919.600	S	5711001
18	CC 1006868675	ROBINSON AMOR NIMROD	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAI-CCF64	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
19	CC 1088320191	SUAREZ HERNANDEZ JOHN KENNEDY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
20	CC 10120791	URIBE VEGA IVAN ALEXANDER	6.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	6.200.000	992.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.200.000	248.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	6.200.000	248.000	6.200.000	431.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.919.600	S	5711001
21	CC 1088290044	VELASQUEZ SARAY LAURA	6.000.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.000.000	960.000	0	0	SANITAS-EPS005	6.000.000	240.000	COMPENSAR-CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	417.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.857.600	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816001576	5	CONSULTEC SAS	B	03	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 21 10 47 OF 205		3275199			GERENCIA@CONSULTECINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37990167	E	2026-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	24.104.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	37990167	2026-07-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
59.298.477	98.429.382	98.429.382	99.523.182	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	9.559.900	0	0	0	9.559.900
PORVENIR	230301	800224808	8	8	3.343.700	0	0	0	3.343.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	5.864.200	0	0	0	5.864.200
EPS(Administradoras: 5)				21	3.937.400	0	0	0	3.937.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	1.801.400	0	0	0	1.801.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	646.100	0	0	0	646.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	309.500	0	0	0	309.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	114.400	0	0	0	114.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	1.066.000	0	0	0	1.066.000
ARP(Administradoras: 1)				21	6.626.200	0	0	0	6.626.200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	21	6.626.200	0	0	0	6.626.200
CCF(Administradoras: 4)				21	3.981.300	0	0	0	3.981.300
CAJASAI	CCF64	892400320	5	2	163.500	0	0	0	163.500
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	6	1.208.700	0	0	0	1.208.700
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	3	514.400	0	0	0	514.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	10	2.094.700	0	0	0	2.094.700
Gran Total					24.104.800	0	0	0	24.104.800

Certificado de Aportes

Se certifica que YAMEL ARANGO PINILLA identificado(a) con CC 93286678 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9508491977	535788390	2026-08-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30								
9506740635	423349045	2026-06-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30								
9505437857	354375686	2026-06-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30								
9503906983	278019722	2026-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30								
9502014478	186731664	2026-04-01	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30								
9500230564	104633546	2026-03-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30								
9498555480	29044705	2026-02-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X	
9496640500	2037528028	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30								

Este certificado se expide el día 2026-08-05 a las 23:08.

PAGADO

Subcontratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 09:27:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083169419

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 10/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROAD DERJ SAS	**Nombre Sucursal**	ROADERJ12	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901951520	**Dirección**	CL 65SUR #92 - 50 CASA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3052954330		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	RODRIGUEZ DIAZ ERICK FABIAN	**Identificación**	CC 1012436533		
Total Afiliados	25	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1014267107	BRANDON ALEXIS ZABALA CORONADO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1023883618	FABIAN HUMBERTO FULANO ABRIL	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1023896983	DUBERNEY MORERA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 778.800
CC 1024516278	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033764451	CRISTIAN STIVEN SERRATO SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1044913063	JORGE LUIS NEGRETE MUÑOZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 350.181	$ 56.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 350.181	$ 14.100	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF21) CAFAM	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 1046269770	EDUARDO LUIS SALCEDO PEREZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 408.545	$ 51.100	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 8.200	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 181.900
CC 10820597	TELLO ORTEGA HERNANDEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 5978859	MILCIADES CRUZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 72281140	JOSE JOAQUIN BORNACHERA OROZCO	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 72341181	JOSE JOAQUIN SANTANA OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 78733677	MARCO SEGUNDO LOPEZ HERNANDEZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 408.545	$ 65.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF21) CAFAM	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF21) CAFAM	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
CC 79379775	ORLANDO GARCIA GOMEZ	01	03	X	X															0	0	13	13	13	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 758.726	$ 30.400	6,960	$ 758.726	$ 52.900	(CCF21) CAFAM	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF21) CAFAM	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/07/2026 | **Empresa NI901951520 ROAD DERJ SAS** | **Planilla Nro: 1083169419** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79850016	JOHN JAIRO NOVOA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79974763	LEONARDO ROMERO ESPITIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 80730583	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80811660	WILLIAM ROMERO GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 94472551	LUIS MARIO ROMERO ESPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 26.088.489	$ 26.847.215	$ 26.847.215	$ 26.847.215	$ 4.175.500	$ 1.263.800	$ 1.869.600	$ 1.075.400	$ 44.500	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.495.500	$ 50.400	$ 8.545.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-04, 04:34:30 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084149503

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-04 16:23:29.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCIAL COP SEGURO SAS				
Documento	NI 901365642	**Dirección**	CR 26 SUR #20 - 00 BARRIO RESTREPO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7068152		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MONTOYA ROJAS GERSON MAURICIO	**Identificación**	CC 1023926782		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001064685		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SALAZAR GUAVITA JOSE DANIEL	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.908	230301		16 %	$ 1.750.908	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.908	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.908	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-04, 04:33:40 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084150103

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-08-04 16:27:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCIAL COP SEGURO SAS				
Documento	NI 901365642	**Dirección**	CR 26 SUR #20 - 00 BARRIO RESTREPO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7068152		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MONTOYA ROJAS GERSON MAURICIO	**Identificación**	CC 1023926782		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3171723		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VANEGAS MENDEZ NOLBEIR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.908	230301		16 %	$ 1.750.908	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.908	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.908	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Personal nuevo


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.018.512.685
BUSTOS VIRGUEZ
APELLIDOS
MARLON ESTEVEN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
10-AGO-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-1500150-01111151-M-1018512685-20191114
0068937906G 2
9910732203

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9012674745
9012674745

No. de Radicación SAT: 30297187

Fecha de Radicación: 13 02 2026

1. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades X	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia X - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo X B. Subsidiado ☐	SI ☐ NO ☐	A. Cotizante X B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente X B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN — II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
BUSTOS Primer Apellido	VIRGUEZ Segundo Apellido	MARLON Primer Nombre	ESTEVEN Segundo Nombre

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1018512685	Femenino ☐ Masculino X	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

14. Lugar de nacimiento — País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
			12 D 07 M A 1999 A A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad — Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI ☐ NO X	SI ☐ NO ☐	Nivel ☐ Grupo ☐	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A		$1.750.905	

26. Residencia — Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
			Cabezera Municipal ☐ Rural Disperso ☐ Centro Poblado ☐ Resto Rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres — Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino ☐ Masculino ☐	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

33. Lugar de nacimiento — País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
			D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres — Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico — Femenino	Masculino	40. Sexo identificación — F	M	T	NB	Otro	Cual	41. Lugar de nacimiento — País	Departamento	Municipio	42. Fecha de nacimiento
B1															D D M M A A A A
B2															D D M M A A A A
B3															D D M M A A A A
B4															D D M M A A A A
B5															D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN — SI	NO	48. Clasificación SISBÉN — NIVEL	GRUPO	49. Discapacidad — SI	NO	CATEGORÍA DISCAPACIDAD	50. Incapacidad permanente — SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona — Cabezera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y	NT	901416158	

59. Ubicación	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CALLE 38 SUR 72 Q 54 BLOQUE	30437913		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐
4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código ☐
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar X
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐
15. Traslado: A Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia ☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante ☐
18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado ☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria ☐

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	Femenino ☐ Masculino ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 13 M 02 A 2026	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
☐ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
☐ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
☐ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☐ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
☐ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
☐ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC
Cantidad:								

TOTAL ANEXOS ☐

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. ☐
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ☐
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ☐
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres ☐
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016. ☐
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ☐

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio ☐ Código del departamento ☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: AYUDANTE DE INSTALADOR, CABLES

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Vigilado Supersalud

Cambio Empleo

Medellín, 21 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1018512685	BUSTOS VIRGUEZ MARLON ESTIVEN	13/02/2026		172²V243	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C807393612620238322

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 10:38:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.247.159, 107.154.191.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COLFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

NIT 800.149.496-2

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ, identificado(a) con C.C 1.018.512.685, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6 y al Fondo Cesantias NIT 800.198.644-5.

Se expide la presente certificación a la fecha 18 de junio de 2026.

El presente certificado emitido contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.



Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

CODIGO DE VERIFICACION Y AUTENTICACION

190325/1/A.REE3-22 -21

ALTURAS CUMBRE COLOMBIA

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

NIT: 901 435 596 -3

CERTIFICADOS EN LA NTC 6072 POR BUREAU VERITAS CON ACREDITACION ONAC N° 09 CPR 008 Y CERTIFICADO N° CO 021.01051
APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRABAJO - RES. 4272 DEL 11052021 N° 08SE2021 220000000028476
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS - RES 0491 DEL 21/03/2023 N° 08SE2023220000000011350
LICENCIA DE SERVICIOS SST 330 DEL 21/01/2021

GRUPO CUMBRE COLOMBIA - SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OTORGA LA:

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

A:

MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ

IDENTIFICADO CON: CC 1018512685

POR HABER CURSADO Y APROBADO EL NIVEL DE CAPACITACION

REENTRENAMIENTO

BAJO ESTANDARES Y LINEAMIENTOS RESOLUCION 4272 / 2021

REALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC, DURANTE EL *19/3/2025* *AL* *19/3/2025*

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE ***8 HORAS***

SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL: *23/03/2025* *DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS*
EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Antonio Avellaneda.

ANTONIO AVELLANEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.010.162.920 DE BOGOTA

BRAYAN BRANDON URRUTIA
ENTRENADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
LICENCIA SST 7641 - 21/11/2022

DATOS COMPLEMENTARIOS RESOLUCION 4272 - MINISTERIO DE TRABAJO

SAC SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS & CUBIERTAS

REALIZADO PARA EMPRESA:	*SAC CONSTRUCCIONES S.A.S* *SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CUBIERTAS S.A.S*	***NIT:***	*9 0 1 4 1 6 1 5 8 1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*LUIS ALBERTO PALMA*	***DOCUMENTO ID:***	*80739361*
AFILIACION DEL TRABAJADOR A RIESGOS LABORALES EN:	*ARL SURA*		

WWW.CUMBRECOLOMBIA.COM

Carrera 21 # 68 - 56 Bogotá DC - Colombia I Móvil: 301 382 9000 I info@cumbrecolombia.com

EXAMENES	***ARL***	***ALTURAS***	***CONFINADOS***	***EQUIPOS***	***ANCLAJES***
MEDICOS	*REINVERSION*	*CURSOS*	*ESPACIOS*	*INSPECCION*	*INSTALACION*

Bogotá D.C., marzo 25 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que MARLON ESTEVEN BUSTOS VIRGUEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1018512685, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ALTURAS CUMBRE COLOMBIA SAS
ENTRENADOR: BRAYAN BRANDON URRUTIA ACOSTA
SEDE DONDE SE FORMÓ: ALTURAS CUMBRE COLOMBIA
EMPLEADOR: SAC CONSTRUCCIONES S.A.S
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: ARL SURA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 19/03/2025 a 19/03/2025
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día marzo 25 de 2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.170.535

MONCADA PARDO

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1986

EL PENON
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

10-MAY-2006 EL PEÑON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00793654-M-1098170535-20160225 00486 44877A 2 .1103800043

Medellín, 15 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de HINCA SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1098170535	PARDO PARDO ROGELIO	01/05/2022		1704V611	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306763232619631274

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/07/2026 08:41:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.57.210, 192.230.104.15, 172.16.42.57

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1098170535
NOMBRES	ROGELIO
APELLIDOS	MONCADA PARDO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/09/2016	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	07/15/2026 09:06:52	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ROGELIO MONCADA PARDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.170.535**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Julio del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Paz y
salvos

Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO – PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, OSCAR STEVENS BEDOYA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.033.693.324 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de SOLDADOR. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 04 días del mes de agosto del año 2026.



Firma:
Cargo: SOLDADOR.
C C . 1.033.693.324

Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad

Asunto: PAZ Y SALVO – PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, EDINSON CALDERON AVILES, identificado con cédula de ciudadanía número 80.197.344 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5", mediante la entidad ROAD DERJ SAS con NIT 901951520, en calidad de SOLDADOR. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 04 días del mes de agosto del año 2026.

EDISON CALDERON AVILES

Firma:
Cargo: SOLDADOR.
C.C. 80.197.344

Bogotá, D.C., 05 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Ciudad


Asunto: **PAZ Y SALVO – PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL**

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo, JULIO CESAR GUAVITA MOLINA , identificado con Cedula de ciudadania número 80.095.515 de Bogotá, certifico que estuve vinculado al Contrato de Consorcio Fortaleza, cuyo objeto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 5"**, mediante la entidad Consorcio Fortaleza con NIT T 901973588 en calidad de AUXILIAR DE OBRA. Me permito certificar que el Consorcio Fortaleza está a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico de egreso en los términos establecidos en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 o la que las modifique o sustituya.

El presente PAZ Y SALVO se firma en Bogotá a los 5 días del mes de agosto del año 2026.



Firma:
Cargo: AUXILIAR DE OBRA
C.c. 1031136727

Investigación de accidente

FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Basado en los requisitos generales de la Resolución 1401 de 2007 (Colombia).

1. Información General

Empresa: ROAD DERJ SAS

NIT: 901951520-7

Fecha del accidente: 29 DE JULIO DE 2026

Hora: 14:15

Fecha de investigación: 31 DE JULIO DE 2026

ARL: SURA

Investigadores: JENNYFER CASALLAS QUINTERO – ERICK FABIAN RODRIGUEZ

2. Datos del Trabajador

Nombre: JOSE JOAQUIN SANTANA OSORIO

Cédula: 72341181

Cargo: INSTALADOR

Área: OBRA

Antigüedad:7 MESES

Tipo de contrato: OBRA LABOR

Jefe inmediato: JUAN RENE RODRIGUEZ

3. Descripción del Accidente

Lugar exacto: Área de trabajo donde se realizaban labores en altura, sobre la cubierta de la obra.

Actividad realizada: Ejecución de trabajo en alturas. El trabajador se desplazaba sobre la cubierta para realizar el anclaje a la estructura.

Descripción cronológica del accidente: El trabajador se encontraba realizando labores en altura sobre la cubierta de la edificación, desplazándose sobre la cercha del andamio. En el momento en que procedía a sujetarse de la cercha para realizar su anclaje, las baldosas de la cubierta cedieron y se rompieron, ocasionando la pérdida del apoyo y una caída a diferente nivel de aproximadamente 3 metros de altura, impactando contra el piso.

Lesión: Politraumatismo por caída de altura.

Parte del cuerpo afectada: Miembro superior derecho

Atención recibida: Se activó el protocolo de atención de emergencias, se brindaron primeros auxilios y el trabajador fue trasladado a un centro asistencial para valoración y atención médica.

4. Testigos

Nombre: Juan Rene Rodríguez Rojas

Cargo: Oficial

Versión de los hechos: El trabajador se encontraba realizando labores en altura sobre la cercha de un andamio. En el momento en que intentaba sujetarse de la estructura para anclarse, las baldosas sobre las que se encontraba cedieron y se rompieron, provocando su caída al nivel inferior desde una altura aproximada de 3 metros.

5. Evidencias







6. Análisis de Causas

Actos inseguros:

- Transitar sobre una superficie frágil sin verificar previamente su resistencia.
- Iniciar el proceso de anclaje encontrándose expuesto al riesgo de caída antes de estar asegurado a un punto de anclaje efectivo.

Condiciones inseguras:

- Cubierta con baldosas frágiles o deterioradas que no soportaron el peso del trabajador.
- Ausencia de una superficie de tránsito segura (pasarelas o plataformas) sobre la cubierta.
- Riesgo de caída a diferente nivel por trabajo en altura.

Factores personales:

- No se evidencian factores personales que hayan contribuido directamente al accidente.

Factores del trabajo:

- Planeación insuficiente de la actividad para el desplazamiento sobre cubierta frágil.
- Deficiencias en la identificación y control del riesgo de caída por colapso de la superficie de trabajo.
- Falta de implementación de medidas de protección colectiva para trabajos sobre cubiertas.

7. Medidas Correctivas y Preventivas

Acción	Responsable	Fecha	Seguimiento
Inspeccionar la cubierta antes de iniciar trabajos en altura e identificar zonas frágiles.	Coordinador SST/ Residente de obra	Inmediata	Verificación en inspecciones.
Verificar que el trabajador permanezca conectado al sistema de protección contra	Supervisor de trajo de alturas	Dentro de los 15 días siguientes	Inspecciones y observaciones en campo.

caídas desde el inicio hasta el final de la labor.			
Reforzar la capacitación en trabajo seguro en alturas y desplazamiento sobre cubiertas frágiles.	Coordinador SST	Permanente	Registro de capacitación.
Actualizar el análisis de riesgos y el permiso de trabajo en alturas para este tipo de actividades.	Coordinador SST	Dentro de los 15 días siguientes	Revisión documental.

8. Conclusiones

El accidente ocurrió por el colapso de la superficie de la cubierta al momento en que el trabajador se disponía a realizar su anclaje, ocasionando una caída a diferente nivel de aproximadamente 3 metros. La investigación evidencia la necesidad de fortalecer la planeación de las actividades en altura, la identificación de superficies frágiles y la implementación de medidas de protección colectiva e individuales que garanticen un desplazamiento seguro y prevengan la ocurrencia de accidentes similares.

9. Firmas

Investigador SST:

Jefe inmediato: Juan Rodriguez

Trabajador:

COPASST: Erick Rodriguez

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	EPS002	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: NINGUNA AFP — Código AFP: AFP000

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

Construcción de edificios no residenciales, incluye construcción de todo tipo de edificios no residenciales, reforma o renovación de estructuras existentes, construcciones prefabricadas

Nombre o razón social: Road Derj SAS

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901951520

Dirección	Teléfono	Fax
CL 65 Sur # 92 - 50 Bosa	3057364609	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

Construcción de edificios no residenciales, incluye construcción de todo tipo de edificios no residenciales, reforma o renovación de estructuras existentes, construcciones prefabricadas

Dirección	Teléfono	Fax
CL 65 Sur # 92 - 50 Bosa	3057364609	

Departamento	Municipio	Zona
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
SANTANA	OSORIO	JOSE JOAQUIN

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	72341181	29/01/1982	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 15C # 53B - 06 BARRIO VILLAS DE SOLEDAD	0000000000	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
ATLANTICO	SOLEDAD	(•) U ( ) R	OFICIAL

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
ELECTRICISTAS DE OBRAS Y AFINES	6 meses 16 días

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
13/01/2026	1750905	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
29/07/2026 02:15:00	S	miércoles

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente: 7:15

Tipo de accidente: ( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

( ) Almacenes o depósitos
(•) Áreas de producción
( ) Áreas recreativas o deportivas
( ) Corredores o pasillos
( ) Escaleras
( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
( ) Oficinas
( ) Otras áreas comunes
( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

( ) Cabeza
( ) Ojo
( ) Cuello
( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
( ) Tórax
( ) Abdomen
(•) Miembros superiores
( ) Manos
( ) Miembros inferiores
( ) Pies
( ) Ubicaciones múltiples
( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

( ) Fractura
( ) Luxación
( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
( ) Conmoción o trauma interno
( ) Amputación o ennucleación
( ) Herida
( ) Trauma superficial
(•) Golpe contusión o aplastamiento
( ) Quemadura
( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
( ) Asfixia
( ) Efecto de la electricidad
( ) Efecto nocivo de la radiación
( ) Lesiones múltiples
( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

( ) Máquinas y/o equipos
( ) Medios de transporte
( ) Aparatos
( ) Herramientas, implementos o utensilios
( ) Materiales o sustancias
( ) Radiaciones
(•) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
( ) Otros agentes no clasificados
( ) Animales (vivos o productos animales)
( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

(•) Caída de personas
( ) Caída de objetos
( ) Pisadas, choques o golpes
( ) Atrapamientos
( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
( ) Exposición o contacto con la electricidad
( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
( ) Golpes por o contra objetos
( ) Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LABORES EN ALTURAS, SOBRE LA CERCHA DE UN ANDAMIO, EN EL MOMENTO EN EL QUE INTENTABA SUJETARSE DE LA ESTRUCTURA PARA ANCLARSE, LAS BALDOSAS SOBRE LAS QUE SE ENCONTRABA CEDIERON Y SE ROMPIERON, PROVOCANDO CAIDA AL NIVEL INFERIOR DESDE UNA ALTURA DE 3 METROS

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE — (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA 79546356
Cargo: OFICIAL

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente: 29/07/2026 15:18:10
Fecha de recibido en ARL SURA: 29/07/2026 15:19:01

ARL | sura
RECIBIDO

Fecha Impresión 29-07-2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

+PARATODOS

BIENVENIDOS A LA CLÍNICA DEL FUTURO

INCAPACIDAD MÉDICA

NUMERO INGRESO	NUMERO INCAPACIDAD	FOLIO
1470986	647051	3

E-mail: servicioalcliente@clinicadeloccidente.com - Web site:www.clinicadeloccidente.com.co - Codigo de Prestador:1100109666-01 - Nit: 860090566-1

Fecha Expedición:	30/07/2026 4:52:50 a. m.	**Lugar:**	BOGOTÁ, D.C.	**Tipo Paciente(PLAN):**	Otro	**Documento Paciente:**	
Entidad:	ARP002 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.					**72341181** Cédula_Ciudadanía	
Nombre Paciente:	**JOSE JOAQUIN SANTANA OSORIO**						
Grupo de Servicio:	ConsultaExterna			**Causa Atención:**	Enfermedad_general	**Edad:**	44 AÑOS - 5 MESES - 30 DÍAS
Presunto Origen:	Comun		**Incap. retroactiva:**	Ninguna			
Modalidad:	Intramural	**Clase:**	Inicial			**Fecha Nacimiento:**	29/01/1982

INCAPACIDAD

Días de Incapacidad	Fecha Inicial	Fecha Final
3	30/07/2026	01/08/2026
DIAGNOSTICO QUE ORIGINA LA INCAPACIDAD		
S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	

Médico: YISELTH PATRICIA RANGEL ESPITIA

Registro Médico: 1019154090

Especialidad: MEDICINA GENERAL

Firma

CL. 6A 70 - 86 - 7423099 - Bogotá - Colombia

BOGOTA Secretaría de Educación	**INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°10**	CONSORCIO FORTALEZA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CONTRATO DE OBRA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 CUYO OBJETO ES:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

INFORME MENSUAL N.10 COMPONENTE AMBIENTAL

06 de julio 2026 al 05 de agosto del 2026

BOGOTA D.C

CONTROL DE ENTREGAS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
01	2026-08-06	Creación del documento	Profesional Ambiental

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – CONSORCIO

ELABORÓ	REVISÓ
	
Nombre: Tatiana Parra Ch.	**Nombre:** Cristian Neira Rubiano
Cargo: Profesional Ambiental	**Cargo**: Director de Obra
Fecha:2026-08-06	**Fecha:** 2026-08-06

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – INTERVENTORÍA

APROBÓ

Nombre: Luis Alejandro González
Cargo: Profesional ambiental de Interventoría
Fecha: 21/08/2026
APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5
2.1. Actividades Técnicas Ambientales 6
2.2. Reuniones componente ambiental 6
2.3. Programa de Manejo Ambiental RCD (PMA-RCD) y Plan de Manejo Ambiental-PMA 6
2.4. Licencias, permisos y otros trámites de permisos ambientales 7
3 SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PMA 8
3.1. Educación ambiental – Capacitaciones 8
3.2. Manejo de la vegetación (flora y fauna) 9
3.2.1. Protección de árboles y zona blanda 9
3.3. Control de emisiones atmosféricas 9
3.3.1. Control de acopios de materiales 9
3.3.2. Controles en el traslado de materiales de construcción y sobrantes 10
3.3.3. Medidas de manejo ambiental para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI 10
3.3.4. Permisos de circulación de vehículos y certificado técnico mecánico 10
3.4. Manejo integral de residuos sólidos 11
3.4.1. Clasificación de residuos 12
3.4.2. Residuos aprovechables 12
3.4.3. Residuos NO aprovechables 12
3.5. Acopio, manejo y disposición final de residuos peligrosos-RESPEL 13
3.6. Manejo de residuos de construcción y demolición-RCD 14
3.6.1. Indicadores manejo de Residuos de Construcción y Demolición-RCD 15
3.6.2. Residuos NO PÉTREOS 15
3.6.3. Residuos PÉTREOS 16
3.7. Seguimiento a la generación y disposición de RCD-Decreto 507 de 2023 17
3.7.1. Gestión indicadores decreto 507 de 2023 17
3.7.2. Indicador circularidad 18
3.8. Manejo de materiales de construcción 18
3.9. Manejo eficiente del agua 19
3.10. Orden y aseo 19
4 Conclusiones 20

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Seguimiento reuniones componente ambiental 6
Tabla 2. Trazabilidad PMA-RCD 7
Tabla 3.Trazabilidad PMA 7
Tabla 4.Licencias, permisos y otros trámites 7
Tabla 5. Registro capacitaciones 8
Tabla 6.PIN ambiental transporte 11
Tabla 7.Trazabilidad residuos aprovechables 12
Tabla 8.Trazabilidad residuos NO aprovechables 12
Tabla 9.Trazabilidad generación RESPEL 13
Tabla 10.Trazabilidad-Cantidad total generada RCD 14
Tabla 11. Disposición RCD NO Pétreo 15
Tabla 12.Trazabilidad RCD pétreo 16
Tabla 13. Trazabilidad suministro de materiales 19

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante el presente documento se indican las actividades ejecutadas por el CONSORCIO FORTALEZA en el componente ambiental, durante el periodo del 06 de julio 2026 al 05 de agosto del 2026, en el cual se reportan las actividades realizadas.

Número contrato obra	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025
Contratista	CONSORCIO FORTALEZA
Objeto del contrato	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Valor del Contrato	$ 2.269.368.717
Acta de Inicio	10 de octubre de 2025
Fecha de terminación	6 MESES
Fecha de adición	05 de octubre 2026

2 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Este informe comunica de manera detallada el estado de avance del contrato en términos ambientales durante el periodo del 06 de julio al 05 de agosto del 2026 para el contrato de obra que se realiza en los diferentes colegios de la secretaria a de educación.

En cuanto a las medidas de manejo ambiental, el contratista desarrolla diariamente un seguimiento de las actividades propuestas con el fin de mitigar, prevenir, corregir y/o compensar los impactos que se puedan generar a causa de las actividades constructivas. Se menciona que durante el periodo mencionado continúan las actividades constructivas en los colegios correspondientes al lote 5, lo cual permitió implementar los programas de manejo ambiental.

Tabla 1. Colegios LOTE 5

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA
Ciudad Bolívar	La Arabia	SEDE A- la Arabia
Ciudad Bolívar	José Jaime Rojas	SEDE A- Naciones Unidas II
Usme	Miguel de Cervantes Saavedra	SEDE A-Miguel de Cervantes Saavedra
Cuidad Bolívar	José María Vargas Villa	SEDE D - José María Vargas
Usme	Athabanza	SEDE A - Valle de Cafam
Ciudad Bolívar	Don Bosco I	SEDE A- La JOYA
Usme	Brasilia Usme	SEDE A -Brasilia
Usme	Luis Eduardo Mora Osejo	SEDE A -Nuevo Monteblanco
Ciudad Bolívar	Bicentenario	SEDE C – La Esperanza- el Tesoro La Joya

2.1. Actividades Técnicas Ambientales.

En lo referente a la gestión ambiental del Contrato de obra **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, durante el periodo del 06 de julio 2026 al 05 de agosto del 2026 no se reportan modificaciones al Plan de Manejo Ambiental- PMA de la versión aprobada el 20 de octubre de 2025, lo cual ha permitido garantizar la implementación de las medidas de manejo ambiental aplicables para la construcción del proyecto. De igual manera se indica que no se reportan modificaciones o alcances a la última versión del PMA-RCD.

En virtud de lo anterior el consorcio dio continuidad a las actividades constructivas de los colegios correspondientes al lote 5, lo cual dio a lugar a la implementación de las medidas establecidas en el PMA y en el PMA-RCD; manteniendo la clasificación adecuada de RCD NO PÉTREO y PÉTREO, control de dispersión de material particulado, aislamiento y clasificación de materiales de obra, jornadas constantes de orden y aseo y mantenimiento puntos ecológicos.

2.2. Reuniones componente ambiental

Durante el periodo del 06 de julio al 05 de agosto del 2026 no se reportan recorridos de carácter ambiental entre interventoría, supervisión ambiental;

Tabla 2. Seguimiento reuniones componente ambiental

ACTA	TEMA
-	-

2.3. Programa de Manejo Ambiental RCD (PMA-RCD) y Plan de Manejo Ambiental-PMA

Durante el periodo mencionado el CONSORCIO FORTALEZA no reporta alcances y/o modificaciones al PMA-RCD, por lo que la trazabilidad de verificación y aprobación de los mismos se mantiene.

Tabla 3. Trazabilidad PMA-RCD

FECHA	ESTADO	SOPORTE DE NOTIFICACIÓN
2025/10/01	Versión No.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD	Se remite mediante correo electrónico el 01 de octubre de 2025.
2025/10/14	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Observaciones interventoría	Se remite mediante correo electrónico del 14 de octubre de 2025.
2025/10/20	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Subsanación observaciones	Se remite mediante correo electrónico el 20 de octubre 2025.
2025/10/31	Versión No.2 Programa de Manejo Ambiental de RCD: Aprobación de interventoría	Se remite mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2025.

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la verificación y aprobación al documento Plan de Manejo Ambiental-PMA, la cual no presenta modificaciones.

Tabla 4.Trazabilidad PMA

FECHA	ESTADO	SOPORTE DE NOTIFICACIÓN
2025/10/01	Versión No.1 Plan de Manejo Ambiental-PMA	Se remite mediante correo electrónico el 01 de octubre de 2025.
2025/10/31	Versión No.1 Plan de Manejo Ambiental-PMA: Aprobación de interventoría.	Se remite mediante correo electrónico el 31 de octubre de 2025.

2.4. Licencias, permisos y otros trámites de permisos ambientales

Con respecto a licencias, permisos y tramites ambientales, en este periodo continúan vigentes los siguientes tramites;

Tabla 5. Licencias, permisos y otros trámites

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
PERMISOS	**ENTIDAD QUE LO OTORGA**	**NORMATIVA**	**ESTADO DE AVANCE DEL TRAMITE**
Programa de Manejo Ambiental de RCD	Secretaría Distrital del Medio Ambiente "SDA"	Res 1115 de 2012 Res 1257 de 2021-MADS Dec 507 de 2023	**PIN AMBIENTAL: 27881**
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	Secretaría Distrital de Ambiente. "SDA"	Dec. 959 de 2000, Dec 506 de 2003 y Res 931 de 2008	NO requiere

Fuente: CONSORCIO FORTALEZA

3 SEGUIMIENTO PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PMA

3.1. Educación ambiental – Capacitaciones.

En el periodo del 06 de julio al 05 de agosto del 2026 el CONSORCIO FORTALEZA, da alcance a las capacitaciones propuestas tales como orden y aseo, contaminación del suelo, clasificación en la fuente.

Ilustración 1. Capacitaciones



Así las cosas, el siguiente indicador evidencia un cumplimiento del **100 %**, toda vez que se dio alcance a las actividades programadas en el Plan de Capacitaciones. Para mayor detalle ver Anexo N°1. cronograma de capacitaciones.

$$Registro\ capacitaciones = \frac{No.\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{No.\ de\ capacitaciones\ programadas} = \frac{1}{1} = 100\%$$

$$Registro\ capacitaciones = \frac{No.\ de\ \text{personas capacitadas}}{No.\ de\ \text{total de empleados}} = \frac{8}{13} = 62\%$$

Cabe resaltar que, si bien no se capacitó al 100 % del personal operativo contratado, esta situación obedece a que la cantidad de personal varía según las actividades definidas en el componente técnico del proyecto. No obstante, durante el período evaluado se logró capacitar al 62 % del personal operativo que se encontraba vinculado y activo.

Tabla 6. Registro capacitaciones

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES				
AMB	**ACTIVIDAD**	**TEMA**	**EJECUTADO/ REPROGRAMADO**	**FECHA**
AMB	Capacitación ambiental	como orden y aseo, contaminación del suelo, clasificación en la fuente.	Ejecutada	09/07/2026

3.2. Manejo de la vegetación (flora y fauna)

En relación a los permisos especiales que se deban tramitar ante Secretaria Distrital de Ambiente-SDA para manejo de flora y fauna se indica que en el periodo del presente informe no se requieren, puesto que, la intervención no afecta ni impacta el hábitat de los mismos.

3.2.1. Protección de árboles y zona blanda.

En lo referente a individuos arbóreos no se encuentran intervenidas estas zonas ni afectadas por el proyecto, en caso de encontrarse se le notificara a la interventoría.

$$Protección\ individuos\ arboreos = \frac{N°\ de\ individuos\ protegidos}{N°\ de\ individuos\ arboreos} * 100$$

**Nota: En este periodo no se reportan individuos arbóreos.*

3.3. Control de emisiones atmosféricas

3.3.1. Control de acopios de materiales

Durante el periodo comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA implementó y mantuvo las medidas de manejo ambiental establecidas para el control de acopios de materiales de construcción y residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de prevenir la dispersión de material particulado y minimizar los impactos sobre la calidad del aire en las áreas de intervención.

Los materiales utilizados en las actividades constructivas fueron almacenados en zonas previamente definidas y adecuadamente delimitadas, garantizando condiciones de orden y seguridad. De igual manera, los acopios de materiales pétreos, agregados y RCD permanecieron confinados mediante el uso de elementos de aislamiento y demarcación, evitando su dispersión por acción del viento o por el tránsito de maquinaria y vehículos. Estas medidas permitieron controlar de manera efectiva la generación de polvo y mantener condiciones adecuadas de limpieza en el frente de obra.

Adicionalmente, se realizó seguimiento permanente al estado de los acopios por parte del personal ambiental del proyecto, verificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Cuando fue requerido, se efectuaron labores de organización y reacomodación de materiales para optimizar el uso del espacio disponible y garantizar la estabilidad de los acopios. Con estas acciones, el CONSORCIO FORTALEZA dio cumplimiento a las medidas de control ambiental orientadas a la prevención de emisiones atmosféricas y al adecuado manejo de los materiales generados y utilizados durante la ejecución de las actividades constructivas.

3.3.2. Controles en el traslado de materiales de construcción y sobrantes

Durante el período reportado se evidenció el ingreso de materiales de obra de tipo granular (sub base), Se verificó que los materiales disponibles permanecieron almacenados en condiciones adecuadas, garantizando su conservación y disponibilidad para su utilización en las diferentes etapas constructivas.

3.3.3. Medidas de manejo ambiental para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI

Con respecto a la reducción de emisiones de GEI el consorcio continúa incentivando el uso y ahorro eficiente del agua y energía, en este periodo no se reportan rupturas de redes de agua potable, en caso que estas rupturas se generen, el CONSORCIO FORTALEZA instalará canecas para recolección y su posterior aprovechamiento en actividades de jornadas de orden y aseo u otras actividades como para mezclas de materiales granulares.

De otro lado se garantizó la segregación adecuada de los residuos con características de aprovechamiento con el fin de que sean entregados a recuperadores específicos autorizados y centros de tratamiento y aprovechamiento- CTA avalados por las Autoridades Ambientales Competentes-AAC, aportando a la reducción de CO2.

3.3.4. Permisos de circulación de vehículos y certificado técnico mecánico

Durante el periodo comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, se reportó la ejecución de actividades de retiro y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En este sentido, se verificó que los vehículos utilizados para dichas labores cuentan con la documentación vigente, incluyendo certificado técnico-mecánico y de emisiones (certificado de gases), garantizando así el control de impactos asociados a fuentes móviles.

De igual manera, se constató que durante las operaciones de ingreso y salida de vehículos a la obra se mantiene la prohibición del lavado de vehículos y equipos en sitios no autorizados, con el fin de evitar vertimientos de sustancias contaminantes y prevenir afectaciones a las fuentes hídricas.

A continuación, se relacionan los vehículos empleados para el retiro y transporte de RCD durante el mes de julio- agosto, confirmando que todos cuentan con el PIN ambiental vigente y que fueron efectivamente utilizados para la disposición adecuada de estos residuos en el periodo evaluado.

Tabla 7.PIN ambiental transporte

PLACA	PIN SDA
ZGA584	9663
ARB157	3377

Fuente: CONSORCIO FORTALEZA

3.4. Manejo integral de residuos sólidos.

A través del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, el CONSORCIO garantiza la adecuada segregación, almacenamiento temporal y disposición de los residuos generados durante la ejecución de las actividades del proyecto, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortaleciendo las buenas prácticas de gestión ambiental entre los trabajadores.

Durante el periodo evaluado, se realizó la correcta clasificación de los residuos en la fuente mediante el uso de recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la separación de residuos orgánicos, residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Esta actividad contribuye a optimizar los procesos de aprovechamiento y reciclaje, reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final y mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza en las áreas de trabajo.

De igual manera, se efectuaron actividades de seguimiento y sensibilización al personal con el fin de reforzar la importancia de la correcta disposición de los residuos en los recipientes correspondientes, evitando la mezcla de materiales y garantizando el adecuado funcionamiento de los puntos de almacenamiento temporal.

3.4.1. Clasificación de residuos

En el periodo del 06 de julio al 05 de agosto del 2026, se reporta generación de residuos sólidos que fueron dispuestos y clasificados en los puntos ecológicos, es así que mediante el siguiente indicador se realiza el seguimiento a la generación total de residuos dispuestos en los puntos ecológicos; cabe resaltar que estos residuos son dispuestos por medio de la empresa prestadora de aseo de la localidad de cada frente de obra.

$$Residuos\ Generados = \frac{\text{Cantidad total de Residuos generados}}{\text{Cantidad total de residuos dispuestos en sitios autorizados}} * 100 = \frac{0{,}004}{0{,}004} = 100\%$$

3.4.2. Residuos aprovechables

Los residuos aprovechables provenientes del contenedor blanco del punto ecológico son entregados al punto de clasificación de residuos, esto se debe a que las cantidades son mínimas y en este orden no se logra entregar a recuperadores específicos de la autoridad ambiental.

Tabla 8. Trazabilidad residuos aprovechables

Mes de reporte	Residuos	Cantidad Ton	Gestor
Octubre 2025	Ninguno	0	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	0	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	0	N/A
Enero 2026	Ninguno	0	N/A
Febrero 2026	Ninguno	0	N/A
Marzo 2026	Ninguno	0	N/A
Abril 2026	Ninguno	0	N/A
Mayo 2026	Ninguno	0	N/A
Junio 2026	Ninguno	0	N/A

3.4.3. Residuos NO aprovechables

En la siguiente tabla, se relaciona la cantidad de residuos no aprovechables generados en el contenedor negro durante el periodo mencionado;

Tabla 9. Trazabilidad residuos NO aprovechables

Mes de reporte	Residuos	Cantidad Ton	Gestor
Octubre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Noviembre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Diciembre 2025	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Enero 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Febrero 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Marzo 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Abril 2026	Ordinarios	0,004	Prestador de servicio de la localidad
Mayo 2026	Ordinarios	0,002	Prestador de servicio de la localidad
Junio 2026	Ordinarios	0,003	Prestador de servicio de la localidad
Julio 2026	Ordinarios	0,004	Prestador de servicio de la localidad

3.5. Acopio, manejo y disposición final de residuos peligrosos-RESPEL

En relación con la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de carácter peligroso, se consideran como tales aquellos que, por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o riesgo biológico, pueden generar afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Dentro de este grupo se incluyen, entre otros, residuos como envases contaminados con sustancias químicas, aceites usados, trapos o materiales impregnados con hidrocarburos, y residuos derivados del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Tabla 10. Trazabilidad generación RESPEL

Mes de reporte	Residuos	Cantidad Ton	Gestor	Certificado
Octubre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Enero 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Febrero 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Marzo 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Abril 2026	RESIDUOS DE LANA MINERAL DE FIBRA DE VIDRIO	0,25	TRACOL	77041247991 566946115
Mayo 2026	ASBESTO	1,9	CIUDAD LIMPIA	113088456
Junio 2026	Ninguno	N/A	N/A	N/A
Julio 2026	Retal teja de asbesto	5,16	CIUDAD LIMPIA	113095278

Fuente: CONSORCIO FORTALEZA

El procedimiento para el retiro de materiales con contenido de asbesto se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad y control ambiental, con el fin de prevenir la liberación de fibras al ambiente y proteger la salud de los trabajadores y de la comunidad circundante. Las actividades incluyeron la delimitación y señalización del área de trabajo, el uso de elementos de protección personal especializados, tales como trajes desechables, respiradores con filtros adecuados y casco de seguridad, así como la humectación permanente del material para minimizar la dispersión de partículas durante su manipulación.

Una vez retirados, los residuos de asbesto fueron embalados y encapsulados mediante plástico de alta resistencia, debidamente sellados y rotulados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente para residuos peligrosos. La empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS fue la responsable de las actividades de recolección, cargue y transporte especializado de los residuos, garantizando su manejo seguro durante todas las etapas de movilización desde el sitio de generación hasta las instalaciones autorizadas para su disposición y tratamiento.

Finalmente, los residuos fueron entregados a la empresa Cuidad Limpia, en calidad de gestor autorizado y responsable del tratamiento y disposición final. El manejo definitivo de estos residuos se realizó mediante su confinamiento en celdas de seguridad, sistema diseñado para el aislamiento permanente de materiales peligrosos, evitando cualquier riesgo de contaminación al suelo, agua o aire. ANEXO N° Protocolo de manejo de asbesto.

$$Residuos\ dispuestos = \frac{Cantidad\ generada\ RESPEL}{Cantidad\ RESPEL\ dispuestos} x100 = \frac{5{,}16}{5{,}16}\ x100 = 100\%$$

3.6. Manejo de residuos de construcción y demolición-RCD

Durante el período comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, se dio continuidad a las jornadas de clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), como parte de las actividades establecidas para fortalecer la gestión integral de estos residuos. Estas jornadas tuvieron como propósito optimizar la separación en la fuente, facilitar el aprovechamiento de los materiales con potencial de reutilización o reciclaje y promover una adecuada disposición de aquellos residuos que no pueden ser aprovechados, contribuyendo así al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

En cuanto al almacenamiento temporal de los RCD, se garantizó que las áreas destinadas para este fin permanecieran debidamente delimitadas, demarcadas y aisladas, con el propósito de evitar la mezcla de materiales, minimizar riesgos para el personal y prevenir impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de los residuos.

Adicionalmente, se mantuvo la trazabilidad de los RCD generados mediante el registro y control mensual de la información correspondiente al tipo y la cantidad de residuos producidos durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Ver tabla 11.

Tabla 11. Trazabilidad-Cantidad total generada RCD

MES	CANTIDAD Toneladas	Tipo de residuo	Tipología RCD	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Octubre 2025	-	-	-	-
Noviembre 2025	102,18	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO y CEMEX
Diciembre 2025	81,94	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO y CEMEX
Enero 2026	14,42	Pétreo	Demolición y excavación	GRECO
Febrero 2026	75,29	Pétreo	Concretos y excavación	CEMEX
	0,72	No Pétreo	Chatarra	ECOPLANET
Marzo 2026	8,96	Pétreo	Excavación	GRECO
Abril 2026	277,58	Pétreo	Otros RCD pétreos y Concreto	GRECO YCEMEX
	0,84	No Pétreo	Chatarra	ECOPLANET
	0,25	No Pétreo	Fibra de Vidrio	TRACOL
Mayo 2026	17,92	Pétreo	Otros RCD pétreos	GRECO
	0,06	No Pétreo	Teja plástica	CIUDAD LIMPIA
	1,9	No Pétreo	Asbesto	CIUDAD LIMPIA
Junio 2026	218,89	Pétreo	Concreto	GRECO YCEMEX
Julio 2026	17,92	Pétreo	Arenas	GRECO
TOTAL	**838,02**			

Fuente CONSORCIO FORTALEZA

3.6.1. Indicadores manejo de Residuos de Construcción y Demolición-RCD

Los siguientes indicadores permiten realizar el respectivo seguimiento a los RCD que van a disposición final, y los que son aprovechados por medio de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD autorizados por las autoridades ambientales competentes;

$$\text{Generación RCD} - \text{Disposición Final} = \frac{Total\ RCD\ entregados}{Total\ RCD\ generado} = \frac{838{,}0}{838{,}0} = 100\%$$

$$Cantidad\ RCD\ aprovechado\ mes = \frac{Total\ RCD\ aprovechado}{peso\ total\ RCD\ - Peso\ Material\ EX\ y\ CIM} = \frac{17{,}92}{23{,}08} = 77{,}6\%$$

$$Cantidad\ RCD\ aprovechado(acumulado) = \frac{Total\ RCD\ aprovechado\ acumulado}{peso\ total\ RCD\ - Peso\ Material\ EX\ y\ CIM} = \frac{718{,}04}{719{,}48} = 100\%$$

Ilustración 2. Densidad de Materiales

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M^3)
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V-Residuos orgánicos	1282,71
VI-Residuos contaminantes	1891,28

3.6.2. Residuos NO PÉTREOS

Durante el período comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA no generó residuos de construcción y demolición (RCD) de tipo no pétreo como resultado de las actividades ejecutadas. En consecuencia, no fue necesario realizar labores de almacenamiento, aprovechamiento o disposición final para este tipo de residuos durante el período objeto del presente informe.

Tabla 12. Disposición RCD NO Pétreo

MES	TIPO DE RCD	CANT TON	RECUPERADOR ESPECIFICO	No. DE CERTIFICADO
Octubre 2025	-	0	N/A	-
Noviembre 2025	-	0	N/A	-
Diciembre 2025	-	0	N/A	-
Enero 2026	-	0	N/A	-
Febrero 2026	CHATARRA	0,72	ECOPLANET	ECO4217
Marzo 2026	-	0	N/A	-
Abril 2026	CHATARRA	0,84	ECOPLANET	ECO4425
Mayo 2026	-	-	-	-
Junio 2026	POLIMERO NO APR – TEJAS PLASTICAS	0,06	CIUDAD LIMPIA	113088457
Julio 2026	-	-	-	-

Fuente CONSORCIO FORTALEZA

3.6.3. Residuos PÉTREOS

Durante el periodo evaluado se reportó la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) de tipo pétreo, correspondientes a materiales como arenas, concretos, ladrillos, asfaltos y material de excavación, se realizó la disposición final de los RCD pétreos a través de gestores autorizados, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Tabla 13.Trazabilidad RCD pétreo

MES	TIPO DE RCD	CANT TON	SITIO DE DISPO FINAL/ RECUPERADOR ESPECIFICO	No. DE CERTIFICADO
Octubre 2025	-	-	-	-
Noviembre 2025	Pétreos	54,2	CEMEX	43624
	Concreto	10,84	CEMEX	43703
	Excavación	10,26	CEMEX	43712
	Demolición	26,88	GRECO	PBT VD A003395-037-2025
Diciembre 2025	Demolición	21,68	CEMEX	43625
	Excavación	51,3	CEMEX	43713
	RCD Escombro	8,96	GRECO	PBT VD A003189-042-2025
Enero 2026	RCD Escombro	8,96	GRECO	PBT VD A003189-034-2025
	Excavación	5,46	INSITU	APROVECHAMIENTO INSITU
Febrero 2026	Concretos	65,04	CEMEX	44120
	Excavación	10,25	CEMEX	44292
Marzo 2026	Excavación	8,96	GRECO	PBT VD A007461-008-2026
Abril 2026	Otros RCD Pétreos	71,68	GRECO	PBT VD A007461-009-2026
	Pétreos	205,88	CEMEX	45197
Mayo 2026	Otros RCD Pétreos	17,92	GRECO	PBT VD A007461-0017-2026
Junio 2026	Pétreos	35,84	GRECO	PBT VD A007461-0019-2026
	Pétreos	183,05	CEMEX	45400 - 45579
Julio 2026	Pétreos	17,92	GRECO	PBT VD A007461-0023-2026
TOTAL		815,08		

3.7. Seguimiento a la generación y disposición de RCD-Decreto 507 de 2023

Dando alcance al Decreto 507 de 2023 mensualmente se reporta la trazabilidad de la generación y disposición de RCD mediante los anexos de dicho decreto y que se encuentran en el Programa de Manejo Ambiental de RCD.

El consorcio tiene en cuenta los siguientes sitios de Disposición final y/o Centros de Aprovechamiento autorizados:

- Granulados Reciclados de Colombia- GRECO- CTA
- CEMEX
- Centro de Gestión Sostenible-CGS
- Ecoplanet
- Bio transformación
- Lasea soluciones S.A.S
- TRACOL

Es importante indicar que al reportar generación de RCD, los certificados de entrega pueden demorar de 15 a 20 días hábiles del siguiente mes, es decir, que los certificados de RCD PÉTREO y NO PÉTREO, correspondiente al mes de julio serán reportados en el siguiente informe, de acuerdo con los tiempos de entrega del proveedor.

3.7.1. Gestión indicadores decreto 507 de 2023

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Distrital 507 de 2023, y particularmente de lo señalado en su artículo 46 respecto de las metas de circularidad en la construcción, durante el presente periodo se adelantaron acciones orientadas a la incorporación de materiales provenientes de procesos de tratamiento y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En este sentido, y como parte de las medidas implementadas para contribuir al cumplimiento del porcentaje de circularidad aplicable al proyecto, se realizó la adquisición de 144,45 toneladas de subbase granular reciclada, proveniente de la Planta de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD MOLINOS JN, material que se incorpora al proceso constructivo como alternativa al uso de materiales de origen natural, promoviendo así el aprovechamiento de residuos y su reincorporación al ciclo productivo. El Decreto 507 de 2023 establece expresamente que las metas de circularidad pueden cumplirse mediante la utilización de elementos o materiales de construcción elaborados a partir del tratamiento y/o aprovechamiento de RCD provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Como contratista, se deja constancia de que la adquisición e incorporación de las 144,45 toneladas de subbase granular reciclada constituye una medida concreta de gestión ambiental y de economía circular adoptada durante el periodo objeto del presente informe, en concordancia con las obligaciones ambientales aplicables al proyecto. Esta actuación contribuye a disminuir la demanda de materias primas naturales, fomentar el aprovechamiento de RCD y fortalecer el uso de materiales reciclados dentro de las actividades de construcción. Para efectos del seguimiento y acreditación del cumplimiento de la meta de circularidad, se cuenta con los respectivos soportes de adquisición, suministro e incorporación del material, así como con la documentación que permita demostrar su procedencia y valorización, de conformidad con los lineamientos establecidos por la SDA, Ver Anexo Reporte RCD Julio. En consecuencia, la cantidad de material reciclado adquirida durante el periodo se reporta como parte de las acciones ejecutadas por el contrato para dar cumplimiento a los compromisos de circularidad establecidos para el proyecto y a la normativa ambiental distrital vigente.

$$Indicador\ Circularidad: \frac{144{,}45\ ton\ (materiales\ provenientes\ de\ aprovechamiento)}{593{,}94\ ton\ (materiales\ ingresados)} * 100 = 24\%$$

3.8. Manejo de materiales de construcción

Durante el periodo reportado el consorcio implementa medidas encaminadas a controlar los impactos ambientales ocasionados por el manejo de los materiales de construcción, se demarcarán los materiales que sean ingresados. Cabe resaltar que, para el mes de julio de 2026, se reporta ingreso de material.

Tabla 14. Trazabilidad suministro de materiales

Mes reporte ingreso de material	Cantidad en toneladas	Tipo de material	Proveedor
Octubre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Noviembre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Diciembre 2025	Ninguno	N/A	N/A
Enero 2026	Ninguno	N/A	N/A
Febrero 2026	27,3	SUB BASE GRANULAR	CONSTRITURAR SAS
Marzo 2026	Ninguno	N/A	N/A
Abril 2026	277,01	SUB BASE GRANULAR	CANTERA LA SACAN
	32,98	CONCRETO TIPO C	CONCREMOVIL
Mayo 2026	10,2	ARENA	FERRETERIA
	10,2	MIXTO	FERRETERIA
	91,80	CONCRETO TIPO C	CONCREMOVIL
Junio 2026	Ninguno	N/A	N/A
Julio 2026	144,45	SUB BASE GRANULAR RECICLADA	MOLINOS JN

Nota: la conversión de los materiales se realiza con las densidades de la ilustración 2.

3.9. Manejo eficiente del agua

Se realizó un uso controlado del recurso hídrico en actividades puntuales de obra, específicamente para la humectación de suelos que han sido estabilizados con cemento. Esta actividad se lleva a cabo con el fin de favorecer el proceso de hidratación del cemento, lo cual permite una adecuada reacción química que garantiza la correcta adherencia, compactación y resistencia del material. La humectación contribuye a evitar el secado prematuro, la formación de fisuras y la pérdida de propiedades mecánicas en las capas tratadas.

Adicionalmente, durante las jornadas de orden y aseo se empleó agua reutilizada para la humectación de áreas, con el propósito de controlar la emisión de material particulado y mantener condiciones adecuadas en el frente de trabajo, promoviendo así un uso eficiente y responsable del recurso hídrico.

3.10. Orden y aseo

En el periodo del presente informe se garantizan jornadas de orden y aseo de forma diaria, esta situación ha permitido mantener el área libre de residuos, emisiones o cualquier tipo de intervención que pueda generar impactos negativos sobre el entorno.

CONSORCIO FORTALEZA ha implementado acciones orientadas al mantenimiento de espacios de trabajo limpios, organizados y libres de materiales que puedan generar riesgos para la integridad física del personal. Entre las acciones observadas se destacan:

- Recolección y disposición adecuada de residuos generados por las actividades constructivas.
- Almacenamiento ordenado de herramientas, materiales y equipos, evitando obstrucciones en las rutas de circulación.
- Señalización adecuada de zonas de almacenamiento y áreas restringidas.
- Disponibilidad de contenedores para la separación de residuos comunes y peligrosos.
- Implementación de rutinas diarias de limpieza por parte del personal asignado.

Estas medidas contribuyen directamente a la prevención de accidentes por caídas, golpes o exposición a materiales contaminantes, al tiempo que promueven un entorno laboral más seguro, eficiente y saludable. Se resalta además el compromiso con el seguimiento y mantenimiento continuo del orden en la obra, así como la disposición para atender las recomendaciones emitidas por el equipo de interventoría.

INDICADORES		
Número de capacitaciones realizadas al personal de obra sobre el manejo de este programa / Número de capacitaciones programadas para el personal de obra en el periodo	1/1	100%
Número de jornadas de orden aseo / Número de jornadas programadas	25/25	100%

4 Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, el CONSORCIO FORTALEZA avanzó en la implementación de las actividades previstas dentro del componente ambiental, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en el Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) aprobados para el proyecto. En el desarrollo de las actividades constructivas, correspondientes principalmente a procesos de demolición y construcción, se aplicaron de manera constante las medidas de prevención y control orientadas a minimizar los impactos ambientales generados. Entre estas se destacan la correcta clasificación de los residuos pétreos, el aislamiento de los acopios temporales, la señalización de zonas de almacenamiento y la ejecución de jornadas diarias de orden y aseo, lo que ha permitido mantener condiciones seguras y adecuadas de operación.

En materia de educación ambiental, durante el periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento del 62% de la programación establecida para el mes, desarrollando jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal vinculado al proyecto. Los temas abordados incluidos fueron orden y aseo, contaminación del suelo, clasificación en la fuente. A través de estas capacitaciones se promovió la prevención de impactos ambientales, el uso responsable de los recursos naturales y el mantenimiento de condiciones seguras y organizadas dentro del proyecto.

En relación con los permisos y trámites ambientales, no se identificó la necesidad de gestionar solicitudes nuevas ante la autoridad ambiental, ya que las actividades ejecutadas no generaron afectaciones sobre individuos arbóreos, zonas blandas, cuerpos hídricos o elementos que requieran intervención o autorización especial.

Finalmente, se resalta que durante el periodo reportado no fue necesario realizar manejo especial sobre sumideros o redes de agua potable; así mismo, se continuó promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico mediante la reutilización de agua para actividades de humectación y aseo.

Al cierre del periodo correspondiente al presente informe, se evidencia el cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización y cargue de la información en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, con registros correspondientes hasta el mes de julio. Lo anterior permite mantener actualizada la información requerida y garantizar la trazabilidad y seguimiento de las actividades reportadas durante el periodo.

En conclusión, el CONSORCIO FORTALEZA dio cumplimiento a las medidas de manejo ambiental establecidas para el periodo evaluado, ejecutando las actividades de forma adecuada, con trazabilidad documental y con un enfoque preventivo que permitió mitigar posibles impactos derivados y garantizar el desarrollo responsable de las actividades constructivas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO














CONSORCIO FORTALEZA
27 jul 2026 8:10:37 a.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA


CONSORCIO FORTALEZA
24 jul 2026 11:36:43
Consorcio Fortaleza
#Cervantes


CONSORCIO FORTALEZA
27 jul 2026 11:34:36
Consorcio Fortaleza
#Cervantes #Biblioteca


CONSORCIO FORTALEZA
21 jul 2026 16:31:52
Consorcio Fortaleza
#Biblioteca


CONSORCIO FORTALEZA
17 jul 2026 2:54:30 p.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA


CONSORCIO FORTALEZA
17 jul 2026 2:49:07 p.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA










CONSORCIO
FORTALEZA
7 jul 2026 10:47:00 a.m.
CONSORCIO FORTALEZA
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA




ANEXO N°1
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOPORTE

CONSORCIO FORTALEZA	CRONOGRAMA CAPACITACIONES AMBIENTALES	**Versión:** 01
		Fecha: 2025-10-01

EMPRESA:	**CONSORCIO FORTALEZA**	**2026**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2025 -2026

ACTIVIDADES		Oct 25	Nov 25	Dic 25	Ene 26	Feb 26	Mar 26	Abr 26	May 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Sep 26	Oct 26	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
MANEJO DE RCD EN OBRA	P	1											1			PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
ORDEN Y ASEO	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		PROFESIONAL AMBIENTAL
	E				E	E	E	E	E	E	E					
DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO	P			1							1					PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PUNTO ECOLÓGICO)	P						1									PROFESIONAL AMBIENTAL
	E			E	E			E			E	1				
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	P		1													PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
LAS 3 (REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR)	P				1					1						PROFESIONAL AMBIENTAL
	E									E						
ECONOMIA CIRCULAR	P					1										PROFESIONAL AMBIENTAL
	E															
MANEJO DE MATERIALES Y APROVECHAMIENTO	P							1	1					1		PROFESIONAL AMBIENTAL
	E					E	E		E							
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	P						1									PROFESIONAL AMBIENTAL
	E			E			E		E							
PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DEL SUELO	P						1						1			PROFESIONAL AMBIENTAL
	E										E					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	P										1					PROFESIONAL AMBIENTAL
	E							E								
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**		
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS		**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**					

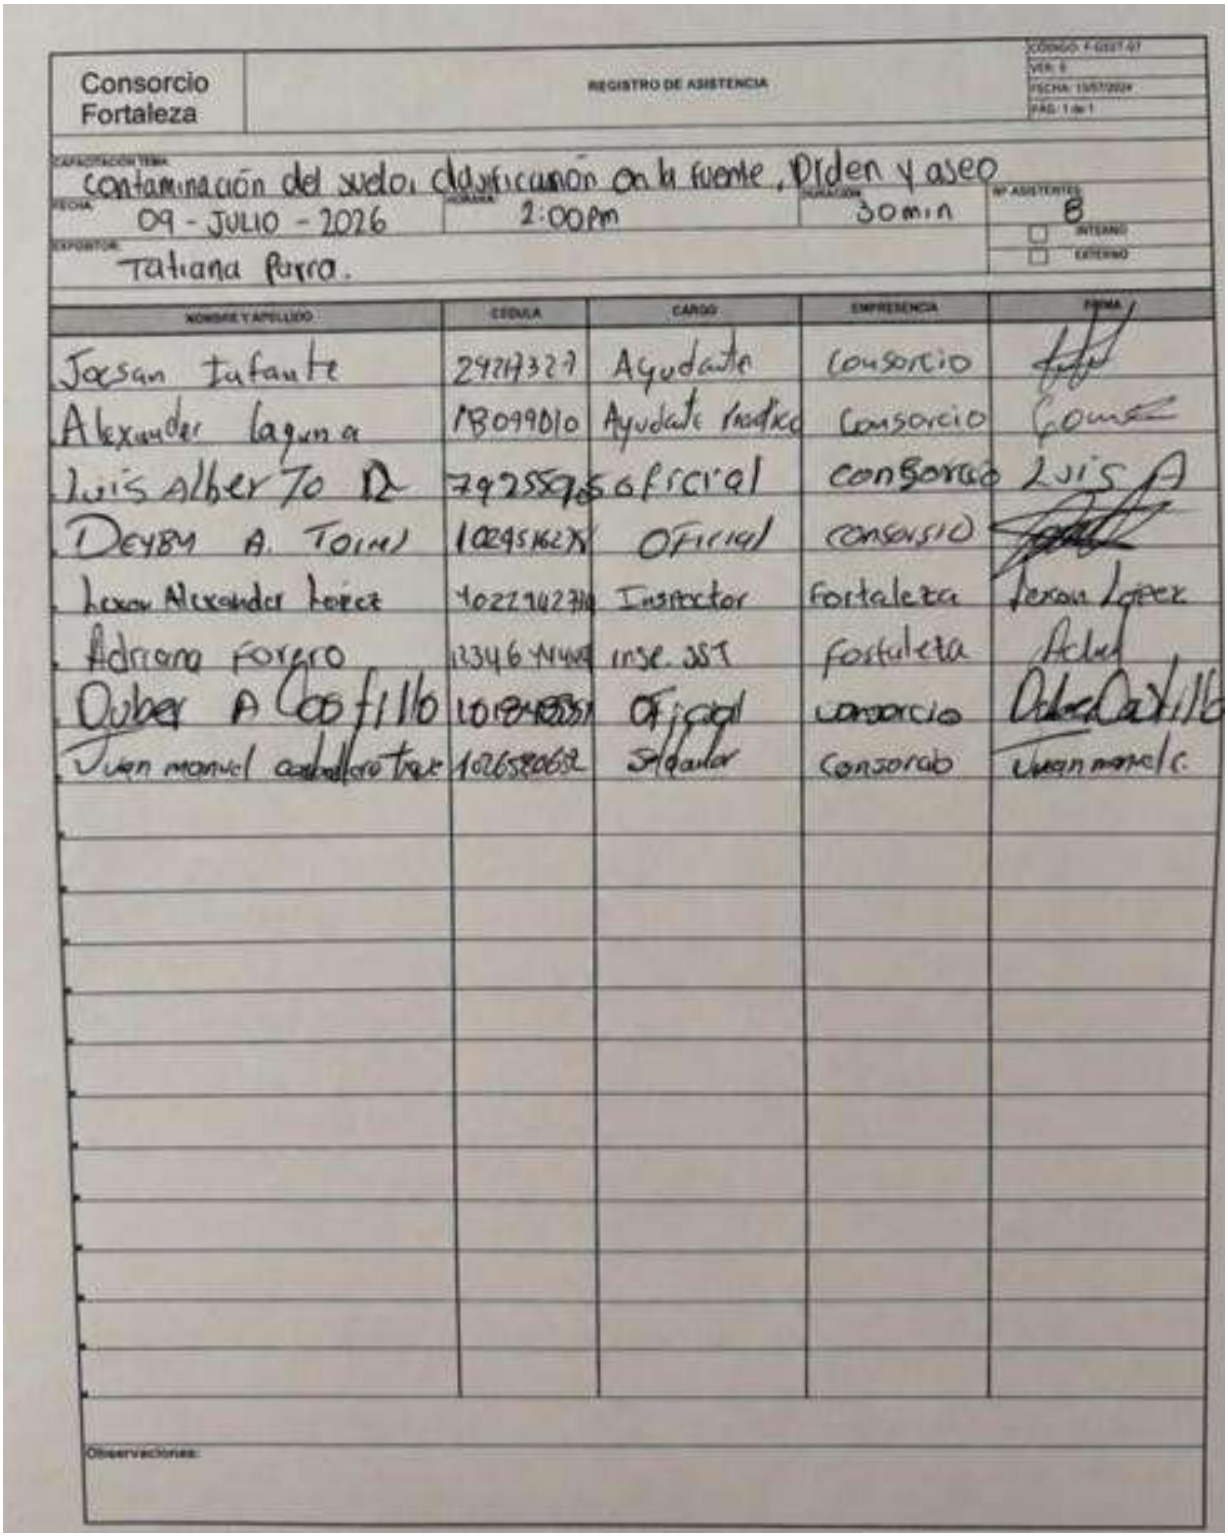

Consorcio Fortaleza

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: F-GSST-07
VER: 0
FECHA: 13/07/2026
PÁG: 1 de 1

CAPACITACIÓN TEMA: Contaminación del suelo, clasificación en la fuente, Orden y aseo

FECHA: 09 - JULIO - 2026 | HORARIA: 2:00Pm | DURACIÓN: 30min | Nº ASISTENTES: 8


EXPOSITOR: Tatiana Parra.


☐ INTERNO ☐ EXTERNO


NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	EMPRESENCIA	FIRMA
Jocsan Infante	24214327	Ayudante	Consorcio	
Alexander laguna	1B099010	Ayudante radica	Consorcio	
Luis Alberto D	79255985	oficial	consorcio	Luis A
Deyby A. Toima	1024516278	Oficial	consorcio	
Jexon Alexander Lopez	1022762716	Instructor	Fortaleza	Jexon Lopez
Adriana Forero	13346 Y1449	inge. SST	fortaleza	Adri
Ouber A Castillo	1018[illegible]	Oficial	consorcio	Ouber Castillo
Juan manuel caballero tra	1026582062	Soldador	Consorcio	Juan manuel c.

Observaciones:

ANEXO N°2
REPORTE DE RCD APP SDA

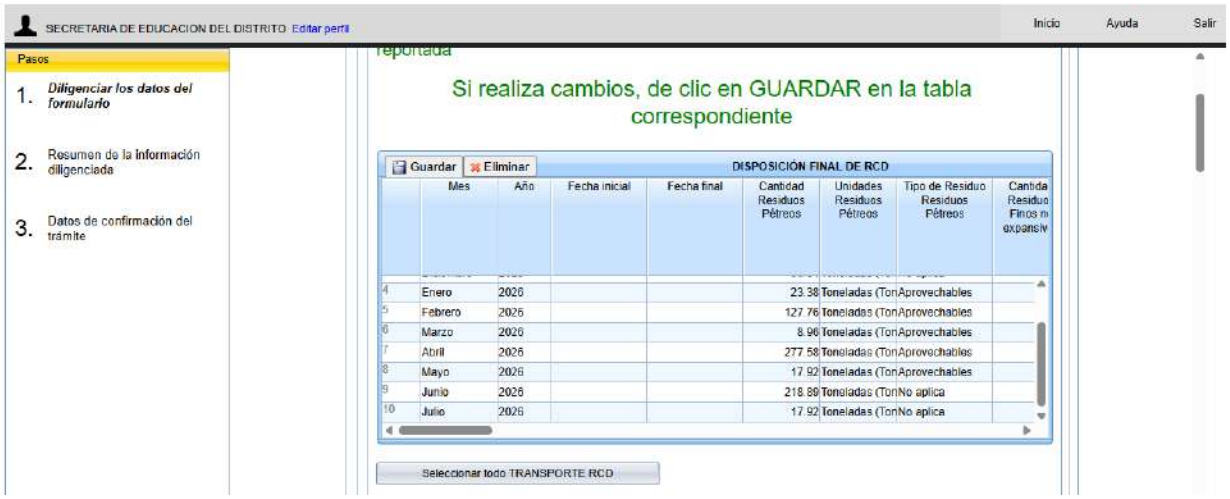
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
Si realiza cambios, de clic en GUARDAR en la tabla correspondiente
Guardar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Mes
Año
Fecha inicial
Fecha final
Cantidad Residuos Pétreos
Unidades Residuos Pétreos
Tipo de Residuo Residuos Pétreos
Enero 2026 23.38 Toneladas (Ton Aprovechables
Febrero 2026 127.76 Toneladas (Ton Aprovechables
Marzo 2026 8.96 Toneladas (Ton Aprovechables
Abril 2026 277.58 Toneladas (Ton Aprovechables
Mayo 2026 17.92 Toneladas (Ton Aprovechables
Junio 2026 218.89 Toneladas (Ton No aplica
Julio 2026 17.92 Toneladas (Ton No aplica
Seleccionar todo TRANSPORTE RCD

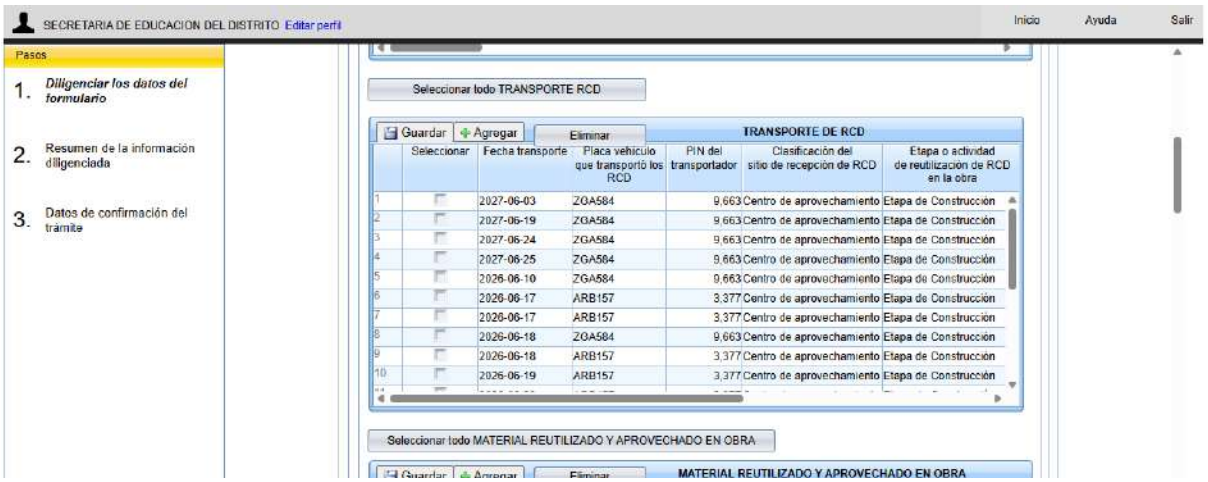
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
Seleccionar todo TRANSPORTE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
PIN del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra
2027-06-03 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2027-06-19 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2027-06-24 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2027-06-25 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-10 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-17 ARB157 3,377 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-17 ARB157 3,377 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-18 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-18 ARB157 3,377 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-06-19 ARB157 3,377 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
Seleccionar todo MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA
MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA

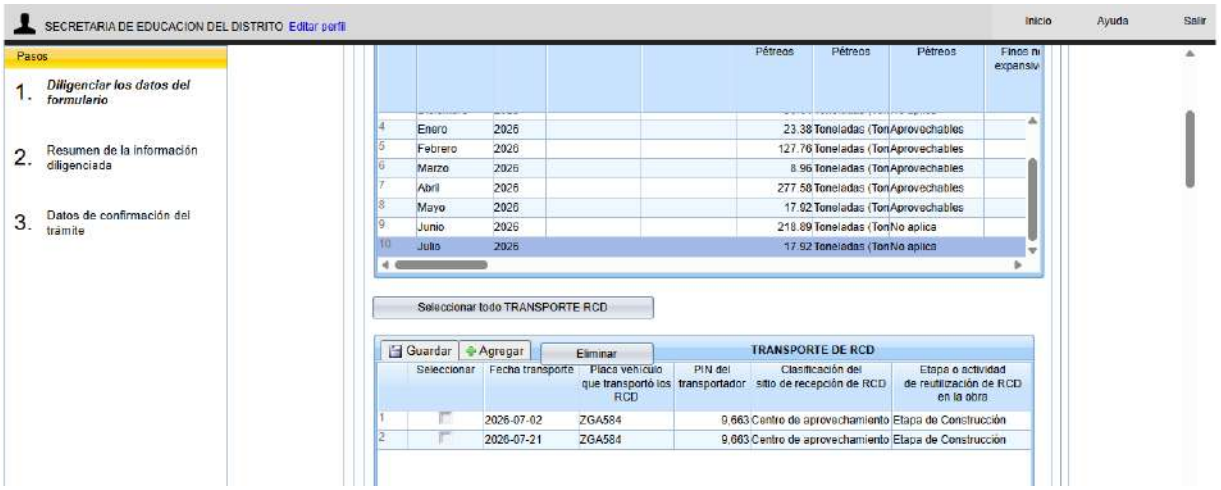
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
Pétreos
Pétreos
Pétreos
Enero 2026 23.38 Toneladas (Ton Aprovechables
Febrero 2026 127.76 Toneladas (Ton Aprovechables
Marzo 2026 8.96 Toneladas (Ton Aprovechables
Abril 2026 277.58 Toneladas (Ton Aprovechables
Mayo 2026 17.92 Toneladas (Ton Aprovechables
Junio 2026 218.89 Toneladas (Ton No aplica
Julio 2026 17.92 Toneladas (Ton No aplica
Seleccionar todo TRANSPORTE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
PIN del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra
2026-07-02 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción
2026-07-21 ZGA584 9,663 Centro de aprovechamiento Etapa de Construcción

ANEXO N°3
DOCUMENTOS VOLQUETAS

LICENCIA DE TRANSITO No. 96-000840

LUZ MARINA QUINTERO N.

X

20.525.588 FACATATIVA.

TRANSV 18B # 159-09 Apto 301

BOGOTA 6704849

TRASPASO SOGAMOSO 15759

09 07 96 Mauricio Avellaneda M.

96-000840

ZGA-584	FORD	F-750	1.977
VOLQUETA		AZUL	
PARTICULAR	PLATON	02	
		AJF75T67854.	
AJF75T67854.	08		
			02

X 20510030018190 CUCUTA 11-07-94

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 189604990

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CDA 37 S.A.S

NIT: 900165471

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-065-001

Fecha de expedición: 2026/05/19

Fecha de vencimiento: 2027/05/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ZGA584

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1977

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8500

NRO. MOTOR:

NRO. CHASIS: AJF75T67854

VIN:

LÍNEA: F 750

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: LUZ M. QUINTERO N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA HORAS DEL	AÑO MES DÍA HORAS DEL
2025 10 6	2025 10 7 LAS 00	2026 10 6 LAS 23:59

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92952195 - 613525432	ZGA584	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	8500	1977

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	FORD	F750	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
AJF75T67854	AJF75T67854	NA	10,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUZ QUINTERO NIETO	3112077819	CC	20525588	SOGAMOSO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	92952195	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respaldo en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] *Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto* 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.024.523.619
TOVAR GARCIA
JOSE JOAQUIN


FECHA DE NACIMIENTO
13-NOV-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-NOV-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
0019506819A 1
33276663

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1024523619



NOMBRE

JOSE JOAQUIN TOVAR GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO

13-11-1991

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

17-02-2026

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL GIRARDOT

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	17-02-2036	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	17-02-2029	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700342477



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 79481318

NOMBRE
VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ

FECHA DE NACIMIENTO
28-09-1968

GRUPO SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
28-01-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.481.318
RAMIREZ DIAZ

APELLIDOS
VICTOR MANUEL

NOMBRES

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033621704

PLACA
ARB157

MARCA
FARGO

LÍNEA
D 600

MODELO
1960

CILINDRADA CC
5.600

COLOR
ROJO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
VOLCO

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
6000

NÚMERO DE MOTOR
468TM2U366451

REG
S

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
1680907346

REG
S

NÚMERO DE CHASIS
BPM8013781

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RAMIREZ DIAZ VICTOR MANUEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79481318

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 189573556

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2026/05/16

Fecha de vencimiento: 2027/05/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ARB157

CLASE: CAMION

MARCA: FARGO

MODELO: 1960

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5600

NRO. MOTOR: 468TM2U366451

NRO. CHASIS: BPM8013781

VIN:

LÍNEA: D 600

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: VICTOR M. RAMIREZ D.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA			AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2026	5	15		DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	5	16	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	5	15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
96674720 - 616318511	ARB157	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	5600	1960

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	FARGO	VOLCO
	LÍNEA VEHÍCULO: D600	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U366451	BPM8013781	NA	6,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VICTOR RAMIREZ DIAZ	3103353046	CC	79481318	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	96674720	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 842,400	$ 438,000	$ 2,400

TOTAL A PAGAR

$ 1,282,800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

Seguro
Ter-Cero Esencial

El complemento del **SOAT** que cubrirá los daños materiales ocasionados a otros en accidentes de tránsito.

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en **www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/**
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.07.14 20:30:10 -05:00

ANEXO N°4
PROTOCOLO DE MANEJO DE ASBESTO

PROTOCOLO DE MANEJO DEL ASBESTO

CONTRATO DE OBRA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 CUYO OBJETO ES:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

BOGOTA D.C

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

CONTROL DE ENTREGAS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
01	2026-06-26	Creación del documento	Profesional Ambiental

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – CONSORCIO

ELABORÓ	REVISÓ
	
Nombre: Tatiana Parra Ch.	**Nombre:** Cristian Neira Rubiano
Cargo: Profesional Ambiental	**Cargo**: Director de Obra
Fecha:2026-06-26	**Fecha:** 2026-06-26

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – INTERVENTORÍA

APROBÓ

Nombre: Luis Alejandro González
Cargo: Profesional ambiental de Interventoría
Fecha: 21/08/2026
APROBÓ

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. ALCANCE 4
4. DEFINICIONES 5
5. NORMATIVIDAD 7
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
   6.1 Datos generales del proyecto. 8
   6.2 Objeto del contrato. 9
   6.3 Localización del proyecto 9
7. MANEJO DEL ASBESTO 9
   7.1 Riesgos a la salud 9
   7.2 ¿Cómo se puede estar expuesto al asbesto? 10
   7.3 ¿Cómo ingresa el asbesto al organismo? 11
   7.4 Enfermedades relacionadas al asbesto. 12
8. Manejo de Residuos 12
   8.1 Manejo del asbesto en obra 12
   8.2 Centro de acopio temporal 13
   8.3 Desplazamientos/ Traslado de residuos de Asbesto. 17
9. Medidas de seguridad 17
   9.2 Medidas de protección. 17
   9.3 Recurso Humano 18
   9.4 Reporte de Gestores autorizados. 18

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 1968 de 2019 *"Por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos"* marcó el principio del final de uso del asbesto en Colombia, una problemática que ha traído consigo consecuencias para la salud y el ambiente.

El Consorcio Fortaleza, por medio del presente documento presenta el protocolo para el manejo del asbesto, en este se incluye las condiciones técnicas para el desmonte en estructuras, embalaje, acopio temporal y almacenamiento, transporte y disposición final.

Para el desarrollo del protocolo se toma como base la normatividad colombiana actual y la *"Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto"* de propiedad de la secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

2. OBJETIVO

Implementar el presente protocolo de Manejo Del Asbesto para evitar las consecuencias en la salud de los trabajadores del Consorcio Fortaleza y del ambiente, por medio de las buenas prácticas, transporte, y disposición final del residuo.

3. ALCANCE

El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio para todo el personal que, de manera directa o indirecta, pueda estar expuesto o tenga interacción con el material clasificado como peligroso (asbesto) durante el desarrollo de sus actividades. Su aplicación comprende a trabajadores directos, personal subcontratista, proveedores, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que requiera ingresar a áreas donde se almacene, manipule, transporte, utilice o disponga dicho material. Asimismo, establece los lineamientos mínimos para garantizar una gestión segura del material peligroso, prevenir incidentes y proteger la seguridad y salud de las personas, así como el medio ambiente y el frente de obra expuesto.

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

4. DEFINICIONES

- **Asbesto o amianto:** designa la forma fibrosa de los silicatos minerales pertenecientes a los grupos de rocas metamórficas, que agrupa a seis (6) tipos de fibras divididos en dos grandes grupos (serpentinas y anfíboles), con propiedades físicas y químicas diferentes.
- **Asbesto cemento:** es una mezcla de cemento Portland con 10% a 20% de fibras de asbesto, incombustible y de alta resistencia mecánica.
- **Alta densidad:** se considera un producto de alta densidad, a cualquier material que contenga más de uno por ciento (1%) de fibra de crisotilo, en el cual la fibra esté encapsulada o fija en un aglutinante natural o artificial (cemento, plástico, asfalto, resinas, mineral u otros), en forma tal que, durante su manipulación, se garantiza que no se desprenden fibras inhalables en cantidades peligrosas. Es un material que no se pulveriza con la simple presión de los dedos.
- **Baja densidad:** se considera un producto de baja densidad, a cualquier material que contenga más de uno por ciento (1%) de fibra de crisotilo, determinado por métodos internacionalmente aceptados, en donde la simple presión con los dedos puede pulverizar el material. Un producto de baja densidad se conoce también como de aplicación friable, en espray (aerosol), o por aspersión. En muchas ocasiones se desconoce el tipo de asbesto o amianto que lo compone y es frecuente que contenga variedades de anfíboles.
- **Administradora de Riesgos Laborales (ARL),** anteriormente Administradora de Riesgos Profesionales (ARP): entidades que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que desarrollan.
- **Contaminantes:** sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos sobre el ambiente, los recursos naturales renovables, no renovables y la salud humana; que solos o en combinación, o como productos de reacción, como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas, se emiten al agua, al aire o al suelo.
- **Crisotilo**: identifica al único representante del grupo de las serpentinas, también conocido como asbesto serpentino o asbesto blanco. Es un mineral con propiedades físicas y químicas diferentes a la de los anfíboles; es el único tipo de asbesto que se utiliza comercialmente.

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

- **Demolición:** es la acción de destruir, derribar o echar abajo una construcción, obra o edificación, de forma parcial o completa.
- **Desmantelamiento:** es el desarme parcial o completo de una obra, maquinaria o equipo.
- **Disposición final de residuos**: es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
- **Exposición:** es la presencia de polvo de crisotilo, o de otras fibras de uso similar, en el aire de la zona de respiración del trabajador. Se cuantifica en términos de la concentración del agente (Valor Límite Permisible - VLP), obtenida de las mediciones de exposición y referida al mismo período de referencia que el utilizado para el VLP aplicable
- **Escombro:** es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.
- **Fibrocemento:** es una mezcla, en diferentes proporciones, de fibras con cemento Portland formando productos de alta densidad, estables y de alta resistencia mecánica. Las fibras pueden ser de diferente naturaleza, como polivinilalcohol (PVA), celulosa, vidrio o asbesto.
- **Fibrocemento con crisotilo:** es una mezcla de cemento con fibra de asbesto crisotilo, también denominado “asbesto cemento”.
- **Fibra de asbesto respirable:** es la fibra de asbesto con un diámetro inferior a 3 µm y cuya longitud es por lo menos el triple del diámetro.
- **Material que contiene crisotilo:** hace referencia a todo material que contiene más de uno por ciento (1%) de crisotilo con respecto a su masa total. Los productos con menos de uno por ciento (1%) de fibra de crisotilo, se consideran libres de crisotilo.
- **Manejo integral:** es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

- **Polvo de asbesto:** son partículas de cualquier tipo de asbesto en suspensión en el aire o depositadas, que pueden desplazarse y permanecer en el medio ambiente, ya sea en zonas residenciales, en lugares de trabajo, etc.
- **Riesgo:** probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.
- **Residuo o desecho:** es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas, contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
- **Residuo peligroso:** es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y para el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso a los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

5. NORMATIVIDAD

Tabla 1. Normatividad Aplicable.

NORMATIVIDAD APLICABLE	
RESOLUCIÓN 2844 DE 2007	"Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia".
RESOLUCIÓN 007 DE 2011	"Por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad del Crisotilo y otras Fibras de Uso Similar". Decreto 1477 de 2014 "Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales"
LEY 1968 DE 2019	"Por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

NORMATIVIDAD APLICABLE	
	protección a la salud de los colombianos". Decreto 0402 de 2021 "Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la prohibición de la importación y la exportación de asbesto en desarrollo de la Ley 1968 de 2019".
ACUERDO 825 DE 2021	"Por medio del cual se dictan lineamientos para la sustitución y gestión integral de asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

Fuente: MADS.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Datos generales del proyecto.

Tabla 2. Datos generales del proyecto.

Número contrato obra	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025
Contratista	CONSORCIO FORTALEZA
Objeto del contrato	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Valor del Contrato	$ 2.269.368.717
Acta de Inicio	10 de octubre de 2025
Fecha de terminación	6 MESES
Fecha de adición	05 de octubre 2026

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

6.2 Objeto del contrato.

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

6.3 Localización del proyecto

En el marco de la ejecución del presente proyecto, se realizarán intervenciones en diferentes sedes de instituciones educativas distritales, en las cuales se desarrollarán actividades de acuerdo con el alcance contractual y los requerimientos técnicos establecidos.

Tabla 3. Colegios LOTE 5

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA
Ciudad Bolívar	La Arabia	SEDE A- la Arabia
Ciudad Bolívar	José Jaime Rojas	SEDE A- Naciones Unidas II
Usme	Miguel de Cervantes Saavedra	SEDE A-Miguel de Cervantes Saavedra
Cuidad Bolívar	José María Vargas Villa	SEDE D - José María Vargas
Usme	Athabanza	SEDE A - Valle de Cafam
Ciudad Bolívar	Don Bosco I	SEDE A- La JOYA
Usme	Brasilia Usme	SEDE A -Brasilia
Usme	Luis Eduardo Mora Osejo	SEDE A -Nuevo Monteblanco
Ciudad Bolívar	Bicentenario	SEDE C – La Esperanza- el Tesoro La Joya

7. MANEJO DEL ASBESTO

7.1 Riesgos a la salud

Riesgos sobre la salud La relación entre la exposición al asbesto y los efectos sobre la salud se han documentado a lo largo de la historia. Es así como el daño pulmonar generado por este mineral se conoce desde comienzos del siglo XX, cuando Montague Murray, en 1906, y Cooke, en 1927, reportaron los primeros casos (Ossa Giraldo, Diana, & Espinal Correa, 2014). Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el asbesto es cancerígeno para los humanos (Grupo 1) (International Agency for Research on Cancer, s.f.).

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

El riesgo de que se presente una enfermedad asociada al asbesto está relacionado con los siguientes factores (Ossa Giraldo, Diana, & Espinal Correa, 2014). • La concentración de las fibras presentes en el aire. • Tipo de asbesto al que se está expuesto. • La duración y frecuencia de la exposición. • El tamaño de las fibras inhaladas. • El tiempo transcurrido desde la exposición inicial. • Condiciones anatómicas y funcionales de la persona. • Efecto sinérgico del humo del tabaco.

Las patologías que se pueden generar dependen del lugar del cuerpo donde ocurra el depósito de fibras de asbesto. Como principio fundamental hay que recordar que las formas de respuesta del organismo se pueden sistematizar como inflamatorias alérgicas, inflamatorias no alérgicas y respuestas carcinogénicas. En el caso del asbesto, este no puede inducir una respuesta alérgica, por lo que los otros dos mecanismos son los que explican las enfermedades asociadas a la exposición a este mineral (Contreras G. Ciencia & Trabajo, 2006).

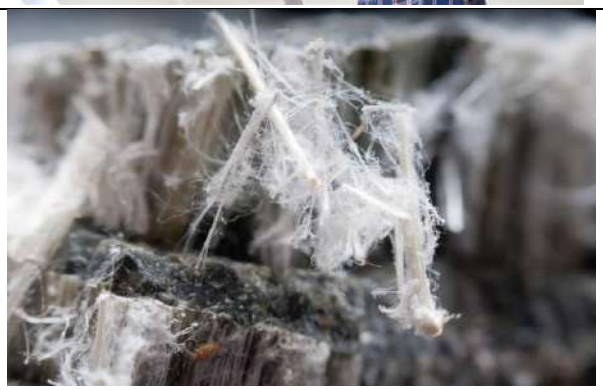
7.2 ¿Cómo se puede estar expuesto al asbesto?

Tabla 4. Exposición de Asbesto.

LUGAR	¿CÓMO?	FOTOGRAFÍA
Lugar de trabajo	• Inadecuada manipulación del asbesto en los lugares de trabajo, en el caso de las construcciones, se da en la demolición de estructura existente.	


1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

LUGAR	¿CÓMO?	FOTOGRAFÍA
Hogar	• Viviendas que contengan tejados en asbesto susceptibles a emitir fibras por desgaste. • Convivir con familiares que trabajen en contacto directo con el asbesto. • Labores de mantenimiento o adecuaciones en el hogar.	
Ambiente	• • Desprendimiento de fibras de crisotilo en el agua, aire o suelo.	

7.3 ¿Cómo ingresa el asbesto al organismo?

Ilustración 1. ¿Cómo ingresa el asbesto al organismo?

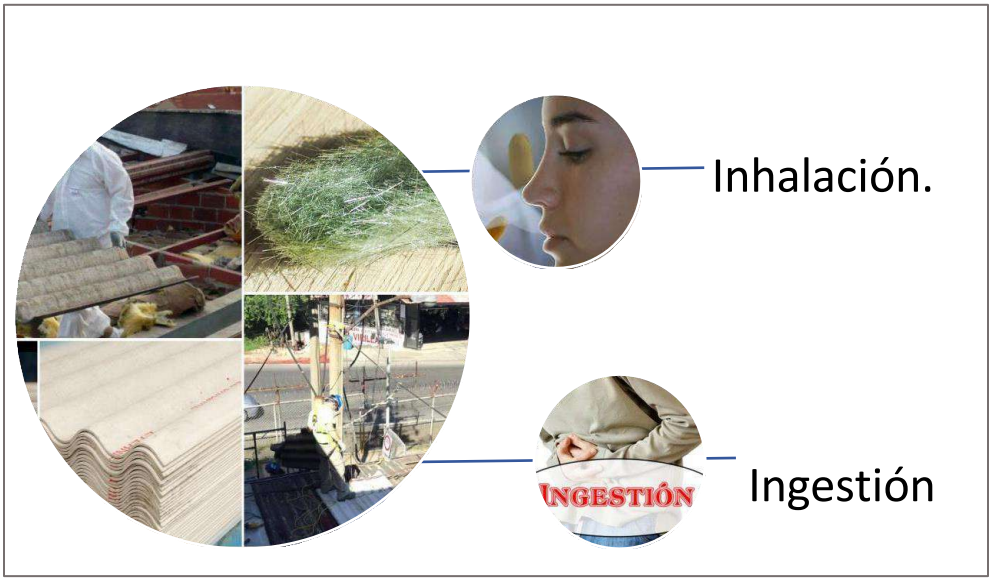

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Por ingestión: las fibras del asbesto también pueden ser ingeridas, cuando las personas consumen alimentos o líquidos contaminados. También puede darse cuando las personas tosen el asbesto que han inhalado y luego ingieren su saliva (Agency for toxic substances and disease registry, s.f.)


Por inhalación: es la principal vía de exposición y proviene de la aspiración de fibras de asbesto en el aire. Puede ocurrir durante la demolición o renovación de edificios antiguos, así como por el corte o pulido de materiales con contenido de este.

7.4 Enfermedades relacionadas al asbesto.




Asnestosis (fibrosis pulmonar)


Cáncer de pulmón



Mesotelioma



Placas pleurales

8. Manejo de Residuos

8.1 Manejo del asbesto en obra

Con base a la normativa aplicable y a las guías internacionales para la prevención de los riesgos relacionados con la exposición al asbesto, se tiene que:

- Previo al inicio de actividades se realizará divulgación al personal respecto al manejo adecuado del ASBESTO, medidas de prevención y autocuidado.

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

- Se llevará a cabo la identificación de peligros, definición e implementación a través del formato de permiso ATS, mismo que se diligenciará con la participación de los colaboradores involucrados en la actividad.
- Garantizar el uso de EPP's al personal encargado del desmonte de estructuras, traslado y almacenamiento del asbesto.
- Señalizar las zonas de trabajo para evitar que el personal externo o el personal que no cuenta con el conocimiento sobre el manejo del asbesto no frecuenten el centro de acopio temporal.
- Se debe humedecer previamente los residuos de asbesto con una solución jabonosa, para evitar la generación de material particulado.
- Únicamente podrá manipular los residuos de asbesto el personal que este capacitado para la manipulación, traslado y acopio.
- Para el desmonte es necesario aplicar los protocolos de trabajo en alturas, teniendo las debidas precauciones del manejo de las tejas, evitando romperlas o dañarlas.

8.2 Centro de acopio temporal

Se debe realizar un espacio amplio que soporte el volumen del asbesto encontrado en obra, para esto se requiere:

- Confinamiento: Crear barreras físicas entre el material que contiene asbesto, estas pueden ser (láminas de plástico, geomembranas, paneles, materiales de fácil lavado.
- Aislar el centro de acopio temporal con puertas y cierres, para evitar que el personal no capacitado manipule los residuos.
- Se debe aislar del suelo los residuos de asbesto, ya sea con una capa de concreto simple de baja resistencia (concreto pobre) o material resistente como geomembranas. (Ilustración 2).
- El acopio temporal debe tener protección contra humedad y/o goteras, ya que si ingresa agua a los residuos puede dañar o acelerar los procesos de desgaste del material y llevar a la contaminación de aguas lluvia o agua residual del proyecto.
- Si los residuos tienen presencia de humedad, se realizará nuevamente el embalaje en el material autorizado en obra.

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Ilustración 2. Ejemplo de acopio temporal de asbesto.



- El material retirado sebe ser humedecido con una solución de agua con jabón, posteriormente, envuelto en capas de plástico de 200 µm o empacado en bolsas especiales para este tipo de residuo. Esta actividad debe ser realizada de manera inmediata, una vez se desmonten las tejas, ya que se puede emitir material particulado proveniente del mineral.

Ilustración 3. Disposición de asbesto.



Fuente: Colegio José Jaime Rojas

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Para el embalaje del material de asbesto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se debe empacar los residuos de asbesto en geomembranas o plástico resistente al material e impermeable.

Ilustración 4. Embalaje de tejas de asbesto.



Fuente: Soluciones de saneamiento ambiental SA.

- Una vez empacado, se debe rotular, este debe contener la palabra “PELIGRO”, nombre del residuo “Asbesto”, Advertencias, Nombre del Consorcio Fortaleza, Cantidad del residuo.

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Tabla 5. Señalización de Asbesto (Acopio y Transporte).

Actividad	Señalización
Acopio de residuos con Asbesto	Según el SGA (Sistema Globalmente Armonizado), para el asbesto se tiene el siguiente símbolo: 
Transporte de Asbesto	Transporte de mercancías peligrosas. Clase 9. 

Fuente: SGA.

[1] Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

[2] Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

8.3 Desplazamientos/ Traslado de residuos de Asbesto.

Para el transporte de los residuos peligrosos de asbesto en fibra o polvo, se deben cumplir las condiciones del Decreto 1609 de 2002 expedida por el Ministerio de Transporte. Independiente del tipo de residuo de asbesto, durante su transporte no deben generarse emisiones de fibras o polvos al aire.

El transporte en general debe realizarse bajo los siguientes criterios:

- Poseer la documentación que garantice la cadena de custodia del residuo desde el momento en que el transportador lo recibió en las instalaciones del generador hasta el momento en que las entrega en el sitio de disposición final.
- Garantizar la preservación del residuo por medio de uso de carro tipo furgón, no se debe realizar el transporte de ningún tipo de residuos de asbesto en carros abiertos.
- Garantizar que el residuo transportado esté perfectamente empacado y embalado, de manera que no emita contaminación externa durante su cargue, transporte y descargue, tanto por la protección de la salud humana y el ambiente, así como para prevenir la contaminación del vehículo de transporte.2

9. Medidas de seguridad

9.2 Medidas de protección.

- Se deberán utilizar Elementos de Protección Personal para retiro de materiales de ASBESTO-CEMENTO.
- Protección respiratoria como máscara de medio rostro con filtro P100 o tipo P3 u otra de igual o mejor calidad.
- Ropa de trabajo como buzo desechable (tipo Tyvek) con capucha y cubre calzado
- Zapatos de seguridad
- Guantes de seguridad
- Lentes de seguridad
- Casco de seguridad

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Para tener en cuenta.

- Para mover materiales de asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, se deben utilizar cuerdas, eslingas o estrobos u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera de evitar su rompimiento, especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales.
- Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento, deben ser envueltos en plástico de a lo menos 200µm de espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado.
- Todos los elementos de protección personal "desechables" deberán ser eliminados junto con el resto de los residuos.

9.3 Recurso Humano

- Personal capacitado para el retiro de este residuo.
- Residente SST.

9.4 Reporte de Gestores autorizados.

Se realiza la consulta a el directorio de la Autoridad Ambiental Competente donde se listan los gestores que cumplan con la disposición final de residuos con asbesto, entre ellos se encuentra

Nombre	Actividad autorizada	Contacto
Tratamiento y Rellenos Ambientales de Colombia S.A.S. ESP	Recolección, Transporte, Tratamiento y disposición final de RESPEL.	+ 57 3045935404.

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.

Para el retiro de estos residuos en obra se debe diligenciar el siguiente formato:

Tabla 7. Formato de registro personal autorizado para la manipulación de asbesto.

CONSORCIO FORTALEZA	**CONSORCIO FORTALEZA** **Registro de personal capacitado para la manipulación de Asbesto.**					
Nombre	**Fecha**	**Lugar**	**EPS**	**ARL**	**Volumen retirado**	**Observaciones**

1 Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de Asbesto. SDA.

2 Guía técnica para la gestión ambiental de los RESIDUOS DE ASBESTO -CAR.
