CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 – RIONEGRO



CONTRATO No. IP 006 - 2026

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"

INFORME MENSUAL No. 2
PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026

RIONEGRO - ANTIOQUIA
JULIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 9
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
Localización General 9
Localización Específica 10
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 11
2. REVISIÓN OBLIGACIONES 12
3. SEGUIMIENTO TÉCNICO 17
3.1 Descripción de obra 17
3.2 Actividades realizadas de obra 17
3.3 Certificados de calidad, Ensayos realizados y resultados 18
3.4 Cuadro de actividades y cantidades ejecutadas 39
3.5 % avance programado vs ejecutado 41
3.6 Programa por frentes de trabajo 41
3.7 Obras extras adicionales aprobadas en el periodo 42
3.8 Registro fotográfico 46
4. SEGUIMIENTO SOCIAL 49
4.1. Socialización y comunicación 49
4.1.1. Socialización 49
4.1.2. Cartelera informativa 51
4.1.3. Valla informativa 52
4.1.4. Material divulgativo 53
4.1.5. Empleabilidad 54
4.1.6. Capacitaciones 55
4.1.7. Comité Ciudadano de Obra 55
4.1.8. Recorrido de reconocimiento y reuniones estratégicas 56
4.2. Caracterización del personal 58
4.2.1. Mano de obra calificada 58
4.2.2. Mano de obra no calificada 59

4.2.3. Enfoque de genero 59
4.2.4. Contratación de mano de obra local 60
4.3. Protección a la infraestructura pública y privada 61
4.3.1. Actas de entorno 62
4.3.2. Actas de vecindad 65
4.4. Atención a la comunidad 68
4.4.1. Punto de Atención a la Comunidad (PAC) 68
4.4.2. Buzon de sugerencias 68
4.4.3. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) 68
5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 70
5.1. PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 70
5.1.1. Conformación del equipo de gestión ambiental 70
5.1.2. Capacitación para el personal de obra 71
5.1.3. Cumplimiento de requerimientos legales 72
5.1.4. Indicadores de seguimiento al programa N° 1 73
5.2. PROGRAMA 2: Manejo de residuos solidos 74
5.2.1. Manejo de residuos sólidos no aprovechables 75
5.2.2. Manejo de residuos sólidos aprovechables 76
Manejo de residuos orgánicos y vegetales 78
5.2.3. Manejo de residuos peligrosos 79
5.2.4. Manejo de residuos especiales 80
5.2.5. Manejo de residuos de Construcción, Demolición (RCD) y Excavación 81
5.2.6. Indicadores de seguimiento programa N° 2 85
5.3. PROGRAMA 3: Manejo de Recurso Aire 86
5.3.1. Manejo integral de materiales de construcción 86
5.3.2. Manejo integral para el control de emisiones atmosféricas y ruido 89
5.3.3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 92
5.3.4. Indicadores de seguimiento programa N°3 94
5.4. PROGRAMA 4: Manejo Integral del Recurso Suelo 95
5.4.1. Manejo de descapote y cobertura vegetal 95
5.4.2. Recuperación de áreas afectadas 97

5.4.3. Manejo para la protección de la fauna 98
5.4.4. Indicadores de seguimiento programa N°4 98
5.5. PROGRAMA 5: Manejo Integral del Recurso Hídrico 99
5.5.1. Manejo de fuentes hídricas en el área de influencia de la obra 99
5.5.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales 101
5.5.3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía 103
5.5.4. Indicadores de seguimiento programa N°5 105
5.6. PROGRAMA 6: Manejo de Instalaciones Temporales 106
5.6.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio 106
5.6.2. Revegetalizacion, empradización y/o paisajismo 108
5.6.3. Indicadores de seguimiento al programa N°6 109
5.7. Otras gestiones ambientales realizadas 109
6. SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 112
6.1. Revisión Seguridad Social 112
6.1.1. Novedades en su personal Ingresos – Retiros del personal de Obra 113
6.2. Consolidado del personal promedio 114
6.2.1. Distribución del personal de acuerdo con la zona donde habita 114
6.3. Programa de Prevención y Promoción en Salud 115
Ausentismo por EG (enfermedad general) 115
6.3.1. Ausentismo por accidentes laborales 116
6.4. Plan de Saneamiento Básico 116
6.4.1. Oficinas y campamentos 116
6.4.2. Unidades sanitarias para el personal de obra y personal administrativo 117
6.4.3. Puntos de acopio de materiales y herramientas 118
6.4.4. Zona de hidratación 119
6.4.5. Recolección de residuos 120
6.5. Inspección de maquinaria y equipos 120
6.6. Medidas de control 122
6.6.1. Entrega de elementos de protección personal 122
6.6.2. Pausas Activas 122
6.7. SG – SST Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 123

6.7.1. Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros) 123
6.8. Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción 125
6.9. Programa de inducción y capacitación 125
6.9.1. Inducción 125
6.9.2. Capacitación y entrenamiento 127
6.10. Señalización y demarcación 128
6.11. Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas 129
6.12. Tareas de alto riesgo 130
6.13. PMT: Plan de Manejo de Transito 130
6.14. Plan de prevención, preparación y atención de emergencias 131
6.14.1. Conclusiones y recomendaciones 132
7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 133
Control anticipo (amortizado – gastado) 133
Pólizas 134
Conclusiones 135
Recomendaciones 135

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Espacial Municipio de Rionegro 10
Ilustración 2. Localización de tramos entregados a intervenir Comuna 1 11
Ilustración 3. Certificado de calidad acero de refuerzo 18
Ilustración 4. Certificado de calidad malla electrosoldada 1 de 2 19
Ilustración 5. Certificado de calidad malla electrosoldada 2 de 2 20
Ilustración 6. Certificado de calidad bordillo 21
Ilustración 7. Certificado de calidad loseta 22
Ilustración 8. Certificado de calidad Adoquín 23
Ilustración 9. Granulometría 24
Ilustración 10. Angularidad 25
Ilustración 11. Caras fracturadas 26
Ilustración 12. CBR 27
Ilustración 13. Desgaste Maquina de los Ángeles 28
Ilustración 14. Equivalente de Arena 29

Ilustración 15. Índice de alargamiento y aplanamiento 30
Ilustración 16. Proctor 31
Ilustración 17. Solidez 32
Ilustración 18. Densidad Anden Casas del Mar 11/06/2026 33
Ilustración 19. Densidad Anden Casas del Mar 19/06/2026 34
Ilustración 20. Densidad Anden Casas del Mar 25/06/2026 34
Ilustración 21. Densidad Anden Casas del Mar 30/06/2026 35
Ilustración 22. Densidad Anden Quebrada Arriba 03/07/2026 35
Ilustración 23. Densidad Anden Quebrada Arriba 09/07/2026 36
Ilustración 24. Densidad Anden Casas del Mar 11/07/2026 36
Ilustración 25. Densidad Anden Laureles 15/07/2026 37
Ilustración 26. Densidad Anden Casas del Mar y Quebrada Arriba 17/07/2026 37
Ilustración 27. Reporte cilindros de concreto 38
Ilustración 28. Cuadro de cantidades ejecutadas al presente informe 1 de 2 39
Ilustración 29. Cuadro de cantidades ejecutadas al presente informe 2 de 2 40
Ilustración 30. Programación por frente de trabajo 41
Ilustración 31 Cartelera informativa 52
Ilustración 32 Valla informativa 53
Ilustración 33 Material divulgativo 53
Ilustración 34 Divulgación vacantes de empleo 55
Ilustración 35 Personal de obra por genero 60
Ilustración 36 Personal de obra por lugar de residencia 61
Ilustración 37 Levantamiento Actas de Vecindad 67
Ilustración 38 Capacitación ambiental 72
Ilustración 39 Manejo de residuos sólidos no aprovechables 76
Ilustración 40 Residuos aprovechables 79
Ilustración 41 Manejo de combustible 80
Ilustración 42 Manejo de madera 81
Ilustración 43 Manejo de RCD 83
Ilustración 44 Manejo de Recurso Aire 89
Ilustración 45 Control Emisiones Atmosféricas 91
Ilustración 46 Maquinaria y equipos 92
Ilustración 47 Material vegetal 96
Ilustración 48 Recurso Hídrico 101
Ilustración 49 Residuos Líquidos 103
Ilustración 50 Uso eficiente de agua y energía 105
Ilustración 51 Instalaciones temporales 108
Ilustración 52 Otras gestiones ambientales 110
Ilustración 53 Grafica de novedades del personal en el mes 114
Ilustración 54 Oficinas 117
Ilustración 55 Unidades sanitarias 117
Ilustración 56 Puntos de acopio 118
Ilustración 57 Zona de hidratación 119

Ilustración 58 Recolección de residuos 120
Ilustración 59 Inspección de maquinaria 121
Ilustración 60 Entrega de elementos de protección personal 122
Ilustración 61 Pausas activas 123
Ilustración 62 Inducciones 126
Ilustración 63 Capacitaciones 128
Ilustración 64 Señalización y demarcación 129
Ilustración 65 PMT 130
Ilustración 66 Inspeccion de suministros para prevención, preparación y atención de emergencias 132

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos principales del contrato de obra IP 006-2026 11
Tabla 2. Resumen de avances contrato 41
Tabla 3. Resumen de estado de avance por sector 42
Tabla 4. Obras Extras aprobadas 42
Tabla 5. Obras Extras en proceso de revisión y aprobación 43
Tabla 6 Registro de socializaciones 50
Tabla 7 Registro fotográfico de socializaciones, recorridos y/o mesas de trabajo 57
Tabla 8 Personal en obra 58
Tabla 9 Registro Actas de Entorno 62
Tabla 10 Registro Actas de Vecindad 66
Tabla 11 Equipo Ambiental 71
Tabla 12 Tema Fecha No. Personas capacitadas 72
Tabla 13 Indicadores de seguimiento N°1 73
Tabla 14 Relación de residuos dispuestos 83
Tabla 15 Relación de residuos sólidos 84
Tabla 16 Indicadores de seguimiento N°2 85
Tabla 17 Material utilizado en la obra (periodo del 13 de junio al 25 de julio) 87
Tabla 18 Relación de material 87
Tabla 19 Relación de maquinaria, vehículos y equipos usados en obra 93
Tabla 20 Indicadores de seguimiento programa N°3 94
Tabla 21 Indicadores de seguimiento programa N°4 98
Tabla 22 Relación de unidades sanitarias portátiles 103
Tabla 23 Registro de limpieza unidades sanitarias portátiles 103
Tabla 24 Indicadores de seguimiento programa N°5 105
Tabla 25 Indicadores de seguimiento programa N°6 109
Tabla 26 Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones 113
Tabla 27 Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones 113
Tabla 28 Consolidado personal en obra por Genero 114

Tabla 29 Personal de Municipios de Antioquia 115
Tabla 30 Personal de otros departamentos 115
Tabla 31 Registro de Ausentismo por EG 116
Tabla 32 Registro de personal con inducción 126
Tabla 33 6.11. Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas 129
Tabla 34. Cuadro pagos realizados (% ejecutado) 133
Tabla 35. Relación gastos anticipo 134
Tabla 36. Póliza de Cumplimiento 134
Tabla 37. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual 134

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objeto **"OBRAS DE CONSTRUCCÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA"**, en el marco del **Contrato de Obra No. IP 006 - 2026**, suscrito con la empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - Edeso.

La ejecución de estas actividades surge del contrato interadministrativo No 10-08-00-21-16-054-2025 cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE ANDENES, CICLOBANDAS, PASAMANOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO", con el fin de construir andenes o senderos peatonales en zonas donde no cuenta con andenes o los andenes existentes presentan daños severos.

Estos andenes son construidos teniendo en cuenta accesibilidad y tránsito a los peatones con discapacidad visual o movilidad reducida

Las actividades desarrolladas en la comuna 1 responden a una metodología de intervención articulada con la comunidad, fundamentada en un enfoque participativo que ha permitido integrar activamente las necesidades de los habitantes del sector. Desde las primeras etapas, se han realizado reuniones con residentes, comerciantes, líderes comunitarios y otras entidades involucradas, con el fin de socializar el proyecto a la comunidad del área intervenida.

Este enfoque participativo no solo optimiza la funcionalidad del proyecto, sino que también fortalece el vínculo entre la comunidad y la obra pública, promoviendo prácticas de corresponsabilidad que permita una mayor apropiación del espacio público.

El proyecto contempla una fase socialización con la comunidad, levantamiento de actas de vecindad en los corredores a intervenir y posteriormente la ejecución de las obras.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad documentar detalladamente las actividades, avances, gestiones técnicas y gestiones administrativas desarrolladas por el contratista Consultores y Constructores Asociados SAS durante el periodo comprendido entre el 13 junio de 2026 y el 25 de julio de 2026.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización General

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Rionegro, el cual está ubicado en el Oriente del departamento de Antioquia, en el Valle de San Nicolás. Se encuentra en la cordillera central de los

Andes y limita al norte con Guarne y San Vicente, al oriente con Marinilla y El Carmen de Viboral, al sur con La Ceja, y al occidente con El Retiro, Envigado y Medellín

Ilustración 1. Ubicación Espacial Municipio de Rionegro




Fuente: Wikipedia

Localización Específica

El proyecto se desarrollará en varios tramos viales ubicados en la Comuna 1 Liborio Mejía del municipio de Rionegro, Antioquia, en sectores priorizados por la Administración Municipal con base en diagnósticos técnicos y solicitudes comunitarias. Los sectores a intervenir son: Casas del Mar, Quebrada Arriba, Bosques del Norte, Galería y/o demás sectores definidos por la Administración Municipal en el transcurso de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. IP 006-2026.

Ilustración 2. Localización de tramos entregados a intervenir Comuna 1

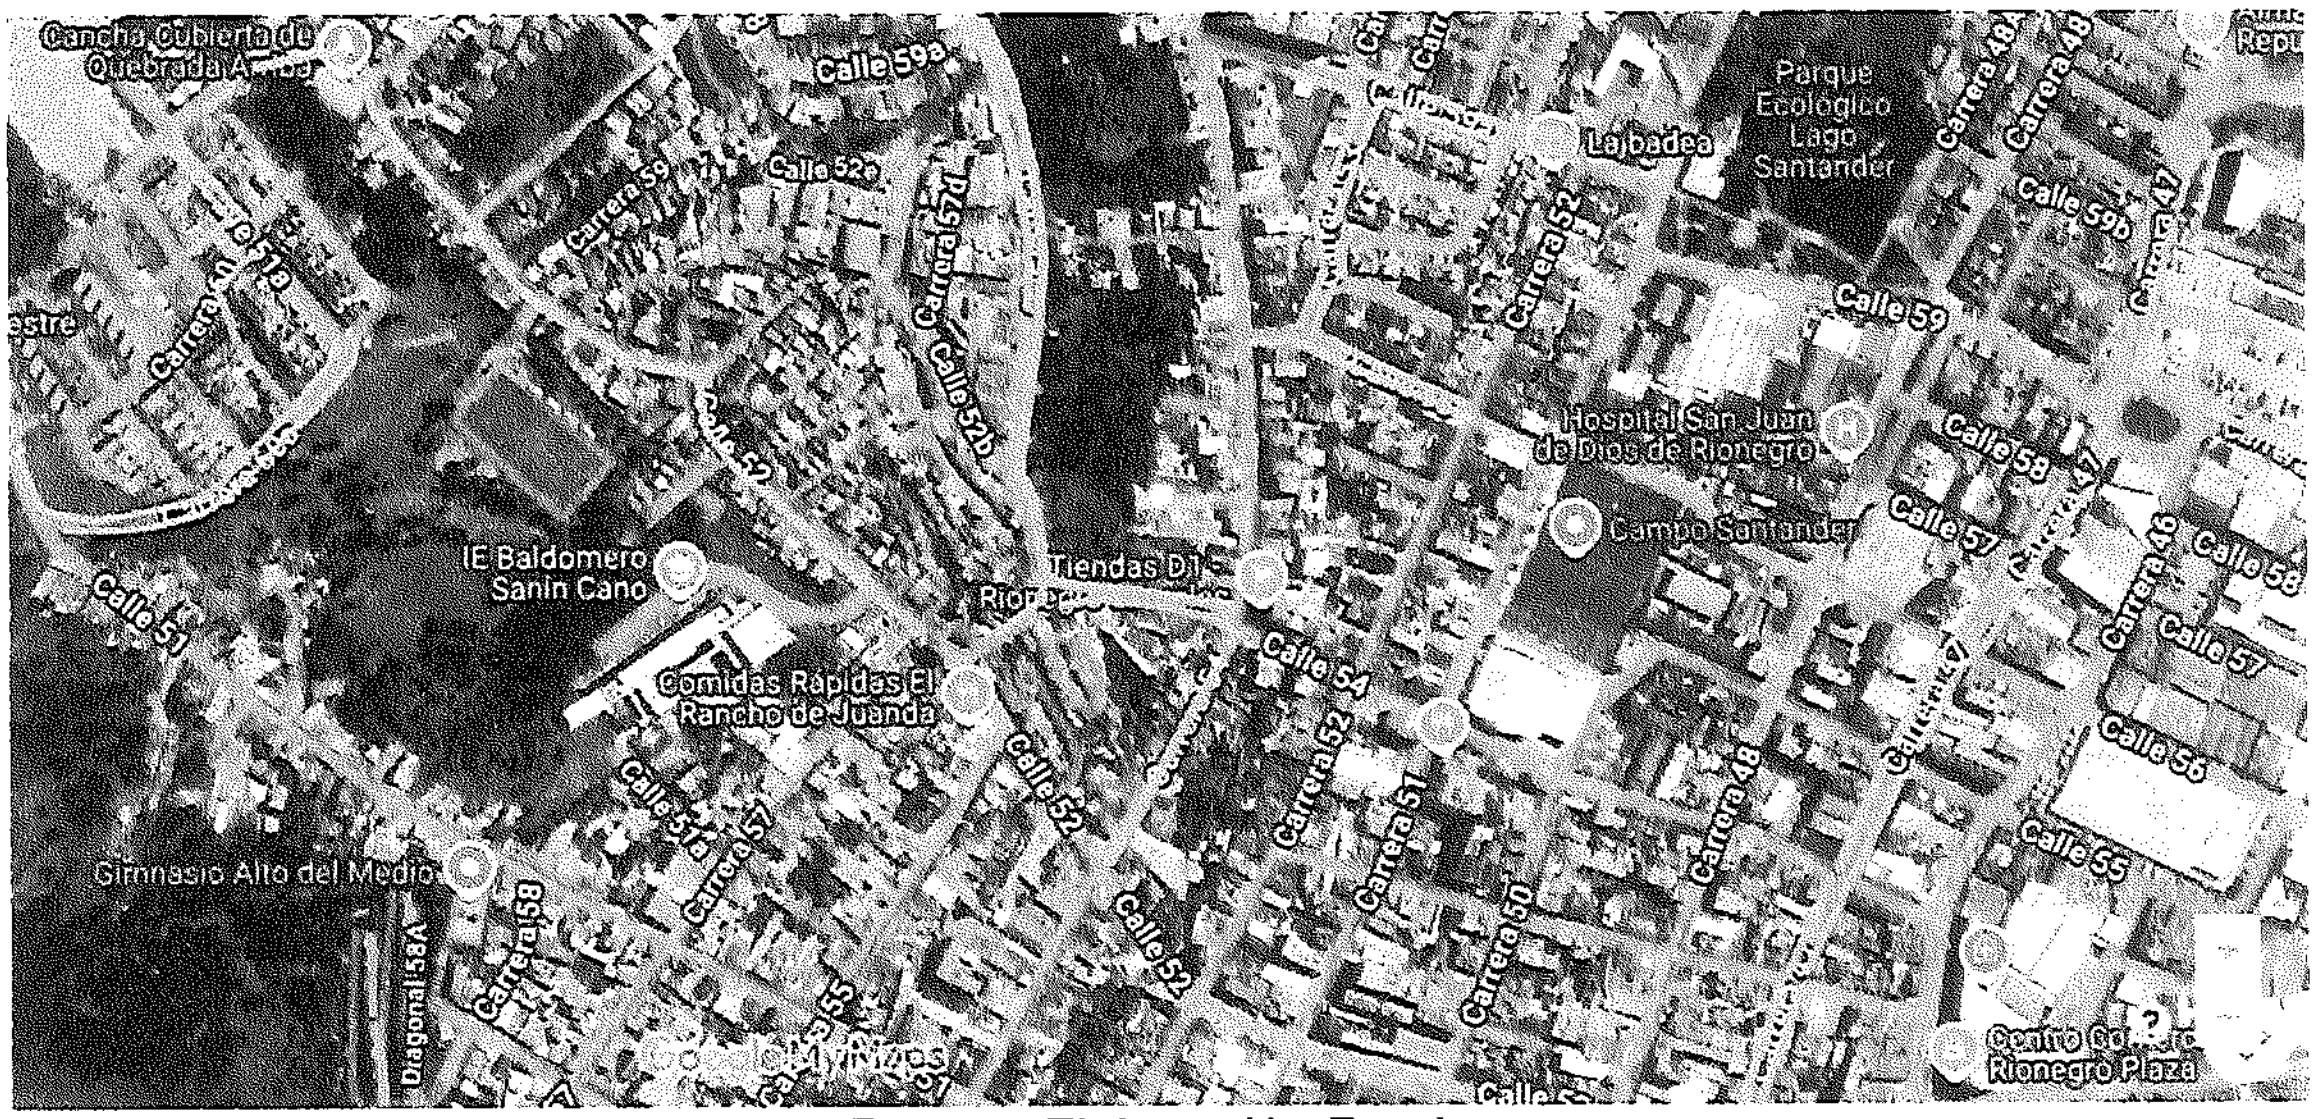

Fuente: Elaboración Propia

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos principales del contrato de obra IP 006-2026

No. Contrato de Obra	CONTRATO No IP 006-2026
Contratista	Consultores y Constructores Asociados SAS
NIT	900.339.866-2
Representante Legal	Ferledy de Jesus Galeano Ciro
Objeto del Contrato	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO".
Valor inicial del Contrato	Tres Mil Quinientos Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos ($3.547.603.146)
Plazo inicial del contrato	Tres (3) Meses
Fecha del Acta de Inicio	11 de mayo de 2026
Fecha de Terminación inicial	11 de agosto de 2026
Adiciones	No Aplica
Suspensiones	No Aplica
Prorrogas	No Aplica

Fuente: Elaboración Propia a partir del contrato de obra

2. REVISIÓN OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y anexo técnico, el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.
4. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, los documentos del proceso de contratación y sus anexos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
11. Estar en permanente comunicación con el interventor y/o supervisor del contrato.

12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
13. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
23. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidación del contrato, de estar de acuerdo con ésta última, y las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.
24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
25. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
26. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.
27. El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDESO y/o la interventoría, por uno de iguales o superiores calidades, así mismo,

el personal profesional deberá cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

28. El contratista deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.
29. El contratista deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo, que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación.
30. Recomendar los materiales más adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance contractual.
31. Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaría solicitados en la invitación y/o pliego de condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista y al factor de calidad propuesto cuando aplique.
32. El contratista se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.
33. El contratista se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
34. El contratista se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual.
35. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las obras en concordancia con las especificaciones de construcción, asegurando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, contrato interadministrativo No. 10-08-00-00-21-16-054-2025, diseños, contrato, propuesta, y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
2. Entregar las obras cumplido con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta y demás documentos que hacen parte integral del contrato.
3. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente contrato.
4. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.
5. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
6. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato.
7. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.
8. Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar el área de trabajo limpia, aseada, sin ningún material sobre el escenario deportivo que pueda ocasionar un accidente, si el espacio debe

ser lavado evitar que se forme una película jabonosa, la limpieza se deberá hacer porque debe quedar en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención.

9. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aquí planteado. Donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros.
10. Mantener al frente de las actividades el personal idóneo, para el cumplimiento del objeto contractual.
11. Proyectar y presentar al supervisor el cronograma de sitios de intervención.
12. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia contratante.
13. Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.
14. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atención a la comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las actividades, en ella se realizara socialización del proyecto y allí se encontrara información sobre los avances del contrato, gestión social y ambiental, generación de empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando este sea requerido.
15. Contar con el equipo profesional idóneo propuesto en la oferta durante la ejecución del contrato, el cambio de alguno de ellos solo podrá ser procedente previo visto de la EDESO.
16. Cumplir con la programación establecida por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.
17. Tener a disposición de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo y personal, para la eventualidad de mayor envergadura en la rehabilitación de vías, construcción de placa huellas y obras complementarias en el municipio de Rionegro, el contratista deberá disponer de equipos complementarios, cuya utilización deberá ser previamente solicitada y aprobada por Edeso y será pagado en la misma acta de corte, adicional a lo acordado en el contrato inicial.
18. El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de maquinaria tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en caso de presentar fallas.
19. Tener a disposición del Contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista deberá atender un cambio en dicha programación de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
20. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcación y señalización en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
21. Mantener así misma póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día.

22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad.
23. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.
24. Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
25. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles.
26. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato.
27. Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada.
28. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta.
29. El contratista deberá acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002.
30. Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.
31. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos establecido por la Entidad.
32. Constituir las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato.
33. Ampliar el plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.
34. El contratista no podrá realizar obras sin autorización escrita del Comité Técnico, de hacerlo será bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagará la obra ejecutada no autorizada
35. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los subcontratistas.
36. Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa contratista, el uniforme deberá confeccionarse de acuerdo con el diseño suministrado por la dirección de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, carné y otros que permitan la identificación del personal que ejecuta las actividades y demás necesarias para el buen desempeño de la labor contratada.
37. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la ejecución de las actividades, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal ni comercial con la dependencia contratante.

38. El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO

3.1 Descripción de obra

La obra ejecutada, comprende la construcción de andenes peatonales con loseta táctil guía y adoquín visual, con acabado escobillado y borde pulido. En las zonas de acceso vehicular, comprende la construcción de rebajes que permitan el ingreso de los vehículos. En las esquinas y zonas de cruce peatonal, se instalarán loseta táctil alertadora que garantice la continuidad del tránsito de los peatones y de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

3.2 Actividades realizadas de obra

Sector Casas del Mar

- Demolición de anden existente para conformación y construcción de andén
- Desmonte y retiro de bordillo existente
- Excavación para replanteo y nivelación del terreno
- Instalación de bordillo para construcción de andén nuevo peatonal
- Relleno con base granular para estructura de soporte del andén peatonal
- Instalación de loseta guía y adoquín visual para tránsito de persona con discapacidad visual y movilidad reducida
- Vaciado de anden en concreto reforzado con acabo escobillado
- Demolición y vaciado de tapas en concreto para cajas de inspección de servicios públicos

Sector Quebrada Arriba

- Demolición de pavimento asfaltico para construcción de anden
- Desmonte y retiro de bordillo existente
- Excavación para replanteo y nivelación del terreno
- Instalación de bordillo para construcción de andén nuevo peatonal
- Relleno con base granular para estructura de soporte del andén peatonal
- Instalación de loseta guía y adoquín visual para tránsito de persona con discapacidad visual y movilidad reducida
- Vaciado de anden en concreto reforzado con acabo escobillado


Sector Laureles

- Demolición de anden existente para conformación y construcción de andén
- Desmonte y retiro de bordillo existente
- Excavación para replanteo y nivelación del terreno
- Instalación de bordillo para construcción de andén nuevo peatonal
- Relleno con base granular para estructura de soporte del andén peatonal
- Instalación de loseta guía y adoquín visual para tránsito de persona con discapacidad visual y movilidad reducida
- Vaciado de anden en concreto reforzado con acabo escobillado

3.3 Certificados de calidad, Ensayos realizados y resultados

- En el presente informe, se incluye los certificados de calidad del acero de refuerzo, malla electrosoldada, bordillos, loseta y adoquín (Adjunto en Anexo No 1).

Ilustración 3. Certificado de calidad acero de refuerzo

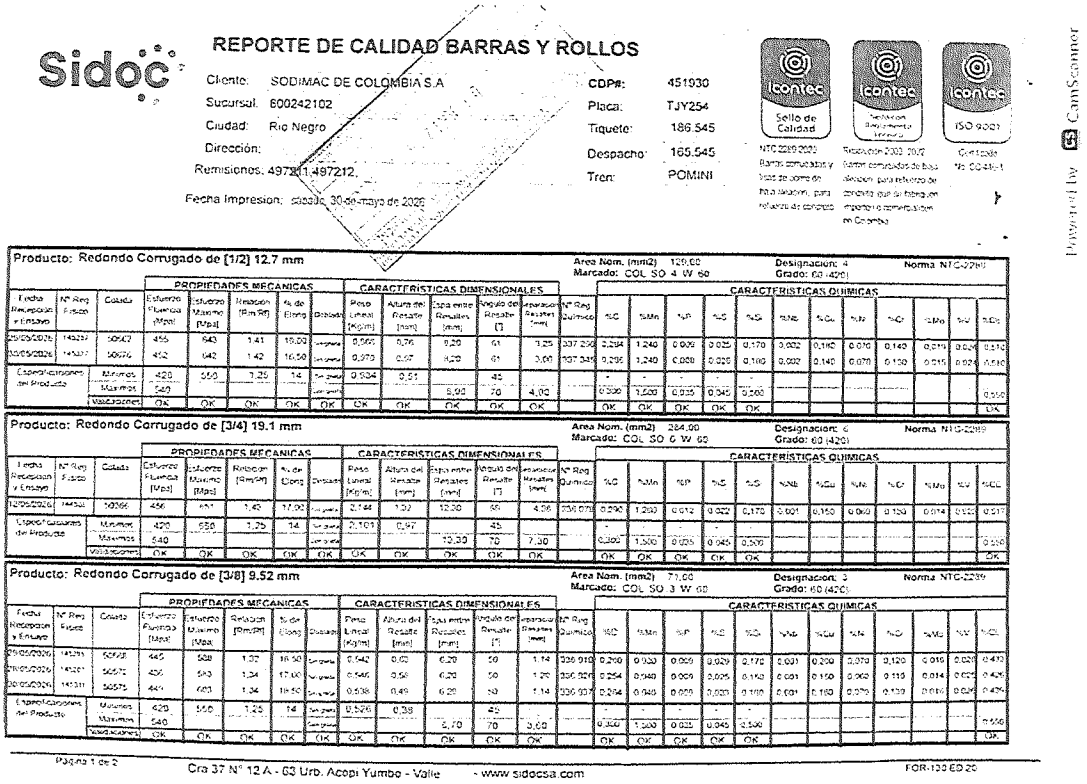

Sidoc

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: SODIMAC DE COLOMBIA S.A
Sucursal: 600242102
Ciudad: Rio Negro
Dirección:
Remisiones: 4972 - 1497212
Fecha Impresion: sabado, 30-de-mayo-de-2026

CDP#: 451930
Placa: TJY254
Tiquete: 186.545
Despacho: 165.545
Tren: POMINI

Icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2023 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto
Icontec — Resolución 2003:2007 Barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto que se fabriquen importen o comercialicen en Colombia
Icontec ISO 9001 — Certificado No. CO-SC-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm — Area Nom. (mm2) 129,00 — Marcado: COL SO 4 W 60 — Designacion: 4 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

Fecha Recepcion y Ensayo	N° Reg Fusion	Colada	PROPIEDADES MECANICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Maximo [Mpa]	Relacion [Rm/Re]	% de Elong	Doblado	CARACTERISTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separacion Resaltes [mm]	N° Reg Quimico	CARACTERISTICAS QUIMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cu	%N	%Cr	%Mo	%V	%Cb
29/05/2026	145297	56540	455	643	1,41	19,00	Cumple	0,666	0,76	8,20	61	3,25	307.290	0,284	1,240	0,009	0,025	0,170	0,002	0,160	0,010	0,140	0,011	0,024	0,010
30/05/2026	145321	56576	452	642	1,42	16,50	Cumple	0,670	0,67	8,20	61	3,00	307.345	0,295	1,240	0,009	0,020	0,160	0,002	0,140	0,010	0,150	0,015	0,024	0,010
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	14	Cumple	0,604	0,51			45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maximos	540				Cumple			0,90	70	4,00			0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,150
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [3/4] 19.1 mm — Area Nom. (mm2) 284,00 — Marcado: COL SO 6 W 60 — Designacion: 6 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

Fecha Recepcion y Ensayo	N° Reg Fusion	Colada	PROPIEDADES MECANICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Maximo [Mpa]	Relacion [Rm/Re]	% de Elong	Doblado	CARACTERISTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separacion Resaltes [mm]	N° Reg Quimico	CARACTERISTICAS QUIMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cu	%N	%Cr	%Mo	%V	%Cb
29/05/2026	145298	56566	456	643	1,40	17,00	Cumple	2,144	1,30	12,30	65	4,06	307.070	0,290	1,260	0,012	0,022	0,170	0,001	0,150	0,009	0,150	0,014	0,022	0,017
Especificaciones del Producto	Minimos	420	630	1,25	14	Cumple	2,101	0,97			45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maximos	540				Cumple			10,30	70	7,30			0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,150
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [3/8] 9.52 mm — Area Nom. (mm2) 71,00 — Marcado: COL SO 3 W 60 — Designacion: 3 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

Fecha Recepcion y Ensayo	N° Reg Fusion	Colada	PROPIEDADES MECANICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Maximo [Mpa]	Relacion [Rm/Re]	% de Elong	Doblado	CARACTERISTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separacion Resaltes [mm]	N° Reg Quimico	CARACTERISTICAS QUIMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cu	%N	%Cr	%Mo	%V	%Cb
29/05/2026	145291	56568	445	508	1,02	16,50	Cumple	0,542	0,62	6,20	50	1,14	306.910	0,299	0,930	0,009	0,029	0,170	0,001	0,200	0,010	0,120	0,010	0,020	0,010
29/05/2026	145291	56571	456	583	1,24	17,00	Cumple	0,545	0,58	6,20	50	1,20	306.924	0,254	0,940	0,009	0,005	0,140	0,001	0,150	0,002	0,110	0,014	0,022	0,429
30/05/2026	145311	56575	440	603	1,34	19,50	Cumple	0,538	0,49	6,20	50	1,14	306.931	0,294	0,940	0,009	0,020	0,160	0,001	0,160	0,005	0,130	0,010	0,024	0,454
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	14	Cumple	0,526	0,38			45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maximos	540				Cumple			0,70	70	3,60			0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,150
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Página 1 de 2 — Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com — FOR-139 ED 20

Powered by CamScanner

Ilustración 4. Certificado de calidad malla electrosoldada 1 de 2

ACEROS TURIA

INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA NTC 5806 VERSION 2019


CODIGO: PE-CAL-R-L.1
VERSION 7
VIGENTE DESDE:01/09/2019
EL CERTIFICADO CONSTA DE 2 PAGINAS

1598

TEMPERATURA AMBIENTAL DENTRO DEL LABORATORIO >= 15°C			26	HUMEDAD RELATIVA DENTRO DEL LABORATORIO >20%<=80%		60	INFORME PARA LA PLANTA: ACEROS TURIA BARRANQUILLA
ORDEN PRODUCCION	1598	Turno	2	Fecha de realizacion del ensayo			29-may-26
DESIGNACION: MALLA ESTANDAR		XX-084-	Coladas Utilizadas		5C53451		

DESCRIPCION DE ATRIBUTOS	REQUISITO SEGÚN NTC 5806	OBTENIDO	OBSERVACIONES
Resistencia a la tracción Mpa	550	746.2	CUMPLE
Resistencia a la fluencia Mpa	485	656.6	CUMPLE
ESFUERZO CORTANTE EN NEWTON	1528	Probeta 1: 5207 · Probeta 2: 4246 · Probeta 3: 6002 · Probeta 4: 5698 · Promedio: 5288 · Desviacion estandar: 767.862	CUMPLE

ANALISIS GRAFICO RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

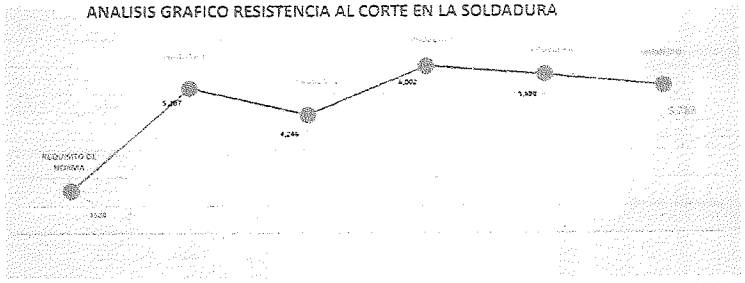

Promedio de Velocidad del ensayo maximo en minutos	689	420	CUMPLE
Ensayo de doblado	No presenta Grietas	No presenta Grietas	CUMPLE
Peso del grafil en gramos /metro	93.06	Pesaje 1: 94.00 · Pesaje 2: 94.00 · Pesaje 3: 94.00 · Pesaje 4: 94.00 · Promedio: 94.0 · Desviacion estandar: 0.00	CUMPLE

Ilustración 5. Certificado de calidad malla electrosoldada 2 de 2

Soldaduras rotas "Unidades" Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.3		6	0						CUMPLE
Oxido Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.6		No presenta	No Presenta						CUMPLE
Ancho 235 cm Maximo 237,5 Minimo 232,5 Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.1		235	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
			235.0	235.5	235.8	235.0	235.3		
			Desviacion estandar				0.39		
Longitud 1800 cm Maximo1818 Minimo 1782 Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.2		600	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
			600.0	598.5	600.0	601.0	599.9		
			Desviacion estandar				1.03		
Numero de barras exacto en unidades Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.7	LONGITUDINAL	16	16						CUMPLE
	TRANSVERSAL	40	40						CUMPLE
Diametro del alambre de grafil en mm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.7 tabla 11	LONGITUDINAL	4	4						CUMPLE
	TRANSVERSAL	4	4						CUMPLE
Separacion en mm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.7 tabla 11	MIN	144	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
	LONGITUDINAL	156	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	MAX		Desviacion estandar				1.29		
	MIN	144	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
	TRANSVERSAL	156	150.0	148.0	151.0	149.0	149.5		
	MAX		Desviacion estandar				1.29		
Longitud pelos en cm Metodo de ensayo NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 13.7 tabla 11	LONGITUDINAL maximo	75	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
			75.0	70.0	74.0	70.0	72.3		
			Desviacion estandar				2.63		
	TRANSVERSAL maximo	50.0	Medicion 1	Medicion 2	Medicion 3	Medicion 4	Promedio		CUMPLE
			50.0	46.0	50.0	50.0	49.0		
			Desviacion estandar				2.00		
ETIQUETADO NTC 5806 Version 2010 y 2019 Num 15.4 RESOLUCION 0277 NUMERAL 6.1	LA ETIQUETA DEBE CONTENER: NOMBRE DEL FABRICANTE; PAIS DE ORIGEN; DESCRIPCION DEL MATERIAL; LOTE DE FABRICACION; DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION; OTRA INFORMACION		LA ETIQUETA VERIFICADA CONTENIA: NOMBRE DEL FABRICANTE; PAIS DE ORIGEN; DESCRIPCION DEL MATERIAL; LOTE DE FABRICACION; DESIGNACION DE LA NORMA DE FABRICACION; OTRA INFORMACION						CUMPLE
ELABORO	INGENIERA DE CALIDAD	MAGALY TRUJILLO	APROBO		DANIEL SANCHES (JEFE DE PLANTA)				
ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS DIRECCION: SEXTA ENTRADA KM 4 VIA MALAMBO CARACOLI TELEFONO: 323 4563217 EMAIL: calidad.barranquilla@aceros-turia.com			EL CERTIFICADO PERTENECE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS PROCEDIMIENTO DE MUESTREO SEGÚN NTC 5805 CERTIFICADO NUMERO CF-4395 Emitido por METROTEST mm: milimetro; cm centimetros; Mpa megapascales						

FIN DEL CERTIFICADO

Ilustración 6. Certificado de calidad bordillo

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
CALLE 61 SUR No. 51-033 - MEDELLÍN
TELEFONO (604) 4822330 - CELULAR 3042853137
www.suelospavimentos.com - suelospavimentos@gmail.com

INFORME PRELIMINAR

FECHA: *12 de mayo de 2026*

OBRA: *PLANTA DE PREFABRICADOS*

EMPRESA: *PREFABRICADOS J & A S.A.S ; Ing. Gloria Isabel Marín*

MUESTRA: *Cilindros de concreto hidráulico*

LUGAR DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: *Sede principal Medellín*

FECHA DE RECIBO EN EL LABORATORIO: *6 de mayo de 2026*

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO: ***MY-12454***

ENSAYO SOLICITADOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO:

1. Resistencia de cilindros a la compresión con método normal, Norma INV E-410-13

CILINDRO No.	MUESTRA	UBICACIÓN	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	EDAD	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (kg/cm2)		
							Requerida	Medida	Probable 28d
1	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	11/05/2026	7	5	3000psi	277	347
2	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	11/05/2026	7	2	3000psi	257	321
3	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	18/05/2026	14	-	3000psi	-	-
4	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	18/05/2026	14	-	3000psi	-	-
5	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	1/06/2026	28	-	3000psi	-	>= 28
6	-	Muestra # 105826 (Fabricación bordillos)	4/05/2026	1/06/2026	28	-	3000psi	-	>= 28
1	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	11/05/2026	7	5	4000psi	337	421
2	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	11/05/2026	7	5	4000psi	347	434
3	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	18/05/2026	14	-	4000psi	-	-
4	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	18/05/2026	14	-	4000psi	-	-
5	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	1/06/2026	28	-	4000psi	-	>= 28
6	-	Muestras #105726 (Fabricación H)	4/05/2026	1/06/2026	28	-	4000psi	-	>= 28

EQUIPO UTILIZADO	MARCA Y REFERENCIA	CÓDIGO	FECHA DE CALIBRACIÓN
Prensa hidráulica	ELE CONTROLS AUTOMAX	PR 02	Julio de 2025

CLAUDIA M. SÁNCHEZ V
INGENIERA CIVIL

Ilustración 7. Certificado de calidad loseta

RAER Consultoría y Laboratorio

MÓDULO DE ROTURA DE ADOQUINES — **NTC 2017-4017**

Proyecto :	Planta Conprecolor		
Cliente :	Conprecolor S.A.S.	**Fecha:**	9/06/2026
Responsable :	Darlyn Tamayo	**Origen:**	Planta Conprecolor
Muestra No :	6352	**Localización :**	Acopio Obra
Descripción :	Adoquines de concreto 200 X 200 X 60	**Destino:**	Mampostería

Módulo de Rotura (MR) de adoquines de concreto

Muestra Nº	Fecha de vaciado	Fecha de prueba	Edad (días)	Altura Prom. (mm)	Ancho Prom. (mm)	Largo Prom. (mm)	Carga. (N)	Tipo de Falla	Resist. (MPa)	Resist. Prom. (MPa)
1	12/05/26	09/06/26	28	60	197	198	14400	Centro de la luz	5,42	5,84
2	12/05/26	09/06/26	28	60	198	198	16800	Centro de la luz	6,29	
3	12/05/26	09/06/26	28	61	198	199	15400	Centro de la luz	5,61	
4	12/05/26	09/06/26	28	60	198	198	15600	Centro de la luz	5,84	
5	12/05/26	09/06/26	28	60	198	199	16000	Centro de la luz	6,03	
							Conformidad (≥ 5,0 MPa a 28 días)			SI

ABSORCIÓN									PROMEDIOS	
ADOQUÍN Nº	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE ENSAYO	EDAD ADOQUÍN	PESO SECO (g)	PESO EN EL AGUA (g)	PESO SSS (g)	ABSORCIÓN (%)	DENSIDAD (kg/m³)	ABSORCIÓN %	DENSIDAD
1	12/05/26	09/06/26	28	5084	2803	5214	2,6	2109	2,29	2124
2	12/05/26	09/06/26	28	5142	2860	5259	2,3	2144		
3	12/05/26	09/06/26	28	5196	2870	5330	2,6	2112		
4	12/05/26	09/06/26	28	5107	2815	5236	2,5	2109		
5	12/05/26	09/06/26	28	5264	2888	5342	1,5	2144		
CONFORMIDAD (=< 7% Y CLASE: LIVIANO, MEDIANO, NORMAL)									SI	

EQUIPO UTILIZADO
Balanza digital, calibrada 2026/02/24
Prensa hidráulica digital calibrada 2026/02/19
Calibrador Pie de Rey, Herramienta menor

Versión: V1
Creación: Octubre 2022

Ilustración 8. Certificado de calidad Adoquín

RAER Consultoría y Laboratorio

MÓDULO DE ROTURA DE ADOQUINES — **NTC 2017-4017**

Proyecto :	Planta Conprecolor		
Cliente :	Conprecolor S.A.S.	**Fecha:**	9/06/2026
Responsable :	Darlyn Tamayo	**Origen:**	Planta Conprecolor
Muestra No :	6352	**Localización :**	Acopio Obra
Descripción :	Adoquines de concreto 200 X 100 X 60	**Destino:**	Mampostería

Modulo de Rotura (MR) de adoquines de concreto

Muestra Nº	Fecha de vaciado	Fecha de prueba	Edad (días)	Altura Prom. (mm)	Ancho Prom. (mm)	Largo Prom. (mm)	Carga. (N)	Tipo de Falla	Resist. (MPa)	Resist. Prom. (MPa)
1	11/05/26	09/06/26	29	59	99	197	10300	Centro de la luz	7,94	7,23
2	11/05/26	09/06/26	29	60	100	199	9700	Centro de la luz	7,23	
3	11/05/26	09/06/26	29	60	101	199	9200	Centro de la luz	6,79	
4	11/05/26	09/06/26	29	62	100	199	9800	Centro de la luz	6,85	
5	11/05/26	09/06/26	29	61	100	200	10100	Centro de la luz	7,33	
						Conformidad (≥ 5,0 MPa a 28 días)				SI

ABSORCIÓN									PROMEDIOS	
ADOQUÍN Nº	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE ENSAYO	EDAD ADOQUÍN	PESO SECO (g)	PESO EN EL AGUA (g)	PESO SSS (g)	ABSORCIÓN (%)	DENSIDAD (kg/m³)	ABSORCIÓN %	DENSIDAD
1	11/05/26	09/06/26	29	2565	1469	2642	3,0	2186	2,88	2203
2	11/05/26	09/06/26	29	2548	1465	2632	3,3	2183		
3	11/05/26	09/06/26	29	2533	1455	2616	3,3	2180		
4	11/05/26	09/06/26	29	2632	1514	2696	2,4	2228		
5	11/05/26	09/06/26	29	2643	1523	2706	2,4	2235		
CONFORMIDAD (=< 7% Y CLASE: LIVIANO, MEDIANO, NORMAL)									SI	

EQUIPO UTILIZADO
Balanza digital, calibrada 2026/02/24
Prensa hidráulica digital calibrada 2026/02/19
Calibrador Pie de Rey, Herramienta menor

Version: V1
Creación: Octubre 2022

- En el presente informe, se incluyen los ensayos realizados a la base granular instalada y suministrada por el proveedor Ingetierras (Adjunto en Anexo No 2).

Ilustración 9. Granulometría

INGE


ANÁLISIS GRANULOMÉRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS INVIAS E-213/214-22

Código: CAL-FR-09
Versión: 02
Pagina: 1 de 1
Fecha: 01-08-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	**FECHA:**	11-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	**MUESTRA No.:**	73
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR	**% Humedad:**	3,1

PESO ANTES DE LAVADO		6250,0	PESO DESPUES DE LAVADO		5680,8	
TAMIZ		PESO RETENIDO INDIVIDUAL	% RETENIDO INDIVIDUAL	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA	ESPECIFICACIÓN INV	
Pulgadas	mm					LIM INF	LIM SUP
2"	50,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
1 1/2"	38,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
1"	25,4	216,6	3,5	3,5	96,5	70	100
3/4"	19,1	615,9	9,9	13,3	86,7	60	90
3/8"	9,51	676,7	10,8	43,6	56,4	45	75
N°4	4,75	1310,9	21,0	64,5	35,5	30	60
N°10	2,00	683,2	10,9	75,5	24,5	20	45
N°40	0,425	470,7	7,5	83,0	17,0	10	30
N°200	0,075	493,6	7,9	90,9	9,1	5	15

Grava (%): 64,5 Arena (%): 26,4 Pasa 200 (%): 9,1

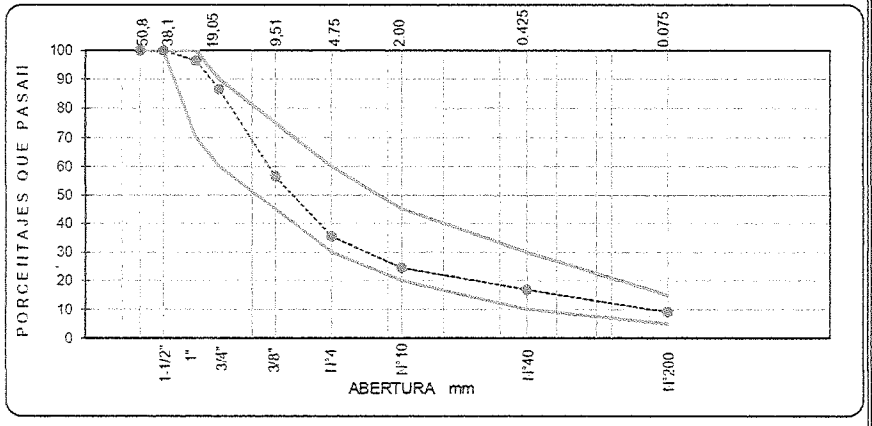

Observaciones:

Omar Vilardy
EJECUTO

Santiago Garcia G.
CALCULO

Ilustración 10. Angularidad

INCC

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS INVIAS E 239-22

Código: CAL-FR-024
Versión: 2
Pagina: 1 de 1
Fecha: 01-08-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	**FECHA:**	11-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	**MUESTRA No.:**	73
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR		

METODO	A		
PESO DEL MOLDE (gr)	274,7	274,7	274,7
(V) VOLUMEN MOLDE (cm3)	99,88	99,88	99,88
AGREG. FINO+ MOLDE (gr)	418,2	418,3	418,4
(F) PESO AGREGADO FINO (gr)	143,5	143,6	143,7
VACÍOS AGREGADO FINO SIN COMPACTAR	0,466	0,466	0,466
% U	46,6	46,6	46,6
PROMEDIO =	46,6		

(G) GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK (g/cm³): 2,693

OBSERVACIONES

Omar Vilardy
EJECUTÓ

Santiago Garcia
CALCULÓ

Ilustración 11. Caras fracturadas

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO
INVIAS E 227-22

Código: CAL-FR-01 | Versión: 2 | Pagina: 1 de 1 | Fecha: 01-06-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	**FECHA:**	11-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	**MUESTRA No.:**	73
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR		

UNA CARA FRACTURADA

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA (g)	PESO MATERIAL CON UNA CARA FRACTURADA (g)	PESO MATERIAL EN LA FRONTERA (g)	PESO MATERIAL SIN FRACTURACIÓN (g)	RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (%)	CARAS FRACTURADAS PONDERADAS (%)
PASA	RETIENE						
1 1/2"	1"	3005,0	2877,0	0	128,0	3,5	331,8
1"	3/4"	1513,0	1451,7	0	61,3	9,9	945,5
3/4"	1/2"	509,7	509,7	0	0,0	19,4	1941,1
1/2"	3/8"	302,3	300,7	0	1,6	10,8	1077,0
3/8"	No. 4	141,7	139,8	0	1,9	21,0	2069,3
TOTAL						64,5	6364,7

PORCENTAJE CON UNA CARA FRACTURADA (%)= 98,6

DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA (g)	PESO MATERIAL CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS (g)	PESO MATERIAL EN LA FRONTERA (g)	PESO MATERIAL SIN FRACTURACIÓN (g)	RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (%)	CARAS FRACTURADAS PONDERADAS (%)
PASA	RETIENE						
1 1/2"	1"	3005,0	2748,0	0	257,0	3,5	316,9
1"	3/4"	1513,0	1369,2	0	143,8	9,9	891,8
3/4"	1/2"	509,7	509,7	0	0,0	19,4	1941,1
1/2"	3/8"	302,3	286,7	0	15,6	10,8	1026,8
3/8"	No. 4	141,7	137,2	0	4,5	21,0	2030,8
TOTAL						64,5	6207,5

PORCENTAJE CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS (%)= 96,2

OBSERVACIONES:

Omar Vilardy — EJECUTÓ

Santiago Garcia — CALCULÓ


Ilustración 12. CBR


ENSAYO DE CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA
INVIAS E-148-22

Código: CAL-FR-05
Versión: 01
Fecha: 05/09/2022

CLIENTE:	INGETIERRAS DE COLOMBIA	APIQUE:		VOLUMEN MOLDE:	2144,0	2114,0	2109,0
PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCION	MUESTRA:		PESO MOLDE:	6872,0	7020,0	6847,0
LOCALIZACION:		PROFUNDIDAD:		FECHA:	11 de mayo de 2026		
DESCRIPCION:	BASE GRANULAR			CBR TIPO:	REMOLDEADO		

TIEMPO	PENETRACIÓN mm	Nº DE Ggolpes 56				Nº DE GOLPES 26				Nº DE GOLPES 10			
		INICIAL		FINAL		INICIAL		FINAL		INICIAL		FINAL	
		MOLDE Nº		1		MOLDE Nº		2		MOLDE Nº		3	
		CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb pul²)
0	0			0	0			0	0			0	0
30"	0.64			1.455	109.0			1.650	124.0			0.121	12.0
60"	1.27			6.449	483.2			4.825	361.6			0.987	74.0
120"	1.91			13.331	999.9			6.459	484.0			2.217	166.1
2'	2.54			20.448	1532.2			9.021	676.1			3.618	270.9
3'	3.81			34.822	2609.3			13.731	1028.9			6.228	466.7
4'	5.08			46.648	3496.5			18.469	1383.9			8.883	665.8
5'	6.35			50.526	3786.1			22.734	1703.6			10.709	802.5
6'	7.62			50.526	3786.1			26.611	1994.1			12.795	958.9
8	10.16			50.526	3786.1			30.701	2301.3			16.506	1236.9
10'	12.70			50.526	3786.1			42.235	3164.8			20.447	1532.2
PESO MUESTRA HUMEDA (g)		5178.0		5263.0		4977.0		5095.0		4992.0		5091.0	
RECIPIENTE Nº		26		28		1		26		5		7	
P. RECIPIENTE + SUELO HUMEDO (g)		439.70		412.95		485.5		439.4		369.1		648.3	
P. RECIPIENTE + SUELO SECO (g)		428.0		383.6		466.0		415.2		369.7		504.6	
P. RECIPIENTE (g)		111.50		110.00		128.2		111.6		112		120.2	
HUMEDAD (%)		5.4		9.6		5.6		9.0		0.1		9.1	
DENSIDAD HUMEDA (Kg/m³)		2415		2455		2324		2410		2392		2371	
DENSIDAD SECA (Kg/m³)		2292		2227		2229		2212		2197		2174	
CBR (%) (2.54")		0.0		163.2		0.0		67.6		0.0		27.3	
CBR (%) (5.08")		0.0		233.0		0.0		92.3		0.0		42.9	
LECTURA DEFORMIMETRO DE EXPANSION (Pulg)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
EXPANSION (%)		0.000				0.000				0.000			





Observaciones:

Omar Vilardy
EJECUTO

Santiago Garcia
CALCULO

Ilustración 13. Desgaste Maquina de los Ángeles

INCE

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
INV E 218/219-22

Código: CAL-FR-04
Versión: 2
Pagina: 1 de 1
Fecha: 01-08-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	**FECHA:**	11-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	**MUESTRA No.:**	73
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR	**NORMA UTILIZADA:**	INV E-218

ENSAYO N°	**REVOLUCIONES**	
	100	**500**
Gradación usada	A	A
N° de esferas	12	12
Peso carga abrasiva (g)	4975,0	4975,0
Peso muestra seca antes del ensayo (g) = (P1)	5011,0	5011,0
Peso muestra seca despues del ensayo (g) = (P2)	4608,0	3391,0
Pérdidas (g) = P1 - P2	403,0	1620,0
% Pérdidas = ((P1 - P2) / P1) *100	**8,0**	**32,3**

TAMAÑOS		**PESO Y GRADACIÓN DE LA MUESTRA, g**						
		INV E-218				**INV E-219**		
PASA	**RETENIDO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**1**	**2**	**3**
3"	2 1/2"					2500 ± 50		
2 1/2"	2"					2500 ± 50		
2"	1 1/2"					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2"	1"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
1"	3/4"	1250 ± 25						5000 ± 25
3/4"	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10					
1/2"	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10					
3/8"	1/4"			2500 ± 10				
1/4"	No. 4			2500 ± 10				
No. 4	No. 8				5000 ± 10			
Total, g		5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	10000 ± 100	10000 ± 75	10000 ± 50
No. de esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000
Carga abrasiva, g		5000 ± 25	4584 ± 25	3330 ± 20	2500 ± 15	5000 ± 25	5000 ± 25	5000 ± 25

OBSERVACIONES

Omar Vilardy
EJECUTÓ

Santiago Garcia
CALCULÓ

Ilustración 14. Equivalente de Arena

EQUIVALENTE DE ARENA
INVIAS E 133-22

Código:	CAL-FR-27
Versión:	02
Pagina:	1 de 1
Fecha:	01-08-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	**FECHA:**	11-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	**MUESTRA No.:**	73
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR		

ENSAYO Nº	1	2	3	4
PROBETA Nº	1	2		
LECTURA DE LA ARCILLA (mm)	7,7	7,6		
LECTURA DE LA ARENA (mm)	3,1	3,1		
EQUIVALENTE DE ARENA (%)	40	41		
PROMEDIO (%)	41			

OBSERVACIONES

Omar Vilardy
EJECUTÓ

Santiago Garcia
CALCULÓ

Ilustración 15. Índice de alargamiento y aplanamiento

	ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS INVIAS E 230-22	Código: CAL-FR-028 Versión: 1 Pagina: 1 de 1 Fecha: 01-08-24

PROYECTO: PLANTA DE PRODUCCIÓN **FECHA:** 11-may-26

FUENTE: SAN FRANCISCO **MUESTRA No.** 73

DESCRIPCIÓN: BASE GRANULAR

INDICE DE ALARGAMIENTO

FRACCION GRANULOMETRICA		MASA INICIAL DE CADA FRACCION (gr)	GRADACION ORIGINAL DE LA MUESTRA (% RET.)	GRADACION CORREGIDA DE LA MUESTRA (%RET.)	MASA DE LAS PARTICULAS ALARGADAS (gr)	INDICE DE ALARGAMIENTO POR FRACCION
PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	R_i			n_i	$(n_i/R_i)*100$
1 1/2"	1"	3005,0	3,5	5,4	468,5	15,6
1"	3/4"	1513,0	9,9	15,3	392,7	26,0
3/4"	1/2"	509,7	19,4	30,1	241,9	47,5
1/2"	3/8"	302,3	10,8	16,8	151,7	50,2
3/8"	1/4"	141,7	21,0	32,5	58,3	41,1
TOTAL		M_{i1}	64,5	100,0	M_{i2}	
		5472			1.313	
				INDICE DE ALARGAMIENTO (IAL) =		24 %

INDICE DE APLANAMIENTO

FRACCION GRANULOMETRICA		MASA INICIAL DE CADA FRACCION (gr)	GRADACION ORIGINAL DE LA MUESTRA (% RET.)	GRADACION CORREGIDA DE LA MUESTRA (%RET.)	MASA DE LAS PARTICULAS PLANAS (gr)	INDICE DE APLANAMIENTO POR FRACCION
PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	R_i			m_i	$(m_i/R_i)*100$
1 1/2"	1"	3005,0	3,5	5,4	649,4	21,6
1"	3/4"	1513,0	9,9	15,3	393,4	26,0
3/4"	1/2"	509,7	19,4	30,1	176,4	34,6
1/2"	3/8"	302,3	10,8	16,8	75,1	24,8
3/8"	1/4"	141,7	21,0	32,5	38	26,8
TOTAL		M_i	64,5	100,0	M_3	
		5472			1.332	
				INDICE DE APLANAMIENTO (IAP)=		24 %

OBSERVACIONES:

Omar Vilardy
EJECUTÓ

Santiago Garcia
CALCULÓ

Ilustración 16. Proctor

INCE

RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS INVIAS E-141/142

Código:	CAL-FR-013
Versión:	02
Pagina:	1 de 1
Fecha:	01-06-24


PROYECTO: PLANTA DE PRODUCCIÓN **FECHA TOMA:** 11-may-26

FUENTE: SAN FRANCISCO **MUESTRA No.:** 73

DESCRIPCIÓN: BASE GRANULAR

Gravedad especifica	2,678
% Fracción gruesa	13,3
% Fracción fina	86,7

Ensayo N°	1	2	3	4
Método de ensayo	C	C	C	
Peso del martillo (lb)	10	10	10	
N° de golpes	56	56	56	
Peso del molde + muestra (Kg)	11,280	11,522	11,526	
Peso del molde (Kg)	6,205	6,205	6,205	
Peso muestra húmeda (Kg)	5,075	5,317	5,321	
Volumen del molde (m^3)	0,002132	0,002132	0,002132	
Densidad húmeda (kg/m3)	2.380	2.494	2.496	
Humedad (%)	2,7	6,2	9,3	
Densidad seca (Kg/m3)	2.317	2.349	2.284	
Peso unitario seco (KN/m3)	22,724	23,032	22,394	

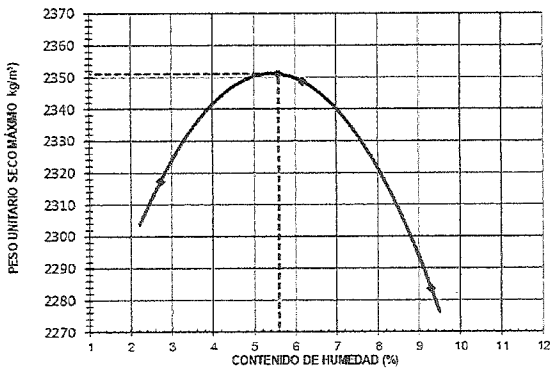

RESULTADOS	Sin corregir	Corregido
Densidad seca máxima (Kg/m3)	2.351	2.372
Peso unitario seco (KN/m3)	23,06	23,26
Humedad óptima (%)	5,6	5,4

OBSERVACIONES: _____

Omar Vilardy
Elaboró

Santiago Garcia G.
Calculó

Ilustración 17. Solidez

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO
INVIAS E 220-22

Código: CAL-FR-016 | Versión: 2 | Página: 1 de 1 | Fecha: 01-08-24

PROYECTO:	PLANTA DE PRODUCCIÓN	FECHA:	19-may-26
FUENTE:	SAN FRANCISCO	MUESTRA No.:	78
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR	TIPO DE SOLUCIÓN:	SULFATO DE MAGNESIO

FRACCIÓN FINA

Tamiz		% Retenido Gradación original	% Retenido Gradación Ponderada	Masa fracciones antes del ensayo (g)	Masa fracciones después del ensayo (g)	% pasa tamiz después del ensayo	% Perdida ponderado (% pérdida corregido)
Tamaño Agreg.							
Pasa	Retiene						
3/8"	N°4	18,7	51,4	100,0	92,7	7,30	3,8
N°4	N°8	8,3	23,0	100,0	89,6	10,40	2,4
N°8	N°16	4,5	12,4	100,0	74,9	25,10	3,1
N°16	N°30	3,2	8,8	100,0	82,0	18,00	1,6
N°30	N°50	1,6	4,4	100,0	67,9	32,10	1,4
TOTALES		36,3	100,0		*% EN PERDIDA AGREG. FINO*		12,3

FRACCIÓN GRUESA

Tamiz		% Retenido Gradación original	% Retenido Gradación Ponderada	Masa fracciones antes del ensayo (g)	Masa fracciones después del ensayo (g)	% pasa tamiz después del ensayo	% Perdida ponderado (% pérdida corregido)
Tamaño Agreg.							
Pasa	Retiene						
2"	1 1/2"						
1 1/2"	1"	2,4	3,8	1000,0	992,0	0,80	0,0
1"	3/4"	9,3	14,5	500,0	473,0	5,40	0,8
3/4"	1/2"	24,0	37,3	670,0	631,8	5,70	2,1
1/2"	3/8"	10,0	15,5	330,0	305,3	7,50	1,2
3/8"	N°4	18,7	29,0	150,8	121,7	19,30	5,6
TOTALES		64,4	100,0		*% EN PERDIDA AGREG. GRUESO*		9,7

EXAMEN CUALITATIVO DE LAS PARTÍCULAS GRUESAS

Tamiz		N° de particulas antes de ensayo	N° de particulas despues de ensayo				
			Agrietadas	Partidas	Escamosas	Desintegradas	Lajosas
Pasa	Retiene		N°	N°	N°	N°	N°
2"	1 1/2"						
1 1/2"	1"						
1"	3/4"						

OBSERVACIONES

Omar Vilardy
EJECUTÓ

Santiago Garcia
CALCULÓ

- En el presente informe, se incluyen los resultados de los ensayos de densidad realizados en el presente periodo, para verificar el grado de compactación de la base granular instalada,

con lo cual se evidencia un grado de compactación promedio mayor al 95% (Adjunto en Anexo No 2).

Ilustración 18. Densidad Anden Casas del Mar 11/06/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	3.4	5.2	95%	93%	38%	K0+070
2	2.7	5.2	95%	99%	42%	K0+095

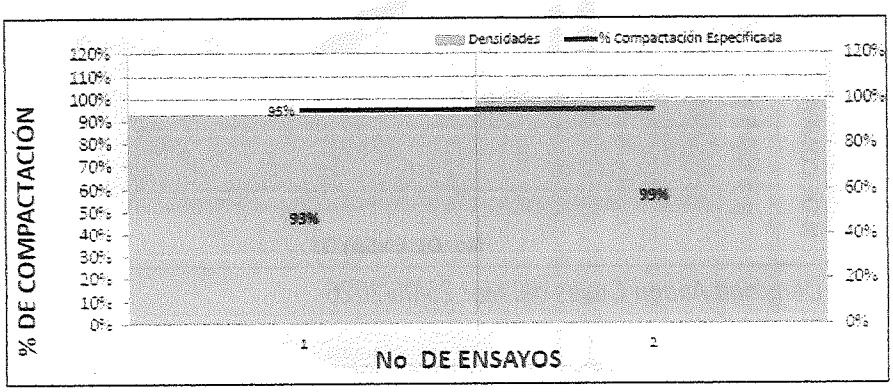


Ilustración 19. Densidad Anden Casas del Mar 19/06/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	3.6	5.4	95%	99%	65%	K0+215
2	3.8	5.4	95%	97%	58%	CDI Tramo Izquierdo

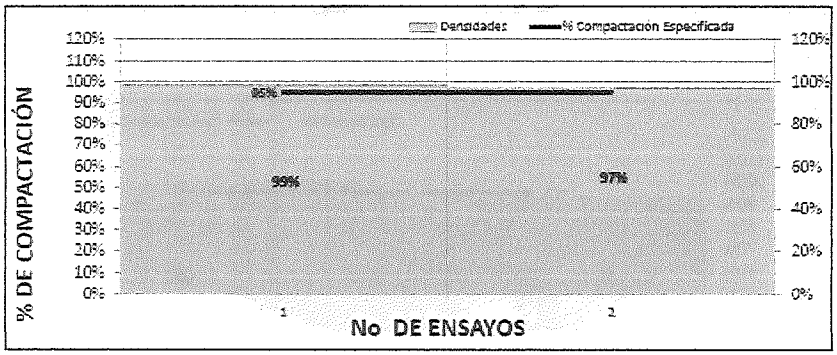


Ilustración 20. Densidad Anden Casas del Mar 25/06/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	5.2	5.4	95%	95%	73%	K0+060
2	4.7	5.4	95%	98%	60%	K0+200

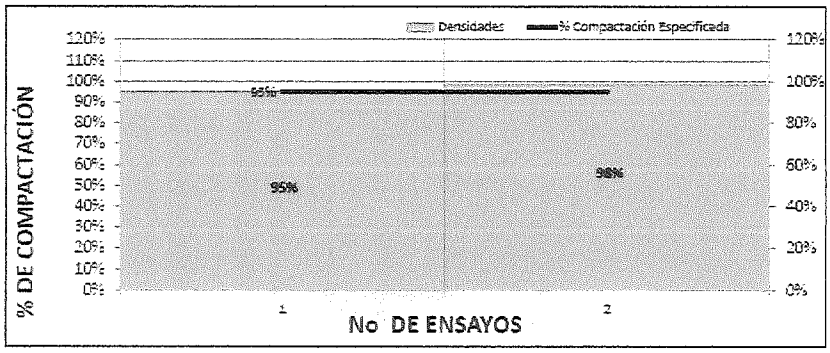


Ilustración 21. Densidad Anden Casas del Mar 30/06/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	5.3	5.4	95%	95%	73%	K0+320
2	4.4	5.4	95%	95%	58%	K0+340

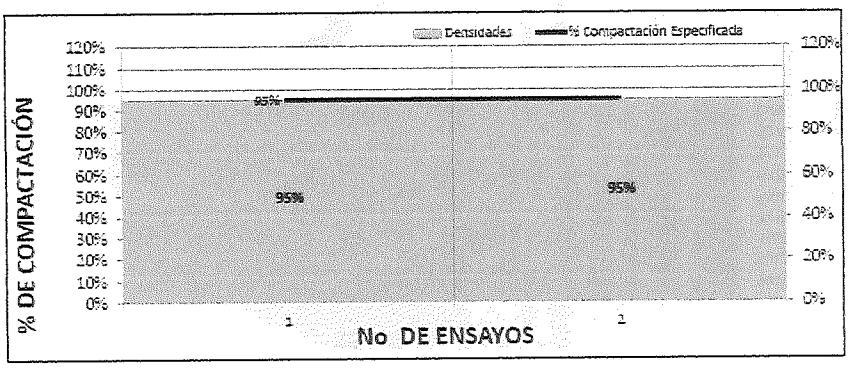


Ilustración 22. Densidad Anden Quebrada Arriba 03/07/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	2.5	5.4	95%	99%	47%	K0+010 Quebrada arriba

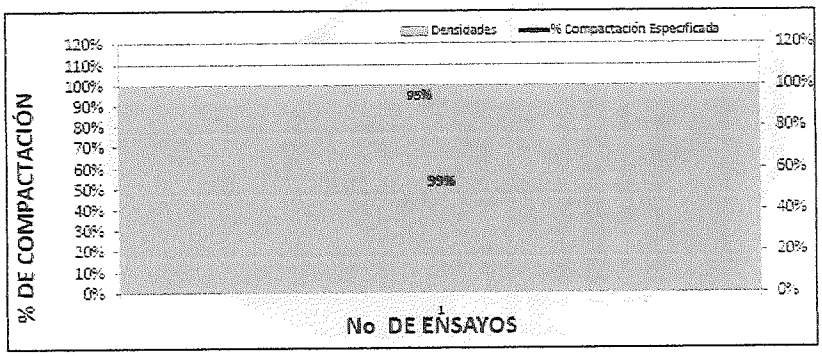


Ilustración 23. Densidad Anden Quebrada Arriba 09/07/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	3.1	5.4	95%	99%	56%	Quebrada arriba K0+060

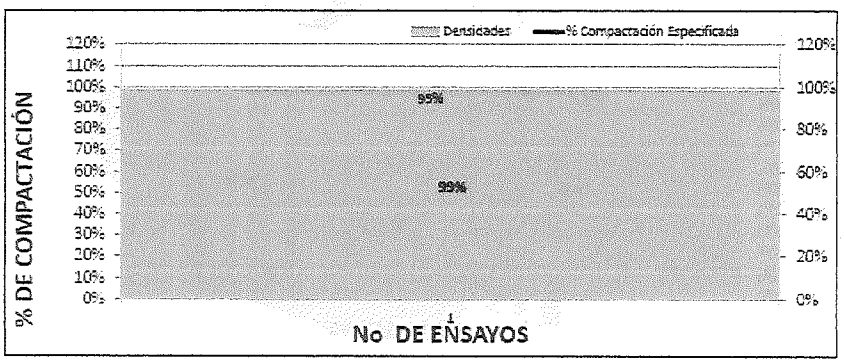


Ilustración 24. Densidad Anden Casas del Mar 11/07/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	3.7	5.4	95%	95%	50%	K0+040 - lado derecho

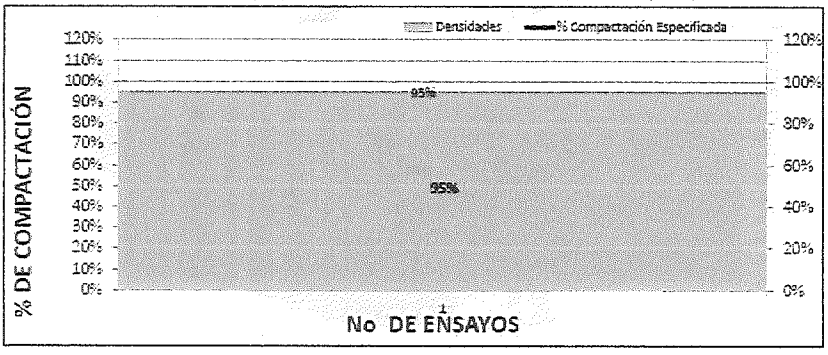


Ilustración 25. Densidad Anden Laureles 15/07/2026

RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	6.2	5.4	95%	97%	93%	Laureles K0+015


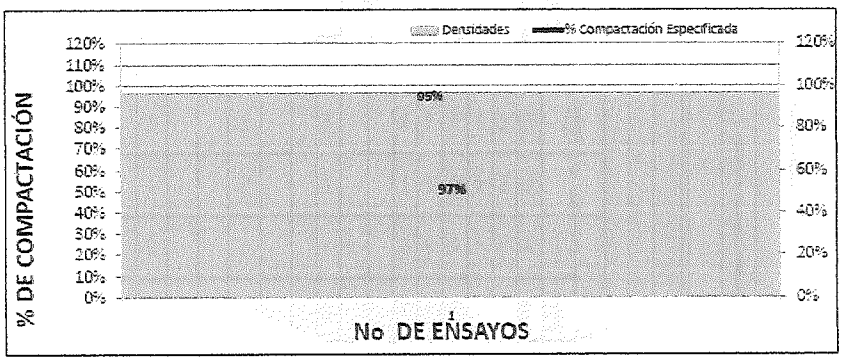


Ilustración 26. Densidad Anden Casas del Mar y Quebrada Arriba 17/07/2026


RESUMEN

No	Humedad (%)	Humedad Optima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	3.9	5.4	95%	95%	52%	Casas del mar K0+030 lado derecho
2	3.5	5.4	95%	96%	51%	Quebrada arriba K0+140

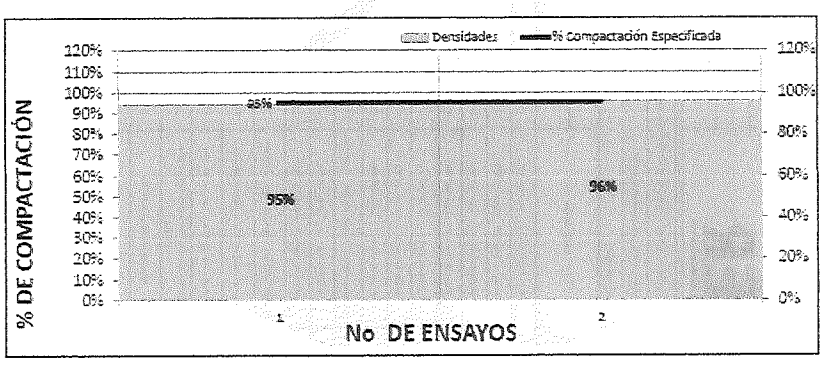

- En el presente informe, se incluyen los resultados de los ensayos realizados a los cilindros de concreto para verificar la resistencia a la compresión con lo cual se evidencia que a los 28 días están dando una resistencia de más de 21 MPa (210 kg/cm2) (Adjunto en Anexo No 2).

Ilustración 27. Reporte cilindros de concreto

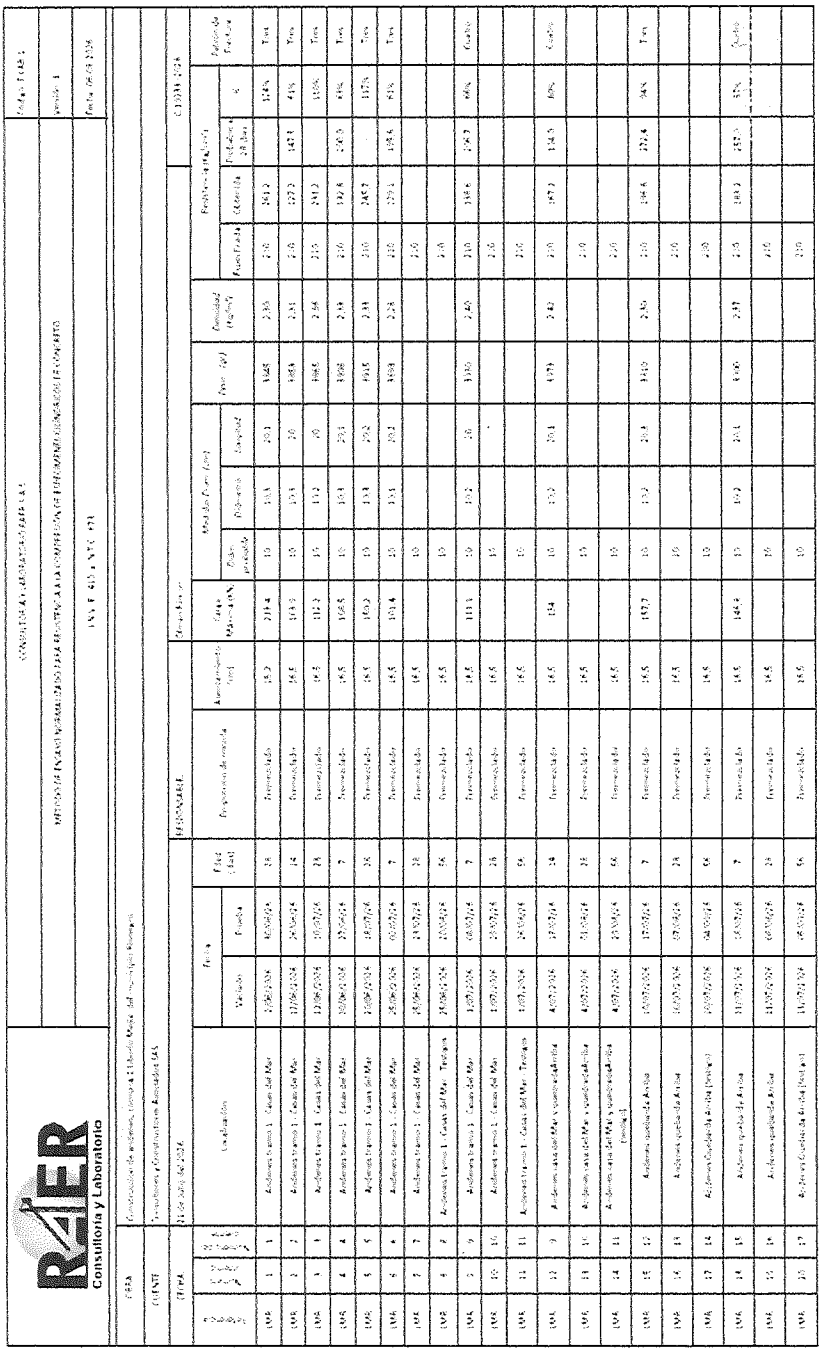

3.4 Cuadro de actividades y cantidades ejecutadas

Ilustración 28. Cuadro de cantidades ejecutadas al presente informe 1 de 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**				**$ 8.316.552,00**		**$ -**
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (incluye equipo de precision debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría.	día	12,00	$ 693.046,00	$ 8.316.552,00		$ -
2	**DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS**				**$ 495.503.357,00**		**$ 88.053.821,00**
2,01	DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, distancia maxima de 15 km.	m3	533,33	$ 238.570,00	$ 127.237.333,00	119,10	$ 28.413.687,00
2,02	DEMOLICION PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	166,67	$ 163.597,00	$ 27.266.167,00	87,60	$ 14.331.097,00
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	3.000,00	$ 70.711,00	$ 212.133.000,00	257,50	$ 18.236.367,00
2,04	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumatico con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	2.000,00	$ 24.480,00	$ 48.960.000,00	1002,70	$ 24.546.096,00
2,05	RETIRO DE SEÑALES VIALES. Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	un	15,00	$ 42.786,00	$ 641.790,00		$ -
2,06	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS). Debe alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo proctor modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la interventoría.	m3	1.066,67	$ 74.311,00	$ 79.265.067,00	34,00	$ 2.526.574,00
3	**ANDENES**				**$ 2.086.736.100,00**		**$ 268.921.665,00**
3,01	Suministro e instalación de loseta táctil guía o alerta de 20x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	5.000,00	$ 35.626,00	$ 178.130.000,00	926,00	$ 29.427.076,00
3,02	Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR tipo INVIAS, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, previa autorización de la interventoría, para parcheos de máximo 25 m2 de área superficial.	m3	1.575,00	$ 284.588,00	$ 448.226.100,00	204,60	$ 58.226.705,00
3,03	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR) 15x45x80 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	5.000,00	$ 104.213,00	$ 521.065.000,00	947,50	$ 98.783.503,00

Ilustración 29. Cuadro de cantidades ejecutadas al presente informe 2 de 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,04	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomerico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoria. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su item respectivo.	m2	7.500,00	$ 125.242,00	$ 939.315.000,00	658,60	$ 82.484.381,00
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 135.448.853,00		$ 409.657,00
6,36	Realce de MH hasta 15 cm. Incluye tapa y cuello nuevos en concreto, demolición de pavimento, suministro, transporte e instalación, excavación, descargue y transportes internos hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye transporte y botada de escombros.	un	30,00	$ 1.157.432	$ 34.722.960,00		$ -
6,37	Suministro e instalación de tapa para caja de contador de agua, fabricada en madera plástica de alta resistencia, con dimensiones adecuadas para la caja existente. La tapa deberá contar con bisagra y sistema de cierre seguro para facilitar el acceso al medidor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	120,00	$ 384.209	$ 46.104.960,00		$ -
6,38	Demolición de la tapa de concreto existente, incluye herraje metálico y construcción de una nueva tapa de concreto reforzado con una resistencia de 21 MPa, garantizando su adecuado ajuste y funcionalidad. Se incluyen actividades de preparación de superficie, limpieza y tratamiento del herraje, vaciado del concreto, curado y acabado final.	m2	133,33	$ 409.657	$ 54.620.933,00	1,00	$ 409.657,00
OE	OBRAS EXTRAS						$ 52.666.545,00
OE-1	Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los anderes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"	m		$ 27.500		18,00	$ 495.000,00
OE-2	Construccion de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de ander peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso recuieran un reforzamiento adicional. El item incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2" cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m2		$ 285.357		76,10	$ 21.715.668,00
OE-3	Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und		$ 144.634		7,00	$ 1.012.438,00
OE-4	Fabricación, instalación y posterior retiro de estructuras provisionales tipo pasarela o rampa de madera destinadas a garantizar el acceso peatonal a las viviendas afectadas por las excavaciones y/o demoliciones. El item incluye el recubrimiento superior con tapete antideslizante, fijaciones seguras para evitar tropiezos, pasamanos de protección si se requieren por altura y el mantenimiento continuo durante el tiempo que dure la interferencia de la obra frente al predio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		$ 100.000			$ -
OE-5	Suministro e instalacion de adoquin demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelacion y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación	m		$ 34.956		842,30	$ 29.443.438,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 2.726.004.862,00		$ 410.051.688,00
				ADMINISTRACION	25,14%	$ 685.258.941,00	$ 103.034.949,00
				IMPREVISTOS	0,00%	$ 0,00	$ 0,00
				UTILIDAD	5,00%	$ 136.300.243,00	$ 20.502.594,00
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 821.559.284,00	$ 123.586.633,00
				VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS		$ 3.547.603.146,00	$ 533.638.321,00

3.5 % avance programado vs ejecutado

De acuerdo a la programación de obra que se encuentra APROBADA por parte de la interventoría y al avance físico del proyecto; el contrato a fecha de corte del 25 de julio de 2026 presenta un porcentaje programado del **81.72%** y un porcentaje de ejecución del **15.04%,** reflejando un atraso de **66.68%** debido a inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato, relacionado con la contratación de mano de obra local, disponibilidad de materiales y falta de disposición de la comunidad con la ejecución de la obra.

Tabla 2. Resumen de avances contrato

Avance programado	Avance ejecutado	Diferencia
81,72	15,04	- 66,68

3.6 Programa por frentes de trabajo

Se incluye la reprogramación por frentes de trabajo para los sectores Casas del Mar, Quebrada Arriba, Laureles, Bosques del Norte y Galería y se indica el estado de avance en cada sector.

Ilustración 30. Programación por frente de trabajo

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	120 días	lun 11/05/26	dom 25/10/26
CASAS DEL MAR (692 m)	120 días	lun 11/05/26	dom 25/10/26
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5 días	lun 19/10/26	dom 25/10/26
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	56 días	lun 11/05/26	lun 27/07/26
ANDENES	54 días	lun 25/05/26	jue 6/08/26
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 días	mié 29/07/26	dom 2/08/26
OBRAS EXTRA	15 días	lun 20/07/26	dom 9/08/26
QUEBRADA ARRIBA (417 m)	89 días	mar 23/06/26	dom 25/10/26
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5 días	lun 19/10/26	dom 25/10/26
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	26 días	mar 23/06/26	mar 28/07/26
ANDENES	25 días	lun 29/06/26	dom 2/08/26
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 días	mié 29/07/26	dom 2/08/26
OBRAS EXTRA	10 días	lun 20/07/26	dom 2/08/26
LAURELES (692 m)	82 días	jue 2/07/26	dom 25/10/26
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5 días	lun 19/10/26	dom 25/10/26
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	47 días	jue 2/07/26	dom 6/09/26
ANDENES	44 días	mar 7/07/26	dom 6/09/26
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 días	mié 2/09/26	dom 6/09/26
OBRAS EXTRA	35 días	lun 20/07/26	dom 6/09/26
BOSQUES DEL NORTE (830 m)	60 días	lun 3/08/26	dom 25/10/26
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5 días	lun 19/10/26	dom 25/10/26
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	60 días	lun 3/08/26	vie 23/10/26
ANDENES	57 días	jue 6/08/26	dom 25/10/26
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 días	mié 21/10/26	dom 25/10/26
OBRAS EXTRA	57 días	jue 6/08/26	dom 25/10/26
GALERIA (906 m)	60 días	lun 3/08/26	dom 25/10/26
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	5 días	lun 19/10/26	dom 25/10/26
DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	59 días	lun 3/08/26	jue 22/10/26
ANDENES	57 días	jue 6/08/26	dom 25/10/26
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 días	mié 21/10/26	dom 25/10/26
OBRAS EXTRA	57 días	jue 6/08/26	dom 25/10/26

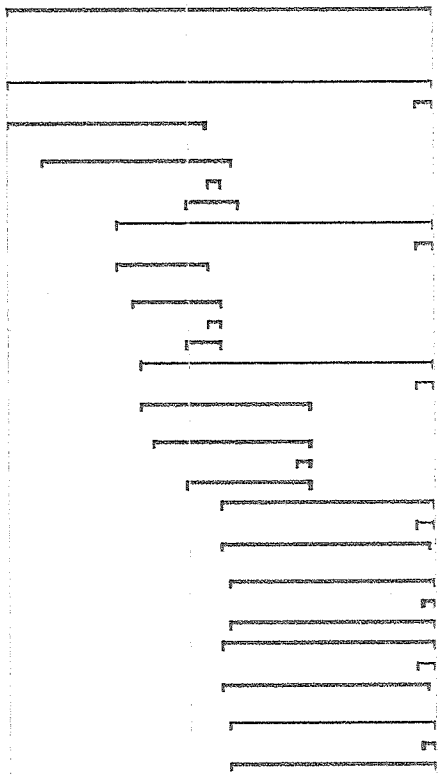


Tabla 3. Resumen de estado de avance por sector

Sector	Cantidad (m)	Construido (m)	% Avance
Casas del Mar	692	581,15	83,98%
Quebrada Arriba	417	192,90	46,26%
Laureles	692	51,50	7,44%
Bosques del Norte	830	0,00	0,00%
Galería	966	0,00	0,00%

3.7 Obras extras adicionales aprobadas en el periodo

Las obras extras aprobadas a la fecha del presente informe se relacionan a continuación:

Tabla 4. Obras Extras aprobadas

Ítem	Descripción
OE-1	Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"
OE-2	Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2" cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción
OE-3	Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación
OE-4	Fabricación, instalación y posterior retiro de estructuras provisionales tipo pasarela o rampa de madera destinadas a garantizar el acceso peatonal a las viviendas afectadas por las excavaciones y/o demoliciones. El ítem incluye el recubrimiento superior con tapete antideslizante, fijaciones seguras para evitar tropiezos, pasamanos de protección si se requieren por altura y el mantenimiento continuo durante el tiempo que dure la interferencia de la obra frente al predio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

OE-5	Suministro e instalación de adoquín demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación

Los APUS de las nuevas obras extras requeridas para la ejecución del proyecto se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Supervisión y el Municipio. La justificación técnica para el requerimiento de estos ítems es la siguiente:

Tabla 5. Obras Extras en proceso de revisión y aprobación




Ítem	Descripción
OE-6	Construcción de viga 0.25x0.4 en concreto de 21Mpa, apoyada sobre micropilotes de 0.3 m diámetro H:1.5m cada metro, y vástago e:0.15m para contención H: < 1.0m, incluye acero de refuerzo según detalle constructivo, incluye formaleta y todo lo necesario para su construcción. la excavación manual se paga es su respectivo ítem
Justificación	Durante la ejecución de las excavaciones para la construcción del andén se identificaron sectores donde las condiciones reales del terreno no garantizan la estabilidad de la estructura. Por tal motivo, se requiere la construcción de un sistema de contención que asegure el confinamiento del terreno, prevenga procesos de erosión y asentamientos, y garantice la estabilidad, seguridad y durabilidad del andén
OE-7	Suministro e instalación de loseta táctil alerta de 20x20x6 en concreto PARA TAPETES DE REBAJE, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación
Justificación	Durante la ejecución de los rebajes peatonales se evidenció la necesidad de instalar tapetes podotáctiles en los cruces para garantizar la accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad visual. Esta actividad es necesaria para brindar una superficie táctil de advertencia en la transición entre el andén y la calzada, constituyendo una obra adicional indispensable para la correcta funcionalidad de los cruces peatonales
OE-8	Rocería mediante poda manual y/o mecánica de cercos vivos en bambú o vegetación similar, incluye extracción de raíces. La actividad incluye recolección, cargue, transporte y disposición final adecuada de los residuos vegetales generados, conforme a las disposiciones ambientales aplicables y en sitios autorizados
Justificación	Durante la ejecución de las obras se identificaron tramos donde cercos vivos y vegetación existente interfieren con la construcción y el adecuado funcionamiento del andén. Por tal motivo, se requiere la poda, extracción de raíces y disposición final del material vegetal, como una obra adicional


	indispensable para garantizar la correcta ejecución de la infraestructura peatonal
OE-9	Suministro transporte e instalación de viento convencional según la norma de EPM NC-RA6-001
Justificación	Durante la ejecución de las obras se identificó que algunos vientos de redes existentes interfieren con el alineamiento y el ancho útil del andén. Por tal motivo, se requiere su reubicación conforme a la Norma EPM NC-RA6-001, como una obra adicional indispensable para garantizar la continuidad, seguridad y accesibilidad del corredor peatonal
OE-10	Suministro e instalación de bloques de césped tipo macana, incluye tierra negra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación
Justificación	Durante la ejecución de las obras se evidenció la necesidad de recuperar los taludes y terraplenes adyacentes al andén mediante la instalación de bloques de grama, con el fin de controlar la erosión, estabilizar las zonas intervenidas y mejorar su integración paisajística. Esta actividad constituye una obra adicional indispensable para la protección y recuperación ambiental del proyecto
OE-11	Reconstrucción de Revoque y regularización de franjas expuestas en muros de fachada, altura máxima de 40 cm. Espesor hasta 5 cm. Incluye cortes con pulidora para unificar alturas, aditivo impermeabilizante y adherente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación
Justificación	La reconstrucción del revoque en franjas expuestas de fachadas se requiere como consecuencia de las demoliciones y la construcción de los nuevos andenes, con el fin de restituir los acabados, proteger los muros contra la humedad y garantizar su adecuada integración con la infraestructura peatonal
OE-12	Realce de cajas de inspección y servicios hasta 80 × 120 cm. Comprende el realce de cajas eléctricas, hidrosanitarias, de válvulas y demás estructuras de inspección, mediante concreto de 21 MPa y malla electrosoldada perimetral D-84, incluyendo nivelación y ajuste de marcos, formaleta, anclajes, acabado, retiro de sobrantes y todo lo necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento
Justificación	El realce de las cajas de inspección y servicios se requiere para ajustarlas a las nuevas cotas de los andenes, garantizando su adecuada funcionalidad, accesibilidad e integración con la infraestructura peatonal, así como la estabilidad y durabilidad de la intervención
OE-13	Suministro, transporte e instalación de bolardo tipo EDU diseño y especificaciones exigidas por la EDU. Cuerpo en fundición de hierro nodular norma ASTM A536 65-45-12- pintado con base anticorrosiva y con pintura de poliuretano. Dimensiones: altura (incluye 30cms para enterrar) de 90 cms, diámetro maximo:14 cms.
Justificación	La instalación de bolardos tipo EDU se requiere para proteger los nuevos andenes, impedir el ingreso de vehículos y garantizar la seguridad,

	accesibilidad y adecuada delimitación del espacio peatonal, asegurando además la durabilidad de la infraestructura
OE-14	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3" a 6" para adecuación de bajantes de aguas lluvias. Incluye reposición, prolongación o reubicación de bajantes existentes para garantizar el correcto desagüe tras la construcción del nuevo andén, con accesorios, conexiones, soportes y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento.
Justificación	La adecuación de los bajantes de aguas lluvias se requiere por la modificación de las cotas del nuevo andén, con el fin de garantizar la correcta evacuación de las aguas, evitar el deterioro de la infraestructura peatonal y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje
OE-15	Instalación de loseta guía podotáctil en caucho acrilo-nitrilo de 0.20mx0.20m sobre tapas de concreto, que incluye la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de adhesivo, colocación, alineación y fijación de la loseta, limpieza final y todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos menores necesarios para su correcta ejecución
Justificación	La instalación de loseta táctil guía plástica se requiere en superficies donde no es viable colocar loseta de concreto, con el fin de garantizar la continuidad de la guía para personas con discapacidad visual, conservar la funcionalidad de las cajas de inspección y cumplir con los criterios de accesibilidad del proyecto
OE-16	Rocería mediante poda manual de vegetación hasta una altura de 2m, Incluyendo extracción de raíces. La actividad incluye recolección, cargue, transporte y disposición final adecuada de los residuos vegetales generados, conforme a las disposiciones ambientales aplicables y en sitios autorizados.
Justificación	Durante la ejecución de las obras se identificaron tramos donde arbustos y vegetación existente interfieren con la construcción y el adecuado funcionamiento del andén. Por tal motivo, se requiere la poda, extracción de raíces y disposición final del material vegetal, como una obra adicional indispensable para garantizar la correcta ejecución de la infraestructura peatonal
OE-17	Suministro, transporte e instalación de Tubería Novafort 8", incluye accesorio, la excavación se pagará por su respectivo ítem
Justificación	Esta obra se requiere para incrementar la capacidad hidráulica de los sumideros existentes, mejorando la captación y evacuación de las aguas lluvias, con el fin de reducir empozamientos y proteger la infraestructura vial y peatonal




3.8 Registro fotográfico


Sector Casas del Mar
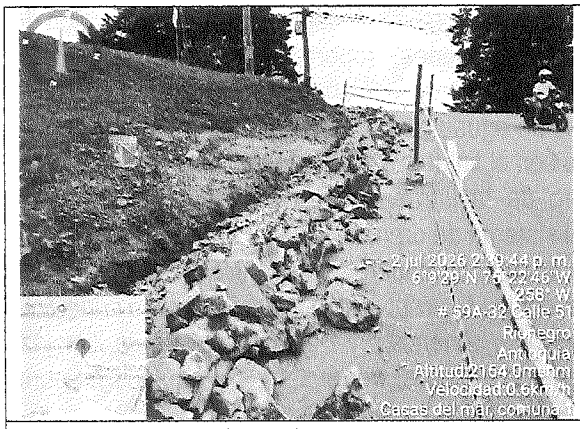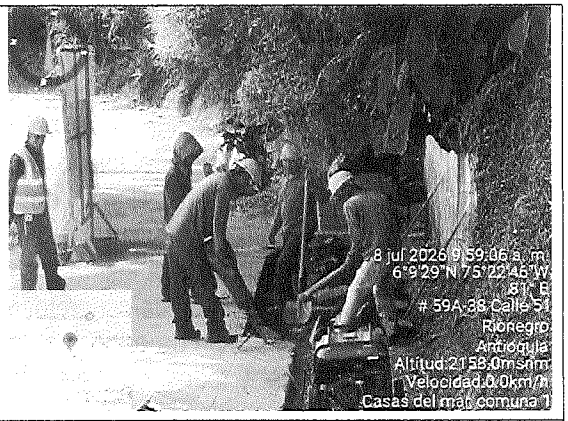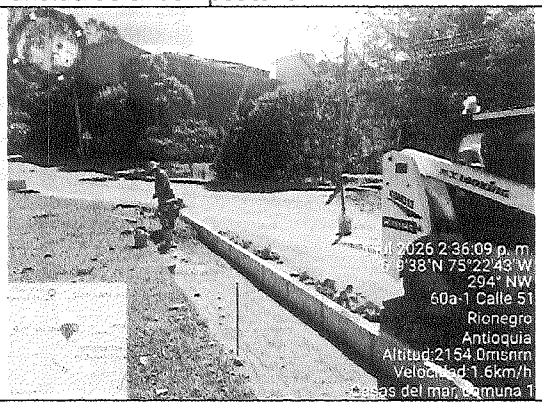
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Demolición de anden existente en concreto</td><td>Corte de pavimento asfaltico para instalación de bordillo</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Fundida de anden peatonal</td><td>Excavación para instalación de base granular</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Instalación de bordillos</td><td>Relleno con base granular para anden</td></tr>
</table>



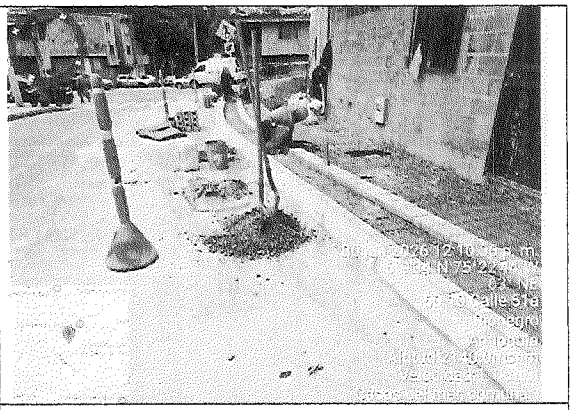
	
Instalación de loseta guía táctil	Instalación de adoquín visual


Sector Quebrada Arriba

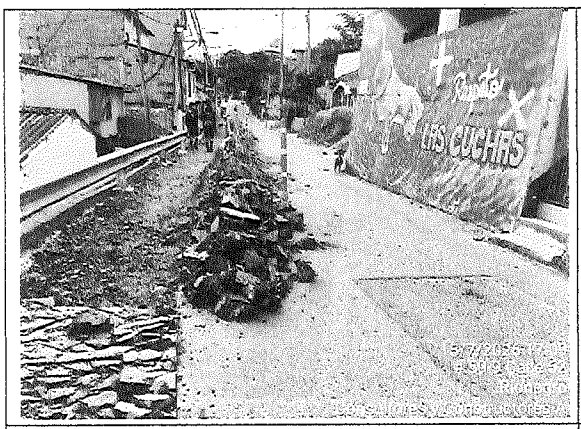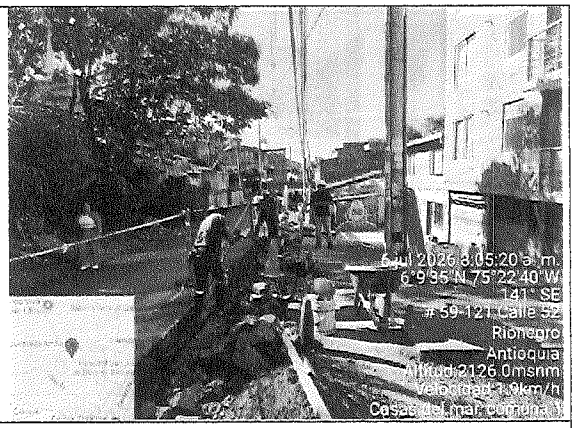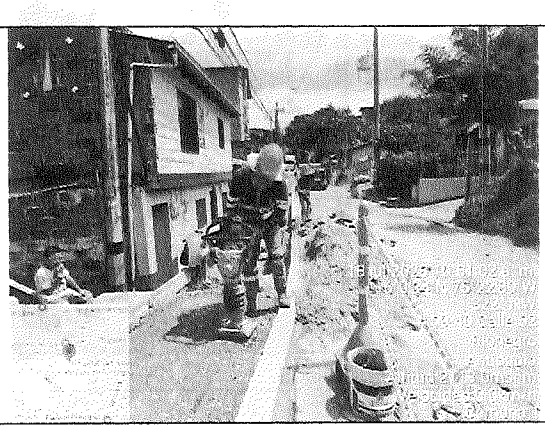	
Corte de pavimento asfaltico para instalación de bordillo	Excavación para instalación de base granular
	
Instalación de bordillos	Relleno con base granular para anden

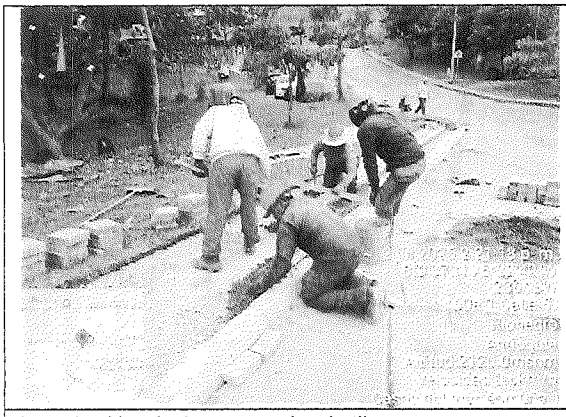	
Instalación de loseta guía táctil	Fundida de anden peatonal

Sector Laureles

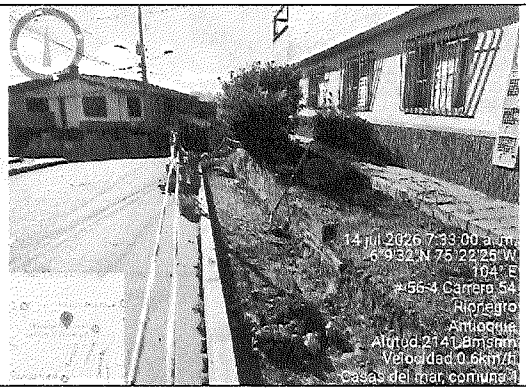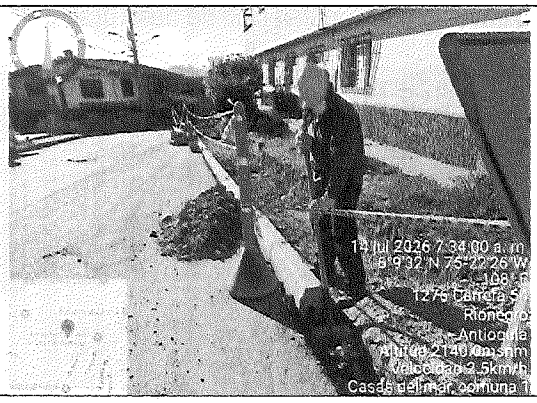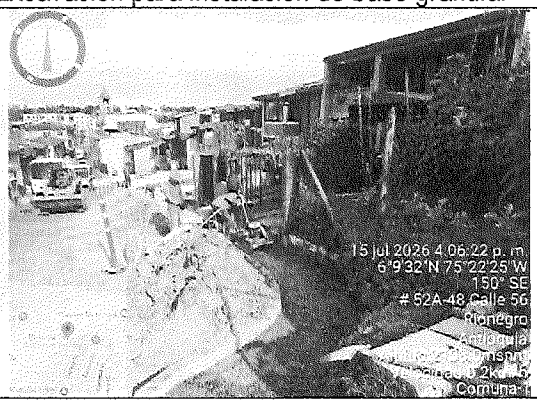	
Demolición de anden existente en concreto	Excavación para instalación de base granular
	
Instalación de bordillos	Relleno con base granular para anden

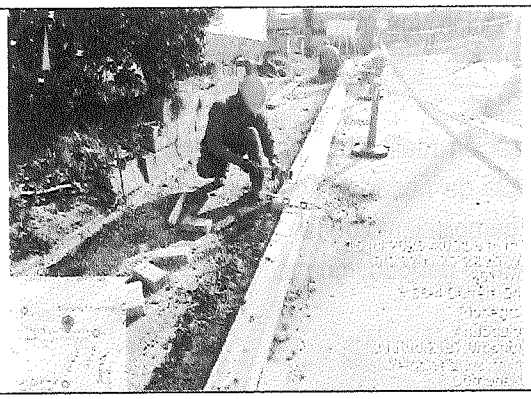	
Instalación de adoquín	Fundida de anden peatonal

4. SEGUIMIENTO SOCIAL

En el marco del Plan de Gestión Social implementado para el proyecto **Obras de construcción de andenes, comuna 1 Liborio Mejía del municipio de Rionegro**, desde el contratista se desarrollan distintas actividades de seguimiento a los indicadores sociales establecidos con el fin de garantizar una adecuada planificación, ejecución y control de las acciones de gestión social asociadas a la obra.

La implementación y seguimiento de estas actividades permiten consolidar una gestión social participativa e incluyente, orientada al fortalecimiento de las relaciones comunitarias y al cumplimiento de los objetivos sociales planteados para el proyecto.

Este informe presenta entonces las actividades desarrolladas en el marco de los siguientes programas:

- Socialización y comunicación.
- Protección a la infraestructura pública y privada.
- Atención a la comunidad y gestión de PQRS.

4.1. Socialización y comunicación

4.1.1. Socialización

Durante el período correspondiente al presente informe, se llevaron a cabo diversas jornadas de socialización dirigidas a la comunidad, con el propósito de informar oportunamente sobre el desarrollo del proyecto, las actividades programadas, los avances de la obra y, de manera especial, los cierres viales requeridos para la ejecución de los trabajos, como estrategia

complementaria de divulgación, esta información fue reforzada mediante el envío de comunicaciones a través de grupos de WhatsApp, garantizando un mayor alcance y una adecuada difusión de los cambios en la movilidad.

Como soporte de las actividades de socialización realizadas, se cuenta con el respectivo registro fotográfico y los listados de asistencia de cada jornada, los cuales evidencian la participación de la comunidad y respaldan el cumplimiento de las actividades de información y participación ciudadana desarrolladas durante el período informado.

Tabla 6 Registro de socializaciones

Fecha	Tipo de socialización	Lugar	N° asistentes	Duración	Observaciones
22/06/2026	Socialización puerta a puerta	Sector Laureles	17	2 horas	Se realizó una jornada de socialización puerta a puerta con los habitantes del sector Laureles, con el propósito de informar sobre el proyecto a ejecutar, su alcance, las actividades previstas, el cronograma de intervención y las posibles afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras.
26/06/2026	Socialización puerta a puerta	Sector Laureles.	22	1 hora	Se realizó una jornada de socialización puerta a puerta con los habitantes del sector Laureles, con el propósito de informar sobre el proyecto a ejecutar, su alcance, las actividades previstas, el cronograma de intervención y las posibles afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras.
09/07/2026	Socialización puerta a puerta	Sector Quebrada Arriba.	13	1 hora	Se realizó una jornada de socialización puerta a puerta con los habitantes del sector


					Quebrada Arriba, con el propósito de informar oportunamente sobre los cierres viales que serían implementados como consecuencia de las diferentes actividades constructivas del proyecto.
23/07/2026	Socialización puerta a puerta	Sector Casas del Mar	18	2 horas	Se llevó a cabo una jornada de socialización puerta a puerta en el sector Casas del Mar, con el propósito de informar la decisión técnica adoptada por el proyecto de no ejecutar la construcción de andenes sobre los predios ubicados en la zona de la pendiente, debido a las condiciones técnicas identificadas durante el desarrollo de la obra.

4.1.2. Cartelera informativa

En el periodo transcurrido a la entrega de este informe se dio continuidad a la instalación y mantenimiento de la cartelera informativa en el área de influencia del proyecto. En atención al avance de la obra, se realizó el traslado de la cartelera al sector Quebrada Arriba, ubicándola estratégicamente en la cancha localizada al inicio del tramo intervenido, con el fin de garantizar su visibilidad y fácil acceso para la comunidad.

La cartelera informativa dispone de información de interés para los habitantes del sector, incluyendo datos generales del proyecto, el avance de la obra, los canales de atención a la ciudadanía, un buzón de sugerencias, formatos para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), así como información actualizada sobre las actividades en ejecución. Esta herramienta constituye un mecanismo permanente de comunicación entre el proyecto y la comunidad, promoviendo el acceso oportuno a la información y fortaleciendo la participación ciudadana.

Ilustración 31 Cartelera informativa

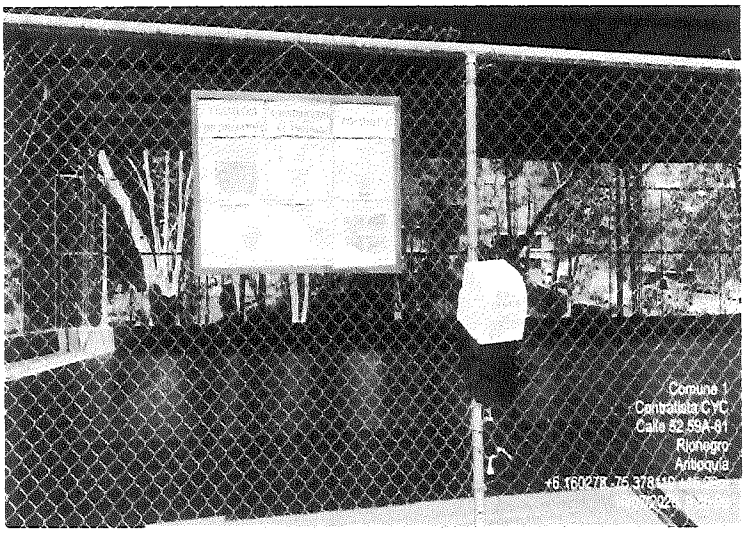

4.1.3. Valla informativa

Durante el período correspondiente al presente informe, se elaboró e instaló la valla informativa del proyecto en el sector Quebrada Arriba, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Administración Municipal en cuanto a diseño, dimensiones y contenido.
La valla fue ubicada en un punto estratégico del área de intervención, con el propósito de brindar información visible y permanente a la comunidad sobre el proyecto, incluyendo datos generales de la obra, la entidad contratante, el contratista, la interventoría, el plazo de ejecución y demás información de interés.

Ilustración 32 Valla informativa



4.1.4. Material divulgativo

Se dejó constancia mediante la adhesión de un sticker de notificación en la puerta de la vivienda donde no se encontró residente en el momento de la visita, con el fin de programarla de acuerdo con la disponibilidad horaria de este y llevar a cabo la elaboración y levantamiento de las actas de vecindad en dichos inmuebles.

Ilustración 33 Material divulgativo



Apreciados ciudadanos

Le informamos que vinimos a visitarte para realizar el **acta de vecindad** de su inmueble, por motivos de las obras que se desarrollan en el sector.

Es importante que usted atienda esta visita para conocer el estado de su vivienda y responder en caso de alguna eventualidad.

Profesionales de Edeso debidamente identificados estaran atendiendole. Por favor contactecnos para programar pronto su visita.

Alcaldía de Rionegro

4.1.5. Empleabilidad

Con el propósito de promover la contratación de mano de obra local no calificada, se han implementado las siguientes estrategias:

- **Habilitación de canales de recepción de hojas de vida**, facilitando el acceso de la comunidad a las oportunidades laborales mediante el correo electrónico socialandenescomuna1@gmail.com y la línea WhatsApp **310 742 0560**, disponibles para el envío y recepción de postulaciones.
- **Difusión de las vacantes mediante la estrategia de voz a voz**, incentivando a los trabajadores vinculados al proyecto, especialmente a los oficiales de obra, para que informen a familiares, vecinos y conocidos residentes en el área de influencia sobre las oportunidades de empleo existentes.
- **Divulgación de vacantes de empleo:** En cumplimiento de las estrategias de vinculación de mano de obra, se realizó la divulgación de las vacantes disponibles para el cargo de **Oficial de Obra** a través del portal de empleo de la **Agencia de Empleo de Comfenalco**
- **Socialización permanente de las vacantes** con la comunidad durante las actividades desarrolladas por el componente social del proyecto, brindando información sobre los perfiles requeridos, el proceso de postulación y los canales habilitados para la recepción de hojas de vida.

Estas acciones buscan garantizar que la comunidad del área de influencia tenga un acceso oportuno y equitativo a las oportunidades laborales generadas por el proyecto, fortaleciendo la participación de la mano de obra local no calificada.

Ilustración 34 Divulgación vacantes de empleo

Comfenalco Antioquia

Certificado de registro y publicación de vacante

Sin ampliación, 14 de julio de 2026

El prestador CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA con Nit 8905008426, adscrita a la Red del Servicio Público de Empleo, CERTIFICA que, una vez consultado el sistema de información, la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS con Nit 9003398662 inscrita con el prestador desde el 4 de julio de 2015 ha registrado una vacante con código 1625936217-416, denominada OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN La publicación de esta vacante se efectuó el día 2 de junio de 2026 .

La vacante tiene la siguiente distribución:

Colombia - Antioquia

La vacante tiene las siguientes sedes asociadas

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS PTO TRIUNFO - CENTRO DE EMPLEO COMFENALCO ANTIOQUIA

Se expide el presente, para que surta los efectos oportunos.

4.1.6. Capacitaciones

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no fue posible realizar las capacitaciones realizadas para el personal de obra, debido a diversos contratiempos de carácter técnico y operativo, así como a situaciones relacionadas con la disponibilidad del personal durante el desarrollo de las actividades constructivas

No obstante, la capacitación prevista para el mes de julio ha sido reprogramada para el mes de agosto, sujeta a las condiciones operativas y al avance de la obra que permita su adecuada ejecución. En consecuencia, las evidencias de la actividad, los registros de asistencia, el material fotográfico y los demás soportes correspondientes serán presentados y relacionados en el informe del periodo siguiente.

4.1.7. Comité Ciudadano de Obra

A la fecha de corte del presente informe, no se ha evidenciado interés por parte de la comunidad del área de influencia en la conformación del Comité Ciudadano de Obra. No obstante, durante las jornadas de socialización realizadas se invitó a los residentes a participar activamente en el seguimiento del proyecto y a manifestar su interés en la creación de dicho comité. Asimismo, se socializaron los diferentes canales de atención y comunicación dispuestos para la comunidad, con el fin de facilitar su participación. Sin embargo, hasta la fecha no se han recibido solicitudes ni manifestaciones de interés para la conformación del Comité Ciudadano de Obra.



4.1.8. Recorrido de reconocimiento y reuniones estratégicas



A la fecha de presentación del informe actual se han realizados los siguientes recorridos y/o reuniones estratégicas:

- El día 17 de junio de 2026 se realizó un recorrido de seguimiento en el sector Casas del Mar, con el acompañamiento de la profesional social de la supervisión, con el propósito de verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas en el tramo que se encuentra actualmente en intervención. Durante la jornada se efectuó la inspección del frente de obra, verificando el avance de las actividades constructivas, las condiciones del área de intervención y el cumplimiento de las medidas de manejo social implementadas en el sector. Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones de movilidad, al relacionamiento con la comunidad y a las posibles situaciones que pudieran requerir atención durante la ejecución del proyecto.
- El día 19 de junio de 2026 se realizó un recorrido técnico en el sector Laureles, con el acompañamiento de la profesional social y el residente civil del contratista, así como también del auxiliar social de la interventoría, con el propósito de efectuar el levantamiento del acta de entorno correspondiente al área de influencia del proyecto. Durante la jornada se realizó la inspección y el registro de las condiciones existentes del entorno previo al inicio de las intervenciones constructivas, documentando aspectos relacionados con el estado de las vías, el espacio público, los elementos urbanos, las redes visibles y demás características relevantes del sector. Esta actividad tuvo como finalidad dejar constancia técnica del estado inicial del entorno, facilitando el seguimiento y la verificación de posibles cambios o afectaciones derivados de la ejecución de la obra. Como soporte de la actividad, se cuenta con el acta de entorno debidamente diligenciada y el correspondiente registro fotográfico.
- Los días 22 y 26 de junio de 2026 se realizaron recorridos en el sector Laureles, con el acompañamiento de la profesional social y el personal técnico del contratista, así como del auxiliar social de la interventoría. Durante estas jornadas se llevaron a cabo actividades de socialización puerta a puerta con los residentes del área de influencia, brindando información sobre el alcance del proyecto, las actividades previstas, el cronograma de intervención y las posibles afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras.
- El día 14 de julio de 2026 se realizó un recorrido técnico en el sector Bosques del Norte, con el acompañamiento de la profesional social y el residente civil del contratista, así como también de la profesional social de la interventoría y la profesional social de la supervisión, con el propósito de efectuar el levantamiento del acta de entorno correspondiente al área de influencia del proyecto. Durante la jornada se realizó la inspección y el registro de las condiciones existentes del

entorno previo al inicio de las intervenciones constructivas, documentando aspectos relacionados con el estado de las vías, el espacio público, los elementos urbanos, las redes visibles y demás características relevantes del sector. Esta actividad tuvo como finalidad dejar constancia técnica del estado inicial del entorno, facilitando el seguimiento y la verificación de posibles cambios o afectaciones derivados de la ejecución de la obra. Como soporte de la actividad, se cuenta con el acta de entorno debidamente diligenciada y el correspondiente registro fotográfico.

Tabla 7 Registro fotográfico de socializaciones, recorridos y/o mesas de trabajo

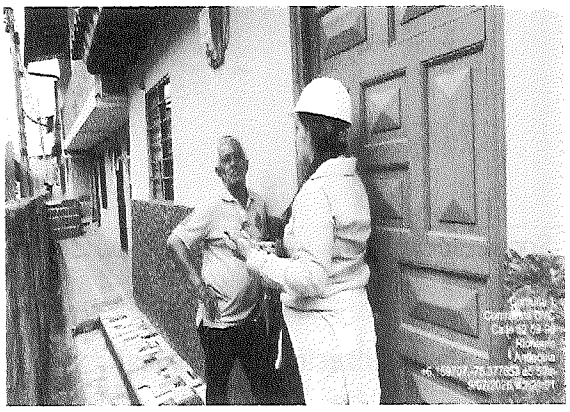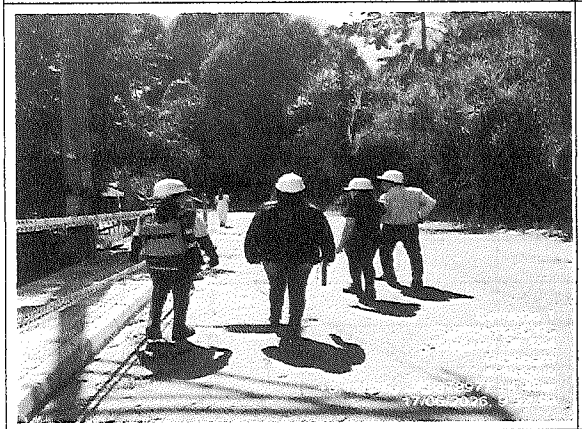	
Socialización puerta a puerta	*Socialización cierres de vía*
	
Imagen 3: Recorrido sector Casas del Mar	*Imagen 4: Comité de obra*

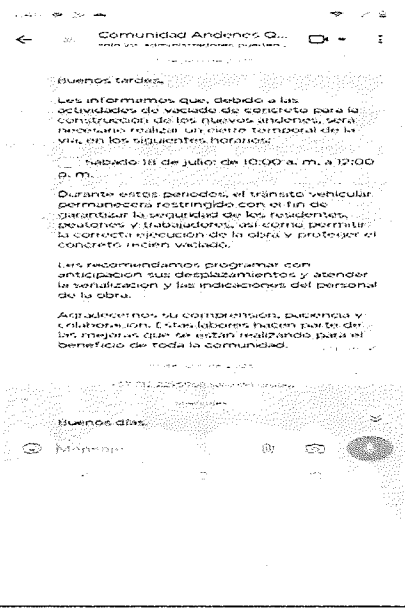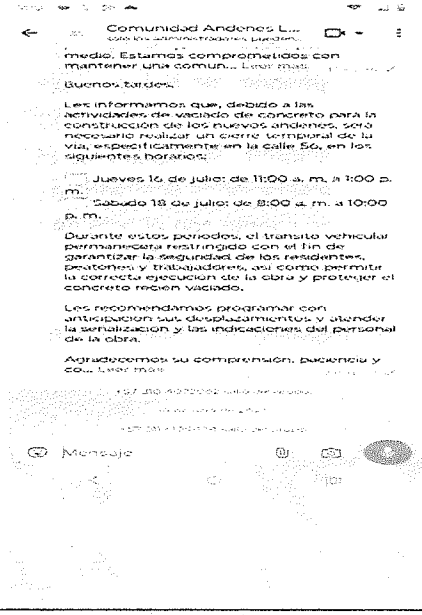	
Socialización cierre vial, vía whatsapp sector Quebrada Arriba	*Socialización cierre vial, vía whatsapp, sector Laureles*

4.2. Caracterización del personal

A la fecha de presentación del informe actual se cuenta con el personal detallado en la siguiente tabla.

Tabla 8 Personal en obra

Personal	Hombres	Mujeres	Total
Mano de obra calificada contratista	5	1	6
Mano de obra no calificada contratista	1	0	1
Mano de obra calificada subcontratista	2	1	3
Mano de obra no calificada subcontratista	32	0	32
Interventoría	2	6	8
		Total	**50**

4.2.1. Mano de obra calificada

Contratista:

- Director de obra: 1

- Residente de obra: 1
- Profesional social: 1
- Profesional SST: 1
- Profesional ambiental: 1
- Auxiliar técnico: 1

Subcontratista:

- Representante legal: 1
- Inspectora SST: 1
- Maestro de obra: 1

Interventoría:

- Director de obra: 1
- Residente de obra: 1
- Auxiliar técnico: 1
- Profesional social: 1
- Auxiliar Social: 1
- Profesional SST: 1
- Auxiliar SST: 1
- Profesional ambiental: 1

4.2.2. Mano de obra no calificada

Contratista:

- Almacenista: 1


Subcontratista:

- Oficial de obra: 6
- Ayudante de obra: 17

4.2.3. Enfoque de genero

Teniendo en cuenta la información registrada en el numeral anterior en el proyecto **Obras de construcción de andenes, comuna 1 Liborio Mejía del municipio de Rionegro**, cuenta con una mayor participación de personal masculino, situación que corresponde a la composición predominante de la mano de obra en las actividades propias del sector de la construcción.

Ilustración 35 Personal de obra por genero

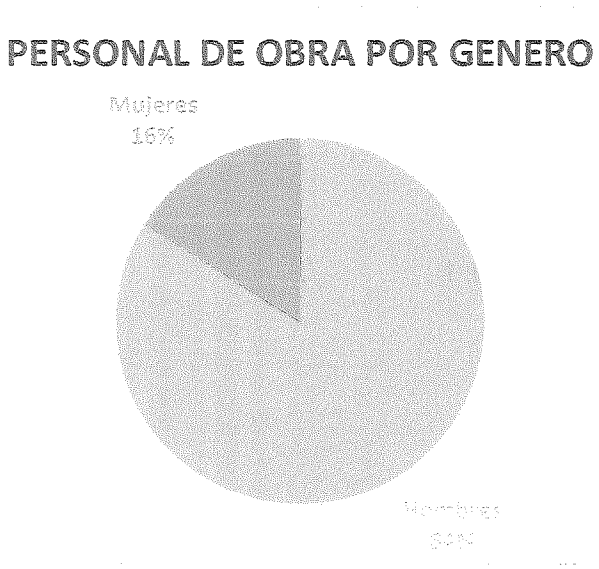


La gráfica evidencia la distribución del personal vinculado al proyecto según su género. Se observa que el 84 % del personal corresponde a hombres, mientras que el 16 % corresponde a mujeres. Estos valores incluyen la totalidad del personal vinculado tanto por la Interventoría, Contratista y subcontratista.

4.2.4. Contratación de mano de obra local

La gráfica presenta la distribución del personal vinculado al proyecto según su lugar de residencia. Se evidencia que el 62 % de los trabajadores reside en el municipio de Rionegro, seguido por un 20 % proveniente del municipio de Santuario, un 14 % correspondiente al Área Metropolitana y un 4 % del municipio de Marinilla

Ilustración 36 Personal de obra por lugar de residencia

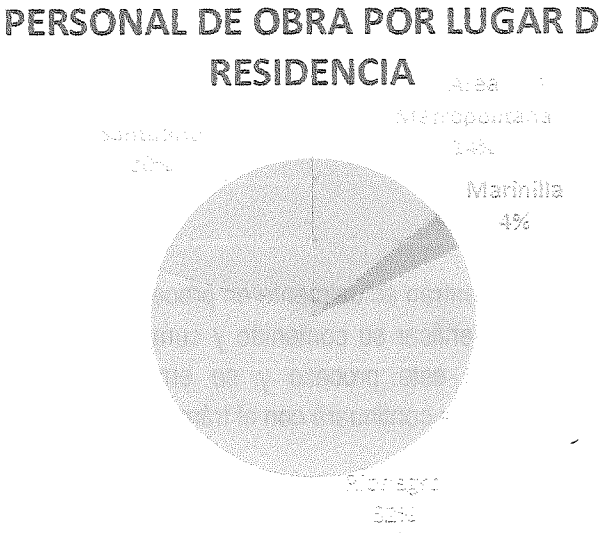

Estos resultados muestran que la mayor parte de la mano de obra contratada corresponde a residentes del municipio de Rionegro, favoreciendo la generación de empleo local y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del área de influencia del proyecto. De igual manera, la participación de personal proveniente de municipios cercanos evidencia la vinculación de trabajadores de la región, atendiendo las necesidades operativas de la obra y la disponibilidad de mano de obra calificada para la ejecución de las actividades constructivas y generación de empleo en el área de influencia y municipios cercanos.

4.3. Protección a la infraestructura pública y privada

Las actas de entorno y de vecindad establecen registros descriptivos, fotográficos y fílmicos que documentan las condiciones físicas y el estado de conservación de los espacios públicos y privados, la infraestructura existente y los elementos ubicados dentro del área de influencia del proyecto. Su propósito es proteger los intereses de la comunidad, garantizando la protección de sus bienes, así como brindar soporte técnico que permita prevenir reclamaciones al contratista por afectaciones o situaciones preexistentes no atribuibles a la ejecución de las obras.
Estos registros se realizaron previamente al inicio de las actividades constructivas y se actualizan una vez finalizada la intervención, con el fin de verificar las condiciones finales del entorno y establecer comparaciones frente al estado inicialmente identificado.

4.3.1. Actas de entorno

A la fecha de corte del informe actual se ha realizado el levantamiento de las siguientes actas de entorno:

- Tramo Casas del Mar
- Tramo Quebrada Arriba
- Tramo Laureles
- Tramo Bosques del Norte

Las actas relacionadas se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría, con el fin de verificar su contenido y cumplimiento de los requisitos establecidos. Una vez finalice este proceso y se emitan las observaciones o aprobaciones correspondientes, se continuará con el trámite respectivo.

Tabla 9 Registro Actas de Entorno

Fecha dd-mm-aa	Tramos identificados	Ubicación del tramo	Total de actas de entorno realizadas	Observaciones
11/05/2026	Tramo 1	Calle 51 entre carreras 59 y 60A Sector Casas del Mar	1	Existencia de mural tipo graffiti. La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Postes de luz desplomados. Sumideros en mal estado. Flujo vehicular medio.
11/05/2026	Tramo 2	Carrera 60A entre carrera 59 y calle 51A Sector casas del Mar	1	La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Postes de luz desplomados. Sumideros en mal estado. Flujo vehicular medio.
11/05/2026	Tramo 3	Calle 51A entre carrera 60 y 60ª Sector casas del Mar	1	La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Postes de luz desplomados. Flujo vehicular medio.

11/05/2026	Tramo 4	Calle 51ª con carrera 60 Sector casas del Mar	1	La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Postes de luz desplomados. Flujo vehicular medio.
9/06/2026	Tramo 1	Calle 52A entre carrera 60 y 60A Sector Quebrada Arriba	1	Existencia de placa deportiva. Existencia de un alcorque en mal estado. Postes de luz desplomados. La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Flujo vehicular medio.
9/06/2026	Tramo 2	Calle 52A entre carreras 58C Y 59 Sector Quebrada Arriba	1	Existencia de placa deportiva. Existencia de un cárcamo de aproximadamente 4 mts. Postes de luz desplomados. La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Flujo vehicular medio.
9/06/2026	Tramo 3	Calle 52A entre carreras 58 y 58 C Sector Quebrada Arriba	1	Postes de luz desplomados. La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Flujo vehicular medio.
9/06/2026	Tramo 4	Calle 52A entre carreras 57A, 57C Y 57D Sector Quebrada Arriba	1	Postes de luz desplomados. La calzada presenta reparcheo de pavimento flexible. Flujo vehicular medio.
19/06/2026	Tramo 1	Sector Laureles Calle 56 entre carreras 52, 53 y 54	1	El tramo presenta un alto nivel de actividad debido a la circulación constante de vehículos y peatones. Se evidencia una vía urbana pavimentada en buen estado general.

19/06/2026	Tramo 2	Sector Laureles Carrera 53 entre carrera 56 A, 58 C, 59 y 59 A	1	Los andenes existentes se encuentran construidos en concreto y presentan ancho variable según el frente de cada predio. En algunos sectores se observan accesos vehiculares a las viviendas
19/06/2026	Tramo 3	Sector Laureles Calle 59A entre carrera 52A, 52B, 53 Y 53A	1	El tramo presenta un alto nivel de actividad debido a la circulación constante de vehículos y peatones. Los andenes existentes están construidos en concreto y presentan continuidad a lo largo del corredor, con variaciones menores en ancho y nivel de acuerdo con la configuración de los predios existentes.
14/07/2026	Tramo 1	Sector Bosques del Norte Carrera 54 entre calles 52 y 54	1	El tramo presenta un alto nivel de actividad debido a la circulación constante de vehículos y peatones. Se evidencia una vía urbana pavimentada en buen estado general.
14/07/2026	Tramo 2	Sector Bosques del Norte Calle 54 entre carreras 54 y 56	1	La vía se encuentra pavimentada con carpeta asfáltica y presenta circulación en ambos sentidos, se evidencian desgaste superficial, fisuras longitudinales y transversales, parches y reparaciones puntuales, propias del uso y del mantenimiento realizado a lo largo del tiempo.
14/07/2026	Tramo 3	Sector Bosques del Norte Carrera 57 con calle 52b	1	La calzada presenta una superficie pavimentada con desgaste superficial normal asociado al uso. El andén existente sobre el costado derecho está construido en concreto y presenta una condición general buena.
14/07/2026	Tramo 4	Sector Bosques del Norte Carrera 57 con calle 52d	1	La calzada presenta una superficie pavimentada con desgaste superficial normal asociado al uso. El andén existente presenta un estado de conservación regular, evidenciándose un deterioro significativo en uno de los tramos.
14/07/2026	Tramo 5	Sector Bosques del Norte	1	La vía está conformada por pavimento asfáltico y presenta condiciones generales de funcionalidad para la circulación vehicular. Se

		Carrera 57 con calle 59a		evidencian fisuras longitudinales y transversales de baja a moderada magnitud, además de desgaste superficial asociado al uso y envejecimiento del pavimento. Sobre el costado izquierdo de la vía se observa un talud conformado en material natural con cobertura de césped y vegetación ornamental.

4.3.2. Actas de vecindad

Con corte a la fecha del presente informe, el estado de avance del proceso de elaboración, revisión y radicación de las actas de vecindad correspondientes a los diferentes frentes de intervención es el siguiente:

- **Tramo Casas del Mar**
  - Actas identificadas y levantadas: 61
  - Actas en revisión por interventoría: 18
  - Actas en proceso de revisión técnica por contratista: 43

- **Tramo Quebrada Arriba**
  - Actas identificadas y levantadas: 42
  - Actas en revisión por interventoría: 19
  - Actas en proceso de revisión técnica por contratista: 23

- **Tramo Laureles**
  - Actas identificadas y levantadas: 53
  - Actas en revisión por interventoría: 16
  - Actas en proceso de revisión técnica por contratista: 37

Las actas que actualmente se encuentran en proceso de revisión y consolidación de la información técnica por parte del contratista serán entregadas en su totalidad a la interventoría para su revisión y posterior radicación ante la entidad pertinente las que correspondan, conforme al cronograma acordado, teniendo como fecha máxima el próximo **06 de agosto de 2026**. En consecuencia, el estado de estas actas será actualizado y reportado en el siguiente informe de avance.

Tabla 10 Registro Actas de Vecindad

Actas de inicio realizadas	Actas de inicio pendientes	% de avance actas de inicio	Actas de cierre realizadas	Actas de cierre pendientes	% de avance de actas de cierre	Observaciones
18	43	29%	0	61	0%	Sector Casas del Mar. A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado el levantamiento de 61, de las cuales 18 se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para su correspondiente revisión técnica y documental. Las actas restantes continúan en proceso de consolidación y trámite, conforme al procedimiento establecido para su posterior radicación y validación.
19	23	45%	0	42	0%	Sector Quebrada Arriba, A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado el levantamiento de 42, de las cuales 19 se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para su correspondiente revisión técnica y documental. Las actas restantes continúan en proceso de consolidación y

						trámite, conforme al procedimiento establecido para su posterior radicación y validación.
16	37	30%	0	53	0%	Sector Laureles. A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado el levantamiento de 53, de las cuales 16 se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para su correspondiente revisión técnica y documental. Las actas restantes continúan en proceso de consolidación y trámite, conforme al procedimiento establecido para su posterior radicación y validación.

Ilustración 37 Levantamiento Actas de Vecindad





4.4. Atención a la comunidad

En este contexto, el Programa de Atención a la Comunidad se desarrolla mediante un conjunto de estrategias y actividades orientadas a garantizar una comunicación efectiva, transparente y permanente con la ciudadanía, fortaleciendo la participación comunitaria y asegurando una adecuada gestión de sus requerimientos. A continuación, se presentan las principales acciones implementadas en el marco de este programa

4.4.1. Punto de Atención a la Comunidad (PAC)

Como contratista disponemos de un Punto de atención a la comunidad ubicado en la Carrera 52 # 56 – 129 del barrio Laureles, el horario de atención es el siguiente:

- Lunes a jueves 8 am – 5 pm.
- Viernes 8 am – 4 pm.

Este espacio está destinado a brindar información actualizada sobre el avance del proyecto, atender inquietudes, recibir observaciones y orientar a la comunidad respecto a los diferentes componentes técnicos, sociales, ambientales y operativos de la obra. De esta manera, se promueve una comunicación directa, oportuna y transparente entre el proyecto y los ciudadanos del área de influencia.

4.4.2. Buzon de sugerencias

El buzón de sugerencias durante el período correspondiente al presente informe se desplazó hacia el sector Quebrada Arriba, contiguo a la cartelera informativa, zona que actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las obras. Su ubicación estratégica facilita el acceso de la comunidad y promueve la participación de los habitantes del área de influencia.

4.4.3. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)

Durante el periodo de inicio de actividades de la obra y la fecha de entrega de este informe se han reportado los siguientes casos:

- El día 28 de mayo se recibió una reclamación por parte de la señora Adriana Patricia Quintero, relacionada con los presuntos daños ocasionados en su propiedad como consecuencia del deslizamiento del compresor utilizado durante la ejecución de las actividades constructivas. En la misma fecha se realizó la visita al lugar, se verificó la situación reportada y se diligenció el formato de atención de PQRS correspondiente, dejando registro de las afectaciones manifestadas por la

propietaria. Posteriormente, el día 3 de junio, la reclamación fue remitida a la interventoría para el trámite y seguimiento respectivos.

Una vez realizada la evaluación técnica de la situación y adelantadas las gestiones entre las partes, se llegó a un acuerdo con la propietaria para la reposición de los elementos afectados y la restitución de las condiciones del área impactada. Ejecutadas las actividades de reposición el día 04 de julio de 2026 y verificado el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la señora Adriana Patricia Quintero manifestó su conformidad con la solución implementada.

En consecuencia, la PQRSD fue cerrada a satisfacción, al evidenciarse el cumplimiento de los acuerdos establecidos y la atención integral de la reclamación. Como soporte del proceso reposan el formato de PQRSD, el registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención

- El día 4 de junio se recibió una reclamación por parte de la señora Eliana Suárez, relacionada con los daños ocasionados en la estructura de la reja de acceso a su propiedad y en el motor de apertura de esta, como consecuencia de un incidente ocurrido durante la ejecución de las actividades constructivas el día 26 de mayo de 2026.

  Posterior al incidente, el equipo social y técnico del proyecto realizó varios intentos de acercamiento con la propietaria con el fin de verificar las afectaciones y diligenciar el formato de atención de PQRSD correspondiente. Una vez fue posible establecer contacto, el día 4 de junio se efectuó el registro formal de la reclamación, dejando constancia de los daños reportados y de las manifestaciones de la propietaria. En esa misma fecha, la documentación fue remitida a la interventoría para el respectivo trámite, evaluación técnica y seguimiento.

  Posteriormente, se realizaron las verificaciones correspondientes y se adelantaron las gestiones necesarias para la atención de la reclamación, definiendo las acciones requeridas para la reparación y reposición de los elementos afectados, de conformidad con los resultados de la evaluación técnica y los acuerdos establecidos entre las partes. En diferentes oportunidades, el contratista ha realizado acercamientos con la señora Eliana Suárez con el propósito de concertar una fecha y hora para la visita del técnico responsable de efectuar la evaluación y las reparaciones correspondientes a los daños reportados. Como parte del seguimiento al caso, el día 30 de junio personal del proyecto se desplazó hasta la vivienda de la propietaria con el propósito de realizar un acercamiento presencial y coordinar directamente la atención de la reclamación; sin embargo, no fue posible establecer contacto, debido a que no se encontraba ninguna persona en el inmueble al

momento de la visita. A la fecha de corte del presente informe, la PQRS continúa en proceso de gestión y se está a la espera de la confirmación por parte de la señora Eliana Suárez para llevar a cabo las reparaciones correspondientes. El contratista ha propuesto realizar la intervención el día 29 de julio a las 7:30 a. m., con el fin de atender los daños reportados en la estructura de la reja de acceso y en el motor de esta. Una vez la propietaria confirme la fecha y autorice el ingreso al inmueble, se procederá con la ejecución de las reparaciones programadas. Posteriormente, se realizará la verificación de las actividades ejecutadas y, de ser procedente, se efectuará el cierre de la PQRSD con el respectivo registro fotográfico y el acta de conformidad suscrita por la propietaria.

5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1. PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental

En el marco de la ejecución del proyecto de construcción de andenes en la Comuna 1, y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante el periodo comprendido entre el **13 de junio y el 25 de julio** se dio continuidad a la implementación, seguimiento y verificación de las medidas de manejo ambiental definidas para las diferentes actividades constructivas. Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como de los requerimientos establecidos por la EDESO, la interventoría y las autoridades ambientales competentes.
Durante este periodo se realizó el acompañamiento técnico y ambiental a las actividades ejecutadas en obra, efectuando el seguimiento al cumplimiento de los programas y medidas contemplados en el PMA, la verificación de los controles ambientales implementados y la identificación de oportunidades de mejora que permitieran fortalecer el desempeño ambiental del proyecto. De igual manera, se continuó con las jornadas de capacitación y sensibilización al personal vinculado a la obra, reforzando la aplicación de buenas prácticas ambientales y promoviendo una cultura de prevención, responsabilidad y mejora continua durante el desarrollo de las actividades constructivas.

5.1.1. Conformación del equipo de gestión ambiental

Con el propósito de dar continuidad a la implementación, seguimiento y control de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante este periodo se mantuvo el acompañamiento del Equipo de Gestión Ambiental, encargado de coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos para el proyecto.
Durante este periodo, el equipo desarrolló actividades de seguimiento a la ejecución de las medidas de manejo ambiental, acompañamiento técnico a las actividades constructivas, verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y atención a los requerimientos

formulados por la EDESO y la interventoría, promoviendo la aplicación de buenas prácticas ambientales durante el desarrollo de la obra.
El Equipo de Gestión Ambiental que brindó acompañamiento durante el periodo reportado estuvo conformado por los siguientes profesionales:

Tabla 11 Equipo Ambiental

Nombre	**Cargo**
Wilmar Mosquera Castaño Contratista	Residente ambiental contratista (50% dedicación)
Adriana Castro Interventoría	Residente ambiental contratista (50% dedicación)

5.1.2. Capacitación para el personal de obra

En desarrollo del Programa de Capacitación al Personal de Obra contemplado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante el periodo comprendido entre el **13 de junio y el 25 de julio** se dio continuidad a las actividades de formación y sensibilización ambiental dirigidas al personal vinculado al proyecto, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el seguimiento a la ejecución de las actividades constructivas.
Durante este periodo se desarrolló una jornada de capacitación enfocada en el Manejo de Residuos Sólidos y el Manejo del Recurso Aire, en la cual se reforzaron los procedimientos para la adecuada separación de los residuos ordinarios, aprovechables y residuos de construcción y demolición (RCD), así como las medidas de prevención y control para minimizar la generación y dispersión de material particulado y demás emisiones atmosféricas asociadas a las actividades de obra.
La capacitación permitió fortalecer el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para estos programas, promoviendo la participación del personal en la correcta aplicación de los procedimientos definidos en el PMA y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental durante la ejecución del proyecto.
La capacitación se programó como resultado de las diferentes inspecciones ambientales realizadas, y a las observaciones realizadas tanto por la supervisión como por la interventoría, con relación al correcto manejo de los RCD
Como evidencia de la actividad desarrollada, se anexan los registros de asistencia y el correspondiente registro fotográfico, los cuales hacen parte de los soportes del seguimiento ambiental del periodo reportado.

Tabla 12 Tema Fecha No. Personas capacitadas

Tema	Fecha	No. Personas capacitadas	% de Cumplimiento
Manejo de Residuos Sólidos y Manejo del recurso Aire	7/07/2026	16	100%

Ilustración 38 Capacitación ambiental



Capacitación en Manejo de residuos sólidos y Manejo de Recurso Aire.

5.1.3. Cumplimiento de requerimientos legales

Durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio, se realizó el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y ambientales aplicables a las actividades ejecutadas en el proyecto, verificando que las labores desarrolladas en los diferentes frentes de obra se ajustaran a la normatividad ambiental vigente y a las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Como parte de este seguimiento, se revisaron las actividades constructivas ejecutadas en los diferentes sectores de intervención, evaluando la necesidad de gestionar permisos, autorizaciones o trámites ambientales ante la autoridad competente. En el sector Casas del Mar se ejecutaron podas y el retiro de pequeños arbustos (*Eugenia* spp.), actividades que, de acuerdo con sus características y alcance, no requirieron la obtención de permisos o autorizaciones ambientales. De igual manera, en el sector Laureles se identificaron individuos de *Eugenia* spp. que serán intervenidos conforme al avance de las actividades constructivas, los cuales, de acuerdo con su condición y características, tampoco requieren autorización ambiental.

Adicionalmente, en el sector Casas del Mar se identificó la necesidad de realizar la tala de un individuo de bambú (guadua), ubicado en proximidad a una red de energía, situación que requiere la intervención coordinada con las entidades competentes debido a las condiciones de riesgo y a la infraestructura existente. En este sentido, el Municipio se encuentra liderando las gestiones correspondientes con EPM para definir el procedimiento a seguir y obtener las autorizaciones que resulten aplicables. A la fecha de cierre del presente informe, el proyecto se encuentra a la espera de la respuesta y de las directrices que emitan dichas entidades para proceder con esta actividad, en cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad vigente.

Con base en la verificación efectuada, se concluye que durante el periodo reportado no fue necesario adelantar, por parte del contratista, trámites relacionados con licencias, permisos, concesiones, aprovechamientos forestales u otras autorizaciones ambientales para las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra. No obstante, se continuará realizando el seguimiento permanente a las gestiones lideradas por el Municipio respecto al individuo de bambú ubicado en el sector Casas del Mar, así como a las intervenciones previstas en el sector Laureles, con el fin de identificar oportunamente cualquier requerimiento legal o ambiental que pueda surgir conforme al avance del proyecto.

5.1.4. Indicadores de seguimiento al programa N° 1

Tabla 13 Indicadores de seguimiento N°1

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del cronograma de capacitaciones	(Número de capacitaciones / número de capacitaciones programadas) X 100 (1 / 1) X 100	100%	Mensual	Registro fotográfico, listado de asistencia
Que por lo menos el 80% de los trabajadores reciban capacitación en temas ambientales.	(Número de empleados capacitados/Número de empleados convocados) x 100. (16/ 18) x 100.	88%	Mensual	Registro fotográfico, listado de asistencia
Contar con la totalidad de permiso ambientales necesarios para la	(Número de permisos obtenidos/ Número de	N/A	Mensual	N/A

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
ejecución del proyecto.	permisos requeridos) x 100. (0/ 0) x 100.			
Atender el 100% de los requerimientos recibidos por parte de las autoridades de control ambiental o entidad contratante.	(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) x 100. (0/0) x 100.	N/A	Mensual	N/A

5.2. PROGRAMA 2: Manejo de residuos solidos

Durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio, se dio continuidad a la implementación del Programa de Manejo de Residuos Sólidos establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), mediante el seguimiento a las actividades de separación en la fuente, almacenamiento temporal, aprovechamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la ejecución de las obras.

Las actividades de seguimiento se desarrollaron en los frentes de trabajo Casas del Mar, Quebrada Arriba y Laureles, verificando que la gestión de los residuos se realizara de acuerdo con las características de cada uno de ellos y conforme a la normatividad ambiental vigente. Durante las inspecciones se evaluó la adecuada clasificación de los residuos ordinarios, aprovechables, residuos de construcción y demolición (RCD) y demás residuos generados por las actividades constructivas, así como el estado de las áreas de almacenamiento temporal y el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA.

Como parte del seguimiento, se verificó la correcta implementación de las medidas de manejo para cada tipo de residuo, incluyendo la presentación de los residuos ordinarios para su recolección por el prestador del servicio de aseo, el almacenamiento y entrega de los materiales aprovechables (en caso de que aplique) al gestor correspondiente y la adecuada gestión de los RCD mediante su transporte y disposición en sitios autorizados. Las actividades desarrolladas cuentan con los respectivos soportes documentales, entre ellos registros fotográficos, actas de entrega de material.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo reportado para cada una de las categorías de residuos generados en los diferentes frentes de obra.

5.2.1. Manejo de residuos sólidos no aprovechables

Durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio, se dio continuidad a las actividades de manejo de los residuos sólidos no aprovechables generados en los frentes de trabajo Casas del Mar, Quebrada Arriba y Laureles, verificando la adecuada separación en la fuente, el almacenamiento temporal y la disposición final, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En el frente Casas del Mar se dispuso un punto ecológico para facilitar la separación y el almacenamiento temporal de los residuos generados por el personal de obra. En el frente Quebrada Arriba, donde durante el periodo se concentró el mayor número de trabajadores y, por consiguiente, la mayor generación de residuos ordinarios, se instalaron canecas para la recolección en la fuente. Por su parte, en el frente Laureles se implementó el uso de bolsas para el almacenamiento temporal de los residuos, de acuerdo con las condiciones operativas del frente.

Durante las inspecciones ambientales se evidenció una mejora en las condiciones generales de orden y aseo en los tres frentes de trabajo, como resultado del seguimiento permanente y de las jornadas de sensibilización realizadas al personal. No obstante, también se identificaron situaciones que requieren seguimiento continuo, entre ellas la pérdida de algunas canecas, presuntamente por retiro de personas ajenas a la obra, la utilización de los recipientes destinados al proyecto por parte de miembros de la comunidad para depositar residuos domiciliarios y, de manera ocasional, la disposición inadecuada de residuos por parte de algunos trabajadores fuera de las canecas o bolsas dispuestas para tal fin. Frente a estas situaciones, se reforzaron las actividades de sensibilización y se realizó la reposición y mantenimiento de los elementos de almacenamiento cuando fue necesario.

Los residuos no aprovechables generados durante el periodo correspondieron principalmente a residuos ordinarios producidos por el personal de obra y a residuos derivados de las actividades constructivas. Una vez separados en la fuente, fueron almacenados temporalmente en cada frente de trabajo y cuando era necesario trasladados a la oficina del contratista para su consolidación. Finalmente, fueron presentados para su recolección en los puntos de acopio definidos por la comunidad, ubicados en las proximidades de cada uno de los frentes de obra, donde el prestador del servicio público de aseo realiza la recolección de acuerdo con las frecuencias establecidas para el sector.

La recolección y disposición final de los residuos no aprovechables fue realizada por la empresa **Verde Limpio**, conforme a las rutas y horarios establecidos para el municipio (jueves y sábados después de las 6:00 p. m.). Debido a que la recolección se efectúa fuera del horario de la jornada laboral, no fue posible obtener registro fotográfico de esta actividad.

Durante el periodo reportado se generó un total de 29,7 kg de residuos no aprovechables, valor que corresponde al consolidado de los tres frentes de trabajo (Casas del Mar, Quebrada Arriba y Laureles), dado que la cuantificación se realiza de manera conjunta al momento de su presentación para la recolección por parte del prestador del servicio de aseo.

Ilustración 39 Manejo de residuos sólidos no aprovechables



Canecas para la separación de residuos en sector quebrada arriba



Punto ecológico para separación de residuos en sector casas del mar



Pesaje de material no reciclable en sector laureles

5.2.2. Manejo de residuos sólidos aprovechables

En este periodo, los principales residuos aprovechables generados correspondieron a bolsas plásticas y cintas utilizadas para la señalización de las áreas de trabajo, materiales que fueron depositados en canecas y bosas plásticas, evitando su mezcla con los residuos no aprovechables y para facilitar su posible aprovechamiento.

No obstante, el reciclador de la zona manifestó que este tipo de residuos (bolsas plásticas y cintas de señalización) no son objeto de recolección debido a que presentan un bajo valor comercial y cuentan con escasas opciones de aprovechamiento en el mercado local, y en el momento no tienen mercado para ellos. En consecuencia, estos materiales no pudieron ser entregados para reciclaje durante el periodo evaluado.

Es importante anotar, que las transeúntes constantemente utilizan los recipientes de las obras para depositar sus diferentes residuos, lo que ocasiona mezcla de diferentes tipos de residuos. De igual manera se es consciente que aún se debe reforzar las acciones para generar una adecuada separación de los diferentes residuos, así mismo como fortalecer la utilización de puntos ecológicos, canecas o bolsas en los diferentes frentes de trabajo.

El material reciclable que se generó en el periodo reportado fue de 21,5kg.

Durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio, se realizó el seguimiento al manejo de los residuos aprovechables generados en los frentes de trabajo Casas del Mar, Quebrada Arriba y Laureles, verificando las condiciones de separación en la fuente, almacenamiento temporal y manejo diferenciado respecto a los residuos no aprovechables.

En el frente Casas del Mar, se realizó la disposición temporal de los residuos aprovechables generados en los recipientes destinados para tal fin, principalmente correspondientes a bolsas plásticas y cintas utilizadas en las actividades de señalización de las áreas de trabajo. En el frente Quebrada Arriba, debido a que durante este periodo se concentró el mayor número de trabajadores, se realizó seguimiento al manejo de los residuos generados, reforzando la separación de los materiales potencialmente aprovechables y evitando su mezcla con residuos ordinarios. En el frente Laureles, se implementaron medidas de almacenamiento mediante bolsas y recipientes disponibles en obra, realizando seguimiento a la adecuada clasificación de los residuos generados.

Durante el periodo reportado, los principales residuos identificados como aprovechables correspondieron a bolsas plásticas y cintas utilizadas para la señalización de las áreas de trabajo. Estos materiales fueron separados en la fuente y almacenados temporalmente con el propósito de evitar su mezcla con residuos no aprovechables y evaluar alternativas de aprovechamiento.

Sin embargo, durante el periodo evaluado no se realizó entrega de estos materiales a recicladores, gestores o empresas de aprovechamiento. De acuerdo con la consulta realizada, este tipo de residuos presenta limitaciones para su comercialización debido a su bajo valor económico, las condiciones del material y las pocas alternativas de aprovechamiento existentes en el mercado local. Por esta razón, al no contar con un receptor para este tipo de material durante el periodo reportado, su manejo se realizó conforme a las condiciones establecidas para los residuos generados en obra.

Adicionalmente, durante las inspecciones realizadas se evidenció que en algunos puntos de almacenamiento ubicados cerca de los frentes de trabajo se presenta disposición de residuos por parte de transeúntes y miembros de la comunidad, generando mezcla de materiales y afectando la separación en la fuente. Ante esta situación, se continúa reforzando la sensibilización al personal de obra y el seguimiento a los puntos de disposición, con el fin de mejorar progresivamente la clasificación y manejo adecuado de los residuos.

Como parte del proceso de mejora continua, se mantiene el seguimiento a la implementación y correcto uso de los puntos ecológicos, canecas y bolsas dispuestas en los diferentes frentes de trabajo, fortaleciendo las acciones encaminadas a garantizar una adecuada gestión integral de los residuos sólidos.

Durante el periodo reportado se generó un total de 21,5 kg de residuos aprovechables, valor correspondiente al consolidado de los frentes de trabajo Casas del Mar, Quebrada Arriba y

Laureles, debido a que la cuantificación se realizó de manera conjunta durante el proceso de recolección y manejo interno de los residuos.

Manejo de residuos orgánicos y vegetales

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento al manejo de residuos orgánicos y vegetales generados en los frentes de obra intervenidos, verificando las condiciones de disposición y aprovechamiento del material resultante de las actividades ejecutadas.

En el frente Casas del Mar, durante el periodo anterior se generó material vegetal asociado a actividades de rocería en un área aproximada de 30 m². Este material fue entregado juntamente con material de excavación al propietario del predio autorizado para su disposición, quien recibió y aceptó ambos materiales en conjunto. Debido a esta condición, no fue posible determinar la cantidad específica de residuos vegetales de manera independiente, ni se cuenta con un certificado exclusivo para este tipo de material.

Se aclara que el predio utilizado para la disposición del material cuenta con la autorización previa de la Interventoría del proyecto, conforme con los lineamientos establecidos para el manejo ambiental de las actividades constructivas.


Para el periodo actual, en el frente Casas del Mar, se realizó la remoción de aproximadamente 10 metros lineales de eugenios correspondientes a un cerco vivo, actividad requerida para el avance de las obras. El material vegetal retirado fue trasladado y dispuesto en un predio del sector previamente autorizado por el propietario, donde será aprovechado como material orgánico para elaboración de abono. Como soporte de esta actividad se anexa acta de entrega.

En el frente Laureles, se identificó la presencia de eugenios y plantas ornamentales asociadas a zonas de jardín; sin embargo, durante el periodo evaluado estas áreas no fueron intervenidas, por lo cual no se generaron residuos vegetales derivados de actividades de remoción o manejo de cobertura vegetal.

En el frente Quebrada Arriba, no se presentaron actividades que requirieran intervención de material vegetal, por lo tanto, durante el periodo objeto del informe no se generaron residuos orgánicos o vegetales asociados a este frente.

De acuerdo con el seguimiento realizado, el manejo del material vegetal generado durante las actividades ejecutadas se efectuó conforme a las condiciones autorizadas para el proyecto. Se continuará realizando seguimiento a los frentes pendientes de intervención, especialmente aquellos donde se identifique posible generación de residuos vegetales durante el desarrollo de futuras actividades constructivas.

Ilustración 40 Residuos aprovechables

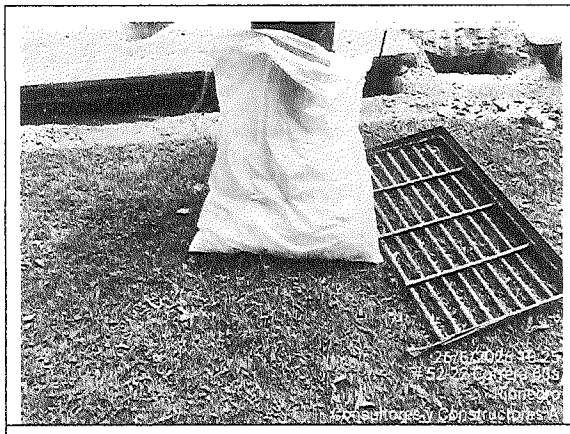

Material reciclable (cintas plásticas)




Material vegetal

5.2.3. Manejo de residuos peligrosos

A la fecha en la ejecución de las obras, no se han generado residuos peligrosos.
Durante el periodo objeto del presente informe, se realizó seguimiento al manejo de residuos peligrosos generados por las actividades constructivas desarrolladas en los diferentes frentes de obra: Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba.
A la fecha, no se han generado residuos peligrosos (RESPEL) asociados a la ejecución de las actividades del proyecto en ninguno de los frentes intervenidos. Durante el periodo evaluado no se presentaron residuos como envases contaminados, materiales impregnados con hidrocarburos, aceites usados, filtros u otros elementos derivados del mantenimiento de equipos o actividades propias de la obra.
En relación con el abastecimiento de combustible requerido para la operación del cargador y demás equipos que utilizan gasolina, este se realizó únicamente cuando fue necesario, sin disponer de un área permanente de almacenamiento de combustible en los frentes de obra. El suministro fue efectuado mediante una camioneta que transportó el combustible en recipientes adecuados (bidones), realizando el abastecimiento directamente en el sitio de operación mediante sistema de bombeo, con el propósito de reducir la probabilidad de ocurrencia de derrames.
Como medida preventiva, durante las actividades de abastecimiento se contó con un kit para atención de derrames. Durante el periodo reportado no se presentaron derrames, fugas, incidentes ambientales ni situaciones que generaran residuos peligrosos derivados del manejo de combustibles.
De acuerdo con el seguimiento realizado, los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba no registraron generación de residuos peligrosos durante el periodo evaluado. Se mantendrá el control preventivo durante las actividades que involucren equipos, combustibles

o sustancias susceptibles de generar RESPEL, verificando la aplicación de las medidas de manejo ambiental establecidas.

Ilustración 41 Manejo de combustible

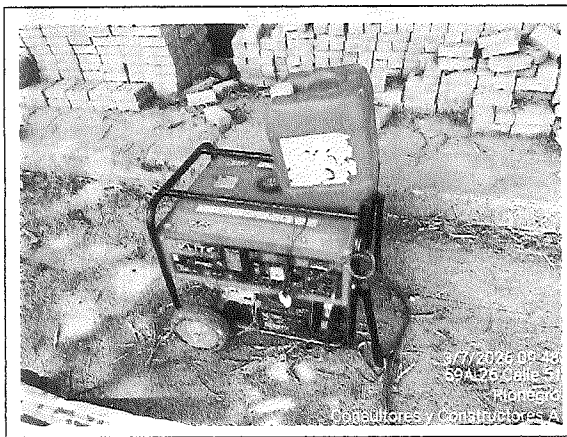

Planta Eléctrica, previa a suministro de combustible



Kit de Derrame

5.2.4. Manejo de residuos especiales

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento al manejo de residuos especiales generados o asociados a las actividades desarrolladas en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba.

Durante el periodo evaluado no se generaron llantas usadas, baterías, elementos asociados al mantenimiento de vehículos o maquinaria, ni otros residuos especiales derivados de actividades de mantenimiento, por lo cual no fue necesario implementar medidas específicas de almacenamiento temporal, aprovechamiento o entrega a gestores autorizados para este tipo de residuos.

En los frentes intervenidos, los materiales generados correspondieron principalmente a residuos de construcción y demolición (RCD) y material producto de excavación, los cuales fueron manejados conforme a los procedimientos establecidos para su almacenamiento temporal, traslado y disposición en los sitios autorizados para tal fin.


En relación con la madera ubicada en los frentes de obra, actualmente esta no se clasifica como residuo, debido a que continúa siendo utilizada y reutilizada en actividades constructivas, principalmente en la conformación de muros de contención, formaletas y otros elementos temporales requeridos para el desarrollo del proyecto. Una vez este material pierda sus condiciones de aprovechamiento y no sea susceptible de reutilización, será clasificado

como residuo y gestionado de acuerdo con las alternativas de almacenamiento, aprovechamiento o disposición final aplicables.
Por frente de obra, se establece lo siguiente:

- **Casas del Mar:** Durante el periodo evaluado no se generaron residuos especiales asociados a llantas, mantenimiento de maquinaria u otros elementos de esta categoría. Los materiales derivados de las actividades constructivas correspondieron principalmente a RCD y material de excavación, cuyo manejo se realizó conforme a los controles establecidos.
- **Laureles:** No se presentaron actividades generadoras de residuos especiales durante el periodo reportado. La madera disponible en el frente continúa siendo utilizada dentro de las actividades constructivas previstas.
- **Quebrada Arriba:** No se generaron residuos especiales durante el periodo evaluado, ni se requirió implementar medidas de manejo asociadas a este tipo de residuos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, durante el periodo reportado no se evidenció generación de residuos especiales en los frentes de obra. Se continuará verificando el manejo adecuado de materiales y residuos que puedan generarse durante el avance de las actividades constructivas.

Ilustración 42 Manejo de madera

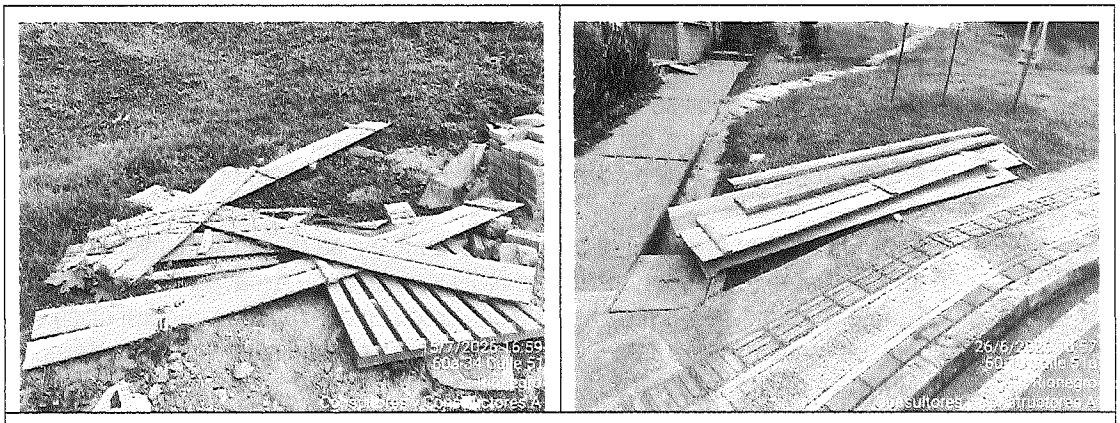

Madera utilizada en obra

5.2.5. Manejo de residuos de Construcción, Demolición (RCD) y Excavación

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento al manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) y material proveniente de excavaciones generados en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba.

Como resultado de las actividades constructivas ejecutadas en los tres frentes, se generó un volumen consolidado de 70 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), provenientes principalmente de actividades de demolición de andenes, y 224 m³ de material producto de excavaciones, para un total de 294 m³ de material manejado durante el periodo evaluado.
El manejo de los materiales generados se realizó de manera diferenciada según las condiciones operativas de cada frente:

- **Casas del Mar:** El material generado fue manejado mediante acopio temporal en áreas previamente definidas dentro de la obra, garantizando condiciones adecuadas para evitar interferencias con el tránsito peatonal y vehicular. Los materiales permanecieron protegidos mediante plástico con el fin de prevenir la dispersión de material particulado y el arrastre de sedimentos por acción de la lluvia.

- **Laureles:** Debido a las condiciones particulares del frente de obra, donde no se cuenta con un área disponible para realizar acopio temporal de RCD y material de excavación, y considerando la distancia existente respecto a los puntos de acopio habilitados en los otros frentes, el manejo del material se realiza mediante retiro directo desde el área de generación.
  Para esta actividad, el minicargador realiza la recolección del material generado dentro del frente y efectúa su cargue directamente en la volqueta destinada para su transporte al sitio autorizado de disposición. Debido a esta modalidad operativa, en algunos casos el retiro del material puede presentar demoras puntuales, dado que se busca consolidar un volumen aproximado que permita optimizar la capacidad de transporte de la volqueta y evitar desplazamientos con cargas parciales.
  Durante estos periodos se mantiene control sobre el material generado, garantizando que permanezca dentro del área de trabajo sin generar afectaciones al tránsito, drenajes, zonas aledañas o condiciones ambientales del entorno.

- **Quebrada Arriba:** Al igual que en el frente Laureles, se realizó seguimiento continuo para efectuar el retiro oportuno de los RCD y material de excavación generados. No obstante, las condiciones propias de la operación en obra pueden generar dificultades puntuales para el retiro inmediato, por lo cual se mantienen medidas de control mientras se realiza su traslado.

El sitio destinado para el acopio temporal de los RCD y material de excavación corresponde a un área autorizada por el municipio, entidad que permitió el desarrollo de esta actividad conforme a las necesidades del proyecto.
La totalidad del material generado durante el periodo reportado fue trasladada a un lote privado ubicado en la vereda Quirama (finca 206), municipio de El Carmen de Viboral, con un área aproximada de 1.200 m², donde el material es utilizado en actividades de adecuación y mejoramiento del lote y sus vías internas.

Durante el periodo evaluado no fue posible realizar reutilización del material de excavación dentro de las actividades constructivas ejecutadas, por lo cual este fue trasladado al sitio autorizado para su aprovechamiento en adecuaciones del predio.
Como soporte de la gestión realizada, se cuenta con actas de solicitud y entrega de material emitidas por el propietario del predio receptor, documentos que se anexan al presente informe.

Tabla 14 Relación de residuos dispuestos


Fechas de generación de (RCD)	**Residuos generados (RCD) (m^3)**	**Residuos reutilizados (RCD) (m^3)**	**Residuos dispuestos en Escombrera (RCD) (m^3)**
13 de junio al 25 de julio	70	0	70
Fechas de generación de Residuos Excavación	**Residuos de excavación generados (m^3)**	**Residuos de excavación reutilizados (m^3)**	**Residuos de excavación dispuestos en Escombrera (m^3)**
13 de junio al 25 de julio	224	0	224

Resumen de disposición: Durante el período reportado se dispusieron 70 m^3 de RCD y 224 m^3 de material de excavación en el lote autorizado ubicado en la vereda Quirama (finca 206) para un total de 294 m^3 de material transportado y recibido, soportado mediante recibos de entrega anexos al informe.

Ilustración 43 Manejo de RCD



RCD en acopio parte baja

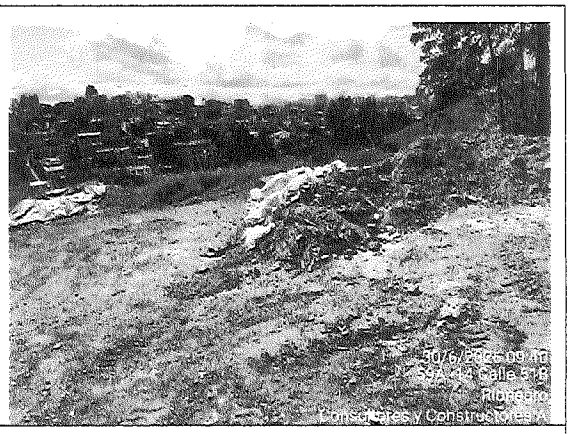

RCD en acopio sectro casas del mar

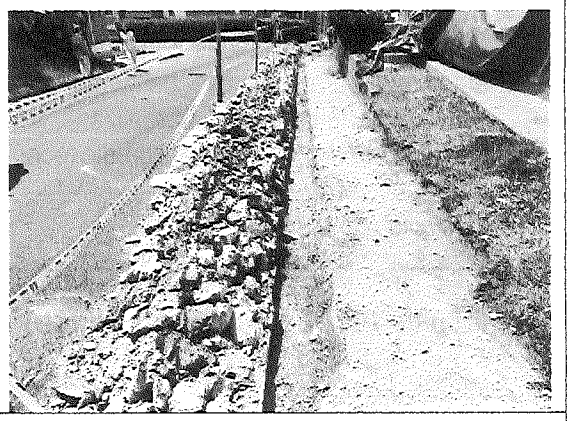
	
RCD en sector quebrada arriba	RCD en sector Laureles

Tabla 15 Relación de residuos sólidos

Fecha generación de residuos	Cantidad de Residuos no aprovechables	Cantidad de Residuos aprovechables	Cantidad de Residuos peligrosos	Cantidad de Residuos especiales	Cantidad de residuos RCD (m^3)	Cantidad de residuos de excavación (m^3)	Empresa recolectora
13 de junio al 25 de julio	29,7	21,5	0	0	68	92	Verde limpio residuos no aprovechables Vehículos particulares (RCD, R. Excavación)
Total	**29,7 kg**	**21,5 kg**	**0**	**0**	**68**	**92**	

Los residuos de RCD, escombros y material de excavación son recolectadas por los vehículos (volquetas) previamente autorizados por la interventoría, y son llevados a los sitios de disposición final. Se anexan acta de solicitud de material y de entrega de material.

5.2.6. Indicadores de seguimiento programa N° 2

Tabla 16 Indicadores de seguimiento N°2

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Disponer el 100% de los residuos generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad.	(Cantidad de residuos no aprovechables dispuestos /Cantidad totales de residuos generados) x 100. (29,7 / 29,7) x 100.	100%	Mensual	Registro fotográfico.
Que mínimo el 50% de los residuos sólidos totales generados puedan ser reciclados.	(Cantidad residuos reciclados/Total residuos generados) x 100. (22,5 / 22,5) x 100.	100%	Mensual	Registro fotográfico
Disponer el 100% de los residuos peligrosos generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad.	(Cantidad de residuos peligrosos gestionados para tratamiento o disposición final/Cantidades totales de residuos peligrosos generados) x 100. (0/ 0) x 100.	0%	Mensual	No aplica.
Disponer el 100% de los residuos especiales generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad.	(Cantidad de residuos especiales gestionados para tratamiento o disposición final /Cantidades totales de residuos especiales generados) x 100.	0%	Mensual	No aplica.

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Disponer el 100% de los residuos de construcción y demolición generados en obra, en zonas legalmente autorizadas para la actividad.	(Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de RCD generados) x 100. (70 m3 / 70 m3) x 100.	100%	Mensual	Acta de entrega de material
Disponer el 100% de los residuos de excavación generados en obra, en zonas legalmente autorizadas para la actividad.	(Cantidad de residuos de excavación dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de residuos de excavación generados) x 100. (224 m3/ 224 m3) x 100.	100%	Mensual	Acta de entrega de material

5.3. PROGRAMA 3: Manejo de Recurso Aire

5.3.1. Manejo integral de materiales de construcción

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las actividades asociadas al manejo del recurso aire en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, verificando las medidas implementadas para el control de material particulado, almacenamiento, transporte y manejo de materiales de construcción.

En los tres frentes se desarrollaron actividades constructivas similares, para las cuales se requirió el ingreso de materiales pétreos, agregados y elementos prefabricados necesarios para la ejecución del proyecto, entre ellos bordillos, losetas, base granular, arena de pega, arena para concreto, triturado, cemento, bloques y acero de refuerzo.

Los materiales fueron suministrados por proveedores autorizados y transportados mediante vehículos adecuados hasta los puntos de trabajo establecidos dentro de la obra.

A continuación, se relaciona el material utilizado durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio:

Tabla 17 Material utilizado en la obra (periodo del 13 de junio al 25 de julio)

Descripción	Cantidad	Proveedor
Cemento	245 (Bulto 50 kg)	Ferretería J y M
Base granular	212 m3	IDC Pavimentos
Arena de pega	42 m3	IDC Pavimentos
Arena de revoque	0,5 m3	IDC Pavimentos
Arena de concreto	20 m3	IDC Pavimentos
Bordillo en concreto	1420	Conprecolor
Loseta	4300	Conprecolor
Adoquín amarillo	2700	Conprecolor
Varilla	242	Ferretería J y M
Bloque de concreto	600	Conprecolor

Los materiales fueron distribuidos y almacenados temporalmente en las áreas definidas dentro de cada frente de obra, manteniendo condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad. Los agregados susceptibles de generar material particulado permanecieron cubiertos cuando las condiciones operativas lo requirieron, reduciendo la dispersión de partículas por acción del viento y facilitando su utilización progresiva conforme al avance de las actividades.
El ingreso y movilización de materiales se realizó conforme a la programación de obra. La relación de transporte y recepción de materiales se presenta a continuación:

Tabla 18 Relación de material

Fecha	Material	Recibo	Volqueta	Cantidad
13 de junio al 25 de julio	Cemento	Residente de obra contratista	Motocarro	245 (Bulto 50 kg)
13 de junio al 25 de julio	Base granular	Residente de obra contratista	LLA 588	212 m3

Fecha	Material	Recibo	Volqueta	Cantidad
13 de junio al 25 de julio	Arena de pega	Residente de obra contratista	LLA 588	42 m3
13 de junio al 25 de julio	Arena de revoque	Residente de obra contratista	UPR767	0,5 m3
13 de junio al 25 de julio	Arena de concreto	Residente de obra contratista	UPR767	20 m3
13 de junio al 25 de julio	Bordillo en concreto	Residente de obra contratista	HSC235	1420
13 de junio al 25 de julio	Loseta	Residente de obra contratista	HSC235	4300
13 de junio al 25 de julio	Adoquín amarillo	Residente de obra contratista	HSC235	2700
13 de junio al 25 de julio	Varilla	Residente de obra contratista	Motocarro	242
13 de junio al 25 de julio	Bloque de concreto	Residente de obra contratista	HSC235	600

Durante el periodo evaluado se mantuvieron las medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir la generación de emisiones de material particulado y minimizar posibles afectaciones al entorno, aplicadas en los tres frentes de obra:



- Almacenamiento temporal de materiales en zonas previamente definidas dentro de cada frente.
- Protección de materiales con potencial de generación de polvo mediante lonas o cubiertas cuando fue necesario.
- Uso progresivo de agregados para reducir tiempos de permanencia en almacenamiento.

- Transporte de materiales en vehículos adecuados y con la carga protegida para evitar dispersión de partículas.
- Ejecución de actividades de preparación y manejo de mezclas sobre superficies controladas, evitando el contacto directo con el suelo.

Durante las inspecciones ambientales realizadas en los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, se verificaron las condiciones de manejo de materiales y las medidas de control implementadas. En los casos donde se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con orden, almacenamiento o aplicación de medidas preventivas, se realizaron las recomendaciones correspondientes al personal encargado para fortalecer el cumplimiento de los controles ambientales establecidos.

De acuerdo con el seguimiento efectuado, durante el periodo reportado las actividades asociadas al manejo de materiales y control del recurso aire se desarrollaron aplicando medidas preventivas orientadas a minimizar la generación de material particulado y mantener condiciones adecuadas dentro de los frentes de obra.

Ilustración 44 Manejo de Recurso Aire

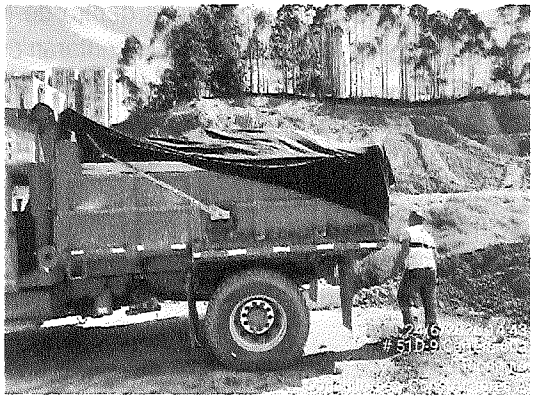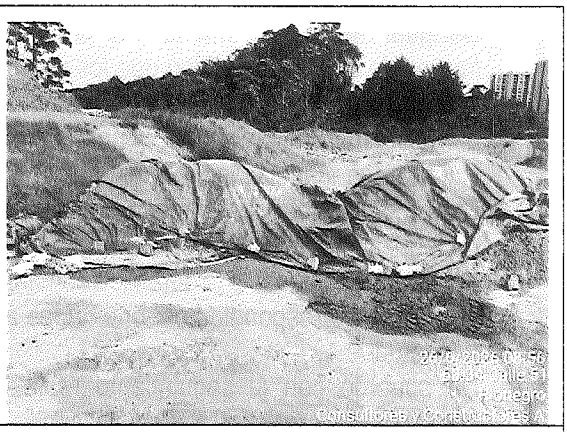	
Vehículo transportando material con lona	Material cubierto para evitar dispersión de partículas

5.3.2. Manejo integral para el control de emisiones atmosféricas y ruido

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas para el control de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, con el propósito de prevenir y minimizar posibles afectaciones al entorno y a la comunidad cercana al proyecto.

Las actividades constructivas desarrolladas en los tres frentes estuvieron asociadas principalmente a excavaciones, demolición, transporte de materiales, corte de elementos en concreto y demás labores propias del avance de obra, para las cuales se mantuvieron las siguientes medidas de control:


- Humectación de las áreas intervenidas y de los materiales susceptibles de generar material particulado, especialmente durante actividades de excavación, demolición y corte de concreto, cuando las condiciones operativas y climáticas lo requirieron.
- Limpieza periódica de los frentes de obra y zonas de circulación cercanas, especialmente en aquellos puntos donde se evidenció presencia de material producto de las actividades constructivas, con el fin de evitar su acumulación y dispersión.
- Transporte de materiales mediante vehículos adecuados, manteniendo las cargas cubiertas para reducir la emisión de partículas y prevenir la pérdida de material durante los recorridos.
- Control de velocidad de circulación de vehículos dentro del área de influencia del proyecto, contribuyendo a la reducción de emisiones de polvo generadas por el tránsito.
- Programación de actividades dentro de los horarios autorizados para la ejecución de obra, evitando la generación de molestias asociadas al ruido durante horarios no permitidos.

De igual manera, se mantuvo la prohibición de realizar quemas de residuos dentro de los frentes de obra y se verificó que los vehículos y equipos vinculados al proyecto contaran con la documentación requerida y los mantenimientos correspondientes, como medida preventiva para el control de emisiones generadas durante su funcionamiento.


Durante las inspecciones ambientales realizadas en los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, se efectuó seguimiento a las condiciones de operación, manejo de materiales, control de polvo y generación de ruido. Cuando se identificaron situaciones puntuales asociadas a la dinámica constructiva, se realizaron las recomendaciones y acciones de mejora correspondientes, orientadas a restablecer las condiciones adecuadas de manejo ambiental.

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el periodo evaluado, las actividades constructivas se desarrollaron aplicando medidas preventivas para el control de emisiones atmosféricas y ruido, fortaleciendo continuamente las buenas prácticas ambientales con el personal vinculado al proyecto.


lustración 45 Control Emisiones Atmosféricas

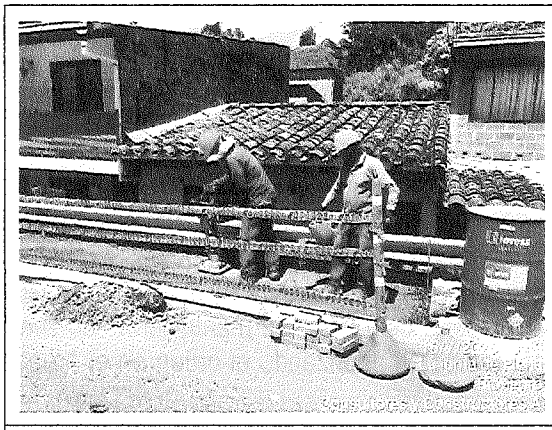


Actividades de humectación en sector quebrada arriba

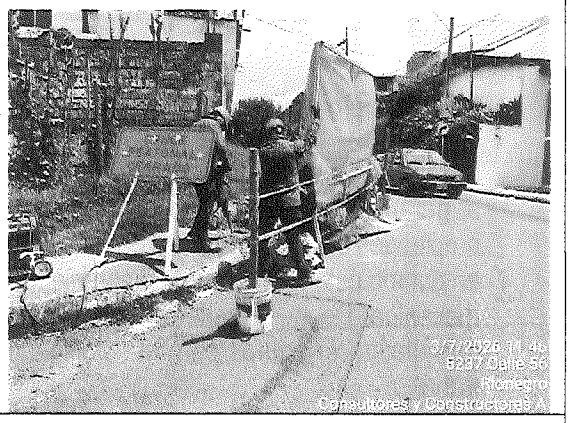


Uso de barrera para control de material particulado en actividades de demolición sector laureles

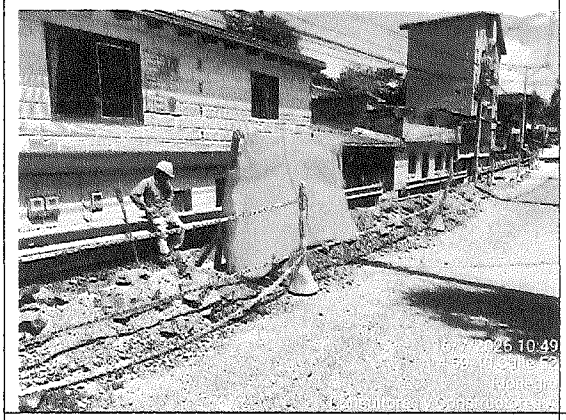

Manejo de material particulado en sector quebrada arriba

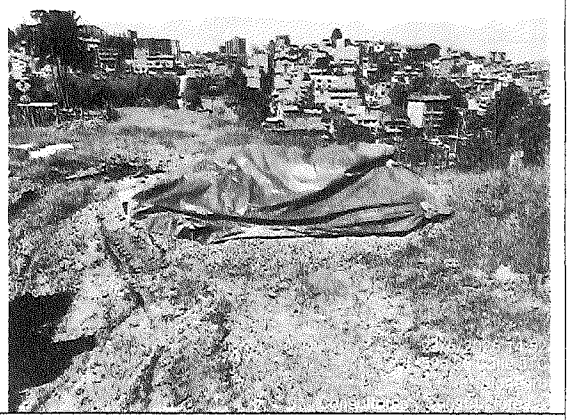

Material cubierto en punto de acopio del sector casas del mar



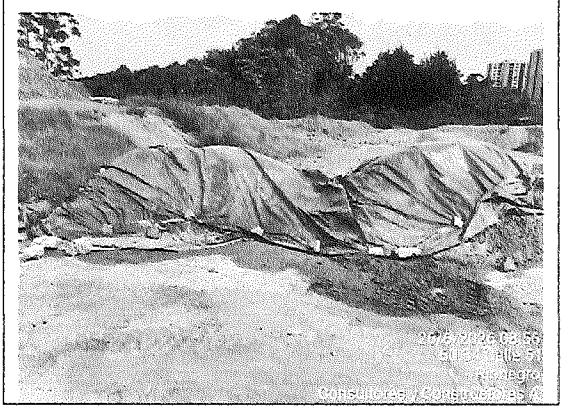


Material cubierto en punto de acopio 2, cerca a al sector quebrada arriba

5.3.3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el presente periodo, se dio continuidad a la implementación de las medidas orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria, herramientas y vehículos empleados en las actividades constructivas. Se operó exclusivamente con equipos y vehículos en óptimo estado mecánico, manteniendo al día la verificación del SOAT y la revisión técnico-mecánica. De igual manera, se verifico el desempeño operativo. Se mantuvieron las zonas delimitadas y seguras para el estacionamiento temporal, priorizando el orden en el área de trabajo.

Ilustración 46 Maquinaria y equipos
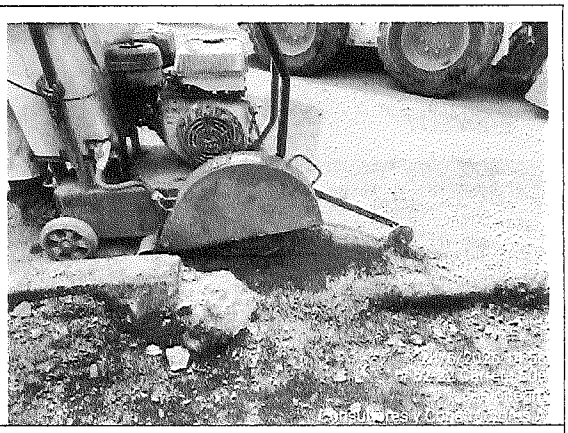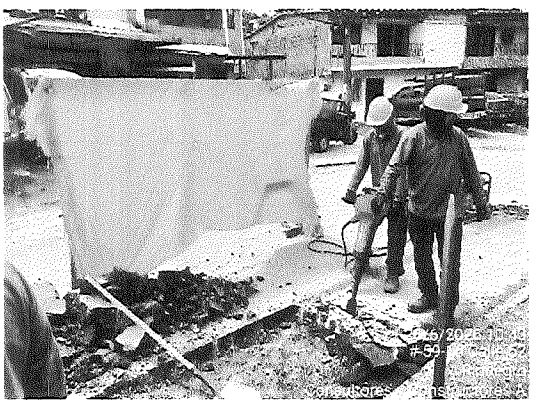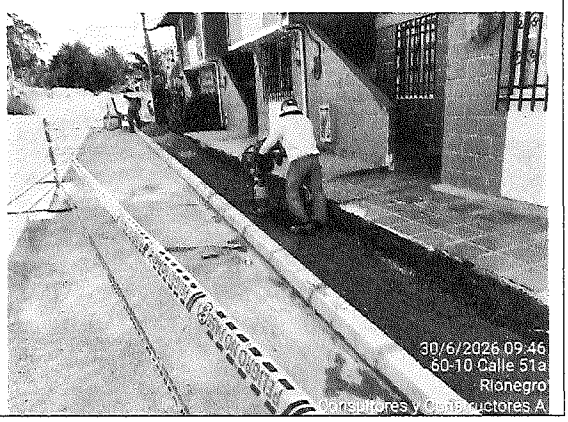
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Minicargador</td><td>Cortadora</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Martillo	Compactadora

Dentro de los vehículos y maquinaria utilizados se tiene:

- Herramienta menor
- Cortadora de concreto
- Planta eléctrica a gasolina
- Martillo demoledor neumático
- Minicargador
- Tronzadora
- Vibrador de concreto
- Compactador tipo canguro
- Compactador tipo rana
- Pulidora
- Canguro

Tabla 19 Relación de maquinaria, vehículos y equipos usados en obra

Tipo de Vehículo o Maquinaria	**Placa o Registro**	**Fecha de ultimo mantenimiento**	**SOAT**	**Revisión Técnico Mecánica**
Volquetas	HSC235	------	23/10/2026	24/10/2026
Volqueta	LLA588	------	16/07/2027	16/07/2027
Volqueta	UPR767	------	25/06/2027	25/06/2027
Compactador tipo rana	-------	22/05/2026	------	-------
Cortadora de concreto	-------	09/03/2026	-------	-------
Planta eléctrica a gasolina	-------	-------	-------	-------
Martillo demoledor neumático	------	27/04/2026	-------	------
Minicargador	-------	26/02/2026	-------	-------
Tronzadora	------	------	-------	-------

Vibrador de concreto	-------	-------	-------	-------
Compactador tipo canguro	-------	04/05/2026	-------	-------
Pulidora	-------	-------	-------	-------

Dentro de las principales medidas implementadas se tienen:

1. Humectación.
2. Implementación de sistemas de control de polvo durante los cortes de concreto.
3. Limpieza diaria de los frentes de obra y de las vías públicas cuando se presentó arrastre de material.
4. Transporte de materiales con la carga debidamente cubierta para prevenir derrames y emisiones de polvo.
5. Desarrollo de las actividades constructivas dentro de los horarios diurnos autorizados para minimizar impactos por ruido.
6. Verificación de la vigencia de la revisión técnico-mecánica de los vehículos vinculados al proyecto para el control de emisiones atmosféricas.

5.3.4. Indicadores de seguimiento programa N°3

Tabla 20 Indicadores de seguimiento programa N°3

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Implementar todas las actividades propuestas para el manejo adecuado de los materiales de construcción.	(Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción/Número de acciones establecidas) x 100. (6/6) x 100.	100%	Mensual	Registro fotográfico
Que el 100% de los vehículos vinculados al proyecto cuenten con la documentación legal vigente.	(Número monitoreos realizados/Número monitoreos programados	100%	Mensual	SOAT, Técnico mecánica

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
	durante el periodo) x 100. (3/3) x 100.			
Que el 100% de la maquinaria y/o equipos vinculados al proyecto, cuenten con la documentación legal vigente.	(Cantidad maquinaria y/o equipos con mantenimiento al día/ Cantidad maquinaria y/o equipos vinculados a la obra) x 100. (9/ 9) x 100.	100%	Mensual	Documentos

5.4. PROGRAMA 4: Manejo Integral del Recurso Suelo

5.4.1. Manejo de descapote y cobertura vegetal

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones de cobertura vegetal y a las actividades asociadas al manejo de descapote en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, procurando limitar las intervenciones únicamente a las áreas requeridas para el desarrollo del proyecto y prevenir afectaciones innecesarias sobre las zonas verdes existentes.

De acuerdo con las condiciones particulares de cada frente, se establece lo siguiente:

Frente Casas del Mar

Durante el periodo evaluado se realizó la intervención de aproximadamente 10 metros lineales de un cerco vivo conformado por Eugenios (Syzygium paniculatum), debido a que su ubicación interfería con la construcción del andén proyectado. La actividad se ejecutó únicamente sobre el tramo requerido para el avance de la obra, evitando afectar la vegetación localizada fuera del área de intervención.

El material vegetal retirado fue trasladado y entregado en una vivienda cercana al sector, donde será utilizado como material orgánico para aprovechamiento como abono. Como soporte de esta actividad se cuenta con el acta de solicitud del material.

Adicionalmente, se identificó la presencia de material vegetal correspondiente a guadua dentro del área de influencia del proyecto, cuya intervención se encuentra pendiente y será gestionada previamente al desarrollo de las actividades que requieran su retiro, verificando las medidas de manejo ambiental aplicables.

Frente Laureles

En este frente se identificó la presencia de jardines y elementos vegetales asociados a zonas ornamentales que podrían requerir intervención para el desarrollo de las actividades constructivas proyectadas. Durante el periodo reportado no se han realizado actividades de retiro, traslado o afectación sobre dichos elementos, debido a que las obras aún no han alcanzado estas áreas.

Se continuará realizando seguimiento al avance de obra con el fin de establecer oportunamente las medidas de manejo requeridas antes de cualquier intervención sobre la cobertura vegetal existente.

Frente Quebrada Arriba

Durante el periodo evaluado no se identificó presencia de material vegetal susceptible de intervención dentro del área de ejecución de las actividades constructivas. Por lo anterior, no se requirieron actividades asociadas a descapote, retiro de cobertura vegetal, tala, trasplante, reubicación o compensación forestal en este frente.

De manera general, durante el periodo reportado no se realizaron actividades de tala, trasplante o compensación forestal sobre individuos arbóreos. Asimismo, se mantuvieron medidas preventivas orientadas a conservar la cobertura vegetal ubicada fuera de las áreas de intervención, evitando afectaciones sobre zonas verdes o elementos naturales no requeridos para la ejecución del proyecto.


Ilustración 47 Material vegetal



Corte de cerca viva en sector casas del mar



Guadua en sector casas del mar

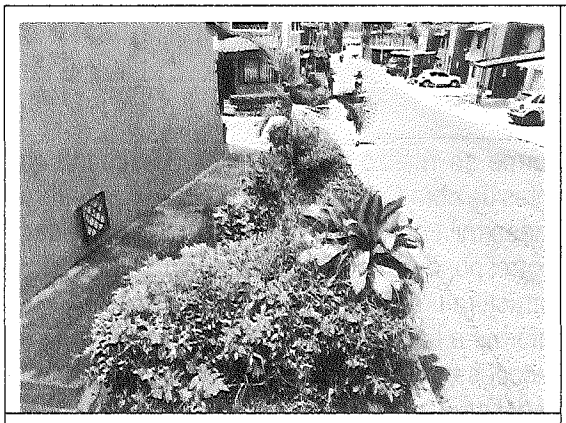

Material vegetal en sector laureles

5.4.2. Recuperación de áreas afectadas

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones del suelo y áreas intervenidas en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, con el fin de identificar posibles procesos de degradación, erosión, afectaciones por manejo inadecuado de materiales o situaciones que requirieran la implementación de medidas de recuperación ambiental.

Durante el periodo evaluado no se evidenciaron procesos de degradación del suelo, fenómenos erosivos, pérdida significativa de cobertura o afectaciones ambientales que hicieran necesaria la ejecución de actividades de recuperación o restauración en ninguno de los frentes intervenidos.

Las actividades constructivas se desarrollaron dentro de las áreas definidas para el proyecto, manteniendo medidas de orden y aseo en los sectores de trabajo. El manejo de materiales excedentes, residuos de construcción y material producto de excavación se realizó conforme a los procedimientos establecidos, evitando acumulaciones prolongadas o afectaciones sobre áreas no intervenidas.

De igual manera, durante las actividades ejecutadas en Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba no se presentaron derrames de combustibles, lubricantes u otras sustancias que pudieran generar alteraciones sobre la calidad del suelo.

En los casos donde se realizaron actividades de excavación, retiro de materiales o adecuación de superficies, se mantuvo seguimiento a las condiciones del terreno, verificando que no se generaran condiciones que requirieran medidas adicionales de estabilización, recuperación o restauración ambiental.

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el periodo reportado, no se identificaron áreas degradadas ni sectores que requirieran la implementación de acciones de recuperación ambiental. Se continuará realizando monitoreo durante el avance de las actividades constructivas para atender oportunamente cualquier condición que pueda presentarse.

5.4.3. Manejo para la protección de la fauna

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones asociadas a la protección de fauna en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba. Las actividades constructivas se desarrollaron dentro de las áreas definidas y autorizadas para la ejecución del proyecto, correspondientes a sectores con un alto grado de intervención antrópica y presencia de infraestructura urbana.

Las labores ejecutadas se desarrollaron conforme a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, verificando que las actividades constructivas no generaran afectaciones sobre la fauna asociada al área de influencia del proyecto.

Debido a las características urbanas del entorno, durante el periodo evaluado se observó de manera ocasional la presencia de animales domésticos, principalmente perros y gatos asociados a residentes y establecimientos cercanos a los frentes de obra. Frente a estas condiciones, el personal vinculado al proyecto mantuvo las recomendaciones de manejo y sensibilización orientadas a prevenir situaciones que pudieran generar molestias, riesgos o afectaciones sobre estos animales durante el desarrollo de las actividades.

En los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba no se identificó presencia de fauna silvestre que requiriera actividades de rescate, ahuyentamiento, traslado o manejo especializado. Asimismo, durante el periodo reportado no se presentaron eventos asociados a afectación, atrapamiento o mortalidad de fauna.

De acuerdo con el seguimiento realizado, no fue necesaria la implementación de medidas adicionales de manejo de fauna durante el periodo evaluado. Se continuará realizando observación preventiva durante el avance de las actividades constructivas, con el fin de atender oportunamente cualquier situación que pueda presentarse.

5.4.4. Indicadores de seguimiento programa N°4

Tabla 21 Indicadores de seguimiento programa N°4

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Que el 100% del área afectada por la obra sea recuperada.	(Área recuperada por la obra/ Área total intervenida por el proyecto) x 100. (0 / 0) x 100.	N/A	Mensual	No aplica

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Cumplir el 100% de las actividades programadas para el Manejo de descapote y cobertura vegetal.	(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. (0/0) x 100.	100%	Mensual	No aplica
Cumplir el 100% de las actividades programadas para el Manejo y la protección de la fauna.	(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. (0/0) x 100.	N/A	Mensual	No aplica.

5.5. PROGRAMA 5: Manejo Integral del Recurso Hídrico

5.5.1. Manejo de fuentes hídricas en el área de influencia de la obra

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones asociadas a la protección del recurso hídrico en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, manteniendo las medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir la afectación de fuentes hídricas, sistemas de drenaje y áreas susceptibles a arrastre de materiales.

De acuerdo con las condiciones particulares de cada frente, se establece lo siguiente:

Frente Casas del Mar

Durante el periodo evaluado no se identificaron fuentes hídricas superficiales cercanas al área directa de intervención. Las medidas de manejo implementadas estuvieron orientadas principalmente a prevenir afectaciones al sistema de drenaje urbano mediante el control de materiales, residuos y sedimentos generados durante las actividades constructivas.

Se mantuvo el orden y aseo del frente de obra, el almacenamiento adecuado de materiales y la protección de los sistemas de drenaje existentes, evitando el ingreso de residuos o material particulado que pudiera ser transportado por aguas lluvias.

Frente Laureles

En este frente no se identificaron fuentes hídricas cercanas al área de ejecución de las actividades constructivas. El manejo ambiental se enfocó en la prevención de posibles afectaciones al sistema de drenaje urbano mediante el control de residuos, materiales de obra y sedimentos asociados a las actividades ejecutadas.

Se mantuvieron las medidas preventivas relacionadas con la limpieza periódica de las áreas intervenidas, el manejo adecuado de materiales y la prohibición de disposición de residuos sobre vías, sumideros o estructuras de drenaje.

Frente Quebrada Arriba


En este frente se identificó la presencia de una fuente hídrica ubicada a una distancia prudente del área de trabajo, sin que las actividades constructivas ejecutadas generen intervención directa sobre esta. Como medida preventiva, se mantuvieron controles orientados a evitar el arrastre de sedimentos, residuos o materiales hacia la fuente hídrica y el sistema de drenaje asociado.

Durante el periodo reportado se implementaron las siguientes medidas de manejo:


- Mantenimiento del acopio de materiales debidamente protegido y cubierto, evitando la dispersión o arrastre de sedimentos por acción del viento o las lluvias.
- Realización de actividades periódicas de limpieza en los frentes de obra, evitando la acumulación de materiales susceptibles de ser transportados hacia los sistemas de drenaje.
- Prohibición de disposición de residuos sólidos o líquidos sobre vías, sumideros y redes de drenaje.
- Protección de los sumideros ubicados en las zonas de intervención para prevenir el ingreso de sedimentos y residuos.
- No realización de captaciones de agua, vertimientos ni intervenciones directas sobre la fuente hídrica identificada.

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el periodo evaluado, las actividades constructivas desarrolladas en los tres frentes se ejecutaron sin evidenciar afectaciones al recurso hídrico. Se continuará con la aplicación de las medidas preventivas establecidas, especialmente en el frente Quebrada Arriba, donde existe mayor sensibilidad por la presencia de una fuente hídrica cercana.


Ilustración 48 Recurso Hídrico

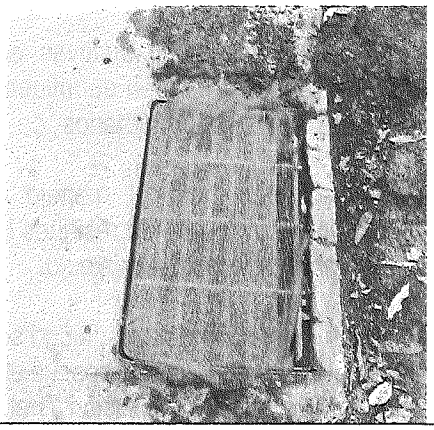

Protección de sumideros (redes de alcantarillado), sector quebrada arriba

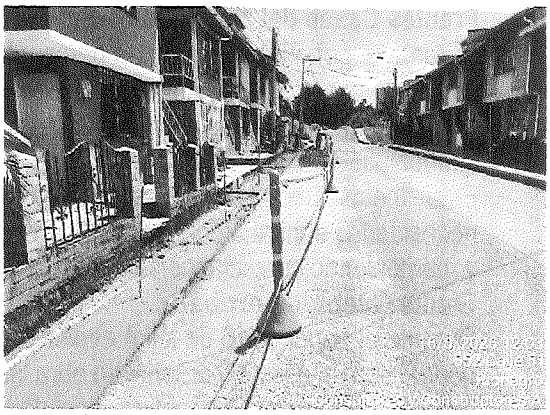

Limpieza de frentes de trabajo para evitar arrastre de materiales sector casas del mar

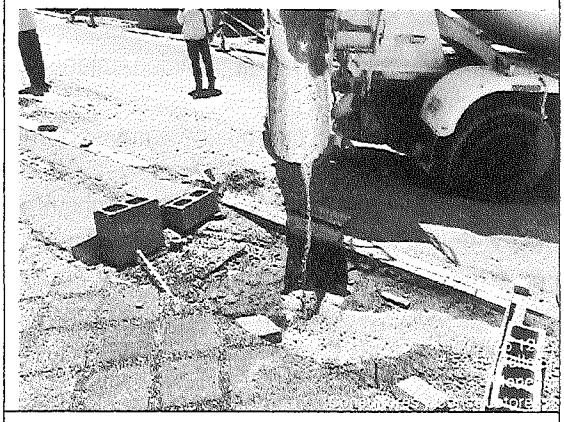

Lavado de canaleta con manguera en área de excavación para evitar contaminación

5.5.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales generados durante la ejecución de las actividades constructivas en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba.
Durante el periodo evaluado no se generaron aguas residuales industriales, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas corresponden principalmente a construcción de andenes y obras asociadas, sin involucrar procesos constructivos que generen este tipo de efluentes.

De acuerdo con las condiciones particulares de cada frente, el manejo de aguas residuales domésticas se realizó de la siguiente manera:

Frentes Casas del Mar y Laureles

Durante el periodo reportado, el personal vinculado a las actividades constructivas realizó el uso de los servicios sanitarios ubicados en viviendas particulares del área de influencia del proyecto, mediante acuerdos establecidos previamente con los propietarios de dichos inmuebles.

Este mecanismo permitió garantizar condiciones adecuadas para el manejo de las necesidades sanitarias del personal, evitando la disposición inadecuada de residuos líquidos y manteniendo condiciones sanitarias acordes con los requerimientos del proyecto.

Frente Quebrada Arriba

Durante el periodo (16 de julio) evaluado se inició la implementación de una unidad sanitaria portátil para el uso del personal de obra, suministrada por la empresa Biosepticos. La empresa encargada realizará las actividades de mantenimiento, limpieza y disposición final de los residuos generados, de acuerdo con la frecuencia establecida para la prestación del servicio.

Al cierre del periodo reportado, la unidad sanitaria no había requerido actividades de mantenimiento, por lo cual no se cuenta aún con registros asociados a dicha labor.

De manera general, durante el periodo evaluado:

- No se generaron vertimientos industriales asociados al funcionamiento de maquinaria, equipos o actividades constructivas.
- No se realizaron descargas de aguas residuales al suelo, cuerpos de agua o sistemas de drenaje.
- Se mantuvieron medidas de control orientadas a prevenir afectaciones ambientales asociadas al manejo de residuos líquidos domésticos.

En cuanto al suministro de agua requerido para las actividades constructivas, este continuó siendo proporcionado mediante el acuerdo establecido con el propietario de una vivienda ubicada en el área de influencia del proyecto, conforme a las condiciones definidas entre las partes.

El subcontratista encargado de las actividades que requieren el uso del recurso hídrico continúa realizando la compensación económica acordada con el propietario de la vivienda, garantizando la disponibilidad del agua necesaria para la ejecución de las labores y promoviendo un uso eficiente y controlado del recurso durante el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con el seguimiento realizado, el manejo de residuos líquidos domésticos e industriales se desarrolló conforme a las medidas establecidas para cada frente de obra, sin evidenciar afectaciones sobre el suelo, sistemas de drenaje o fuentes hídricas cercanas.

Ilustración 49 Residuos Líquidos



Baño portátil

Tabla 22 Relación de unidades sanitarias portátiles

Ubicación	Coordenadas	Cantidad	Empresa
Cancha Quebrada arriba	6° 9'32.12"N y 75°22'39.16"O	1	Biosepticos

Tabla 23 Registro de limpieza unidades sanitarias portátiles

Fecha	# orden de servicio	Placa vehículo	# de baños	Cantidad agua residual
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				N/A

Se anexa actas de préstamo de baño

5.5.3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía

Uso de agua

Durante el periodo objeto del presente informe, el suministro de agua requerido para el desarrollo de las actividades constructivas en los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada

Arriba continuó siendo proporcionado mediante el apoyo de viviendas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El abastecimiento del recurso hídrico se realizó conforme a los acuerdos establecidos con los propietarios de los inmuebles, quienes autorizaron el suministro del agua necesaria para la ejecución de las actividades de obra. Como soporte de esta gestión se anexan las respectivas actas de apoyo y suministro de agua suscritas entre las partes.

El consumo de agua estuvo asociado principalmente a actividades propias del desarrollo constructivo, tales como:

- Humectación de superficies y materiales para el control de emisiones de material particulado.
- Elaboración y curado de mezclas de concreto y mortero.
- Limpieza ocasional de herramientas y equipos utilizados durante las actividades de obra.

Para el almacenamiento temporal y distribución del recurso dentro de los frentes de trabajo se utilizaron canecas destinadas para tal fin, permitiendo un manejo controlado del agua y evitando desperdicios durante su utilización.




Durante el desarrollo de las actividades se mantuvieron prácticas orientadas al uso eficiente y responsable del recurso hídrico, procurando que el agua suministrada fuera utilizada exclusivamente para las labores requeridas dentro del proyecto y evitando consumos innecesarios.

Uso de energía

Durante el periodo evaluado, el consumo de energía estuvo asociado principalmente al funcionamiento de equipos y herramientas requeridas para la ejecución de las actividades constructivas. Se promovió el uso racional de este recurso mediante la operación de equipos únicamente durante los periodos necesarios para el desarrollo de las labores programadas y verificando condiciones adecuadas de funcionamiento.

De acuerdo con el seguimiento realizado en los frentes Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, se mantuvieron las medidas orientadas al uso eficiente de los recursos naturales, fortaleciendo las buenas prácticas ambientales durante la ejecución del proyecto.

Ilustración 50 Uso eficiente de agua y energía
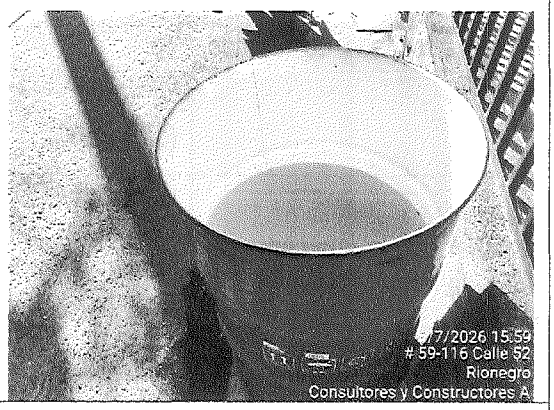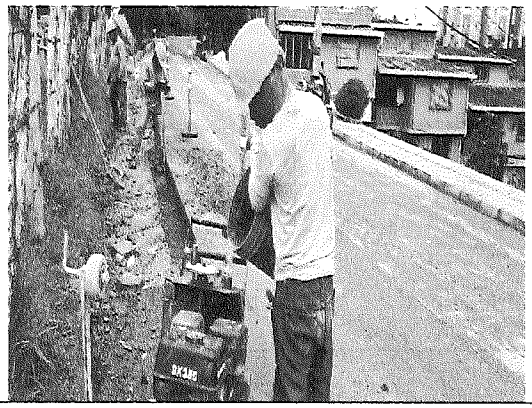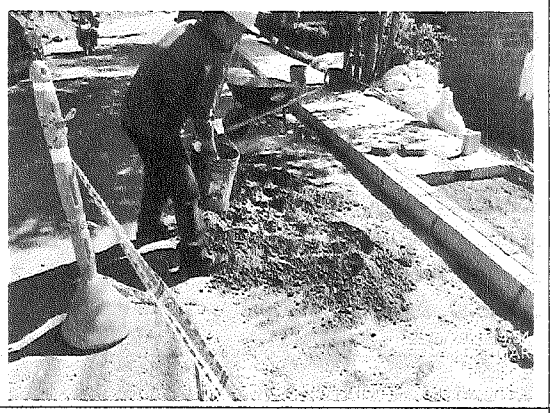
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Uso de canecas para ahorrar agua sector quebrada arriba</td><td>Usos de canecas sector casas del mar</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Suministro de agua en cortadora, con valde y embudo para uso racional del agua</td><td>Preparación de mezcla con agua en valde para usos racional</td></tr>
</table>

5.5.4. Indicadores de seguimiento programa N°5

Tabla 24 Indicadores de seguimiento programa N°5

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Implementar todas las actividades propuestas para el	(Número de medidas implementadas/Número	0%	Mensual	N/A

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
manejo adecuado de fuentes hídricas.	de medidas programadas) x 100. (0/0) x 100.			
Disponer adecuadamente el 100% de los residuos líquidos ARD.	Cantidad ARD tratada y dispuesta adecuadamente / cantidad de Residuos Líquidos Domésticos generados) x 100	100%	Mensual	Acta de préstamo de baño de vivienda.
Realizar 100% del mantenimiento	(No. de mantenimientos programados /No. de mantenimientos ejecutados) *100 (0 /0) *100	N/A	Mensual	N/A
Que el 100% de las actividades programadas para el uso eficiente del agua y la energía dentro de este proyecto, sean ejecutadas.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectas) x 100. (1/1) x 100.	100%	Mensual	Registro fotográfico

5.6. PROGRAMA 6: Manejo de Instalaciones Temporales

5.6.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones de instalación, funcionamiento y manejo de áreas de almacenamiento asociadas a los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba.

Durante el periodo evaluado no fue necesaria la instalación de campamentos temporales, casetas, bodegas, talleres u otras estructuras provisionales dentro de ninguno de los frentes de obra. Las actividades constructivas se desarrollaron utilizando las áreas definidas dentro de cada sector, sin requerir la ocupación de nuevas zonas para la instalación de infraestructura temporal.

El almacenamiento de herramientas, materiales y elementos requeridos para la ejecución del proyecto se realizó mediante el apoyo de espacios existentes, principalmente viviendas ubicadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con las necesidades operativas de cada frente.

De acuerdo con las condiciones particulares de cada sector, se establece lo siguiente:

- **Casas del Mar:** El almacenamiento de materiales y herramientas se realizó mediante el uso de espacios disponibles en una vivienda ubicada en el sector, evitando la instalación de estructuras temporales dentro del área de intervención.
- **Laureles:** Para el almacenamiento de materiales y herramientas se utilizó una vivienda ubicada en el sector y la oficina del contratista, espacios destinados para apoyar la operación del frente de obra y mantener las condiciones adecuadas de organización y control.
- **Quebrada Arriba:** El manejo de herramientas y materiales se realizó mediante el uso de espacios disponibles en una vivienda del sector, sin requerir la instalación de campamentos, bodegas o estructuras provisionales dentro del frente de obra.

Adicionalmente, se mantuvo el uso de un lote autorizado por el municipio para el almacenamiento temporal de materiales requeridos para la ejecución del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de manejo y organización.

Durante el periodo reportado no se habilitaron áreas destinadas a talleres, mantenimiento de maquinaria o almacenamiento permanente de combustibles dentro de los frentes de obra. Las actividades que requirieron limpieza de herramientas o equipos se realizaron aplicando medidas preventivas orientadas a evitar afectaciones sobre el suelo, sistemas de drenaje u otras áreas diferentes al frente de trabajo.

Como parte del seguimiento ambiental, se verificaron las condiciones de orden y aseo en los sectores intervenidos, reforzando con el personal operativo la importancia de mantener las áreas organizadas, realizar una adecuada separación y disposición temporal de residuos, y conservar protegidos los materiales almacenados mediante cubiertas u otros elementos de protección cuando las condiciones lo requirieron.

De acuerdo con el seguimiento realizado, durante el periodo evaluado no se requirió la instalación ni desmantelamiento de campamentos u obras provisionales asociadas al proyecto. Las áreas utilizadas para almacenamiento y apoyo operativo mantuvieron condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades constructivas.

Ilustración 51 Instalaciones temporales



Acopio de materiales en vivienda del sector casas del mar

5.6.2. Revegetalizacion, empradización y/o paisajismo

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a las condiciones de las áreas intervenidas en los frentes de obra Casas del Mar, Laureles y Quebrada Arriba, verificando la necesidad de implementar actividades asociadas a revegetalización, empradización o paisajismo.

De acuerdo con las características del proyecto y las actividades contempladas dentro del alcance contractual, no se requieren actividades de revegetalización, empradización o paisajismo en ninguno de los frentes de obra.

Durante el periodo evaluado:

- No se identificaron áreas intervenidas que requieran procesos de recuperación mediante revegetalización o empradización.
- No se realizaron actividades de descapote que generen la necesidad de implementar recuperación vegetal posterior.
- No se identificaron taludes, zonas inestables o áreas con procesos erosivos que requieran intervención mediante obras de recuperación o estabilización vegetal.
- No se ejecutaron actividades de paisajismo dentro de los frentes intervenidos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, no fue necesaria la implementación de medidas asociadas a revegetalización, empradización o paisajismo durante el periodo reportado.

5.6.3. Indicadores de seguimiento al programa N°6

Tabla 25 Indicadores de seguimiento programa N°6

Meta	Indicador	Valor del indicador	Frecuencia	Evidencia
Cumplir el 100% de las actividades programadas, para la Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. (1/ 1) x 100.	100%	Mensual	Registro fotográfico
Restaurar el 100% de las áreas intervenidas por campamentos y centros de acopio.	(Áreas restauradas/Áreas utilizadas como instalaciones temporales) x 100. (0/0) x 100.	0%	Mensual	N/A

5.7. Otras gestiones ambientales realizadas

Durante el período reportado se realizó una gestión ambiental adicional asociada a la intervención de una guadua ubicada en uno de los tramos del proyecto, la cual genera interferencia con la ejecución del andén proyectado, debido a que parte de su estructura se encuentra sobre el área requerida para la obra y presenta cercanía con líneas de energía existentes.

En este sentido, se solicitó apoyo y acompañamiento al municipio con el fin de gestionar la intervención requerida y coordinar las acciones correspondientes con la empresa prestadora del servicio de energía (EPM), considerando la necesidad de realizar la actividad de manera segura y prevenir posibles afectaciones sobre la infraestructura eléctrica.

A la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido respuesta definitiva por parte de las entidades correspondientes, por lo cual se encuentra pendiente la coordinación y autorización requerida para proceder con la intervención de la guadua.

Las demás actividades ambientales ejecutadas durante el período se desarrollaron conforme a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, sin requerirse acciones adicionales diferentes a las anteriormente descritas.

Como parte del seguimiento ambiental realizado durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 25 de julio, se efectuaron acciones complementarias orientadas a fortalecer las condiciones de orden, aseo y protección ambiental en los diferentes frentes de trabajo (Casas del Mar, Quebrada Arriba y Laureles). Estas actividades fueron resultado de las inspecciones ambientales periódicas y de las observaciones realizadas durante el desarrollo de las obras.


Dentro de las principales gestiones efectuadas se encuentran la solicitud de mejoras en las condiciones de orden y aseo de las áreas intervenidas, la recolección de escombros y materiales residuales que permanecían sobre la vía una vez finalizadas las actividades constructivas, la recolección y disposición adecuada de residuos vegetales generados durante las intervenciones, así como la instalación de mallas de protección sobre los sumideros con el fin de evitar el ingreso de sedimentos y otros materiales que pudieran afectar el sistema de drenaje.



Estas acciones fueron comunicadas oportunamente al personal responsable de la obra y objeto de seguimiento hasta la implementación de las medidas correctivas correspondientes, contribuyendo al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al mejoramiento continuo de las condiciones ambientales en los diferentes frentes de intervención.



Durante el seguimiento a las acciones requeridas, se ha identificado que en algunas ocasiones se presentan tiempos adicionales para la ejecución de las actividades correctivas solicitadas, debido a la programación operativa y dinámica propia de los trabajos en obra. No obstante, desde la gestión ambiental se realiza seguimiento permanente, reiterando la importancia de atender oportunamente las observaciones identificadas y verificando la implementación de las medidas requeridas. De esta manera, se busca fortalecer continuamente las condiciones de orden, aseo y manejo ambiental en los diferentes frentes de trabajo, promoviendo la mejora continua durante la ejecución del proyecto.

A continuación, se presentan los registros fotográficos del antes y después de las acciones implementadas, como evidencia de las gestiones realizadas y de la efectividad de las medidas correctivas adoptadas.

Ilustración 52 Otras gestiones ambientales

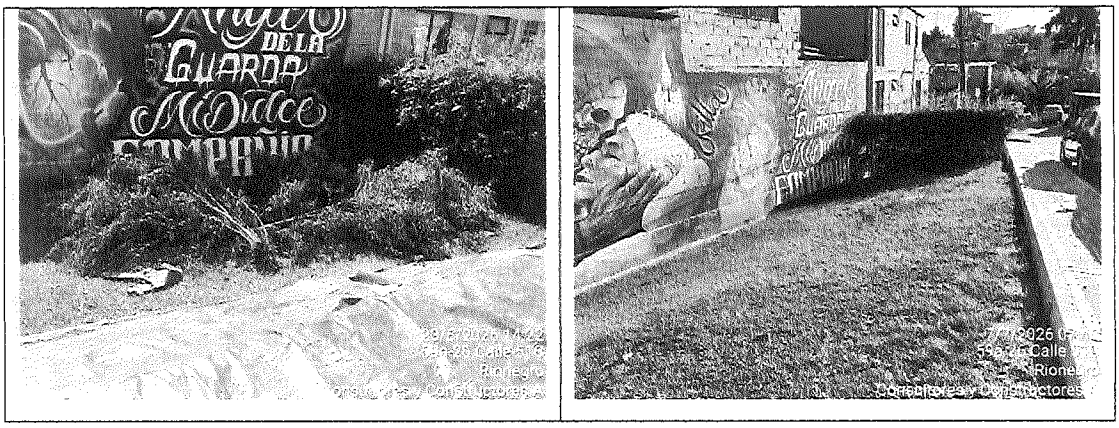

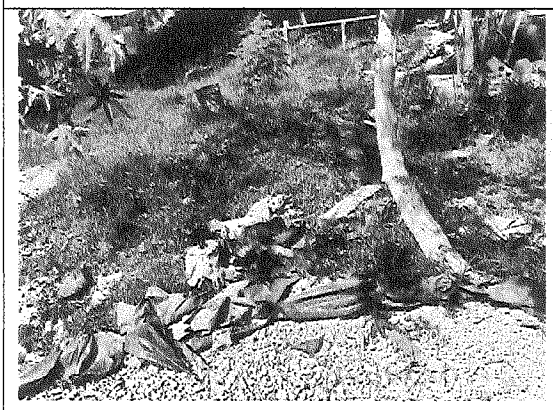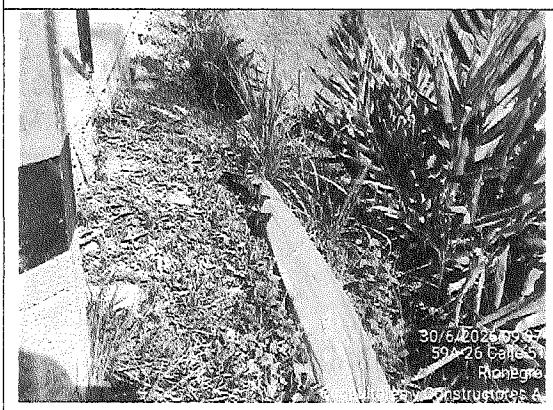Material vegetal en sector casas del mar	Retiro de material vegetal
	
Diferentes tipos de residuos en punto de acopio	Retiro de residuos de punto de acopio
	
Escombros en vía sector quebrada arriba	Retiro de escombros en vía
	

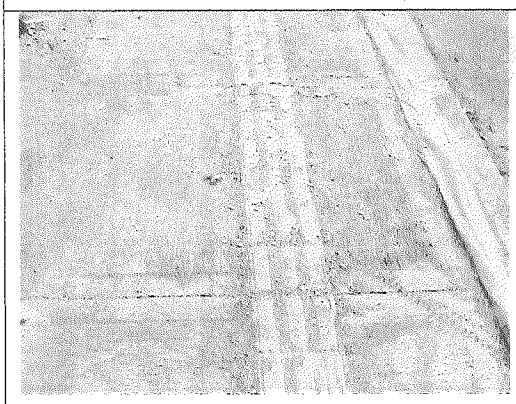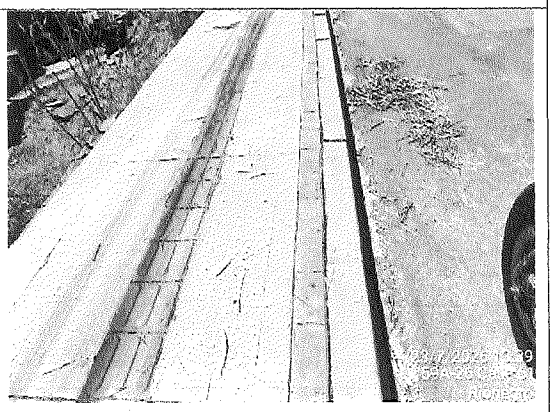Residuos en frentes de obra sector casas del mar	Retiro de residuos en frente de obra
	
Material de obra obstruyendo entrada a viviendas, sector Quebrado Arriba	Restiro de material de obra
	
Material de arrastre en andenes, sector casas del mar	Barrido de material de arrastre

6. SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

6.1. Revisión Seguridad Social

CONTRATISTA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

Tabla 26 Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones

Nombre	Cargo	Dedicación	Salario AU	IBC Cotizado	Mes	N° Planilla	Novedad
Sergio Amaury Durango Zora	Director de obra	100%	$ 6.100.000	$ 6.100.000	Junio - Julio	9507642458	Cumple
Olman Sneyder Rincon Gaviria	Ingeniero Residente	100%	$ 6.000.000	$ 4.400.000	Junio - Julio	9507642458	Ingreso
Jose Raul García Estevez	Auxiliar Civil	100%	$ 3.000.000	$ 3.187.506	Junio - Julio	9507642458	Cumple
Giovany de jesus Rivera Acevedo	Residente SST	100%	$ 3.600.000	$ 3.826.637	Junio - Julio	9507642458	Cumple
Laura Villegas Giraldo	Residente Social	100%	$ 3.600.000	$ 3.600.000	Junio - Julio	9507642458	Cumple
Wilmar Mosquera Castaño	Residente Ambiental	50%	$ 2.500.000	$ 2.500.000	Junio - Julio	9507642458	Cumple

INTERVENTORIA CONSORCIO MYG

Tabla 27 Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones


Nombre	Cargo	Dedicación	Salario AU	IBC Cotizado	Mes	N° Planilla	Novedad
Santiago Guerra Gomez	Director de obra	50%	$ 3.700.000	$ 3.700.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Rodrigo Betancur Correa	Residente Civil	100%	$ 5.200.000	$ 5.200.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Claudia Marcela Muñoz Giraldo	Auxiliar Civil	100%	$ 3.250.000	$ 3.250.000	Julio	1082777616	Afiliaciones
Yasmin Catalina Alvarez Alzate	Auxiliar Civil	100%	$ 3.250.000	$ 3.250.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Darly yohana García Aguirre	Residente SST	100%	$ 4.200.000	$ 4.200.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Elizabeth Cortes Vergara	Auxiliar SST	100%	$ 3.250.000	$ 3.250.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Estefania Correa Civil	Auxiliar SST	100%	$ 3.250.000	$ 3.250.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Luz Adriana Castro Jaramillo	Residente Ambiental	100%	$ 4.200.000	$ 4.200.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE
Mayra Fernanda Henao Moreno	Residente Social	100%	$ 4.200.000	$ 4.200.000	Junio - Julio	1082777616	CUMPLE

6.1.1. Novedades en su personal Ingresos – Retiros del personal de Obra

A lo largo del período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, el proyecto registró el ingreso de 19 trabajadores, en respuesta a las necesidades operativas y de ejecución de las actividades programadas.

En el mismo período se presentaron 11 retiros de personal, distribuidos de la siguiente manera: 1 Ingeniero Residente y 10 Obreros. En consecuencia, el balance del período refleja un incremento neto de 8 trabajadores en la planta de personal del proyecto.

Ilustración 53 Grafica de novedades del personal en el mes

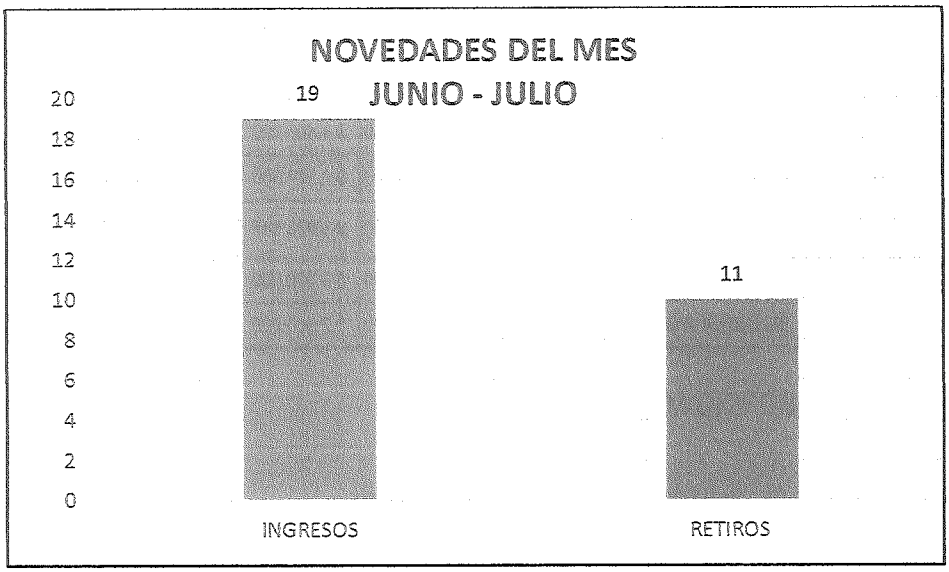

6.2. Consolidado del personal promedio

Tabla 28 Consolidado personal en obra por Genero

AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Personal Contratista Administrativos	5	1	6
Personal contratista mano de obra	35	1	36
TOTAL	40	2	42
Personal interventoría	2	3	5

6.2.1. Distribución del personal de acuerdo con la zona donde habita

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se evidenció que la planta de personal estuvo conformada por 42 colaboradores activos, cuya distribución por lugar de residencia es la siguiente: 22 colaboradores residen en el municipio de Rionegro, 7 en El Santuario, 5 en Guarne, 3 en Marinilla, 3 en Medellín, 1 en Bello y 1 en Itagüí.
Esta distribución evidencia que la mayor concentración del personal se encuentra en el municipio de Rionegro, seguido por El Santuario y Guarne, cumpliendo así con los

lineamientos en responsabilidad social, garantizando que la mano de obra sea de la región de influencia del proyecto.

Tabla 29 Personal de Municipios de Antioquia

Municipio de Antioquia	Cantidad de trabajadores
Bello	1
Guarne	5
Itagüí	1
Marinilla	3
Medellín	3
Rionegro	22
Santuario	7
Total	42

Tabla 30 Personal de otros departamentos

Departamento	Cantidad de trabajadores
Antioquia	42
Otros departamentos	0
Total	42

6.3. Programa de Prevención y Promoción en Salud

Ausentismo por EG (enfermedad general)

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se registraron dos (2) días de ausentismo laboral por enfermedad de origen común (enfermedad general), correspondientes al colaborador José García, quien presentó un cuadro clínico de gastroenteritis. Este evento fue debidamente registrado dentro del indicador de ausentismo por enfermedad

general y no se identificó relación con las actividades laborales desarrolladas ni con factores de riesgo presentes en el entorno de trabajo.

Tabla 31 Registro de Ausentismo por EG

No.	NOMBRE	OFICIO	INCAPACIDAD					# DE DIAS	CODIGO CIE	MES	DIAGNOSTICO
			EG	EL	LM-LP	AC	AT				
1	JOSE RAUL GARCIA	AUXLIAR DE INGENEIRIA	X					2	A083	JULIO	OTRAS ENTERITIS VIRALES

6.3.1. Ausentismo por accidentes laborales

Durante el periodo comprendido del 13 de junio al 23 de julio de 2026, no se presentaron accidentes de trabajo con pérdida de tiempo, en los anexos del presente informe se adjunta el certificado de accidentalidad el periodo analizado; por otra parte, se anexa certificado del periodo anterior del (comprendido del 12 de mayo al 12 de junio) dicho certificado con fecha de emisión del 30 de junio de 2026.

6.4. Plan de Saneamiento Básico

6.4.1. Oficinas y campamentos

Para la ejecución del contrato IPP-006- 2026. Se dispone de una oficina con todos los equipos de oficina (computadores. Impresoras, escáner)

Ilustración 54 Oficinas




Foto 1: Oficinas Administrativas

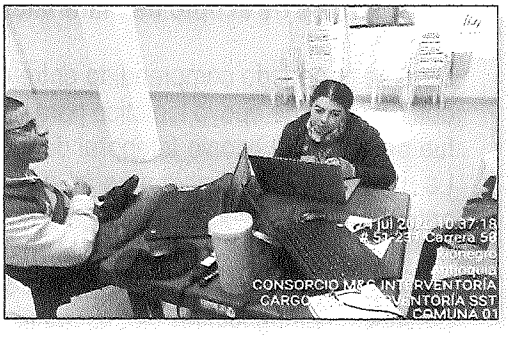


Foto 2: Oficina interventoría

6.4.2. Unidades sanitarias para el personal de obra y personal administrativo

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se garantizó la disponibilidad de servicios sanitarios para la totalidad del personal vinculado al proyecto, de acuerdo con la ubicación de sus actividades laborales. Para el personal administrativo, se dispuso de las unidades sanitarias ubicadas en la oficina administrativa, localizada en la Carrera 52 # 56-129, barrio Laureles. Por su parte, el personal operativo contó con un baño portátil, estratégicamente instalado en el área de intervención del proyecto, específicamente en la cancha sintética del barrio Quebrada Arriba, asegurando el acceso a instalaciones sanitarias en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y disponibilidad durante la ejecución de las actividades.

Ilustración 55 Unidades sanitarias



Foto 3: Baño Oficina administrativa

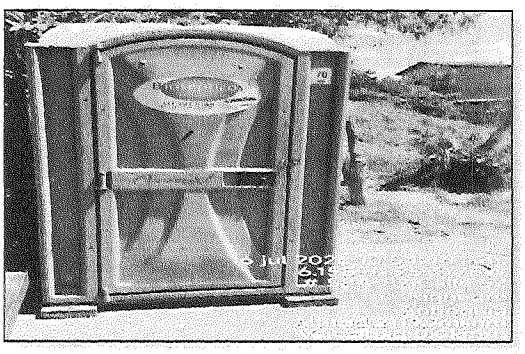
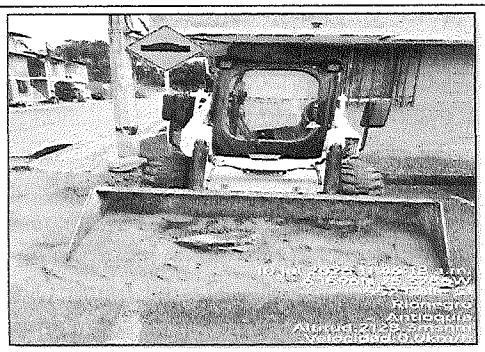


Foto 4: baño personal operativo

6.4.3. Puntos de acopio de materiales y herramientas

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se dispusieron dos (2) áreas de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades del proyecto. La primera fue destinada al acopio temporal de materiales, ubicada en el predio autorizado para tal fin. La segunda correspondió a un área para el almacenamiento y resguardo de herramientas y equipos menores, localizada en la vivienda situada en la calle 51D # 60-15 en el barrio casas del mar. Estas áreas fueron habilitadas con el propósito de garantizar una adecuada organización, conservación y control de los recursos utilizados durante la ejecución del proyecto, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras y ordenadas en las operaciones.


Ilustración 56 Puntos de acopio

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 5: Acopio herramientas</td><td>Foto 6: Acopio maquinaria</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 7. Acopio temporal</td><td>Foto 8. Acopio temporal de material</td></tr>
</table>

6.4.4. Zona de hidratación

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se garantizó el suministro periódico de hidratación al personal operativo mediante la entrega de agua potable en bolsa durante la jornada laboral. Esta medida fue implementada con el fin de promover una adecuada hidratación de los trabajadores, contribuir a la prevención de la fatiga térmica y minimizar los riesgos asociados a la exposición a condiciones ambientales propias de las actividades desarrolladas en campo, favoreciendo el bienestar y la protección de la salud de los colaboradores.

Ilustración 57 Zona de hidratación
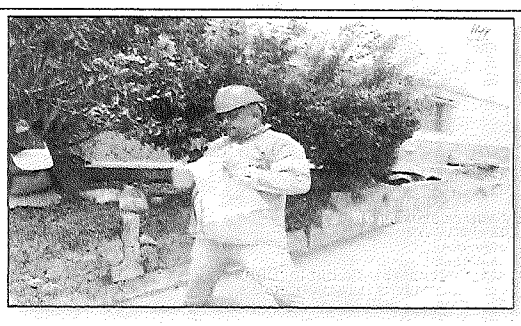
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 9: Suministro de hidratación</td><td>Foto 10: Suministro de hidratación</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 11: Se verifica el suministro y disponibilidad de agua potable para el personal.</td><td>Foto 12: Se constata el acceso a agua potable para el personal que desarrolla actividades en el frente de obra durante la jornada laboral.</td></tr>
</table>

6.4.5. Recolección de residuos

La recolección y disposición final de los residuos ordinarios es realizada por la empresa VERDE LIMPIO, de acuerdo con las frecuencias establecidas para el sector, el horario habitual de recolección se realiza después de las 6:00 PM. los jueves y sábados, por lo que no se tiene registro fotográfico de la recolección.

Ilustración 58 Recolección de residuos



Foto 13: Puntos ecológicos

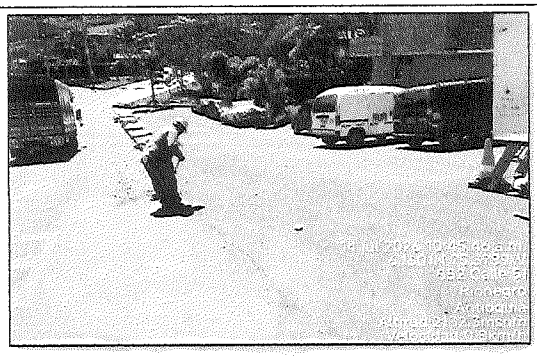


Foto 14: Orden y aseo

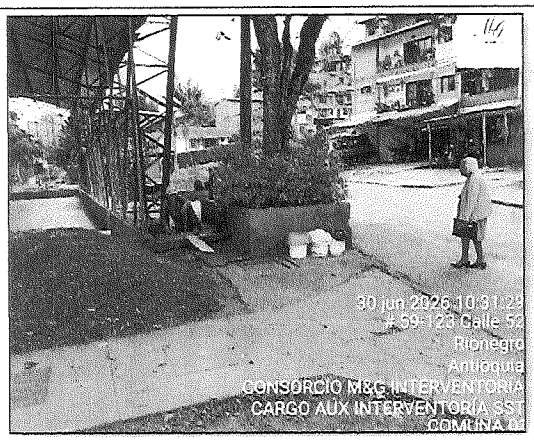


Foto 15: Puntos ecológico



Foto 16: Orden y aseo





6.5. Inspección de maquinaria y equipos

Para el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se ejecutaron inspecciones preoperacionales a los diferentes equipos empleados en la ejecución de la obra, con el propósito de verificar sus condiciones mecánicas, operativas y de seguridad antes de su puesta

en funcionamiento. Estas inspecciones permitieron identificar oportunamente posibles condiciones subestándar, garantizando que los equipos utilizados cumplieran con los requisitos mínimos para una operación segura y contribuyendo a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y fallas operacionales. Entre los equipos inspeccionados se encuentran:

- Minicargador
- Martillo demoledor neumático
- Cortadora de concreto
- Pulidora
- Taladro demoledor eléctrico
- Compactador tipo rana
- Compactador tipo canguro
- concretadora

Ilustración 59 Inspección de maquinaria

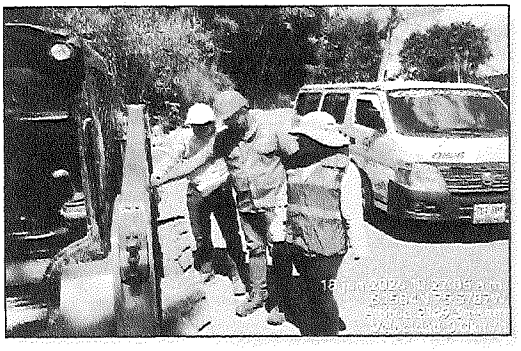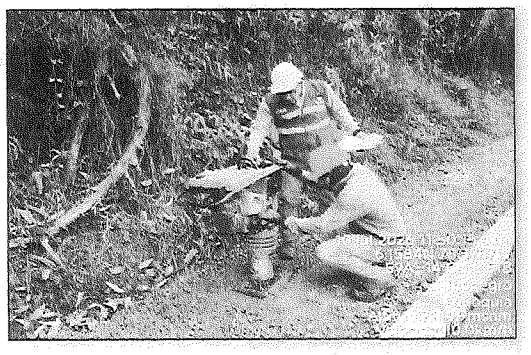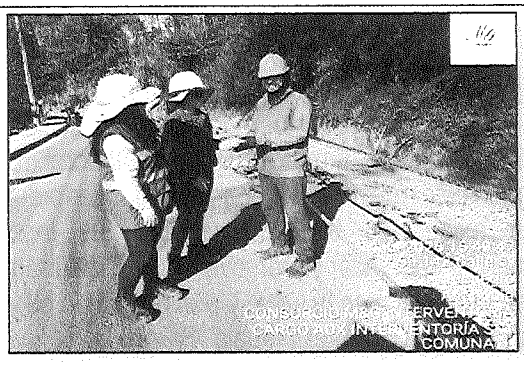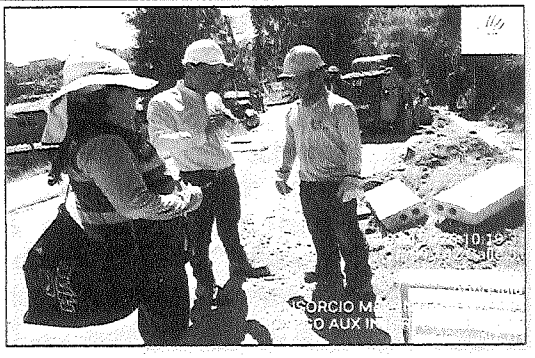
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 17: Inspección de minicargador</td><td>Foto 18: Inspección de compactador tipo canguro</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 19: Verificación entrega de Dotación</td><td>Foto 20: Inspección de EPP</td></tr>
</table>

6.6. Medidas de control

6.6.1. Entrega de elementos de protección personal

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se realizó la entrega inicial y la reposición oportuna de los elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado al proyecto, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad y las necesidades identificadas durante la ejecución de la obra. La reposición se efectuó cuando los elementos presentaban signos de deterioro, pérdida de sus características de protección o cuando habían alcanzado el final de su vida útil, garantizando que los trabajadores contaran permanentemente con EPP en condiciones óptimas de funcionamiento y desempeño, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ilustración 60 Entrega de elementos de protección personal
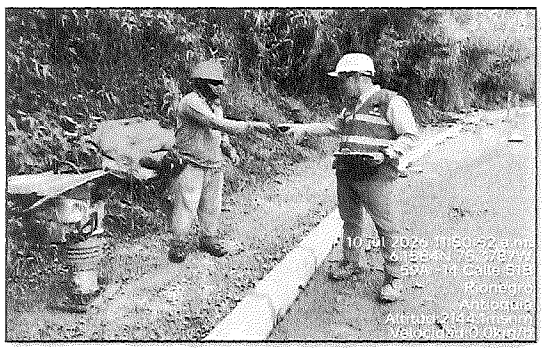
<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>Foto 17: Reposición EPP</td>
<td>Foto 14: Reposición EPP</td>
</tr>
</table>

6.6.2. Pausas Activas

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se implementó el programa de pausas activas dirigido al personal vinculado al proyecto, mediante la ejecución de ejercicios de movilidad, estiramiento y relajación muscular durante la jornada laboral. Esta actividad tuvo como objetivo disminuir la fatiga física, prevenir la aparición de desórdenes musculoesqueléticos (DME) asociados a las exigencias biomecánicas de las labores desempeñadas, favorecer la recuperación funcional del trabajador y promover hábitos saludables, contribuyendo al fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ilustración 61 Pausas activas

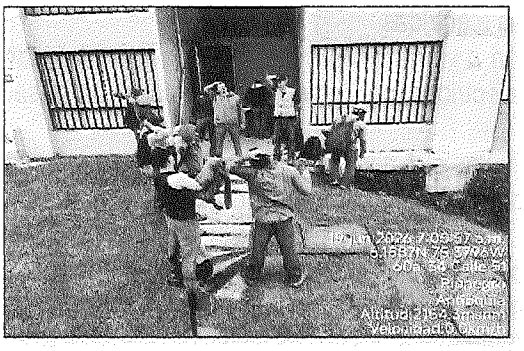


Foto 15: Pausas activa

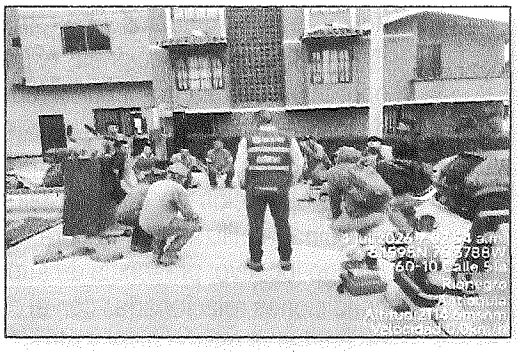


Foto 16: Calentamiento previo

6.7. SG – SST Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un componente fundamental para la ejecución segura y eficiente de las actividades del proyecto, orientada a la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos presentes en el entorno laboral. Su adecuada implementación contribuye a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promoviendo condiciones seguras para el desarrollo de las actividades y el bienestar de los trabajadores.

6.7.1. Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se llevó a cabo la identificación, evaluación y seguimiento de los peligros y factores de riesgo asociados a las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto, con el propósito de implementar medidas de intervención orientadas a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Como resultado de la evaluación realizada, se identificaron como riesgos prioritarios los siguientes:

- Condiciones de seguridad – Riesgo de tránsito: exposición a eventos asociados con colisiones, atropellamientos y demás incidentes derivados de la circulación de vehículos y maquinaria en las zonas de intervención.
- Riesgo biomecánico: manipulación manual de cargas, adopción de posturas forzadas y realización de sobreesfuerzos durante la ejecución de las actividades operativas.

- Condiciones de seguridad – Riesgo mecánico: exposición a atrapamientos, cortes, golpes y proyección de partículas durante la operación y manipulación de equipos, herramientas manuales y herramientas eléctricas.
- Riesgo físico – Vibraciones: exposición a vibraciones mano-brazo generadas por la operación de taladros neumáticos y eléctricos, con potencial afectación de la salud de los trabajadores.
- Riesgo físico – Ruido: exposición a niveles elevados de presión sonora ocasionados por la operación de equipos tales como compresores, pulidoras, taladros y demás maquinaria utilizada en la obra.
- Riesgo locativo: presencia de superficies irregulares, terrenos húmedos, desniveles y condiciones relacionadas con el orden y aseo que podrían incrementar la probabilidad de caídas al mismo nivel y otros incidentes.

Con el fin de controlar los riesgos identificados y reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados, se implementaron las siguientes medidas de intervención, de conformidad con la jerarquía de controles establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

- Socialización de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) previo al inicio de las actividades.
- Asignación de personal competente y debidamente capacitado para la operación de maquinaria, equipos y herramientas.
- Ejecución de inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas, incluyendo minicargador, compresor, cortadora de concreto, taladro demoledor y tronzadora, verificando su estado de funcionamiento y condiciones de seguridad.
- Implementación de señalización preventiva, delimitación y demarcación de las áreas de trabajo para el control de accesos y la mitigación de riesgos.
- Suministro, uso y seguimiento al estado de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con los peligros identificados y las actividades ejecutadas.
- Desarrollo de jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal sobre identificación de peligros, valoración de riesgos y adopción de comportamientos seguros durante la ejecución de las labores.

Las medidas implementadas permitieron fortalecer los controles operacionales del proyecto, promoviendo condiciones de trabajo seguras y contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientados a la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores.

6.8. Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción

Los estándares, procedimientos de trabajo seguro y procesos de inducción, reinducción y capacitación constituyen herramientas esenciales para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Su aplicación sistemática permite estandarizar la ejecución de las actividades, establecer controles operacionales frente a los peligros identificados y garantizar que los trabajadores desarrollen sus labores conforme a los requisitos técnicos, legales y organizacionales establecidos.

Asimismo, estos mecanismos contribuyen al fortalecimiento de las competencias técnicas y comportamentales del personal, promoviendo la apropiación de prácticas seguras, el cumplimiento de los procedimientos definidos y el desarrollo de una cultura preventiva basada en el autocuidado, la identificación temprana de peligros y la gestión del riesgo. En consecuencia, su implementación favorece la reducción de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, contribuyendo a la mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo y al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

Para la ejecución de las actividades se tienen implementados los instructivos de operación de los siguientes equipos o maquinaria _

- Instructivo de operación de martillo eléctrico
- Instructivo de operación de mezcladora de concreto
- Instructivo de operación de planta eléctrica
- Instructivo de operación de cortadora de pavimento
- Instructivo de operación de compactador tipo rana
- Instructivo de operación compactador tipo canguro

6.9. Programa de inducción y capacitación

La empresa tiene establecido un programa de inducción y reinducción, el cual tiene como objetivo dar a conocer al personal aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, tales como: políticas, objetivos SST. Riesgos inherentes a las actividades, aspectos e impactos ambientales, dotación y elementos de protección personal, reglamentos, comités, brigadas de emergencias.

6.9.1. Inducción

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se llevó a cabo el proceso de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la totalidad de los diecinueve (19) colaboradores que ingresaron al proyecto. Este proceso tuvo como finalidad garantizar que el personal adquiriera los conocimientos necesarios sobre las políticas,

normas, procedimientos, peligros, riesgos y medidas de control aplicables a las actividades a desarrollar, así como las responsabilidades individuales en materia de prevención.

Tabla 32 Registro de personal con inducción

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA DE INDUCCION
1	Valentinca cebalos	1001812767	16/07/2026
2	Luis Alberto urieles	85470665	11/05/2026
3	Carlos Mario Cardona	15443450	22/06/2026
4	Edilberto Jose Gonzalez Aphusana	17827895	9/06/2026
5	Enzo Bracho Gonzalez	1124510292	22/06/2026
6	Esteban Manuel Silva	1124510292	22/06/2026
7	Jose Gregorio Moreno Chirinos	1124510292	22/06/2026
8	Osvaldo Enrique Manjarrez	92028745	22/06/2026
9	Santiago Andres Licona Garcia	1064791736	22/06/2026
10	Yorlin Chiripua Olea	1193038927	22/06/2026
11	Jesus Miguel Hernandez Jimenez	1052960921	23/06/2026
12	Andres Antonio Urariyu Urariyu	1124498718	1/07/2026
13	Arturo Hector Gonsalez Uriana	5297984	1/07/2026
14	Deiny Gonzalez Urariyu	1147943895	1/07/2026
15	Elio Jose Paz Jusayu	1124029064	1/07/2026
16	Luis Miguel Avila Suarez	59092275	1/07/2026
17	Jose Antonio Oropeza	699546	1/07/2026
18	Kenedy Efren Sanoja Garrido	1130536	1/07/2026
19	Omar Jose Garcia De La Hoz	1082951609	1/07/2026

Ilustración 62 Inducciones



Foto 17: inducción al personal subcontratista

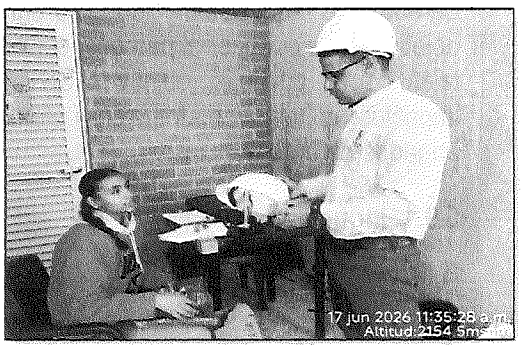


Foto 18: inducción inspectora SST

6.9.2. Capacitación y entrenamiento

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se ejecutó el Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), desarrollando actividades de formación y sensibilización dirigidas al personal del proyecto, con el propósito de fortalecer sus competencias en materia de prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y promoción de comportamientos seguros durante la ejecución de las actividades. En el marco de este plan, se impartieron las siguientes capacitaciones:

- **Manejo Integral de Residuos Sólidos**, orientada a fortalecer las buenas prácticas para la clasificación, almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos generados durante la ejecución del proyecto.
- **Uso, cuidado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP)**, enfatizando la selección, utilización, inspección y conservación de los equipos de protección de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad.
- **Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para la clasificación y etiquetado de productos químicos**, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la identificación de peligros, interpretación de pictogramas, hojas de datos de seguridad y medidas de prevención para el manejo seguro de sustancias químicas.
- **Actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas y conductores)**, enfocada en el reconocimiento de los diferentes usuarios de la vía, sus derechos, deberes y la adopción de conductas preventivas para la reducción del riesgo de accidentes de tránsito.
- **Señalización vial y normas de tránsito**, orientada a reforzar el conocimiento de la señalización reglamentaria, preventiva e informativa, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente en materia de seguridad vial.
- **Conductas seguras de movilidad para motociclistas**, dirigida a fortalecer las competencias relacionadas con la conducción defensiva, la gestión del riesgo vial, la identificación de peligros durante los desplazamientos y la adopción de prácticas seguras para la prevención de siniestros viales.

Estas actividades de capacitación contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de prevención, al desarrollo de competencias técnicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la consolidación de comportamientos seguros, favoreciendo el control de los riesgos prioritarios identificados en el proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el SG-SST.

Ilustración 63 Capacitaciones

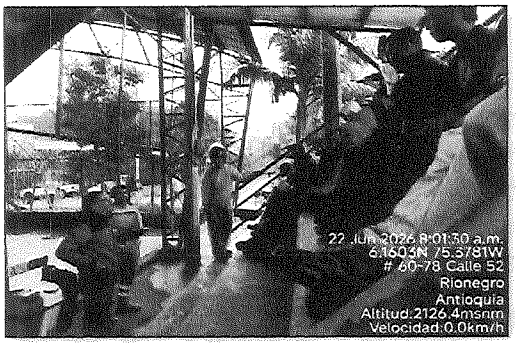


Foto 19: capacitación sistema globalmente armonizado



Foto 20: capacitación manejo integral de residuos solidos



Foto 21: Charlas de seguridad



Foto 22: Charlas de seguridad previas

6.10. Señalización y demarcación

Durante el período evaluado, se realizó la adquisición de sesenta (60) balizas de señalización y siete (7) señales transitorias móviles, con el propósito de fortalecer las medidas de control relacionadas con la señalización, demarcación y gestión de la seguridad vial en las áreas de intervención del proyecto.

La incorporación de estos dispositivos permitió mejorar la delimitación de las zonas de trabajo, controlar el acceso a áreas con presencia de peligros y facilitar la canalización segura del tránsito peatonal en los sectores intervenidos. Asimismo, estas medidas contribuyeron a incrementar la visibilidad de las actividades ejecutadas, reducir la exposición de trabajadores y terceros a riesgos asociados con la circulación de personas y vehículos, y fortalecer el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial **(PESV)**, el **Plan** de Manejo de Tránsito (PMT) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ilustración 64 Señalización y demarcación

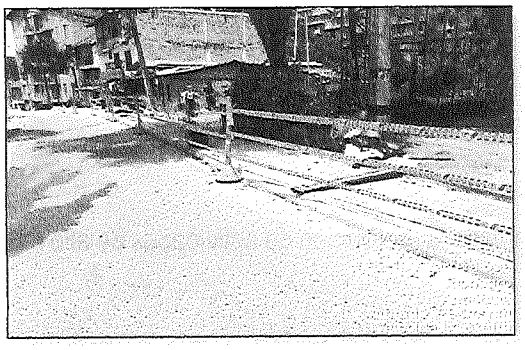


Foto 23: señalización y demarcaron de áreas

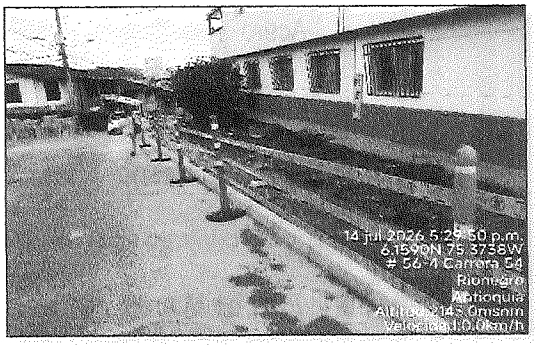


Foto 24: demarcación de áreas de trabajo

6.11. Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

Para el periodo entre el 13 de junio al 23 de julio de 2026. se utilizaron los materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas descritas en la tabla

Tabla 33 6.11. Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

Proceso	Materiales	Equipos	Herramientas	Sustancias Químicas
Construcción de andenes	Base granular	Cortadora de concreto	Pala	Acpm
	Triturado para concretos	Planta eléctrica a gasolina	Picas	Gasolina
	Arena	Minicargador	Barras	Cemento
	Ladrillos	Tronzadora	Almadana	
	Bordillos	Vibrador de concreto	Palustres	
	Losetas	Compactador tipo rana	Llanas	

Adoquin Pulidora

Acero

6.12. Tareas de alto riesgo

Durante la ejecución del contrato no se tiene estipulado la realización de actividades de alto riesgo.

6.13. PMT: Plan de Manejo de Transito

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se implementaron medidas de control orientadas a la gestión del riesgo en las zonas de intervención, mediante la instalación de senderos peatonales temporales, la ubicación de señalización preventiva y la demarcación de las áreas de trabajo donde se desarrollaron las actividades operativas.
La instalación del sendero peatonal tuvo como finalidad garantizar el tránsito seguro de peatones y demás usuarios de la vía, segregando los flujos de circulación respecto de las áreas de ejecución de la obra y minimizando la exposición a los peligros derivados de las actividades constructivas.
De manera complementaria, se realizó la instalación de señalización preventiva y la delimitación física de las zonas de trabajo, conforme a las condiciones operativas del proyecto y a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas medidas permitieron advertir oportunamente sobre la presencia de riesgos, restringir el acceso a áreas de peligro, orientar la circulación de peatones y vehículos, y fortalecer los controles operacionales para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y eventos que pudieran afectar a trabajadores, contratistas y comunidad en general.

Ilustración 65 PMT



Foto 27: instalación de señalización informativa- sector quebrada arriba	**Foto 28:** instalación de sendero peatonal- sector quebrada arriba
	
Foto 29: Señalización informativa – sector laureles	**Foto 30:** Señal informativa- sector quebrada laureles



6.14. Plan de prevención, preparación y atención de emergencias

Durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 23 de julio de 2026, se garantizó la disponibilidad de equipos y recursos para la atención inicial de emergencias en el área de ejecución del proyecto, mediante la ubicación estratégica de un botiquín de primeros auxilios, un extintor portátil y un kit para el control de derrames, instalados en el sector [indicar ubicación].

La disposición de estos recursos tuvo como finalidad fortalecer la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia, permitiendo la atención oportuna de lesiones, el control inicial de conatos de incendio y la contención inmediata de derrames de sustancias potencialmente contaminantes, con el fin de minimizar sus impactos sobre la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente.

La ubicación de estos equipos fue definida de acuerdo con las características operativas del frente de trabajo, garantizando su accesibilidad, visibilidad y disponibilidad permanente durante la ejecución de las actividades, en concordancia con el Plan de Atención de Emergencias y los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ilustración 66 Inspeccion de suministros para prevención, preparación y atención de emergencias
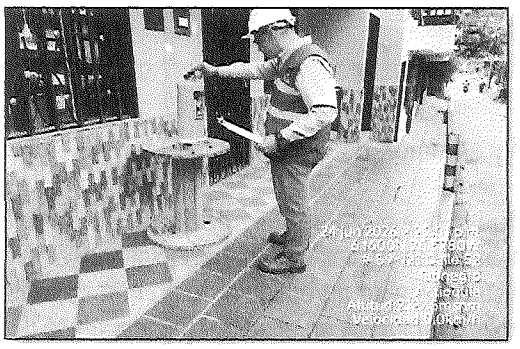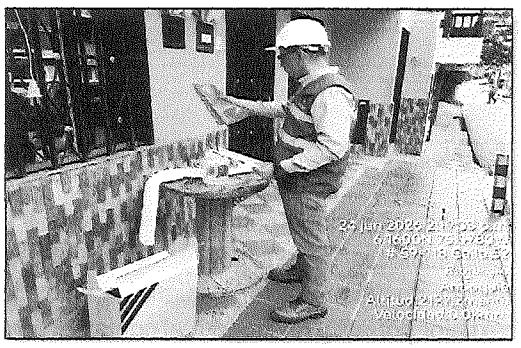
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 31: Inspección de botiquín</td><td>Foto 32: Inspección de camilla</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Foto 33: Inspección de extintor</td><td>Foto 34: Inspección Kit de derrames.</td></tr>
</table>

6.14.1. Conclusiones y recomendaciones

Durante el período evaluado se evidenció una gestión favorable por parte del contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, reflejada en la implementación de pausas activas, entrega y reposición de EPP, ejecución de capacitaciones, aplicación de medidas de señalización y delimitación, así como la disponibilidad de recursos para la atención de emergencias. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las medidas preventivas y a la generación de condiciones de trabajo seguras.

Se evidenció la implementación de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), acompañada de actividades de capacitación y socialización en materia de seguridad vial. La disposición de señalización, demarcación y elementos de control en los frentes de obra permite mitigar los riesgos asociados a la interacción entre trabajadores, peatones y vehículos, por lo que se considera importante mantener el seguimiento continuo de estas medidas durante la ejecución del proyecto.

Durante el período evaluado se evidenció una evolución favorable en la gestión documental y preventiva del contratista, con avances en el seguimiento de los requerimientos y en la implementación de controles en campo. Como parte del proceso de mejora continua, se continuará fortaleciendo la actualización de la Matriz IPVR, la identificación de los riesgos específicos en los ATS y la socialización del Plan de Emergencias, con el propósito de consolidar la articulación entre la planificación, la documentación y las condiciones reales de trabajo.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Tabla 34. Cuadro pagos realizados (% ejecutado)

Descripción	Recursos Iniciales	Adición N°1	Valores totales
Costo Directo	2.726.004.862	NA	2.726.004.862
Administración [25.14%]	685.298.041	NA	685.298.041
Utilidad [5%]	136.300.243	NA	136.300.243
Total Contrato:	3.547.603.146	NA	3.547.603.146
Anticipo [10%]	354.760.314,60	NA	354.760.314,60
Vr. Acta de pago #1	533.638.321	NA	533.638.321
Amortización #1	354.760.314,60	NA	354.760.314,60
Vr. Neto a pagar en Acta de pago #1	178.878.006.40	NA	178.878.006.40
Pagos Total:	533.638.321	NA	533.638.321
% Cobrado	15.04%	NA	14.32%
Pendiente Por Cobrar:	3.013.964.825	NA	3.013.964.825
% Pendiente por cobrar	84.96%	NA	84.96%

Control anticipo (amortizado – gastado)

El anticipo recibido, ha sido gastado en anticipos a proveedores de Bordillo, loseta, base granular, concreto y subcontratista de mano de obra. A continuación, se relaciona el nombre de los proveedores y el subcontratista, para los soportes de las consignaciones realizadas, (Ver anexo No 3).

Tabla 35. Relación gastos anticipo

Anticipo a contratista		
Consultores y constructores SAS	**$**	**354.760.314,60**
Gastado en Anticipo a proveedores y subcontratista		
Prefabricados J&A	$	70.000.000,00
IDC Pavimentos	$	120.000.000,00
Comprecolor	$	30.688.125,00
Ingeniería y Construcciones MJM	$	148.005.500,00
Total gastado	**$**	**368.693.625.00**

Pólizas

Tabla 36. Póliza de Cumplimiento

CONCEPTO	Vigencia		Vr. Asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento.	11/05/26	10/02/27	354.760.314.60
Buen manejo del anticipo.	11/05/26	10/02/27	354.760.314.60
Prestaciones sociales	11/05/26	11/08/29	354.760.314.60
Estabilidad de la obra	11/08/26	11/08/31	354.760.314.60

Tabla 37. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual

CONCEPTO	Vigencia		Vr. Asegurado
	Desde	Hasta	
Predios Labores y Operaciones	11/05/26	11/08/26	525.271.500.00
Responsabilidad Civil Patronal	11/05/26	11/08/26	525.271.500.00
Contratistas y Subcontratistas	11/05/26	11/08/26	525.271.500.00
Vehículos propios y no propios	11/05/26	11/08/26	525.271.500.00

Conclusiones

- Durante el período reportado, se ejecutaron las actividades programadas para la construcción de los andenes peatonales, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, planos, normas aplicables y demás documentos contractuales. Las actividades desarrolladas fueron objeto del correspondiente seguimiento por parte de la supervisión e interventoría, verificando la calidad de los procesos constructivos ejecutados.

- El avance físico alcanzado durante el periodo, contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en la reprogramación de obra aprobada, permitiendo la consolidación de la infraestructura peatonal proyectada. Las obras ejecutadas mejoran progresivamente las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para los peatones, en concordancia con el alcance del contrato.

- De acuerdo con las actividades ejecutadas y verificadas durante el período, el proyecto continúa su desarrollo conforme a la programación establecida y a las condiciones técnicas definidas en el contrato.

Recomendaciones

- Continuar con la ejecución de las actividades conforme a la programación de obra aprobada, manteniendo una adecuada coordinación entre el contratista, la interventoría y la supervisión, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y la continuidad de los frentes de trabajo.

- Mantener la implementación de los controles de calidad sobre los materiales, procedimientos constructivos y actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas vigentes y los requisitos contractuales, dejando el correspondiente registro documental de las verificaciones realizadas.

- Continuar fortaleciendo las medidas de manejo de tránsito, señalización temporal, seguridad industrial y protección de los peatones durante la ejecución de las obras, así como realizar el seguimiento permanente a las actividades pendientes, con el propósito de minimizar riesgos, evitar interferencias con la comunidad y asegurar la correcta culminación del proyecto.

CONSORCIO M&G / Empresa de Desarrollo Sostenible	**ACTA DE OBRA N° 1**	Código:	
		Versión:	
		Pagina:	
	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"		

INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**CONTRATO N°**	ODC No 22 DE 2026	**PERIODO DEL ACTA**	11 DE MAYO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**CONTRATO N°**	IP 006-2026	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	11 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**($3.547.603.146)** INCLUYE AIU	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	11 DE AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**				**$ 8.316.552,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (Incluye equipo de precisión debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría.	dia	12,00	$ 693.046,00	$ 8.316.552,00		$ -			-	$ -	0,00%
2	**DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS**				**$ 495.503.357,00**		**$ 88.053.821,00**		**$ -**		**$ 88.053.821,00**	**2,48%**
2,01	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventoría, distancia máxima de 15 km.	m3	533,33	$ 238.570,00	$ 127.237.333,00	119,10	$ 28.413.687,00			119,10	$ 28.413.687,00	0,80%
2,02	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	166,67	$ 163.597,00	$ 27.266.167,00	87,60	$ 14.331.097,00			87,60	$ 14.331.097,00	0,40%
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	3.000,00	$ 70.711,00	$ 212.133.000,00	257,90	$ 18.236.367,00			257,90	$ 18.236.367,00	0,51%
2,04	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	2.000,00	$ 24.480,00	$ 48.960.000,00	1002,70	$ 24.546.096,00			1.002,70	$ 24.546.096,00	0,69%
2,05	RETIRO DE SEÑALES VIALES. Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	un	15,00	$ 42.786,00	$ 641.790,00		$ -			-	$ -	0,00%
2,06	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS). Debe alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo proctor modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría.	m3	1.066,67	$ 74.311,00	$ 79.265.067,00	34,00	$ 2.526.574,00			34,00	$ 2.526.574,00	0,07%

CONSORCIO M&G	**ACTA DE OBRA N° 1**	Código:	
		Versión:	
		Pagina:	
	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"		

INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**CONTRATO N°**	ODC No 22 DE 2026	**PERIODO DEL ACTA**	11 DE MAYO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**CONTRATO N°**	IP 006-2026	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	11 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**($3.547.603.146)** INCLUYE AIU	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	11 DE AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
3	**ANDENES**				**$ 2.086.736.100,00**		**$ 268.921.665,00**		**$ -**		**$ 268.921.665,00**	**7,58%**
3,01	Suministro e instalación de loseta táctil guía o alerta de 20x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	5.000,00	$ 35.626,00	$ 178.130.000,00	826,00	$ 29.427.076,00			826,00	$ 29.427.076,00	0,83%
3,02	Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR tipo INVIAS, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, previa autorización de la interventoría , para parcheos de máximo 25 m2 de área superficial.	m3	1.575,00	$ 284.588,00	$ 448.226.100,00	204,60	$ 58.226.705,00			204,60	$ 58.226.705,00	1,64%
3,03	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR) 15x45x80 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	5.000,00	$ 104.213,00	$ 521.065.000,00	947,90	$ 98.783.503,00			947,90	$ 98.783.503,00	2,78%
3,04	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de polluretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	7.500,00	$ 125.242,00	$ 939.315.000,00	658,60	$ 82.484.381,00			658,60	$ 82.484.381,00	2,33%
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 135.448.853,00**		**$ 409.657,00**		**$ -**		**$ 409.657,00**	**0,01%**
6,36	Realce de MH hasta 15 cm. Incluye tapa y cuello nuevos en concreto, demolición de pavimento, suministro, transporte e instalación, excavación, descargue y transportes internos hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye transporte y botada de escombros.	un	30,00	$ 1.157.432	$ 34.722.960,00		$ -			-	$ -	0,00%

CONSORCIO M&G / Empresa de Desarrollo Sostenible	**ACTA DE OBRA N° 1**	Código:	
		Versión:	
		Pagina:	
	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"		

INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**CONTRATO N°**	ODC No 22 DE 2026	**PERIODO DEL ACTA**	11 DE MAYO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**CONTRATO N°**	IP 006-2026	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	11 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**($3.547.603.146)** INCLUYE AIU	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	11 DE AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
6,37	Suministro e instalación de tapa para caja de contador de agua, fabricada en madera plástica de alta resistencia, con dimensiones adecuadas para la caja existente. La tapa deberá contar con bisagra y sistema de cierre seguro para facilitar el acceso al medidor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	120,00	$ 384.208	$ 46.104.960,00		$ -			-	$ -	0,00%
6,38	Demolición de la tapa de concreto existente, incluye herraje metálico y construcción de una nueva tapa de concreto reforzado con una resistencia de 21 MPa, garantizando su adecuado ajuste y funcionalidad. Se incluyen actividades de preparación de superficie, limpieza y tratamiento del herraje, vaciado del concreto, curado y acabado final.	m2	133,33	$ 409.657	$ 54.620.933,00	1,00	$ 409.657,00			1,00	$ 409.657,00	0,01%
OE	**OBRAS EXTRAS**						**$ 52.666.545,00**				**$ 52.666.545,00**	
OE-1	Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"	m		$ 27.500		18,00	$ 495.000,00			18,00	$ 495.000,00	0,01%
OE-2	Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2" cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m2		$ 285.357		76,10	$ 21.715.668,00			76,10	$ 21.715.668,00	0,61%
OE-3	Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und		$ 144.634		7,00	$ 1.012.438,00			7,00	$ 1.012.438,00	0,03%
OE-4	Fabricación, instalación y posterior retiro de estructuras provisionales tipo pasarela o rampa de madera destinadas a garantizar el acceso peatonal a las viviendas afectadas por las excavaciones y/o demoliciones. El ítem incluye el recubrimiento superior con tapete antideslizante, fijaciones seguras para evitar tropiezos, pasamanos de protección si se requieren por altura y el mantenimiento continuo durante el tiempo que dure la interferencia de la obra frente al predio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		$ 100.000			$ -			-	$ -	0,00%

ACTA DE OBRA N° 1

Código:	
Versión:	
Pagina:	

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"

INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**CONTRATO N°**	ODC No 22 DE 2026	**PERIODO DEL ACTA**	11 DE MAYO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**CONTRATO N°**	IP 006-2026	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	11 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	($3.547.603.146) INCLUYE AIU	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	11 DE AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
OE-5	Suministro e instalación de adoquín demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación	m		$ 34.956		842,30	$ 29.443.439,00			842,30	$ 29.443.439,00	0,83%
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 2.726.004.862,00**		**$ 410.051.688,00**		**$ 0,00**		**$ 410.051.688,00**	**11,56%**
	ADMINISTRACION			25,14%	$ 685.298.041,00		$ 103.084.049,00				$ 103.084.049,00	2,91%
	IMPREVISTOS			0,00%	$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00	
	UTILIDAD			5,00%	$ 136.300.243,00		$ 20.502.584,00				$ 20.502.584,00	0,58%
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 821.598.284,00**		**$ 123.586.633,00**				**$ 123.586.633,00**	**3,48%**
	VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 3.547.603.146,00**		**$ 533.638.321,00**				**$ 533.638.321,00**	**15,04%**

V/R INICIAL CONTRATO: $ 3.547.603.146,00
V/R ADICIONES: $ -
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 3.547.603.146,00

V/R ANTICIPO $ 354.760.314,60
% ANTICIPO : 10%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 533.638.321,00 **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS

No	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	PENDIENTE POR COBRAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	11/05/26 - 25/07/26	$ 533.638.321,00	15,04%	$ 354.760.314,60	$ 178.878.006,40	$ 3.013.964.825,00	15,04%
TOTAL			**$ 533.638.321,00**	**15,04%**	**$ 354.760.314,60**	**$ 178.878.006,40**	**$ 3.013.964.825,00**	**15,04%**

Nota:
El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exima al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al decimo por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando al entero por exceso o por defecto.

Firma
Nombre: **FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista: **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS**
Cedula de Ciudadania N°: **98.504.713**

Firma
Nombre: **MARIANA LONDOÑO BETANCURT**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **CONSORCIO M&G**
Cedula de Ciudadania N°: **1.018.228.426**

Firma
Nombre: **SERGIO AMAURY DURANGO ZORA**
Director de Obra
Contratista: **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS**
Cedula de Ciudadania N°: **98.505.041**

Firma
Nombre: **SANTIAGO GUERRA GÓMEZ**
Drector de Interventoria
Interventoría: **CONSORCIO M&G**
Cedula de Ciudadania N°: **1.152.688.859**

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**NIT**	902059165 - 3	**CONTRATO DE OBRA N°**	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**NIT**	900339866 - 2	**PLAZO INICIAL**	3 (Tres) Meses

FECHA	**DD**	25	**MM**	7	**AA**	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, distancia máxima de 15 km.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	**SUB CAPÍTULO**		**ITEM**	2,01	**UNID**	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



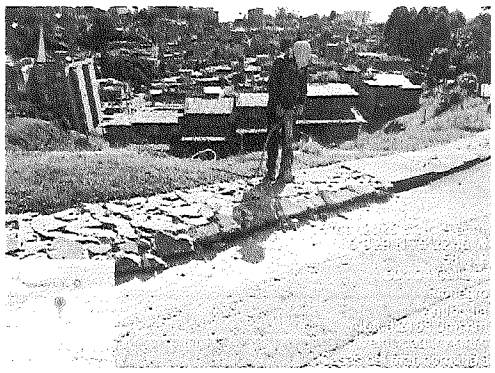

Actividad / Ubicación	**Carril**	**Distancia**	**Ancho**	**Altura**	**Área total**	**CANTIDAD**	**Medida Parcial**
Calle 51 - Losa anden existente	Izquierdo	36,20	0,95	0,20	0,19	1,00	6,90
Carrera 59A - Losa anden existente	Izquierdo	190,05	0,95	0,20	0,19	1,00	36,10
Carrera 59A - Losa anden existente	Derecho	56,06	0,95	0,25	0,24	1,00	13,30
Carrera 59A - Demolición cuneta existente	Derecho	107,40	0,86	0,17	0,15	1,00	15,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente	Izquierdo	39,10	0,95	0,20	0,19	1,00	7,40
Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente	Derecho	44,50	0,95	0,20	0,19	1,00	8,50
Calle 51C - Losa anden existente	Derecho	21,35	0,80	0,20	0,16	1,00	3,40
Calle 51C - Losa anden existente	Derecho	6,05	0,85	0,20	0,17	1,00	1,00
Calle 51C - Recta	Izquierdo	6,10	1,05	0,25	0,26	1,00	1,60
Calle 51C - Anden Variable	Izquierdo	13,00	1,81	0,25	0,45	1,00	5,90
Calle 51C - Recta	Izquierdo	2,10	1,10	0,25	0,28	1,00	0,60
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,60	0,63	0,27	0,17	1,00	0,10
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,55	0,35	0,27	0,09	1,00	0,10
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,60	0,92	0,30	0,28	1,00	0,20
Calle 51D - Rampa acceso moto	Derecho	1,10	0,90	0,29	0,26	1,00	0,30
Calle 51C - Cuneta existente	Izquierdo	11,48	0,30	0,19	0,06	1,00	0,70
Cra 60A - Anden existente - costado cancha	Derecho	38,00	0,90	0,20	0,18	1,00	6,80
			CASAS DEL MAR			**TOTAL**	**108,60**
CALLE 56- Losa anden existente	Izquierdo	52,70	1,00	0,20	0,20	1,00	10,50
			LAURELES			**TOTAL**	**10,50**
						Subtotal	**119,10**
						Cantidad Acumulada Anterior	0,00
						TOTAL ACUMULADA	**119,10**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,02	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	36,20	0,10	0,10	0,01	1,00	0,40
Carrera 59A	Izquierdo	190,05	0,22	0,17	0,04	1,00	7,10
Carrera 59A - Demolición anden existente	Derecho	56,06	0,55	0,17	0,09	1,00	5,20
Carrera 59A - Junto a cuneta existente	Derecho	107,40	0,67	0,17	0,11	1,00	12,20
Carrera 59A - Despues de cuneta existente	Derecho	27,50	1,40	0,17	0,24	1,00	6,50
Calle 51 D entre 51C y 52	Izquierdo	45,60	0,20	0,10	0,02	1,00	0,90
Calle 51 D entre 51C y 52	Derecho	44,50	0,20	0,10	0,02	1,00	0,90
Cra 60A - Anden existente - costado cancha	Derecho	38,00	0,20	0,15	0,03	1,00	1,10
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**34,30**
Calle 52	Derecho	26,50	1,00	0,17	0,17	1,00	4,50
Calle 52 - Llave contra anden existente	Derecho	26,50	0,40	0,25	0,10	1,00	2,70
Calle 52	Derecho	147,00	1,30	0,17	0,22	1,00	32,50
Calle 52 - Llave contra anden existente	Derecho	147,00	0,20	0,25	0,05	1,00	7,40
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	23,10	1,60	0,15	0,24	1,00	5,50
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**52,60**
Calle 56	Izquierdo	40,00	0,12	0,15	0,02	1,00	0,70
LAURELES						**TOTAL**	**0,70**
Subtotal							**87,60**
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							**87,60**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165-3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,03	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



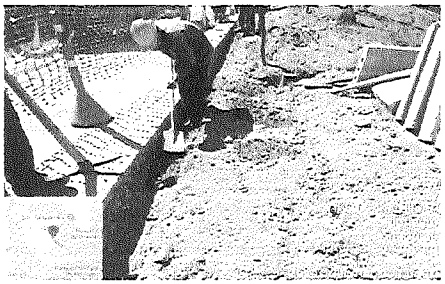



Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Anden	Izquierdo	36,20	1,25	0,15	0,19	1,00	6,80
Calle 51 - Bordillo	Izquierdo	36,20	0,30	0,20	0,06	1,00	2,20
Calle 51 - Doble Bordillo	Izquierdo	33,55	0,30	0,20	0,06	1,00	2,00
Carrera 59A - Anden	Izquierdo	190,05	0,95	0,15	0,14	1,00	27,10
Carrera 59A - Bordillo	Izquierdo	190,05	0,30	0,20	0,06	1,00	11,40
Carrera 59A - Doble Bordillo	Izquierdo	76,55	0,30	0,20	0,06	1,00	4,60
Carrera 59A - Muro 1	Izquierdo	48,60	0,40	0,40	0,16	1,00	7,80
Carrera 59A - Muro 2	Izquierdo	14,90	0,40	0,40	0,16	1,00	2,40
Carrera 59A - Anden	Derecho	187,50	1,55	0,15	0,23	1,00	43,60
Carrera 59A - Bordillo	Derecho	187,50	0,30	0,20	0,06	1,00	11,30
Calle 51D entre 51C y 52 - Anden	Izquierdo	45,30	0,95	0,15	0,14	1,00	6,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo	Izquierdo	45,60	0,30	0,20	0,06	1,00	2,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Doble Bordillo	Izquierdo	6,50	0,30	0,45	0,14	1,00	0,90
Calle 51D entre 51C y 52 - Anden	Derecho	44,50	0,95	0,15	0,14	1,00	6,30
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo	Derecho	44,50	0,30	0,20	0,06	1,00	2,70
Calle 51C - Anden	Derecho	6,05	1,05	0,15	0,16	1,00	1,00
Calle 51C - Anden	Derecho	21,35	1,10	0,15	0,17	1,00	3,50
Calle 51C - Bordillo	Derecho	6,05	0,30	0,20	0,06	1,00	0,40
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10	1,55	0,15	0,23	1,00	1,40
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00	1,86	0,15	0,28	1,00	3,60
Calle 51C - Recta	Izquierdo	2,10	1,30	0,15	0,20	1,00	0,40
Calle 51C - Bordillo	Izquierdo	21,20	0,30	0,20	0,06	1,00	1,30
Cra 60A - Anden	Derecho	38,00	1,41	0,15	0,21	1,00	8,00
Cra 60A - Bordillo	Derecho	38,00	0,30	0,20	0,06	1,00	2,30
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**160,20**
Calle 52 - Anden - cancha	Derecho	26,50	1,40	0,15	0,21	1,00	5,60
Calle 52 - Anden - via	Derecho	99,60	1,55	0,15	0,23	1,00	23,20
Calle 52 - Anden - rebaje	Derecho	47,40	1,55	0,32	0,50	1,00	23,50
Calle 52 - Bordillo	Derecho	173,50	0,30	0,20	0,06	1,00	10,40
Calle 52 - Tuberia Novafort 8"	Derecho	30,00	0,30	0,50	0,15	1,00	4,50
Calle 52 - Caja 80x80 a descole	Derecho	1,10	1,10	1,50	1,65	1,00	1,80
Calle 52 - Cra 59 y 58a - Anden	Derecho	23,10	1,60	0,15	0,24	1,00	5,50
Calle 52 - Cra 59 y 58a - Bordillo	Derecho	23,10	0,30	0,20	0,06	1,00	1,40
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**75,90**
CALLE 56- Anden	Izquierdo	20,70	1,40	0,15	0,21	1,00	4,30
CALLE 56- Anden - rebaje	Izquierdo	32,00	1,40	0,32	0,45	1,00	14,30
CALLE 56- Bordillo	Izquierdo	52,70	0,30	0,20	0,06	1,00	3,20
LAURELES						**TOTAL**	**21,80**
Subtotal							**257,90**
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							**257,90**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses


FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,04	UNID	m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Hacia via	Izquierdo	36,20				1,00	36,20
Calle 51 - Hacia zona verde	Izquierdo	36,20				1,00	36,20
Carrera 59A - Hacia via	Izquierdo	190,05				1,00	190,05
Carrera 59A - Hacia zoma verde	Izquierdo	190,05				1,00	190,05
Carrera 59A - Hacia via	Derecho	56,06				1,00	56,06
Carrera 59A - Hacia zona verde	Derecho	56,06				1,00	56,06
Carrera 59A - Hacia zona verde	Derecho	40,70				1,00	40,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia via	Izquierdo	39,10				1,00	39,10
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia paramento casa	Izquierdo	39,10				1,00	39,10
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia via	Derecho	44,50				1,00	44,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia parameto casa	Derecho	44,50				1,00	44,50
Calle 51C - Hacia zona verde	Derecho	21,35				1,00	21,35
Calle 51C - Hacia parque	Derecho	21,35				1,00	21,35
Calle 51C - Hacia zona verde	Derecho	6,05				1,00	6,05
Cra 60A - Hacia via	Derecho	38,00				1,00	38,00
Cra 60A - Hacia zona verde	Derecho	38,00				1,00	38,00
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**897,27**
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	
Calle 56 - Hacia via	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
Calle 56 - Hacia paramento	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
LAURELES						**TOTAL**	**105,40**
						Subtotal	**1.002,70**
						Cantidad Acumulada Anterior	0,00
						TOTAL ACUMULADA	**1.002,70**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses


FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS). Debe alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo proctor modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,06	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

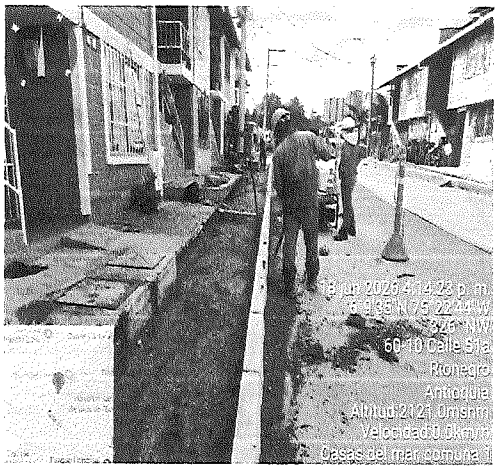

Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Lleno Bordillo via	Izquierdo	36,20	0,15	0,15	0,02	1,00	0,80
Calle 51 - Lleno Bordillo zona verde	Izquierdo	33,55	0,15	0,15	0,02	1,00	0,80
Carrera 59A - Lleno Muro No 1	Izquierdo	48,60	0,40	0,50	0,20	1,00	9,70
Carrera 59A - Lleno Muro No 2	Izquierdo	14,90	0,40	0,50	0,20	1,00	3,00
Carrera 59A - Lleno Bordillo via	Izquierdo	190,05	0,15	0,15	0,02	1,00	4,30
Carrera 59A - Lleno Bordillo zona verde	Izquierdo	76,55	0,15	0,15	0,02	1,00	1,70
Carrera 59A - Lleno Bordillo via	Derecho	187,50	0,15	0,15	0,02	1,00	4,20
Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo via	Izquierdo	51,86	0,15	0,15	0,02	1,00	1,20
Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo zona verde	Izquierdo	6,50	0,15	0,15	0,02	1,00	0,10
Calle 51D entre 51C y 52 - Lleno Bordillo via	Derecho	48,10	0,15	0,15	0,02	1,00	1,10
Calle 51C - Lleno bordillo	Izquierdo	21,20	0,15	0,15	0,02	1,00	0,50
Calle 51C - Lleno bordillo	Derecho	6,05	0,15	0,15	0,02	1,00	0,10
Cra 60A - Lleno Bordillo	Derecho	38,00	0,15	0,15	0,02	1,00	0,90
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**28,40**
Calle 52 - Lleno Bordillo	Derecho	175,00	0,15	0,15	0,02	1,00	3,90
Calle 52 - Cra 59 y 58a - Lleno bordillo	Derecho	23,10	0,15	0,15	0,02	1,00	0,50
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**4,40**
Calle 56 - Lleno Bordillo	Izquierdo	52,70	0,15	0,15	0,02	1,00	1,20
LAURELES						**TOTAL**	**1,20**
Subtotal							**34,00**
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							**34,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de loseta táctil guía o alerta de 20x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación.				
CAPÍTULO	3. ANDENES	SUB CAPÍTULO		ITEM	3,01

UNID: m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	35,00				1,00	35,00
Carrera 59A	Izquierdo	185,25				1,00	185,30
Carrera 59A	Derecho	186,30				1,00	186,30
Calle 51D entre 51C y 52	Izquierdo	45,60				1,00	45,60
Calle 51D entre 51C y 52	Derecho	42,20				1,00	42,20
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10				1,00	6,10
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00				1,00	13,00
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	2,10				1,00	2,10
Calle 51C - Recta	Derecho	26,80				1,00	26,80
Cra 60A	Derecho	38,00				1,00	38,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	580,40
Calle 52	Derecho	172,30				1,00	172,30
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	21,80				1,00	21,80
QUEBRADA ARRIBA						TOTAL	194,10
Calle 56	Izquierdo	51,50				1,00	51,50
LAURELES						TOTAL	51,50
Subtotal							826,00
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							826,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	**NIT**	902059165 - 3	**CONTRATO DE OBRA N°**	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	**NIT**	900339866 - 2	**PLAZO INICIAL**	3 (Tres) Meses


FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR tipo INVIAS, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado, previa autorización de la interventoría , para parcheos de máximo 25 m2 de área superficial.

CAPÍTULO	3. ANDENES	**SUB CAPÍTULO**		**ITEM**	3,02	**UNID**	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

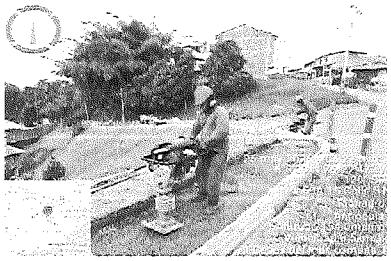



Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	36,20	1,05	0,20	0,21	1,00	7,60
Carrera 59A	Izquierdo	190,05	1,05	0,20	0,21	1,00	39,90
Carrera 59A	Derecho	160,00	1,35	0,20	0,27	1,00	43,20
Carrera 59A	Derecho	27,50	1,25	0,20	0,25	1,00	6,90
Calle 51D entre 51C y 52	Izquierdo	45,60	1,05	0,20	0,21	1,00	9,60
Calle 51D entre 51C y 52	Derecho	44,50	1,05	0,20	0,21	1,00	9,30
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10	1,35	0,20	0,27	1,00	1,60
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00	1,66	0,20	0,33	1,00	4,30
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	2,10	1,10	0,20	0,22	1,00	0,50
Calle 51C - Bahia	Derecho	6,05	1,05	0,20	0,21	1,00	1,30
Calle 51C - Recta	Derecho	21,35	1,10	0,20	0,22	1,00	4,70
Cra 60A	Derecho	38,00	1,21	0,20	0,24	1,00	9,20
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**138,10**
Calle 52	Derecho	26,50	1,21	0,20	0,24	1,00	6,40
Calle 52	Derecho	31,60	1,30	0,20	0,26	1,00	8,20
Calle 52	Derecho	115,40	1,35	0,20	0,27	1,00	31,20
Calle 52 - Relleno tuberia Novafort 8"	Derecho	30,00	0,30	0,40	0,09	1,00	2,70
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	23,10	1,40	0,20	0,25	1,00	5,70
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**54,20**
Calle 56	Izquierdo	30,00	1,17	0,20	0,23	1,00	7,00
Calle 56	Izquierdo	4,10	1,01	0,20	0,20	1,00	0,80
Calle 56	Izquierdo	18,60	1,21	0,20	0,24	1,00	4,50
LAURELES						**TOTAL**	**12,30**
					Subtotal		**204,60**
					Cantidad Acumulada Anterior		0,00
					TOTAL ACUMULADA		**204,60**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR) 15x45x80 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

CAPÍTULO	3. ANDENES	SUB CAPÍTULO		ITEM	3,03	UNID	m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Bordillo via	Izquierdo	36,20				1,00	36,20
Calle 51 - Bordillo zona verde	Izquierdo	33,55				1,00	33,60
Carrera 59A - Bordillo via	Izquierdo	190,05				1,00	190,10
Carrera 59A - Bordillo zona verde	Izquierdo	76,55				1,00	76,60
Carrera 59A - Bordillo via	Derecho	187,50				1,00	187,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo via	Izquierdo	51,86				1,00	51,90
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo zona verde	Izquierdo	6,50				1,00	6,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo via	Derecho	48,10				1,00	48,10
Calle 51C	Izquierdo	21,20				1,00	21,20
Calle 51C	Derecho	6,05				1,00	6,10
Cra 60A	Derecho	38,00				1,00	38,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	695,80
Calle 52	Derecho	175,00				1,00	175,00
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	24,40				1,00	24,40
QUEBRADA ARRIBA						TOTAL	199,40
Calle 56	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
LAURELES						TOTAL	52,70
Subtotal							947,90
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							947,90

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

CAPÍTULO	3. ANDENES	SUB CAPÍTULO		ITEM	3,04	UNID	m2

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	35,00	0,75		26,25	1,00	26,30
Carrera 59A	Izquierdo	186,45	0,75		139,84	1,00	139,80
Carrera 59A	Derecho	158,80	1,05		166,74	1,00	166,70
Carrera 59A	Derecho	27,50	0,95		26,13	1,00	26,10
Calle 51D entre 51C y 52	Izquierdo	44,60	0,75		33,45	1,00	33,50
Calle 51D entre 51C y 52	Derecho	42,20	0,75		31,65	1,00	31,70
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10	1,05		6,41	1,00	6,40
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00	1,36		17,68	1,00	17,70
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	2,10	0,80		1,68	1,00	1,70
Calle 51C - Bahia	Derecho	6,05	0,75		4,54	1,00	4,50
Calle 51C - Recta	Derecho	21,35	0,90		19,22	1,00	19,20
Cra 60A	Derecho	38,00	0,95		36,10	1,00	36,10
CASAS DEL MAR		**581,15**	**m**			**TOTAL**	**509,70**
Calle 52	Derecho	24,10	0,76		18,32	1,00	18,30
Calle 52	Derecho	99,60	0,90		89,64	1,00	89,60
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	21,80	1,10		23,98	1,00	24,00
QUEBRADA ARRIBA		**145,50**	**m**			**TOTAL**	**131,90**
Calle 56	Izquierdo	19,50	0,87		16,97	1,00	17,00
LAURELES		**19,50**	**m**			**TOTAL**	**17,00**
					Subtotal		**658,60**
					Cantidad Acumulada Anterior		0,00
					TOTAL ACUMULADA		**658,60**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses


FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Demolición de la tapa de concreto existente, incluye herraje metálico y construcción de una nueva tapa de concreto reforzado con una resistencia de 21 MPa, garantizando su adecuado ajuste y funcionalidad. Se incluyen actividades de preparación de superficie, limpieza y tratamiento del herraje, vaciado del concreto, curado y acabado final.

CAPÍTULO	3. ANDENES	SUB CAPÍTULO		ITEM	6,38	UNID	m2

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Caja electrica existente	Izquierdo	0,40	1,20		0,48	2,00	1,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	1,00
Subtotal							1,00
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							1,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA


DESCRIPCIÓN	Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"

CAPÍTULO	OBRAS EXTRAS	SUB CAPÍTULO		ITEM			OE-1		UNID	m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
calle 52 # 59-115	Derecho	11,60				1,00	11,60
QUEBRADA ARRIBA						TOTAL	11,60
calle 56 # 52-31	Izquierdo	2,90				1,00	2,90
calle 56 # 52-41	Izquierdo	3,50				1,00	3,50
LAURELES						TOTAL	6,40
						Subtotal	18,00
						Cantidad Acumulada Anterior	0,00
						TOTAL ACUMULADA	18,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses


FECHA	DD	24	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2" cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción

CAPÍTULO	OBRAS EXTRAS	SUB CAPÍTULO		ITEM		OE-2	UNID	m2

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

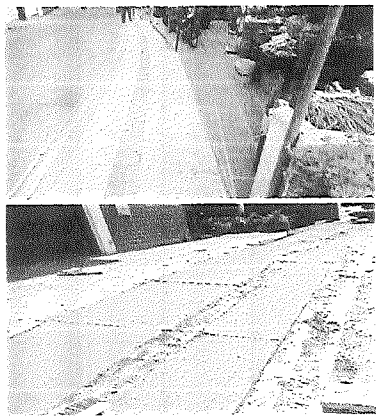

Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 52	Derecho	31,60	1,00		31,60	1,00	31,60
Calle 52	Derecho	15,80	1,05		16,59	1,00	16,60
QUEBRADA ARRIBA		47,40	m			TOTAL	48,20
Calle 56	Izquierdo	9,30	0,87		8,09	1,00	8,10
Calle 56	Izquierdo	4,10	0,71		2,91	1,00	2,90
Calle 56	Izquierdo	18,60	0,91		16,93	1,00	16,90
LAURELES		32,00	m			TOTAL	27,90
					Subtotal		76,10
					Cantidad Acumulada Anterior		0,00
					TOTAL ACUMULADA		76,10

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA


DESCRIPCIÓN	Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación

CAPÍTULO	OBRAS EXTRAS	SUB CAPÍTULO		ITEM		OE-3	UNID	und

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
calle 51D # 60-33	Izquierdo					1,00	1,00
calle 51 C # 59A-64	Izquierdo					3,00	3,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	4,00
calle 56 # 52-31	Izquierdo					1,00	1,00
calle 56 # 52-77	Izquierdo					1,00	1,00
calle 56 # 53-43	Izquierdo					1,00	1,00
LAURELES						TOTAL	3,00
Subtotal							7,00
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							7,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de adoquín demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación

CAPÍTULO	OBRAS EXTRAS	SUB CAPÍTULO		ITEM		OE-5	UNID m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	33,55				1,00	33,60
Carrera 59A	Izquierdo	190,05				1,00	190,10
Carrera 59A	Derecho	187,50				1,00	187,50
Calle 51D entre 51C y 52	Izquierdo	46,30				1,00	46,30
Calle 51D entre 51C y 52	Derecho	48,10				1,00	48,10
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10				1,00	6,10
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00				1,00	13,00
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	2,10					
Calle 51C - Bahia	Derecho	6,05				1,00	6,10
Calle 51C - Recta	Derecho	21,35				1,00	21,40
Cra 60A	Derecho	38,00				1,00	38,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	590,20
Calle 52	Derecho	175,00				1,00	175,00
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	24,40				1,00	24,40
QUEBRADA ARRIBA						TOTAL	199,40
Calle 56	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
LAURELES						TOTAL	52,70
Subtotal							842,30
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							842,30

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, distancia máxima de 15 km.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,01	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



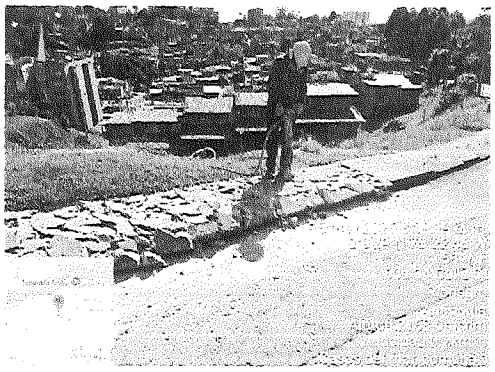

Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Losa anden existente	Izquierdo	36,20	0,95	0,20	0,19	1,00	6,90
Carrera 59A - Losa anden existente	Izquierdo	190,05	0,95	0,20	0,19	1,00	36,10
Carrera 59A - Losa anden existente	Derecho	56,06	0,95	0,25	0,24	1,00	13,30
Carrera 59A - Demolición cuneta existente	Derecho	107,40	0,86	0,17	0,15	1,00	15,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente	Izquierdo	39,10	0,95	0,20	0,19	1,00	7,40
Calle 51D entre 51C y 52 - Losa anden existente	Derecho	44,50	0,95	0,20	0,19	1,00	8,50
Calle 51C - Losa anden existente	Derecho	21,35	0,80	0,20	0,16	1,00	3,40
Calle 51C - Losa anden existente	Derecho	6,05	0,85	0,20	0,17	1,00	1,00
Calle 51C - Recta	Izquierdo	6,10	1,05	0,25	0,26	1,00	1,60
Calle 51C - Anden Variable	Izquierdo	13,00	1,81	0,25	0,45	1,00	5,90
Calle 51C - Recta	Izquierdo	2,10	1,10	0,25	0,28	1,00	0,60
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,60	0,63	0,27	0,17	1,00	0,10
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,55	0,35	0,27	0,09	1,00	0,10
Calle 51D - Rampa acceso moto	Izquierdo	0,60	0,92	0,30	0,28	1,00	0,20
Calle 51D - Rampa acceso moto	Derecho	1,10	0,90	0,29	0,26	1,00	0,30
Calle 51C - Cuneta existente	Izquierdo	11,48	0,30	0,19	0,06	1,00	0,70
Cra 60A - Anden existente - costado cancha	Derecho	38,00	0,90	0,20	0,18	1,00	6,80
CASAS DEL MAR						TOTAL	108,60
CALLE 56- Losa anden existente	Izquierdo	52,70	1,00	0,20	0,20	1,00	10,50
LAURELES						TOTAL	10,50
Subtotal							119,10
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							119,10

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026

ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, cargue, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,02	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51	Izquierdo	36,20	0,10	0,10	0,01	1,00	0,40
Carrera 59A	Izquierdo	190,05	0,22	0,17	0,04	1,00	7,10
Carrera 59A - Demolición anden existente	Derecho	56,06	0,55	0,17	0,09	1,00	5,20
Carrera 59A - Junto a cuneta existente	Derecho	107,40	0,67	0,17	0,11	1,00	12,20
Carrera 59A - Despues de cuneta existente	Derecho	27,50	1,40	0,17	0,24	1,00	6,50
Calle 51 D entre 51C y 52	Izquierdo	45,60	0,20	0,10	0,02	1,00	0,90
Calle 51 D entre 51C y 52	Derecho	44,50	0,20	0,10	0,02	1,00	0,90
Cra 60A - Anden existente - costado cancha	Derecho	38,00	0,20	0,15	0,03	1,00	1,10
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**34,30**
Calle 52	Derecho	26,50	1,00	0,17	0,17	1,00	4,50
Calle 52 - Llave contra anden existente	Derecho	26,50	0,40	0,25	0,10	1,00	2,70
Calle 52	Derecho	147,00	1,30	0,17	0,22	1,00	32,50
Calle 52 - Llave contra anden existente	Derecho	147,00	0,20	0,25	0,05	1,00	7,40
Calle 52 - Cra 59 y 58a	Derecho	23,10	1,60	0,15	0,24	1,00	5,50
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**52,60**
Calle 56	Izquierdo	40,00	0,12	0,15	0,02	1,00	0,70
LAURELES						**TOTAL**	**0,70**
Subtotal							**87,60**
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							**87,60**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165-3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,03	UNID	m3

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



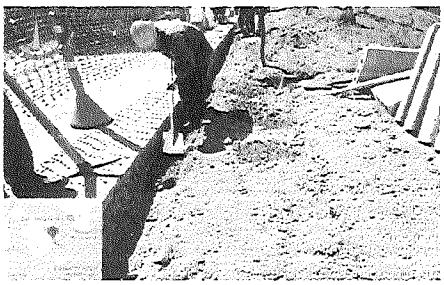



Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Anden	Izquierdo	36,20	1,25	0,15	0,19	1,00	6,80
Calle 51 - Bordillo	Izquierdo	36,20	0,30	0,20	0,06	1,00	2,20
Calle 51 - Doble Bordillo	Izquierdo	33,55	0,30	0,20	0,06	1,00	2,00
Carrera 59A - Anden	Izquierdo	190,05	0,95	0,15	0,14	1,00	27,10
Carrera 59A - Bordillo	Izquierdo	190,05	0,30	0,20	0,06	1,00	11,40
Carrera 59A - Doble Bordillo	Izquierdo	76,55	0,30	0,20	0,06	1,00	4,60
Carrera 59A - Muro 1	Izquierdo	48,60	0,40	0,40	0,16	1,00	7,80
Carrera 59A - Muro 2	Izquierdo	14,90	0,40	0,40	0,16	1,00	2,40
Carrera 59A - Anden	Derecho	187,50	1,55	0,15	0,23	1,00	43,60
Carrera 59A - Bordillo	Derecho	187,50	0,30	0,20	0,06	1,00	11,30
Calle 51D entre 51C y 52 - Anden	Izquierdo	45,30	0,95	0,15	0,14	1,00	6,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo	Izquierdo	45,60	0,30	0,20	0,06	1,00	2,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Doble Bordillo	Izquierdo	6,50	0,30	0,45	0,14	1,00	0,90
Calle 51D entre 51C y 52 - Anden	Derecho	44,50	0,95	0,15	0,14	1,00	6,30
Calle 51D entre 51C y 52 - Bordillo	Derecho	44,50	0,30	0,20	0,06	1,00	2,70
Calle 51C - Anden	Derecho	6,05	1,05	0,15	0,16	1,00	1,00
Calle 51C - Anden	Derecho	21,35	1,10	0,15	0,17	1,00	3,50
Calle 51C - Bordillo	Derecho	6,05	0,30	0,20	0,06	1,00	0,40
Calle 51C - Parte recta	Izquierdo	6,10	1,55	0,15	0,23	1,00	1,40
Calle 51C - Parte Variable	Izquierdo	13,00	1,86	0,15	0,28	1,00	3,60
Calle 51C - Recta	Izquierdo	2,10	1,30	0,15	0,20	1,00	0,40
Calle 51C - Bordillo	Izquierdo	21,20	0,30	0,20	0,06	1,00	1,30
Cra 60A - Anden	Derecho	38,00	1,41	0,15	0,21	1,00	8,00
Cra 60A - Bordillo	Derecho	38,00	0,30	0,20	0,06	1,00	2,30
CASAS DEL MAR						**TOTAL**	**160,20**
Calle 52 - Anden - cancha	Derecho	26,50	1,40	0,15	0,21	1,00	5,60
Calle 52 - Anden - via	Derecho	99,60	1,55	0,15	0,23	1,00	23,20
Calle 52 - Anden - rebaje	Derecho	47,40	1,55	0,32	0,50	1,00	23,50
Calle 52 - Bordillo	Derecho	173,50	0,30	0,20	0,06	1,00	10,40
Calle 52 - Tuberia Novafort 8"	Derecho	30,00	0,30	0,50	0,15	1,00	4,50
Calle 52 - Caja 80x80 a descole	Derecho	1,10	1,10	1,50	1,65	1,00	1,80
Calle 52 - Cra 59 y 58a - Anden	Derecho	23,10	1,60	0,15	0,24	1,00	5,50
Calle 52 - Cra 59 y 58a - Bordillo	Derecho	23,10	0,30	0,20	0,06	1,00	1,40
QUEBRADA ARRIBA						**TOTAL**	**75,90**
CALLE 56- Anden	Izquierdo	20,70	1,40	0,15	0,21	1,00	4,30
CALLE 56- Anden - rebaje	Izquierdo	32,00	1,40	0,32	0,45	1,00	14,30
CALLE 56- Bordillo	Izquierdo	52,70	0,30	0,20	0,06	1,00	3,20
LAURELES						**TOTAL**	**21,80**
Subtotal							**257,90**
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							**257,90**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

MEMORIAS DE CÁLCULO


OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO M&G	NIT	902059165 - 3	CONTRATO DE OBRA N°	IP 006-2026
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	NIT	900339866 - 2	PLAZO INICIAL	3 (Tres) Meses

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2026


ELABORÓ	Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA
APROBÓ	Ing. SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.						
CAPÍTULO	2. DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y LLENOS	SUB CAPÍTULO		ITEM	2,04	UNID	m

ESQUEMAS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





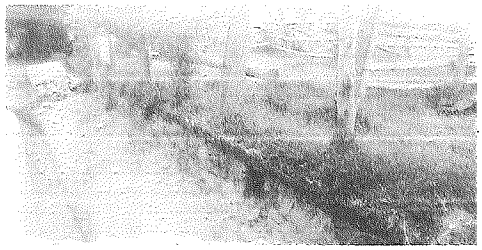

Actividad / Ubicación	Carril	Distancia	Ancho	Altura	Área total	CANTIDAD	Medida Parcial
Calle 51 - Hacia via	Izquierdo	36,20				1,00	36,20
Calle 51 - Hacia zona verde	Izquierdo	36,20				1,00	36,20
Carrera 59A - Hacia via	Izquierdo	190,05				1,00	190,05
Carrera 59A - Hacia zona verde	Izquierdo	190,05				1,00	190,05
Carrera 59A - Hacia via	Derecho	56,06				1,00	56,06
Carrera 59A - Hacia zona verde	Derecho	56,06				1,00	56,06
Carrera 59A - Hacia zona verde	Derecho	40,70				1,00	40,70
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia via	Izquierdo	39,10				1,00	39,10
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia paramento casa	Izquierdo	39,10				1,00	39,10
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia via	Derecho	44,50				1,00	44,50
Calle 51D entre 51C y 52 - Hacia parameto casa	Derecho	44,50				1,00	44,50
Calle 51C - Hacia zona verde	Derecho	21,35				1,00	21,35
Calle 51C - Hacia parque	Derecho	21,35				1,00	21,35
Calle 51C - Hacia zona verde	Derecho	6,05				1,00	6,05
Cra 60A - Hacia via	Derecho	38,00				1,00	38,00
Cra 60A - Hacia zona verde	Derecho	38,00				1,00	38,00
CASAS DEL MAR						TOTAL	897,27
QUEBRADA ARRIBA						TOTAL	
Calle 56 - Hacia via	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
Calle 56 - Hacia paramento	Izquierdo	52,70				1,00	52,70
LAURELES						TOTAL	105,40
Subtotal							1.002,70
Cantidad Acumulada Anterior							0,00
TOTAL ACUMULADA							1.002,70

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Ing. OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA

M.P. 68202 - 268154 STD

Residente Interventoria: Ing. RODRIGO BETANCUR CORREA

M.P. 011037 - 0507481 ANT

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	CONVENIO PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FO-ESI-28 Versión: 02 Fecha: 29/11/2022

OBJETO: "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJÍA DEL MUNICIPIO RIONEGRO"

CONTRATO No. IP-006-DE 2026

ACTA DE CONVENIO DE OBRA ADICIONAL N° 01

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	Contrato Interadministrativo No. 10-08-00-00-21-16-054-2025, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE ANDENES, CICLOBANDAS, PASAMANOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO."
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIONEGRO
CONTRATISTA:	EDESO
CONTRATO OBRA N°:	IP-006-2026
CONTRATISTA:	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
INTERVENTORIA:	CONSORCIO MYG
OBJETO:	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, COMUNA 1 LIBORIO MEJÍA DEL MUNICIPIO RIONEGRO"
VALOR:	$ 3.547.603.146
PLAZO:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2026

En la Ciudad de Rionegro se reunieron a los días 23 del mes de julio del 2026, Mariana Londoño Betancur, quién actúa en nombre y representacion de la Interventoría CONSORCIO MYG, Ferledy de Jesús Galeano Ciro, quién actúa en nombre y representacion de la empresa contratista CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S y JOHNNY CARDONA MÁRQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 71.618.846, quien actúa en calidad de Gerente General según Decreto de nombramiento No 016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldía de Rionegro - Antioquia, y acta de posesión No 015 del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO". Esto con el fin de pactar y definir precios y cantidades de ítems adicionales los cuales complementan los capítulos presupuestales ya establecidos, siendo estos necesarios para garantizar el objeto y alcance contractual.

La Interventoría recibió, revisó y aprobó los precios unitarios a costo directo los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así:

OBRA EXTRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO
OE-01	Corte con pulidora en la articulación entre un andén de concreto y fachadas existentes para creación de junta de aislamiento, que absorba los movimientos estructurales diferenciales evitando que vibraciones por posterior demolición de los andenes fracturen los acabados de la fachada. Espesor hasta 4"	m	$ 27.500
OE-02	Construcción de la losa vehicular concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m para rampa de acceso ubicada en la franja de andén peatonal acceso a garajes o predios o en aquellos puntos que por su uso requieran un reforzamiento adicional. El ítem incluye el acero de refuerzo en parilla con varilla de 1/2" cada 0.20 m en las dos direcciones, Malla electrosoldada D-84, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 245.387
OE-03	Reparación y/o reubicación de la acometida domiciliar de servicios públicos cuya ejecución se hace necesaria debido a que la posición, profundidad o estado real de la red difiere sustancialmente de la información técnica entregada al inicio del proyecto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	$ 144.634
OE-04	Fabricación, instalación y posterior retiro de estructuras provisionales tipo pasarela o rampa de madera destinadas a garantizar el acceso peatonal a las viviendas afectadas por las excavaciones y/o demoliciones. El ítem incluye el recubrimiento superior con tapete antideslizante, fijaciones seguras para evitar tropiezos, pasamanos de protección si se requieren por altura y el mantenimiento continuo durante el tiempo que dure la interferencia de la obra frente al predio y todo lo necsario para su correcto funcionamiento..	UNIDAD	$ 100.000

OE-05	Suministro e instalación de adoquin demarcador de 10x20x6 en concreto, con mortero de nivelación y fijación, incluyendo materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 34.956

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por la Interventoria.

2. Los anteriores precios de obra extra se suscriben para garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del contrato N° IP 006-2026

Para constancia se firma por los que intervienen a los 23 dias del mes de julio del año 2026;

FERLEDY DE JESÚS GALEANO CIRO
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
Representante del Contratista

JOHN ALEXANDER OCHOA LÓPEZ
Supervisor del Proyecto
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO

MARIANA LONDOÑO BETANCUR
CONSORCIO M YG
Representante de la Interventoria

JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente General
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 900339866-2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha: 14/08/2026

Señores: EDESO – EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Ciudad

Yo, **FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO**, identificado con cedula de ciudadanía No 98.504.713 en mi condición de representante legal de la empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS** identificada con NIT **900339866-2**, certifico que durante los últimos 6 meses del año 2026 la Empresa se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP) (Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Puerto Nare (ANT.), a los 14 días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,

FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO
Representante Legal
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

Relación personal seguridad social mes de Abril / pagada en Mayo				
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Salario**	**Fecha de Ingreso**
Giovany de Jesus Rivera Acevedo	CyC	Profesional SST	$ 3.600.000,00	13/05/2026
Juan Felipe Quintero Alzate	CyC	Almacenista	$ 2.800.000,00	13/05/2026
Katerine Mesa Calderon	CyC	Residente de obra	$ 6.000.000,00	12/05/2026
Jeferson Enrique Romero Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Fabian David Delgado Parra	MJM	Ingeniero Residente	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Juan Esteban Gomez Ciro	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	29/04/2026
Jose Manuel Valenzuela Vasquez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Yanderson Puertas Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Ramon Antonio Ciro Villegas	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Antonio Luis Burgos Oviedo	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Luis Alberto Urieles Noriega	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	17/06/2026
Eliecer Adonay Frontado Ortiz	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Leandro Enrrique Nuñez Perez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Yerson efrain gatica garcia	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026

Relación personal seguridad social mes de Mayo / pagada en Junio				
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Salario**	**Fecha de Ingreso**
Giovany de Jesus Rivera Acevedo	CyC	Profesional SST	$ 3.600.000,00	13/05/2026
Juan Felipe Quintero Alzate	CyC	Almacenista	$ 2.800.000,00	13/05/2026
Katerine Mesa Calderon	CyC	Residente de obra	$ 6.000.000,00	12/05/2026
Laura Villegas Giraldo	CyC	Profesional Social	$ 3.600.000,00	12/05/2026
Wilmar Mosquera Castaño	CyC	Profesional Ambiental	$ 2.500.000,00	24/05/2026
Sergio Amaury Durango Zora	CyC	Director de Obra	$ 6.100.000,00	12/05/2026
Jose Raul Garcia Estevez	CyC	Auxiliar de Ingenieria	$ 3.000.000,00	12/05/2026
Ebel Leon Torreglosa	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Yury Yojana Pinzon Lopez	MJM	Inspectora SST	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Jose joaquin pico miranda	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	27/05/2026
jose del carmen Ordoñez higinio	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Luis Alberto Urieles Noriega	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	17/06/2026
Jose Angel Mendez Arevalo	MJM	Representante Legal	$ 1.750.905,00	15/05/2026
Jeferson Enrique Romero Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Fabian David Delgado Parra	MJM	Ingeniero Residente	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Juan Esteban Gomez Ciro	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Luis Carlos Gomez Ciro	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Julian David Romero Gutierrez	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Edier Banquet Hernandez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Ronal Navarro Soñeth	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Jose Manuel Valenzuela Vasquez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Juan David Navarro Argumedo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Yanderson Puertas Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Ramon Antonio Ciro Villegas	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Antonio Luis Burgos Oviedo	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Wilson enrique zambrano uriana	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Richard Zambrano Uriana	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Jose Grogorio Cortez Perez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Eliecer Adonay Frontado Ortiz	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Gustavo Josue Vasquez Padilla	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Leandro Enrrique Nuñez Perez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Angel antonio nuñez Chacin	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Yerson efrain gatica garcia	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026

Relación personal seguridad social mes de Junio / pagada en Julio				
Nombre	Empresa	Cargo	Salario	Fecha de Ingreso
Giovany de Jesus Rivera Acevedo	CyC	Profesional SST	$ 3.600.000,00	13/05/2026
Juan Felipe Quintero Alzate	CyC	Almacenista	$ 2.800.000,00	13/05/2026
Katerine Mesa Calderon	CyC	Residente de obra	$ 6.000.000,00	12/05/2026
Laura Villegas Giraldo	CyC	Profesional Social	$ 3.600.000,00	12/05/2026
Wilmar Mosquera Castaño	CyC	Profesional Ambiental	$ 2.500.000,00	24/05/2026
Sergio Amaury Durango Zora	CyC	Director de Obra	$ 6.100.000,00	12/05/2026
Jose Raul Garcia Estevez	CyC	Auxiliar de Ingenieria	$ 3.000.000,00	12/05/2026
Olman Sneyder Rincon Gaviria	CyC	Residente de obra	$ 6.000.000,00	11/06/2026
Valentina Ceballos Quintero	MJM	Inspectora SST	$ 1.750.905,00	16/06/2026
Jeferson Enrique Romero Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Fabian David Delgado Parra	MJM	Ingeniero Residente	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Juan Esteban Gomez Ciro	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Luis Carlos Gomez Ciro	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Carlos Daniel Ortiz Lopez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	5/06/2026
Edier Banquet Hernandez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Ronal Navarro Soñeth	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Jose Manuel Valenzuela Vasquez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Julian David Romero Gutierrez	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Yanderson Puertas Camargo	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Jesus Miguel Hernandez Jimenez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	24/06/2026
Ramon Antonio Ciro Villegas	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Santiago Andres Licona Garcia	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Esteban Manuel Silva Rojas	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Antonio Luis Burgos Oviedo	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Wilson enrique zambrano uriana	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Richard Zambrano Uriana	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Enzo Bracho Gonzalez	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	24/06/2026
Yorlin Chirupia Olea	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Carlos Mario Cardona Loaiza	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Edilberto Jose Gonzalez Aphusana	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Eduardo Segundo Gonzalez Aphusana	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	5/06/2026
Yury Yojana Pinzon Lopez	MJM	Inspectora SST	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Ebel Leon Torreglosa	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Jose joaquin pico miranda	MJM	Oficial de obra	$ 1.750.905,00	27/05/2026
Luis Alberto Urieles Noriega	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	17/06/2026
Osvaldo Enrrique Manjarres Romero	MJM	Maestro de Obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Jose Angel Mendez Arevalo	MJM	Representante Legal	$ 1.750.905,00	15/05/2026
Jose Grogorio Cortez Perez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Jose Gregonio Moreno Chirinos	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	23/06/2026
Eliecer Adonay Frontado Ortiz	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Gustavo Josue Vasquez Padilla	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026
Leandro Enrrique Nuñez Perez	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	4/06/2026
Angel antonio nuñez Chacin	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	21/05/2026
Yerson efrain gatica garcia	MJM	Ayudante de obra	$ 1.750.905,00	12/05/2026

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GIOVANY DE JESUS RIVERA ACEVEDO identificado(a) con CC 98504976 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	288716195	9504452975	E	2026-05-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$4,105,118	$656,900
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,105,118	$285,800
CCF	COMFAMA	30	4%	$4,105,118	$164,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,105,118	$164,300

Este certificado se expide el día 2026-05-21 a las 09:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN FELIPE QUINTERO ALZATE identificado(a) con CC 1036134451 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	288716195	9504452975	E	2026-05-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,900,135	$304,100
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,900,135	$132,300
CCF	COMFAMA	30	4%	$1,900,135	$76,100
EPS	SAVIA SALUD	30	4%	$1,900,135	$76,100

Este certificado se expide el día 2026-05-21 a las 09:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KATERINE MESA CALDERON identificado(a) con CC 1018348884 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	288716195	9504452975	E	2026-05-07	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	11	16%	$2,200,000	$352,000
ARL	ARL SURA	11	6.96%	$2,200,000	$153,200
CCF	COMFAMA	11	4%	$2,200,000	$88,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	11	4%	$2,200,000	$88,000

Este certificado se expide el día 2026-05-21 a las 09:47.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 05:47:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85389489

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 13/05/2026

DEL APORTANTE

ocial	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MJM SAS		
nto	NI902046317	**Dirección**	CL 48 #38 - 45
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2272711
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ntante Legal	MENDEZ AREVALO JOSE ANGEL	**Identificación**	CC 93396207
llados	18	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
JEFERSON ENRIQUE ROMERO CAMARGO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 176.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
FABIAN DAVID DELGADO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
JUAN ESTEBAN GOMEZ CIRO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 176.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
MIGUEL ANGEL NARANJO MARTINEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
JOSE MANUEL VALENZUELA VASQUEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 176.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
YANDERSON JOSE PUERTAS CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
RAMON ANTONIO CIRO VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
JESUS DAVID MARTINEZ RAMOS	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641.999	$ 102.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 641.999	$ 26.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
ELIAN RAFAEL BOHORQUEZ MANJARREZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 641.999	$ 102.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 641.999	$ 26.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
ANTONIO LUIS BURGOS OVIEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
JOSE DARIO EPIEYU	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 176.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
JOSE IGNACIO URIANA PALMAR	01	00																	0	30	30	30	30	(26-14) COLPENSIONES	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
LUIS ALBERTO URIELES MORIEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
ELIECER ADONAY FRONTADO ORTIZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
JHONY ENRIQ VILLALOBOS COLINA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
LEANDRO ENRIQUE NUÑEZ PEREZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 176.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
ELISEO ALBERTO SENCIAL MARRUFO	01	00		X															0	1	1	1	1	(26-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
YERSON EFRAIN GATICA GARCIA	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 176.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 176.091	$ 7.100	6,960	$ 176.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 176.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600

lace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TALES

nsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.073.430	$ 13.073.430	$ 13.073.430	$ 13.073.430	$ 2.093.000	$ 524.200	$ 910.400	$ 524.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.051.800	$ 18.100	$ 4.069.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900339866	2	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	Calle 48 Nro. 3-55	PUERTO NARE-ANTIOQUIA	8347009	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364180047	9506013362	E	2026/06/17	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$56,479,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	tna	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (79 Afiliados)																								$196,745,369	$39,307,900			$196,770,469	$7,870,000			$196,745,369	$7,875,000			$197,121,129		$11,827,600		$0	$0	SI	$66,979,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO1 (2 Afiliados)																								$3,325,453	$532,100			$2,450,000	$98,000			$3,325,453	$133,100			$4,200,905		$102,400		$0	$0		$865,600
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																								$3,325,453	$532,100			$2,450,000	$98,000			$3,325,453	$133,100			$4,200,905		$102,400		$0	$0		$865,600
1	CC	21940476	GALEANO CIRO GIOVANI ALEIDA																			230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS010	30	$2,450,000	$98,000	CCF04	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	2.436%	$59,700	30	$0	$0	SI	$647,700
2	CC	1017204783	GARCIA HOYOS ASTRID VIVIANA	X																		230201	9	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	9	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	9	$0	$0	No	$217,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (72 Afiliados)																								$170,850,369	$27,339,400			$170,850,369	$6,837,500			$170,850,369	$6,659,600			$170,850,369		$11,585,800		$0	$0		$52,422,300
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (72 Afiliados)																								$170,850,369	$27,339,400			$170,850,369	$6,837,500			$170,850,369	$6,659,600			$170,850,369		$11,585,800		$0	$0		$52,422,300
3	CC	1036132754	ACEVEDO PRADA SANTIAGO ENEL																			230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS040	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
4	CC	1039685687	ALBA GUZMAN JUAN CAMILO		X																	230301	12	$1,440,000	$230,400	EPS037	12	$1,440,000	$57,600	CCF04	12	$1,440,000	$57,600	14-11	12	$1,440,000	6.960%	$100,300	12	$0	$0	SI	$445,900
5	CC	1007903495	ARANGO OCHOA JUAN PABLO																			230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS040	27	$1,575,815	$63,100	CCF04	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$488,100
6	CC	1007903495	ARANGO OCHOA JUAN PABLO												X							230201	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
7	CC	1039679005	ARBOLEDA DAZA YILBER SMITH																			230301	30	$1,760,854	$281,800	EPS037	30	$1,760,854	$70,500	CCF04	30	$1,760,854	$70,500	14-11	30	$1,760,854	6.960%	$122,600	30	$0	$0	SI	$545,400
8	CC	75049928	ARENAS CORRALES MAURICIO																			25-14	30	$3,873,368	$619,800	EPS040	30	$3,873,368	$155,000	CCF04	30	$3,873,368	$155,000	14-11	30	$3,873,368	6.960%	$269,600	30	$0	$0	SI	$1,199,400
9	CC	77019936	ARRIETA MEJIA OMAR EUGENIO																			230301	30	$2,824,674	$452,000	EPS037	30	$2,824,674	$113,000	CCF04	30	$2,824,674	$113,000	14-11	30	$2,824,674	6.960%	$196,600	30	$0	$0	SI	$874,600
10	CC	1090455863	ATENCIO BETANCOURT RAMIRO																			231001	27	$2,307,480	$369,200	EPS041	27	$2,307,480	$92,300	CCF04	27	$2,307,480	$92,300	14-11	27	$2,307,480	6.960%	$160,700	27	$0	$0	SI	$714,500
11	CC	1090455863	ATENCIO BETANCOURT RAMIRO												X							231001	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
12	CC	1036134807	AVENDAÑO GOMEZ CARLOS MARIO		X																	230301	11	$641,999	$102,800	ESSC24	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	SI	$198,900
13	CC	1036133856	BARRERA VARGAS DIDIAN ESTEFANIA																			230201	30	$4,625,473	$740,100	EPS040	30	$4,625,473	$185,100	CCF04	30	$4,625,473	$185,100	14-11	30	$4,625,473	6.960%	$322,000	30	$0	$0	SI	$1,432,300
14	CC	1095919501	BAUTISTA ASCANIO JEIMY JULIET																			230301	30	$4,629,930	$740,800	EPS040	30	$4,629,930	$185,200	CCF04	30	$4,629,930	$185,200	14-11	30	$4,629,930	6.960%	$322,300	30	$0	$0	SI	$1,433,500
15	CC	1036133391	BERRIO COSME JACKELINE																			230301	30	$1,980,968	$317,000	EPS040	30	$1,980,968	$79,300	CCF04	30	$1,980,968	$79,300	14-11	30	$1,980,968	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,500
16	CC	1036220541	BRICEÑO ANGULO GEAN LUKAS																			230301	30	$2,177,490	$348,400	EPS037	30	$2,177,490	$87,100	CCF04	30	$2,177,490	$87,100	14-11	30	$2,177,490	6.960%	$151,600	30	$0	$0	SI	$674,200
17	CC	98503991	CAMACHO RAMIREZ ERMINSON																			230301	30	$3,006,177	$481,000	EPS037	30	$3,006,177	$120,300	CCF04	30	$3,006,177	$120,300	14-11	30	$3,006,177	6.960%	$209,300	30	$0	$0	SI	$930,900
18	CC	1036131254	CAÑIZALES OROZCO MARIA CRISTINA																			25-14	30	$4,629,930	$740,800	EPS040	30	$4,629,930	$185,200	CCF04	30	$4,629,930	$185,200	14-11	30	$4,629,930	6.960%	$322,300	30	$0	$0	SI	$1,433,500
19	CC	1039691994	CARDENAS CASTRILLON LEYDY TATIANA																			231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
20	CC	1057095339	CASTAÑO GUTIERREZ DANIEL FELIPE																			230301	30	$1,765,828	$282,600	EPS037	30	$1,765,828	$70,700	CCF04	30	$1,765,828	$70,700	14-11	30	$1,765,828	6.960%	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,000
21	CC	1007512281	COLMENARES QUIROZ CARLOS STEVEN	X	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
22	CC	1036134238	DIAZ MADRID CRISTIAN CAMILO																			230301	30	$1,915,058	$306,500	EPS037	30	$1,915,058	$76,700	CCF04	30	$1,915,058	$76,700	14-11	30	$1,915,058	6.960%	$133,300	30	$0	$0	SI	$593,200

23	CC	98505041	DURANGO ZORA SERGIO AMAURY	X																	230301	26	$5,286,667	$845,900	EPS010	26	$5,286,667	$211,500	CCF04	26	$5,286,667	$211,500	14-11	26	$5,286,667	6.960%	$368,000	26	$0	$0	SI	$1,636,900
24	CC	1036133362	FLOREZ NORIEGA LUIS ALFREDO																		25-14	30	$1,966,792	$314,700	EPS037	30	$1,966,792	$78,700	CCF04	30	$1,966,792	$78,700	14-11	30	$1,966,792	6.960%	$136,900	30	$0	$0	SI	$609,000
25	CC	1014240803	FRANCO GOMEZ JOSE ANDRES											X							230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
26	CC	98504713	GALEANO CIRO FERLEDY DE JESUS																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
27	CC	1036131866	GARCIA GIRALDO DIEGO																		231001	30	$4,054,781	$648,800	EPS010	30	$4,054,781	$162,200	CCF04	30	$4,054,781	$162,200	14-11	30	$4,054,781	6.960%	$282,300	30	$0	$0	SI	$1,255,500
28	CC	71278258	GARCIA ESTEVEZ JOSE RAUL	X																	231001	21	$2,386,373	$381,900	EPS010	21	$2,386,373	$95,500	CCF04	21	$2,386,373	$95,500	14-11	21	$2,386,373	6.960%	$166,100	21	$0	$0	SI	$739,000
29	CC	1007512041	GIRALDO MUÑOZ ANA MARIA											X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
30	CC	1007512041	GIRALDO MUÑOZ ANA MARIA																		230301	27	$1,980,000	$316,800	EPS005	27	$1,980,000	$79,200	CCF04	27	$1,980,000	$79,200	14-11	27	$1,980,000	6.960%	$137,900	27	$0	$0	SI	$613,100
31	CC	1036222804	GONZALEZ COLORADO JOHN JAIRO																		230301	30	$2,680,000	$428,800	EPS002	30	$2,680,000	$107,200	CCF04	30	$2,680,000	$107,200	14-11	30	$2,680,000	6.960%	$186,600	30	$0	$0	SI	$829,800
32	CC	71194114	HERNANDEZ TOBON ELKIN DE JESUS											X							230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF04	30	$1,750,906	$0	14-11	30	$1,750,906	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
33	CC	98504913	HERNANDEZ LOPEZ NELSON DE JESUS																		230301	30	$1,844,423	$295,200	EPS037	30	$1,844,423	$73,800	CCF04	30	$1,844,423	$73,800	14-11	30	$1,844,423	6.960%	$128,400	30	$0	$0	SI	$571,200
34	CC	1036132995	HINCAPIE SALAZAR YEWISON																		230301	30	$3,194,538	$511,200	EPS037	30	$3,194,538	$127,800	CCF04	30	$3,194,538	$127,800	14-11	30	$3,194,538	6.960%	$222,400	30	$0	$0	SI	$989,200
35	CC	98505013	ISAZA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO																		230301	30	$2,695,228	$431,300	EPS037	30	$2,695,228	$107,900	CCF04	30	$2,695,228	$107,900	14-11	30	$2,695,228	6.960%	$187,600	30	$0	$0	SI	$834,700
36	CC	1066607202	LUNA OSPINA JOHEN MANUEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
37	CC	1036134858	MARIN GALEANO BRAYAN STEVEN																		230301	30	$1,915,854	$306,600	ESSC24	30	$1,915,854	$76,700	CCF04	30	$1,915,854	$76,700	14-11	30	$1,915,854	6.960%	$133,400	30	$0	$0	SI	$593,400
38	CC	1039693397	MARIN JARAMILLO MARLON JHONARIS																		230301	30	$2,962,560	$474,100	EPS040	30	$2,962,560	$118,600	CCF04	30	$2,962,560	$118,600	14-11	30	$2,962,560	6.960%	$206,200	30	$0	$0	SI	$917,500
39	CC	1000888409	MARIN MURIEL ROBINSON ANDRES		X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
40	CC	1036132836	MARTINEZ ZAPATA JUAN GUILLERMO																		230301	30	$2,785,072	$445,700	EPS037	30	$2,785,072	$111,500	CCF04	30	$2,785,072	$111,500	14-11	30	$2,785,072	6.960%	$193,900	30	$0	$0	SI	$862,600
41	CC	1036133349	MEJIA GALEANO NAYLA FERNANDA																		230301	30	$2,840,000	$454,400	EPS010	30	$2,840,000	$113,600	CCF04	30	$2,840,000	$113,600	14-11	30	$2,840,000	6.960%	$197,700	30	$0	$0	SI	$879,300
42	CC	1007335148	MELO RUIZ JUAN DAVID																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
43	CC	1018348884	MESA CALDERON KATERINE																		230201	30	$6,387,506	$1,022,100	EPS010	30	$6,387,506	$255,600	CCF04	30	$6,387,506	$255,600	14-11	30	$6,387,506	6.960%	$444,600	30	$0	$0	SI	$1,977,900
44	CC	1036134058	MORENO GALEANO JUAN GUILLERMO																		231001	30	$2,312,619	$370,100	EPS037	30	$2,312,619	$92,600	CCF04	30	$2,312,619	$92,600	14-11	30	$2,312,619	6.960%	$161,000	30	$0	$0	SI	$716,300
45	CC	1094892536	MORENO SANCHEZ PAOLA	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS040	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
46	CC	15443626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	X																	230201	8	$666,667	$106,700	EPS010	8	$666,667	$26,700	CCF04	8	$666,667	$26,700	14-11	8	$666,667	6.960%	$46,500	8	$0	$0	SI	$206,600
47	CC	1000120022	MUÑOZ VELEZ RONALDO ALEXIS	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
48	CC	98504034	NORIEGA ACEVEDO JHON HERNANDO																		25-14	30	$2,962,560	$474,100	EPS040	30	$2,962,560	$118,600	CCF04	30	$2,962,560	$118,600	14-11	30	$2,962,560	6.960%	$206,200	30	$0	$0	SI	$917,500
49	CC	1001438032	PAREJA URRUTIA YANIOR ANDREW		X																230301	11	$641,999	$102,800	ESSC24	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	SI	$198,900
50	CC	1036223352	PAVA DE LA OSSA ERIKA YURANY	X																	230301	23	$2,760,000	$441,600	EPS010	23	$2,760,000	$110,400	CCF04	23	$2,760,000	$110,400	14-11	23	$2,760,000	6.960%	$192,100	23	$0	$0	SI	$854,500
51	CC	3392694	PULGARIN HERNANDEZ JUAN DAVID																		230201	30	$1,854,371	$296,700	EPS010	30	$1,854,371	$74,200	CCF04	30	$1,854,371	$74,200	14-11	30	$1,854,371	6.960%	$129,100	30	$0	$0	SI	$574,200
52	CC	1129624229	PULIDO PARRA DAVID ALEJANDRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
53	CC	98503779	QUINTANA CASTILLO WALTER ALBERTO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
54	CC	1036134451	QUINTERO ALZATE JUAN FELIPE																		230301	30	$2,767,237	$442,800	EPS040	30	$2,767,237	$110,700	CCF04	30	$2,767,237	$110,700	14-11	30	$2,767,237	6.960%	$192,600	30	$0	$0	SI	$856,800
55	CC	1036134356	RESTREPO PEREZ AYINSON ALEXANDER																		231001	30	$1,825,520	$292,100	EPS040	30	$1,825,520	$73,100	CCF04	30	$1,825,520	$73,100	14-11	30	$1,825,520	6.960%	$127,100	30	$0	$0	SI	$565,400
56	CC	1036134400	RIOS SIERRA JHONY ALEXANDER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
57	CC	98503450	RIOS AGUDELO OSCAR ALBERTO																		230301	30	$1,830,494	$292,900	ESSC24	30	$1,830,494	$73,300	CCF04	30	$1,830,494	$73,300	14-11	30	$1,830,494	6.960%	$127,500	30	$0	$0	SI	$567,000

58	CC	98504976	RIVERA ACEVEDO GIOVANY DE JESUS																		25-14	30	$3,816,069	$610,600	EPS037	30	$3,816,069	$152,700	CCF04	30	$3,816,069	$152,700	14-11	30	$3,816,069	6.960%	$265,600	30	$0	$0	SI	$1,181,600
59	CC	1054552020	ROMERO GAVIRIA ANDRES MAURICIO																		230301	30	$3,232,810	$517,300	EPS037	30	$3,232,810	$129,400	CCF04	30	$3,232,810	$129,400	14-11	30	$3,232,810	6.960%	$225,100	30	$0	$0	SI	$1,001,200
60	CC	1054555472	ROMERO GAVIRIA IVAN DARIO																		25-14	30	$3,664,440	$586,400	ESSC24	30	$3,664,440	$146,600	CCF04	30	$3,664,440	$146,600	14-11	30	$3,664,440	6.960%	$255,100	30	$0	$0	SI	$1,134,700
61	CC	71338437	RUIZ ALVAREZ JOSE SIGIFREDO																		231001	30	$2,818,800	$451,100	EPS037	30	$2,818,800	$112,800	CCF04	30	$2,818,800	$112,800	14-11	30	$2,818,800	6.960%	$196,200	30	$0	$0	SI	$872,900
62	CC	3392510	SALDARRIAGA ZAPATA RAUL ANTONIO																		230301	30	$3,071,976	$491,600	EPS037	30	$3,071,976	$122,900	CCF04	30	$3,071,976	$122,900	14-11	30	$3,071,976	6.960%	$213,900	30	$0	$0	SI	$951,300
63	CC	10183487	SANCHEZ JARAMILLO JESUS MARIA																		25-14	30	$2,177,490	$348,400	EPS037	30	$2,177,490	$87,100	CCF04	30	$2,177,490	$87,100	14-11	30	$2,177,490	6.960%	$151,600	30	$0	$0	SI	$674,200
64	CC	1102383355	SANDOVAL HERNANDEZ ANDERSON YESID																		230301	30	$2,832,377	$453,200	EPS037	30	$2,832,377	$113,300	CCF04	30	$2,832,377	$113,300	14-11	30	$2,832,377	6.960%	$197,200	30	$0	$0	SI	$877,000
65	CC	1036133079	SIERRA MONTOYA DEINER ALBERTO	X																	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF04	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	SI	$379,800
66	CC	1036132961	SUAREZ CASTAÑEDA JUAN ESTEBAN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
67	CC	1040730658	TAMAYO DAVID NANCY YULIANA	X	X																25-14	13	$1,061,667	$169,900	EPS010	13	$1,061,667	$42,500	CCF04	13	$1,061,667	$42,500	14-11	13	$1,061,667	6.960%	$73,900	13	$0	$0	SI	$328,800
68	CC	98504897	URBINA ORTIZ EDUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
69	CC	1152684553	VALENZUELA HENAO MAINORY TATIANA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
70	CC	1036134611	VANEGAS CADAVID JOSE ALBERTO																		230301	30	$2,718,069	$434,900	EPS002	30	$2,718,069	$108,800	CCF04	30	$2,718,069	$108,800	14-11	30	$2,718,069	6.960%	$189,200	30	$0	$0	SI	$841,700
71	CC	1036134366	VANEGAS CADAVID VICTOR ALBERTO																		230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	SI	$415,700
72	CC	1036134366	VANEGAS CADAVID VICTOR ALBERTO											X							230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$81,600
73	CC	1091202459	VELASCO BLANDON BRANDON CAMILO																		230301	30	$1,760,854	$281,800	EPS017	30	$1,760,854	$70,500	CCF04	30	$1,760,854	$70,500	14-11	30	$1,760,854	6.960%	$122,600	30	$0	$0	SI	$545,400
74	CC	89008342	VELASCO PIRA ROBINSON GERMAN																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS040	30	$2,900,000	$116,000	CCF04	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
75	CC	1007433564	VELASQUEZ CIRO JHOAN ALEXIS	X																	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF04	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	SI	$379,800
76	CC	1036133352	VIDES BELTRAN JHON JENRRY	X																	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
77	CC	1017222344	VILLEGAS GIRALDO LAURA	X																	230301	21	$2,616,651	$418,700	EPS010	21	$2,616,651	$104,700	CCF04	21	$2,616,651	$104,700	14-11	21	$2,616,651	6.960%	$182,200	21	$0	$0	SI	$810,300
78	CC	1056775162	YEPES ROJAS ANGEL		X																230301	24	$2,144,000	$343,100	EPS037	24	$2,144,000	$85,800	CCF04	24	$2,144,000	$85,800	14-11	24	$2,144,000	6.960%	$149,300	24	$0	$0	SI	$664,000
Centro de Trabajo: SERVICIOS (5 Afiliados)																							$12,070,065	$1,931,400			$12,070,065	$482,900			$12,070,065	$482,900			$12,070,065		$294,400		$0	$0		$3,191,600
Ciudad: PUERTO NARE Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							$12,070,065	$1,931,400			$12,070,065	$482,900			$12,070,065	$482,900			$12,070,065		$294,400		$0	$0		$3,191,600
79	CC	1007202136	ARANGO PEREZ LUZ YAZMIN																		230301	30	$1,839,720	$294,400	EPS037	30	$1,839,720	$73,600	CCF04	30	$1,839,720	$73,600	14-11	30	$1,839,720	2.436%	$44,900	30	$0	$0	SI	$486,500
80	CC	1036222732	GOMEZ RAMIREZ LORENA																		230301	30	$1,839,720	$294,400	EPS040	30	$1,839,720	$73,600	CCF04	30	$1,839,720	$73,600	14-11	30	$1,839,720	2.436%	$44,900	30	$0	$0	SI	$486,500
81	CC	21854809	HENAO HERNANDEZ AIDOLINDA																		230301	30	$1,839,720	$294,400	EPS037	30	$1,839,720	$73,600	CCF04	30	$1,839,720	$73,600	14-11	30	$1,839,720	2.436%	$44,900	30	$0	$0	SI	$486,500
82	CC	21854782	MARIN BETANCUR DIANA MARIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
83	CC	21940106	VARGAS QUINTANA MARIA LEONOR																		25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF04	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	2.436%	$117,000	30	$0	$0	SI	$1,269,000
Total Afiliados(79)																							$186,245,887	$29,802,900			$185,370,434	$7,418,400			$186,245,887	$7,275,600			$187,121,339		$11,982,600		$0	$0		$56,479,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$29,802,900	$0	$0	$29,802,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,141,500	$0	$0	$3,141,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,632,700	$0	$0	$4,632,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$17,658,100	$0	$0	$17,658,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$4,370,600	$0	$0	$4,370,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$11,982,600	$0	$0	$11,982,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	79	$11,982,600	$0	$0	$11,982,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$7,275,600	$0	$0	$7,275,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	79	$7,275,600	$0	$0	$7,275,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				78	$7,418,400	$0	$0	$7,418,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$348,000	$0	$0	$348,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,877,000	$0	$0	$1,877,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,500	$0	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	$2,871,500	$0	$0	$2,871,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$99,400	$0	$0	$99,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$316,500	$0	$0	$316,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$86,300	$0	$0	$86,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	16	$1,749,200	$0	$0	$1,749,200
TOTAL				79	$56,479,500	$0	$0	$56,479,500

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-06-04, 09:57:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 85646366

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

Fecha limite de pago: 2026-06-04

PAGADA 04/06/2026

DEL APORTANTE

›cial	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MJM SAS				
ıto	NI902046317	**Dirección**	CL 48 #38 - 45		
:mpresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2272711		
›ona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
ıtante Legal	MENDEZ AREVALO JOSE ANGEL	**Identificación**	CC93396207		

.LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
LEON TORREGLOSA EBEL	01	00	X															0	12	12	12	12	PROTECCION	$ 700.362	$ 112.100	SALUD TOTAL EPS	$ 700.362	$ 28.100	ARL SURA	$ 700.362	$ 49.800	COMFAMA	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100
QUINTERO PADIERNA EDIO OMEDIS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
URIANA PALMAR JOSE GNACIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
PINZON LOPEZ YURY YOJANA	01	00	X															0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 1.109.907	$ 177.500	EPS SURA	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
PICO MIRANDA JOSE JOAQUIN	01	00	X															0	6	6	6	6	PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	EPS SURA	$ 291.818	$ 11.700	ARL SURA	$ 291.818	$ 20.400	COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
ORDOÑEZ HIGINIO JOSE DEL CARMEN	01	00	X															0	11	11	11	11	PROTECCION	$ 641.999	$ 102.800	EPS SURA	$ 641.999	$ 25.700	ARL SURA	$ 641.999	$ 44.700	COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.900
URIELES NORIEGA LUIS ALBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
MENDEZ AREVALO JOSE ANGEL	01	00	X															0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 1.050.543	$ 168.100	EPS SANITAS	$ 1.050.543	$ 42.100	ARL SURA	$ 1.050.543	$ 73.200	COMFAMA	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.500
GOMEZ RUIZ PAULINA	01	00	X															0	19	19	19	19	COLPENSIONES	$ 1.109.907	$ 177.500	EPS SURA	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
ROMERO CAMARGO JEFERSON ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
ARIAS BARRAGAN EDINSON MARCELO	01	00	X	X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 9.400	ARL SURA	$ 233.454	$ 18.300	COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
DELGADO PARRA FABIAN DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
GOMEZ CIRO JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
GOMEZ CIRO LUIS CARLOS	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	ARL SURA	$ 583.635	$ 40.700	COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
ROMERO GUTIERREZ JULIAN DAVID	01	00	X	X														0	11	11	11	11	COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.800	SALUD TOTAL EPS	$ 641.999	$ 25.700	ARL SURA	$ 641.999	$ 44.700	COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.900
RESTREPO CANO SEBASTIAN	01	00	X															0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 1.109.907	$ 177.500	EPS SURA	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
BANQUET HERNANDEZ EDIER	01	00	X															0	19	19	19	19	PROTECCION	$ 1.109.907	$ 177.500	NUEVA EPS	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
TOBON MARTINEZ JANER SEBASTIAN	01	00	X															0	6	6	6	6	COLFONDOS	$ 291.818	$ 46.700	SALUD TOTAL EPS	$ 291.818	$ 11.700	ARL SURA	$ 291.818	$ 20.400	COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
CARDONA OTALVARO SEBASTIAN	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	EPS SURA	$ 291.818	$ 11.700	ARL SURA	$ 291.818	$ 20.400	COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
ZAPATA HERRERA YONATAN DAVID	01	00	X	X														0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	ARL SURA	$ 116.727	$ 9.200	COMFAMA	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.300
NAVARRO SOÑETH RONAL	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 700.362	$ 112.100	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 700.362	$ 28.100	ARL SURA	$ 700.362	$ 49.800	COMFAMA	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100
NARANJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	01	00		X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
VALENZUELA VASQUEZ JOSE MANUEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
NAVARRO ARGUMEDO JUAN DAVID	01	00	X															0	29	29	29	29	PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.692.542	$ 67.800	ARL SURA	$ 1.692.542	$ 117.900	COMFAMA	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
PUERTAS CAMARGO YANDERSON JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
CIRO VILLEGAS RAMON ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
SEVILLA FUENTES JOHAN JOSE	01	00	X															0	29	29	29	29	PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	NUEVA EPS	$ 1.692.542	$ 211.600	ARL SURA	$ 1.692.542	$ 117.900	COMFAMA	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 33.900	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 762.900
LAMBRANO MARTINEZ ISSAC DAVID	01	00	X															0	6	6	5	6	COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	ARL SURA	$ 291.818	$ 20.400	COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.500
BURGOS OVIEDO ANTONIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
ZAMBRANO URIANA WILSON ENRIQUE	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 700.362	$ 112.100	FAMISANAR EPS	$ 700.362	$ 28.100	ARL SURA	$ 700.362	$ 49.800	COMFAMA	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100
EPIEYU JOSE DARIO	01	00		X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
ZAMBRANO URIANA RICHARD	01	00	X															0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 1.109.907	$ 177.500	EPS SANITAS	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
PUSHANA GERVACIO	01	00	X															0	19	19	19	19	COLPENSIONES	$ 1.109.907	$ 177.500	NUEVA EPS	$ 1.109.907	$ 44.400	ARL SURA	$ 1.109.907	$ 77.200	COMFAMA	$ 1.109.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
HOYOS RADA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	ARL SURA	$ 583.635	$ 40.700	COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CORTEZ PEREZ JOSE GREGORIO	01	00	X															0	12	12	12	12	PROTECCION	$ 700.362	$ 112.100	NUEVA EPS	$ 700.362	$ 28.100	ARL SURA	$ 700.362	$ 49.800	COMFAMA	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100

Pagado: 04/06/2026 | Empresa NI902046317 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MJM SAS | Planilla Nro: 85646366 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

.LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
SUAREUCO JOVO YOHANDER DAVID	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 68.364	$ 9.400	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 68.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 68.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
FRONTADO ORTIZ ELIECER ADONAY	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
VASQUEZ PADILLA GUSTAVO JOSUE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 68.364	$ 9.400	SAVIA SALUD	$ 68.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 68.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
NUÑEZ PEREZ LEANDRO ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
NUÑEZ CHACIN ANGEL ANTONIO	01	00	X															0	11	11	11	11	COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 641.999	$ 25.700	ARL SURA	$ 641.999	$ 44.700	COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.900
ROMERO ROMERO GABINO SEGUNDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 68.364	$ 9.400	EPS SURA	$ 68.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 68.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
GABRILES OJEDA JHAIR NAZARETH	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 68.364	$ 9.400	SALUD TOTAL EPS	$ 68.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 68.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
GONZALEZ GONZALEZ JAIRDEYOR DAVID	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 68.364	$ 9.400	NUEVA EPS	$ 68.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 68.364	$ 4.100	COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
SATICA GARCIA YERSON EFRAIN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.760.905	$ 121.900	COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

.ES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
09	$ 39.979.009	$ 39.979.009	$ 39.979.009	$ 6.399.000	$ 0	$ 0	$ 1.745.500	$ 2.784.600	$ 1.601.700	$ 33.900	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.615.600	$ 10.100	$ 12.625.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GIOVANY DE JESUS RIVERA ACEVEDO identificado(a) con CC 98504976 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900369866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,826,637	$612,300
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,826,637	$266,400
CCF	COMFAMA	30	4%	$3,826,637	$153,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,826,637	$153,100

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 09:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE RAUL GARCIA ESTEVEZ identificado(a) con CC 71278258 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,187,506	$510,100
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,187,506	$221,900
CCF	COMFAMA	30	4%	$3,187,506	$127,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,187,506	$127,600

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KATERINE MESA CALDERON identificado(a) con CC 1018348884 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S Nit 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	7	16%	$1,400,000	$224,000
ARL	ARL SURA	7	6.96%	$1,400,000	$97,500
CCF	COMFAMA	7	4%	$1,400,000	$56,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	7	4%	$1,400,000	$56,000

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 09:52.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA VILLEGAS GIRALDO identificado(a) con CC 1017222344 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,600,000	$576,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,600,000	$250,600
CCF	COMFAMA	30	4%	$3,600,000	$144,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,600,000	$144,000

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 10:08.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OLMAN SNEYDER RINCON GAVIRIA identificado(a) con CC 1096208927 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	22	16%	$4,400,000	$704,000
ARL	ARL SURA	22	6.96%	$4,400,000	$306,300
CCF	COMFAMA	22	4%	$4,400,000	$176,000
EPS	SANITAS	22	4%	$4,400,000	$176,000

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 09:58.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERGIO AMAURY DURANGO ZORA identificado(a) con CC 98505041 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S Nit 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,100,000	$976,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,100,000	$424,600
CCF	COMFAMA	30	4%	$6,100,000	$244,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$6,100,000	$244,000

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 09:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILMAR MOSQUERA CASTAÑO identificado(a) con CC 15443626 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900939866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,500,000	$400,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,500,000	$174,000
CCF	COMFAMA	30	4%	$2,500,000	$100,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,500,000	$100,000

Este certificado se expide el día 2026-07-08 a las 09:57.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN FELIPE QUINTERO ALZATE identificado(a) con CC 1036134451 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NI 900339866

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	459326201	9507642458	E	2026-07-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,895,457	$463,300
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,895,457	$201,600
CCF	COMFAMA	30	4%	$2,895,457	$115,900
EPS	SAVIA SALUD	30	4%	$2,895,457	$115,900

Este certificado se expide el día 2026-08-19 a las 03:03.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 05:35:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86776135

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 08/07/2026

DEL APORTANTE

ɔcial	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MJM SAS		
ıto	NI902046317	**Dirección**	CL 48 #38 - 45
:mpresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2272711
ɜona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ıtante Legal	MENDEZ AREVALO JOSE ANGEL	**Identificación**	CC 93396207
lados	38	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
VALENTINA CEBALLOS QUINTERO	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 933.816	$ 149.600	(EPS010) EPS SURA	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
JEFFERSON ENRIQUE ROMERO CAMARGO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
FABIAN DAVID DELGADO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JUAN ESTEBAN GOMEZ CIRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
LUIS CARLOS GOMEZ CIRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CARLOS DANIEL ORTIZ LOPEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PORVENIR	$ 1.676.816	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.676.816	$ 63.100	6,960	$ 1.676.816	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.676.816	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
EDIER BANQUET HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
RONAL NAVARRO SOÑETH	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JOSE MANUEL VALENZUELA VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JUAN DAVID NAVARRO ARGUMEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
YANDERSON JOSE PUERTAS CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JESUS MIGUEL HERNANDEZ JIMENEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.600	(CCF04) COMFAMA	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.700
RAMON ANTONIO CIRO VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
SANTIAGO ANDRES LICONA GARCIA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
ESTEBAN MANUEL SILVA ROJAS	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
ANTONIO LUIS BURGOS OVIEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
WILSON ENRIQUE ZAMBRANO URIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
RICHARD ZAMBRANO URIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
ENZO BRACHO GONZALEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 466.908	$ 74.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 466.908	$ 18.400	6,960	$ 466.908	$ 32.600	(CCF04) COMFAMA	$ 466.908	$ 18.700	$ 9.460	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 207.900

lace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 08/07/2026 | **Empresa NI902046317 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MJM SAS** | **Planilla Nro: 86776135** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio de 2026**

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado / Novedades / Pensiones / Salud / Riesgos / Cajas / Parafiscales / Total

Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
/ORLIN CHRIPUA OLEA	01	00	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 683.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 683.635	$ 23.400	6,960	$ 683.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 683.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
.EANDRO GABRIEL ABREU /ONTIEL	01	00	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.283.997	$ 61.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.283.997	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
NESTOR DE JESUS MARTINEZ ESCOBAR	01	05	X	X														0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600
CARLOS MARIO CARDONA /OAIZA	01	00	X	X														0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 16.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.300
EDILBERTO JOSE GONZALEZ APUSHANA	01	00	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.283.997	$ 61.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.283.997	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
EDUARDO SEGUNDO GONZALEZ APUSHANA	01	00	X															0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.676.816	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.676.816	$ 63.100	6,960	$ 1.676.816	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.676.816	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
/URY YOJANA PINZON LOPEZ	01	00		X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 68.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 68.364	$ 2.400	6,960	$ 68.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
EBEL LEON TORREGLOSA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
IOSE JOAQUIN PICO MIRANDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
LUIS ALBERTO URIELES MORIEGA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
OSVALDO ENRIQUE MANJARREZ ROMERO	01	00	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 683.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 683.635	$ 23.400	6,960	$ 683.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 683.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
IOSE ANGEL MENDEZ AREVALO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
IOSE GREGORIO CORTEZ PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
IOSE GREGORIO MORENO CHIRINOS	01	00	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 683.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 683.635	$ 23.400	6,960	$ 683.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 683.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
ELIECER ADONAY FRONTADO ORTIZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
GUSTAVO JOSUE VASQUEZ PADILLA	01	00		X														0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 817.089	$ 130.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 58.900	(CCF04) COMFAMA	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
LEANDRO ENRIQUE NUÑEZ PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
ANGEL ANTONIO NUÑEZ CHACIN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. NOVILIDAD	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.300
YERSON EFRAIN GATICA GARCIA	01	00		X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 68.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 68.364	$ 2.400	6,960	$ 68.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 68.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300

TALES

isión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
632.439	$ 46.749.166	$ 46.749.166	$ 46.749.166	$ 7.463.200	$ 1.911.800	$ 3.255.300	$ 1.872.100	$ 9.400	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.525.900	$ 22.200	$ 14.548.100

lace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 900339866-2

CERTIFICADO DE EXONERACIÓN PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO AL ART. 114 DE ESTATUTO TRIBUTARIO

Fecha: 14/08/2026

Señores: EDESO
Ciudad

Ref contrato: Contrato IP-006-2026 Construcción de Andenes, Comuna 1 LIBORIO MEJIA del Municipio de Rionegro

Yo, **FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO**, identificado con cedula de ciudadanía No 98.504.713 en mi condición de representante legal de la empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS** identificada con NIT **900339866-2**, certifico que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo al artículo 114 de estatuto tributario

Dada en Puerto Nare (ANT.), a los 14 días del mes de Agosto de 2026

Cordialmente,

FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO
Representante Legal
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168796909	582530487	20/08/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900339866**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.3.196.117**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 306,408.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 306,408.00	COP$ 306,408.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168796909	582530487	20/08/2026

Número de Identificación
900339866

Primer Nombre ó Razón Social
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
Calle 46 Nro. 6-30

Ciudad de Domicilio
Puerto Nare, Antioquia

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3136027459

Correo electrónico
administracion@cycnare.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
IPS-006-2026

Nombre Obra
obras de construccion de anden

Fecha Inicio Obra
11/05/2026

Fecha Terminación Obra
25/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
RIONEGRO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
3547603146.00

Costo Total Mano de Obra
30805274.00

Número de Trabajadores en el Periodo
7

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
306408.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
306408.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168795902	582489754	20/08/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900339866**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.3.196.117**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 306,408.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 306,408.00	COP$ 306,408.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168795902	582489754	20/08/2026

Número de Identificación
900339866

Primer Nombre ó Razón Social
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
Calle 46 Nro. 6-30

Ciudad de Domicilio
Puerto Nare, Antioquia

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3136027459

Correo electrónico
administracion@cycnare.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
IP-006-2026

Nombre Obra
Construccion de andenes comuna

Fecha Inicio Obra
11/05/2026

Fecha Terminación Obra
25/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
RIONEGRO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
3547603146.00

Costo Total Mano de Obra
28388347.00

Número de Trabajadores en el Periodo
7

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
306408.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
306408.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168792949	582379621	20/08/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900339866**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.3.196.117**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 262,636.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 262,636.00	COP$ 262,636.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168792949	582379621	20/08/2026

Número de Identificación
900339866

Primer Nombre ó Razón Social
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
Calle 46 Nro. 6-30

Ciudad de Domicilio
Puerto Nare, Antioquia

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3136027459

Correo electrónico
administracion@cycnare.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
IP-006-2026

Nombre Obra
obras de construccion de anden

Fecha Inicio Obra
11/05/2026

Fecha Terminación Obra
25/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
RIONEGRO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
3547603146.00

Costo Total Mano de Obra
23402706.00

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
262636.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
262636.00

ecollect
Seguro para ti

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellín	1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Puerto Nare 5 8 5

41. Dirección principal
CL 48 3 55

42. Correo electrónico gerencia@cycnare.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 4 7 0 0 9	3 1 3 6 0 2 7 4 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 1 2 2 1	4 2 1 0	2 0 1 0 1 2 2 1	9 6 0 1	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-01-17 / 04:19:21PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GALEANO CIRO FERLEDY DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descapitalizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 0 0 0 8	9 7
73. Fecha	2 0 1 0 0 1 2 7	2 0 1 1 1 2 1 0
74. Número de notaría	1	1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 1 2	2 0 1 1 1 2 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 4 2 9 5 6	4 2 9 5 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	5 8 5	5 2

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 1 2 7
81. Hasta	2 0 4 0 0 1 2 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 8	2 0 1 4 0 4 0 1		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 5 0 4 7 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALEANO	CIRO	FERLEDY	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 9 4 0 1 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	QUINTANA	MARIA	LEONOR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 0 6 9 2 6 7		8 4 0 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	PARRA	ROSALBA	DE JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 9 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín	1 1

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 2 1 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUENO

Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueno

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/07/2026 - 15:15:02
Recibo No. S000408216, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jNuQd8UnRr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/52 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
Nit : 900339866-2
Domicilio: Puerto Nare, Antioquia

MATRÍCULA

Matrícula No: 42956
Fecha de matrícula: 12 de febrero de 2010
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 48 NRO 3 55
Barrio : BRR EL CENTRO
Municipio : Puerto Nare, Antioquia
Correo electrónico : gerencia@cycnare.com
Teléfono comercial 1 : 8347009
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3136027459

Dirección para notificación judicial : CL 48 NRO 3 55
Barrio : BRR EL CENTRO
Municipio : Puerto Nare, Antioquia
Correo electrónico de notificación : gerencia@cycnare.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2010008 del 27 de enero de 2010 de la Notaria Unica de Puerto Nare, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2010, con el No. 2411 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS Y COMPAÃ‘IA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública del 10 de diciembre de 2011 de la Notaria Unica de Puerto Nare, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2011, con el No. 3051 del Libro IX, se inscribió SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 10 de diciembre de 2061.

OBJETO SOCIAL

articulo no. 4. Objeto social: La sociedad tendra como objeto principal, las siguientes actividades: 1. Obras civiles hidraulicas. 2. Obras sanitarias y ambientales. 3. Sistemas de comunicacion y obras complementarias. 4. Edificaciones y obras de urbanismo. 5. Montajes electromecanicos y obras complementarias. 6. Obras para mineria e hidrocarburos. 7. Obras de transporte y complementarios. 8. Servicios generales: (Sistemas de seguridad social, instrumentacion y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, distribucion y/o evacuacion de productos industriales, cercas electricas de seguridad). 9. Consultores con especialidad en agricultura y desarrollo rural. 10. Consultores con especialidad en regiones climaticas tropicales. 11. Consultores con especialidad en estudios macroeconomicos. 12. Consultores con especialidad en aprovechamiento y uso de la tierra, descripcion y evaluacion de drenajes. 13. Consultores con especialidad en aprovechamiento y uso de los recursos hidricos. 14. Consultores con especialidad en infraestructura fisica. 15. Consultores con especialidad en infraestructura social. 16. Consultores con especialidad en mecanizacion agricola, movimiento de tierra. 17. Especialidad en control de plagas, enfermedades y malezas. 18. Consultores con especialidad en servicios ganaderos; salud animal. 19. Consultores con especialidad forestal; economia forestal. 20. Consultores con especialidad en pesca; politicas de desarrollo pesquero. 21. Consultores con especialidad en turismo. 22. Consultores con especialidad ambiental; planeacion y legislacion. 23. Consultores con especialidad en medidas de proteccion ambiental. 24. Consultores con especialidad en telecomunicaciones; organizacion. 25. Consultores con especialidad en sistemas de telefonia masiva, telegrafo y telex. 26. Consultores con especialidad en transporte; organizacion del transporte, planeacion del transporte regional, nacional y multimodal. 27. Consultores con especialidad en infraestructura para transporte vial. 28. Consultores con especialidad en serviciado transporte por carretera. 29. Consultores con especialidad en vias de navegacion interior. 30. Consultores con especialidad en desarrollo urbano; planeamiento en desarrollo urbano. 31. Consultores con especialidad en planeacion, diseños de ingenieria y aplicaciones en proyectos de vivienda. 32. Consultores con especialidad en suministro de agua y saneamiento. 33. Consultores con especialidad en saneamiento; sistema de recoleccion de aguas residuales. 34. Consultores con

especialidad en desechos de solidos. 35. Consultores cón especialidad en planeacion y gestion publica. 36. Consultores con especialidad en sistemas de informacion. 37. Consultores con especialidad en gestion de proyectos. 38. Consultores con especialidad en servicios basicos de ingenieria aerofotogrametria e imagenes por satelite. 39. Efectuar avaluos urbanos y rurales. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podra ademas. 1. Hacer cualquier clase de inversiones. 2. Formar parte de otras compañias. 3. Adquirir inmuebles, venderlos, permutarlos o gravados. 4. Ocuparse de la importacion, compra, venta, distribucion y fabricacion de equipos de toda naturaleza, materias primas. 5. Dedicarse a cualquier otro negocio licito de comercio o industria, siempre que la operacion, acto o contrato sea relativo a su objeto principal. 6. Celebrar todas las operaciones de credito que le permitan obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa. 7. Otorgar, aceptar o cumplir mandatos para asuntos licitos, sean de caracter general o especial, judicial o extrajudicial. 8. Recibir bienes para su administracion. 9. Adquirir o explotar patentes, concesiones o constituirse en agente o representante de otros comerciantes. 10. Asociarse o contratar servicios de terceros. 11. Constituir compañias filiales para el establecimiento y explotacion de empresas destinadas a la realizacion de cualquiera de las actividades contenidas en su objeto social. 12. Establecer talleres, almacenes, depositos, centros de explotacion y demas establecimientos industriales o comerciales que sean necesarios, para el normal desarrollo de su objeto. 13. Tomar interes como participe, asociado o accionista, fundadora, en otras empresas de objeto analogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a esas empresas. 14. Enajenar sus cuotas, derechos o cuotas sociales en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas. 15. Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demas derechos de la propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotacion. 16. En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles e inmuebles, de caracter civil o comercial que guarden relacion con el objeto social expresado en este articulo. 17. Ejecutar todos los actos y contratos conducentes a lograr la finalidad de la compañia. Paragrafo: Queda totalmente prohibido a la sociedad constituirse en garante de obligaciones de terceros y caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas a las propias. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podra ser asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitucion, ingrese a ellas por adquirir interes social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier titulo, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o juridicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de. Credito, otorgando las garantias del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interes o sin el, exigir u otorgar las garantias reales o personales que, se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como

fin acrecer su patrimonio; girar: Aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de titulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro, de los limites y en las condiciones previstas, por la ley y estos. Articulo no. 4: Objeto social: La sociedad tendrá una adiccion a su objeto principal, y se anexaran las siguientes actividades: Mantenimiento y reparacion especializado de productos elaborados en metal y de maquinaria y equipo. Recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos, recuperacion de materiales. Recoleccion de desechos. Recoleccion de desechos no peligrosos. Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos. Recuperacion de materiales. Construccion de edificios. Construccion de edificios residenciales. Construccion de edificios no residenciales. Obras de ingenieria civil. Construccion de carreteras y vías de ferrocarril. Construccion de proyectos de servicio publico. Construccion de otras obras de ingenieria civil. Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil. Demolicion y preparacion del terreno. Demolicion. Preparacion del terreno. Instalaciones electricas, de fontaneria y otras instalaciones especializadas. Instalaciones electricas. Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado. Otras instalaciones especializadas. Terminacion y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil. Transporte terrestre publico automotor. Transporte de pasajeros. Transporte mixto. Transporte de carga por carretera. Transporte fluvial. Transporte fluvial de pasajeros. Transporte fluvial de carga. Manipulacion de carga. Otras actividades complementarias al transporte. Actividades inmobiliarias. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucion o por contrata. Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis tecnicos. Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica. Ensayos y analisis tecnicos. Actividades especializadas de diseño. Actividades de alquiler y arrendamiento. Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores. Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.C.P. Otras actividades de suministro de recurso humano. Actividades de servicios a edificios y paisajismo jardines, zonas verdes. Actividades combinadas de apoyo a instalaciones. Actividades de limpieza. Limpieza general interior de edificios. Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales. Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Actividades administrativas y de apoyo de oficina. Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina. Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina. Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 40.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 40.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 40.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

artículo no. 9. Representante legal: La representacion legal de la sociedad y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo del gerente. El suplente del gerente lo reemplazara en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendra las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazar. Facultades del representante legal: En desarrollo de o contemplado en los artículos 99 y 196 del código de comercio, son funciones y facultades del representante legal las propias de su cargo y en especial las siguientes: A. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales, etc. B. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. C. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social. En ejercicio de esta facultad podrá: Adquirir, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaría o hipotecaria, recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; d. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza, e. Presentar a los accionistas en forma periódica, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales, f. Presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 del código de comercio, g. Designar, promover y remover el personal administrativo de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro árgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc., Y hacer los despidos del caso, h. Convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones de cualquier carácter, i. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los limites señalados en estos

estatutos, j. Cuidar la recaudación e inversion de los fondos de la empresa, k. Velar por que todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular, l. Todas las demás funciones no atribuidas por los accionista(s) u otro órgano social que tengan relación con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás que le delegue la ley, la asamblea general. Parágrafo. Limitación al gerente: El gerente y /o suplente del gerente requerirá de autorización de la asamblea de accionistas, para celebrar y ejecutar contratos, cuando la cuantía del mismo fuere igual o superior á doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv). Artículo no. 10. Prohibiciones a administradores: Salvo en los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se confieran. Tampoco podrán votar en la aprobación de balances, ni cuentas de fin de ejercicio, ni en las de liquidación del patrimonio social.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública del 10 de diciembre de 2011 de la Notaria Unica de PUERTO NARE, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2011 con el No. 3051 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO	C.C. No. 98.504.713

Por Acta No. 39 del 10 de abril de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2025 con el No. 13271 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	VACANTE VACANTE	**********

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 19 de agosto de 2017 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2017 con el No. 6081 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF

CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUENO

Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueno

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/07/2026 - 15:15:04
Recibo No. S000408216, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jNuQd8UnRr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/52 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISOR FISCAL ROSALBA DE JESUS GARCIA PARRA C.C. No. 22.069.267 84044-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 97 del 05 de abril de 2011 de la Notaria Unica Puerto Nare	2858 del 24 de junio de 2011 del libro IX
*) E.P. del 10 de diciembre de 2011 de la Notaria Unica Puerto Nare	3049 del 28 de diciembre de 2011 del libro IX
*) E.P. del 10 de diciembre de 2011 de la Notaria Unica Puerto Nare	3051 del 28 de diciembre de 2011 del libro IX
*) E.P. del 25 de febrero de 2014 de la Notaria Unica Puerto Nare	4151 del 25 de abril de 2014 del libro IX
*) Acta No. 6 del 29 de enero de 2015 de la Asamblea De Accionistas	4485 del 05 de febrero de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 270 del 16 de noviembre de 2018 de la Notaria Unica Puerto Nare	6859 del 19 de noviembre de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUENO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: S9601 F4111

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL

CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUENO

Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/07/2026 - 15:15:04
Recibo No. S000408216, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jNuQd8UnRr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/52 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4.346.185.115,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4111.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Diana C. Bedoya R.
Diana Carolina Bedoya Rivera
Secretaria

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092830463

(415)7707212489984(8020) 001876409283046 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900339866	2				

11. Razón social

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. CL 48 3 55	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSC	2,001	3,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764092830463

(415)7707212489984(8020) 001876409283046 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900339866	2				

11. Razón social: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 48 3 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Puerto Nare

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-05-06 / 11:14:10 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: GALEANO CIRO FERLEDY DE JESUS

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 98504713 — 1004. DV: 3

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

997. Fecha formalización: 2025-05-06/11:14:10

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 900339866-2

CERTIFICADO GASTOS ANTICIPO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN

Yo, **FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO**, identificado con cedula de ciudadanía No **98.504.713** en mi condición de representante legal de la empresa **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS** identificada con NIT **900339866-2**, certifico que el anticipo recibido fue invertido según el plan de inversión presentado

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Compra de prefabricados	$ 280.757.750,00	79%
2	Subcontrato de mano de obra	$ 74.002.564,30	21%
Total		**$ 354.760.314,30**	**100%**

Tabla 1. Plan de inversión presentado

GASTADO EN ANTICIPO A PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA	
Prefabricados J&A	$ 70.000.000,00
IDC Pavimentos	$ 120.000.000,00
Comprecolor	$ 30.688.125,00
Mano de Obra - Ingeniería y Construcciones MJM	$ 148.005.500,00
Total gastado	**$ 368.693.625,00**

Tabla 2. Gatos Plan de inversión presentado

Se expide la presente certificación a solicitud de la EDESO – Empresa de Desarrollo Sostenible

Se firma a los 14 días del mes de agosto del año 2026 en Rionegro, Antioquia

~~FERLEDY~~ DE JESUS GALEANO CIRO
Representante Legal
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Sábado, 04 de julio de 2026, 2:22:05 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Prefabricados Jya

Producto destino
325 - 000026 - 22

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
04 Jul 2026

Identificación destinatario
901785109

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 20.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.3.196.117

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Sábado, 25 de julio de 2026, 9:34:32 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Prefabricados Jya

Producto destino
325 - 000026 - 22

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 Jul 2026

Identificación destinatario
901785109

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 20.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Sábado, 16 de mayo de 2026, 9:13:00 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
16 May 2026

Nombre del destinatario
Prefabricados Jya

Identificación destinatario
901785109

Producto destino
325 - 000026 - 22

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 30.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.190.123.5

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Miércoles, 20 de mayo de 2026, 3:36:17 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Idc Pavimentos Sas

Producto destino
647 - 000063 - 52

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
901301430

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 20.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Miércoles, 20 de mayo de 2026, 2:36:51 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Idc Pavimentos Sas

Producto destino
647 - 000063 - 52

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
901301430

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 100.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Miércoles, 20 de mayo de 2026, 3:31:53 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Conprecolor Sas

Producto destino
161 - 000213 - 01

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
901259334

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.095.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 206.84.81.218

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Sábado, 23 de mayo de 2026, 5:29:19 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Conprecolor Sas

Producto destino
161 - 000213 - 01

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
23 May 2026

Identificación destinatario
901259334

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 26.593.125,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.190.123.11

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Jueves, 14 de mayo de 2026, 8:32:13 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ingenieria Y Const

Producto destino
240 - 00178 - 02

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
14 May 2026

Identificación destinatario
902046317

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 118.005.500,00

Código
OKA

VIGILADO © SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Viernes, 08 de mayo de 2026, 8:42:54 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 May 2026

Nombre del destinatario
Ingenieria Y Const

Identificación destinatario
902046317

Producto destino
240 - 00178 - 02

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 20.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.9.221.90

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consult.asoc.y Cia - Nit: 900339866
Sábado, 09 de mayo de 2026, 6:57:38 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 May 2026

Nombre del destinatario
Ingenieria Y Const

Identificación destinatario
902046317

Producto destino
240 - 00178 - 02

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 10.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.9.221.90

Certificado
Bancario

Lunes, 22 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA identificado(a) con NIT 900339866, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25463098560	2010/10/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Puerto Nare 5 8 5

41. Dirección principal

CL 48 3 55

42. Correo electrónico gerencia@cycnare.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 4 7 0 0 9	3 1 3 6 0 2 7 4 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 1 2 2 1	4 2 1 0	2 0 1 0 1 2 2 1		9 6 0 1 4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALEANO CIRO FERLEDY DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-11-2025 03:48:31PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973294001

(415)7707212489984(8020) **000001497329400 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellin	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 0 0 0 8	9 7
73. Fecha	2 0 1 0 0 1 2 7	2 0 1 1 1 2 1 0
74. Número de notaría	1	1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 1 2	2 0 1 1 1 2 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 4 2 9 5 6	4 2 9 5 6
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	5 8 5	5 2

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 1 2 7
81. Hasta	2 0 4 0 0 1 2 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 8	2 0 1 4 0 4 0 1		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 5 0 4 7 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALEANO	CIRO	FERLEDY	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 9 4 0 1 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	QUINTANA	MARIA	LEONOR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973294001

(415)7707212489984(8020) 000001497329400 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 9 8 6 6	2	Impuestos de Medellin	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 0 6 9 2 6 7		8 4 0 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	PARRA	ROSALBA	DE JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 9 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973294001

(415)7707212489984(8020) **000001497329400 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellin 1 1	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 2 1 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 900339866-2

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
No. Rad:. 0771
Fch. Rad.: 19/08/2026 16:18:52

Rionegro, 19 de agosto de 2026

IP-06-09-2026

Señor (es):
EDESO
Gerente General

REF: Contrato de obra IP 006-2026 Obras de construcción de andenes, comuna 1 Liborio Mejía del municipio de Rionegro Antioquia

ASUNTO: Entrega de Acta parcial de obra No 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente y adjunto a este documento, entregamos acta parcial de obra No 1 con sus respectivos anexos.

Se relaciona contenido de sobre adjunto:

- Acta parcial de obra No 1
- Informe mensual No 1
- Informe mensual No 2
- Acta de aprobación de obras extras
- Bitácora
- Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes a parafiscales
- Certificado de exoneración de pago sistema seguridad social de acuerdo al Art. 114 del estatuto tributario
- Listado de personal y planilla de pago de seguridad social
- Certificado de existencia y representación Legal
- Copia resolución de facturación vigente
- Certificación de inversión conforme Plan de inversión de anticipo
- Soporte de gastos efectuados con el recurso del anticipo
- Certificación bancaria
- 1 memoria USD

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente,

FERLEDY DE JESUS GALEANO CIRO
Representante Legal
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS
