
CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1	**IDU-1839-2021 - ZONAS INDUSTRIALES G3-CLB-20250318**	**641 días**	**mié 19/01/22**	**vie 18/09/26**	**$59.265.899.210,00**		
2	Acta de inicio	0 días	mié 19/01/22	mié 19/01/22	$0,00		4;5
3	**FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**198 días**	**mié 19/01/22**	**mar 18/03/25**	**$616.197.036,00**		
4	PRELIMINARES UNUÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34KH	98 días	mié 19/01/22	mar 17/05/22	$304.848.815,00	2	8FC+1 día;10FC+1 día;16FC+1
5	reconocimiento economico	98 días	mié 19/01/22	mar 17/05/22	$81.311.364,00	2	8FC+1 día;10FC+1 día
6	**FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES ADICION**	**99 días**	**mar 19/11/24**	**mar 18/03/25**	**$230.036.857,00**		
7	**COMPONENTE TECNICO**	**99 días**	**mar 19/11/24**	**mar 18/03/25**	**$230.009.853,00**		
8	PRESENTACION HOJAS DE VIDA PARA GESTIONES PRELIMINARES	10 días	mar 19/11/24	sáb 30/11/24	$10.524.328,00	4FC+1 día;5FC+1 día	55
9	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**35 días**	**mar 19/11/24**	**mar 31/12/24**	**$98.254.324,00**		
10	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	30 días	mar 19/11/24	mar 24/12/24	$98.253.324,00	4FC+1 día;5FC+1 día	11
11	ENTREGA DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	0 días	mar 24/12/24	mar 24/12/24	$1.000,00	10	55;12
12	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	5 días	mar 24/12/24	mar 31/12/24	$0,00	11	13
13	APROBACION PRECIOS Y ENTREGA AL IDU	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	$0,00	12	55
14	REVISIÓN DOCUMENTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**94 días**	**mar 19/11/24**	**mié 12/03/25**	**$50.265.874,00**		
15	**14 CIVS**	**80 días**	**mar 19/11/24**	**lun 24/02/25**	**$25.133.437,00**		
16	REVISAR Y ESTUDIAR DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS	75 días	mar 19/11/24	mar 18/02/25	$25.132.437,00	4FC+1 día;5FC+1 día	25;57CC+30 días;17;33CC+70 días;21FC+1 día
17	ENTREGA DE INFORME DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 14 CIVS	0 días	mar 18/02/25	mar 18/02/25	$0,00	16	55;18;95FC+1 día
18	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 14 CIVS	5 días	mar 18/02/25	lun 24/02/25	$1.000,00	17	19
19	ENTREGA AL IDU INFORME 14 CIVS	0 días	lun 24/02/25	lun 24/02/25	$0,00	18	55
20	**16 CIVS**	**18 días**	**mié 19/02/25**	**mié 12/03/25**	**$25.132.437,00**		
21	REVISAR Y ESTUDIAR DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS	18 días	mié 19/02/25	mié 12/03/25	$25.132.437,00	16FC+1 día	41FC-3 días;55
22	EFECTUAR UNA VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO, CON LA ASISTENCIA	0 días	mar 3/12/24	mar 3/12/24	$0,00	4FC+13 días;5FC+13 días	24FC+3 días
23	TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	**60 días**	**vie 6/12/24**	**mar 18/02/25**	**$0,00**		

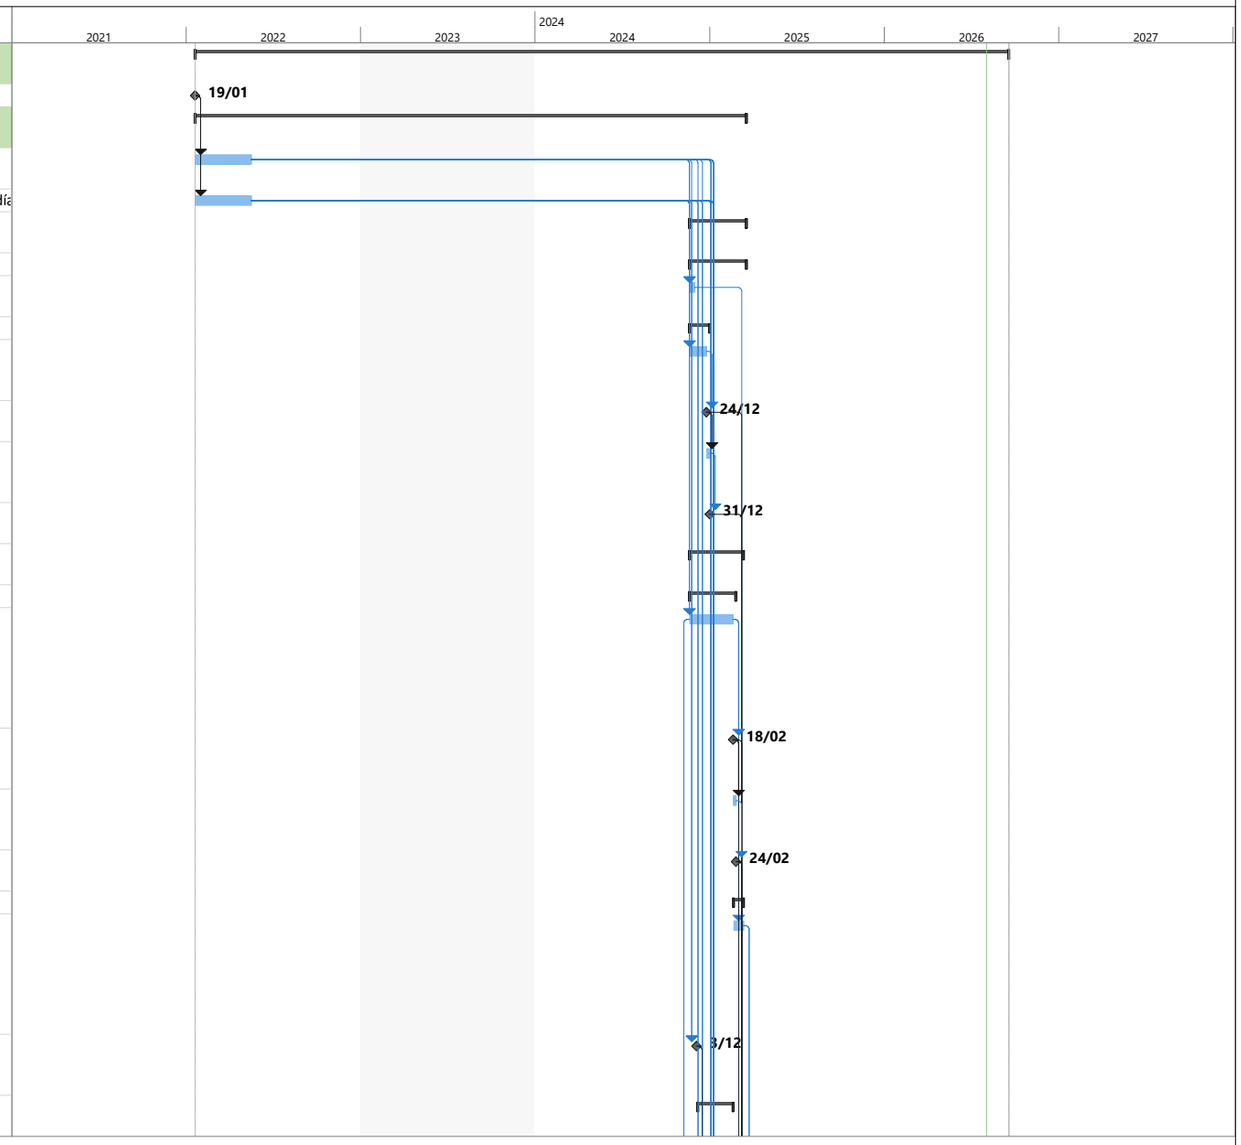


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
24	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	0 días	vie 6/12/24	vie 6/12/24	$0,00	22FC+3 días	55
25	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	0 días	mar 18/02/25	mar 18/02/25	$0,00	16	55
26	**PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS**	**10 días**	**mar 7/01/25**	**sáb 18/01/25**	**$24.538.952,00**		
27	REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O AJUSTE PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS	5 días	mar 7/01/25	lun 13/01/25	$24.537.952,00	4FC+40 días;5FC+40 días	28
28	ENTREGA DE INFORME PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS	0 días	lun 13/01/25	lun 13/01/25	$0,00	27	55;29
29	REVISION DEL PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	5 días	lun 13/01/25	sáb 18/01/25	$1.000,00	28	30
30	APROBACION PLAN Y ENTREGA AL IDU	0 días	sáb 18/01/25	sáb 18/01/25	$0,00	29	55
31	**PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN**	**29 días**	**mié 12/02/25**	**mar 18/03/25**	**$29.671.508,00**		
32	**14 CIVS**	**10 días**	**mié 12/02/25**	**lun 24/02/25**	**$21.121.191,00**		
33	CALCULO Y ANALISIS DE CANTIDADES PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO 14 CIVS	5 días	mié 12/02/25	mar 18/02/25	$6.776.870,00	16CC+70 días	34;35CC
34	ENTREGA DE PRESUPUESTO 14 CIVS	0 días	mar 18/02/25	mar 18/02/25	$0,00	33	55;38
35	ANALISIS, SECTORIZACION DEL PROYECTO	4 días	mié 12/02/25	lun 17/02/25	$12.569.874,00	33CC	36CC+1 día
36	ELABORACION DEL PDT ENTAPA DE CONSTRUCCION 14 CIVS	4 días	jue 13/02/25	mar 18/02/25	$1.773.447,00	35CC+1 día	37
37	ENTREGA DE PDT ETAPA DE CONSTRUCCION 14 CIVS	0 días	mar 18/02/25	mar 18/02/25	$0,00	36	55;38
38	REVISION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 14 CIVS	5 días	mar 18/02/25	lun 24/02/25	$1.000,00	34;37	39;48CC
39	APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION Y ENTREGA AL IDU 14 CIVS	0 días	lun 24/02/25	lun 24/02/25	$0,00	38	55
40	**16 CIVS**	**8 días**	**sáb 8/03/25**	**mar 18/03/25**	**$8.550.317,00**		
41	CALCULO Y ANALISIS DE CANTIDADES PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO 16 CIVS	5 días	sáb 8/03/25	vie 14/03/25	$6.776.870,00	21FC-3 días	42;43CC+1 día;51FC-2 días
42	ENTREGA DE PRESUPUESTO CIVS	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	41	45
43	ELABORACION DEL PDT ENTAPA DE CONSTRUCCION 16 CIVS	4 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	$1.772.447,00	41CC+1 día	44
44	ENTREGA DE PDT ETAPA DE CONSTRUCCION 16 CIVS	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	43	45

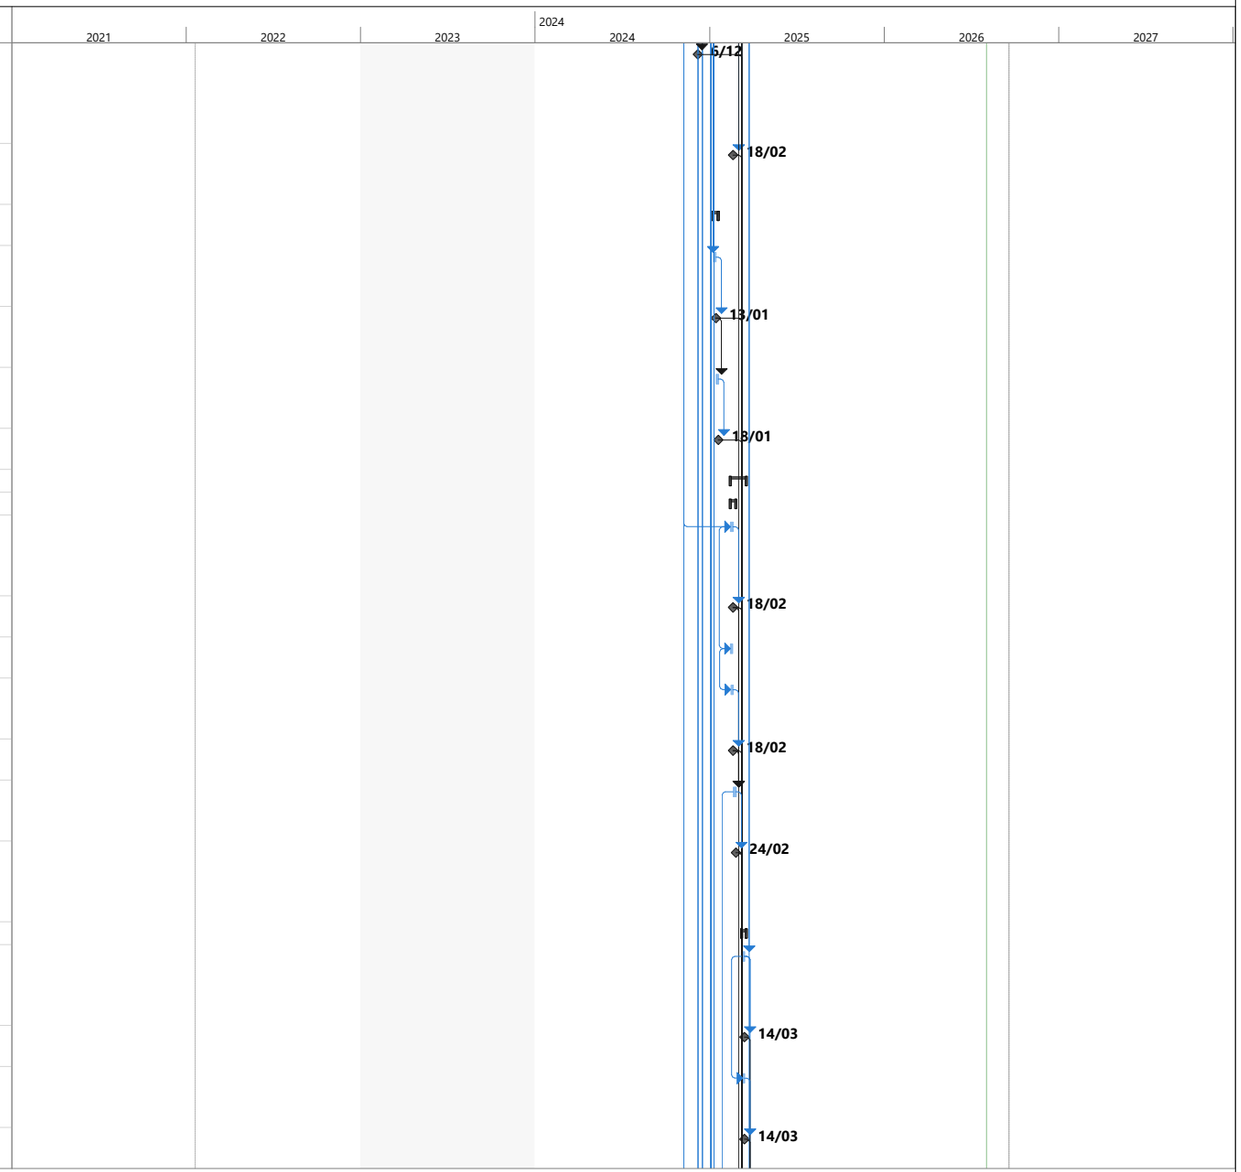


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
45	REVISION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 16 CIVS	3 días	vie 14/03/25	mar 18/03/25	$1.000,00	44;42	46
46	APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION Y ENTREGA AL IDU 16 CIVS	0 días	mar 18/03/25	mar 18/03/25	$0,00	45	55
47	**PAC**	**4 días**	**mar 18/02/25**	**sáb 22/02/25**	**$1.502.510,00**		
48	ELABORACION PAC	4 días	mar 18/02/25	sáb 22/02/25	$1.502.510,00	38CC	49
49	ENTREGA DE PAC	0 días	sáb 22/02/25	sáb 22/02/25	$0,00	48	55
50	**INFORME FINAL ETAPA**	**5 días**	**mié 12/03/25**	**mar 18/03/25**	**$15.252.357,00**		
51	ELABORACION INFORME GENERAL	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$15.251.357,00	41FC-2 días	52
52	ENTREGA DE INFORME	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	51	55;53
53	REVISION DE INFORME FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	3 días	vie 14/03/25	mar 18/03/25	$1.000,00	52	54
54	APROBACION DEL INFRME FINAL Y ENTREGA AL IDU	0 días	mar 18/03/25	mar 18/03/25	$0,00	53	55
55	FIN COMPONENTE TECNICO	0 días	mar 18/03/25	mar 18/03/25	$0,00	11;25;52;8;17;24;28;	1867FC+388 días;18
56	**COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.**	**16 días**	**mar 24/12/24**	**mié 15/01/25**	**$2.002,00**		
57	ELABORACIÓN Y ENTREGA A LA INTERVENTORÍA PMT PARA INICIO DE OBRA	5 días	mar 24/12/24	mar 31/12/24	$1.000,00	16CC+30 días	58
58	REVISIÓN DE LOS PMT´S TRAMOS INICIALES, POR LA INTERVENTORÍA, GENERACIÓN DE OBSERVACIONES	5 días	mar 31/12/24	mié 8/01/25	$1,00	57	59
59	ATENCIÓN A OBSERVACIONES	3 días	mié 8/01/25	sáb 11/01/25	$1.000,00	58	60
60	REVISION Y APROBACION POR LA INTERVENTORÍA	3 días	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	$1,00	59	61
61	RADICACIÓN PMT´s TRAMOS INCIALES ANTE LA SDM	0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$0,00	60	62
62	FIN COMPONENTE PMT	0 días	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$0,00	61	95
63	**COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD**	**12 días**	**vie 3/01/25**	**sáb 18/01/25**	**$4.002,00**		
64	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	1 día	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	$1.000,00	4FC+38 días;5FC+38 días	67
65	VERIFICACION DE PERMISO SILVICULTURAS Y ENTREGA DE INFORME SOBRE EL MISMO	1 día	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	$1.000,00	4FC+38 días;5FC+38 días	67
66	VERIFICACION Y/O ACTUALIZACION DEL MAO Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA	1 día	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	$1.000,00	4FC+38 días;5FC+38 días	67
67	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA, GENERACIÓN DE OBSERVACIONES	5 días	sáb 4/01/25	sáb 11/01/25	$1,00	64;65;66	68
68	ATENCIÓN A OBSERVACIONES	3 días	sáb 11/01/25	mié 15/01/25	$1.000,00	67	69
69	REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA INTERVENTORÍA	3 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	$1,00	68	70
70	FIN COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	0 días	sáb 18/01/25	sáb 18/01/25	$0,00	69	95
71	**COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**33 días**	**sáb 7/12/24**	**sáb 18/01/25**	**$21.000,00**		

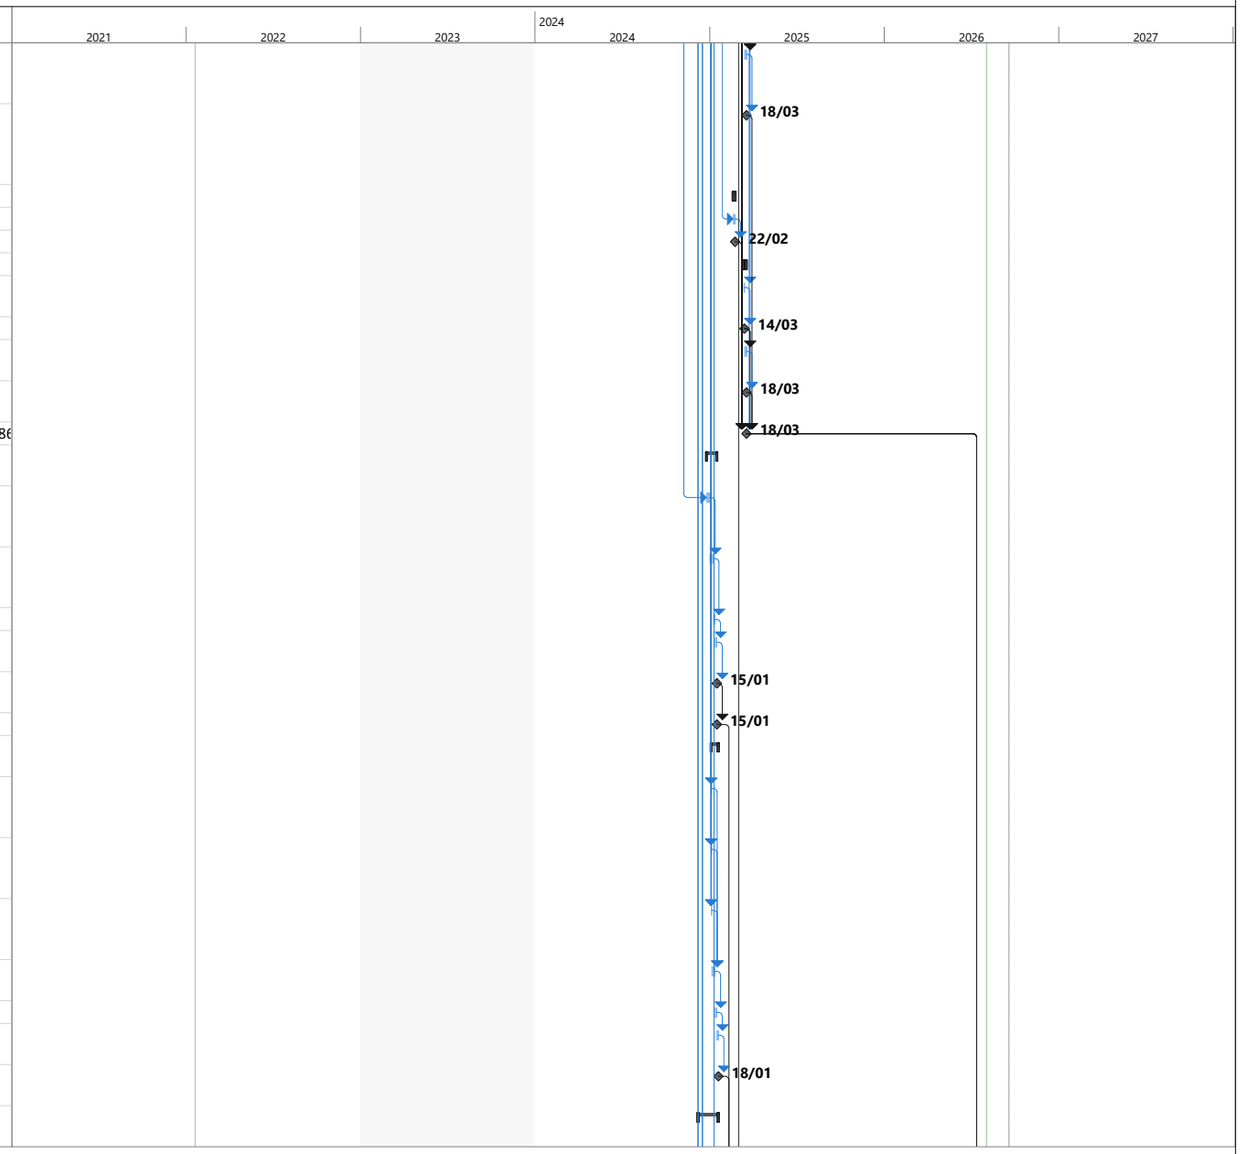


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
72	PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	1 día	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	$1.000,00	4FC+17 días;5FC+17 días	73
73	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	$1.000,00	72	74
74	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	10 días	mié 11/12/24	lun 23/12/24	$1.000,00	73	75
75	APROBACION	3 días	lun 23/12/24	vie 27/12/24	$1.000,00	74	93
76	DIRECTORIO DE ACTORES SOCIALES	1 día	jue 9/01/25	vie 10/01/25	$1.000,00	80CC	84FC+2 días;77
77	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$1.000,00	76	78
78	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	3 días	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$1.000,00	77	79
79	APROBACION	2 días	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	$1.000,00	78	93
80	METODOLOGIA DE ACTAS DE VECINDAD, INVENTARIO DE PREDIO Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	1 día	jue 9/01/25	vie 10/01/25	$1.000,00	4FC+42 días;5FC+42 días	76CC;81
81	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$1.000,00	80	82
82	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	3 días	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$1.000,00	81	83;530
83	APROBACION	2 días	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	$1.000,00	82	93
84	REUNION DE INICIO	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	$1.000,00	76FC+2 días	93
85	INSTALACION PUNTO IDU	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/24	$1.000,00	4FC+24 días;5FC+24	93;86
86	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	$1.000,00	85	87
87	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	12 días	mié 18/12/24	vie 3/01/25	$1.000,00	86	88
88	APROBACION	2 días	vie 3/01/25	mar 7/01/25	$1.000,00	87	93
89	INFORME DE ANTECEDENTES	1 día	jue 9/01/25	vie 10/01/25	$1.000,00	4FC+42 días;5FC+42	90
90	REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$1.000,00	89	91
91	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES	3 días	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$1.000,00	90	92
92	APROBACION	2 días	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	$1.000,00	91	93
93	FIN COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0 días	sáb 18/01/25	sáb 18/01/25	$0,00	92;84;85;79;83;88;7	95
94	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**439 días**	**mié 19/02/25**	**mar 18/08/26**	**$58.649.702.174,00**		
95	ACTA DE INICIO FASE DE EJECUCION	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	$0,00	17FC+1 día;93;70;62	98;169;248FC+20 día
96	**CIV 16000704 (25)**	**436 días**	**mié 19/02/25**	**jue 13/08/26**	**$2.235.478.024,00**		
97	**Preliminares**	**118 días**	**mié 19/02/25**	**mié 16/07/25**	**$2.554.174,00**		
98	Aprobación PMT por SDA costado noroccidental	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	$0,00	95	105;100
99	Aprobación PMT por SDA costado suroriental	0 días	mié 16/07/25	mié 16/07/25	$0,00	128FC+15 días	111
100	Cerramiento de obra	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	$0,00	98	101
101	Implementación de PMT	3 días	jue 20/02/25	lun 24/02/25	$0,00	100	102
102	Replanteo general	3 días	lun 24/02/25	jue 27/02/25	$2.554.174,00	101	105
103	**Alcantarillado combinado**	**237 días**	**jue 27/02/25**	**mié 17/12/25**	**$289.294.070,00**		
104	**Costado noroccidental**	**111 días**	**jue 27/02/25**	**mié 16/07/25**	**$139.449.157,00**		
105	Excavación	55 días	jue 27/02/25	mié 7/05/25	$40.778.209,00	98;102	106CC+3 días
106	Instalación de tubería	55 días	lun 3/03/25	sáb 10/05/25	$36.109.587,00	105CC+3 días	107CC+33 días
107	Rellenos	25 días	vie 11/04/25	jue 15/05/25	$22.406.325,00	106CC+33 días	108FC-15 días
108	Construcción de pozos	20 días	vie 25/04/25	mié 21/05/25	$17.204.298,00	107FC-15 días	123
109	Construcción sumideros	15 días	vie 27/06/25	mié 16/07/25	$22.950.738,00	128	121
110	**Costado suroriental**	**126 días**	**mié 16/07/25**	**mié 17/12/25**	**$135.443.804,00**		
111	Excavación	70 días	mié 16/07/25	mié 8/10/25	$23.359.952,00	128FC+15 días;99	112CC+3 días
112	Instalación de tubería	70 días	sáb 19/07/25	sáb 11/10/25	$45.443.256,00	111CC+3 días	113CC+33 días
113	Rellenos	40 días	vie 29/08/25	jue 16/10/25	$23.869.707,00	112CC+33 días	114FC-15 días
114	Construcción de pozos	20 días	sáb 27/09/25	mié 22/10/25	$17.697.451,00	113FC-15 días	130

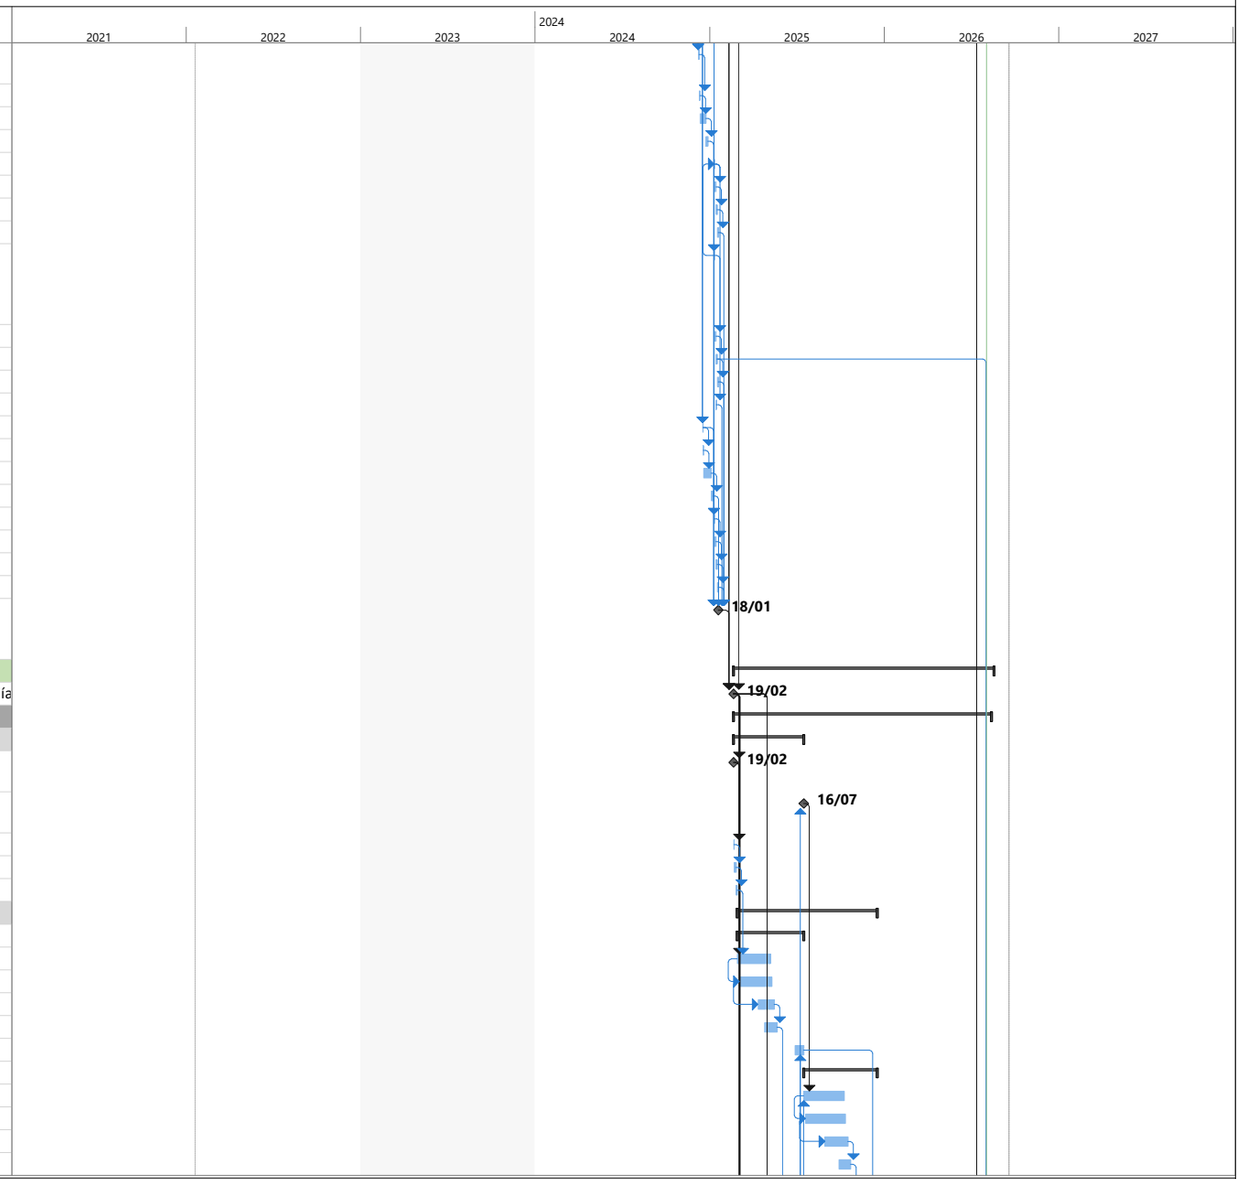


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
115	Construcción sumideros	15 días	vie 28/11/25	mié 17/12/25	$25.073.438,00	133	121
116	**Interseccion cr 42A bis - Cll 14**	**15 días**	**vie 28/11/25**	**mié 17/12/25**	**$14.401.109,00**		
117	Excavación	8 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	$6.880.618,00	133	118CC+3 días
118	Instalación de tubería	8 días	mar 2/12/25	vie 12/12/25	$3.320.481,00	117CC+3 días	119CC+6 días
119	Rellenos	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	$1.857.303,00	118CC+6 días	120FC-2 días
120	Construcción de pozos	5 días	jue 11/12/25	mié 17/12/25	$2.342.707,00	119FC-2 días	135;121
121	Fin alcantarillado	0 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25	$0,00	109;115;120	166
122	**Pavimentos**	**202 días**	**mié 21/05/25**	**lun 26/01/26**	**$1.200.732.034,00**		
123	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 21/05/25	mié 21/05/25	$0,00	108	125;130;135
124	**Costado noroccidental**	**30 días**	**mié 21/05/25**	**vie 27/06/25**	**$541.348.263,00**		
125	Excavación	10 días	mié 21/05/25	mar 3/06/25	$65.399.669,00	123	126CC+10 días
126	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mar 3/06/25	sáb 14/06/25	$97.261.983,00	125CC+10 días	127CC+5 días
127	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	lun 9/06/25	vie 20/06/25	$166.832.993,00	126CC+5 días	128
128	Pavimento en Concreto	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	$211.853.618,00	127	109;111FC+15 días;9
129	**Costado suroriental**	**30 días**	**mié 22/10/25**	**vie 28/11/25**	**$535.238.570,00**		
130	Excavación	10 días	mié 22/10/25	mar 4/11/25	$66.061.202,00	114;123	131CC+10 días
131	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mar 4/11/25	sáb 15/11/25	$95.849.296,00	130CC+10 días	132CC+5 días
132	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	lun 10/11/25	sáb 22/11/25	$164.412.901,00	131CC+5 días	133CC+5 días
133	Pavimento en Concreto	10 días	sáb 15/11/25	vie 28/11/25	$208.915.171,00	132CC+5 días	115;117;139;147FC+
134	**Interseccion cr 42A bis - Cll 14**	**31 días**	**mié 17/12/25**	**lun 26/01/26**	**$124.145.201,00**		
135	Excavación	12 días	mié 17/12/25	vie 2/01/26	$11.656.655,00	120;123	136CC+11 días
136	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mié 31/12/25	vie 16/01/26	$23.446.263,00	135CC+11 días	137CC+5 días
137	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	mié 7/01/26	jue 22/01/26	$40.221.699,00	136CC+5 días	138CC+3 días
138	Pavimento en Concreto	12 días	sáb 10/01/26	lun 26/01/26	$48.820.584,00	137CC+3 días	139
139	Fin pavimentos	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$0,00	133;138	166
140	**Acueducto**	**51 días**	**lun 5/01/26**	**vie 6/03/26**	**$109.712.842,00**		
141	Excavaciones	45 días	lun 5/01/26	vie 27/02/26	$11.361.926,00	147CC	142CC+3 días
142	Instalación de tubería	45 días	jue 8/01/26	mar 3/03/26	$84.749.614,00	141CC+3 días	143CC+23 días
143	Rellenos	25 días	jue 5/02/26	vie 6/03/26	$13.601.302,00	142CC+23 días	157;144;156
144	Fin acueducto	0 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26	$0,00	143	166
145	**Codensa**	**111 días**	**lun 5/01/26**	**jue 21/05/26**	**$299.113.772,00**		
146	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$0,00	133FC+29 días	147;153
147	Excavaciones	60 días	lun 5/01/26	mar 17/03/26	$13.158.105,00	133FC+5 días;146	148CC+3 días;141CC
148	Instalación de tubería	60 días	jue 8/01/26	vie 20/03/26	$141.341.865,00	147CC+3 días	149CC+23 días
149	Rellenos	60 días	jue 5/02/26	lun 20/04/26	$48.579.356,00	148CC+23 días	151
150	Cajas	60 días	vie 6/03/26	jue 21/05/26	$96.034.446,00	157CC	151
151	Fin codensa	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$0,00	150;149	166
152	**ETB**	**21 días**	**jue 7/05/26**	**mar 2/06/26**	**$25.079.601,00**		
153	Renivelación camaras	21 días	jue 7/05/26	mar 2/06/26	$25.079.601,00	159CC+9 días;146	154
154	Fin ETB	0 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$0,00	153	166

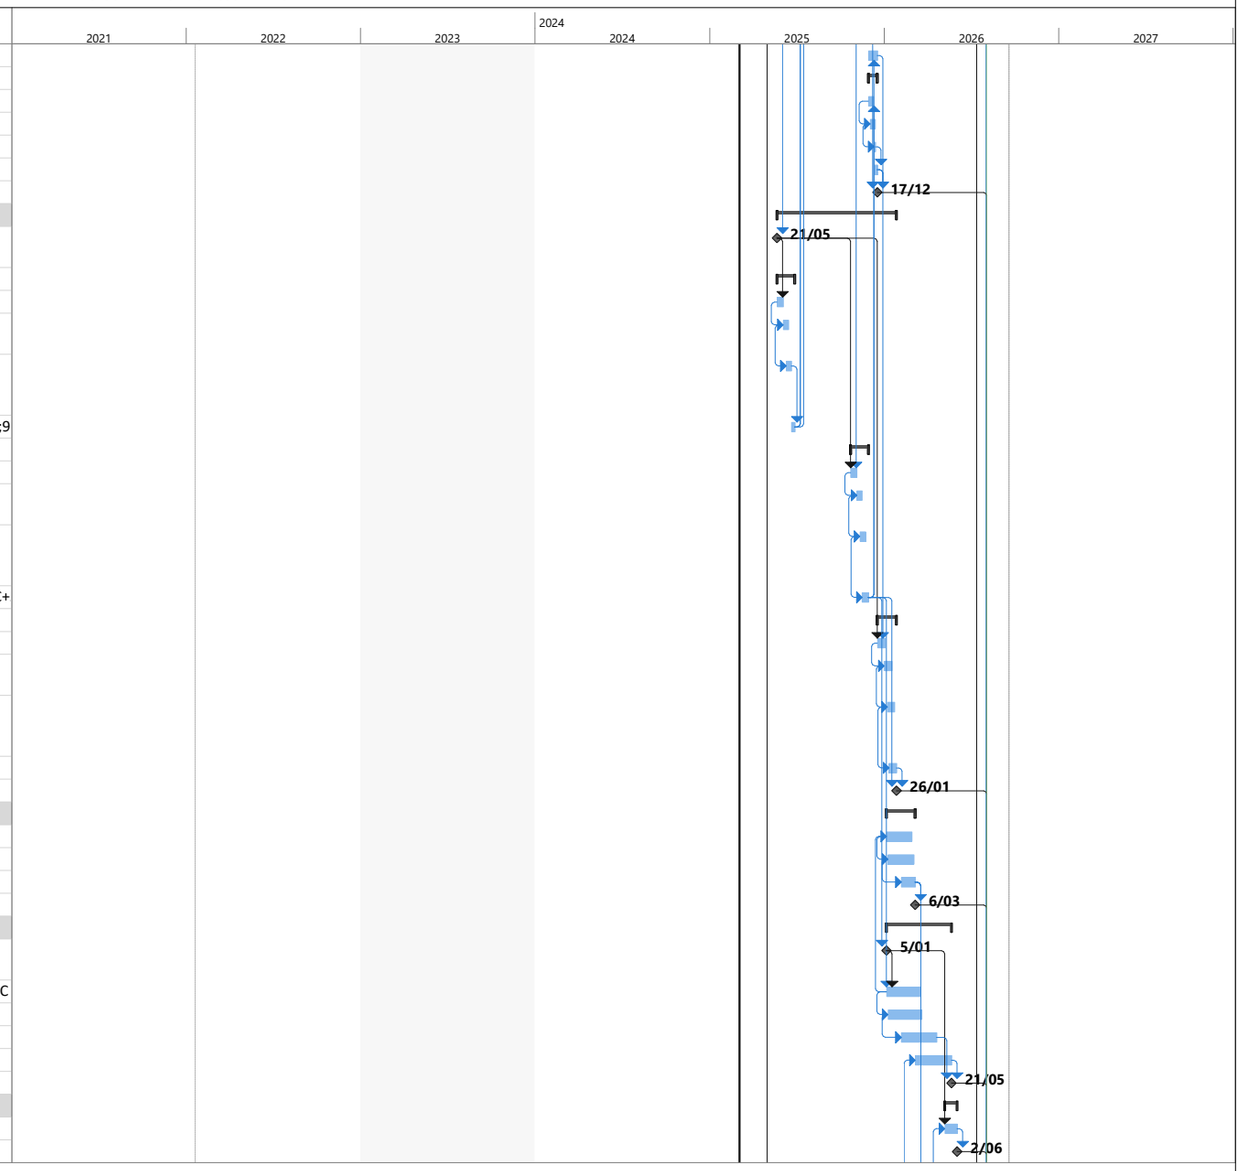


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
155	**Espacio público**	**70 días**	**vie 6/03/26**	**mar 2/06/26**	**$281.023.671,00**		
156	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26	$0,00	143	157
157	Excavación	60 días	vie 6/03/26	jue 21/05/26	$33.205.137,00	143;156	158CC+35 días;150C
158	Rellenos	30 días	lun 20/04/26	mié 27/05/26	$31.295.640,00	157CC+35 días	159CC+5 días
159	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	30 días	sáb 25/04/26	mar 2/06/26	$216.522.894,00	158CC+5 días	153CC+9 días;163;160;162
160	Fin Espacio publico	0 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$0,00	159	166
161	**Señalización**	**2 días**	**mar 11/08/26**	**jue 13/08/26**	**$27.967.860,00**		
162	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	159;666	163;164
163	Señalizacion vertical	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$6.841.135,00	159;162	165
164	Señalizacion horizontal	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$21.126.725,00	162	165
165	Fin señalización	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	164;163	166
166	Fin CIV	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	121;151;154;160;165	1870
167	**CIV 16000600 (24)**	**437 días**	**mié 19/02/25**	**vie 14/08/26**	**$2.038.712.129,00**		
168	**Preliminares**	**146 días**	**mié 19/02/25**	**mié 20/08/25**	**$2.503.651,00**		
169	Aprobación PMT por SDA costado noroccidental	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	$0,00	95	171
170	Aprobación PMT por SDA costado suroriental	0 días	mié 20/08/25	mié 20/08/25	$0,00	205FC+15 días	181
171	Cerramiento de obra	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	$0,00	169	172
172	Implementación de PMT	1 día	jue 20/02/25	vie 21/02/25	$0,00	171	173
173	Replanteo general	2 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	$2.503.651,00	172	176FC+12 días
174	**Alcantarillado sanitario**	**191 días**	**lun 10/03/25**	**vie 31/10/25**	**$206.774.450,00**		
175	**Costado noroccidental**	**61 días**	**lun 10/03/25**	**lun 26/05/25**	**$105.903.075,00**		
176	Excavación	50 días	lun 10/03/25	lun 12/05/25	$62.756.657,00	173FC+12 días	177CC+3 días
177	Instalación de tubería	50 días	jue 13/03/25	vie 16/05/25	$13.217.284,00	176CC+3 días	178CC+33 días
178	Rellenos	20 días	jue 24/04/25	mar 20/05/25	$12.463.428,00	177CC+33 días	179FC-10 días
179	Construcción de pozos	15 días	mié 7/05/25	lun 26/05/25	$17.465.706,00	178FC-10 días	188;185
180	**Costado suroriental**	**61 días**	**mié 20/08/25**	**vie 31/10/25**	**$100.871.375,00**		
181	Excavación	50 días	mié 20/08/25	sáb 18/10/25	$57.136.877,00	205FC+15 días;170	182CC+3 días
182	Instalación de tubería	50 días	sáb 23/08/25	mié 22/10/25	$13.684.183,00	181CC+3 días	183CC+33 días
183	Rellenos	20 días	mié 1/10/25	sáb 25/10/25	$12.816.264,00	182CC+33 días	184FC-10 días
184	Construcción de pozos	15 días	mar 14/10/25	vie 31/10/25	$17.234.051,00	183FC-10 días	194;185
185	Fin Alcantarillado sanitario	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$0,00	179;184	245
186	**Alcantarillado pluvial**	**176 días**	**lun 26/05/25**	**lun 29/12/25**	**$141.921.762,00**		
187	**Costado noroccidental**	**74 días**	**lun 26/05/25**	**mar 26/08/25**	**$109.566.216,00**		
188	Excavación	25 días	lun 26/05/25	jue 26/06/25	$45.718.750,00	179	189CC+1 día
189	Instalación de tubería	25 días	mar 27/05/25	vie 27/06/25	$15.875.676,00	188CC+1 día	190CC+13 días
190	Rellenos	15 días	jue 12/06/25	mié 2/07/25	$15.739.522,00	189CC+13 días	191FC-5 días
191	Construcción de pozos	10 días	mié 25/06/25	mar 8/07/25	$8.235.241,00	190FC-5 días	202;200
192	Construcción sumideros	20 días	jue 31/07/25	mar 26/08/25	$23.997.027,00	205	198
193	**Costado suroriental**	**46 días**	**vie 31/10/25**	**lun 29/12/25**	**$32.355.546,00**		
194	Excavación	10 días	vie 31/10/25	jue 13/11/25	$9.765.216,00	184	195CC+3 días
195	Instalación de tubería	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	$8.430.213,00	194CC+3 días	196CC+8 días
196	Rellenos	5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25	$2.161.604,00	195CC+8 días	207
197	Construcción sumideros	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	$11.998.513,00	210	198

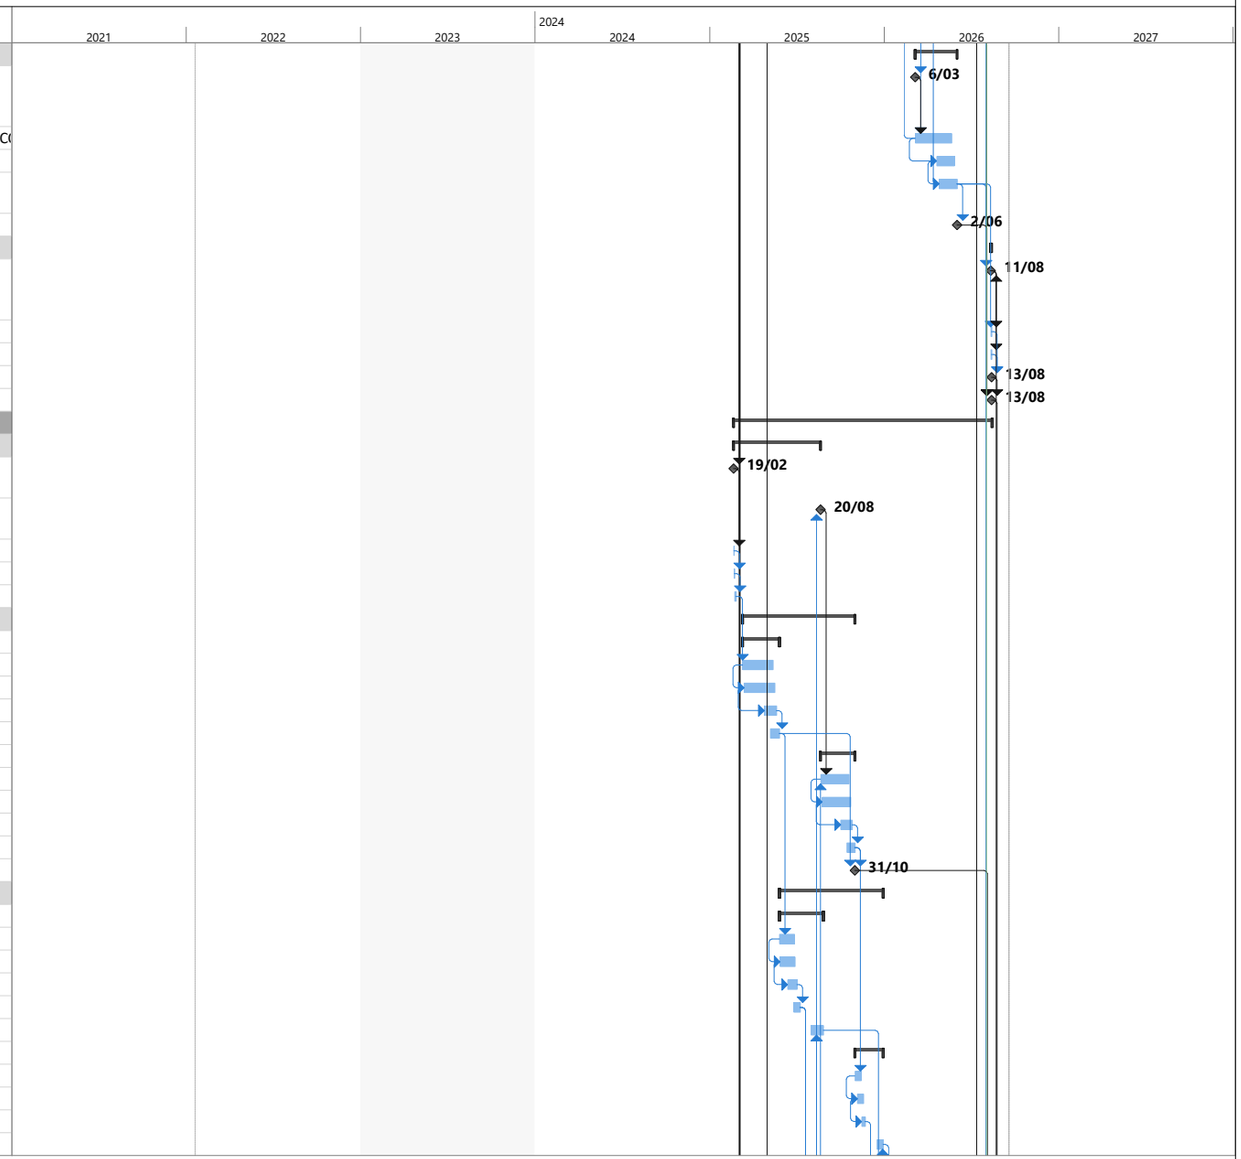


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
198	Fin alcantarillado pluvial	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25	$0,00	192;197	245
199	**Pavimentos**	**159 días**	**mar 8/07/25**	**mar 20/01/26**	**$1.077.219.547,00**		
200	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$0,00	191	202
201	**Costado noroccidental**	**20 días**	**mar 8/07/25**	**jue 31/07/25**	**$485.921.508,00**		
202	Excavación	10 días	mar 8/07/25	sáb 19/07/25	$60.134.185,00	191;200	203CC+10 días
203	Estabilización de subrasante rajón con sello	7 días	sáb 19/07/25	lun 28/07/25	$95.921.507,00	202CC+10 días	204CC+2 días
204	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	7 días	mar 22/07/25	mié 30/07/25	$123.402.756,00	203CC+2 días	205CC+3 días
205	Concreto	5 días	vie 25/07/25	jue 31/07/25	$206.463.060,00	204CC+3 días	181FC+15 días;192;2
206	**Costado suroriental**	**20 días**	**vie 21/11/25**	**mar 16/12/25**	**$495.696.782,00**		
207	Excavación	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$64.593.239,00	196	208CC+10 días
208	Estabilización de subrasante rajón con sello	7 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$97.147.235,00	207CC+10 días	209CC+2 días;673
209	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	7 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25	$124.979.648,00	208CC+2 días	210CC+3 días
210	Concreto	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	$208.976.660,00	209CC+3 días	197;216;212
211	**Interseccion cr 42A bis - Cll 14**	**27 días**	**mar 16/12/25**	**mar 20/01/26**	**$95.601.257,00**		
212	Excavación	12 días	mar 16/12/25	mié 31/12/25	$8.947.572,00	210	213CC+10 días
213	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	lun 29/12/25	mié 14/01/26	$19.958.416,00	212CC+10 días	214CC+2 días
214	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	mié 31/12/25	vie 16/01/26	$25.679.249,00	213CC+2 días	215CC+3 días
215	Concreto	12 días	lun 5/01/26	mar 20/01/26	$41.016.020,00	214CC+3 días	216
216	Fin Pavimentos	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	$0,00	205;210;215	245
217	**Acueducto**	**16 días**	**sáb 11/10/25**	**vie 31/10/25**	**$83.082.635,00**		
218	Excavaciones	10 días	sáb 11/10/25	vie 24/10/25	$21.319.892,00	224CC+30 días	219CC+3 días
219	Instalación de tubería	10 días	jue 16/10/25	mar 28/10/25	$49.200.357,00	218CC+3 días	220CC+3 días
220	Rellenos	10 días	lun 20/10/25	vie 31/10/25	$12.562.386,00	219CC+3 días	221
221	Fin acueducto	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$0,00	220	245
222	**Codensa**	**91 días**	**sáb 6/09/25**	**sáb 27/12/25**	**$206.360.216,00**		
223	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	sáb 6/09/25	sáb 6/09/25	$0,00	205FC+30 días	224;230
224	Excavaciones	35 días	sáb 6/09/25	sáb 18/10/25	$12.454.295,00	223	225CC+3 días;218CC-
225	Instalación de tubería	35 días	mié 10/09/25	mié 22/10/25	$74.298.199,00	224CC+3 días	226CC+23 días
226	Rellenos	15 días	mar 7/10/25	sáb 25/10/25	$48.137.982,00	225CC+23 días	227;233CC
227	Cajas	12 días	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	$71.469.740,00	226;236CC+13 días	228
228	Fin codensa	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	$0,00	227	245
229	**ETB**	**12 días**	**vie 12/12/25**	**sáb 27/12/25**	**$14.815.385,00**		
230	Renivelación camaras	12 días	vie 12/12/25	sáb 27/12/25	$14.815.385,00	236CC+13 días;223	231
231	Fin ETB	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	$0,00	230	245
232	**Espacio público**	**250 días**	**mar 7/10/25**	**vie 14/08/26**	**$284.418.688,00**		
233	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	$0,00	226CC	234
234	Excavación	80 días	mar 7/10/25	vie 16/01/26	$32.767.010,00	233	235CC+35 días
235	Rellenos	50 días	jue 20/11/25	jue 22/01/26	$30.456.808,00	234CC+35 días	236CC+5 días

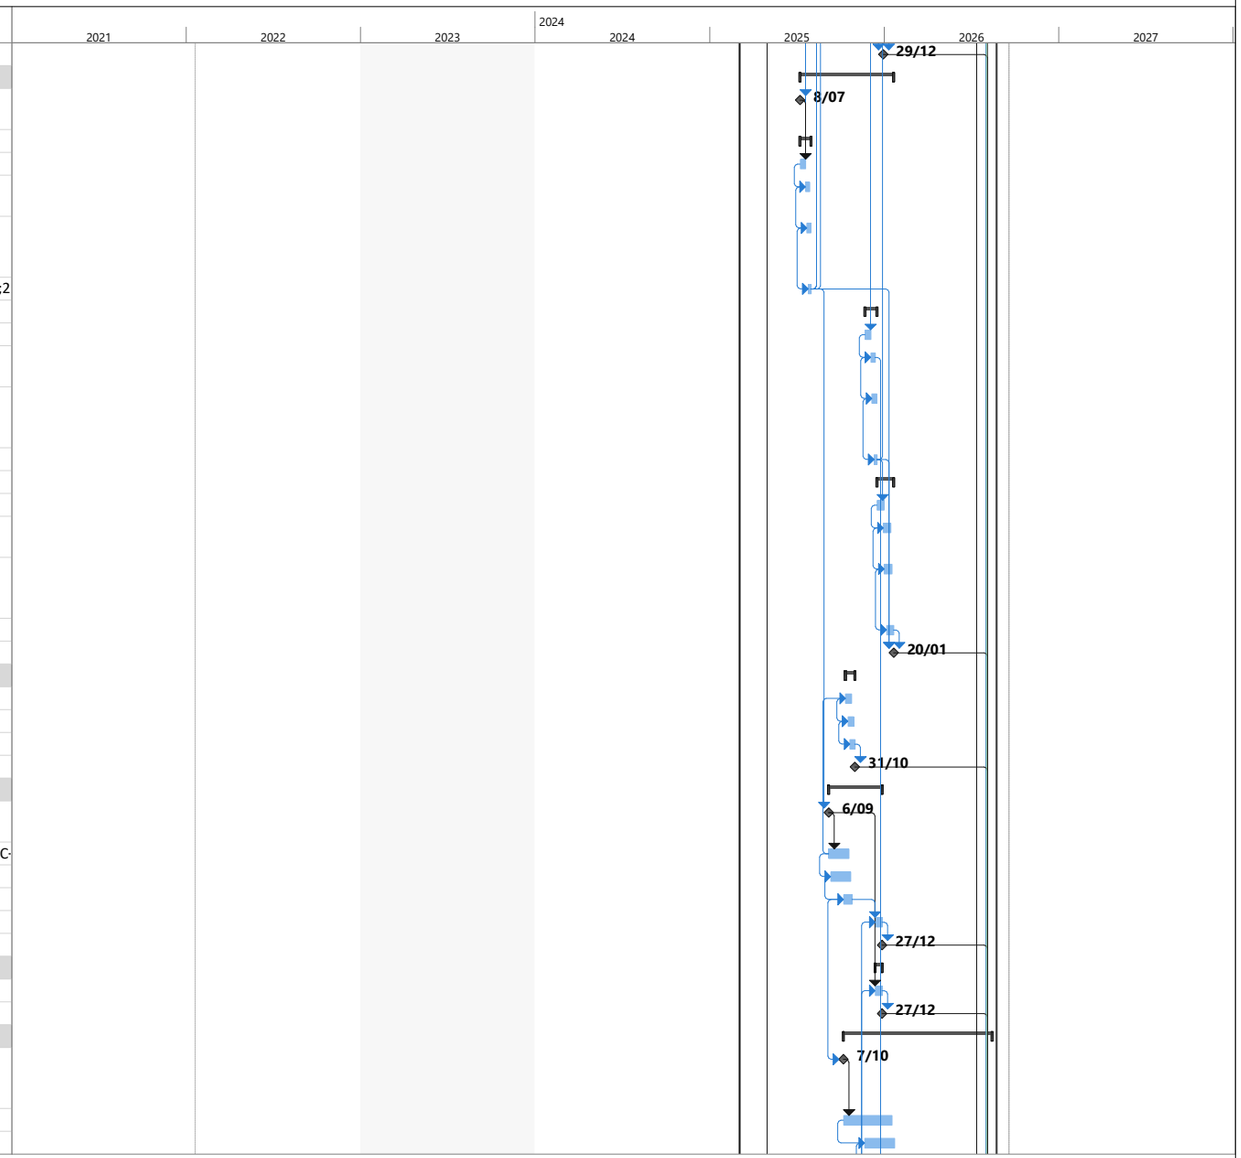


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
236	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	50 días	mié 26/11/25	mié 28/01/26	$200.858.230,00	235CC+5 días	227CC+13 días;230CC+13 días
237	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$20.336.640,00**		
238	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$20.336.640,00	241	239
239	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	242;238	245
240	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$21.615.795,00**		
241	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	242;243;238
242	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$3.653.519,00	241	239
243	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$17.962.276,00	241	244
244	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	243	245
245	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	185;198;216;221;228	1870
246	**CIV 16000802 (23)**	**417 días**	**vie 14/03/25**	**vie 14/08/26**	**$3.963.916.684,00**		
247	**Preliminares**	**11 días**	**vie 14/03/25**	**vie 28/03/25**	**$4.438.748,00**		
248	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	95FC+20 días	249FC+7 días
249	Cerramiento de obra	1 día	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	$0,00	248FC+7 días	250
250	Implementación de PMT	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$0,00	249	251
251	Replanteo general	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$4.438.748,00	250	271
252	**Alcantarillado sanitario**	**278 días**	**vie 13/06/25**	**vie 22/05/26**	**$261.917.759,00**		
253	**Costado nororiental**	**71 días**	**lun 23/02/26**	**vie 22/05/26**	**$122.861.518,00**		
254	Excavación	60 días	lun 23/02/26	vie 8/05/26	$55.425.408,00	268	255CC+3 días
255	Instalación de tubería	60 días	jue 26/02/26	mar 12/05/26	$23.272.068,00	254CC+3 días	256CC+33 días
256	Rellenos	30 días	jue 9/04/26	vie 15/05/26	$15.431.787,00	255CC+33 días	257FC-20 días
257	Construcción de pozos	25 días	mar 21/04/26	vie 22/05/26	$28.732.255,00	256FC-20 días	293;284
258	**Costado suroccidental**	**101 días**	**vie 13/06/25**	**mié 15/10/25**	**$139.056.241,00**		
259	Excavación	90 días	vie 13/06/25	mié 1/10/25	$46.014.638,00	274	260CC+3 días
260	Instalación de tubería	90 días	mar 17/06/25	sáb 4/10/25	$32.672.972,00	259CC+3 días	261CC+33 días
261	Rellenos	60 días	lun 28/07/25	mié 8/10/25	$23.662.561,00	260CC+33 días	262FC-25 días
262	Construcción de pozos	30 días	mar 9/09/25	mié 15/10/25	$36.706.070,00	261FC-25 días	288;281;284;286
263	**Alcantarillado pluvial**	**370 días**	**vie 28/03/25**	**mié 1/07/26**	**$567.107.132,00**		
264	**Costado nororiental**	**163 días**	**mié 10/12/25**	**mié 1/07/26**	**$255.631.006,00**		
265	Excavación	50 días	mié 10/12/25	mar 10/02/26	$80.706.248,00	291FC+15 días	266CC+3 días
266	Instalación de tubería	50 días	sáb 13/12/25	vie 13/02/26	$81.722.895,00	265CC+3 días	267CC+33 días
267	Rellenos	20 días	sáb 24/01/26	mar 17/02/26	$25.803.340,00	266CC+33 días	268FC-30 días
268	Construcción de pozos	35 días	mar 13/01/26	lun 23/02/26	$31.402.983,00	267FC-30 días	254
269	Construcción sumideros	30 días	sáb 23/05/26	mié 1/07/26	$35.995.540,00	296FF	284
270	**Costado suroccidental**	**212 días**	**vie 28/03/25**	**mar 16/12/25**	**$311.476.126,00**		
271	Excavación	50 días	vie 28/03/25	vie 30/05/25	$71.809.196,00	251	272CC+3 días
272	Instalación de tubería	50 días	mar 1/04/25	mié 4/06/25	$100.794.809,00	271CC+3 días	273CC+33 días
273	Rellenos	20 días	mié 14/05/25	sáb 7/06/25	$26.690.795,00	272CC+33 días	274FC-25 días
274	Construcción de pozos	30 días	mié 7/05/25	vie 13/06/25	$28.309.627,00	273FC-25 días	259
275	Construcción sumideros	20 días	vie 21/11/25	mar 16/12/25	$83.871.699,00	291	284
276	**Alcantarillado combinado interseccion cr 42bis - cll 17**	**11 días**	**mar 2/06/26**	**mié 17/06/26**	**$17.552.327,00**		
277	Excavación	5 días	mar 2/06/26	mar 9/06/26	$5.253.169,00	891	278CC+3 días
278	Instalación de tubería	5 días	vie 5/06/26	vie 12/06/26	$9.338.040,00	277CC+3 días	279CC+3 días
279	Rellenos	5 días	mié 10/06/26	mié 17/06/26	$2.961.118,00	278CC+3 días	298

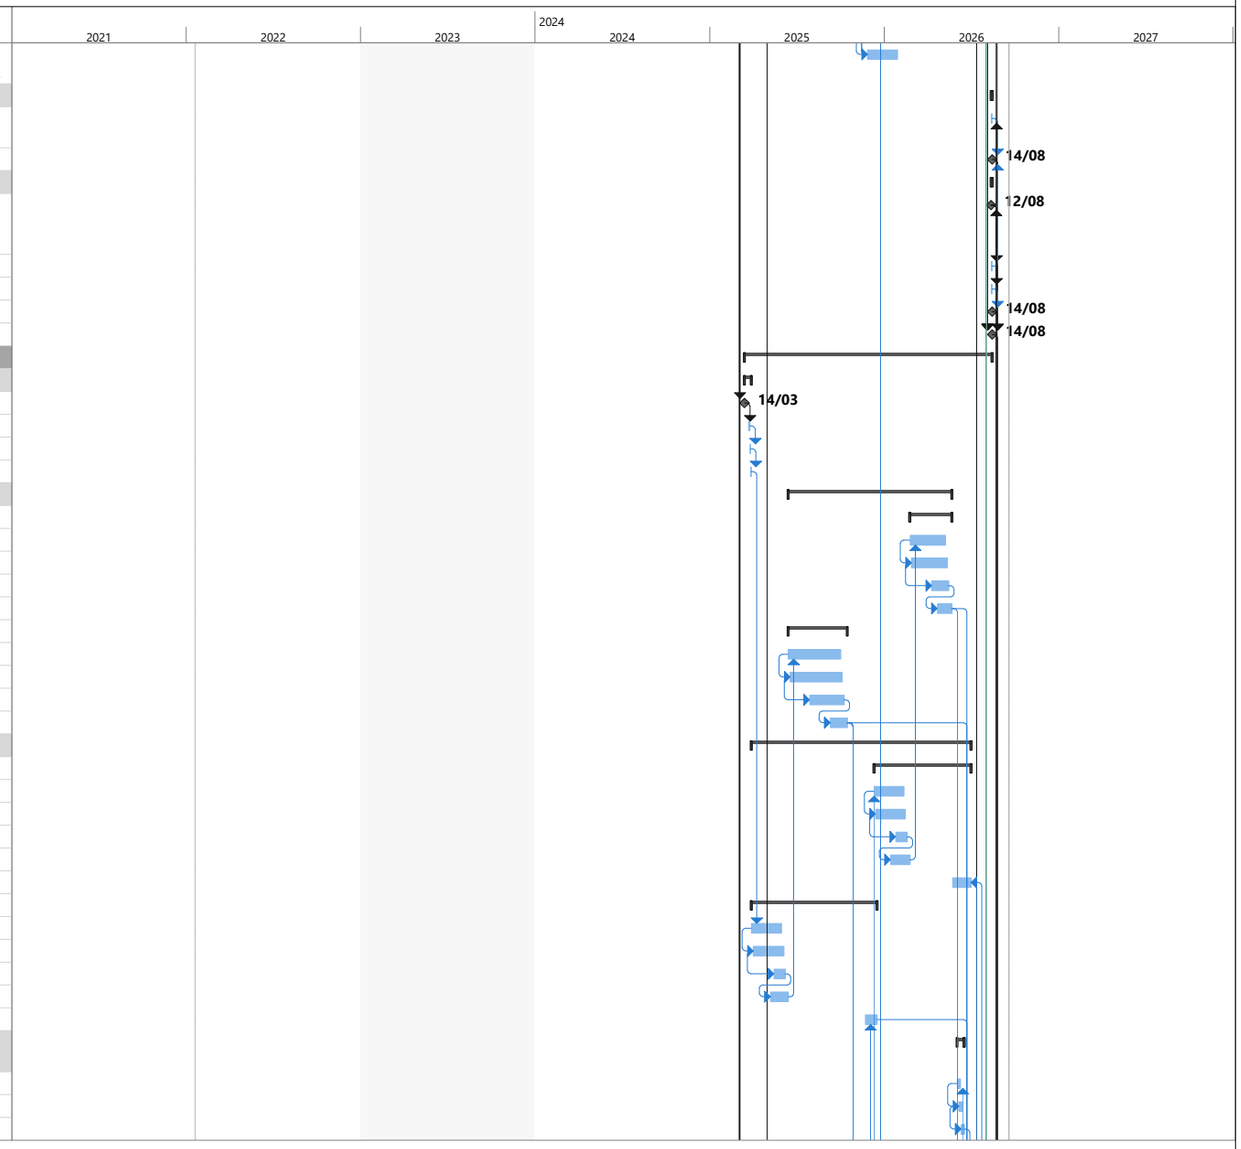


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
280	**Alcantarillado combinado interseccion cr 42bis - cll 13**	**209 días**	**mié 15/10/25**	**jue 2/07/26**	**$20.300.163,00**		
281	Excavación	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25	$5.793.128,00	262	282CC+3 días
282	Instalación de tubería	5 días	sáb 18/10/25	vie 24/10/25	$11.735.844,00	281CC+3 días	283CC+3 días
283	Rellenos	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$2.771.191,00	282CC+3 días	303;284
284	Fin alcantarillado pluvial	0 días	jue 2/07/26	jue 2/07/26	$0,00	283;298;275;269;257	336
285	**Pavimentos**	**221 días**	**mié 15/10/25**	**jue 16/07/26**	**$1.487.005.784,00**		
286	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$0,00	262	288
287	**Costado suroccidental**	**30 días**	**mié 15/10/25**	**vie 21/11/25**	**$589.606.302,00**		
288	Excavación	10 días	mié 15/10/25	lun 27/10/25	$86.816.441,00	262;286	289CC+10 días
289	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 27/10/25	sáb 8/11/25	$100.155.273,00	288CC+10 días	290CC+5 días
290	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 1/11/25	vie 14/11/25	$148.939.648,00	289CC+5 días	291CC+5 días
291	Concreto	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	$253.694.940,00	290CC+5 días	265FC+15 días;275;3
292	**Costado nororiental**	**31 días**	**vie 22/05/26**	**mié 1/07/26**	**$630.496.395,00**		
293	Excavación	12 días	vie 22/05/26	vie 5/06/26	$71.353.136,00	257	294CC+11 días
294	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	jue 4/06/26	jue 18/06/26	$110.392.104,00	293CC+11 días	295CC+5 días
295	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	jue 11/06/26	mié 24/06/26	$164.171.986,00	294CC+5 días	296CC+5 días
296	Concreto	10 días	jue 18/06/26	mié 1/07/26	$284.579.169,00	295CC+5 días	269FF;307
297	**Interseccion cr 42bis - cll17**	**24 días**	**mié 17/06/26**	**jue 16/07/26**	**$213.670.908,00**		
298	Excavación	12 días	mié 17/06/26	jue 2/07/26	$35.757.402,00	279	284;299CC+5 días
299	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mar 23/06/26	mié 8/07/26	$36.339.033,00	298CC+5 días	300CC+2 días
300	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	jue 25/06/26	vie 10/07/26	$54.041.406,00	299CC+2 días	301CC+5 días
301	Concreto	12 días	jue 2/07/26	jue 16/07/26	$87.533.067,00	300CC+5 días	307
302	**Interseccion cr 42bis - cll13**	**20 días**	**mar 28/10/25**	**sáb 22/11/25**	**$53.232.179,00**		
303	Excavación	12 días	mar 28/10/25	mié 12/11/25	$4.261.675,00	283	304CC+3 días
304	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	vie 31/10/25	sáb 15/11/25	$10.000.483,00	303CC+3 días	305CC+2 días
305	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	mar 4/11/25	mié 19/11/25	$14.870.969,00	304CC+2 días	306CC+3 días
306	Concreto	12 días	vie 7/11/25	sáb 22/11/25	$24.099.052,00	305CC+3 días	315;314FC+10 días
307	Fin pavimentos	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	$0,00	291;296;301;315	336
308	**Acueducto**	**66 días**	**jue 4/12/25**	**mar 24/02/26**	**$611.144.976,00**		
309	Excavaciones	60 días	jue 4/12/25	mar 17/02/26	$39.643.142,00	315CC	310CC+3 días
310	Instalación de tubería	60 días	mar 9/12/25	vie 20/02/26	$471.923.400,00	309CC+3 días	311CC+33 días
311	Rellenos	30 días	mar 20/01/26	mar 24/02/26	$99.578.434,00	310CC+33 días	325;312;324
312	Fin de acueducto	0 días	mar 24/02/26	mar 24/02/26	$0,00	311	336
313	**Codensa**	**177 días**	**jue 4/12/25**	**lun 13/07/26**	**$314.981.956,00**		
314	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 4/12/25	jue 4/12/25	$0,00	306FC+10 días	315
315	Excavaciones	75 días	jue 4/12/25	vie 6/03/26	$19.420.511,00	306;314	316CC+3 días;307;30
316	Instalación de tubería	75 días	mar 9/12/25	mar 10/03/26	$167.171.300,00	315CC+3 días	317CC+33 días

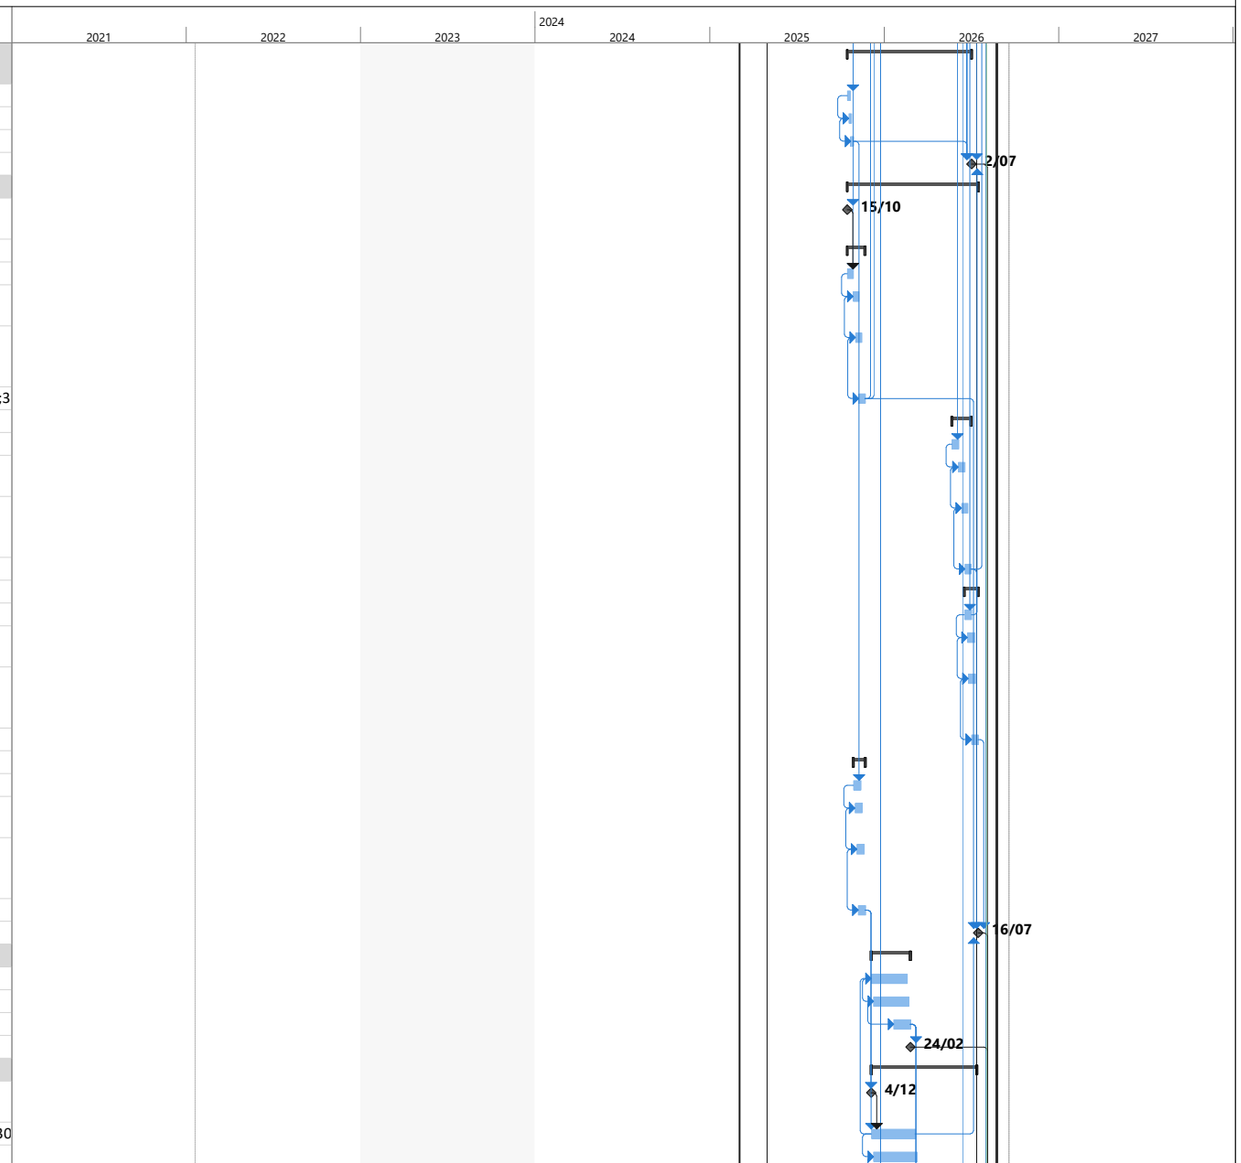


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
317	Rellenos	45 días	mar 20/01/26	vie 13/03/26	$77.309.685,00	316CC+33 días	318
318	Cajas	40 días	sáb 23/05/26	lun 13/07/26	$51.080.460,00	317;327CC+5 días	319
319	Fin Codensa	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	$0,00	318	336
320	**ETB**	**18 días**	**sáb 20/06/26**	**lun 13/07/26**	**$15.240.121,00**		
321	Renivelación camaras	18 días	sáb 20/06/26	lun 13/07/26	$15.240.121,00	327CC+27 días	322
322	Fin ETB	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	$0,00	321	336
323	**Espacio público**	**134 días**	**mar 24/02/26**	**mar 11/08/26**	**$586.186.523,00**		
324	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 24/02/26	mar 24/02/26	$0,00	311	325
325	Excavación	120 días	mar 24/02/26	vie 24/07/26	$80.717.193,00	311;324	326CC+63 días
326	Rellenos	70 días	mié 13/05/26	lun 10/08/26	$77.603.131,00	325CC+63 días	327CC+3 días
327	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	68 días	sáb 16/05/26	mar 11/08/26	$427.866.199,00	326CC+3 días	318CC+5 días;321CC+27 días
328	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$41.009.210,00**		
329	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$41.009.210,00	332	330
330	Fin Espacio publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	329	336
331	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$37.031.985,00**		
332	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	333CC;334CC;329
333	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$7.307.951,00	332CC	335CC
334	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$29.724.034,00	332CC	335
335	Fin Señalización	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	334;333CC	336
336	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	284;307;312;319;322	1870
337	**CIV 16000627 (6)**	**423 días**	**vie 28/02/25**	**jue 6/08/26**	**$2.065.644.131,00**		
338	**Preliminares**	**12 días**	**vie 28/02/25**	**vie 14/03/25**	**$2.919.376,00**		
339	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	$0,00	95FC+8 días	340FC+8 días
340	Cerramiento de obra	1 día	lun 10/03/25	mar 11/03/25	$0,00	339FC+8 días	341
341	Implementación de PMT	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	$0,00	340	342
342	Replanteo general	2 días	mié 12/03/25	vie 14/03/25	$2.919.376,00	341	344
343	**Alcantarillado combinado**	**146 días**	**vie 14/03/25**	**vie 12/09/25**	**$409.178.343,00**		
344	Excavación	70 días	vie 14/03/25	mié 11/06/25	$146.361.012,00	342	345CC+3 días
345	Instalación de tubería	70 días	mar 18/03/25	sáb 14/06/25	$128.864.067,00	344CC+3 días	346CC+43 días
346	Rellenos	30 días	lun 12/05/25	mié 18/06/25	$53.385.083,00	345CC+43 días	347FC-10 días
347	Construcción de pozos	15 días	vie 6/06/25	mié 25/06/25	$14.884.957,00	346FC-10 días	351CC+10 días
348	Construcción sumideros	40 días	vie 25/07/25	vie 12/09/25	$65.683.224,00	355	349
349	Fin alcantarillado	0 días	vie 12/09/25	vie 12/09/25	$0,00	348	385
350	**Pavimentos**	**30 días**	**mié 18/06/25**	**vie 25/07/25**	**$570.220.088,00**		
351	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	$0,00	347CC+10 días	352
352	Excavación	20 días	mié 18/06/25	lun 14/07/25	$47.570.766,00	351	353CC+15 días
353	Estabilización de subrasante rajón con sello	9 días	mar 8/07/25	vie 18/07/25	$58.637.553,00	352CC+15 días	354CC+5 días
354	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	8 días	lun 14/07/25	mié 23/07/25	$170.063.431,00	353CC+5 días	355CC+5 días
355	Concreto	5 días	sáb 19/07/25	vie 25/07/25	$293.948.338,00	354CC+5 días	348;364FC+5 días;35
356	Fin pavimentos	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$0,00	355	385
357	**Acueducto**	**36 días**	**mar 26/08/25**	**mar 7/10/25**	**$190.930.850,00**		

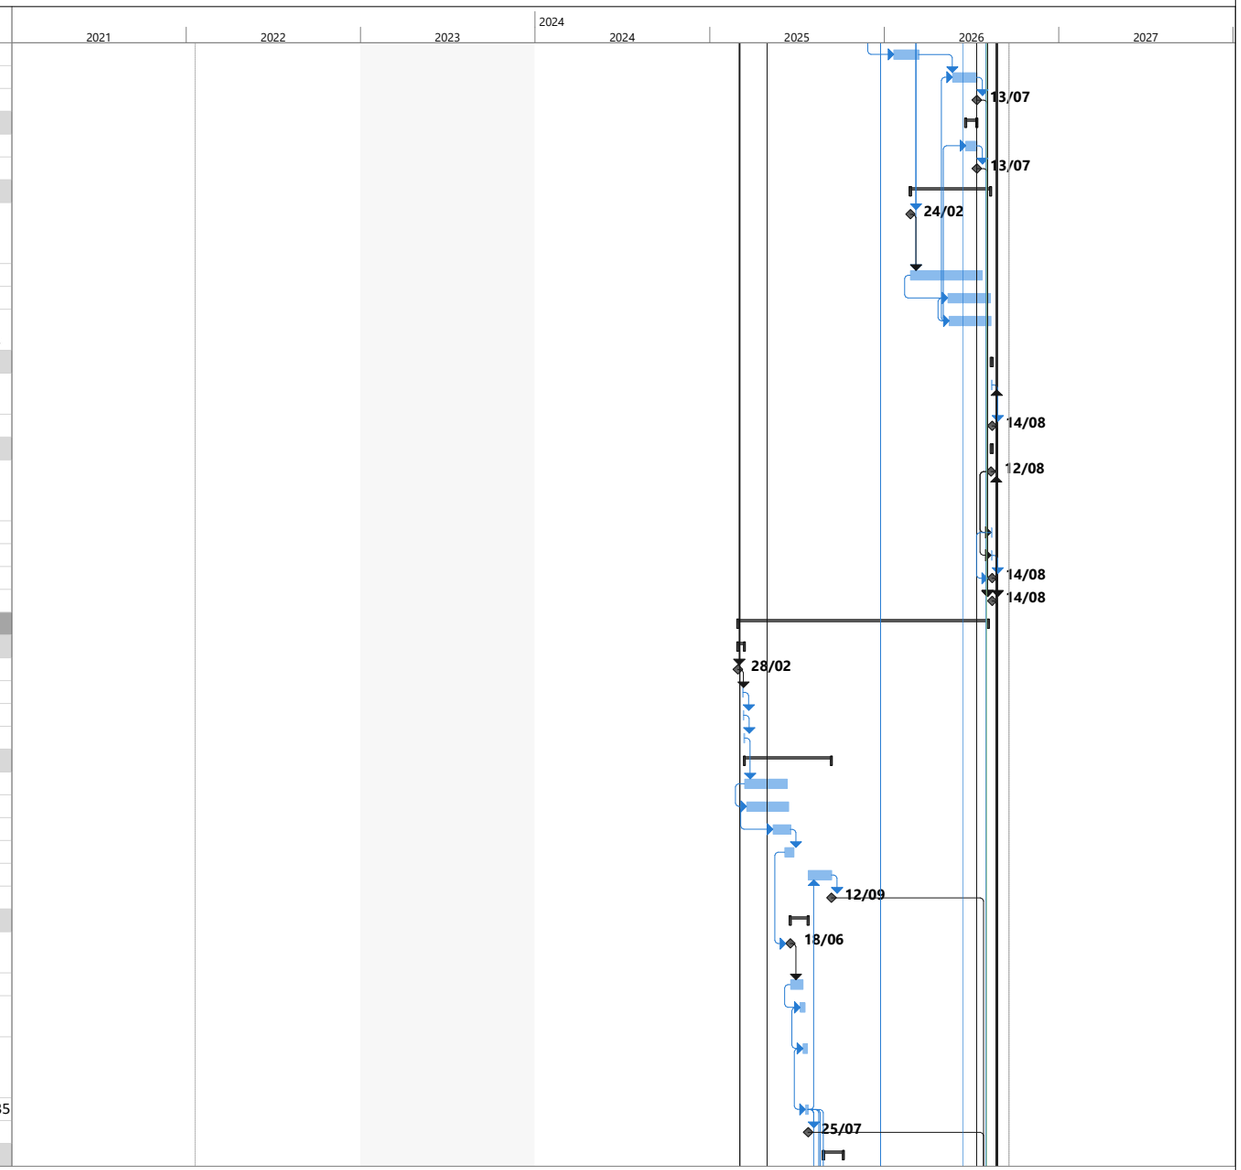


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
358	Excavaciones	30 días	mar 26/08/25	mar 30/09/25	$16.968.971,00	364CC	359CC+3 días
359	Instalación de tubería	30 días	vie 29/08/25	vie 3/10/25	$151.915.837,00	358CC+3 días	360CC+23 días
360	Rellenos	10 días	jue 25/09/25	mar 7/10/25	$22.046.042,00	359CC+23 días	374;361;373
361	Fin acueducto	0 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	$0,00	360	385
362	**Codensa**	**206 días**	**mar 26/08/25**	**mié 6/05/26**	**$319.520.173,00**		
363	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	$0,00	355FC+25 días	364
364	Excavaciones	90 días	mar 26/08/25	sáb 13/12/25	$14.433.333,00	355FC+5 días;363	365CC+3 días;358CC
365	Instalación de tubería	90 días	vie 29/08/25	mié 17/12/25	$156.680.292,00	364CC+3 días	366CC+43 días
366	Rellenos	50 días	lun 20/10/25	sáb 20/12/25	$53.445.864,00	365CC+43 días	367
367	Cajas	70 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$94.960.684,00	366;376CC+30 días	368
368	Fin codensa	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$0,00	367	385
369	**ETB**	**18 días**	**mar 14/04/26**	**mié 6/05/26**	**$20.895.896,00**		
370	Renivelación camaras	18 días	mar 14/04/26	mié 6/05/26	$20.895.896,00	376CC+82 días	371
371	Fin ETB	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$0,00	370	385
372	**Espacio público**	**170 días**	**mar 7/10/25**	**mié 6/05/26**	**$499.416.632,00**		
373	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	$0,00	360	374
374	Excavación	150 días	mar 7/10/25	sáb 11/04/26	$75.315.375,00	360;373	375CC+65 días
375	Rellenos	100 días	sáb 27/12/25	mié 29/04/26	$69.563.291,00	374CC+65 días	376CC+5 días
376	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	100 días	sáb 3/01/26	mié 6/05/26	$354.537.966,00	375CC+5 días	367CC+30 días;370CC+82 días
377	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mar 4/08/26**	**jue 6/08/26**	**$21.370.268,00**		
378	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	$21.370.268,00	381	379
379	Fin espacio publico	0 días	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$0,00	378	385
380	**Señalización**	**2 días**	**mar 4/08/26**	**jue 6/08/26**	**$31.192.505,00**		
381	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$0,00	666FC-5 días	382;383;378
382	Señalizacion vertical	2 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	$4.572.358,00	381	384
383	Señalizacion horizontal	2 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	$26.620.147,00	381	384
384	Fin señalización	0 días	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$0,00	382;383	385
385	Fin CIV	0 días	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$0,00	349;356;361;368;371	1870
386	**CIV 16000686 (7)**	**310 días**	**vie 25/07/25**	**jue 13/08/26**	**$2.415.379.505,00**		
387	**Preliminares**	**4 días**	**vie 25/07/25**	**mié 30/07/25**	**$3.082.343,00**		
388	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$0,00	355	389
389	Cerramiento de obra	1 día	vie 25/07/25	sáb 26/07/25	$0,00	388	390
390	Implementación de PMT	1 día	sáb 26/07/25	lun 28/07/25	$0,00	389	391
391	Replanteo general	2 días	lun 28/07/25	mié 30/07/25	$3.082.343,00	390	393
392	**Alcantarillado combinado**	**166 días**	**mié 30/07/25**	**jue 19/02/26**	**$614.426.809,00**		
393	Excavación	80 días	mié 30/07/25	mié 5/11/25	$183.806.810,00	391	394CC+3 días
394	Instalación de tubería	80 días	sáb 2/08/25	sáb 8/11/25	$126.373.687,00	393CC+3 días	395CC+33 días
395	Rellenos	50 días	vie 12/09/25	mié 12/11/25	$59.399.070,00	394CC+33 días	396FC-10 días
396	Construcción de pozos	15 días	jue 30/10/25	mié 19/11/25	$16.172.383,00	395FC-10 días	401;400
397	Construcción sumideros	50 días	vie 19/12/25	jue 19/02/26	$228.674.859,00	404	398
398	Fin alcantarillado	0 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26	$0,00	397	434
399	**Pavimentos**	**25 días**	**mié 19/11/25**	**vie 19/12/25**	**$585.259.383,00**		
400	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$0,00	396	401

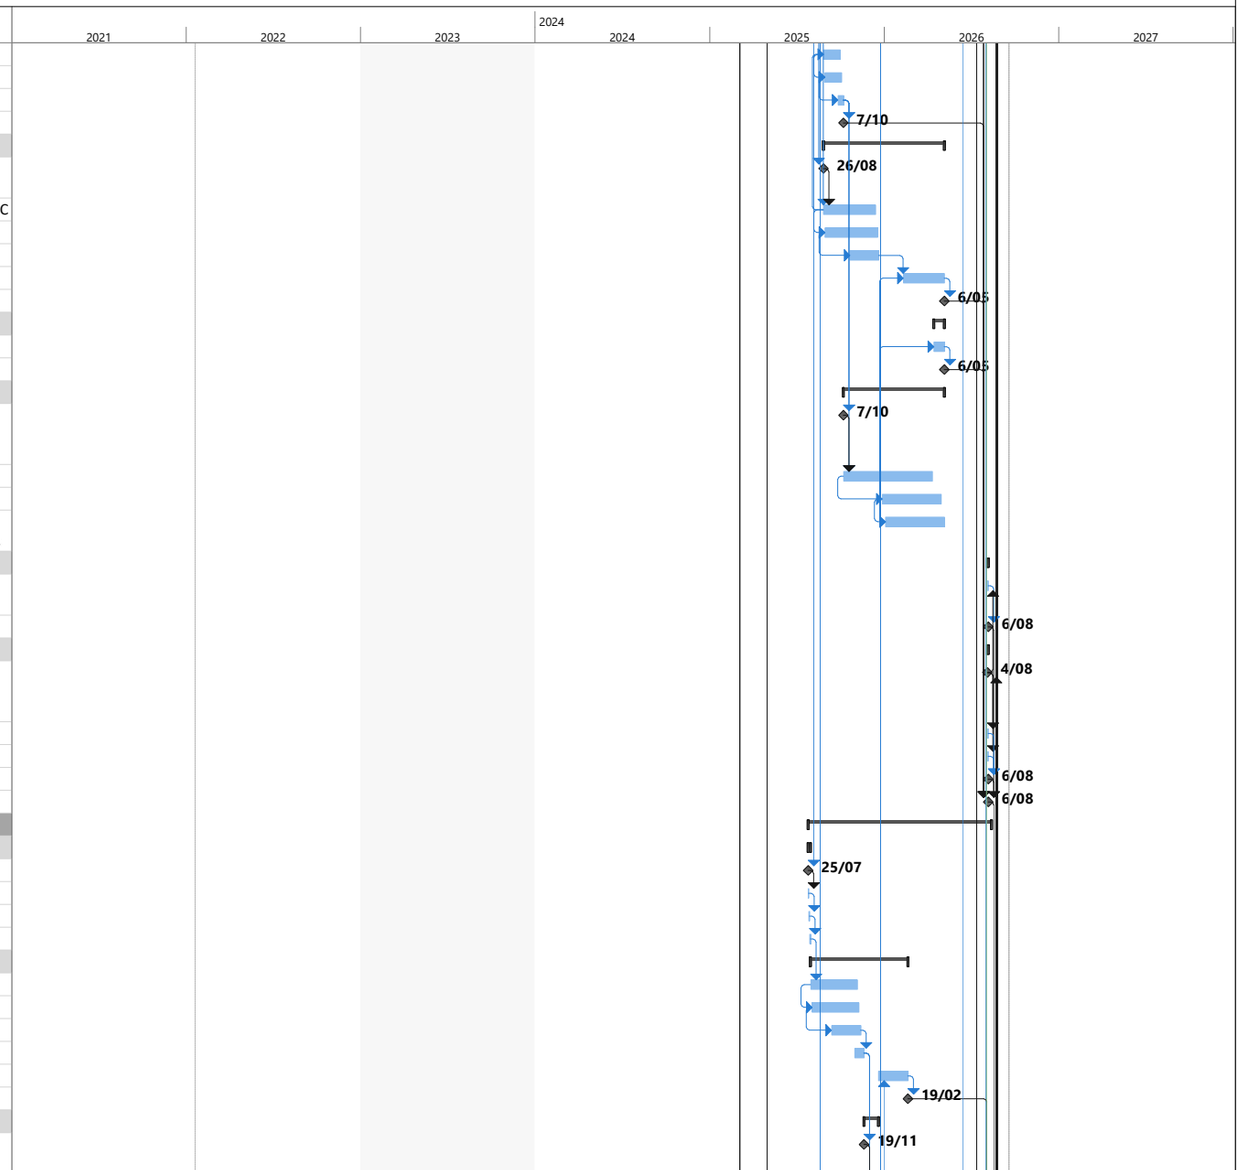


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
401	Excavación	15 días	mié 19/11/25	sáb 6/12/25	$48.169.457,00	396;400	402CC+10 días
402	Estabilización de subrasante rajón con sello	8 días	lun 1/12/25	jue 11/12/25	$59.221.914,00	401CC+10 días	403CC+5 días
403	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	5 días	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25	$171.465.114,00	402CC+5 días	404CC+5 días
404	Concreto	5 días	sáb 13/12/25	vie 19/12/25	$306.402.898,00	403CC+5 días	397;413FC+5 días;40
405	Fin pavimentos	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25	$0,00	404	434
406	**Acueducto**	**41 días**	**mar 27/01/26**	**lun 16/03/26**	**$221.522.071,00**		
407	Excavaciones	35 días	mar 27/01/26	lun 9/03/26	$53.598.806,00	413CC	408CC+3 días
408	Instalación de tubería	35 días	vie 30/01/26	jue 12/03/26	$129.007.844,00	407CC+3 días	409CC+3 días
409	Rellenos	35 días	mar 3/02/26	lun 16/03/26	$38.915.421,00	408CC+3 días	423;410;422
410	Fin acueducto	0 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26	$0,00	409	434
411	**Codensa**	**140 días**	**mar 27/01/26**	**sáb 18/07/26**	**$368.843.647,00**		
412	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	$0,00	404FC+30 días	413
413	Excavaciones	55 días	mar 27/01/26	sáb 4/04/26	$17.005.629,00	404FC+5 días;412	414CC+3 días;407CC
414	Instalación de tubería	55 días	vie 30/01/26	mié 8/04/26	$179.767.695,00	413CC+3 días	415CC+3 días
415	Rellenos	54 días	mar 3/02/26	vie 10/04/26	$62.802.092,00	414CC+3 días	416
416	Cajas	80 días	vie 10/04/26	sáb 18/07/26	$109.268.231,00	415;423CC+10 días	417
417	Fin condensa	0 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	$0,00	416	434
418	**ETB**	**18 días**	**jue 25/06/26**	**vie 17/07/26**	**$24.131.566,00**		
419	Renivelación camaras	18 días	jue 25/06/26	vie 17/07/26	$24.131.566,00	425CC+25 días	420
420	Fin ETB	0 días	vie 17/07/26	vie 17/07/26	$0,00	419	434
421	**Espacio público**	**98 días**	**lun 16/03/26**	**vie 17/07/26**	**$541.999.732,00**		
422	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26	$0,00	409	423
423	Excavación	90 días	lun 16/03/26	mié 8/07/26	$81.461.273,00	409;422	424CC+50 días;416C
424	Rellenos	45 días	mar 19/05/26	mar 14/07/26	$75.216.070,00	423CC+50 días	425CC+5 días
425	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	43 días	lun 25/05/26	vie 17/07/26	$385.322.389,00	424CC+5 días	419CC+25 días
426	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mar 11/08/26**	**jue 13/08/26**	**$24.744.295,00**		
427	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$24.744.295,00	430	431CC;428
428	Fin espacio publico	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	427	434
429	**Señalización**	**2 días**	**mar 11/08/26**	**jue 13/08/26**	**$31.369.659,00**		
430	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	666	431;432;427
431	Señalizacion vertical	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$4.561.386,00	427CC;430	433
432	Señalizacion horizontal	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$26.808.273,00	430	433
433	Fin Señalización	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	431;432	434
434	Fin CIV	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	398;405;410;417;42(	1870
435	**CIV 16000625 (30)**	**409 días**	**vie 14/03/25**	**mar 4/08/26**	**$1.714.273.979,00**		
436	**Preliminares**	**12 días**	**vie 14/03/25**	**sáb 29/03/25**	**$2.043.622,00**		
437	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	95FC+20 días	438FC+8 días;924FC+
438	Cerramiento de obra	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$0,00	437FC+8 días	439
439	Implementación de PMT	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	$0,00	438	440
440	Replanteo general	2 días	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	$2.043.622,00	439	442
441	**Alcantarillado combinado**	**157 días**	**sáb 29/03/25**	**jue 9/10/25**	**$379.586.594,00**		

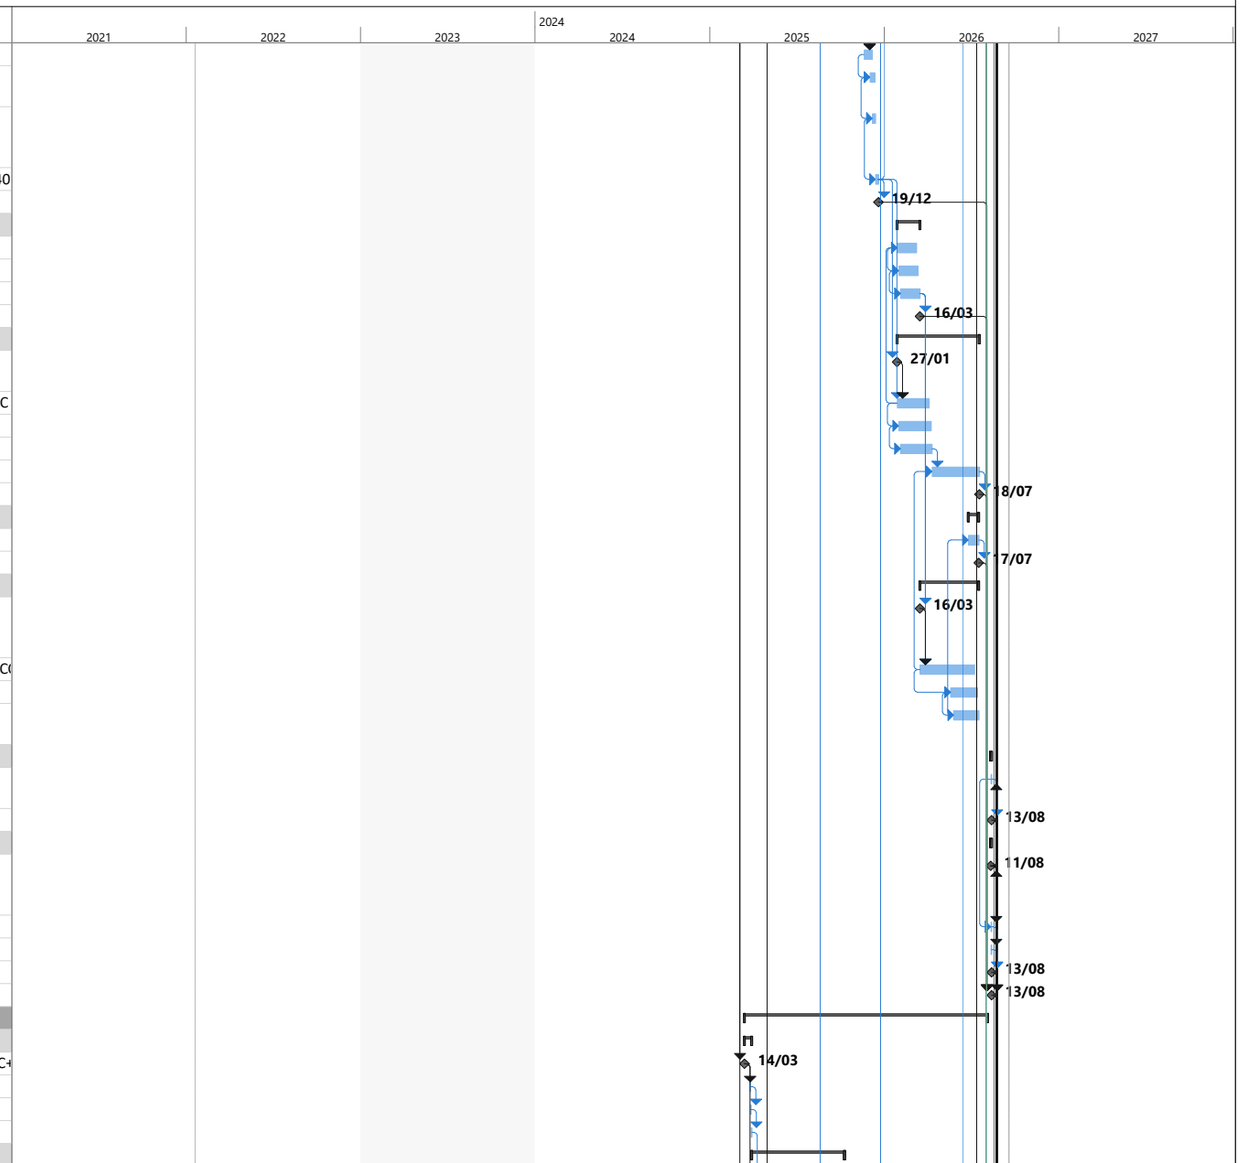


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
442	Excavación	70 días	sáb 29/03/25	jue 26/06/25	$121.676.699,00	440	443CC+3 días
443	Instalación de tubería	70 días	mié 2/04/25	mar 1/07/25	$112.749.385,00	442CC+3 días	444CC+33 días
444	Rellenos	40 días	jue 15/05/25	vie 4/07/25	$65.307.175,00	443CC+33 días	445FC-10 días
445	Construcción de pozos	15 días	vie 20/06/25	jue 10/07/25	$12.416.255,00	444FC-10 días	450;449
446	Construcción sumideros	45 días	sáb 16/08/25	jue 9/10/25	$67.437.080,00	453	447
447	Fin alcantarillado	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$0,00	446	483
448	**Pavimentos**	**31 días**	**jue 10/07/25**	**sáb 16/08/25**	**$653.268.003,00**		
449	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$0,00	445	450
450	Excavación	12 días	jue 10/07/25	jue 24/07/25	$73.209.005,00	445;449	451CC+11 días
451	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mié 23/07/25	lun 4/08/25	$112.943.429,00	450CC+11 días	452CC+5 días
452	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	mar 29/07/25	lun 11/08/25	$167.960.909,00	451CC+5 días	453CC+5 días
453	Concreto	10 días	lun 4/08/25	sáb 16/08/25	$299.154.660,00	452CC+5 días	446;481;462FC+5 día
454	Fin pavimentos	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	$0,00	453	483
455	**Acueducto**	**36 días**	**vie 3/10/25**	**mar 18/11/25**	**$124.019.874,00**		
456	Excavaciones	30 días	vie 3/10/25	lun 10/11/25	$18.867.625,00	462CC	457CC+3 días
457	Instalación de tubería	30 días	mar 7/10/25	jue 13/11/25	$90.563.370,00	456CC+3 días	458CC+18 días
458	Rellenos	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$14.588.879,00	457CC+18 días	472;459;471
459	Fin acueducto	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$0,00	458	483
460	**Codensa**	**106 días**	**vie 3/10/25**	**jue 12/02/26**	**$196.024.640,00**		
461	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$0,00	453FC+40 días	462
462	Excavaciones	55 días	vie 3/10/25	jue 11/12/25	$11.663.134,00	453FC+5 días;461	463CC+3 días;456CC
463	Instalación de tubería	55 días	mar 7/10/25	lun 15/12/25	$57.395.687,00	462CC+3 días	464CC+33 días
464	Rellenos	25 días	mar 18/11/25	jue 18/12/25	$49.913.688,00	463CC+33 días	466
465	Cajas	70 días	mar 18/11/25	jue 12/02/26	$77.052.131,00	472CC	466
466	Fin Codensa	0 días	jue 12/02/26	jue 12/02/26	$0,00	465;464	483
467	**ETB**	**15 días**	**vie 6/02/26**	**mar 24/02/26**	**$19.993.327,00**		
468	Renivelación camaras	15 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	$19.993.327,00	474CC+25 días	469
469	Fin ETB	0 días	mar 24/02/26	mar 24/02/26	$0,00	468	483
470	**Espacio público**	**80 días**	**mar 18/11/25**	**mar 24/02/26**	**$283.011.868,00**		
471	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$0,00	458	472
472	Excavación	70 días	mar 18/11/25	jue 12/02/26	$38.391.123,00	458;471	473CC+5 días;465CC
473	Rellenos	70 días	lun 24/11/25	mié 18/02/26	$37.530.873,00	472CC+5 días	474CC+35 días
474	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	40 días	mié 7/01/26	mar 24/02/26	$207.089.872,00	473CC+35 días	468CC+25 días
475	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 1/08/26**	**mar 4/08/26**	**$40.837.172,00**		
476	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 1/08/26	mar 4/08/26	$40.837.171,00	479	477
477	Fin Espacio publico	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$1,00	476	483
478	**Señalización**	**2 días**	**sáb 1/08/26**	**mar 4/08/26**	**$15.488.879,00**		
479	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26	$0,00	666FC-7 días	480;481;476
480	Señalizacion vertical	2 días	sáb 1/08/26	mar 4/08/26	$4.511.463,00	479	482
481	Señalizacion horizontal	2 días	sáb 1/08/26	mar 4/08/26	$10.977.416,00	453;479	482

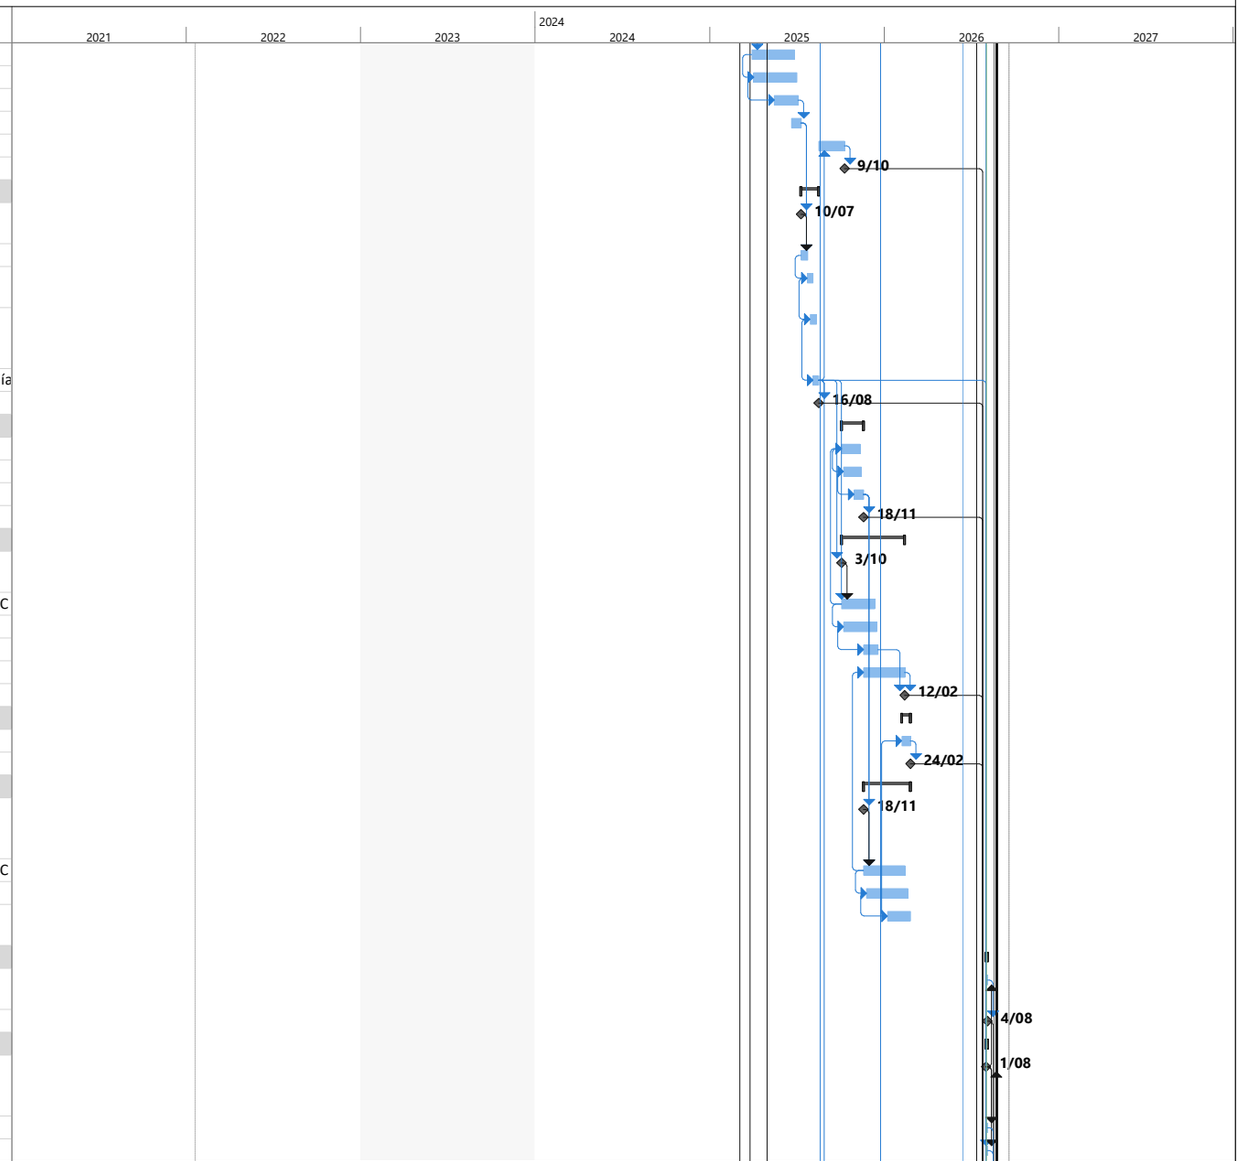


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
482	Fin señalización	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$0,00	480;481	483
483	Fin CIV	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$0,00	447;454;459;466;469	1870
484	**CIV 16000654 (29)**	**290 días**	**sáb 16/08/25**	**mar 11/08/26**	**$1.718.010.094,00**		
485	**Preliminares**	**10 días**	**sáb 16/08/25**	**vie 29/08/25**	**$2.038.451,00**		
486	Aprobación PMT por SDA	0 días	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	$0,00	453	487FC+6 días
487	Cerramiento de obra	1 día	lun 25/08/25	mar 26/08/25	$0,00	486FC+6 días	488
488	Implementación de PMT	1 día	mar 26/08/25	mié 27/08/25	$0,00	487	489
489	Replanteo general	2 días	mié 27/08/25	vie 29/08/25	$2.038.451,00	488	491
490	**Alcantarillado combinado**	**176 días**	**vie 29/08/25**	**mié 1/04/26**	**$294.213.052,00**		
491	Excavación	90 días	vie 29/08/25	mié 17/12/25	$97.456.530,00	489	492CC+3 días
492	Instalación de tubería	90 días	mar 2/09/25	sáb 20/12/25	$101.921.215,00	491CC+3 días	493CC+43 días
493	Rellenos	50 días	jue 23/10/25	mié 24/12/25	$33.377.183,00	492CC+43 días	494
494	Construcción de pozos	5 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25	$4.634.547,00	493	499;498
495	Construcción sumideros	45 días	vie 6/02/26	mié 1/04/26	$56.823.577,00	502	496
496	Fin alcantarillado	0 días	mié 1/04/26	mié 1/04/26	$0,00	495	530
497	**Pavimentos**	**30 días**	**mié 31/12/25**	**vie 6/02/26**	**$753.645.321,00**		
498	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	$0,00	494	499
499	Excavación	15 días	mié 31/12/25	mar 20/01/26	$84.562.108,00	494;498	500CC+10 días
500	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mié 14/01/26	lun 26/01/26	$130.457.196,00	499CC+10 días	501CC+5 días
501	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	mar 20/01/26	sáb 31/01/26	$194.012.480,00	500CC+5 días	502CC+5 días
502	Concreto	10 días	lun 26/01/26	vie 6/02/26	$344.613.537,00	501CC+5 días	495;511;503;510FC+
503	Fin pavimentos	0 días	vie 6/02/26	vie 6/02/26	$0,00	502	530
504	**Acueducto**	**46 días**	**sáb 7/03/26**	**mar 5/05/26**	**$96.905.351,00**		
505	Excavaciones	40 días	sáb 7/03/26	lun 27/04/26	$16.317.660,00	511CC	506CC+3 días
506	Instalación de tubería	40 días	mié 11/03/26	jue 30/04/26	$67.237.377,00	505CC+3 días	507CC+3 días
507	Rellenos	40 días	sáb 14/03/26	mar 5/05/26	$13.350.314,00	506CC+3 días	521;508;520
508	Fin acueducto	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26	$0,00	507	530
509	**Codensa**	**101 días**	**sáb 7/03/26**	**lun 13/07/26**	**$263.209.026,00**		
510	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$0,00	502FC+25 días	511
511	Excavaciones	40 días	sáb 7/03/26	lun 27/04/26	$13.200.415,00	502;510	512CC+3 días;505CC
512	Instalación de tubería	40 días	mié 11/03/26	jue 30/04/26	$140.332.878,00	511CC+3 días	513CC+3 días
513	Rellenos	40 días	sáb 14/03/26	mar 5/05/26	$48.488.266,00	512CC+3 días	515
514	Cajas	50 días	lun 11/05/26	lun 13/07/26	$61.187.467,00	521CC+5 días	515
515	Fin codensa	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	$0,00	514;513	530
516	**ETB**	**15 días**	**jue 25/06/26**	**mar 14/07/26**	**$25.153.059,00**		
517	Renivelación camaras	15 días	jue 25/06/26	mar 14/07/26	$25.153.059,00	523CC+15 días	518
518	Fin ETB	0 días	mar 14/07/26	mar 14/07/26	$0,00	517	530
519	**Espacio público**	**56 días**	**mar 5/05/26**	**mar 14/07/26**	**$254.506.501,00**		
520	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26	$0,00	507	521
521	Excavación	50 días	mar 5/05/26	mar 7/07/26	$32.983.919,00	507;520	522CC+23 días;514C
522	Rellenos	30 días	mar 2/06/26	vie 10/07/26	$31.417.606,00	521CC+23 días	523CC+3 días
523	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	30 días	vie 5/06/26	mar 14/07/26	$190.104.976,00	522CC+3 días	517CC+15 días;524
524	Fin espacio publico	0 días	mar 14/07/26	mar 14/07/26	$0,00	523	530

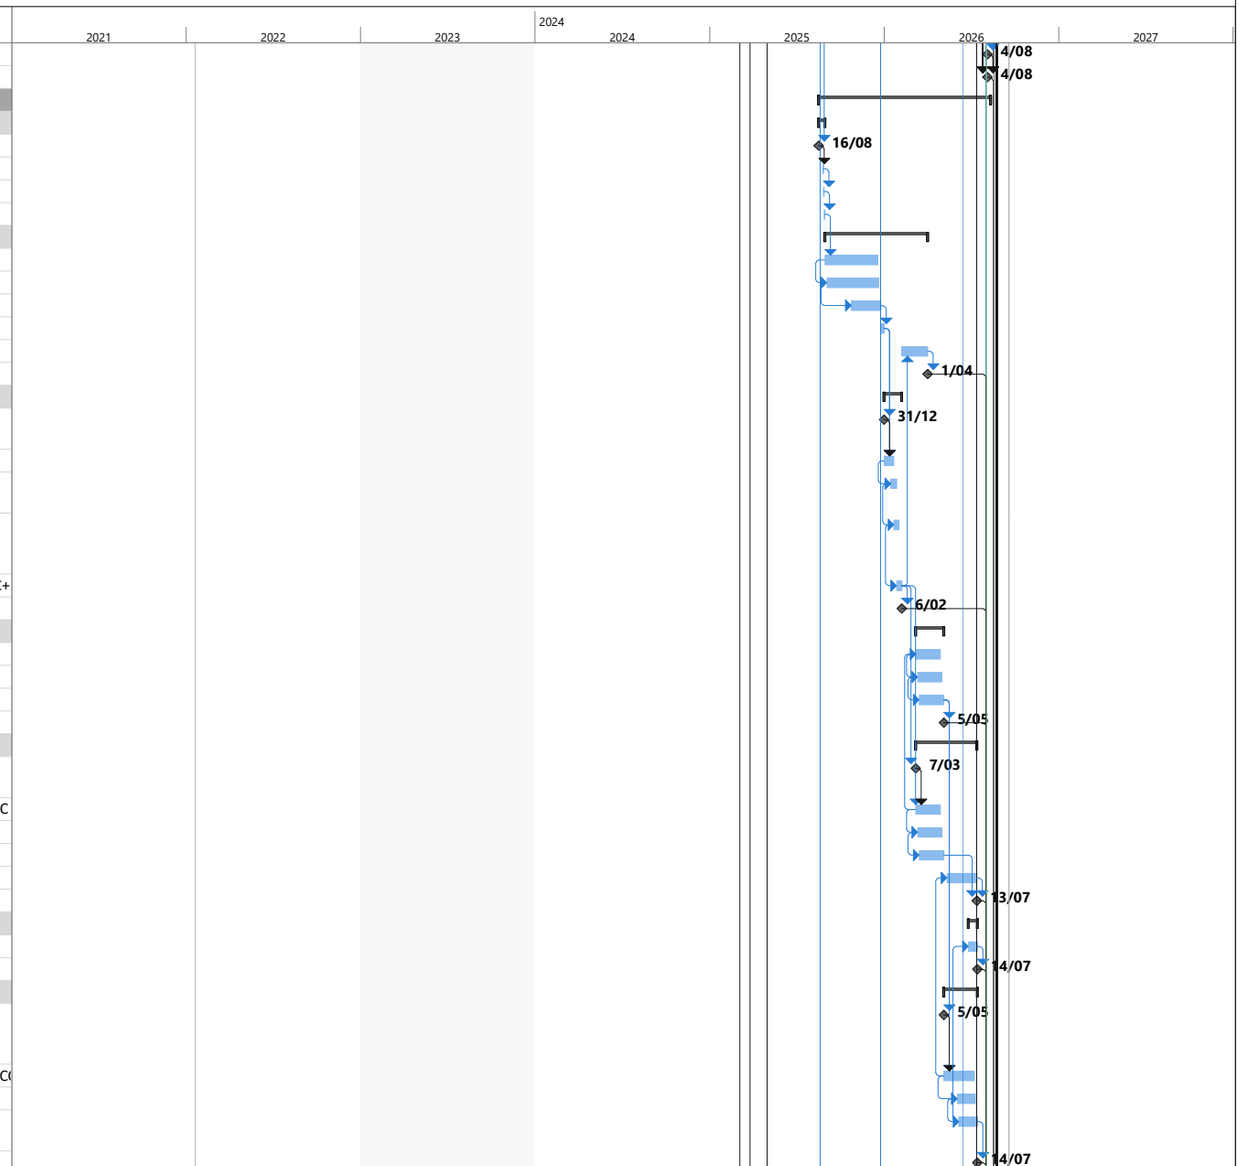


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
525	**Señalización**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$28.339.333,00**		
526	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	$0,00	666FC-2 días	528;527
527	Señalizacion vertical	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$5.378.062,00	526	529
528	Señalizacion horizontal	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$22.961.271,00	526	529
529	Fin Señalizacion	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	528;527	530
530	Fin CIV	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	503;508;515;82;524;	1870
531	**CIV 16000567 (28)**	**417 días**	**vie 14/03/25**	**vie 14/08/26**	**$2.012.931.657,00**		
532	**Preliminares**	**12 días**	**vie 14/03/25**	**sáb 29/03/25**	**$2.521.138,00**		
533	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 14/03/25	vie 14/03/25	$0,00	95FC+20 días	534FC+8 días
534	Cerramiento de obra	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	$0,00	533FC+8 días	535
535	Implementación de PMT	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	$0,00	534	536
536	Replanteo general	2 días	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	$2.521.138,00	535	538
537	**Alcantarillado combinado**	**193 días**	**sáb 29/03/25**	**lun 24/11/25**	**$311.511.678,00**		
538	Excavación	120 días	sáb 29/03/25	mié 27/08/25	$128.496.542,00	536	539CC+3 días
539	Instalación de tubería	120 días	mié 2/04/25	sáb 30/08/25	$95.838.662,00	538CC+3 días	540CC+63 días
540	Rellenos	62 días	vie 20/06/25	vie 5/09/25	$40.397.685,00	539CC+63 días	541
541	Construcción de pozos	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25	$4.046.303,00	540	546;545
542	Construcción sumideros	25 días	jue 23/10/25	lun 24/11/25	$42.732.486,00	549	543
543	Fin alcantarillado	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	542	577
544	**Pavimentos**	**35 días**	**jue 11/09/25**	**jue 23/10/25**	**$945.852.316,00**		
545	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$0,00	541	546
546	Excavación	20 días	jue 11/09/25	sáb 4/10/25	$113.845.831,00	541;545	547CC+15 días
547	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 29/09/25	vie 10/10/25	$167.154.406,00	546CC+15 días	548CC+5 días
548	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 4/10/25	vie 17/10/25	$248.579.516,00	547CC+5 días	549CC+5 días
549	Concreto	10 días	vie 10/10/25	jue 23/10/25	$416.272.563,00	548CC+5 días	542;575;558FC+5 día
550	Fin Pavimentos	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$0,00	549	577;580
551	**Acueducto**	**36 días**	**jue 8/01/26**	**vie 20/02/26**	**$37.844.557,00**		
552	Excavaciones	30 días	jue 8/01/26	vie 13/02/26	$7.324.240,00	560CC+10 días	553CC+3 días
553	Instalación de tubería	30 días	mar 13/01/26	mar 17/02/26	$25.709.003,00	552CC+3 días	554CC+13 días
554	Rellenos	20 días	mié 28/01/26	vie 20/02/26	$4.811.314,00	553CC+13 días	568;555;567
555	Fin Acueducto	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$0,00	554	577
556	**Codensa**	**137 días**	**lun 24/11/25**	**mar 12/05/26**	**$356.764.882,00**		
557	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	549FC+25 días	558
558	Excavaciones	55 días	lun 24/11/25	sáb 31/01/26	$18.487.860,00	549FC+5 días;557	559CC+3 días
559	Instalación de tubería	55 días	jue 27/11/25	mié 4/02/26	$161.916.641,00	558CC+3 días	560CC+23 días
560	Rellenos	35 días	vie 26/12/25	sáb 7/02/26	$70.754.654,00	559CC+23 días	561;552CC+10 días
561	Cajas	65 días	vie 20/02/26	mar 12/05/26	$105.605.727,00	560;568CC	562
562	Fin Codensa	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	$0,00	561	577
563	**ETB**	**21 días**	**mar 28/04/26**	**lun 25/05/26**	**$21.202.431,00**		
564	Renivelación camaras	21 días	mar 28/04/26	lun 25/05/26	$21.202.431,00	570CC+14 días	565
565	Fin ETB	0 días	lun 25/05/26	lun 25/05/26	$0,00	564	577
566	**Espacio público**	**70 días**	**vie 20/02/26**	**mar 19/05/26**	**$301.860.869,00**		

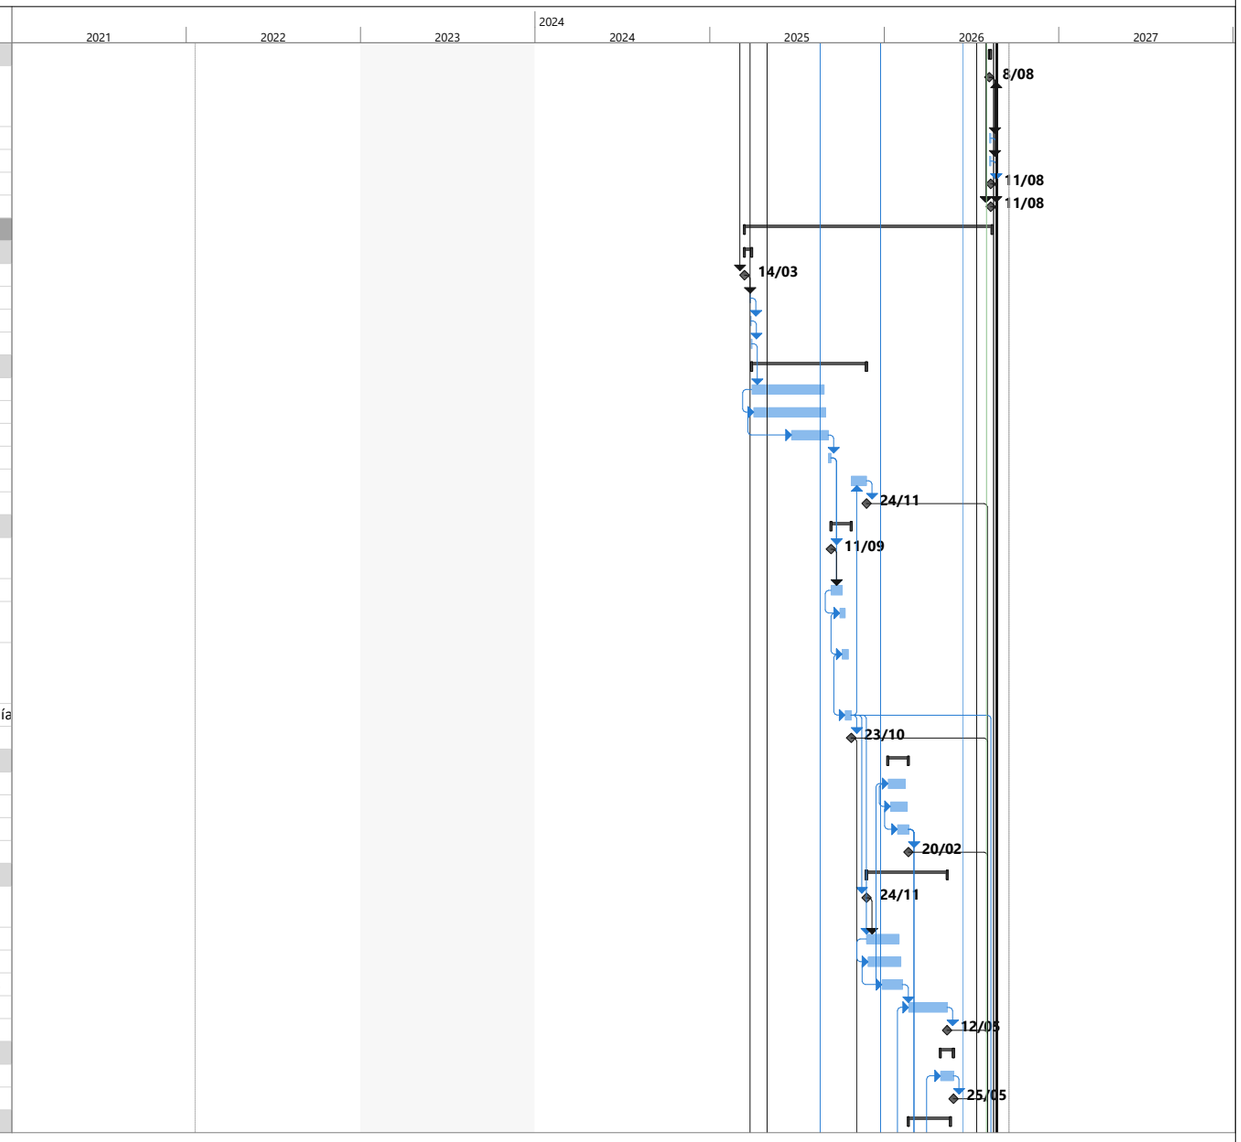


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
567	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$0,00	554	568
568	Excavación	60 días	vie 20/02/26	mié 6/05/26	$39.676.572,00	554;567	569CC+5 días;561CC
569	Rellenos	60 días	jue 26/02/26	mar 12/05/26	$36.896.148,00	568CC+5 días	570CC+35 días
570	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	30 días	sáb 11/04/26	mar 19/05/26	$225.288.149,00	569CC+35 días	564CC+14 días;574;571;573
571	Fin Espacio publico	0 días	mar 19/05/26	mar 19/05/26	$0,00	570	577
572	**Señalización**	**70 días**	**mar 19/05/26**	**vie 14/08/26**	**$35.373.786,00**		
573	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	570;666FC+1 día	575
574	Señalizacion vertical	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	$5.259.314,00	570	576
575	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$30.114.472,00	549;573	576
576	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	574;575	577
577	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	543;550;555;562;565	1870
578	**CIV 16000445 (26)**	**237 días**	**jue 23/10/25**	**vie 14/08/26**	**$650.798.447,00**		
579	**Preliminares**	**6 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/10/25**	**$572.827,00**		
580	Aprobación PMT por SDA	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$0,00	550	581
581	Cerramiento de obra	2 días	jue 23/10/25	sáb 25/10/25	$0,00	580	582
582	Implementación de PMT	2 días	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	$0,00	581	583
583	Replanteo general	2 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$572.827,00	582	585
584	**Alcantarillado combinado**	**86 días**	**jue 30/10/25**	**sáb 14/02/26**	**$140.676.449,00**		
585	Excavación	40 días	jue 30/10/25	vie 19/12/25	$45.830.311,00	583	586CC+3 días
586	Instalación de tubería	40 días	mar 4/11/25	mar 23/12/25	$57.279.256,00	585CC+3 días	587CC+23 días
587	Rellenos	20 días	mar 2/12/25	sáb 27/12/25	$17.446.412,00	586CC+23 días	592;591
588	Construcción sumideros	15 días	mié 28/01/26	sáb 14/02/26	$20.120.470,00	595	589
589	Fin alcantarillado	0 días	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26	$0,00	588	623
590	**Pavimentos**	**25 días**	**sáb 27/12/25**	**mié 28/01/26**	**$219.477.886,00**		
591	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	$0,00	587	592
592	Excavación	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$25.471.336,00	587;591	593CC+5 días;626FC-
593	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	sáb 3/01/26	vie 16/01/26	$37.322.401,00	592CC+5 días	594CC+5 días
594	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 9/01/26	jue 22/01/26	$55.508.792,00	593CC+5 días	595CC+5 días
595	Concreto	10 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	$101.175.357,00	594CC+5 días	588;621;604FC+5 día
596	Fin pavimentos	0 días	mié 28/01/26	mié 28/01/26	$0,00	595	623
597	**Acueducto**	**41 días**	**vie 27/02/26**	**lun 20/04/26**	**$93.707.210,00**		
598	Excavaciones	35 días	vie 27/02/26	lun 13/04/26	$16.628.169,00	606CC	599CC+3 días
599	Instalación de tubería	35 días	mar 3/03/26	jue 16/04/26	$64.315.349,00	598CC+3 días	600CC+13 días
600	Rellenos	25 días	mié 18/03/26	lun 20/04/26	$12.763.692,00	599CC+13 días	614;601;613
601	Fin Acueducto	0 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26	$0,00	600	623
602	**Codensa**	**72 días**	**vie 20/02/26**	**jue 21/05/26**	**$100.843.096,00**		
603	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$0,00	595FC+20 días	604
604	Excavaciones	15 días	vie 20/02/26	mar 10/03/26	$4.085.009,00	595FC+5 días;603	605CC+3 días
605	Instalación de tubería	15 días	mar 24/02/26	vie 13/03/26	$38.000.340,00	604CC+3 días	606CC+3 días
606	Rellenos	15 días	vie 27/02/26	mar 17/03/26	$15.314.079,00	605CC+3 días	607;598CC
607	Cajas	25 días	lun 20/04/26	jue 21/05/26	$43.443.668,00	606;614CC	608

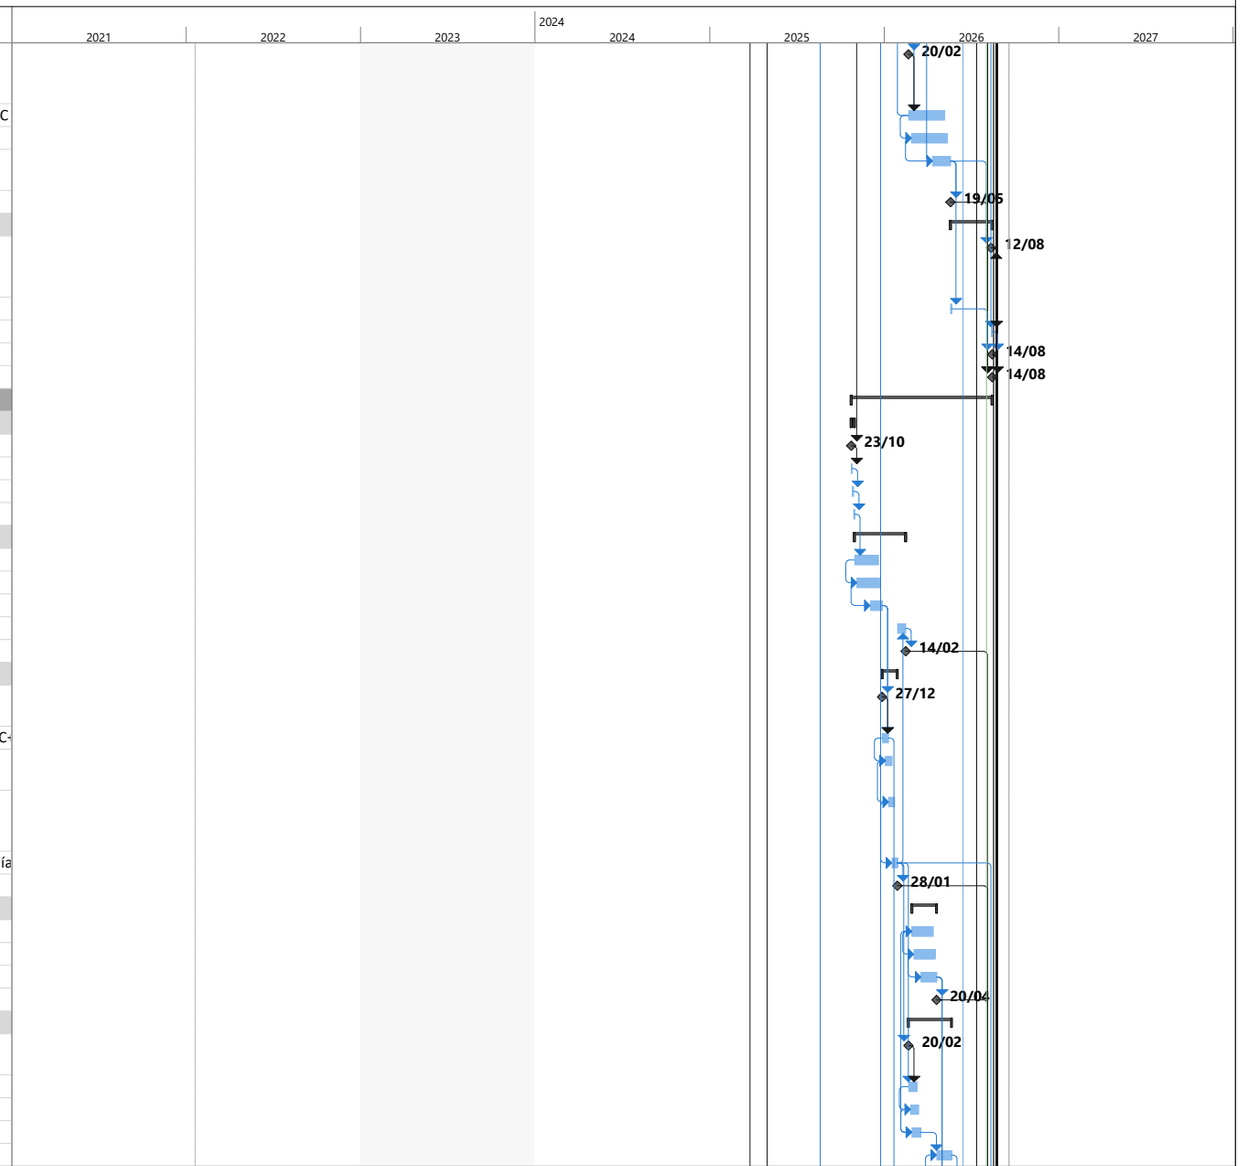


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
608	Fin codensa	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$0,00	607	623
609	**ETB**	**10 días**	**jue 21/05/26**	**mar 2/06/26**	**$12.128.490,00**		
610	Renivelación camaras	10 días	jue 21/05/26	mar 2/06/26	$12.128.490,00	616CC+5 días	611
611	Fin ETB	0 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$0,00	610	623
612	**Espacio público**	**35 días**	**lun 20/04/26**	**mar 2/06/26**	**$75.249.189,00**		
613	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26	$0,00	600	614
614	Excavación	25 días	lun 20/04/26	jue 21/05/26	$9.149.222,00	600;613	615CC+5 días;607CC
615	Rellenos	25 días	sáb 25/04/26	mié 27/05/26	$8.604.869,00	614CC+5 días	616CC+15 días
616	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	15 días	jue 14/05/26	mar 2/06/26	$57.495.098,00	615CC+15 días	610CC+5 días;620;617;619
617	Fin Espacio publico	0 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$0,00	616	623
618	**Señalización**	**58 días**	**mar 2/06/26**	**vie 14/08/26**	**$8.143.300,00**		
619	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	616;666FC+1 día	621
620	Señalizacion vertical	2 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	$2.156.017,00	616	622
621	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$5.987.283,00	595;619	622
622	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	620;621	623
623	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	622;589;601;608;611	870
624	**CIV 16000463 (27)**	**173 días**	**sáb 10/01/26**	**jue 13/08/26**	**$1.047.048.895,00**		
625	**Preliminares**	**6 días**	**sáb 10/01/26**	**lun 19/01/26**	**$1.334.251,00**		
626	Aprobación PMT por SDA	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	$0,00	592FC+1 día	627
627	Cerramiento de obra	2 días	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	$0,00	626	628
628	Implementación de PMT	2 días	mié 14/01/26	vie 16/01/26	$0,00	627	629
629	Replanteo general	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26	$1.334.251,00	628	631
630	**Alcantarillado combinado**	**91 días**	**lun 19/01/26**	**sáb 9/05/26**	**$192.589.267,00**		
631	Excavación	35 días	lun 19/01/26	sáb 28/02/26	$72.586.552,00	629	632CC+3 días
632	Instalación de tubería	35 días	jue 22/01/26	mié 4/03/26	$58.687.374,00	631CC+3 días	633CC+13 días
633	Rellenos	25 días	vie 6/02/26	sáb 7/03/26	$23.722.521,00	632CC+13 días	634
634	Construcción de pozos	10 días	sáb 7/03/26	jue 19/03/26	$8.642.826,00	633	639;638
635	Construcción sumideros	20 días	mié 15/04/26	sáb 9/05/26	$28.949.994,00	642	636
636	Fin alcantarillado	0 días	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	$0,00	635	670
637	**Pavimentos**	**20 días**	**jue 19/03/26**	**mié 15/04/26**	**$618.597.513,00**		
638	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26	$0,00	634	639
639	Excavación	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	$70.024.560,00	634;638	640CC+10 días
640	Estabilización de subrasante rajón con sello	4 días	mié 1/04/26	mié 8/04/26	$108.030.481,00	639CC+10 días	641CC+2 días
641	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	3 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26	$160.656.832,00	640CC+2 días	642CC+3 días
642	Concreto	5 días	jue 9/04/26	mié 15/04/26	$279.885.640,00	641CC+3 días	635;668;651FC+5 día
643	fin pavimentos	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26	$0,00	642	670
644	**Acueducto**	**16 días**	**lun 11/05/26**	**sáb 30/05/26**	**$36.070.245,00**		
645	Excavaciones	10 días	lun 11/05/26	sáb 23/05/26	$7.324.240,00	653CC	646CC+3 días
646	Instalación de tubería	10 días	jue 14/05/26	mié 27/05/26	$23.934.691,00	645CC+3 días	647CC+8 días
647	Rellenos	5 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	$4.811.314,00	646CC+8 días	661;648;660
648	Fin acueducto	0 días	sáb 30/05/26	sáb 30/05/26	$0,00	647	670
649	**Codensa**	**62 días**	**lun 27/04/26**	**mar 14/07/26**	**$47.833.811,00**		

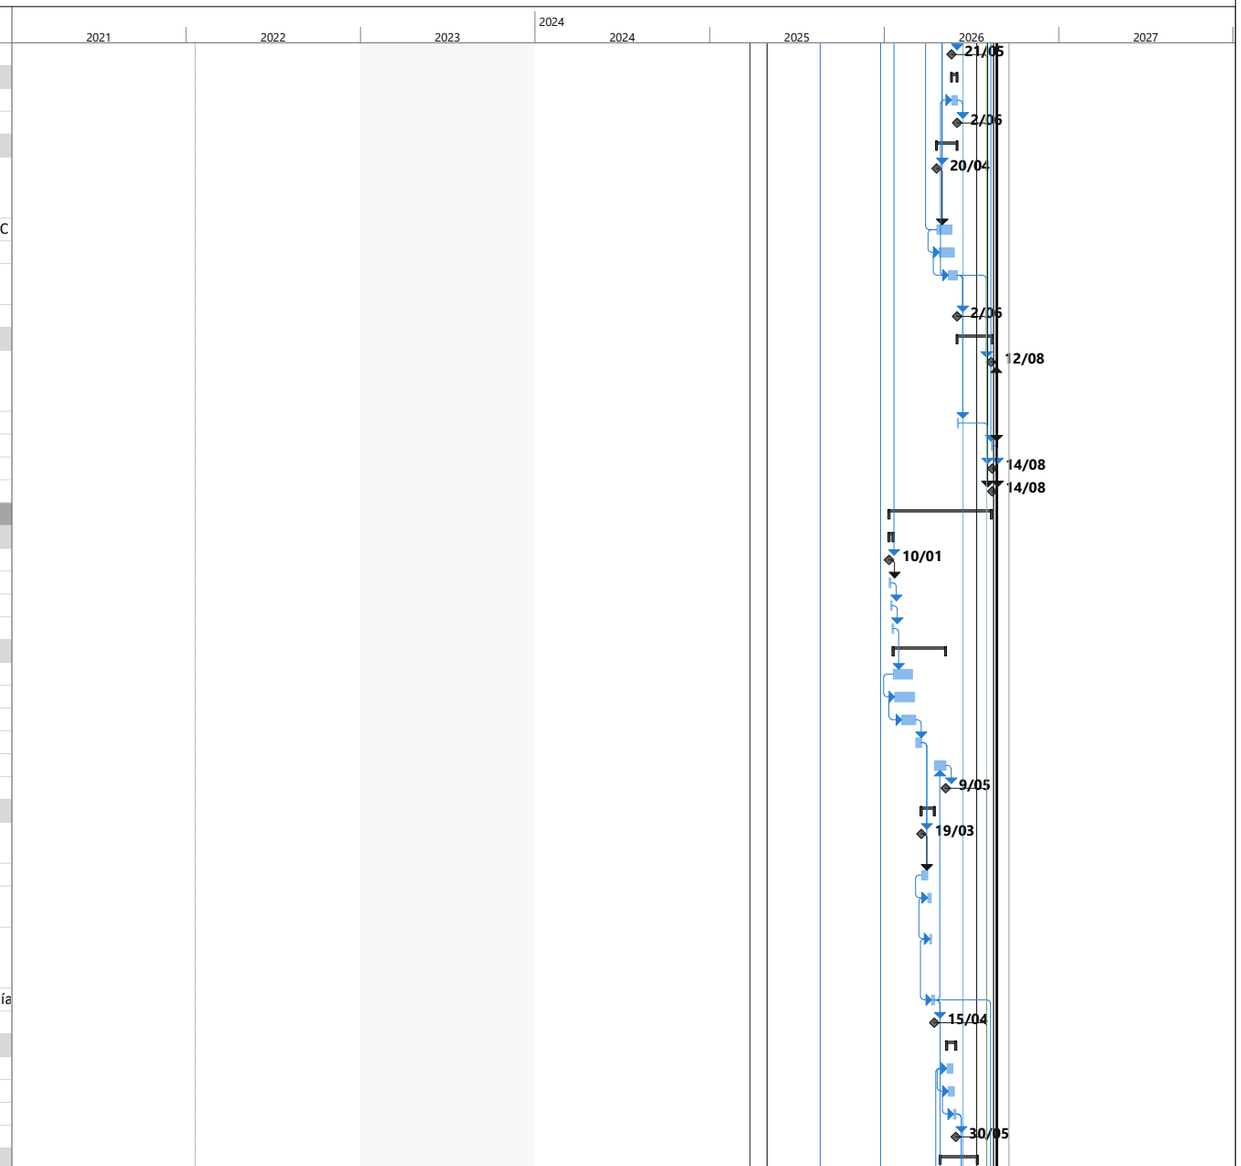


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
650	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	$0,00	642FC+10 días	651
651	Excavaciones	10 días	lun 27/04/26	sáb 9/05/26	$3.363.001,00	642FC+5 días;650	652CC+3 días
652	Instalación de tubería	10 días	jue 30/04/26	mié 13/05/26	$24.551.999,00	651CC+3 días	653CC+8 días
653	Rellenos	5 días	lun 11/05/26	sáb 16/05/26	$12.150.236,00	652CC+8 días	654;645CC
654	Cajas	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	$7.768.575,00	653;663CC+5 días	655
655	Fin Codensa	0 días	mar 14/07/26	mar 14/07/26	$0,00	654	670
656	**ETB**	**10 días**	**jue 2/07/26**	**mar 14/07/26**	**$7.737.471,00**		
657	Renivelación camaras	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	$7.737.471,00	663CC+5 días	658
658	Fin ETB	0 días	mar 14/07/26	mar 14/07/26	$0,00	657	670
659	**Espacio público**	**35 días**	**sáb 30/05/26**	**mar 14/07/26**	**$118.312.872,00**		
660	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 30/05/26	sáb 30/05/26	$0,00	647	661
661	Excavación	25 días	sáb 30/05/26	jue 2/07/26	$13.526.033,00	647;660	662CC+5 días
662	Rellenos	25 días	vie 5/06/26	mié 8/07/26	$12.911.038,00	661CC+5 días	663CC+15 días
663	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	15 días	jue 25/06/26	mar 14/07/26	$91.875.801,00	662CC+15 días	654CC+5 días;657CC+5 días;664;666FC+22
664	Fin Espacio publico	0 días	mar 14/07/26	mar 14/07/26	$0,00	663	670
665	**Señalización**	**2 días**	**mar 11/08/26**	**jue 13/08/26**	**$24.573.465,00**		
666	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	663FC+22 días	668;162;241FC+1 día;332FC+1 día;381FC-5
667	Señalizacion vertical	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$2.569.123,00	666	669
668	Señalizacion horizontal	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$22.004.342,00	642;666	669
669	Fin Señalizacion	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	667;668	670
670	Fin CIV	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	636;643;648;655;65	1870
671	**CIV 16000467 (19)**	**199 días**	**vie 12/12/25**	**mar 18/08/26**	**$1.133.971.222,00**		
672	**Preliminares**	**4 días**	**vie 12/12/25**	**mié 17/12/25**	**$1.453.791,00**		
673	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$0,00	208	674;735;801;863
674	Cerramiento de obra	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	$0,00	673	675
675	Implementación de PMT	1 día	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	$0,00	674	676
676	Replanteo general	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	$1.453.791,00	675	679
677	**Alcantarillado combinado**	**115 días**	**mié 17/12/25**	**vie 8/05/26**	**$137.599.954,00**		
678	**Costado noroccidental**	**86 días**	**mié 17/12/25**	**mié 1/04/26**	**$111.402.801,00**		
679	Excavación	35 días	mié 17/12/25	vie 30/01/26	$27.221.896,00	676	680CC+3 días
680	Instalación de tubería	35 días	sáb 20/12/25	mar 3/02/26	$22.041.600,00	679CC+3 días	681CC+13 días
681	Rellenos	25 días	mié 7/01/26	vie 6/02/26	$7.071.584,00	680CC+13 días	682FC-5 días
682	Construcción de pozos	10 días	sáb 31/01/26	jue 12/02/26	$26.825.293,00	681FC-5 días	694;692
683	Construcción sumideros	20 días	sáb 7/03/26	mié 1/04/26	$28.242.428,00	697	690
684	**Interseccion cr 42B - Cll 17**	**49 días**	**sáb 7/03/26**	**vie 8/05/26**	**$26.197.153,00**		
685	Excavación	5 días	sáb 7/03/26	vie 13/03/26	$11.394.832,00	697	686CC+3 días
686	Instalación de tubería	5 días	mié 11/03/26	mar 17/03/26	$756.012,00	685CC+3 días	687CC+3 días
687	Rellenos	5 días	sáb 14/03/26	vie 20/03/26	$4.220.774,00	686CC+3 días	688
688	Construcción de pozos	5 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	$3.826.278,00	687	699
689	Construcción sumideros	5 días	sáb 2/05/26	vie 8/05/26	$5.999.257,00	702	690
690	Fin alcantarillado	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$0,00	683;689	732
691	**Pavimentos**	**64 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 2/05/26**	**$474.111.494,00**		
692	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	jue 12/02/26	jue 12/02/26	$0,00	682	694

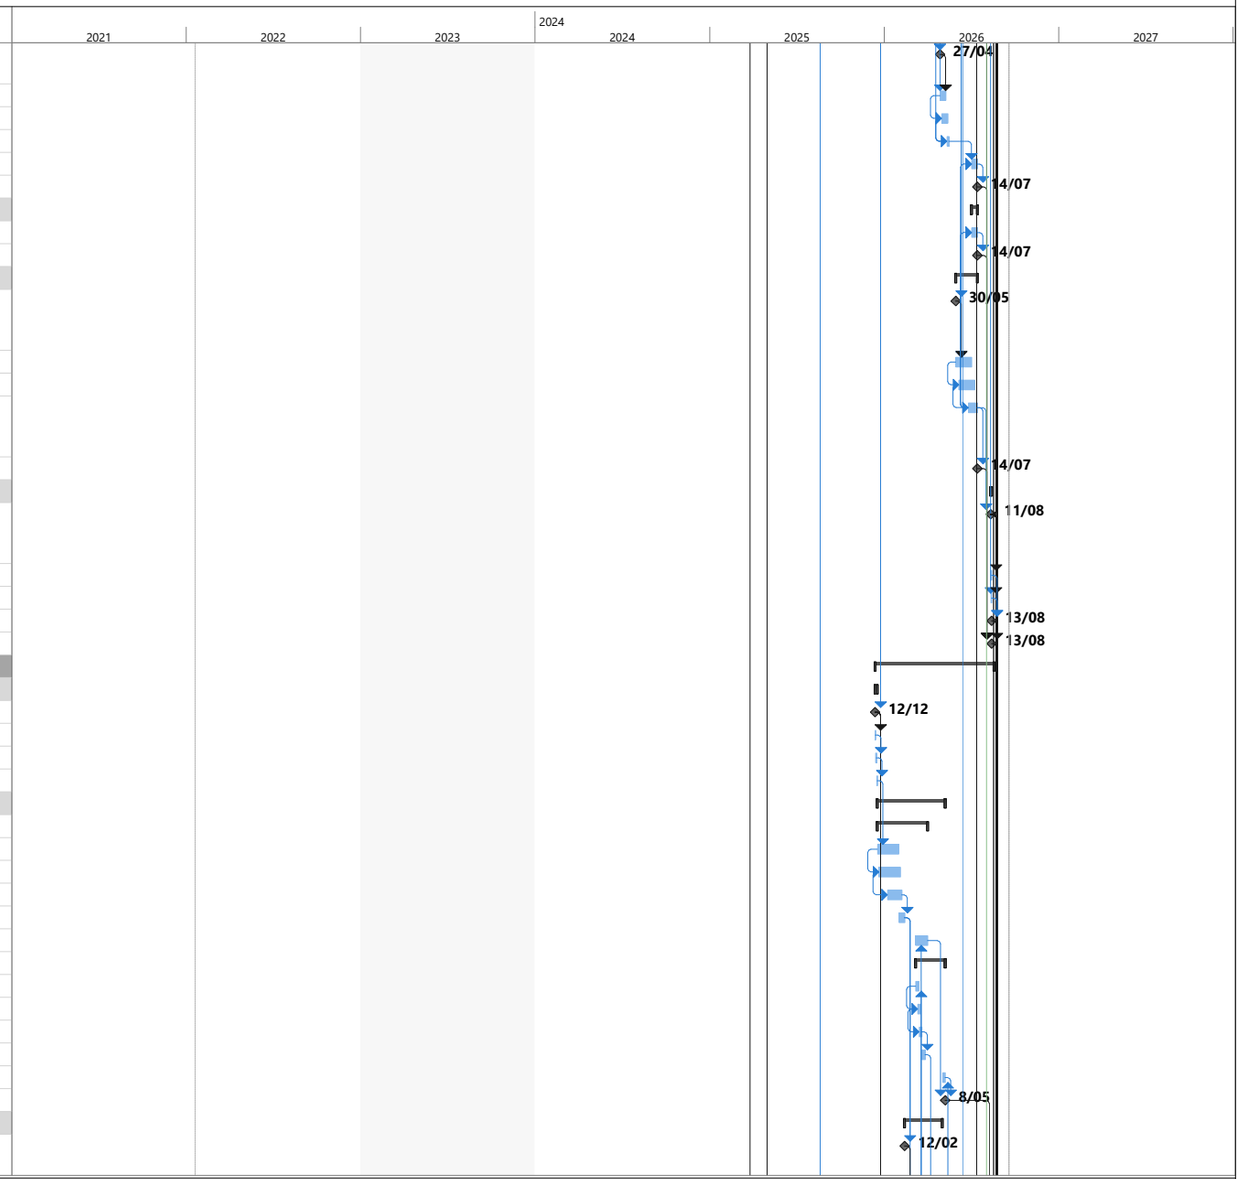


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
693	**Costado noroccidental**	**20 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 7/03/26**	**$320.280.431,00**		
694	Excavación	10 días	jue 12/02/26	mar 24/02/26	$23.561.830,00	682;692	695CC+5 días
695	Estabilización de subrasante rajón con sello	8 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26	$27.975.759,00	694CC+5 días	696CC+5 días
696	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	5 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26	$107.995.206,00	695CC+5 días	697CC+5 días
697	Concreto	5 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	$160.747.636,00	696CC+5 días	683;685;703;711FC+
698	**Interseccion cr 42B - Cll 17**	**28 días**	**vie 27/03/26**	**sáb 2/05/26**	**$153.831.063,00**		
699	Excavación	12 días	vie 27/03/26	lun 13/04/26	$15.554.444,00	688	700CC+5 días
700	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	sáb 4/04/26	sáb 18/04/26	$15.417.823,00	699CC+5 días	701CC+5 días
701	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	$59.516.726,00	700CC+5 días	702CC+6 días
702	Concreto	12 días	vie 17/04/26	sáb 2/05/26	$63.342.070,00	701CC+6 días	689;703
703	Fin pavimentos	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	697;702	732
704	**Acueducto**	**26 días**	**jue 9/04/26**	**lun 11/05/26**	**$90.098.961,00**		
705	Excavaciones	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	$8.995.085,00	711CC	706CC+3 días
706	Instalación de tubería	20 días	lun 13/04/26	jue 7/05/26	$70.818.544,00	705CC+3 días	707CC+13 días
707	Rellenos	10 días	mar 28/04/26	lun 11/05/26	$10.285.332,00	706CC+13 días	721;708;720
708	Fin Acueducto	0 días	lun 11/05/26	lun 11/05/26	$0,00	707	732
709	**Codensa**	**61 días**	**jue 9/04/26**	**mié 24/06/26**	**$178.574.492,00**		
710	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$0,00	697FC+25 días	711
711	Excavaciones	35 días	jue 9/04/26	vie 22/05/26	$9.296.932,00	697FC+5 días;710	712CC+3 días;705CC
712	Instalación de tubería	35 días	lun 13/04/26	mar 26/05/26	$78.711.215,00	711CC+3 días	713CC+23 días
713	Rellenos	15 días	lun 11/05/26	vie 29/05/26	$35.157.901,00	712CC+23 días	715
714	Cajas	35 días	lun 11/05/26	mié 24/06/26	$55.408.444,00	721CC	715
715	Fin codensa	0 días	mié 24/06/26	mié 24/06/26	$0,00	714;713	732
716	**ETB**	**15 días**	**jue 18/06/26**	**mar 7/07/26**	**$15.602.308,00**		
717	Renivelación camaras	15 días	jue 18/06/26	mar 7/07/26	$15.602.308,00	723CC	718
718	Fin ETB	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$0,00	717	732
719	**Espacio público**	**71 días**	**lun 11/05/26**	**sáb 8/08/26**	**$191.749.621,00**		
720	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 11/05/26	lun 11/05/26	$0,00	707	721
721	Excavación	65 días	lun 11/05/26	vie 31/07/26	$26.110.874,00	707;720	722CC+5 días;714CC
722	Rellenos	65 días	sáb 16/05/26	jue 6/08/26	$25.299.363,00	721CC+5 días	723CC+25 días
723	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	41 días	jue 18/06/26	sáb 8/08/26	$140.339.384,00	722CC+25 días	717CC
724	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$22.403.897,00**		
725	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$22.403.897,00	728	726
726	Fin Espacio publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	725	732
727	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$22.376.704,00**		
728	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	730;729;725
729	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$6.033.323,00	728	731
730	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$16.343.381,00	728	731
731	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	729;730	732

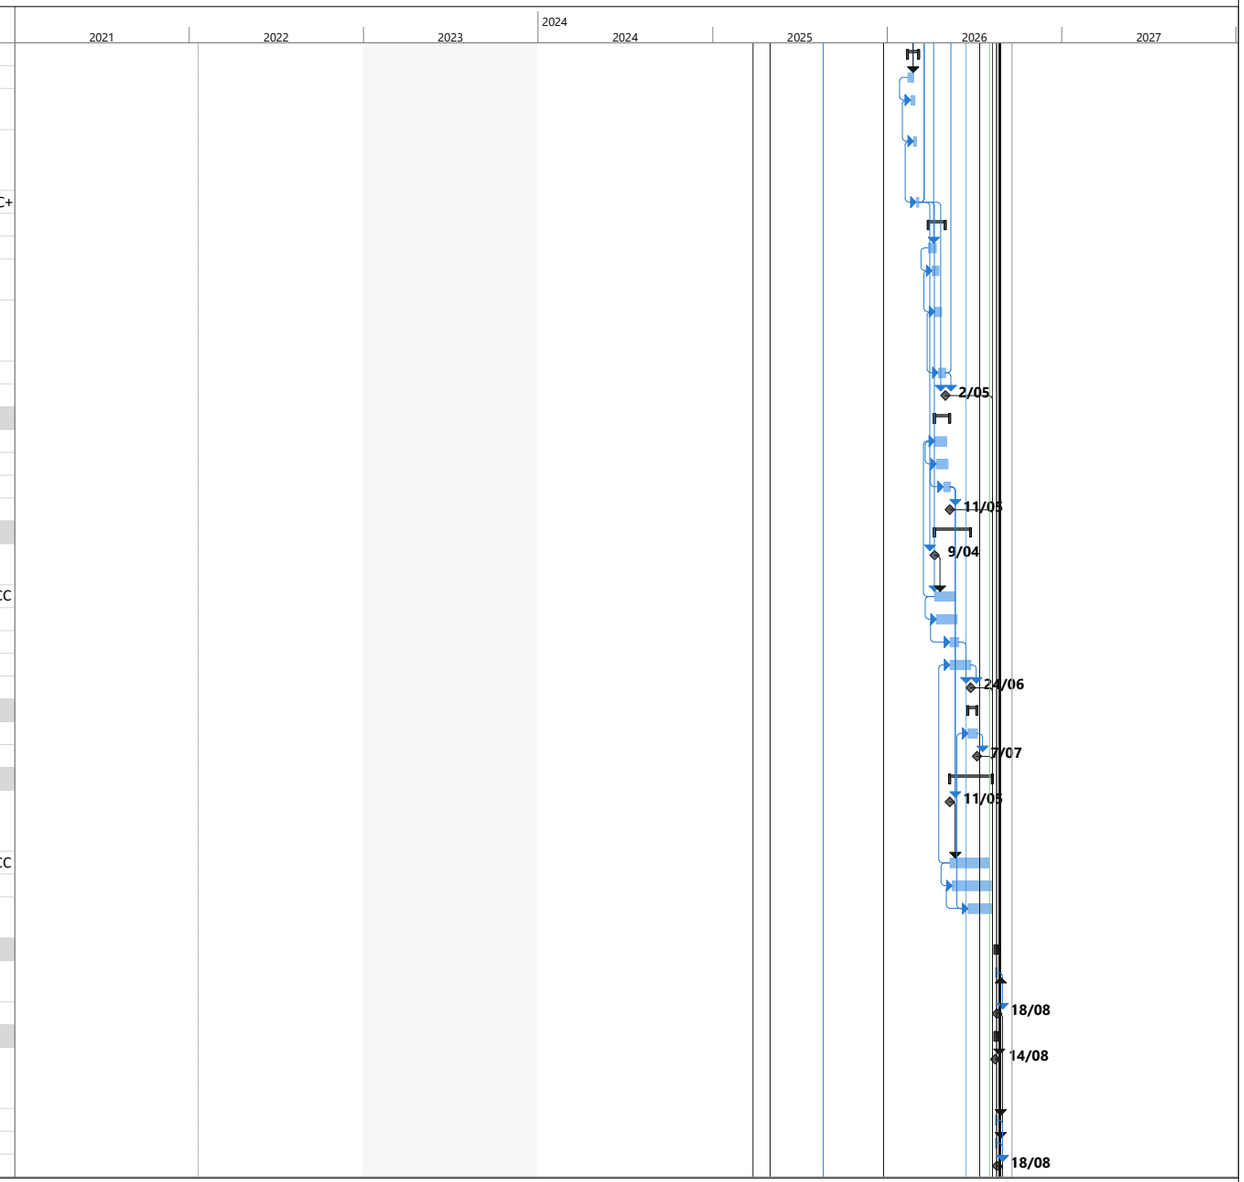


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
732	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	690;703;708;715;718	1870
733	**CIV 16004523 (20)**	**199 días**	**vie 12/12/25**	**mar 18/08/26**	**$1.056.851.491,00**		
734	**Preliminares**	**4 días**	**vie 12/12/25**	**mié 17/12/25**	**$1.425.008,00**		
735	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$0,00	673	736
736	Cerramiento de obra	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	$0,00	735	737
737	Implementación de PMT	1 día	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	$0,00	736	738
738	Replanteo general	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	$1.425.008,00	737	741
739	**Alcantarillado combinado**	**134 días**	**mié 17/12/25**	**lun 1/06/26**	**$191.661.284,00**		
740	**Costado noroccidental**	**101 días**	**mié 17/12/25**	**mar 21/04/26**	**$163.327.115,00**		
741	Excavación	50 días	mié 17/12/25	mar 17/02/26	$57.863.017,00	738	742CC+3 días
742	Instalación de tubería	50 días	sáb 20/12/25	vie 20/02/26	$25.715.087,00	741CC+3 días	743CC+23 días
743	Rellenos	30 días	mar 20/01/26	mar 24/02/26	$17.660.570,00	742CC+23 días	744FC-5 días
744	Construcción de pozos	10 días	mié 18/02/26	lun 2/03/26	$27.477.912,00	743FC-5 días	755;753
745	Construcción sumideros	20 días	jue 26/03/26	mar 21/04/26	$34.610.529,00	758	751
746	**Interseccion cr 42Abis - Cll 17**	**25 días**	**jue 30/04/26**	**lun 1/06/26**	**$28.334.169,00**		
747	Excavación	10 días	jue 30/04/26	mié 13/05/26	$15.008.953,00	763	748CC+5 días
748	Instalación de tubería	10 días	jue 7/05/26	mié 20/05/26	$5.017.648,00	747CC+5 días	749CC+5 días
749	Rellenos	10 días	mié 13/05/26	mar 26/05/26	$3.815.656,00	748CC+5 días	750FC-5 días
750	Construcción de pozos	10 días	mié 20/05/26	lun 1/06/26	$4.491.912,00	749FC-5 días	751
751	Fin alcantarillado	0 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26	$0,00	745;750	798
752	**Pavimentos**	**48 días**	**lun 2/03/26**	**jue 30/04/26**	**$510.793.352,00**		
753	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$0,00	744	755
754	**Costado noroccidental**	**20 días**	**lun 2/03/26**	**jue 26/03/26**	**$290.792.931,00**		
755	Excavación	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	$40.292.796,00	744;753	756CC+5 días
756	Estabilización de subrasante rajón con sello	8 días	sáb 7/03/26	mar 17/03/26	$22.319.367,00	755CC+5 días	757CC+5 días
757	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	5 días	vie 13/03/26	jue 19/03/26	$86.159.632,00	756CC+5 días	758CC+5 días
758	Concreto	5 días	jue 19/03/26	jue 26/03/26	$142.021.136,00	757CC+5 días	745;760;769;765;777
759	**Interseccion cr 42B - Cll 17**	**28 días**	**jue 26/03/26**	**jue 30/04/26**	**$148.121.760,00**		
760	Excavación	12 días	jue 26/03/26	sáb 11/04/26	$9.845.141,00	758	761CC+5 días
761	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mié 1/04/26	vie 17/04/26	$15.417.823,00	760CC+5 días	762CC+6 días
762	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	$59.516.726,00	761CC+6 días	763CC+5 días
763	Concreto	12 días	jue 16/04/26	jue 30/04/26	$63.342.070,00	762CC+5 días	747;769
764	**Interseccion cr 42Abis - Cll 17**	**28 días**	**jue 26/03/26**	**jue 30/04/26**	**$71.878.661,00**		
765	Excavación	12 días	jue 26/03/26	sáb 11/04/26	$8.426.976,00	758	766CC+5 días
766	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mié 1/04/26	vie 17/04/26	$7.074.582,00	765CC+5 días	767CC+6 días
767	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	$27.310.894,00	766CC+6 días	768CC+5 días
768	Concreto	12 días	jue 16/04/26	jue 30/04/26	$29.066.209,00	767CC+5 días	796;769
769	Fin pavimentos	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	$0,00	758;763;768	798
770	**Acueducto**	**26 días**	**jue 9/04/26**	**lun 11/05/26**	**$22.299.655,00**		
771	Excavaciones	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	$2.460.297,00	777CC	772CC+3 días
772	Instalación de tubería	20 días	lun 13/04/26	jue 7/05/26	$16.939.097,00	771CC+3 días	773CC+13 días

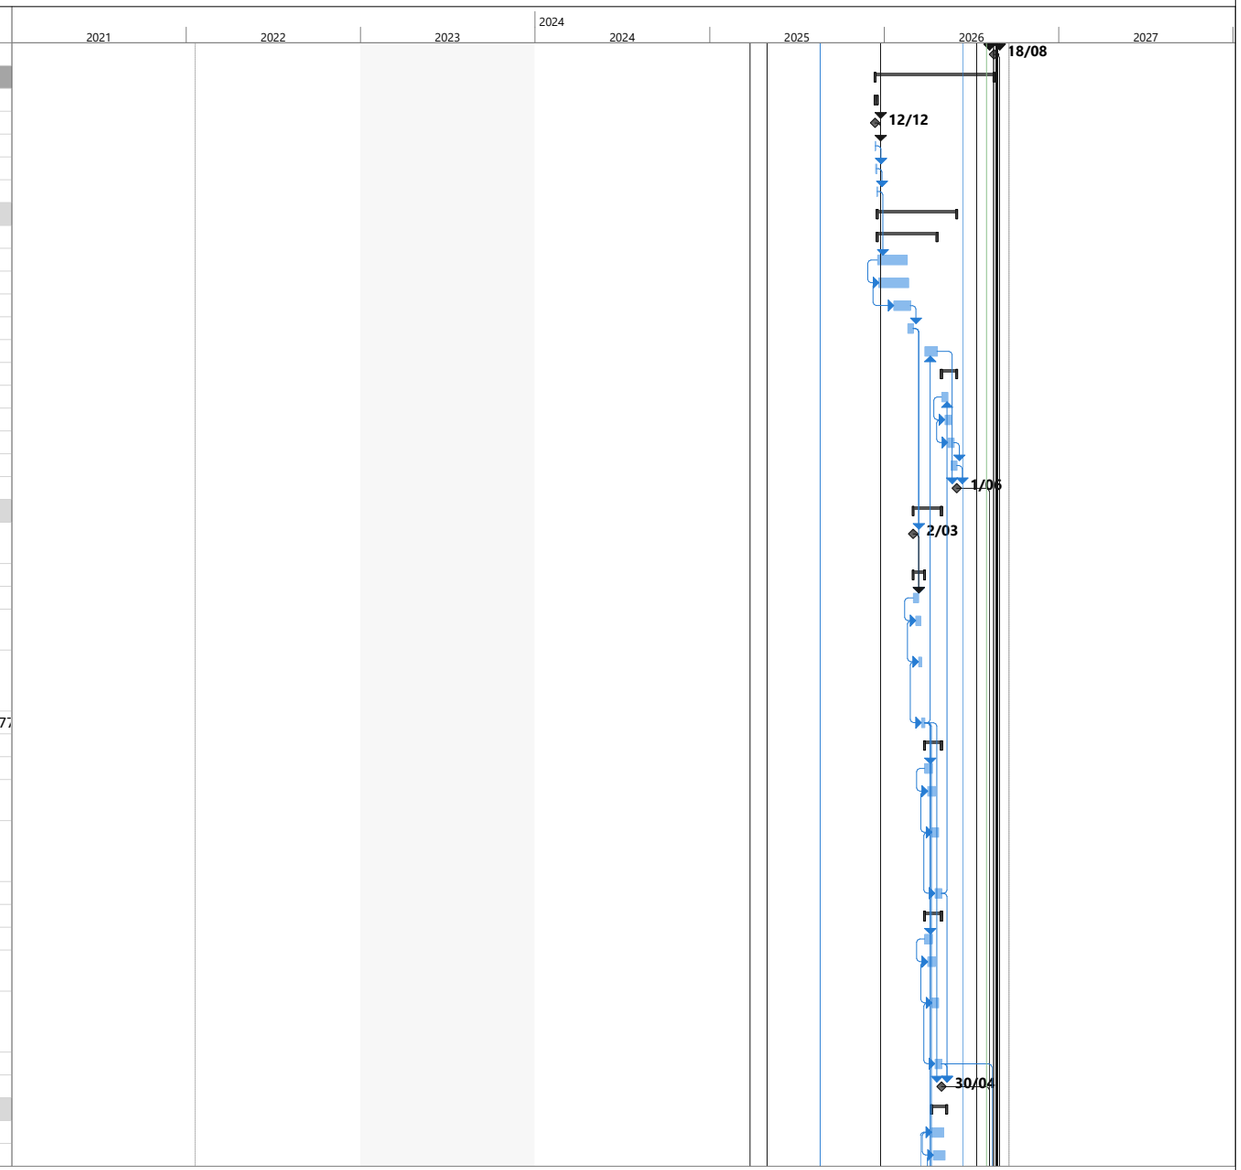


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
773	Rellenos	10 días	mar 28/04/26	lun 11/05/26	$2.900.261,00	772CC+13 días	787;774;786
774	Fin acueducto	0 días	lun 11/05/26	lun 11/05/26	$0,00	773	798
775	**Codensa**	**66 días**	**jue 9/04/26**	**mié 1/07/26**	**$109.661.026,00**		
776	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$0,00	758FC+10 días	777
777	Excavaciones	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	$3.682.377,00	758FC+5 días;776	778CC+3 días;771CC
778	Instalación de tubería	20 días	lun 13/04/26	jue 7/05/26	$35.871.495,00	777CC+3 días	779CC+13 días
779	Rellenos	10 días	mar 28/04/26	lun 11/05/26	$13.148.633,00	778CC+13 días	780
780	Cajas	30 días	sáb 23/05/26	mié 1/07/26	$56.958.521,00	779;787CC+10 días	781
781	Fin Codensa	0 días	mié 1/07/26	mié 1/07/26	$0,00	780	798
782	**ETB**	**10 días**	**jue 25/06/26**	**mié 8/07/26**	**$7.903.089,00**		
783	Renivelación camaras	10 días	jue 25/06/26	mié 8/07/26	$7.903.089,00	789CC+10 días	784
784	Fin ETB	0 días	mié 8/07/26	mié 8/07/26	$0,00	783	798
785	**Espacio público**	**71 días**	**lun 11/05/26**	**sáb 8/08/26**	**$172.066.193,00**		
786	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 11/05/26	lun 11/05/26	$0,00	773	787
787	Excavación	65 días	lun 11/05/26	vie 31/07/26	$24.378.752,00	773;786	788CC+3 días;780CC-
788	Rellenos	65 días	jue 14/05/26	mar 4/08/26	$23.300.604,00	787CC+3 días	789CC+23 días
789	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	45 días	vie 12/06/26	sáb 8/08/26	$124.386.837,00	788CC+23 días	791;783CC+10 días
790	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$13.872.039,00**		
791	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$13.872.039,00	789	792
792	Fin Espacio publico	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	791	798
793	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$27.169.845,00**		
794	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	796;795
795	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$5.537.171,00	794	797
796	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$21.632.674,00	768;794	797
797	Fin Señalización	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	795;796	798
798	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	751;774;781;784;792	1870
799	**CIV 16000517 (21)**	**199 días**	**vie 12/12/25**	**mar 18/08/26**	**$953.849.072,00**		
800	**Preliminares**	**4 días**	**vie 12/12/25**	**mié 17/12/25**	**$1.187.742,00**		
801	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$0,00	673	802
802	Cerramiento de obra	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	$0,00	801	803
803	Implementación de PMT	1 día	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	$0,00	802	804
804	Replanteo general	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	$1.187.742,00	803	807
805	**Alcantarillado combinado**	**67 días**	**mié 17/12/25**	**lun 9/03/26**	**$78.993.029,00**		
806	**Costado noroccidental**	**56 días**	**mié 17/12/25**	**mar 24/02/26**	**$64.504.697,00**		
807	Excavación	20 días	mié 17/12/25	mar 13/01/26	$11.875.715,00	804	808CC+3 días
808	Instalación de tubería	20 días	sáb 20/12/25	vie 16/01/26	$9.497.875,00	807CC+3 días	809CC+13 días
809	Rellenos	10 días	mié 7/01/26	mar 20/01/26	$1.287.878,00	808CC+13 días	819;817
810	Construcción sumideros	10 días	jue 12/02/26	mar 24/02/26	$41.843.229,00	822	815
811	**Interseccion cr 42Abis - Cll 17**	**21 días**	**jue 12/02/26**	**lun 9/03/26**	**$14.488.332,00**		
812	Excavación	15 días	jue 12/02/26	lun 2/03/26	$6.408.932,00	822	813CC+3 días
813	Instalación de tubería	15 días	lun 16/02/26	jue 5/03/26	$6.558.714,00	812CC+3 días	814CC+8 días
814	Rellenos	10 días	mié 25/02/26	lun 9/03/26	$1.520.686,00	813CC+8 días	824;815;829
815	Fin alcantarillado	0 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26	$0,00	810;814	860

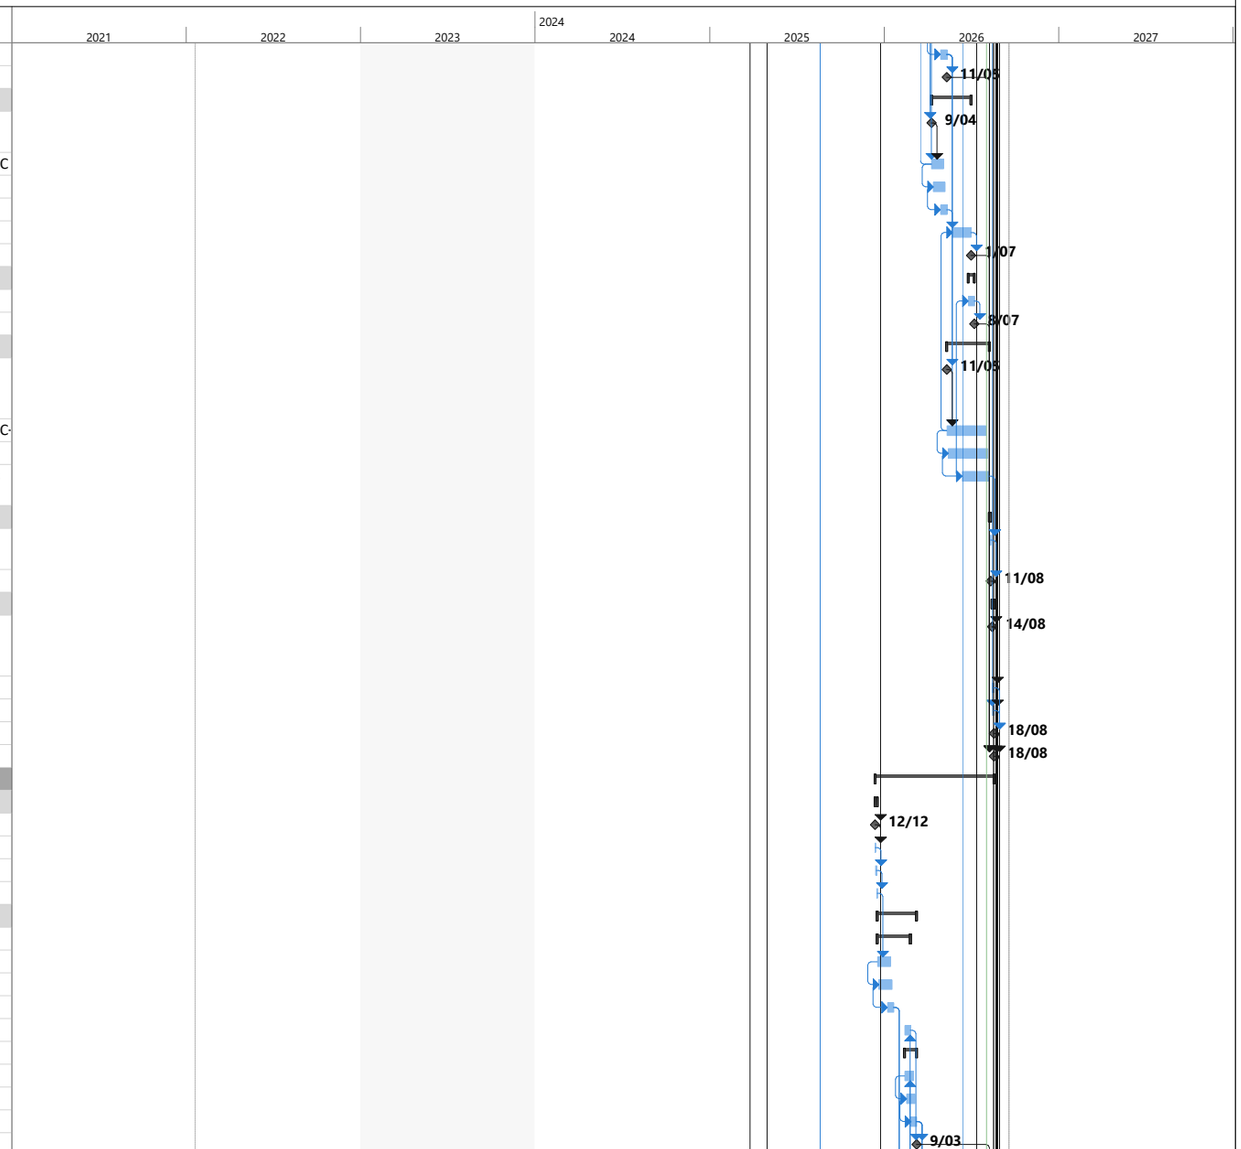


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
816	**Pavimentos**	**69 días**	**mar 20/01/26**	**mar 14/04/26**	**$476.275.385,00**		
817	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	$0,00	809	819
818	**Costado noroccidental**	**20 días**	**mar 20/01/26**	**jue 12/02/26**	**$288.881.625,00**		
819	Excavación	10 días	mar 20/01/26	sáb 31/01/26	$17.078.848,00	809;817	820CC+10 días
820	Estabilización de subrasante rajón con sello	4 días	sáb 31/01/26	jue 5/02/26	$24.347.124,00	819CC+10 días	821CC+2 días
821	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26	$93.989.339,00	820CC+2 días	822CC+3 días
822	Concreto	5 días	vie 6/02/26	jue 12/02/26	$153.466.314,00	821CC+3 días	810;812;833
823	**Interseccion cr 42Abis - Cll 17**	**28 días**	**lun 9/03/26**	**mar 14/04/26**	**$90.577.826,00**		
824	Excavación	12 días	lun 9/03/26	mar 24/03/26	$10.410.301,00	814	825CC+11 días
825	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	sáb 21/03/26	mié 8/04/26	$8.938.787,00	824CC+11 días	826CC+3 días
826	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	jue 26/03/26	sáb 11/04/26	$34.505.465,00	825CC+3 días	827CC+2 días
827	Concreto	12 días	sáb 28/03/26	mar 14/04/26	$36.723.273,00	826CC+2 días	833
828	**Interseccion cr 42A - Cll 17**	**28 días**	**lun 9/03/26**	**mar 14/04/26**	**$96.815.934,00**		
829	Excavación	12 días	lun 9/03/26	mar 24/03/26	$11.127.537,00	814	830CC+11 días
830	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	sáb 21/03/26	mié 8/04/26	$9.554.352,00	829CC+11 días	831CC+3 días
831	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	jue 26/03/26	sáb 11/04/26	$36.881.754,00	830CC+3 días	832CC+2 días
832	Concreto	12 días	sáb 28/03/26	mar 14/04/26	$39.252.291,00	831CC+2 días	858;841;833;840FC+
833	Fin pavimentos	0 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26	$0,00	822;827;832	860
834	**Acueducto**	**16 días**	**sáb 2/05/26**	**vie 22/05/26**	**$106.799.729,00**		
835	Excavaciones	10 días	sáb 2/05/26	jue 14/05/26	$16.673.004,00	841CC	836CC+3 días
836	Instalación de tubería	10 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	$72.892.501,00	835CC+3 días	837CC+8 días
837	Rellenos	5 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26	$17.234.224,00	836CC+8 días	851;838;850
838	Fin acueducto	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	$0,00	837	860
839	**Codensa**	**61 días**	**sáb 2/05/26**	**vie 17/07/26**	**$132.567.158,00**		
840	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	832FC+15 días	841
841	Excavaciones	20 días	sáb 2/05/26	mié 27/05/26	$6.471.684,00	832;840	842CC+3 días;835CC
842	Instalación de tubería	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	$67.633.309,00	841CC+3 días	843CC+13 días
843	Rellenos	10 días	vie 22/05/26	mié 3/06/26	$23.962.437,00	842CC+13 días	844
844	Cajas	30 días	mié 10/06/26	vie 17/07/26	$34.499.728,00	843;851CC+15 días	845
845	Fin Codensa	0 días	vie 17/07/26	vie 17/07/26	$0,00	844	860
846	**ETB**	**10 días**	**mar 7/07/26**	**sáb 18/07/26**	**$8.030.454,00**		
847	Renivelación camaras	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	$8.030.454,00	853CC+10 días	848
848	Fin ETB	0 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	$0,00	847	860
849	**Espacio público**	**62 días**	**vie 22/05/26**	**sáb 8/08/26**	**$128.869.096,00**		
850	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	$0,00	837	851
851	Excavación	55 días	vie 22/05/26	jue 30/07/26	$16.741.484,00	837;850	852CC+3 días;844CC-
852	Rellenos	55 días	mar 26/05/26	lun 3/08/26	$15.808.368,00	851CC+3 días	853CC+23 días
853	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	36 días	mié 24/06/26	sáb 8/08/26	$96.319.244,00	852CC+23 días	847CC+10 días;854;857;856

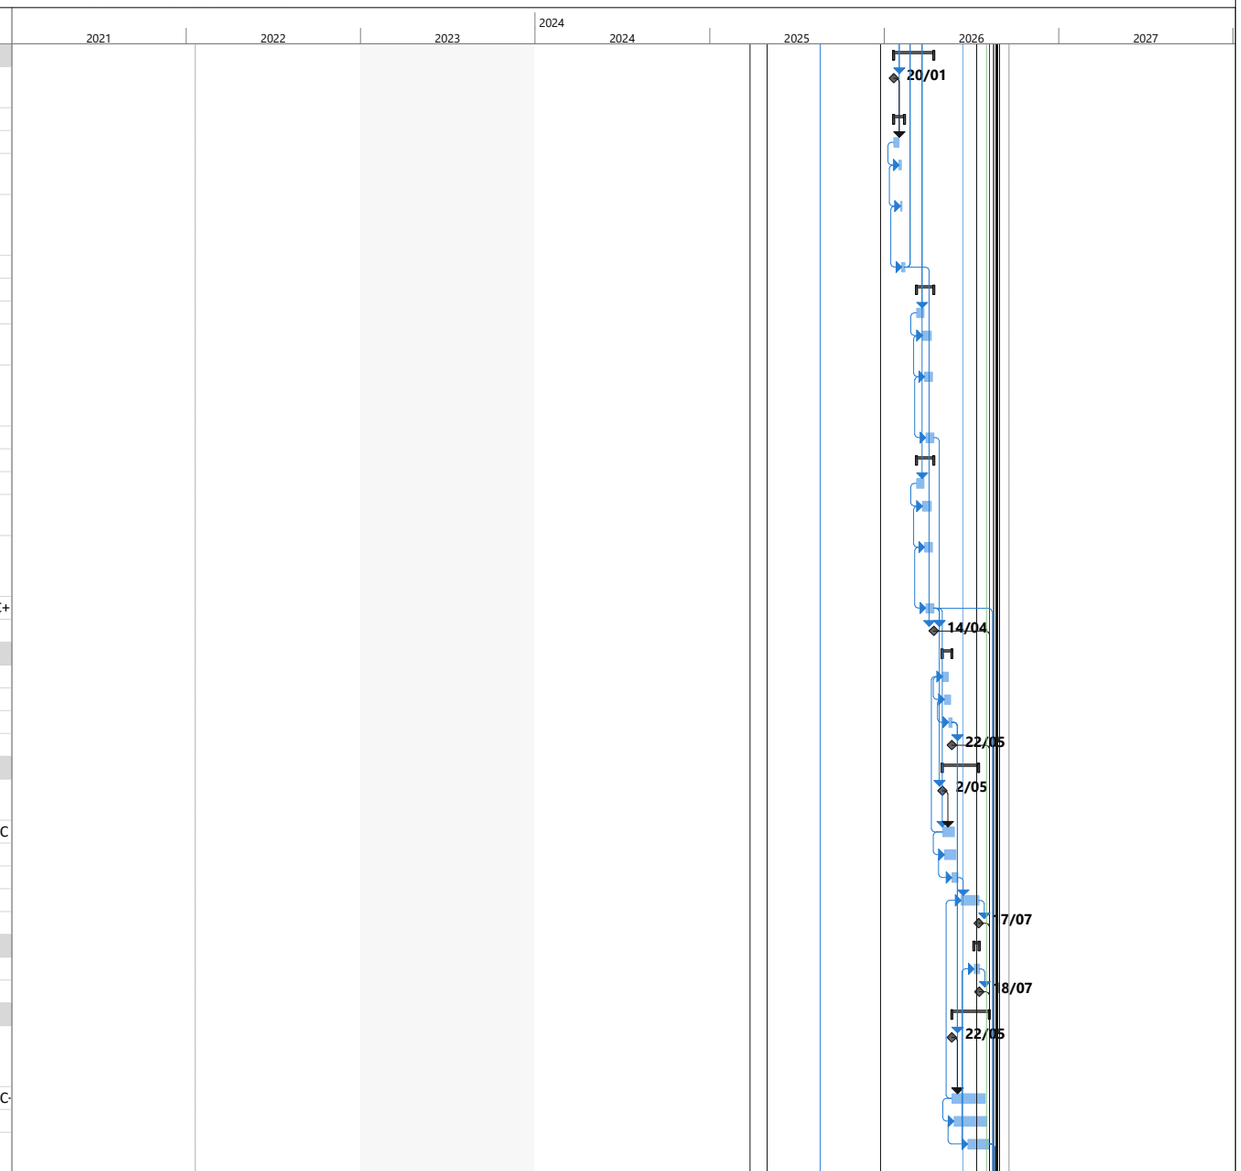


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
854	Fin Espacio publico	0 días	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	$0,00	853	860
855	**Señalización**	**7 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 18/08/26**	**$21.126.479,00**		
856	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	853;666FC+3 días	858
857	Señalizacion vertical	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$2.088.583,00	853	859
858	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$19.037.896,00	832;856	859
859	Fin Señalización	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	857;858	860
860	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	815;833;838;845;848	1870
861	**CIV 16000597 (22)**	**199 días**	**vie 12/12/25**	**mar 18/08/26**	**$1.632.585.705,00**		
862	**Preliminares**	**4 días**	**vie 12/12/25**	**mié 17/12/25**	**$1.958.640,00**		
863	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$0,00	673	864
864	Cerramiento de obra	1 día	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	$0,00	863	865
865	Implementación de PMT	1 día	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	$0,00	864	866
866	Replanteo general	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	$1.958.640,00	865	869
867	**Alcantarillado combinado**	**107 días**	**mié 17/12/25**	**mar 28/04/26**	**$124.502.823,00**		
868	**Costado noroccidental**	**86 días**	**mié 17/12/25**	**mié 1/04/26**	**$83.075.496,00**		
869	Excavación	30 días	mié 17/12/25	sáb 24/01/26	$33.374.833,00	866	870CC+3 días
870	Instalación de tubería	30 días	sáb 20/12/25	mié 28/01/26	$11.734.365,00	869CC+3 días	871CC+3 días
871	Rellenos	30 días	mié 24/12/25	sáb 31/01/26	$8.379.636,00	870CC+3 días	872FC-5 días
872	Construcción de pozos	10 días	lun 26/01/26	vie 6/02/26	$1.344.234,00	871FC-5 días	883;881
873	Construcción sumideros	20 días	sáb 7/03/26	mié 1/04/26	$28.242.428,00	886	879
874	**Interseccion cr 42A - Cll 17**	**41 días**	**sáb 7/03/26**	**mar 28/04/26**	**$41.427.327,00**		
875	Excavación	15 días	sáb 7/03/26	jue 26/03/26	$14.921.585,00	886	876CC+3 días
876	Instalación de tubería	15 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26	$9.969.829,00	875CC+3 días	877CC+3 días
877	Rellenos	15 días	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26	$4.537.400,00	876CC+3 días	878
878	Construcción de pozos	20 días	sáb 4/04/26	mar 28/04/26	$11.998.513,00	877	888;879
879	Fin alcantarillado	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	$0,00	873;878	921
880	**Pavimentos**	**94 días**	**vie 6/02/26**	**mar 2/06/26**	**$743.133.917,00**		
881	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	vie 6/02/26	vie 6/02/26	$0,00	872	883
882	**Costado noroccidental**	**25 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 7/03/26**	**$634.162.785,00**		
883	Excavación	15 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	$73.384.087,00	872;881	884CC+5 días
884	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	jue 12/02/26	mar 24/02/26	$55.298.914,00	883CC+5 días	885CC+5 días
885	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	mié 18/02/26	lun 2/03/26	$213.471.766,00	884CC+5 días	886CC+5 días
886	Concreto	10 días	mar 24/02/26	sáb 7/03/26	$292.008.018,00	885CC+5 días	873;875;892;900FC+
887	**Interseccion cr 42A - Cll 17**	**28 días**	**mar 28/04/26**	**mar 2/06/26**	**$108.971.132,00**		
888	Excavación	12 días	mar 28/04/26	mié 13/05/26	$12.096.581,00	878	889CC+5 días
889	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mar 5/05/26	mié 20/05/26	$10.107.509,00	888CC+5 días	890CC+6 días
890	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	mar 12/05/26	mié 27/05/26	$39.017.128,00	889CC+6 días	891CC+5 días
891	Concreto	12 días	mar 19/05/26	mar 2/06/26	$47.749.914,00	890CC+5 días	919;277;892
892	Fin pavimentos	0 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$0,00	886;891	921
893	**Acueducto**	**16 días**	**jue 9/04/26**	**mar 28/04/26**	**$333.014.750,00**		
894	Excavaciones	10 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	$26.265.326,00	900CC	895CC+3 días
895	Instalación de tubería	10 días	lun 13/04/26	vie 24/04/26	$222.959.885,00	894CC+3 días	896CC+3 días

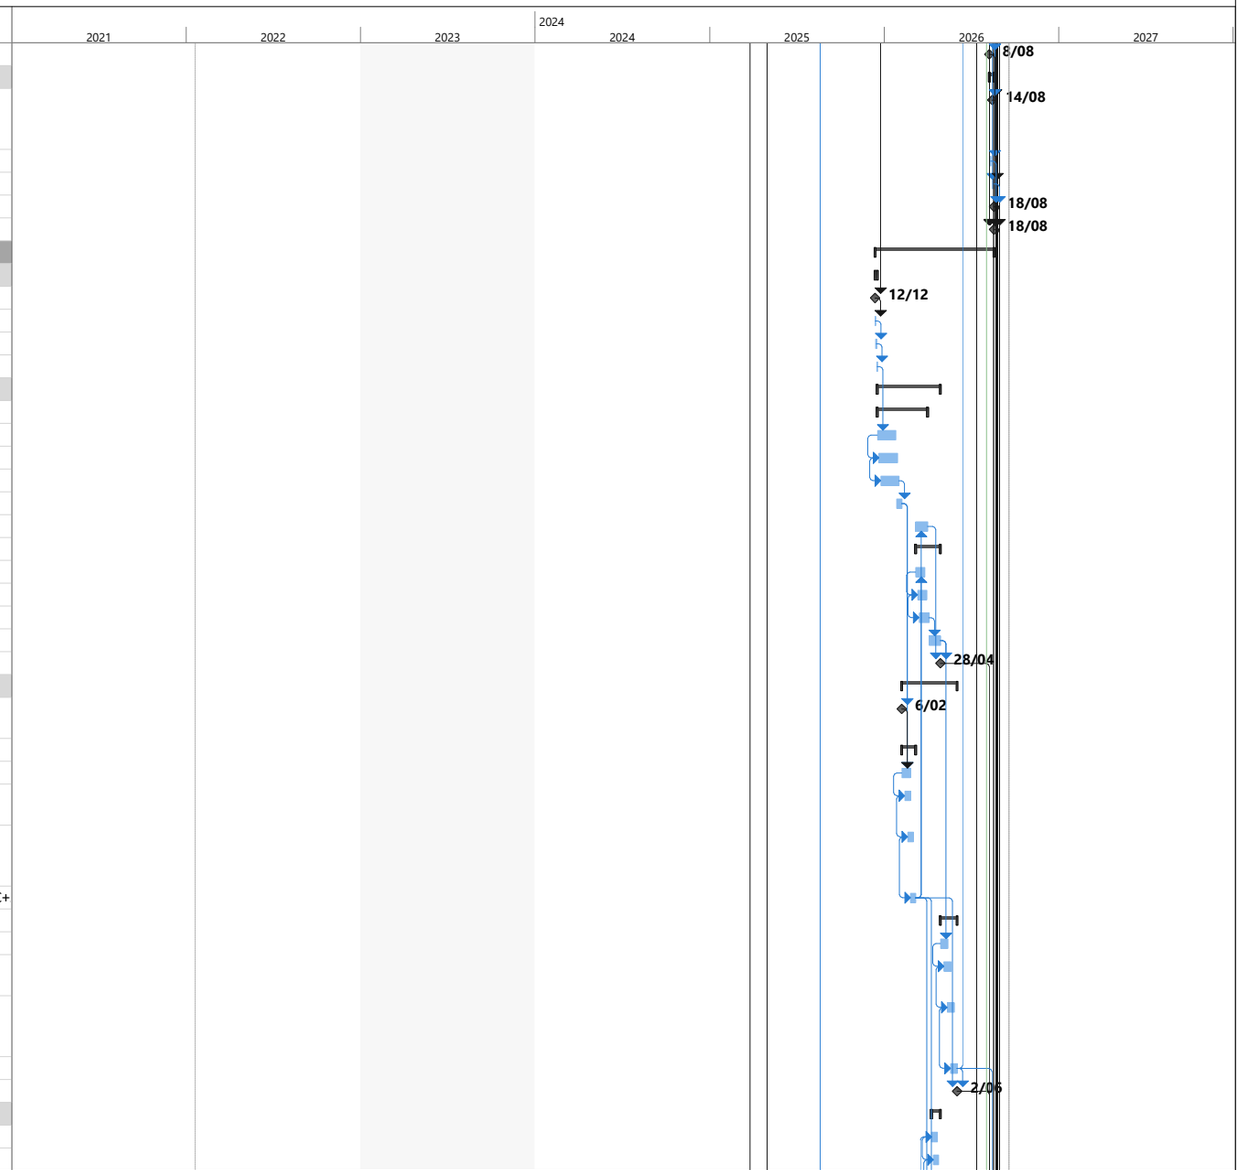


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
896	Rellenos	10 días	jue 16/04/26	mar 28/04/26	$83.789.539,00	895CC+3 días	910;897;909
897	Fin acueducto	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	$0,00	896	921
898	**Codensa**	**76 días**	**jue 9/04/26**	**lun 13/07/26**	**$150.738.018,00**		
899	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$0,00	886FC+25 días	900
900	Excavaciones	25 días	jue 9/04/26	sáb 9/05/26	$6.947.109,00	886FC+5 días;899	901CC+3 días;894CC
901	Instalación de tubería	25 días	lun 13/04/26	mié 13/05/26	$77.502.321,00	900CC+3 días	902CC+3 días
902	Rellenos	25 días	jue 16/04/26	sáb 16/05/26	$26.141.861,00	901CC+3 días	903
903	Cajas	25 días	jue 11/06/26	lun 13/07/26	$40.146.727,00	902;912CC+25 días	904
904	Fin Codensa	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	$0,00	903	921
905	**ETB**	**25 días**	**jue 11/06/26**	**lun 13/07/26**	**$25.522.547,00**		
906	Renivelación camaras	25 días	jue 11/06/26	lun 13/07/26	$25.522.547,00	912CC+25 días	907
907	Fin ETB	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	$0,00	906	921
908	**Espacio público**	**81 días**	**mar 28/04/26**	**sáb 8/08/26**	**$219.957.192,00**		
909	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	$0,00	896	910
910	Excavación	75 días	mar 28/04/26	vie 31/07/26	$30.396.206,00	896;909	911CC+5 días
911	Rellenos	75 días	mar 5/05/26	jue 6/08/26	$29.515.923,00	910CC+5 días	912CC+5 días
912	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	71 días	lun 11/05/26	sáb 8/08/26	$160.045.063,00	911CC+5 días	903CC+25 días;906CC+25 días
913	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$22.403.897,00**		
914	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$22.403.897,00	917	915
915	Fin Espacio publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	914	921
916	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$11.353.921,00**		
917	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	919;918;914
918	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$2.336.217,00	917	920
919	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$9.017.704,00	891;917	920
920	Fin señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	918;919	921
921	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	879;892;897;904;907	1870
922	**CIV 16000928 (15)**	**406 días**	**vie 28/03/25**	**vie 14/08/26**	**$1.025.377.172,00**		
923	**Preliminares**	**14 días**	**vie 28/03/25**	**lun 14/04/25**	**$1.069.854,00**		
924	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 28/03/25	vie 28/03/25	$0,00	437FC+11 días	925FC+8 días;975
925	Cerramiento de obra	2 días	lun 7/04/25	mié 9/04/25	$0,00	924FC+8 días	926
926	Implementación de PMT	2 días	mié 9/04/25	vie 11/04/25	$0,00	925	927
927	Replanteo general	2 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	$1.069.854,00	926	930
928	**Alcantarillado**	**116 días**	**lun 14/04/25**	**sáb 6/09/25**	**$222.566.366,00**		
929	**Costado noroccidental**	**116 días**	**lun 14/04/25**	**sáb 6/09/25**	**$222.566.366,00**		
930	Excavación	55 días	lun 14/04/25	mar 24/06/25	$55.558.263,00	927	931CC+3 días
931	Instalación de tubería	55 días	sáb 19/04/25	vie 27/06/25	$85.506.585,00	930CC+3 días	932CC+3 días
932	Rellenos	55 días	mié 23/04/25	mié 2/07/25	$27.650.866,00	931CC+3 días	933FC-5 días
933	Construcción de pozos	10 días	mié 25/06/25	mar 8/07/25	$41.317.395,00	932FC-5 días	935;937
934	Construcción sumideros	25 días	mié 6/08/25	sáb 6/09/25	$12.533.257,00	942	935
935	Fin alcantarillado	0 días	sáb 6/09/25	sáb 6/09/25	$0,00	933;934	972
936	**Pavimentos**	**25 días**	**mar 8/07/25**	**mié 6/08/25**	**$428.656.775,00**		
937	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$0,00	933	939
938	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mar 8/07/25**	**mié 6/08/25**	**$428.656.775,00**		

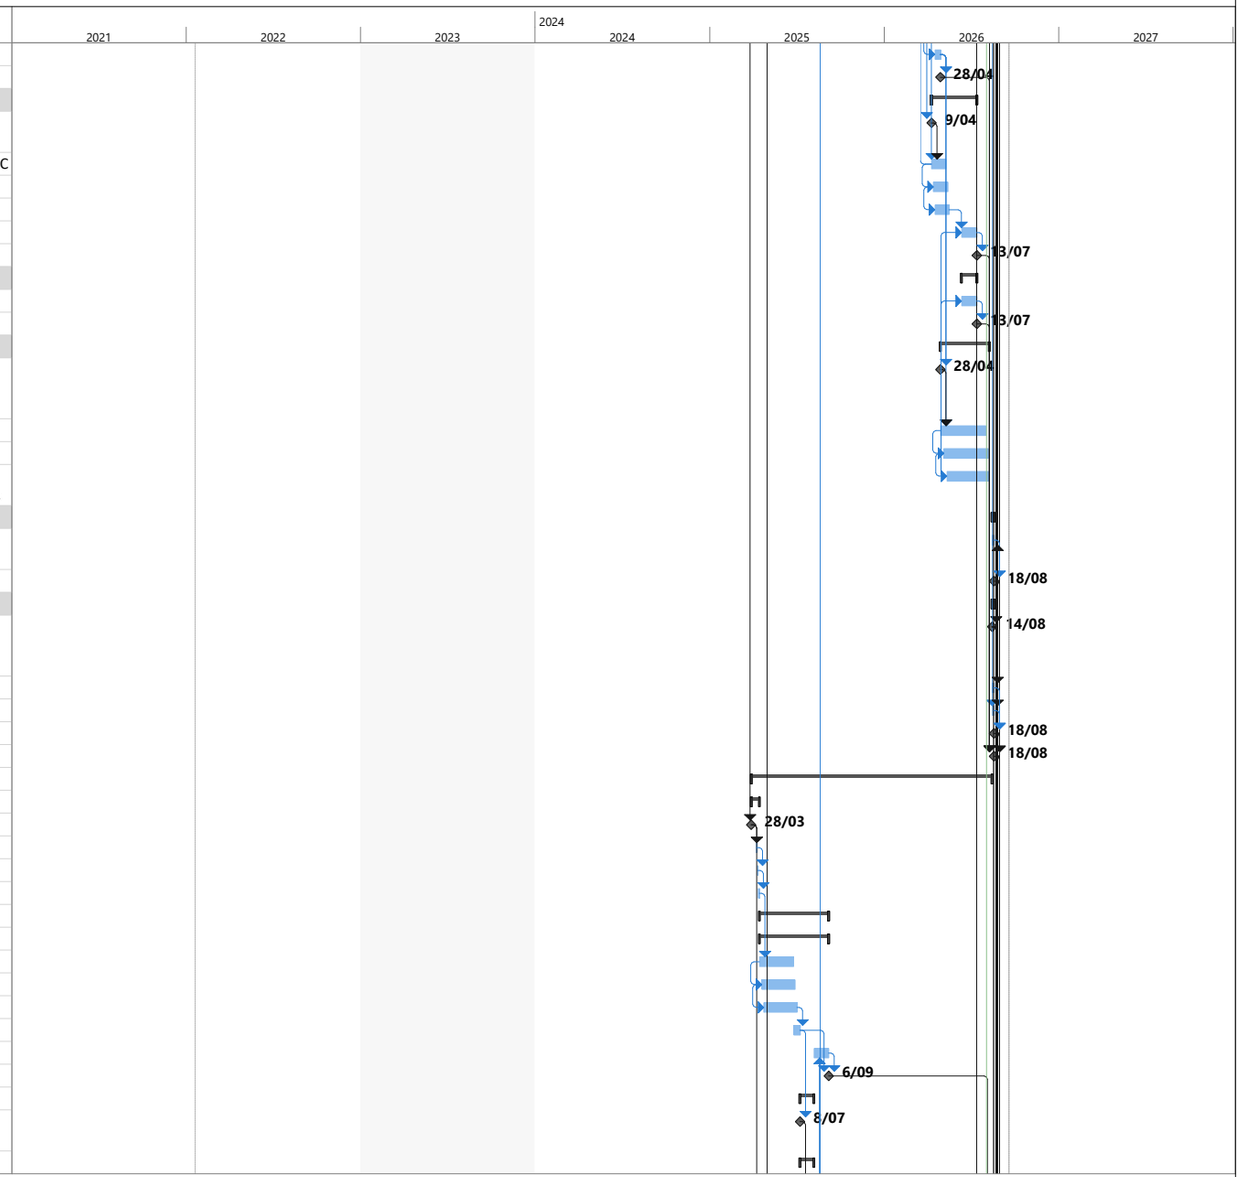


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
939	Excavación	10 días	mar 8/07/25	sáb 19/07/25	$52.541.686,00	937	940CC+5 días
940	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 14/07/25	vie 25/07/25	$81.200.178,00	939CC+5 días	941CC+5 días
941	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 19/07/25	jue 31/07/25	$104.469.101,00	940CC+5 días	942CC+5 días
942	Concreto	10 días	vie 25/07/25	mié 6/08/25	$190.445.810,00	941CC+5 días	934;943;950FC+10 d
943	Fin Pavimentos	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	$0,00	942	972
944	**Acueducto**	**36 días**	**sáb 6/09/25**	**lun 20/10/25**	**$75.453.450,00**		
945	Excavaciones	15 días	sáb 6/09/25	mié 24/09/25	$6.252.302,00	951CC+15 días	946CC+3 días
946	Instalación de tubería	15 días	mié 10/09/25	sáb 27/09/25	$59.651.067,00	945CC+3 días	947CC+3 días
947	Rellenos	15 días	sáb 13/09/25	mié 1/10/25	$9.550.081,00	946CC+3 días	948;960
948	Fin acueducto	15 días	mié 1/10/25	lun 20/10/25	$0,00	947	972
949	**Codensa**	**76 días**	**mié 20/08/25**	**jue 20/11/25**	**$136.078.731,00**		
950	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 20/08/25	mié 20/08/25	$0,00	942FC+10 días	951
951	Excavaciones	35 días	mié 20/08/25	mar 30/09/25	$5.798.810,00	950	952CC+3 días;945CC-
952	Instalación de tubería	35 días	sáb 23/08/25	vie 3/10/25	$63.266.545,00	951CC+3 días	953CC+3 días
953	Rellenos	35 días	mié 27/08/25	mar 7/10/25	$21.487.551,00	952CC+3 días	954
954	Cajas	35 días	mar 7/10/25	jue 20/11/25	$45.525.825,00	953	955
955	Fin codensa	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$0,00	954	972
956	**ETB**	**6 días**	**vie 31/07/26**	**sáb 8/08/26**	**$6.784.931,00**		
957	Renivelación camaras	6 días	vie 31/07/26	sáb 8/08/26	$6.784.931,00	963FC-6 días	958
958	Fin ETB	0 días	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	$0,00	957	972
959	**Espacio público**	**252 días**	**mié 1/10/25**	**mar 11/08/26**	**$132.032.385,00**		
960	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$0,00	947	961
961	Excavación	240 días	mié 1/10/25	lun 27/07/26	$17.044.484,00	960	962CC+5 días
962	Rellenos	240 días	mar 7/10/25	sáb 1/08/26	$15.888.020,00	961CC+5 días	963CC+25 días
963	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	220 días	vie 7/11/25	sáb 8/08/26	$88.269.791,00	962CC+25 días	957FC-6 días
964	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$10.830.090,00**		
965	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$10.830.090,00	969FC-5 días	966
966	Fin Espacio Publico	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	965	972
967	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$22.734.680,00**		
968	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	969
969	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$3.173.462,00	968	970CC;965FC-5 días
970	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$19.561.218,00	969CC	971
971	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	970	972
972	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	935;943;948;955;958	1870
973	**CIV 16000984 (16)**	**406 días**	**vie 28/03/25**	**vie 14/08/26**	**$902.871.693,00**		
974	**Preliminares**	**14 días**	**vie 28/03/25**	**lun 14/04/25**	**$1.101.703,00**		
975	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 28/03/25	vie 28/03/25	$0,00	924	976FC+8 días;1023
976	Cerramiento de obra	2 días	lun 7/04/25	mié 9/04/25	$0,00	975FC+8 días	977
977	Implementación de PMT	2 días	mié 9/04/25	vie 11/04/25	$0,00	976	978
978	Replanteo general	2 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	$1.101.703,00	977	981
979	**Alcantarillado**	**106 días**	**lun 14/04/25**	**mar 26/08/25**	**$191.602.776,00**		

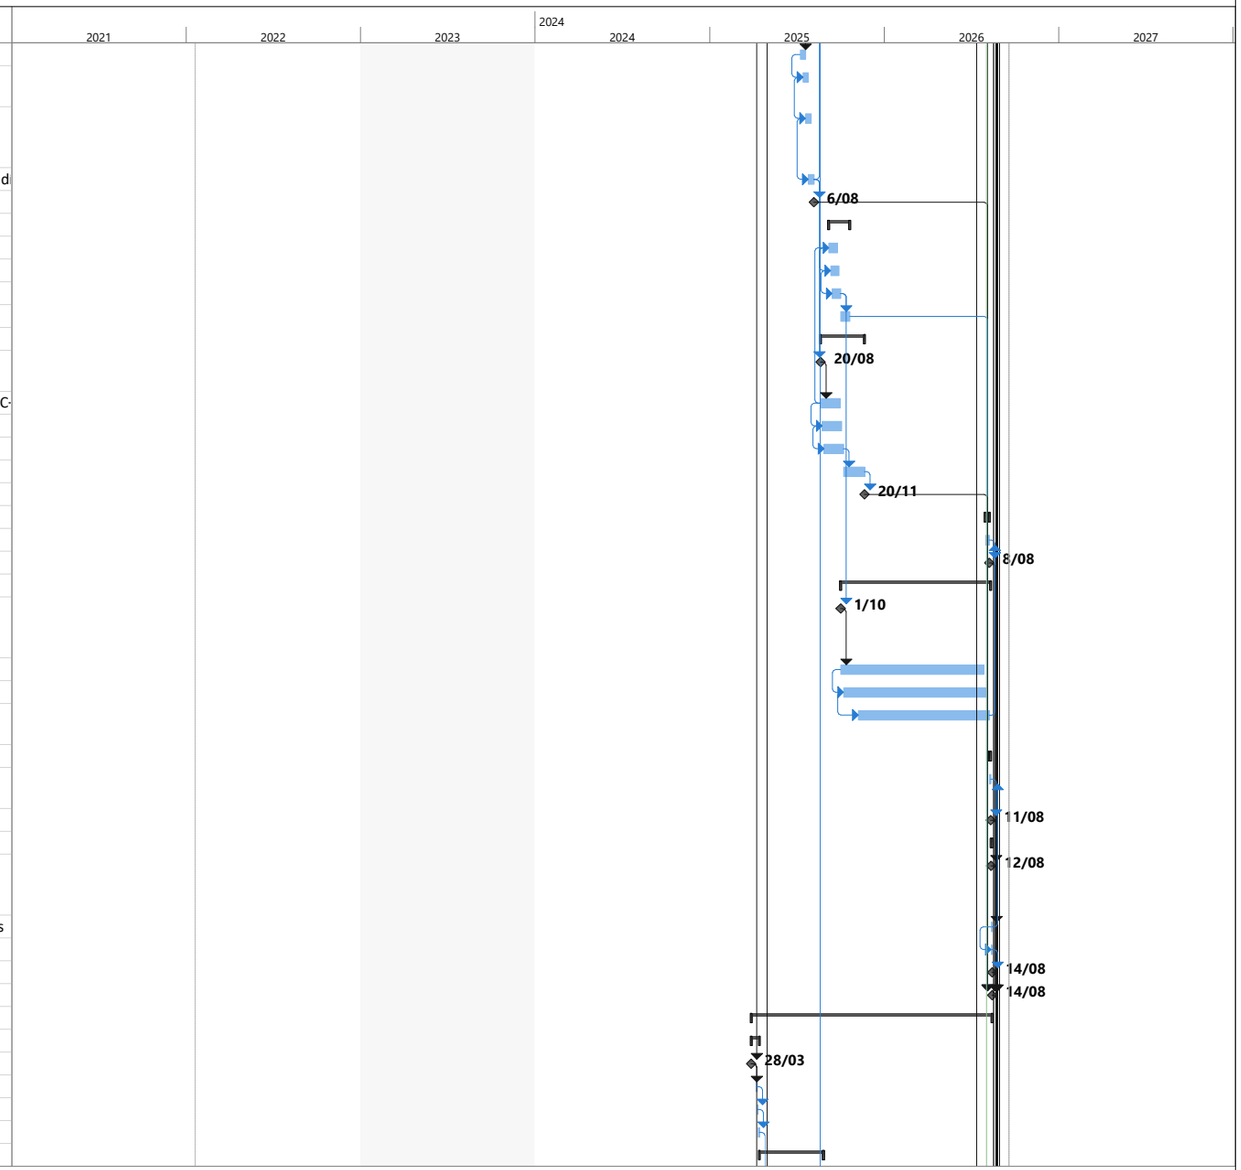


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
980	**Costado noroccidental**	**106 días**	**lun 14/04/25**	**mar 26/08/25**	**$191.602.776,00**		
981	Excavación	55 días	lun 14/04/25	mar 24/06/25	$54.257.794,00	978	982CC+3 días
982	Instalación de tubería	55 días	sáb 19/04/25	vie 27/06/25	$72.494.353,00	981CC+3 días	983CC+3 días
983	Rellenos	55 días	mié 23/04/25	mié 2/07/25	$24.561.547,00	982CC+3 días	984FC-5 días
984	Construcción de pozos	10 días	mié 25/06/25	mar 8/07/25	$24.782.922,00	983FC-5 días	986;988
985	Construcción sumideros	15 días	mié 6/08/25	mar 26/08/25	$15.506.160,00	993	986
986	Fin alcantarillado	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	$0,00	984;985	1020
987	**Pavimentos**	**25 días**	**mar 8/07/25**	**mié 6/08/25**	**$454.582.943,00**		
988	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	$0,00	984	990
989	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mar 8/07/25**	**mié 6/08/25**	**$454.582.943,00**		
990	Excavación	10 días	mar 8/07/25	sáb 19/07/25	$54.932.324,00	988	991CC+5 días
991	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 14/07/25	vie 25/07/25	$87.541.568,00	990CC+5 días	992CC+5 días
992	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 19/07/25	jue 31/07/25	$112.616.376,00	991CC+5 días	993CC+5 días
993	Concreto	10 días	vie 25/07/25	mié 6/08/25	$199.492.675,00	992CC+5 días	985;994;1001FC+10
994	Fin Pavimentos	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	$0,00	993	1020
995	**Acueducto**	**16 días**	**sáb 6/09/25**	**jue 25/09/25**	**$23.455.394,00**		
996	Excavaciones	10 días	sáb 6/09/25	jue 18/09/25	$3.594.339,00	1002CC+15 días	997CC+3 días
997	Instalación de tubería	10 días	mié 10/09/25	lun 22/09/25	$16.932.304,00	996CC+3 días	998CC+3 días
998	Rellenos	10 días	sáb 13/09/25	jue 25/09/25	$2.928.751,00	997CC+3 días	999;1008
999	Fin acueducto	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$0,00	998	1020
1000	**Codensa**	**111 días**	**mié 20/08/25**	**sáb 3/01/26**	**$93.021.986,00**		
1001	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 20/08/25	mié 20/08/25	$0,00	993FC+10 días	1002
1002	Excavaciones	20 días	mié 20/08/25	vie 12/09/25	$4.118.221,00	1001	1003CC+3 días;996C
1003	Instalación de tubería	20 días	sáb 23/08/25	mar 16/09/25	$40.706.250,00	1002CC+3 días	1004CC+3 días
1004	Rellenos	20 días	mié 27/08/25	vie 19/09/25	$14.773.631,00	1003CC+3 días	1006
1005	Cajas	20 días	mar 9/12/25	sáb 3/01/26	$33.423.884,00	1011FC-20 días	1006
1006	Fin codensa	0 días	sáb 3/01/26	sáb 3/01/26	$0,00	1005;1004	1020
1007	**Espacio público**	**257 días**	**jue 25/09/25**	**mar 11/08/26**	**$123.068.319,00**		
1008	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$0,00	998	1009
1009	Excavación	50 días	jue 25/09/25	mié 26/11/25	$16.486.818,00	1008	1010CC+5 días
1010	Rellenos	50 días	mié 1/10/25	mar 2/12/25	$15.215.958,00	1009CC+5 días	1011CC+25 días
1011	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	50 días	vie 31/10/25	sáb 3/01/26	$83.781.294,00	1010CC+25 días	1005FC-20 días
1012	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$7.584.249,00**		
1013	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$7.584.249,00	1017FC-5 días	1014
1014	Fin Espacio Publico	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1013	1020
1015	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$16.038.572,00**		
1016	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1017
1017	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$2.337.553,00	1016	1018CC;1013FC-5 día
1018	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$13.701.019,00	1017CC	1019
1019	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1018	1020

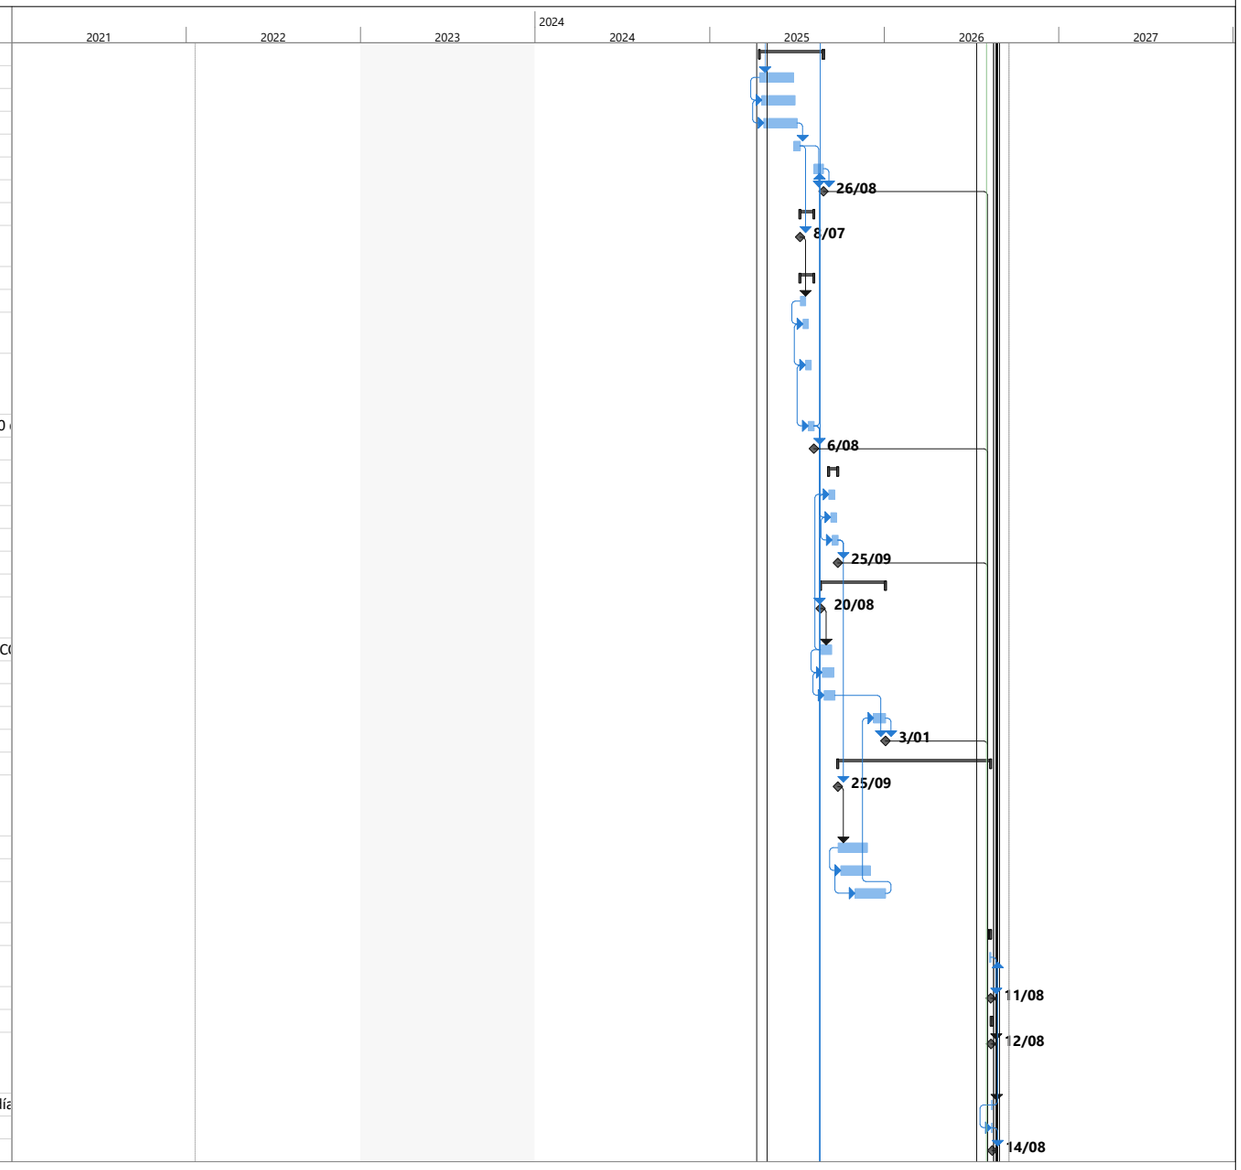


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1020	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	986;994;1006;999;10	1870
1021	**CIV 16001043 (17)**	**406 días**	**vie 28/03/25**	**vie 14/08/26**	**$389.871.382,00**		
1022	**Preliminares**	**14 días**	**vie 28/03/25**	**lun 14/04/25**	**$558.284,00**		
1023	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 28/03/25	vie 28/03/25	$0,00	975	1024FC+8 días;1065F
1024	Cerramiento de obra	2 días	lun 7/04/25	mié 9/04/25	$0,00	1023FC+8 días	1025
1025	Implementación de PMT	2 días	mié 9/04/25	vie 11/04/25	$0,00	1024	1026
1026	Replanteo general	2 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	$558.284,00	1025	1029
1027	**Alcantarillado**	**61 días**	**lun 14/04/25**	**mié 2/07/25**	**$50.067.466,00**		
1028	**Costado noroccidental**	**61 días**	**lun 14/04/25**	**mié 2/07/25**	**$50.067.466,00**		
1029	Excavación	20 días	lun 14/04/25	sáb 10/05/25	$20.238.377,00	1026	1030CC+3 días
1030	Instalación de tubería	20 días	sáb 19/04/25	jue 15/05/25	$10.004.794,00	1029CC+3 días	1031CC+3 días
1031	Rellenos	20 días	mié 23/04/25	lun 19/05/25	$7.825.782,00	1030CC+3 días	1035
1032	Construcción sumideros	10 días	mié 18/06/25	mié 2/07/25	$11.998.513,00	1040	1033
1033	Fin alcantarillado	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	$0,00	1032	1062
1034	**Pavimentos**	**25 días**	**lun 19/05/25**	**mié 18/06/25**	**$228.379.611,00**		
1035	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	$0,00	1031	1037
1036	**Costado noroccidental**	**25 días**	**lun 19/05/25**	**mié 18/06/25**	**$228.379.611,00**		
1037	Excavación	10 días	lun 19/05/25	vie 30/05/25	$27.611.697,00	1035	1038CC+5 días
1038	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	sáb 24/05/25	vie 6/06/25	$44.002.724,00	1037CC+5 días	1039CC+5 días
1039	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 30/05/25	jue 12/06/25	$56.603.856,00	1038CC+5 días	1040CC+5 días
1040	Concreto	10 días	vie 6/06/25	mié 18/06/25	$100.161.334,00	1039CC+5 días	1032;1041;1043FC+1
1041	Fin Pavimentos	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	$0,00	1040	1062
1042	**Codensa**	**91 días**	**mié 2/07/25**	**lun 20/10/25**	**$30.729.359,00**		
1043	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	$0,00	1040FC+10 días	1044
1044	Excavaciones	15 días	mié 2/07/25	sáb 19/07/25	$1.700.608,00	1043	1045CC+3 días
1045	Instalación de tubería	15 días	sáb 5/07/25	mié 23/07/25	$18.478.232,00	1044CC+3 días	1046CC+3 días
1046	Rellenos	15 días	mié 9/07/25	sáb 26/07/25	$6.416.644,00	1045CC+3 días	1048;1050
1047	Cajas	10 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	$4.133.875,00	1053FC-10 días	1048
1048	Fin codensa	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$0,00	1046;1047	1062
1049	**Espacio público**	**310 días**	**sáb 26/07/25**	**vie 14/08/26**	**$68.412.930,00**		
1050	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 26/07/25	sáb 26/07/25	$0,00	1046	1051
1051	Excavación	40 días	sáb 26/07/25	sáb 13/09/25	$7.576.937,00	1050	1052CC+5 días
1052	Rellenos	40 días	vie 1/08/25	vie 19/09/25	$7.815.820,00	1051CC+5 días	1053CC+25 días
1053	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	40 días	mar 2/09/25	lun 20/10/25	$43.282.648,00	1052CC+25 días	1047FC-10 días
1054	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$9.737.525,00**		
1055	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$9.737.525,00	1058	1056
1056	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1055	1062
1057	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$11.723.732,00**		
1058	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1059;1055
1059	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$2.292.121,00	1058	1060CC

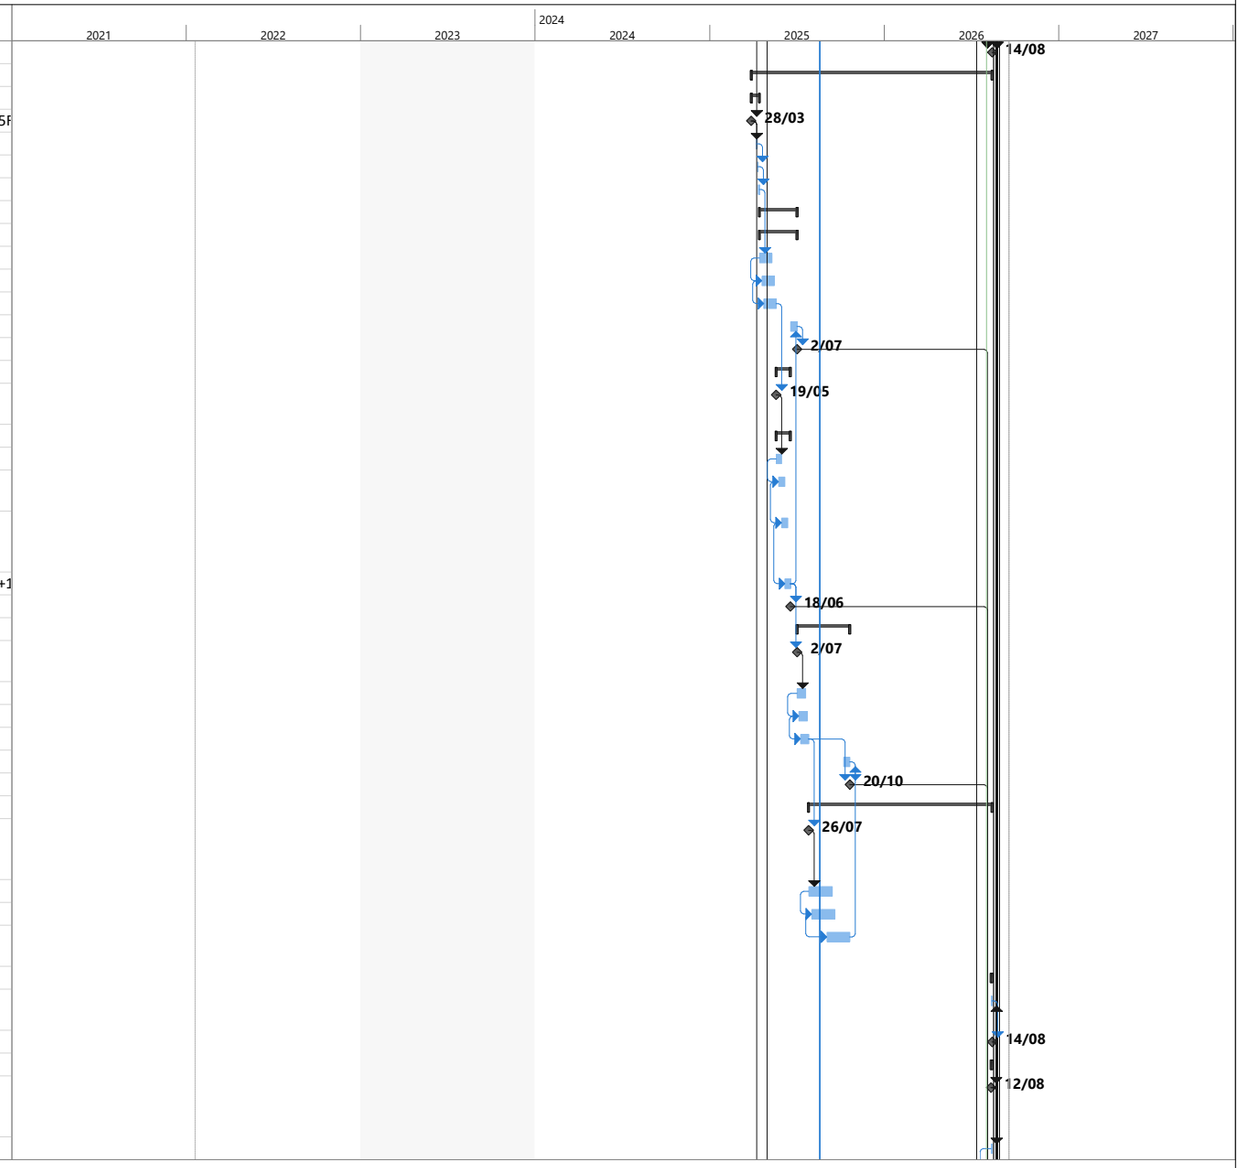


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1060	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$9.431.611,00	1059CC	1061
1061	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1060	1062
1062	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1033;1041;1048;105	1870
1063	**CIV 16001008 (14)**	**400 días**	**vie 4/04/25**	**vie 14/08/26**	**$950.739.897,00**		
1064	**Preliminares**	**14 días**	**vie 4/04/25**	**mié 23/04/25**	**$1.000.666,00**		
1065	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 4/04/25	vie 4/04/25	$0,00	1023FC+6 días	1066FC+8 días;1113;
1066	Cerramiento de obra	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$0,00	1065FC+8 días	1067
1067	Implementación de PMT	2 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$0,00	1066	1068
1068	Replanteo general	2 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$1.000.666,00	1067	1071
1069	**Alcantarillado**	**121 días**	**mié 23/04/25**	**vie 19/09/25**	**$173.928.355,00**		
1070	**Costado noroccidental**	**121 días**	**mié 23/04/25**	**vie 19/09/25**	**$173.928.355,00**		
1071	Excavación	55 días	mié 23/04/25	mié 2/07/25	$48.211.636,00	1068	1072CC+3 días
1072	Instalación de tubería	55 días	sáb 26/04/25	sáb 5/07/25	$40.600.269,00	1071CC+3 días	1073CC+3 días
1073	Rellenos	55 días	mié 30/04/25	mié 9/07/25	$23.232.399,00	1072CC+3 días	1074FC-5 días
1074	Construcción de pozos	10 días	jue 3/07/25	mar 15/07/25	$47.316.652,00	1073FC-5 días	1076;1078
1075	Construcción sumideros	30 días	jue 14/08/25	vie 19/09/25	$14.567.399,00	1083	1076
1076	Fin alcantarillado	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$0,00	1074;1075	1110
1077	**Pavimentos**	**25 días**	**mar 15/07/25**	**jue 14/08/25**	**$386.547.329,00**		
1078	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$0,00	1074	1080
1079	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mar 15/07/25**	**jue 14/08/25**	**$386.547.329,00**		
1080	Excavación	10 días	mar 15/07/25	sáb 26/07/25	$45.386.843,00	1078	1081CC+5 días
1081	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	$72.330.496,00	1080CC+5 días	1082CC+5 días
1082	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 26/07/25	vie 8/08/25	$93.047.583,00	1081CC+5 días	1083CC+5 días
1083	Concreto	10 días	vie 1/08/25	jue 14/08/25	$175.782.407,00	1082CC+5 días	1075;1084;1091FC+1
1084	Fin Pavimentos	0 días	jue 14/08/25	jue 14/08/25	$0,00	1083	1110
1085	**Acueducto**	**16 días**	**sáb 13/09/25**	**jue 2/10/25**	**$47.919.725,00**		
1086	Excavaciones	10 días	sáb 13/09/25	jue 25/09/25	$2.872.896,00	1092CC+15 días	1087CC+3 días
1087	Instalación de tubería	10 días	mié 17/09/25	lun 29/09/25	$40.906.268,00	1086CC+3 días	1088CC+3 días
1088	Rellenos	10 días	sáb 20/09/25	jue 2/10/25	$4.140.561,00	1087CC+3 días	1089;1098
1089	Fin acueducto	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$0,00	1088	1110
1090	**Codensa**	**116 días**	**mié 27/08/25**	**sáb 17/01/26**	**$160.538.206,00**		
1091	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 27/08/25	mié 27/08/25	$0,00	1083FC+10 días	1092
1092	Excavaciones	35 días	mié 27/08/25	mar 7/10/25	$5.180.987,00	1091	1086CC+15 días;109
1093	Instalación de tubería	35 días	sáb 30/08/25	vie 10/10/25	$56.591.061,00	1092CC+3 días	1094CC+3 días
1094	Rellenos	35 días	mié 3/09/25	mié 15/10/25	$19.205.052,00	1093CC+3 días	1096
1095	Cajas	40 días	jue 27/11/25	sáb 17/01/26	$79.561.106,00	1101FC-40 días	1096
1096	Fin codensa	0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	$0,00	1094;1095	1110
1097	**Espacio público**	**251 días**	**jue 2/10/25**	**mar 11/08/26**	**$136.307.652,00**		
1098	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$0,00	1088	1099
1099	Excavación	55 días	jue 2/10/25	mié 10/12/25	$17.289.924,00	1098	1100CC+5 días
1100	Rellenos	55 días	mié 8/10/25	mar 16/12/25	$15.920.378,00	1099CC+5 días	1101CC+25 días
1101	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	55 días	sáb 8/11/25	sáb 17/01/26	$87.928.853,00	1100CC+25 días	1095FC-40 días
1102	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$15.168.497,00**		

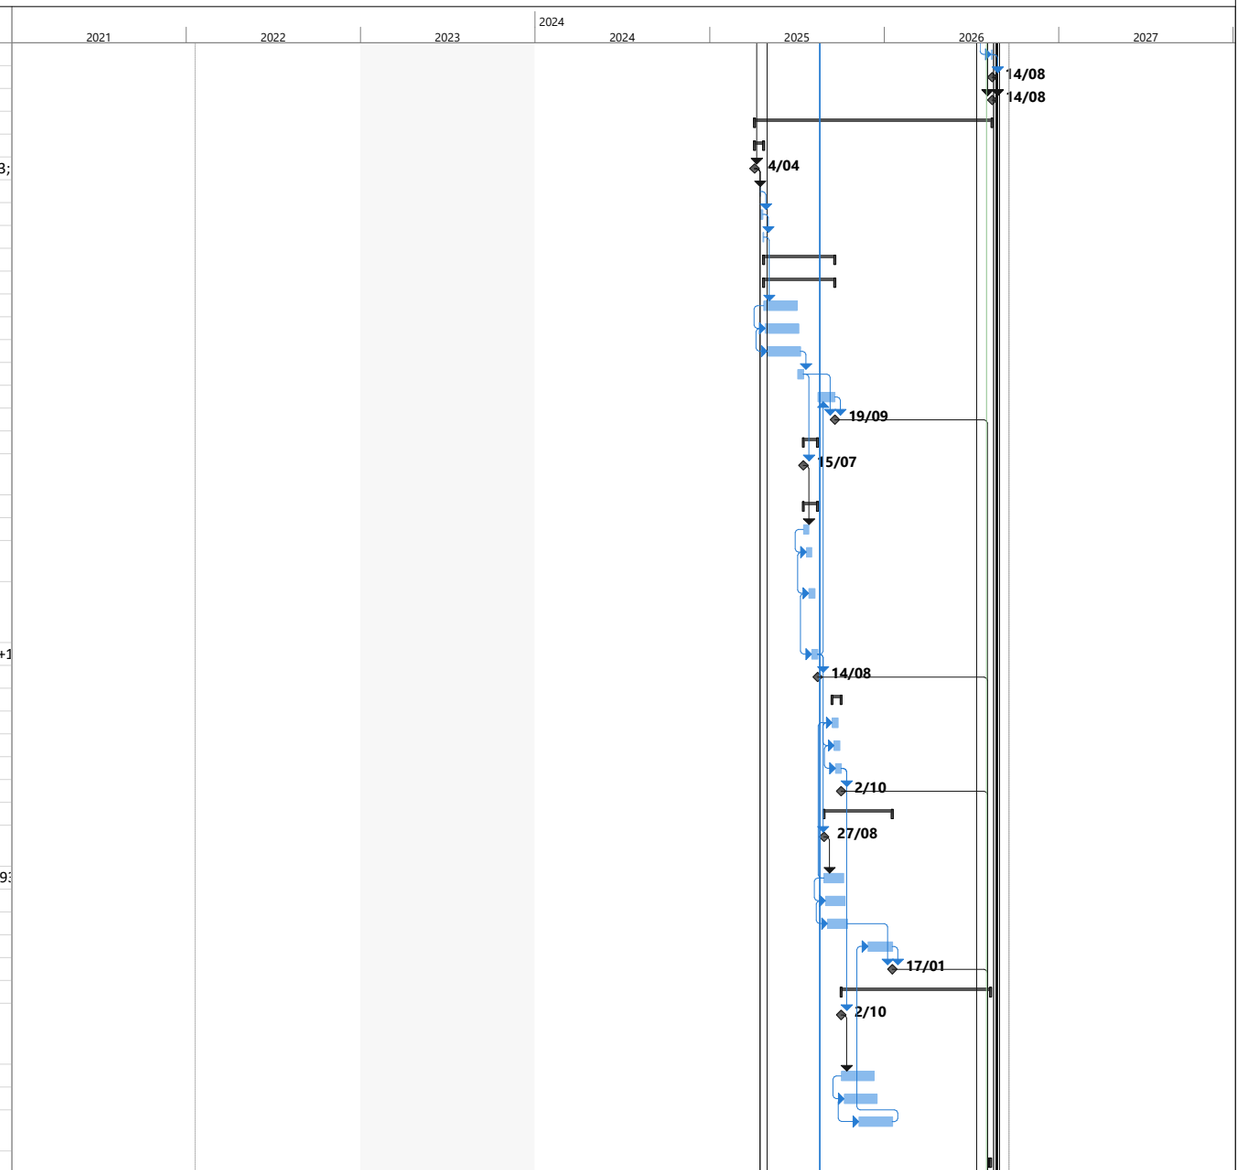


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1103	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$15.168.497,00	1107FC-5 días	1104
1104	Fin Espacio Publico	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1103	1110
1105	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$44.497.964,00**		
1106	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1107
1107	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$5.966.223,00	1106	1108CC;1103FC-5 día
1108	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$38.531.741,00	1107CC	1109
1109	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1108	1110
1110	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1076;1084;1089;109	1870
1111	**CIV 16001063 (18)**	**402 días**	**vie 4/04/25**	**mar 18/08/26**	**$865.349.113,00**		
1112	**Preliminares**	**14 días**	**vie 4/04/25**	**mié 23/04/25**	**$1.116.830,00**		
1113	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 4/04/25	vie 4/04/25	$0,00	1065	1114FC+8 días
1114	Cerramiento de obra	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$0,00	1113FC+8 días	1115
1115	Implementación de PMT	2 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$0,00	1114	1116
1116	Replanteo general	2 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$1.116.830,00	1115	1119
1117	**Alcantarillado**	**106 días**	**mié 23/04/25**	**mar 2/09/25**	**$149.774.422,00**		
1118	**Costado noroccidental**	**106 días**	**mié 23/04/25**	**mar 2/09/25**	**$149.774.422,00**		
1119	Excavación	55 días	mié 23/04/25	mié 2/07/25	$40.621.297,00	1116	1120CC+3 días
1120	Instalación de tubería	55 días	sáb 26/04/25	sáb 5/07/25	$34.506.804,00	1119CC+3 días	1121CC+3 días
1121	Rellenos	55 días	mié 30/04/25	mié 9/07/25	$18.790.901,00	1120CC+3 días	1125
1122	Construcción sumideros	20 días	vie 8/08/25	mar 2/09/25	$55.855.420,00	1130	1123
1123	Fin alcantarillado	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25	$0,00	1122	1157
1124	**Pavimentos**	**25 días**	**mié 9/07/25**	**vie 8/08/25**	**$431.312.384,00**		
1125	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 9/07/25	mié 9/07/25	$0,00	1121	1127
1126	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mié 9/07/25**	**vie 8/08/25**	**$431.312.384,00**		
1127	Excavación	10 días	mié 9/07/25	lun 21/07/25	$51.983.073,00	1125	1128CC+5 días
1128	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mar 15/07/25	sáb 26/07/25	$82.723.640,00	1127CC+5 días	1129CC+5 días
1129	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	$106.418.315,00	1128CC+5 días	1130CC+5 días
1130	Concreto	10 días	sáb 26/07/25	vie 8/08/25	$190.187.356,00	1129CC+5 días	1122;1131;1138FC+1
1131	Fin Pavimentos	0 días	vie 8/08/25	vie 8/08/25	$0,00	1130	1157
1132	**Acueducto**	**21 días**	**lun 8/09/25**	**jue 2/10/25**	**$34.352.225,00**		
1133	Excavaciones	15 días	lun 8/09/25	jue 25/09/25	$5.105.839,00	1139CC+15 días	1134CC+3 días
1134	Instalación de tubería	15 días	jue 11/09/25	lun 29/09/25	$25.409.156,00	1133CC+3 días	1135CC+3 días
1135	Rellenos	15 días	lun 15/09/25	jue 2/10/25	$3.837.230,00	1134CC+3 días	1136;1145
1136	Fin acueducto	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$0,00	1135	1157
1137	**Codensa**	**121 días**	**jue 21/08/25**	**sáb 17/01/26**	**$82.381.276,00**		
1138	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 21/08/25	jue 21/08/25	$0,00	1130FC+10 días	1139
1139	Excavaciones	25 días	jue 21/08/25	vie 19/09/25	$3.427.604,00	1138	1133CC+15 días;114
1140	Instalación de tubería	25 días	lun 25/08/25	mar 23/09/25	$37.220.492,00	1139CC+3 días	1141CC+3 días
1141	Rellenos	25 días	jue 28/08/25	vie 26/09/25	$12.936.153,00	1140CC+3 días	1143
1142	Cajas	20 días	lun 22/12/25	sáb 17/01/26	$28.797.027,00	1148FC-20 días	1143
1143	Fin codensa	0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	$0,00	1141;1142	1157
1144	**Espacio público**	**253 días**	**jue 2/10/25**	**jue 13/08/26**	**$142.652.514,00**		

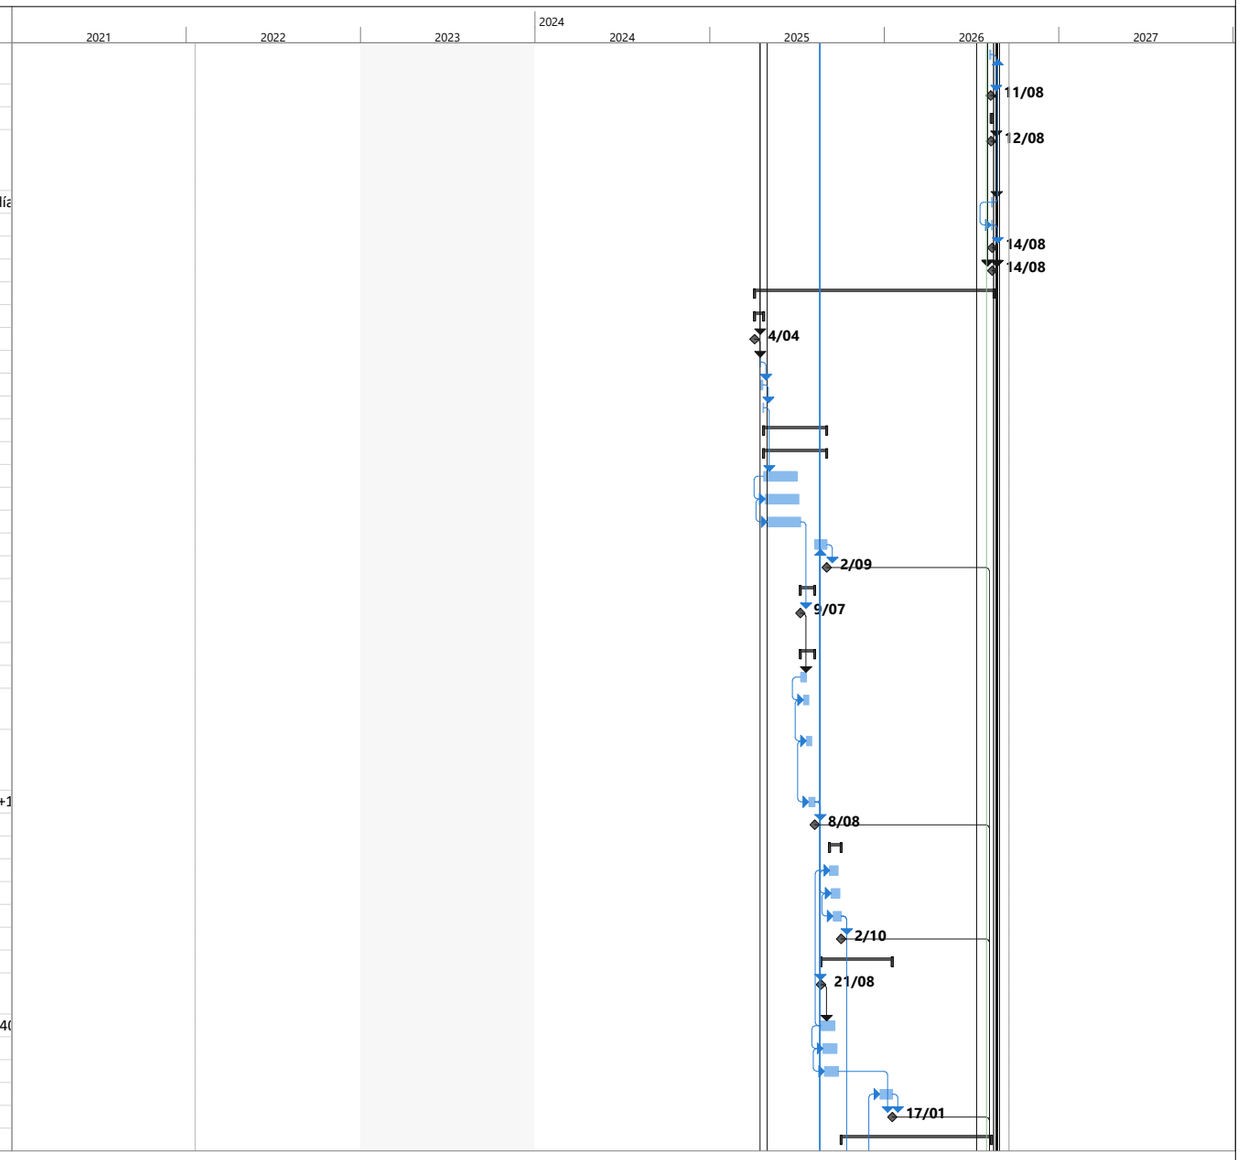


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1145	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$0,00	1135	1146
1146	Excavación	55 días	jue 2/10/25	mié 10/12/25	$16.223.143,00	1145	1147CC+5 días
1147	Rellenos	55 días	mié 8/10/25	mar 16/12/25	$17.184.848,00	1146CC+5 días	1148CC+25 días
1148	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	55 días	sáb 8/11/25	sáb 17/01/26	$94.076.026,00	1147CC+25 días	1142FC-20 días
1149	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mar 11/08/26**	**jue 13/08/26**	**$15.168.497,00**		
1150	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	$15.168.497,00	1154FC-5 días	1151
1151	Fin Espacio Publico	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	1150	1157
1152	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$23.759.462,00**		
1153	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1154
1154	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$3.870.395,00	1153	1155CC;1150FC-5 día
1155	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$19.889.067,00	1154CC	1156
1156	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1155	1157
1157	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1123;1131;1136;114	1870
1158	**CIV 16001009 (12)**	**290 días**	**jue 21/08/25**	**vie 14/08/26**	**$1.174.014.367,00**		
1159	**Preliminares**	**14 días**	**jue 21/08/25**	**sáb 6/09/25**	**$1.510.040,00**		
1160	Aprobación PMT por SDA	0 días	jue 21/08/25	jue 21/08/25	$0,00	993FC+11 días	1161FC+8 días;1227
1161	Cerramiento de obra	2 días	sáb 30/08/25	mar 2/09/25	$0,00	1160FC+8 días	1162
1162	Implementación de PMT	2 días	mar 2/09/25	jue 4/09/25	$0,00	1161	1163
1163	Replanteo general	2 días	jue 4/09/25	sáb 6/09/25	$1.510.040,00	1162	1166
1164	**Alcantarillado**	**128 días**	**sáb 6/09/25**	**mié 11/02/26**	**$215.199.064,00**		
1165	**Pluvial**	**96 días**	**sáb 6/09/25**	**sáb 3/01/26**	**$110.701.725,00**		
1166	Excavación	25 días	sáb 6/09/25	lun 6/10/25	$39.529.251,00	1163	1167CC+3 días
1167	Instalación de tubería	25 días	mié 10/09/25	jue 9/10/25	$24.056.095,00	1166CC+3 días	1168CC+3 días
1168	Rellenos	25 días	sáb 13/09/25	mar 14/10/25	$14.623.790,00	1167CC+3 días	1169FC-5 días;1172
1169	Construcción de pozos	15 días	mar 7/10/25	sáb 25/10/25	$14.494.819,00	1168FC-5 días	1182
1170	Construcción sumideros	15 días	lun 15/12/25	sáb 3/01/26	$17.997.770,00	1189	1182
1171	**Sanitario**	**41 días**	**mar 14/10/25**	**mié 3/12/25**	**$62.445.458,00**		
1172	Excavación	25 días	mar 14/10/25	jue 13/11/25	$26.997.282,00	1168	1173CC+3 días
1173	Instalación de tubería	25 días	vie 17/10/25	mar 18/11/25	$6.967.028,00	1172CC+3 días	1174CC+3 días
1174	Rellenos	25 días	mar 21/10/25	vie 21/11/25	$11.044.664,00	1173CC+3 días	1175FC-5 días;1184
1175	Construcción de pozos	15 días	vie 14/11/25	mié 3/12/25	$17.436.484,00	1174FC-5 días	1182
1176	**Interseccion Cr 43 - Cll 10A**	**47 días**	**lun 15/12/25**	**mié 11/02/26**	**$42.051.881,00**		
1177	Excavación	15 días	lun 15/12/25	sáb 3/01/26	$14.169.149,00	1189	1178CC+3 días
1178	Instalación de tubería	15 días	jue 18/12/25	mié 7/01/26	$7.096.980,00	1177CC+3 días	1179CC+3 días
1179	Rellenos	15 días	lun 22/12/25	sáb 10/01/26	$4.439.331,00	1178CC+3 días	1180FC-5 días
1180	Construcción de pozos	10 días	lun 5/01/26	sáb 17/01/26	$10.347.164,00	1179FC-5 días	1182;1191
1181	Construcción sumideros	15 días	sáb 24/01/26	mié 11/02/26	$5.999.257,00	1194FF	1182
1182	Fin alcantarillado	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	$0,00	1169;1170;1175;118	1224
1183	**Pavimentos**	**66 días**	**vie 21/11/25**	**mié 11/02/26**	**$669.664.329,00**		
1184	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$0,00	1174	1186
1185	**Costado noroccidental**	**19 días**	**vie 21/11/25**	**lun 15/12/25**	**$452.783.554,00**		
1186	Excavación	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$75.380.459,00	1184	1187CC+3 días
1187	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mar 25/11/25	sáb 6/12/25	$83.872.759,00	1186CC+3 días	1188CC+3 días

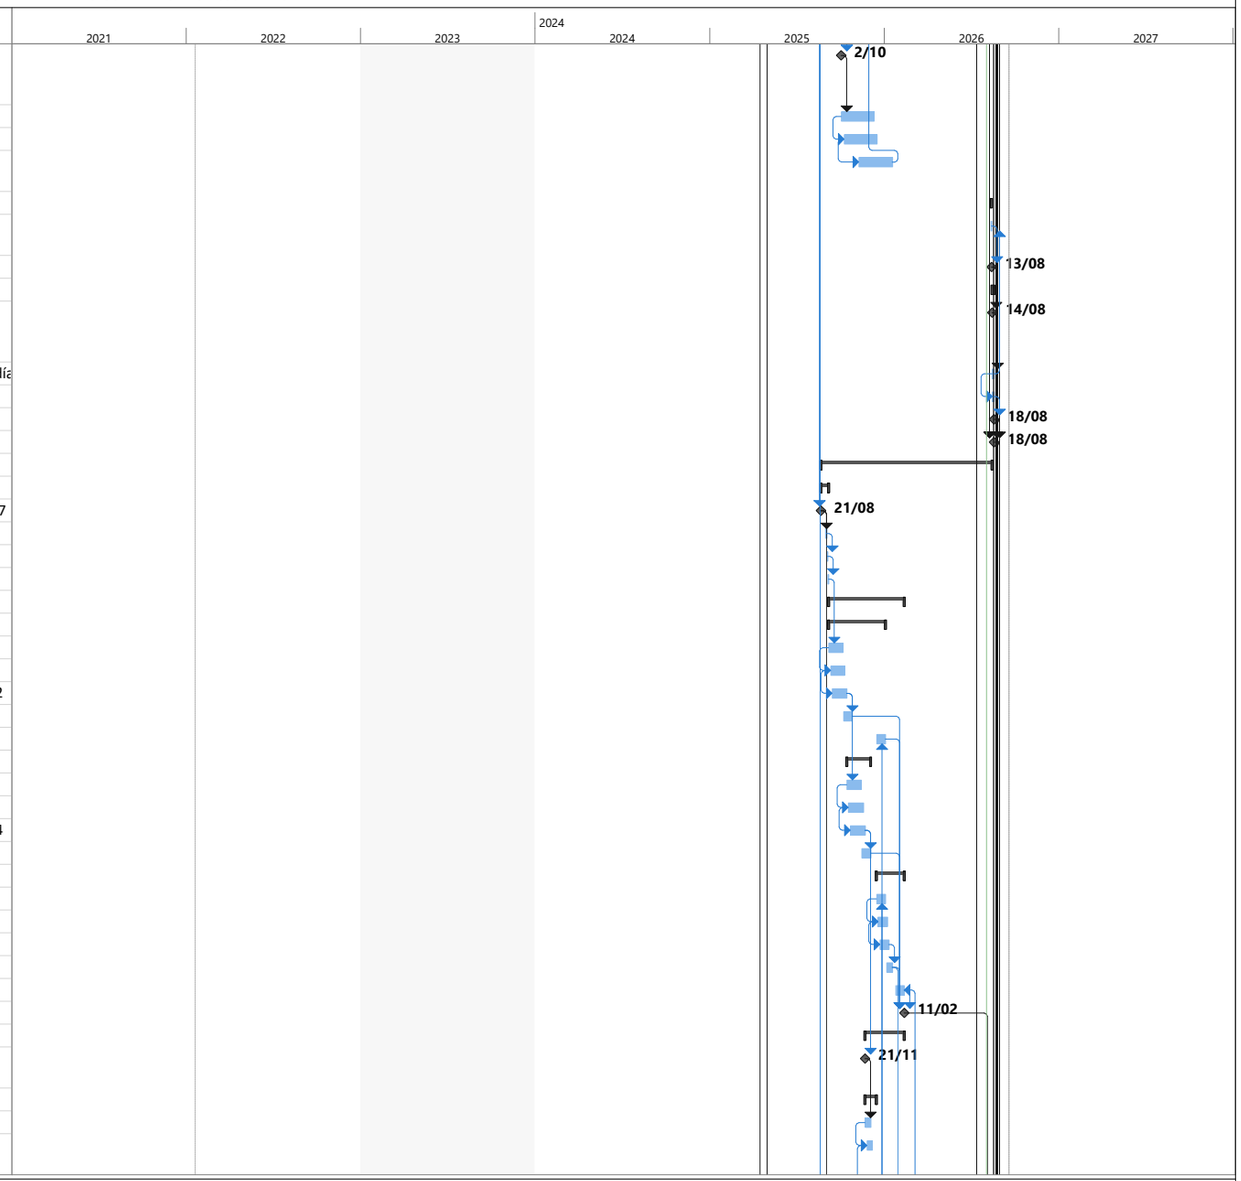


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1188	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 28/11/25	jue 11/12/25	$107.896.651,00	1187CC+3 días	1189CC+3 días
1189	Concreto	10 días	mar 2/12/25	lun 15/12/25	$185.633.685,00	1188CC+3 días	1170;1195;1202FC+1
1190	**Interseccion Cr 43 - Cll 10A**	**21 días**	**sáb 17/01/26**	**mié 11/02/26**	**$216.880.775,00**		
1191	Excavación	12 días	sáb 17/01/26	sáb 31/01/26	$18.872.137,00	1180	1192CC+3 días
1192	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	mié 21/01/26	mié 4/02/26	$48.462.728,00	1191CC+3 días	1193CC+3 días
1193	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	sáb 24/01/26	sáb 7/02/26	$62.341.990,00	1192CC+3 días	1194CC+3 días
1194	Concreto	12 días	mié 28/01/26	mié 11/02/26	$87.203.920,00	1193CC+3 días	1181FF;1195
1195	Fin Pavimentos	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	$0,00	1189;1194	1224
1196	**Acueducto**	**16 días**	**vie 16/01/26**	**mié 4/02/26**	**$55.071.843,00**		
1197	Excavaciones	10 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	$4.521.021,00	1203CC+15 días	1198CC+3 días
1198	Instalación de tubería	10 días	mar 20/01/26	sáb 31/01/26	$43.886.160,00	1197CC+3 días	1199CC+3 días
1199	Rellenos	10 días	vie 23/01/26	mié 4/02/26	$6.664.662,00	1198CC+3 días	1200;1212
1200	Fin acueducto	0 días	mié 4/02/26	mié 4/02/26	$0,00	1199	1224
1201	**Codensa**	**181 días**	**sáb 27/12/25**	**lun 10/08/26**	**$59.414.754,00**		
1202	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	$0,00	1189FC+10 días	1203
1203	Excavaciones	25 días	sáb 27/12/25	mié 28/01/26	$3.658.264,00	1202	1197CC+15 días;1204
1204	Instalación de tubería	25 días	mié 31/12/25	sáb 31/01/26	$27.525.723,00	1203CC+3 días	1205CC+3 días
1205	Rellenos	25 días	lun 5/01/26	mié 4/02/26	$14.463.467,00	1204CC+3 días	1207
1206	Cajas	30 días	vie 3/07/26	lun 10/08/26	$13.767.300,00	1215FC-30 días	1207
1207	Fin codensa	0 días	lun 10/08/26	lun 10/08/26	$0,00	1205;1206	1224
1208	**ETB**	**6 días**	**sáb 1/08/26**	**lun 10/08/26**	**$6.784.931,00**		
1209	Renivelación camaras	6 días	sáb 1/08/26	lun 10/08/26	$6.784.931,00	1215FC-6 días	1210
1210	Fin ETB	0 días	lun 10/08/26	lun 10/08/26	$0,00	1209	1224
1211	**Espacio público**	**154 días**	**mié 4/02/26**	**vie 14/08/26**	**$142.952.788,00**		
1212	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mié 4/02/26	mié 4/02/26	$0,00	1199	1213
1213	Excavación	140 días	mié 4/02/26	mar 28/07/26	$18.689.774,00	1212	1214CC+5 días
1214	Rellenos	140 días	mar 10/02/26	lun 3/08/26	$17.244.587,00	1213CC+5 días	1215CC+25 días
1215	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	120 días	mié 11/03/26	lun 10/08/26	$94.003.206,00	1214CC+25 días	1206FC-30 días;1209FC-6 días
1216	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$13.015.221,00**		
1217	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$13.015.221,00	1220	1218
1218	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1217	1224
1219	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$23.416.618,00**		
1220	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1221;1217
1221	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$6.685.557,00	1220	1222CC
1222	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$16.731.061,00	1221CC	1223
1223	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1222	1224
1224	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1182;1195;1200;120	1870
1225	**CIV 16001064 (13)**	**290 días**	**jue 21/08/25**	**vie 14/08/26**	**$737.017.604,00**		

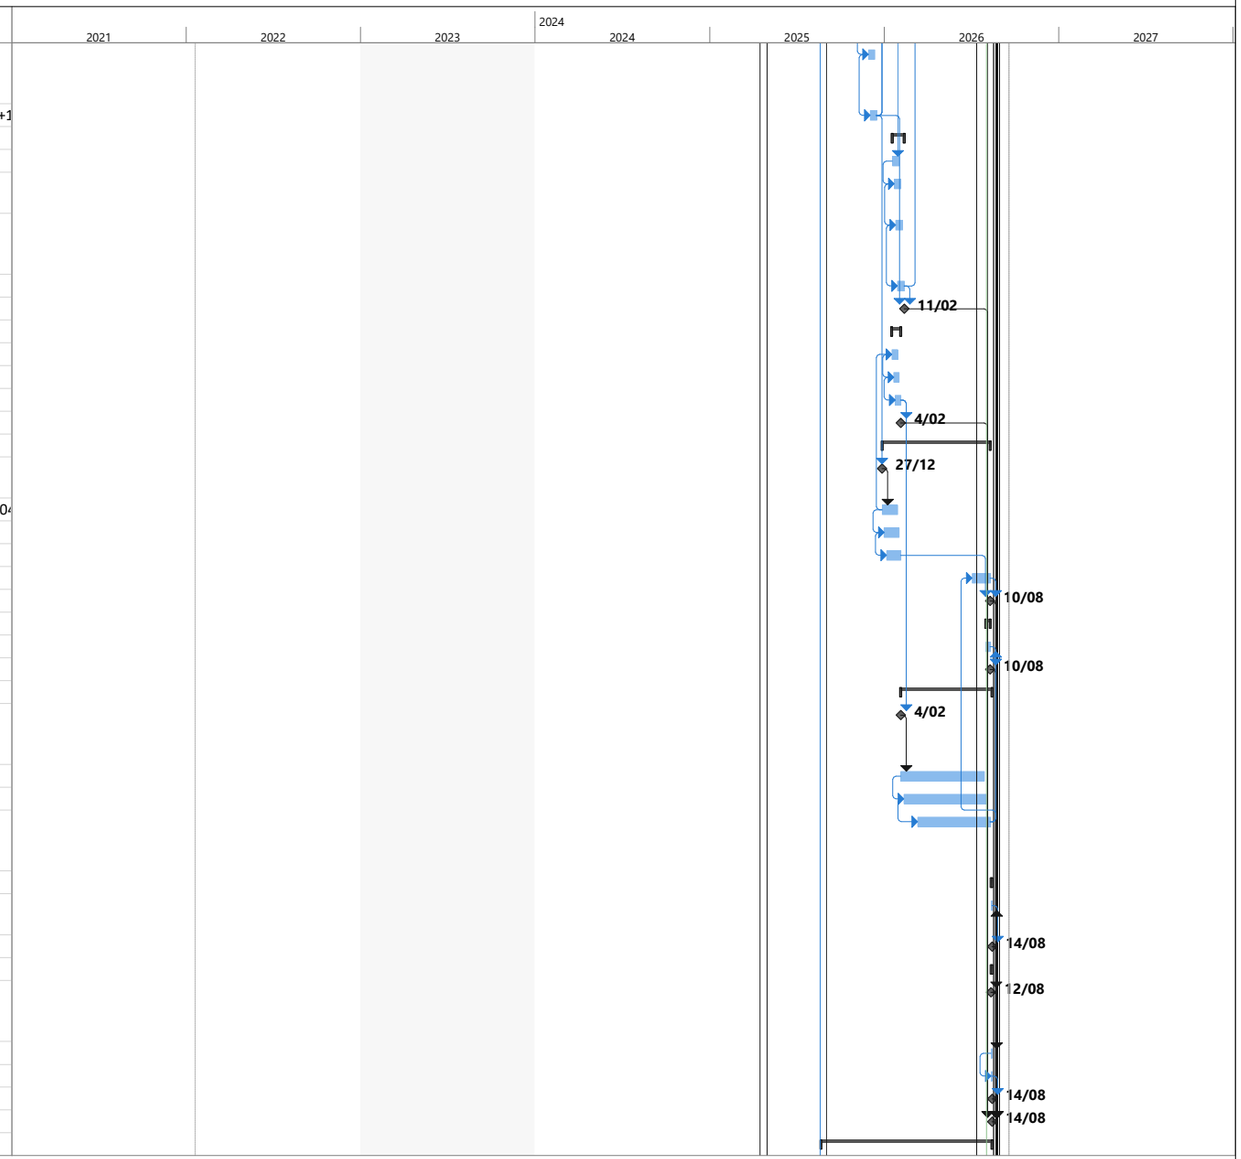


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1226	**Preliminares**	**14 días**	**jue 21/08/25**	**sáb 6/09/25**	**$973.112,00**		
1227	Aprobación PMT por SDA	0 días	jue 21/08/25	jue 21/08/25	$0,00	1160	1228FC+8 días
1228	Cerramiento de obra	2 días	sáb 30/08/25	mar 2/09/25	$0,00	1227FC+8 días	1229
1229	Implementación de PMT	2 días	mar 2/09/25	jue 4/09/25	$0,00	1228	1230
1230	Replanteo general	2 días	jue 4/09/25	sáb 6/09/25	$973.112,00	1229	1233
1231	**Alcantarillado**	**86 días**	**sáb 6/09/25**	**sáb 20/12/25**	**$126.721.656,00**		
1232	**Alcantarillado**	**86 días**	**sáb 6/09/25**	**sáb 20/12/25**	**$126.721.656,00**		
1233	Excavación	35 días	sáb 6/09/25	sáb 18/10/25	$29.195.758,00	1230	1234CC+3 días
1234	Instalación de tubería	35 días	mié 10/09/25	mié 22/10/25	$23.240.795,00	1233CC+3 días	1235CC+3 días
1235	Rellenos	35 días	sáb 13/09/25	sáb 25/10/25	$12.418.837,00	1234CC+3 días	1236FC-5 días
1236	Construcción de pozos	5 días	lun 20/10/25	sáb 25/10/25	$4.775.519,00	1235FC-5 días	1238;1240
1237	Construcción sumideros	20 días	mié 26/11/25	sáb 20/12/25	$57.090.747,00	1245	1238
1238	Fin alcantarillado	0 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25	$0,00	1236;1237	1275
1239	**Pavimentos**	**25 días**	**sáb 25/10/25**	**mié 26/11/25**	**$403.127.884,00**		
1240	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	$0,00	1236	1242
1241	**Costado noroccidental**	**25 días**	**sáb 25/10/25**	**mié 26/11/25**	**$403.127.884,00**		
1242	Excavación	10 días	sáb 25/10/25	vie 7/11/25	$53.963.035,00	1240	1243CC+5 días
1243	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	vie 31/10/25	jue 13/11/25	$75.816.156,00	1242CC+5 días	1244CC+5 días
1244	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 7/11/25	jue 20/11/25	$97.537.346,00	1243CC+5 días	1245CC+5 días
1245	Concreto	10 días	jue 13/11/25	mié 26/11/25	$175.811.347,00	1244CC+5 días	1237;1246;1253FC+1
1246	Fin Pavimentos	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$0,00	1245	1275
1247	**Acueducto**	**16 días**	**sáb 27/12/25**	**sáb 17/01/26**	**$29.202.660,00**		
1248	Excavaciones	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$1.817.162,00	1254CC+15 días	1249CC+3 días
1249	Instalación de tubería	10 días	mié 31/12/25	mié 14/01/26	$25.466.667,00	1248CC+3 días	1250CC+3 días
1250	Rellenos	10 días	lun 5/01/26	sáb 17/01/26	$1.918.831,00	1249CC+3 días	1251;1263
1251	Fin acueducto	0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	$0,00	1250	1275
1252	**Codensa**	**111 días**	**mar 9/12/25**	**vie 24/04/26**	**$24.262.419,00**		
1253	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25	$0,00	1245FC+10 días	1254
1254	Excavaciones	20 días	mar 9/12/25	sáb 3/01/26	$1.545.015,00	1253	1248CC+15 días;125
1255	Instalación de tubería	20 días	vie 12/12/25	mié 7/01/26	$6.994.225,00	1254CC+3 días	1256CC+3 días
1256	Rellenos	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	$6.699.308,00	1255CC+3 días	1258;1257FC+65 días
1257	Cajas	20 días	lun 30/03/26	vie 24/04/26	$9.023.871,00	1256FC+65 días	1258;1260
1258	Fin codensa	0 días	vie 24/04/26	vie 24/04/26	$0,00	1256;1257	1275
1259	**ETB**	**18 días**	**vie 24/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$21.730.236,00**		
1260	Renivelación camaras	18 días	vie 24/04/26	sáb 16/05/26	$21.730.236,00	1257	1261
1261	Fin ETB	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$0,00	1260	1275
1262	**Espacio público**	**169 días**	**sáb 17/01/26**	**vie 14/08/26**	**$116.265.001,00**		
1263	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	$0,00	1250	1264
1264	Excavación	155 días	sáb 17/01/26	mar 28/07/26	$14.145.783,00	1263	1265CC+5 días
1265	Rellenos	155 días	vie 23/01/26	lun 3/08/26	$13.879.304,00	1264CC+5 días	1266CC+25 días
1266	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	133 días	sáb 21/02/26	jue 6/08/26	$76.863.541,00	1265CC+25 días	1275
1267	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$11.376.373,00**		

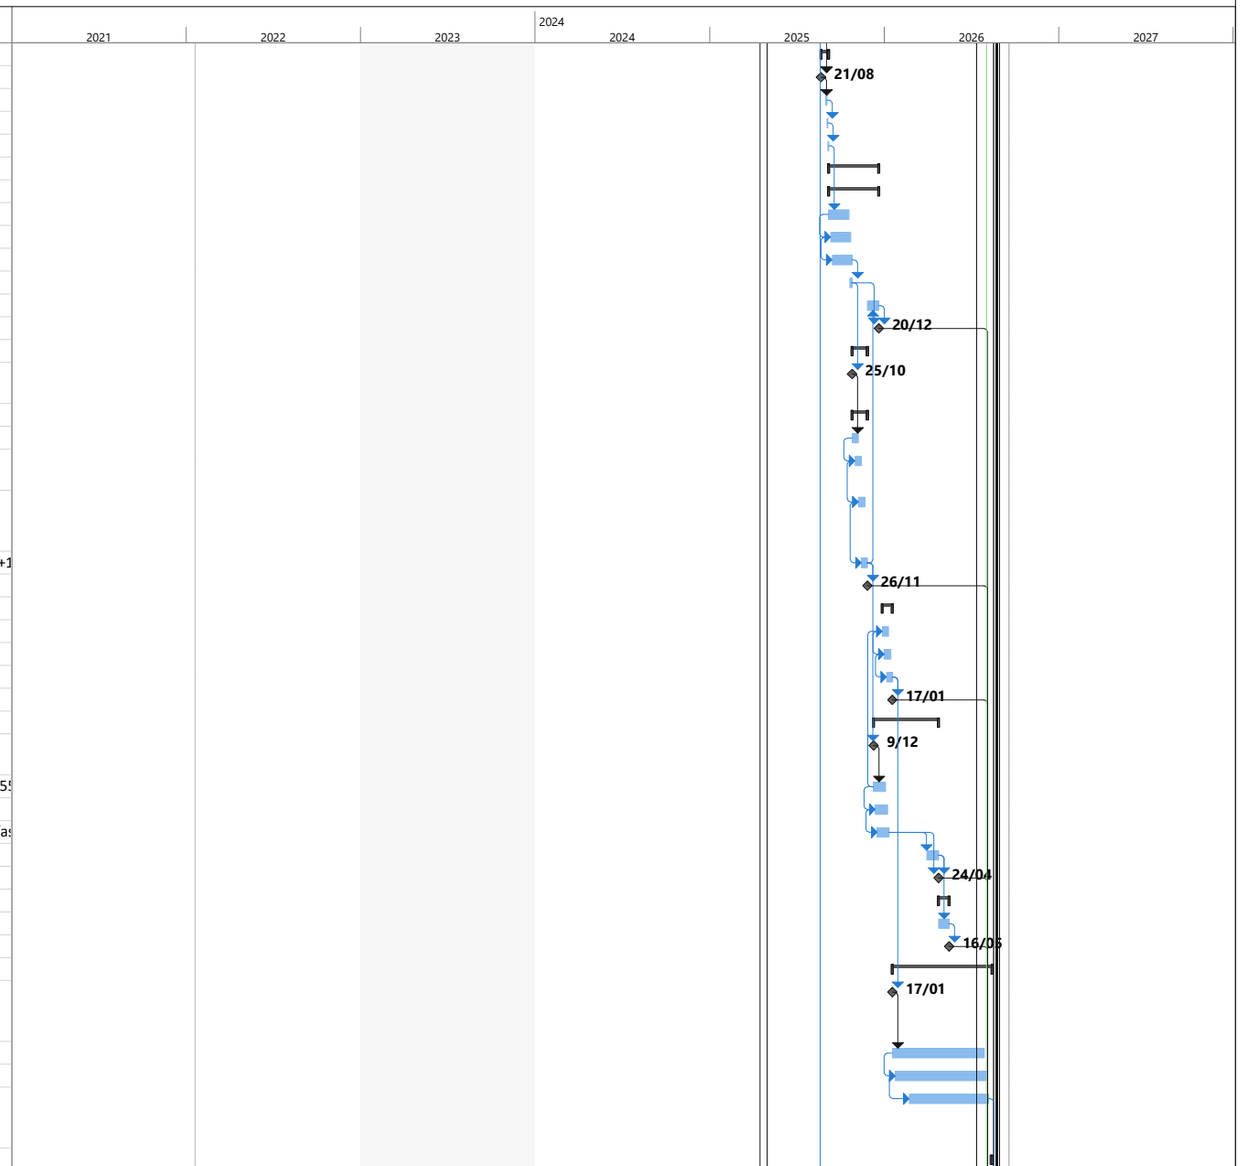


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1268	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$11.376.373,00	1271	1269
1269	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1268	1275
1270	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$14.734.636,00**		
1271	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1272;1268
1272	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$2.471.043,00	1271	1273CC
1273	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$12.263.593,00	1272CC	1274
1274	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1273	1275
1275	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1238;1246;1251;125	1870
1276	**CIV 16000873 (11)**	**400 días**	**vie 4/04/25**	**vie 14/08/26**	**$1.972.307.769,00**		
1277	**Preliminares**	**14 días**	**vie 4/04/25**	**mié 23/04/25**	**$2.315.950,00**		
1278	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 4/04/25	vie 4/04/25	$0,00	1065	1279FC+8 días
1279	Cerramiento de obra	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$0,00	1278FC+8 días	1280
1280	Implementación de PMT	2 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$0,00	1279	1281
1281	Replanteo general	2 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$2.315.950,00	1280	1284
1282	**Alcantarillado**	**177 días**	**mié 23/04/25**	**jue 27/11/25**	**$379.330.122,00**		
1283	**Pluvial**	**177 días**	**mié 23/04/25**	**jue 27/11/25**	**$324.433.610,00**		
1284	Excavación	75 días	mié 23/04/25	vie 25/07/25	$99.509.339,00	1281	1285CC+3 días
1285	Instalación de tubería	75 días	sáb 26/04/25	mar 29/07/25	$73.676.687,00	1284CC+3 días	1286CC+3 días
1286	Rellenos	75 días	mié 30/04/25	vie 1/08/25	$63.484.229,00	1285CC+3 días	1287FC-5 días;1290
1287	Construcción de pozos	20 días	sáb 26/07/25	jue 21/08/25	$20.296.264,00	1286FC-5 días	1293
1288	Construcción sumideros	20 días	sáb 1/11/25	jue 27/11/25	$67.467.091,00	1300	1293
1289	**Sanitario**	**46 días**	**vie 1/08/25**	**vie 26/09/25**	**$54.896.512,00**		
1290	Excavación	40 días	vie 1/08/25	vie 19/09/25	$25.872.093,00	1286	1291CC+3 días
1291	Instalación de tubería	40 días	mar 5/08/25	mar 23/09/25	$10.026.353,00	1290CC+3 días	1292CC+3 días
1292	Rellenos	40 días	sáb 9/08/25	vie 26/09/25	$18.998.066,00	1291CC+3 días	1293;1295
1293	Fin alcantarillado	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	$0,00	1292;1287;1288	1330
1294	**Pavimentos**	**30 días**	**vie 26/09/25**	**sáb 1/11/25**	**$910.055.797,00**		
1295	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	vie 26/09/25	vie 26/09/25	$0,00	1292	1297
1296	**Costado noroccidental**	**30 días**	**vie 26/09/25**	**sáb 1/11/25**	**$910.055.797,00**		
1297	Excavación	15 días	vie 26/09/25	mié 15/10/25	$112.159.774,00	1295	1298CC+5 días
1298	Relleno en clase B	15 días	jue 2/10/25	mar 21/10/25	$178.622.120,00	1297CC+5 días	1299CC+5 días
1299	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	15 días	mié 8/10/25	lun 27/10/25	$229.799.170,00	1298CC+5 días	1300CC+5 días
1300	Concreto	15 días	mié 15/10/25	sáb 1/11/25	$389.474.733,00	1299CC+5 días	1288;1301;1308FC+1
1301	Fin Pavimentos	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1300	1330
1302	**Acueducto**	**36 días**	**mié 3/12/25**	**lun 19/01/26**	**$149.947.889,00**		
1303	Excavaciones	30 días	mié 3/12/25	sáb 10/01/26	$42.842.754,00	1309CC+15 días	1304CC+3 días
1304	Instalación de tubería	30 días	sáb 6/12/25	jue 15/01/26	$76.626.909,00	1303CC+3 días	1305CC+3 días
1305	Rellenos	30 días	jue 11/12/25	lun 19/01/26	$30.478.226,00	1304CC+3 días	1306;1318
1306	Fin acueducto	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$0,00	1305	1330
1307	**Codensa**	**171 días**	**vie 14/11/25**	**mar 16/06/26**	**$185.802.169,00**		
1308	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$0,00	1300FC+10 días	1309
1309	Excavaciones	45 días	vie 14/11/25	sáb 10/01/26	$10.177.719,00	1308	1303CC+15 días;1310
1310	Instalación de tubería	45 días	mié 19/11/25	jue 15/01/26	$93.888.966,00	1309CC+3 días	1311CC+3 días

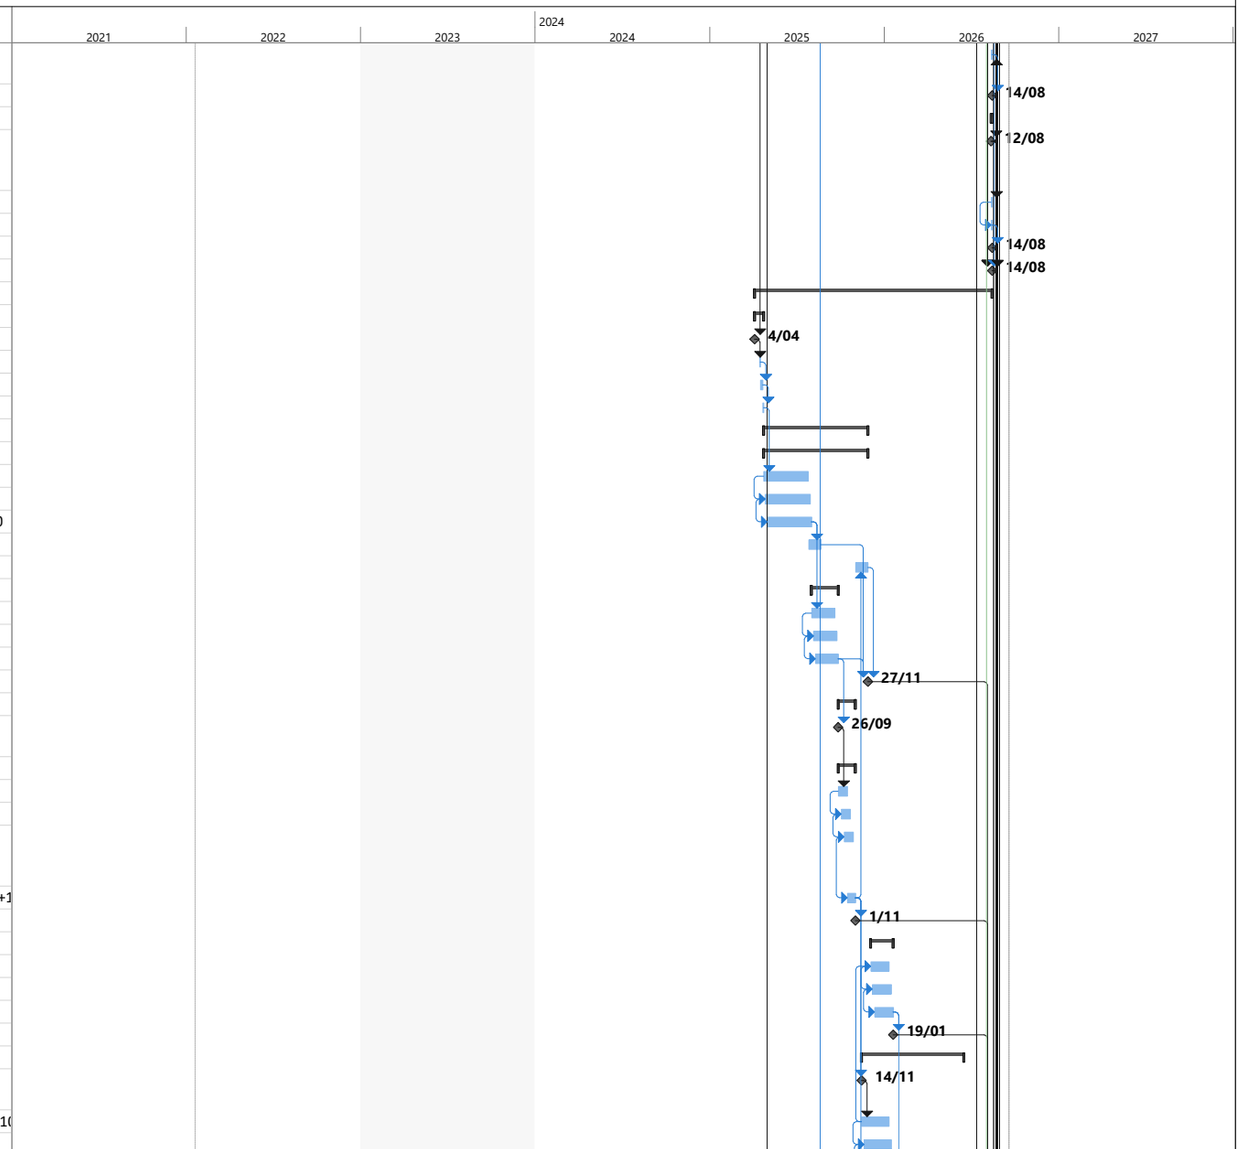


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1311	Rellenos	45 días	sáb 22/11/25	lun 19/01/26	$39.368.653,00	1310CC+3 días	1313
1312	Cajas	55 días	mié 8/04/26	mar 16/06/26	$42.366.831,00	1321FC-55 días	1313
1313	Fin codensa	0 días	mar 16/06/26	mar 16/06/26	$0,00	1311;1312	1330
1314	**ETB**	**12 días**	**sáb 30/05/26**	**mar 16/06/26**	**$14.225.643,00**		
1315	Renivelación camaras	12 días	sáb 30/05/26	mar 16/06/26	$14.225.643,00	1321FC-12 días	1316
1316	Fin ETB	0 días	mar 16/06/26	mar 16/06/26	$0,00	1315	1330
1317	**Espacio público**	**168 días**	**lun 19/01/26**	**vie 14/08/26**	**$259.215.192,00**		
1318	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$0,00	1305	1319
1319	Excavación	90 días	lun 19/01/26	vie 8/05/26	$36.408.402,00	1318	1320CC+5 días
1320	Rellenos	90 días	sáb 24/01/26	jue 14/05/26	$33.563.224,00	1319CC+5 días	1321CC+25 días
1321	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	90 días	lun 23/02/26	mar 16/06/26	$180.598.606,00	1320CC+25 días	1312FC-55 días;1315FC-12 días
1322	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$8.644.960,00**		
1323	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$8.644.960,00	1326	1324
1324	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1323	
1325	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$71.415.007,00**		
1326	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1327;1323
1327	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$5.233.129,00	1326	1328CC
1328	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$66.181.878,00	1327CC	1329
1329	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1328	1330
1330	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1293;1301;1306;131	1870
1331	**CIV 16000789 (8)**	**229 días**	**sáb 1/11/25**	**vie 14/08/26**	**$1.964.960.526,00**		
1332	**Preliminares**	**13 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 19/11/25**	**$2.925.151,00**		
1333	Aprobación PMT por SDA	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1300	1334FC+7 días;1389
1334	Cerramiento de obra	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$0,00	1333FC+7 días	1335
1335	Implementación de PMT	2 días	jue 13/11/25	sáb 15/11/25	$0,00	1334	1336
1336	Replanteo general	2 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$2.925.151,00	1335	1339
1337	**Alcantarillado**	**157 días**	**mié 19/11/25**	**lun 1/06/26**	**$454.228.711,00**		
1338	**Pluvial**	**157 días**	**mié 19/11/25**	**lun 1/06/26**	**$202.879.875,00**		
1339	Excavación	50 días	mié 19/11/25	mié 21/01/26	$54.264.625,00	1336	1340CC+3 días
1340	Instalación de tubería	50 días	sáb 22/11/25	sáb 24/01/26	$41.668.328,00	1339CC+3 días	1341CC+3 días
1341	Rellenos	50 días	mié 26/11/25	mié 28/01/26	$21.977.662,00	1340CC+3 días	1342FC-5 días;1345C
1342	Construcción de pozos	25 días	jue 22/01/26	vie 20/02/26	$24.976.693,00	1341FC-5 días	1349
1343	Construcción sumideros	50 días	lun 30/03/26	lun 1/06/26	$59.992.567,00	1356	1349
1344	**Sanitario**	**71 días**	**mar 9/12/25**	**jue 5/03/26**	**$251.348.836,00**		
1345	Excavación	60 días	mar 9/12/25	vie 20/02/26	$128.252.514,00	1341CC+10 días	1346CC+3 días
1346	Instalación de tubería	60 días	vie 12/12/25	mar 24/02/26	$58.987.089,00	1345CC+3 días	1347CC+3 días
1347	Rellenos	60 días	mar 16/12/25	vie 27/02/26	$43.411.458,00	1346CC+3 días	1349;1348FC-5 días
1348	Construcción de pozos	10 días	sáb 21/02/26	jue 5/03/26	$20.697.775,00	1347FC-5 días	1351CC
1349	Fin alcantarillado	0 días	lun 1/06/26	lun 1/06/26	$0,00	1342;1343;1347	1386
1350	**Pavimentos**	**30 días**	**sáb 21/02/26**	**lun 30/03/26**	**$609.295.891,00**		
1351	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 21/02/26	sáb 21/02/26	$0,00	1348CC	1353
1352	**Costado noroccidental**	**30 días**	**sáb 21/02/26**	**lun 30/03/26**	**$609.295.891,00**		
1353	Excavación	15 días	sáb 21/02/26	mié 11/03/26	$52.064.758,00	1351	1354CC+5 días

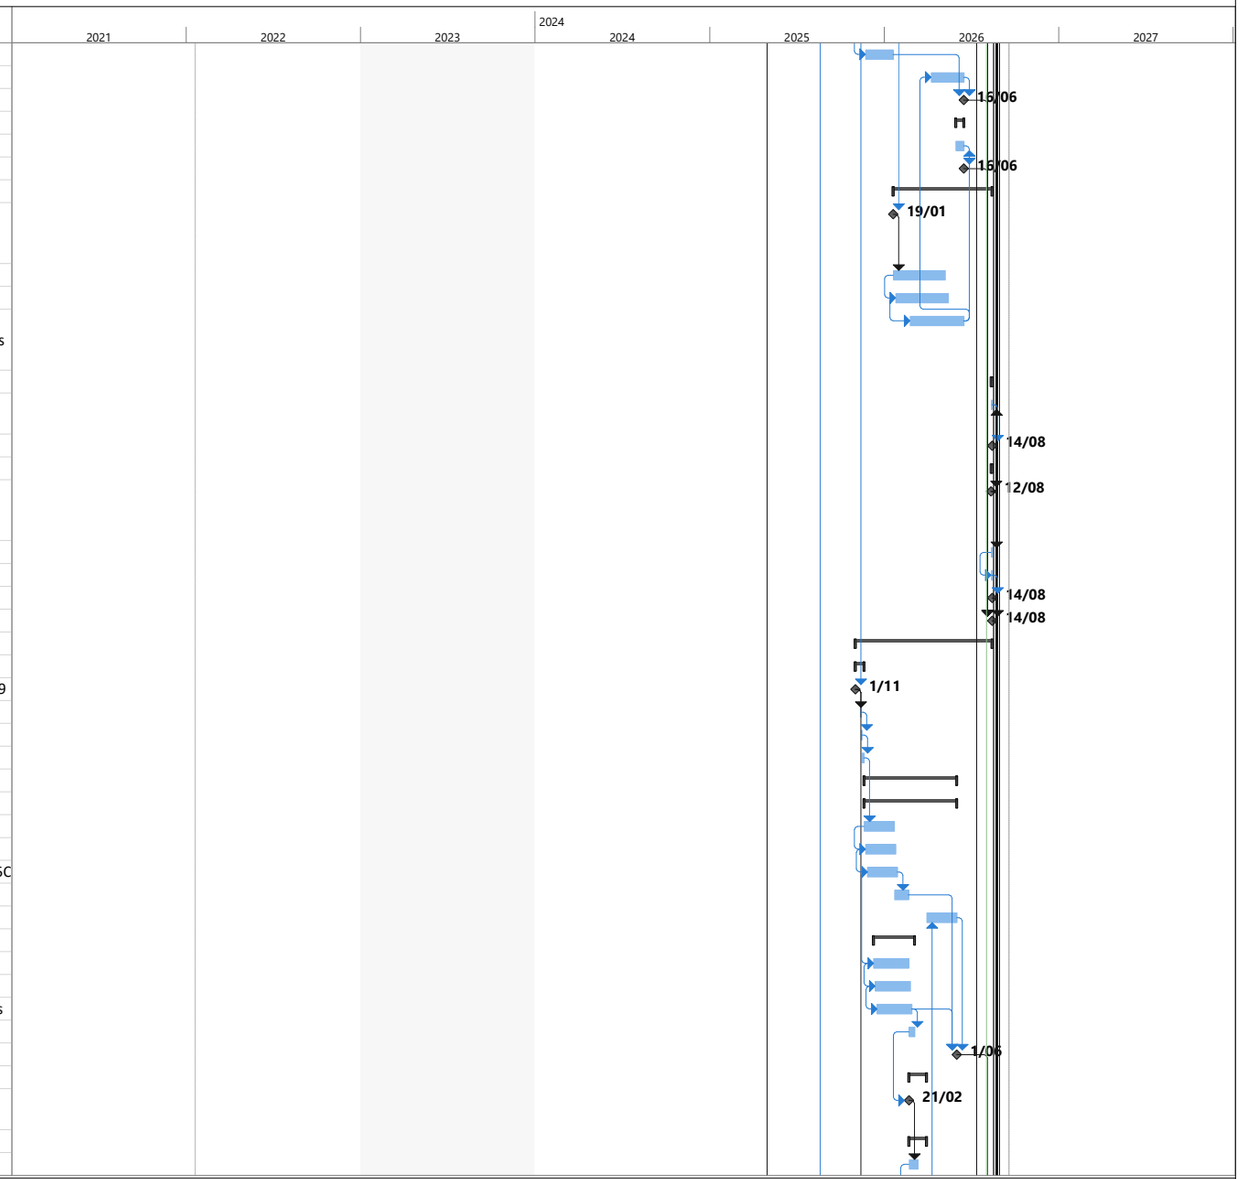


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1354	Estabilización de subrasante rajón con sello	15 días	vie 27/02/26	mar 17/03/26	$60.978.161,00	1353CC+5 días	1355CC+5 días
1355	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	15 días	jue 5/03/26	mar 24/03/26	$176.546.210,00	1354CC+5 días	1356CC+5 días
1356	Concreto	15 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26	$319.706.762,00	1355CC+5 días	1343;1357;1364CC
1357	Fin Pavimentos	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	$0,00	1356	1386
1358	**Acueducto**	**21 días**	**lun 30/03/26**	**sáb 25/04/26**	**$58.030.609,00**		
1359	Excavaciones	15 días	lun 30/03/26	sáb 18/04/26	$4.967.094,00	1365CC+15 días	1360CC+3 días
1360	Instalación de tubería	15 días	sáb 4/04/26	mié 22/04/26	$49.059.043,00	1359CC+3 días	1361CC+3 días
1361	Rellenos	15 días	mié 8/04/26	sáb 25/04/26	$4.004.472,00	1360CC+3 días	1362;1374CC
1362	Fin acueducto	0 días	sáb 25/04/26	sáb 25/04/26	$0,00	1361	1386
1363	**Codensa**	**121 días**	**mié 11/03/26**	**mar 11/08/26**	**$301.367.291,00**		
1364	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	$0,00	1356CC	1365
1365	Excavaciones	40 días	mié 11/03/26	jue 30/04/26	$12.966.570,00	1364	1359CC+15 días;136
1366	Instalación de tubería	40 días	sáb 14/03/26	mar 5/05/26	$142.200.383,00	1365CC+3 días	1367CC+3 días
1367	Rellenos	40 días	mié 18/03/26	vie 8/05/26	$48.265.463,00	1366CC+3 días	1369
1368	Cajas	40 días	lun 22/06/26	mar 11/08/26	$97.934.875,00	1377FC-40 días	1369
1369	Fin codensa	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1367;1368	1386
1370	**ETB**	**12 días**	**lun 27/07/26**	**mar 11/08/26**	**$15.729.673,00**		
1371	Renivelación camaras	12 días	lun 27/07/26	mar 11/08/26	$15.729.673,00	1377FC-12 días	1372
1372	Fin ETB	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1371	1386
1373	**Espacio público**	**100 días**	**mié 8/04/26**	**mar 11/08/26**	**$497.463.566,00**		
1374	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mié 8/04/26	mié 8/04/26	$0,00	1361CC	1375
1375	Excavación	90 días	mié 8/04/26	mié 29/07/26	$74.441.850,00	1374	1376CC+5 días
1376	Rellenos	90 días	mar 14/04/26	mar 4/08/26	$68.236.592,00	1375CC+5 días	1377CC+35 días
1377	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	60 días	mié 27/05/26	mar 11/08/26	$345.246.721,00	1376CC+35 días	1368FC-40 días;1371FC-12 días
1378	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**sáb 8/08/26**	**mar 11/08/26**	**$9.538.403,00**		
1379	Instalación de mobiliario urbano	2 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$9.538.403,00	1383FC-5 días	1380
1380	Fin Espacio Publico	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1379	1386
1381	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$25.919.634,00**		
1382	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1383
1383	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$5.244.557,00	1382	1384CC;1379FC-5 día
1384	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$20.675.077,00	1383CC	1385
1385	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1384	1386
1386	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1349;1357;1362;136	1870
1387	**CIV 16000874 (9)**	**229 días**	**sáb 1/11/25**	**vie 14/08/26**	**$1.183.592.146,00**		
1388	**Preliminares**	**13 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 19/11/25**	**$1.809.117,00**		
1389	Aprobación PMT por SDA	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1333	1390FC+7 días;1445
1390	Cerramiento de obra	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$0,00	1389FC+7 días	1391
1391	Implementación de PMT	2 días	jue 13/11/25	sáb 15/11/25	$0,00	1390	1392
1392	Replanteo general	2 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$1.809.117,00	1391	1395
1393	**Alcantarillado**	**117 días**	**mié 19/11/25**	**lun 13/04/26**	**$154.072.996,00**		

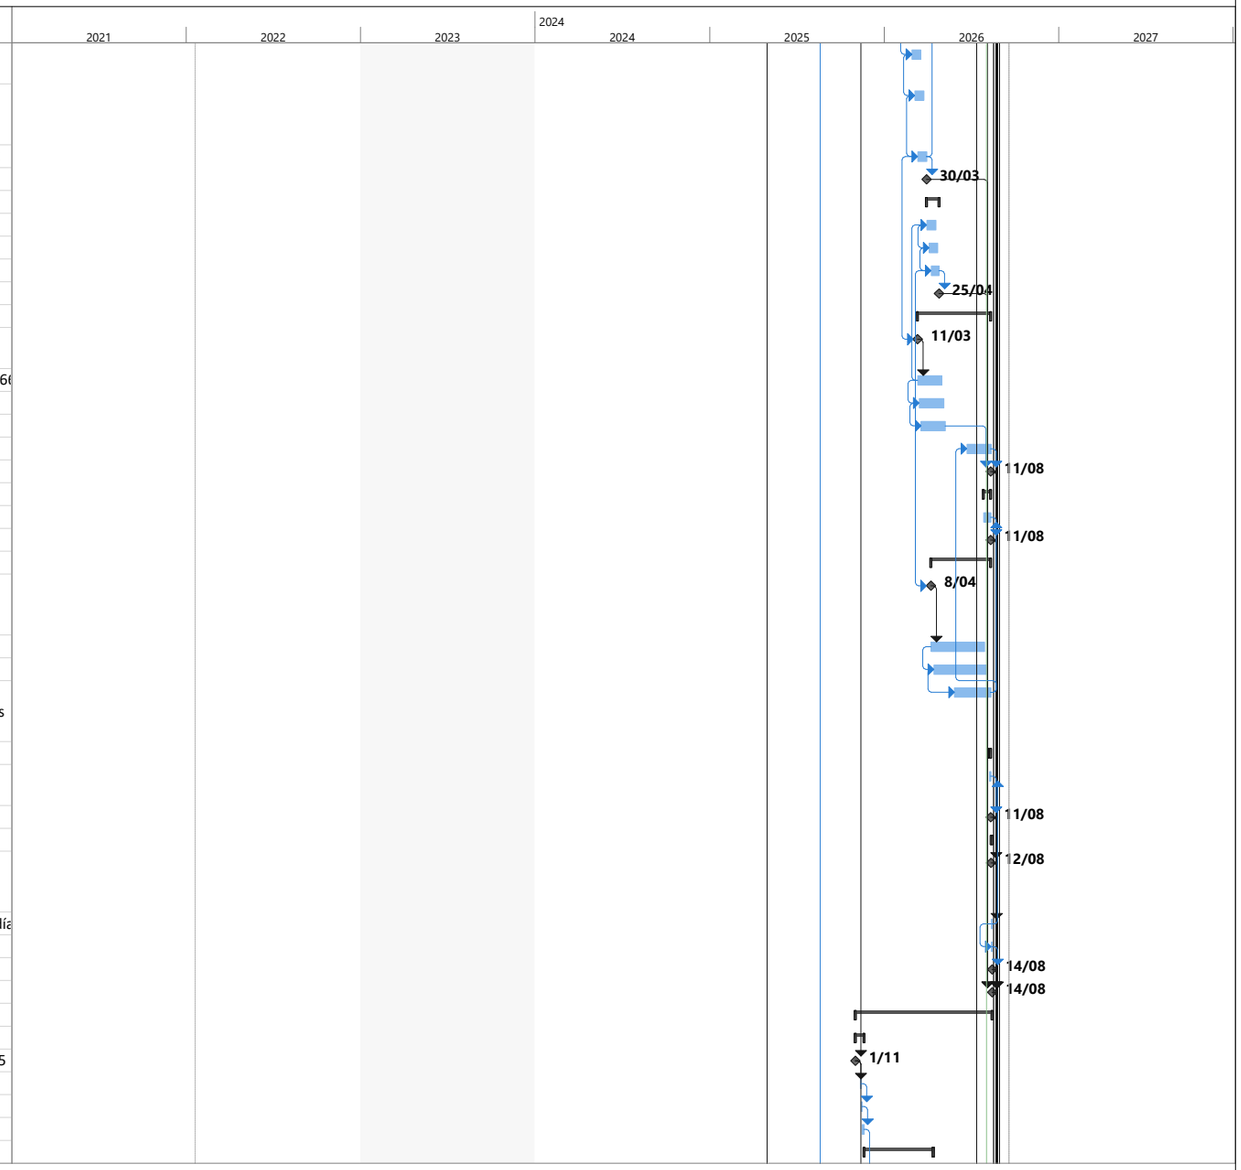


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1394	**Pluvial**	**117 días**	**mié 19/11/25**	**lun 13/04/26**	**$97.938.485,00**		
1395	Excavación	25 días	mié 19/11/25	vie 19/12/25	$20.217.662,00	1392	1396CC+3 días
1396	Instalación de tubería	25 días	sáb 22/11/25	mar 23/12/25	$31.339.960,00	1395CC+3 días	1397CC+3 días
1397	Rellenos	25 días	mié 26/11/25	sáb 27/12/25	$11.179.302,00	1396CC+3 días	1398FC-5 días;1401
1398	Construcción de pozos	5 días	sáb 20/12/25	sáb 27/12/25	$5.205.278,00	1397FC-5 días	1405
1399	Construcción sumideros	25 días	mié 11/03/26	lun 13/04/26	$29.996.283,00	1412	1405
1400	**Sanitario**	**36 días**	**sáb 27/12/25**	**mar 10/02/26**	**$56.134.511,00**		
1401	Excavación	30 días	sáb 27/12/25	mar 3/02/26	$29.603.585,00	1397	1402CC+3 días
1402	Instalación de tubería	30 días	mié 31/12/25	vie 6/02/26	$9.065.050,00	1401CC+3 días	1403CC+3 días
1403	Rellenos	30 días	lun 5/01/26	mar 10/02/26	$9.453.171,00	1402CC+3 días	1405;1404FC-5 días
1404	Construcción de pozos	5 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26	$8.012.705,00	1403FC-5 días	1407
1405	Fin alcantarillado	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26	$0,00	1398;1399;1403	1442
1406	**Pavimentos**	**25 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/03/26**	**$477.350.401,00**		
1407	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$0,00	1404	1409
1408	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/03/26**	**$477.350.401,00**		
1409	Excavación	10 días	mar 10/02/26	sáb 21/02/26	$58.306.490,00	1407	1410CC+5 días
1410	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	$91.550.880,00	1409CC+5 días	1411CC+5 días
1411	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 21/02/26	jue 5/03/26	$117.785.079,00	1410CC+5 días	1412CC+5 días
1412	Concreto	10 días	vie 27/02/26	mié 11/03/26	$209.707.952,00	1411CC+5 días	1399;1413;1420FC+1
1413	Fin Pavimentos	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	$0,00	1412	1442
1414	**Acueducto**	**16 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 2/05/26**	**$91.650.871,00**		
1415	Excavaciones	10 días	lun 13/04/26	vie 24/04/26	$5.412.561,00	1421CC+15 días	1416CC+3 días
1416	Instalación de tubería	10 días	jue 16/04/26	mar 28/04/26	$73.975.381,00	1415CC+3 días	1417CC+3 días
1417	Rellenos	10 días	lun 20/04/26	sáb 2/05/26	$12.262.929,00	1416CC+3 días	1418;1430
1418	Fin acueducto	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	1417	1442
1419	**Codensa**	**91 días**	**mar 24/03/26**	**jue 16/07/26**	**$123.122.502,00**		
1420	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	$0,00	1412FC+10 días	1421
1421	Excavaciones	35 días	mar 24/03/26	jue 7/05/26	$5.201.004,00	1420	1415CC+15 días;142
1422	Instalación de tubería	35 días	vie 27/03/26	lun 11/05/26	$54.021.868,00	1421CC+3 días	1423CC+3 días
1423	Rellenos	35 días	mar 31/03/26	jue 14/05/26	$19.095.321,00	1422CC+3 días	1425
1424	Cajas	35 días	mar 2/06/26	jue 16/07/26	$44.804.309,00	1433FC-35 días	1425
1425	Fin codensa	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	$0,00	1423;1424	1442
1426	**ETB**	**12 días**	**jue 2/07/26**	**jue 16/07/26**	**$15.090.084,00**		
1427	Renivelación camaras	12 días	jue 2/07/26	jue 16/07/26	$15.090.084,00	1433FC-12 días	1428
1428	Fin ETB	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	$0,00	1427	1442
1429	**Espacio público**	**83 días**	**sáb 2/05/26**	**vie 14/08/26**	**$305.690.440,00**		
1430	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	1417	1431
1431	Excavación	50 días	sáb 2/05/26	sáb 4/07/26	$43.845.617,00	1430	1432CC+5 días
1432	Rellenos	50 días	vie 8/05/26	vie 10/07/26	$40.248.986,00	1431CC+5 días	1433CC+25 días
1433	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	30 días	mar 9/06/26	jue 16/07/26	$205.565.750,00	1432CC+25 días	1424FC-35 días;1427FC-12 días
1434	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$16.030.087,00**		

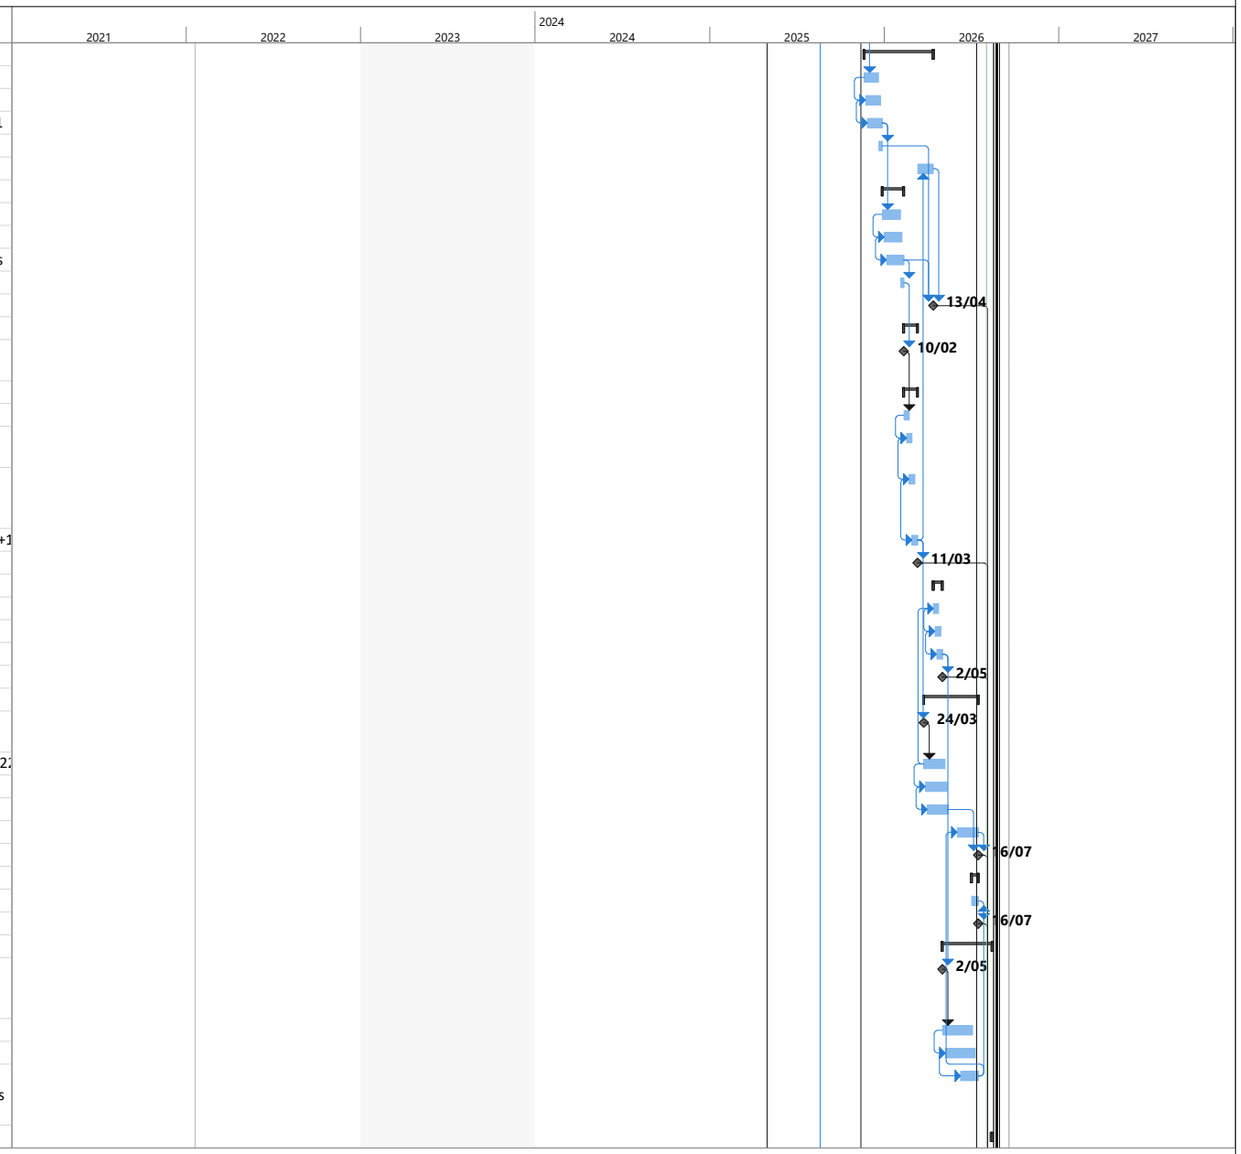


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1435	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$16.030.087,00	1438	1436
1436	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1435	1442
1437	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$14.805.735,00**		
1438	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1439;1435
1439	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$2.779.000,00	1438	1440CC
1440	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$12.026.735,00	1439CC	1441
1441	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1440	1442
1442	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1405;1413;1418;142	1870
1443	**CIV 16000942 (10)**	**229 días**	**sáb 1/11/25**	**vie 14/08/26**	**$1.077.911.600,00**		
1444	**Preliminares**	**13 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 19/11/25**	**$1.553.690,00**		
1445	Aprobación PMT por SDA	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1389	1446FC+7 días
1446	Cerramiento de obra	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$0,00	1445FC+7 días	1447
1447	Implementación de PMT	2 días	jue 13/11/25	sáb 15/11/25	$0,00	1446	1448
1448	Replanteo general	2 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$1.553.690,00	1447	1451
1449	**Alcantarillado**	**102 días**	**mié 19/11/25**	**mar 24/03/26**	**$110.308.589,00**		
1450	**Pluvial**	**102 días**	**mié 19/11/25**	**mar 24/03/26**	**$54.966.177,00**		
1451	Excavación	20 días	mié 19/11/25	sáb 13/12/25	$12.689.195,00	1448	1452CC+3 días
1452	Instalación de tubería	20 días	sáb 22/11/25	mié 17/12/25	$12.359.083,00	1451CC+3 días	1453CC+3 días
1453	Rellenos	20 días	mié 26/11/25	sáb 20/12/25	$7.152.534,00	1452CC+3 días	1454FC-5 días;1457
1454	Construcción de pozos	5 días	lun 15/12/25	sáb 20/12/25	$4.767.595,00	1453FC-5 días	1461
1455	Construcción sumideros	15 días	jue 5/03/26	mar 24/03/26	$17.997.770,00	1468	1461
1456	**Sanitario**	**46 días**	**sáb 20/12/25**	**lun 16/02/26**	**$55.342.412,00**		
1457	Excavación	30 días	sáb 20/12/25	mié 28/01/26	$25.421.833,00	1453	1458CC+3 días
1458	Instalación de tubería	30 días	mié 24/12/25	sáb 31/01/26	$8.928.094,00	1457CC+3 días	1459CC+3 días
1459	Rellenos	30 días	lun 29/12/25	mié 4/02/26	$6.853.452,00	1458CC+3 días	1460;1463
1460	Construcción de pozos	10 días	mié 4/02/26	lun 16/02/26	$14.139.033,00	1459	1461
1461	Fin alcantarillado	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	$0,00	1454;1455;1460	1503
1462	**Pavimentos**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 26/03/26**	**$580.847.956,00**		
1463	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mié 4/02/26	mié 4/02/26	$0,00	1459	1465
1464	**Costado noroccidental**	**25 días**	**mié 4/02/26**	**jue 5/03/26**	**$408.261.580,00**		
1465	Excavación	10 días	mié 4/02/26	lun 16/02/26	$44.936.744,00	1463	1466CC+5 días;1470I
1466	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	mar 10/02/26	sáb 21/02/26	$42.247.065,00	1465CC+5 días	1467CC+5 días
1467	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	$122.318.643,00	1466CC+5 días	1468CC+5 días
1468	Concreto	10 días	sáb 21/02/26	jue 5/03/26	$198.759.128,00	1467CC+5 días	1455
1469	**Interseccion Cr 43 - Cll 10A**	**27 días**	**sáb 21/02/26**	**jue 26/03/26**	**$172.586.376,00**		
1470	Excavación	12 días	sáb 21/02/26	sáb 7/03/26	$17.363.229,00	1465FC+5 días	1471CC+5 días
1471	Estabilización de subrasante rajón con sello	12 días	vie 27/02/26	vie 13/03/26	$19.899.332,00	1470CC+5 días	1472CC+5 días
1472	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	12 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26	$57.611.314,00	1471CC+5 días	1473CC+5 días
1473	Concreto	12 días	mié 11/03/26	jue 26/03/26	$77.712.501,00	1472CC+5 días	1474;1481FC+10 días
1474	Fin Pavimentos	0 días	jue 26/03/26	jue 26/03/26	$0,00	1473	1503
1475	**Acueducto**	**16 días**	**lun 27/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$38.514.386,00**		

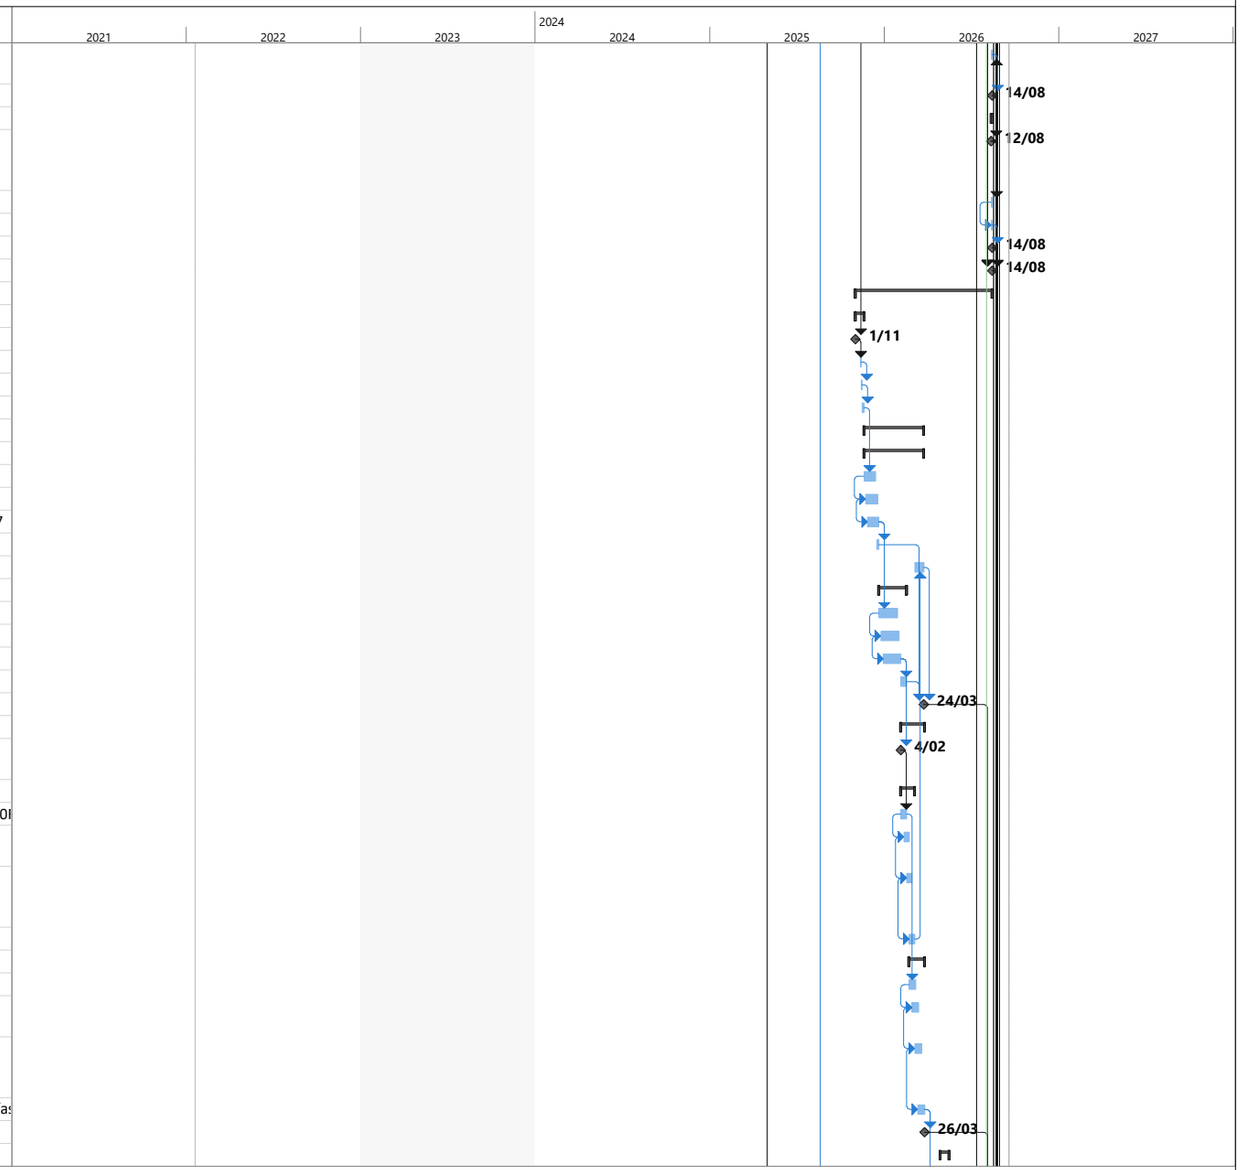


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1476	Excavaciones	10 días	lun 27/04/26	sáb 9/05/26	$3.374.558,00	1482CC+15 días	1477CC+3 días
1477	Instalación de tubería	10 días	jue 30/04/26	mié 13/05/26	$32.151.742,00	1476CC+3 días	1478CC+3 días
1478	Rellenos	10 días	mar 5/05/26	sáb 16/05/26	$2.988.086,00	1477CC+3 días	1479;1491
1479	Fin acueducto	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$0,00	1478	1503
1480	**Codensa**	**86 días**	**jue 9/04/26**	**sáb 25/07/26**	**$160.181.150,00**		
1481	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$0,00	1473FC+10 días	1482
1482	Excavaciones	40 días	jue 9/04/26	jue 28/05/26	$7.439.821,00	1481	1476CC+15 días;148
1483	Instalación de tubería	40 días	lun 13/04/26	lun 1/06/26	$74.549.533,00	1482CC+3 días	1484CC+3 días
1484	Rellenos	40 días	jue 16/04/26	jue 4/06/26	$26.805.811,00	1483CC+3 días	1486;1485
1485	Cajas	40 días	jue 4/06/26	sáb 25/07/26	$51.385.985,00	1484	1486;1488FF
1486	Fin codensa	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$0,00	1484;1485	1503
1487	**ETB**	**12 días**	**vie 10/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$14.981.002,00**		
1488	Renivelación camaras	12 días	vie 10/07/26	sáb 25/07/26	$14.981.002,00	1485FF	1489
1489	Fin ETB	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$0,00	1488	1503
1490	**Espacio público**	**71 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$146.108.252,00**		
1491	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$0,00	1478	1492
1492	Excavación	60 días	sáb 16/05/26	vie 31/07/26	$18.050.745,00	1491	1493CC+5 días
1493	Rellenos	60 días	sáb 23/05/26	jue 6/08/26	$16.659.646,00	1492CC+5 días	1494CC+25 días
1494	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	37 días	mié 24/06/26	lun 10/08/26	$95.409.940,00	1493CC+25 días	1503
1495	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$15.987.921,00**		
1496	Instalación de mobiliario urbano	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$15.987.921,00	1499	1497
1497	Fin Espacio Publico	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1496	1503
1498	**Señalización**	**2 días**	**mié 12/08/26**	**vie 14/08/26**	**$25.416.575,00**		
1499	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	666FC+1 día	1500;1496
1500	Señalizacion vertical	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$4.578.300,00	1499	1501CC
1501	Señalizacion horizontal	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$20.838.275,00	1500CC	1502
1502	Fin Señalizacion	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1501	1503
1503	Fin CIV	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1461;1474;1479;148	1870
1504	**CIV 16000483 (2)**	**285 días**	**vie 29/08/25**	**mar 18/08/26**	**$1.525.713.556,00**		
1505	**Preliminares**	**13 días**	**vie 29/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$1.783.608,00**		
1506	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	$0,00	355FC+28 días	1507FC+7 días;1567;
1507	Cerramiento de obra	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	$0,00	1506FC+7 días	1508
1508	Implementación de PMT	2 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	1507	1509
1509	Replanteo general	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	$1.783.608,00	1508	1512
1510	**Alcantarillado**	**97 días**	**sáb 13/09/25**	**mar 13/01/26**	**$354.621.112,00**		
1511	**Pluvial**	**86 días**	**sáb 13/09/25**	**lun 29/12/25**	**$282.548.782,00**		
1512	Excavación	25 días	sáb 13/09/25	mar 14/10/25	$77.397.964,00	1509	1513CC+3 días
1513	Instalación de tubería	25 días	mié 17/09/25	vie 17/10/25	$98.845.007,00	1512CC+3 días	1514CC+3 días
1514	Rellenos	25 días	sáb 20/09/25	mar 21/10/25	$32.377.405,00	1513CC+3 días	1515FC-5 días
1515	Construcción de pozos	15 días	mié 15/10/25	sáb 1/11/25	$25.934.353,00	1514FC-5 días	1522;1524
1516	Construcción sumideros	20 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25	$47.994.053,00	1529	1522
1517	**Sanitario**	**21 días**	**mar 16/12/25**	**mar 13/01/26**	**$72.072.330,00**		
1518	Excavación	15 días	mar 16/12/25	lun 5/01/26	$34.975.884,00	1529FC+10 días	1519CC+3 días

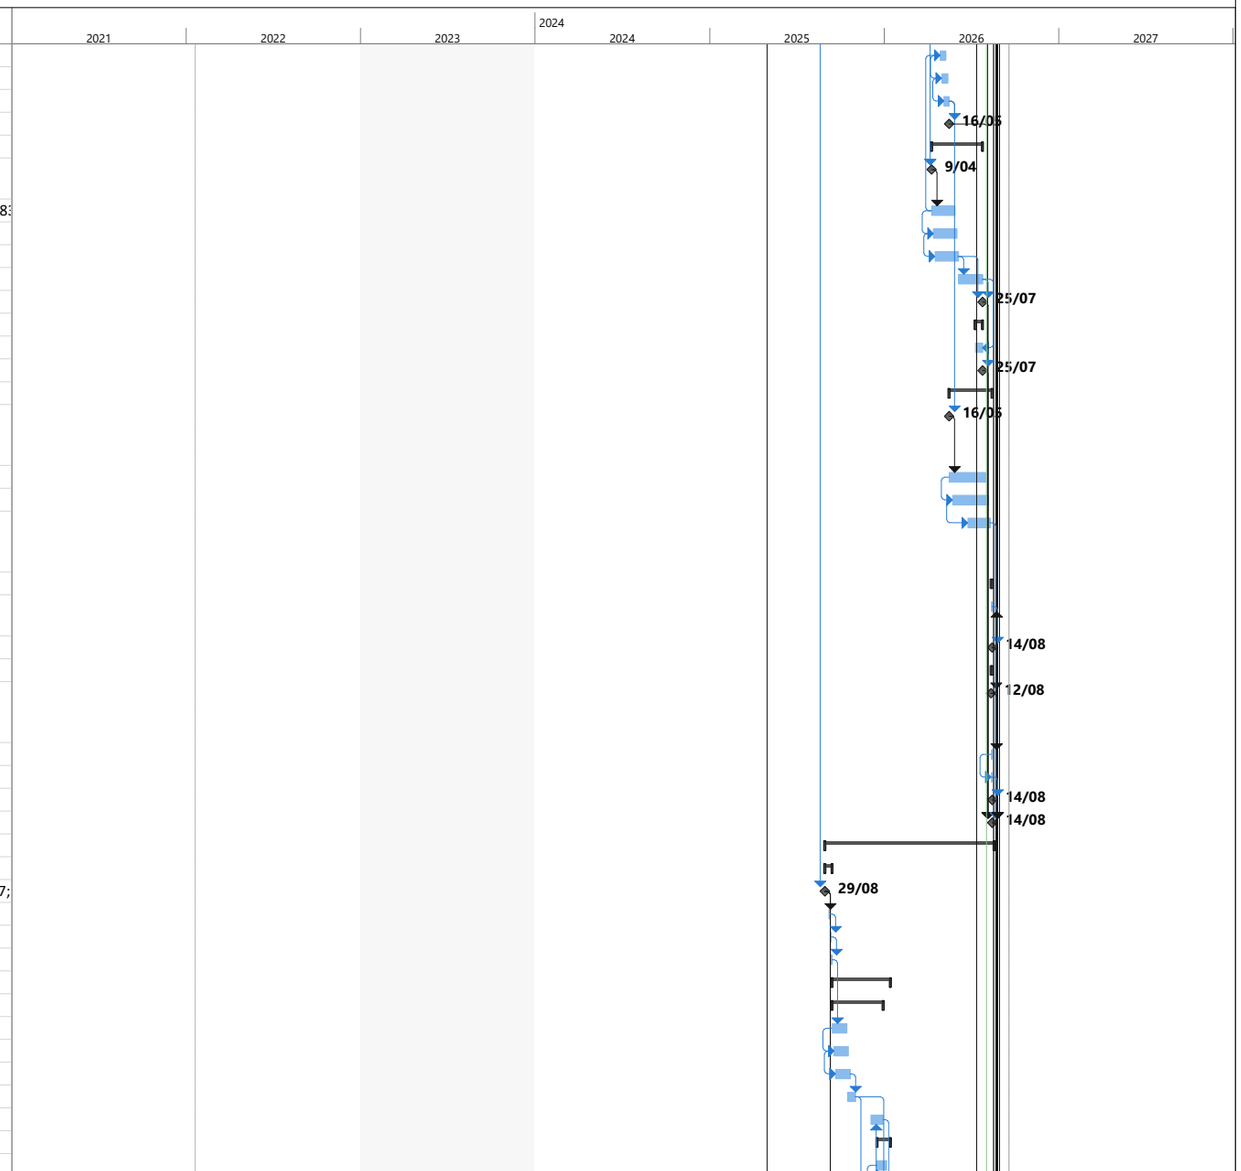


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1519	Instalación de tubería	15 días	vie 19/12/25	jue 8/01/26	$11.952.479,00	1518CC+3 días	1520CC+3 días
1520	Rellenos	15 días	mar 23/12/25	mar 13/01/26	$11.707.756,00	1519CC+3 días	1521CC+3 días
1521	Construcción de pozos	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$13.436.211,00	1520CC+3 días	1522;1531
1522	Fin alcantarillado	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$0,00	1515;1516;1521	1564
1523	**Pavimentos**	**79 días**	**sáb 1/11/25**	**lun 9/02/26**	**$676.938.082,00**		
1524	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1515	1526
1525	**Costado suroriental**	**25 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 3/12/25**	**$350.918.994,00**		
1526	Excavación	10 días	sáb 1/11/25	vie 14/11/25	$34.018.143,00	1524	1527CC+5 días
1527	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	$30.557.080,00	1526CC+5 días	1528CC+5 días
1528	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 14/11/25	jue 27/11/25	$117.960.289,00	1527CC+5 días	1529CC+5 días
1529	Concreto	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$168.383.482,00	1528CC+5 días	1516;1518FC+10 días
1530	**Costado noroccidental**	**25 días**	**vie 9/01/26**	**lun 9/02/26**	**$326.019.088,00**		
1531	Excavación	10 días	vie 9/01/26	jue 22/01/26	$34.018.174,00	1521	1532CC+5 días
1532	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	$30.557.080,00	1531CC+5 días	1533CC+5 días
1533	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	jue 22/01/26	mar 3/02/26	$117.960.289,00	1532CC+5 días	1534CC+5 días
1534	Concreto	10 días	mié 28/01/26	lun 9/02/26	$143.483.545,00	1533CC+5 días	1542FC+10 días;1535
1535	Fin Pavimentos	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$0,00	1534	1564
1536	**Acueducto**	**31 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 18/04/26**	**$49.449.516,00**		
1537	Excavaciones	25 días	mar 10/03/26	sáb 11/04/26	$11.142.146,00	1543CC+15 días	1538CC+3 días
1538	Instalación de tubería	25 días	vie 13/03/26	mié 15/04/26	$30.654.198,00	1537CC+3 días	1539CC+3 días
1539	Rellenos	25 días	mar 17/03/26	sáb 18/04/26	$7.653.172,00	1538CC+3 días	1540;1552
1540	Fin acueducto	0 días	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	$0,00	1539	1564
1541	**Codensa**	**141 días**	**vie 20/02/26**	**sáb 15/08/26**	**$175.662.136,00**		
1542	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$0,00	1534FC+10 días	1543
1543	Excavaciones	50 días	vie 20/02/26	jue 23/04/26	$7.938.903,00	1542	1537CC+15 días;1544
1544	Instalación de tubería	50 días	mar 24/02/26	lun 27/04/26	$85.529.356,00	1543CC+3 días	1545CC+3 días
1545	Rellenos	50 días	vie 27/02/26	jue 30/04/26	$29.350.940,00	1544CC+3 días	1547
1546	Cajas	50 días	sáb 13/06/26	sáb 15/08/26	$52.842.937,00	1555FC-50 días	1547
1547	Fin codensa	0 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26	$0,00	1545;1546	1564
1548	**ETB**	**20 días**	**mié 22/07/26**	**sáb 15/08/26**	**$19.742.850,00**		
1549	Renivelación camaras	20 días	mié 22/07/26	sáb 15/08/26	$19.742.850,00	1555FC-20 días	1550
1550	Fin ETB	0 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26	$0,00	1549	1564
1551	**Espacio público**	**96 días**	**sáb 18/04/26**	**mar 18/08/26**	**$216.331.864,00**		
1552	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	$0,00	1539	1553
1553	Excavación	88 días	sáb 18/04/26	jue 6/08/26	$27.076.766,00	1552	1554CC+5 días
1554	Rellenos	88 días	vie 24/04/26	jue 13/08/26	$25.856.925,00	1553CC+5 días	1555CC+25 días
1555	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	65 días	mar 26/05/26	sáb 15/08/26	$136.827.908,00	1554CC+25 días	1546FC-50 días;1549FC-20 días
1556	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$26.570.265,00**		
1557	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$26.570.265,00	1560	1558

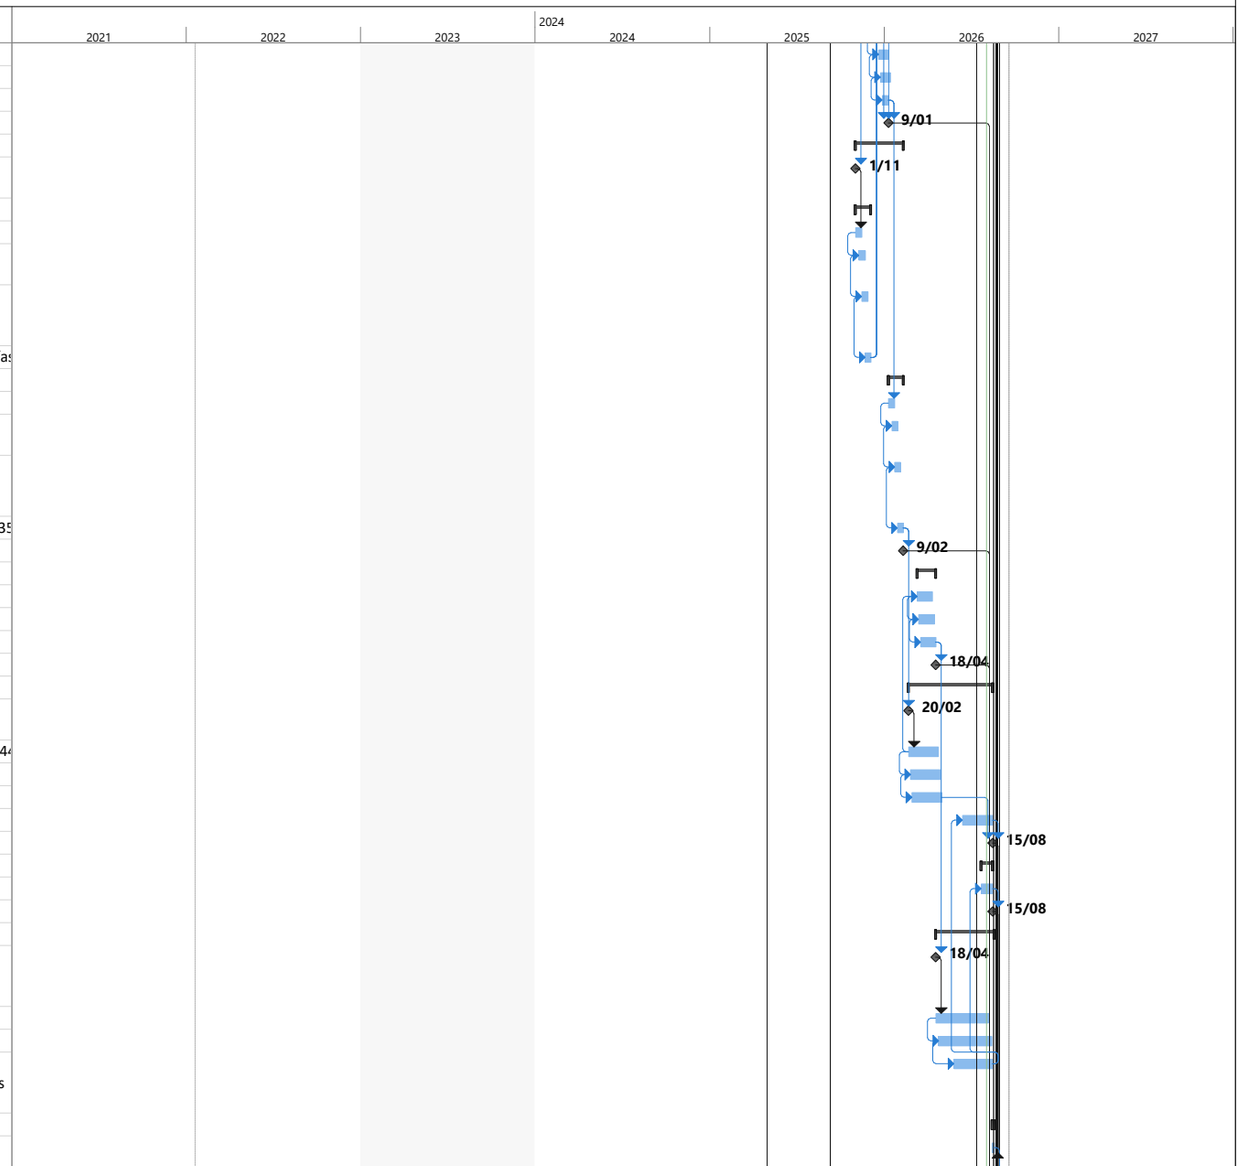


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1558	Fin Espacio Publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1557	1564
1559	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$31.184.388,00**		
1560	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1561;1557
1561	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$2.587.313,00	1560	1562CC
1562	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$28.597.075,00	1561CC	1563
1563	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1562	1564
1564	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1522;1535;1540;154	1870
1565	**CIV 16000550 (3)**	**285 días**	**vie 29/08/25**	**mar 18/08/26**	**$2.024.385.043,00**		
1566	**Preliminares**	**13 días**	**vie 29/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$2.764.772,00**		
1567	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	$0,00	1506	1568FC+7 días
1568	Cerramiento de obra	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	$0,00	1567FC+7 días	1569
1569	Implementación de PMT	2 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	1568	1570
1570	Replanteo general	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	$2.764.772,00	1569	1573
1571	**Alcantarillado**	**117 días**	**sáb 13/09/25**	**jue 5/02/26**	**$455.382.840,00**		
1572	**Pluvial**	**76 días**	**sáb 13/09/25**	**mar 16/12/25**	**$277.636.250,00**		
1573	Excavación	30 días	sáb 13/09/25	lun 20/10/25	$86.446.139,00	1570	1574CC+3 días
1574	Instalación de tubería	30 días	mié 17/09/25	jue 23/10/25	$115.278.560,00	1573CC+3 días	1575CC+3 días
1575	Rellenos	30 días	sáb 20/09/25	lun 27/10/25	$32.783.497,00	1574CC+3 días	1576FC-5 días
1576	Construcción de pozos	10 días	mar 21/10/25	sáb 1/11/25	$19.131.027,00	1575FC-5 días	1583;1585
1577	Construcción sumideros	10 días	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$23.997.027,00	1590	1583
1578	**Sanitario**	**41 días**	**mar 16/12/25**	**jue 5/02/26**	**$177.746.590,00**		
1579	Excavación	35 días	mar 16/12/25	jue 29/01/26	$94.737.732,00	1590FC+10 días	1580CC+3 días
1580	Instalación de tubería	35 días	vie 19/12/25	lun 2/02/26	$42.786.065,00	1579CC+3 días	1581CC+3 días
1581	Rellenos	35 días	mar 23/12/25	jue 5/02/26	$30.310.658,00	1580CC+3 días	1582FC-5 días
1582	Construcción de pozos	5 días	vie 30/01/26	jue 5/02/26	$9.912.135,00	1581FC-5 días	1583;1592
1583	Fin alcantarillado	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$0,00	1576;1577;1582	
1584	**Pavimentos**	**95 días**	**sáb 1/11/25**	**vie 27/02/26**	**$905.819.651,00**		
1585	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1576	1587
1586	**Costado suroriental**	**25 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 3/12/25**	**$434.786.476,00**		
1587	Excavación	10 días	sáb 1/11/25	vie 14/11/25	$46.592.419,00	1585	1588CC+5 días
1588	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	$41.895.070,00	1587CC+5 días	1589CC+5 días
1589	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 14/11/25	jue 27/11/25	$161.729.995,00	1588CC+5 días	1590CC+5 días
1590	Concreto	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$184.568.992,00	1589CC+5 días	1577;1579FC+10 días
1591	**Costado noroccidental**	**19 días**	**jue 5/02/26**	**vie 27/02/26**	**$471.033.175,00**		
1592	Excavación	10 días	jue 5/02/26	mar 17/02/26	$46.592.419,00	1582	1593CC+3 días
1593	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 9/02/26	vie 20/02/26	$41.895.070,00	1592CC+3 días	1594CC+3 días
1594	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	jue 12/02/26	mar 24/02/26	$161.729.995,00	1593CC+3 días	1595CC+3 días
1595	Concreto	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	$220.815.691,00	1594CC+3 días	1603FC+10 días;1596
1596	Fin Pavimentos	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$0,00	1595	1625
1597	**Acueducto**	**26 días**	**lun 30/03/26**	**sáb 2/05/26**	**$49.316.904,00**		
1598	Excavaciones	20 días	lun 30/03/26	vie 24/04/26	$9.912.527,00	1604CC+15 días	1599CC+3 días
1599	Instalación de tubería	20 días	sáb 4/04/26	mar 28/04/26	$31.431.492,00	1598CC+3 días	1600CC+3 días

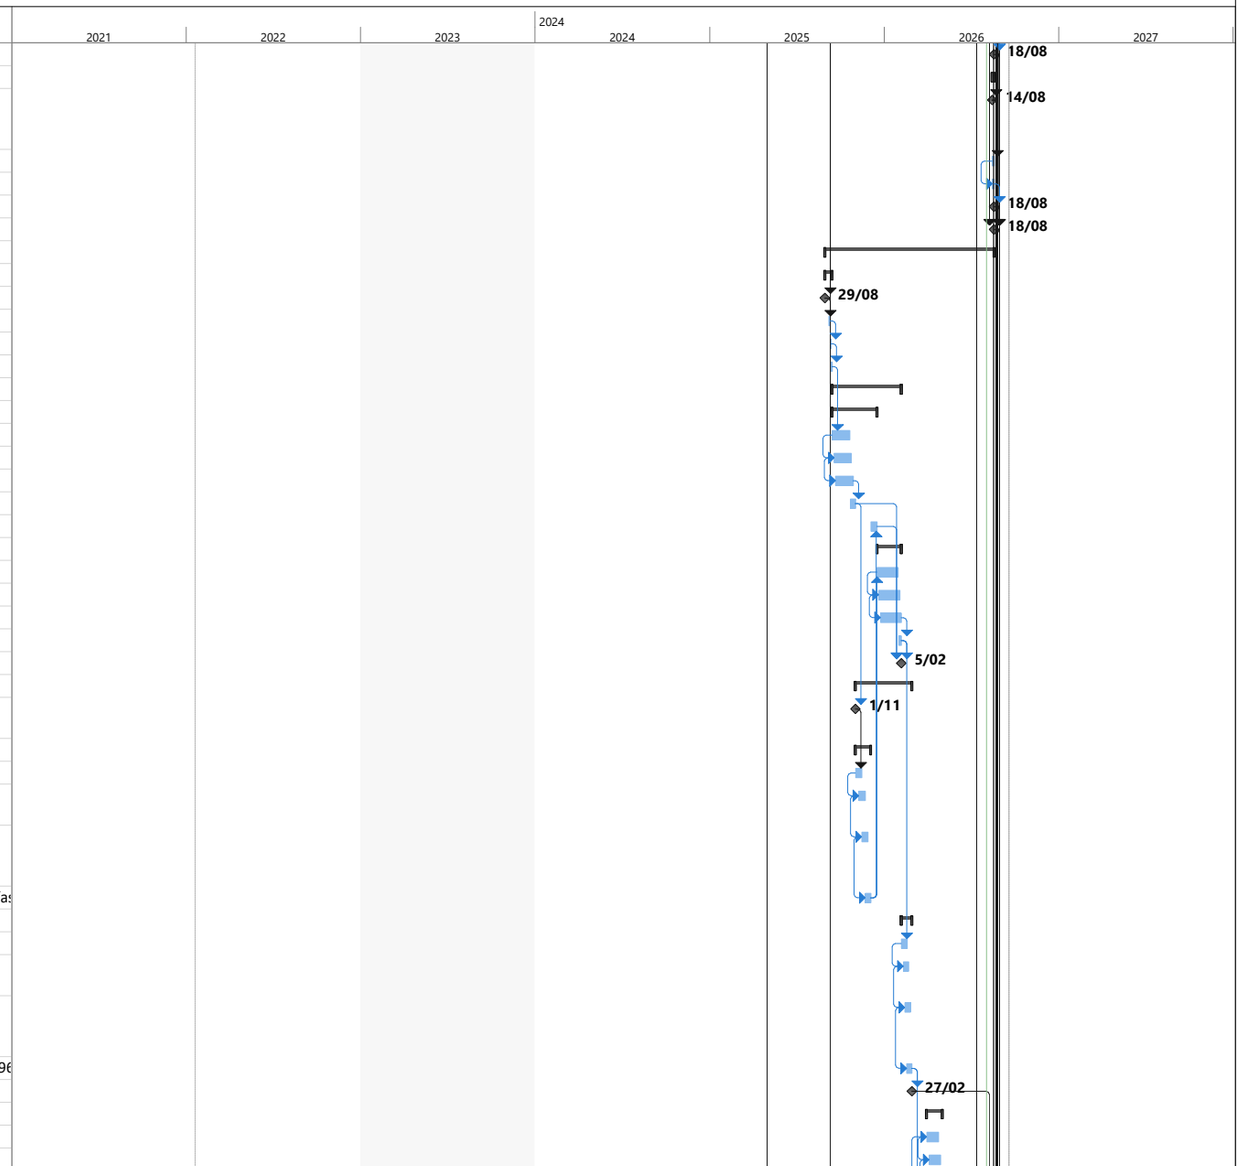


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1600	Rellenos	20 días	mié 8/04/26	sáb 2/05/26	$7.972.885,00	1599CC+3 días	1601;1613
1601	Fin acueducto	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	1600	1625
1602	**Codensa**	**119 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 8/08/26**	**$220.972.237,00**		
1603	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	$0,00	1595FC+10 días	1604
1604	Excavaciones	70 días	mié 11/03/26	sáb 6/06/26	$10.489.815,00	1603	1598CC+15 días;1605
1605	Instalación de tubería	70 días	sáb 14/03/26	jue 11/06/26	$114.948.348,00	1604CC+3 días	1606CC+3 días
1606	Rellenos	70 días	mié 18/03/26	mar 16/06/26	$39.085.315,00	1605CC+3 días	1608
1607	Cajas	40 días	vie 19/06/26	sáb 8/08/26	$56.448.759,00	1616FC-40 días	1608
1608	Fin codensa	0 días	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	$0,00	1607;1606	1625
1609	**ETB**	**18 días**	**jue 16/07/26**	**sáb 8/08/26**	**$21.683.982,00**		
1610	Renivelación camaras	18 días	jue 16/07/26	sáb 8/08/26	$21.683.982,00	1616FC-18 días	1611
1611	Fin ETB	0 días	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26	$0,00	1610	1625
1612	**Espacio público**	**85 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 18/08/26**	**$357.637.076,00**		
1613	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	$0,00	1600	1614
1614	Excavación	70 días	sáb 2/05/26	mié 29/07/26	$51.472.320,00	1613	1615CC+5 días
1615	Rellenos	70 días	vie 8/05/26	mar 4/08/26	$47.283.224,00	1614CC+5 días	1616CC+25 días
1616	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	48 días	mar 9/06/26	sáb 8/08/26	$233.120.379,00	1615CC+25 días	1607FC-40 días;1610FC-18 días
1617	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$25.761.153,00**		
1618	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$25.761.153,00	1621	1619
1619	Fin Espacio Publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1618	1625
1620	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$10.807.581,00**		
1621	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1622;1618
1622	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$1.427.413,00	1621	1623CC
1623	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$9.380.168,00	1622CC	1624
1624	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1623	1625
1625	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1596;1601;1608;161	1870
1626	**CIV 16000602 (4)**	**285 días**	**vie 29/08/25**	**mar 18/08/26**	**$1.297.625.177,00**		
1627	**Preliminares**	**13 días**	**vie 29/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$1.464.274,00**		
1628	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	$0,00	1506	1629FC+7 días;1689
1629	Cerramiento de obra	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	$0,00	1628FC+7 días	1630
1630	Implementación de PMT	2 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	1629	1631
1631	Replanteo general	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	$1.464.274,00	1630	1634
1632	**Alcantarillado**	**112 días**	**sáb 13/09/25**	**vie 30/01/26**	**$356.326.221,00**		
1633	**Pluvial**	**86 días**	**sáb 13/09/25**	**lun 29/12/25**	**$220.238.047,00**		
1634	Excavación	30 días	sáb 13/09/25	lun 20/10/25	$66.120.886,00	1631	1635CC+3 días
1635	Instalación de tubería	30 días	mié 17/09/25	jue 23/10/25	$91.651.184,00	1634CC+3 días	1636CC+3 días
1636	Rellenos	30 días	sáb 20/09/25	lun 27/10/25	$30.534.829,00	1635CC+3 días	1637FC-5 días
1637	Construcción de pozos	10 días	mar 21/10/25	sáb 1/11/25	$7.934.121,00	1636FC-5 días	1644;1646
1638	Construcción sumideros	20 días	mié 3/12/25	lun 29/12/25	$23.997.027,00	1651	1644
1639	**Sanitario**	**36 días**	**mar 16/12/25**	**vie 30/01/26**	**$136.088.174,00**		
1640	Excavación	30 días	mar 16/12/25	vie 23/01/26	$58.317.516,00	1651FC+10 días	1641CC+3 días
1641	Instalación de tubería	30 días	vie 19/12/25	mar 27/01/26	$46.662.563,00	1640CC+3 días	1642CC+3 días
1642	Rellenos	30 días	mar 23/12/25	vie 30/01/26	$20.232.493,00	1641CC+3 días	1643FC-5 días

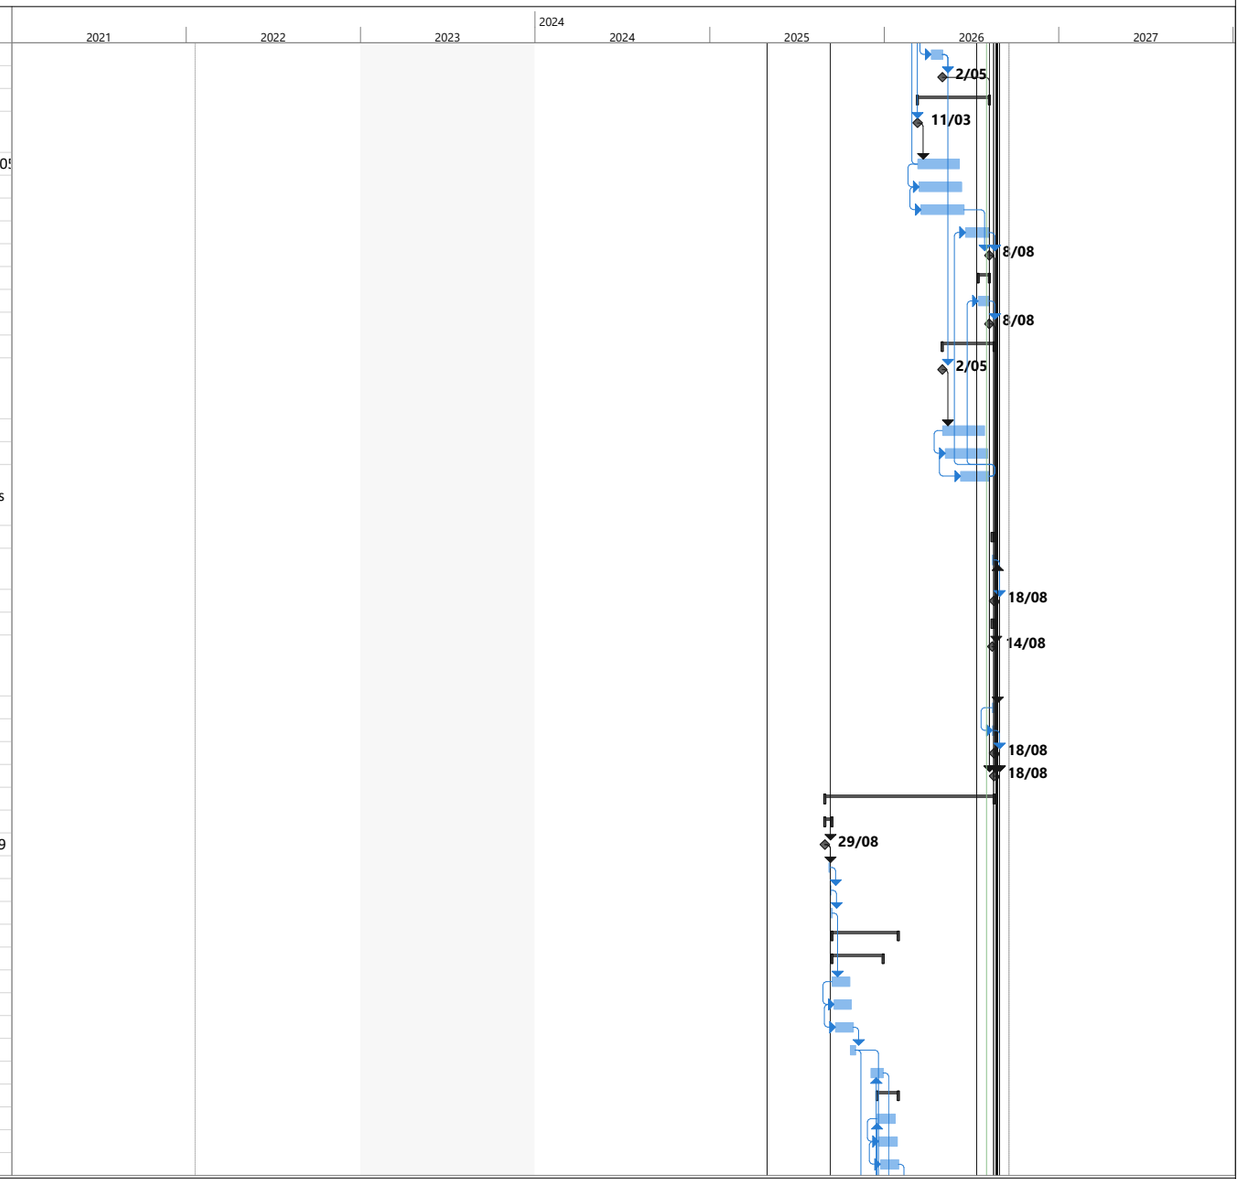

Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1643	Construcción de pozos	5 días	sáb 24/01/26	vie 30/01/26	$10.875.602,00	1642FC-5 días	1653
1644	Fin alcantarillado	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25	$0,00	1637;1638	1686
1645	**Pavimentos**	**96 días**	**sáb 1/11/25**	**sáb 28/02/26**	**$550.449.482,00**		
1646	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	$0,00	1637	1648
1647	**Costado suroriental**	**25 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 3/12/25**	**$270.201.069,00**		
1648	Excavación	10 días	sáb 1/11/25	vie 14/11/25	$27.797.808,00	1646	1649CC+5 días
1649	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	$24.982.546,00	1648CC+5 días	1650CC+5 días
1650	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	vie 14/11/25	jue 27/11/25	$96.442.282,00	1649CC+5 días	1651CC+5 días
1651	Concreto	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$120.978.433,00	1650CC+5 días	1638;1640FC+10 días
1652	**Costado noroccidental**	**25 días**	**vie 30/01/26**	**sáb 28/02/26**	**$280.248.413,00**		
1653	Excavación	10 días	vie 30/01/26	mié 11/02/26	$27.797.808,00	1643	1654CC+5 días
1654	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	jue 5/02/26	mar 17/02/26	$24.982.546,00	1653CC+5 días	1655CC+5 días
1655	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	mié 11/02/26	lun 23/02/26	$96.442.282,00	1654CC+5 días	1656CC+5 días
1656	Concreto	10 días	mar 17/02/26	sáb 28/02/26	$131.025.777,00	1655CC+5 días	1664FC+10 días;1657
1657	Fin Pavimentos	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	$0,00	1656	1686
1658	**Acueducto**	**31 días**	**mié 25/03/26**	**lun 4/05/26**	**$70.095.269,00**		
1659	Excavaciones	25 días	mié 25/03/26	sáb 25/04/26	$12.485.211,00	1665CC+10 días	1660CC+3 días
1660	Instalación de tubería	25 días	sáb 28/03/26	mié 29/04/26	$45.309.305,00	1659CC+3 días	1661CC+3 días
1661	Rellenos	25 días	mié 1/04/26	lun 4/05/26	$12.300.753,00	1660CC+3 días	1662;1674
1662	Fin acueducto	0 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26	$0,00	1661	1686
1663	**Codensa**	**124 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 15/08/26**	**$107.043.868,00**		
1664	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	jue 12/03/26	jue 12/03/26	$0,00	1656FC+10 días	1665
1665	Excavaciones	40 días	jue 12/03/26	sáb 2/05/26	$6.324.280,00	1664	1659CC+10 días;1660
1666	Instalación de tubería	40 días	lun 16/03/26	mié 6/05/26	$67.626.371,00	1665CC+3 días	1667CC+3 días
1667	Rellenos	40 días	jue 19/03/26	sáb 9/05/26	$23.401.545,00	1666CC+3 días	1669
1668	Cajas	20 días	mié 22/07/26	sáb 15/08/26	$9.691.672,00	1677FC-20 días	1669
1669	Fin codensa	0 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26	$0,00	1667;1668	1686
1670	**ETB**	**10 días**	**lun 3/08/26**	**sáb 15/08/26**	**$11.962.873,00**		
1671	Renivelación camaras	10 días	lun 3/08/26	sáb 15/08/26	$11.962.873,00	1677FC-10 días	1672
1672	Fin ETB	0 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26	$0,00	1671	1686
1673	**Espacio público**	**84 días**	**lun 4/05/26**	**mar 18/08/26**	**$178.823.197,00**		
1674	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26	$0,00	1661	1675
1675	Excavación	70 días	lun 4/05/26	jue 30/07/26	$22.400.390,00	1674	1676CC+5 días
1676	Rellenos	70 días	sáb 9/05/26	mié 5/08/26	$21.364.072,00	1675CC+5 días	1677CC+25 días
1677	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	53 días	mié 10/06/26	sáb 15/08/26	$114.165.501,00	1676CC+25 días	1668FC-20 días;1671FC-10 días
1678	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$20.893.234,00**		
1679	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$20.893.234,00	1682	1680
1680	Fin Espacio Publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1679	1686
1681	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$21.459.993,00**		




Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1682	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1683;1679
1683	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$2.525.146,00	1682	1684CC
1684	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$18.934.847,00	1683CC	1685
1685	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1684	1686
1686	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1662;1657;1644;166	1870
1687	**CIV 16000637 (5)**	**285 días**	**vie 29/08/25**	**mar 18/08/26**	**$1.782.586.753,00**		
1688	**Preliminares**	**13 días**	**vie 29/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$2.121.387,00**		
1689	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	$0,00	1628	1690FC+7 días;1748F
1690	Cerramiento de obra	2 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	$0,00	1689FC+7 días	1691
1691	Implementación de PMT	2 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	1690	1692
1692	Replanteo general	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	$2.121.387,00	1691	1695
1693	**Alcantarillado**	**62 días**	**sáb 13/09/25**	**vie 28/11/25**	**$139.933.040,00**		
1694	**Pluvial**	**31 días**	**sáb 13/09/25**	**mar 21/10/25**	**$33.756.446,00**		
1695	Excavación	25 días	sáb 13/09/25	mar 14/10/25	$8.210.753,00	1692	1696CC+3 días
1696	Instalación de tubería	25 días	mié 17/09/25	vie 17/10/25	$14.878.856,00	1695CC+3 días	1697CC+3 días
1697	Rellenos	25 días	sáb 20/09/25	mar 21/10/25	$10.666.837,00	1696CC+3 días	1699
1698	**Sanitario**	**31 días**	**mar 21/10/25**	**vie 28/11/25**	**$106.176.594,00**		
1699	Excavación	25 días	mar 21/10/25	vie 21/11/25	$43.020.330,00	1697	1700CC+3 días
1700	Instalación de tubería	25 días	vie 24/10/25	mar 25/11/25	$40.164.864,00	1699CC+3 días	1701CC+3 días
1701	Rellenos	25 días	mar 28/10/25	vie 28/11/25	$16.712.189,00	1700CC+3 días	1702FC-5 días
1702	Construcción de pozos	5 días	sáb 22/11/25	vie 28/11/25	$6.279.211,00	1701FC-5 días	1703;1705
1703	Fin alcantarillado	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	$0,00	1702	1745
1704	**Pavimentos**	**60 días**	**vie 28/11/25**	**mié 11/02/26**	**$917.411.556,00**		
1705	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	vie 28/11/25	vie 28/11/25	$0,00	1702	1712
1706	**Costado suroriental**	**25 días**	**mar 13/01/26**	**mié 11/02/26**	**$458.705.898,00**		
1707	Excavación	10 días	mar 13/01/26	sáb 24/01/26	$48.067.602,00	1715FC+10 días	1708CC+5 días
1708	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	lun 19/01/26	vie 30/01/26	$43.148.812,00	1707CC+5 días	1709CC+5 días
1709	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	sáb 24/01/26	jue 5/02/26	$166.570.177,00	1708CC+5 días	1710CC+5 días
1710	Concreto	10 días	vie 30/01/26	mié 11/02/26	$200.919.307,00	1709CC+5 días	1723
1711	**Costado noroccidental**	**25 días**	**vie 28/11/25**	**mar 30/12/25**	**$458.705.658,00**		
1712	Excavación	10 días	vie 28/11/25	jue 11/12/25	$48.067.602,00	1705	1713CC+5 días
1713	Estabilización de subrasante rajón con sello	10 días	jue 4/12/25	mié 17/12/25	$43.148.812,00	1712CC+5 días	1714CC+5 días
1714	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	10 días	jue 11/12/25	mar 23/12/25	$166.570.177,00	1713CC+5 días	1715CC+5 días
1715	Concreto	10 días	mié 17/12/25	mar 30/12/25	$200.919.067,00	1714CC+5 días	1707FC+10 días;1716
1716	Fin Pavimentos	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25	$0,00	1715	1745
1717	**Acueducto**	**26 días**	**jue 12/03/26**	**mié 15/04/26**	**$110.696.931,00**		
1718	Excavaciones	20 días	jue 12/03/26	mié 8/04/26	$17.084.540,00	1724CC+25 días	1719CC+3 días
1719	Instalación de tubería	20 días	lun 16/03/26	sáb 11/04/26	$73.291.689,00	1718CC+3 días	1720CC+3 días
1720	Rellenos	20 días	jue 19/03/26	mié 15/04/26	$20.320.702,00	1719CC+3 días	1721;1733
1721	Fin acueducto	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26	$0,00	1720	1745
1722	**Codensa**	**148 días**	**mié 11/02/26**	**vie 14/08/26**	**$335.686.229,00**		

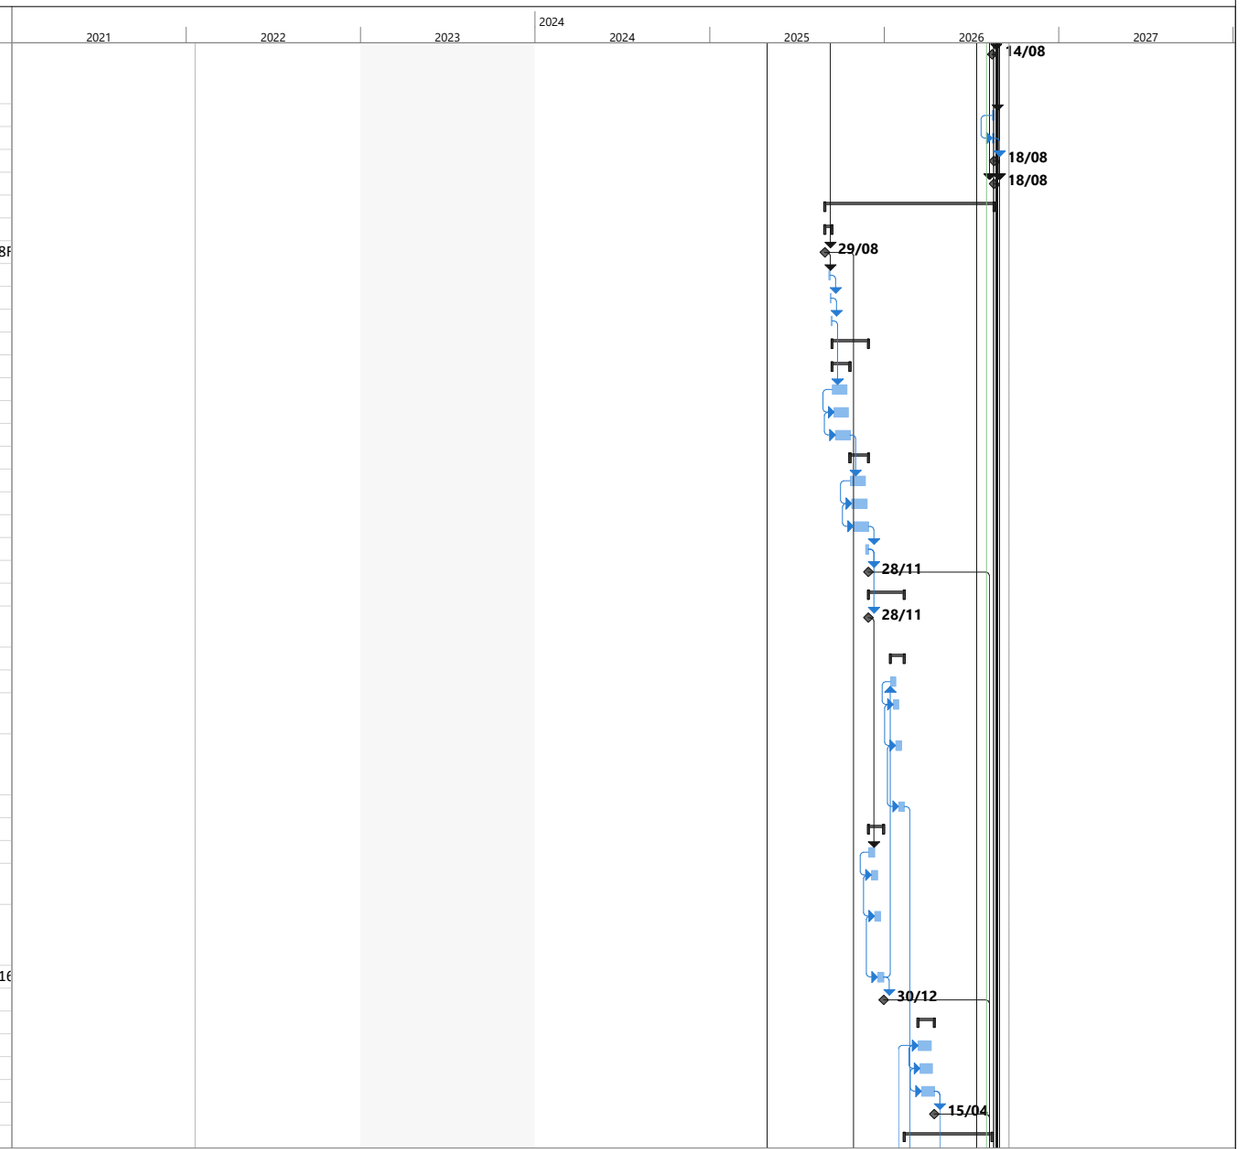


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1723	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	$0,00	1710	1724
1724	Excavaciones	50 días	mié 11/02/26	mar 14/04/26	$13.395.589,00	1723	1725CC+3 días;1718(
1725	Instalación de tubería	50 días	sáb 14/02/26	vie 17/04/26	$137.151.372,00	1724CC+3 días	1726CC+3 días
1726	Rellenos	50 días	mié 18/02/26	mar 21/04/26	$48.601.292,00	1725CC+3 días	1728
1727	Cajas	50 días	vie 12/06/26	vie 14/08/26	$136.537.976,00	1736FC-50 días	1728
1728	Fin codensa	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1726;1727	1745
1729	**ETB**	**12 días**	**jue 30/07/26**	**vie 14/08/26**	**$14.981.002,00**		
1730	Renivelación camaras	12 días	jue 30/07/26	vie 14/08/26	$14.981.002,00	1736FC-12 días	1731
1731	Fin ETB	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1730	1745
1732	**Espacio público**	**99 días**	**mié 15/04/26**	**mar 18/08/26**	**$188.116.483,00**		
1733	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26	$0,00	1720	1734
1734	Excavación	85 días	mié 15/04/26	jue 30/07/26	$23.428.819,00	1733	1735CC+5 días
1735	Rellenos	85 días	mar 21/04/26	mié 5/08/26	$21.797.177,00	1734CC+5 días	1736CC+35 días
1736	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	57 días	mié 3/06/26	vie 14/08/26	$128.221.336,00	1735CC+35 días	1730FC-12 días;1727FC-50 días
1737	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$14.669.151,00**		
1738	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$14.669.151,00	1741	1739
1739	Fin Espacio Publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1738	1745
1740	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$73.640.125,00**		
1741	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1742;1738
1742	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$7.923.572,00	1741	1743CC
1743	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$65.716.553,00	1742CC	1744
1744	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1743	1745
1745	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1703;1716;1721;172	1870
1746	**CIV 16000484 (1)**	**227 días**	**vie 7/11/25**	**mar 18/08/26**	**$785.439.279,00**		
1747	**Preliminares**	**13 días**	**vie 7/11/25**	**lun 24/11/25**	**$1.165.528,00**		
1748	Aprobación PMT por SDA	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$0,00	1689FC+58 días	1749FC+7 días
1749	Cerramiento de obra	2 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$0,00	1748FC+7 días	1750
1750	Implementación de PMT	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$0,00	1749	1751
1751	Replanteo general	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$1.165.528,00	1750	1760
1752	**Alcantarillado**	**205 días**	**lun 24/11/25**	**mié 5/08/26**	**$125.028.988,00**		
1753	**Pluvial**	**184 días**	**vie 19/12/25**	**mié 5/08/26**	**$87.893.096,00**		
1754	Excavación	15 días	vie 19/12/25	jue 8/01/26	$16.299.454,00	1762	1755CC+3 días
1755	Instalación de tubería	15 días	mar 23/12/25	mar 13/01/26	$10.468.403,00	1754CC+3 días	1756CC+3 días
1756	Rellenos	15 días	sáb 27/12/25	vie 16/01/26	$5.457.973,00	1755CC+3 días	1757FC-5 días
1757	Construcción de pozos	20 días	vie 9/01/26	mar 3/02/26	$19.671.726,00	1756FC-5 días	1764;1766
1758	Construcción sumideros	20 días	sáb 11/07/26	mié 5/08/26	$35.995.540,00	1771FF+5 días	1764
1759	**Sanitario**	**26 días**	**lun 24/11/25**	**vie 26/12/25**	**$37.135.892,00**		
1760	Excavación	15 días	lun 24/11/25	vie 12/12/25	$15.689.562,00	1751	1761CC+3 días
1761	Instalación de tubería	15 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	$6.792.642,00	1760CC+3 días	1762CC+3 días
1762	Rellenos	15 días	lun 1/12/25	vie 19/12/25	$4.657.041,00	1761CC+3 días	1763FC-5 días;1754
1763	Construcción de pozos	10 días	sáb 13/12/25	vie 26/12/25	$9.996.647,00	1762FC-5 días	1764
1764	Fin alcantarillado	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26	$0,00	1763;1757;1758	1796
1765	**Pavimentos**	**143 días**	**mar 3/02/26**	**jue 30/07/26**	**$325.931.601,00**		

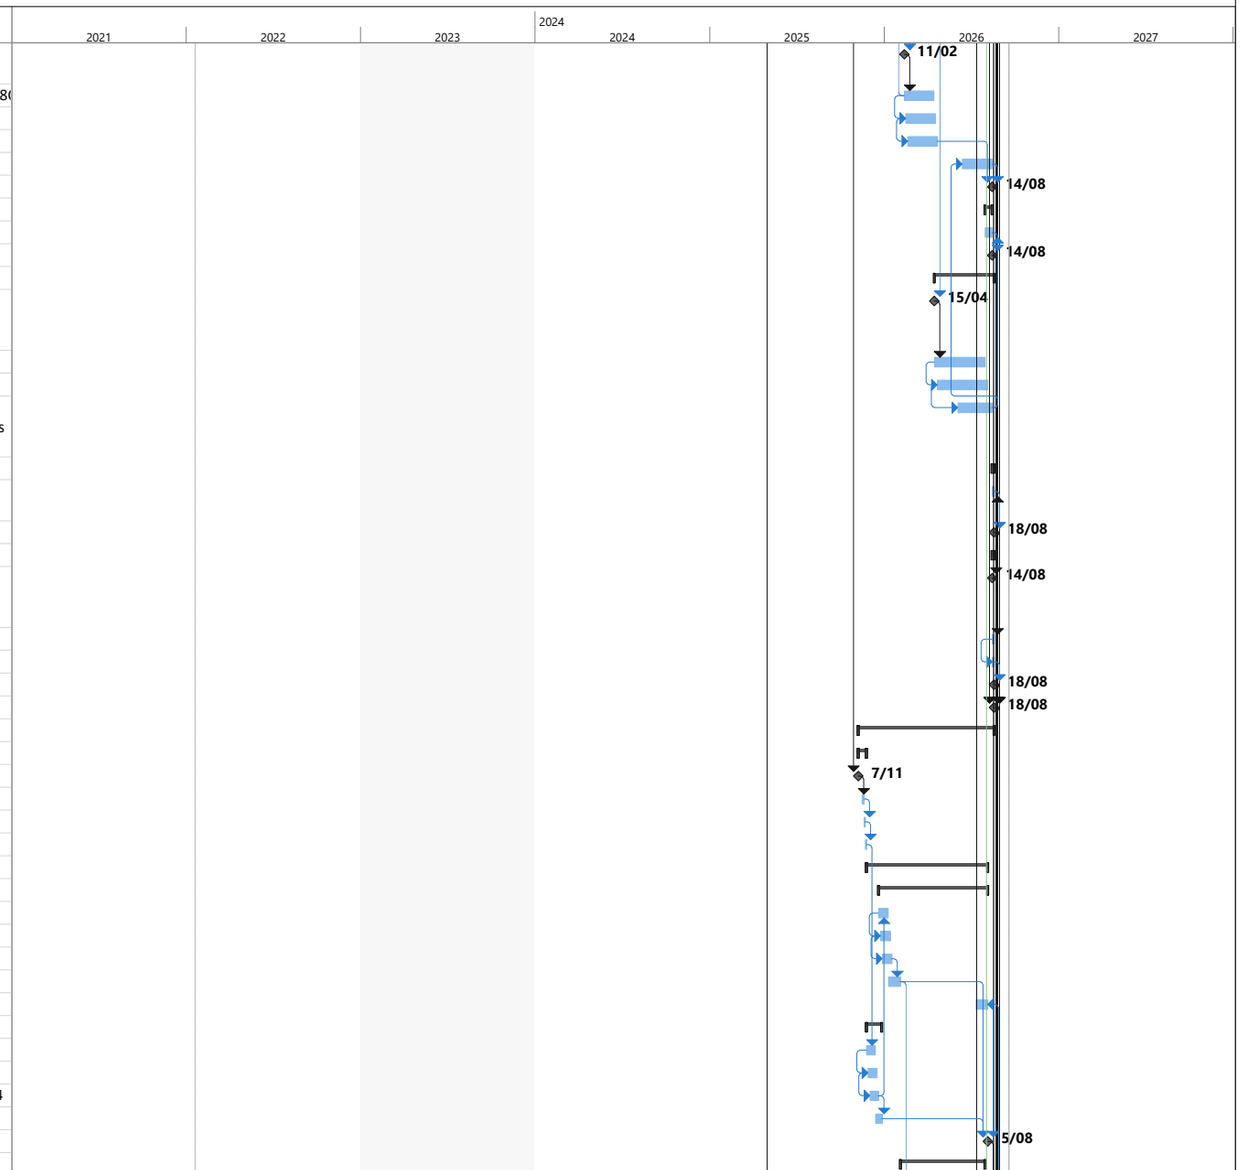


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1766	Solución observaciones a pavimentos por parte del IDU	0 días	mar 3/02/26	mar 3/02/26	$0,00	1757	1768
1767	**Pavimento**	**143 días**	**mar 3/02/26**	**jue 30/07/26**	**$325.931.601,00**		
1768	Excavación	135 días	mar 3/02/26	mar 21/07/26	$31.802.652,00	1766	1769CC+3 días
1769	Estabilización de subrasante rajón con sello	135 días	vie 6/02/26	vie 24/07/26	$32.715.732,00	1768CC+3 días	1770CC+3 días
1770	Base granular clase A estabilizada con emulsión asfáltica	135 días	mar 10/02/26	mar 28/07/26	$94.723.032,00	1769CC+3 días	1771CC
1771	Concreto	137 días	mar 10/02/26	jue 30/07/26	$166.690.185,00	1770CC	1758FF+5 días;1772;
1772	Fin Pavimentos	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$0,00	1771	1796
1773	**Codensa**	**96 días**	**mié 18/03/26**	**vie 17/07/26**	**$144.515.447,00**		
1774	Solución de interferencias codensa y ETB por parte del IDU	0 días	mié 18/03/26	mié 18/03/26	$0,00	1771FC-106 días	1775
1775	Excavaciones	30 días	mié 18/03/26	sáb 25/04/26	$4.987.178,00	1774	1776CC+3 días
1776	Instalación de tubería	30 días	sáb 21/03/26	mié 29/04/26	$53.391.819,00	1775CC+3 días	1777CC+3 días
1777	Rellenos	30 días	jue 26/03/26	lun 4/05/26	$18.439.830,00	1776CC+3 días	1779;1778FC+30 días
1778	Cajas	30 días	mié 10/06/26	vie 17/07/26	$67.696.620,00	1777FC+30 días	1779;1781FF
1779	Fin codensa	0 días	vie 17/07/26	vie 17/07/26	$0,00	1777;1778	1796
1780	**ETB**	**15 días**	**mar 30/06/26**	**vie 17/07/26**	**$16.229.394,00**		
1781	Renivelación camaras	15 días	mar 30/06/26	vie 17/07/26	$16.229.394,00	1778FF	1782
1782	Fin ETB	0 días	vie 17/07/26	vie 17/07/26	$0,00	1781	1796
1783	**Espacio público**	**76 días**	**mié 13/05/26**	**mar 18/08/26**	**$162.858.475,00**		
1784	Solución de observaciones a Espacio público por parte del IDU	0 días	mié 13/05/26	mié 13/05/26	$0,00	1771CC+75 días	1785
1785	Excavación	60 días	mié 13/05/26	mar 28/07/26	$23.437.699,00	1784	1786CC+5 días
1786	Rellenos	60 días	mié 20/05/26	lun 3/08/26	$21.647.832,00	1785CC+5 días	1787CC+35 días
1787	Acabados (Bardillo, Sardinel, Loseta, Adoquin, Concretos)	30 días	vie 3/07/26	lun 10/08/26	$112.427.992,00	1786CC+35 días	1796
1788	**Mobiliario urbano**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$5.344.952,00**		
1789	Instalación de mobiliario urbano	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$5.344.952,00	1792	1790
1790	Fin Espacio Publico	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1789	1796
1791	**Señalización**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**mar 18/08/26**	**$9.709.846,00**		
1792	Actualización de planos señalización por vencimiento por parte del IDU	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	666FC+3 días	1793;1789
1793	Señalizacion vertical	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$2.761.629,00	1792	1794CC
1794	Señalizacion horizontal	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	$6.948.217,00	1793CC	1795
1795	Fin Señalizacion	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1794	1796
1796	Fin CIV	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1764;1772;1779;178	1870
1797	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE.	27 días	lun 13/07/26	sáb 15/08/26	$1.351.180.351,00	55FC+388 días	1872CC+6 días
1798	**Costo actividades Ambientales y SST**	**382 días**	**mié 30/04/25**	**mar 18/08/26**	**$4.317.338.351,00**		
1799	Mes 1	1 día	mié 30/04/25	vie 2/05/25	$17.784.844,00	95FC+57 días	1800FC+24 días
1800	Mes 2	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$85.540.289,00	1799FC+24 días	1801FC+23 días
1801	Mes 3	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$56.393.074,00	1800FC+23 días	1802FC+24 días
1802	Mes 4	1 día	jue 31/07/25	vie 1/08/25	$98.234.559,00	1801FC+24 días	1803FC+24 días
1803	Mes 5	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25	$133.172.620,00	1802FC+24 días	1804FC+24 días

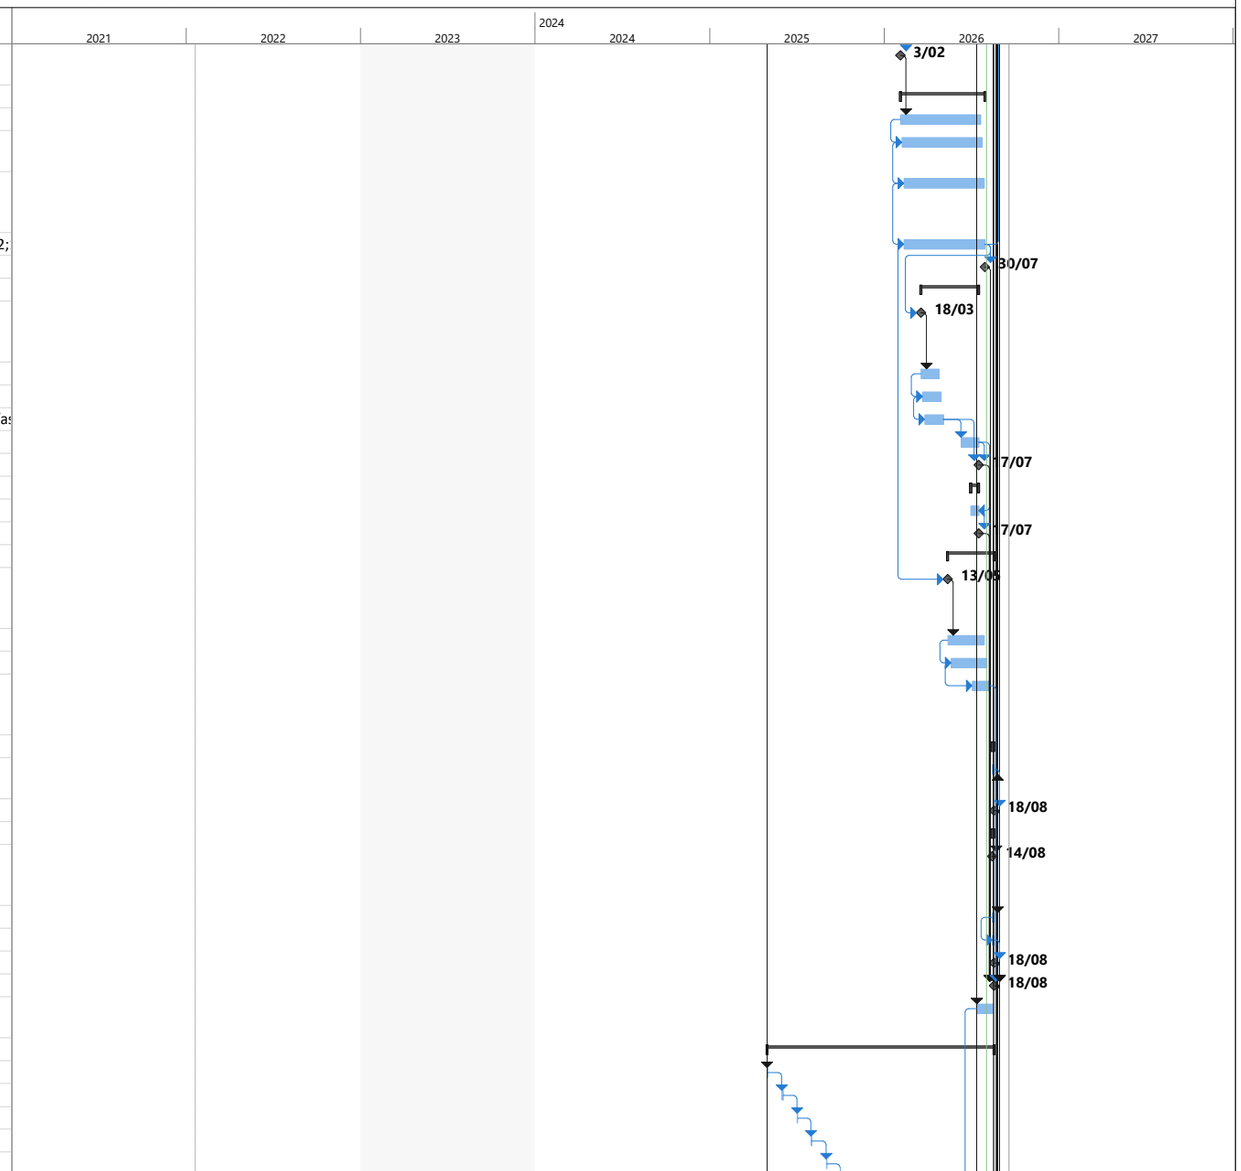


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1804	Mes 6	1 día	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$428.020.924,00	1803FC+24 días	1805FC+25 días
1805	Mes 7	1 día	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	$100.593.985,00	1804FC+25 días	1806FC+22 días
1806	Mes 8	1 día	sáb 29/11/25	lun 1/12/25	$73.325.675,00	1805FC+22 días	1807FC+24 días
1807	Mes 9	1 día	mié 31/12/25	vie 2/01/26	$202.362.283,00	1806FC+24 días	1808FC+24 días
1808	Mes 10	1 día	sáb 31/01/26	lun 2/02/26	$489.778.722,00	1807FC+24 días	1809FC+24 días
1809	Mes 11	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	$358.800.607,00	1808FC+24 días	1810FC+23 días
1810	Mes 12	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$231.096.329,00	1809FC+23 días	1811FC+23 días
1811	Mes 13	1 día	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	$225.826.154,00	1810FC+23 días	1812FC+23 días
1812	Mes 14	1 día	sáb 30/05/26	lun 1/06/26	$221.643.516,00	1811FC+23 días	1813FC+23 días
1813	Mes 15	1 día	mié 1/07/26	jue 2/07/26	$200.000.000,00	1812FC+23 días	1814FC+23 días
1814	Mes 16	1 día	jue 30/07/26	vie 31/07/26	$500.000.000,00	1813FC+23 días	1815FC+12 días
1815	Mes 17	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	$894.764.770,00	1814FC+12 días	1870
1816	**Costo Diálogo Ciudadano y de Comunicación Estratégica**	**382 días**	**mié 30/04/25**	**mar 18/08/26**	**$1.399.701.705,00**		
1817	Mes 1	1 día	mié 30/04/25	vie 2/05/25	$5.933.853,00	95FC+57 días	1818FC+24 días
1818	Mes 2	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$29.253.766,00	1817FC+24 días	1819FC+23 días
1819	Mes 3	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$19.595.824,00	1818FC+23 días	1820FC+24 días
1820	Mes 4	1 día	jue 31/07/25	vie 1/08/25	$32.333.109,00	1819FC+24 días	1821FC+24 días
1821	Mes 5	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25	$44.172.234,00	1820FC+24 días	1822FC+24 días
1822	Mes 6	1 día	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$139.135.949,00	1821FC+24 días	1823FC+25 días
1823	Mes 7	1 día	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	$32.613.049,00	1822FC+25 días	1824FC+22 días
1824	Mes 8	1 día	sáb 29/11/25	lun 1/12/25	$24.634.749,00	1823FC+22 días	1825FC+24 días
1825	Mes 9	1 día	mié 31/12/25	vie 2/01/26	$70.544.966,00	1824FC+24 días	1826FC+24 días
1826	Mes 10	1 día	sáb 31/01/26	lun 2/02/26	$163.345.188,00	1825FC+24 días	1827FC+24 días
1827	Mes 11	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	$120.794.257,00	1826FC+24 días	1828FC+23 días
1828	Mes 12	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$76.843.624,00	1827FC+23 días	1829FC+23 días
1829	Mes 13	1 día	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	$76.423.713,00	1828FC+23 días	1830FC+23 días
1830	Mes 14	1 día	sáb 30/05/26	lun 1/06/26	$74.464.130,00	1829FC+23 días	1831FC+23 días
1831	Mes 15	1 día	mié 1/07/26	jue 2/07/26	$70.000.000,00	1830FC+23 días	1832FC+23 días
1832	Mes 16	1 día	jue 30/07/26	vie 31/07/26	$150.000.000,00	1831FC+23 días	1833FC+12 días
1833	Mes 17	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	$269.613.294,00	1832FC+12 días	1870
1834	**Costo Plan de Manejo de Tránsito**	**382 días**	**mié 30/04/25**	**mar 18/08/26**	**$1.451.843.419,00**		
1835	Mes 1	1 día	mié 30/04/25	vie 2/05/25	$5.637.363,00	95FC+57 días	1836FC+24 días
1836	Mes 2	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$27.369.861,00	1835FC+24 días	1837FC+23 días
1837	Mes 3	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$18.313.553,00	1836FC+23 días	1838FC+24 días
1838	Mes 4	1 día	jue 31/07/25	vie 1/08/25	$31.257.027,00	1837FC+24 días	1839FC+24 días
1839	Mes 5	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25	$45.614.597,00	1838FC+24 días	1840FC+24 días
1840	Mes 6	1 día	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$132.776.016,00	1839FC+24 días	1841FC+25 días
1841	Mes 7	1 día	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	$31.257.027,00	1840FC+25 días	1842FC+22 días
1842	Mes 8	1 día	sáb 29/11/25	lun 1/12/25	$23.917.088,00	1841FC+22 días	1843FC+24 días
1843	Mes 9	1 día	mié 31/12/25	vie 2/01/26	$65.855.618,00	1842FC+24 días	1844FC+24 días
1844	Mes 10	1 día	sáb 31/01/26	lun 2/02/26	$158.125.350,00	1843FC+24 días	1845FC+24 días
1845	Mes 11	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	$116.272.912,00	1844FC+24 días	1846FC+23 días
1846	Mes 12	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$75.720.894,00	1845FC+23 días	1847FC+23 días
1847	Mes 13	1 día	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	$76.337.638,00	1846FC+23 días	1848FC+23 días
1848	Mes 14	1 día	sáb 30/05/26	lun 1/06/26	$74.611.976,00	1847FC+23 días	1849FC+23 días
1849	Mes 15	1 día	mié 1/07/26	jue 2/07/26	$70.000.000,00	1848FC+23 días	1850FC+23 días
1850	Mes 16	1 día	jue 30/07/26	vie 31/07/26	$150.000.000,00	1849FC+23 días	1851FC+12 días
1851	Mes 17	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	$348.776.499,00	1850FC+12 días	1870

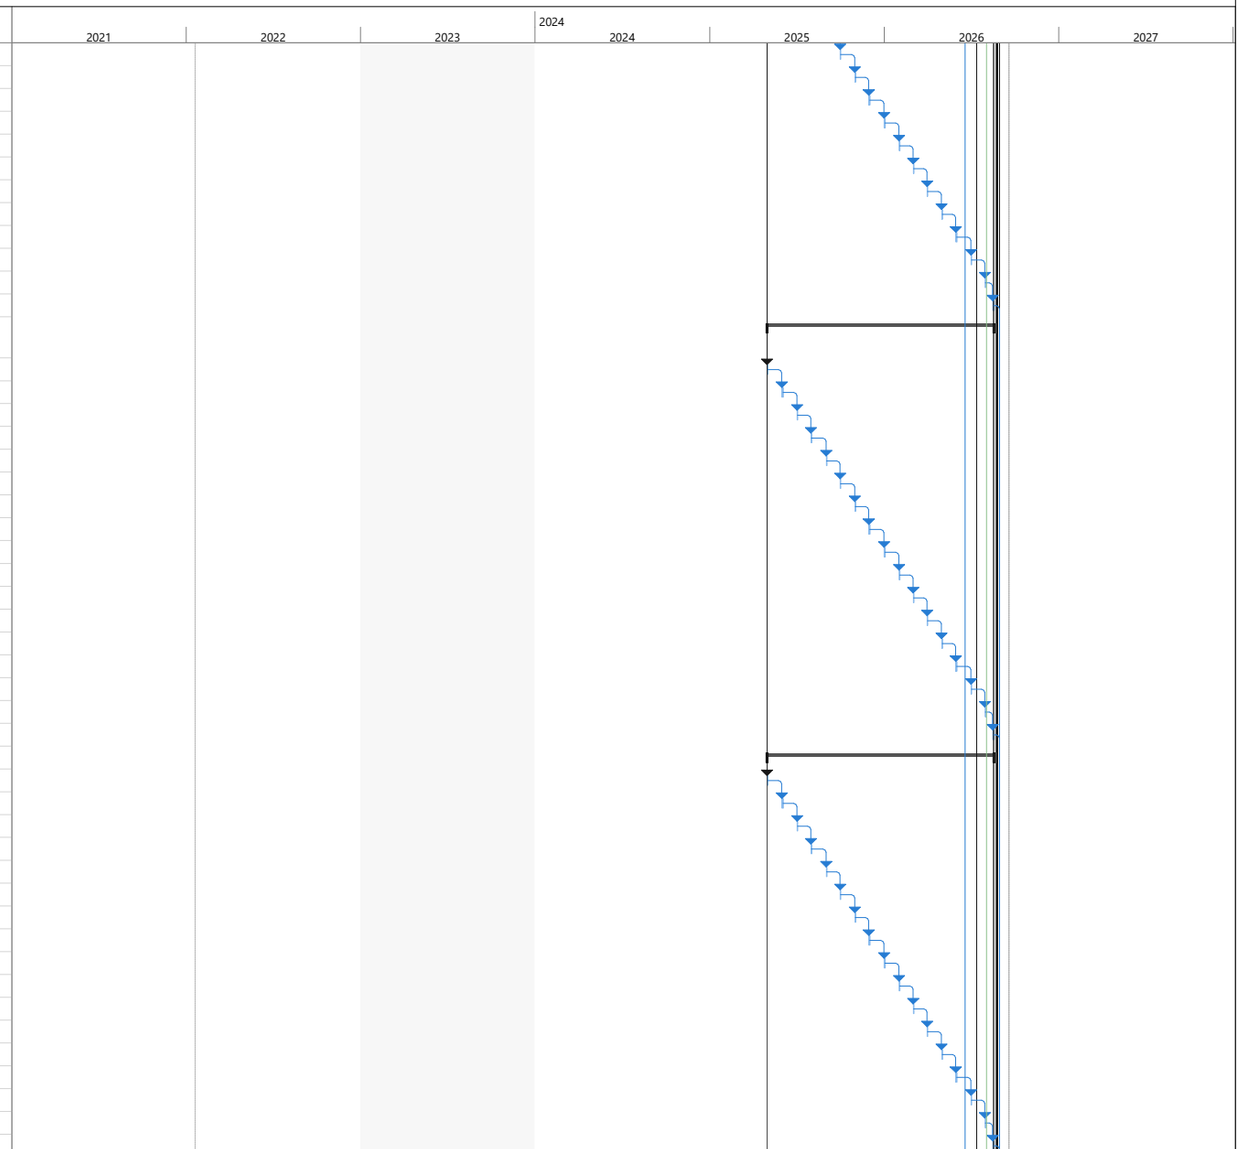


Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1852	**Ajustes por cambio de vigencia para obras-AIU-PMQ-PGS-PMT-ACERO**	**382 días**	**mié 30/04/25**	**mar 18/08/26**	**$5.758.171.898,00**		
1853	Mes 1	1 día	mié 30/04/25	vie 2/05/25	$12.883.419,00	95FC+57 días	1854FC+24 días
1854	Mes 2	1 día	sáb 31/05/25	mar 3/06/25	$64.083.628,00	1853FC+24 días	1855FC+23 días
1855	Mes 3	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$41.131.814,00	1854FC+23 días	1856FC+24 días
1856	Mes 4	1 día	jue 31/07/25	vie 1/08/25	$69.992.782,00	1855FC+24 días	1857FC+24 días
1857	Mes 5	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25	$104.578.081,00	1856FC+24 días	1858FC+24 días
1858	Mes 6	1 día	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$30.709.639,00	1857FC+24 días	1859FC+24 días
1859	Mes 7	1 día	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$229.616.760,00	1858FC+24 días	1860FC+24 días
1860	Mes 8	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25	$347.590.202,00	1859FC+24 días	1861FC+22 días
1861	Mes 9	1 día	mar 30/12/25	mié 31/12/25	$89.764.588,00	1860FC+22 días	1862FC+24 días
1862	Mes 10	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	$654.538.333,00	1861FC+24 días	1863FC+24 días
1863	Mes 11	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	$472.480.379,00	1862FC+24 días	1864FC+24 días
1864	Mes 12	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$394.392.158,00	1863FC+24 días	1865FC+96 días
1865	Mes 16	1 día	vie 31/07/26	sáb 1/08/26	$700.000.000,00	1864FC+96 días	1866FC+11 días
1866	Mes 17	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	$2.546.410.115,00	1865FC+11 días	1870
1867	Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26	$3.408.084,00	55FC+388 días	1870
1868	Costos estimados para ensayos de laboratorio en la fase de ejecución	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26	$2.320.500,00	55FC+388 días	1870
1869	Fondo de Compensaciones	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26	$66.523.754,00	55FC+388 días	1870
1870	FIN ETAPA CONSTRUCCION	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	166;245;336;385;434	2024
1871	**ETAPA DE RECIBO**	**49 días**	**mar 21/07/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
1872	Inicio estapa de recibo	0 días	mar 21/07/26	mar 21/07/26	$0,00	1797CC+6 días	2023FC+26 días;1874
1873	**CIV 16000625 (30)**	**8 días**	**mar 11/08/26**	**vie 21/08/26**	**$0,00**		
1874	Entrega ENEL MT	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1872FC+17 días	1879;1875FC+1 día
1875	Entrega ENEL AP	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	1874FC+1 día	1880;1876FC+4 días
1876	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1875FC+4 días	1881;1877FC+3 días
1877	Entrega ETB	0 días	vie 21/08/26	vie 21/08/26	$0,00	1876FC+3 días	1882
1878	**CIV 16000654 (29)**	**8 días**	**mar 11/08/26**	**vie 21/08/26**	**$0,00**		
1879	Entrega ENEL MT	0 días	mar 11/08/26	mar 11/08/26	$0,00	1874	1884FC+2 días
1880	Entrega ENEL AP	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	$0,00	1875	1885FC+2 días
1881	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1876	1886FC+2 días
1882	Entrega ETB	0 días	vie 21/08/26	vie 21/08/26	$0,00	1877	1887FC+2 días
1883	**CIV 16000627 (6)**	**8 días**	**jue 13/08/26**	**lun 24/08/26**	**$0,00**		
1884	Entrega ENEL MT	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	1879FC+2 días	1889
1885	Entrega ENEL AP	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1880FC+2 días	1890
1886	Entrega ACUEDUCTO	0 días	jue 20/08/26	jue 20/08/26	$0,00	1881FC+2 días	1891
1887	Entrega ETB	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1882FC+2 días	1892
1888	**CIV 16000686 (7)**	**8 días**	**jue 13/08/26**	**lun 24/08/26**	**$0,00**		
1889	Entrega ENEL MT	0 días	jue 13/08/26	jue 13/08/26	$0,00	1884	1894FC+3 días
1890	Entrega ENEL AP	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$0,00	1885	1895FC+3 días
1891	Entrega ACUEDUCTO	0 días	jue 20/08/26	jue 20/08/26	$0,00	1886	1896FC+3 días
1892	Entrega ETB	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1887	1897FC+3 días
1893	**CIV 16000704 (25)**	**8 días**	**mar 18/08/26**	**jue 27/08/26**	**$0,00**		
1894	Entrega ENEL MT	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1889FC+3 días	1899
1895	Entrega ENEL AP	0 días	mié 19/08/26	mié 19/08/26	$0,00	1890FC+3 días	1900
1896	Entrega ACUEDUCTO	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1891FC+3 días	1901
1897	Entrega ETB	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1892FC+3 días	1902
1898	**CIV 16000600 (24)**	**8 días**	**mar 18/08/26**	**jue 27/08/26**	**$0,00**		

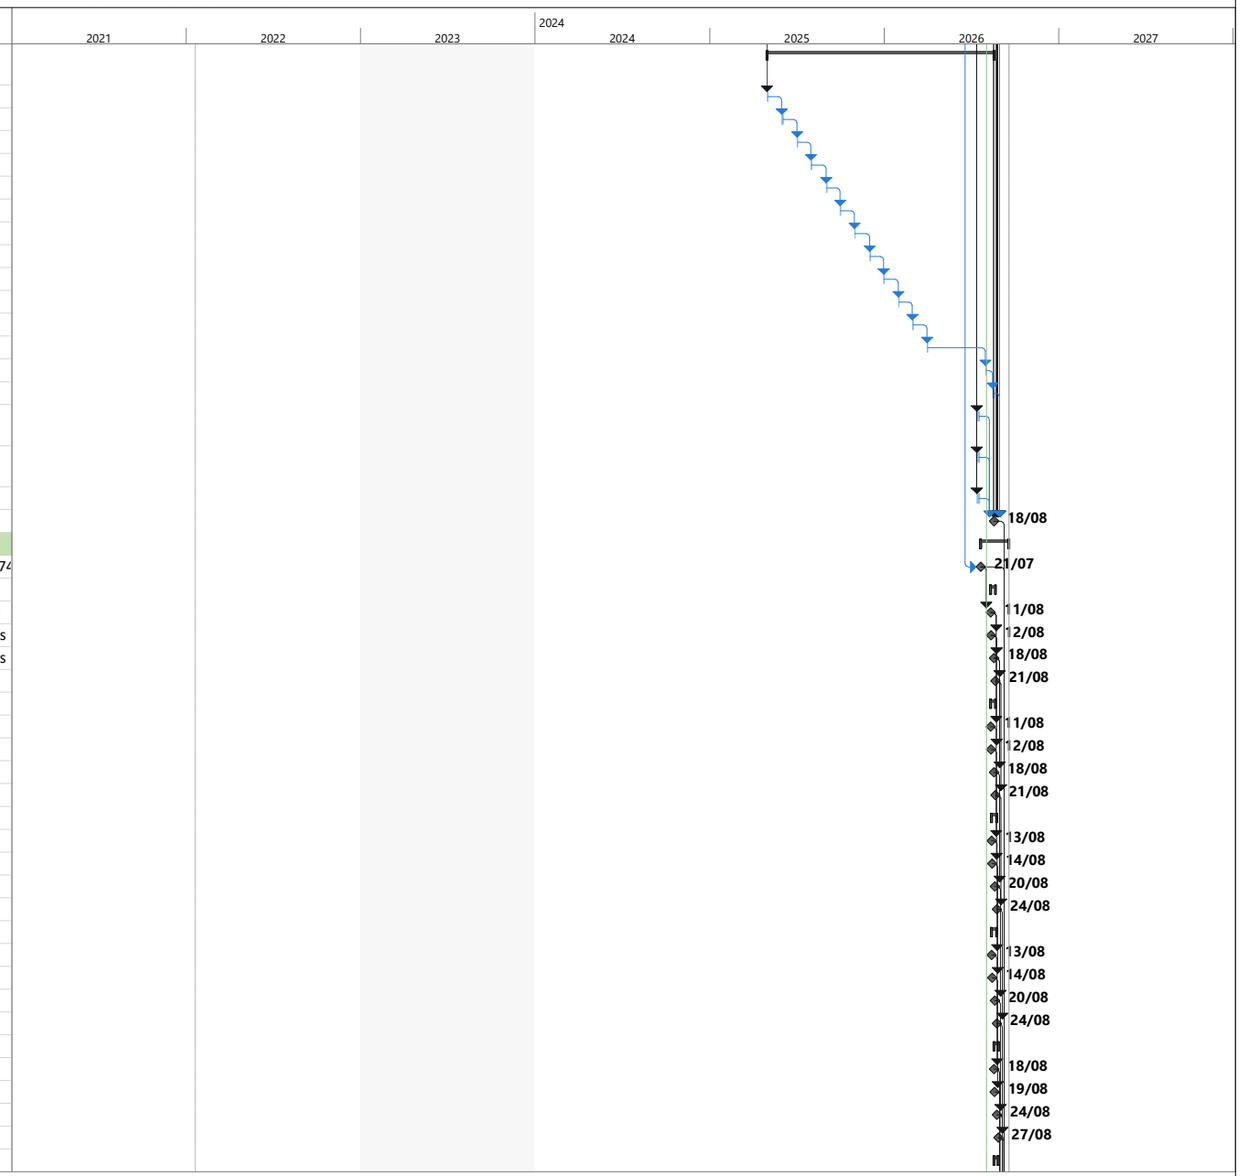

Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1899	Entrega ENEL MT	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26	$0,00	1894	1904FC+2 días
1900	Entrega ENEL AP	0 días	mié 19/08/26	mié 19/08/26	$0,00	1895	1905FC+2 días
1901	Entrega ACUEDUCTO	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1896	1906FC+2 días
1902	Entrega ETB	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1897	1907FC+2 días
1903	**CIV 16000942 (10)**	**8 días**	**jue 20/08/26**	**sáb 29/08/26**	**$0,00**		
1904	Entrega ENEL MT	0 días	jue 20/08/26	jue 20/08/26	$0,00	1899FC+2 días	1909
1905	Entrega ENEL AP	0 días	vie 21/08/26	vie 21/08/26	$0,00	1900FC+2 días	1910
1906	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	$0,00	1901FC+2 días	1911
1907	Entrega ETB	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$0,00	1902FC+2 días	1912
1908	**CIV 16000873 (11)**	**8 días**	**jue 20/08/26**	**sáb 29/08/26**	**$0,00**		
1909	Entrega ENEL MT	0 días	jue 20/08/26	jue 20/08/26	$0,00	1904	1914FC+3 días
1910	Entrega ENEL AP	0 días	vie 21/08/26	vie 21/08/26	$0,00	1905	1915FC+3 días
1911	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26	$0,00	1906	1916FC+3 días
1912	Entrega ETB	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$0,00	1907	1917FC+3 días
1913	**CIV 16000567 (28)**	**8 días**	**lun 24/08/26**	**mié 2/09/26**	**$0,00**		
1914	Entrega ENEL MT	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1909FC+3 días	1919
1915	Entrega ENEL AP	0 días	mar 25/08/26	mar 25/08/26	$0,00	1910FC+3 días	1920
1916	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$0,00	1911FC+3 días	1921
1917	Entrega ETB	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1912FC+3 días	1922
1918	**CIV 16000445 (26)**	**8 días**	**lun 24/08/26**	**mié 2/09/26**	**$0,00**		
1919	Entrega ENEL MT	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1914	1924
1920	Entrega ENEL AP	0 días	mar 25/08/26	mar 25/08/26	$0,00	1915	1925
1921	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$0,00	1916	1926
1922	Entrega ETB	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1917	1927
1923	**CIV 16000463 (27)**	**8 días**	**lun 24/08/26**	**mié 2/09/26**	**$0,00**		
1924	Entrega ENEL MT	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$0,00	1919	1929FC+3 días
1925	Entrega ENEL AP	0 días	mar 25/08/26	mar 25/08/26	$0,00	1920	1930FC+3 días
1926	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$0,00	1921	1931FC+3 días
1927	Entrega ETB	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1922	1932FC+3 días
1928	**CIV 16000802 (23)**	**8 días**	**jue 27/08/26**	**sáb 5/09/26**	**$0,00**		
1929	Entrega ENEL MT	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1924FC+3 días	1934
1930	Entrega ENEL AP	0 días	vie 28/08/26	vie 28/08/26	$0,00	1925FC+3 días	1935
1931	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1926FC+3 días	1936
1932	Entrega ETB	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1927FC+3 días	1937
1933	**CIV 16000597 (22)**	**8 días**	**jue 27/08/26**	**sáb 5/09/26**	**$0,00**		
1934	Entrega ENEL MT	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1929	1939
1935	Entrega ENEL AP	0 días	vie 28/08/26	vie 28/08/26	$0,00	1930	1940
1936	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1931	1941
1937	Entrega ETB	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1932	1942
1938	**CIV 16000789 (8)**	**8 días**	**jue 27/08/26**	**sáb 5/09/26**	**$0,00**		
1939	Entrega ENEL MT	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1934	1944
1940	Entrega ENEL AP	0 días	vie 28/08/26	vie 28/08/26	$0,00	1935	1945
1941	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1936	1946
1942	Entrega ETB	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1937	1947
1943	**CIV 16000874 (9)**	**8 días**	**jue 27/08/26**	**sáb 5/09/26**	**$0,00**		
1944	Entrega ENEL MT	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	$0,00	1939	1949FC+3 días
1945	Entrega ENEL AP	0 días	vie 28/08/26	vie 28/08/26	$0,00	1940	1950FC+3 días
1946	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mié 2/09/26	mié 2/09/26	$0,00	1941	1951FC+3 días
1947	Entrega ETB	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1942	1952FC+3 días



Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1948	**CIV 16000467 (19)**	**8 días**	**lun 31/08/26**	**mié 9/09/26**	**$0,00**		
1949	Entrega ENEL MT	0 días	lun 31/08/26	lun 31/08/26	$0,00	1944FC+3 días	1954
1950	Entrega ENEL AP	0 días	mar 1/09/26	mar 1/09/26	$0,00	1945FC+3 días	1955
1951	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1946FC+3 días	1956
1952	Entrega ETB	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1947FC+3 días	1957
1953	**CIV 16004523 (20)**	**8 días**	**lun 31/08/26**	**mié 9/09/26**	**$0,00**		
1954	Entrega ENEL MT	0 días	lun 31/08/26	lun 31/08/26	$0,00	1949	1959
1955	Entrega ENEL AP	0 días	mar 1/09/26	mar 1/09/26	$0,00	1950	1960
1956	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1951	1961
1957	Entrega ETB	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1952	1962
1958	**CIV 16000517 (21)**	**8 días**	**lun 31/08/26**	**mié 9/09/26**	**$0,00**		
1959	Entrega ENEL MT	0 días	lun 31/08/26	lun 31/08/26	$0,00	1954	1964FC+6 días
1960	Entrega ENEL AP	0 días	mar 1/09/26	mar 1/09/26	$0,00	1955	1965FC+6 días
1961	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	$0,00	1956	1966FC+6 días
1962	Entrega ETB	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1957	1967FC+6 días
1963	**CIV 16000984 (16)**	**8 días**	**lun 7/09/26**	**mié 16/09/26**	**$0,00**		
1964	Entrega ENEL MT	0 días	lun 7/09/26	lun 7/09/26	$0,00	1959FC+6 días	1969
1965	Entrega ENEL AP	0 días	mar 8/09/26	mar 8/09/26	$0,00	1960FC+6 días	1970
1966	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	$0,00	1961FC+6 días	1971
1967	Entrega ETB	0 días	mié 16/09/26	mié 16/09/26	$0,00	1962FC+6 días	1972
1968	**CIV 16001043 (17)**	**8 días**	**lun 7/09/26**	**mié 16/09/26**	**$0,00**		
1969	Entrega ENEL MT	0 días	lun 7/09/26	lun 7/09/26	$0,00	1964	1974
1970	Entrega ENEL AP	0 días	mar 8/09/26	mar 8/09/26	$0,00	1965	1975
1971	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	$0,00	1966	1976
1972	Entrega ETB	0 días	mié 16/09/26	mié 16/09/26	$0,00	1967	1977
1973	**CIV 16001008 (14)**	**8 días**	**lun 7/09/26**	**mié 16/09/26**	**$0,00**		
1974	Entrega ENEL MT	0 días	lun 7/09/26	lun 7/09/26	$0,00	1969	1979
1975	Entrega ENEL AP	0 días	mar 8/09/26	mar 8/09/26	$0,00	1970	1980
1976	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	$0,00	1971	1981
1977	Entrega ETB	0 días	mié 16/09/26	mié 16/09/26	$0,00	1972	1982
1978	**CIV 16000928 (15)**	**8 días**	**lun 7/09/26**	**mié 16/09/26**	**$0,00**		
1979	Entrega ENEL MT	0 días	lun 7/09/26	lun 7/09/26	$0,00	1974	1984FC+2 días
1980	Entrega ENEL AP	0 días	mar 8/09/26	mar 8/09/26	$0,00	1975	1985FC+2 días
1981	Entrega ACUEDUCTO	0 días	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26	$0,00	1976	1986FC+2 días
1982	Entrega ETB	0 días	mié 16/09/26	mié 16/09/26	$0,00	1977	1987FC+1 día
1983	**CIV 16001063 (18)**	**7 días**	**mié 9/09/26**	**jue 17/09/26**	**$0,00**		
1984	Entrega ENEL MT	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1979FC+2 días	1989
1985	Entrega ENEL AP	0 días	jue 10/09/26	jue 10/09/26	$0,00	1980FC+2 días	1990
1986	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	1981FC+2 días	1991
1987	Entrega ETB	0 días	jue 17/09/26	jue 17/09/26	$0,00	1982FC+1 día	1992
1988	**CIV 16001009 (12)**	**7 días**	**mié 9/09/26**	**jue 17/09/26**	**$0,00**		
1989	Entrega ENEL MT	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1984	1994
1990	Entrega ENEL AP	0 días	jue 10/09/26	jue 10/09/26	$0,00	1985	1995
1991	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	1986	1996
1992	Entrega ETB	0 días	jue 17/09/26	jue 17/09/26	$0,00	1987	1997
1993	**CIV 16001064 (13)**	**7 días**	**mié 9/09/26**	**jue 17/09/26**	**$0,00**		
1994	Entrega ENEL MT	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	$0,00	1989	1999FC+4 días
1995	Entrega ENEL AP	0 días	jue 10/09/26	jue 10/09/26	$0,00	1990	2000FC+4 días
1996	Entrega ACUEDUCTO	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	1991	2001FC+3 días




Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CRONOGRAMA DE PRELIMINRES CONTRATO IDU 1839 DEL 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1997	Entrega ETB	0 días	jue 17/09/26	jue 17/09/26	$0,00	1992	2002FC+1 día
1998	**CIV 16000483 (2)**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
1999	Entrega ENEL MT	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26	$0,00	1994FC+4 días	2004
2000	Entrega ENEL AP	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	1995FC+4 días	2005
2001	Entrega ACUEDUCTO	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	1996FC+3 días	2006
2002	Entrega ETB	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	1997FC+1 día	2007
2003	**CIV 16000550 (3)**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
2004	Entrega ENEL MT	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26	$0,00	1999	2009
2005	Entrega ENEL AP	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	2000	2010
2006	Entrega ACUEDUCTO	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2001	2011
2007	Entrega ETB	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2002	2012
2008	**CIV 16000602 (4)**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
2009	Entrega ENEL MT	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26	$0,00	2004	2014
2010	Entrega ENEL AP	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	2005	2015
2011	Entrega ACUEDUCTO	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2006	2016
2012	Entrega ETB	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2007	2017
2013	**CIV 16000637 (5)**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
2014	Entrega ENEL MT	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26	$0,00	2009	2019
2015	Entrega ENEL AP	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	2010	2020
2016	Entrega ACUEDUCTO	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2011	2021
2017	Entrega ETB	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2012	2022
2018	**CIV 16000484 (1)**	**4 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	**$0,00**		
2019	Entrega ENEL MT	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26	$0,00	2014	2023
2020	Entrega ENEL AP	0 días	mar 15/09/26	mar 15/09/26	$0,00	2015	2023
2021	Entrega ACUEDUCTO	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2016	2023
2022	Entrega ETB	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2017	2023
2023	Fin etapa de recibo	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	1872FC+26 días;2019	2024
2024	FIN CONTRATO 1839 DEL 2021	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$0,00	2023;1870	

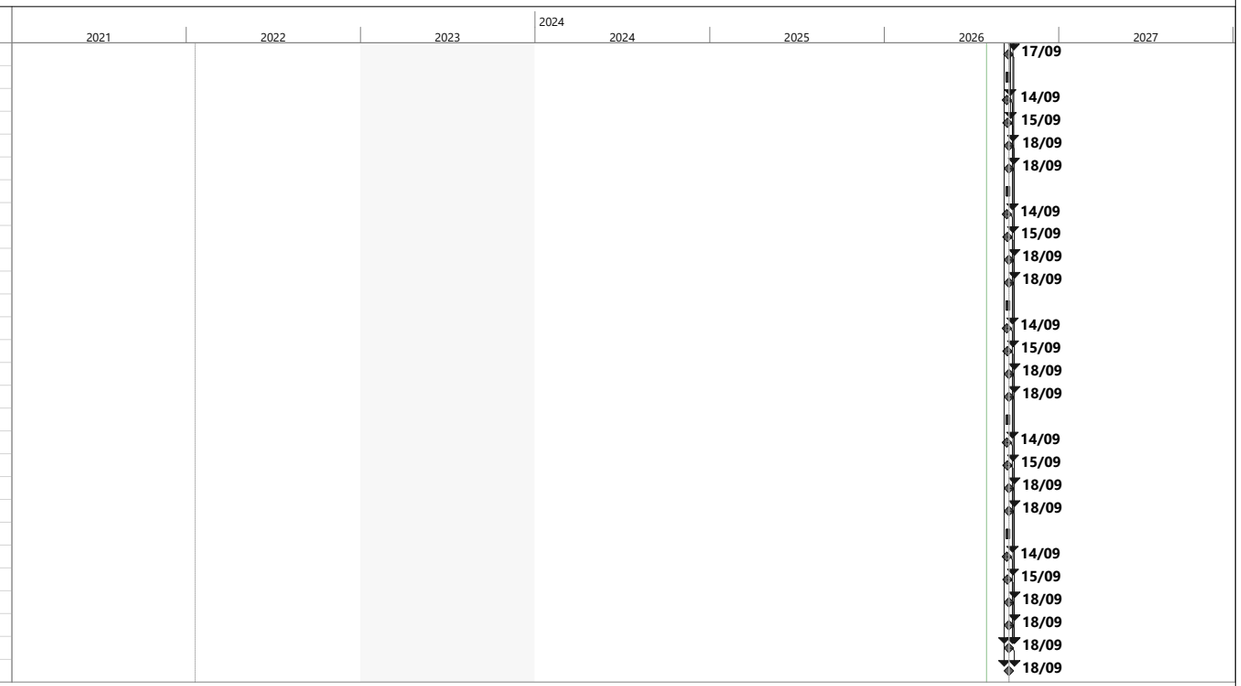

Proyecto: pRELIMINARES
Fecha: lun 3/08/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso
