CONTRATO N° 4600104902 de 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VIAL, SEMAFORIZACIÓN Y DISPOSITIVOS ITS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.

INFORME MENSUAL # 13

PERIODO: 01 al 30 de junio de 2026

ELABORÓ:	Edil Gerardo Ramírez Serna Leidy Milena Torres Luna Gloria Elena Aguilar Carvajal
REVISÓ	Natalia Zapata Puerta
APROBÓ:	Maria Andrea Carmona Sanchez Jorge Alberto Ramirez Giraldo

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 3
Datos Generales del Contrato Interadministrativo 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 5
Cantidades Contratadas: 5
Cronograma de ejecución de las actividades por Emvarias SA ESP: 6
4. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL - COMPONENTE 1: 6
Diseño, presentación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad: 6
Corredores, Cantidades de Segregadores y Señales Verticales intervenidas en el periodo reportado y saldo del contrato: 7
Registros fotográficos de las actividades realizada en el periodo reportado 9
Talento Humano, Afiliación a la seguridad social y capacitación 14
Vehículos, equipos Materiales y EPP por actividad de Lavado. 14
Permiso Uso de hidrantes de EPM: 14
5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PODA DE ÁRBOLES - COMPONENTE 2: 15
Zonas Priorizadas de Intervención por la Secretaría de Movilidad 15
Plan de Manejo de Tránsito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad: 15
Diagnósticos Técnicos por Tipo de árboles diagnosticados en el Periodo reportado: 15
Mapa de ubicación de Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda de árboles 15
Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda en el Periodo reportado: 16
Reporte de novedades operativas: 31
Talento humano, Equipos y Materiales del Componente 2 32
Talento humano para la ejecución del Componente 2 32
Vehículos para recolección de residuos vegetales del componente 2 33
Vehículos para transporte de personal, herramientas y materiales del Componente 2 33
Recursos físicos y materiales del Componente 2. 33
Seguridad y Salud en el trabajo: 34
6. INFORME ADMINISTRATIVO: 34
Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 34
7. INFORME FINANCIERO: 34
Las condiciones de la ejecución de los recursos del contrato antes de IVA es la siguiente: 34
8. INFORME JURÍDICO: 35
El estado de las garantías del contrato es el siguiente: 35
9. DOCUMENTOS ANEXOS: 35

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Datos Generales del Contrato Interadministrativo

CONTRATO No.	**4600104902 de 2025**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NIT	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P
NIT	890.905.055-9
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VIAL, SEMAFORIZACIÓN Y DISPOSITIVOS ITS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ML ($633.185.259) IVA Incluido.
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES, sin superar la vigencia fiscal y contados a partir de la fecha de la legalización y marcación de inicio en SECOP II por parte del supervisor del contrato, previa obtención del Registro Presupuestal correspondiente.
AMPLIACION N°1	**Ampliación No. 01:** Por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de enero de 2026 al veintiocho (28) de febrero de 2026, ambas fechas inclusive. Redistribución de los recursos del documento Anexo denominado “Presupuesto”.
FECHA DE INICIO:	21/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE LA MODIFICACIÓN	31/07/2026
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	
OTROSÍ N° 01	MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PRESUPUESTO OFICIAL, consistente en la Redistribución de recursos, en los siguientes términos: Trasladar del Componente 2: Diagnóstico técnico y poda de árboles, que tiene como finalidad mitigar y retirar ramas que obstaculizan la visual de los actores viales en los puntos donde se encuentre instalado el sistema de semaforización, y dispositivos ITS del Distrito de Medellín, al Componente 1: Aseo y mantenimiento de la señalización vial de la ciudad mediante la ejecución de actividades consistentes en las labores de lavado y limpieza de los elementos segregadores de carril, tales como bordillos, tachas, delineadores y el lavado de las señales verticales el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($246.972.870).

CONTRATO No.	**4600104902 de 2025**
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**Modificación No. 02.** Consistente en: **Ampliación No. 02**: Por el término de cinco (05) meses, contados a partir del primero (01) de marzo de 2026 al treinta y uno (31) de julio de 2026, ambas fechas inclusive. **Otrosí No. 02**: MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE PRESUPUESTO OFICIAL, consistente en el reajuste de precios por ítem. **Adición No. 01:** Por valor de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($315.500.618), equivalentes al 40,51% del valor contrato inicial y correspondiente a 180.19 SMMLV de 2026.
SUPERVISORES DEL CONTRATO	MARIA ANDREA CARMONA SANCHEZ JORGE ALBERTO RAMIREZ GIRALDO

Se plantea para el contrato **(COMPONENTE N°1)**, prestar el servicio de aseo y mantenimiento de la señalización vial de la ciudad mediante la ejecución de actividades consistentes en las labores de lavado y limpieza de los elementos segregadores de carril, tales como bordillos, tachas, delineadores y el lavado de las señales verticales en las zonas que la supervisión del contrato considere pertinentes.

Adicionalmente se plantea **(COMPONENTE N°2)** realizar un diagnóstico técnico y poda de árboles, que tiene como finalidad mitigar y retirar ramas que obstaculizan la visual de los actores viales en los puntos donde se encuentre instalado el sistema de semaforización, y dispositivos ITS del Distrito de Medellín. El propósito es propiciar un mantenimiento óptimo al escenario público y las zonas administradas por el ente territorial, así garantizar condiciones, funciones ecológicas y silviculturales de los árboles, percepción de limpieza y mitigación de riesgos y mejora en la seguridad para todos los actores viales.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del contrato 4600104902 DE 2025 suscrito entre el Distrito de Medellín – Secretaría de Movilidad y Emvarias S.A. E.S.P, para determinar los avances de la ejecución física y financiera del contrato interadministrativo, en el periodo comprendido entre **los días 01 al 30 de junio de 2026** en el Distrito de Medellín.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar a la Secretaría de Movilidad de Medellín los avances de la ejecución de las actividades contratadas con Emvarias S.A ESP, los corredores viales que fueron intervenidos mediante lavado y limpieza, así como los diagnósticos técnicos y podas de árboles realizada, durante el periodo comprendido entre los días **los días 01 al 30 de junio de 2026** en el Distrito de Medellín.

- Establecer los porcentajes de ejecución física y financiera con corte **al día 30 de junio de 2026,** de cada una de las actividades del contrato interadministrativo 4600104902 DE 2025 suscrito entre el Distrito de Medellín- Secretaría de Movilidad y Emvarias S.A E.S.P.

- Documentar el cumplimiento de los Planes de Manejo de Transito PMT y el seguimiento protocolos de seguridad implementados durante la ejecución de las actividades en el periodo reportado.

- Facturar las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, en el periodo comprendido entre los **días 01 al 30 de junio de 2026 .**

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

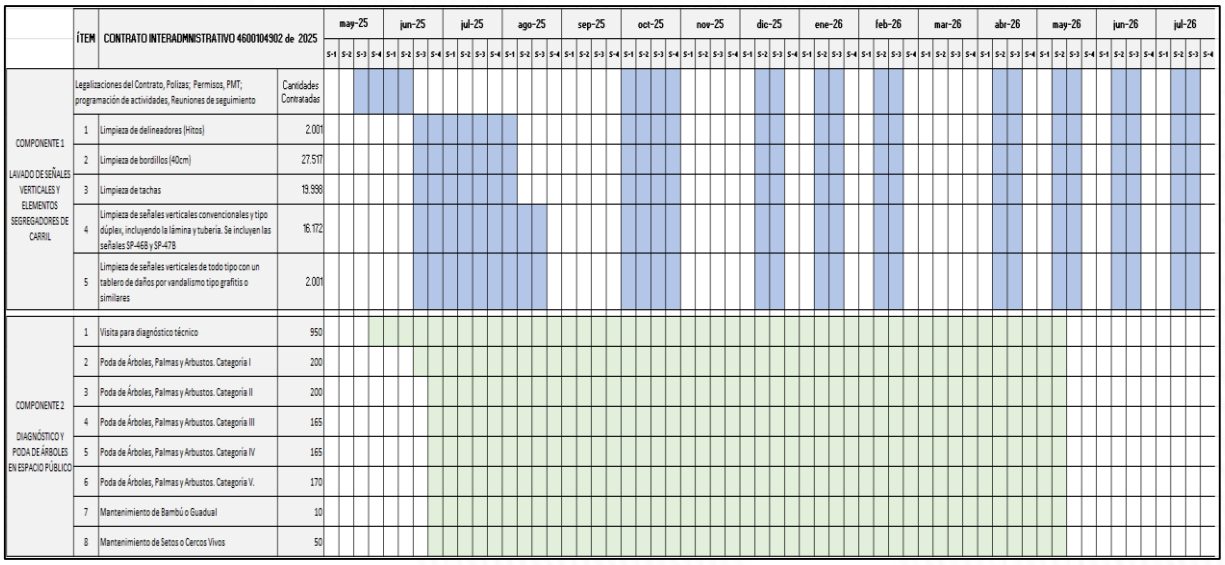
Cantidades Contratadas:

Para optimizar los recursos disponibles, desde la Secretaría de Movilidad se consideró necesario realizar Modificaciones que permitan atender las necesidades técnicas de la entidad, mediante ampliaciones del plazo, redistribución de los recursos, y adición para asegurar que las intervenciones se ejecuten de manera eficiente y acordes a necesidades del distrito de Medellín.

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades contratadas después de las Modificaciones realizadas al contrato interadministrativo:

CONTRATO Nº 4600104902 de 2025				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		CONDICIONES DEL CONTRATO DESPUES DE LA REDISTRIBUCIÓN		MODIFICACION Nº2			CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DESPUES DE LAS MODIFICACIONES	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidades despues de la redistribución	Valor Total despues de la redistribucion	Cantidad Adionada	Valor Unitario 2026	Total	Cantidad	Valor
1	Limpieza de Delineadores (Hitos).	Und	1.500	$ 3.991,00	$ 5.986.500	1.500	$ 5.986.500	501	$ 4.716	$ 2.362.716	2.001	$ 8.349.216,00
2	Limpieza de Bordillos.	Und	10.000	$ 4.962,00	$ 49.620.000	24.004	$ 119.107.848	3.513	$ 5.864	$ 20.600.232	27.517	$ 139.708.080,00
3	Limpieza de Tachas.	Und	9.000	$ 1.192,00	$ 10.728.000	17.004	$ 20.268.768	2.994	$ 1.409	$ 4.218.546	19.998	$ 24.487.314,00
4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Und	4.059	$ 20.748,00	$ 84.216.132	10.071	$ 208.953.108	6.101	$ 24.518	$ 149.584.318	16.172	$ 358.537.426,00
5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	Und	2.034	$ 35.849,00	$ 72.916.866	800	$ 28.679.200	1.201	$ 42.362	$ 50.876.762	2.001	$ 79.555.962,00
6	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Global	1	$ 15.811.402,00	$ 15.811.402	1	$ 15.811.402	1	$ 18.684.176	$ 18.684.176	2	$ 34.495.578,00
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	$ 239.278.900		$ 398.806.826			$ 246.326.750		$ 645.133.576
1	Visita para diagnóstico técnico	Und	950	$ 56.418,00	$ 53.597.100	750	$ 42.313.500	200	$ 66.669,00	$ 13.333.800	950	$ 55.647.300,00
2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	Und	200	$ 136.727,00	$ 27.345.400	130	$ 17.774.510	80	$ 161.569,00	$ 12.925.520	210	$ 30.700.030,00
3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	Und	200	$ 227.433,00	$ 45.486.600	390	$ 88.698.870	80	$ 268.755,00	$ 21.500.400	470	$ 110.199.270,00
4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	Und	165	$ 319.251,00	$ 52.676.415	165	$ 52.676.415	15	$ 377.256,00	$ 5.658.840	180	$ 58.335.255,00
5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	Und	165	$ 411.069,00	$ 67.826.385	35	$ 14.387.415	15	$ 485.756,00	$ 7.286.340	50	$ 21.673.755,00
6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	Und	170	$ 761.405,00	$ 129.438.850	10	$ 7.614.050	6	$ 899.745,00	$ 5.398.470	16	$ 13.012.520,00
7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	Metro cuadrado	10	$ 33.421,00	$ 334.210	1	$ 33.421	1	$ 39.493,00	$ 39.493	2	$ 72.914,00
8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	Metro Lineal	50	$ 140.359,00	$ 7.017.950	5	$ 701.795	3	$ 165.861,00	$ 497.583	8	$ 1.199.378,00
				SUBTOTAL COMPONENTE 2	$ 383.722.910		$ 224.199.976			$ 66.640.446		$ 290.840.422
				TOTAL COMPONENTES	$ 623.001.810		$ 623.006.802			$ 312.967.196		$ 935.973.998
				IVA (19%)	$ 10.183.449		$ 8.039.565			$ 2.533.422		$ 10.572.987
				TOTAL	$ 633.185.259		$ 631.046.367			$ 315.500.618		$ 946.546.985

Cronograma de ejecución de las actividades por Emvarias SA ESP:



	ÍTEM	CONTRATO INTERADMNISTRATIVO 4600104902 de 2025		may-25				jun-25				jul-25				ago-25				sep-25				oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26			
				S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4
COMPONENTE 1 LAVADO DE SEÑALES VERTICALES Y ELEMENTOS SEGREGADORES DE CARRIL		Legalizaciones del Contrato, Polizas; Permisos, PMT; programación de actividades, Reuniones de seguimiento	Cantidades Contratadas																																																								
	1	Limpieza de delineadores (Hitos)	2.001																																																								
	2	Limpieza de bordillos (40cm)	27.517																																																								
	3	Limpieza de tachas	19.998																																																								
	4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo la lámina y tubería. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	16.172																																																								
	5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	2.001																																																								
COMPONENTE 2 DIAGNÓSTICO Y PODA DE ÁRBOLES EN ESPACIO PÚBLICO	1	Visita para diagnóstico técnico	950																																																							
	2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	200																																																							
	3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	200																																																						
	4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	165																																																					
	5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	165																																																					
	6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V.	170																																																				
	7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	10																																																				
	8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	50																																																				

4. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL - COMPONENTE 1:

Diseño, presentación y aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad:

Para el manejo de las acciones preventivas que permitan garantizar la seguridad vial de todos los actores y usuarios en los corredores viales objeto de intervención, mediante este contrato interadministrativo, en la siguiente tabla se detallan los oficios de aprobación de los Planes de manejo de Transito PMT, las fechas y horarios de cierres parciales autorizados del Contrato Interadministrativo 4600104902 de 2025:

FECHA	RADICADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	HORARIO	ESTADO
24/06/2025	202530282660	27/06/2025 11/07/2025	03/07/2025 17/07/2025	21:00– 04:00	Aprobación
17/12/2025	202530621475	15/12/2025 13/01/2026	31/12/2025 24/01/2026	21:00– 04:00	Prórroga
10/02/2026	202630051493	14/02/2026	28/02/2026	21:00– 04:00	Prórroga
14/04/2026	202630165502	13/04/2026 04/05/2026 01/06/2026	19/04/2026 10/05/2026 07/06/2026	21:00 – 04:00	Prórroga

Corredores, Cantidades de Segregadores y Señales Verticales intervenidas en el periodo reportado y saldo del contrato:

La siguiente tabla muestra las comunas y los barrios donde se realizaron intervenciones en el periodo reportado:

COMUNA DISTRITO DE MEDELLIN	BARRIOS
COMUNA 10 – LA CANDELARIA	San Benito
	Corazón de Jesús
COMUNA 12 – LA AMÉRICA	La America
	Barrio Cristóbal
	La Castellana
	La Floresta
	Santa Mónica
	Simón Bolívar
COMUNA 14 – EL POBLADO	Manila
	Astorga
	Patio Bonito
	Villa Carlota

En el **ANEXO E_** Intervenciones COMPONENTE 1 de la carpeta compartida se detallan los sitios y cantidades intervenidas por ítem para dar cumplimiento a los compromisos contractuales.

La ejecución física y financiera del contrato se resume en la siguiente tabla:

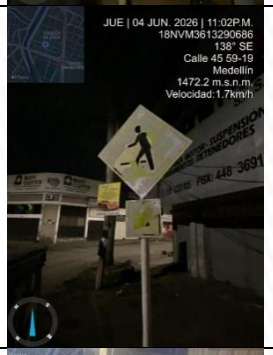
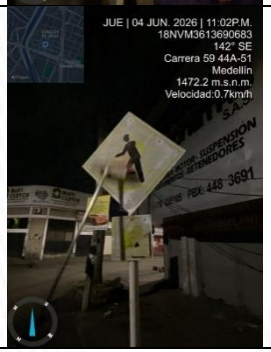
La totalidad de los registros fotográficos se pueden ver en el enlace https://kf.kobotoolbox.org/accounts/login/?next=%2F%23%2F#/

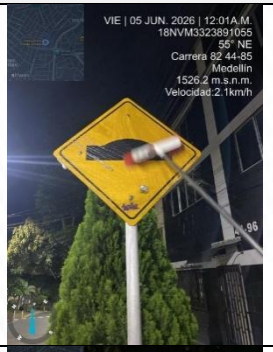
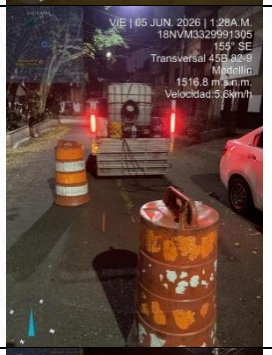
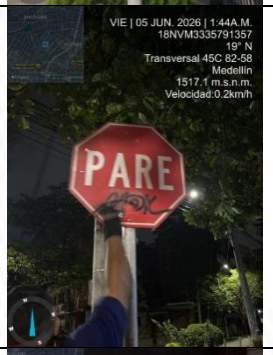
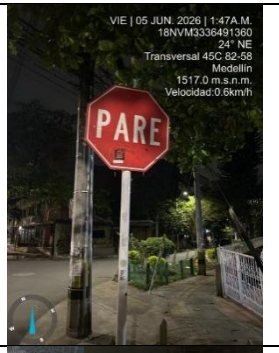
(Usuario: **lavadosenalistica**;
Contraseña: **Movilidad2025***

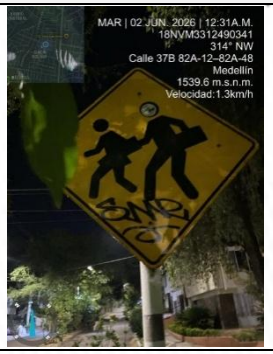
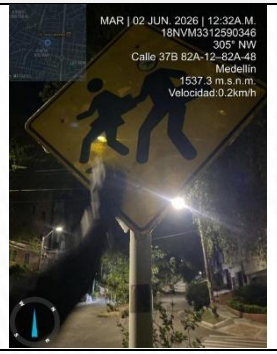
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					MODIFICACIÓN No. 2			CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DESPUES DE LAS MODIFICACIONES		ACTA 13 Junio 01 a 30 de 2026	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario 2025	Cantidad adicionada	Valor unitario 2026	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	Valor Total
1	Limpieza de Delineadores (Hitos).	Und	1,500	$ 3,991.00	501.00	$ 4,716	$ 2,362,716	2,001.00	$ 8,349,216	-	$ 0
2	Limpieza de Bordillos.	Und	10,000	$ 4,962.00	3,513.00	$ 5,864	$ 20,600,232	27,517.00	$ 139,708,080	-	$ 0
3	Limpieza de Tachas.	Und	9,000	$ 1,192.00	2,994.00	$ 1,409	$ 4,218,546	19,998.00	$ 24,487,314	-	$ 0
4	Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B	Und	4,059	$ 20,748.00	6,101.00	$ 24,518	$ 149,584,318	16,172.00	$ 358,537,426	394.00	$ 9,660,092
5	Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares	Und	2,034	$ 35,849.00	1,201.00	$ 42,362	$ 50,876,762	2,001.00	$ 79,555,962	99.00	$ 4,193,838
6	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	Global	1	$ 15,811,402.00	1.00	$ 18,684,176	$ 18,684,176	2.00	$ 34,495,578	-	$ 0
	SUBTOTAL COMPONENTE 1						**$ 246,326,750**		**$ 645,133,576**		**$ 13,853,930**
1	Visita para diagnóstico técnico	Und	950	$ 56,418.00	200.00	$ 66,669	$ 13,333,800	950.00	$ 55,647,300	100.00	$ 5,641,800
2	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	Und	200	$ 136,727.00	80.00	$ 161,569	$ 12,925,520	153.00	$ 30,700,030	10.00	$ 1,615,690
3	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	Und	200	$ 227,433.00	80.00	$ 268,755	$ 21,500,400	489.00	$ 110,199,270	58.00	$ 15,587,790
4	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	Und	165	$ 319,251.00	15.00	$ 377,256	$ 5,658,840	207.00	$ 58,335,255	31.00	$ 11,694,936
5	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	Und	165	$ 411,069.00	15.00	$ 485,756	$ 7,286,340	51.00	$ 21,673,755	14.00	$ 6,800,584
6	Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	Und	170	$ 761,405.00	6.00	$ 899,745	$ 5,398,470	10.00	$ 13,012,520	-	$ 0
7	Mantenimiento de Bambú o Guadual	Metro cuadra	10	$ 33,421.00	1.00	$ 39,493	$ 39,493	-	$ 72,914	-	$ 0
8	Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	Metro Lineal	50	$ 140,359.00	3.00	$ 165,861	$ 497,583	-	$ 1,199,378	-	$ 0
	SUBTOTAL COMPONENTE 2						**$ 66,640,446**		**$ 290,840,422**		**$ 41,340,800**
	TOTAL COMPONENTES						**$ 312,967,196**		**$ 935,973,998**		**$ 55,194,730**
	IVA (19%)						**$ 2,533,422**		**$ 10,572,987**		**$ 1,071,942**
	TOTAL						**$ 315,500,618**		**$ 946,546,985**		**$ 56,266,672**

Registros fotográficos de las actividades realizadas en el periodo reportado

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 10 – La Candelaria	**Ayacucho Cr 59**				
Comuna 10 – La Candelaria	**Barrio triste Cl 49**				

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 10 – La Candelaria	**Barrio triste Cl 46**				
Comuna 10 – La Candelaria	**Barrio triste Cl 45**				
Comuna 10 – La Candelaria	**Barrio triste Cl 49**				

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 12 – La América	**Barrio La América Cr 82**				
Comuna 12 – La América	**Barrio La América Trasversal 45c**				
Comuna 12 – La América	**Barrio La América Cl46**				

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 12 – La América	**Barrio Santa Mónica Cll37b**				
Comuna 14 – El Poblado	**Barrio Villa Carlota Crr43f**				
Comuna 14 – El Poblado	**Barrio Manila Cll 11A**				

COMUNA	CORREDOR VIAL	IMPLEMENTACION PMT	ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DURANTE LA INTERVENCIÓN	DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Comuna 14 – El Poblado	**Barrio Patio Bonito Crr45**				

Talento Humano, Afiliación a la seguridad social y capacitación

Todas las personas que participaron en la ejecución de las actividades del contrato cuentan con afiliación al Sistema de Seguridad Social de Colombia, fondo de pensiones, y una Administradora de Riesgos Laborales **(ARL)**.

Vehículos, equipos Materiales y EPP por actividad de Lavado.

Actividad	Vehículos.	Equipos y materiales	Implementos utilizados y EPP
Limpieza de Señalética :Delineadores plásticos (Hitos), bordillos y tachas	Carro tanque Chevrolet de 9.000 litros (2) Camión tipo estaca dotado con 2.000 litros de agua (2). Camioneta doble cabina para transportar las personas, la señalización y los elementos de trabajo (1) Automóvil para el transporte de personal (1)	Hidro lavadoras de 3800 PSI a gasolina. (4) Mangueras de 10 mts con acoples rápidos. (8) Mangueras de 25 mts con acoples rápidos. (2) Mangueras jardineras de 40 mts. (2) Galones de desengrasante líquido Industrial 100% Biodegradable. Herramientas manuales (escobas, rastrillos, palas, espátulas) Cepillos Cerdas suaves y duras Microfibras y Costales de fibra Agua abundante, tomada del sistema de acueducto municipal.	Uniforme: overol reflectivo Delantal sintético Vestuario invierno. Gorra Botas punta de acero, Protección auditiva. Guantes Gafas de seguridad Mascarillas.
Limpieza de señales verticales convencionales y tipo dúplex, incluyendo el tablero. Se incluyen las señales SP-46B y SP-47B			
Limpieza de señales verticales de todo tipo con un tablero de daños por vandalismo tipo grafitis o similares			

Permiso Uso de hidrantes de EPM:

Se anexa al informe, copia del aforo y renovación de uso autorizado de hidrantes del sistema de acueducto de EPM del mes de junio de 2026. (Ver **ANEXO B** en carpeta Drive).

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y PODA DE ÁRBOLES - COMPONENTE 2:

Zonas Priorizadas de Intervención por la Secretaría de Movilidad

Para el diagnóstico de árboles asociados a conflictos con semaforización y dispositivos ITS, la Secretaría de Movilidad definió unos puntos adicionales en los cuales se asoció: dirección, número de dispositivo, registros fotográficos y otros complementarios para la evaluación silvicultural pertinente.

Para este periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio del 2026, no se realizaron diagnósticos.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT), por parte de la Secretaría de Movilidad:

A continuación, se detallan los Planes de Manejo de Tránsito aprobados por la Secretaría de Movilidad para el manejo de las acciones preventivas que permitan garantizar la seguridad vial de todos los actores asociados durante el desarrollo de las actividades para este componente:

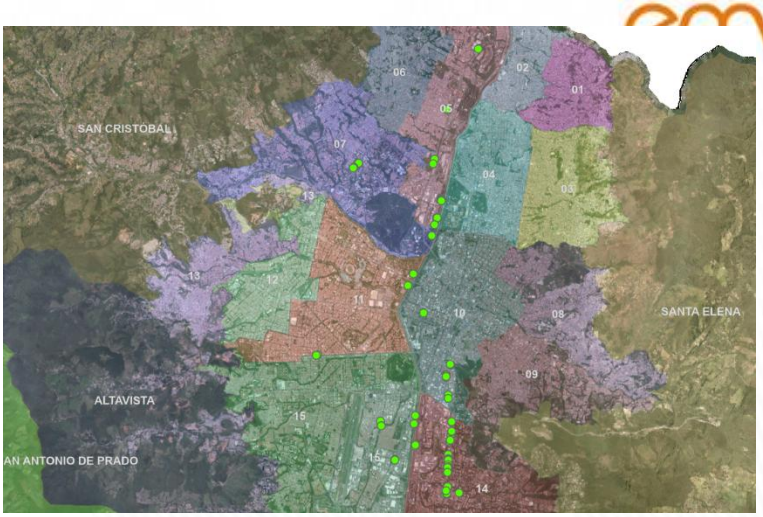
FECHA	RADICADO	ESTADO
23/01/2025	202530021363	Aprobación
29/05/2025	202530238814	Prórroga
15/08/2025	202530385216	Prórroga
27/10/2025	202530529749	Prórroga
20/01/2026	202630018473	Prórroga
02/06/2026	202630268779	Prórroga

Diagnósticos Técnicos por Tipo de árboles diagnosticados en el Periodo reportado:

De acuerdo con la información reportada en el informe del mes de junio (acta No. 13), no se presentan diagnósticos para este periodo (informe No. 13), considerando que el presupuesto disponible en este ítem ya se había ejecutado en su totalidad.

Se aclara que durante el mes de enero se realizaron **112 diagnósticos**. Sin embargo, por un error en el proceso de la solicitud de factura, únicamente fueron cobrados **12 diagnósticos**. Por tal motivo, en el presente período se facturarán los **100 diagnósticos pendientes**, correspondientes a los servicios prestados en enero, aplicando las **tarifas vigentes del año 2025**.

Mapa de ubicación de Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda de árboles



Individuos intervenidos a través de la actividad de Poda en el Periodo reportado:

Las intervenciones de poda refieren árboles que constituyen seres vivos y por normatividad, cualquier actividad sobre ellos en el Distrito de Medellín, debe ingresarse en el Sistema del Árbol Urbano (SAU), por lo tanto, se comparte en este documento los datos asociados a las podas ejecutadas e ingresadas en la plataforma en el periodo reportado y corresponden a ciento trece (113) intervenciones de poda distribuidas de la siguiente manera:

CATEGORÍA ARBOREA	No. DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría I	10
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría II	58
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría III	31
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría IV	14
Poda de Árboles, Palmas y Arbustos. Categoría V	0
Mantenimiento de Bambú o Guadual	0
Mantenimiento de Setos o Cercos Vivos	0
TOTAL	**113**

A continuación, se detalla la información técnica asociada a los 113 individuos intervenidos con el servicio de poda:

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
2/06/2026	J8879	0010511 0231831	*Pseudosamanea guachapele*	12,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 95-42, Separador Vial	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8914	0010517 0080111	*Lafoensia acuminata*	10,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Zona 2	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
3/06/2026	J8915	0010517 0000862	*Lafoensia acuminata*	10,70	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8916	0010517 0000864	*Lafoensia acuminata*	11,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8917	0010517 0000865	*Lafoensia acuminata*	12,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64A N 72-12, Zona Verde, Separador Víal.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8918	0010517 0000641	*Fraxinus uhdei*	17,80	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8919	0010517 0000643	*Fraxinus uhdei*	18,50	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8920	0010517 0000836	*Fraxinus uhdei*	18,20	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 72 N 64-00, Separador Víal, sobre Avenida Regional, sentido Norte-Sur, costado este Secretaría de Tránsito y Transporte.	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8921	0010517 0000210	*Syagrus sancona*	9,50	Categoría II	Poda de mantenimiento	Carrera 64 N 72, Avenida Regional, sentido Norte-Sur, Al Frente de TCC	Zona 2	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
3/06/2026	J8922	0010517 0001126	*Fraxinus uhdei*	17,60	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64 N 72, Separador Vial, Avenida Regional, sentido Norte-Sur, Al Frente de TCC	Zona 2	Sin novedad
3/06/2026	J8928	0011504 0001828	*Mangifera indica*	8	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50 sentido Norte - Sur entre Calles 29B y 30,Costado occidental de la autopista	Zona 6	Se observaron focos de pudrición en la base del individuo y dos de sus brazos principales. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
3/06/2026	J8929	0011504 0000351	*Mangifera indica*	7,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50 sentido Norte - Sur entre Calles 29B y 30,Costado occidental de la autopista	Zona 6	Sin novedad
3/06/2026	J8930	0011504 0870114	*Zygia longifolia*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50, sentido norte-sur entre calles 29A y 25, costado occidental de la autopista.	Zona 6	Sin novedad
3/06/2026	J8931	0011504 0870113	*Zygia longifolia*	7	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50, sentido norte-sur entre calles 29A y 25, costado occidental de la autopista.	Zona 6	Sin novedad
3/06/2026	J8932	0011504 0870112	*Zygia longifolia*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50, sentido norte-sur entre calles 29A y 25, costado occidental de la autopista.	Zona 6	Sin novedad
3/06/2026	J8933	0011504 0000356	*Ficus benjamina*	13,70	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50, sentido Norte - Sur entre Calles 25 y 24, Costado occidental de la autopista	Zona 6	Se observó panal activo de gurras y nido activo de coquito, se realiza poda sin interrumpir el ciclo reproductivo de la especie

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
3/06/2026	J8934	0011504 0000357	*Ficus benjamina*	13,80	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 50, sentido Norte - Sur entre Calles 25 y 24, Costado occidental de la autopista	Zona 6	Se observaron focos de pudrición en la base del individuo. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
4/06/2026	J8923	0010517 0020103	*Cenostigma pluviosum*	8,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64 N 67, Avenida Regional, Rotonda Norte	Zona 2	Sin novedad
4/06/2026	J8924	0011101 0251243	*Terminalia catappa*	12,80	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 entre la calle 50 y 52, sentido norte-sur al costado occidental de la autopista, Diagonal Biblioteca Pública Piloto	Zona 4	Sin novedad
4/06/2026	J8925	0011101 0030059	*Schinus terebinthifolia*	17,30	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 entre la calle 50 y 52, sentido norte-sur al costado occidental de la autopista, al frente de la Biblioteca Pública Piloto	Zona 4	Sin novedad
4/06/2026	J8926	0011102 0000762	*Handroanthus chrysanthus*	10,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 N 50, Costado Occidental, Separador Central, Autopista Sur	Zona 4	Sin novedad
4/06/2026	J8927	0011102 0000763	*Handroanthus chrysanthus*	9,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 N 50, Costado Occidental, Separador Central, Autopista Sur	Zona 4	Sin novedad
5/06/2026	J8906	0011403 0000487	*Guarea guidonia*	7,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18, separador central avenida regional (sentido sur -norte)	Zona 5	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
5/06/2026	J8907	00114030000679	*Eriobotrya japonica*	5,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad
5/06/2026	J8908	00114030000678	*Eriobotrya japonica*	5,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad
5/06/2026	J8909	00114030000762	*Eriobotrya japonica*	5,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad
5/06/2026	J8910	00114030000763	*Eriobotrya japonica*	5,10	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad
5/06/2026	J8911	00114030000490	*Leucaena leucocephala*	10,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad
5/06/2026	J8912	00114030000141	*Pithecellobium dulce*	13,40	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 49 N 18-78, Separador Central Avenida Regional (sentido sur -norte). Al frente de Servientrega	Zona 5	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
5/06/2026	J8913	0011403 0200159	*Phoenix roebelenii*	3,70	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 49 N 18-62, Costado izquierdo, avenida regional (sentido Sur-Norte), frente a Servientrega	Zona 5	Sin novedad
10/06/2026	J8902	0010915 0000235	*Syagrus romanzoffiana*	9,40	Categoría II	Poda de mantenimiento	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas, Separador central	Zona 3	Sin novedad
10/06/2026	J8903	0010915 0030691	*Inga edulis*	12,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas	Zona 3	Sin novedad
10/06/2026	J8904	0010915 0000236	*Syagrus romanzoffiana*	9,20	Categoría II	Poda de mantenimiento	Carrera 38 N 19-255, Avenida las Palmas, Separador central	Zona 3	Sin novedad
11/06/2026	J8993	0011411 0011151	*Pithecellobium dulce*	15,40	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 25 N 9A SUR-100	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8974	0011420 0000183	*Enterolobium cyclocarpum*	7,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10-02, Separador Central	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8975	0011420 0000229	*Libidibia punctata*	6,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10-02, Separador Central	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8973	0011419 0000736	*Annona muricata*	3,60	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10-02, Separador Central	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8970	0011419 0000556	*Bauhinia picta*	9,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8971	0011419 0000761	*Dracaena reflexa*	2,60	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se observo nido activo de tortolita. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo.

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
11/06/2026	J8988	0011418 0000066	*Psidium guajava*	7,10	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 42-45	Zona 5	Se observaron focos de pudrición en la base y en unos de sus brazos principales. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
11/06/2026	J8969	0011419 0000373	*Tabebuia rosea*	10,80	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 11A, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8989	0011418 0000067	*Psidium friedrichsthalianum*	6,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 42-45	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8990	0011418 0000098	*Terminalia buceras*	9,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 40-20	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8991	0011418 0000097	*Psidium friedrichsthalianum*	7,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 40-10	Zona 5	Se observo nido inactivo de siriri. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
11/06/2026	J8992	0011418 0000096	*Lagerstroemia speciosa*	7,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 10 N 40-06	Zona 5	Se observo nido activo de Siriri (adulto alimentando a los polluelos). Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
11/06/2026	J9044	0011418 0000925	*Dypsis lutescens*	3,40	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 40 N 10A-22	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J9045	0011418 0000926	*Dypsis lutescens*	3,50	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 40 N 10A-22	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J9046	0011418 0000927	*Dypsis lutescens*	3,50	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 40 N 10A-22	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J9047	0011418 0000928	*Dypsis lutescens*	3,80	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 40 N 10A-22	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J9048	0011418 0000929	*Dypsis decaryi*	4	Categoría I	Poda de mantenimiento	Carrera 40 N 10A-22	Zona 5	Sin novedad
11/06/2026	J8994	0010502 0040274	*Leucaena leucocephala*	12,90	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 111A-331, Autopista Norte	Zona 2	Sin novedad
11/06/2026	J8995	0010502 0040247	*Leucaena leucocephala*	12,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 111A-243, Autopista Norte	Zona 2	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
11/06/2026	J8996	0010502 0040260	*Senna spectabilis*	11,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 111A-349, Autopista Norte	Zona 2	Sin novedad
11/06/2026	J8997	0010502 0040279	*Leucaena leucocephala*	11,10	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 111A-357, Autopista Norte	Zona 2	Sin novedad
11/06/2026	J8998	0011007 0000261	*Myroxylon balsamum*	7,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 57 N 45-02	Zona 7	Sin novedad
11/06/2026	J8999	0011007 0000306	*Myroxylon balsamum*	8,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 57 N 45-02	Zona 7	Se observo nido activo de torcaza. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
11/06/2026	J9022	0011020 0000231	*Zygia longifolia*	15,30	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 37 N 44, Costado Norte, Rotonda Sandiego	Zona 3	Sin novedad
11/06/2026	J9023	0011020 0000229	*Zygia longifolia*	13,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 37 N 44, Costado Norte, Rotonda Sandiego	Zona 3	Sin novedad
11/06/2026	J8936	0011012 0280023	*Libidibia punctata*	11,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 34-95	Zona 7	Sin novedad
11/06/2026	J8937	0011012 0280024	*Libidibia punctata*	9,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 34-95	Zona 7	Sin novedad
11/06/2026	J8938	0011012 0280028	*Libidibia punctata*	11,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 34-95	Zona 7	Sin novedad
12/06/2026	J9001	0011108 0000748	*Jacaranda mimosifolia*	9,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 76 N 33-05	Zona 4	Sin novedad
12/06/2026	J9002	0011620 0000505	*Cenostigma pluviosum*	10,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 76 N 32F-23	Zona 4	Sin novedad
12/06/2026	J9003	0011620 0000336	*Cenostigma pluviosum*	8,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 76 N 32F-23	Zona 4	Sin novedad
12/06/2026	J9004	0011108 0000759	*Pithecellobium dulce*	15,20	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Calle 33 N 76-29, Separador Vial	Zona 4	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
13/06/2026	J9012	0010522 0000008	*Inga acrocephala*	7,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 entre calle 84 y calle 80	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J9013	0011105 0740173	*Machaerium capote*	4,30	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 80A, Costado Occidental, Cementerio Universal	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J9006	0010706 0000465	*Mangifera indica*	7,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Vial	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J9007	0010715 0740094	*Syzygium malaccense*	8,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Vial	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J9008	0010706 0000468	*Syzygium malaccense*	8,80	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Vial	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
13/06/2026	J9009	0010706 0000467	*Mangifera indica*	7,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 entre la Calle 76 y la Calle 77AC, separador Víal	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J9010	0010706 0000161	*Syzygium malaccense*	10,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 N 76-08 separador central de la vía	Zona 2	Presenta daños mecánicos en diferentes partes y rama reventada, la cual se realiza su corrección
13/06/2026	J9011	0010706 0000146	*Eugenia myrtifolia*	11	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 80 N 76-08, en el separador Víal.	Zona 2	Presenta daños mecánicos en su fuste principal y diferentes ramificaciones, se retira rama de gran tamaño por su alto grado de descomposición con el fin de evitar un accidente. Se recomienda inspección fitosanitaria en 6 meses.
13/06/2026	J8941	0011012 0000823	*Pithecellobium dulce*	15,30	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 30-91, Separador Central	Zona 7	Sin novedad
13/06/2026	J8942	0011012 0000251	*Cenostigma pluviosum*	6,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 30-12, Separador Central	Zona 7	Sin novedad
13/06/2026	J8943	0011012 0000316	*Clerodendrum quadriloculare*	4,70	Categoría I	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 30-12, Separador Central	Zona 7	Sin novedad
13/06/2026	J8944	0011020 0000440	*Pithecellobium dulce*	15,40	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 30-12, Separador Central	Zona 7	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
13/06/2026	J8977	00114040000021	*Cenostigma pluviosum*	10,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Zona 5	Se observo nido inactivo de tortolita y torcaza. Se realiza poda dejando nidos sobre el individuo.
13/06/2026	J8978	00114030000061	*Cenostigma pluviosum*	10,30	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Zona 5	Se observo panal inactivo de angolitas (afectaciones del panal ajeno a nuestra operación), nido inactivo de tortolita y torcaza, se realiza poda dejando panal y nidos sobre el individuo.
13/06/2026	J8979	00114040000024	*Cenostigma pluviosum*	15,30	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Zona 5	Se observo nido activo de torcaza. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
13/06/2026	J8980	00114040000025	*Cenostigma pluviosum*	16,80	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8981	00114040000026	*Cenostigma pluviosum*	16	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 23-44, Separador vial	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8982	00114040000258	*Cenostigma pluviosum*	9,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 25A-45, Separador vial	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8945	00114040000270	*Libidibia punctata*	10,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de corrección	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8946	00114040000254	*Cenostigma pluviosum*	8,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Zona 5	Se observo panal activo de angolitas, se realiza poda sin afectar el panal.
13/06/2026	J8947	00114040000253	*Cenostigma pluviosum*	9,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 19-104, Separador Central	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8948	00114030000271	*Cenostigma pluviosum*	6,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 19-17	Zona 5	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
13/06/2026	J8949	00114040000269	*Cenostigma pluviosum*	11,50	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 19-17, Separador Central	Zona 5	Se observo panal inactivo de quita calzon (se retira panal del árbol), panal activo de angolitas y nido activo de tortolita. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
13/06/2026	J8950	00114030000351	*Handroanthus chrysanthus*	6,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43B N 16B - Costado occidental Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8955	00114030000721	*Cenostigma pluviosum*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B-28, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8956	00114030000722	*Cenostigma pluviosum*	10,20	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B-28, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8957	00114030000723	*Cenostigma pluviosum*	10,60	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8958	00114030000725	*Cenostigma pluviosum*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8959	00114030000726	*Cenostigma pluviosum*	8,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8960	00114030000727	*Cenostigma pluviosum*	9,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16B, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se observo nido activo de torcaza. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
13/06/2026	J8962	0011404 0000430	*Tabebuia rosea*	7,60	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8963	0011404 0000431	*Cenostigma pluviosum*	8,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se observo nido activo de mirla. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
13/06/2026	J8964	0011403 0000359	*Tabebuia rosea*	17,50	Categoría IV	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8966	0011403 0000592	*Cenostigma pluviosum*	8,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 14-57, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Sin novedad
13/06/2026	J8967	0011403 0000154	*Spathodea campanulata*	9,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 14-27	Zona 5	Se observaron dos nidos activos de tortolita. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
13/06/2026	J8972	0011419 0000555	*Terminalia ivorensis*	13,40	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 10-47	Zona 5	Se observaron 3 nidos activos de siriri y uno de tórtola. Se intervino sin afectación de su ciclo reproductivo
13/06/2026	J8939	0011012 0280027	*Libidibia punctata*	9,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 34-95	Zona 7	Sin novedad
13/06/2026	J8940	0011012 0280026	*Libidibia punctata*	11	Categoría III	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 43A N 34-95	Zona 7	Sin novedad
25/06/2026	J8985	0011503 0120065	*Syzygium malaccense*	9,10	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 23A-13, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
25/06/2026	J8986	0011504 0750689	*Mangifera indica*	8,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 65 N 21A-26, Esquina	Zona 6	Sin novedad
25/06/2026	J9037	0011507 0001438	*Zygia longifolia*	6,20	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 52 N 14, Separador Central	Zona 6	Sin novedad

Fecha Ejecución	Consecutivo	Código de árbol	Especie	Altura	Tipo	Tipo de intervención	Ubicación	Zona EMV	Observaciones durante la intervención
25/06/2026	J9038	0011507 0001439	*Libidibia punctata*	6,70	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 52 N 14, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
25/06/2026	J9039	0011507 0002080	*Handroanthus chrysotrichus*	6,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 52 N 14, Separador Central	Zona 6	Sin novedad
25/06/2026	J9057	0010505 0000228	*Leucaena leucocephala*	7,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 104-67	Zona 2	Sin novedad
25/06/2026	J9058	0010505 0000366	*Leucaena leucocephala*	6,00	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 104-67	Zona 2	Sin novedad
25/06/2026	J9059	0010505 0000428	*Mangifera indica*	6,30	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 64C N 104-67	Zona 2	Sin novedad
25/06/2026	J9054	0010729 0140050	*Mangifera indica*	9,40	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 N 63, Detrás de la Universidad Nacional, Avenida Regional, Sentido Norte-Sur	Zona 2	Sin novedad
25/06/2026	J9055	0010729 0140051	*Mangifera indica*	9,50	Categoría II	Poda de mantenimiento, Poda de despunte	Carrera 63 N 63, Detrás de la Universidad Nacional, Avenida Regional, Sentido Norte-Sur	Zona 2	Sin novedad

REGISTRO FOTOGRÁFICO CORTE DE CÉSPED CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

J9017		
Antes	**Durante**	**Después**

		
J9057		
Antes	**Durante**	**Después**
		
J9058		
Antes	**Durante**	**Después**



Los registros fotográficos asociados a la actividad de poda de árboles contienen información de cada sitio referenciado con fotografías panorámicas y presentan coordenadas geográficas, fecha y hora de captura. El respaldo de esta información se encuentra en la carpeta online generada desde EMVARIAS para este contrato y cuyo enlace de acceso, consulta y descarga es el siguiente: Registro fotográfico

Reporte de novedades operativas:



Para este periodo se identificaron 4 (cuatro) novedades operativas, descritas en la siguiente tabla:

Fecha de revisión	Consecutivo	Codigo de árbol	Especie	Altura	Dirección	Zona EMV	Observaciones durante la intervención	Novedad por no intervención
13/06/2026	J8976	00114040000020	*Cenostigma pluviosum*	9,4	Carrera 43A N 22-30, Separador vial	Zona 5	Se encuentra en proceso de defoliación. Se recomienda intervención durante noviembre de 2026	Fenología

Fecha de revisión	Consecutivo	Codigo de árbol	Especie	Altura	Dirección	Zona EMV	Observaciones durante la intervención	Novedad por no intervención
13/06/2026	J8961	00114040000234	*Handroanthus chrysanthus*	7,5	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se encuentra en proceso de defoliación. Se recomienda intervención durante noviembre de 2026	Fenología
13/06/2026	J8965	00114040000226	*Handroanthus chrysanthus*	3,5	Carrera 43A N 16, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se encuentra en proceso de defoliación. Se recomienda intervención durante noviembre de 2026	Fenología
13/06/2026	J8968	00114190000752	*Spathodea campanulata*	9	Carrera 43A N 12-12, Separador vial Avenida Comuna 14 - El Poblado	Zona 5	Se encuentra en proceso de defoliación. Se recomienda intervención durante noviembre de 2026	Fenología

Talento humano, Equipos y Materiales del Componente 2

Por tratarse de una actividad que requiere condiciones técnicas específicas y equipos especiales, además de un talento humano idóneo y certificado para trabajos asociados al uso de motosierras y trabajo en alturas, EMVARIAS S.A E.S.P. para realizar las labores de diagnóstico y poda de árboles se acompaña de aliados expertos en la ejecución de este tipo de actividades; para este caso concreto son:

ITEM	ALIADO	CONTRATO
Poda de árboles	DVB Ingeniería S.A.S.	CW 262730
Interventoría	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	CW 295042

Talento humano para la ejecución del Componente 2

CLASIFICACIÓN	CANTIDAD
Mano de Obra Calificada - MOC (Hombre y Mujeres)	14
Mano de Obra NO Calificada MONC (Hombres y Mujeres)	16
Mano de Obra Calificada MOC - Mujeres	5
Mano de Obra Calificada MOC - Hombres	9
Mano de Obra NO Calificada MONC Mujeres	2
Mano de Obra NO Calificada MONC Hombres	14
TOTAL, MUJERES	7
TOTAL, HOMBRES	23
TOTAL, MUJERES + HOMBRES	**30**
# JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS	4
# PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0
# DE PERSONAS X PRIMERA VEZ EMPLEADAS FORMALMENTE	0
# DE TRABAJADORES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL	0
# DE MUJERES CONTRATADAS RESIDENTES EN MEDELLÍN	4
# DE HOMBRES CONTRATADOS RESIDENTES EN MEDELLÍN	12
# DE MUJERES CABEZA DE HOGAR	2
# DE MUJERES EN VULNERABILIDAD SOCIAL, VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO	1

Vehículos para recolección de residuos vegetales del componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de residuos vegetales:

Placa	Marca	Línea	Modelo	Capacidad Kg	No. Ejes
KOL198	JMC	LVBV3ABB8ME001569	2022	1800	2
ESL734	CHEVROLET	NQR	2018	4600	1
JYM433	JAC	L8	2023	5000	2
LKO736	FOTON	BJ1128VGPEK-F2	2023	5900	2
WFQ934	HINO	427	2018	4050	2

Vehículos para transporte de personal, herramientas y materiales del Componente 2

Para el desarrollo del contrato se cuenta con los siguientes vehículos para el transporte de personal, herramientas y materiales:

Placa	Marca	Línea	Modelo	Tipo
DGT247	SSANGTONG	NEW ACTION SPORTS	2015	CAMIONETA- DOBLE CABINA
WFQ937	HINO	XZU720L-HKFRP	2018	CAMIÓN-FURGÓN

Recursos físicos y materiales del Componente 2.

Para la ejecución del contrato, se dispuso de los siguientes recursos físicos y materiales herramientas y equipos:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
EQUIPO DE ALTURAS	6
MACHETE	12
SEÑALIZACIÓN (Incluye 1 hombres en la vía - 1 Cierre derecha - 1 Cierre a ala izquierda - 2 Conos - Banderero - 1 Pare y siga)	5
MOTOSIERRA MS 250	8
CADENA MOTOSIERRA	8
LIMAS MOTO SIERRA	8
CINTA REFLECTIVA (ROLLOS)	8
LIMA MACHETE	8
KIT ANTIDERRAMES	8
HIPSOMETROS	8
CINTAS DIAMETRICAS	8

Seguridad y Salud en el trabajo:

A todas las personas que participan en la ejecución de las actividades se les suministró los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) necesarios para la ejecución de las actividades de diagnóstico de individuos objeto de poda e intervención posterior.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Ver Documento **Anexo A**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/07/2026	Aportes al sistema de seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje correspondiente al mes de junio 2026	Maricela Vidales Vargas Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 171008-T Designed por Ernst & Young Audit S.A. S

7. INFORME FINANCIERO:

Las condiciones de la ejecución de los recursos del contrato antes de IVA es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR (DESPUÉS DE IVA)
Valor del Contrato	**$ 633.185.259**
Adiciones	**$ 315.500.618**
Total, valor del contrato más adiciones	**$ 633.185.259**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 01	**$ 23.407.515**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 02	**$ 173.448.017**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 03	**$ 7.049.429**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 04	**$ 24.226.559**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 05	**$ 24.343.164**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 06	**$ 51.212.931**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 07	**$ 67.336.037**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 08	**$ 182.864.394**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 09	**$ 54.802.472**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 10	**$ 10.509.195**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 11	**$ 107.004.102**
Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 12	**$ 102.275.981**

Pago solicitado a pagar- ACTA de Pago 13	**$ 56.266.672**
Pagos Realizados a la fecha	**$ 884.746.378**
Porcentaje de ejecución financiera	**93,47%**

8. INFORME JURÍDICO:

El estado de las garantías del contrato es el siguiente:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	4275136	Calidad del Servicio	15–MAY–2025	31–ENE–2027		$ 94.868.587,70
SURAMERICANA	4275136	Cumplimiento	15–MAY–2025	31–ENE–2027		$ 94.868.587,70
SURAMERICANA	013001016461	Responsabilidad Civil Extracontractual	15–MAY–2025	31–AGO–2026		$ 350.181.000,00

9. DOCUMENTOS ANEXOS:

ANEXO A: Certificados Revisor fiscal y Parafiscales de Emvarias

ANEXO B. Permisos utilización de hidrantes junio 2026

ANEXO C: GALERIA_REGISTRO FOTOGRAFICO Ejecuciones junio 2026

ANEXO D: Intervenciones COMPONENTE 1- junio 2026

ANEXO B. Copia oficios con radicados N° 202530021363 del 23 de enero de 2025 y 202530238814 del 29 de mayo de 2025, Radicados N° 202530529749 del 27 de octubre del 2025, Radicados N° 202630018473 del 20 de enero del 2026; aprobación del Plan de Manejo de Transito -PMT por la Secretaría de Movilidad de Medellín_ COMPONENTE N°2

ANEXO E: Carpeta en línea que relaciona las Fichas de diagnóstico de árboles, programaciones y registro fotográfico alojado en servidor, en el cual se evidencian las actividades realizadas durante el periodo reportado. El enlace de acceso a la información del COMPONENTE N°2 es: CONTRATO MOVILIDAD 4600104902 DE 2025
