
	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 6**


CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**6**	**DEL**	17/08/2026	**AL**	22/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	39


AVANCE DEL CONTRATO

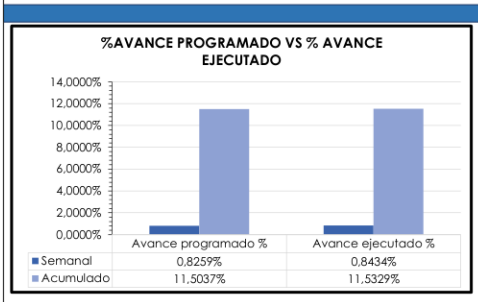

Semanal	Acumulado	
0,8259%	11,5037%	Avance programado %
$ 15.250.657,38	$ 212.428.961,63	Valor programado
0,8434%	11,5329%	Avance ejecutado %
$ 212.967.718,18	$ 212.967.718,18	Valor ejecutado

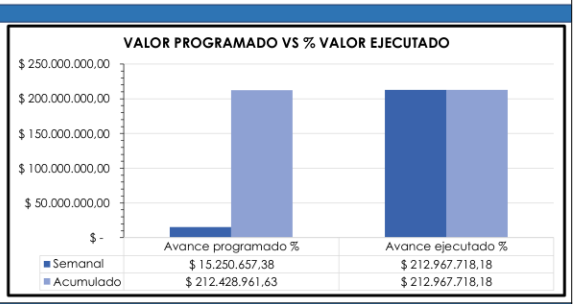

GRAFICA DE AVANCE

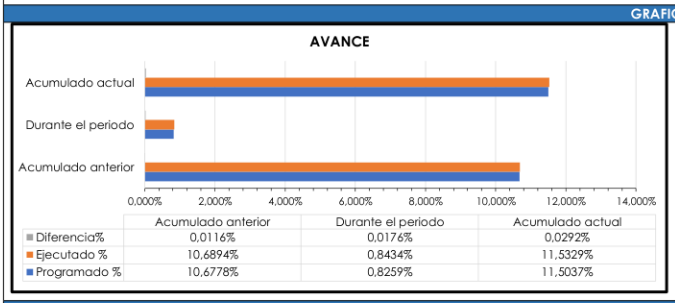

Programado %	Ejecutado %	Diferencia%		
10,6778%	10,6894%	0,0116%	Acumulado anterior	Ok,Adelantados
0,8259%	0,8434%	0,0176%	Durante el periodo	Ok,Adelantados
11,5037%	11,5329%	0,0292%	Acumulado actual	Ok,Adelantados

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
Subtotal					**$ 39.221.436,09**		**2,12%**	**$ 39.221.436,09**
2,0	**CIMENTACIONES**							
2,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
2,1,7	Suministro y colocacion de material seleccionado	m3	23,47	$ 254.992,89	$ 5.983.466,24	23,47	0,3240%	$ 5.983.466,24
2,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
Subtotal					**$ 94.094.346,44**		**5,05%**	**$ 93.210.724,67**
3,0	**ESTRUCTURAS**							
3,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
3,1,5	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para losa del tanque de almacenamiento según despiece estructural, Fy=420 Mpa	kg	69,88	$ 13.791,77	$ 963.835,10	69,88	0,0522%	$ 963.835,10
3,1,6	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para losa del tanque de almacenamiento.	m3	1,50	$ 1.306.138,90	$ 1.959.208,35	1,50	0,1061%	$ 1.959.208,35
3,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
3,2,3	Suministro, figurado e intalación de acero de refuerzo para viga cinta según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289.	Kg	113,04	$ 13.791,77	$ 1.558.968,74	113,04	0,0844%	$ 1.558.968,74
3,2,4	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga cinta de 0,10x0,15m.	m3	4,64	$ 1.547.906,40	$ 7.182.285,68	4,64	0,3889%	$ 7.182.285,68
3,2,5	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para graderia según despiece estructural, Fy=420 Mpa	kg	363,06	$ 13.791,77	$ 5.007.303,19	72,61	0,0542%	$ 1.001.460,64
Subtotal					**$ 82.929.614,98**		**3,83%**	**$ 70.662.109,88**
4,0	**MAMPOSTERÍA**							
Subtotal					**$ 105.187.268,15**		**0,00%**	**$ -**
5,0	**PLACA "PAZ A LO BIEN"**							
Subtotal					**$ 7.771.829,37**		**0,00%**	**$ -**
6,0	**PINTURA Y ACABADOS**							
Subtotal					**$ 18.282.886,57**		**0,00%**	**$ -**
7,0	**CUBIERTA**							
Subtotal					**$ 268.229.847,05**		**0,00%**	**$ -**
8,0	**IMPERMEABILIZACIONES**							
Subtotal					**$ 4.879.736,45**		**0,00%**	**$ -**
9,0	**CARPINTERIA METALICA**							
Subtotal					**$ 39.260.462,35**		**0,00%**	**$ -**
10,0	**ESPACIO PUBLICO**							
Subtotal					**$ 89.073.503,90**		**0,00%**	**$ -**
11,0	**PLAZAS Y ANDENES**							
Subtotal					**$ 696.317.769,43**		**0,00%**	**$ -**
12,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**							
Subtotal					**$ 126.450.174,22**		**0,00%**	**$ -**
13,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
Subtotal					**$ 227.395.176,97**		**0,00%**	**$ -**
	CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP		1,00	$ 13.440.042,00	**$ 13.440.042,00**		**-**	$ -
	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO		1,00	$ 16.794.462,00	**$ 16.794.462,00**	0,29	**0,26%**	$ 4.866.031,78
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		1,00	$ 17.282.430,00	**$ 17.282.430,00**	0,29	**0,27%**	$ 5.007.415,76
	TOTAL ACUMULADO				**$ 1.846.610.986,00**		**11,5329%**	**$ 212.967.718,18**

Realizó.	Revisó.	Supervisó.
ANDRES FERIA AGUIRRE INTERVENTORIA	ADALBERTO SOTOMAYOR RUIZ SECRETRARIO DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	DAVID GONZALES PUENTE SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 6**

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00		
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**6**	**DEL**	17/08/2026	**AL**	22/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	39

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades conrrespondientes a la culminacion del suministro y colocacion del material de relleno en el Edificio de Servicio y en el Area Polivalente.
Igualmente en el Edificio de Servicio se desarrollaron las actividades pertinentes a la figuracion y colocacion del acero de refuerzo de la losa del tanque al igual que la fundicion en concreto de la misma; en el Area Polivalente se desarrollo el figurado del acero de refuerzo de la viga cinta y el concreto de la misma, y se inicio con la figuracion del acero de la graderia.

Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).
