**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Dirección Territorial Amazonía — DTAM

# INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA 2

Periodo: 1 de julio del 2026 al 31 de julio de 2026

Obras de mantenimiento de la Sede Administrativa de la Dirección Territorial Amazonía, Bogotá D.C.

| | |
|---|---|
| **Contrato de obra N°** | NC-CO-342-2026 |
| **Contratante** | Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| **Contratista** | KAXA S.A.S. — NIT 901.590.857-3 |
| **Elaboró** | Jhon Jairo Cárdenas — Residente de Obra |
| **Fecha de elaboración** | Del 1 de julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |

## 1. Descripción general y datos del proyecto

El presente informe corresponde al seguimiento técnico de las obras de mantenimiento de la Sede Administrativa de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) ubicada en la ciudad de Bogotá de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejecutadas en el marco del contrato de obra N° NC-CO-342-2026, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio del 2026 y el 31 de julio de 2026.

| | |
|---|---|
| **Objeto del contrato** | Realizar las obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonía ubicada en Bogotá, en el marco de las sedes mantenidas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional (SC12-3299016-6-041). |
| **Contrato N°** | NC-CO-342-2026 |
| **Contratante** | Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| **Representante contratante** | Julia Astrid del Castillo Sabogal — Subdirectora Administrativa y Financiera |
| **Contratista** | KAXA S.A.S. |
| **NIT** | 901.590.857-3 |
| **Representante legal** | Lissy Maryuri Fernández Montenegro |
| **Ubicación** | Calle 12 C N° 8-79, Piso 2 — Bogotá D.C. (placa de inventario N° 474596) |
| **Fecha de inicio** | 11 de junio de 2026 |
| **Plazo de ejecución** | Dos (02) Meses y quince (15) Días |
| **Fecha de terminación** | 26 de agosto de 2026 |
| **Valor total del contrato** | $ 113.648.554 |
| **Periodo del informe** | 1 de Julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |
| **Modificatorio** | N/A |
| **Fecha Modificatorio** | N/A |
| **CDP** | No° 2726 |
| **C-3299-0900-3-10101C-3299011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL** | $ 2.675.802.095 |

**Alcance general:** las obras contemplan intervenciones de mantenimiento y adecuación distribuidas en doce (12) areas de trabajo dentro del alcance: baños comunes (hombres y mujeres), oficina de dirección, baños internos (hombres y mujeres), auditorio-archivo, cuarto de lactancia, cocina, acceso principal, ventanería interior, sectorización de red eléctrica, pintura, otros y retiro de escombros y aseo general.

**Relación Documentos Presupuestales**

| Vigencia Presupuestal | CDP No. | Fecha CDP | VALOR CDP |
|---|---|---|---|
| ACTUAL | 2726 | 08 de enero del 2026 | $2.675.802.095 |

**Datos Entidad Bancaria Contratista**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| **Bancolombia** | **Ahorros** | **718-000030-30** |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.: 400074226 (Anexo 3 – Referencia 215802)**
**FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2026**
**ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 11/06/2026 | 26/08/2026 | $ 350.181.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 11/06/2026 | 26/08/2026 | $ 350.181.000,00 |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES – PLO | 11/06/2026 | 26/08/2026 | $ 350.181.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 11/06/2026 | 26/08/2026 | $ 350.181.000,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 11/06/2026 | 26/08/2026 | $ 350.181.000,00 |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 400074227 (Anexo 3 – Referencia 215801)**
**FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2026**
**ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/06/2026 | 26/02/2027 | $ 11.364.855,40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/06/2026 | 26/08/2028 | $ 5.682.427,70 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 26/08/2026 | 26/08/2031 | $ 22.729.710,80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11/06/2026 | 26/02/2027 | $ 11.364.855,40 |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $113.648.554 |
| VALOR TOTAL ACTA 1 | $ 45,525,310 |
| VALOR TOTAL ACTA 2 EN PROCESO DE PAGO | $ 56,758,389 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR | $ 11,364,855 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 41,740,116 |
| SALDO POR LIBERAR | $ 0,00 |

**2. Seguimiento y reporte de avance por áreas de trabajo**

A continuación, se relaciona el avance de las actividades programadas para cada uno de los frentes de trabajo con corte al 31 de julio de 2026, describiendo las actividades desarrolladas durante el periodo del informe.

Durante la ejecución del contrato No NC-CO-342-2026 se dio alcance a las actividades establecidas dentro del marco contractual, según la autorización de intervención de areas

realizadas por supervisión, durante el desarrollo del alcance el contratista de obra evidencio la necesidad de plantea ítems o actividades no previstas aquellas que, no fueron contempladas en el proyecto ni en la oferta económica inicial, sin embargo, se evidencio la necesidad de que se incluyan para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario realizar la respectiva solicitud a supervisión para ajustar el alcance del presupuesto (Balance presupuestal y financiero) debido a que las cantidades de las áreas presentaron mayores y menores cantidades, así como la inclusión de cinco (5) ítems no previstos, los cuales no fueron motivo de adición, por ausencia de recursos disponibles por parte de la entidad. A continuación, se relacionan las descripciones de los ítems no previstos:

| NP | ITEMS NO PREVISTOS |
|---|---|
| NP(01) | Desmonte y reinstalación de divisiones metálicas de baños internos (se reinstalan las MISMAS divisiones existentes; no incluye suministro de división nueva) |
| NP(02) | Suministro e instalación de piso en granito fundido en sitio (triturado + cemento gris) por metro lineal. Incluye fundida, pulida y |
| NP(03) | Suministro e instalación de Pañete de Mortero en paredes Baños internos mujeres y hombres |
| NP(04) | Suministro y aplicación de filos en mortero para el marco de puertas por metro lineal - cocina |

Como resultado de estas actividades, fue necesario llegar a un mutuo acuerdo con supervisión, para prescindir de la ejecución de ciertas actividades relevantes dentro del contrato como son el suministro e instalación de la estufa eléctrica de 4 puestos, la mesa plegable y los días de aseo general, junto con actividades que se redujeron debido a menores cantidades.

Por último, se presentaron diferencias en mayores cantidades como en el caso de la instalación del mesón en granito, ya que, al corroborar las medidas tomadas en sitio, no correspondían al metraje estimado en la oferta económica inicial.

La solicitud de ítems no previstos, se fue evidenciando según el orden en el que fueron brindados los accesos a intervenir las áreas de trabajo.

### 2.2 Oficina de Dirección

**Programación:** Programado del 15 al 17 de junio de 2026.

Se realizo el desmonte e instalación del lavamanos de la dirección como parte de los acuerdos establecidos en la celebración de la reunión del 27 de Julio del 2026 en acompañamiento de la supervisión del contrato, en donde se informó de la necesidad de balancear el alcance del contrato, debido a las cantidades recolectadas en sitio.

Por otro lado, en la oficina de dirección, también, se le realizo la pintura interna y la del techo del baño, junto con el cobro del excedente que no se autorizó cobrar por parte de supervisión en la primera acta debido a que superaba la cantidad estimada en la versión inicial del presupuesto.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | Desmonte de lavamanos | Und | 1 |
| 2,07 | Suministro e instalación de Lavamanos Caxbri + Griferia Alta Cromo+desague | Und | 1 |
| 2,08 | Desmonte de vidrio (rejilla de ventilación) | m² | 0,19 |
| 2,09 | Suministro e instalación de rejilla de ventilación para baño | m² | 0,19 |

### 2.3 Baños internos (hombres y mujeres)

**Programación:** Programado del 17 de junio al 13 de julio de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó el desmonte, suministro e instalación del mesón en granito y los lavamanos de los baños internos de hombres y mujeres, junto con la instalación de los puntos de iluminación establecidos contractualmente.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 3,06 | Desmonte del salpicadero del lavamanos | m² | 2,57 |
| 3,14 | Suministro e instalación de Lavamanos Caxbri + Griferia Alta Cromo+desague | Und | 6,00 |
| 3,15 | Suministro e instalación de Mesón lavamanos 0,55m x 2,83m x 0,32m de alto | m² | 5,07 |
| 3,19 | Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo LED de empotrar de 12W redonda luz calida, cableado, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP). | Und | 10,00 |

### 2.4 Auditorio - Archivo

**Programación:** Programado del 13 de junio al 17 de julio de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó la entrega de tres (3) puntos de iluminación que no se pudieron cobrar inicialmente en el Acta N°1 porque superaba la cantidad estimada inicialmente en el contrato, una vez formalizado el balance, realizamos el proceso de solicitud de cobro respectivo.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 4,03 | Suministro e instalación de Punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria panel LED 60x60 cm, cableado, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP). | m² | 2,57 |

### 2.5 Cuarto de lactancia

**Programación:** Programado del 15 de junio al 2 de julio de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó el cobro del ventanal que se comparte dentro del cuarto de lactancia y cocina, es importante enfatizar que hay una parte de la ventana que se encuentra cubierta por el muro divisorio, sin embargo, se ajustó para incluirse así como los respectivos desperdicios de la división.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 5,02 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio tipo pesado cal. 24 (38/31 para sistemas fijos y 80/25 para sistema corredizo de alumina, con sellador climatico tipo sowsill o equivalente) + vidrio templado 6mm incoloro borde pulido y brillado). Incluye fijo superior y a un lado (cuarto de Lactancia) | m² | 0,20 |

### 2.6 Cocina

**Programación:** Programado del 15 de junio al 2 de julio de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó la ejecución del desmonte e instalación del piso, cobro del ventanal que se comparte dentro del cuarto de lactancia y cocina, es importante enfatizar que hay una parte de la ventana que se encuentra cubierta por el muro divisorio. Los valores asociados al desmonte del mesón fueron asumidos por el encargado del mantenimiento de la sede territorial.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 6,01 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio tipo pesado cal. 24 (38/31 para sistemas fijos y 80/25 para sistema corredizo de alumina, con sellador climatico tipo sowsill o equivalente) + vidrio templado 6mm incoloro borde pulido y brillado). Incluye fijo superior y a un lado (cuarto de Lactancia) | m² | 0,20 |
| 6,04 | Suministro e instalación de Enchape piso cerámico tipo vancouver corona o equivalente formato de 60x60 cm. Color a convenir por la dirección territorial, incluye pegante tipo pegacor o similar y sellado de juntas con Sika Binda Boquilla color o similar. | m² | 23,20 |

### 2.7 Acceso Principal

**Programación:** Programado del 17 de julio al 5 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó la instalación del acceso biométrico, en acompañamiento del profesional encargado de mantenimiento, quien dio visto bueno de la instalación de este.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 7,03 | Suministro e instalación de Acceso biométrico | Und | 1,00 |

### 2.8 Ventaneria Interior

**Programación:** Programado del 17 de Julio del 2026 al 5 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:** Se suministró y aplicó en la ventanería de la sede internamente esmalte para metal, incluyendo masilla, lijado y anticorrosivo.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 8,01 | Suministro y aplicación de Esmalte para metal, incluye masilla (donde se requiera), lijado y anticorrosivo. | M2 | 90,50 |

### 2.9 Sectorización eléctrica

**Programación:** Programado del 17 de Julio del 2026 al 5 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:** Se suministro e instaló de los cables negro, blanco y verde, tubería EMT ½" necesarios para sectorizar la iluminación en el sector del área designada para el fondo para la vida.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 9,01 | Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color negro. Con normatividad vigente (RETIE) | ML | 6,50 |
| 9,02 | Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color blanco. Con normatividad vigente (RETIE) | ML | 6,50 |
| 9,03 | Suministro e instalación Cable No. 12 THHN / THWN color verde. Con normatividad vigente (RETIE) | ML | 6,50 |
| 9,04 | Suministro e instalación de Tubo EMT 1/2", incluye instalación de tubo, adaptadores, uniones, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Con normatividad vigente (RETIE). | ML | 6,50 |
| 9,05 | Suministro e instalación de punto para interruptor sencillo completa, (blanco), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | Und | 2 |

### 2.10 Pintura

**Programación:** Programado del 5 de agosto al 22 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:** Se ejecutó la aplicación de resanes, pintura interior sobre muros y cielorraso a 2 manos. Es importante mencionar que, teniendo en cuenta el incremento del alcance previsto, fue necesario de acuerdo a solicitud de la entidad en recorridos de obra, que se le diera prioridad en cantidades ejecutadas a la pintura interna sobre muros de las oficinas donde hay puestos de trabajo de funcionarios públicos, lo anterior debido a que el presupuesto estaba muy ajustado de acuerdo con el avance en el balance.

Asi las cosas, se balanceó el contrato, para darle alcance a todos los muros internos y techos, sin embargo, por la falta de recursos y el balanceo de cantidades, no alcanzó el presupuesto inicial para hacer la pintura externa del acceso frente a ascensores, por lo cual, el supervisor, indicó que sería parte de actividades que tendrán que ejecutar en otro contrato o en su defecto, con recursos que se gestionen posteriormente.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 10,01 | Suministro y aplicación de Resane, pintura interior sobre muros a 2 manos (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 361,39 |

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 10,02 | Suministro y aplicación de Resane y pintura interior de cielorraso 2 manos (Incluye resanes generales, filos y dilataciones) | M2 | 158,38 |

### 2.11 Otros

**Programación:** Programado del 5 de agosto al 22 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Se realizó el suministro e instalación del panel de fibra mineral para cielorraso de 60x60 cm, el cual sirvió para poder subsanar el desmonte del cielo raso que estaba flotando hacia la puerta del acceso principal, que fue desmontado cuando se realizó el cambio de la puerta de acceso principal en vidrio.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 11,01 | Suministro e instalación de panel fibra mineral para cielorraso de 60x60 cm | m² | 4,00 |

### 2.12 Retiros de Escombros y Aseo

**Programación:** Programado del 5 de agosto al 22 de agosto de 2026 (en ejecución).

**Actividades desarrolladas en el periodo:**

Debido a que se realizó la demolición de enchapes de los baños internos, cocina, cielo rasos, divisiones y vidrios, fue necesario realizar la extracción de otros 7 metros cúbicos para el segundo mes de ejecución.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| 12,01 | Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados y certificados. (No incluye asbestocemento) | m2 | 7 |

Dentro del balance por ausencia de recursos fue necesario no realizar el aseo general para entrega de obra, lo anterior, ya que, todas las áreas se encuentran en constante aseo, de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios públicos y supervisión.

### 2.13 Items No previstos

**Programación:** Inmediatamente posterior a la aprobación formal de los ítems.

**Actividades desarrolladas en el periodo:** Debido a que el área de disposición de RCD autorizada es pequeña, ya se ha dispuesto escombros, se proyecta que tendremos que sacar más en el siguiente corte parcial de obra.

| Ítem | Actividad programada | Unidad | Cantidad ejecutada periodo Acta N°2 |
|---|---|---|---|
| NP(01) | Desmonte y reinstalación de divisiones metálicas de baños internos (se reinstalan las MISMAS divisiones existentes; no incluye suministro de división nueva). | m2 | 14,52 |
| NP(02) | Suministro e instalación de piso en granito fundido en sitio (triturado + cemento gris), por metro lineal. Incluye fundida, pulida y brillado. | ML | 3 |
| NP(03) | Demolición cerámica piso - cocina | m2 | 23,20 |
| NP(04) | Suministro e instalación de Pañete de Mortero en paredes Baños internos mujeres y hombres | m2 | 63,27 |
| NP(05) | Suministro y aplicación de filos en mortero para el marco de puertas por metro lineal - cocina | ML | 5,45 |

## 3. Registro fotográfico

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los procedimientos constructivos y actividades ejecutadas en obra durante el periodo del informe. Fuente Propia.

### 3.1 Baños comunes (hombres y mujeres)

Baños Hombres Comunes



Baños Mujeres Comunes



## 3.2 Oficina de Dirección








### 3.3 Baños internos (hombres y mujeres)

Mujeres





Hombres







### 3.4 Auditorio – Archivo





### 3.5 Cuarto de lactancia



### 3.6 Cocina




### 3.7 Acceso principal



### 3.8 Mantenimiento de Ventaneria Interna




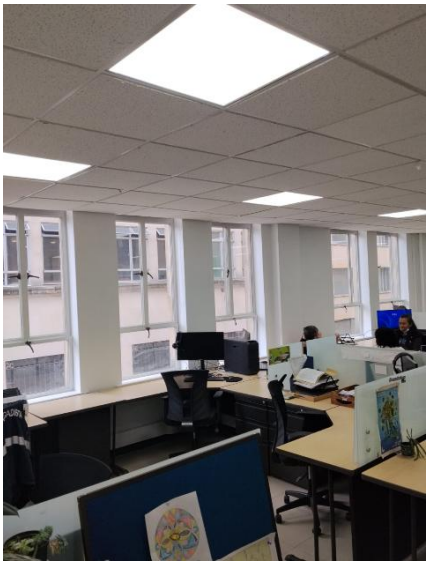



## 3.9 Sectorización Red Eléctrica




## 3.10 Pintura

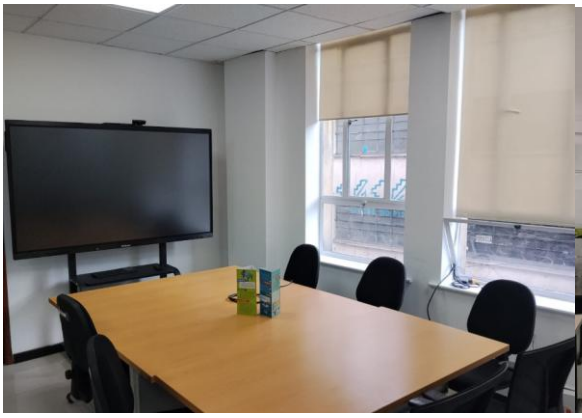

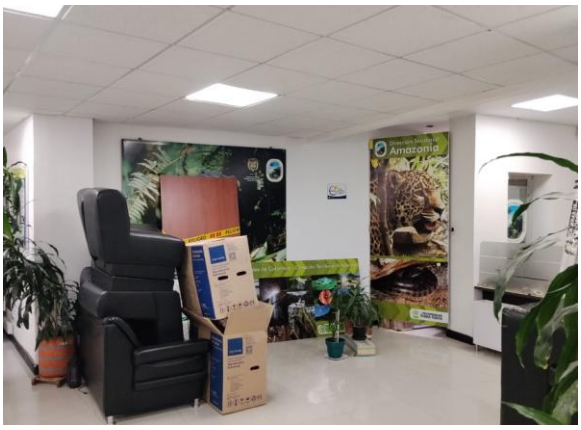


## 3.11 Otros



### 3.12 Retiro de escombros y aseo

| | |
|---|---|
| VECOAGREINT S.A.S | **CONSTANCIA DE GESTIÓN** |

| | |
|---|---|
| **MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 REGISTRO DE GESTOR CAR No.54** | **APROBADO MEDIANTE PIN TRATA-27144 REGISTRO IDU 683 de 2023 Y 687 de 2023** |

| **1. DATOS DEL GENERADOR** | |
|---|---|
| Nombre del proyecto (obra) | REMODELACION CLL 12 |
| Nombre o razón social | KAXA SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901590857-3 |
| Representante Legal | LISSY MARYURI MONTENEGRO FERNANDEZ |
| Dirección domicilio | CLL 12 C No 8-79 P 2 |
| Teléfono | 316 579 5189 |
| Correo electrónico | byb.demoliciones.sas@gmail.com ; g.proyectos.bybdemoliciones.sas@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CLL 12 C No 8-79 P 2 |
| PIN-GEN | N/A |

| **3. GESTIÓN INTEGRAL RCD** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR | Punto Limpio | | Disposición Final | | Recuperador Especifico | |
| | Receptor | | Planta de Tratamiento y Aprovechamiento | X | Otro ¿Cuál? | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro CAR No.** | 54 | **Datos del Gestor** | |
| **Fecha de recepción RCD** | **julio-26** | **Nombre o Razón Social** | VECOAGREINT SAS |
| | | **Identificación o NIT** | 901660184-6 |
| | | **Representante Legal** | YEIMEN GAONA BAUTISTA |
| | | **Dirección** | AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2 VÍA PARCELAS, 500M COSTADO IZQUIERDO |
| | | **Municipio** | COTA |
| | | **Teléfono de contacto** | 3143949448 |
| | | **Correo Electronico** | vecoagreintsas@gmail.com |

| **VEHÍCULO** | **TIPO DE MATERIAL** | **CANTIDAD m3** | **CANTIDAD (Ton)** |
|---|---|---|---|
| **Volqueta Doble** | **Otros residuos pétreos** | **7,045** | **10,36** |
| | Total RCD Dispuesto | **7,045** | **10,36** |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del representante legal gestor | YEIMEN GAONA BAUTISTA | REPRESENTANTE LEGAL VECOAGREINT SAS |
| CC: 79761226 | FIRMA | |

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.
Nota: La información suministrada en este certificado referente al generador, lugar de procedencia, obra y demás datos asociados al origen de los RCD´S, es suministrada por el cliente a VECOAGREINT S.AS.; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de VECOAGREINT S.A.S, declara y garantiza a VECOAGREINT S.A.S. que la información suministrada es veraz, completa y exonera a VECOAGREINT S.A.S. de toda responsabilidad con respecto a la misma. Esta certificación se emite en el marco del convenio de colaboración suscrito entre VECOAGREINT S.A.S. e INAR – Industria Nacional de Agregados Reciclados, mediante el cual se articula la operación técnica de la planta de aprovechamiento conforme a lo establecido contractualmente, sin que ello implique modificación alguna en los registros y obligaciones ambientales vigentes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consecutivo para verificación del certificado | VEAG | 879 | de | 2026 | |

## 3.13 Items No previstos











## 4. Bitácora / libro de obra

La copia de la bitácora o libro de obra correspondiente al periodo se adjunta al presente informe. Ver Anexo A — Copia de la bitácora de obra.

## 5. Actas de comité semanal

Durante el periodo se realizaron los comités de obra con la participación del contratista, la supervisión y el personal técnico. Las actas debidamente suscritas por los asistentes se relacionan a continuación y se adjuntan al presente informe (Anexo B).

| Acta N° | Fecha | Asistentes |
|---|---|---|
| 01 | 25 de Mayo del 2026 | KAXA S.A.S, Supervisión, Apoyo a la supervisión |
| Acta de Inicio | 11 de Junio del 2026 | KAXA S.A.S, Supervisión, Apoyo a la supervisión |
| 02 | 17 de Junio del 2026 | KAXA S.A.S, Supervisión, Apoyo a la supervisión |
| 03 | 1 de Julio del 2026 | KAXA S.A.S, Supervisión, Apoyo a la supervisión |
| 04 | 27 de Julio del 2026 | KAXA S.A.S, Supervisión |

## 6. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)

El informe de seguridad y salud en el trabajo del periodo, elaborado por el profesional en SST, se adjunta como Anexo C. En él se detallan las inspecciones de seguridad, uso de elementos de protección personal, charlas diarias (cinco minutos), matriz de peligros y demás actividades del sistema de gestión de SST desarrolladas en obra.

## 7. Informe de manejo ambiental

Durante el periodo se dio cumplimiento a las medidas de manejo ambiental aplicables a la obra. Los escombros y residuos de construcción y demolición (RCD) generados por los desmontes y demoliciones fueron acopiados temporalmente en un sitio delimitado dentro de la obra, clasificados y dispuestos con transportadores autorizados hacia sitios de disposición final certificados. Se implementaron medidas de orden y aseo, manejo de residuos ordinarios y reciclables, control de material particulado y protección de las áreas aledañas de trabajo. El Informe del numeral se encuentra dentro del informe SST y ambiental Anexo C.

## 8. Programación de Obra

La programación fue ejecutada a satisfacción, previo a la terminación del plazo contractual definido.

## 9. Relación del personal empleado en la obra

Se relaciona el personal empleado en la ejecución de la obra durante el periodo del informe:

| Nombre | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| Jovanny Romero | Técnico / Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |

| Nombre | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| Jhon Jairo Cárdenas | Residente de Obra | 1 julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |
| Fabio Nelson Corredor | Maestro | 1 julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |
| Julio Cesar Muñoz | Ayudante | 1 julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |
| Victor Mauricio Sierra Martinez | Contratista | 1 julio del 2026 al 31 de julio de 2026 |

**10. Acreditación de pago de aportes parafiscales y seguridad social**

La acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda, se adjunta como Anexo E, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**12 balance del contrato**

El balance del contrato de acuerdo con los recursos presupuestales asignados se presentó, junto con el acta de ítems no previstos y respectivas cotizaciones.

## 13. Relación de anexos

**Anexo A.** Copia de la bitácora / libro de obra

**Anexo B.** Actas de comité semanal suscritas

**Anexo C.** Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)

**Anexo D.** certificados de disposición

| | |
|---|---|
| Representante Legal<br>KAXA S.A.S | Supervisor<br>Parques Nacionales Naturales de Colombia |

KAXA SAS
INGENIERIA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Miercoles, 1 de Julio 2026 | Quedan | 55 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Dias |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | instalación de enchape lijado ventaneria |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se recibe material de enchape de pared, se solicita en el grupo de whatsapp confirmación de distribución del piso y pared en baños internos.
- Se instala enchape, se verifica medidas del orinal de comunes y baño interno
- Se prepara superficie de ventaneria en oficina Profesional 18.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 22 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Jueves, 2 Julio 2026 | Quedan | 54 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:00 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | lijado de ventaneria instalacion de enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se instala enchape en muros y pisos baños
- Se avanza en lijado de Ventaneria Asistencia tecnica

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 23 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes, 3 Julio 2026 | Quedan | 53 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | lijado ventaneria instalacion enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se instala enchape en muros y pisos baños
- Se avanza en lijado de Ventaneria

Almacen - Bodega

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 24 de 70

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Direccion Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Sabado, 4 de Julio 2026 | Quedan | 52 |
| FECHA INICIO: | 14/06/2026 | | Dias |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | instalacion de enchape aplicacion anticorrosivo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua lijando en oficina profesional 18; por la ventaneria
- Se instala enchape de pisos y muros baños
- Se pinta techos baños de mujeres.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | domingo, 5 de Julio 2026 | Quedan | 51 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/06/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7 | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo el Domingo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 26 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Lunes, 6 de Julio de 2026 | Quedan | 50 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Aplicacion de anticorrosivo, instalación de enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua con la instalación de enchape en Baños.
- Se aplica anticorrosivo en ventaneria Almacen - Bodega
- Se embaquilla Baños internos.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 27 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Martes 7 Julio 2026 | Quedan | 49 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Dias |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Emboquillado aplicacion anticorrosivo enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua con la instalación de enchape en Baños
- Se aplica anticorrosivo en ventaneria Profesional 18
- Se emboquilla baños internos y se verifica lo necesario para ajustar Orinal en baños Comunes

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicado en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Miercoles 8, Julio 2026 | Quedan | 48 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 5 | Aplicar Pintura esmalte instalación de filtro UV en archivo instalación Acceso Biometrico |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se instaló el orinal en Baños Comunes
- Se instaló la pelicula de filtro UV en el almacen del auditorio principal.
- Se continua con la instalación de enchape baños internos y embaquillado
- Se instalo Biometrico en la noche con visto bueno del profesional encargado de mantenimiento y por supervisión.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Jueves 9 de Julio 2026 | Quedan | 47 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Resane techos Baños embaquillado resane muros en altura Instalacion enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Personal | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua con la instalación de enchape en Baños.
- Resane de techos en baños, embaquillado
- Anticorrosivo y pintura se aplico en la ventana del baño de Mujeres
- Pintura en techo baños.

| Elaboro: | Aprobacion PNNC: |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes 10 Julio 2026 | Quedan | 46 |
| FECHA INICIO: | 7/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Resane y pintura de techos instalación de enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Aplicación de pintura en techos y muros en poceta lavatraperos dentro baño de mujeres.
- Instalación de enchape en Baños

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicado en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Sabado 11 Julio 2026 | Quedan | 45 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Aplicación esmalte en ventaneria<br>Instalación de divisiones metalicas<br>Instalación enchape |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua con la aplicación de esmalte pintura en ventaneria
- Se continua con la instalación de enchape
- Se verificó lo necesario para realizar el montaje de las divisiones metalicas existentes

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Domingo, 12 Julio 2026 | Quedan | 44 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabaja por ser domingo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Lunes festivo 13 Julio 2026 | Quedan | 43 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | festivo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo por ser lunes festivo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Martes, 14 de Julio 2026 | Quedan | 42 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 3 | Instalacion de enchape Sectorización electrica iluminación baños instalacion de sanitarios. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continuó con la instalación de enchape
- Se instalaron sanitarios en Baños internos.
- Se solicito aprobación a la supervisión para la compra de la iluminación en los baños internos ; asi mismo, se realizo trabajo en la sectorización electrica e interruptores
- Se instalaron las divisiones, previa socialización con supervision de la actividad y la ~~necesidad de la~~ actividad no prevista inicialmente

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

## PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonía ubicada en Bogotá* | | |
| **NO. RADICADO:** | **SC12-3299016-6-041** | | |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| **FECHA HOY:** | miércoles 15 de julio de 2026 | *Quedan* | *42* |
| **FECHA INICIO:** | 11/06/2026 | | |
| **FECHA FIN:** | 26/08/2026 | | *Días* |
| **HORA INICIO ACTIVIDADES** | | **HORA FIN ACTIVIDADES** | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Instalación de sanitarios, enchape de baños internos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Total Personal*** | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Se realiza verificación de avance de actividades, donde se evidencia que en el baño interno de las mujeres se encuentran instalado los 3 sanitarios, con las divisiones y el enchape de piso y pared al 100%, quedando pendiente la instlación de las luminarias, meson de lavamanos y lavamanos. En cuanto a el baño interior de hombres, se evidencia un 99% de avance en la instalación de enchape de piso y pared, estan instalando las divisiones de los baños, queda pendiente la instalación de sanitarios, orinales y luminarias, al igual que el meson y el lavamanos, adicionalmente, se evidencia la instalación del acceso biometrico. Se realiza la recomendación del ajuste de la ventana del cuarto de lactancia, la instalación del sanitario y lavamanos de la oficina de la directora.**

| ***Elaboro:*** | ***Aprobacion PNNC:*** |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Jueves 16 Julio 2026 | Quedan | 41 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Instalación orinales y sanitario desmonte sanitario iluminacion baños |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó el desmonte e instalación del sanitario de la oficina de dirección.
- Se ejecutó tambien la instalación de los orinales del baño de hombres internos.
- Se adecuo e instaló los puntos de iluminación con todo lo necesario para su funcionamiento
- El profesional de mantenimiento manifesto que los sensores los reutilizaran porque estaban buenos

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERIA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 35 de 45

## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes, 17 Julio 2026 | Quedan | 40 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Enbaquillado<br>Aplicación esmalte<br>instalación enchape |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Personal | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la parte final del enchape en baños de hombres.
- Se resano pintura en muros baño de hombres
- Se pinto con pintura de esmalte ventanería por Almacen-Bodega
- El profesional de mantenimiento realizo el desmonte del mesón de la cocina ↳ de la supervisión

| Elaboro: | Aprobacion PNNC: |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 36 de 75

## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Sabado, 18 Julio 2026 | Quedan | 39 |
| FECHA INICIO: | 19/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 2:00 pm |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura techo baño Hombres |
| | | Demolición piso Cocina |
| | | Aseo |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Personal | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la demolición del piso y Aseo
- Se verifica el funcionamiento del sifon del lavamanos, es decir, se destapó.
- Se continuó con la pintura en techo del baño de hombres y muros blancos.

| Elaboro: | Aprobacion PNNC: |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 37 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Domingo 19 Julio 2026 | Quedan | 38 |
| FECHA INICIO: | 11/04/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | Días | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo el domingo.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 38 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Lunes festivo 20 Julio 2026 | Quedan | 37 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/26 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo por ser festivo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 31 de 75

## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Martes 29 Julio 2026 | Quedan | 36 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Mejoramiento superficie piso cocina<br>Lijado ventanas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua con el lijado de ventanería en Areas de Asistencia tecnica.
- Se prepara la superficie para garantizar el pegante ceramico en el piso de la cocina

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 10 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes 22 Julio 2016 | Quedan | 35 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2016 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2016 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Resane, pintura general, Lijado ventaneria |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se avanzo en lijado y Anticorrosivo de la Ventaneria en el auditorio de Almacen.
- Se resaró muros para aplicar pintura en pasillos y Cocina.

| *Elabora:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| **NO. RADICADO:** | **SC12-3299016-6-041** | | |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| **FECHA HOY:** | Jueves 23 Julio 2026 | *Quedan* | 34 |
| **FECHA INICIO:** | 11/06/2026 | | *Días* |
| **FECHA FIN:** | 26/08/2026 | | |
| **HORA INICIO ACTIVIDADES** | 7:30 am | **HORA FIN ACTIVIDADES** | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura cableado e interruptores |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo el cableado y puesta punto de los interruptores en el pasillo entre asistencias tecnicas.
- Continuan realizando Aplicación de Anticorrosivo en Asistencia tecnica.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes, 24 Julio 2026 | Quedan | 33 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Aplicacion de anticorrosivo<br>Resane muros<br>Meson lavamanos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua con el mejoramiento de la Superficie de las ventanas, aplicando anticorrosivo en ventaneria de Asesores de la dirección.

- Se resanaron muros en Asistencia tecnica y de Asesores dirección

- Se instalaron Anclajes ó Pie de amigos para el meson en granito de los Baños, queda pendiente un pie porque se daño la broca.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Sabado 25 julio 2026 | Quedan | 32 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Dias |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 2:00 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo pintura en Asistencia Tecnica y Asesores de dirección.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Domingo 26 Julio 2026 | Quedan | 31 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | Días |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo por ser domingo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
NIT. 901.590.857-3

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Lunes 27 Julio 2026 | Quedan | 30 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura almacen |
| | | Instalacion piso |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo la instalación del enchape de piso
- Pintura Almacén en muros por escritorios

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Martes 28 Julio 2026 | Quedan | 29 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura, Resane |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo embaquillado y resane en cocina de muros.
- Preparación de Superficie en Humanas Sala de espera para resanar.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 17 de 35

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Miercoles 29 Julio 2026 | Quedan | 28 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Lijado Resane techos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo el resane de techo en Humaras
- Se ajustó la humedad; Sin embargo, dentro del alcance no esta impermeabilización.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Jueves 30 Julio 2026 | Quedan | 27 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo la pintura del sector de Humanas y Sala de espera.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Viernes 31 Julio 2026 | Quedan | 26 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continuó con la pintura en Humanas y Resane. de muros.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**

Hoja 50 de 75

## INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Sabado 1 Agosto 2026 | Quedan | 25 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 2:00 pm |

## PERSONAL EN OBRA

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 3 | Pintura y resanes meson y marmol |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó el Acabado en Pintura de techos en Humanas y Sala de espera.
- Se Ingresa el material que se utilizara en los mesones de los baños comunes de marmol.

| *Elabora:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

## PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá



| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Domingo 2 Agosto 2026 | Quedan | 24 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | | HORA FIN ACTIVIDADES | |

**PERSONAL EN OBRA**

| *Cargo* | *Cantidad* | *Actividad* |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- No se trabajo por ser domingo

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

## PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá

Hoja 52 de 75

| INFORMACION GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Lunes 3 Agosto 2026 | Quedan | 23 |
| FECHA INICIO: | 11/06/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Resane muros |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se realizo el resane de muros en el pasillo frente a cuarto de lactancia.

- Se realizó recorrido en compañia del Arq. Carlos Leonardo Abril Supervisor

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

KAXA SAS
INGENIERÍA EMERGENTE
SINCE 2022

**KAXA S.A.S.**
**NIT. 901.590.857-3**

# BITACORA DE OBRA

**PNNC - Dirección Territorial Amazonia - Sede Bogotá**



**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | *Obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonia ubicada en Bogotá* | | |
| NO. RADICADO: | SC12-3299016-6-041 | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 12C No. 8 - 79 - Piso 2 | | |
| FECHA HOY: | Martes 4 Agosto 2026 | Quedan | 22 |
| FECHA INICIO: | 11/08/2026 | | Días |
| FECHA FIN: | 26/08/2026 | | |
| HORA INICIO ACTIVIDADES | 7:30 am | HORA FIN ACTIVIDADES | 5:30 pm |

**PERSONAL EN OBRA**

| Cargo | Cantidad | Actividad |
|---|---|---|
| KAXA S.A.S | 2 | Pintura<br>Resane<br>marmol lavamanos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Total Personal* | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Se continua trabajando en resane de muros y pintura del cuarto de lactancia y pasillo.

- Se esta trabajando en la instalación de un soporte longitudinal en el frontal para garantizar estabilidad del mismo, en los mesones de marmol de los lavamanos.

| *Elaboro:* | *Aprobacion PNNC:* |
|---|---|
| Ing Residente - KAXA S.A.S | Parques Nacionales Naturales de Colombia |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: A4_FO_01 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 19/12/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| No Acta: 001 | Dependencia: Grupo de Infraestructura | Fecha (dd/mm/aaaa): 27/05/2026 |

**EQUIPO DE TRABAJO:**

| |
|---|
| Carlos Leonardo Abril |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| Intervenciones 2026 |

**TEMAS A TRATAR:**

| |
|---|
| 1. Presentación |
| 2. Socialización de actividades |
| 3. Logística |
| 4. Compromisos |

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

| No. Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | Se desarrolla la reunión en compañía del Contratista de Obra, Supervisor y apoyo GI PNN. Acompaña Oscar Muñoz, Técnico de infraestruter. DTAM. |
| 2. | Se realiza recorrido para la revisión general de las actividades a ejecutar y se programa visita con maestro de obra para lunes 01/06 |
| 3. | Se podrá trabajar de lunes a viernes en horario de oficina sin ruido. Si se requieren demoliciones despues de las 5pm y sábados y domingo. |
| 4. | Se programe visita para el lunes 01 de junio para revisar cantidades y generar un balance inicial. |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---|---|---|
| 1. Revisar tipo de certificación final | Supervisor PNN | 01/06/2026 |
| 2. Entrega documentación inicial | Contratista | 01/06/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: A4_FO_01 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 19/12/2023 |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD | FIRMA (Informar en caso de ser virtual) |
|---|---|---|
| Carlos Leonardo Abril | SAF -GI | |
| Juan Carlos Ramoncio Rosocancio | SAF-GI | |
| Erika Bustos Ruiz | SAF-GI | Erika Bustos |
| Liliana Barrera G. | KAYA. | |
| Oscar Muñoz | DTAM | |
| | | |

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**

Extensión del documento

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE INICIO DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | BOGOTÁ D.C., 11 DE JUNIO DE 2026 |
| **CONTRATANTE** | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| **NÚMERO CONTRATO DE OBRA** | CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-342-2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO** | SC12-3299016-6-041 Realizar las obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Dirección Territorial Amazonía ubicada en Bogotá, en el marco de las sedes mantenidas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional. |
| **CONTRATISTA** | KAXA SAS<br>NIT: 901590857-3<br>R/L: LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($113.648.554) M/CTE |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | La sede se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, específicamente en la Calle 12 C No.8-79, Piso 2. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **SUPERVISIÓN** | CARLOS LEONARDO ABRIL BARRERA<br>Supervisor – Parques Nacionales Naturales de Colombia<br>ERIKA BUSTOS RUIZ<br>Apoyo a la supervisión - Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| **FECHA DE INICIO** | 11 DE JUNIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 25 DE AGOSTO DE 2026 |
| **NUMERO DE PLACA DE INVENTARIO** | Sede Administrativa Dirección Territorial Amazonía - 474596 |

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE INICIO DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| (Aplica para mantenimiento) | |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de inicio del objeto del **CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-342-2026** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

En consecuencia, se procede al inicio de la misma, el día **11 de junio de 2026**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

***EL CONTRATISTA***

**LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO**
Representante Legal
Kaxa S.A.S

***EL SUPERVISOR***

**CARLOS LEONARDO ABRIL BARRERA**
Supervisor
Parques Nacionales Naturales de Colombia

***EL APOYO A LA SUPERVISIÓN***

**ERIKA BUSTOS RUIZ**
Apoyo a la Supervisión
Parques Nacionales Naturales de Colombia

| | LISTA DE ASISTENCIA | Código: A4-FO-05<br>Versión: 2<br>Vigente desde: 28/10/2025 |
|---|---|---|

**AYUDA DE MEMORIA**

**RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES** (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

- Se realiza un recorrido a las diferentes actividades ejecutadas a la fecha verificando su estado y las necesidades de imprevistos requeridos para su evaluación. según Apu nuevo.
- Se llevará a cabo el desmonte del mesón en baño de ~~(mujeres)~~ hombres buscando su reutilización.
- Los espejos se reistalan apenas a su ubicación actual. y se balancearan las actividades acorde a necesidades prioritarias.
- Los escombros a retirar son los residuos de demolición así como puertas, marcos de ventanas y otro definidos por los funcionarios de la sede.

**COMPROMISOS** En caso se requerirse incluir más filas.

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA) | FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|
| • Enviar solicitudes de acceso para trabajo los fines de semana y para retiro de escombros | Contratista de Obra | Semana a Semana. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **LISTA DE ASISTENCIA** | Código: A4-FO-05<br>Versión: 2<br>Vigente desde: 28/10/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL EVENTO: | Seguimiento Contrato de Obra 06-34 -2026 DTAM Bogotá | | | ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO<br>Nombre Completo | Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida |
| NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones) | | TIPO DE REUNION: | Video conferencia ☐ | Presencial ☒ | |
| LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK | Sede administrativa DTAM Bogotá | FECHA: (DD/MM/AAAA) 17/01/2026 | HORA INICIO: 9:00 | HORA FIN: 11:00 | |

**PARTICIPANTES**

| No. | NOMBRE Y APELLIDO | Tipo Doc. Identidad | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS | TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | TIPO ASISTENCIA | | FIRMA (Aplica para asistencia presencial) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Presencial | Virtual | |
| 1 | Carlos Leonardo Abril | CC | 93549337 | PNN | Funcionario | Profesional | carlos.abril@PNN | 3112538263 | X | | |
| 2 | Liliana Barrero | CC | 52956983 | KAXA | Contratista | Ga. Administrativo | kaxa.gruvic@gmail.com | 3002941651 | X | | |
| 3 | EDWIN RENERO | CC | 80821621 | KAXA | CONTRATISTA | SST | edwin.renero0919@gmail.com | 3157688883 | X | | |
| 4 | Juan Camilo Rodriguez | CC | 1022433109 | KAXA | Contratista | Ing Residente | camilo.rodriguez@gmail.com | 3114955616 | X | | |
| 5 | Erika Bustos Ruiz | CC | 1018488806 | PNN | Contratista PNN | Ing. Civil | erika.bustos@pnn | 3202612337 | X | | |
| 6 | Oscar Muñoz | CC | 79.363.554 | DTAM | Contratista | técnico | oscarmunoz05@gmail.com | 3114560261 | X | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |

**NOTA**: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

| | LISTA DE ASISTENCIA | Código: A4-FO-05<br>Versión: 2<br>Vigente desde: 28/10/2025 |
|---|---|---|

**AYUDA DE MEMORIA**

**RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES** (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

- Se realiza la revisión de las actividades ejecutadas con el fin de proyectar corte de obra.
- Se reciben actividades no previstas como pilas o bocatoma de acceso bajo puente en seco
- Se realizan recomendaciones generales sobre los documentos del informe técnico, SST y ambiental a entregar.

**COMPROMISOS** En caso se requerirse incluir más filas.

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA) | FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|
| KAXA se compromete a enviar la documentación del corte para el viernes 3 de julio. | Contratista KAXA | 3/07/26 |
| KAXA se compromete a ir proyectando los APU's no previstos y tenerlos para revisión sobre los primeros días del mes de julio. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | **LISTA DE ASISTENCIA** | Código: A4-FO-05<br>Versión: 2<br>Vigente desde: 28/10/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL EVENTO: | Comite de Obra - Mantenimiento DTAM | | ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO | | |
| | | | Nombre Completo | Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida | |
| | | | Erika Bustos | G. Ingraestructura | |
| NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones) | Erika Bustos R. | TIPO DE REUNION: | Video conferencia ☐ | Presencial ☒ | |
| LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK | DTAM | FECHA: (DD/MM/AAAA) 1/04/26 | HORA INICIO: 3 PM | HORA FIN: 4 PM | |

**PARTICIPANTES**

| No. | NOMBRE Y APELLIDO | Tipo Doc. Identidad | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS | TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | TIPO ASISTENCIA | | FIRMA (Aplica para asistencia presencial) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Presencial | Virtual | |
| 1 | Erika Bustos R. | CC | 1085948506 | G. Ingraestructura | Contratista | Ing. Civil | erika.bustos@pnn.gov.co | 3202617334 | X | | Erika Bustos |
| 2 | Carlos Leonardo Ariza | CC | 80849331 | CISAF | Funcionario | Profesional | carlos.ariza@PNN | 3112573127 | X | | |
| 3 | OSCAR MUÑOZ | CC | 79356514 | CONTRATISTA DTAM | Contratista | tecnico | oscarmuz265@gmail.com | 3114178261 | X | | |
| 4 | Liliana Barrera | CC | 52956887 | Residente Adm. | Contratista | Ing. Adminis. | lilianitabarrera@hotmail.com | 3003416513 | X | | |
| 5 | Jhon Jairo Cárdenas | CC | 1193484947 | Residente Obra | Contratista | Ing. Civil | ing.jhon.cardenas21@gmail.com | 3219687124 | X | | |
| 6 | JOVANNY ROMERO | CC | 80242621 | INSPECTOR SST | CONTRATISTA | ING SST | edwinromero0919@gmail.com | 3054866581 | X | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |

**NOTA**: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: A4_FO_01 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 19/12/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| No Acta: 007 | Dependencia: Grupo de Infraestructura | Fecha (dd/mm/aaaa):27/07/2026 |

**EQUIPO DE TRABAJO:**

| |
|---|
| Carlos Leonardo Abril - Supervisor PNN |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| Balance actividades de obra contrato CO-342-2026 DTAM |

**TEMAS A TRATAR:**

| |
|---|
| 1. Análisis actividades de obra no prevista |
| 2. Actividades por ejecutar |
| 3. Actividades a eliminar |
| 4. Mayores cantidades |

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

| No. Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | Dentro de las actividades proyectadas en los baños no se encontraba la actividad de desmonte y reinstalación de las divisiones existentes junto a la falta del pañete de muros para su posterior enchape; así mismo, dentro de las adecuación de la cocina no se contempló el desmonte del piso existente. Suministro de puerta de vidrio se hizo necesario la instalación del pirlan en granito pulido. Adecuación del marco de cocina para puerta en madera. |
| 2. | Pintura y enchape de cocina. Revisar posibilidad de instalación de mueble de lavamanos en oficina de dirección. |
| 3. | Estufa y mesa plegable de madera. Reducción de pintura. |
| 4. | Meson del baño, escombros. |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---|---|---|
| 1. Revisión final de obra | Supervisor-Contratista | 03/08/2026 |
| 2. | | |

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---|---|---|
| 3. | | |
| 4. | | |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**


| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**


| **NOMBRE Y APELLIDO** | **ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD** | **FIRMA (Informar en caso de ser virtual)** |
|---|---|---|
| Carlos Leonardo Abril | GI-SAF | N/A |
| | | |
| Jhon Jairo Cárdenas | KAXA S.A.S | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**

Extensión del documento

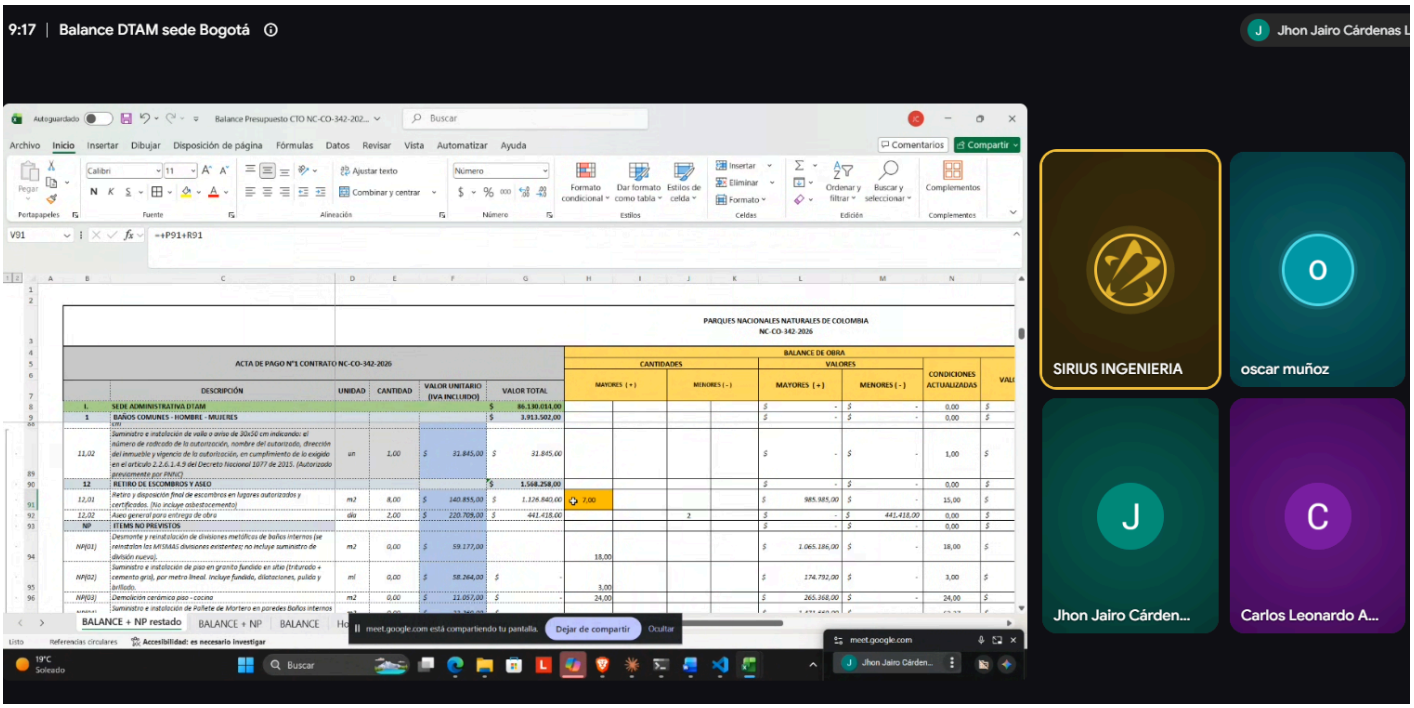
9:17 | Balance DTAM sede Bogotá
Jhon Jairo Cárdenas L
SIRIUS INGENIERIA
oscar muñoz
Jhon Jairo Cárden...
Carlos Leonardo A...
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026
ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO NC-CO-342-2026
BALANCE DE OBRA
CANTIDADES
VALORES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
VALOR TOTAL
MAYORES (+)
MENORES (-)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
SEDE ADMINISTRATIVA DTAM
BAÑOS COMUNES - HOMBRE - MUJERES
RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO
ITEMS NO PREVISTOS
BALANCE + NP restado
BALANCE + NP
BALANCE
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: A4_FO_01 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 19/12/2023 |

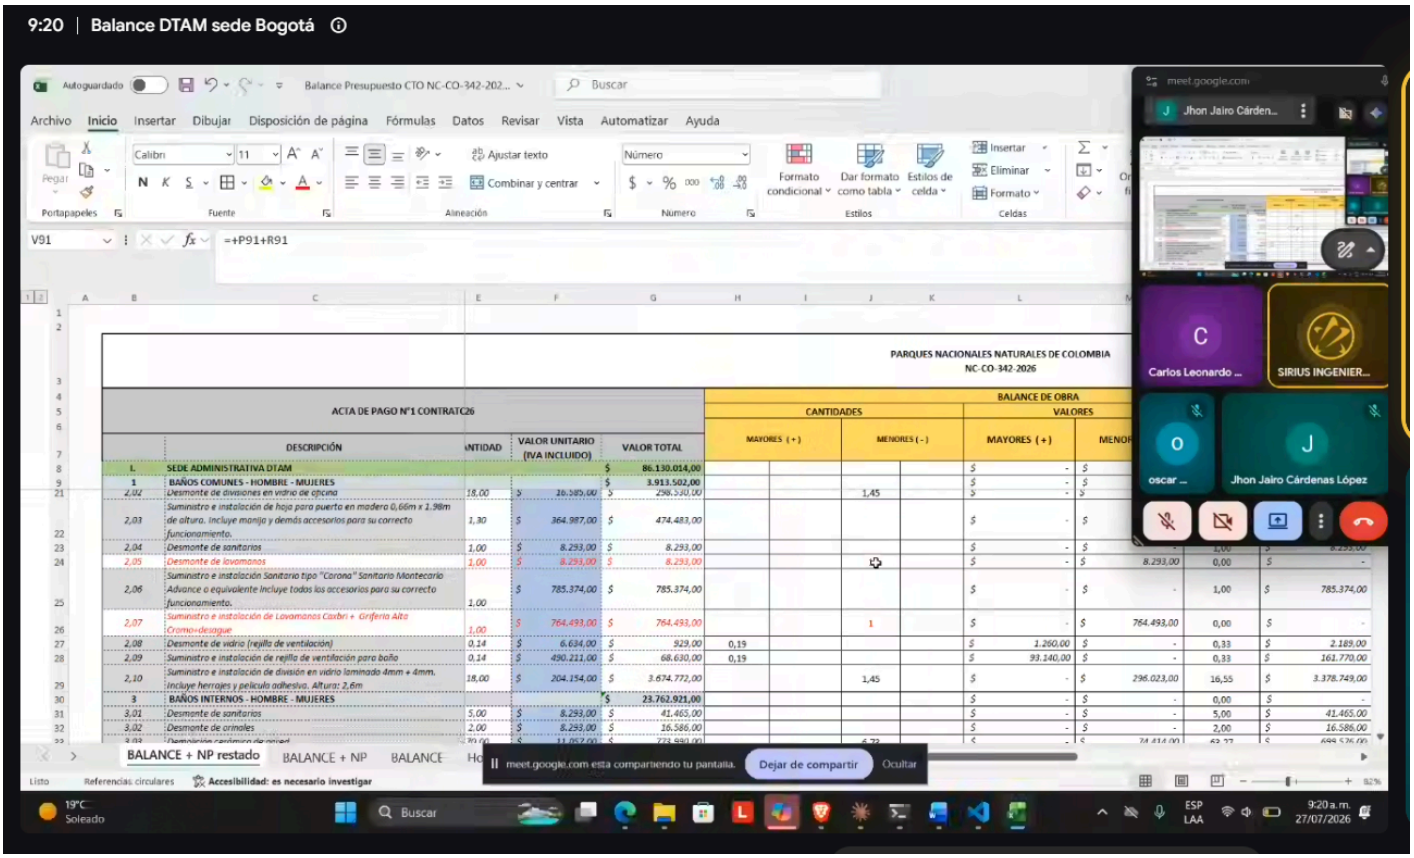

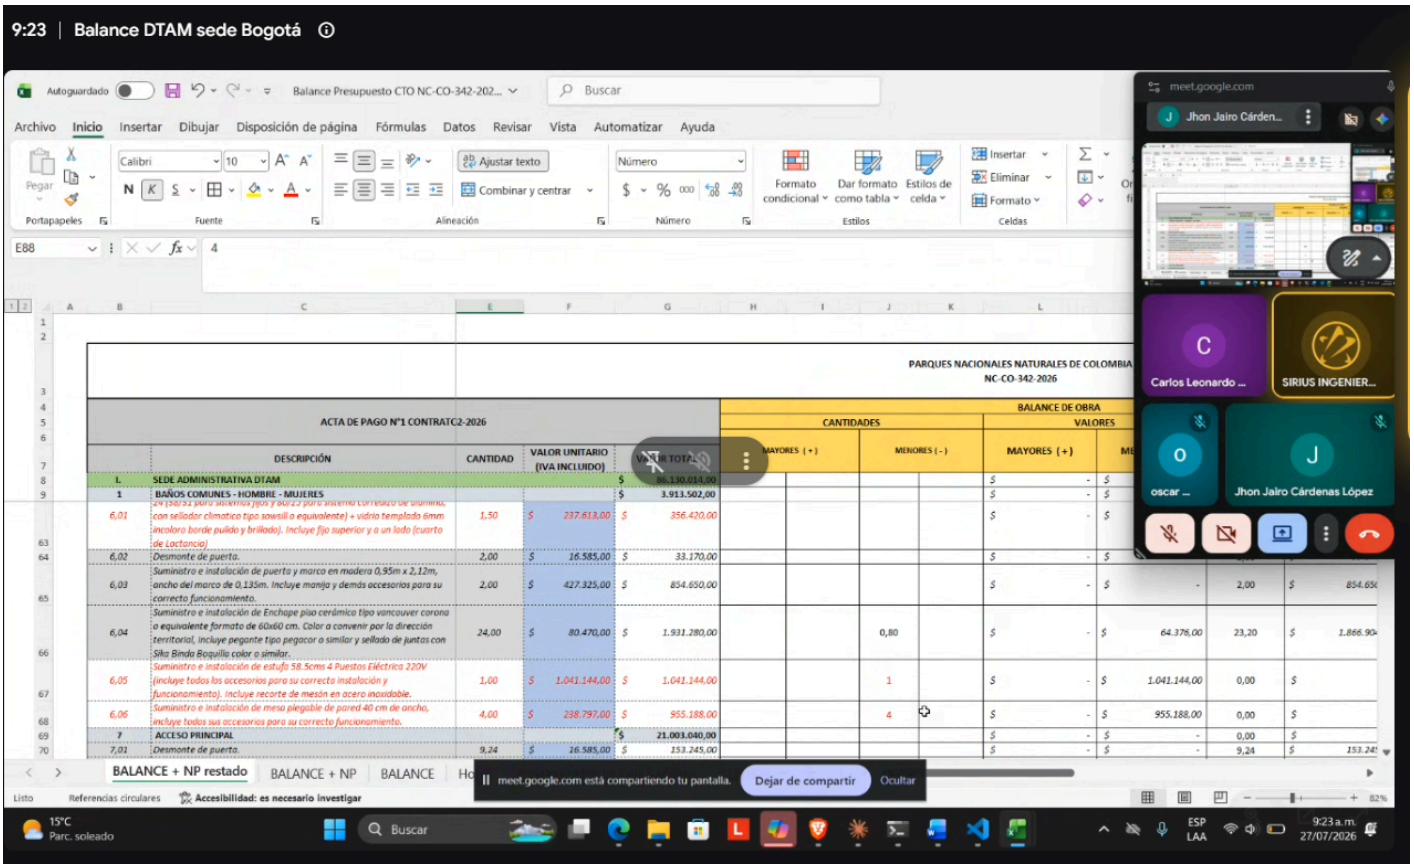
9:23 | Balance DTAM sede Bogotá
Balance Presupuesto CTO NC-CO-342-202...
Buscar
Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NC-CO-342-2026
ACTA DE PAGO N°1 CONTRATO2-2026
BALANCE DE OBRA
CANTIDADES
VALORES
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
MAYORES ( + )
MENORES ( - )
I. SEDE ADMINISTRATIVA DTAM
1 BAÑOS COMUNES - HOMBRE - MUJERES
6,01
6,02 Desmonte de puerta.
6,03
6,04
6,05
6,06
7 ACCESO PRINCIPAL
7,01 Desmonte de puerta.
BALANCE + NP restado
BALANCE + NP
BALANCE
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Jhon Jairo Cárden...
Carlos Leonardo ...
SIRIUS INGENIER...
oscar ...
Jhon Jairo Cárdenas López
15°C Parc. soleado
Buscar
ESP LAA
9:23 a.m. 27/07/2026

**KAXA SAS**

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD4 Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS PARQUE NACIONAL NATURALES DE COLOMBIA, DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. EL OBJETO COMPRENDE LA SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA POR DIVISIONES/PUERTAS DE VIDRIO, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE VENTANERÍA, INTERVENCIÓN Y ENCHAPE TOTAL DE BAÑOS Y COCINA (INCLUYENDO DEMOLICIONES, PAÑETES Y CAMBIO DE APARATOS Y MESONES), ADECUACIÓN DE COCINA Y PINTURA GENERAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ASEGURANDO LA CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y ERGONOMÍA DE LAS INSTALACIONES.

CONTRATO:

31 JULIO 2026

**TABLA DE CONTENIDO**

**Contenido**

1. INTRODUCCION …… 3

2. OBJETIVOS…….. 4

3. INFORMACION DEL PROYECTO……4

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO …… ……...5

5. DESCRICION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA …… …….. 6

6. RELACION DEL PERSONAL …… …… 7

7. AUSENTISMO …… ……7

8. ACCIDENTALIDAS ……8

9. INDICADORES SST……8

10. CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES……8

11. INDUCCIONES AL PERSONALEN SGSST ……..……...10

12. REGLAMENTO DE HIGUIEN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL……13

# 1. INTRODUCCION

Este informe presenta un resumen detallado de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución de la obra en el marco de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo (SSTA). Con un enfoque integral en seguridad, salud ocupacional y sostenibilidad ambiental, implementando acciones continúas dirigidas a proteger el bienestar de los trabajadores y reducir el impacto ambiental de las actividades realizadas a lo largo del proyecto.

Las actividades se han estado ejecutando en estricta conformidad con las normativas vigentes en Seguridad y Salud Laboral. Se ha venido implementando medidas rigurosas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a las tareas de construcción y reacondicionamiento en el área de trabajo.

Estas labores tienen como propósito conservar en buen estado la infraestructura física y brindar un ambiente seguro y confortable para el personal uniformado y civil que hace uso de dichas instalaciones.

## 2. OBJETIVOS

Realizar supervisiones diarias de las actividades para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, asegurando el cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo (SSTA).

Fomentar el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) entre los trabajadores, con el objetivo de disminuir los riesgos asociados con la manipulación de materiales.

## 3. INFORMACION DEL PROYECTO

Demolición técnica y segura de los acabados existentes (cerámica en pisos y paredes).

Desinstalación de aparatos sanitarios, griferías y mesones anteriores.

Preparación de superficies mediante la aplicación de pañete y nivelación.

Preparación, resane y aplicación de pintura general en muros y techos de las áreas u oficinas intervenidas, utilizando materiales de alta calidad para garantizar una correcta cobertura y renovación estética de los espacios de trabajo.

Suministro e instalación de nuevo enchape cerámico en pisos y paredes, junto con el montaje de nuevos aparatos sanitarios, mesones y accesorios que garanticen la funcionalidad e higiene del espacio.


Modificaciones locativas, reparaciones y adecuaciones funcionales en el área de cocina, asegurando condiciones óptimas de habitabilidad, orden y limpieza.

## 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO






## 5. DESCRICION DE LAS ACTIVIDADES
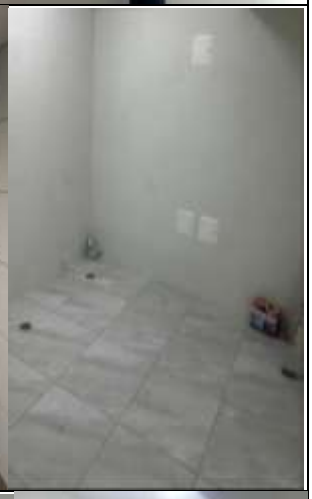
| | |
|---|---|
| Se realiza la limpieza y pintado de techo de baños siguiente todas las recomendaciones técnicas y de seguridad. |   |
| Se realiza la instalación de pisos y paredes en los baños siguiendo todas las normas de seguridad y recomendaciones técnicas. |   |
| Se realiza instalaciones de estructura que separa los sanitarios en los baños. |   |

| | |
|---|---|
| Se realiza instalación de sanitarios y orinales en baños siguiendo las recomendaciones técnicas y los protocolos de seguridad |  |
| Se realizo instalación del piso en la cocina, siguiendo los procedimientos de seguridad la normativa técnica. |  |
| Se realiza instalación de orinal nuevo siguiendo los protocolos de seguridad y normas técnicas. |  |


| | |
|---|---|
| Se realiza recolección de escombro siguiendo los protocolos ambientales y de seguridad para su clasificación. Y disposición final. |    |
| Se Realiza instalación de biométrico siguiendo todos los protocolos de seguridad y las normas técnicas. |   |

## 6. RELACION DE PERSONAL

| PERSONAL MINIMO PARA ACTIVIDADES DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL TRABAJADOR | N° CEDULA | CARGOS |
| 1 | FABIO NELSON CORREDOR | 7.185.032 | MAESTRO |
| 2 | JULIO CESAR MUÑOZ | 79.429.378 | AYUDANTE |
| 3 | JOVANNY ROMERO | 80.242.621 | ING SST |
| 4 | JHON JAIRO CARDENAS | 1.193.484.247 | ING RESIDENTE |


## 7. AUSENTISMO

En el presente período de referencia del informe, no se ha presentado incapacidades.

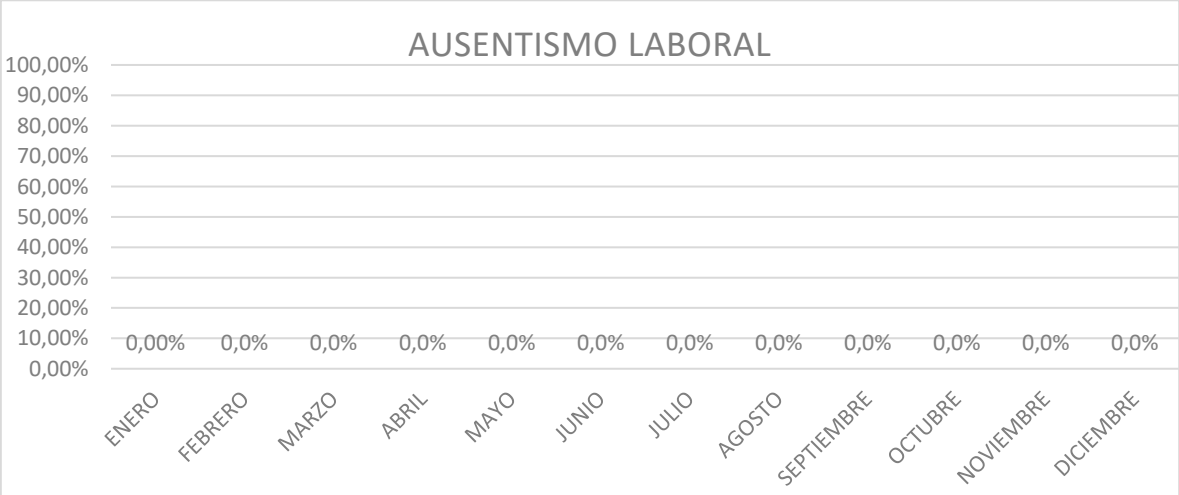




## 8. ACCIDENTABILIDAD


Durante el periodo actual del informe, no se presentó ningún tipo de accidente laboral.

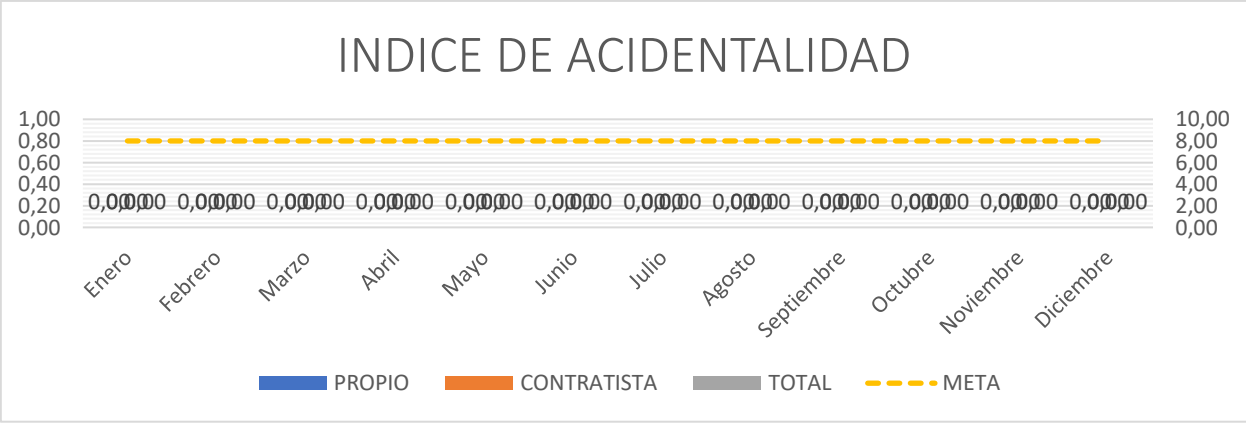

**KAXA SAS**

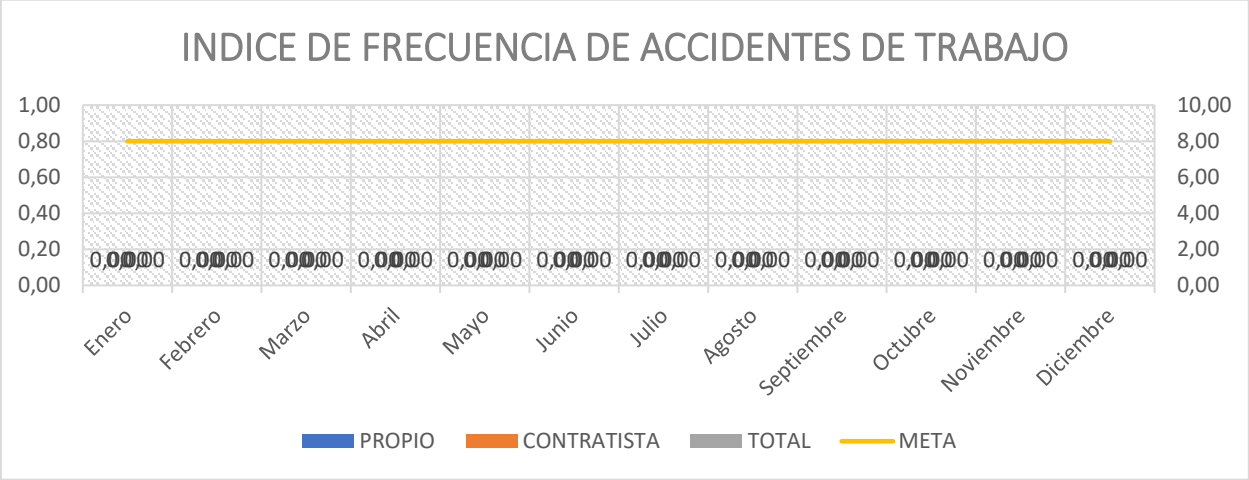

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROPIO
CONTRATISTA
TOTAL
META

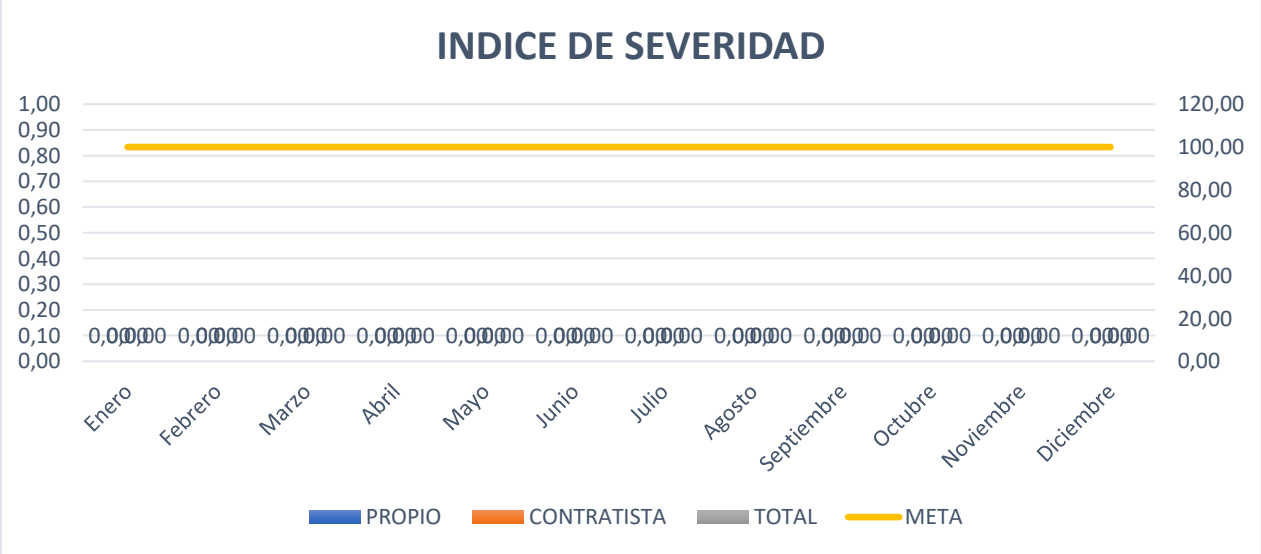
INDICE DE SEVERIDAD
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROPIO
CONTRATISTA
TOTAL
META

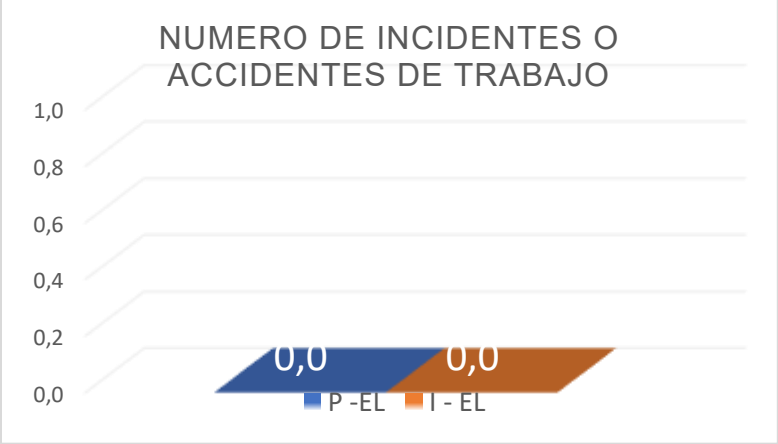

NUMERO DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
P -EL
T - EL

## 9. INDICADORES SST


La empresa revisa la ejecución de actividades propuestas en el plan anual de trabajo del SG-SST

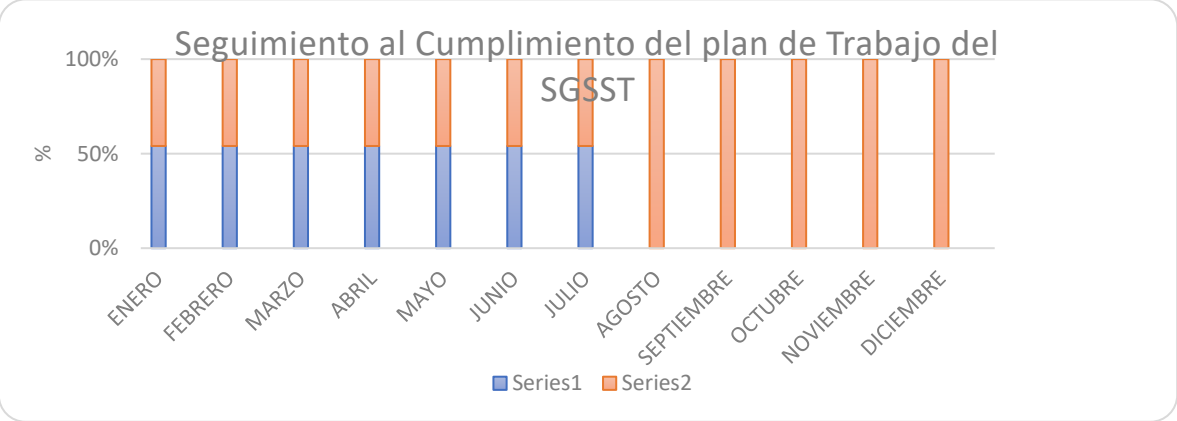



La empresa ejecuta el plan de inspecciones de seguridad para el control de los actos y condiciones inseguras en las áreas de trabajo.

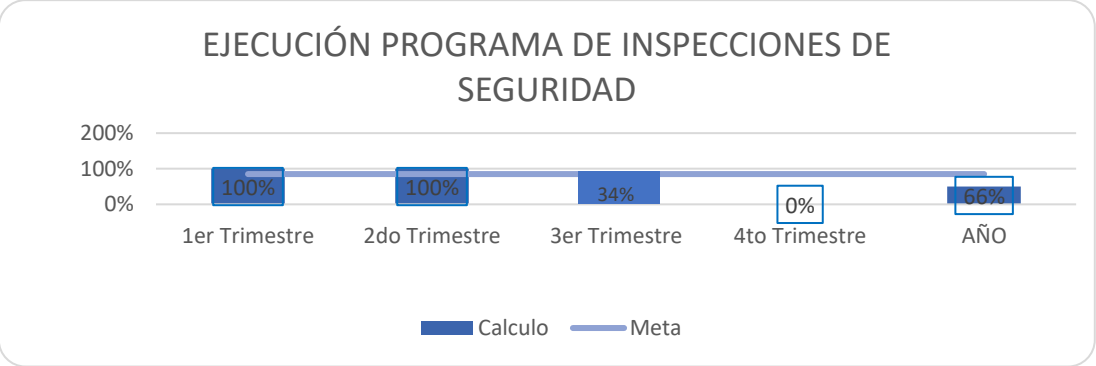



La empresa realiza las investigaciones de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo.

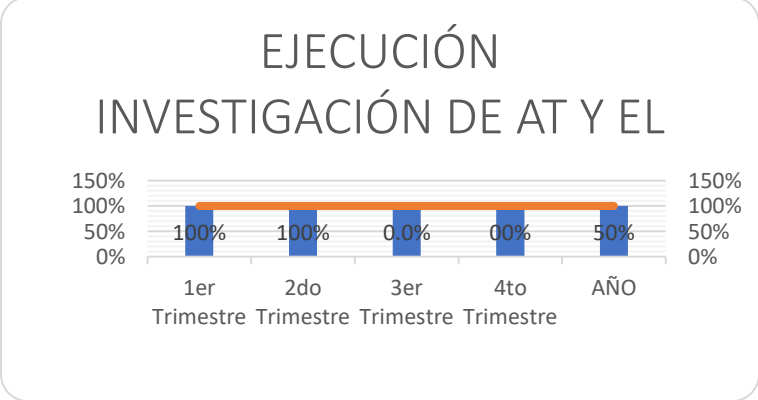

La empresa da cumplimiento a los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo.

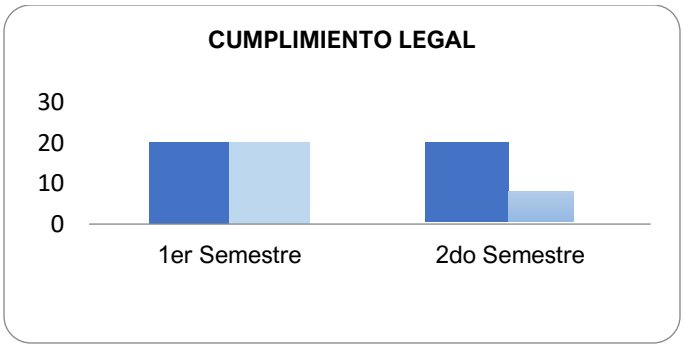



La empresa da cumplimiento a los requisitos mínimos del SG-SST de acuerdo con Resolución 0312 del 2019




## 10. CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES

Durante el periodo del informe, se vienen realizando capacitaciones en identificación de riesgos según la GTC- 45, en riesgos mecánicos, eléctrico, trabajos de alturas, manejo de cargas e higiene postural a todo el personal y para el mes de julio se tiene un cronograma de capacitaciones por parte del HSEQ, para darle cumplimiento al SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), conforme a la normativa vigente.

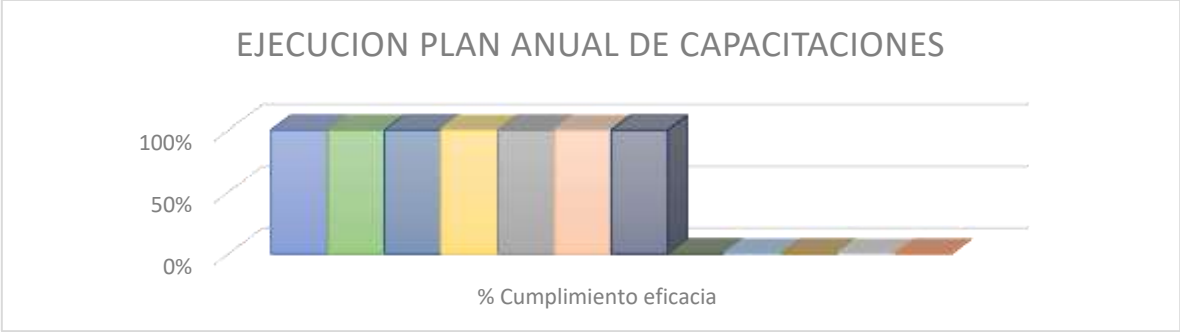

## 11. INDUCCIONES AL PERSONAL EN SG-SST

Dando cumplimiento a los requisitos contractuales y normativos del SG- SST. Se fomenta tener en cuenta una formación específica en SG-SST para todos los trabajadores, resaltando aspectos técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se reporta el ingreso de las personas a los cuales se les realiza la respetiva notificación de riesgo.

- Socialización políticas y objetivos
- Socialización reglamento de Higiene y Seguridad industrial.
- Socialización de política de no alcohol, tabaco y consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenas.
- Sistemas de seguridad social.
- Socialización accidente de trabajo, reporte de AT y enfermedad laboral.
- Socialización de Procedimientos de ATEP y los que apliquen según las actividades constructivas que se desarrollen.
- Notificación de riesgos.
- Socialización del Plan de Emergencia y punto de encuentro.
- Uso de Elementos de Protección Personal.
- Notificación del examen de ingreso y egreso.
- Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales.
- Seguridad Social-ARL, EPS, FP.
- Generalidades en obra.
- Señalización y demarcación en obra.
- Socialización de Perfiles de cargo.
- Socialización de aspectos generales e impactos ambientales.
- Procedimiento de trabajo seguro, actividades de alto riesgo.
- Socialización separación de residuos.
- Socialización uso eficiente del agua.
- Socialización ahorro de energía.
- Socialización manejo de sustancias peligrosas.
- Socialización respuesta ante derrames.

## 12. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda,

puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones, de acuerdo al Decreto 614 de 1984, el Decreto Unificado 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019

Cordialmente,

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL
KAXA

**JOVANNY ROMERO**
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

# CONSTANCIA DE GESTIÓN

| MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 REGISTRO DE GESTOR CAR No.54 | APROBADO MEDIANTE PIN TRATA-27144 REGISTRO IDU 683 de 2023 Y 687 de 2023 |
|---|---|

| 1. DATOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| Nombre del proyecto (obra) | REMODELACION CLL 12 |
| Nombre o razón social | KAXA SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901590857-3 |
| Representante Legal | LISSY MARYURI MONTENEGRO FERNANDEZ |
| Dirección domicilio | CLL 12 C No 8-79 P 2 |
| Teléfono | 316 579 5189 |
| Correo electrónico | byb.demoliciones.sas@gmail.com ; g.proyectos.bybdemoliciones.sas@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CLL 12 C No 8-79 P 2 |
| PIN-GEN | N/A |

| 3. GESTIÓN INTEGRAL RCD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR | Punto Limpio | | Disposición Final | | Recuperador Específico | |
| | Receptor | | Planta de Tratamiento y Aprovechamiento | X | Otro ¿Cuál? | |

| Registro CAR No. | 54 | Datos del Gestor | |
|---|---|---|---|
| Fecha de recepción RCD | julio-26 | Nombre o Razón Social | VECOAGREINT SAS |
| | | Identificación o NIT | 901660184-6 |
| | | Representante Legal | YEIMEN GAONA BAUTISTA |
| | | Dirección | AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2 VÍA PARCELAS, 500M COSTADO IZQUIERDO |
| | | Municipio | COTA |
| | | Teléfono de contacto | 3143949448 |
| | | Correo Electronico | vecoagreintsas@gmail.com |

| VEHÍCULO | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD m3 | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| Volqueta Doble | Otros residuos pétreos | 7,045 | 10,36 |

| Total RCD Dispuesto | 7,045 | 10,36 |
|---|---|---|

| Nombre del representante legal gestor | | YEIMEN GAONA BAUTISTA |  REPRESENTANTE LEGAL VECOAGREINT SAS |
|---|---|---|---|
| CC: | 79761226 | FIRMA | |

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.
Nota: La información suministrada en este certificado referente al generador, lugar de procedencia, obra y demás datos asociados al origen de los RCD´S, es suministrada por el cliente a VECOAGREINT S.AS.; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de VECOAGREINT S.A.S, declara y garantiza a VECOAGREINT S.A.S. que la información suministrada es veraz, completa y exonera a VECOAGREINT S.A.S. de toda responsabilidad con respecto a la misma. Esta certificación se emite en el marco del convenio de colaboración suscrito entre VECOAGREINT S.A.S. e INAR – Industria Nacional de Agregados Reciclados, mediante el cual se articula la operación técnica de la planta de aprovechamiento conforme a lo establecido contractualmente, sin que ello implique modificación alguna en los registros y obligaciones ambientales vigentes.

| Consecutivo para verificación del certificado | VEAG 879 de 2026 |
|---|---|

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto | No. 54 | |
| Nombre o razón social | VECOAGREINT S.A.S | |
| Documento de identificación o NIT | 901.660.184-6 | |
| Representante Legal | YEIMEN GAONA BAUTISTA | |
| Dirección | AUT MEDELLIN KM 2 VIA PARCELAS COTA, COSTADO IZQUIERDO 500M | |
| Telefono | 3143949448 | |
| Correo Electrónico | vecoagreintsas@gmail.com | |
| Municipio o Distrito | COTA, CUNDINAMARCA | |
| Gestor | Punto limpio | |
| | Correo electrónico | X |
| | Disposición final | |
| **DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR** | | |
| Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto | N/A | |
| Nombre o razón social | KAXA SAS | |
| 0 | 901590857-3 | |
| Representante Legal | LISSY MARYURI MONTENEGRO FERNANDEZ | |
| Dirección | CLL 12 C No 8-79 P 2 | |
| Telefono | 316 579 5189 | |
| Correo Electrónico | byb.demoliciones.sas@gmail.com ; | |
| Dirección de generación de RCD | CLL 12 C No 8-79 P 2 | |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | | |
| **Tipo de reciduo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Reciduos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento** | 10,36 | |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: Coberturas vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos productos de la excavación entre otros | 0 | |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. | 0 | |
| 1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros. | 10,36 | |
| 1.4 No pétros: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos rakes como: PCV, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuterano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (dywall), entre otros. | 0 | |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | 0 | |
| 2.1 Los contaminados con reciduos peligrosos. | 0 | |
| 2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | 0 | |
| 2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión. | 0 | |
| **TOTAL RCD recibidos (t)** | **10,36** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **julio-26** | |

Coordialmente



FIRMA (Gestor de RCD - Representante Legal)
CC - N.I.T 79.761.226 - 901.660.184-6
NOMBRE: YEIMEN GAONA BAUTISTA
