





Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario En Tubería PVC D=8"

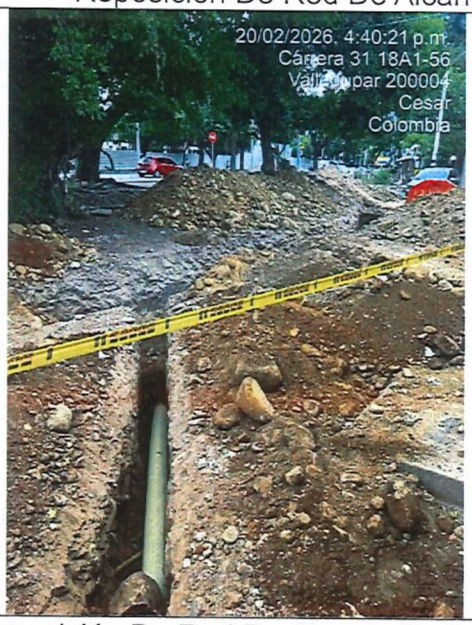

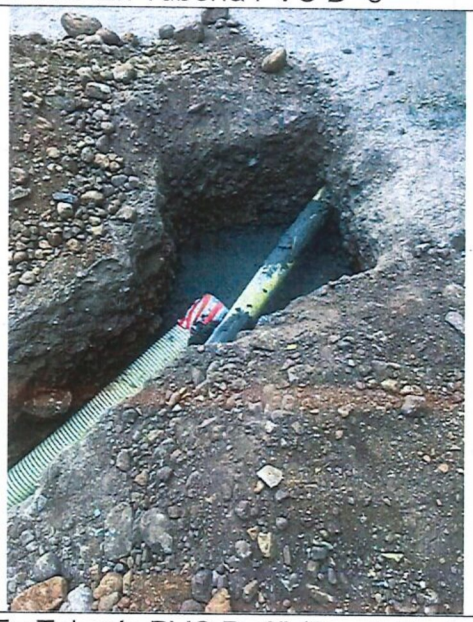


Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario En Tubería PVC D=6" (Domiciliarias)






Conexión De Acometidas Domiciliarias A La Red Principal De Alcantarillado Sanitario Por Medio De Kit De Silla Yee PVC D=200mmx160mm - 8"X6"

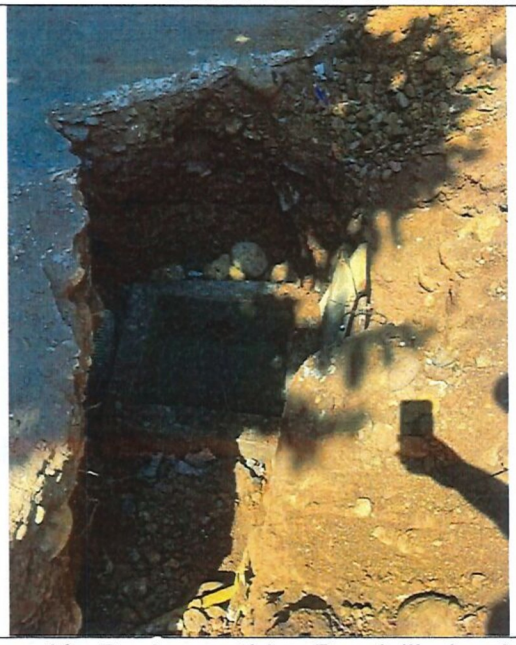



Conexión De Acometidas Domiciliarias A La Red Principal De Alcantarillado Sanitario Por Medio De Kit De Silla Yee PVC D=200mmx160mm - 8"X6"



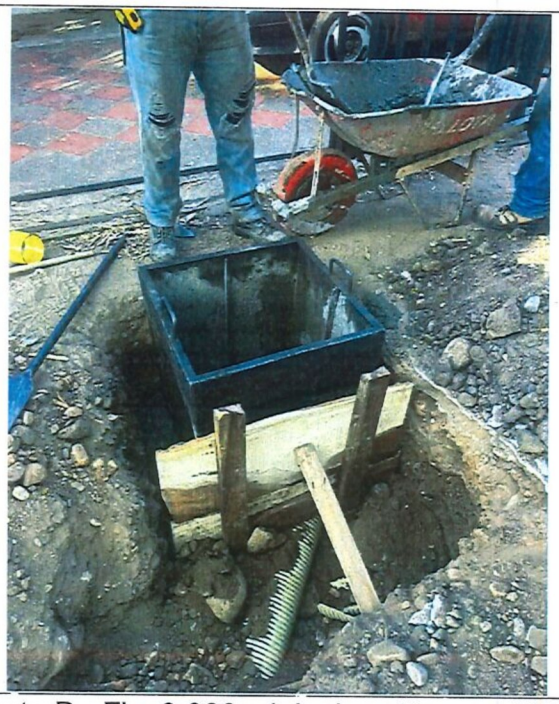

Caja De Inspección De 60x60x60cm, En Concreto De F'c=3.000psi, Incluye Excavación, Acero, Tape, Tapa Y Herrajes, Cañuelas, E Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento

Se Anexa Copia de las bitácoras realizadas en los diferentes tramos. ***(ANEXO - 11. BITACORA TRAMO NUEVAS FLORES – TOCAIMO – MEDIA LUNA, ANEXO – 12. TRAMO VALLEDUPAR – LA MESA, ANEXO – 13. BITACORA TRAMO LA MESA – EL PALMAR, ANEXO - 14. BITACORA TRAMO LA MESA - EL MAMON, ANEXO - 15. BITACORA TRAMO VALLEDUPAR URBANO.)***

9. RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS – UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE.

El listado de los recursos presentados por la Unión Temporal Red Vial se encuentra detallado en el Informe de Seguimiento al Plan de Calidad entregado por dicha entidad, el cual hace parte integral del presente informe y se adjunta como Anexo 27.

Se anexa informe de calidad de la Unión Temporal Red Vial Del Norte, en el cual el contratista presenta los recursos con los que cuenta. ***(ANEXO – 27. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD – UNION TEMPORAL RED VIAL.)***

10. REPORTE CLIMATOLOGICO.


Durante el periodo evaluado se registraron precipitaciones de carácter leve y de forma esporádica, con mayor ocurrencia en horas de la tarde y la noche, conforme a los datos recopilados en los puntos de control establecidos para el proyecto. La información registrada permite caracterizar el comportamiento de las lluvias dentro del periodo informado,

constituyéndose en un insumo técnico para el seguimiento de las condiciones climáticas que inciden en la ejecución de las actividades de obra.


En referencia con lo anterior, se anexan los gráficos correspondientes a los registros de precipitación del periodo, con el fin de presentar de manera cuantitativa y trazable el comportamiento observado, en atención a los mecanismos de control y reporte establecidos.

Se Anexa reporte climatológico tomado en los diferentes tramos. ***(ANEXO – 7. REPORTE ESTADO DEL TIEMPO)***

10.1. TRAMO 1 – GLORIETA – TRAMACUA – LA MESA.

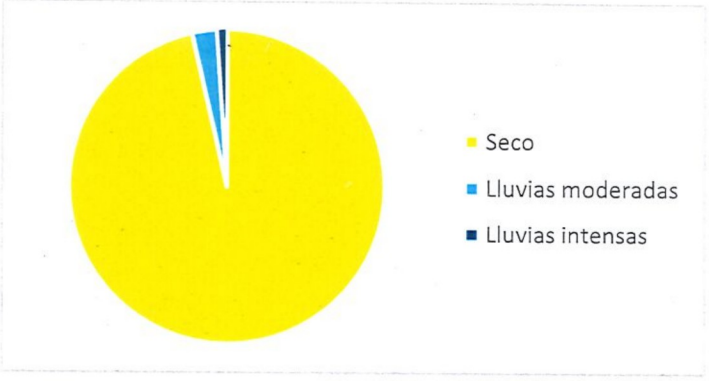


Seco	96.39%
Lluvias moderadas	2.50%
Lluvias intensas	1.11%

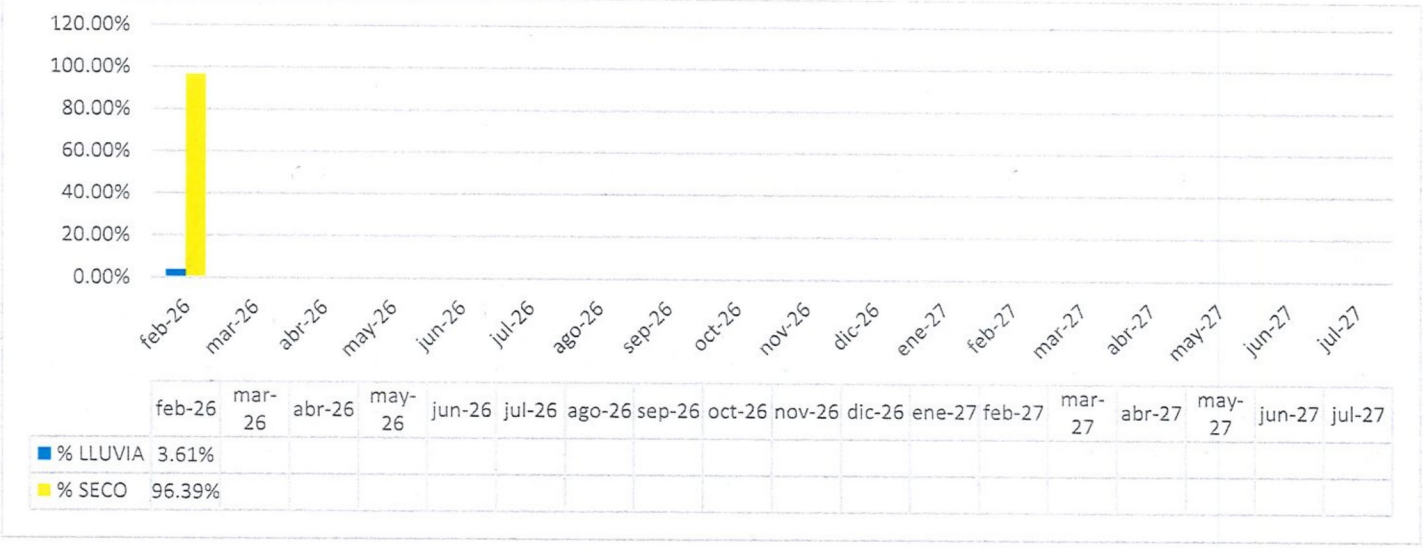


	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27
% LLUVIA	3.61%																	
% SECO	96.39%																	

10.2. TRAMO 2 – TRANSFORMADOR – TOCAIMO – MEDIA LUNA.

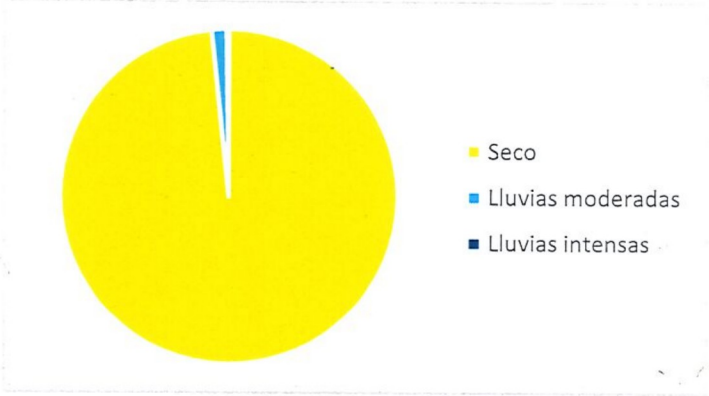


Seco	98.33%
Lluvias moderadas	1.39%
Lluvias intensas	0.28%

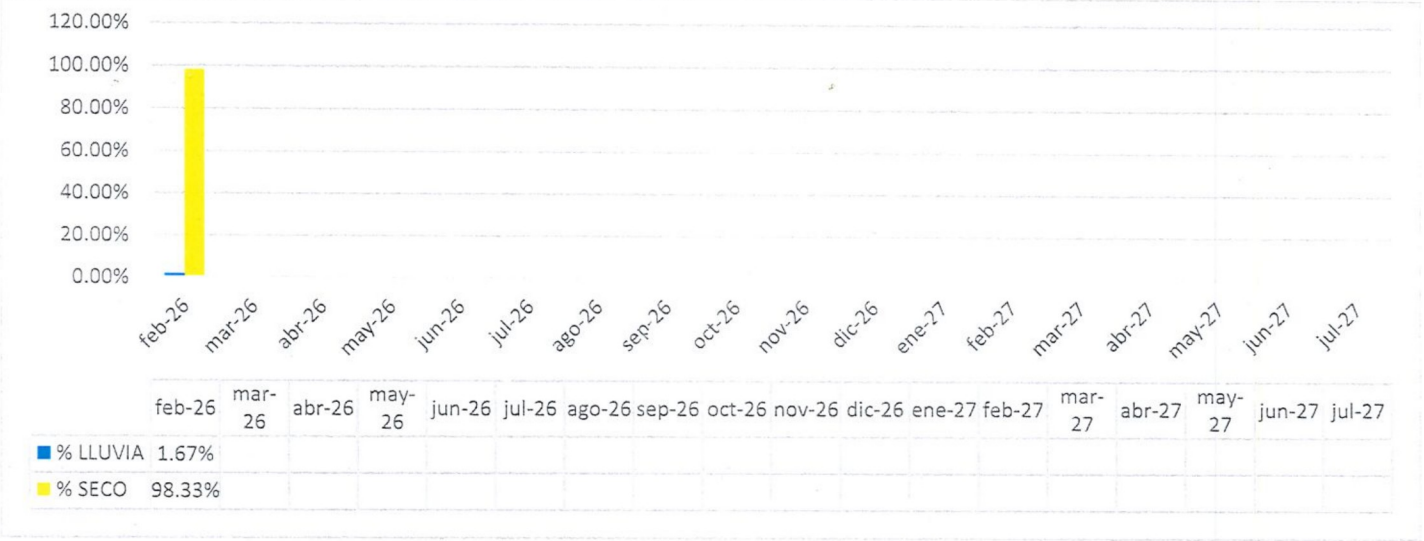


	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27
% LLUVIA	1.67%																	
% SECO	98.33%																	

10.3. TRAMO 3 – VALLEDUPAR URBANO.

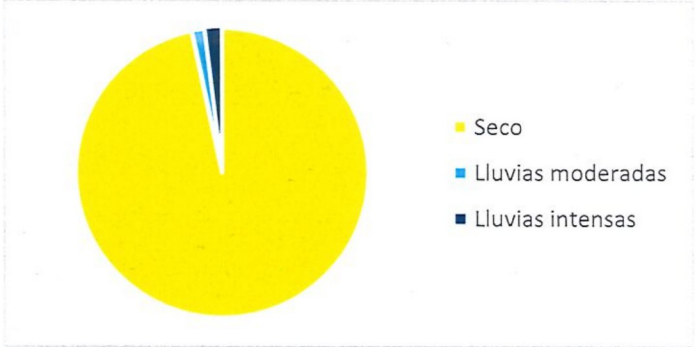

Seco	96.67%
Lluvias moderadas	1.39%
Lluvias intensas	1.94%

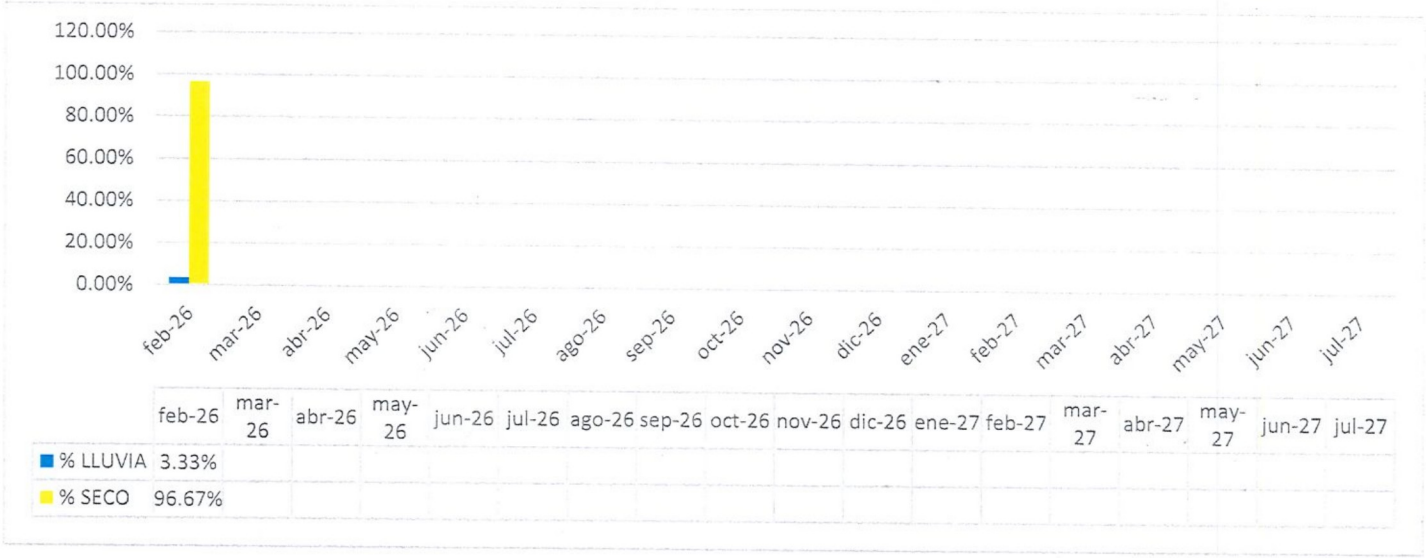

11. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA – CONSORCIO INTERNORTE PC

11.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Modalidad De Contratación:	Concurso de Méritos Abierto	
Proceso De Selección.	CMA-SIN-0004-2025	
Tipo De Contrato:	Contrato Interventoría	
N° de Contrato:	2026 – 05 – 0004	
Entidad Contratante	Gobernación del Cesar	
Fecha Suscripción Del Contrato:	12 de Enero de 2026	
Objeto Del Contrato:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento de la red vial en la Subregión Norte del departamento del Cesar.	
Contratista:	Consorcio Internorte PC Nit: 902.028.286-3	
Conformado Por:	Consultorías Asesorías y Gestión de Infraestructura y Construcción S.A.S	90%
	Proyectos y Gestión Avanzada de Interventorías S.A.S.	10%
Representante Legal:	Daniela María Granados Miranda	
Valor Inicial Del Contrato:	$ 12.632.283.517,00	
Valor Final Del Contrato:	$ 12.632.283.517,00	
Anticipo:	$ 5.052.913.406,80	
Plazo De Ejecución Inicial:	Dieciocho (18) meses	

Fecha de Inicio:	10 de Enero de 2026
Fecha de Terminación Inicial:	9 de Agosto de 2027
Supervisor Designado:	Said Lozano Lozano (Secretaría De Infraestructura)
Fecha De Designación De La Supervisión:	10 De Febrero De 2026

11.2. RELACIÓN DE ACTAS Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	TIPO	FECHA	MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	ACTA DE INICIO	10/01/2026	DAR INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2026 – 05 – 0004

11.3. INFORMACION FINANCIERA CONSORCIO INTERNORTE PC.

1.3.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL.

A continuación se presentan los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales correspondientes para el contrato de interventoría N° 2026-05-0004:

DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	39725	VALOR	$ 10.338.788.360,56	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
N°	39125	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	1729	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
N°	1728	VALOR	$ 7.488.208.429,23	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	99 - 8.1.4.08.10.001.02.003 - 10-7 - 2025002200041, INTERVENTORIAS-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRETERAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR; 99 - 8.1.4.09.10.001.02.01 - 15-2 - 2025002200042, INTERVENTORIA-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)					
N°	5826	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
N°	5726	VALOR	$ 7.488.208.429,23	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026

1.3.2. PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS CONSORCIO INTERNORTE PC.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA					
IMPUESTO	**VALOR BASE**	**TARIFA**	**VALOR**	**NÚMERO LIQUIDACIÓN**	**FECHA DE PAGO**
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 10.615.364.300,00	1,0 %	$ 106.154.000,00	32604030089	-

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 10.615.364.300,00	1,5 %	$ 159.230.000,00	32604030089	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 10.615.364.300,00	1,0 %	$ 106.154.000,00	32604030089	-
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 10.615.364.300,00	0,5 %	$ 53.077.000,00	32604030089	-
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 10.615.364.300,00	0,5 %	$ 53.077.000,00	32604030089	5/02/2026

11.4. CONTROL DE POLIZAS CONSORCIO INTERNORTE PC

- **Pólizas Iniciales firma de Contrato de Interventoría**

El anexo 0 corresponde a la firma del contrato No.2026 – 05 – 0004 del 29 de enero de 2026 para garantizar su cumplimiento y el cual a la fecha, se encuentra aprobada en SECOP II por la entidad contratante.

CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA				
ASEGURADORA: Seguros del Estado		FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-02-2026 - ANEXO 0		
COBERTURA	No. POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	CG - 1073004	$ 1.263.228.351,70	29-01-2026	29-11-2027
Buen Manejo del Anticipo	CG - 1073004	$ 5.052.913.406,80	29-01-2026	29-11-2027
Prestaciones sociales	CG - 1073004	$ 1.263.228.351,70	29-01-2026	29-07-2030
Calidad del servicio	CG - 1073004	$ 3.789.685.055,10	29-07-2027	29-07-2032

- **Pólizas Acta de inicio de contrato de Interventoría**

Los Anexo 2, corresponden a la actualización de las vigencias de acuerdo la firma del acta de inicio del día diez (10) de febrero de 2006, del contrato de Interventoría y que a la fecha, se encuentra aprobada en SECOP II por la entidad contratante.

CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA				
ASEGURADORA: Seguros del Estado		FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/04/2025 ANEXO 2		
COBERTURA	No. POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	CG - 1073004	$ 1.263.228.351,70	29-01-2026	29-11-2027
Buen Manejo del Anticipo	CG - 1073004	$ 5.052.913.406,80	29-01-2026	29-11-2027
Prestaciones sociales	CG - 1073004	$ 1.263.228.351,70	29-01-2026	29-07-2030
Calidad del servicio	CG - 1073004	$ 3.789.685.055,10	29-07-2027	29-07-2032

Se Anexan copias de las Pólizas aprobadas del Consorcio Internorte PC. ***(ANEXO – 9. POLIZAS APROBADAS – CONSORCIO INTERNORTE PC)***

11.5. PERSONAL EN OBRA – CONSORCIO INTERNORTE PC

De conformidad con los requerimientos definidos en los pliegos de condiciones y en atención al personal mínimo exigido para la ejecución contractual del contrato de interventoría, se presenta el equipo profesional para el consorcio Internorte PC, evidenciando el cumplimiento de los perfiles profesionales, la experiencia específica y las capacidades técnicas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades incluidas en el alcance del contrato. Igualmente, se constató que cada integrante del equipo cumple con los porcentajes y tiempos mínimos de dedicación requeridos, así como con las demás condiciones técnicas establecidas para la ejecución de las obligaciones contractuales.

Resumen total de Profesionales Requeridos		
Personal profesional	**Cantidad**	**Dedicación**
Director de Interventoría	1	90%
Residente de Interventoría	7	100%
Especialista en Pavimentos	1	60%
Especialista Hidráulico	1	60%
Especialista en Vías	1	50%
Especialista SISSOMA	2	100%
Especialista Ambiental	2	100%
Auxiliar Administrativo	2	100%
Especialista Social	2	100%
Inspector de Interventoría	7	100%
Especialista en Estructuras	1	60%
Laboratorista	2	100%
Residente Social	1	50%
Residente Ambiental	1	100%

El CONSORCIO INTERNORTE PC, dándole cumplimento a lo plasmado en los pliegos de condiciones, ha dispuesto de un grupo interdisciplinario de profesionales, estos en sus labores diarias tienen a cargo la revisión y supervisión de las actividades contractuales pactadas, se presenta el personal requerido por la entidad contratante para los tramos a ejecutar, disponiendo del personal relacionado a continuación:

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	TRAMO
Director De Interventoría	90.00%	Rodrigo Cerón	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa Tramo 3 - Valledupar Urbano
Especialista En Estructuras	60.00%	Armando Enrique Rivero Royero	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores Tramo 3 - Valledupar Urbano

Especialista En Hidráulica	60.00%	Erwin Celedón	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores Tramo 3 - Valledupar Urbano
Especialista En Vías	50.00%	Armando Jose Rivero Galvis	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores Tramo 3 - Valledupar Urbano
Especialista Pavimentos	60.00%	Lili Castrillón	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores Tramo 3 - Valledupar Urbano
Residente De Interventoría	100.00%	Ricardo Añez	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Residente De Interventoría	100.00%	Javier Martínez	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Inspector De Interventoría	100.00%	Amilkar Cadena	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Inspector De Interventoría	100.00%	Rafael Rivera	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Especialista Ambiental	100.00%	Brenda Castrillón	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Especialista SISOMA	100.00%	Andreina Granadillo	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Especialista Social	100.00%	Yenifer Quiroz	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Laboratorista Inspector	100.00%	Diego Meléndez	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Auxiliar Administrativo	100.00%	Daileth Luquez	Tramo 1 - Media Luna - Tocaimo - Nuevas Flores
Residente De Interventoría	100.00%	Malory De Angel	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Residente De Interventoría	100.00%	Roger Galvis	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Residente De Interventoría	100.00%	Andres Camacho	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Inspector De Interventoría	100.00%	Jean Carlos López	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Inspector De Interventoría	100.00%	Oscar Castillo	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Inspector De Interventoría	100.00%	Jose Camilo Corzo	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Especialista Ambiental	100.00%	Gloria Elizabeth Castrillón	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Especialista Social	100.00%	Natalia Daza	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Laboratorista Inspector	100.00%	Guillermo Betancur	Tramo 2 - Glorieta - La Tramacua - La Mesa
Residente De Interventoría	100.00%	Natalia Sierra	Tramo 3 - Valledupar Urbano
Residente De Interventoría	100.00%	Elkin Trujillo	Tramo 3 - Valledupar Urbano

Inspector De Interventoría	100.00%	Samuel Sepúlveda	Tramo 3 - Valledupar Urbano
Inspector De Interventoría	100.00%	Giordanna Zuleta	Tramo 3 - Valledupar Urbano
Residente Ambiental	100.00%	Mario Gomez	Tramo 3 - Valledupar Urbano
Residente Social	50.00%	Claudia Hinojosa	Tramo 3 - Valledupar Urbano
Auxiliar Administrativo	100.00%	Maria De Los Angeles	Tramo 3 - Valledupar Urbano

Se Anexa Aportes y pagos de la Seguridad Social correspondiente al mes de febrero del Consorcio Internorte PC. ***(ANEXO – 10. PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE NOMINA – CONSORCIO INTERNORTE PC)***

11.6. PAGOS REALIZADOS AL CONSORCIO INTERNORTE PC

A la fecha de expedición del presente informe, no se evidencian actas parciales tramitadas ni pagos efectuados susceptibles de ser relacionados o reportados dentro del componente de seguimiento financiero del proyecto para el **Contrato De Interventoría N° 2026 – 05 – 0001**. En consecuencia, no se registran operaciones que impliquen reconocimiento de obligaciones, ejecución presupuestal o afectación de los recursos asignados.

11.7. INFORME DE GASTOS REALIZADOS.

- **Ejecución Mes de Febrero – 2026.**

Con corte al mes de febrero de 2026, se registra una ejecución por un valor de MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE ($1.522.740.015,00), distribuida de acuerdo con los componentes requeridos para la ejecución del contrato de la siguiente manera:

EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INTERNORTE PC		
DESCRIPCION	**EJECUCION FEBRERO 2026**	**EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO 2026**
PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO	$ 337.801.365,00	$ 337.801.365,00
ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y CAMIONETA	$ 1.132.438.650,00	$ 1.132.438.650,00
VIGILANCIA-COMUNICACIONES-INFORMES	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.522.740.015,00**	**$ 1.522.740.015,00**

El análisis financiero efectuado permite evidenciar la adecuada trazabilidad de los recursos ejecutados, la correspondencia entre los valores aplicados y las actividades efectivamente desarrolladas. En este sentido, se verifica que las erogaciones realizadas responden a necesidades propias del contrato y cuentan con soporte documental que respalda su


procedencia y correcta aplicación. ***(ANEXO - 20. SOPORTES DE PAGO FINANCIERO - CONSORCIO INTERNORTE PC)***


11.8. RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS.


A continuación, se relaciona los recursos físicos y electrónicos con los que dispone el personal de obra para la realización de los trabajos. Se relaciona fotos de cada obra que haya iniciado durante el periodo informado.

RECURSO	NOMBRE	REFERENCIA
OFICINA	INTERNORTE PC	CRA 13A #7B-48, BARRIO SAN CARLOS
LABORATORIO	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S.	DG 20B 18B 63 LOCAL 2, BARRIO LAS DELICIAS
TOPOGRAFIA	JER TOPOGRAFIA S.A.S.	CALLE 8B #38-41, BARRIO DIVINO NIÑO
TRANSPORTE	NISSAN NP300	LTW431
	TOYOTA FORTUNER	JVL822
	RENAULT DUSTER	IEW313

REGISTRO FOTOGRAFICO RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	

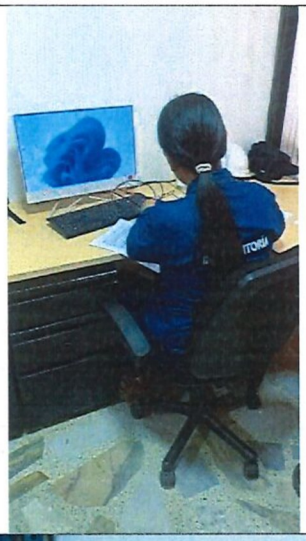

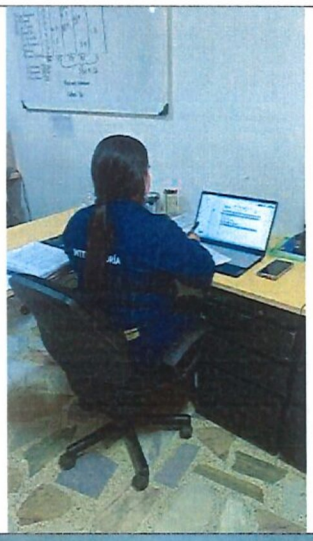











EPSON











Se Anexan soportes de recursos físicos del Consorcio Internorte PC. ***(ANEXO – 26. SOPORTES RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS – CONSORCIO INTERNORTE PC.***

11.9. INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS.

Durante el periodo informado, los distintos especialistas que conforman el equipo de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y SST realizaron recorridos de inspección y verificación en los diferentes tramos viales objeto del proyecto, en conjunto con el personal técnico y operativo del contratista de obra Unión Temporal Red Vial del Norte. Estas actividades se desarrollaron con el propósito de efectuar una revisión integral de las

condiciones actuales de ejecución, verificar el avance físico de las obras, evaluar las actividades ejecutadas en cada frente de trabajo y realizar seguimiento a las observaciones técnicas previamente identificadas.

De igual manera, las visitas permitieron generar espacios de articulación entre la interventoría y el contratista, orientados a optimizar los tiempos de respuesta frente a las no conformidades, observaciones y requerimientos presentados durante la ejecución contractual, garantizando así una atención oportuna y coordinada entre las diferentes áreas del proyecto. En este sentido, cada componente especializado adelantó las respectivas revisiones y ajustes relacionados con aspectos técnicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, así como el seguimiento a las actividades constructivas, señalización, manejo de materiales, control de calidad y cumplimiento de las especificaciones establecidas para el proyecto.

Así mismo, durante los recorridos se efectuó verificación de las condiciones de movilidad, localización de los frentes activos, revisión de cantidades ejecutadas, evaluación del estado de las obras de drenaje y validación de las actividades contempladas dentro del cronograma contractual, dejando registro de las observaciones realizadas y de los compromisos adquiridos por el contratista para su respectiva corrección y seguimiento por parte de la interventoría. Todo lo anterior, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", en cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para la ejecución de la obra.

Así mismo, la UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE, mediante su Informe de Seguimiento al Plan de Calidad, anexó el concepto técnico elaborado por el Ingeniero Eberto Rafael Ortega Sinning, profesional especialista en Vías y Transporte presentado dentro de la propuesta técnica del contratista. No obstante, dicho concepto se encuentra actualmente en proceso de revisión y evaluación por parte del especialista correspondiente de la interventoría técnica, con el fin de verificar su conformidad técnica y el cumplimiento de los criterios establecidos para el proyecto.

Se Anexa Informe presentado y actas de visitas realizadas en el periodo informado ***(ANEXO – 24. CONCEPTOS TECNICOS DISEÑOS – UNION TEMPORAL RED VIAL)***

11.10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En desarrollo de las funciones de seguimiento, control y vigilancia establecidas para el Contrato de Interventoría N° 2026–05–0004, cuyo objeto corresponde a la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mejoramiento de la Red Vial en la Subregión Norte del Departamento del Cesar, esta Interventoría efectuó el proceso de

revisión, inspección y verificación integral sobre las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el marco del Contrato N° 2026–04–0001.

Como resultado del seguimiento realizado durante el periodo evaluado, se evidenció que el contratista viene desarrollando las actividades conforme a los lineamientos establecidos contractualmente, manteniendo observancia sobre la normativa técnica vigente aplicable al proyecto, así como sobre las especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones, estudios y diseños aprobados, documentos contractuales y demás disposiciones que regulan la ejecución de las obras.

La verificación adelantada por esta Interventoría comprendió, entre otros aspectos, el control sobre la implementación de procedimientos constructivos, revisión de memorias de diseño, validación de cantidades ejecutadas, seguimiento al avance físico de obra, verificación de la correcta conformación de estructuras de pavimento y revisión permanente del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para cada una de las actividades ejecutadas.

Adicionalmente, como parte del ejercicio de control técnico y aseguramiento de la calidad, esta Interventoría realizó y verificó la ejecución de ensayos de laboratorio, pruebas de campo y controles técnicos sobre los materiales y actividades desarrolladas por el contratista, con el propósito de validar objetivamente el cumplimier to de las condiciones de calidad exigidas para el proyecto.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas, los registros documentales revisados, las inspecciones realizadas en campo y los resultados obtenidos a través de los ensayos y controles de calidad ejecutados, esta Interventoría concluye que, para el periodo objeto de evaluación, el contratista de obra desarrolla las actividades dentro del marco de cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones y los documentos contractuales vigentes.

Lo anterior se presenta sin perjuicio de las actividades de seguimiento continuo, observaciones, recomendaciones y requerimientos que, en ejercicio de las funciones propias de la Interventoría, puedan generarse durante las siguientes etapas de ejecución contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto, la calidad de las obras y la correcta entrega de la infraestructura ejecutada.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

12.1. CONCLUSIONES.

- Durante el período comprendido entre el 10 y el 28 de febrero de 2026, el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR presentó un avance físico acumulado del 2.26%, lo cual evidencia un avance frente al cronograma establecido, dado que para la misma fecha el avance programado es del 1.21%.

- La participación activa de la comunidad evidencia un alto nivel de compromiso frente al proyecto, así como disposición para aplicar las buenas prácticas aprendidas y replicarlas entre familiares, empleados y visitantes.

- La articulación entre el equipo técnico, social y de interventoría ha sido fundamental para garantizar un proceso informativo claro, fortalecer la confianza comunitaria y facilitar el correcto desarrollo del proyecto.

- La unión temporal red Vial del norte para el periodo informado, no ha completado el personal mínimo requerido por la entidad para la ejecución del contrato, a lo cual se requiere se presente en los próximos informes los profesionales restantes.

- Para el periodo informado, no se presento por parte de la Unión temporal el soporte de los gastos efectuados en el periodo informado, lo cual como Interventoría impide realizar el debido control de los gastos realizados por la Unión temporal Red Vial.

- Se verificó el cumplimiento de las condiciones contractuales en aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales y de seguridad laboral, garantizando la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos, así como el registro documental y fotográfico del avance de obra.

12.2. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda fortalecer y optimizar las actividades administrativas orientadas a la debida subsanación de observaciones, con el fin de mitigar los impactos que han ocasionado retrasos en los procesos de verificación y revisión de los planes de trabajo e informes mensuales correspondientes.

- Mantener una adecuada planeación semanal de actividades que permita anticipar necesidades de personal, materiales y equipos, evitando interrupciones que puedan generar atrasos frente al cronograma establecido.

- Implementar controles diarios de avance en los frentes de obra, verificando el cumplimiento de metas parciales y estableciendo acciones correctivas inmediatas en caso de presentarse desviaciones respecto a lo programado.

- Considerar planes de contingencia frente a factores externos como el clima o el estado de las vías de acceso, de modo que se puedan ejecutar estrategias alternativas sin comprometer el avance general del proyecto.

- Mantener una comunicación clara y oportuna sobre cronogramas, avances y compromisos, con esta interventoría y la entidad contratante.

13. ANEXOS

ANEXO - 1. PRESUPUESTO OFICIAL ENTREGADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ANEXO - 2. POLIZAS APROBADAS – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 4. PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 5. PROGRAMACION DE OBRA APROBADA.

ANEXO - 6. INFORMES SEMANALES – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 7. REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO.

ANEXO - 8. ADJUDICACION CONSORCIO INTERNORTE PC.

ANEXO - 9. POLIZAS APROBADAS – CONSORCIO INTERNORTE PC.

ANEXO - 10. PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL – CONSORCIO INTERNORTE PC

ANEXO - 11. BITACORA TRAMO NUEVAS FLORES – TOCAIMO – MEDIA LUNA.

ANEXO - 12. BITACORA TRAMO VALLEDUPAR – LA MESA.

ANEXO - 13. BITACORA TRAMO LA MESA – EL PALMAR

ANEXO - 14. BITACORA TRAMO LA MESA - EL MAMON

ANEXO - 15. BITACORA TRAMO VALLEDUPAR URBANO

ANEXO - 16. ENSAYOS DE LABORATORIO – CONSORCIO INTERNORTE PC.

ANEXO - 17. CERTIFICADO DE CALIBRACION EQUIPO TOPOGRAFICOS Y DE LABORATORIOS – CONSORCIO INTERNORTE PC.

ANEXO - 18. RECIBO DE ACTIVIDADES

ANEXO - 19. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA – CONSORCIO INTERNORTE PC.

ANEXO - 20. SOPORTES DE PAGO FINANCIERO - CONSORCIO INTERNORTE PC

ANEXO - 21. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE SST.

ANEXO - 22. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

ANEXO - 23. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL.

ANEXO - 24. CONCEPTO TECNICO DISEÑO GEOMETRICO VIAL – UNION TEMPORAL RED VIAL

ANEXO - 25. LABORATORIOS Y CONTROL DE MATERIALES – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 26. RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS – CONSORCIO INTERNORTE.

ANEXO - 27. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD – UNION TEMPORAL RED VIAL.

ANEXO - 1. PRESUPUESTO OFICIAL ENTREGADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA DE LA SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES							
1.1	310.1	310-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	109594.60	$ 5,796.00	$ 635,210,302.00
Subtotal								$ 635,210,302.00
2	DEMOLICIONES							
2.1	200.1.1	200-22		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	6.30	$ 6,582,724.00	$ 41,471,161.00
2.2	201.7	201-22		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	333.07	$ 163,705.00	$ 54,525,224.00
2.3	201.15	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	125.59	$ 88,559.00	$ 11,122,125.00
Subtotal								$ 107,118,510.00
3	EXCAVACION							
3.1	210.1.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	28718 65	$ 35,037.00	$ 1,006,215,340.00
Subtotal								$ 1,006,215,340.00
4	TRANSPORTE							
4.1	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	186671.23	$ 1,729.00	$ 322,754,557.00
Subtotal								$ 322,754,557.00
5	RELLENO							
5.1	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA DE ACARREO 59 KM)	M3	1250.00	$ 235,110.00	$ 293,887,500.00
5.2	220.1	220-22		TERRAPLEN (DISTANCIA DE ACARREO 59 KM)	M3	76716.22	$ 241,233.00	$ 18,506,483,899.00
5.3	221.1	221-22		PEDRAPLEN COMPACTO (DISTANCIA DE ACARREO DE 59KM)	M3	4136.00	$ 129,282.00	$ 534,710,352.00
Subtotal								$ 19,335,081,751.00
6	SUB BASE Y BASE							
6.1	320.1.1	320-22		SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 59 KM)	M3	23084.82	$ 253,888.00	$ 5,860,958,780.00
Subtotal								$ 5,860,958,780.00
7	PAVIMENTO							
7.1	500.1.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 PREMEZCLADO E=0.2M (DISTANCIA DE ACARREO DE 59KM)	M3	16322.60	$ 1,203,492.00	$ 19,644,118,519.00
7.2	1P		1P	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	38868.00	$ 27,196.00	$ 1,057,054,128.00
7.3	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO. INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA, BARRAS DE UNION Y CANASTILLAS	KG	213912.85	$ 8,912.00	$ 1,906,391,319.00

Subtotal								$	22,607,563,966.00
8	OBRAS HIDRAULICAS								
	ALCANTARILLAS Y CUNETAS								
8.1	630.1.3.1	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	234.00	$ 1,154,123.00	$	270,064,782.00
8.2	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA Y CUNETA	KG	133257.46	$ 8,912.00	$	1,187,590,484.00
8.3	661.1.2	661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	300.00	$ 1,350,058.00	$	405,017,400.00
8.4	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	3311.16	$ 962,483.00	$	3,186,935,210.00
	BOX CULVERT DE 2MX2M								
8.5	630.1.3.1	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DEL BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	318.16	$ 1,154,123.00	$	367,195,774.00
8.6	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	23.28	$ 732,121.00	$	17,043,777.00
8.7	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60 - PARA ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DEL BOX CULVERT	KG	26807.52	$ 8,912.00	$	238,908,618.00
8.8	210.1	210-22		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	670.93	$ 35,037.00	$	23,507,374.00
8.9	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA BOX CVULVERT Y ESPACIO OCUPADO POR LA EXCAVACION (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	272.00	$ 235,110.00	$	63,949,920.00
8.10	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAMOS (100-1000 M) MATERIAL EXCAVADO DE BOX	M3-KM	4361.02	$ 1,729.00	$	7,540,204.00
	BOX CULVERT 3.0 X 2.0 M								
8.11	630.1.3.1	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DEL BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	272.90	$ 1,154,123.00	$	314,960,167.00
8.12	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	18.75	$ 732,121.00	$	13,727,269.00
8.13	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60 - PARA ENTRADA Y SALIDA Y CUERPO DEL BOX CULVERT	KG	26267.80	$ 8,912.00	$	234,098,634.00
8.14	210.1	210-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA BOX CVULVERT Y ESPACIO OCUPADO POR LA EXCAVACION (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	195.00	$ 235,110.00	$	45,846,450.00
8.15	610.1	610-22		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	547.41	$ 35,037.00	$	19,179,604.00
8.16	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAMOS (100-1000 M) MATERIAL EXCAVADO DE BOX	M3-KM	3558.13	$ 1,729.00	$	6,152,007.00
	CANAL RECTANGULAR								
8.17	610.1	610-22		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE CANAL RECTANGULAR	M3	4200.00	$ 35,037.00	$	147,155,400.00
8.18	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAMOS (100-1000 M) MATERIAL EXCAVADO Del CANAL RECTANGULAR	M3-KM	27300.00	$ 1,729.00	$	47,201,700.00
8.19	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) PARA SOLADO ESTRUCTURA DE CANAL RECTANGULAR (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	140.00	$ 732,121.00	$	102,496,940.00
8.20	630.1.3.1	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) ESTRUCTURA DE CANAL RECTANGULAR (DISTANCIA ACARREO 59 KM)	M3	1360.00	$ 1,294,293.00	$	1,760,238,480.00
8.21	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60 - PARA CANAL RECTANGULAR	KG	26000.00	$ 8,912.00	$	231,712,000.00
Subtotal								$	8,690,522,194.00
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION								
9.1	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	23318.00	$ 5,019.00	$	117,033,042.00
9.2	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	9660.00	$ 5,019.00	$	48,483,540.00
9.3	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	14394.00	$ 5,019.00	$	72,243,486.00
9.4	710.1.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	114.00	$ 1,062,448.00	$	121,119,072.00
9.5	741.1	741-22		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	10.00	$ 878,607.00	$	8,786,070.00
Subtotal								$	367,665,210.00
10	GAVIONES								
10.1	681.1	681-22		GAVIONES EN MALLA TRIPLE TORSION CAL 12	M3	5400.00	$ 427,355.00	$	2,307,717,000.00
Subtotal								$	2,307,717,000.00
11	PUENTE								

11.1	600.2.4	600-22		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN PARA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS Y ALETAS. (BAJO AGUA).	M3	1271.62	$ 174,852.00	$ 222,345,300.00
11.2	610.4	610-22		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO PARA ARREGLO DE LOS ACCESOS DEL PUENTE	M3	1865.79	$ 235,110.00	$ 438,665,887.00
11.3	600.2.4	600-22		EXCAVACION PARA CAISSON PRE EXCAVADOS D= 2.0 mts (NO INCLUYE CAMISA METALICA NI ACERO DE REFUERZO) (INCLUYE CONCRETO PARA ANILLOS SIN TRANSPORTE)	ML	44.00	$ 5,201,213.00	$ 228,853,372.00
11.4	630.3	630-22		CONCRETO CLASE C (28 MPA O 280 KG/CM2 O 4000PSI) (Tablero y Pilotes en concreto)	M3	42.85	$ 1,516,663.00	$ 64,989,010.00
11.5	3P		3P	CONCRETO 3.500 psi PARA CIMENTACIÓN DE ESTRIBOS, ALETAS, Y LOSA DE APROXIMACIÓN. CON FIBRA (para estribos, muros y aletas)	M3	122.50	$ 1,304,894.00	$ 159,849,515.00
11.6	630.3	630-22		CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	3.10	$ 732,121.00	$ 2,269,575.00
11.7	630.6	630-22		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	51.20	$ 575,952.00	$ 29,488,742.00
11.8	900.3.3	900.3-22		TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO	M3-KM	7227.28	$ 1,729.00	$ 12,495,967.00
11.9	640.1	640-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	22810.01	$ 8,912.00	$ 203,282,809.00
11.10	2P		2P	SELLO PARA JUNTAS - CINTA PVC 0.22	ML	18.01	$ 137,548.00	$ 2,477,239.00
11.11	4P		4P	APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO 400 mm x 400 mm x 74 mm Según diseño	UND	6.00	$ 1,989,869.00	$ 11,939,214.00
11.12	650.2	650-22		SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA (A-709 GR50WT1) PARA VIGAS Y RIOSTRAS	KG	24094.01	$ 30,091.00	$ 725,012,855.00
11.13	650.2	650-22		FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A36)	KG	1551.16	$ 14,019.00	$ 21,745,712.00
11.14	663.1	663-22		TUBERIA PERFORADA PVC 100 MM	ML	20.57	$ 16,775.00	$ 345,062.00
11.15	673.2	673-22		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	37.80	$ 21,642.00	$ 818,068.00
11.16	673.1	673-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	3.24	$ 11,647.00	$ 37,736.00
11.17	730.1	730-22		BARANDAS METALICAS TIPO INVIAS	ML	27.00	$ 703,416.00	$ 18,992,232.00
11.18	640.1	640-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTERDECK CALIBRE 20	M2	128.96	$ 131,225.00	$ 16,922,776.00
11.19	623.2	623-22		EJECUCIÓN PRUEBA DE CARGA	UND	1.00	$ 5,646,699.00	$ 5,646,699.00
11.20	620.3	620-22		PRUEBA DE CARGA E INTEGRIDAD PARA PILOTES	UND	2.00	$ 12,969,536.00	$ 25,939,072.00
11.21	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO PARA CAISSONS	KG	22430.59	$ 8,912.00	$ 199,901,418.00
11.22	630.3	630-22		CONCRETO CLASE C (28 MPA O 280 KG/CM2 O 4000PSI) PARA CAISSONS	M3	138.26	$ 1,516,663.00	$ 209,693,826.00
11.23	681.3	681-22		GAVIONES EN MALLA TRIPLE TORSION CAL 12	M3	199.99	$ 427,355.00	$ 85,466,726.00
11.24	731.1	731-22		BARANDA EN CONCRETO PREFABRICADA	ML	51.50	$ 276,579.00	$ 14,243,819.00
11.25	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	82.40	$ 5,019.00	$ 413,566.00
Subtotal								$ 2,701,836,197.00
SUBTOTAL DE OBRAS MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR								**$ 63,942,643,807.00**

				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)				$ 290,942,822.00
				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)				$ 254,390,849.00
				DESCIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR X KM**	**TOTAL**
				CARACTERIZACION VIAL	KM	11.7	$ 1,518,000.00	$ 17,694,612.00

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1 VIA GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

1	**PRELIMINARES**							
1.1	310.1	310-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	139992.00	$ 5,796.00	$ 811,393,632.00
Subtotal								**$ 811,393,632.00**
2	**DEMOLICIONES**							
2.1	200.1	200-22		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	6.63	$ 7,127,423.00	$ 47,263,367.00
2.2	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	77.34	$ 185,494.00	$ 14,346,848.00
2.3	201.12	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5M)	ML	50.40	$ 135,715.00	$ 6,840,036.00
2.4	460.1	460-22		FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (H=0.07)	M2	73680.00	$ 10,181.00	$ 750,136,080.00
Subtotal								**$ 818,586,331.00**

3	EXCAVACION								
3.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	1082.15	$	35,037.00	$ 37,915,290.00
3.2	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	20998.80	$	35,037.00	$ 735,734,956.00
Subtotal									$ 773,650,246.00
4	TRANSPORTE								
4.1	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	347796.54	$	1,729.00	$ 601,340,218.00
Subtotal									$ 601,340,218.00
5	RELLENO								
5.1	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	340.50	$	133,952.00	$ 45,610,656.00
5.2	220.1	220-22		TERRAPLEN	M3	19598.88	$	140,074.00	$ 2,745,293,517.00
Subtotal									$ 2,790,904,173.00
6	SUB BASE Y BASE								
6.1	320.1	320-22		SUBBASE GRANULAR	M3	28980.72	$	152,729.00	$ 4,426,196,385.00
6.2	330.1	330-22		BASE GRANULAR	M3	21551.40	$	186,568.00	$ 4,020,801,595.00
6.3	223.1	330-22		GEOMALLA BIAXIAL FORTGRID BX100	M2	66312.00	$	16,185.00	$ 1,073,259,720.00
Subtotal									$ 9,520,257,700.00
7	PAVIMENTO								
7.1	420.1	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	122800.00	$	10,339.00	$ 1,269,629,200.00
7.2	450.2P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA	M3	14736.00	$	1,200,038.00	$ 17,683,759,968.00
7.3	223.2	223-22		GEOMALLA FORGID ASPHALT 160	M2	98240.00	$	18,885.00	$ 1,855,262,400.00
Subtotal									$ 20,808,651,568.00
8	OBRAS HIDRAULICAS								
	ALCANTARILLAS								
8.1	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	115.44	$	1,045,183.00	$ 120,655,926.00
8.2	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	81.77	$	1,045,183.00	$ 85,464,614.00
8.3	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA Y CUNETAS	KG	91083.48	$	8,912.00	$ 811,735,992.00
8.4	661.1	661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	444.00	$	1,331,065.00	$ 590,992,860.00
8.5	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	2441.07	$	810,089.00	$ 1,977,480,067.00
	BOX CULVERT DE 1.0X1.0 MTS								
8.6	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	32.40	$	1,045,183.00	$ 33,863,929.00
8.7	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	41.60	$	616,039.00	$ 25,627,222.00
8.8	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	1.50	$	1,045,183.00	$ 1,567,775.00
8.9	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	2.80	$	616,039.00	$ 1,724,909.00
8.10	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1MX1M	KG	1180.00	$	8,912.00	$ 10,516,160.00
8.11	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1MX1M	KG	5033.60	$	8,912.00	$ 44,859,443.00
8.12	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	136.73	$	35,037.00	$ 4,790,581.00
8.13	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS. NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	79.20	$	102,480.00	$ 8,116,416.00
8.14	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	3929.91	$	1,729.00	$ 6,794,817.00
8.15	1P		1P	CINTA PVC	ML	80.00	$	137,548.00	$ 11,003,840.00
Subtotal									$ 3,735,194,551.00
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION								

9.1	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	24738.00	$	5,019.00	$ 124,160,022.00
9.2	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	12369.00	$	5,019.00	$ 62,080,011.00
9.3	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	7421.40	$	5,019.00	$ 37,248,007.00
9.4	710.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	117.00	$	1,058,385.00	$ 123,831,045.00
9.5	741.1	741-22		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	10.00	$	874,544.00	$ 8,745,440.00
Subtotal									$ **356,064,525.00**
SUBTOTAL VIA GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA									$ **40,216,042,944.00**
VIA LA MESA - EL PALMAR									
1	PRELIMINARES								
1.1	310.1	310-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	45399.00	$	5,796.00	$ 263,132,604.00
Subtotal									$ **263,132,604.00**
2	DEMOLICIONES								
2.1	200.1	200-22		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	2.70	$	7,127,423.00	$ 19,239,766.00
2.2	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	77.34	$	185,494.00	$ 14,346,848.00
2.3	201.12	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5M)	ML	50.40	$	135,715.00	$ 6,840,036.00
Subtotal									$ **40,426,650.00**
3	EXCAVACION								
3.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	773.85	$	35,037.00	$ 27,113,382.00
3.2	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	13374.57	$	35,037.00	$ 468,604,725.00
3.3	600.2.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (DISPOSICION FINAL DE MATERIALES)	M3	750.00	$	88,785.00	$ 66,588,750.00
Subtotal									$ **562,306,857.00**
4	TRANSPORTE								
4.1	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	271151.20	$	1,729.00	$ 468,820,425.00
Subtotal									$ **468,820,425.00**
5	RELLENO								
5.1	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	252.00	$	133,952.00	$ 33,755,904.00
5.2	220.1	220-22		TERRAPLEN	M3	8916.38	$	140,074.00	$ 1,248,952,788.00
Subtotal									$ **1,282,708,692.00**
6	SUB BASE Y BASE								
6.1	320.1	320-22		SUBBASE GRANULAR	M3	18683.32	$	152,729.00	$ 2,853,484,292.00
Subtotal									$ **2,853,484,292.00**
7	PAVIMENTO								
7.4	500.1.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 E=0,18M	M3	13013.09	$	1,124,122.00	$ 14,628,303,905.00
7.5	2P		2P	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE FSPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	24102.00	$	27,196.00	$ 655,477,992.00
7.6	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO. INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA, BARRAS DE UNION Y CANASTILLAS. EL PALMAR	KG	193446.24	$	8,912.00	$ 1,723,992,927.00
Subtotal									$ **17,007,774,824.00**
8	OBRAS HIDRAULICAS								
	ALCANTARILLAS								
8.1	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	115.44	$	1,045,183.00	$ 120,655,926.00
8.2	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	81.77	$	1,045,183.00	$ 85,464,614.00

8.3	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA Y CUNETAS	KG	89484.26	$	8,912.00	$ 797,483,683.00
8.4	661.1	661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	296.00	$	1,331,065.00	$ 393,995,240.00
8.5	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	2395.37	$	810,089.00	$ 1,940,464,508.00
	BOX CULVERT DE 1.0X1.0 MTS								
8.6	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	25.92	$	1,045,183.00	$ 27,091,143.00
8.7	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	33.28	$	616,039.00	$ 20,501,778.00
8.8	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	1.20	$	1,045,183.00	$ 1,254,220.00
8.9	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	2.24	$	616,039.00	$ 1,379,927.00
8.10	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1MX1M	KG	944.00	$	8,912.00	$ 8,412,928.00
8.11	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1MX1M	KG	4026.88	$	8,912.00	$ 35,887,555.00
8.12	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	109.38	$	35,037.00	$ 3,832,465.00
8.13	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS. NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	63.36	$	102,480.00	$ 6,493,133.00
8.14	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	3143.93	$	1,729.00	$ 5,435,854.00
8.15	1P		1P	CINTA PVC	ML	64.00	$	137,548.00	$ 8,803,072.00
Subtotal									**$ 3,457,156,046.00**
9	**SEÑALIZACION Y DEMARCACION**								
9.1	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	24560.00	$	5,019.00	$ 123,266,640.00
9.2	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	12280.00	$	5,019.00	$ 61,633,320.00
9.3	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	7368.00	$	5,019.00	$ 36,979,992.00
9.4	710.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	115.00	$	1,058,385.00	$ 121,714,275.00
9.5	741.1	741-22		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	10.00	$	874,544.00	$ 8,745,440.00
Subtotal									**$ 352,339,667.00**
11	**OBRAS DE CONTENCION**								
11.1	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIALES)	M3	119.90	$	35,037.00	$ 4,200,936.00
11.2	610.4			SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO SELECCIONADO TIPO SUBBASE PARA ESTRUCTURAS	M3	45.10	$	133,952.00	$ 6,041,235.00
11.3	630.1.6			CONCRETO DE 14MPa (2000PSI) DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA SOLADOS	M3	5.32	$	616,039.00	$ 3,277,327.00
11.4	640.1			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA	KG	2426.80	$	8,912.00	$ 21,627,642.00
11.5	630.1.4.2			CONCRETO DE 21MPa (3000PSI) DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA OBRAS DE CONTENCION	M3	58.75	$	1,065,853.00	$ 62,618,864.00
11.6	673.1.1			SUMINSITRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800 PARA MUROS DE CONTENCION	M2	162.00	$	11,647.00	$ 1,886,814.00
11.7	3P		3P	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA MUROS DE CONTENCION	ML	40.00	$	21,642.00	$ 865,680.00
11.8	610.8			SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE 3/4" PARA MUROS DE CONTENCION	M3	41.00	$	217,516.00	$ 8,918,156.00
Subtotal									**$ 109,436,654.00**
SUBTOTAL VIA LA MESA - EL PALMAR									**$ 26,397,586,711.00**

VIA LA MESA - EL MAMON									
1	**PRELIMINARES**								
1.1	310.1	310-22		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	89163.78	$	5,796.00	$ 516,793,292.00
Subtotal									**$ 516,793,292.00**
2	**DEMOLICIONES**								
2.1	200.1	200-22		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	5.30	$	7,127,423.00	$ 37,786,962.00
2.2	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	38.67	$	185,494.00	$ 7,173,424.00
2.3	201.12	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5M)	ML	25.20	$	135,715.00	$ 3,420,018.00
Subtotal									**$ 48,380,404.00**

3	EXCAVACION								
3.1	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	405.35	$	35,037.00	$ 14,202,248.00
3.2	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	6809.85	$	35,037.00	$ 238,596,714.00
3.3	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (DISPOSICION FINAL DE MATERIALES)	M3	750.00	$	88,785.00	$ 66,588,750.00
Subtotal									$ 319,387,712.00
4	TRANSPORTE								
4.1	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	144966.64	$	1,729.00	$ 250,647,321.00
Subtotal									$ 250,647,321.00
5	RELLENO								
5.1	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	132.00	$	133,952.00	$ 17,681,664.00
5.2	220.1	220-22		TERRAPLEN	M3	4539.90	$	140,074.00	$ 635,921,953.00
Subtotal									$ 653,603,617.00
6	SUB BASE Y BASE								
6.1	320.1	320-22		SUBBASE GRANULAR	M3	9079.80	$	152,729.00	$ 1,386,748,774.00
Subtotal									$ 1,386,748,774.00
7	PAVIMENTO								
7.4	500.1.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 E=0,18M	M3	6625.80	$	1,124,122.00	$ 7,448,207,548.00
7.5	2P		2P	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	12276.00	$	27,196.00	$ 333,858,096.00
7.6	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO. INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA, BARRAS DE UNION Y CANASTILLAS	KG	98528.37	$	8,912.00	$ 878,084,851.00
Subtotal									$ 8,660,150,495.00
8	OBRAS HIDRAULICAS								
	ALCANTARILLAS								
8.1	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	56.16	$	1,045,183.00	$ 58,697,477.00
8.2	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	39.78	$	1,045,183.00	$ 41,577,380.00
8.3	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA Y CUNETAS	KG	45434.13	$	8,912.00	$ 404,908,967.00
8.4	661.1	661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	144.00	$	1,331,065.00	$ 191,673,360.00
8.5	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	1219.64	$	810,089.00	$ 988,015,328.00
	BOX CULVERT DE 1.0X1.0 MTS								
8.6	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	12.96	$	1,045,183.00	$ 13,545,572.00
8.7	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	16.64	$	616,039.00	$ 10,250,889.00
8.8	630.4	630-22		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	0.60	$	1,045,183.00	$ 627,110.00
8.9	630.6	630-22		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	1.12	$	616,039.00	$ 689,964.00
8.10	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1MX1M	KG	472.00	$	8,912.00	$ 4,206,464.00
8.11	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1MX1M	KG	2013.44	$	8,912.00	$ 17,943,777.00
8.12	210.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	54.69	$	35,037.00	$ 1,916,209.00
8.13	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	31.68	$	102,480.00	$ 3,246,566.00
8.14	900.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	1571.97	$	1,729.00	$ 2,717,936.00
8.15	1P		1P	CINTA PVC	ML	32.00	$	137,548.00	$ 4,401,536.00
Subtotal									$ 1,744,418,535.00
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION								
9.1	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	12270.00	$	5,019.00	$ 61,583,130.00

9.2	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	6135.00	$	5,019.00	$ 30,791,565.00
9.3	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	3681.00	$	5,019.00	$ 18,474,939.00
9.4	710.1	710-22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	67.00	$	1,058,385.00	$ 70,911,795.00
9.5	741.1	741-22		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	5.00	$	874,544.00	$ 4,372,720.00
Subtotal									$ 186,134,149.00
11	OBRAS DE CONTENCION								
11.1	210.1.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIALES)	M3	119.90	$	35,037.00	$ 4,200,936.00
11.2	610.4	610-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO SELECCIONADO TIPO SUBBASE PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA DE ACARREO DE 18KM)	M3	45.10	$	133,952.00	$ 6,041,235.00
11.3	630.1.6	630-22		CONCRETO DE 14MPa (2000PSI) DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA SOLADOS	M3	5.32	$	616,039.00	$ 3,277,327.00
11.4	640.1	640-22		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA	KG	2426.80	$	8,912.00	$ 21,627,642.00
11.5	630.1.4.2	630-22		CONCRETO DE 21MPa (3000PSI) DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARA OBRAS DE CONTENCION	M3	58.75	$	1,065,853.00	$ 62,618,864.00
11.6	673.1.1	673-22		SUMINSITRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800 PARA MUROS DE CONTENCION	M2	162.00	$	11,647.00	$ 1,886,814.00
11.7	3P		3P	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA MUROS DE CONTENCION	ML	40.00	$	21,642.00	$ 865,680.00
11.8	610.8	610-22		SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE 3/4" PARA MUROS DE CONTENCION	M3	41.00	$	217,516.00	$ 8,918,156.00
Subtotal									$ 109,436,654.00
SUBTOTAL VIA LA MESA - EL MAMON									$ 13,875,700,953.00
SUBTOTA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR									$ 80,489,330,608.00
				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)					$ 247,502,274.00
				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)					$ 255,177,064.00
				DESCIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR X KM	TOTAL
				CARACTERIZACION VIAL	KM	28.86	$	1,518,000.00	$ 43,806,512.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR									
1	PRELIMINARES								
1.1				Excavación mecánica de la explanación	m3	33635.98	$	35,037.00	$ 1,178,503,831.00
1.2				Conformación de la calzada existente	m2	90908.15	$	4,132.00	$ 375,632,476.00
1.3				Transporte de material proveniente de la excavación	m3-km	422889.71	$	1,729.00	$ 731,176,309.00
Subtotal									$ 2,285,312,616.00
2	MATERIALES GRANULARES								
2.1				Subbase granular	m3	18181.65	$	143,832.00	$ 2,615,103,083.00
2.2				Relleno Seleccionado	m3	3747.31	$	126,603.00	$ 474,420,688.00
Subtotal									$ 3,089,523,771.00
3	CAPA DE RODADURA								
3.1				Pavimento de concreto hidráulico MR = 4,2 MPa premezclado de 17 cm de espesor. Incluye transporte	m3	15454.38	$	1,117,714.00	$ 17,273,576,887.00
3.2				Corte, limpieza y sello de juntas de dilatación de pavimentos de concreto hidráulico.	mL	39331.22	$	27,196.00	$ 1,069,651,859.00
3.3				Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	153842.18	$	8,912.00	$ 1,371,041,508.00
3.4				Tapa de acero para pozo de inspección	ud.	76.00	$	499,560.00	$ 37,966,560.00
Subtotal									$ 19,752,236,814.00
4	ESPACIO PÚBLICO								
4.1				Excavación manual en material común (zona de espacio público)	m3	4385.26	$	72,224.00	$ 316,721,018.00

4.2				Relleno con material clasificado proveniente de la excavación.	m3	3078.69	$ 80,924.00	$ 249,139,910.00
4.3				Bordillo en concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión, con sección transversal de 15 cm x 15 cm, fundido sobre losa de pavimento. Incluye 2 varillas de refuerzo longitudinal de 3/8" y ganchos de 3/8" con una longitud de 50 cm, espaciados cada 40 cm.	mL	16981.62	$ 71,175.00	$ 1,208,666,804.00
4.4				Bordillo en concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión, con sección transversal de 15 cm x 20 cm, fundido sobre losa de pavimento. Incluye 2 varillas de refuerzo longitudinal de 3/8" y ganchos de 3/8" con una longitud de 50 cm, espaciados cada 40 cm.	mL	3876.04	$ 81,330.00	$ 315,238,333.00
4.5				Bordillo en concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión, con sección transversal de 15 cm x 25 cm, fundido sobre losa de pavimento. Incluye 2 varillas de refuerzo longitudinal de 3/8" y ganchos de 3/8" con una longitud de 50 cm, espaciados cada 40 cm.	mL	8382.58	$ 94,530.00	$ 792,405,287.00
4.6				Concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión para andenes con un espesor de 7 cm.	m2	28837.88	$ 122,826.00	$ 3,542,041,449.00
Subtotal								$ 6,424,212,801.00
5	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
5.1				Señales verticales de tránsito tipo SR y SP de 60 cm x 60 cm calidad tipo INVIAS.	ud.	236.00	$ 677,900.00	$ 159,984,400.00
Subtotal								$ 159,984,400.00
6	REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS							
6.1				Excavación mecánica para tubería de alcantarillado	m3	195.99	$ 37,932.00	$ 7,434,293.00
6.2				Excavación manual para acometidas domiciliarias	m3	67.32	$ 72,224.00	$ 4,862,120.00
6.3				Cama de arena para instalación de tubería de alcantarillado. Incluye suministro y compactación.	m3	13.07	$ 157,237.00	$ 2,055,088.00
6.4				Relleno de zanja de alcantarillado con material clasificado proveniente de la excavación. Incluye compactación del material.	m2	241.34	$ 80,993.00	$ 19,546,851.00
6.5				Reposición de red de alcantarillado sanitario en tubería PVC d=8"	mL	145.18	$ 122,165.00	$ 17,735,915.00
6.6				Reposición de red de alcantarillado sanitario en tubería PVC d=6" (domiciliarias)	mL	102.00	$ 94,449.00	$ 9,633,798.00
6.7				Conexión de acometidas domiciliarias a la red principal de alcantarillado sanitario por medio de kit de silla yee PVC d=200mmx160mm - 8"x6"	ud.	17.00	$ 313,372.00	$ 5,327,324.00
6.8				Caja de inspección de 60x60x60cm, en concreto de f'c=3.000psi, incluye excavación, acero, tape, tapa y herrajes, cañuelas, e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ud.	17.00	$ 368,485.00	$ 6,264,245.00
6.9				Suministro e instalación de tubería PVC d=1/2" para reposición de acometidas domiciliarias de agua potable	mL	90.60	$ 18,583.00	$ 1,683,620.00
Subtotal								$ 74,543,254.00
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR								$ 31,785,813,656.00
				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)				$ 309,300,000.00
				PMA				$ 194,703,245.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 176,217,788,071.00
VALOR TOTAL	$ 177,831,305,449.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	7%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

ANEXO - 2. POLIZAS APROBADAS – UNION TEMPORAL RED VIAL.

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10

Cumplimiento Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

% del valor de la oferta: 5

Fecha límite para entrega de garantías: 9/01/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18828403	Seriedad de la oferta		18.046.119.354,2 COP	-	19 días de tiempo transcurrido *(17/04/2026 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida
CO1.WRT.19529695	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	195.614.435.993,3 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	8/07/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada
CO1.WRT.19413423	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	8.891.565.272,45 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	8/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada
CO1.WRT.19412990	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	186.722.870.721,45 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	8/07/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.03 10:14:36 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: WHSl+MikA419L261DYGH5A==

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS20000000059-D001

No. PÓLIZA CG-1071640 No. ANEXO 1 No. CERTIFICADO 40245054 No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 02/03/2026 SUC. EXPEDIDORA CARTAGENA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 08/01/2026	24:00 Horas Del 08/07/2032		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	No. DOC. IDENTIDAD	902.022.182-9
DIRECCIÓN	DG 6 A 13 B 21 OF 101 A	TELÉFONO	3008121224
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NRO 12-120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	TELÉFONO	5885602
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NRO 12-120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	TELÉFONO	5885602

OBJETO DE CONTRATO

CANCELACION POR TRASLADO
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 2026 04 0001, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE, CONFORMADO POR:
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. 901.283.017- 7 PARTICIPACION 1%
VIARIA S.A.S. 901.922.982-2 PARTICIPACION 1%
FEAE S.A.S. 900.514.247-3 PARTICIPACION 10%
TRIADA INGENIERIA S.A.S. ZOMAC 901.755.594-1 PARTICIPACION 88%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/01/2026	24:00 Horas Del 08/11/2027	-53.349.391.634,70	-244.457.143,86
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 08/01/2026	24:00 Horas Del 08/11/2027	-71.132.522.179,60	-325.942.858,48
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/01/2026	24:00 Horas Del 08/07/2030	-8.891.565.272,45	-99.999.658,75
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/07/2027	24:00 Horas Del 08/07/2032	-53.349.391.634,70	-667.598.209,02

TOTAL ASEGURADO $ -186.722.870.721,45

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COLOMBIANA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			27
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	CEDIDO			35

PRIMA BRUTA	$	-1.337.997.870,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-1.337.997.870,11
GASTOS EXP.	$	-7.800,00
IVA	$	-254.221.077,32
TOTAL A PAGAR	$	-1.592.226.747,43

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1071640	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	40245054	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/01/2026	24:00 Horas Del	08/07/2032		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - Papel A4

seguros mundial®

Aliados

AGENCIA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1071640** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CESAR / DEPARTAMENTO DEL CESAR** , expedida por la Compañia en **02/03/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **03** dias del mes **MARZO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	40245054
Fecha de Facturación	02/03/2026
Fecha Limite de Pago	01/04/2026

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	CG-1071640	Prima	-1.338.005.670,11
Periodo Facturado	08/01/2026 | 08/07/2032	IVA	-254.221.077,32
		VALOR TOTAL A PAGAR $	-1.592.226.747,43

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL
	DG 6 A 13 B 21 OF 101 A 902.022.182
Intermediario	COLOMBIANA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

UNICAMENTE

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	40245054
Fecha de Facturación	02/03/2026
Fecha Limite de Pago	01/04/2026

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	CG-1071640	Prima	-1.338.005.670,11
Periodo Facturado	08/01/2026 | 08/07/2032	IVA	-254.221.077,32
		VALOR TOTAL A PAGAR $	-1.592.226.747,43

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL
	DG 6 A 13 B 21 OF 101 A 902.022.182
Intermediario	COLOMBIANA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000040245054(3900)0-1592226747(96)20260401

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900402450 54(3900)0-1592226747(96)20260401

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.03 10:15:29 -05:00

Código de Seguridad: kdskJaPl2wNyGS3nu/bRWQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2A0000000059-D001

No PÓLIZA CG-1071640 | No. ANEXO 2 | No. CERTIFICADO 40245091 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICION 03/03/2026 | SUC. EXPEDIDORA CARTAGENA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 10/02/2026	24:00 Horas Del 10/08/2032		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	No. DOC. IDENTIDAD	902.022.182-9
DIRECCIÓN	DG 6 A 13 B 21 OF 101 A	TELÉFONO	3008121224
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NRO 12-120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	TELÉFONO	5885602
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	892.399.999-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NRO 12-120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	TELÉFONO	5885602

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/02/2026, SE MODIFICA LAS VIGENCIAS, QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 2026 04 0001, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE. CONFORMADO POR:
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. 901.283.017- 7 PARTICIPACION 1%
VIARIA S.A.S. 901.922.982-2 PARTICIPACION 1%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/02/2026	24:00 Horas Del 11/12/2027	53.349.391.634,70	244.457.143,86
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 10/02/2026	24:00 Horas Del 11/12/2027	71.132.522.179,60	325.942.858,48
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/02/2026	24:00 Horas Del 10/08/2030	8.891.565.272,45	99.999.658,75
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/08/2027	24:00 Horas Del 10/08/2032	53.349.391.634,70	667.598.209,02

TOTAL ASEGURADO $ 186.722.870.721,45

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COLOMBIANA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 1.337.997.870,11
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 1.337.997.870,11
GASTOS EXP.	$ 7.800,00
IVA	$ 254.221.077,32
TOTAL A PAGAR	$ 1.592.226.747,43

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			27
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	CEDIDO			35

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1071648	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	40245091	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/02/2026	24:00 Horas Del	10/08/2032		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

FEAE S.A.S. 900.514.247-3 PARTICIPACION 10%
TRIADA INGEMIERIA S.A.S. ZOMAC 901.755.594-1 PARTICIPACION 88%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGA AFI

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1071640** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CESAR / DEPARTAMENTO DEL CESAR** , expedida por la Compañía en **03/03/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **03** días del mes **MARZO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

64

- CLIENTE -

Fecha de Facturacion	03/03/2026
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG-1071640
Periodo Facturado	10/02/2026 | 10/08/2032

Referencia de Pago No.	40245091
Fecha Limite de Pago	02/04/2026
Prima	1.338.005.670,11
IVA	254.221.077,32
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.592.226.747,43

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL
DG 6 A 13 B 21 OF 101 A	902.022.182
Intermediario	COLOMBIANA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. [illegible]
2. [illegible] UNICAMENTE [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

PATRIMONIOS AUTONOMOS CAECIOR CAPITAL FIDUCIARIA

NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Fecha de Facturación	03/03/2026
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG-1071640
Periodo Facturado	10/02/2026 | 10/08/2032

Referencia de Pago No.	40245091
Fecha Limite de Pago	02/04/2026
Prima	1.338.005.670,11
IVA	254.221.077,32
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.592.226.747,43

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL
DG 6 A 13 B 21 OF 101 A	902.022.182
Intermediario	COLOMBIANA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000040245091(3900)0015922267 47(96)20260402

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039033(8020)031594(8020)229900040245091(3900)0015922267 47(96)20260402

VIGILADO

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
