MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
SUBDIRECCION

Fecha:	Villavicencio, 19 de agosto de 2026		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora de finalización:**	16:00 horas
Lugar:	Sala Juntas de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García		

ACTA AE-2026- -ESECU – SUDIE 2.21

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EJECUCIÓN AL CONTRATO 51-6-10015-26, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL CUAL FUE AUTORIZADO, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Desarrollo de la agenda
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

- Camila Rivera (Residente de Obra)
- Ana Carolina Díaz (Coordinadora HSEQ)
- IJ. Jonathan Álvarez (Supervisor Técnico)
- ST. Niovelandia (Supervisora Jurídica)
- SI. Alexander Castañeda (Gestión Ambiental)
- Edwin Gil (Profesional SST)

2. Lectura del acta anterior.

No aplica

3. Verificación de los compromisos.

No aplica

4. Desarrollo de la agenda.

Avance Técnico y Financiero:

- Ejecución del 97% del contrato total ($207.214.998,42).
- Actividades concluidas en Alojamiento de Auxiliares, Auditorio, Comedor y Bohío.
- Actividades extras aprobadas por $36.606.064,85 con saldo a favor de $6.178.936,93.

Aspectos Jurídicos y HSEQ:

- Parafiscales del personal al día.
- Cobertura de Seguridad Social verificada en campo.
- Aclaración de canal de comunicación por correo electrónico oficial.

Gestión Ambiental:

- Pendiente la entrega final de certificados de disposición de escombros (RCD) y luminarias tratadas (programado para la semana siguiente).

Trabajos en Altura:

- Se analizó la inclusión de limpieza de canales y sustitución de policarbonato en tarima.
- Dado que requiere plan de trabajo seguro en alturas (andamios certificados, permisos y equipo especializado), se evalúa costo-beneficio frente al presupuesto.

Interviene el señor IJ. Jonathan Álvarez: En el primer comité se realizó, reunión con mi coronel, y se autorizaron una serie de actividades, entre ellas estaba el mantenimiento del alojamiento de auxiliares, un auditorio, el comedor y unas actividades en el bohío.

Se llevaron a cabo las actividades preliminares y las de ejecución dentro del alojamiento de auxiliares. Básicamente se hizo desmonte de enchapes, alistados de piso, desmonte de cerámicas, aparatos sanitarios, desmonte de cielorrasos, red eléctrica, lámparas, cubierta, entre otras. También ya se realizaron actividades de acabados, por decirlo así: se realizaron el reemplazo de los alistados de piso, las redes hidrosanitarias, hidráulicas, enchapes de piso, enchapes de pared, instalación de aparatos sanitarios, puertas, cielorrasos, lámparas, cubiertas nuevas, estucos, pinturas, guarda escobas y otras actividades como instalación de canales y bajantes. También se realizó la intervención de la red hidrosanitaria del auditorio, que se encontraba con taponamientos y se dejó en perfecto estado de funcionamiento.

Igualmente se reemplazaron o se están elaborando las puertas del comedor de estudiantes, se reemplazaron los policarbonatos de las cubiertas de acceso al comedor, al igual que las de acceso al bohío de la escuela.

Se solicitó a la empresa contratista el corte de obra de las actividades ya mencionadas que estuviesen terminadas a la fecha, y nos están pasando un corte por valor de 207.214.998,42 pesos que a la fecha correspondería al 97% del contrato total.

Esta mañana se realizaron verificaciones junto con mi teniente Angie y la ingeniera residente, evidenciando ahí unas observaciones pequeñas, pero ya se corrigieron y quedaría igualmente por ese mismo valor el corte.

Estamos, en la elaboración de los informes de supervisión, recibo a satisfacción para, una vez ya unificados con los tres comités, realizar el trámite correspondiente para el trámite del pago de la cuenta.

Interviene la señorita ST. Niovelandia: me presento subteniente Niovelandia, como supervisora jurídica del contrato con Ingeniería Vergara López S.A.S., en el cual se revisó todo el tema de parafiscales. Se hizo una visita de obra con la ingeniera residente, en el cual se puede evidenciar que se encuentran al día con los parafiscales del personal que está en obra.

Se entiende que los primeros radicados ya han ido saliendo el personal, me imagino que han renovado la planta, pero los que se encuentran en este momento dentro del proceso de ejecución de la obra tienen los parafiscales al día. Asimismo, se revisó la memoria de cálculo, se revisó la orden de trabajo y el informe de recepción detallada.

Los tres comités: el económico, el jurídico y el técnico, que es acá el señor intendente jefe, y con la ingeniera se verificaron unos aspectos que teníamos duda. Ya pues subsanado todo, la idea es poder proceder a la facturación con la autorización del señor ordenador del gasto y los informes que nos pide a nosotros como contratos para cargar eso a la plataforma SECOP.

continuando aquí con el comité, es importante resaltar que se han venido haciendo esas visitas de acompañamiento y verificación por parte inclusive de los integrantes aquí del comité técnico, jurídico y económico. De igual forma, se realizó una visita por parte del señor subintendente Alexander Castañeda, del Sistema de Gestión Ambiental, y del señor Edwin Gil, de Seguridad y Salud en el Trabajo. También pues ellos realizaron algunas observaciones y verificaciones, y es importante que ellos también nos cuenten respecto a su visita qué encontraron, cuáles fueron los resultados de esa visita, para que quede como soporte dentro del presente comité.

Interviene el señor SI. Alexander Castañeda: como apoyo a la supervisión del contrato de mantenimiento de obra del alojamiento de los auxiliares de policía, en lo que tiene que ver en materia ambiental. Se habló con la ingeniera acerca del certificado de disposición de los residuos de los escombros e igualmente del certificado de las luminarias como tal que fueron instaladas en la obra. Estamos a la espera de que, pues se haga la entrega de estos dos certificados.

Interviene el señor PRO06. Edwin Gil: Se realizo el día de ayer una visita en acompañamiento del señor capitán Cuervos, se verificó el pago de seguridad social del personal que se encontraba en ese momento en obra. Se presentaron cuatro funcionarios de los cuales se contrastó frente a las planillas que en ese momento mostró la ingeniera residente, y se constató que los que estaban allí en ese momento contaban con la cobertura del pago de seguridad social.

Adicional a ello, se hizo una observación frente a la respuesta de una solicitud que se hizo en un momento al correo beylezsas@gmail.com, que a la fecha pues no se ha tenido conocimiento de la respuesta al correo de esecu.gut-sst@policia.gov.co. Se reenvió nuevamente a la señora ingeniera residente y pues al momento seguimos en espera de la respuesta.

La solicitud era con respecto a unas obras que se adelantaban en su momento que implicaban tareas de alto riesgo y diligenciamiento de unos documentos necesarios y requeridos para la ejecución de tal actividad.

Interviene la señora Diana / Contratista: el correo nunca llegó, y en la última semana no había llegado correo porque he contestado los correos de los que me han llegado de la parte ambiental. Y de la parte ambiental aún no hemos hecho la disposición final; incluso ya para la próxima semana que entra ya vamos a hacer la disposición final de todos los residuos que tenemos allí. Entonces es como para que lo tenga presente, pero yo ya contesté un correo de la parte ambiental, pero por la

parte de SST no he recibido ningún correo hasta la fecha. No sé si de pronto me escribes por WhatsApp y yo te confirmo otra vez el correo, porque pues lo que te digo, no hemos recibido ningún correo de parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es importante entonces, por parte de la ingeniera de obra o del ingeniero contratista, representante legal, de pronto alguna manifestación en cuanto a lo que se está adelantando y lo que falta por avanzar en la obra, y ya para ir dejando pues claros los puntos de las áreas que faltan por intervenir.

Interviene la Ing. Camila Rivera: En cuanto a las actividades ejecutadas en el alojamiento, solamente falta la disposición del RCD y eso sería todo. Ya se montó la orden de trabajo con respecto a las actividades extras, que incluyen actividades para el muro de la entrada, auditorio, el comedor, el bohío y el shut. El total de todas estas actividades da 36.606.064,85, teniendo así un saldo todavía a favor de 6.178.936,93. En la parte del muro de entrada se incluyen estas actividades preliminares, la parte eléctrica, el muro en mampostería enchapado en su totalidad, acabados en pintura, mortero y pues obviamente el aseo general del área.

Como se va a hacer un retiro de las mallas existentes, pues esas se le darían disposición a la escuela. Para la parte del auditorio, pues se tiene contemplado la puerta principal en vidrio y otras actividades de esas que fueron las que se realizaron en la parte de adentro para el destaponamiento.

En el comedor serían la instalación de las puertas correspondientes, estas van a quedar de doble hoja en aluminio con ventilación abriendo hacia afuera, y se hizo pues ya el cambio de cubierta en ambas entradas. En la parte del bohío se hizo el cambio de las cubiertas correspondientes. Bueno, una estaba existente, esa se retiró, se cambió, y la otra no estaba, pero pues ya se hizo la instalación. Y por último tenemos actividad en el shut, que es el cambio de una puerta. El material de esto sería en lámina Cold Rolled, obviamente corrediza y que tenga ventilación, pues por lo que se encuentra en el shut de basura. Se había tenido presente también dos actividades extras más que eran el aseo y mantenimiento de una canal ubicada en uno de los alojamientos y el cambio de una sección de policarbonato en la parte al frente de la tarima. ¿Qué pasa? Por temas de altura, estas actividades no se incluyeron.


COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
6. Verificar que el personal que ingrese a las instalaciones policiales sea confiable y cuente con la documentación correspondiente.	**Subdirector Escuela**	**Permanente**
4. Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas.	**Contratista**	**Permanente**

ACTA AE-2026- -ESECU – SUDIE 2.21 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EJECUCIÓN AL CONTRATO 51-6-10015-26, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL CUAL FUE AUTORIZADO, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Registro fotográfico

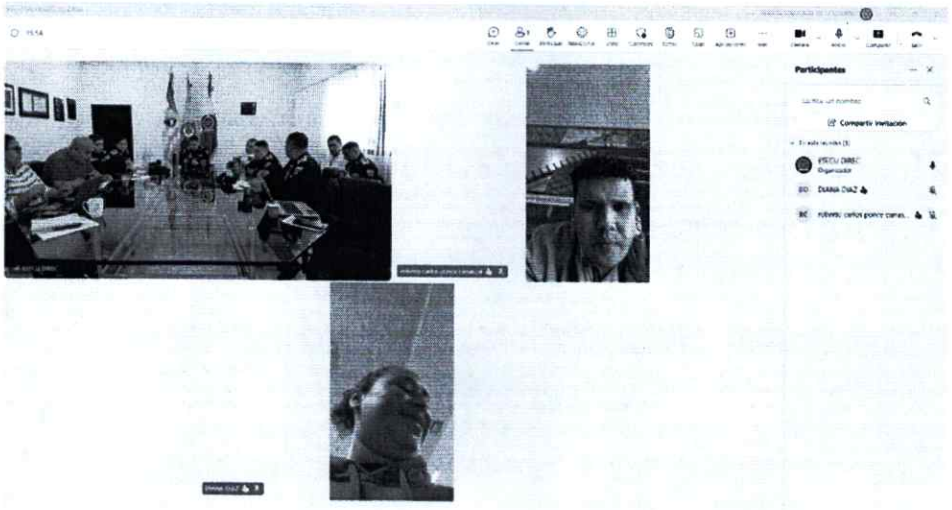



CONVOCATORIA

El próximo comité de obra se realizará en las instalaciones sala juntas Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, fecha pendiente por programar.

Capitan CRISTIAN ENRIQUE CUERVO BARRIOS
Jefe Logístico de la Unidad

Elaboro: CT. Cristian Enrique Cuervo Barrio
Revisado: CT. Cristian Enrique Cuervo Barrio
Fecha de elaboración 17/08/2026
Ubicación:disco D:\\mis documentos\archivos2026

Carrera 37 47-00 Barrio La Esmeralda
Teléfono 6641179
esecu.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
GRUPO LOGISTICO

Fecha:	Villavicencio, 19 de Agosto de 2026		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora de finalización:**	16:00 horas
Lugar:	Sala Juntas de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.		

ACTA AE-2026- -ESECU – SUDIE 2.21

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EJECUCIÓN AL CONTRATO 51-6-10015-26, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL CUAL FUE AUTORIZADO, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA

Carrera 37 47-00 Barrio La Esmeralda
Teléfono 6641179
esecu.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

NFORMACIÓN PUBLICA

AE-2026-002132-ESECU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
GRUPO LOGISTICO

Fecha:	Villavicencio, 19 de Agosto de 2026		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora de finalización:**	16:00 horas
Lugar:	Sala Juntas de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.		

ACTA AE-2026- -ESECU – SUDIE 2.21

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EJECUCIÓN AL CONTRATO 51-6-10015-26, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL CUAL FUE AUTORIZADO, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TC	Rivelos moneco Julian	Esecu-Direc	Esecu-Direc@Polco	71.260.393	3215393280	
MY	DURAN MACHADO GONZALO	SUBDIR - ESECU	garzalo.duran1072@	81.715.165	3203002107	
My	Diana M Segura Ramirez	COORD-ESECU.	diana.segura1333	1.032.372.118	3213918147	
CT	Rosa Delcira Acevedo	Jefat - Esecu	Rosa.acevedo4019@	1020740189	3143334734	
ST	Anggie Vecanda Olaya	GRUPO-ASTUR	anggie.vebanda6988	1018444286	3102131060	
IS	JHONATAN ALCAIZEZ	REINF A.	jajon.alcarez	86088896	3118178807	
IT	Dora Ramos Ramos	Asesor - Grulo	dramos.yamos.@	1067853085	3275164749	

Carrera 37 47-00 Barrio La Esmeralda
Teléfono 6641179
esecu.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

NFORMACIÓN PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
GRUPO LOGISTICO

Fecha:	Villavicencio, 19 de Agosto de 2026		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora de finalización:**	16:00 horas
Lugar:	Sala Juntas de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.		

ACTA AE-2026- -ESECU – SUDIE 2.21

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DEL SEGUNDO COMITÉ DE OBRA EN EJECUCIÓN AL CONTRATO 51-6-10015-26, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL CUAL FUE AUTORIZADO, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
PTO 06	Edwin Fabian Gil Pacheco	GUSAP	edwin.gil@camogas.co	74860381	3143517561	
SI	Alexander Castaneda	plane	Alexander.Castaneda	1022357268	3115619585	
CT	CRISTIAN CUERVO	GRULO	enrique.cuervo5089	1070585089	3208398914	
IT	Diego Castro Montero	GRUFI	diego.castro1765	1.024491765	3125286133	

Carrera 37 47-00 Barrio La Esmeralda
Teléfono 6641179
esecu.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

NFORMACIÓN PUBLICA

037-10
