Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE BARRANCABERMEJA REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARÍA JURIDICA Y DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO 1732-24 REMITE A LA SECRETARÍA JURÍDICA Y DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO: ACTA DE LIQUIDACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A - NIT:829000291-4**	**N°. CONTRATO: 1732-24**
DETALLE:	**PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:** ACTA PARCIAL ○ ACTA DE LIQUIDACIÓN ● OTRA: _____	**CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:** ○ CUENTA DE COBRO ○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○ OTRO: _____ **FIRMA DEL SUPERVISOR**

SECRETARÍA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA DE CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS(CD DEBE VENIR MARCADO)	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS EVALUACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

RECIBIDO DE LA SECRETARÍA JURIDICA

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS EVALUACIÓN

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARÍA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD:

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL OTRO SÍ, COPIA DEL OTRO SI

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
Dir: KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO
Tel: 3134234312
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO
email: facturacion@pisansilvestre.com

NIT 829000291-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN N° 18764085928786 del 23/12/2024 valida desde 23/12/2024 hasta 23/12/2025, Numeración Autorizado del prefijo: FE desde el número 423 al 999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FE436**

Señor(es)
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890201900 - 6
CR 5 50 43 SEC COMERCIAL
Tel: 6221936
armando.montes@barrancabermeja.gov.co
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/05/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	26/06/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	1732-24	CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 9,9405% DEL VALOR DEL APORTE DEL DISTRITO DE BARRANCABEMEJA CONVENIO 1732-24 CUYO OBJETO ES 'RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL DE CONEXIONES HIDRICAS EN AREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA'	1.00	UND	$1,395,686,249.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,395,686,249.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$1,395,686,249.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$1,395,686,249.00
Total a Pagar	$1,395,686,249.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: OMGlqK4N8sd+2nGTF9lVowlMm9YyR0rvO8cAA+fdB/A89ls8B6VCZhdjvCKKEnzoltty9Lhs0r/
W16BcO8LLAgaOybgc77IRDYfRnX8aGjhzNcwRMDbaA8kOyahYAUlOX4ZIX1dCgHKndM1tSyMmUqUmFDuwbnwpddjGr9lobXygUHWZR/
f6x31Nnb61pbdK40fFenb78VsbQ0aT1C8moyCyztotKtcTKjbXERQ6OwhEP3s4F2nn7S6rt5Gh/
r+gmHHU3DP3Na5wvNJ63H7fGoK36PincWQE9nsFtAtvUCopPaJWQ2U3Vm9bLRDyVmvhcrjP0u7HNCQkECybjQ==

CUFE: 20dbf2e1f91a57be84de8cbeb8d40d28afc8fb6c7242f5b40e838b3d505d773fc8e005d71df8fb912671f45f9c4c1753c

Fecha y hora de Generación: 5/27/2025 3:44:15 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/27/2025 3:44:15 PM

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

Barrancabermeja, 26 de mayo de 2025

Señores:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Rafael Leonardo Granados Cardenas
secretario Distrital de Barrancabermeja – Santander

REFERENCIA: CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO Según la CLAUSULA OCTAVA-IMPUTACION PRESUPUESTAL, Del convenio interadministrativo N° 1732-24 cuyo objeto es "RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL DE CONEXIONES HIDRICAS EN AREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente PISCICOLA SAN SIVESTRE S.A allega la factura N°436 correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **($1.395.686.249) M/TCE**.

Por concepto de CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO según la CLAUSULA OCTAVA – IMPUTACION PRESUPUESTAL. ***CUARTO Y ULTIMO*** El distrito desembolsara un 9,9405% de sus aportes pactados cuando el avance del proyecto corresponda a un noventa y nueve punto sesenta y siete por ciento (99,67%), previa presentación del informe correspondiente de ejecución con las respectivas evidencias, acta parcial y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la entidad ejecutora.

El desembolso se tomará de los siguientes rubros presupuestales:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR DEL RUBRO	DESEMBOLSO N°1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	TOTAL PAGADO	PENDIENTE DESEMBOLSO
2.3-3202-0000-007-240029-2.3.2.020.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RIBEREÑOS	$ 642.791.405,00	$ 528.000.000,00	$ 114.791.405,00		$ 642.791.405,00	
2.3-3202-0000-007-240029-2.3.2.020.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TRANSFERENCIA CORMAGDALENA LEY 161 DE 1994	$ 10.569.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 3.000.000.000,00	$ 4.212.134.922,00	$ 9.162.134.922,00	$ 1.337.865.078,00
2.3-3202-0000-007-240029-2.3.2.020.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TRANSFERENCIA CORMAGDALENA LEY 161 DE 1994 RECURSOS DEL BALANCE	$ 97.999.695,00	$ 97.999.695,00	$ -		$ 97.999.695,00	$ -
2.3-3202-0000-007-240029-2.3.2.020.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-RIBEREÑOS	$ 8.358.702,00	$ -	$ -		$ -	$ -
2.3-3202-0000-007-240029-2.3.2.020.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Fonab 156 recursos propios acuerdo 030/94	RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACUERDO	$ 2.791.299.940,00	$ 1.636.135.227,00	$ 1.097.343.517,00		$ 2.733.478.744,00	$ 57.821.171,00
			$ 14.040.449.742,00	$ 4.212.134.922,00	$ 4.212.134.922,00	$ 4.212.134.922,00	$ 12.636.404.766,00	$ 1.395.686.249,00

NOTA 1: El pago o la consignación de los dineros deberán depositarse en la cuenta de ahorros N° 146200101062 del BANCO DAVIVIENDA, cuyo titular es el suscrito PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

Atentamente,

JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Gerente Encargado
Piscícola San Silvestre S.A

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: gerencia@pisansilvestre.com
administrativa@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander, COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 1732-24

CONVENIO N°:	1732-24
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6.
COOPERANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.
NIT	829.000.291-4
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO	JOSÉ DE JESUS QUICENO FLÓREZ
CÉDULA:	1.096.187.823 DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INCIAL:	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE es de: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($14.431.259.513). Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($390.809.771).
VALOR ADICIONAL No. 1: POR PARTE DE PISCICOLA SAN SILVESTRE	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($251.669.348)
VALOR TOTAL OTROSI MODIFICATORIO No. 1	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE es de: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($14.682.928.861) Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($642.479.119).
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No. 24-04028** DEL 05 DE JUNIO DE 2024 REGISTRO PRESUPUESTAL **N° 24-04836** DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **CEPAA No. 3583** DEL 05 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS – Secretario de Distrital de Ambiente y transición energética o quien haga sus veces
BANCO DE PROYECTOS:	20240680810028 – 2024680810029
OTROSI MODIFICATORIO No.1	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ MODIFICATORIO No.2	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

En el Distrito de Barrancabermeja, se reunieron **RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS** – SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, según Decreto de Nombramiento N°168 del 23 de abril de 2025 mediante acta de posesión 052, en su calidad de Supervisor del Convenio No.1732-24 y el señor **JOSÉ DE JESUS QUICENO FLÓREZ**, mediante Nombramiento Acta de Junta Directiva N° 122-2024 en su calidad de representante legal encargado de la empresa PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A., con el objeto de suscribir la presente Acta de liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Distrito de Barrancabermeja suscribió el Convenio Interadministrativo No.1732-24 con la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A., identificada con NIT 829.000.291-4, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL REPOBLAMIENTO ICTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS"*

2. Que el día veintisiete (27) de agosto de 2024 se suscribe OTROSÍ MODIFICATORIO No.1 al convenio interadministrativo No.1732-24 mediante el cual entre otros se realiza la ampliación del plazo de ejecución del convenio por diez días, siendo la nueva fecha de terminación del convenio No.1732-24 el día 30 de diciembre de 2024.

3. Que el día diez (10) de octubre de 2024 se suscribe OTROSÍ MODIFICATORIO No.2 al convenio interadministrativo No.1732-24 mediante el cual se realiza la ampliación de los alcances y el presupuesto de algunas actividades establecidas en el convenio No.1732-24, sin adicionar recursos al presupuesto del convenio.

4. Que el día treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió acta de finalización de la ejecución del convenio No.1732-24.

5. Que, sobre valor y forma de pago, se dispuso lo siguiente:

PRIMER DESEMBOLSO: El Distrito desembolsará un 30% de sus aportes pactados una vez las partes en comité de seguimiento aprueben el PDT y el ejecutor allegue el certificado de cumplimiento de aportes a parafiscales y seguridad social.
SEGUNDO DESEMBOLSO: El Distrito desembolsará un 30% de sus aportes pactados cuando el avance del proyecto corresponda a un cincuenta por ciento (50%), previa presentación del informe correspondiente de ejecución con las respectivas evidencias, actas parciales y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la entidad ejecutora.
TERCER DESEMBOLSO: El Distrito desembolsará un 30% de sus aportes pactados cuando el avance del proyecto corresponda a un noventa por ciento (90%), previo presentación del informe correspondiente de ejecución con las respectivas evidencias, actas parciales y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la entidad ejecutora.
Desembolso final: El distrito desembolsará un 10% de sus aportes pactados cuando el avance del proyecto corresponda cien por ciento (100%), previa presentación del informe

correspondiente de ejecución con las respectivas evidencias, actas parciales y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social de la entidad ejecutora.

6. Que mediante oficio de fecha 26 de mayo de 2025 la Piscícola San Silvestre S.A. radico el informe final y de liquidación del convenio No.1732-24 el cual contiene: Informe financiero final y de liquidación, informe técnico, liquidaciones monitores, Liquidaciones vigías, liquidaciones administrativos, liquidación Unión Temporal Limpieza INCO, liquidación COSTRUMULL, liquidación LASERTEC, liquidación JTR logística Empresarial de Transporte S.A.S, Paz y Salvos de personal (administrativo, monitores y vigías), certificado repoblamiento íctico, informe financiero consolidado, informe técnico consolidado.

7. **EJECUCIÓN DEL CONVENIO:**

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-2024)		
URBANO			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DISTRITO
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD				
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	ML	25.801,000473	25.801	99,9999982%	$ 984.953.175
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros de ancho	ML	8.164	8.164	100%	$ 421.988.996
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	M2	103.204,00189147	103.204	99.9999982%	$ 402.805.212
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	M2	40.329	40.329	100%	$ 213.501.726
				TOTAL	99.99%	$ 2.023.249.109

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-24)		
RURAL			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DISTRITO
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD				
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	40.449	40.449	100%	$ 2.425.928.775
1.2.2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	M2	159.303	159.303	100%	$ 1.043.753.256
				TOTAL	100%	$ 3.469.682.031

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-2024)		
ITEM	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS (Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO	VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DISTRITO
2.1	Ciénaga San Rafael de Chucuri	M2	40.000	40.000	100%	$ 1.214.400.000,00
2.2	Ciénaga Opón	M2	40.000	40.000	100%	
2.3	Ciénaga Zapatero	M2	40.000	40.000	100%	
2.4	Ciénaga la Cira	M2	60.000	60.000	100%	
2.5	Ciénaga los Mangos	M2	20.000	20.000	100%	
2.6	Ciénaga Llanito	M2	40.000	40.000	100%	
				TOTAL	100%	

REMOCION DE SEDIMENTOS									
			a corte 04/11/2024	05/11/2024 A 13/12/2024					
Sectores intervenidos	Cantidad contractual	Unidad	Acta parcial 1	Acta parcial 2	Acta Parcial 3	Acta Final	Total	% de ejecución	VALOR TOTAL DE

									EJECUCIÓN DISTRITO
Caño Pozo 7- Sector el Puente	17.160,62	M3	4203,26	407,25	0	0	4.610,51	99.91%	$3.172.404.358
Caño Pozo 7- Sector Bendición de Dios			0	1977,76	0	0	1977,76		
Caño Pozo 7- Sector Renacer			0	6.569,63	0	0	6.569,63		
Caño sector Diamante-Las Torres			0	0	2.286,66	1.701,44	3.988,10		
TOTAL			4203,26	8.954,64	2.286,66	1.701,44	17.146,00		
NOTA	De la cantidad total, quedó un saldo por ejecutar 14,62 m3								

2	REPOBLAMIENTO ICTICO	UNIDAD	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN PISCICOLA	VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DISTRITO
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	1.779.840,00	2.500.955	$ 139.999.781	$ 732.833.514
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	540.002,00	656.605,19	$ 52.238.144	$ 241.920.896
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430.114,00	446.780	$ 49.998.000	$ 1.290.342.000

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-24)		
RURAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO	VALOR DE EJECUCIÓN DISTRITO
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	40.449	40.449	100%	$ 2.425.928.775
1.2.2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	M2	159.303	159.303	100%	$ 1.043.753.256
				TOTAL	100%	$ 3.469.682.031

VALLAS INFORMATIVAS	UND	CANT	VALOR DE EJECUCIÓN DISTRITO
Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	10	$ 14.243.340
Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	5	$ 8.746.670
	TOTAL	100%	$ 22.990.010

EJECUTADO A LA FECHA							
4.2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	UNIDAD	CANT	TIEMPO (MES)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO	VALOR DE EJECUCIÓN PISCICOLA
4,2,1	Arrendamiento oficina	MES	0	0,0	0		
4,2,2	Costo papelería, fotocopias, etc	MES	1	4,0	4.0	100%	$ 10.629.348
4,2,3	Servicios públicos y operacionales	MES	1	4,0	4.0	100%	$ 10.000.000
4,2,4	Alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones	MES	1	4,0	4.0	100%	$ 22.800.000
4,2,5	Alquiler de camioneta (todo	MES	2	4,0	4.0	100%	$ 153.840.000

	incluido * 3 vehículos)						
4,2,6	Campamentos contaíner incluye serv. Públicos provisionales y bienestar (50 m2 a $100.000/m2) 4 und	MES	0	0,0	0		
4,2,7	Pólizas 0,7%	MES	0	0,0	0		
TOTAL						**100%**	**$ 197.269.348**

1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	% AVANCE FÍSICO	VALOR DE EJECUCIÓN DISTRITO
1.1	Formación de monitores ambientales participativos	und	4	120	100%	$ 15.480.000
1.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	und	4	120	100%	$ 1.481.782.080
1.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	und	4	12	100%	$ 8.343.530
1.4	Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente	und	2	34	100%	$ 152.544.128
VALOR TOTAL					**100%**	**$ 1.658.149.738**

1.4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Prest. Soc.)	UND	Condiciones iniciales			Condiciones actualizadas			VALOR DE EJECUCIÓN PISCICOLA	VALOR DE EJECUCIÓN DISTRITO
			TIEMP mes	CANT	FM	TIEMP mes	CANT	FM		
1.4,1.1	Coordinador	und	4	1,00	1,98	4,300 (129 días)	1	1,74		$ 55.135.977,16
1.4,1,2	Abogado	und	4	1,00	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74		$ 44.295.200
1.4,1,3	Ingeniero Ambiental o afines	und	4	3,00	1,98	4,930 (147 días)	1	1,74		$ 31.327.351,84
1.4,1,4	Ingeniero de producción	und	4	1,00	1,98	4,616 (138 días)	1	1,74	$ 29.332.796,55	
1.4,1,5	Ingeniero pesquero	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74	$ 26.934.800	
1.4,1,6	Médico veterinario	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74	$ 25.418.400	
1.4,1,7	Contador	und	4	1	1,98	5,900 (177 días)	1	1,74		$ 39.728.830
1.4,1,8	Coordinador de producción	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74		$35.632.000
1.4,1,9	Profesional residente	und	0	0	0	4,000 (120 días)	1	1,74	$ 35.632.000	
1.4,1,10	Auxiliar Administrativo	und	0	0	0	4,000 (120 días)	1	1,74	$ 10.030.000	
1.4,1,11	Ingeniero Ambiental o afines	und	0	0	0	5,667 (147 días)	1	1,74	$ 36.009.400	
1.4,1,12	Ingeniero Ambiental o afines	und	0	0	0	5,500 (112 días)	1	1,74	$ 34.950.300	
VALOR TOTAL									**$ 198.307.696,55**	**$ 206.119.359**

Nota: En los valores de cierre y liquidación del personal técnico y administrativo ,se realizó el ajuste en el factor multiplicador, teniendo en cuenta los descuentos presentes en los procesos administrativos de la piscícola San Silvestre S.A (De acuerdo con el artículo 25 de la ley 1706 del 2012); una vez realizado el ajuste del factor multiplicador este queda en 1.70, siendo menor al estipulado en otro sí modificatorio N°2, que tiene por objeto ampliar los alcances de las actividades 1 y 3 del convenio interadministrativo N° 1732-24, como se muestra en el cuadro. Por lo cual hay unos valores sin ejecutar.

8. BALANCE ECONÓMICO

- **APORTES DEL DISTRITO**

Valor del Aporte distrito	**$ 14.040.449.742,00**	
Valor primer desembolso (pagado)		$ 4.212.134.922,00
Valor segundo desembolso (pagado)		$ 4.212.134.922,00
Valor tercer desembolso(pagado)		$ 4.212.134.922,00

Valor presente acta de liquidación		**$ 1.395.686.249,00**
Saldo a favor del Distrito		$ 8.358.727,00
Sumas Iguales	**$ 14.040.449.742,00**	**$ 14.040.449.742,00**

La presente sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 1.395.686.249,00)** a favor del contratista, correspondiente al acta de liquidación.

- **APORTES PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.**

Valor del Aporte cooperante	$ 642.479.119	
Valor ejecutado		$ 637.812.969,55
Valor sin ejecutar		$ 4.666.149,45
Sumas Iguales	$ 642.479.119	$ 642.479.119

9. FACTURA

El contratista para el cobro del acta de liquidación del contrato No.1732-24, presentó la siguiente factura, la cual representa el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, siendo este el 10% faltante.

FECHA	FACTURA	SUBTOTAL
27/05/2025	**FE436**	**$ 1.395.686.249,00**

10. RUBRO PRESUPUESTAL

Los valores de la presente acta de liquidación, serán pagados por el rubro presupuestal que se presenta a continuación:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTES DE FINANCION	VALOR DEL RUBRO	DESEMBOLSO N° 1	DESEMBOLSO N° 2	DESEMBOLSO N° 3	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO
2.3-3202-0900-037-240029-2.3.2.020.02.009	SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	RIBEREÑOS	$ 642.791.405,00	$ 528.000.000,00	$ 114.791.405,00			$ 0,00
2.3-3202-0900-037-240029-2.3.2.020.02.009	SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	TRANSFERENCIA CORMAGDALENA LEY 161 DE 1994	$ 10.500.000.000,00	$ 1.950.000.000,00	$ 3.000.000.000,00	$ 4.212.134.922,00	$ 1.337.865.078,00	$ 0,00
2.3-3202-0900-037-240029-2.3.2.020.02.009	SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	TRANSFERENCIA CORMAGDALENA LEY 161 DE 1994 RECURSOS DEL BALANCE	$ 97.999.695,00	$ 97.999.695,00				$ 0,00
2.3-3202-0900-037-240029-2.3.2.020.02.009	SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-RIBEREÑOS	$ 8.358.702,00					$ 8.358.702,00
2.3-3202-0900-037-240029-2.3.2.020.02.009	SERVICIOS PARA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FONAB 1 % RECURSOS PROPIOS ACUERDO 020/94	RECURSOS PROPIOS DESTINANCION ESPECIFICA POR ACUERDO	$ 2.791.299.940,00	$ 1.636.135.227,00	$ 1.097.343.517,00		$ 57.821.171,00	$ 25,00
TOTALES			$ 14.040.449.742,00	$ 4.212.134.922,00	$ 4.212.134.922,00	$ 4.212.134.922,00	$ 1.395.686.249,00	$ 8.358.727,00

11. CONSTANCIAS

- Que el supervisor del contrato encuentra que se cumplió con todos los requisitos de ley para dar trámite al pago final y liquidación estipulado en el convenio 1732-24, conforme a la documentación aportada por el contratista.

- Que el Supervisor del convenio 1732-24 manifiesta que el contratista, cumplió a cabalidad con el alcance objeto del contrato dentro del plazo, conforme al informe presentado.
- Que el contratista Piscícola San Silvestre S.A.., representada legalmente por el señor JOSÉ DE JESUS QUICENO FLÓREZ, manifiesta que el Distrito de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
- Que el contratista Piscícola San Silvestre S.A., representada legalmente por JOSÉ DE JESUS QUICENO FLÓREZ, manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de los alcances objeto del convenio 1732-24, son veraces y obedece a la verdad de la ejecución.
- Que queda un saldo a favor del distrito por la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE SIETE PESOS ($8.358.727), que no fueron ejecutados.
- Que una vez el Distrito de Barrancabermeja cancele la presente acta de liquidación, y la empresa Piscícola San Silvestre S.A, allegue certificado de rendimientos financieros de la cuenta abierta para el desembolso de los recursos del convenio y la trasferencia al Distrito síes del caso; las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada de este convenio.

12. CERTIFICACIÓN

Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la unidad de contabilidad y de tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al convenio No.1732-24 a nombre de PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en el Distrito de Barrancabermeja, a los 27 días de junio de 2025

POR EL DISTRITO,

RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS
Secretario Distrital de Ambiente y Transición Energética
Supervisor del Convenio 1732-24

POR EL CONTRATISTA,

JOSÉ DE JESUS QUICENO FLÓREZ
Representante Legal (E) PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.
Acta de Junta Directiva N° 122-2024

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó	Luis Adrian Quintero	26/06/2025	
Proyectó	Sara Santodomingo Quevedo	26/06/2025	
Revisó jurídico	Rubén Darío Villamizar Miranda	26/06/2025	
Aprobó	Rafael Leonardo Granados Cárdenas	26/06/2025	
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

ANEXO ACTA LIQUIDACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1732-24

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y REPOBLAMIENTO ÍCTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS

		CONDICIONES DEL CONVENIO (ACTUALIZADAS)								CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS					
1	ACTIVIDAD 1. OBRAS DE CONECTIVIDAD HIDRICA														
1.1	LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES														
1.1.1	Caños urbanos	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	APORTE PISCICOLA SAN SILVESTRE	ALCALDIA		CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	APORTE PISCICOLA SAN SILVESTRE	ALCALDIA	Saldos
1.1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	ml	4	25.601,00	$ 38.175,00	$ 984.953.193,00		$ 984.953.193,00		25.601,00	$ 38.175,00	$ 984.953.175,00		$ 984.953.175,00	$ 18,00
1.1.1.2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	ml	4	8.184,00	$ 51.669,00	$ 421.988.996,00		$ 421.988.996,00		8.184,00	$ 51.669,00	$ 421.988.996,00		$ 421.988.996,00	$ 0,00
1.1.1.3	Roceria menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	m^2	4	103.204,00	$ 3.903,00	$ 402.805.219,00		$ 402.805.219,00		103.204,00	$ 3.903,00	$ 402.805.212,00		$ 402.805.212,00	$ 7,00
1.1.1.4	Roceria mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	m^2	4	40.329,00	$ 5.294,00	$ 213.501.726,00		$ 213.501.726,00		40.329,00	$ 5.294,00	$ 213.501.726,00		$ 213.501.726,00	$ 0,00
	Sub Total					$ 2.023.249.134,00		$ 2.023.249.134,00				$ 2.023.249.109,00	$ 0,00	$ 2.023.249.109,00	$ 25,00
1.1.2	Caños rurales														
1.1.2.1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	ml	4	40.449,00	$ 59.975,00	$ 2.425.928.775,00		$ 2.425.928.775,00		40.449,00	$ 59.975,00	$ 2.425.928.775,00		$ 2.425.928.775,00	$ 0,00
1.1.2.2	Limpieza, destronque y roceria mayor a 1 metro de alto	m^2	4	159.303,00	$ 6.552,00	$ 1.043.753.256,00		$ 1.043.753.256,00		159.303,00	$ 6.552,00	$ 1.043.753.256,00		$ 1.043.753.256,00	$ 0,00
	Sub Total					$ 3.469.682.031,00		3.469.682.031				$ 3.469.682.031,00	$ 0,00	$ 3.469.682.031,00	$ 0,00
	SUBTOTAL DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN CAÑOS URBANOS Y RURALES					$ 5.492.931.165,00	$ -	5.492.931.165,00							
1.2	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS														
1.2.1	LIMPIEZA MANUAL	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	Valor Parcial	Valor Parcial							
1.2.1.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitio autorizado)	m^2	3	240.000,00	5.060,00	$ 1.214.400.000,00		$ 1.214.400.000,00		240.000,00	$ 5.060,00	$ 1.214.400.000,00	$ 0,00	$ 1.214.400.000,00	$ 0,00
	Sub Total					$ 1.214.400.000,00									
1.2.2	VALLAS INFORMATIVAS														
1.2.2.1	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en el perimetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	2	10,00	$ 1.424.334,00	$ 14.243.340,00		$ 14.243.340,00		10,00	$ 1.424.934,00	$ 14.243.340,00		$ 14.243.340,00	$ 0,00
1.2.2.2	Suministro e instalacion de valla con enfoque en la conservacion de cuerpos hidricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	2	5,00	$ 1.749.334,00	$ 8.746.670,00		$ 8.746.670,00		5,00	$ 1.749.334,00	$ 8.746.670,00		$ 8.746.670,00	$ 0,00
	Sub Total					$ 22.990.010,00									
	SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS					$ 1.237.390.010,00	$ -	$ 1.237.390.010,00				$ 22.990.010,00	$ 0,00	$ 22.990.010,00	$ 0,00
1.3	LIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS														
1.3.1	LIMPIEZA MECANICA	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	Valor Parcial	Valor Parcial							
1.3.1.1	Remoción de sedimentos	m3	3	17.180,62	$ 185.023,00	$ 3.175.109.187,00		$ 3.175.109.187,00		17.148,00	$ 185.023,00	$ 3.172.404.358,00		$ 3.172.404.358,00	$ 2.704.829,00
	SUBTOTAL DELIMPIEZA MECANICA EN CAÑOS URBANOS					$ 3.175.109.187,00		$ 3.175.109.187,00				$ 3.172.404.358,00	$ 0,00	$ 3.172.404.358,00	$ 2.704.829,00
1.4	ADMINISTRATIVOS														
1.4.1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	UND	TIEMP mes	CANT	FM	DEDIACACION	Vr UNIT	Vr TOTAL	APORTE PISCICOLA SAN SILVESTRE	ALCALDIA		TIEMP mes				
1.4.1.1	Coordinador	und	4,300	1	1,74	100%	$ 7.650.000,00	$ 57.237.300,00		$ 57.237.300,00		$ 4,30	$ 7.650.000,00	$ 55.135.977,16		$ 55.135.977,16	$ 2.101.322,84
1.4.1.2	Abogado	und	4,000	1	1,74	100%	$ 6.514.000,00	$ 45.337.440,00		$ 45.337.440,00		4	$ 6.514.000,00	$ 44.295.200,00		$ 44.295.200,00	$ 1.042.240,00
1.4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	und	4,930	1	1,74	100%	$ 3.738.000,00	$ 32.064.466,00		$ 32.064.466,00		4,93	$ 3.738.000,00	$ 31.327.351,84		$ 31.327.351,84	$ 737.114,16
1.4.1.4	Ingeniero de produccion	und	4,616	1	1,74	100%	$ 3.738.000,00	$ 30.022.980,00	$ 30.022.980,00			4,616	$ 3.738.000,00	$ 29.332.796,55	$ 29.332.796,55		$ 690.183,45
1.4.1.5	Ingeniero pesquero	und	4,000	1	1,74	100%	$ 3.961.000,00	$ 27.568.560,00	$ 27.568.560,00			4	$ 3.961.000,00	$ 26.934.800,00	$ 26.934.800,00		$ 633.760,00
1.4.1.6	Medico veterinario	und	4,000	1	1,74	100%	$ 3.738.000,00	$ 26.016.480,00	$ 26.016.480,00			4	$ 3.738.000,00	$ 25.418.400,00	$ 25.418.400,00		$ 598.080,00
1.4.1.7	Contador	und	5,900	1	1,74	100%	$ 3.961.000,00	$ 40.663.626,00		$ 40.663.626,00		5,9	$ 3.961.000,00	$ 39.728.830,00		$ 39.728.830,00	$ 934.796,00
1.4.1.8	Coordinador de produccion	und	4,000	1	1,74	100%	$ 5.240.000,00	$ 36.470.400,00		$ 36.470.400,00		4	$ 5.240.000,00	$ 35.632.000,00		$ 35.632.000,00	$ 838.400,00
1.4.1.9	Profesional residente	und	4,000	1	1,74	100%	$ 5.240.000,00	$ 36.470.400,00	$ 36.470.400,00			4	$ 5.240.000,00	$ 35.632.000,00	$ 35.632.000,00		$ 838.400,00
1.4.1.10	Auxiliar Administrativo	und	4,000	1	1,74	100%	$ 1.475.000,00	$ 10.266.000,00	$ 10.266.000,00			4	$ 1.475.000,00	$ 10.030.000,00	$ 10.030.000,00		$ 236.000,00
1.4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	und	5,667	1	1,74	100%	$ 3.738.000,00	$ 36.856.680,00	$ 36.856.680,00			5,67	$ 3.738.000,00	$ 36.009.400,00	$ 36.009.400,00		$ 847.280,00
1.4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	und	5,500	1	1,74	100%	$ 3.738.000,00	$ 35.772.660,00	$ 35.772.660,00			5,5	$ 3.738.000,00	$ 34.950.300,00	$ 34.950.300,00		$ 822.360,00

ACTA DE FINALIZACIÓN CONVENIO 1732-24

CONVENIO N°:	1732-24.
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6.
COOPERANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.
NIT	829.000.291-4
REPRESENTANTE LEGAL	GICELA SANTOS CAJAR
CÉDULA:	28.020.077 DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INCIAL:	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE es de: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($14.431.259.513). Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($390.809.771).
VALOR ADICIONAL No. 1: POR PARTE DE PISCICOLA SAN SILVESTRE	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($251.669.348)
VALOR TOTAL OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE es de: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($14.682.928.861). Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($642.479.119).
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 24-04028 DEL 05 DE JUNIO DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CEPAA No. 3583 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	LUDWING FRANCISCO GOMEZ ALMEIDA – Secretario de Medio Ambiente o quien haga sus veces
BANCO DE PROYECTOS:	20240680810028 – 2024680810029

Scanned with CamScanner

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Medio Ambiente

OTROSI MODIFICATORIO No.1	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024
OTROSÍ MODIFICATORIO No.2	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

En el Distrito de Barrancabermeja, se reunieron **LUDWING FRANCISCO GÓMEZ ALMEIDA**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.747.152 de Bucaramanga, Secretario de Medio Ambiente, en su calidad de Supervisor del Convenio No.1732-24 y la señora **GICELA SANTOR CAJAR**, identificada con cédula de ciudadanía número 28.020.077 de Barrancabermeja, en su calidad de representante de la empresa PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A., con el objeto de suscribir la presente finalización, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Distrito de Barrancabermeja suscribió el Convenio Interadministrativo No.1732-24 con la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A., identificada con NIT 829.000.291-4, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL REPOBLAMIENTO ICTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS"*

2. Que el día VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2024 suscribió el acta de inicio Convenio Interadministrativo No.1732-24.

3. Que el día veintisiete (27) de agosto de 2024 se suscribe OTROSÍ MODIFICATORIO No.1 al convenio interadministrativo No.1732-24 mediante el cual entre otros se realiza la ampliación del plazo de ejecución del convenio por diez días, siendo la nueva fecha de terminación del convenio No.1732-24 el día 30 de diciembre de 2024.

4. Que el día diez (10) de octubre de 2024 se suscribe OTROSÍ MODIFICATORIO No.2 al convenio interadministrativo No.1732-24 mediante el cual se realiza la ampliación de los alcances y el presupuesto de algunas actividades establecidas en el convenio No.1732-24.

5. Que los alcances y actividades del convenio finalizaron conforme a lo pactado y en cumplimiento de las obligaciones el día treinta (30) de diciembre de 2024.

Conforme a lo anterior,

ACUERDAN

1. Dejar constancia de la finalización del Convenio Interadministrativo No.1732-24 con la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A., identificada con NIT 829.000.291-4, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL REPOBLAMIENTO ICTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS", de acuerdo con las consideraciones anteriormente descritas.

2. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación directa o indirectamente al Distrito.

Scanned with CamScanner

3. Que las partes de mutuo acuerdo realizaran la liquidación del convenio, en la cual se acordaran las, revisiones, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones y transacciones con el fin de resolver las divergencias que pudieran llegar a presentarse en concordancia con lo dispuesto en la cláusula decima octava del anexo de condiciones del convenio.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 30 DIC. 20.

POR EL DISTRITO,

LUDWING FRANCISCO GÓMEZ ALMEIDA
Secretario de Medio Ambiente
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

GICELA SANTOS CAJAR
Representante legal
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó aspectos jurídicos	Gilma Landinez	30/12/2024	
Proyectó aspectos técnicos y financieros	Luis Adrián Quintero	30/12/2024	
Aprobó	Ludwing Francisco Gómez Almeida	30/12/2024	
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Scanned with CamScanner

PISCÍCOLA
SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Se certifica que la entidad **PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.**, identificada con NIT. 829.000.291-4, ha dado cumplimiento durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de suscripción del presente documento, quedando a paz y salvo, de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar; en cuanto a SENA e ICBF, la empresa se encuentra exonerada de estos aportes según Art. 114 – 1 del Estatuto Tributario Nacional.

Dada en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de enero del 2025.

WILLIAM LEON GÓMEZ
Revisor Fiscal
T-P No. 77337-T

JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Gerente Suplente

ACCION	*CARGO*	*NOMBRE*	*FIRMA*
Proyectó	*Contador Publico PSS*	*Eliana Andrea Jiménez Mahecha*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Teléfonos: Gerencia: (+57) 313 423 4317
Negocios: (+57) 313 423 4312
E-mail: gerencia@pisansilvestre.com
Web: www.pisansilvestre.com
Dirección: Kilómetro 7 vía Llanito
Barrancabermeja, Santander,
COLOMBIA




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

77337-T

WILLIAM
LEON GOMEZ
C.C. 91441269
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ R. 83362

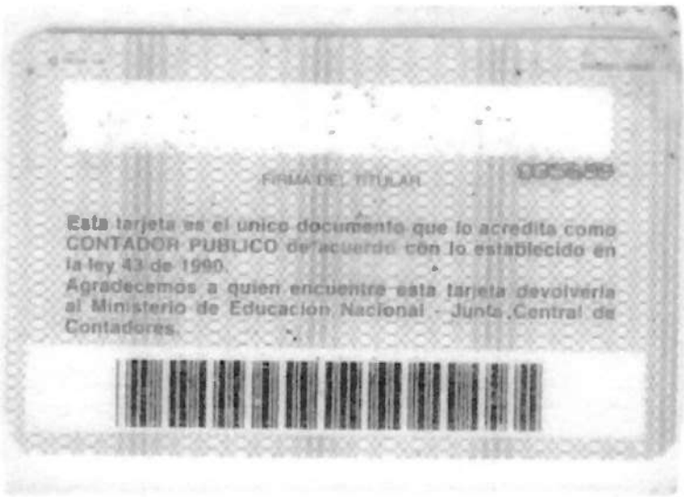

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.441.269**

LEON GOMEZ

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1973**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-NOV-1991 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2701900-00197621-M-0091441269-20091117 0018065259A 1 24032640

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7957532701	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1210153129

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	5	$ 755,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755,800	$ 0	$ 755,800
25-14 COLPENSIONES	7	$ 1,060,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,060,900	$ 0	$ 1,060,900
230301-PORVENIR	28	$ 4,389,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,389,400	$ 0	$ 4,389,400
									$ 6,206,100	$ 0	$ 6,206,100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 381,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381,500	$ 0	$ 0	$ 381,500
EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116,200	$ 0	$ 0	$ 116,200
EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 112,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112,700	$ 0	$ 0	$ 112,700
EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 433,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433,600	$ 0	$ 0	$ 433,600
ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116,200	$ 0	$ 0	$ 116,200
NUEVA EPS CM	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 591,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591,400	$ 0	$ 0	$ 591,400
												$ 1,751,600	$ 0	$ 0	$ 1,751,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	45		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,067,400	$ 1,067,400	$ 0	$ 0	$ 1,067,400
								$ 1,067,400	$ 0	$ 0	$ 1,067,400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	45	$ 1,751,800	$ 0	$ 1,751,800
		$ 1,751,800	$ 0	$ 1,751,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
DA TAN CAR IER	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	21																230301-PORVENIR	21	$ 910,000	$ 145,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910,000	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910,000	829000291	$ 22,200	21	$ 910,000	CCF38-CAFABA	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS NDOZA STINA EL	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	23																230301-PORVENIR	23	$ 996,667	$ 159,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996,667	$ 39,900	$ 0	$ 39,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996,667	829000291	$ 24,300	23	$ 996,667	CCF38-CAFABA	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
INO NANDEZ ERNES	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	21																230301-PORVENIR	21	$ 910,000	$ 145,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,600	NUEVA EPS CM	21	$ 910,000	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910,000	829000291	$ 22,200	21	$ 910,000	CCF38-CAFABA	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGAS LA LAR	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	26																230301-PORVENIR	26	$ 1,126,667	$ 180,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180,300	NUEVA EPS CM	26	$ 1,126,667	$ 45,100	$ 0	$ 45,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1,126,667	829000291	$ 27,500	26	$ 1,126,667	CCF38-CAFABA	$ 45,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZA ASQUEZ FA LIZA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	21																230301-PORVENIR	21	$ 910,000	$ 145,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,600	NUEVA EPS CM	21	$ 910,000	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910,000	829000291	$ 22,200	21	$ 910,000	CCF38-CAFABA	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NTES REGION Y ROLINA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI	23																230301-PORVENIR	23	$ 996,667	$ 159,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996,667	$ 39,900	$ 0	$ 39,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996,667	829000291	$ 24,300	23	$ 996,667	CCF38-CAFABA	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
D:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	8020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Acuicultura de agua dulce.
NTACIÓN	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957532701		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1210153129

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																														PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
TILLO NO LIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230201-PROTECCION	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
O CARRO AR EM	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A EGAS DER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NTES UNGRY ALIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETA A LUIS MANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230201-PROTECCION	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS017-FAMISANAR	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ROZO CON A VELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EDO EZ NEY ELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ATE DOZA AUDIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		26																230301-PORVENIR	26	$ 1.126.667	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.300	NUEVA EPS CM	26	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 45.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.126.667	829000291	$ 27.500	26	$ 1.128.667	CCF38-CAFABA	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGUEZ Z DY AMA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EDES A AN RES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TICA ARES IA ANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DA NCO LUZ ELICA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TO VES DER RICIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
D:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	8020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Acuicultura de agua dulce.
NTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7957532701	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1210153129

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																													PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MERES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
TOYA ANDIEZ EY FANIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230201-PROTECCION	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AS RUA ENA A	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BOA OVIA LOB UEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																25-14 COLPENSIONES	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIA ADA KTO	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		25																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	829000291	$ 26.400	25	$ 1.083.334	CCF38-CAFABA	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARGO HA LIB	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERCA AS CY A	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAY EZ EL.	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGUEZ TRO OS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																25-14 COLPENSIONES	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RIGUEZ RIAN INGO	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LESTER MONROY MIDES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																25-14 COLPENSIONES	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REZ DERO ENIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARDO A FANNY UB	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230201-PROTECCION	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRAN EZ ET	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS017-FAMISANAR	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:		BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
		KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO: 6020385
		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
NTACIÓN:		MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Acuicultura de agua dulce.
		SUCURSAL	
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957532701		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1210153129	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
NDIA LDO DIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ZAR	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		21																	21		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERREZ B ARILA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EJA SABEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		23																	23		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DA JAS CA RA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		26																230301-PORVENIR	26	$ 1.126.667	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.300	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 45.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.126.667	829000291	$ 27.500	26	$ 1.126.667	CCF38-CAFABA	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Z COTE ELIDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230301-PORVENIR	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	NUEVA EPS CM	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ BOSNU OMAR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	ESSC24-COOSALUD ESS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REAL ARDO Y	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	ESSC24-COOSALUD ESS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ERA IA MAR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TELLAN ARO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																230201-PROTECCION	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AN GAS NO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MMO DAS E DER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		21																25-14 COLPENSIONES	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	ESSC24-COOSALUD ESS	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 910.000	829000291	$ 22.200	21	$ 910.000	CCF38-CAFABA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TO ERICA E ANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.776.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
D:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Acuicultura de aguas dulce.
NTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7957472197		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1210179102

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	1	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.300	$ 0	$ 76.300
231001-COLFONDOS	2	$ 152.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 0	$ 152.600
25-14 COLPENSIONES	6	$ 478.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.600	$ 0	$ 478.600
230301-PORVENIR	24	$ 1.900.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900.600	$ 0	$ 1.900.600
									$ 2.608.100	$ 0	$ 2.608.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 62.500
EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 105.900
EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 62.500
EPS037-NUEVA EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 265.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.700	$ 0	$ 0	$ 265.700
EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 88.600
NUEVA EPS CM	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
												$ 710.200	$ 0	$ 0	$ 710.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 434.300	$ 434.300	$ 0	$ 0	$ 434.300
								$ 434.300	$ 0	$ 0	$ 434.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	36	$ 710.200	$ 0	$ 710.200
		$ 710.200	$ 0	$ 710.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ELO AS ND ETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	11																
ERO A SON AM	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	04																
LA QUEZ ELME	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	11																
EZ INCO E LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	11																
ARIS RTINEZ ICA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	14																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300
230301-PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800
230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300
230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300
230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100
EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
NUEVA EPS CM	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100
EPS037-NUEVA EPS	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100
ESSC24-COOSALUD ESS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 173.334	829000291	$ 4.300
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667	829000291	$ 14.800

PARAFISCALES: CCF DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 173.334	CCF38-CAFABA	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	$ 606.667	CCF38-CAFABA	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
SOCIAL:		PISCICOLA SAN SILVESTRE SA	
	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	8020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de aguas dulces.
NTACIÓN:	SUCURSAL		
ERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957472197			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1210179102

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
E:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957472197		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1210179102

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
IO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7957472197	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1210179102		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
A LA DE QUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11																	25-14 COLPENSIONES	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	EPS017-FAMISANAR	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700	11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ LLA AR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	NUEVA EPS CM	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700	11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
UERA A EJO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11																	230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700	11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OSAR AMIZRA DES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11																	25-14 COLPENSIONES	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700	11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LVAS AYO A LOS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11																	25-14 COLPENSIONES	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	829000291	$ 11.700	11	$ 476.667	CCF38-CAFABA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.462.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
D:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7953332171	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1199406166

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	3	$ 989.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 989.400	$ 0	$ 989.400
25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.367.500	$ 0	$ 0	$ 38.200	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 3.443.900	$ 0	$ 3.443.900
230201- PROTECCION	1	$ 217.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.400	$ 0	$ 217.400
231001-COLFONDOS	1	$ 627.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.200	$ 0	$ 627.200
									$ 5.277.900	$ 0	$ 5.277.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.700	$ 0	$ 0	$ 172.700
EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 919.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 919.200	$ 0	$ 0	$ 919.200
EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.800	$ 0	$ 0	$ 156.800
												$ 1.300.700	$ 0	$ 0	$ 1.300.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 340.000	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 340.000
								$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 340.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	12	$ 1.300.700	$ 0	$ 1.300.700
		$ 1.300.700	$ 0	$ 1.300.700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: MBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
IO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953332171		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		119408166

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD							ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
EZ AS ANDA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000	829000291	$ 38.600	30	$ 3.500.000	CCF38-CAFABA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ÑO GA A LIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	829000291	$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LDO ANCUR TAVO	DEPEND		$ 1.604.382	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.917.236	$ 306.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.917.236	$ 76.700	$ 0	$ 76.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.917.236	829000291	$ 20.100	30	$ 1.917.236	CCF38-CAFABA	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LVAREZ TINEZ RIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25							01-25									25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.218.209	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.000	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.218.209	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.218.209	829000291	$ 12.800	25	$ 1.218.209	CCF38-CAFABA	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NDA TO RS ERTO	DEPEND		$ 2.828.670	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.828.670	$ 452.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 452.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.828.670	$ 113.200	$ 0	$ 113.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.828.670	829000291	$ 29.600	30	$ 2.828.670	CCF38-CAFABA	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RRERO HUGO ONSO	DEPEND		$ 2.828.670	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.828.670	$ 452.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 452.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.828.670	$ 113.200	$ 0	$ 113.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.828.670	829000291	$ 29.600	30	$ 2.828.670	CCF38-CAFABA	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.219.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
IO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
E:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de aguas dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7953230830	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1199368661

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	3	$ 527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.000	$ 0	$ 527.000
25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.000	$ 0	$ 1.276.000
231001-COLFONDOS	2	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.000	$ 0	$ 319.000
230301-PORVENIR	21	$ 3.481.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.481.200	$ 0	$ 3.481.200
									$ 5.603.200	$ 0	$ 5.603.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 171.700
EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 239.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.400	$ 0	$ 0	$ 239.400
EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.100	$ 0	$ 0	$ 130.100
MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 50.300
EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 399.000
ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 119.700
NUEVA EPS CM	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 371.200
												$ 1.481.400	$ 0	$ 0	$ 1.481.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 902.400	$ 902.400	$ 0	$ 0	$ 902.400
								$ 902.400	$ 0	$ 0	$ 902.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	36	$ 1.481.400	$ 0	$ 1.481.400
		$ 1.481.400	$ 0	$ 1.481.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23														
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23														
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23														
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23														
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23														

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	ESSC24-COOSALUD ESS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300
230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300
231001-COLFONDOS	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300
230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300
230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300

PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	8020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953230830	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1109368661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953230830		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1199368661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES								
																														PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
O HUCA JEL	DEPEND	REG CUMP PENS	$ 1.300.000	FIJO			SI		23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
HECO TESINO A	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS017-FAMISANAR	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETA HEZ SARE MEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	02	30																230301-PORVENIR	29	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	29	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.256.667	829000291	$ 30.700	28	$ 1.256.667	SCCF38-CAFABA	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ENO ULVEDA V	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ETA RIGUEZ MA EL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LLA RIGUEZ BIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Z EZ MIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRAN BEL REA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230201-PROTECCION	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS017-FAMISANAR	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TILLO DOBA NA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RERA RIDO ONIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EZ VEDRA ICUE	DEPEND	INDEMN SUSTDEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI		23																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AN INA UEL IN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	ESSC24-COOSALUD ESS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
RA DOSA LOS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS017-FAMISANAR	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
IO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
E:	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953230830		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1199368661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
LLANTE RES NANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CHEZ TRO IR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AN TA JOSE NARDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																230301-PORVENIR	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	NUEVA EPS CM	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
O DIAZ RRIBO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	ESSC24-COOSALUD ESS	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ON DENAS EN O	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																231001-COLFONDOS	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 996.667	829000291	$ 24.300	23	$ 996.667	CCF38-CAFABA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.468.400

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de aguas dulce.
NTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7953228909	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1199348918

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	3	$ 1,960,600	$ 0	$ 0	$ 38,300	$ 38,300	$ 0	$ 0	$ 2,046,200	$ 0	$ 2,046,200
25-14 COLPENSIONES	1	$ 398,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398,800	$ 0	$ 398,800
									$ 2,445,000	$ 0	$ 2,445,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,000	$ 0	$ 0	$ 28,000
EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 564,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564,200	$ 0	$ 0	$ 564,200
												$ 592,200	$ 0	$ 0	$ 592,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 360,800	$ 360,800	$ 0	$ 0	$ 360,800
								$ 360,800	$ 0	$ 0	$ 360,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	4	$ 592,200	$ 0	$ 592,200
		$ 592,200	$ 0	$ 592,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
GNEZ EDICHA ANA REA	DEPEND		$ 3,961,000	FIJO			SI	30															
MEZ AS IVELIN STEFANI	DEPEND		$ 7,650,000	FIJO			SI	30															
RIGUEZ RADA IN ARDO	DEPEND		$ 3,738,000	FIJO			SI	20															
RRERA JIZ NIN NIQUE	DEPEND		$ 5,240,000	FIJO			SI	04															

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 3,961,000	$ 633,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 633,800
230301-PORVENIR	30	$ 7,650,000	$ 1,224,000	$ 38,300	$ 38,300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,300,600
25-14 COLPENSIONES	20	$ 2,492,000	$ 398,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 398,800
230301-PORVENIR	4	$ 698,667	$ 111,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111,800

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3,961,000	$ 158,500	$ 0	$ 158,500
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 7,650,000	$ 306,000	$ 0	$ 306,000
EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 2,492,000	$ 99,700	$ 0	$ 99,700
EPS037-NUEVA EPS	4	$ 698,667	$ 28,000	$ 0	$ 28,000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3,961,000	$829000291	$ 96,500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7,650,000	$829000291	$186,400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 2,492,000	$829000291	$ 60,800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 698,667	$829000291	$ 17,100

PARAFISCALES: DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 3,961,000	CCF38-CAFABA	$ 158,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 7,650,000	CCF38-CAFABA	$ 306,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	$ 2,492,000	CCF38-CAFABA	$ 99,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 698,667	CCF38-CAFABA	$ 28,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.990.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
N SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
O:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	8020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
ENTACIÓN:	SUCURSAL		
NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7953226310	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1199394208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	3	$ 866.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.200	$ 0	$ 866.200
25-14 COLPENSIONES	3	$ 360.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.200	$ 0	$ 360.200
									$ 1.226.400	$ 0	$ 1.226.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 62.400
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 109.700
EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 20.000
EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.400	$ 0	$ 0	$ 317.400
												$ 509.500	$ 0	$ 0	$ 509.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 310.400	$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 310.400
								$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 310.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38-CAFABA	7	$ 509.500	$ 0	$ 509.500
		$ 509.500	$ 0	$ 509.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: MBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ERO A DELLY ERALDA	DEPEND		$ 1.475.000	FIJO		SI		29														
ORQUE ORZANO O SES	DEPEND		$ 3.738.000	FIJO		SI		13														
ID A AY	DEPEND		$ 3.738.000	FIJO		SI		22														
ARIA ABRIA IN ID	DEPEND		$ 3.738.000	FIJO		SI		10														
TIZABA EDRO DE UJS	DEPEND		$ 3.961.000	FIJO		SI		01														
LLOS E ARO HER	DEPEND		$ 3.738.000	FIJO		SI		04														

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	29	$ 1.425.834	$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.200
25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.619.800	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.200
230301-PORVENIR	22	$ 2.741.200	$ 438.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.600
230301-PORVENIR	10	$ 1.246.000	$ 199.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.400
25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.034	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.200
25-14 COLPENSIONES	4	$ 498.400	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 79.800

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.425.834	$ 57.100	$ 0	$ 57.100
EPS037-NUEVA EPS	13	$ 1.619.800	$ 64.800	$ 0	$ 64.800
EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 2.741.200	$ 109.700	$ 0	$ 109.700
EPS037-NUEVA EPS	10	$ 1.246.000	$ 49.900	$ 0	$ 49.900
EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 132.034	$ 5.300	$ 0	$ 5.300
EPS017-FAMISANAR	4	$ 498.400	$ 20.000	$ 0	$ 20.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.425.834	829000291	$ 34.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 1.619.800	829000291	$ 39.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 2.741.200	829000291	$ 66.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 1.246.000	829000291	$ 30.400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 132.034	829000291	$ 3.300
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 498.400	829000291	$ 12.200

PARAFISCALES: DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
29	$ 1.425.834	CCF38-CAFABA	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	$ 1.619.800	CCF38-CAFABA	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	$ 2.741.200	CCF38-CAFABA	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	$ 1.246.000	CCF38-CAFABA	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1	$ 132.034	CCF38-CAFABA	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 498.400	CCF38-CAFABA	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 829000291
ÓN SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
PIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
E:	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
SENTACIÓN:	SUCURSAL		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953226310	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1199394208		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
AM RTINEZ EXANDER	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 5.240.000	FIJO			SI		29																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 5.065.334	$ 202.700	$ 0	$ 202.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 5.065.334	829000291	$ 123.400	29	$ 5.065.334	CCF38-CAFABA	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.555.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000291
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 7 VIA AL LLANITO	TELÉFONO:	6020385
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Acuicultura de agua dulce.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952311683			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1199451708

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141163631269

(415)7707212489984(8020) 000014116363126 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 9 0 0 0 2 9 1	4	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: VIA AL LLANITO ESTACION PISCICOLA ESTACION DE BOMBEO

42. Correo electrónico: contabilidad@pisansilvestre.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 2 3 4 3 1 7	3 1 3 4 2 3 4 3 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 3 2 2	1 9 9 6 0 1 2 6							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	1	9	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUICENO FLOREZ JOSE DE JESUS

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-05-2025 03:47:53PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANCABERMEJA, SANTANDER, 19/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.** con **NIT 829.000.291-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 146200101062

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


VIGILADO

Secretaría Distrital
de Ambiente y
Transición Energética

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADO DELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1732-24 DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y REPOBLAMIENTO ÍCTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS.

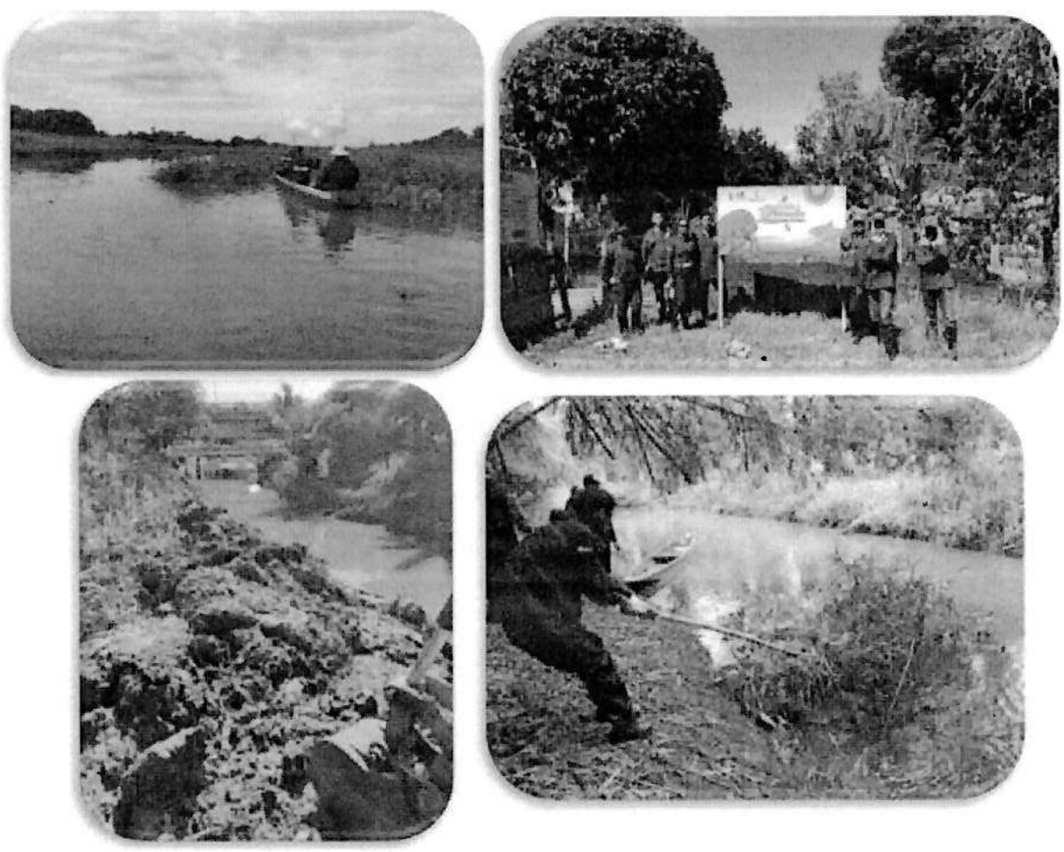

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 de junio al 30 de diciembre 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO 3
2. GENERALIDADES 4
3. MODIFICACIONES, ADICIONES AL CONVENIO 4
3.1. Adición el plazo 4
3.2. Adición en valor 4
4. ACTIVIDADES DE PREALISTAMIENTO 5
4.1. Presentación del Plan de trabajo (PDT) 5
4.2. Socializaciones del convenio a las comunidades 6
5. ALCANCES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6
5.1. OBRAS DE CONECTIVIDAD 6
5.1.1. Limpieza Manual y Rocería en Caños Urbanos y Rurales 6
5.1.1.1. Caños Urbanos 7
5.1.1.2. Caños Rurales 149
6. MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS 173
6.1. Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) 173
7. VALLAS INFORMATIVAS 178
7.1. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano 178
7.2. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural 180
8. LIMPIEZA MECÁNICA 182
8.1. Localización de actividades 183
9. ADMINISTRATIVOS 185
10. REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMITAS 188
11. MONITORES PARTICIPATIVOS 191
11.1. Formación de monitores ambientales participativos 191
11.2. Monitoreos ambientales (incluye transporte) 193
12. MONITOREO FISICOQUÍMICO DEL AGUA 203
12.1. Resultados de los muestreos fisicoquímicos tomados en campo 207
12.2. Resultados de los muestreos fisicoquímicos del laboratorio 208
12.3. Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente 209
13. COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1732-24 210
14. CONCLUSIONES 211

1. FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO

CONVENIO N°:	1732-24
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6.
COOPERANTE:	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.
NIT	829.000.291-4
REPRESENTANTE LEGAL	GICELA SANTOS CAJAR
CÉDULA:	28.020.077 DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INCIAL:	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCICULA SAN SILVESTRE es de: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($14.431.259.513). Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCICULA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($390.809.771).
VALOR ADICIONAL No. 1: POR PARTE DE PISCICULA SAN SILVESTRE	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($251.669.348)
VALOR TOTAL OTROSI MODIFICATORIO No. 1	El valor total del convenio, producto de la suma de los aportes del DISTRITO y el aporte de la PISCICULA SAN SILVESTRE es de: CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($14.682.928.861) Distribuidos así: a) EL DISTRITO aportará la suma de: CATORCE MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.040.449.742). b) LA PISCICULA SAN SILVESTRE: aportará la suma de: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($642.479.119).
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No. 24-04028** DEL 05 DE JUNIO DE 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **CEPAA No. 3583 DEL 05 DE JUNIO DE 2024**
SUPERVISOR:	RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS – Secretario Distrital de Ambiente y Transición energética o quien haga sus veces
BANCO DE PROYECTOS:	20240680810028 – 2024680810029
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO No. 2	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024

2. GENERALIDADES

El presente informe de supervisión corresponde al desarrollo de las actividades del **Convenio interadministrativo N°1732-24 cuyo objeto es** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE CONEXIONES HÍDRICAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" correspondiente al periodo comprendido entre 21 de junio al 30 de diciembre 2024.

3. MODIFICACIONES, ADICIONES AL CONVENIO

En el periodo comprendido entre el día 21 de junio al 30 de diciembre de 2024 el convenio 1732-24 ha sufrido las siguientes modificaciones:

3.1. Adición el plazo

Ítem	Descripción	Fecha de suscripción
1	Adición en Plazo N°1	27/08/2024

A fecha 4 de noviembre de 2024 el convenio 1732-24 presenta una adición de diez (10) días calendarios con lo cual el plazo de ejecución terminara el día treinta (30) de diciembre de 2024.

3.2. Adición en valor

Ítem	Descripción	Fecha de suscripción
1	Otrosí modificatorio N°1	27/08/2024
2	Otrosí modificatorio N°2	

A fecha 4 de noviembre de 2024 el convenio 1732-24 presenta una adición DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($251.669.348) aportados por la Piscícola San Silvestre (Otrosí modificatorio N°1). Entidad que asumió los ítems señalados en el numeral 4.2 correspondiente a la actividad 1 **OBRAS DE CONECTIVIDAD HÍDRICA** que hace alusión a **GASTOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS,** y que inicial mente se había pactado ejecutar con aportes de la Alcaldía Distrital. Los recursos liberados de la Alcaldía Distrital fueron adicionados al alcance de la actividad 2 que hace mención a REPOBLAMIENTO **DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMICAS. Quedando de la siguiente manera:**

Asimismo, mediante Otro sí modificatorio N°2 se realizó la actualización de los alcances y presupuesto de las actividades No. 1 numeral 4.1. y 3 numeral 1.2.; quedando así:

ADICIONAR los alcances de la actividad No. **1 *"OBRAS DE CONECTIVIDAD HÍDRICA"***, numeral ***"4.1. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (Inc. Prest. Soc.)"***, ampliando el termino de los contratos del personal técnico y administrativo en los siguientes términos:

RECURSO	PERFIL	TERMINACION	DIAS ADICIONALES	PLAZO FINAL
Alcaldía	CONTADOR	03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	57 DIAS	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
Alcaldía	COORDINADORA	21 DE DICIEMBRE DEL 2024	9 DÍAS	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
Piscícola	INGENIERO AMBIENTAL	03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	37 DÍAS	10 DE DICIEMBRE DEL 2024
Piscícola	INGENIERO AMBIENTAL	24 DE OCTUBRE DEL 2024	50 DÍAS	13 DE DICIEMBRE DEL 2024
Alcaldía	INGENIERO AMBIENTAL	23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27 DÍAS	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
Piscícola	INGENIERO PRODUCCION	04 DE DICIEMBRE DEL 2024	18 DÍAS	22 DE DICIEMBRE DEL 2024

ADICIONAR a la actividad No. **3** "***MONITOREOS PARTICIPATIVOS***" el alcance **1.4. "Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente"** incluyendo **treinta y cuatro (34)** monitores ambientales, por un tiempo de dos **(02) meses**, los cuales realizaran las siguientes actividades.

a. Fortalecer las actividades de embellecimiento y recuperación de áreas críticas afectadas por residuos sólidos.
b. Sensibilización de las comunidades aledañas a los caños.
c. Limpieza de áreas críticas afectadas por residuos sólidos. en los siguientes términos:

Lo anterior en los siguientes términos:

	ACTIVIDAD 3. MONITOREOS PARTICIPATIVOS					
1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
1.1	Formación de monitores ambientales participativos	und	4	120	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00
1.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	und	4	120	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00
1.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	und	4	12	$ 695.294,15	$ 8.343.530,00
1.4	Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente	und	2	34	$ 2.243.296,00	$ 152.544.128,00
					Sub Total	1.658.149.738,00
					TOTAL, MONITOREOS PARTICIPATIVOS	1.658.149.738,00

4. ACTIVIDADES DE PREALISTAMIENTO

4.1. Presentación del Plan de trabajo (PDT)

El 02 de julio de 2024 la Piscícola San Silvestre S.A realizó la sustentación y presentación del PDT, Análisis de Precios Unitarios, Programa de obra, Flujo de caja, Programa de generación de empleo y plan de manejo ambiental, documentos requeridos para el inicio del convenio ante el comité de seguimiento en el que participó el equipo de la Secretaria de Ambiente y Transición Energética y el equipo técnico de Piscícola San Silvestre SA

4.2. Socializaciones del convenio a las comunidades

Las socializaciones del convenio se realizaron en 6 comunas del área urbana y 6 cuerpos cenagosos del área rural. Tal como se describe a continuación:

COMUNA O ÁREA RURAL	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
Comuna 1	12/07/2024; 14/08/24
Comuna 3	15/07/2024; 21/06/2024; 20/07/2024
Comuna 4	19/07/2024
Comuna 5	17/07/2024; 21/08/2024
Comuna 6	13/08/2024; 16/08/2024
Comuna 7	22/06/2024
Corregimiento San Rafael de Chucurí	30/07/2024
CIENEGA EL OPÓN	24/07/2024
CIENEGA EL LLANITO	31/07/2024
CIENAGA LA CIRA	28/07/2024
CIENAGA JUAN ESTEBAN	24/07/2024
CORREGIMIENTO LA FORTUNA	12/08/2024

5. ALCANCES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El convenio interadministrativo presenta tres (3) alcances generales: 1.) Obras de conectividad, el cual incluye actividades de limpieza manual en cuerpos hídricos lenticos y loticos, rocería, limpieza mecánica de caños y personal administrativo; 2.) Repoblamiento de especies nativas ecosistemitas; 3.) Monitores participativos.

5.1. OBRAS DE CONECTIVIDAD

5.1.1. Limpieza Manual y Rocería en Caños Urbanos y Rurales

La limpieza manual en caños urbanos constituye un proceso técnico esencial que tiene como objetivo principal la eliminación de residuos orgánico e inorgánicos que genera contaminación y obstrucciones de las conexiones hídricas, con el fin de preservar el flujo adecuado de agua y prevenir posibles inundaciones que generan riesgos.

Dentro de los alcances establecidos en el convenio interadministrativo se encuentran las obras de conectividad hídrica que incluye acciones de limpieza manual y rocería de caños urbanos y rurales, limpieza manual en cuerpos de agua lénticos y lóticos, limpieza mecánica en caños urbanos y un alcance administrativo que corresponde al personal necesario para la gestión integral del proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Para el cumplimiento de este alcance se suscribió el **contrato de obra N°095 de 2024** con la **Unión Temporal Limpieza INCO 2024,** en virtud del **Convenio interadministrativo 1732-24.**

DATOS CONTRATO 095-24	
CONTRATO No.:	095 DE 2024
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ECTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERIA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEHA OARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVIBILIDAD HÍDRICA DE SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024 NIT. 901.864.847-7 R/L JOSE JULIAN CHACON AVENDAÑO
CONTRATANTE	PISCIOLA SAN SILVESTRE S.A. NIT.829.000.291-4
SUPERVISOR	JHON EDUARDO RODRIGUEZ ESTRADA Supervisor designado
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRACTUAL	SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.730.321.175)
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DEL 2024

4	ACTIVIDAD 1. OBRAS DE CONECTIVIDAD HIDRICA CONDICIONES CONTRACTUALES					
4.1	**LIMPIEZA MANUAL EN CAÑOS URBANOS Y RURALES**					
4.1.1	**CAÑOS URBANOS**	**UND**	**TIEMP mes**	**CANT**	**Vr UNIT**	**Vr TOTAL**
4.1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	4	25.801,00	38.175,00	$ 984.953.193,00
4.1.1.2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	ml	4	8.164,00	51.689,00	$ 421.988.996,00
	Sub Total					**$ 1.406.942.189,00**
4.1.2	**CAÑOS RURALES**	**UND**	**TIEMP mes**	**CANT**	**Vr UNIT**	**Vr TOTAL**
4.1.2.1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	ml	4	40.449,00	59.975,00	$ 2.425.928.775,00
	SUBTOTAL DE LIMPIEZA MANUAL EN CAÑOS URBANOS Y RURALES					**$ 3.652.870.964,00**

5.1.1.1. Caños Urbanos

Durante el periodo comprendido entre el **30 de agosto al 30 de diciembre de 2024**, se logró un **avance del 99.99%** en las actividades de **limpieza urbana de caños** y **rocería** en el Distrito. Estas acciones han tenido como objetivo mejorar el drenaje urbano, evitar el taponamiento de los sistemas de drenaje pluvial y reducir riesgos de inundaciones, contribuyendo a una gestión más eficiente del agua en la ciudad.

Se realizó limpieza manual a 25.801 metros lineales (Ml) a caños con cauce de 0 a 5 metros de ancho, 8.164 Ml a caños con cauce de 5 a 10 metros de ancho y se retiró material vegetal, residuos sólidos emergentes y sumergidos que se encontraron en los caños del Distrito de Barrancabermeja. En rocería en ronda hídrica, se realizó la intervención de 103.204 m^2 en caños con rocería menores a 1 metro de alto y 40.329 m^2 de rocería en caños con rocería mayor a 1 metro de alto. Cumpliendo con el 100% de las especificaciones técnicas del convenio 1732-24.

Se intervinieron la totalidad de **87 caños urbanos** en el Distrito de Barrancabermeja.

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-2024)	
URBANO			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD			
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho	ML	25.801,000473	25.801	99,9999982%
1.1.2	Limpieza de caños de 5 a 10 metros de ancho	ML	8.164	8.164	100%
1.1.3	Rocería menor a un metro de alto	M2	103.204,00189147	103.204	99.9999982%
1.1.4	Rocería mayor a un metro de alto	M2	40.329	40.329	100%
				TOTAL	99.99%

5.1.1.1.1. Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado

Se realizó la limpieza manual de caños en el Distrito de Barrancabermeja, enfocándose en la extracción de material vegetal y residuos sólidos emergentes y sumergidos. El proceso consistió en utilizar herramientas manuales como rastrillos metálicos, palas, palines, escobas y machetes, y en casos necesarios, motosierra para retirar troncos obstruyentes.

- El proceso de limpieza consistió en arrancar el material vegetal y residuos sólidos emergentes y sumergidos que se encontraban dentro de los caños.
- El material a remover consiste en acumulación de residuos sólidos tales como: cables, colchones, hierros, cadenas, neumático, neveras y demás material vegetal que interfiera con el cauce natural del caño.
- A continuación, se debe asignar la cuadrilla correspondiente para realizar la limpieza esta debe estar dotada de la herramienta y equipo de protección personal necesarios para realizar la actividad.
- Una vez realizado el retiro se debe instaurar un punto de acopio temporal para empacar en sacos o bolsas cuando la disposición final no es inmediata de los residuos sólidos extraídos de los caños y el material vegetal, la frecuencia de recolección es diaria.

Finalmente, se procede a transportar por medio de volqueta los sacos o bolsas hasta su correcta disposición final en el relleno sanitario o escombrera, según la naturaleza del residuo.

- Los residuos inorgánicos recolectados incluyeron botellas plásticas, vasos desechables, bolsas plásticas, papel y cartón contaminado, así como objetos voluminosos como colchones, muebles e inodoros. Este material fue depositado en sacos de fibra y llevado a un sitio de acopio, donde la empresa prestadora de servicios de aseo se encargó de su recolección y disposición final en el relleno sanitario del Distrito.
- El material vegetal recolectado fue trasladado a la escombrera municipal. Esta actividad no solo mejoró la calidad del entorno, sino que también contribuyó a la prevención de inundaciones y fomentó la conciencia ambiental en la comunidad.

COMUNA 1

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector Casa de la Cultura	Comuna 1	0-5 m	117			117	0	117	0	0	117	0
Caño sector Palmira	Comuna 1	0-5 m	309			309	0	309	0	0	309	0
TOTAL			426			426	0	426	0	0	0	0

CAÑO SECTOR CASA DE LA CULTURA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Sector casa de la cultura	ML	Comuna 1	117	117





P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR PALMIRA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector Palmira	ML	Comuna 1	309	309

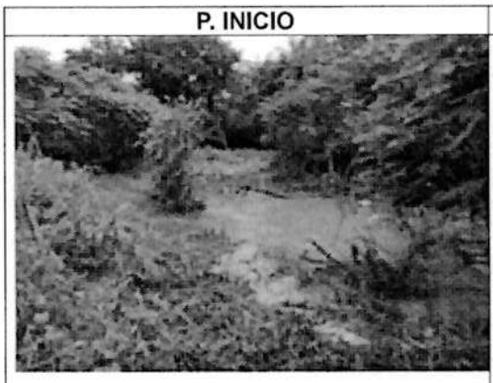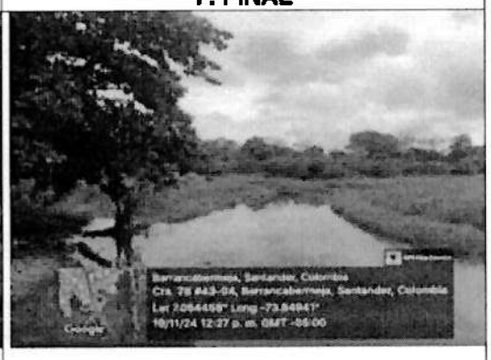

P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 2

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector Olaya herrera	Comuna 2	0-5 m	240			240	0	240	0	0	240	0
Caño Callejón de los perros	Comuna 2	0-5 m	93			93	0	93	0	0	93	0
Caño sector P. Ecológico Parnaso	Comuna 2	0-5 m	131			131	0	131	0	0	131	0
TOTAL			464			464	0	464	0	0	0	0

CAÑO SECTOR OLAYA HERRERA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Olaya herrera	ML	Comuna 2	240	240



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CALLEJÓN DE LOS PERROS


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño callejón de los perros	ML	Comuna 2	93	93



P. INIC	P. FINAL
	

MBRE CAÑO		COM		

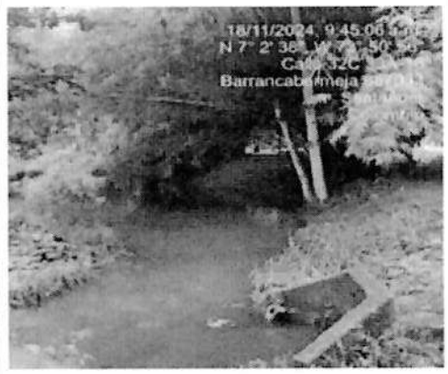

	P. FINAL
	

. 27-08. piso

COMUNA 3

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal Inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Internacional sector San Judas	Comuna 3	0-5 m	131	110		21	0	21	0	0	21	0
Caño Internacional sector Pipatón (Canalizado)	Comuna 3	0-5 m	124			124	0	124	0	0	124	0
Caño Internacional sector Pipatón (Natural)	Comuna 3	0-5 m	149			149	0	149	0	0	149	0
Caño Internacional humedal Jerusalén	Comuna 3	0-5 m	191	9		182	0	182	0	0	182	0
Caño Internacional sector Jerusalén	Comuna 3	0-5 m	164			164	0	164	0	0	164	0
Caño Internacional sector Belén	Comuna 3	0-5 m	108	96		12	0	12	0	0	12	0
Caño Internacional sector Algarrobos	Comuna 3	0-5 m	306			306	0	306	0	0	306	0
Caño La Paz sector Mano de Dios (zona natural)	Comuna 3	0-5 m	125			125	0	125	0	0	125	0
Caño La Paz sector Mano de Dios (zona poblada)	Comuna 3	0-5 m	188			188		188	0	0	188	0
Caño La Paz sector La Paz	Comuna 3	0-5 m	375	24		351		351	0	0	351	0
Caño sector la mina	Comuna 3	0-5 m	814			814		0	814	0	814	0
Caño 20 de enero - rosario	Comuna 3	0-5 m	456			456		0	456	0	456	0
Caño sector Villa Luisa Etapa I	Comuna 3	0-5 m	244			244		244	0	0	244	0
Caño La Paz sector Villa Luisa I	Comuna 3	0-5 m	210			210		210	0	0	210	0
Jerusalén sector CAIF	Comuna 3	0-5 m	178			178		178	0	0	178	0
Caño sector 22 de Marzo-Brisas de Altamira	Comuna 3	0-5 m	596			596		0	596	0	596	0
Urbanización San Silvestre	Comuna 3	0-5 m	513			513		0	513	0	513	0
Caño 22 de marzo	Comuna 3	0-5 m	604			604		0	604	0	604	0
Caño sector Antonio Nariño	Comuna 3	0-5 m	573			573		0	573	0	573	0
Caño entrada Santa Isabel Etapa II	Comuna 3	0-5 m			151	151		151	0	0	151	0
Caño Santa Isabel Etapa II cra 28	Comuna 3	0-5 m			88	88		88	0	0	88	0
TOTAL			6.049	239	238	6.049	0	2.493	3.556	0	6.049	0


CAÑO INTERNACIONAL SECTOR SAN JUDAS



NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Internacional Sector San Judas	ML	Comuna 3	131	21	Reubicación 110 ML en el caño entrada Santa Isabel II (22 ML) y Santa Isabel etapa II cra 28 (88 ML)



CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PIPATÓN (CANALIZADO)

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Internacional Sector Pipatón (Canalizado)	ML	Comuna 3	124	124

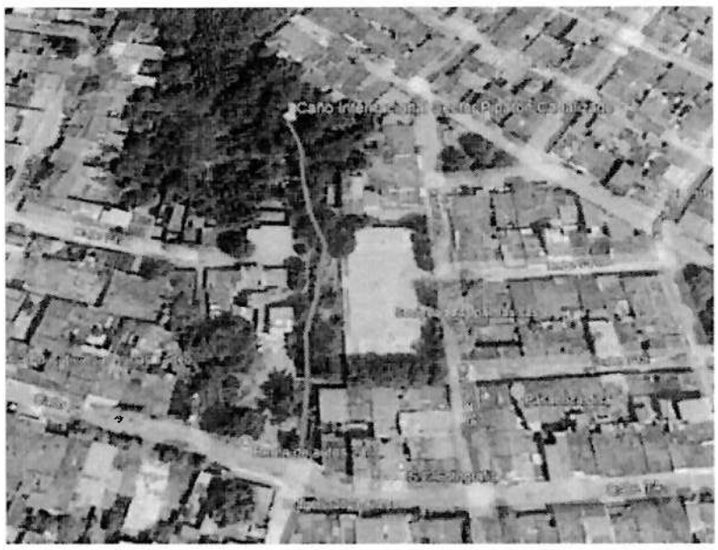

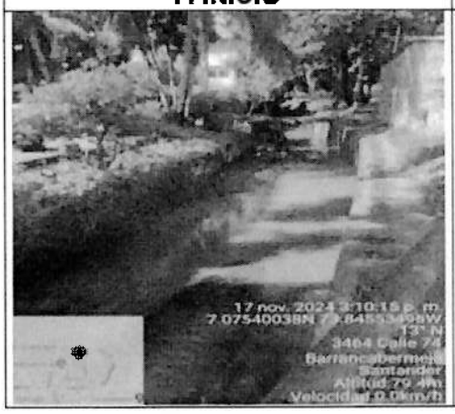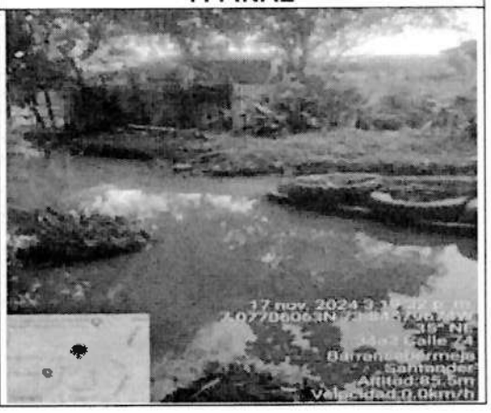P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PIPATÓN (NATURAL)

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Internacional Sector Pipatón (Natural)	ML	Comuna 3	149	149



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO INTERNACIONAL HUMEDAL JERUSALÉN


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Internacional humedal Jerusalén	ML	Comuna 3	191	182	Se reubican 9 ML en el caño Entrada Santa Isabel Etapa II




P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR JERUSALÉN

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Internacional sector Jerusalén	ML	Comuna 3	164	164

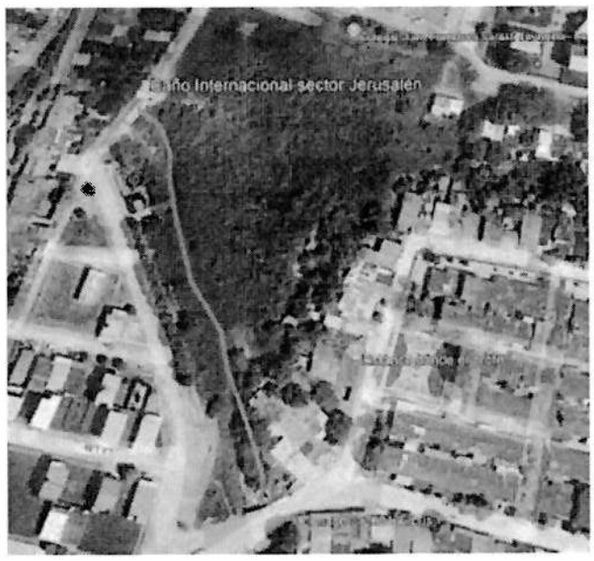


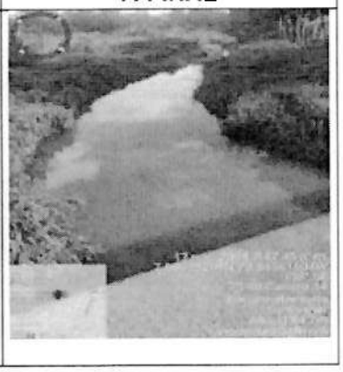P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR BELÉN


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Internacional sector Belén	ML	Comuna 3	108	12	Se reubican 96 ML en el caño Entrada Santa Isabel Etapa II

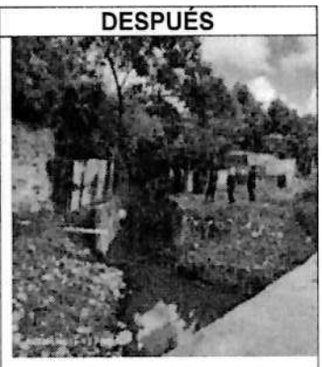


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR ALGARROBOS

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Internacional sector Algarrobos	ML	Comuna 3	306	306

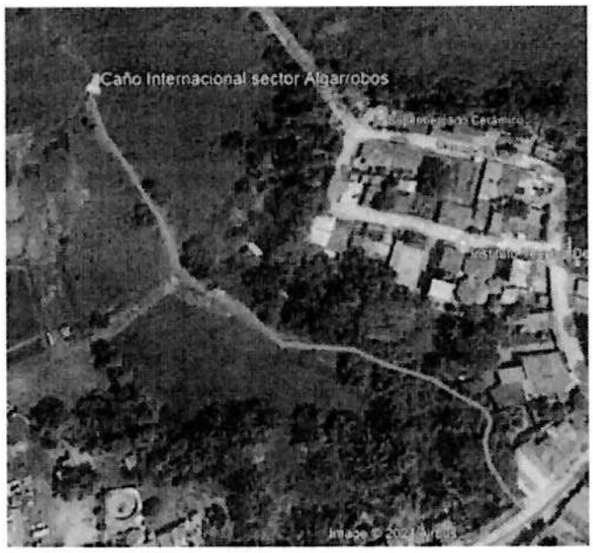

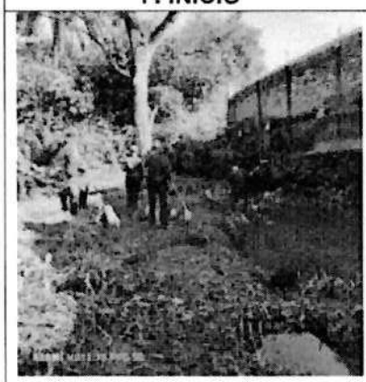
P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO LA PAZ SECTOR MANO DE DIOS (ZONA NATURAL)

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la Paz sector mano de Dios (Zona natural)	ML	Comuna 3	125	125



Se modifica el trazo del caño, teniendo en cuenta está ubicado en la parte trasera de las viviendas de la siguiente manera.

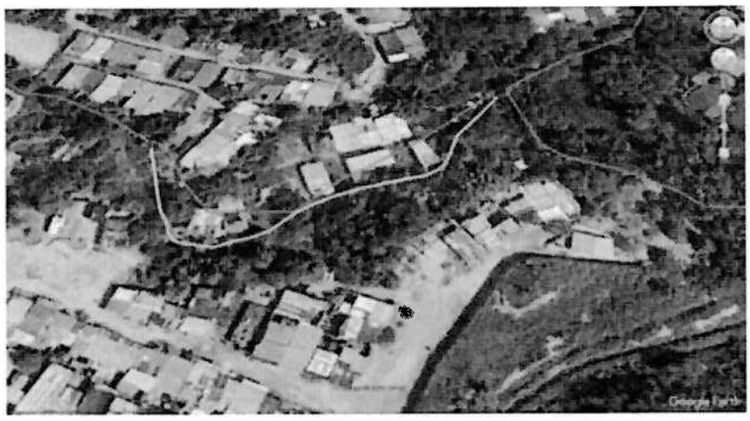


P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO LA PAZ SECTOR MANO DE DIOS (POBLADA)

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la Paz sector mano de Dios (poblada)	ML	Comuna 3	188	188

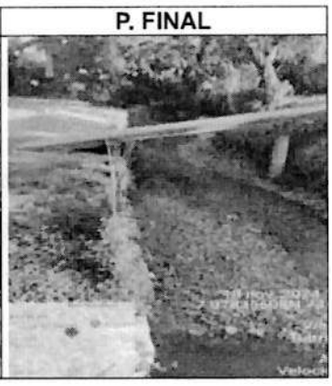

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO LA PAZ SECTOR LA PAZ

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño la Paz sector la Paz	ML	Comuna 3	375	351	Se reubican 24 ml en el caño Entrada Santa Isabel Etapa II



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR LA MINA

NOMBRE CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector la mina	Ml	3	814	814



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO 20 DE ENERO – ROSARIO

NOMBRE CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 20 de enero - rosario	Ml	3	456	456




P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR VILLA LUISA ETAPA 1

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector Villa Luisa Etapa 1	ML	Comuna 3	244	244

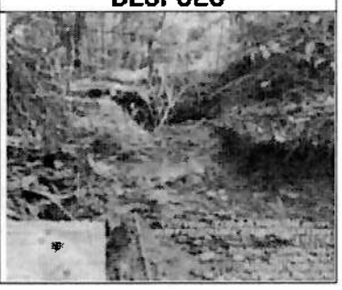


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA PAZ SECTOR VILLA LUISA I

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño la Paz sector villa Luisa I	ML	Comuna 3	210	210	

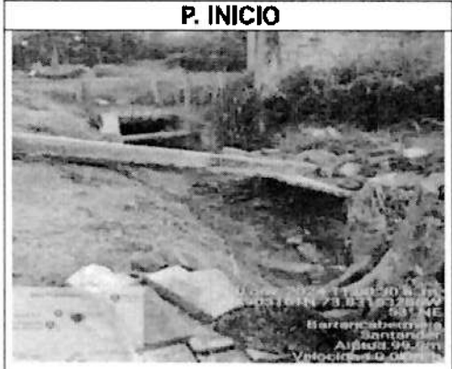

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO JERUSALÉN SECTOR CAIF

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño internación sector CAIF	ML	Comuna 3	178	178



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR 22 DE MARZO – BRISAS DE ALTAMIRA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector 22 de marzo-Brisas de Altamira	Ml	3	596	596




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO URBANIZACIÓN SAN SILVESTRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Urbanización San Silvestre	Ml	3	513	513

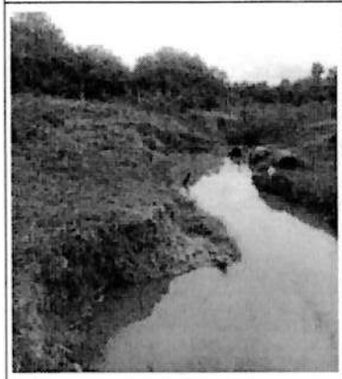

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 22 DE MARZO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 22 de marzo	Ml	3	604	604



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR ANTONIO NARIÑO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Antonio Nariño	Ml	3	573	573




P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	METROS LINEALES	ANCHO
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Reubicación caño Internacional sector Belén)	Comuna 3	96 ML	0-5 m
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Reubicación caño la paz sector la paz)	Comuna 3	24 ML	0-5 m
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (caño internacional humedal Jerusalén)	Comuna 3	9 ML	0-5 m
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Caño internacional sector san judas)	Comuna 3	22 ML	0-5 m
Caño Santa Isabel Etapa II Cra 28.	Comuna 3	88 ML	0-5 m
TOTAL		239 ML	

CAÑO ENTRADA SANTA ISABEL ETAPA II

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II	Ml	3	151	151

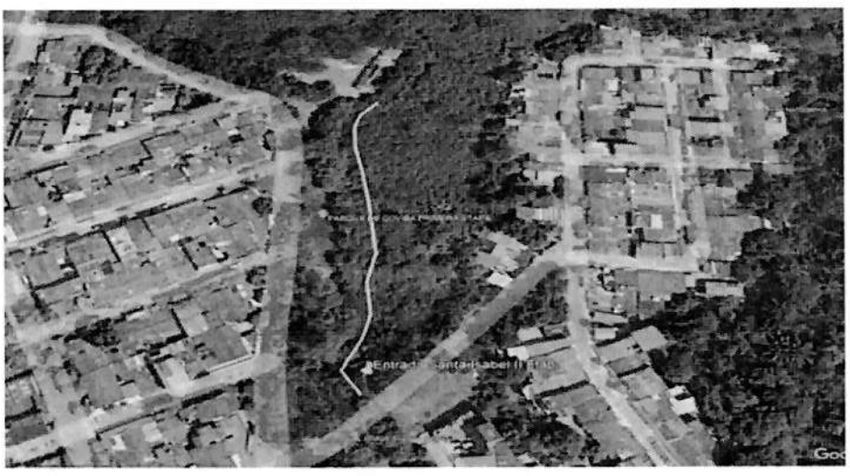

ANTES	DESPUÉS
	

CAÑO SANTA ISABEL ETAPA II – CRA 28

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Santa Isabel Etapa II – Cra 28	Ml	3	88	88



ANTES	DESPUÉS
	

COMUNA 4

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector El Refugio	Comuna 4	0-5 m	230			230	0	230	0	0	230	0
Caño Parque Ecológico C/tenario	Comuna 4	0-5 m	156			156	0	156	0	0	156	0
Caño las flores	Comuna 4	0-5 m	868			868	0	868	0	0	868	0
Caño Sector Yarima I	Comuna 4	0-5 m	194			194	0	194	0	0	194	0
Caño sector Yarima II	Comuna 4	0-5 m	157	9		148	0	148	0	0	148	0
Caño las flores	Comuna 4	0-5 m			9	9	0	9	0	0	9	0
TOTAL			1.605	9	9	1.605	0	1.605	0	0	0	0

CAÑO SECTOR EL REFUGIO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector El Refugio	ML	Comuna 4	230	230




P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO PARQUE ECOLÓGICO C/TENARIO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Parque Ecológico C/tenario	ML	Comuna 4	156	156

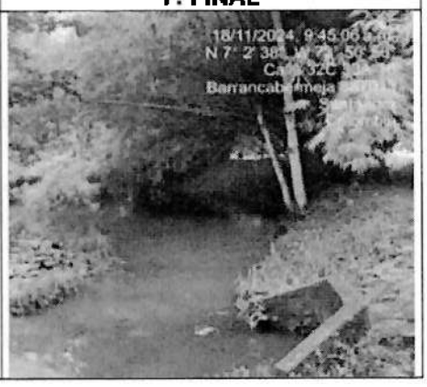


P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO LAS FLORES

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño las Flores	ML	Comuna 4	868	868



P. INICIO	P. FINAL

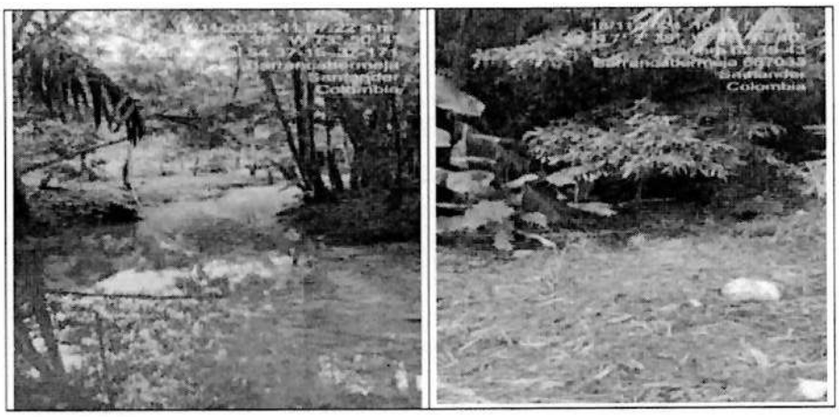

CAÑO SECTOR YARIMA I

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Sector Yarima 1	ML	Comuna 4	194	194




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR YARIMA II

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño sector Yarima 2	ML	Comuna 4	157	148	Reubicar 9 ml por el tramo de la vía férrea

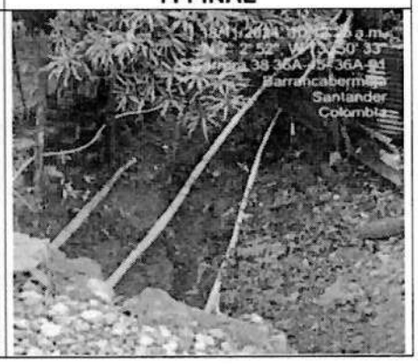

P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS

En la comuna 4 no se pudo intervenir 9 ml del sector Yarima II por las características del terreno, por lo tanto, se reubicaron en el caño Las flores:

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ANCHO	METROS LINEALES
Caño las Flores	Comuna 4	0-5 m	9 ML
TOTAL			9 ML

COMUNA 5


Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño Camelias sector Versalles	Comuna 5	0-5 m	192			192	0	192	0	0	192	0
Caño Camelias sector Provivienda	Comuna 5	0-5 m	232			232	0	232	0	0	232	0
Caño Camelias sector Porvenir	Comuna 5	0-5 m	148			148	0	148	0	0	148	0
Caño Camelias sector Santander	Comuna 5	0-5 m	266			266	0	266	0	0	266	0
Caño Camelias sector 1° de Mayo	Comuna 5	0-5 m	518			518	0	518	0	0	518	0

Caño Camelias sector Las Américas	Comuna 5	0-5 m	361			361	0	361	0	0	361	0
Caño sector Alcázar	Comuna 5	0-5 m	181			181	0	181	0	0	181	0
Caño sector La Esperanza Calle 57c	Comuna 5	0-5 m	171			171	0	171	0	0	171	0
Caño Ramaral sector San Pedro Claver	Comuna 5	0-5 m	507	195		312	0	312	0	0	312	0
Caño Sector Simon Bolivar	Comuna 5	0-5 m	320			320	0	0	320	0	320	0
Caño 1 sector Miraflores	Comuna 5	0-5 m	201			201	0	0	201	0	201	0
Caño 2 sector Miraflores	Comuna 5	0-5 m	210			210	0	0	210	0	210	0
Caño sector Santana	Comuna 5	0-5 m	411			411	0	0	411	0	411	0
Caño Santana-puente elevado	Comuna 5	0-5 m			195	195	0	195	0	0	195	0
TOTAL			3.718	195	195	3.718	0	2.576	0	0	3.718	0

CAÑO CAMELIAS SECTOR VERSALLES

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector Versalles	ML	Comuna 5	192	192

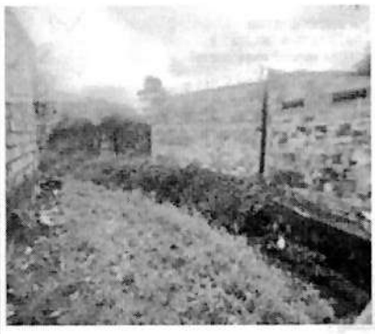


P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR PROVIVIENDA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector Provivienda	ML	Comuna 5	232	232

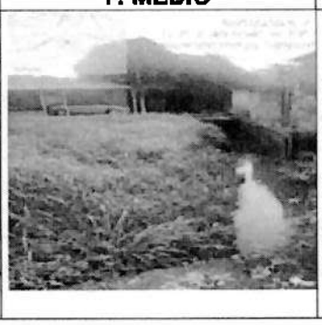

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR PORVENIR

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector Porvenir	ML	Comuna 5	148	148






P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR SANTANDER

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector Santander	ML	Comuna 5	266	266

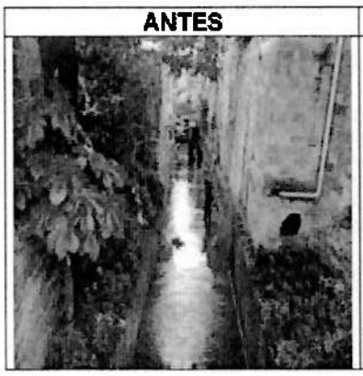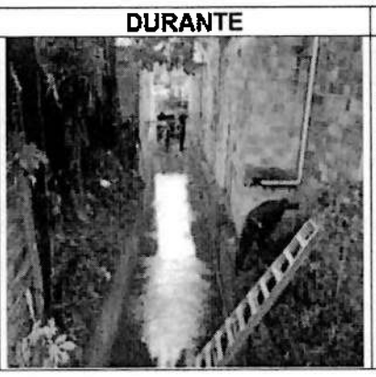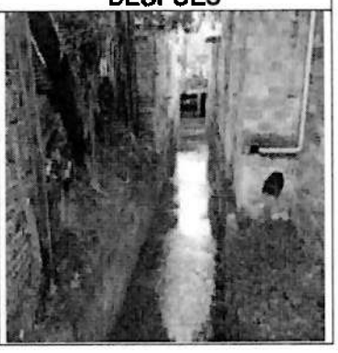

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR 1° DE MAYO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector 1° de Mayo	ML	Comuna 5	518	518





P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR LAS AMÉRICAS

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Camelias sector Las Américas	ML	Comuna 5	361	361

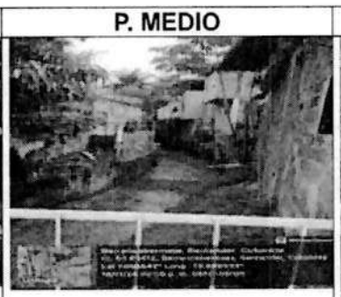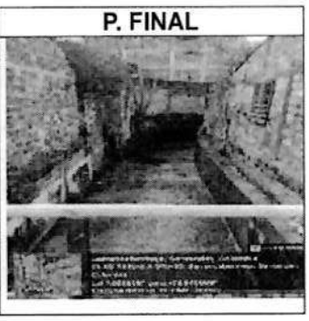

P INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		


NOMBRE			CANTIDAD GRAMADO	CANTIDAD
Caño ector Alcázar	ML	Comu 5	181	181



MBRE			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTA
Caño sector la esperanza calle 57c	ML	Comuna 5	171	171



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

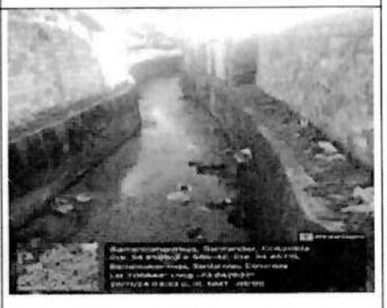CAÑO RAMARAL SECTOR SAN PEDRO CLAVEL

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Ramaral Sector San Pedro Clavel	ML	Comuna 5	507	312	Se reubican 195 ML por condiciones del terreno en el caño Santana – Puente Elevado




P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR SIMON BOLIVAR

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Sector Simón Bolívar	Ml	5	320	320

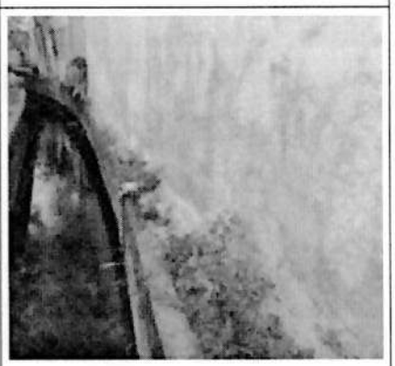

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 1 SECTOR MIRAFLORES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 1 sector Miraflores	MI	5	201	201



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 2 SECTOR MIRAFLORES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 2 sector Miraflores	MI	5	210	210




P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR SANTANA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Santana	Ml	5	411	411

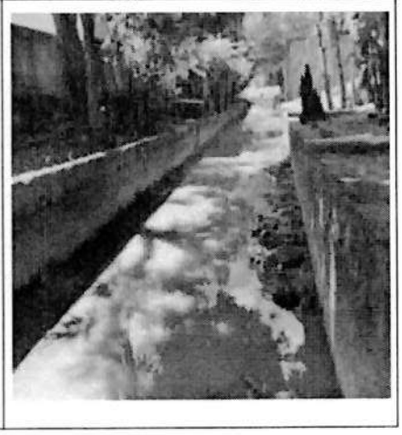

P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	METROS LINEALES	ANCHO
Caño Santana – puente elevado (Reubicación Caño Ramaral sector San Pedro Clavel)	Comuna 5	195	0-5
TOTAL		195 ML	

COMUNA 6

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño sector Oro Negro 1	Comuna 6	0-5 m	169			169	0	0	169	0	169	0
Caño sector Progreso-Oro Negro	Comuna 6	0-5 m	530			530	0	0	530	0	530	0
Caño sector Playita-Manzanares	Comuna 6	0-5 m	653			653	0	0	653	0	653	0
Caño bendición de dios etapa I	Comuna 6	0-5 m	583			583	0	0	583	0	583	0
Caño sector Brisas del Oriente	Comuna 6	0-5 m	419			419	0	419	0	0	419	0
Caño sencillo 3 bendición de dios	Comuna 6	0-5 m	216			216	0	0	216	0	216	0
Caño sencillo 1 sector Bendición de Dios	Comuna 6	0-5 m	178			178	0	0	178	0	178	0
Caño sencillo 2 sector Bendición de Dios	Comuna 6	0-5 m	212			212	0	0	212	0	212	0
Caño sector San Pedro	Comuna 6	0-5 m	505			505	0	505	0	0	505	0
Caño sector Puerta del Sol	Comuna 6	0-5 m	394			394	0	394	0	0	394	0
Caño sector San Martin	Comuna 6	0-5 m	230			230	0	230	0	0	230	0
Caño sector el Boston	Comuna 6	0-5 m	466			466	0	0	466	0	466	0
Caño Boston 2	Comuna 6	0-5 m	219			219	0	0	219	0	219	0
Caño sector San Martin Diagonal 55	Comuna 6	0-5 m	316			316	0	316	0	0	316	0
Caño sector Danubio	Comuna 6	0-5 m	248	248		0	0	0	0	0	0	0
Caño sector puerta del sol 2	Comuna 6	0-5 m	197			197	0	0	197	0	197	0
Caño sector puerta del sol 3 (reubicado puerta del sol 2)	Comuna 5	0-5 m			248	248	0	248	0	0	248	0
TOTAL			5.535	248	248	5.535	0	2.112	3.423	0	5.535	0

CAÑO SECTOR ORO NEGRO 1

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Oro Negro 1	Ml	6	169	169



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR PROGRESO – ORO NEGRO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Progreso-Oro Negro	Ml	6	530	530




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR PLAYITA – MANZANARES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Playita-Manzanares	Ml	6	653	653

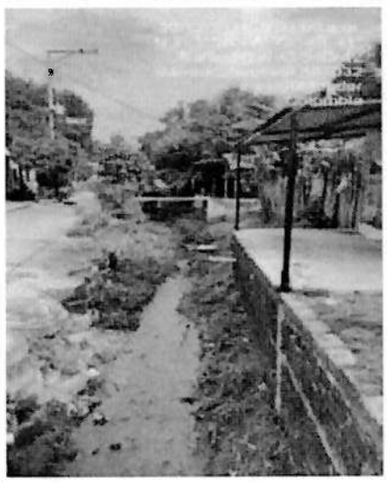

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO BENDICIÓN DE DIOS ETAPA I


CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño bendición de dios etapa I	Ml	6	583	583



CAÑO SECTOR BRISAS DEL ORIENTE

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Brisas del Oriente	ML	Comuna 6	419	419

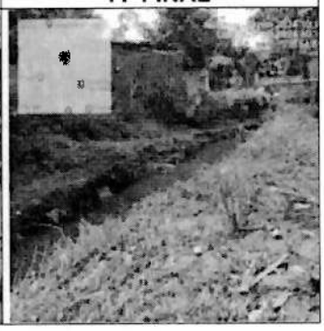

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SENCILLO 3 BENDICIÓN DE DIOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sencillo 3 bendición de Dios	Ml	6	216	216



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SENCILLO 1 SECTOR BENDICIÓN DE DIOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sencillo 1 sector Bendición de Dios	Ml	6	178	178



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SENCILLO 2 SECTOR BENDICIÓN DE DIOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sencillo 2 sector Bendición de Dios	Ml	6	212	212



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SAN PEDRO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño San Pedro	ML	Comuna 6	505	505




P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO PUERTA DEL SOL

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Puerta del Sol	ML	Comuna 6	394	394

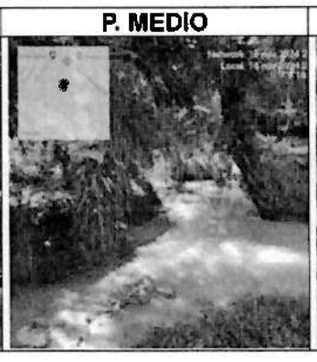


P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR SAN MARTIN

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Sector San Martin	ML	Comuna 6	230	230

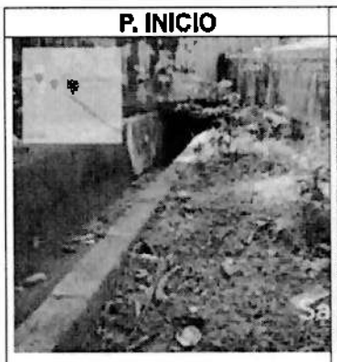

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR EL BOSTON

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector El Boston	Ml	6	466	466



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR EL BOSTON 2


CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Boston 2	Ml	6	219	219



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR SAN MARTÍN DIAG 55

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector San Martín Diag 55	ML	Comuna 6	316	316

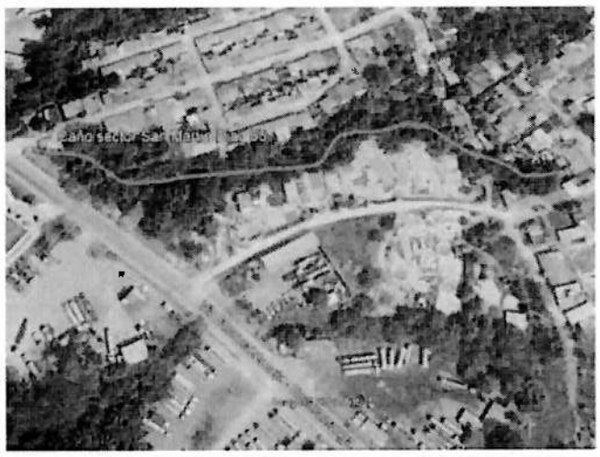

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		


CAÑO SECTOR DANUBIO


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Sector Danubio	ML	Comuna 6	248	0	Se reubican 248 ml en el caño sector puerta del sol 3



CAÑO PUERTA DEL SOL 2

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño puerta del sol 2	Ml	6	197	197

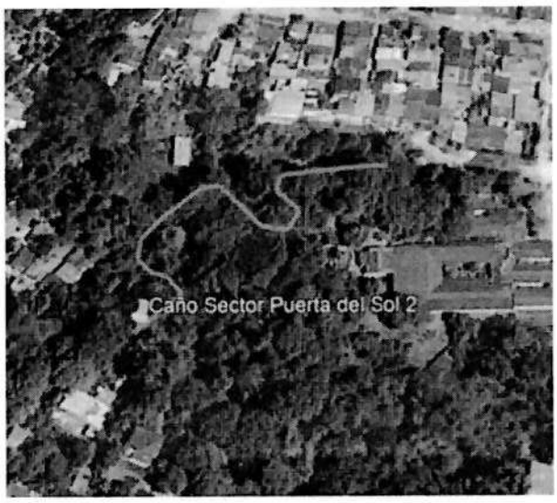

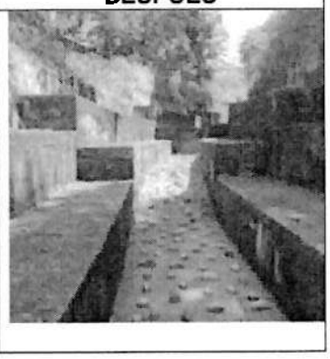ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CANTIDADES REUBICADAS

En la comuna 6 no se pudo intervenir el caño sector Danubio por las características del terreno, por lo tanto, se reubicaron en el caño Sector Puerta del Sol 3

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	METROS LINEALES	ANCHO
Caño Sector Puerta del Sol 3	Comuna 6	248 ML	0-5
TOTAL		248 ML	



ANTES	DESPUÉS
	

COMUNA 7

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño sectores Brisas del Poblado-Villa Aura	Comuna 7	0-5 m	340			340	0	0	340	0	340	0
Caño sector 9 de Agosto	Comuna 7	0-5 m	441			441	0	441	0	0	441	0
Caño sector Villarelis II - La Independencia	Comuna 7	0-5 m	1319			1319	0	1319	0	0	1319	0
Prados de campestre	Comuna 7	0-5 m	208			208	0	0	208	0	208	0
Campestre	Comuna 7	0-5 m	216			216	0	216	0	0	216	0
Caño villarelis III	Comuna 7	0-5 m	1281	711		570	570	0	0	0	570	0
Caño Nuevo Horizonte	Comuna 7	0-5 m	486			486	0	486	0	0	486	0
Caño El Campin	Comuna 7	0-5 m	510			510	0	510	0	0	510	0
Urb. Terrazas del puerto	Comuna 7	0-5 m	1155			1155	0	1155	0	0	1155	0
Urb. Ciudad del SOL	Comuna 7	0-5 m	731			731	0	731	0	0	731	0
Caño Asn. 03 DE OCTUBRE	Comuna 7	0-5 m	163			163	0	0	163	0	163	0
Caño brisas villarelys	Comuna 7	0-5 m	753			753	0	0	753	0	753	0
Caño cielos abiertos	Comuna 7	0-5 m	401			401	0	0	401	0	401	0
Caño San Francisco-Cardales (Reubicación Villarelis 3)	Comuna 7				502	502	0	502	0	0	502	0
Caño Puerto 65 (Reubicación Villarelis 3)	Comuna 7				90	90	0	90	0	0	90	0
Caño Danubio sector los Abuelos (Reubicación Villarelis 3)	Comuna 7				119	119	0	119	0	0	119	0
TOTAL			8004	711	711	8004	570	5569	1865	0	8004	0

CAÑO SECTORES BRISAS DEL POBLADO- VILLA AURA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sectores Brisas del Poblado- Villa Aura	Ml	7	340	340



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR 9 DE AGOSTO


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector 9 de agosto	ML	Comuna 7	441	441





ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR VILLARELIS II- LA INDEPENDENCIA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector Villarelis II- la independencia	ML	Comuna 7	1319	1319

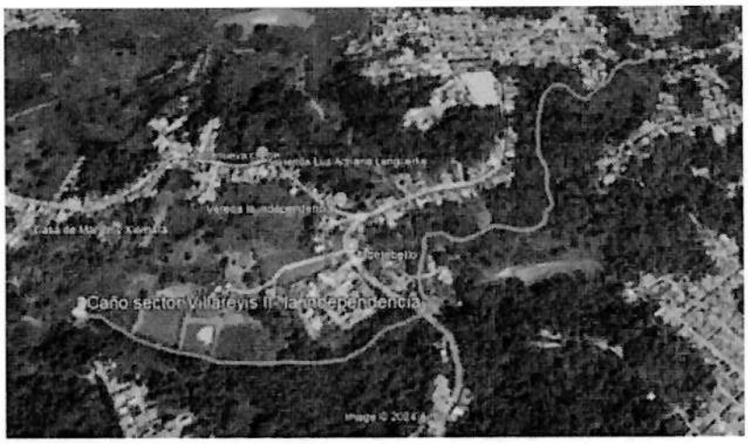

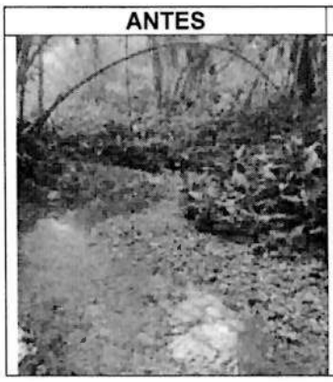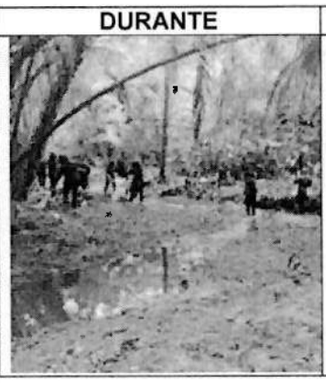ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO PRADOS DEL CAMPESTRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Prados del Campestre	Ml	7	208	208



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CAMPESTRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Campestre	Ml	7	216	216




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO VILLAREYS III

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Caño Vallarelys III	ML	7	1281	570	Se reubican 711 ml por características del terreno en los caños San Francisco – Cardales, Caño Puerto 65 y Caño Danubio sector los abuelos

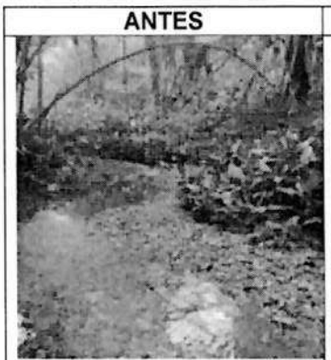

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO NUEVO HORIZONTE

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Nuevo Horizonte	ML	Comuna 7	486	486



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO EL CAMPIN

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño el Campin	ML	Comuna 7	510	510



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

TERRAZAS DEL PUERTO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Terrazas del Puerto	ML	Comuna 7	1155	1155



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

URB. CIUDAD DEL SOL

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Urb. Ciudad del Sol	ML	Comuna 7	731	731



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO ASN. 03 DE OCTUBRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Asn. 03 DE OCTUBRE	Ml	7	163	163



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO BRISAS VILLARELYS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño brisas Villarelys	Ml	7	753	753



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CIELOS ABIERTOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Cielos Abiertos	Ml	7	401	401



P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS


En la comuna 7, en el caño Villarelys III, se reubicaron 711 ml en los siguientes caños

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
caño San Francisco-Cardales	Ml	1	502	Se reubico por el caño Villarelys III
Caño puerto 65	Ml	5	90	
Caño Danubio sector los Abuelos	Ml	6	119	
TOTAL			711	


CAÑO SAN FRANCISCO-CARDALES



CAÑO PUERTO 65

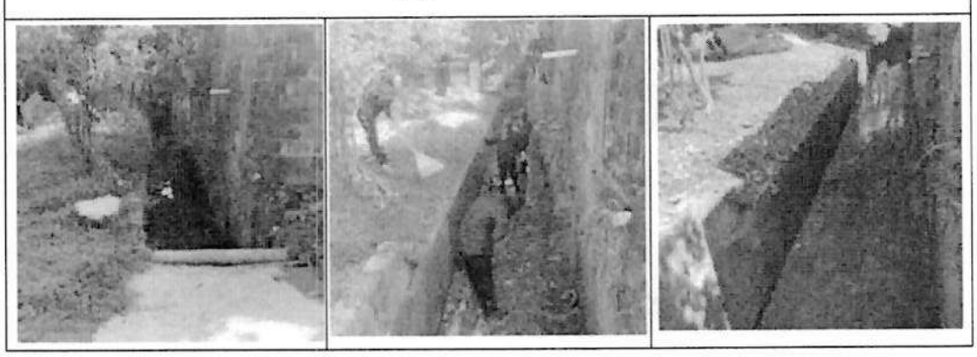

CAÑO DANUBIO SECTOR LOS ABUELOS

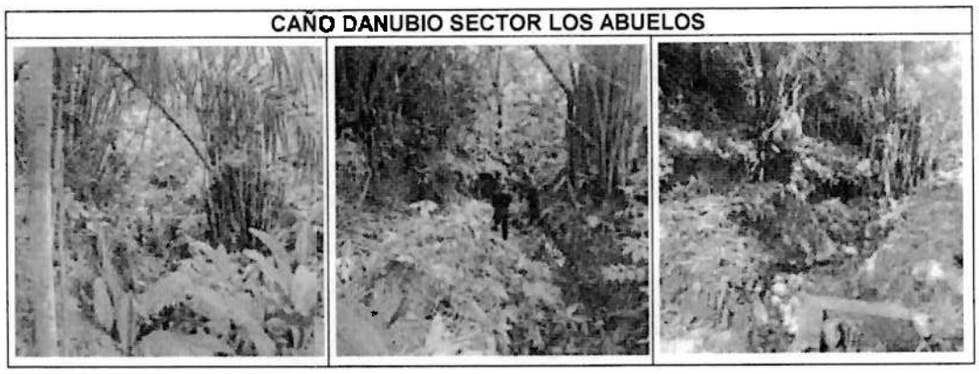

5.1.1.1.2. Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).

En el desarrollo de las actividades proyectadas, se contempla la limpieza manual de caños urbanos con un ancho promedio de 5 a 10 metros. Este proceso implica la remoción manual de residuos sólidos, tanto inorgánicos como orgánicos, que puedan causar obstrucciones y contaminación en el cauce.

En esta actividad se intervino un total de 8.164 ML de limpieza, en donde se usaron herramientas menores tales como machetes, palas, palines, ganchos tridentes de hierro, lazos, varas, limas, canoas, remos, garabatos y el material vegetal fue empacado en sacos se acopio en área de trabajo y posteriormente fue retirado para su disposición final.

COMUNA 1

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño puente el arenal - la rampa	Comuna 1	5-10 m	900	900		0	0	0	0	0	0	0
Caño Buenos Aires	Comuna 1	5-10 m	489			489	0	489	0	0	489	0
pozo 7 -santa barbara- isla del zapato	Comuna 1	5-10 m	1427			1427	0	0	1427	0	1427	0
Dorado Sector Las Iguanas (Reposición del caño Arenal la Rampa	Comuna 1	5-10 m			300	300	0	300	0	0	300	0
Caño Buenos Aires II Cra 19 (Reposición del caño Arenal la Rampa)	Comuna 1	5-10 m			200	200	0	200	0	0	200	0
Caño isla del zapato Box Culvert (reposición caño Arenal la Rampa)	Comuna 1	5-10 m			400	400	0	0	400	0	400	0
TOTAL			2816	900	900	2816	0	989	1827	0	2816	0

CAÑO PUENTE EL ARENAL – LA RAMPA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Caño Puente el Arenal – La Rampa	Ml	1	900	0	Se reubican los 900 ML de limpieza en el caño Dorado sector las Iguanas, caños Buenos Aires II Cra 19 y caño Isla del Zapato Box Culvert



CAÑO BUENOS AIRES

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Buenos Aires	ML	Comuna 1	489	489



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO POZO 7 -SANTA BARBARA- ISLA DEL ZAPATO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Pozo 7 -santa barbara- isla del zapato	ml	1	1427	1427



P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS

En la comuna 1, del caño puente el arenal - la rampa, se reubicaron 900 ml en los siguientes caños: caño Dorado sector las Iguanas, caños Buenos Aires II Cra 19 y caño Isla del Zapato Box Culvert

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
caño Dorado – Sector las iguanas	Ml	1	300	Se reubico por el caño puente el Arenal – la Rampa
Caño Buenos Aires II Cra 19	Ml	1	200	
Caño Isla del Zapato Box Culvert	Ml	1	400	
TOTAL			900	

CAÑO ISLA DEL ZAPATO BOX COLBERT (REPOSICIÓN)





CAÑO DORADO SECTOR LAS IGUANAS (REPOSICIÓN)






COMUNA 2

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Las Camelias sector Floresta Baja-UIS	Comuna 2	5-10 m	311			311	0	0	311	0	311	0
Caño Camelias sector Villaluz-Policía	Comuna 2	5-10 m	961			961	0	0	961	0	961	0
TOTAL			1272	0	0	1272	0	0	1272	0	1272	0

CAÑO LAS CAMELIAS SECTOR FLORESTA BAJA- UIS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Las Camelias sector Floresta Baja- UIS	ML	3	311	311

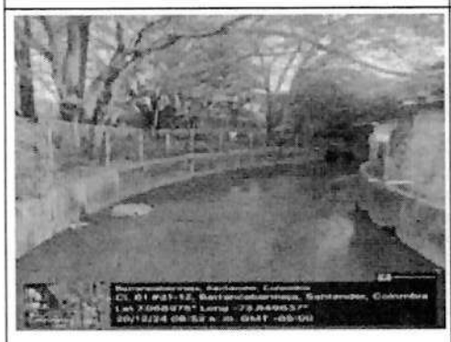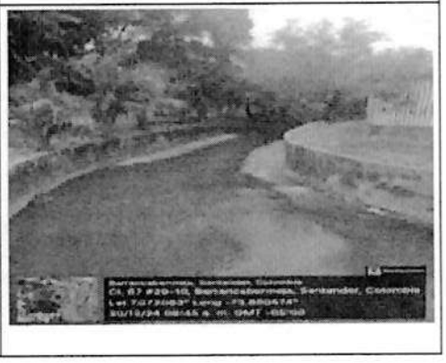


P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CAMELIAS SECTOR VILLALUZ-POLICIA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Camelias sector Villaluz-Policía	ML	2	961	961

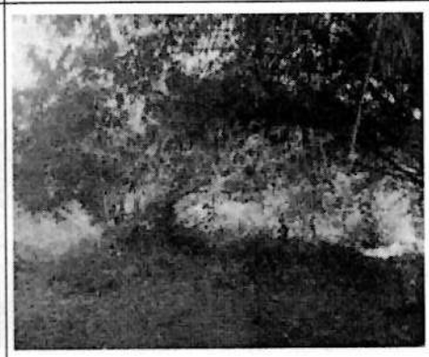

P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 3

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño La Paz sector 12 de agosto	Comuna 3	5-10 m	123			123	0	123	0	0	123	0
Caño La Paz sector Villa de Dios	Comuna 3	5-10 m	148			148	0	148	0	0	148	0
Caño La Paz sector Brisas La Paz	Comuna 3	5-10 m	224			224	0	224	0	0	224	0
Caño Internacional sector PTAR San silvestre	Comuna 3	5-10 m	1160			1160	0	0	1160	0	1160	0
TOTAL			1.655			1.655	0	495	1160	0	1.650	0

CAÑO LA PAZ SECTOR 12 DE AGOSTO


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la Paz sector 12 de agosto	ML	Comuna 3	200	200



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA PAZ SECTOR VILLA DE DIOS

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la Paz sector villa de Dios	ML	Comuna 3	148	148

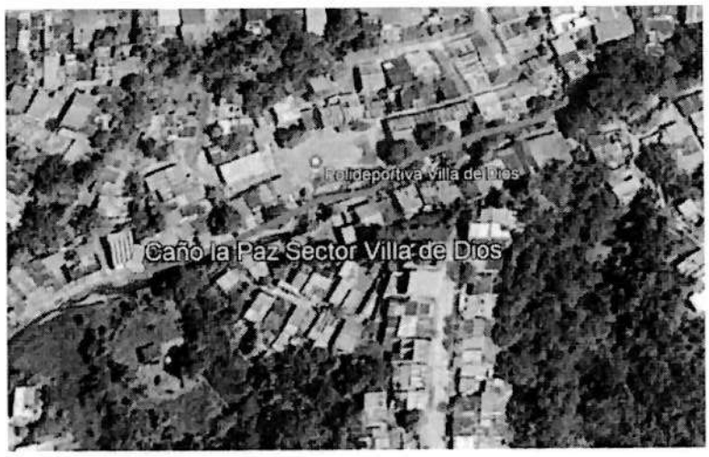

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA PAZ SECTOR BRISAS DE LA PAZ

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la Paz Sector Brisas de la Paz	ML	Comuna 3	224	224




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PTAR SAN SILVESTRE

NOMBRE CAÑO	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO ML	CANTIDAD EJECUTADO ML
Caño Internacional sector PTAR San silvestre	3	1160	1160

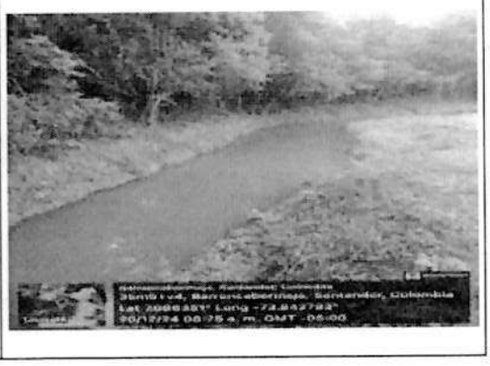

P. INICIO	P. FINAL
	



COMUNA 5

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Camelias sector Las Camelias	Comuna 5	5-10 m	212			212	0	0	212	0	212	0
TOTAL			212	0	0	212	0	0	212	0	212	0

CAÑO CAMELIAS SECTOR LAS CAMELIAS

NOMBRE CAÑO	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO ML	CANTIDAD EJECUTADO ML
Caño Camelias sector Las Camelias	5	212	212

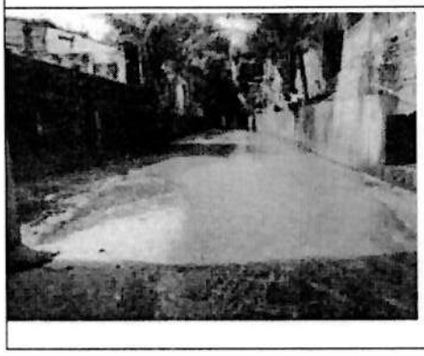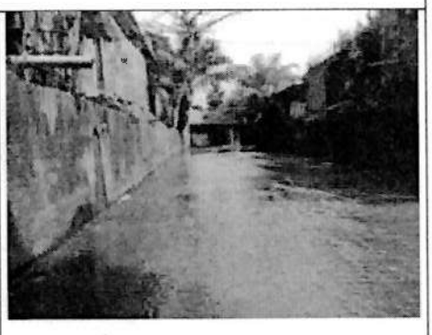

P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 7

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Metro lineal inicial	Menores	Mayores	Metro lineal actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño sector Los Corales	Comuna 7	5-10 m	492			492	0	0	492	0	492	0
pozo 7 -las torres sta bárbara	Comuna 7	5-10 m	1717			1717	0	0	1717	0	1717	0
TOTAL			2209	0	0	2209	0	0	2209	0	2209	0

CAÑO SECTOR LOS CORALES

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector Los Corales	ML	Comuna 7	492	492



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO POZO 7 -LAS TORRES STA BÁRBARA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Calo pozo 7 -las torres sta bárbara	ML	Comuna 7	1717	1717



P. INICIO	P. FINAL
	

5.1.1.1.3. Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)

Se realizaron las respectivas rocerías de menor a un metro a los costados de los caños intervenidos, equivalentes a 103.204 metros cuadrados (m2) conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del convenio 1732-24.

- **Rocería en área de ronda hídrica**

El proceso de limpieza consiste en arrancar el material vegetal emergente que se encuentra en las áreas de la ronda hídrica de los caños. Esta actividad de retiro de material vegetal se realizará en forma manual o mecánica para visualizar la zona del caño, asimismo la vegetación emergente o sumergida que impida el drenaje.

- **Rocería manual**

- Se realizó el corte de maleza, tenido en cuenta que el machete siempre debe orientarse de tal manera que el corte sea retirado del cuerpo del operador.
- El movimiento del corte se realizó de un lado a otro, hacia a fuera, sin aplicar excesiva fuerza.
- En los trabajos de áreas con pasto alto, se utilizaron bastones de apoyo o garabato para facilitar su manejo de forma segura sin exponer las manos a una lesión.
- No debe amarrarse el machete a la mano.

La actividad se ejecutó con el uso de herramientas menores tales como machetes, palas, palines, ganchos tridentes de hierro, lazos, varas, limas, canoas, remos, garabatos; el material vegetal fue empacado en sacos se acopio en área de trabajo y posteriormente fue retirado para su disposición final

COMUNA 1

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector Casa de la Cultura	Comuna 1	0-5 m	468			468	0	468	0	0	468	0
Caño sector Palmira	Comuna 1	0-5 m	1.236			1.236	0	1.236	0	0	1.236	0
TOTAL			1704	0	0	1704	0	1704	0	0	1704	0

CAÑO SECTOR CASA DE LA CULTURA

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector Casa de la Cultura	M2	1	468	468



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR PALMIRA

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector Palmira	M2	1	1236	1236



P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 2

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector Claya herrera	Comuna 2	0-5 m	960			960	0	960	0	0	960	0
Caño Callejón de los perros	Comuna 2	0-5 m	372			372	0	372	0	0	372	0
Caño sector P. Ecológico Pamaso	Comuna 2	0-5 m	524			524	0	524	0	0	524	0
TOTAL			1856	0	0	1856	0	1856	0	0	1856	0

CAÑO SECTOR OLAYA HERRERA

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	CANTIDAD **PROGRAMADA M2**	CANTIDAD EJECUTADA **M2**
Caño sector Olaya Herrera	M2	2	960	960



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CALLEJÓN DE LOS PERROS

ROCERÍA MENOR A **UN METRO**				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	CANTIDAD **PROGRAMADA M2**	CANTIDAD **EJECUTADA M2**
Caño callejón de los perros	M2	2	372	372




P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR PARQUE ECOLÓGICO PARNASO

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Caño sector parque ecológico Parnaso	M2	2	524	524

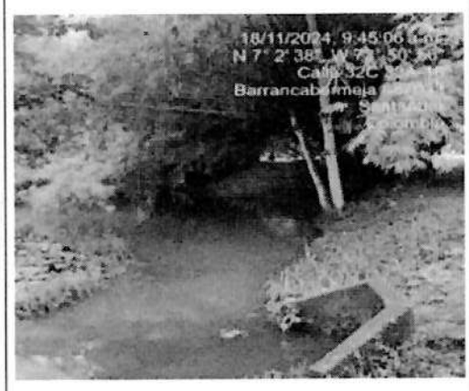

P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 3

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Internacional sector San Judas	Comuna 3	0-5 m	524	440		84	0	84	0	0	84	0
Caño Internacional sector Pipatón (Canalizado)	Comuna 3	0-5 m	496			496	0	496	0	0	496	0
Caño Internacional sector Pipatón (Natural)	Comuna 3	0-5 m	596			596	0	596	0	0	596	0
Caño Internacional humedal Jerusalén	Comuna 3	0-5 m	764	36		728	0	728	0	0	728	0
Caño Internacional sector Jerusalén	Comuna 3	0-5 m	656			656	0	656	0	0	656	0
Caño Internacional sector Belén	Comuna 3	0-5 m	432	384		48	0	48	0	0	48	0
Caño Internacional sector Algarrobos	Comuna 3	0-5 m	1.224			1.224	0	1.224	0	0	1.224	0
Caño La Paz sector Mano de Dios (zona natural)	Comuna 3	0-5 m	500			500	0	500	0	0	500	0
Caño La Paz sector Mano de Dios (zona poblada)	Comuna 3	0-5 m	752			752	0	752	0	0	752	0
Caño La Paz sector La Paz	Comuna 3	0-5 m	1.500	96		1.404	0	1.404	0	0	1.404	0
Caño sector la mina	comuna 3	0-5 m	3.256			3.256	0	0	3.256	0	3.256	0
Caño 20 de enero - rosario	Comuna 3	0-5 m	1.824	72		1.752	0	0	1.752	0	1.752	0
Caño sector Villa Luisa Etapa I	Comuna 3	0-5 m	976			976	0	200	776	0	976	0
Caño La Paz sector Villa Luisa I	Comuna 3	0-5 m	840			840	0	840	0	0	840	0
Jerusalén sector CAIF	Comuna 3	0-5 m	712			712	0	712	0	0	712	0
Caño sector 22 de marzo-Brisas de Altamira	Comuna 3	0-5 m	2.384			2.384	0	0	2.384	0	2.384	0
Urbanización San Silvestre	Comuna 3	0-5 m	2.052			2.052	0	0	2.052	0	2.052	0
Caño 22 de marzo	Comuna 3	0-5 m	2.416			2.416	0	0	2.416	0	2.416	0
Caño sector Antonio Nariño	Comuna 3	0-5 m	2.292			2.292	0	0	2.292	0	2.292	0
Caño entrada Santa Isabel Etapa II	Comuna 3	0-5 m			520	520	0	520	0	0	520	0
Caño Santa Isabel Etapa II cra 28	Comuna 3	0-5 m			436	436	0	436	0	0	436	0
Caño puerto 65	Comuna 3	0-5 m			72	72	0	0	72	0	72	0
TOTAL			24.196	1.028	1.028	24.196	0	9.196	15.000	0	24.196	0


CAÑO INTERNACIONAL SECTOR SAN JUDAS



ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	OBSERVACIONES
Caño Internacional sector san Judas	M2	3	524	84	Se reubicaron los 440 m^2 de rocería faltantes en el caño entrada Santa Isabel Etapa II (4 m^2) y caño Santa Isabel Etapa II cra 26 (436 m^2)



CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PIPATÓN (CANALIZADO)

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Internacional sector Pipatón (Canalizado)	M2	3	946	496

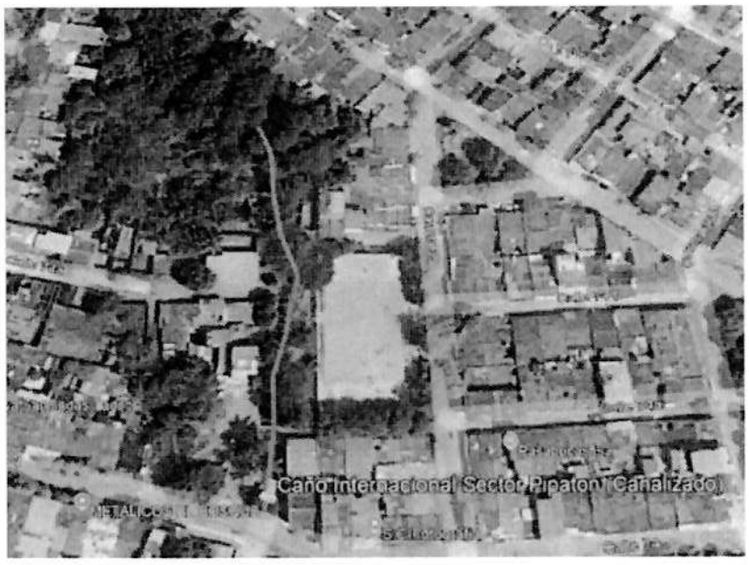


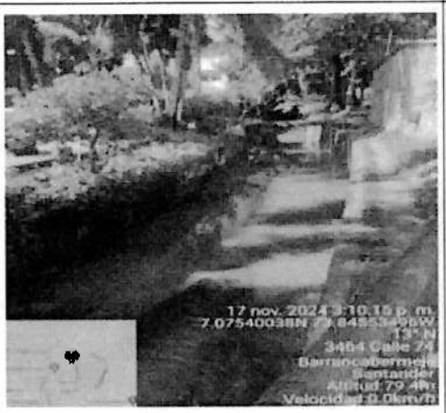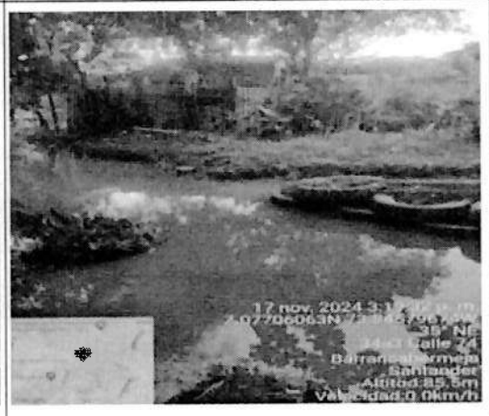P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PIPATÓN (NATURAL)

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Internacional sector Pipatón (Natural)	M2	3	596	596

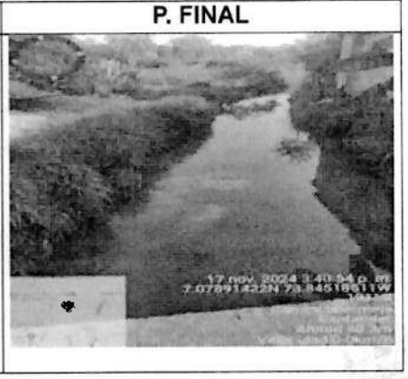

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO INTERNACIONAL HUMEDAL JERUSALÉN

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Internacional humedal Jerusalén	M2	3	764	728	Se reubican los 36 m² de rocería faltantes en el caño Entrada Santa Isabel Etapa II




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR JERUSALÉN


ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Internacional sector Jerusalén	M2	Comuna 3	656	656

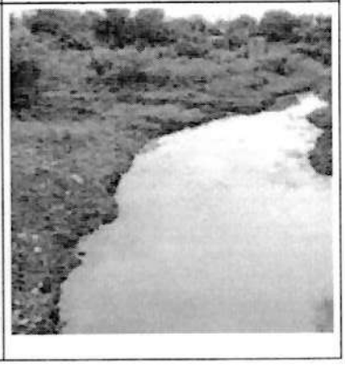

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		


ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Internacional sector Belén	M2	3	432	48	Se reubican los 384 m² de rocería faltantes en el caño entrada Santa Isabel etapa II

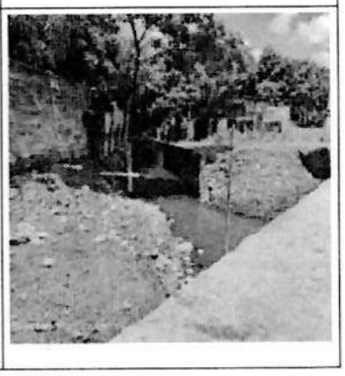


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR ALGARROBOS

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Caño Internacional sector Algarrobos	M2	Comuna 3	1224	1224

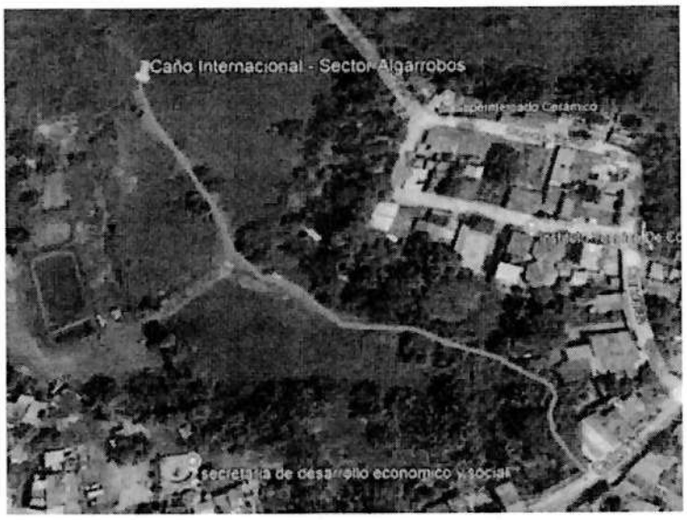

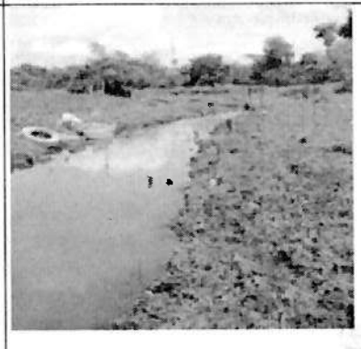
ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		



CAÑO LA PAZ SECTOR MANO DE DIOS (ZONA NATURAL)

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño la Paz sector mano de Dios (Zona natural)	M2	Comuna 3	500	500



Se modifica el trazo del caño, ya que como se observa en la imagen de arriba, este pasa por encima de las viviendas, más sin embargo su cauce real es detrás de las viviendas localizadas en esta zona, como se puede observar en la imagen de abajo

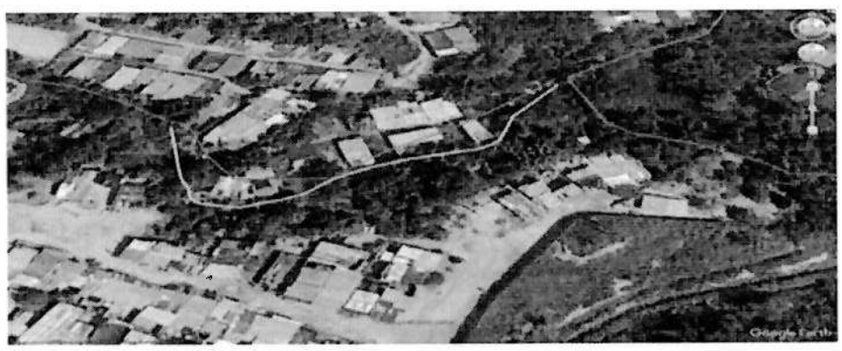


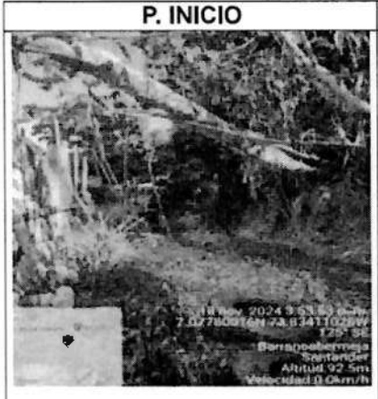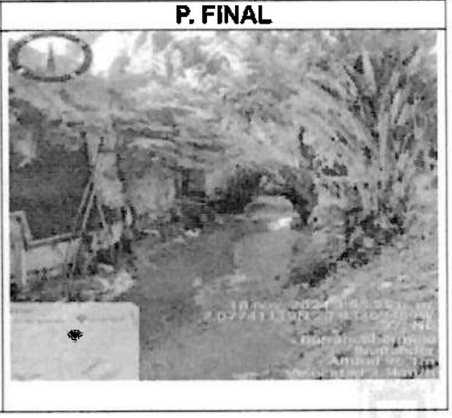P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO LA PAZ SECTOR MANO DE DIOS (POBLADA)

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño la Paz sector mano de Dios (poblada)	M2	Comuna 3	752	752

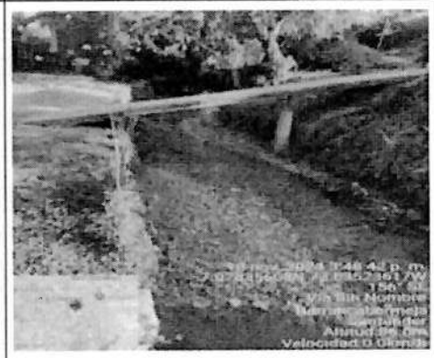

INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO LA PAZ SECTOR LA PAZ


ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño la Paz sector la Paz	M2	3	1500	1404	Se reubican 96 m² de rocería faltantes en el caño entrada Santa Isabel Etapa II



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO SECTOR LA MINA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector la mina	M2	3	3256	3256

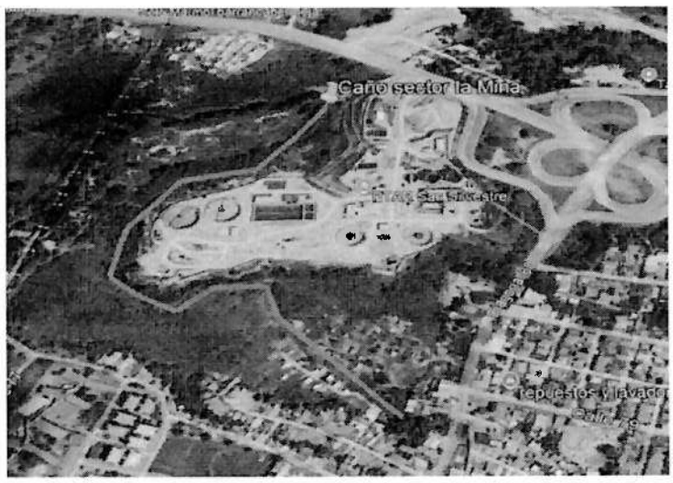

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO 20 DE ENERO – ROSARIO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Caño 20 de enero - rosario	M2	3	1824	1752	Se reubican los 72 m^2 de rocería faltantes en el caño Puerto 65



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

			CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD



		DESPUÉS
		

ROCERÍA MENOR UN METRO				
			CANTIDAD RAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño la Paz sector villa Luisa				



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO JERUSALEN SECTOR CAIF

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Jerusalén sector CAIF	M2	Comuna 3	712	712




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR 22 DE MARZO-BRISAS DE ALTAMIRA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector 22 de marzo-Brisas de Altamira	M2	3	2384	2384

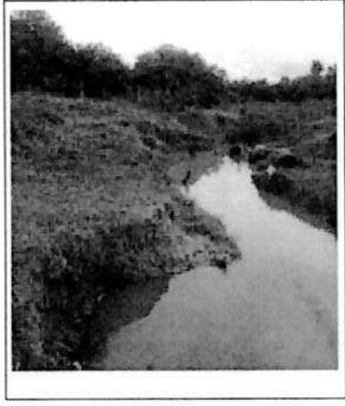

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO URBANIZACIÓN SAN SILVESTRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Urbanización San Silvestre	M2	3	2052	2052



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 22 DE MARZO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 22 de marzo	M2	3	2416	2416



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR ANTONIO NARIÑO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Antonio Nariño	M2	3	2292	2292



P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES A REUBICAR


En la comuna 3, del caño Internacional sector San Judas, se reubicaron 440 m^2 de rocería, del caño Internacional humedal Jerusalén se reubican 36 m^2, del caño Internacional sector Belén se reubican 384 m^2, del caño la Paz sector la Paz se reubican 96 m^2, esto con un total de 956 m^2 a reubicar de la actividad de rocería; para dar cumplimiento en su totalidad a la actividad, se hizo la reposición en el caño Entrada Santa Isabel Etapa II con una ejecución de 520 m^2 de rocería y en el caño Santa Isabel Etapa II Cra 28 con una ejecución de 436 m^2, esto da cumplimiento a la totalidad de 956 m^2 de rocería.

Del caño 20 de enero – Rosario se reubican 72 m^2 de rocería en el caño Puerto 65

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Reubicacion caño Internacional sector Belen)	Comuna 3	Men a 1m	384

Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Reubicion caño la paz sector la paz)	Comuna 3	Men a 1m	96
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (caño internacional humedal Jerusalén)	Comuna 3	Men a 1m	36
Caño Entrada Santa Isabel Etapa II (Caño Internacional sector san judas)	Comuna 3	Men a 1m	4
Caño Santa Isabel Etapa II Cra 28.	Comuna 3	Men a 1m	436
TOTAL			**956 M2**


Caño Entrada Santa Isabel Etapa II
Rocería: 520 m2

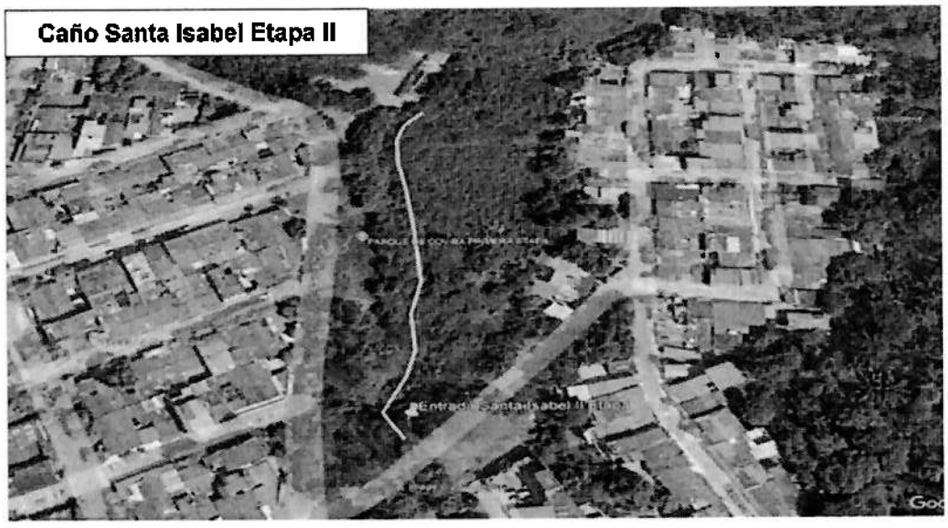

ANTES	DESPUÉS
	

Caño Santa Isabel Etapa II Cra 28.
Rocería: 436 m2


Caño Santa Isabel Etapa II CRA 28.

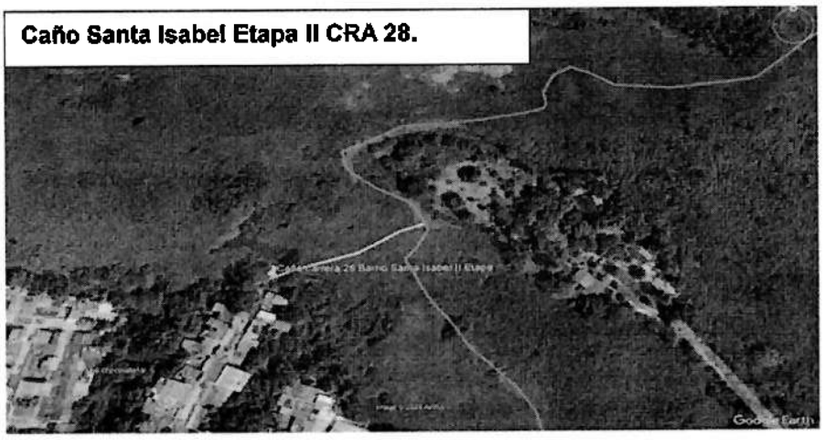

ANTES	DESPUÉS
	

REPOSICIÓN ROCERIA MENOR A UN METRO DE ALTO					
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**OBSERVACIONES**
Caño puerto 65 (Reposición)	M2	Comuna 3	72	72	Esta actividad de rocería y limpieza reemplaza a el caño 20 de enero - rosario

CAÑO PUERTO 65 REPOSICIÓN

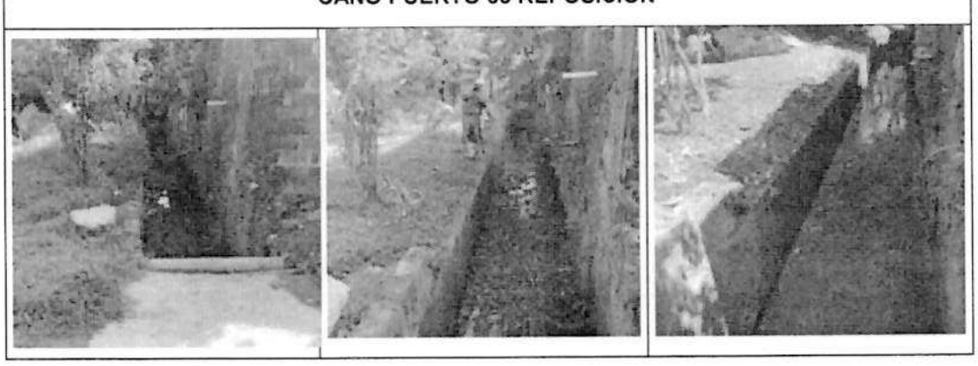


COMUNA 4

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sector El Refugio	Comuna 4	0-5 m	920			920	0	920	0	0	920	0
Caño Parque Ecologico Cñtenario	Comuna 4	0-5 m	624			624	0	624	0	0	624	0
Caño las flores	Comuna 4	0-5 m	3.472			3.472	0	3.472	0	0	3.472	0
Caño Sector Yarima I	Comuna 4	0-5 m	776			776	0	776	0	0	776	0
Caño sector Yarima II	Comuna 4	0-5 m	628	36		592	0	592	0	0	592	0
Caño las flores	Comuna 4	0-5 m			36	36	0	36	0	0	36	0
TOTAL			6.420	36	36	6.420		6.420	0	0	6.420	0

CAÑO SECTOR EL REFUGIO

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector El Refugio	M2	4	920	920

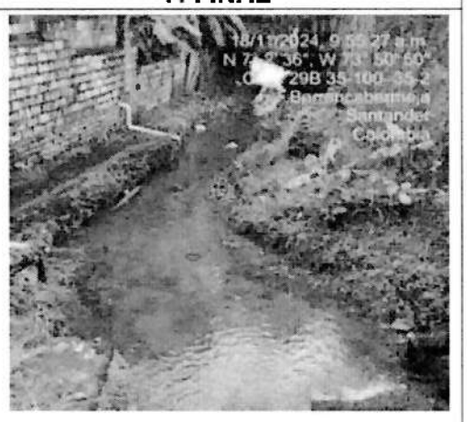

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO PARQUE ECOLÓGICO CINCUENTENARIO

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Parque Ecológico Cincuentenario	M2	4	624	624





P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO LAS FLORES


ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño las Flores	M2	4	3472	3472

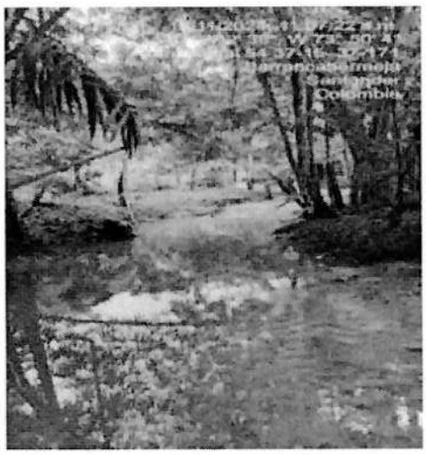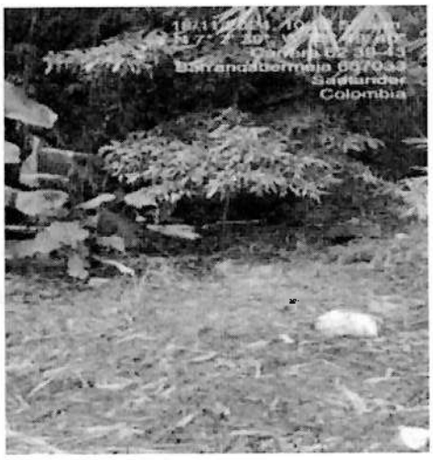


P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR YARIMA 1

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Caño sector Yarima 1	M2	4	776	776

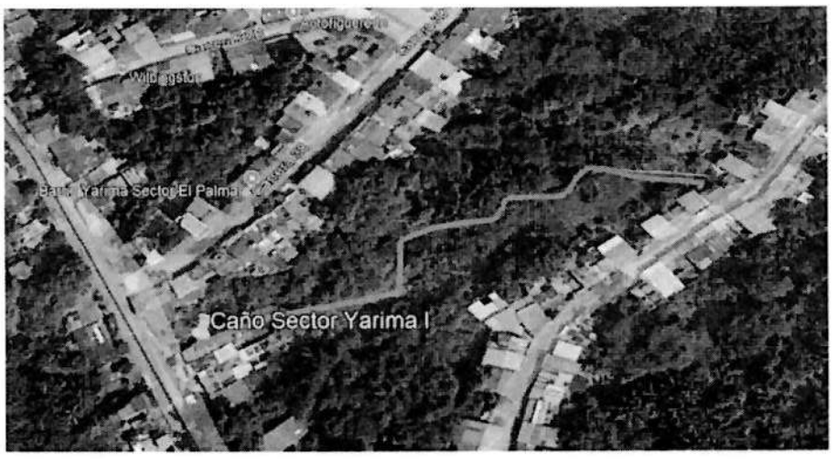

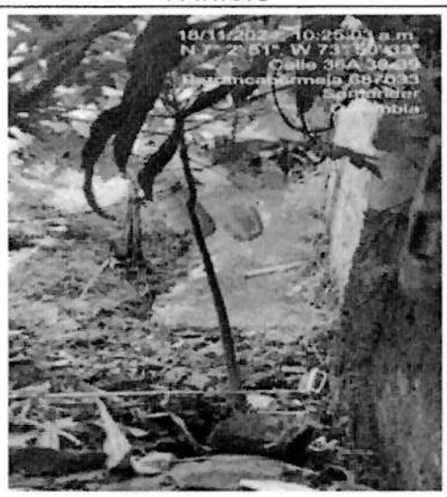P. INICIO	P. FINAL
	

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño sector Yarima 2	M2	4	628	592	Se reubican los 36 m² de rocería en el caño las Flores



P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES A REUBICAR

En la comuna 4 no se pudo intervenir completamente el caño sector Yarima II debido a las características del terreno, por lo tanto, los 36 m² de rocería sobrantes se trasladaron al caño las Flores ubicado en la misma comuna.

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ANCHO	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Caño las Flores	Comuna 4	0-5 m	Men a 1m	36


COMUNA 5

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Camelias sector Versalles	Comuna 5	0-5 m	768	221		547	0	547	0	0	547	0
Caño Camelias sector Provivienda	Comuna 5	0-5 m	928	709		219	0	219	0	0	219	0
Caño Camelias sector Porvenir	Comuna 5	0-5 m	592	468		124	0	124	0	0	124	0
Caño Camelias sector Santander	Comuna 5	0-5 m	1.064	880		184	0	184	0	0	184	0
Caño Camelias sector 1° de Mayo	Comuna 5	0-5 m	2.072	1.278		794	0	794	0	0	794	0
Caño Camelias sector Las Américas	Comuna 5	0-5 m	1.444	585		859	0	859	0	0	859	0
Caño sector Alcazar	Comuna 5	0-5 m	724	36		688	0	688	0	0	688	0
Caño sector La Esperanza Calle 57c	Comuna 5	0-5 m	684			684	0	684	0	0	684	0
Caño Ramaral sector San Pedro Claver	Comuna 5	0-5 m	2.028	744		1.284	0	1.284	0	0	1.284	0
Caño Sector Simon Bolivar	Comuna 5	0-5 m	1.280			1.280	0	0	1.280	0	1.280	0
Caño 1 sector Miraflores	Comuna 5	0-5 m	804			804	0	0	804	0	804	0
Caño 2 sector Miraflores	Comuna 5	0-5 m	840			840	0	0	840	0	840	0
Caño sector Santana	Comuna 5	0-5 m	1.644			1.644	0	0	1.644	0	1.644	0
Cancha de fútbol bendición de Dios etapa 1	Comuna 5	0-5 m			4.921	4.921	0	4.921	0	0	4.921	0
TOTAL			14.872	4.921	4.921	14.872	0	14.872	4.568	0	14.872	0

CAÑO CAMELIAS SECTOR VERSALLES

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector Versalles	M2	5	768	547	Se reubican 221 m² de rocería en la cancha de fútbol bendición de Dios etapa I

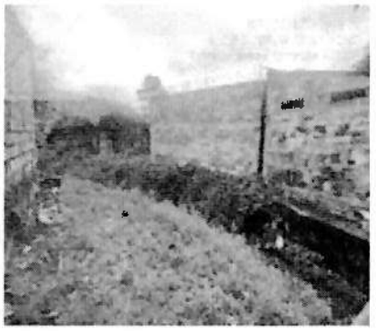

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR PROVIVIENDA

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector Provivienda	M2	5	928	219	Se reubican 709 m² de rocería en la cancha de fútbol bendición de Dios etapa I



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR PORVENIR

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector Porvenir	M2	5	592	124	Se reubican 468 m² de rocería en la cancha de futbol bendición de Dios etapa I



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR SANTANDER

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector Santander	M2	5	1064	184	Se reubican 880 m² de rocería en la cancha de fútbol bendición de Dios etapa I



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR 1° DE MAYO

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector 1° de mayo	M2	5	2072	794	Se reubican 1278 m² de rocería en la cancha de futbol bendición de Dios etapa I



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO CAMELIAS SECTOR LAS AMÉRICAS

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño Camelias sector las Américas	M2	5	1444	859	Se reubican 585 m² de rocería en la cancha de futbol bendición de Dios etapa I



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO SECTOR ALCÁZAR

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	CANTIDAD POR REUBICAR M2
Caño sector Alcázar	M2	5	724	688	Se reubican 36 m² de rocería en la cancha bendición de Dios etapa I



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO SECTOR LA ESPERANZA CALLE 57C

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector la Esperanza calle 57c	M2	5	684	684



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO RAMARAL SECTOR SAN PEDRO CLAVER

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**	**CANTIDAD POR REUBICAR M2**
Caño Ramaral Sector San Pedro Claver	M2	5	2028	1284	Se reubican 744 m^2 de rocería en la cancha de futbol bendición de Dios etapa I



INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO SECTOR SIMÓN BOLÍVAR

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Sector Simón Bolivar	M2	5	1280	1280



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 1 SECTOR MIRAFLORES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 1 sector Miraflores	M2	5	804	804



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO 2 SECTOR MIRAFLORES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño 2 sector Miraflores	M2	5	840	840




P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR SANTANA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Santana	M2	5	1644	1644

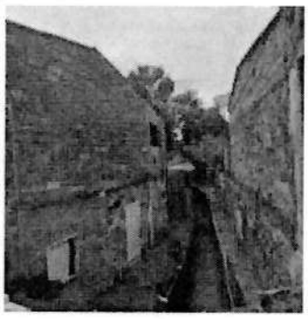

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CANTIDADES A REUBICAR

En la comuna 5 no se pudieron intervenir completamente los siguientes caños, por lo tanto, quedó un faltante total de 4921 m2 de rocería, los cuales se vieron en la necesidad de reubicarlos en la cancha de fútbol bendición de Dios etapa I para poder cumplir de manera satisfactoria las especificaciones del convenio

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ANCHO	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Caño Camelias sector 1 de mayo	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	1278
Caño Camelias sector porvenir	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	468
Caño Camelias sector las Américas	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	585
Caño Camelias sector Provivienda	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	709
Caño Camelias sector Santander	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	880
Caño Camelias sector Versalles	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	221
Caño sector Alcázar	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	36
Caño sector San pedro	Comuna 5	0-5 m	Men a 1m	744
TOTAL				4.921 m2

NOMBRE	COMUNA	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Bendición de Dios Etapa 1. Sector cancha.	Comuna 5	Men a 1m	4921
TOTAL			4.921M2

Cancha de futbol Bendición de Dios Etapa 1.

Rocería: 4.921 m2



Cancha de futbol Bendición de Dios Etapa 1

ANTES	DESPUÉS
	

COMUNA 6

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño sector Oro Negro 1	Comuna 6	0-5 m	676			676	0	0	676	0	676	0
Caño sector Progreso-Oro Negro	Comuna 6	0-5 m	2.120			2.120	0	0	2.120	0	2.120	0
Caño sector Playita-Manzanares	Comuna 6	0-5 m	2.612			2.612	0	0	2.612	0	2.612	0
Caño bendición de dios etapa I	Comuna 6	0-5 m	2.332			2.332	0	0	2.332	0	2.332	0
Caño sector Brisas del Oriente	Comuna 6	0-5 m	1.676			1.676	0	1.676		0	1.676	0
Caño sencillo 3 bendición de Dios	Comuna 6	0-5 m	864			864	0	0	864	0	864	0
Caño sencillo 1 sector Bendición de Dios	Comuna 6	0-5 m	712			712	0	0	712	0	712	0
Caño sencillo 2 sector Bendición de Dios	Comuna 6	0-5 m	848			848	0	0	848	0	848	0
Caño sector San Pedro	Comuna 6	0-5 m	2.020			2.020	0	2.020	0	0	2.020	0
Caño sector Puerta del Sol	Comuna 6	0-5 m	1.576			1.576	0	1.576	0	0	1.576	0
Caño sector San Martin	Comuna 6	0-5 m	920			920	0	920	0	0	920	0
Caño sector el Boston	Comuna 6	0-5 m	1.864			1.864	0	0	1.864	0	1.864	0
Caño Boston 2	Comuna 6	0-5 m	876			876	0	0	876	0	876	0
Caño sector San Martin Diagonal 55	Comuna 6	0-5 m	1.264			1.264	0	1.264	0	0	1.264	0
Caño sector Danubio	Comuna 6	0-5 m	992	992		0	0	0	0	0	0	0
Caño sector puerta del sol 2	Comuna 6	0-5 m	788			788	0		788	0	788	0
Campesire	Comuna 6	0-5 m	864			864	0	864	0	0	864	0
Caño Puerta del sol 3 (Reposición Danubio)	Comuna 6	0-5 m			992	992	0	992	0	0	992	0
TOTAL			23.004	992	992	23.004	0	9.312	13.692	0	23.004	0

CAÑO SECTOR ORO NEGRO 1

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Oro Negro 1	M2	6	676	676



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR PROGRESO-ORO NEGRO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Progreso-Oro Negro	M2	6	2120	2120



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR PLAYITA-MANZANARES

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector Playita-Manzanares	M2	6	2612	2612



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO BENDICIÓN DE DIOS ETAPA I

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño bendición de dios etapa I	M2	6	2332	2332





P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR BRISAS DEL ORIENTE

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector Brisas del Oriente	M2	6	1676	1676

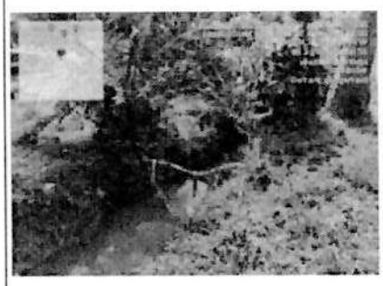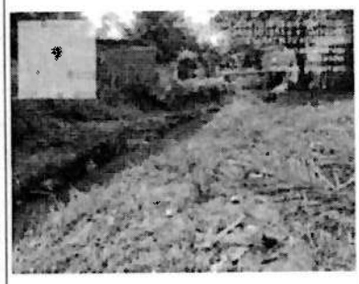


INICIO	MEDIO	FINAL
		

CAÑO SENCILLO 3 BENDICIÓN DE DIOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sencillo 3 bendición de Dios	M2	6	864	864



bie

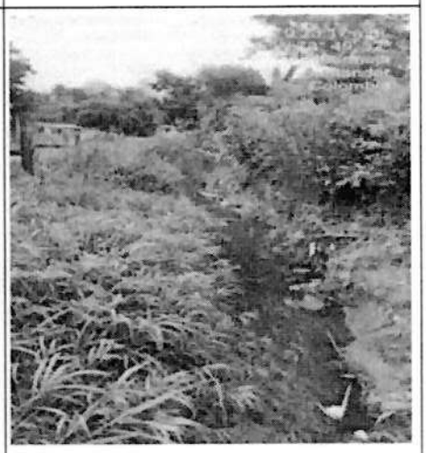	P. FINAL
	

		NA	CANTIDA PROGRAMA	ANTIDAD EJECUTA



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

Libert

CAÑO SENCILLO 2 SECTOR BENDICIÓN DE DIOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sencillo 2 sector Bendición de Dios	M2	6	848	848





ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SAN PEDRO

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño San Pedro	M2	6	2020	2020

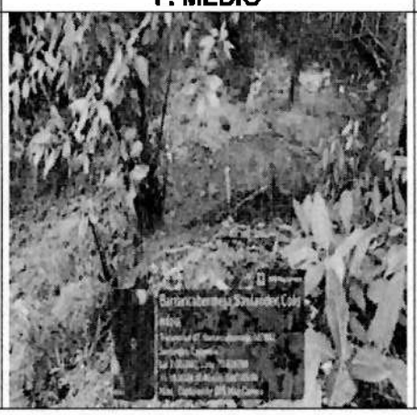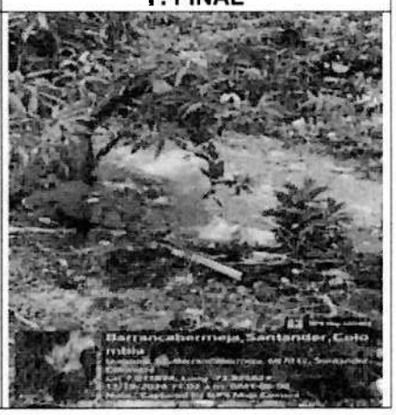


P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO PUERTA DEL SOL

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Puerta del Sol	M2	6	1576	1576

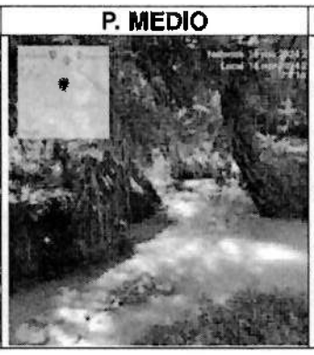


P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR SAN MARTIN


ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector San Martin	M2	6	920	920

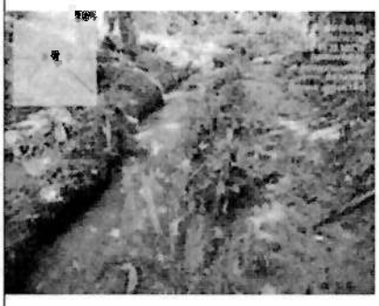

P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR EL BOSTON

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sector El Boston	Ml	6	1864	1864

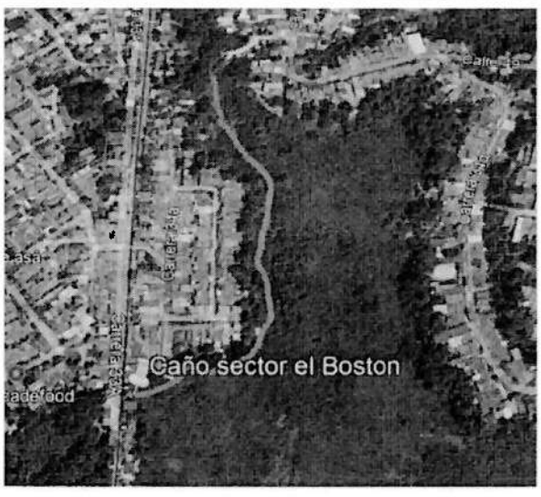

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO BOSTON 2

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Boston 2	M2	6	876	876



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO SECTOR SAN MARTIN DIAG. 55

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector San Martin Diag. 55	M2	6	1264	1264



P. INICIO	P. MEDIO	P. FINAL
		

CAÑO SECTOR DANUBIO

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	OBSERVACIONES
Caño sector Danubio	M2	6	992	992	Se reubican los 992 m² de rocería en el caño Puerta del Sol 3



CAÑO SECTOR CAMPESTRE


ROCERIA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector Campestre	M2	6	864	864



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO PUERTA DEL SOL 2

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño puerta del sol 2	M2	6	788	788

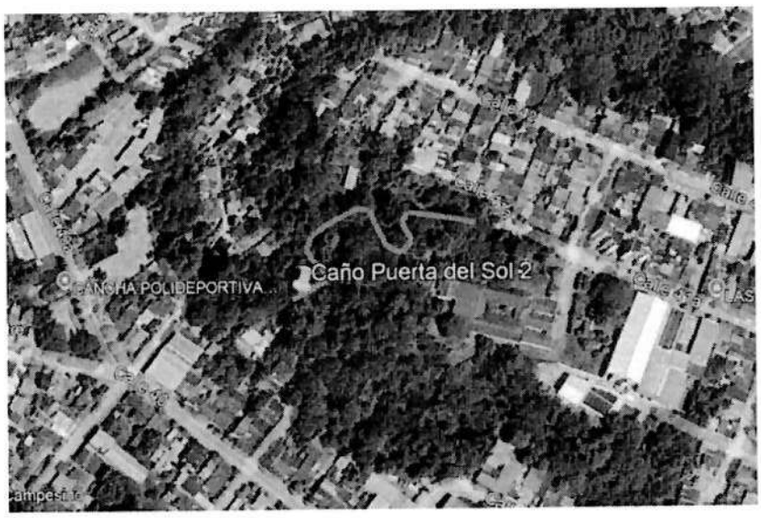

CANTIDADES REUBICADAS

En la comuna 6 no se pudo intervenir el caño Danubio, por lo tanto, quedó un faltante total de 992 m2 de rocería, los cuales se vieron en la necesidad de reubicarlos totalmente para poder cumplir de manera satisfactoria las especificaciones del convenio, este se reubicó en el caño puerta del sol 3.

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ANCHO	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Caño puerta del sol 3	Comuna 6	0-5 m	Men a 1m	992

CAÑO SECTOR PUERTA DEL SOL 3.

Rocería: 992 m2



COMUNA 7

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño sectores Brisas del Poblado- Villa Aura	Comuna 7	0-5 m	1.360			1.360	0	0	1.360	0	1.360	0
Caño sector 9 de agosto	Comuna 7	0-5 m	1.764			1.764	0	1.764	0	0	1.764	0
Caño sector Villarelis II - La Independencia	Comuna 7	0-5 m	5.276			5.276	0	5.276	0	0	5.276	0
Prados de campestre	Comuna 7	0-5 m	832			832	0	0	832	0	832	0
Caño Villarelis III	Comuna 7	0-5 m	5.124	2.844		2.280	2.280		0	0	2.280	0
Caño Nuevo Horizonte	Comuna 7	0-5 m	1.944			1.944	0	1.944	0	0	1.944	0
Caño El Campin	Comuna 7	0-5 m	2.040			2.040	0	2.040	0	0	2.040	0
Urb. Terrazas del puerto	Comuna 7	0-5 m	4.620			4.620	0	4.620	0	0	4.620	0
Urb. Ciudad del SOL	Comuna 7	0-5 m	2.924			2.924	0	2.924	0	0	2.924	0
Caño Asn. 03 DE OCTUBRE	Comuna 7	0-5 m	652	76		576	0	0	576	0	576	0
Caño brisas Villarelis	Comuna 7	0-5 m	3.012			3.012	0	0	3.012	0	3.012	0
Caño cielos abiertos	Comuna 7	0-5 m	1.804			1.804	0	0	1.804	0	1.804	0
Caño calle 63 Esperanza (Reposición caño Asn 03 de octubre)	Comuna 5	0-5 m			76	76	0	0	76	0	76	0
caño San Francisco-Cardales (Reposición)	Comuna 1	0-5 m			2.008	2.008	0	0	2.008	0	2008	0
Caño sector Danubio los abuelos (Reposición)	Comuna 6	0-5 m			476	476	0	0	476	0	476	0
Caño puerto 65 (Reposición)	Comuna 5	0-5 m			360	360	0	0	360	0	360	0
TOTAL			31.152	2.920	2.920	31.152	2.280	18.568	10.304	0	31.152	0

CAÑO SECTORES BRISAS DEL POBLADO- VILLA AURA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño sectores Brisas del Poblado- Villa Aura	M2	7	1360	1360




ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR 9 DE AGOSTO

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector 9 de agosto	M2	7	1764	1764

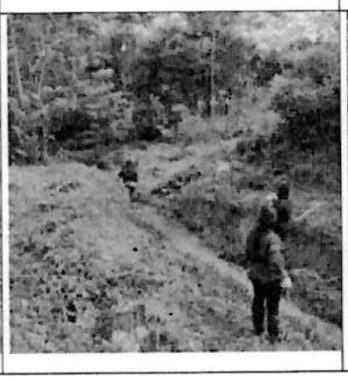

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO SECTOR VILLARELIS II – LA INDEPENDENCIA

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño sector Villarelis II – la Independencia	M2	7	5276	5276



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

PRADOS DEL CAMPESTRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Prados del Campestre	M2	7	832	832



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO VILLARELIS III

ROCERÍA MENOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	OBSERVACIONES
Caño Villarelis III	M2	7	5.124	2.280	Se reubican 2.844 m^2 de rocería en el caño San Francisco – Cardales (2.008 m^2), caño sector Danubio los abuelos (476 m^2) y caño Puerto 65 (360 m^2)



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO NUEVO HORIZONTE

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Nuevo Horizonte	M2	7	1944	1944



P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO EL CAMPIN

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Caño el Campin	M2	**7**	**2040**	2040



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO URB, TERRAZAS DEL PUERTO


ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Urb, Terrazas del Puerto	M2	7	4620	4620



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO URB, CIUDAD DEL SOL

ROCERÍA MENOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	COMUNA	CANTIDAD **PROGRAMADA M2**	CANTIDAD **EJECUTADA M2**
Urb, Ciudad del Sol	M2	7	2924	2924

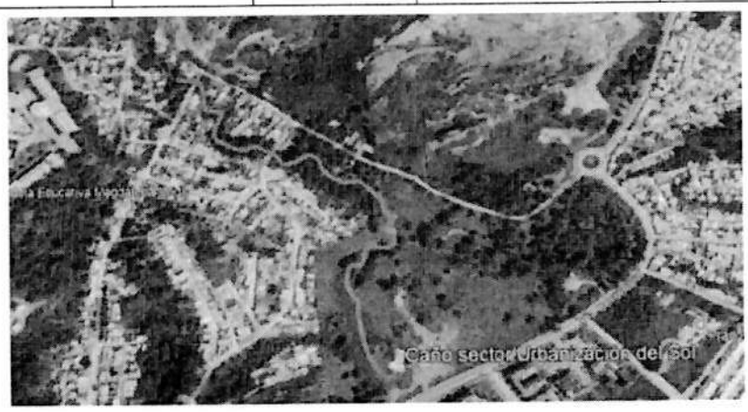

CAÑO ASN. 03 DE OCTUBRE

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD **PROGRAMADA**	CANTIDAD **EJECUTADA**	OBSERVACIONES
Caño Asn. 03 DE OCTUBRE	M2	7	652	576	Se reubican los 76 m2 de rocería faltantes en el caño calle 63 Esperanza



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO BRISAS VILLARELYS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño brisas villarelys	M2	7	3012	3012



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO CIELOS ABIERTOS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Cielos Abiertos	M2	7	1604	1604



P. INICIO	P. FINAL
	


CANTIDADES REUBICADAS


En la comuna 7 no se pudieron ejecutar 2.920 m^2 de rocería correspondientes al caño Villarelis III (2.844 m^2) y caño Asn. 03 de octubre (76 m^2), estas cantidades se reubicaron en el caño San Francisco – Cardales, caño Danubio los abuelos, caño Puerto 65 y caño calle 63 Esperanza esto con el fin de ejecutar la actividad en su totalidad.

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD EJECUTADA M2
caño San Francisco-Cardales (Reposición)	M2	1	2008
Caño sector Danubio los abuelos (Reposición)	M2	6	476
Caño puerto 65 (Reposición)	M2	5	360
caño calle 63 Esperanza (Reposición)	M2	5	76
TOTAL			2.920

CAÑO SAN FRANCISCO-CARDALES		
		

CAÑO SECTOR DANUBIO LOS ABUELOS (REPOSICIÓN)		
		

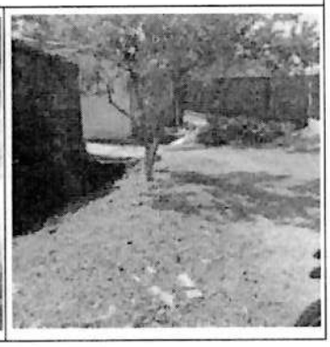CAÑO PUERTO 65 (REPOSICIÓN)		
		

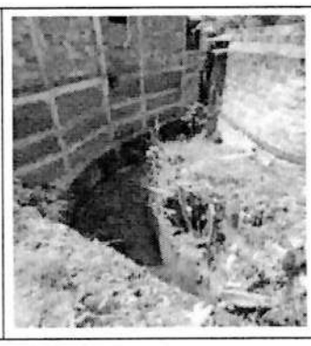CAÑO CALLE 63 ESPERANZA (REPOSICIÓN)		
		

5.1.1.1.4. ROCERÍA MAYOR A 1 METRO DE ALTO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO).

Durante la ejecución de las actividades planificadas, se incluyen trabajos de rocería mayores a 1 metro de altura, en los costados laterales de cada uno de los trazados de los caños, con un total de 40.329 metros cuadrados (m^2) conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del convenio 1732-24.


COMUNA 1

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Buenos aires	Comuna 1	5-10m	1956			1956	0	1956	0	0	1956	0
Caño puente el arenal - la rampa	Comuna 1	5-10m	3600	3600		0	0	0	0	0	0	0
Pozo 7 - santa barbara - isla del zapato	Comuna 1	5-10m	5708			5708	0	0	5708	0	5708	0
Dorado Sector Las Iguanas (Reposición del caño Arenal la Rampa	Comuna 1	5-10m			1200	1200	0	1200	0	0	1200	0
Caño Buenos Aires II Cra 19 (Reposición del caño Arenal la Rampa)	Comuna 1	5-10m			800	800	0	800	0	0	800	0
Caño Box Culver entrada isla del Zapato (Reposición del caño Arenal la Rampa)	Comuna 1	5-10m			1600	1600	0	0	1600	0	1600	0
TOTAL			11.264	3.600	3.600	11.264	0	3.956	7.308	0	11.264	0

CAÑO BUENOS AIRES

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño Buenos Aires	M2	1	1956	1956

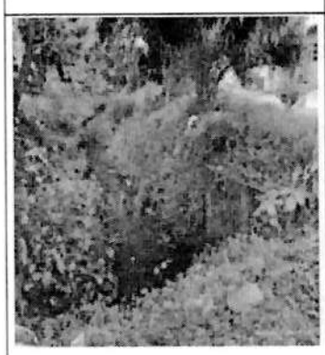

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO PUENTE EL ARENAL – LA RAMPA

ROCERÍA MAYOR A UN METRO					
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2	OBSERVACIONES
Caño Puente el Arenal – La Rampa	M2	1	3600	0	Se reubican los 3600 m² de rocería en el caño Dorado sector las Iguanas (1200 m²), caño Buenos Aires II cra 19 (800 m²) y caño box culvert entrada Isla del Zapato (1600 m²)



POZO 7 -SANTA BARBARA- ISLA DEL ZAPATO

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Pozo 7 -santa barbara- isla del zapato	M2	1	5708	5708




P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES REUBICADAS

En la comuna 1 no se pudo intervenir el caño Puente Arenal – la Rampa, por lo tanto, quedó un faltante total de 3600 m2 de rocería, los cuales se vieron en la necesidad de reubicarlos totalmente para poder cumplir de manera satisfactoria las especificaciones del convenio en el caño Dorado sector las Iguanas (1200 m^2), caño Buenos Aires II cra 19 (800 m^2) y caño box culvert entrada Isla del Zapato (1600 m^2)

NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	ANCHO	ALTURA DE ROCERIA	ROCERIA (M2)
Caño Dorado sector las Iguanas	Comuna 1	0-5 m	May a 1m	1200
Caño Buenos Aires II Cra 19	Comuna 1	0-5 m	May a 1m	800
caño box culvert entrada Isla del Zapato	Comuna 1	0-5 m	May a 1m	1600
TOTAL				**3.600**

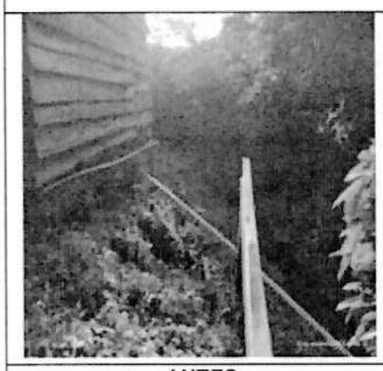DORADO SECTOR LAS IGUANAS – ROCERÍA 1200 M2		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

CAÑO BUENOS AIRES II CRA 19 – ROCERÍA 800 M2		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS


CAÑO ISLA DEL ZAPATO BOX COLBERT (REPOSICIÓN)		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS


COMUNA 2

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por Ejecutar
Caño Las Camelias sector Floresta Baja- UIS	Comuna 2	5-10 m	1244			1244	0	0	1244	0	1244	0
Caño Camelias sector Villaluz-Policía	Comuna 2	5-10 m	3844			3844	0	0	3844	0	3844	0
TOTAL			5.088			5.088	0	0	0	0	5.088	0

CAÑO LAS CAMELIAS SECTOR FLORESTA BAJA- UIS

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Las Camelias sector Floresta Baja- UIS	M2	2	1244	1244

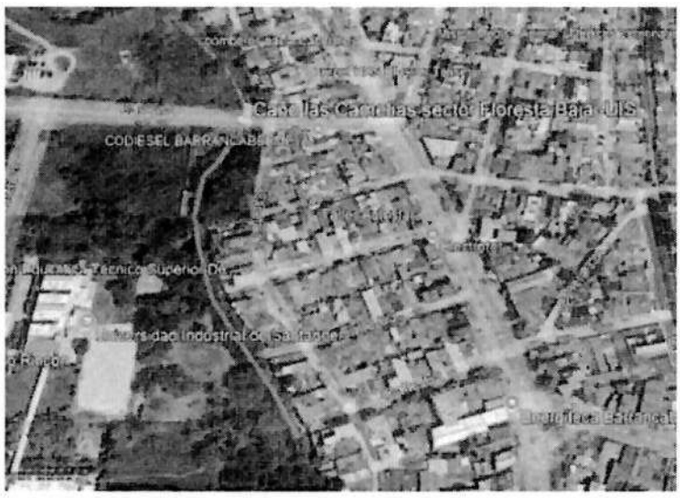


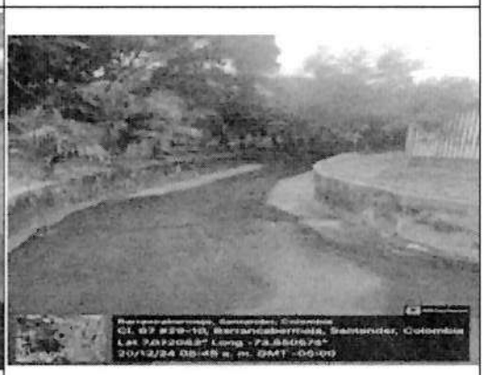P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO CAMELIAS SECTOR VILLALUZ - POLICIA

CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
Caño Camelias sector Villaluz-Policía	M2	2	3844	3844

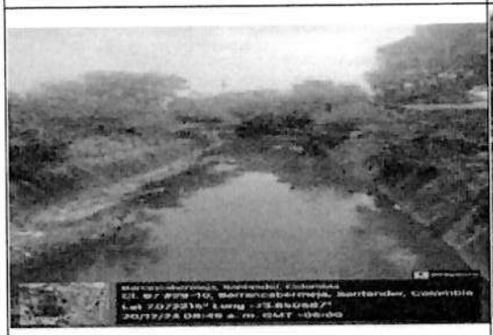

P. INICIO	P. FINAL
	

COMUNA 3

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño la Paz sector 12 de agosto	Comuna 3	5-10m	492			492	0	492	0	0	492	0
Caño la Paz sector ville de Dios	Comuna 3	5-10m	592			592	0	592	0	0	592	0
Caño la Paz Sector Brisas de la Paz	Comuna 3	5-10m	896			896	0	896	0	0	896	0
Caño Internacional sector PTAR San silvestre	Comuna 3	5-10 m	4640			4640	0		4.640	0	4.640	0
TOTAL			6.620			6.620	0	1.980	4.640	0	6.620	0

CAÑO LA PAZ SECTOR 12 DE AGOSTO

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño la Paz sector 12 de agosto	M2	3	492	492



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA PAZ SECTOR VILLA DE DIOS

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Caño la Paz sector villa de Dios	M2	**3**	592	592



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA PAZ SECTOR BRISAS DE LA PAZ

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Caño la Paz sector brisas de la Paz	M2	3	896	896



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO INTERNACIONAL SECTOR PTAR SAN SILVESTRE

NOMBRE CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO M2	CANTIDAD EJECUTADO M2
Caño Internacional sector PTAR San silvestre	M2	3	4640	4640



P. INICIO	P. FINAL
	


COMUNA 5

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Caño Camelias sector las Camelias	Comuna 5	5-10m	848	304		544	0	0	544	0	544	0
Cristo Petrolero (Reposición del caño Camelias sector las Camelias)	Comuna 3	5-10m	592		304	304	0	0	304	0	592	0
TOTAL			6.620	304	304	848	0	0	848	0	848	0

CAÑO CAMELIAS SECTOR LAS CAMELIAS

NOMBRE CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADO M2	CANTIDAD EJECUTADO M2	OBSERVACIONES
Caño Camelias sector Las Camelias	M2	5	848	544	Se reponen los 304 m^2 de la actividad de rocería en el Cristo Petrolero

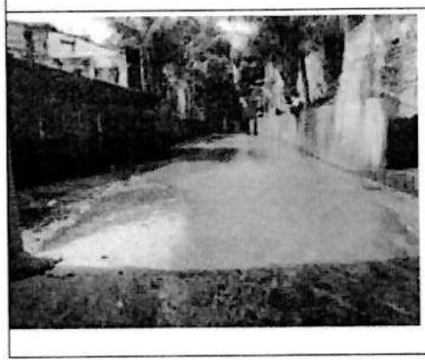

P. INICIO	P. FINAL
	

CANTIDADES A REUBICAR

En la comuna 5 no se pudo intervenir completamente el caño sector las Camelias, por lo tanto, quedó un faltante total de 304 m² de rocería, los cuales se vieron en la necesidad de reubicarlos totalmente para poder cumplir de manera satisfactoria las especificaciones del convenio en el Cristo Petrolero

NOMBRE CAÑO	COMUNA	UND	CANTIDAD EJECUTADA M2
Rocería Cristo Petrolero (Reposición)	1	M2	304

ROCERÍA CRISTO PETROLERO (REPOSICIÓN)		
		


COMUNA 6

Nombre Caño	Comuna	Ancho (m)	Rocería (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 actualizado	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total, Ejecutado	Por ejecutar
Pozo 7 Bendición de dios	Comuna 6	5-10 m	1.453			1.453	0	1.453	0	0	1.453	0
Pozo 7 sector renacer	Comuna 66	5-10 m	1.604			1.604	0	1.604	0	0	1.604	0
Pozo 7 puente	Comuna 6	5-10 m	1.440			1.440	0	1.440	0	0	1.440	0
TOTAL			4.497	0	0	4.497	0	4.497	0	0	4.497	0

POZO 7 BENDICIÓN DE DIOS

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Pozo 7 bendición de Dios	M2	6	1453	1453

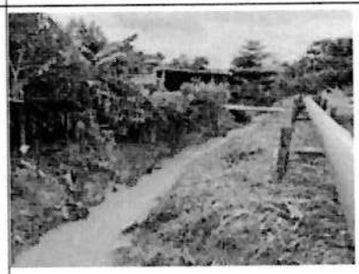


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

POZO 7 SECTOR RENACER

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	UND	COMUNA	CANTIDAD PROGRAMADA M2	CANTIDAD EJECUTADA M2
Pozo 7 sector Renacer	M2	6	1604	1604

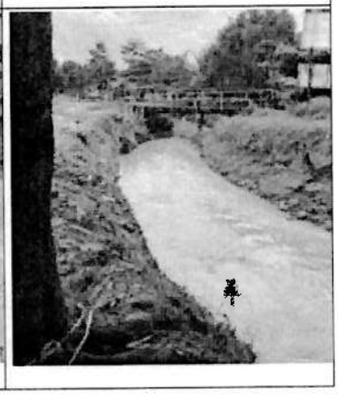


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

POZO 7 SECTOR PUENTE

ROCERÍA MAYOR A UN METRO				
CAÑO	**UND**	**COMUNA**	**CANTIDAD PROGRAMADA M2**	**CANTIDAD EJECUTADA M2**
Pozo 7 sector puente	M2	6	1440	1440

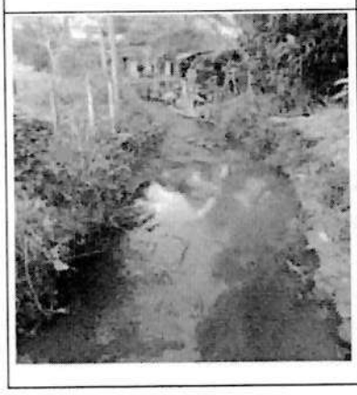

ANTES		DESPUÉS
		

									Ejecutado Acta	Presenta Acta de Liquidación		
Caño ector Los												
bárbara	Comuna 7											
						12012	0				012	

			CANTIDAD RGRAMADO	CANTIDAD M2
Caño sector Los Corales		7	1968	1968




Libertad,

P. INICIO	P. FINAL
	

CAÑO POZO 7 - DIAMANTE - LAS TORRES

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
pozo 7 - diamante - las torres	M2	7	3176	3176

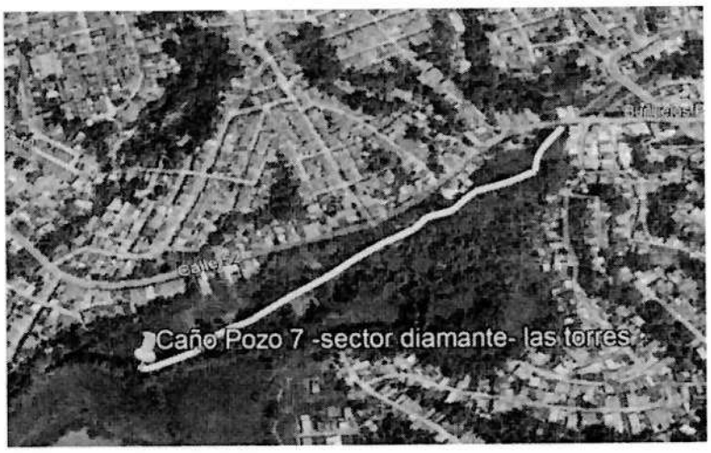

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO POZO 7 -LAS TORRES STA BÁRBARA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	COMUNA	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
pozo 7 -las torres sta bárbara	M2	Comuna 7	6868	6868



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

La distribución de los metros lineales y de rocería que no se pudieron ejecutar en los caños que estaban previstos dentro del convenio 1732-24 se reubicaron en aquellos tramos de caños que se identificaron como puntos críticos del Distrito de Barrancabermeja, esto se hizo en concertación con la comunidad y en actas que se hicieron durante los comités realizados durante la ejecución del convenio, con el fin de mejorar la movilidad de los cuerpos hídricos para así evitar afectaciones a la comunidad.

5.1.1.2. Caños Rurales

El taponamiento de los caños afluentes a las Ciénagas, como consecuencia de la acción humana debido a la falta de cultura ciudadana, no permite mantener la dinámica natural del complejo cenagoso, lo que ha provocado la disminución del caudal por el mismo, situación que se traduce en desbordamiento de los caños debido la obstrucciones sumado a las fuertes lluvias que afectan el sector, por ende el deterioro de sus condiciones naturales, con el fin de recuperar la cuenca hídrica, se plantea adelantar acciones de limpieza y des taponamiento a través de procesos de extracción y retiro de material vegetal, residuos sólidos flotantes y sumergidos de los caños que dificulta su navegabilidad en la zona rural

LIMPIEZA DE CAÑOS MAYORES A 10 METROS DE ANCHO

Consiste en la ejecución de actividades de limpieza manual y retiro de material vegetal, residuos sólidos emergentes y sumergidos que se encuentran en los caños anteriormente seleccionados, para su posterior disposición final en Las márgenes adyacentes del caño.

La metodología plantea, teniendo en cuenta la simbiosis entre problemática ambiental y social en el área, consiste en la erradicación manual con ayuda de herramientas para el retiro de material vegetal y los residuos sólidos, que se ubiquen sobre el cauce de los caños.

- El proceso de limpieza consiste en arrancar el material vegetal y residuos sólidos emergentes y sumergidos que se encuentra dentro de los caños rurales
- El material a remover consiste en acumulación de residuos sólidos tales como: cables, colchones, hierros, cadenas, neumático, neveras, así como la extracción demás material vegetal que interfiera con el cauce natural del caño.
- A continuación, se debe asignar la cuadrilla correspondiente para realizar la limpieza esta debe estar dotada de la herramienta y equipo de protección personal necesarios para realizar la actividad.
- Una vez realizado el retiro se debe instaurar un punto de acopio temporal para empacar en sacos o bolsas cuando no sea posible realizar la disposición final de los residuos en el sitio autorizado.

El Material vegetal extraído de los caños incluidos para el presente ítem se dispondrán en las laderas como disposición final

A la fecha, se ha registrado un **avance físico total del 100% en las actividades de limpieza en caños rurales.** Se realizaron actividades de limpieza en 18 caños rurales. En particular, la limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho presenta un avance general de ejecución del 100%, con 40.449 metros lineales. Así mismo, la limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto muestra la ejecución de 159.303 m² arrojando un avance del 100%

EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-24)	
RURAL			CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO
ITEM	DESCRIPCION	UNDAD			
1.2.1	Limpieza de caños rurales mayores a 10 metros de ancho	ML	40.449	40.449	100%
1.2.2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto	M2	159.303	159.303	100%
				TOTAL	100%

5.1.1.2.1. Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho

Nombre caño / Localización	Comuna	Ancho (m	Metro line	Menores	Mayores	M2 (Actualizadas)	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total Ejecutado	Por Ejecutar
Caño El Cuarenta (peroles) bajos	Fortuna	may 10 m	2541			2541	0	0	2541	0	2541	0
Quebrada las lajas	Fortuna	may 10 m	3419	3419		0	0	0	0	0	0	0
Caño sector Zabalo-san silvestre	Ciénaga San silvestre	may 10 m	2541			2541	0	2541	0	0	2541	0
Caño Palotal	Campo Gala (El Uanito)	may 10 m	1749			1749	0	0	1749	0	1749	0
Caño rosario	Ciénaga San silvestre	may 10 m	4185			4185	0	210	3975	0	4185	0
Caño el deseo- sector ciénaga san silvestre	Ciénaga San silvestre	may 10 m	5325			5325	0	0	5325	0	5325	0
Caño juan esteban- el arenal	Ciénaga juan esteban	may 10 m	4009			4009	0	0	0	4009	4009	0
Caño Cuatro Bocas - Juan Esteban	Ciénaga la cira	may 10 m	3279			3279	0	0	3279	0	3279	0
Caño viejo- juan esteban	Ciénaga juan esteban	may 10 m	708			708	0	0	708	0	708	0
Caño Buenavista (Sector cienaga el castillo)	ciénaga el castillo	may 10 m	857			857	0	0	857	0	857	0
Vía aeropuerto-carrilera	Juan esteban	may 10 m	632			632	0	0	632	0	632	0
Quebrada la roja	El Uanito	may 10 m	3300	28		3272	0	1435	1837	0	3272	0
caño natural el llanito	El llanito	may 10 m	2707			2707	0	0	2707	0	2707	0
Caño el 15 la carrilera	juan esteban	may 10 m	1538			1538	0	0	0	1538	1538	0
Caño conexión la carrilera	juan esteban	may 10 m	276			276	0	0	276	0	276	0
Caño la carrilera sector Buenavista	juan esteban	may 10 m	890			890	0	0	890	0	890	0
Caño guadualito	San Silvestre	may 10 m	2493			2493	0	0	2493	0	2493	0
Caño fortuna vía principal (Reubicación quebrada las lajas)					3419	3419	0	0	3419	0	3419	0
Caño San Rafael de Chucurí (Reubicación quebrada la roja)					28	28	0	0	28	0	28	0
												0
TOTAL			40449	3447	3447	40449	0	4186	30716	5547	40449	0

Limpieza de caños mayores 10 metros de ancho				
NOMBRE CAÑO	COMUNA LOCALIZACIÓN	PROGRAMADO ML	EJECUTADO ML	OBSERVACIONES
Caño El Cuarenta (peroles) bajos	Fortuna	2541	2541	
Quebrada las lajas	Fortuna	3419	0	Este caño se reubico por el caño fortuna vía principal.
Caño sector Zabalo – San Silvestre	Ciénaga San Silvestre	2541	2541	
Caño El Palotal	Campo Gala	1749	1749	
Caño rosario	Ciénaga San silvestre	4185	4185	En el acta 2 se cobraron 210 Ml, por lo tanto, se ejecutó la cantidad total programada
Caño el deseo- sector ciénaga san silvestre	Ciénaga San silvestre	5325	5325	
Caño Juan Esteban – El Arenal	Ciénaga Juan Esteban	4009	4009	
Caño Cuatro Bocas – Juan Esteban	Ciénaga la Cira	3279	3279	
Caño Buenavista (Sector ciénaga el castillo)	Ciénega Castillo	857	857	
Vía aeropuerto-carrilera	Juan esteban	632	632	
Quebrada la roja	El Llanito	3300	3272	En el acta 2 se ejecutó 1435 ml y en el acta 3 se ejecutó 1837 ml y los 28 ml de limpieza faltantes se reubicaron en el caño San Rafael de Chucurí
caño natural el llanito	El Llanito	2707	2707	
Caño conexión la carrilera	juan esteban	276	276	
Caño la carrilera sector Buenavista	Juan esteban	890	890	
Caño guadualito	San Silvestre	2493	2493	
Caño viejo- juan esteban	Ciénega Juan Esteban	708	708	
Caño el 15 la carrilera	Juan esteban	1538	1538	
Caño fortuna vía principal (Reubicación quebrada las lajas)	Fortuna	3419	3419	
Caño San Rafael de Chucurí (Reubicación quebrada la roja)	San Rafael de Chucurí	28	28	
TOTAL		40.449	40.449	

CAÑO EL CUARENTA (PEROLES)


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño el Cuarenta (Peroles)	ML	Fortuna	2541	2541



CAÑO EL CUARENTA (PEROLES) BAJOS		
		

QUEBRADA LAS LAJAS




NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Quebrada las Lajas	ML	Fortuna	3419	Se reubicaron los 2541 ml en el caño Fortuna vía principal

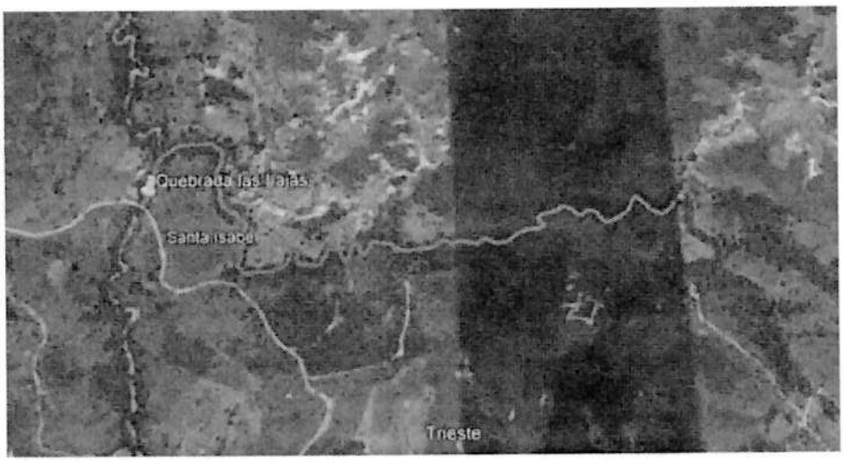

CAÑO SECTOR ZABALO – SAN SILVESTRE


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño sector Zabalo – San Silvestre	ML	Ciénaga San Silvestre	2541	2541

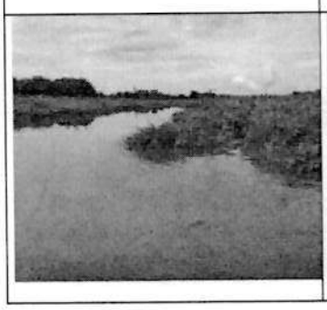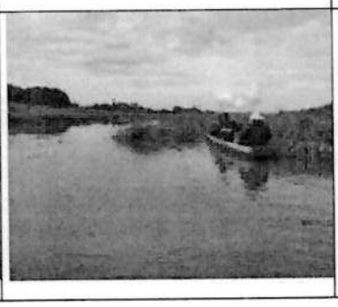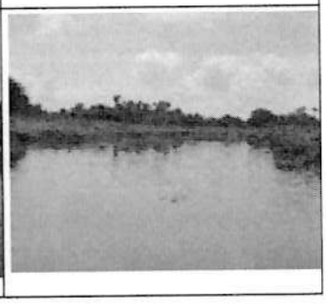

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO PALOTAL


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Palotal	ML	Campo Gala (Llanito)	1749	1749

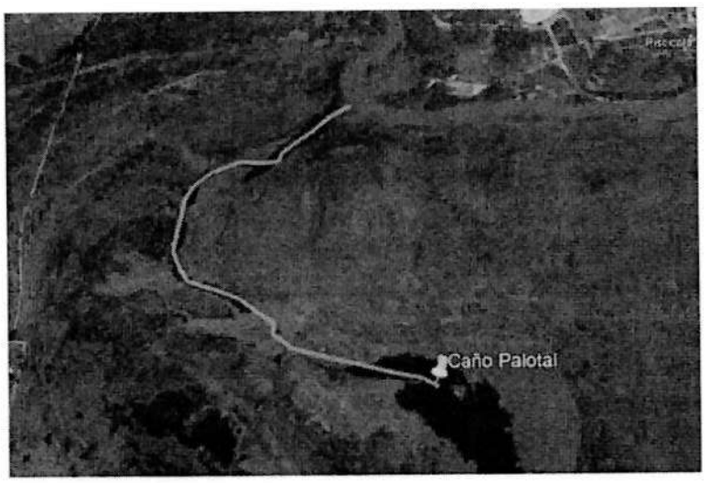

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO ROSARIO


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Rosario	ML	Ciénaga San Silvestre	4185	4185

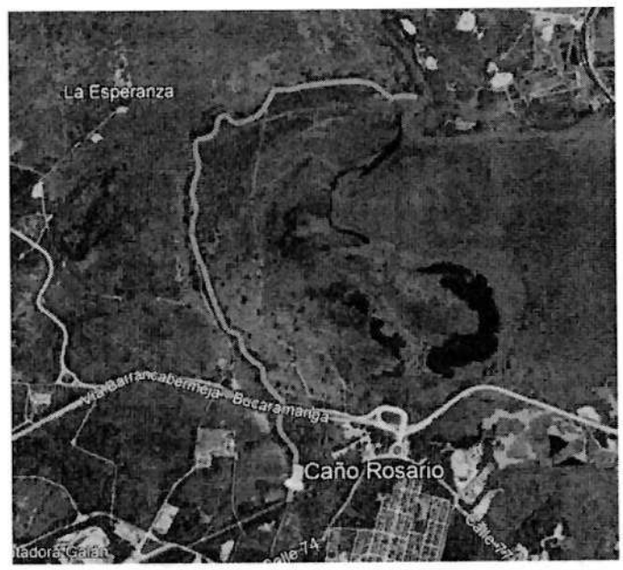


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO EL DESEO – SECTOR CIÉNAGA SAN SILVESTRE

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño el Deseo – sector ciénaga San Silvestre	ML	Ciénaga San Silvestre	5325	5325

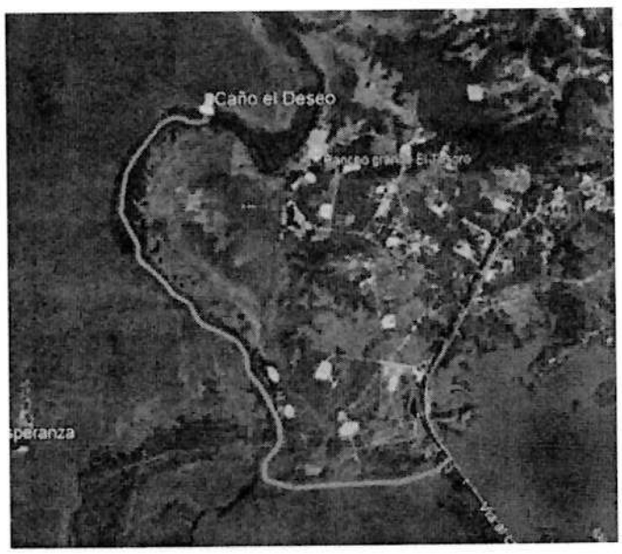

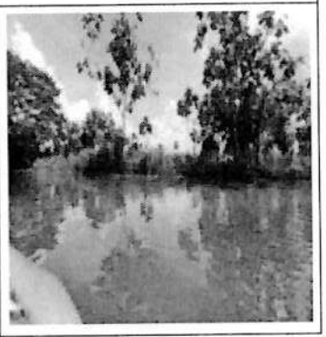ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO JUAN ESTEBAN – EL ARENAL

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Juan Esteban – el Arenal	ML	Ciénaga Juan Esteban	4009	4009



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO CUATRO BOCAS – JUAN ESTEBAN


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Cuatro Bocas – Juan Esteban	ML	Ciénaga la Cira	3279	3279



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO VIEJO – JUAN ESTEBAN


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño viejo – Juan Esteban	ML	Ciénaga Juan Esteban	708	708

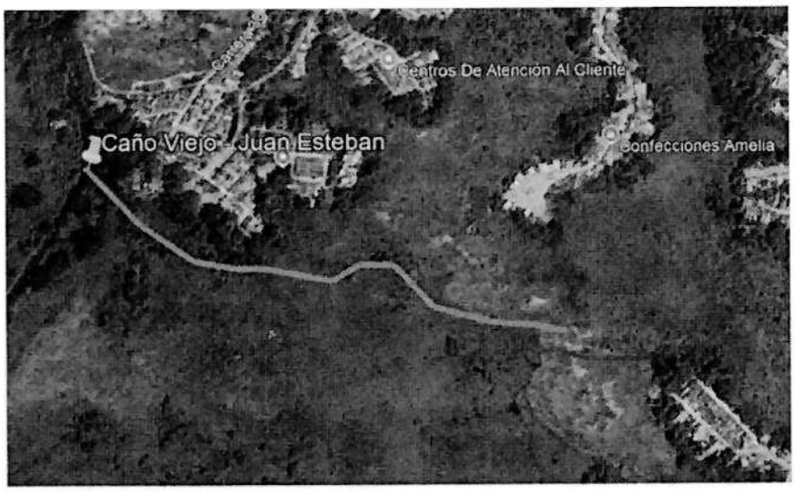


ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO BUENAVISTA – SECTOR CIÉNAGA EL CASTILLO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Buenavista – sector Ciénaga el Castillo	ML	Ciénaga el Castillo	857	857

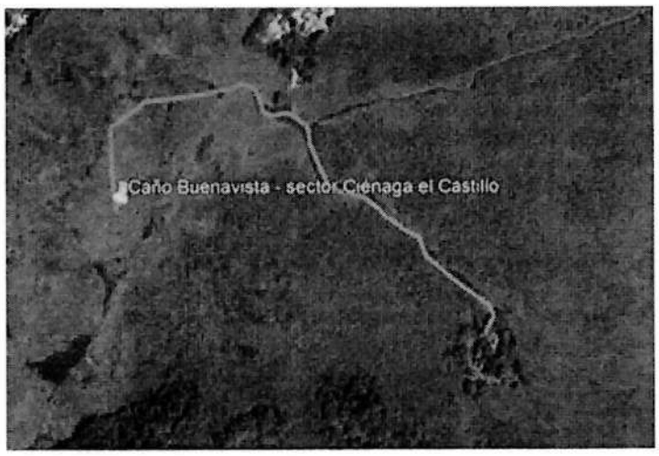

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

VÍA AEROPUERTO – CARRILERA


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Vía aeropuerto - carrilera	ML	Juan Esteban	632	632



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO QUEBRADA LA ROJA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Quebrada la Roja	ML	El Llanito	3300	3272	Se reubican los 28 ml faltantes en el caño San Rafael de Chucurí

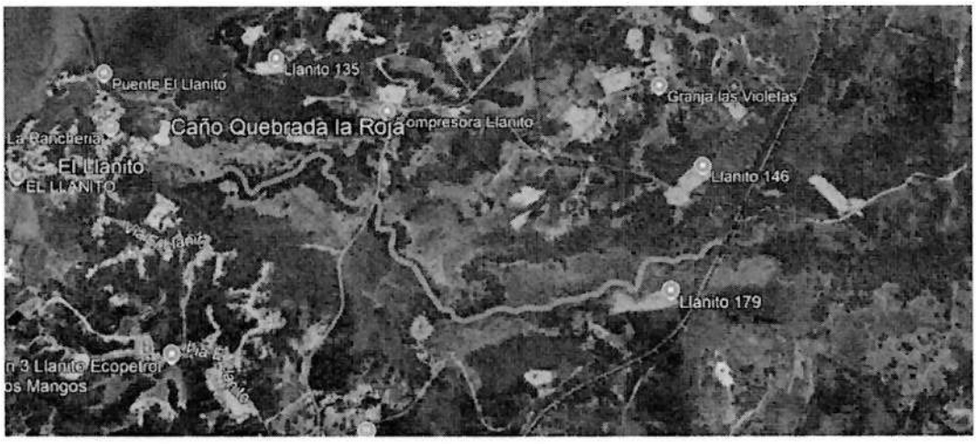

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO NATURAL EL LLANITO


NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño natural el Llanito	ML	El Llanito	2707	2707



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO EL 15 LA CARRILERA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño el 15 la carrilera	ML	Juan Esteban	1538	1538

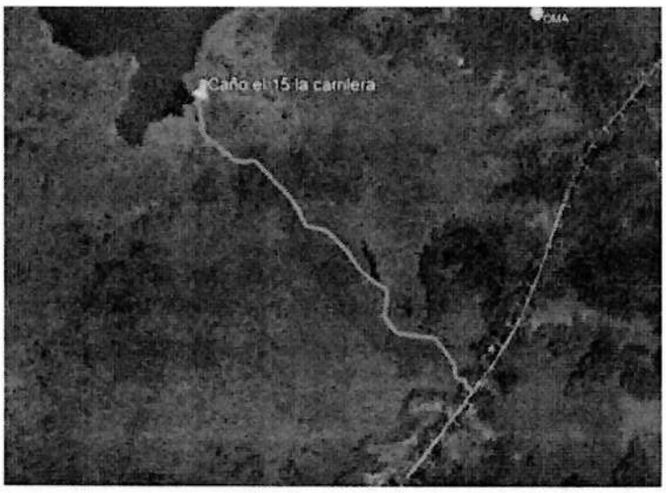

C

			CANT	CANTIDAD EJECUTADO
				2



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO LA CARRILERA SECTOR BUENAVISTA

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño la carrilera sector Buenavista	ML	Juan Esteban	890	890



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CAÑO GUADALITO

NOMBRE CAÑO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD PRGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADO
Caño Guadalito	ML	San Silvestre	2493	2493



ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

CANTIDADES REUBICADAS

En la limpieza de los caños rurales mayores a 10 metros no se pudieron ejecutar 3.447 ml, por lo tanto, se hace necesaria su reubicación en el caño la Fortuna vía principal y caño San Rafael de Chucurí para darle cumplimiento a la actividad.

NOMBRE CAÑO	EJECUTADO ML	OBSERVACIONES
Caño fortuna vía principal (Reubicación)	3419	Este caño se repuso por la Quebrada las lajas
Caño San Rafael de Chucurí	28	En este caño se ejecutaron los metros de limpieza lineal faltante en la quebrada la Roja.
TOTAL	3.447	

CAÑO FORTUNA VÍA PRINCIPAL (REUBICACIÓN)		
		

CAÑO SAN RAFAEL DE CHUCURÍ (REUBICACIÓN)		
		

5.1.1.2.2. LIMPIEZA, DESTRONQUE Y ROCERÍA MAYOR A 1 M DE ALTO

Rocería: El proceso de limpieza consiste en arrancar el material vegetal emergente que se encuentra en las áreas laterales de los caños veredales intervenidos con altura mayor a 1, sobre un ancho aproximado de 2 m en cada costad, Esta actividad de retiro de material vegetal se realizará en forma manual o mecánica, así mismo la vegetación

Destronque y poda de la vegetación: Es natural que sobre el firmal se encuentre cobertura vegetal fuertemente establecida y muchas veces de árboles, lo que se debe adelantar labores iniciales de poda para el desplazamiento tanto del personal como de la maquinaria. Las podas son necesarias para desbloquear los recorridos del agua dentro del ecosistema por la acumulan material vegetal flotante y van generando apilamientos de troncos junto con ramas caídas de la vegetación del complejo hídrico. Esta poda o destronque se puede realizar con la ayuda de motosierras que deben ser afilados a diario para facilitar el trabajo o con machetes en el caso de las podas

En esta actividad se ejecutó un total de 159.303 m^2 de rocería en los caños rurales ubicados en el Distrito de Barrancabermeja, esto con el fin de mejorar la movilidad hídrica de los cuerpos de aguas que se encuentra interconectados.

Nombre caño	Comuna / Localización	Roceria (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 (Actualizadas)	Ejecutado Acta No 1	Ejecutado Acta No 2	Ejecutado Acta No 3	Presentó Acta de Liquidación	Total Ejecutado	Por Ejecutar
Caño El Cuarenta (perfiles) bapa	Fortuna	10164			10164	0	0	10164	0	10164	0
Quebrada las lajas	Fortuna	13676			0	0	0		0	0	0
Caño sector Zábalo-san silvestre	Ciénaga San silvestre	10164			0	0	0		0	0	0
Caño Palotal	Campo Gela (El Llanito)	6986			6986	0	0	6986	0	6996	0
Caño rosario	Ciénaga San silvestre	16740			16740	0	840	15900	0	16740	0
Caño el deseo- sector ciénaga san silvestre	Ciénaga San silvestre	21300			21300	0	0	21300	0	21300	0
Caño juan esteban- el arenal	Ciénaga juan esteban	16036			16036	0	0		16036	16036	0
Caño Cuatro Bocas - Juan Esteban	Ciénaga la cira	13116			13116	0	0	13116	0	13116	0
Caño vapi- juan esteban	Ciénaga juan esteban	2832			2832	0	0	2832	0	2832	0
Caño Buenavista (Sector ciénaga el castillo)	ciénaga el castillo	3428	944		2484	0	0	2484	0	2484	0
Via aeropuerto-carrilera	Juan esteban	2528			2528	0	0	2528	0	2528	0
Quebrada la roja	El Llanito	13200	112		13088	0	5740	7348	0	13088	0
caño natural el llanito	El llanito	10828			10828	0	0	10828	0	10828	0
Caño el 15 la carrilera	Juan esteban	6152			6152	0	0		6152	6152	0
Caño conexión la carrilera	Juan esteban	1104			1104	0	0	1104	0	1104	0
Caño la carrilera sector Buenavista	Juan esteban	3560			3560	0	0	3560	0	3560	0
Caño guadualito	San Silvestre	7479			7479	0	0	7479	0	7479	0
Caño fortuna vía principal (Reubicación quebrada las lajas)	Fortuna			13676	13676	0	0	13676	0	13676	0
Caño San Rafael de Chucurí (Reubicación quebrada la roja)	San Rafael de Chucurí			11220	11220	0	0	11220	0	11220	0
TOTAL		159303	1056	24896	159303	0	6580	130535	22188	159303	0

LIMPIEZA, DESTRONQUE Y ROCERÍA MAYOR A 1 METRO DE ALTO				
Nombre caño	**Comuna Localización**	**PROGRAMADO M2**	**EJECUTADO M2**	**OBSERVACIONES**
Caño El Cuarenta (peroles) bajos	Fortuna	10164	10164	
Quebrada las lajas	Fortuna	13676	0	Este caño se reubico por el caño fortuna vía principal.
Caño El Palotal	Campo Gala	6996	6996	
Caño sector Zabalo-san silvestre	Ciénaga San Silvestre	10164	0	Este caño se reubico por el caño San Rafael de Chucurí
Caño rosario (Faltante)	Ciénaga San silvestre	16740	16740	En el acta 2 se cobraron 840 M2
Caño el deseo- sector clénaga san silvestre	Ciénaga San silvestre	21300	21300	
Caño Juan Esteban – el Arenal	Ciénaga Juan Esteban	16036	16036	
Caño Buenavista (Sector ciénaga el castillo)	Ciénega Castillo	3428	2484	Se reubicaron los 944 m^2 correspondientes a la actividad de rocería en el caño San Rafael de Chucurí
Vía aeropuerto-carrilera	Juan esteban	2528	2528	
Quebrada la roja	El Llanito	13200	13088	En el acta 2 se ejecutaron 5740 m^2 y en el acta 3 se ejecutaron 7348 m^2. Se reubicaron los 112 m^2 correspondiente a la actividad de rocería en el caño San Rafael de Chucurí
caño natural el llanito	El Llanito	10828	10828	
Caño el 15 la carrilera	Juan Esteban	6152	6152	
Caño conexión la carrilera	juan esteban	1104	1104	
Caño la carrilera sector Buenavista	Juan esteban	3560	3560	
Caño guadualito	San Silvestre	7479	7479	
Caño viejo- juan esteban	Ciénega Juan Esteban	2832	2832	
Caño 4 bocas – Juan Esteban	Juan Esteban	13116	13116	
Caño fortuna vía principal (Reubicación quebrada las lajas)	Fortuna	13676	13676	
Caño San Rafael de Chucurí (Reubicación quebrada la roja)	San Rafael de Chucurí	11220	11220	
TOTAL		159.303	159.303	

CAÑO EL CUARENTA (PEROLES) BAJOS





CAÑO EL PALOTAL





CAÑO SECTOR ZABALO-SAN SILVESTRE





CAÑO ROSARIO






CAÑO EL DESEO- SECTOR CIÉNAGA SAN SILVESTRE		
		

CAÑO BUENAVISTA (SECTOR CIÉNAGA EL CASTILLO)		
		

VÍA AEROPUERTO-CARRILERA		
		

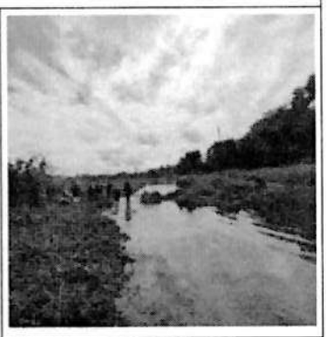QUEBRADA LA ROJA (FALTANTE)		
		

CAÑO NATURAL EL LLANITO





CAÑO CONEXIÓN LA CARRILERA





CAÑO LA CARRILERA SECTOR BUENAVISTA






CAÑO GUADUALITO






CAÑO VIEJO- JUAN ESTEBAN

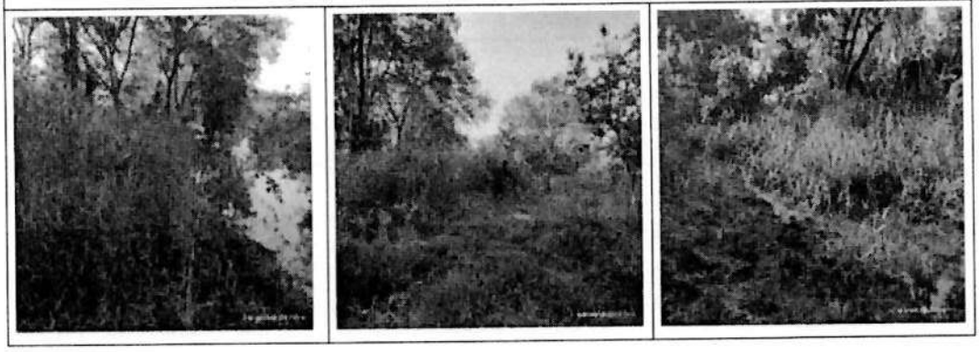

CAÑO 4 BOCAS – JUAN ESTEBAN



CAÑO EL 15 LA CARRILERA

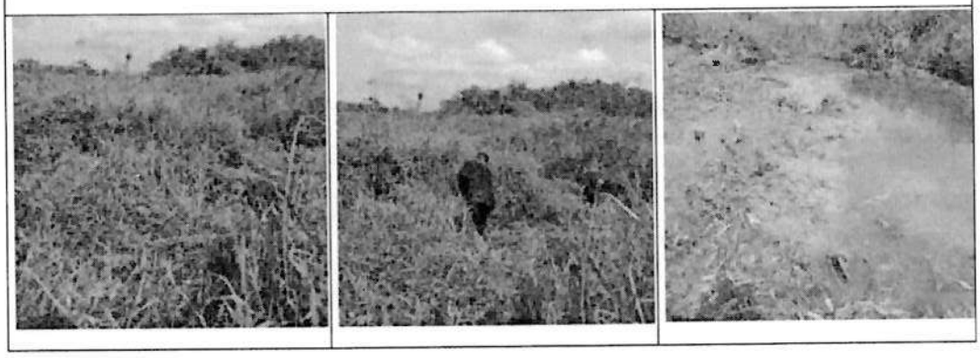


CAÑO JUAN ESTEBAN – EL ARENAL



CANTIDADES REUBICADAS

CAÑO FORTUNA VÍA PRINCIPAL (REUBICACIÓN)

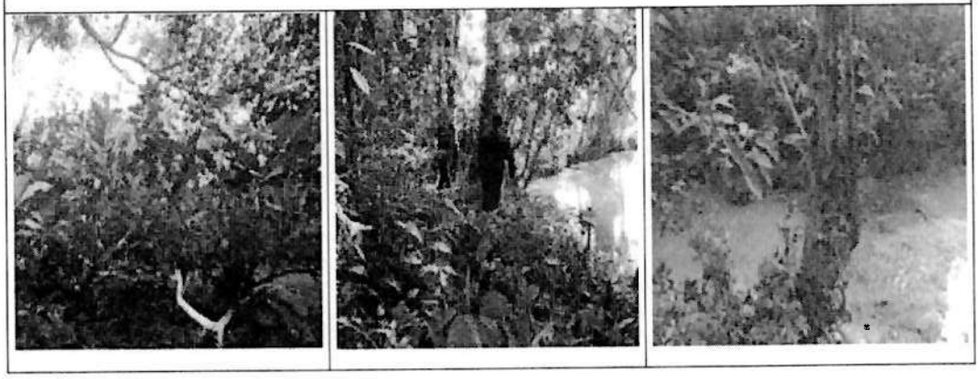

CAÑO SAN RAFAEL DE CHUCURÍ (REUBICACIÓN)



6. MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS


6.1. Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)

Consiste en la ejecución de actividades de limpieza y retiro del material emergente de las ciénagas realizando la limpieza del espejo de agua. El taponamiento de los afluentes a las Ciénagas, como consecuencia de la proliferación de macrófitos debido a la alta concentración de materia orgánica en sus aguas, no permite mantener la dinámica natural del complejo cenagoso, lo que ha provocado la disminución de la navegabilidad por el mismo, así como la reducción significativa de los espejos de agua.



La actividad 2. Correspondiente MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS, se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **Contrato de Obra N° 095 del 2024** suscrito con la **Unión Temporal Limpieza INCO 2024,** en virtud del **Convenio interadministrativo 1732-24** y a la fecha, se ha registrado un **avance físico total del 100%** en el proyecto de limpieza y retiro de material emergente en diversas ciénagas, de los seis cuerpos de agua considerados se ha intervenido la Ciénaga Llanito, San Rafael de chucuri, Opón, Zapatero, los Mangos y La Cira, ejecutando una cantidad total de 240.000m².


EJECUTADO A LA FECHA				FECHA: (30-12-2024)	
ITEM	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HIDRICA EN CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS (Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO
2.1	Ciénaga San Rafael de Chucuri	M2	40.000	40.000	100%
2.2	Ciénaga Opón	M2	40.000	40.000	100%
2.3	Ciénaga Zapatero	M2	40.000	40.000	100%
2.4	Ciénaga la Cira	M2	60.000	60.000	100%
2.5	Ciénaga los Mangos	M2	20.000	20.000	100%
2.6	Ciénaga Llanito	M2	40.000	40.000	100%
				TOTAL	100%



Movilidad hídrica e cuerpos lenticos y loticos	Comuna / Localización	Destronque y limpieza (m2)	Menores	Mayores	Metro m2 (Actualizadas)	Ejecutad. Acta No 1	Ejecutad. Acta No 2	Ejecutad. Acta No 3	Presente Acta de Liquidación	Total Ejecutado	Por Ejecutar
Ciénaga San Rafael de Chucuri	Ciénaga San Rafael de Chucuri	40000			40000	0	4800	35200	0	40000	0
Ciénaga Opón	Ciénaga Opón	40000			40000	0	3010	36990	0	40000	0
Ciénaga Zapatero	Ciénaga Zapatero	40000			40000	0	10000	30000	0	40000	0
Ciénaga la Cira	Ciénaga la Cira	60000			60000	0	4200	37267,3	18532,7	60000	0
Ciénaga los Mangos	Ciénaga los Mangos	20000			20000	0	0	0	20000	20000	0
Ciénaga Llanito	Ciénaga Llanito	40000			40000		30000	10000	0	40000	0
TOTAL		240000			240000		52010	149457,3	38532,7	240000	0

CIÉNAGA SAN RAFAEL DE CHUCURI		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

CIÉNAGA OPÓN		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

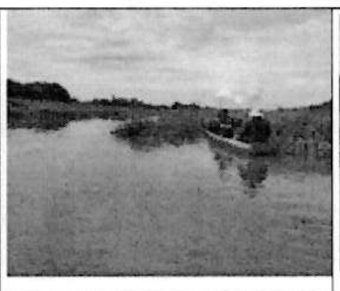CIÉNAGA ZAPATERO		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

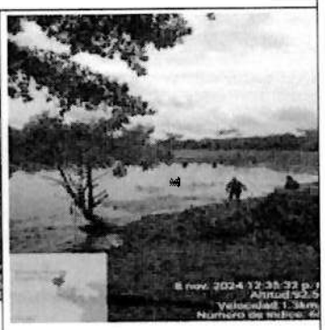CIÉNAGA LA CIRA		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

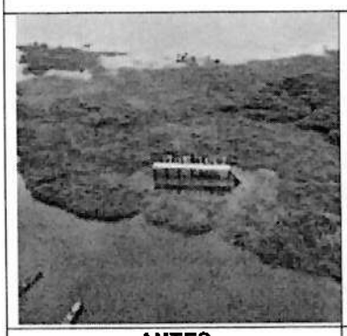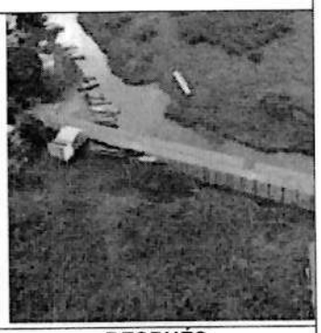CIÉNAGA EL LLANITO		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

CIÉNAGA LOS MANGOS		
		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS

7. VALLAS INFORMATIVAS

VALLAS INFORMATIVAS	UND	CANT		Ubicación
Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)	und	10,00	1	Comuna 1 – Puente Arenal
			2	Comuna 1 – Buenos Aires II
			3	Comuna 6 – Puente Pozo Siete
			4	Comuna 4 - Parque ecológico
			5	Comuna 2 – Villa Luz
			6	Comuna 3 – Santa Isabel
			7	Comuna 3 - 20 de enero
			8	Comuna 7 - Paraíso
			9	Comuna 7 - Pablo Acuña
			10	Comuna 5 - Las Américas
Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)	und	5,00	1	Corregimiento el Llanito
			2	Corregimiento el Llanito
			3	Corregimiento La Fortuna
			4	Corregimiento El Centro
			5	Corregimiento El Centro

7.1. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano




VALLAS INFORMATIVAS	LOCALIZACION	# DE VALLAS A INSTALAR
Elaboración de valla estructural en cerchas de ángulos de 9" 2 x 3/16, incluye lámina galvanizada calibre 26 con dobleces. La estructura esté conformada en dos (2) cerchas de 2.50 mts de alto (tamaño de la valla 2x1 mts)	COMUNA 1	1
	COMUNA 2	1
	COMUNA 3	2
	COMUNA 4	1
	COMUNA 5	2
	COMUNA 6	2
	COMUNA 7	1



Comuna 1 – Puente Arenal



Comuna 1 – Buenos Aires II

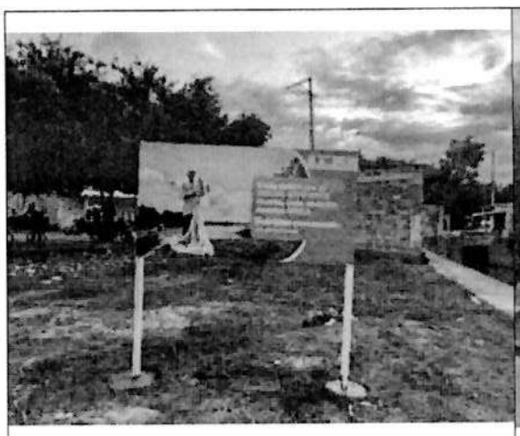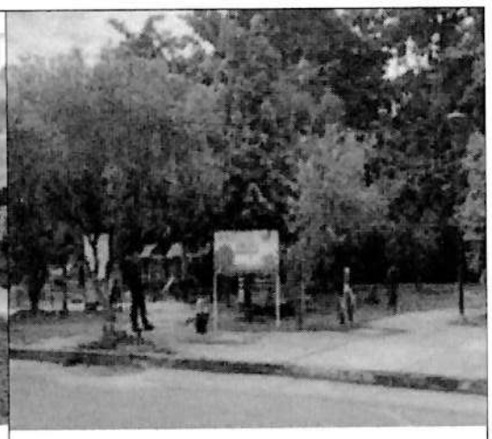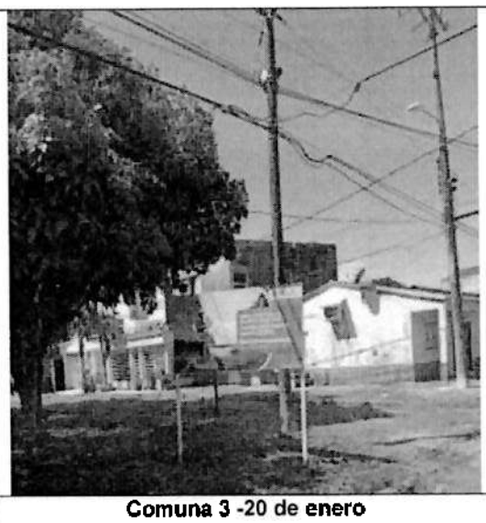	
Comuna 6 – Puente Pozo Siete	Comuna 4 – Parque ecológico
	
Comuna 2 – Villa Luz	Comuna 3 – Santa Isabel
	
Comuna 3 -20 de enero	Comuna 7 – barrio el paraiso

	
Comuna 7 – Barrio Pablo Acuña	Comuna 5 – barrio las Americas

7.2. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural.

VALLAS INFORMATIVAS	LOCALIZACION	# DE VALLAS A INSTALAR
Elaboración de valla estructural en cerchas de ángulos de 9" 2 x 3/16, incluye lámina galvanizada calibre 26 con dobleces. La estructura está conformada en dos (2) cerchas de 2.50 mts de alto (tamaño de la valla 2x1 mts)	Corregimiento la Fortuna	1
	Corregimiento el Llanito	2
	Corregimiento El Centro	2

	
Corregimiento el Llanito	Corregimiento El Llanito



Corregimiento La Fortuna



El Centro



El Centro

Los soportes de la ejecución de las actividades de limpieza y rocería de caños urbanos, caños rurales y de cuerpos cenagosos se encuentran en:

Contrato de obra N° 1732-24 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el distrito de Barrancabermeja y la Piscícola San Silvestre S.A. para la recuperación y conservación ambiental de conexiones hídricas en áreas urbanas y rurales, en el distrito de Barrancabermeja	Informe de obra No 1 Tomo 1 y 2 Informe de Obra No 2 Tomo 1 al 17 Informe área Jurídica Tomo 2 de 2

8. LIMPIEZA MECÁNICA

La limpieza mecánica de sedimentos se viene desarrollando de manera adecuada a través del contrato de obra N° 113-2024 cuyo objeto es "contrato de obra para remoción de sedimentos, mantenimiento y rehabilitación de áreas ecológicas de conservación ambiental en el distrito de Barrancabermeja". Presenta un avance del 99.99 (%) por ciento. Tal como se relaciona a continuación:

DATOS CONTRATO	
CONTRATO No.:	113-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA LABOR PARA LA REMOCION DE SEDIMENTOS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AREAS ECOLOGICAS DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR:	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIENTE PESOS MCTE ($3.175.109.187,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUBCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	1 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	CONSTRUMULL SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALEXANDER NARVAEZ MACMAHON
NIT:	829.002.572-8
SUPERVISOR:	PISCICOLA SAN SILVESTRE SAS
DELEGACION A LA SUPERVISION	EDWIN DAVID TAMARA SANABRIA

REMOCION DE SEDIMENTOS								
			a corte 04/11/2024	**05/11/2024 A 13/12/2024**				
Sectores intervenidos	**Cantidad contractual**	**Unidad**	**Acta parcial 1**	**Acta parcial 2**	**Acta Parcial 3**	**Acta Final**	**Total**	**% de ejecución**
Caño Pozo 7- Sector el Puente	17.160,62	M3	4203,26	407,25	0	0	4.610,51	99.91%
Caño Pozo 7- Sector Bendición de Dios			0	1977,76	0	0	1977,76	
Caño Pozo 7- Sector Renacer			0	6.569,63	0	0	6.569,63	
Caño sector Diamante- Las Torres			0	0	2.286,66	1.701,44	3.988,10	
TOTAL			4203,26	8.954,64	2.286,66	1.701,44	17.146,00	
NOTA	De la cantidad total, quedó un saldo por ejecutar 14,62 m3							


Para la actividad de remoción mecánica se culminó con un avance de 99,91% en la remoción mecánica de sedimentos, lo que representa una cantidad ejecutada de 17.146 m³ de un total planificado de 17.160,62 m³.

8.1. Localización de actividades

Puntualmente el contrato contempla la ejecución de las actividades de remoción mecánica en 4 sectores o caños localizados en la comuna 6 y 7 del distrito, en una longitud aproximadamente de 1.663 metros lineales, tal cual como se relaciona en la siguiente tabla:


No	NOMBRE DEL CAÑO	COMUNA	LONGITUD
1	Caño Pozo 7- sector Renacer	6	401
2	Caño Pozo 7- Sector Bendición de Dios	6	363
3	Caño Pozo 7- Sector el Puente	6	360
4	Caño sector Diamante- Las Torres	7	539

La siguiente imagen muestra la localización geoespacial de los sectores a intervenir según el alcance del proyecto

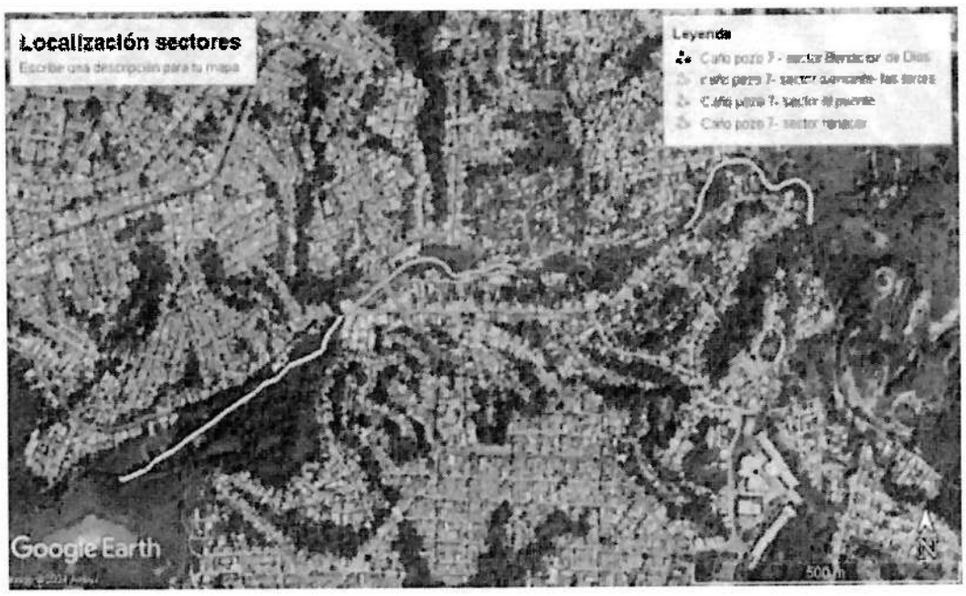


Remoción de sedimentos



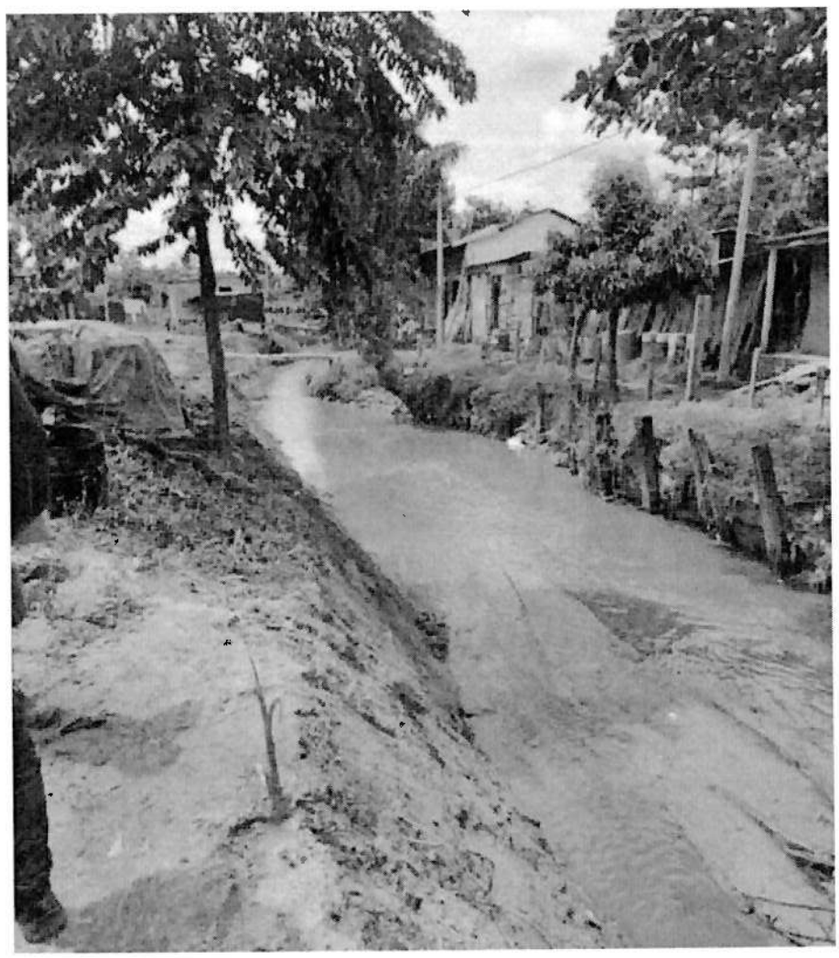

Perfilado del cause

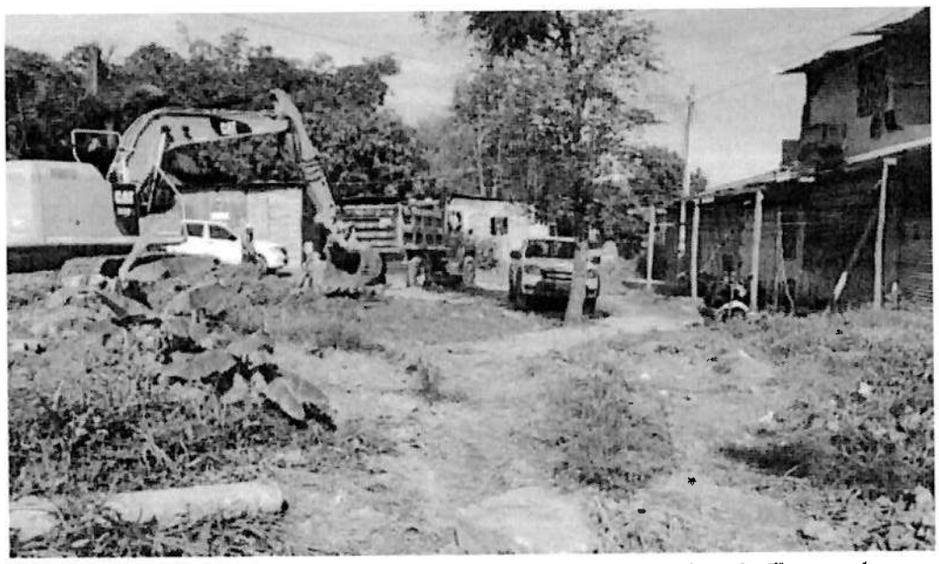

Cargue y retiro de los sedimentos (se evidencia la utilización de Excavadora y Volqueta)



Utilización de Minicargador

EQUIPO USADOS PARA LA REMOCIÓN MECÁNICA.

- Excavadora de oruga hidráulica.
- Minicargador tipo bocat.
- Volqueta 8 m3

Los soportes de la ejecución se encuentran en:

Contrato de obra N° 113-2024 cuyo objeto es "contrato de obra para remoción de sedimentos, mantenimiento y rehabilitación de áreas ecológicas de conservación ambiental en el distrito de Barrancabermeja	Informe 5 tomo 1 de 2 páginas 101 a 143 (Actas de recibido 2, 3 y final) y Informe 6 del 10% tomo 1 de 3, en el capítulo Limpieza mecánica en caños urbanos (Acta final y de liquidación empresa CONSTRUMULL, factura No. FE 433)

9. ADMINISTRATIVOS

El ítem administrativo está conformado por personal, papelería y otros.

9.1. Personal técnico y administrativo (inc.prest. soc.)

Este ítem presento modificación (Otrosí modificatorio N° 2) a las condiciones tal como se relaciona a continuación:

1.4,1	PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc. Prest. Soc.)	UND	Condiciones iniciales			Condiciones actualizadas		
			TIEMP mes	CANT	FM	TIEMP mes	CANT	FM
1.4.1.1	Coordinador	und	4	1,00	1,98	4,300 (129 días)	1	1,74

1.4.1.2	Abogado	und	4	1,00	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.3	Ingeniero Ambiental o afines	und	4	3,00	1,98	4,930 (147 días)	1	1,74
1.4.1.4	Ingeniero de producción	und	4	1,00	1,98	4,616 (138 días)	1	1,74
1.4.1.5	Ingeniero pesquero	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.6	Médico veterinario	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.7	Contador	und	4	1	1,98	5,900 (177 días)	1	1,74
1.4.1.8	Coordinador de producción	und	4	1	1,98	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.9	Profesional residente	und	0	0	0	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.10	Auxiliar Administrativo	und	0	0	0	4,000 (120 días)	1	1,74
1.4.1.11	Ingeniero Ambiental o afines	und	0	0	0	5,667 (147 días)	1	1,74
1.4.1.12	Ingeniero Ambiental o afines	und	0	0	0	5,500 (112 días)	1	1,74

A continuación, se relaciona el personal contratado:

NOMBRE	CEDULA	EPS	PENSION	CARGO	FECHA INICIO	ADICIONAL EN TIEMPO	FECHA TERMINACION
Marylin Estefani Agamez Rojas	1098735575	Famisanar	Porvenir	Coor. Del Proyecto	22/08/2024	9 DIAS	21/12/2024
Alexander Bram Martinez	91435398	Nueva EPS	Pensionado	Ing Residente	30/08/2024		29/12/2024
Amparo Esther Trillos Usme	21934244	Famisanar	colpensiones	Med. Veterinario	05/08/2024		04/08/2024
Delly Esmeralda Romero Joya	1005240503	Sanitas	Porvenir	Aux. Administrativa	30/08/2024		29/12/2024
Edwin David Tamara Sanabria	1096231235	Nueva EPS	Porvenir	Ing. Ambiental	04/07/2024	37 DIAS	10/12/2024
Edwin Herrera Cruz	74150120	Nueva EPS	Porvenir	Coor. Produccion	05/08/2024		04/12/2024
Eliana Andrea Jimenez Mahecha	1096194626	Nueva EPS	Porvenir	Contadora	04/07/2024	57 DIAS	03/11/2024
Jhon Eduardo Rodriguez Estrada	13854766	Salud Total	Colpensiones	Ing. Ambiental	24/07/2024	27 DIAS	23/11/2024
Jimmy Rubio Mora	1096209659	Nueva EPS	Porvenir	Ing. Produccion	05/08/2024	18 DIAS	04/12/2024

Jorge Luis Aristizabal Regino	15676686	Sanitas	Colpensiones	Ing. Pesquero	02/08/2024		01/12/2024
Marylin Estefani Agamez Rojas	1098735575	Famisanar	Porvenir	Ing. Ambiental	25/06/2024	58	21/08/2024
Julio Moises Bohorquez Solorzano	1096203216	Nueva EPS	Colpensiones		23/08/2024	50 DIAS	13/12/2024
María Fernanda Peralta Castrillón	63514190	Sura	Colpensiones	Abogada	25/06/2024		24/10/2024

A corte 30 de diciembre de 2024 presenta en la ejecución de los recursos humanos del convenio 1732-24 por parte de la alcaldía un avance del 97.330%, quedando sin ejecutar 2.67% lo cual corresponde financieramente a un 0.040% del aporte del Distrito de Barrancabermeja; por parte de Piscicola San Silvestre se presenta un avance de 97.01%, quedando sin ejecutar 2.99% lo cual corresponde financieramente a un 0.726% del aporte de Piscicola San Silvestre.

Los soportes de la ejecución se encuentran en:

Informe de ejecución	Anexo verificación de cumplimiento de los perfiles Informe 5 tomo 1 de 2 páginas 143 a 146 informe financiero tomo 1 de 2: nómina y seguridad social

9.2. Oficina, papelería y otros

Este ítem presento modificación (Otrosí modificatorio N° 2) a las condiciones, la totalidad de este ítem fue asumido su costo por la Piscícola San Silvestre S.A; tal como se relaciona a continuación:

OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:

1.4,2		UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	APORTE PISCICOLA SAN SILVESTRE	ALCALDIA	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	APORTE PISCICOLA SAN SILVESTRE	ALCALDIA
142.1	Arrendamiento oficina	mes	4	1	$ 4.000.000,00	$ 16.000.000,00		$ 16.000.000,00	mes	4	0	$ 4.000.000,00	$ -		
142.2	Costo papelería, fotocopias, e	und	4	1	$ 2.657.337,00	$ 10.629.348,00		$ 10.629.348,00	und	4	1	$ 2.657.337,00	$ 10.629.348,00	$ 10.629.348,00	
142.3	Servicios públicos y operacion	mes	4	1	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	mes	4	1	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	
142.4	Alquiler de equipos de compu	mes	4	1	$ 5.700.000,00	$ 22.800.000,00		$ 22.800.000,00	mes	4	1	$ 5.700.000,00	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00	
142.5	Alquiler de camioneta (todo i	mes	4	2	$ 19.230.000,00	$ 153.840.000,00		$ 153.840.000,00	mes	4	2	$ 19.230.000,00	$ 153.840.000,00	$ 153.840.000,00	
142.6	Campamentos concejmar incluye serv publicos provisionales y bienestar (50 m2 a $100.000/m2)14 und	mes	4	1	$ 9.600.000,00	$ 38.400.000,00		$ 38.400.000,00	mes	4	0	$ 9.600.000,00	$ -		
142.7	Polizas 0,7%	GLB	4	1	$ 101.018.817,00	$ 101.018.817,00	$ 101.018.817,00		GLB	4	0	$ 101.018.817,00	$ -		
Sub Total						$ 352.688.165,00	$ 101.018.817,00	$ 251.669.348,00					$ 197.269.348,00	$ 197.269.348,00	$ -

EJECUTADO A LA FECHA						
4,2	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	UNIDAD	CANT	TIEMPO (MES)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE FISICO
4,2,1	Arrendamiento oficina	MES	0	0,0	0	
4,2,2	Costo papelería, fotocopias, etc	MES	1	4,0	4,0	100%
4,2,3	Servicios públicos y operacionales	MES	1	4,0	4,0	100%
4,2,4	Alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones	MES	1	4,0	4,0	100%
4,2,5	Alquiler de camioneta (todo incluido * 3 vehículos)	MES	2	4,0	4,0	100%

4,2,6	Campamentos container incluye serv. Públicos provisionales y bienestar (50 m2 a $100.000/m2) 4 und	MES	0	0,0	0	
4,2,7	Pólizas 0,7%	MES	0	0,0	0	
TOTAL						100%

A corte 30 de diciembre de 2024 presenta un avance del 100%.

Los soportes de la ejecución se encuentran en:

Costo papelería, fotocopias, etc	contrato N° 057-2024	$10.629.348,00	Informe 4 tomo 1 de 2 páginas 175 a 176 informe financiero tomo 1 de 2: contrato N° 057-2024, factura electrónica N° FT2038, Acta de liquidación contrato N° 057-2024,
Servicios públicos y operacionales			Informe 4 tomo 1 de 2 páginas 175 a 176 informe financiero tomo 1 de 2: soporte pago de servicios públicos, luz, internet (estación Piscícola),
Alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones	Contrato 102-2024,	$ 22.800.000	Informe 5 tomo 1 de 2 páginas 147 a 148 Acta parcial 1 con DS N° 931 Acta parcial 2 con DS N° 958 Acta parcial 3 con DS N° 1012 Informe de liquidación N°6 del 10% tomo 3 de 3, en el capítulo oficina, papelería y otros, se encuentra el acta final y de liquidación con DS N°1079
Alquiler de camioneta (todo incluido * 3 vehículos)	Contrato N° 092-2024	$ 153.840.000	Informe 5 tomo 1 de 2 páginas 147 a 148 Acta parcial 1 con N° Factura FE 120 Acta parcial 2 con N° Factura FE 131 Acta parcial 3 con N° Factura FE 143 Informe de liquidación N°6 del 10% tomo 3 de 3, en el capítulo oficina, papelería y otros, se encuentra el acta final y de liquidación con factura N° FE 161

10. REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS ECOSISTEMITAS

La actividad de repoblamiento fue modificada en sus cantidades a través del acta de modificación N° 1 tal como se relaciona a continuación:

2	REPOBLAMIENTO ÍCTICO	UNIDAD	CANTIDADES INICIALES	CANTIDADES ACTUALIZADAS
2.1	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Bocachico (Prochilodus magdalenae)	UN	1.779.840,00	2.500.955
2.2	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Dorada (Brycon moorei)	UN	540.002,00	656.605,19
2.3	Repoblamiento ictiológico con alevinos de la especie nativa Blanquillo (Sorubim cuspicaudus)	UN	430.114,00	446.780

A la fecha 13 de diciembre presenta un avance del cien por ciento (99.99%)

No.	CIÉNAGA	ESPECIE	CANTIDADES	CANTIDAD EJECUTADAS a corte 04/11/2024	CANTIDAD EJECUTADAS 05/11/2024 a 13/12/2024	POR EJECUTAR
1	El Llanito	Bocachico	350.955,00	350.955,00		0,00
		Dorada	109.355,19	109.355,00		0,19
		Blanquillo	72.895,00	72.895,00		0,00
2	La Cira	Bocachico	400.000,00	400.000,00		0,00
		Dorada	109.450,00		109.450	0,00
		Blanquillo	74.777,00		74.777	0,00
3	Zapatero	Bocachico	400.000	400.000,00		0,00
		Dorada	109.450,00	109.450,00		0,00
		Blanquillo	74.777,00	74.777,00		0,00
4	Los Mangos	Bocachico	400.000	400.000,00		0,00
		Dorada	109.450,00		109.450	0,00
		Blanquillo	74.777,00		74.777	0,00
5	El Opón	Bocachico	400.000	400.000,00		0,00
		Dorada	109.450,00	109.450,00		0,00
		Blanquillo	74.777,00	74.777,00		0,00
6	San Rafael de Chucurí	Bocachico	550.000,00	550.000,00		0,00
		Dorada	109.450,00	109.450,00		0,00
		Blanquillo	74.777,00	74.777,00		0,00

Cantidades y fechas de las siembras

No.	CIÉNAGA	ESPECIE	CANTIDAD	FECHA
1	El Llanito	Bocachico	350.955	26/08/2024
		Dorada	109.355	29/09/2024
		Blanquillo	72.895	
2	La Cira	Bocachico	400.000	28/09/2024
		Dorada	109.450	23/11/2024
		Blanquillo	74.777	
3	Zapatero	Bocachico	400.000	8/10/2024
		Blanquillo	74.777	16/10/2024
		Dorada	109.450	16/10/2024
4	Los Mangos	Bocachico	400.000	15/10/2024
		Dorada	109.450	

		Blanquillo	74.777	23/11/2024
5	El Opón	Bocachico	400.000	19/10/2024
		Dorada	109.450	
		Blanquillo	74.777	
6	San Rafael de Chucuri	Bocachico	550.000	19/10/2024
		Dorada	109.450	
		Blanquillo	74.777	

Para la siembra de los alevinos se realizó con el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, comunidad de pescadores, piscícola San Silvestre y secretaria de Medio Ambiente. Se contó con una logística consistente en un trasporte terrestre y acuático.

La siembra se realizó en horas de la mañana de 06:00 a.m. hasta las 10:00 am realizando una a climatización de aproximadamente 15 minutos antes de la siembra.

	**Empaque:** los alevinos se encontraban empacados en bolsas de plástico calibre "2.5", y las bolsas iban en cajas de cartón.
	**Estado Fitosanitario:** Los alevinos presentaban un buen estado fitosanitario. **Empaque:** Se transportaron los alevinos empacados en bolsa de plástico calibre "2.5". **Volumen:** Las bolsas contenian tres (3) litros de agua que cubriria el 30% de la capacidad de la bolsa y el 70% restante debe estar ocupado por oxígeno.
	**Talla:** El rango de alevinos para el repoblamiento fue de: 1,5 a 3 cm de longitud total.
	Proceso de climatización de aproximadamente 15 minutos

Los soportes de la ejecución se encuentran en:

Informe de ejecución	Informe 4 tomo 1 de 2 páginas 179 a 194 Informe 5 tomo 1 de 2 páginas 148 a 153 Certificado de liquidación de repoblamiento emitido por la gerencia de Piscícola San Silvestre, se encuentra en la carpeta acta de liquidación y certificado de repoblamiento, tomo 1 de 1

11. MONITORES PARTICIPATIVOS

La actividad de monitoreos participativos presento una modificación de las condiciones iniciales, tal como se presenta a continuación:

3	ACTIVIDAD 3. MONITOREOS PARTICIPATIVOS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
3.1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	Valor Parcial
3.1.2	Monitoreos ambientales (Incluye transporte)	und	4	120	$ 3.398.841,00	$ 1.631.443.680,00	und	4	120	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00	$ 1.481.782.080,00

Quedando actualizadas la actividad 3 de la siguiente manera:

	ACTIVIDAD 3. MONITOREOS PARTICIPATIVOS					
1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
1.1	Formación de monitores ambientales participativos	und	4	120	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00
1.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	und	4	120	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00
1.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	und	4	12	$ 695.294,15	$ 8.343.530,00
1.4	Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente	und	2	34	$ 2.243.296,00	$ 152.544.128,00
					Sub Total	1.658.149.738,00
					TOTAL, MONITOREOS PARTICIPATIVOS	1.658.149.738,00

11.1. Formación de monitores ambientales participativos.

1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
1.1	Formación de monitores ambientales participativos	und	4	120	$ 129.000,00	$ 15.480.000,00

La formación de los 120 monitores ambientales se desarrolló a través de 7 capacitaciones divididos en grupos de 40 participantes con lo cual se garantizó el

correcto entendimiento de cada una de las temáticas tratadas. Asimismo, en el desarrollo de las capacitaciones se entregaron: libretas media carta, planillero, folletos.

Módulo	Duración
1. Introducción a los monitores Ambientales	2 horas
2. Leyes y Regulaciones Ambientales	4 horas
3. Monitoreo, Vigilancia y Participación Comunitaria para la Protección Ambiental	2 horas
4. Procedimientos para el Reporte de Hallazgos Ambientales	2 horas
5. Uso de Formatos de Reporte y Herramientas de Monitoreo	2 horas
6. Formación de monitores por Autoridades Competentes	3 horas
7 estrategias para Sensibilizar y Educar a la Comunidad.	2 horas
Total	**21 horas**

Para el desarrollo de la Formación de monitores ambientales participativos la Piscícola San Silvestre S.A suscribió tres contratos los cuales se relacionan a continuación:

089-2024	KATHERINE OTALVAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO EN LA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN MARCO DEL CONVENIO 1732-2024	$ 6'000.000	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 089-2024, cuenta de cobro, Acta de liquidación, factura DS953
090-024	CAROL MEJIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL APOYO EN LA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.	$ 6'000.000	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 090-2024, cuenta de cobro, Acta de liquidación, factura DS954
105-2024	COMPULASER	COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA FORMACIÓN DE MONITORES AMBIENTALES PARTICIPATIVOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1732- 2024 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	$ 3'480.000	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 105-2024, , Acta de liquidación, factura COMP806

Balance económico de la actividad de Formación de monitores ambientales participativos

VALOR DE LA ACTIVIDAD	$ 15.480.000,00		
VALOR contrato 089-2024		$ 6.000.000	Contrato ejecutado y liquidado
VALOR contrato 090-024		$ 6.000.000	Contrato ejecutado y liquidado
VALOR contrato 104-2024		$ 3.480.000	Contrato ejecutado y liquidado
SUMAS IGUALES	$ 15.480.000,00	$ 15.480.000,00	

En conclusión, la actividad de Formación de monitores ambientales participativos se desarrolló de acuerdo con las especificaciones técnicas y se ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados.

Informe de ejecución	Informe 4 tomo 1 de 2 páginas 195 a 200 Informe 4 tomo 2 de 2 páginas 201 a 2014

11.2. Monitoreos ambientales (incluye transporte)

3	ACTIVIDAD 3. MONITOREOS PARTICIPATIVOS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
3.1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	Valor Parcial
3.1.2	Monitoreos ambientales (incluye transporte)	und	4	120	$ 3.398.841,00	$ 1.631.443.680,00	und	4	120	$ 3.087.046,00	$ 1.481.782.080,00	$ 1.481.782.080,00

Esta actividad tuvo una diminución del valor unitario teniendo en cuenta que en las condiciones iniciales se estipulo un factor multiplicador salarial del 1,98, sin embargo, la Piscícola está exento del pago de algunos factores (SENA, ICBF), con lo cual el factor multiplicador es de 1,74. Dichos cambios están contenidos en el Otrosí modificatorio N° 2 de fecha 10 de octubre de 2024

El monitoreo participativo ambiental estuvo conformado por integrantes de las diferentes agremiaciones presentes, como pescadores, ambientalistas y la población general. Las actividades de concertación, capacitación y áreas de trabajo fueron proporcionadas por la PISCÍCOLA SAN SILVESTRE, la cual contó con las capacidades técnicas, administrativas y operativas necesarias para liderar dicho grupo de trabajo.

Para la actividad de Monitoreos ambientales se contrató 120 personas a quienes se les entrego la respectiva dotación consistente en una gorra, camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad y capuchón; los cuales se relacionan a continuación:

N°	NO. CC	TRABAJADOR	FECHA INGRESO	FECHA TERMINACION	RH	ARL	ESTADO
	1.123.803.425	DANA ZULAY CASTELLANOS PEREZ	1/08/2024	30/09/2024	B-	POSITIVA	FINALIZO
	13.305.818	SERGIO SANMIGUEL CALA	2/09/2024	1/11/2024	AB+	POSITIVA	FINALIZO

1	1.005.182.217	GERSON FABIAN ROMERO JOYA	5/11/2024	4/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
2	91.435.380	ALVARO JAIMES DE LA OSSA	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
3	1.005.190.441	BERTILDA BELTRAN BERMUDEZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
4	1.096.249.741	ERICKSON ANDRES LOBO RINCON	1/08/2024	30/11/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
5	1.062.907.090	YESENIA CARDENAS BERMUDEZ	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
	28.202.738	GLORIBETH CENDALES SALAS	5/11/2024	4/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
6	1.096.235.819	JHON ALEXANDER MARTINEZ PLATA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
7	37.578.576	BETSABE DEL CARMEN ARRIETA SANCHEZ	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
8	91.000.871	JESUS MARIA GUALDRON VELANDIA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
9	28.488.501	EDILMA JUDITH POLO ACEVEDO	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
10	63.463.176	HELICA MARIA AMAYA VALENZUELA	1/08/2024	30/11/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
11	37.936.515	DECIRET HERNANDEZ MENESES	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
12	91.498.565	MIGUEL VILLANUEVA VILLANUEVA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
13	13.853.218	HEBERT ARMANDO GOMEZ PEREZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
14	91.429.943	VICENTE ALFREDO PEREZ	1/08/2024	30/11/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
15	63.456.507	GRISELDA OROZCO DIAZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
16	91.433.804	WILSON LAMO QUIÑONES	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
17	1.096.241.300	GLORIA MARIA PARRA JAIMES	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
18	28.483.589	NORMA CONSTANZA BRAM MARTINEZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
19	37.938.937	YANETH AGUILAR ATENCIA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
20	1.096.246.372	SERGIO ANDRES ARIZA RUIZDIAZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
21	63.463.429	CARMEN RUBIO GONZALEZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO

22	1.096.217.818	KELLY JOHANA TORRES VARGAS	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
23	1.005.239.607	YUCELLY ELIANA GONZALEZ ARDILA	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
24	37.878.161	MARISOL BRAN CELIS	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
25	1.098.694.582	JOSE LEONARDO CUEVAS URIBE	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
26	1.096.224.299	CRISTHIAN ANDRES ARDILA SANCHEZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
27	63.471.010	MARIA LUISA CAICEDO PRADA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
28	1.096.194.929	DIANA PATRICIA PERLAZA TORRES	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
29	63.460.586	MARIA BERNARDINA JIMENEZ RAMOS	1/08/2024	30/11/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
30	28.488.890	MARICELA MANTILLA PEÑALOZA	1/08/2024	30/11/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
31	1.005.371.725	ANDRES MAURICIO ANGARITA TUESTA	1/08/2024	30/11/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
32	33.221.227	PILAR EDITH ESTACIO CRUZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
33	63.458.735	MARITZA FLOREZ RUSSO	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
34	91.448.479	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MARMOL	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
35	1.096.221.069	MARIA EUGENIA BELTRAN BERMUDEZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
35	37.578.023	MARIA ANGELICA CABALLERO ALVAREZ	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
37	13.891.409	OMAR MORALES PEÑA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
38	37.579.741	LYDIS GONZALEZ DIAZ	1/08/2024	30/11/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
39	91.432.960	ARCELIO NOGUERA RADA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
40	13.851.408	JURLEDINSON RINCON BAYONA	1/08/2024	30/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
41	1.096.238.845	ANGIE CAROLINA PEREZ RICO	24/07/2024	23/11/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
42	1098804606	JESSIKA JULIETH CORTES PATIÑO	24/07/2024	23/11/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO

43	91424436	CARLOS HUMBERTO GUERRERO GOMEZ	12/08/2024	15/11/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
	1.096.235.261	DYLAN MACKEY AGUIRRE LINDADO	19/11/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
44	63470913	DIANA MILDRED ORTIZ PADILLA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
45	13893480	OMAR GOMEZ ARGUELLO	12/08/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
46	37921504	GLADYS NIÑO PRECIADO	12/08/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
47	1096242614	JULIO CESAR PEREZ DIAZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
48	1096202844	LIZ KARIM GONZALEZ BARRERA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
49	1096232247	MARIA VERONICA AVENDAÑO CUELLAR	12/08/2024	11/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
50	63461505	MARTHA CECILIA DELOS REYES FLOREZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
51	1096203392	ELVIA MARIA MORALES FONSECA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
52	91435856	ALCIDES ESCOBAR SAHABEDRA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
53	91478567	JUAN CARLOS BUELVAS TAMAYO	12/08/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
54	1096199691	DANIELA MARQUEZ MARTINEZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
55	1065578374	JOSE LUIS PEREZ FRANCO	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
56	1096217196	RICARDO GUZMAN VERGARA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
57	23042691	MARIA TERESA BELTRAN MEJIA	12/08/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
58	5611160	ARNULFO MENDOZA BOHORQUEZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
59	91430660	EDGAR ORTIZ PADILLA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
60	13887767	AMADO DE JESUS ORTIZ CHACON	12/08/2024	11/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
61	52263893	ADALGIZA AVILA VASQUEZ	12/08/2024	11/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
62	13854674	JOHN ALBERTO BOHORQUEZ GONZALEZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
63	91424081	JORGE ENRIQUE FERIA ARDILA	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO

64	1023886400	JACKELINE AVILA VASQUEZ	12/08/2024	11/12/2024	A-	POSITIVA	FINALIZO
65	1005180534	INGRITH YESETH CAMELO CAÑAS	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
66	1096253520	ELIDE YASMIN TORRES VELASQUEZ	12/08/2024	11/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
67	1096212365	ELIZABETH JOHANA ALVAREZ GARRO	12/08/2024	11/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
68	1096193439	JESICA AMARIS MARTINEZ	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
69	63469055	FLORINDA LONDOÑO CORTES	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
70	63464946	MARIA ELENA BAUTISTA DIAZ	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
71	91250156	MIGUEL ANTONIO PEÑA CARVAJAL	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
72	28489413	SANDRA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
73	1096203697	KAREN TATIANA DIAZ RODRIGUEZ	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
74	1096235746	YESENIA SALAS MENDOZA	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
75	1096231164	YENNY ANDREA PEREZ ORTIZ	15/08/2024	14/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
76	37921579	ENID SALAZAR	22/08/2024	21/12/2024	A-	POSITIVA	FINALIZO
77	1005183150	DELFA YULITZA ISAZA VELASQUEZ	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
78	37581226	MINET BELTRAN GOMEZ	22/08/2024	21/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
79	1000781229	OSCAR JAVIER PRADA GAITAN	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
80	3557944	HERMIDES BALLESTEROS MONROY	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
81	91435918	JAIRO CASTELLANOS	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
82	1096246733	MARIA VIVIANA BURITICA PAYARES	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
83	28484365	NIDIA ISABEL SURMAY GOMEZ	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
84	63469868	GRIZELIDA ORTIZ MOSCOTE	22/08/2024	21/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
85	1096217756	NATALY MICHELA CAICEDO IBAÑEZ	22/08/2024	21/12/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
86	28488490	GLEDIS RODRIGUEZ CASTRO	22/08/2024	21/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO

87	12578616	CARLOS MANUEL GAMBOA SEGOVIA	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
88	1005178935	YULEINIS OSPINO HERNANDEZ	22/08/2024	21/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
89	1193443591	LORENA MARIA CAÑAS ROA	22/08/2024	21/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
90	91442122	JORGE ELIECER PALOMINO VANEGAS	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
91	1005189074	NATALIA PORTILLO OSPINO	22/08/2024	21/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
92	37577719	LISTENIA SUAREZ CORDERO	22/08/2024	21/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
93	37580158	FANNY ARELIS FAJARDO ROA	22/08/2024	21/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
94	1005183993	NELY CAROLINA FUENTES OBREGON	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
95	40295046	LIUDMILA GUTIERREZ LEMUS	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
96	1116791727	YIRLEY STEFANIA MONTOYA FERNANDEZ	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
97	28020078	NANCY MARIA FIGUEROA ROJAS	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
98	63454721	ANA ISABEL GIL MEJIA	24/08/2024	23/12/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
99	1005177407	CRISTINA ISABEL ARIAS MENDOZA	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
10	1096243718	JOHAN ANDRES PAREDES LUNA	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
101	91517395	JORGE ARMANDO TURIZO FIGUEROA	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
102	1116772585	GEYDER MAURICIO BRITO NIEVES	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
103	1096209327	LUIS FERNANDO PIANETA MEJIA	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
104	23105823	AMELIS CAMARGO ROCHA	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
105	3557369	DOMINGO RODRIGUEZ FLORIAN	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
106	91440122	YAIRSIÑO GUZMAN VANEGAS	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
107	1005179148	KEYLA DICLAR VANEGAS	27/08/2024	26/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO

108	1096184534	GEYDER CALA VANEGAS	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
109	91433244	NIELCY JOSE VILLAREAL GALLARDO	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
110	1096249896	LUZ ANGELICA OCHOA BLANCO	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
111	37619135	CLAUDIA VELANDIA JURADO	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
112	1096210373	MARIA NELA PEDROZO CHACON	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
113	91421580	OMAR AGAMEZ BARRIOSNUEVOS	24/08/2024	23/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO
114	1005190009	EDUAR STIVEN CARO LASCARRO	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
115	91434767	ALDEMAR MADERA BAENA	24/08/2024	23/12/2024	B+	POSITIVA	FINALIZO
116	63466218	MONICA OMAIRA PARADA BARAJAS	27/08/2024	26/12/2024	O-	POSITIVA	FINALIZO
117	1096238346	WENDY JOHANNA RODRIGUEZ CRUZ	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
118	1096194602	INGRY NATALIA FUENTES RUIZ	24/08/2024	23/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
119	1095227493	GERALDIN PEÑATE MENDOZA	27/08/2024	26/12/2024	A+	POSITIVA	FINALIZO
120	13891218	CALIXTO RIVERA ESTRADA	26/08/2024	25/12/2024	O+	POSITIVA	FINALIZO

A fecha de 30 de diciembre 2024 ya no se encontraban activos los monitores ambientales que hicieron parte del convenio 1732-24.

Registro de recorridos de monitoreo ambiental en complejos cenagosos del Distrito, consolidado hasta el 04 al noviembre del 2024:

COMPLEJO CENAGOSO	NUMERO DE RECORRIDOS
Ciénaga San Silvestre	199
Ciénaga Llanito	221
ciénaga Juan Esteban	232
Ciénega de La Cira	39
Ciénega de San Rafael de Chucurí	31
Ciénega del Opón	24
TOTAL, PERIODO	**750**

El monitoreo ambiental en los complejos cenagosos del distrito de Barrancabermeja, que abarca cuerpos de agua como la Ciénaga San Silvestre, El Llanito, Juan Esteban, Cira, la Ciénaga del Opón y la Ciénaga de San Rafael de Chucurí, es una actividad crucial para la conservación de estos ecosistemas, los cuales tienen una enorme relevancia tanto ecológica como social. Estos cuerpos de agua no solo proporcionan hábitats para una amplia variedad de especies de flora y fauna, sino que también son una fuente vital de agua

y recursos económicos para las comunidades locales, que dependen de ellos para su subsistencia.

Registro de recorridos de monitoreo ambiental en complejos cenagosos del Distrito, consolidado hasta el 30 de diciembre del 2024:

	MONITOREOS PARTICIPATIVOS DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024							
	FECHA	LLANITO	JUAN ESTEBAN	SAN SILVESTRE	CHUCURI	OPON	CIRA	TOTAL
CONTRATO N.°: 104- 2024 - INPROTEG S.A.S	09 DE SEP AL 12 DE SEP DEL 2024	30	24	24	0	0	0	78
	16 DE SEP AL 19 DE SEP DEL 2024	24	24	24	7	4	0	83
	23 DE SEP AL 27 DE SEP DEL 2024	30	42	40	5	5	0	122
	30 DE SEP AL 04 DE OCT. DEL 2024	36	40	46	5	5	3	135
	07 DE OCT AL 11 DE OCT DEL 2024	15	20	30	5	7	5	82
	14 DE OCT AL 25 DE OCT DEL 2024	34	35	30	5	5	5	114
	18 AL 22 NOV 2024	16	20	20	5	5	5	71
	25 AL 29 NOV 2024	14	16	18	7	5	5	65
CONTRATO N.°: 140- 2024 - INPROTEG S.A.S	12 AL 18 DIC 2024	40	40	40	10	12	8	150
	TOTAL	239	261	272	49	48	31	900

Durante los recorridos, se llevaron a cabo diversas actividades, como las jornadas de sensibilización ambiental, orientadas a educar a la población sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas, se realizaron observaciones diarias de la fauna y flora, junto con la aplicación de técnicas de monitoreo ambiental, enfocadas en evaluar parámetros clave como la calidad del agua, la biodiversidad y el impacto de las actividades humanas en la zona.



Capacitación de Monitoreos ambientales



Monitoreos ambientales con su dotación



Trasporte fluvial de los de Monitoreos ambientales

Los soportes de ejecución:

Contrato 081-2024	Objeto: contrato de compraventa de dotación para empleados de la Piscícola San Silvestre S.A. en el marco del convenio 1732-24, suscrito con la alcaldia distrital de Barrancabermeja.	$ 112.115.850	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 081-2024, factura FV261, acta parcial N° 1 factura FV278, acta parcial N° 2, factura FV318, Acta de liquidación.
Contrato 091-2024	Objeto: Contrato de prestación de servicios para afiliaciones con entidad de Ley del personal en el marco del convenio interadministrativo N° 1732-24	$ 4.218.480	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 091-2024, factura

			DS938, cuenta de cobro, Acta de liquidación.
Contrato 104-2024	Objeto: Servicio de transporte fluvial para el cumplimiento de las actividades N° 2 y 3 establecidas en el marco del convenio N° 1732-2024 interadministrativo firmado con la alcaldía distrital de Barrancabermeja	$ 280.000.000 valor inicial $ 112.5000.000 Valor adicional Valor total con adicional $ 392.500.000 Valor total ejecutado $351.800.000 Valor total ejecutado en transporte de monitores ambientales $337.500.000 Valor transporte de repoblamiento $14.300.000	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 104-2024, adicional en valor, cuenta de cobro N° 1, Acta parcial N° 1, factura N° FE 506, acta parcial N° 2, factura N° FE 507 y acta final de liquidación factura N° FE 511
Contrato 140-20024	Objeto: Servicio de transporte fluvial para el cumplimiento de las actividades establecidas en el marco del convenio N° 1732-2024 interadministrativo firmado con la alcaldía distrital de Barrancabermeja	$67.500.000 valor inicial $67.500.000 valor total ejecutado	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe N° 6 del 10% tomo 3 de 3 en el capitulo transporte monitores ambientales, acta de liquidación factura N°.FE 518
Nota: El valor total del transporte para la actividad de monitores ambientales es de $405.000.000, en donde se suma el contrato 104-24 con un valor perteneciente a la actividad de $337.500.0000 y en el contrato140-24 con un valor de $67.500.000			
Contrato 078-2024	Objeto: Prestación de servicios de exámenes médicos ocupacionales para empleados de la Piscícola San Silvestre S.A en el marco del convenio 1732-2024, suscrito con la alcaldía distrital de Barrancabermeja	$ 35.200.000 Valor total del contrato $33.340.000 Valor total ejecutado	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 078-2024, factura FV N° 99, Acta parcial N° 1, Acta parcial N° 2 con factura N° FV 115 y en el informe N° 6 del 10% tomo 3 de 3 en el capitulo Seguridad social monitores ambientales se encuentra el acta final y de liquidación con factura N° FV 137
	Planillas de seguridad social y Nomina monitores meses de julio, agosto, septiembre, octubre,		Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2 y sus respectivos paz y salvo se encuentran en la carpeta de Paz y Salvo
	Informe de ejecución		Informe 4 tomo 2 de 2 páginas 215 a 273

12. MONITOREO FISICOQUÍMICO DEL AGUA

3	ACTIVIDAD 3. MONITOREOS PARTICIPATIVOS					
3.1	MONITOREOS PARCITIPATIVOS	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
3.1.3	Monitoreo fisicoquímico del agua.	und	4	12	$ 695.294,15	$ 8.343.530,00


A la fecha se han realizado 6 monitoreos fisicoquímicos iniciales del agua. Los cuales fueron ejecutados por el **laboratorio LASERTEC**, en las siguientes ciénagas:

- Ciénaga del Opón
- Ciénaga San Rafel de Chucurí
- Ciénaga la Cira
- Ciénaga Zapatero
- Ciénaga Llanito
- Ciénaga los Mangos

Las tomas se realizaron de acuerdo con lo establecido en los protocolos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –IDEAM-; la metodología incluye la calibración de los equipos portátiles, toma de muestras, preservación, refrigeración y transporte y el complemento con registro fotográfico. Descripción del sitio de muestreo. Midiendo las siguientes variables:


IN-SITU	GENERALES
Ph	Demanda Bioquímica de Oxigeno
Temperatura	Demanda Química de oxigeno
	Solidos suspendidos Totales
Conductividad	Fosforo Total
	Nitrógeno Total
Oxígeno Disuelto	Alcalinidad
	Dureza Total
Saturación de oxigeno	Coliformes Totales
	Coliformes Termo tolerantes




CIÉ



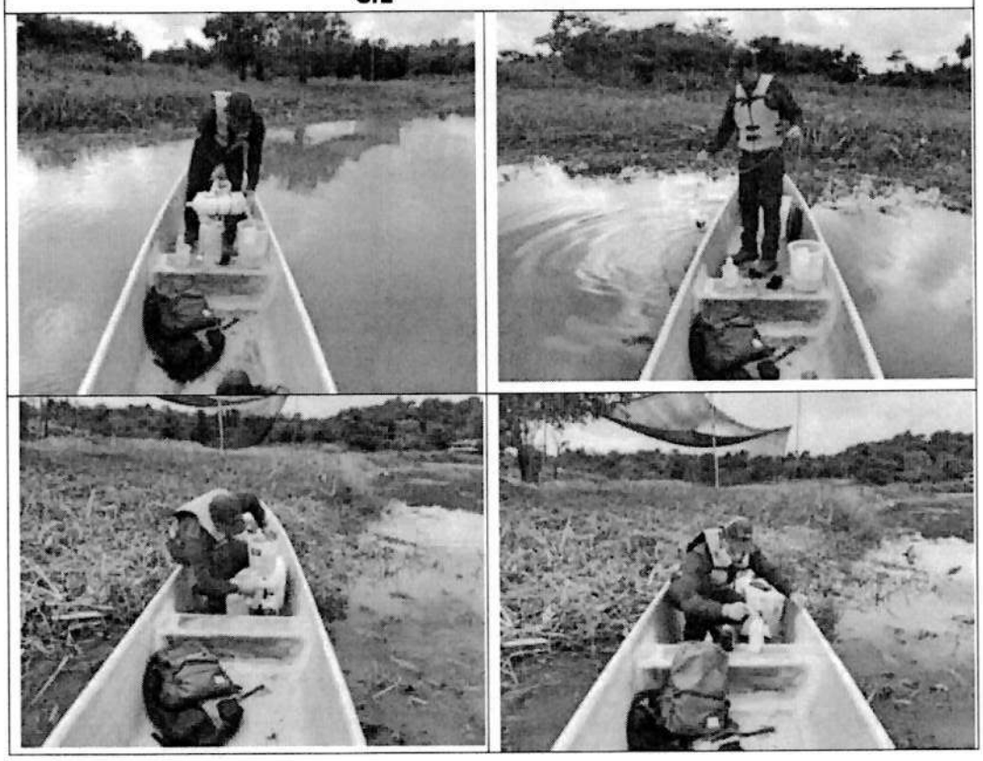





F


CHUCURÍ

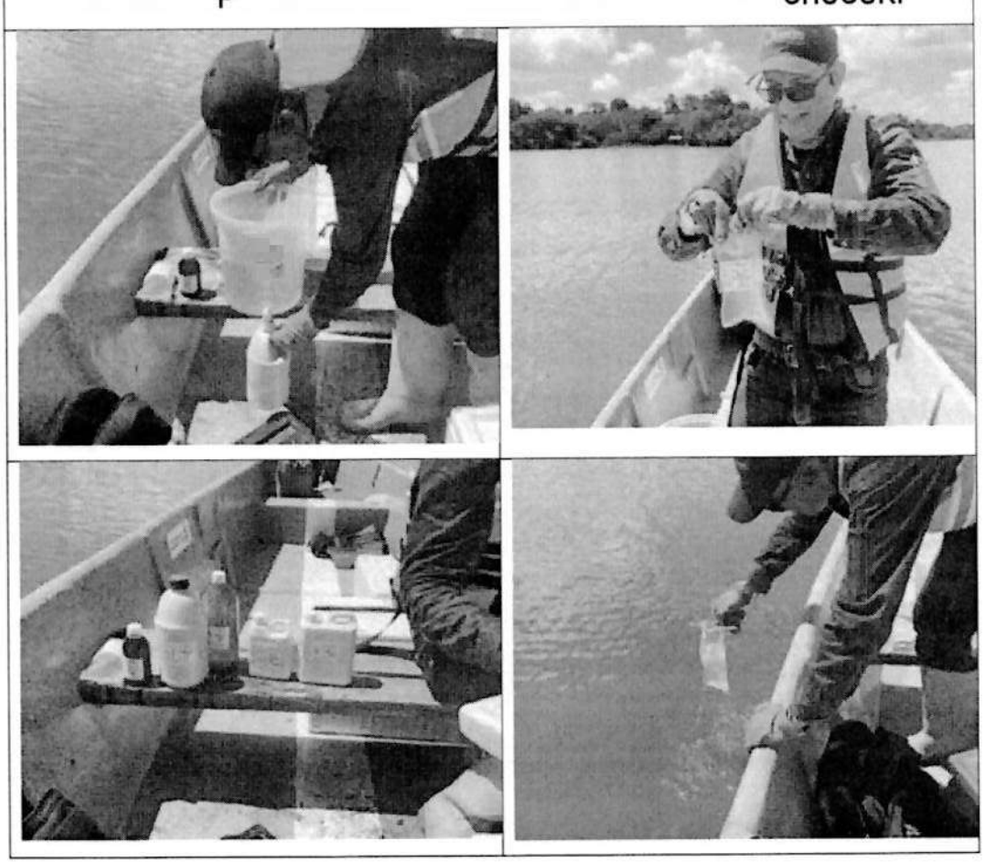


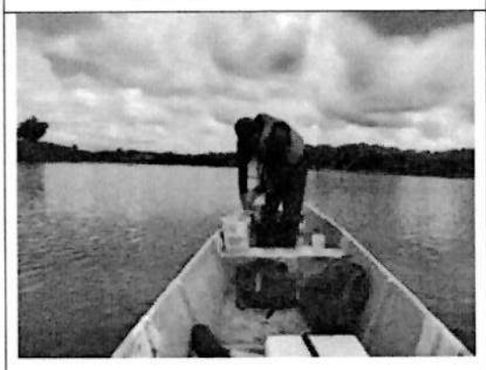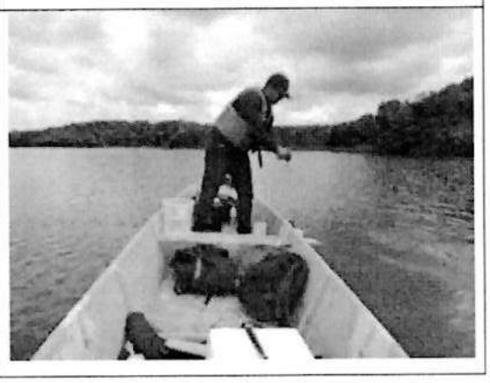REGISTRO FOTOGRAFICO CIENAGA ZAPATERO	
	
	

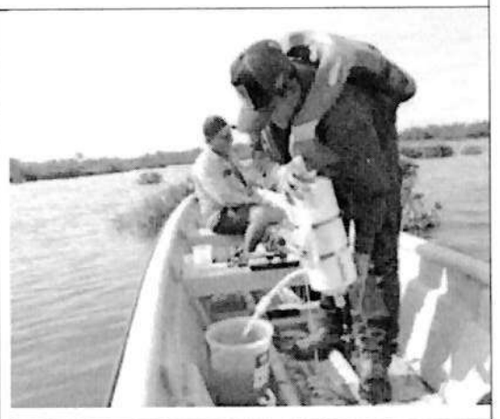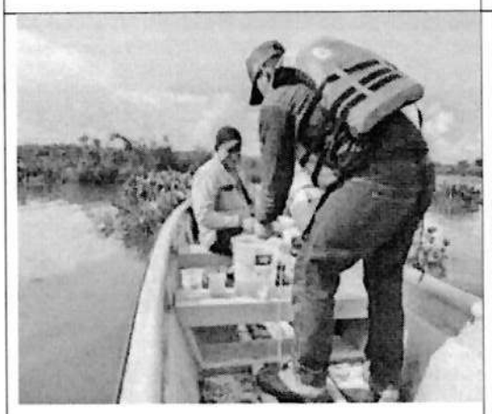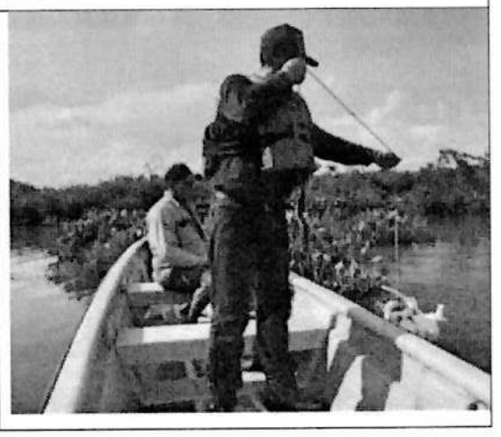REGISTRO FOTOGRAFICO CIÉNAGA LA CIRA	
	
	

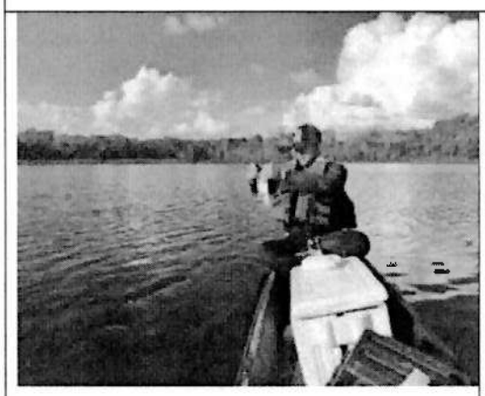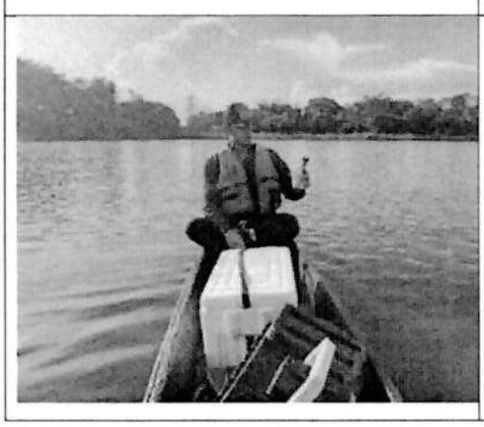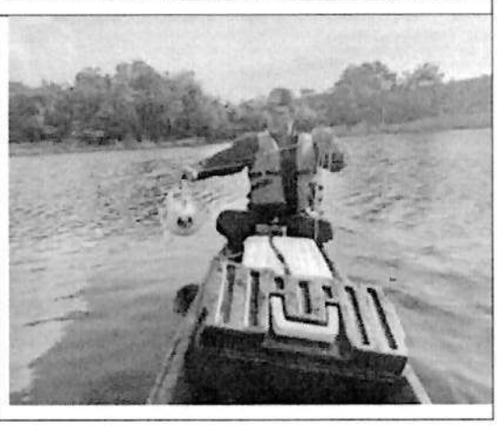REGISTRO FOTOGRAFICO CIENAGA LOS MANGOS	
	
	

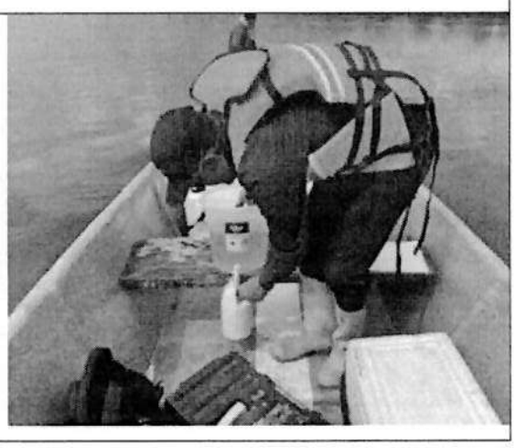REGISTRO FOTOGRAFICO CIENAGA OPÓN	
	

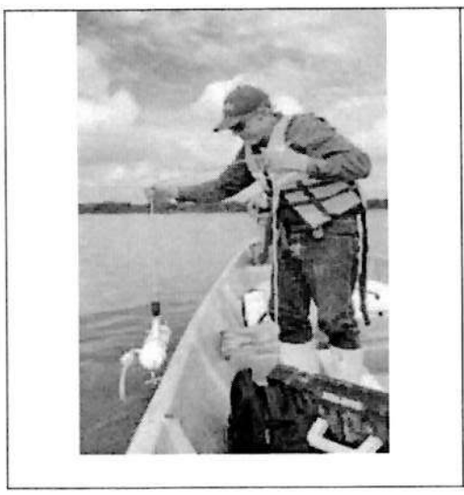



12.1. Resultados de los muestreos fisicoquímicos tomados en campo

Datos In- Situ								
Punto de muestreo	Profundidad [m]	Hora [H: Min]	Temperatura Ambiente [°C]	pH [Unid. de pH]	Temperatura de la muestra [°C]	Oxigeno Disuelto [mg O_2/L]	Saturación de Oxigeno [%]	Conductividad [µS/cm]
Ciénaga Llanito	Superficie (0,22 m)	08:55	30,0	5,90	28,6	2,50	32,7	42,0
	Media (0,60 m)	09:10	30,0	5,80	28,5	2,40	31,0	39,0
	Fondo (0,90 m)	09:26	30,1	5,70	28,5	2,40	31,0	33,0
Ciénaga San Rafael	Superficie (0,30 m)	09:30	33,4	8,50	31,2	8,01	108	64,0
	Media (0,90 m)	09:42	33,4	8,50	30,5	7,78	103	59,0
	Fondo (1,20 m)	10:00	33,6	8,10	30,4	7,54	100	81,0
Ciénaga Zapatero	Superficie (0,80 m)	10:33	31,2	5,90	31,0	3,00	40,4	28,0
	Media (2,40 m)	10:48	31,1	5,80	30,1	2,40	31,9	23,0
	Fondo (3,20 m)	11:10	31,3	5,80	29,2	2,20	28,8	23,0

Datos In- Situ								
Punto de muestreo	Profundidad [m]	Hora [H: Min]	Temperatura Ambiente [°C]	pH [Unid. de pH]	Temperatura de la muestra [°C]	Oxigeno Disuelto [mg O_2/L]	Saturación de Oxigeno [%]	Conductividad [µS/cm]
Ciénaga Opón	Superficie (0,30 m)	11:30	35,6	7,10	33,9	5,55	77,8	78,0
	Media (0,80 m)	11:43	35,6	7,20	32,0	5,36	73,2	90,0
	Fondo (1,10 m)	12:00	35,7	7,50	31,5	5,23	71,4	73,0
Ciénaga La Cira	Superficie (0,24 m)	14:10	33,2	6,10	32,9	3,50	48,5	53,0
	Media (0,90 m)	14:30	33,3	6,00	31,6	3,00	41,0	52,0
	Fondo (1,00 m)	14:50	33,6	6,10	30,8	2,80	37,7	52,0
Ciénaga Los Mangos	Superficie (0,32 m)	16:30	33,2	5,80	33,0	5,20	72,0	15,0
	Media (0,72 m)	16:45	32,8	5,80	31,6	4,60	62,8	14,0
	Fondo (1,28 m)	17:00	32,4	5,70	30,7	4,30	58,0	14,0

12.2. Resultados de los muestreos fisicoquímicos del laboratorio

	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS 240863					
				CIÉNAGA LLANITO	CIÉNAGA SAN RAFAEL	CIÉNAGA ZAPATERO	CIÉNAGA OPÓN	CIÉNAGA LA CIRA	CIÉNAGA LOS MANGOS
a	Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5210 B, SM 4500 O B	mg O_2/L	2,90	6,97	<1,98	2,92	2,82	<1,98
a	Demanda Química de Oxígeno	SM 5220 C	mg O_2/L	<30,0	<30,0	<30,0	50,0	<30,0	<30,0
a	Sólidos Suspendidos Totales	SM 2540 D	mg/L	58 1	36,8	13,7	31,7	97,6	15,8
a	Fósforo Total	SM 4500-P B4, D	mg P/L	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
**	Nitrógeno Total	EN 12260 (2003)	mg N/L	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
a	Dureza Total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/L	71,2	78,2	39,0	112	60,3	47,0
a	Alcalinidad Total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/L	8,97	22,9	6,90	33,4	13,0	1,50
a	Coliformes Totales	SM 9223 B	NMP/100ml	920800	540	350	920	91900	2061
a	Coliformes Termotolerantes	SM 9223 B Mod.Escudo	NMP/100ml	350	4,0	22,0	24,9	170	177,0

Tras los análisis realizados en laboratorio, se determina que los índices de contaminación generada en los cuerpos de agua Ciénaga Llanito, Ciénaga San Rafael, Ciénaga Zapatero, Ciénaga Opón, Ciénaga La Cira y Ciénaga Los Mangos son los siguientes:

Los valores de **ICOMI** en las tres profundidades de las Ciénagas Llanito, San Rafael, Zapatero, La Cira y Los Mangos indican que no existe un riesgo significativo relacionado con la mineralización del agua, lo que refleja ausencia de altos niveles de contaminantes inorgánicos. Sin embargo, para la Ciénaga Opón tiene un nivel bajo de contaminación en las tres profundidades, lo cual indica la presencia de sólidos disueltos y una posible concentración de minerales, así como una carga moderada de contaminantes orgánicos, que podrían provenir de materia orgánica de origen animal o vegetal.

Los valores de **ICOMO** registrados en las Ciénagas Llanito (en sus tres profundidades) y la Cira (en las profundidades media y del fondo) son altos, lo que sugiere una mayor carga de contaminantes orgánicos, probablemente asociados a materia orgánica. El índice de ICOSUS en las tres profundidades de las muestras analizadas, evidencia la ausencia de contaminación significativa por sólidos suspendidos, garantizando una buena calidad en términos de turbidez y partículas en suspensión.

Los valores muy bajos en el índice de **ICOpH** de las muestras analizadas, indican que no hay alteraciones significativas en el pH, lo que sugiere que el agua se mantiene dentro de los rangos naturales de pH, sin impactos relevantes derivados de contaminantes ácidos o básicos.

Por último, los valores de **ICOTRO** que se sitúa en la categoría de eutrófico para las muestras analizadas indican que el agua contiene niveles moderados de nutrientes como fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes podrían estar favoreciendo el crecimiento de algas y otros organismos acuáticos, lo cual, si no se gestiona adecuadamente, podría generar un desequilibrio ecológico a largo plazo.

Los soportes de ejecución se encuentran en:

Contrato 130-2024	Objeto: servicio de monitoreo de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en seis cuerpos de agua del distrito de Barrancabermeja establecidas en el convenio 1732-2024 suscrito entre la alcaldía de Barrancabermeja y la Piscícola San Silvestre S.A	$ 8.343.530	Los soportes de ejecución se encuentran en el informe financiero tomo 2 de 2: Contrato 130-2024. Informe 4 tomo 2 de 2 páginas 274 a 280 ejecución se Informe N° 6 del 10% tomo 3 de 3 se encuentra el acta parcial 1 con factura N° FELA1934 y acta final y de liquidación con factura N° FELA 665

12.3. Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente

3	ACTIVIDAD 3, **MONITOREOS** PARTICIPATIVOS	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS				
3.1	MONITOREOS **PARCITIPATIVOS**	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL	UND	TIEMP mes	CANT	Vr UNIT	Vr TOTAL
3.1.4	Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente	und					und	2	34	$ 2.243.296,00	$ 152.544.128,00

Corresponde a una actividad adicionada mediante otrosí modificatorio N° 2. A continuación se relaciona el listado de los Monitores ambientales vigilantes del medio ambiente:

ITEM	NO. DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA INGRESO	FECHA TERMINACION	RH	ARL
1	1096209862	ALDANA	DIAZ	ANAI	YERILSA	24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
2	63464097	ARRIETA	RODRIGUEZ	NORMA	ISABEL	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
3	63468531	ARENILLA	RODRIGUEZ	GLORIA		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
4	914514572	BARON	CARDENAS	RUBEN	DARIO	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
5	1096196021	BASTIDAS	MARIN	DANIEL		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
6	63472072	BELTRAN	MURIEL	RUBY	ANDREA	24/10/2024	23/12/2024	B+	ACTIVO
7	63538977	CANTILLO	CORDOBA	VIVIANA		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
8	91437558	COLLANTE	TORRES	FERNANDO		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
9	1005186463	CORREA	JIMENEZ	DANNER	ALEXANDER	24/10/2024	23/12/2024	B+	ACTIVO
10	91447995	DURAN	PLATA	JOSE	LEONARDO	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
11	1004804022	GALVIZ	ECHEVERRY	KATERIN	JOHANA	24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
12	13565752	GARCIA	MARTINEZ	FERMIN		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
13	91430491	GAÑAN	MOLINA	MANUEL	EDWIN	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
14	1096197221	GOMEZ	PADILLA	ELIANA		24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
15	91320736	MAX	HERRERA	RODRIGO		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO

16	1096201657	MACKEN	GOLZALES	ISARITH	DEL CARMEN	24/10/2024	23/12/2024	B+	ACTIVO
17	37932283	MORENO	SEPULVEDA	LUCY		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
18	13892224	NIETO	MACHUCA	MIGUEL		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
19	91446502	NIETO	DIAZ	RODRIGO		24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
20	91433448	RIVERA	BARBOSA	JUAN	CARLOS	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
21	1005345142	RUEDA	ANGARITA	MARLIN	GISSELA	24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
22	28020951	PACHECO	MONTECINO	DIANA		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
23	63471989	PAEZ	GOMEZ	YAZMIN		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
24	91420298	PEREZ	SAAVEDRA	LUIS	ENRIQUE	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
25	1005178470	ROBLES	BELEÑO	YURLEI	TATIANA	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
26	1005178469	ROBLES	BELEÑO	SHIRLEY	JOANA	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
27	13570956	SANABRIA	MEZA	JHEISON		24/10/2024	23/12/2024	AB+	ACTIVO
28	91446387	SANCHEZ	CASTRO	YAMIR		24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
29	1096225573	TAPIA	BRIÑEZ	MARIA	NAILEN	24/10/2024	23/12/2024	A+	ACTIVO
30	1096231877	TELLEZ	ACOSTA	MAIRA	ALEJANDRA	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
31	1096218728	TRIVIÑO	PEREZ	CATHERINE		24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
32	1005178564	VASQUEZ	VANEGAS	LUZBELI	ANDREINA	24/10/2024	23/12/2024	O+	ACTIVO
33	1096217818	KELLY	JOHANA	TORRES	VARGAS	2/12/2024	30/12/2024	O+	ACTIVO
	1098804606	JESSIKA	JULIETH	CORTES	PATIÑO	28/11/2024	30/12/2024	O+	ACTIVO
34	1096235819	JHON	ALEXANDER	MARTINEZ	PLATA	2/12/2024	30/12/2024	O+	ACTIVO
	37578576	BETSABE	DEL CARMEN	ARRIETA	SANCHEZ	2/12/2024	30/12/2024	A+	ACTIVO

Los soportes de ejecución se encuentran en:

Nomina monitores meses octubre,		Informe Financiero tomo 1 de 1
informe de ejecución		Informe 5 tomo 2 de 2 páginas 201 a 242

13. COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1732-24

Durante la ejecución del convenio 1732-24 se realizaron comités de seguimiento en dónde se mostraban los avances del mismo y las reubicaciones contempladas de aquellos caños que no se podían realizar completamente debido a las condiciones del terreno. Estos comités se hicieron en conjunto con la secretaría de medio ambiente, piscícola, área jurídica y contable del convenio, con el fin de darle un cumplimiento completo al convenio.

Los comités realizados durante la ejecución del convenio hasta el 04 de noviembre de 2024 se relacionan en el siguiente cuadro:

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Conformación e instalación de comité de seguimiento del convenio 1732-24	03 de julio de 2024
2	Revisión primera cuenta, plan de trabajo, tema jurídico y revisión de personal	09 de julio de 2024
3	Revisión de socializaciones sector urbano y de ejecución presupuestal del convenio	16 de julio de 2024
4	Revisión solicitud de plazo para ejecución de actividades en campo del convenio 1732-24	19 de julio de 2024

5	Recepción de documentos y revisión cronograma de inicio de actividades	26 de julio de 2024
6	Revisión cronograma de inicio de actividades	27 de agosto de 2024
7	Revisión de personal, plan de trabajo, tema jurídico y revisión de los dos puntos para incluir en la limpieza de caños	16 de septiembre de 2024
8	Revisión de personal, plan de trabajo, tema jurídico y revisión de los puntos para incluir en la limpieza de caños	30 de septiembre de 2024
9	Revisión de pendientes, plan de trabajo y modificatorio	08 de octubre de 2024
10	Revisión de plan de trabajo, pendientes y modificatorio	18 de octubre de 2024
11	Revisión plan de trabajo y pendientes	25 de octubre de 2024
12	Avances de los contratos generados	5 de noviembre de 2024
13	Reubicación de 20.000 m2 de la Ciénaga los Mangos a Ciénaga la Cira	26 de noviembre de 2024

14. CONCLUSIONES

- El convenio interadministrativo N° 1732-24, se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo con las especificaciones técnicas y cantidades estipuladas.
- El mayor impacto positivo se viene dando con la remoción mecánica, la cual ha beneficiado a próximamente 2000 familias del asentamiento humano pozo 7 y sus alrededores, quienes con los trabajos realizados manifiestan que los problemas de inundaciones de los cuales sufijan constantemente han disminuido entre un 70 y 80 porciento.
- Se generó aproximadamente 700 empleos entre directos e indirectos en la ejecución del convenio.
- Las comunidades pesqueras se han beneficiado tanto en la generación de mano de obra como por la siembra de alevinos, que garantizaran la seguridad alimentaria en un futuro cercano.
- La ejecución general del convenio 1732-24 a corte 30 de diciembre de 2024 es del 99.99% en sus actividades de limpieza, rocería y destronque en caños urbanos y rurales ya que no se pudo ejecutar un 0.0000009%, por lo tanto, queda un saldo sin ejecutar de $25.00 y su informe de ejecución y acta de liquidación se encuentra en el informe de actas de liquidación y certificados de repoblamiento en el capítulo actas de liquidación tomo 1 de 1
- En remoción mecánica se cierra con un 99.91% de ejecución en esta actividad, por lo tanto, queda un saldo sin ejecutar de $2.704.829 pesos y su informe de ejecución y acta de liquidación se encuentra en el informe N°6 del 10% en el tomo 1 de 3 en el capítulo limpieza mecánica en caños urbanos
- En el repoblamiento ictiológico, su ejecución fue 99.99%, ya que en el repoblamiento de la especie Dorada (Brycon moorei) no se pudo ejecutar 0.19 unidades debido a que en la práctica en este tipo de actividades se trabaja con números enteros de organismos vivos y no con decimales, es por eso que en este ítem queda un saldo sin ejecutar de $86.00 pesos
- En el personal administrativo se presenta en la ejecución de los recursos humanos del convenio 1732-24 por parte de la alcaldía un avance del 97.330%, quedando sin ejecutar 2.67% lo cual corresponde financieramente a un 0.040% del aporte del Distrito de Barrancabermeja, por lo tanto queda un saldo sin ejecutar de $5.653.873 pesos; por parte de Piscícola San

Silvestre se presenta un avance de 97.01%, quedando sin ejecutar 2.99% lo cual corresponde financieramente a un 0.726% del aporte de Piscícola San Silvestre, por lo tanto queda un saldo sin ejecutar de $4.666.149, para un total de $10.320.022 sin ejecución teniendo en cuenta el aporte de ambos.

RAFAEL LEONARDO GRANADOS CARDENAS
Secretario Medio Ambiente
Supervisor

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	FIRMA
Proyectó	Luis Adrián Quintero Suarez	26/06/2025	
	Sara Santodomingo Quevedo	26/06/2025	
Aprobó	Rafael Leonardo Granados Cárdenas	26/06/2025	
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			
