Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-024885 Id: 838965
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 26-08-2026 21:19:39
Folios: 2

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

**DE:** **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

**ASUNTO:** REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO DE 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de julio de 2026, para su conocimiento y trámite correspondiente.

| N°CONVENIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| 1313-23 | ARGELIA | CAUCA | 126 |
| 1767-24 | CHACHAGUI | NARIÑO | 463 |
| 2311-25 | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | 302 |
| 1470-24 | CONSACA | NARIÑO | 151 |
| 2323-25 | CUBARRAL | META | 53 |
| 2306-24 | DISTRISEGURIDAD | | 116 |
| 2307-25 | EL PEÑOL | NARIÑO | 53 |
| 1918-22 | IPIALES | NARIÑO | 925 |
| 2180-25 | LA GLORIA | CESAR | 62 |
| 2345-25 | MANZANARES | CALDAS | 197 |
| 2314-25 | MORROA | SUCRE | 81 |
| 2315-25 | POTOSÍ | NARIÑO | 241 |
| 2299-25 | SAN MARTÍN DE LOS LLANOS | META | 63 |
| 2053-21 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 453 |
| 2175-25 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 224 |
| 2336-25 | SAPUYES | NARIÑO | 398 |
| 2301-25 | TUCHÍN | CÓRDOBA | 106 |



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-024885 Id: 838965
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 26-08-2026 21:19:39
Folios: 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2050-21 | TUMACO | NARIÑO | 90 |
| 1617-23 | VILLA RICA | CAUCA | 48 |
| 2331-25 | VISTAHERMOSA | META | 40 |

Cordialmente,

**ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

**Elaboró:** Alejandra Galviz – Profesional Apoyo a la supervisión - SPS



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. **2336 DE 2025** MUNICIPIO DE SAPUYES (NARIÑO) |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO** DE **2026** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO.. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Corregimiento El Espino del Municipio de Sapuyes SAN FRANCISCO O RECUERDO | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE SAPUYES DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/12/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA | 13/11/2025 | ACTUAL |
| | TITO LORENZO LOVO CARRETERO | 07/11/2025 | 12/11/2025 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ | 13/11/2025 | 31/12/2025 |
| | LIZA YOHANA ROJAS OJEDA | 02/02/2026 | ACTUAL |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 58625 | 7 /11/ 2025 | |
| | No.8626 | 10/01/2026 | |
| **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No 39525 | 7 /11/ 2025 | |
| | No.8626 | 10/01/2026 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 520-47994000053982 | 11/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: 30/07/2026 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $149.827.981,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $84.123.457,00 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR DE OBRA** | $1.846.883.748,00 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $369.164.814.,00 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | 26-12-2026 | $857.500.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | NO APLICA | 30/04/2026 | $735.000.000 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | 50% | | $ 612.500.000 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD). G. Remisión | 100% | | $ 245.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 1.592.500.000,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-44-10100652 | Cumplimiento | $490,000,000.00 | 07/11/2025 | 31/01/2027 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** LP-2025-002 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | $149.827.981,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 31/07/2026 | |
| | SUSPENSIÓN | 20/05/2026 | |
| | REINICIO | 06/07/2026 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/07/2026 | | |
| **Fecha de terminación del contrato Otro si N 002** | 14/12/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $149.827.981,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6 | | |
| **PÓLIZA No.** | 775-74-994000000913 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 09/03/2026 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** CM-2026-001. | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE | $ 84.123.457,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 31/07/2026 | |
| | SUSPENSIÓN | 20/05/2026 | |
| | REINICIO | 06/07/2026 | |
| **Fecha de terminación del contrato Inicial** | 31/07/2026 | | |
| **Fecha de terminación del contrato Otro si N 002** | 14/12/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $84.123.457,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 | | |
| **PÓLIZA No.** | 41-44-101303666 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 06/03/2026 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** LP-2025-002 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | $1.846.883.748,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 31/07/2026 | |
| | SUSPENSIÓN | 20/05/2026 | |
| | REINICIO | 06/07/2026 | |
| **Fecha de terminación Inicial del contrato** | 31/07/2026 | | |
| **Fecha de terminación del contrato Otro si N 002** | 14/12/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $1.846.883.748,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6 | | |
| **PÓLIZA No.** | 775-74-994000000913 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 09/03/2026 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** CM-2026-001. | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO | $ 369.164.814,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO C&L SAPUYES R.L SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 31/07/2026 | |
| | SUSPENSIÓN | 20/05/2026 | |
| | REINICIO | 06/07/2026 | |
| **Fecha de terminación Inicial del contrato** | 31/07/2026 | | |
| **Fecha de terminación del contrato Otro si N 002** | 14/12/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 369.164.814,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 | | |
| **PÓLIZA No.** | 41-44-101303666 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 06/03/2026 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | | SI | NO |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:** | Junio 2026 | X | |
| **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | N 01 del 06 julio a 31 julio de 2026 | X | |
| **INFORME FINANCIERO** | Julio 2026 | X | |
| **SALDO DE LA CUENTA BANCARIA** | $1.548.380.611,81 | X | |
| **ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | Ejecución Obra Etapa II | X | |
| **OTROS** | N/A | | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | 2.71% |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | 2.22% |

- **COMPONENTE TÉCNICO:**

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2026, se inicia el seguimiento a la Etapa II – Ejecución de Obra del proyecto “Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo 1”, ubicado en el corregimiento de El Espino, municipio de Sapuyes, Nariño, cuya ejecución se formalizó mediante Acta de Reinicio y Acta de Inicio suscritas por el municipio de Sapuyes el 6 de julio de 2026, una vez superada la suspensión comprendida entre el 20 de mayo y el 6 de julio de 2026.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de obra e interventoría y de conformidad con los estudios y diseños aprobados, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y programación contractual, se verificó la ejecución de actividades correspondientes a localización y replanteo, excavaciones, retiro y disposición de material, preparación de cimentaciones, instalación de acero de refuerzo PDR-60 y ejecución de redes hidráulicas y de aguas lluvias. De las cantidades verificadas, las actividades de excavación manual y mecánica, desalojo de material, red hidráulica de 1” y red de aguas lluvias de 6” alcanzaron el 100 % de las cantidades programadas, mientras que el acero de refuerzo PDR-60 presentó un avance del 18,18 %.

Desde el componente físico-financiero, con corte al 31 de julio de 2026, se registra una ejecución real de $41.025.090, equivalente al 2,22 %, frente a una ejecución programada de $50.037.889, equivalente al 2,71 %, evidenciándose una diferencia de 0,49 puntos porcentuales, equivalente a $9.012.799. Esta situación constituye un desfase respecto de la programación contractual vigente, que debe ser objeto de seguimiento permanente por parte de la interventoría y de acciones oportunas por parte del contratista, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato.

Desde el punto de vista técnico, durante el periodo se identificaron restricciones asociadas a la disponibilidad del recurso hídrico, derivadas del racionamiento del servicio de agua potable en el sector, circunstancia que incidió en la continuidad de actividades que requieren suministro permanente de agua, particularmente las relacionadas con la preparación, colocación, fundición y curado de elementos de concreto. Frente a dicha circunstancia, el contratista implementó mecanismos de almacenamiento de agua en el campamento de obra como medida de contingencia, orientada a mitigar la afectación y garantizar, en la medida de lo técnicamente posible, la continuidad de los frentes de trabajo.

No obstante, las circunstancias operativas identificadas no eximen al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que corresponde mantener las medidas de prevención, mitigación y recuperación necesarias para evitar una afectación mayor sobre la programación, las actividades de la ruta crítica y las metas físicas previstas.

En materia contractual el municipio de Sapuyes Nariño , mediante Modificatorio No. 02, suscrito el 31 de julio de 2026, se formalizó la prórroga de los contratos de obra e interventoría hasta el 14 de diciembre de 2026 con proyección de un modificatorio N03 hasta el 31 de diciembre de 2026 , con fundamento en las necesidades técnicas y operativas requeridas para la culminación integral de la Etapa II, incluyendo los tiempos asociados a la ejecución y secuencia constructiva, fraguado y curado de concretos, condiciones climáticas, suministro y disponibilidad de materiales, realización de ensayos y controles de calidad y, cuando resulte aplicable, la obtención de las certificaciones RETIE y RETILAP previstas dentro del alcance contractual.

En consecuencia, al cierre del periodo objeto de seguimiento, se evidencia una ejecución inicial de la Etapa II, con frentes activos relacionados principalmente con movimiento de tierras, cimentación y redes técnicas (hidráulicas y sanitarias); sin embargo, persiste un desfase frente a la programación acumulada. En tal sentido, resulta técnicamente necesario y contractualmente exigible que el contratista implemente y fortalezca las acciones de recuperación, mediante la optimización de rendimientos, disponibilidad oportuna de personal, equipos, materiales e insumos, ampliación o reorganización de frentes de trabajo cuando técnicamente proceda y priorización de las actividades que inciden en la ruta crítica.

Por su parte, la supervisión del ente territorial e interventoría deberá continuar ejerciendo el control técnico, administrativo, financiero y contractual, verificando la ejecución efectiva de las actividades, cantidades, calidad de los materiales, cumplimiento de especificaciones, programación y medidas de recuperación adoptadas, dejando los respectivos soportes en los informes y registros de seguimiento.

- **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

El 01 de julio de 2026, el Municipio de Sapuyes, Nariño, mediante comunicación remitida vía correo electrónico, envió al Ministerio del Interior copia adicional, en medio digital, de los estudios y diseños (Fase I) correspondientes al proyecto, para efectos de su incorporación y seguimiento dentro del expediente contractual.

El 03 de julio de 2026, mediante comunicación remitida por correo electrónico, el Municipio de Sapuyes – Nariño presentó para revisión y trámite la solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, acompañada de los respectivos documentos técnicos, administrativos y jurídicos que sustentan y justifican la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio.

El 05 de julio de 2026 se remitió comunicación oficial al Municipio de Sapuyes, mediante la cual se solicitó ampliar y complementar la justificación técnica y jurídica de la solicitud de Prórroga No. 1, precisando las circunstancias que sustentan la necesidad de ampliar el plazo, las actividades pendientes y el término requerido para garantizar la adecuada culminación de las obligaciones previstas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, junto con los respectivos soportes.

El 06 de julio de 2026, el Municipio de Sapuyes, mediante comunicación remitida por correo electrónico, presentó el paquete técnico y jurídico solicitud prorroga 1 debidamente ajustado, incorporando las modificaciones y subsanaciones correspondientes, de conformidad con las observaciones y requerimientos formulados previamente por el Ministerio del Interior, para efectos de su revisión y validación.

El 08 de julio de 2026, el Municipio de Sapuyes, mediante comunicación remitida vía correo electrónico, presentó los documentos anexos debidamente ajustados correspondientes a la Solicitud de Prórroga No. 1 del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, atendiendo las observaciones formuladas previamente, para su respectiva revisión, validación y trámite por parte del Ministerio del Interior.

El 11 de julio de 2026, el Municipio de Sapuyes, Nariño, remitió el Informe Mensual de Supervisión No. 8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, relacionado con el seguimiento técnico, administrativo y contractual de la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025.

El 15 de julio se remitió comunicación oficial, mediante correo electrónico, al Municipio de Sapuyes, a través de la cual se convocó a una mesa de seguimiento virtual programada para el 17 de julio de 2026, a partir de las 4:00 p. m, La convocatoria tuvo como propósito efectuar el seguimiento técnico, administrativo y contractual al estado de ejecución del convenio, verificando el avance y cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad territorial y los contratistas derivados, con especial énfasis inicio (fase II ) ejecución de obra.

El 17 de julio de 2026 se realizó mesa técnica virtual con la participación de la supervisión, el Municipio de Sapuyes (Nariño), la interventoría y el contratista, con el propósito de socializar y revisar la ejecución obra del proyecto, Convenio Interadministrativo No. 2336-26, verificando su consistencia técnica y su concordancia con el alcance contractual.

El 24 de julio de 2026 se llevó a cabo mesa técnica virtual con participación de la supervisión, el Municipio de Sapuyes (Nariño), la interventoría y el contratista, con el objeto de realizar seguimiento técnico al avance de ejecución de la obra, verificando el estado de las actividades desarrolladas frente a la programación vigente, el porcentaje de avance físico, la ejecución de los diferentes frentes y capítulos de obra, así como la correspondencia entre las cantidades ejecutadas, los soportes técnicos y las obligaciones establecidas contractualmente. De igual manera, se revisaron las actividades pendientes, las situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de la ejecución y los compromisos requeridos para garantizar la continuidad y cumplimiento de las metas físicas del proyecto, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025.

El 30 de julio de 2026, se efectuó en la plataforma SECOP II la aprobación de la Prórroga No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2336-25, mediante la cual se formalizó la ampliación del plazo de ejecución contractual, de conformidad con la solicitud presentada y los soportes técnicos y jurídicos que sustentaron su procedencia.

El 31 de julio de 2026 se llevó a cabo mesa técnica virtual con participación de la supervisión, el Municipio de Sapuyes (Nariño), la interventoría y el contratista, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la ejecución de la obra. En la reunión se verificó el avance físico frente a la programación contractual vigente, el desarrollo de los diferentes frentes y actividades, así como la correspondencia entre lo ejecutado, los soportes técnicos y las obligaciones contractuales. De igual manera, se analizaron las actividades pendientes y los aspectos técnicos y operativos que podrían afectar el plazo de ejecución, estableciendo los compromisos y acciones de seguimiento requeridos para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de las metas, condiciones y obligaciones previstas en el Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025.

- **COMPONENTE FINANCIERO:**

  A corte del mes de Julio de 2026, y de acuerdo con el extracto bancario remitido por el Municipio de Sapuyes, Nariño, el convenio presenta el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $2.450.000.000 |
| VALOR APORTADO POR FONSECON | $2.450.000.000 |
| VALOR DESEMBOLSADO A LA FECHA | $ 1.592.500.000,00 |
| SALDO EN LA CUENTA BANCARIA EXTRACTO JULIO -2026 | $ 1.131.464.639,91 |
| VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO | $ 0 |

**VALORES CANCELADOS A LA FECHA A CONTRATISTAS (DERIVADOS)**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-2025-002 | Pago anticipo (25%) del valor de la Etapa de Ejecución de Obra, correspondiente al Contrato de Obra No. LP-2025-002. | 2797 | 2026001181 | 29/07/2026 | $461.720.937,00 | $0,00 | $461.720.937,00 |
| LP-2025-002 | Cobro proveedores otros bancos | 3051 | — | 29/07/2026 | $8.670,00 | $0,00 | $8.670,00 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | | **$461.729.607,00** | **$0,00** | **$461.729.607,00** |

- **COMPONENTE CONTRACTUAL:**

El convenio presenta una fecha de terminación contractual Inicial hasta el 31 de julio de 2026, con la aprobación de la prórroga 1 fecha terminación contrato hasta 31 de diciembre de 2026.

- **ANEXOS:**

  - Anexo correo electrónico de fecha 01/07/2026, mediante el cual el Municipio de Sapuyes remitió copia digital de los estudios y diseños – Fase I.
  - Anexo correo electrónico de fecha 03/07/2026, mediante el cual el Municipio presentó la Solicitud de Prórroga No. 1, con sus soportes técnicos y jurídicos.
  - Anexo comunicación de fecha 05/07/2026, mediante la cual se solicitó complementar la justificación técnica y jurídica de la Prórroga No. 1.
  - Anexo: correo electrónico de fecha 06/07/2026, mediante el cual el Municipio Sapuyes remitió la Solicitud de Prórroga No. 1 ajustada, atendiendo las observaciones formuladas.
  - Anexo correo electrónico de fecha 08/07/2026, mediante el cual municipio de Sapuyes remitieron los documentos ajustados para revisión y trámite de la Prórroga No. 1.
  - Anexo correo electrónico de fecha 11/07/2026, mediante el cual el Municipio Sapuyes remitió el Informe Mensual de Supervisión No. 8.
  - Anexo: comunicación de fecha 15/07/2026, mediante la cual se convocó a mesa de seguimiento virtual para el 17/07/2026.
  - Anexo soporte de mesa técnica virtual de fecha 17/07/2026.
  - Anexo soporte de mesa técnica virtual de fecha 24/07/2026.
  - Anexo soporte de aprobación en SECOP II de fecha 30/07/2026, correspondiente a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2336 de 2025.
  - Anexo: soporte de mesa técnica virtual de fecha 31/07/2026.
  - Anexo Informe mensual N 9 remitido Municipio de Sapuyes-Nariño
  - Anexo Extracto Bancario Mes de Julio-2026
  - Anexo Informe Financiero Mes de Julio -2026
  - Anexo Informe Mensual de Interventoría 1 Etapa II ejecución de Obra.
  - Anexo Informes semanales de interventoría 1-2-3-4

**JUSTIFICACION DE AVANCE**:

El comportamiento del avance correspondiente al periodo comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2026 se sustenta técnicamente en la puesta en marcha de la Etapa II – Ejecución de Obra del proyecto “Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo 1”. A partir del 6 de julio de 2026, con la formalización de las actas de reinicio e inicio de la

fase constructiva, se dio apertura operativa a los frentes de intervención, permitiendo materializar las actividades contempladas en los estudios y diseños aprobados y avanzar de manera progresiva en la secuencia constructiva definida para el proyecto. Durante el periodo se desarrollaron actividades de localización y replanteo, adecuación y excavación del terreno, cimentaciones, instalación de acero de refuerzo y ejecución de redes hidráulicas y de aguas lluvias, las cuales corresponden a actividades fundamentales para la conformación de la infraestructura y la habilitación de los frentes requeridos para las fases posteriores de ejecución.

El avance financiero reportado por la interventoría corresponde a una ejecución real de $41.025.090 (2,22 %) frente a una programación de $50.037.889 (2,71 %), presentándose una desviación de 0,49 puntos porcentuales, equivalente a $9.012.799. Esta diferencia se encuentra principalmente asociada a las restricciones derivadas del racionamiento del servicio de agua potable, condición que incidió en los rendimientos de actividades relacionadas con la preparación, fundición y curado de elementos de concreto. Como medida de manejo, el contratista implementó tanques de almacenamiento de agua, permitiendo mitigar la afectación y mantener la continuidad de las actividades.

Adicionalmente, mediante Modificatorio No. 02 del 31 de julio de 2026 por parte del municipio de Sapuyes -Nariño, se amplió el plazo contractual (derivados) hasta el 14 de diciembre de 2026, permitiendo disponer del tiempo técnico requerido para desarrollar integralmente las actividades previstas, incluyendo los procesos de control de calidad, curado de concretos, suministro de materiales y requerimientos asociados a las certificaciones RETIE y RETILAP.

En consecuencia, el avance ejecutado durante el periodo se considera técnicamente sustentado, toda vez que corresponde a actividades efectivamente desarrolladas y verificadas en campo por la supervisión e interventoría, en concordancia con el alcance y la secuencia constructiva prevista. La desviación identificada es susceptible de recuperación mediante la optimización de los frentes de trabajo, fortalecimiento de los rendimientos, control de la ruta crítica y seguimiento permanente a la programación, con el propósito de garantizar la continuidad de la ejecución y el cumplimiento de las metas físicas, financieras y contractuales del proyecto.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 26/02/2026 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| IM-Sapuyes-7-26<br>**ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA**<br>Supervisor Convenio No. 2336 de 2025<br>Periodo 1 al 31 de Julio -2026<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Ministerio –FONSECON | **LIZA YOHANA ROJAS OJEDA**<br>Apoyo Supervisión Convenio No. 2336 de 2025<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio –FONSECON |

# REMISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PAZ A LO BIEN CONVENIO 2336-25

Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda

Mié 01/07/2026 9:30

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGA 1-07-2026 FI...

ALCALDÍA DE SAPUYES

Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Recibido, gracias. | No lo puedo abrir. | No se puede abrir.

Responder | Reenviar

# SOLICITUD DE PRORROGA CONVENKIO INTERADMINISTRATIVO 2336-25

Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda

Vie 03/07/2026 10:44

| | | | |
|---|---|---|---|
| INT.C&L2026 - 002 INTERVE... 232 KB | CRONOGRAMA CONVENIO ... 256 KB | RESPUESTA SUPERVISION PR... 225 KB | CRONOGRAMA PAZ A LO BI... 625 KB |

Mostrar los 7 datos adjuntos (15 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Cordial saludo.

De manera atenta, nos permitimos remitir para su revisión y trámite la solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, junto con los documentos soporte que sustentan la necesidad de ampliar el plazo de ejecución.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o información adicional que se requiera.

ALCALDÍA DE SAPUYES

Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Responder Reenviar

solicitud Resumir este correo electrónico

Liza Yohana Rojas Ojeda

Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño <planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Dom 05/07/2026 21:26

Importancia alta

Cordial saludo Ingeniero Jhon deacuerdo a la solicitud de prorroga 1 favor ampliar justificacion solicitud de prorroga decuerdo a las observaciones realizadas .

Quedo atenta a sus comentarios


Interior

**Liza Yohana Rojas Ojeda**

liza.rojas@mininterior.gov.co

**Ingeniera Civil Contratista/Apoyo a la supervisión**

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.**

**Teléfono:** 601 242 74 00

Cra 8 No 12B – 31 Edificio Bancol Piso 10

**Bogotá, Colombia** www.mininterior.gov.co


Responder Reenviar

SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIO 2336-25 Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda; liyorojasojeda@gmail.com

Lun 06/07/2026 13:40

INT.C&L2026 - 002 INTERVE... 232 KB

RESPUESTA SUPERVISION PR... 225 KB

CRONOGRAMA CONVENIO ... 256 KB

SOLICITUD PRORROGA CON... 126 KB

Mostrar los 7 datos adjuntos (15 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

ALCALDÍA DE SAPUYES

Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Responder Responder a todos Reenviar

anexos convenio  Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda

Mié 08/07/2026 11:34

Buen dia,

ANEXOS PRORROGA 1 CONV 2336-25.pdf

Mediante el presente anexo documentos convenio 2336-25

ALCALDÍA DE SAPUYES

Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Recibido, gracias.  Muchas gracias.  Adjunto documento firmado.

Responder  Reenviar

# INFORME N8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2336-25

Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda

Sáb 11/07/2026 10:52

INFORME 8.rar
1 MB

Cordial saludo
Remito informe N8 correspondiente al mes de Junio del 2026 - Convenio Interadministrativo 2336 -25

ALCALDÍA DE SAPUYES
Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Recibido, gracias. | Gracias por el informe. | Informe recibido.

Responder | Reenviar

Accepted: Reunion de seguimiento semsnal convenio 2336-25 FASE 2 E... @ vie 17 jul 2026 16:00 - 16:30 (COT) (Liza Yohana Rojas Ojeda) Resumir este correo electrónico

Este evento ocurrió el **hace 3 semanas** (Vie 17/07/2026, de 16:00 a 16:30) Seguimiento

**Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño has accepted this invitation.**

Cordial saludo me permito informar que el día viernes 17 de julio se llevara a cabo reunión de seguimiento semanal, al convenio interadministrativo 2336-25.

Cordialmente,

ING LIZA YOHANA ROJAS OJEDA
MINISTERIO DEL INTERIOR

---

Reunión de Microsoft Teams
Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/27315096878112?p=54f1aXXJ3x7BsQMEHi
Id. de reunión: 273 150 968 781 12
Código de acceso: q39nw7Q5

---

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema
Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

---

**When**

viernes 17 jul 2026 · 16:00 – 16:30 (Hora estándar de Colombia)

**Location**

Reunión de Microsoft Teams
**View map**

**Guests**

REMISION DE INFORMES SEMANALES 1 Y 2 Resumir este correo electrónico

S

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - Nariño<planeacion@sapuyes-narino.gov.co>

Para: Liza Yohana Rojas Ojeda

Mar 28/07/2026 15:29

INFORMES SEMANAL 1 EJEC... 564 KB

INFORMES SEMANAL II EJEC... 2 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Cordial saludo

En el marco de la ejecución de la Etapa II (Construcción) del Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025, me permito remitir los Informes Semanales No. 1 y No. 2, correspondientes al seguimiento de la ejecución de las actividades de obra, así como de los componentes administrativo y ambiental desarrollados durante el periodo reportado.

ALCALDÍA DE SAPUYES
Jhon Steven Burgos C.
Secretario de Planeación
**Contacto:** 3163808227

Responder Reenviar

| | |
|---|---|
| ACTA No. | **12-2026 (Mesa de Trabajo Virtual )** |
| FECHA | 17-07-2026 |
| CIUDAD | Bogotá |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | **Convenio 2336-25** |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO"; |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | -- |
| MOTIVO: | Seguimiento y revisión Cronograma de Actividades convenio 2336-25, Etapa II Ejecución de obra |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
|---|---|
| Nombre: Ing. Andrés Hernández García<br>C.C.:<br><br>Cargo: Supervisor Convenio | Nombre: Jhon Steven Burgos Caicedo<br>C.C./ NIT:<br><br>Cargo: Supervisión Ente Territorial-Sapuyes Nariño |
| Nombre Ing. Liza Yohana Rojas Ojeda:<br>C.C.:39679285<br><br>Cargo: Apoyo Supervisión | Nombre:<br>C.C./ NIT:<br><br>Cargo: |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Se envía solicitud vía email a la Entidad Alcaldía municipal Sapuyes Nariño con el fin de realizar Seguimiento al cronograma contractual dentro de los plazos establecidos del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon con el municipio de Sapuyes – Nariño.

Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025
Proyecto: Centro de Convivencia Ciudadana – Municipio de Sapuyes (Nariño)
Fase II – Ejecución de Obra
Fecha: 17 de julio de 2026
Modalidad: Reunión virtual

**ORDEN DEL DÍA**

Verificación de quórum.
Seguimiento convenio 2336-25.
Definición de compromisos y cierre.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 4:04 p. m. del 17 de julio de 2026, se dio inicio a la reunión virtual de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2336-25, con la participación de la supervisión del Ministerio del Interior, la supervisión del Municipio de Sapuyes, el contratista y la interventoría, con el fin de revisar avance fase II ejecución de obra.

**Desarrollo de la reunión**

Se dio apertura a la reunión de seguimiento correspondiente al inicio de la Fase II – Ejecución de Obra del Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025, informando que actualmente se encuentra en trámite la aprobación de la Prórroga No. 1 del convenio y que, mientras culmina dicho proceso, se realizarán comités técnicos semanales con el fin de efectuar el seguimiento permanente al avance físico, técnico y contractual del proyecto.

Durante la sesión se reiteró la obligación de remitir oportunamente los informes semanales y mensuales de obra, acompañados del respectivo registro fotográfico, garantizando la coherencia entre el avance físico ejecutado, los porcentajes reportados y el cronograma aprobado, los cuales servirán como base para el seguimiento efectuado por la supervisión del Ministerio del Interior y la supervisión municipal.

La supervisión del Municipio de Sapuyes informó que las actividades de la fase constructiva iniciaron el 7 de julio de 2026 con labores de localización y replanteo del proyecto, continuando posteriormente con excavaciones para las cimentaciones del edificio de servicios, la maloca, la pista de trote y las redes hidrosanitarias. Asimismo, se indicó que se viene fortaleciendo el personal operativo con el propósito de incrementar el rendimiento de la obra durante las siguientes semanas.

Por parte de la interventoría se presentó el informe correspondiente a las dos primeras semanas de ejecución, indicando que la primera semana comprendió actividades preliminares de localización, replanteo, topografía, instalación del campamento y entrega de elementos de protección personal, actividades que hacen parte de los costos indirectos (A.I.U.) y, por tanto, no generan avance físico dentro del presupuesto del proyecto. Posteriormente se iniciaron las excavaciones, conformación de cimentaciones y redes externas del proyecto. Se reportó un avance físico acumulado del 1,11 %, evidenciándose un desfase temporal aproximado del 0,27 %, principalmente por la necesidad de realizar el desalojo de material existente en el terreno antes de iniciar las excavaciones programadas.

Frente al atraso identificado, el contratista manifestó que las actividades de excavación culminarían aproximadamente el 23 de julio de 2026 y que el cronograma será recuperado mediante la ejecución simultánea de diferentes frentes de trabajo, incluyendo la construcción de la estructura de la maloca en taller, el desarrollo independiente de las áreas administrativas y el adelanto de actividades eléctricas, buscando mantener la programación general del proyecto y cumplir los plazos contractuales previstos.

Durante la reunión también se revisó la programación financiera del convenio, recordando que el siguiente desembolso se encuentra condicionado al cumplimiento del 50 % del avance físico de obra, porcentaje que, de acuerdo con el cronograma vigente, se proyecta alcanzar durante la semana dieciséis de ejecución, aproximadamente en el mes de octubre de 2026. Igualmente, se aclaró el procedimiento para el reconocimiento del anticipo de la etapa de obra, indicando que este corresponde al 25 % del valor de la Fase II, conforme a las condiciones establecidas en los documentos contractuales modificatorios y una vez surtidos los requisitos administrativos correspondientes.

Finalmente, se acordó mantener reuniones virtuales de seguimiento con periodicidad semanal, remitir los informes con corte semanal para revisión de la supervisión municipal y del Ministerio del Interior, y continuar con el seguimiento permanente al cronograma, al avance físico y a la gestión contractual relacionada con la formalización de la prórroga y los trámites administrativos pendientes.

**Compromisos**

1. Continuar la ejecución de las actividades de excavación y cimentación conforme al cronograma ajustado.
2. Remitir semanalmente los informes técnicos con registro fotográfico, garantizando coherencia entre el avance físico, financiero y el cronograma de ejecución.
3. Implementar frentes simultáneos de trabajo para recuperar el desfase presentado en las primeras semanas de ejecución.
4. Adelantar las gestiones administrativas necesarias para la aprobación de la Prórroga No. 1 y la actualización de las garantías contractuales.
5. Mantener el seguimiento técnico semanal por parte de la supervisión municipal, verificando el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto.

En constancia, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la reunión.

Dentro de las obligaciones contraídas en este tipo de convenio se contemplan usualmente las siguientes responsabilidades:

(…).(…) CLAUSULA PRIMERA OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA ETAPA INICIAL DEL CONVENIO. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (…).

(...).

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Municipio Sapuyes Nariño** | Programación y cumplimiento Reunión de seguimiento semanal | **prioritario** |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma
Supervisor Municipio Sapuyes Nariño

Liza Yohana Rojas Ojeda
Apoyo Supervisión

Jhon Steven Burgos Caicedo
Supervisor Ente territorial Sapuyes -Nariño

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

| | |
|---|---|
| ACTA No. | **13-2026 (Mesa de Trabajo Virtual )** |
| FECHA | 24-07-2026 |
| CIUDAD | Bogotá |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | **Convenio 2336-25** |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO”; |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | -- |
| MOTIVO: | Seguimiento y revisión Cronograma de Actividades convenio 2336-25, Etapa II Ejecución de obra |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
|---|---|
| Nombre: Ing. Andrés Hernández García<br>C.C.:<br>Cargo: Supervisor Convenio | Nombre: Jhon Steven Burgos Caicedo<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: Supervisión Ente Territorial-Sapuyes Nariño |
| Nombre Ing. Liza Yohana Rojas Ojeda:<br>C.C.:39679285<br>Cargo: Apoyo Supervisión | Nombre:<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Se envía solicitud vía email a la Entidad Alcaldía municipal Sapuyes Nariño con el fin de realizar Seguimiento al cronograma contractual dentro de los plazos establecidos del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon con el municipio de Sapuyes – Nariño.

**Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025**
Proyecto: Centro de Convivencia Ciudadana – Municipio de Sapuyes (Nariño)
Fase II – Ejecución de Obra
Fecha: 24 de julio de 2026
Modalidad: Reunión virtual

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Realizar seguimiento al avance de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2336-25, revisando el cumplimiento del cronograma de obra, el porcentaje de avance físico ejecutado, las actividades desarrolladas durante la tercera semana de ejecución y las acciones implementadas para mitigar el atraso presentado frente a la programación contractual.

**ASISTENTES**

- Supervisión Ministerio del Interior.

- Supervisión del Municipio de Sapuyes – Secretaría de Planeación.
- Contratista de obra.
- Interventoría.
- Equipo técnico del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La reunión fue instalada por la supervisión del Ministerio del Interior, quien indicó que el encuentro tendría como finalidad efectuar el seguimiento semanal al desarrollo del convenio y conocer el estado de avance de la ejecución de las obras. Posteriormente se concedió el uso de la palabra a la supervisión de la entidad territorial para presentar el informe correspondiente a la tercera semana de ejecución.

La Secretaría de Planeación del Municipio de Sapuyes informó que la obra se encuentra cursando la tercera semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado actividades de excavación mecánica, excavaciones para las redes sanitarias, preparación para el suministro e instalación de tuberías y figurado de acero para los elementos estructurales de cimentación. Igualmente manifestó que las actividades ejecutadas corresponden a lo programado para esta etapa y que el avance previsto acumulado para la semana era del 1,82 %.

Posteriormente, el contratista realizó la presentación del informe técnico semanal, indicando que durante el periodo comprendido entre el 20 y el 24 de julio de 2026 se culminaron las excavaciones requeridas para el bloque de servicios, las zapatas y vigas de cimentación, así como la preparación del acero de refuerzo para cimentaciones, incluyendo el corte y figurado de varillas conforme a los diseños estructurales aprobados. Asimismo, informó que se realizó el retiro y disposición final del material excavado, se ejecutaron las excavaciones correspondientes a las instalaciones sanitarias y se implementó la señalización preventiva del frente de obra.

Durante la exposición también se informó que, conforme al estudio de suelos, se evidenció la presencia de material rocoso de gran magnitud en algunos sectores del proyecto, situación que fue atendida mediante el uso de maquinaria y labores manuales, sin impedir la continuidad de las actividades programadas.

Respecto al seguimiento del cronograma, el contratista presentó el comportamiento de los porcentajes programados y ejecutados, indicando que el avance físico acumulado alcanzó el 1,62 %, frente a un avance programado del 1,82 %, generando un atraso acumulado del 0,20 %. Se explicó que dicho desfase corresponde principalmente al aplazamiento del inicio de las actividades de solado, el cual ha sido compensado parcialmente mediante la ejecución anticipada de excavaciones y la preparación del acero de refuerzo.

La supervisión del Ministerio del Interior solicitó aclaración sobre la diferencia entre los porcentajes reportados durante la reunión anterior y los presentados en el informe de la semana tres. El contratista explicó que el porcentaje del 0,77 % correspondía exclusivamente al atraso registrado en la primera semana de ejecución, mientras que durante la segunda semana se logró una compensación parcial alcanzando un acumulado ejecutado del 1,11 %. Para la tercera semana, el

avance acumulado corresponde al 1,62 %, manteniéndose un atraso del 0,20 % frente al cronograma contractual.

Adicionalmente, la supervisión recordó el compromiso adquirido en la reunión anterior relacionado con la implementación de medidas para disminuir el retraso presentado. En respuesta, el contratista informó que se incrementó el personal en obra, contando actualmente con 10 trabajadores, distribuidos en diferentes frentes de trabajo, lo que ha permitido avanzar simultáneamente en actividades de excavación, armado de acero y preparación para las instalaciones sanitarias. Asimismo, indicó que el ingreso del material correspondiente a la tubería permitirá aumentar el rendimiento de la ejecución durante las siguientes semanas.

Finalmente, la supervisión del Ministerio del Interior manifestó la importancia de mantener el ritmo de ejecución con el propósito de recuperar completamente el atraso presentado y cumplir las metas establecidas dentro del cronograma contractual. Por su parte, el contratista reiteró el compromiso de habilitar tres frentes simultáneos de trabajo (maloca, bloque de servicios y pista de trote), estrategia que permitirá incrementar el rendimiento de la obra y alcanzar los porcentajes programados.

No presentándose observaciones adicionales por parte de la supervisión de la entidad territorial ni de los demás asistentes, se dio por finalizada la reunión, acordando realizar un nuevo seguimiento durante la semana siguiente.

**COMPROMISOS**

1. El contratista continuará ejecutando las actividades conforme al cronograma aprobado, fortaleciendo los frentes de trabajo para reducir el atraso acumulado.
2. Mantener el seguimiento semanal al porcentaje de avance físico y al cumplimiento del cronograma de obra.
3. Presentar en la siguiente reunión el reporte actualizado del avance físico ejecutado y las acciones implementadas para recuperar el retraso.
4. La supervisión del Ministerio del Interior continuará efectuando el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la ejecución del convenio.

En constancia, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la reunión.

Dentro de las obligaciones contraídas en este tipo de convenio se contemplan usualmente las siguientes responsabilidades:

> (…).(…) CLAUSULA PRIMERA OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA ETAPA
> INICIAL DEL CONVENIO. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (…).


(...).

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Municipio Sapuyes Nariño** | Programación y cumplimiento Reunión de seguimiento semanal | **prioritario** |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma
Supervisor Municipio Sapuyes Nariño



Liza Yohana Rojas Ojeda
Apoyo Supervisión



Jhon Steven Burgos Caicedo
Supervisor Ente territorial Sapuyes -Nariño

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

| | |
|---|---|
| ACTA No. | **14-2026 (Mesa de Trabajo Virtual )** |
| FECHA | 31-07-2026 |
| CIUDAD | Bogotá |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | **Convenio 2336-25** |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO”; |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | -- |
| MOTIVO: | Seguimiento y revisión Cronograma de Actividades convenio 2336-25, Etapa II Ejecución de obra |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Contratista/Convenido** |
|---|---|
| Nombre: Ing. Andrés Hernández García<br>C.C.:<br>Cargo: Supervisor Convenio | Nombre: Jhon Steven Burgos Caicedo<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: Supervisión Ente Territorial-Sapuyes Nariño |
| Nombre Ing. Liza Yohana Rojas Ojeda:<br>C.C.:39679285<br>Cargo: Apoyo Supervisión | Nombre:<br>C.C./ NIT:<br>Cargo: |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Se envía solicitud vía email a la Entidad Alcaldía municipal Sapuyes Nariño con el fin de realizar Seguimiento al cronograma contractual dentro de los plazos establecidos del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon con el municipio de Sapuyes – Nariño.

**Fecha**: 31 de julio de 2026
**Hora:** 3:56 p. m.
**Modalidad**: Reunión virtual
**Proyecto:** Etapa II – Convenio Interadministrativo No. 2336-25
**Municipio:** Sapuyes – Nariño

**1. OBJETO DE LA REUNIÓN**

Realizar seguimiento al estado de ejecución del proyecto correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 2336-25, revisando los avances técnicos y administrativos registrados durante la semana de seguimiento, las situaciones presentadas en el desarrollo de las actividades de obra, el comportamiento de los indicadores de ejecución, la documentación pendiente y las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del plazo contractual vigente.

**2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Durante la reunión, la Secretaría de Planeación Municipal de Sapuyes – Nariño presentó el avance de las actividades correspondientes al cierre de la semana cuatro de ejecución de la Etapa Dos del convenio.
En materia técnica, se informó que fueron finalizadas las excavaciones correspondientes a la cimentación de la Maloca, el edificio de servicios y las zonas destinadas a los filtros de drenaje. De igual manera, se reportó la ejecución de actividades relacionadas con las instalaciones sanitarias y la instalación de tubería hidráulica de una pulgada, así como el figurado de acero requerido para las actividades de cimentación.

No obstante, durante el desarrollo de las excavaciones manuales se presentó una condición particular del terreno relacionada con la presencia de material rocoso de gran magnitud. De acuerdo con lo manifestado por la arquitecta Jessica Stephanie Vanegas Góngora, esta condición fue identificada principalmente en el sector cercano a la Institución Educativa de El Espino. Se indicó que, si bien los sondeos y las condiciones identificadas en el estudio de suelos fueron adecuados para las demás áreas evaluadas, en este sector se encontró una condición geológica que no había sido prevista en la magnitud inicialmente observada.

Frente a esta situación, se dejó constancia de la importancia de realizar el seguimiento técnico correspondiente y de documentar adecuadamente las condiciones encontradas en campo, de manera que cualquier situación que pueda incidir en el desarrollo del cronograma quede debidamente soportada dentro de los informes de ejecución.

**3. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA**

Otro de los aspectos analizados correspondió al suministro de agua requerido para el desarrollo de las actividades constructivas. Se informó que, debido a la situación de escasez de agua y a las condiciones propias de la temporada seca, actualmente se dispone de un tanque provisional con capacidad aproximada de 200 litros.
Con el propósito de evitar afectaciones en las actividades de obra, particularmente en aquellas relacionadas con la fundición de zapatas, se informó que se gestionó la adquisición y traslado de dos tanques adicionales con capacidad de 1.000 litros cada uno, cuya llegada se tiene prevista para la siguiente semana.
En este sentido, se acordó que el contratista y la interventoría deberán implementar las medidas necesarias para garantizar un almacenamiento suficiente de agua en el sitio de obra, procurando prevenir posibles interrupciones o retrasos derivados del desabastecimiento.

**4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN**

En materia de seguridad, se informó que fueron instalados catorce (14) tableros informativos y de seguridad en el área de intervención, con el propósito de advertir y prevenir riesgos tanto para el personal vinculado al proyecto como para los peatones y demás personas que transitan por la zona.
Se resaltó la necesidad de mantener las condiciones de señalización y seguridad durante toda la ejecución de las actividades, especialmente teniendo en cuenta la ubicación del proyecto y la interacción con la comunidad.

**5. REVISIÓN DE AVANCES E INDICADORES DE EJECUCIÓN**

Durante la revisión de los informes semanales se identificó una inconsistencia en el porcentaje de avance reportado inicialmente para la semana cuatro. Luego de realizar la verificación correspondiente, se estableció que el porcentaje real ejecutado durante dicha semana corresponde al 0,60 %, y no al 0,93 % reportado inicialmente.

Como resultado de la corrección, el avance acumulado general del proyecto corresponde al 2,22 %, presentándose un atraso del 0,49 % frente a la programación establecida.
Sobre este particular, Ing Liza Yohana Rojas Ojeda manifestó la importancia de que la interventoría y los responsables de la elaboración de los informes realicen una revisión detallada de los porcentajes de ejecución física y financiera antes de su remisión, con el fin de evitar inconsistencias que puedan afectar el seguimiento contractual, los procesos de auditoría y la información que debe ser reportada al Ministerio del Interior.

Se solicitó igualmente a Santiago Pantoja realizar los ajustes correspondientes en los informes semanales, dejando claramente establecidos los porcentajes de ejecución, atraso y acumulado real del proyecto.

**6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TALLER**

Durante la reunión, Francisco Javier Mora Castro planteó la necesidad de establecer claridad respecto de la forma en que deben documentarse y valorarse las actividades que se ejecutan fuera del sitio de obra, particularmente aquellas relacionadas con el figurado y preparación del acero y demás trabajos desarrollados en taller para la construcción de la Maloca.
Al respecto, se consideró necesario que estas actividades sean debidamente soportadas mediante registros, evidencias y documentación técnica que permitan establecer su avance real y su correspondencia con las actividades previstas en el cronograma, evitando que trabajos efectivamente ejecutados sean interpretados como actividades no realizadas o como atrasos del proyecto.

**7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL**

En relación con los compromisos administrativos, la Secretaría de Planeación Municipal informó que el informe semanal No. 3 se encontraba pendiente de remisión y que se adelantarían las gestiones necesarias para su entrega, así como la posterior remisión del informe correspondiente a la siguiente semana, una vez surtida la revisión respectiva.
De igual manera, se reiteró la necesidad de mantener actualizada la plataforma SECOP II, incorporando oportunamente la documentación contractual y administrativa que corresponda.
Se informó igualmente que las minutas de contratación derivada ya se encuentran disponibles y que se gestionará su entrega al equipo jurídico municipal para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes.

**8. PRÓRROGA DEL CONVENIO Y CRONOGRAMA FINAL**

Durante la reunión se informó que la Prórroga No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 2336-25 fue aprobada y registrada, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
No obstante, se indicó que la meta establecida para la entrega física del proyecto es el 14 de diciembre de 2026, por lo que se requiere mantener un seguimiento permanente al cronograma y

adoptar oportunamente las medidas necesarias para evitar que las situaciones técnicas, administrativas o de suministro puedan afectar dicha meta.
De manera especial, se resaltó la necesidad de priorizar la gestión y obtención de las certificaciones RETIE y RETILAP, considerando que estos documentos constituyen un requisito importante para la culminación y entrega final del proyecto. Se solicitó a Francisco Javier Mora Castro adelantar las gestiones correspondientes con la debida anticipación, evitando que su trámite se convierta en una limitante para la entrega.

**9. COMPROMISOS Y ACUERDOS**

Como resultado de la reunión, se establecieron los siguientes compromisos:
Contratista e interventoría: Implementar las medidas necesarias para garantizar el almacenamiento suficiente de agua en el sitio de obra y prevenir desabastecimientos.
Santiago Pantoja: Ajustar los informes semanales, corrigiendo los porcentajes de ejecución, atraso y acumulado de acuerdo con los valores verificados durante la reunión.
Secretaría de Planeación Municipal de Sapuyes – Nariño: Gestionar y remitir el informe semanal No. 3 y el informe No. 4, una vez finalizada la revisión correspondiente.
Secretaría de Planeación Municipal de Sapuyes – Nariño: Coordinar con el equipo jurídico municipal la entrega y gestión de las minutas correspondientes a la contratación derivada.
Francisco Javier Mora Castro: Priorizar la gestión de las certificaciones RETIE y RETILAP, con el fin de garantizar su disponibilidad antes de la entrega final del proyecto.
Contratista e interventoría: Mantener actualizada la información contractual y de ejecución en la plataforma SECOP II y garantizar la trazabilidad documental del proyecto.
Interventoría: Fortalecer la revisión de los informes técnicos y financieros antes de su remisión, verificando que los porcentajes y valores reportados correspondan con el avance real de la obra.
Se acordó que los informes semanales deberán ser remitidos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de corte, mientras que los informes mensuales deberán ser entregados a la entidad territorial, a más tardar, el sexto (6.º) día del mes siguiente, con el fin de permitir su revisión y posterior remisión al Ministerio del Interior dentro de los tiempos establecidos.

Finalmente, se reiteró a los participantes la importancia de mantener una coordinación permanente entre la Secretaría de Planeación Municipal, contratista e interventoría, realizando seguimiento oportuno a las actividades técnicas, administrativas y financieras del proyecto.

Se hizo énfasis en que, teniendo en cuenta la prórroga aprobada hasta el 31 de diciembre de 2026 y la meta de entrega física prevista para el 14 de diciembre de 2026, resulta necesario fortalecer el control del cronograma, atender oportunamente las situaciones identificadas en obra y garantizar la entrega completa de los soportes técnicos, administrativos y documentales requeridos.
Agotados los temas objeto de la reunión, se da por terminada la sesión, dejando constancia de los compromisos establecidos para su respectivo seguimiento.

En constancia, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la reunión.

Dentro de las obligaciones contraídas en este tipo de convenio se contemplan usualmente las siguientes responsabilidades:

(…).(…) CLAUSULA PRIMERA OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA ETAPA
INICIAL DEL CONVENIO. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (…).


(...).


**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Municipio Sapuyes Nariño** | Programación y cumplimiento Reunión de seguimiento semanal | **prioritario** |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma
Supervisor Municipio Sapuyes Nariño





Liza Yohana Rojas Ojeda
Apoyo Supervisión

Jhon Steven Burgos Caicedo
Supervisor Ente territorial Sapuyes -Nariño

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

| INFORME DE EJECUCIÓN |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No.2336 DE 2025, MUNICIPIO DE SAPUYES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO. | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Corregimiento El Espino del Municipio de Sapuyes<br>SAN FRANCISCO O RECUERDO | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE SAPUYES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | $ 2.450.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | $ 2.450.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/11/2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | JHON STEVEN BURGOS CAICEDO | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 58625 | 07/11/2025 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 9025 | 07/11/2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 96-44-101200652 | 11/11/2025 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 11/11/2025 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | FECHA: 29/07/2026 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 30/06/2027 | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 149.827.981,00 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 84.123.457,00 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.846.883.748,00 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA DE OBRA** | $ 369.164.814,00 | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | |
| **LINK DEL CONVENIO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | |

| | |
|---|---|
| **LINK CONTRATACION ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53141&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4Uhmj5C6_jTEss4KRHiiIrz5Znx2UhUmA2Qzv34cHe26TMd-Dws1C-pn06Ovcaq7ELpWbWmxB9EyHumsxJDhOZ_E6HGa_8OULCKk0NgqHOIRGVqOZlUu3tAzG_z70BhsnT-gLoYBSWfOQG49ez-bjl_MQnKVX6AJiDAN8i3-THM2iD0wCHkhzQ-xtRnQqaMb_HTbsi_k7bQdZSdEM5o9uRAPrb97TPPbsrxmIJH_1-7y8N1LgLyOuaA0oBoG4COx_ZPdehzYZNo3RLP9Vpd4OQmJa0qAQFnssXGoy-Zasjr2a_5mloe34tkvA6EW9TaEP2tL9upBZwL8xDfZn1SwG6fVQlndO17x4liE2tiT6d1uyhKjJZ8WENmI2nFMliGAkZq0e2KmMW74p0lNe_4t1_PRy11X8VVhY8aWoxaCczcIdKir7atKGuopT2W0AobiSBGDYNZIcy2X7H-BUwWPjL25bd_3-nljDFoqqRmWIbULMpxlvCz0S-FVmZlKSwDeEzKbNfESfjveMde3eg1ybSLPxigWlaxyPx81bo52Lub7_xDIQeoK0kkDbwAr-c3dHsOW30bzdwpxJVn7er21S_XsosNzeq5uHl3IPAtlSXIm_dhPyv1d1VaMKQH97Z6lOwMUov-zwv2iUMJG7eOmRizXYF6l1OLOIttq9BfcGyOzZtozEAdxw5KDeqnBgaMJjd0bsd9ar3s0ZxOvsPfxYir3hNqCgC58GXt7DEtVQKrZNl-i7QllZ9BnZxRyVltkNO4rqcD5w_oPISlcZshzk8jEDTiXFE0GOrKDen0cQnz_SNcxGsOgxuRJJExEVmWK3GcrgWMwFfjbRKC1q_SJ3jUtZ6jo1lDAeDBA3RnIQbrs7wksCsadsV_7mS9IXAdkb6F0ujHwislSDsg7e5EDG23wTP7lEo9cvJevKGhbn0qJflRoN8HGYHNRgOpalcb3cRIBSRBY1vpeLOo04o9cXTQmri7wwOXdfMtXfepEYD3lYnE9lI5WLbr9QUeKBy1EudOvxuEUI9f59d2rI34wmo2lpu1DQraEgwa1kjC_dNBAWdKOHVQVvHs0ZCG1WZa4JhBiUpMJG-P47YT-pMnnrprXWB5g |
| **LINK CONTRATACION INTERVENTORIA ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14671743&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6CcO-3_8FxFINN6n1ll-YZ41jNUuRH9QJ7vHofXaSvMSJ62TAFjL00pczbhd00qP979BA4yBrCZNyVbyl9eEe6m8vZiyfPyMKqXcghYRbYtguXnZxsh-7FSCx4qmuV0P937jQBRNyXHLOVfsobFi6YBUampCqnxdb_088FRkU54Vt-NiNCGFRd-STGToqKKFlM-Fzs6u3W7DQWjZfZFAvjJxJsBt8tVjy4ztbAKj1Mnrtd9rtD2vdqKC2NbZmaTqDzAg57RZma1THXQE3egGiGqeqN7nAoIjeXHB6G5TR8J7r7DPjnhsehmVvxb8wUCAl9WLCESy-TgX9uulYG07ReKg9nwJpP0oek-sgRY79R9TxtfOhxX3MSr7L39mQRTzvuEc788rwtKr9qoAclxv6X8yiO8WypGStRi7aTBkhTm5pJkZy1Jq9S5mwOuHIfTEG-Lf5dbblHnBtJrOlhszS-_1VskVFqH2anqIslkh5ZQ-QOy78giAiN7kZ565m2phs9Ckqi-zfOD6zgTfveHlgXm9pXlFYmzVyJVGQUN6FjU7xrrQvSAzZ0V7CxLSqHLUacPU1IaxVbADQbIXsUvd-AE0CEs1YQcgeHHXMHDjRVKrj4-bnBDBYpbc8nCuE-mNMwMJeEjCQiED2rs2q2Md3GXHyiuu_WR2oOXjmzZc7y1QirJgad7dpuR2x9MDMaytHM9Xe3LkOUGrT9t0rjkWXVsafvn1jeCWa8GXw3rT74fRWx2yLHsCt02VNGPRCzT2qFNTiRO2RNinPzlPnS97STEBkcfwxphVxB88I5NKUc0B47C6PBfhy97RK0SbGha4vL_CuRRFm4vRhBTvvFvH9E8Lxmqh2VutI2IYyBz-3-Tq1_77tuw1-H1TXvdN8HQLeGc6lRlhFZYOJ7RusBIDGxUgWbcnxqPzdkKNQ-p2Q0HJpQ_SfBvELfj7a6v4wxgNKV6DweQCBOWTu8qal1W0snLmb3Jc02P9hqGa9RXm02LFA4-urQCviUmlOQURdwQONtCTj88oevsmp7TXJwfCW8pAVKLF6wPVdaIE0FW6ENUtIY2FD43CbuoxPcEtYkoJv3pdL3Gb-92fuUJqO0OsgsGw9tVQ |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 26/12/2025 | $ 857.500.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 0% | 30/04/2026 | $ 735.000.000,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de | 50% | DD/MM/AAAA | $612.500.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD). G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | 100% | DD/MM/ AAAA | $245.000.000,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 1.592.500.000 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6 ANEXO 1**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 96-44-10100652 | Cumplimiento | $ 490.000.000 | 07/11/2025 | 30/06/2027 |
| | Calidad de servicio | $ 0,00 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| **No. del contrato** LP-2025-002 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | Estudios y Diseños | $149.827.981,00 |
| | | | Obra | $1.846.883.748 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | | | $ 1,996,711,729 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 | 31/07/2026 | | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 20/05/2026 | | |
| | REINICIO 1 | 06/07/2026 | | |
| **Fecha de terminación inicial del contrato** | 31/07/2026 | | | |
| **Fecha de terminación según Otro Si N 002 del contrato** | 14/12/2026 | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | | $ 1,996,711,729 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** NIT. 860.524.654-6 | | | |
| **PÓLIZA No.** | 775-74-994000000913 | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 09/03/2026 | | | |

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| **No. del contrato** CM-2026-001. | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | Estudios y Diseños | $ 84.123.457,00 |
| | | | Obra | $ 369.164.814,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO C&L SAPUYES | | R.L SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/03/2026 | | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 31/07/2026 | | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 20/05/2026 | | |
| | REINICIO 1 | 06/07/2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha de terminación Inicial del contrato** | 31/07/2026 | |
| **Fecha de terminación según Otro Si N 002 del contrato** | 14/12/2026 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $453.288.271 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** NIT 860.009.578-6 | |
| **PÓLIZA No.** | **41-44-101303666** | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **06/03/2026** | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | SI | NO |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO | JUNIO 2026 | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | X | |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | X | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | X | |
| OTROS | | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **PROGRAMADO DE EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2336 DE 2025** | **9.5** |
| **PROGRAMADO DE EJECUCIÓN - ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS – LP -002 - 2026** | **100%** |
| **PROGRAMADO DE EJECUCIÓN - ETAPA OBRA – LP -002 - 2026** | **2.22%** |

**% EJECUTADO DE OBRA**

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2026, se dio inicio formal a la Etapa II – Ejecución de Obra del proyecto denominado “Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo 1”, localizado en el corregimiento de El Espino, municipio de Sapuyes, departamento de Nariño. Esta etapa inició con la suscripción del Acta de Reinicio y del Acta de Inicio de la Etapa II el día 6 de julio de 2026, una vez superado el periodo de suspensión que se extendió desde el 20 de mayo hasta el 6 de julio de 2026.

Durante el periodo evaluado, el contratista inició las actividades constructivas correspondientes a la preparación y adecuación del terreno, cimentación e instalación de redes técnicas, de conformidad con los estudios, diseños y especificaciones técnicas aprobados para el proyecto. Entre las principales actividades desarrolladas se encuentran la localización y replanteo, la nivelación y verificación altimétrica del terreno, las excavaciones manuales y mecánicas, el desalojo del material producto de excavación, la instalación y conformación del acero de refuerzo PDR 60, así como la ejecución de la red hidráulica en tubería PVC de 1 pulgada y la red de aguas lluvias en tubería de 6 pulgadas.

De acuerdo con el seguimiento efectuado durante el periodo, las actividades de excavación manual, excavación mecánica, desalojo de material, red hidráulica de 1” y red de aguas lluvias de 6” presentan un 100 % de ejecución respecto de las cantidades previstas para cada actividad, mientras que el acero de refuerzo PDR 60 registra un 18,18 % de ejecución, encontrándose este último en proceso de desarrollo.

En términos de avance fisico-financiero, con corte al 31 de julio de 2026, la Etapa II presenta una inversión real acumulada de $41.025.090, equivalente al 2,22 % del valor correspondiente a la ejecución de obra, frente a una inversión proyectada acumulada de $50.037.889, equivalente al 2,71 %. Lo anterior representa un desfase del 0,49 %, correspondiente a $9.012.799, asociado principalmente a las restricciones generadas por el racionamiento del servicio de agua potable en la zona, situación que afectó actividades que requieren disponibilidad continua del recurso, particularmente los procesos de mezcla, fundición y curado del concreto.

Como medida de contingencia frente a esta situación, el contratista implementó tanques de almacenamiento de agua de gran capacidad en el campamento de obra, con el propósito de disponer de una reserva durante las horas de interrupción del servicio y garantizar la continuidad de actividades constructivas, especialmente los procesos de fundición, curado e higiene del personal.

En materia contractual, durante el periodo se formalizó mediante Modificatorio No. 02, suscrito el 31 de julio de 2026, la prórroga del plazo de ejecución de los contratos de obra e interventoría hasta el 14 de diciembre de 2026, con el propósito de garantizar el tiempo requerido para el desarrollo de los procesos constructivos de la Etapa II, considerando, entre otros aspectos, los tiempos de curado de concretos, las condiciones climáticas, la logística de suministro de materiales, las pruebas de calidad y las certificaciones RETIE y RETILAP.

En consecuencia, al cierre del periodo reportado, el convenio presenta un avance inicial de la Etapa II, con los primeros frentes de obra habilitados y actividades de movimiento de tierras, cimentación y redes técnicas en ejecución. Si bien se presenta un desfase frente a la programación contractual, la interventoría considera que este es recuperable, razón por la cual se requiere mantener la continuidad de los frentes de trabajo y adoptar medidas de recuperación que permitan reducir el atraso durante los siguientes periodos y garantizar el cumplimiento de las metas fisicas y financieras previstas para la ejecución del proyecto.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

El avance registrado durante el periodo comprendido entre el 6 y el 31 de julio de 2026 se encuentra justificado en el inicio efectivo de la Etapa II – Ejecución de Obra del proyecto “Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana ‘Paz a lo Bien’ Tipo 1”, posterior a la suscripción del Acta de Reinicio y del Acta de Inicio de la etapa constructiva el 6 de julio de 2026. Lo anterior permitió reactivar los frentes de trabajo y dar continuidad a las actividades previstas en los estudios, diseños y programación contractual.

Durante el periodo se desarrollaron actividades correspondientes a la fase inicial de ejecución, principalmente localización y replanteo, nivelación y adecuación del terreno, excavaciones manuales y mecánicas, desalojo de material, actividades de cimentación, instalación de acero de refuerzo y ejecución de redes hidráulicas y de aguas lluvias. Estas actividades constituyen los primeros componentes necesarios para habilitar los diferentes frentes constructivos y permitir la continuidad de las etapas posteriores de cimentación, estructura e instalaciones del proyecto.

De acuerdo con el informe de interventoría, al cierre del periodo se presenta una inversión real acumulada de $41.025.090, equivalente al 2,22 % de la Etapa II, frente a una inversión proyectada de $50.037.889, equivalente al 2,71 %, generándose un desfase del 0,49 %, correspondiente a $9.012.799. Este comportamiento se encuentra asociado principalmente a las condiciones operativas externas derivadas del racionamiento del servicio de agua potable, el cual incidió directamente en el desarrollo de actividades que requieren disponibilidad continua del recurso, particularmente aquellas relacionadas con la preparación, fundición y curado de elementos de concreto.

La situación descrita afectó los rendimientos diarios de las cuadrillas y el ritmo de ejecución de algunas actividades de la ruta crítica; sin embargo, el contratista implementó como medida de contingencia la instalación de tanques de almacenamiento de agua de gran capacidad, permitiendo disponer de una reserva durante los periodos de interrupción del servicio y mantener la continuidad de los procesos constructivos.
Adicionalmente, durante el periodo se formalizó la prórroga del plazo contractual hasta el 14 de diciembre de 2026, mediante el Modificatorio No. 02 suscrito el 31 de julio de 2026. Esta ampliación permite disponer del tiempo necesario para desarrollar integralmente las actividades de la Etapa II, considerando las condiciones propias del proceso constructivo, los tiempos requeridos para el curado

de concretos, las variaciones climáticas, la logística de suministro de materiales, las pruebas de calidad y las gestiones asociadas a las certificaciones RETIE y RETILAP.

En este sentido, el avance reportado para el periodo se considera técnicamente sustentado y acorde con el inicio de la etapa constructiva, teniendo en cuenta que durante el mes se habilitaron y ejecutaron los primeros frentes de obra. El desfase identificado frente a la programación contractual se considera susceptible de recuperación, para lo cual se requiere mantener la continuidad de las actividades, optimizar los frentes de trabajo y realizar seguimiento permanente a los rendimientos y a la ruta crítica, con el propósito de reducir progresivamente la diferencia acumulada y garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el proyecto.

Por lo anterior, el avance ejecutado durante el periodo objeto de seguimiento se encuentra respaldado por actividades efectivamente desarrolladas en campo, verificadas por la interventoría y asociadas directamente al alcance contractual de la Etapa II, manteniéndose el proyecto en fase activa de ejecución y con condiciones contractuales vigentes para continuar con el desarrollo de las obras programadas.

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

**JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**
Supervisor Convenio No. 2336 de 2025
Secretaria de Planeación Y Obras
Administración Municipal de Sapuyes

# DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.05

## CUENTA DE AHORROS
1013 0004 5107

INFORME DEL MES: JULIO /2026

Apreciado Cliente
**MUNICIPIO SAPUYES**
tesoreria@sapuyes-narino.gov.co

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $1,593,064,281.56 |
| Más Créditos | $131,612.35 |
| Menos Débitos | $461,731,254.00 |
| Nuevo Saldo | $1,131,464,639.91 |
| Saldo Promedio | $1,548,380,611.81 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 29 07 | $ 8,670.00- | 3051 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 07 | $ 461,720,937.00- | 2797 | Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8000991496 PAGO DE PROVEEDORES 181 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 07 | $ 131,612.35+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 07 | $ 1,647.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |




LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2336 DE 2025**

**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO.**

**INFORME FINANCIERO DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2026**
**MUNICIPIO DE SAPUYES-NARIÑO**

**PROYECTO (S):**

| |
|---|
| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO. |
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO. |

CUENTA ( AHORROS) No.: 0550101300045107 DEL BANCO: DAVIVIENDA

**VALOR CONVENIO** **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

| | | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | | 26/11/2025 | GIRO 1 | $ 857.500.000,00 |
| | | 30/04/2026 | GIRO 2 | $ 735.000.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **TOTAL GIRADO MINISTERIO** | **$ 1.592.500.000,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA : 0550101300045107 A LA FECHA (4)** **$ 1.592.500.000,00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| No. LP-2025-002 | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES - RL CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA | $ 1.996.711.729,00 | | $ 1.996.711.729,00 |
| No. CM-2026-001 | CONSORCIO C&L SAPUYES | $ 453.288.271,00 | | $ 453.288.271,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 2.450.000.000,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. LP-2025-002 | PAGO ANTICIPO (25%) DEL VALOR DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA: CONTRATO DE OBRA No. LP - 2025 - 002 | 2797 | 2026001181 | 29/07/2026 | $ 461.720.937,00 | $ 0,00 | $ 461.720.937,00 |
| No. LP-2025-002 | COBRO PROVEEDORES OTROS BANCOS | 3051 | | 29/07/2026 | $ 8.670,00 | $ 0,00 | $ 8.670,00 |
| | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (3)** | | | | | **$ 461.729.607,00** | **$ 0,00** | **$ 461.729.607,00** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/12/2025 | $ 14.107,25 |
| 31/01/2026 | $ 72.888,69 |
| 28/02/2026 | $ 66.034,19 |
| 31/03/2026 | $ 72.900,50 |
| 30/04/2026 | $ 72.342,52 |
| 30/05/2026 | $ 135.387,85 |
| 30/06/2026 | $ 130.620,56 |
| 31/07/2026 | $ 131.612,35 |
| 31/07/2026 | -$ 1.647,00 |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 694.246,91** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (4)** **$ 1.592.500.000,00**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (4)** **$ 461.729.607,00**

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (2)** $ 694.246,91

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 694.246,91**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 1.131.464.639,91**

**SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER**

**OBSERVACIONES**

| |
|---|
| EL VALOR DEL SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO SE LIQUIDA AL FINALIZAR EL CONVENIO |

**FIRMA**

TESORERO / SEC PLANEACIÓN

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

**MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO OBRA No. LP-2025-002 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO".**

---

Entre los suscritos a saber: **MUNICIPIO DE SAPUYES**, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcaldesa Municipal **LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.085.280.717 de Pasto (N), actuando en nombre y representación del Municipio de Sapuyes, Departamento de Nariño, en su calidad de Alcaldesa Municipal, según credencial expedida por el órgano competente, cargo del cual tomó posesión de acuerdo a las formalidades que establece la ley, debidamente autorizado para contratar, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; por otra parte, **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** identificada con NIT. 902033941-1, representado legalmente por **CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.269.741 de Pasto (N), quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos celebrar el presente Modificatorio No. 002 al contrato de obra cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO" que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; para prorrogar el plazo de ejecución del mismo, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **1.** Que, la Alcaldesa del Municipio de Sapuyes (N) dio apertura, mediante Resolución No. 11 del cinco (05) de enero de 2026, a la Licitación de Obra Pública N° LP-2025-002, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO". **2.** Que, para amparar las obligaciones derivadas del contrato resultante del citado proceso de selección, se expidió el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2026000018 del dos (02) de enero de dos mil veintiséis (2026). **3.** Que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones en el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co, informando a los interesados sobre el objeto, alcance y condiciones generales de participación del proceso. **4.** Que, surtido el procedimiento de recepción de propuestas y conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, el comité evaluador procedió a la verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación de los proponentes, emitiendo el correspondiente informe de evaluación, en el cual ocupó el primer orden de elegibilidad el proponente **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** identificada con NIT. 902033941-1, representado legalmente por **CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.269.741 de Pasto (N). **5.** Que, de conformidad con el Estatuto Contractual y lo dispuesto en los pliegos de condiciones, correspondía a la Entidad adjudicar el contrato al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad. **6.** Que, mediante Resolución No. 031 del treinta (30) de enero de 2026, se adjudicó el contrato ibidem a **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** identificada con NIT. 902033941-1, representado legalmente por **CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.269.741 de Pasto (N), suscribiéndose el respectivo Contrato de Obra N° LP-2025-002 el día veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiséis (2026). **7.** Que, el valor total del Contrato de Obra No. LP-002-2025 se pactó en la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 1.996.711.729,00), con un plazo de ejecución de 6 meses, de los cuales 1 mes corresponde a la Etapa I de Estudios y Diseños y 5 meses a la Etapa II de Ejecución de Obra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **8.** Que, el día doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Modificatorio No. 01 al Contrato de Obra No. LP-2025-002, mediante el cual se estableció como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Así mismo, se modificaron la Cláusula Sexta (Anticipo y/o Pago Anticipado) y la Cláusula Octava (Forma de Pago), de conformidad con lo estipulado en el referido Modificatorio. **9.** Que, el día dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron acta de inicio al Contrato de Obra No. LP-2025-002.**10.** Que, el día veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. LP-2025-002, suspendiendo temporalmente la ejecución contractual hasta tanto se obtuviera la aprobación

definitiva de los estudios y diseños por parte de la entidad competente, decisión sustentada en razones de orden técnico, administrativo y contractual, las cuales quedaron debidamente expuestas en el documento soporte que hace parte integral del Acta de Suspensión No. 01**. 11.** Que, mediante Acta de Recibo de Entregables de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), se dejó constancia de que el Ministerio del Interior emitió concepto favorable y aprobó la totalidad de los productos correspondientes a la Etapa I – Estudios y Diseños, una vez la interventoría efectuó la revisión técnica, administrativa y normativa de la documentación presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha etapa y en virtud de ello el día seis (06) de julio de dos mil veintiséis (2026) se suscribe acta de reinicio No.1 fijando como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de julio de 2026. **12.** Que, el presente proceso contractual se deriva del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Sapuyes y el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO".**13.** Que, el día siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026) el representante legal de UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES identificada con NIT. 902033941-1, en calidad de contratista de obra solicita prorroga al Contrato de Obra No. LP-2025-002, justificando que: *"La presente solicitud obedece a un requerimiento técnico ineludible orientado a garantizar la estabilidad estructural de la obra, el cumplimiento estricto de la normativa de sismo resistencia vigente en Colombia (NSR-10) y la adecuada protección de los recursos públicos invertidos. El Contrato de Obra No. LP-2025-002 fue estructurado bajo la modalidad de "estudios, diseños y construcción". No obstante, dentro de su trazabilidad contractual, el Otrosí No. 01 ajustó el plazo de ejecución con el fin de armonizarlo con las vigencias del Convenio de cofinanciación No. 2336 de 2025. Este ajuste, si bien responde a una necesidad administrativa, no refleja la realidad técnica inherente a los procesos de ingeniería, razón por la cual se hace necesario ampliar los plazos asociados al cumplimiento de los entregables tanto documentales como físicos. El proyecto cuenta actualmente con una Memoria Descriptiva de carácter conceptual, la cual no constituye una ingeniería de detalle. En este sentido, la ejecución de la Etapa I, bajo estándares técnicos adecuados, demanda como mínimo: La ejecución de una campaña geotécnica que incluya sondeos y ensayos de laboratorio (triaxiales, consolidación, límites de Atterberg), cuyos tiempos de desarrollo, procesamiento y emisión de resultados no pueden ser inferiores a treinta (30) días calendario sin comprometer la confiabilidad de los parámetros de capacidad portante y comportamiento del suelo. El desarrollo de un análisis estructural dinámico detallado, considerando que el corregimiento de El Espino se ubica en zona de amenaza sísmica, lo que implica el diseño riguroso de pórticos, sistemas de cimentación y detalles de refuerzo, sujetos a revisión, validación y ajustes por parte de la Interventoría, proceso que por sí mismo consume el plazo actualmente previsto. La elaboración y coordinación integral de planos de detalle estructural, redes hidrosanitarias, eléctricas y demás especialidades, los cuales deben articularse de manera coherente con el diseño arquitectónico aprobado. Adicionalmente, la fase constructiva de infraestructura presenta condicionantes técnicas y logísticas que inciden directamente en la programación, entre las cuales se destacan: El concreto estructural requiere un periodo mínimo de curado de veintiocho (28) días para alcanzar su resistencia de diseño, conforme a la normativa técnica. Un plazo global reducido obligaría a prácticas constructivas inadecuadas, tales como el desencofrado prematuro o la omisión de procesos de maduración, comprometiendo la seguridad estructural del proyecto. Las condiciones climáticas del corregimiento de El Espino, caracterizadas por regímenes de alta pluviosidad, inciden en la ejecución de actividades críticas, por lo cual es necesario contemplar holguras razonables que permitan gestionar eventos climáticos previsibles sin afectar la calidad ni la continuidad de la obra. La adquisición y suministro de materiales y elementos especializados (estructuras metálicas, carpintería en aluminio y dotaciones específicas exigidas por el Ministerio) dependen de cadenas logísticas externas, principalmente desde ciudades capitales, lo que introduce tiempos adicionales que deben ser considerados en la programación. Se requiere que, dentro de las actividades de carácter administrativo, se garantice la adecuada gestión, trámite y obtención de las certificaciones técnicas necesarias para asegurar la correcta operación, funcionalidad y sostenibilidad de las instalaciones en el tiempo, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Entre estas se contemplan, de manera enunciativa mas no limitativa, las certificaciones RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), las cuales implican la ejecución de procesos de inspección, verificación, eventuales ajustes técnicos y la correspondiente aprobación por parte de organismos acreditados. Estas gestiones requieren tiempos específicos que deben ser incorporados de manera explícita dentro de la programación del proyecto, dada su incidencia directa*

*en la puesta en funcionamiento de las instalaciones. En lo correspondiente a las actividades de embellecimiento, acabados y terminaciones arquitectónicas en las diferentes áreas intervenidas, es técnicamente indispensable contar con la totalidad de las actividades constructivas previamente ejecutadas y debidamente finalizadas, garantizando condiciones óptimas de estabilidad, limpieza, soporte y adherencia. Dichas actividades comprenden, entre otras, la aplicación de estucos, pinturas, enchapes, sellados y recubrimientos, las cuales, por su naturaleza, demandan tiempos de fraguado, curado y secado que pueden extenderse aproximadamente hasta una (1) semana, dependiendo de las condiciones ambientales y de las especificaciones técnicas de los materiales utilizados. En consecuencia, estas labores no pueden ser ejecutadas de manera simultánea con otras actividades constructivas, debiendo ser consideradas dentro de la ruta crítica del proyecto, en la medida en que inciden directamente en la calidad final de la obra. De manera complementaria, es necesario reconocer la existencia de actividades que, aunque no siempre son contempladas de forma explícita en la programación inicial, tienen una incidencia directa en la ejecución y en el cumplimiento de los plazos contractuales. Dentro de estas se destacan los ensayos de control de calidad y los procesos de liberación de actividades, que comprenden tanto pruebas de laboratorio como verificaciones en campo —incluyendo, entre otros, ensayos de resistencia de concretos, compactación de suelos, pruebas hidrostáticas en redes y verificaciones de sistemas eléctricos—. La obtención de resultados satisfactorios y su respectiva aprobación constituyen un requisito indispensable para la continuidad de las actividades subsiguientes, generando dependencias técnicas que deben ser debidamente planificadas. Así mismo, se deben prever las posibles interferencias y requerimientos de coordinación entre las diferentes especialidades que concurren en el proyecto (estructural, arquitectónica, hidrosanitaria, eléctrica, entre otras), toda vez que la superposición o incompatibilidad entre redes, elementos constructivos o detalles de diseño puede derivar en ajustes en obra, reprocesos o reprogramaciones, con incidencia directa sobre la secuencia constructiva y la ruta crítica. Finalmente, es indispensable incorporar dentro de la planificación general los tiempos asociados a los procesos de cierre administrativo y documental del proyecto, los cuales comprenden la elaboración y consolidación de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, protocolos de pruebas y puesta en marcha, actas de recibo y la recopilación integral de las certificaciones técnicas exigidas. Estas actividades, aunque se desarrollan en la fase final, son determinantes para la entrega formal, la liquidación del contrato y la entrada en operación del proyecto, por lo que su adecuada programación resulta fundamental para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. Desde la perspectiva contractual y de gestión de riesgos, la presente solicitud se fundamenta además en los siguientes aspectos: Conforme a la matriz de riesgos del contrato, el contratista no está obligado a asumir contingencias derivadas de la inexistencia de diseños de detalle previos. La ampliación del plazo permite mitigar riesgos técnicos antes de comprometer inversiones significativas en la fase constructiva. En atención a los principios de responsabilidad técnica, ética profesional y cumplimiento normativo, se advierte que la ejecución del proyecto en un plazo inferior al técnicamente viable comprometería directamente la calidad, durabilidad y seguridad de la obra. En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente a la Interventoría evaluar y conceptuar favorablemente la presente solicitud de prórroga, proponiendo la siguiente reprogramación contractual: Etapa I – Estudios y Diseños: Sesenta (60) días calendario. Etapa II – Construcción y Entrega: Ciento cincuenta (150) días calendario (cinco meses). (…)"* **14.** Que, el día ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026) el representante legal de CONSORCIO C&L SAPUYES identificado con NIT. 902.042.007 – 3, en calidad de interventor, emite concepto Técnico y Aval de Interventoría a la Solicitud de Prórroga No. 01 recomendando fijar como nueva fecha de terminación el 14 de diciembre de 2026. **15.** Que, el supervisor del contrato avala la solicitud de prorroga al plazo de ejecución hasta el catorce (14) de diciembre de 2026, en consecuencia, solicita al Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana FONSECON prorrogar el Convenio 2336 de 2025, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026) y se remiten los soportes correspondientes que justifican la necesidad de suscribir la prórroga. **16.** Que, el día veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026) se suscribió OTROSI NO. 01 al convenio 2336 de 2025 el cual consiste en PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2336 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAPUYES (NARIÑO), en el cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**17.** Que en mérito de lo expuesto y la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para

la ejecución del objeto contractual, acuerdan celebrar el presente Modificatorio No. 02 al Contrato de Obra No. LP-2025-002 bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato de obra No. LP-2025-002 hasta el catorce (14) de diciembre de dos mil veintiséis (2026) y por lo anterior modificar del contrato principal y de la siguiente manera la:

> *"**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**:*
>
> *El plazo estimado para la ejecución del Contrato será desde la suscripción del acta de inicio, hasta el día catorce (14) de diciembre del año 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones."*

**CLÁUSULA SEGUNDA. –** El CONTRATISTA deberá actualizar las garantías inicialmente constituidas de acuerdo a los ajustes que estima el presente documento.

**CLÁUSULA TERCERA. –** El presente se perfecciona con la firma de las partes.

**CLÁUSULA CUARTA. –** Quedan vigentes las demás cláusulas del Contrato principal.

Para constancia, se firma en el Municipio de Sapuyes (N), a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Por el Municipio,

***LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES***
Alcaldesa Municipal

Por el Contratista,

**CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA**
**R.L. UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**
Contratista

**MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM-2026-001 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

Entre los suscritos a saber: **MUNICIPIO DE SAPUYES**, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcaldesa Municipal **LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.085.280.717 de Pasto (N), actuando en nombre y representación del Municipio de Sapuyes, Departamento de Nariño, en su calidad de Alcaldesa Municipal, según credencial expedida por el órgano competente, cargo del cual tomó posesión de acuerdo a las formalidades que establece la ley, debidamente autorizado para contratar, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; por otra parte, **CONSORCIO C&L SAPUYES,** identificado con NIT. 902042007-3, representado legalmente por **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.215.772 de Pasto (N), quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos celebrar el presente Modificatorio No. 002 al contrato de interventoría cuyo objeto consiste en "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; para prorrogar el plazo de ejecución del mismo, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **1.** Que, la Alcaldesa del Municipio de Sapuyes (N) dio apertura, mediante Resolución No. 048 del nueve (09) de febrero de 2026, al concurso de méritos N° CM-2026-001, cuyo objeto consiste en la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **2.** Que, para amparar las obligaciones derivadas del contrato resultante del citado proceso de selección, se expidió el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2026000019 del dos (02) de enero de dos mil veintiséis (2026). **3.** Que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones en el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co, informando a los interesados sobre el objeto, alcance y condiciones generales de participación del proceso. **4.** Que, surtido el procedimiento de recepción de propuestas y conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, el comité evaluador procedió a la verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación de los proponentes, emitiendo el correspondiente informe de evaluación, en el cual ocupó el primer orden de elegibilidad el proponente **CONSORCIO C&L SAPUYES,** identificado con NIT. 902042007-3, representado legalmente por **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.215.772 de Pasto (N). **5.** Que, de conformidad con el Estatuto Contractual y lo dispuesto en los pliegos de condiciones, correspondía a la Entidad adjudicar el contrato al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad. **6.** Que, mediante Resolución No. 070 del veinticuatro (24) de febrero de 2026, se adjudicó el contrato ibidem a **CONSORCIO C&L SAPUYES,** identificado con NIT. 902042007-3, representado legalmente por **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.215.772 de Pasto (N), suscribiéndose el respectivo Contrato de Interventoría CM-2026-001 el día tres (03) de marzo del año dos mil veintiséis (2026). **7.** Que, el valor total del Contrato de Interventoría No. CM-2026-001 se pactó en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 453.288.271) M/CTE, con un plazo de ejecución de 6 meses, de los cuales 1 mes corresponde a la Etapa I de Estudios y Diseños y 5 meses a la Etapa II de Ejecución de Obra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **8.** Que, el día doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Modificatorio No. 01 al Contrato de Interventoría No. CM-2026-001, mediante el cual se estableció fecha de terminación el día treinta y uno (31) de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Así mismo, se modificaron la Cláusula Sexta (Anticipo y/o Pago Anticipado) y la Cláusula Octava (Forma de Pago), de conformidad con lo estipulado en el referido Modificatorio. **9.** Que, el día dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron acta de inicio al Contrato de Interventoría No. CM-2026-001.**10.** Que, el día veinte (20)

de mayo de dos mil veintiséis (2026), las partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Interventoría No. CM-2026-001, como consecuencia de la suspensión temporal del Contrato de Obra objeto de seguimiento por la presente interventoría, la cual fue adoptada hasta tanto se obtuviera la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte de la entidad competente, por razones de orden técnico, administrativo y contractual debidamente sustentadas en el Acta de Suspensión No. 01 del contrato de obra. En ese sentido, y dado que la ejecución del contrato de interventoría depende directamente del desarrollo del contrato de obra sobre el cual ejerce las funciones de seguimiento, control y vigilancia, resultó procedente suspender igualmente la ejecución del presente contrato de interventoría.**11.** Que, mediante Acta de Recibo de Entregables de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), se dejó constancia de que el Ministerio del Interior emitió concepto favorable y aprobó la totalidad de los productos correspondientes a la Etapa I – Estudios y Diseños, una vez la interventoría efectuó la revisión técnica, administrativa y normativa de la documentación presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha etapa y en virtud de ello el día seis (06) de julio de dos mil veintiséis (2026) se suscribe acta de reinicio No.1 de obra e interventoría fijando como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de julio de 2026. **12.** Que, el presente proceso contractual se deriva del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Sapuyes y el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO".**13.** Que, el día siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026) el representante legal de UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES identificada con NIT. 902033941-1, en calidad de contratista de obra solicita prorroga al Contrato de Obra No. LP-2025-002, justificando que: *"La presente solicitud obedece a un requerimiento técnico ineludible orientado a garantizar la estabilidad estructural de la obra, el cumplimiento estricto de la normativa de sismo resistencia vigente en Colombia (NSR-10) y la adecuada protección de los recursos públicos invertidos. El Contrato de Obra No. LP-2025-002 fue estructurado bajo la modalidad de "estudios, diseños y construcción". No obstante, dentro de su trazabilidad contractual, el Otrosí No. 01 ajustó el plazo de ejecución con el fin de armonizarlo con las vigencias del Convenio de cofinanciación No. 2336 de 2025. Este ajuste, si bien responde a una necesidad administrativa, no refleja la realidad técnica inherente a los procesos de ingeniería, razón por la cual se hace necesario ampliar los plazos asociados al cumplimiento de los entregables tanto documentales como físicos. El proyecto cuenta actualmente con una Memoria Descriptiva de carácter conceptual, la cual no constituye una ingeniería de detalle. En este sentido, la ejecución de la Etapa I, bajo estándares técnicos adecuados, demanda como mínimo: La ejecución de una campaña geotécnica que incluya sondeos y ensayos de laboratorio (triaxiales, consolidación, límites de Atterberg), cuyos tiempos de desarrollo, procesamiento y emisión de resultados no pueden ser inferiores a treinta (30) días calendario sin comprometer la confiabilidad de los parámetros de capacidad portante y comportamiento del suelo. El desarrollo de un análisis estructural dinámico detallado, considerando que el corregimiento de El Espino se ubica en zona de amenaza sísmica, lo que implica el diseño riguroso de pórticos, sistemas de cimentación y detalles de refuerzo, sujetos a revisión, validación y ajustes por parte de la Interventoría, proceso que por sí mismo consume el plazo actualmente previsto. La elaboración y coordinación integral de planos de detalle estructural, redes hidrosanitarias, eléctricas y demás especialidades, los cuales deben articularse de manera coherente con el diseño arquitectónico aprobado. Adicionalmente, la fase constructiva de infraestructura presenta condicionantes técnicas y logísticas que inciden directamente en la programación, entre las cuales se destacan: El concreto estructural requiere un periodo mínimo de curado de veintiocho (28) días para alcanzar su resistencia de diseño, conforme a la normativa técnica. Un plazo global reducido obligaría a prácticas constructivas inadecuadas, tales como el desencofrado prematuro o la omisión de procesos de maduración, comprometiendo la seguridad estructural del proyecto. Las condiciones climáticas del corregimiento de El Espino, caracterizadas por regímenes de alta pluviosidad, inciden en la ejecución de actividades críticas, por lo cual es necesario contemplar holguras razonables que permitan gestionar eventos climáticos previsibles sin afectar la calidad ni la continuidad de la obra. La adquisición y suministro de materiales y elementos especializados (estructuras metálicas, carpintería en aluminio y dotaciones específicas exigidas por el Ministerio) dependen de cadenas logísticas externas, principalmente desde ciudades capitales, lo que introduce tiempos adicionales que deben ser considerados en la programación. Se requiere que, dentro de las actividades de carácter administrativo, se garantice la adecuada gestión, trámite y obtención de las certificaciones técnicas necesarias para asegurar la correcta operación, funcionalidad y sostenibilidad de las instalaciones en el tiempo, en estricto*

*cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Entre estas se contemplan, de manera enunciativa mas no limitativa, las certificaciones RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), las cuales implican la ejecución de procesos de inspección, verificación, eventuales ajustes técnicos y la correspondiente aprobación por parte de organismos acreditados. Estas gestiones requieren tiempos específicos que deben ser incorporados de manera explícita dentro de la programación del proyecto, dada su incidencia directa en la puesta en funcionamiento de las instalaciones. En lo correspondiente a las actividades de embellecimiento, acabados y terminaciones arquitectónicas en las diferentes áreas intervenidas, es técnicamente indispensable contar con la totalidad de las actividades constructivas previamente ejecutadas y debidamente finalizadas, garantizando condiciones óptimas de estabilidad, limpieza, soporte y adherencia. Dichas actividades comprenden, entre otras, la aplicación de estucos, pinturas, enchapes, sellados y recubrimientos, las cuales, por su naturaleza, demandan tiempos de fraguado, curado y secado que pueden extenderse aproximadamente hasta una (1) semana, dependiendo de las condiciones ambientales y de las especificaciones técnicas de los materiales utilizados. En consecuencia, estas labores no pueden ser ejecutadas de manera simultánea con otras actividades constructivas, debiendo ser consideradas dentro de la ruta crítica del proyecto, en la medida en que inciden directamente en la calidad final de la obra. De manera complementaria, es necesario reconocer la existencia de actividades que, aunque no siempre son contempladas de forma explícita en la programación inicial, tienen una incidencia directa en la ejecución y en el cumplimiento de los plazos contractuales. Dentro de estas se destacan los ensayos de control de calidad y los procesos de liberación de actividades, que comprenden tanto pruebas de laboratorio como verificaciones en campo —incluyendo, entre otros, ensayos de resistencia de concretos, compactación de suelos, pruebas hidrostáticas en redes y verificaciones de sistemas eléctricos—. La obtención de resultados satisfactorios y su respectiva aprobación constituyen un requisito indispensable para la continuidad de las actividades subsiguientes, generando dependencias técnicas que deben ser debidamente planificadas. Así mismo, se deben prever las posibles interferencias y requerimientos de coordinación entre las diferentes especialidades que concurren en el proyecto (estructural, arquitectónica, hidrosanitaria, eléctrica, entre otras), toda vez que la superposición o incompatibilidad entre redes, elementos constructivos o detalles de diseño puede derivar en ajustes en obra, reprocesos o reprogramaciones, con incidencia directa sobre la secuencia constructiva y la ruta crítica. Finalmente, es indispensable incorporar dentro de la planificación general los tiempos asociados a los procesos de cierre administrativo y documental del proyecto, los cuales comprenden la elaboración y consolidación de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, protocolos de pruebas y puesta en marcha, actas de recibo y la recopilación integral de las certificaciones técnicas exigidas. Estas actividades, aunque se desarrollan en la fase final, son determinantes para la entrega formal, la liquidación del contrato y la entrada en operación del proyecto, por lo que su adecuada programación resulta fundamental para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. Desde la perspectiva contractual y de gestión de riesgos, la presente solicitud se fundamenta además en los siguientes aspectos: Conforme a la matriz de riesgos del contrato, el contratista no está obligado a asumir contingencias derivadas de la inexistencia de diseños de detalle previos. La ampliación del plazo permite mitigar riesgos técnicos antes de comprometer inversiones significativas en la fase constructiva. En atención a los principios de responsabilidad técnica, ética profesional y cumplimiento normativo, se advierte que la ejecución del proyecto en un plazo inferior al técnicamente viable comprometería directamente la calidad, durabilidad y seguridad de la obra. En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente a la Interventoría evaluar y conceptuar favorablemente la presente solicitud de prórroga, proponiendo la siguiente reprogramación contractual: Etapa I – Estudios y Diseños: Sesenta (60) días calendario. Etapa II – Construcción y Entrega: Ciento cincuenta (150) días calendario (cinco meses). (…)"* **14.** Que, el día ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026) el representante legal de CONSORCIO C&L SAPUYES identificado con NIT. 902.042.007 – 3, en calidad de interventor, emite concepto Técnico y Aval de Interventoría a la Solicitud de Prórroga No. 01 recomendando fijar como nueva fecha de terminación el 14 de diciembre de 2026 y por ende solicitando que se amplie el plazo de ejecución del contrato de interventoría por el mismo término. **15.** Que, el supervisor del contrato avala la solicitud de prorroga al plazo de ejecución hasta el catorce (14) de diciembre de 2026, en consecuencia, solicita al Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana FONSECON prorrogar el Convenio 2336 de 2025, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026) y se remiten los soportes correspondientes que justifican la necesidad de suscribir la prórroga. **16.** Que, el día veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026) se suscribió OTROSI NO. 01 al convenio 2336 de 2025 el cual consiste en PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2336 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAPUYES (NARIÑO), en el cual se amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**17.** Que, en mérito de lo expuesto y de la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución, seguimiento, control y vigilancia del Contrato de Obra objeto de la presente interventoría, así como de contribuir al cumplimiento de los fines estatales y a la satisfacción del interés público, acuerdan celebrar el presente Modificatorio No. 02 al Contrato de Interventoría No. CM-2026-001, de conformidad con las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. CM-2026-001 hasta el catorce (14) de diciembre de dos mil veintiséis (2026) y por lo anterior modificar del contrato principal y de la siguiente manera la:

> *"**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**:*
>
> *El plazo estimado para la ejecución del Contrato será desde la suscripción del acta de inicio, hasta el día catorce (14) de diciembre del año 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones."*

**CLÁUSULA SEGUNDA. –** El CONTRATISTA deberá actualizar las garantías inicialmente constituidas de acuerdo a los ajustes que estima el presente documento.

**CLÁUSULA TERCERA. –** El presente se perfecciona con la firma de las partes.

**CLÁUSULA CUARTA. –** Quedan vigentes las demás cláusulas del Contrato de Interventoría principal.

Para constancia, se firma en el Municipio de Sapuyes (N), a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Por el Municipio,

***LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES***
Alcaldesa Municipal

Por el Contratista,

**SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO**
**R.L. CONSORCIO C&L SAPUYES**
Contratista de Interventoría

**ACTA DE REINICIO No. 01**
**CONTRATO DE OBRA No. LP-2025-002**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | LP-2025-002 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **NIT:** | 800.099.149-6 |
| **REP LEGAL:** | LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES |
| **C.C N°** | 1.085.280.717 DE PASTO (N) |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **NIT:** | 902033941-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **C.C N°** | 1.085.269.741 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 6 meses, de los cuales 1 mes corresponde a la Etapa I de Estudios y Diseños y 5 meses a la Etapa II de Ejecución de Obra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **PLAZO SEGÚN OTRO SI 01** | El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, hasta el 31 de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 1.996.711.729,00) |
| **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN** | DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA OTROSI No. 1** | DOCE (12) DE MARZO DE 2026 – MODIFICATORIO |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 1** | VEINTE (20) DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 1** | SEIS (06) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 01** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **SUPERVISION** | JHON STEVEN BURGOS CAICEDO<br>secretario de planeación y obras |

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO C&L SAPUYES identificado con NIT. 902042007 – 3, representado legalmente por SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA R. |
| **GARANTIAS** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |

**775 47 994000004648 - ANEXO 2**
**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | 18/03/2026 | 30/11/2026 | $399.342.346.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 18/03/2026 | 30/11/2026 | $461.720.937.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 18/03/2026 | 31/07/2029 | $399.342.346.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días | | $399.342.346.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 18/09/2026 | 18/09/2031 | $199.671.173.00 |

**775 74 994000000913 - ANEXO 2**
**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 18/03/2026 | 31/07/2026 | $525.271.500.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 18/03/2026 | 31/07/2026 | $525.271.500.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 18/03/2026 | 31/07/2026 | $525.271.500.00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 18/03/2026 | 31/07/2026 | $525.271.500.00 |

En el Municipio de Sapuyes (N), a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil veintiséis, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sapuyes la señora, **LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES**, alcaldesa Municipal de Sapuyes, el señor **JHON STEVEN BURGOS CAICEDO,** en calidad de secretario de planeación y obras, **CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA,** identificado con C. C. No. 1.085.269.741 en representación legal de la **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES,** identificada con NIT. No. 902033941-1, en calidad de contratista de obra y **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA,** en representación legal de **CONSORCIO C&L SAPUYES**, en calidad de interventor, con el objeto de suscribir acta de reinicio No.1 al contrato de obra No. LP-2025-002, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el Contrato de Obra LP-2025-002 fue celebrado bajo la modalidad de llave en mano, teniendo como objeto la realización de los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Tipo 1 en el corregimiento El Espino, municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, contemplando para su ejecución dos etapas claramente definidas: la Etapa I – Estudios y Diseños, con un plazo de ejecución de dos (2) meses, y la Etapa II – Ejecución de Obra, con un plazo de ejecución inicial de 6 meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que el día doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Otrosí No. 01 al Contrato de Obra No. LP-2025-002, mediante el cual se modificó la Cláusula Cuarta (Plazo), estableciendo como plazo de ejecución del contrato cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, con fecha de terminación prevista para el treinta y

uno (31) de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Así mismo, se modificaron la Cláusula Sexta (Anticipo y/o Pago Anticipado) y la Cláusula Octava (Forma de Pago), de conformidad con lo estipulado en el referido Otrosí.

- Que el día veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. LP-2025-002, suspendiendo temporalmente la ejecución contractual hasta tanto se obtuviera la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte de la entidad competente, decisión sustentada en razones de orden técnico, administrativo y contractual, las cuales quedaron debidamente expuestas en el documento soporte que hace parte integral del Acta de Suspensión No. 01.

- Que mediante Acta de Recibo de Entregables de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), se dejó constancia de que el Ministerio del Interior emitió concepto favorable y aprobó la totalidad de los productos correspondientes a la Etapa I – Estudios y Diseños, una vez la interventoría efectuó la revisión técnica, administrativa y normativa de la documentación presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha etapa.

- Que en virtud de haberse superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del contrato, al haberse obtenido la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior, las partes consideran procedente reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. LP-2025-002, con el fin de dar continuidad a la Etapa II del proyecto, en cumplimiento del objeto contractual.

- Que actualmente la Entidad se encuentra a la espera de la formalización de la ampliación del plazo del Convenio Interadministrativo suscrito con el Ministerio, actuación que resulta indispensable para proceder, de forma posterior, con el ajuste correspondiente en los tiempos de ejecución de los contratos derivados de este, incluyendo el presente negocio jurídico.

**ACUERDOS:**

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

**PRIMERO: REINICIAR** el Contrato de obra N°. LP-2025-002 suscrito entre el Municipio de Sapuyes (N) y CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA, identificado con C. C. No. 1.085.269.741, en representación legal de la **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES,** identificada con NIT. No. 902033941-1, en calidad de Contratista de Obra, el cual tiene como objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO", en cumplimiento a las normas vigentes de Contratación Estatal en Colombia.

**SEGUNDO:** EL presente reinicio del contrato, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO" se perfecciona con la suscripción por las partes y rige a partir de la suscripción del presente documento.

**TERCERO:** El contratista de obra remitirá copia de la presente acta a la compañía aseguradora para lo de su competencia.

**CUARTO:** Que la suspensión del contrato no comporta ningún supuesto que signifique alguna reclamación por rompimiento del equilibrio económico del contrato.

**QUINTO:** El Contratista se obliga a actualizar las respectivas pólizas, para su respectiva aprobación por parte del municipio.

**SEXTO:** Las partes dejan expresa constancia de que se encuentran a la espera de la formalización de la ampliación del plazo del Convenio Interadministrativo ibidem y una vez se perfeccione dicha prórroga se procederá con la suscripción del respectivo modificatorio para ajustar el plazo del presente contrato de obra y sus derivados, garantizando así la coherencia temporal de la ejecución del proyecto conforme al cronograma de obra que estima el desarrollo de la infraestructura.

**SEPTIMO:** Que la fecha de terminación del contrato se fija para el día treinta y uno (31) de julio de 2026.

Para constancia se firma por quienes intervienen el día seis (06) de julio del año dos mil veintiséis (2026).

**LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ M.**
Alcaldesa

**JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

**CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA**
R.L. U.T. DESARROLLO SAPUYES
Contratista De Obra

**SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**
R.L. CONSORCIO C&L SAPUYES
Interventor

**ACTA DE REINICIO No. 01**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-001-2026**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | CM-001-2026 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **NIT:** | 800.099.149-6 |
| **REP LEGAL:** | LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES |
| **C.C N°** | 1.085.280.717 DE PASTO (N) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **NIT:** | 902042007 – 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **C.C N°** | 1.004.215.772 DE PASTO (N) |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 6 meses, de los cuales 1 mes corresponde a la Etapa I de Estudios y Diseños y 5 meses a la Etapa II de Ejecución de Obra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **PLAZO SEGÚN OTRO SI 01** | El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (04) meses y trece (13) días, a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE ($149.827.981,00) |
| **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN** | DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA OTROSI No. 1** | DOCE (12) DE MARZO DE 2026 – MODIFICATORIO |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 1** | VEINTE (20) DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 1** | SEIS (06) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 01** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **SUPERVISION** | JHON STEVEN BURGOS CAICEDO<br>secretario de planeación y obras |

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO C&L SAPUYES identificado con NIT. 902042007 – 3, representado legalmente por SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA R. |
| **GARANTIAS** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

**41-44-101303666 - ANEXO 4**
**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | 18/03/2026 | 15/12/2026 | $45.328.827.10 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 18/03/2026 | 15/12/2026 | $60.692.058.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 18/03/2026 | 15/08/2029 | $22.664.413.55 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 18/09/2026 | 18/09/2031 | $45.328.827.10 |

En el Municipio de Sapuyes (N), a los seis (06) día del mes de julio del año dos mil veintiséis de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sapuyes la señora **LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES**, alcaldesa Municipal de Sapuyes, el señor **JHON STEVEN BURGOS CAICEDO,** en calidad de secretario de planeación y obras, y **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**, en representación legal de **CONSORCIO C&L SAPUYES**, en calidad de interventor, con el objeto de suscribir acta de reinicio No.1 al contrato de interventoría No. CM-001-2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día tres (03) de marzo de 2026 se suscribió contrato de interventoría No. CM-001-2026 para realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental al Contrato de Obra LP-2025-002 celebrado bajo la modalidad de llave en mano, teniendo como objeto la realización de los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Tipo 1 en el corregimiento El Espino, municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, contemplando para su ejecución dos etapas claramente definidas: la Etapa I – Estudios y Diseños, con un plazo de ejecución de dos (2) meses, y la Etapa II – Ejecución de Obra, con un plazo de ejecución inicial de 6 meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que el día doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Otrosí No. 01 al contrato de interventoría No. CM-001-2026, mediante el cual se modificó la Cláusula Cuarta (Plazo), estableciendo como plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026. Así mismo, se modificaron la Cláusula Sexta (Anticipo y/o Pago Anticipado) y la Cláusula Octava (Forma de Pago), de conformidad con lo estipulado en el referido Otrosí.

- Que el día veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) las partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. LP-2025-002 y al contrato de interventoría No. CM-001-2026, suspendiendo temporalmente la ejecución contractual hasta tanto se obtuviera la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte de la entidad competente, decisión sustentada en razones de orden técnico, administrativo y contractual, las cuales quedaron debidamente expuestas en el documento soporte que hace parte integral del Acta de Suspensión No. 01.

- Que mediante Acta de Recibo de Entregables de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), se dejó constancia de que el Ministerio del Interior emitió concepto favorable y aprobó la totalidad de los productos correspondientes a la Etapa I – Estudios y Diseños, una vez la interventoría efectuó la revisión técnica, administrativa y normativa de la documentación presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha etapa.

- Que en virtud de haberse superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del contrato, al haberse obtenido la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior, las partes consideran procedente reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. LP-2025-002 e interventoría No. CM-001-2026, con el fin de dar continuidad a la Etapa II del proyecto, en cumplimiento del objeto contractual.

- Que en armonía con el contrato de obra principal, actualmente la Entidad se encuentra a la espera del trámite y formalización de la ampliación del plazo del Convenio suscrito con el Ministerio del Interior, siendo que dicha actuación resulta indispensable para proceder, de forma posterior, con el ajuste correspondiente en los tiempos de ejecución de los contratos derivados, incluyendo el presente contrato de interventoría.

**ACUERDOS:**

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

**PRIMERO: REINICIAR** el Contrato de interventoría N°. CM-001-2026 suscrita entre el Municipio de Sapuyes (N) y **CONSORCIO C&L SAPUYES**, quien se identifica con NIT. No. 902042007-3, representada legalmente por SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.004.215.772 de Pasto, en calidad de Contratista de interventoría, el cual tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", en cumplimiento a las normas vigentes de Contratación Estatal en Colombia.

**SEGUNDO:** EL presente reinicio del contrato, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" se perfecciona con la suscripción por las partes y rige a partir de la suscripción del presente documento.

**TERCERO:** El contratista de interventoría remitirá copia de la presente acta a la compañía aseguradora para lo de su competencia.

**CUARTO:** Que la suspensión del contrato no genera ningún supuesto que comporte una causal que se pueda alegar como rompimiento del equilibrio económico del contrato.

**QUINTO:** El Contratista se obliga a actualizar las respectivas pólizas, para su respectiva aprobación por parte del municipio.

**SEXTO:** Las partes dejan expresa constancia de que se encuentran a la espera de la formalización de la ampliación del plazo del Convenio ibidem. Una vez se perfeccione dicha prórroga se procederá con la suscripción del respectivo modificatorio para ajustar de manera definitiva el plazo del presente contrato de interventoría, garantizando que su vigencia cubra la totalidad de la ejecución y liquidación del contrato de obra respectivo.

**SEPTIMO:** Que la fecha de terminación del contrato se fija para el día treinta y uno (31) de julio de 2026.

Para constancia se firma por quienes intervienen el día seis (06) de julio del año dos mil veintiséis (2026).

**LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ M.**
Alcaldesa

**JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

**SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**
R.L. CONSORCIO C&L SAPUYES
Interventor

Entre los suscritos, **NANCY STELLA PATIÑO LEÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.557.646 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, identificado con NIT 830.114.475-6, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 0353 del 27 de marzo de 2025 y posesionada mediante Acta No. 054 del 01 de abril de 2025, delegada como Ordenadora del Gasto a través de la Resolución No. 1153 del 18 de julio de 2024 que adiciona el artículo primero a la Resolución No. 0150 del 01 de febrero de 2021, quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, **LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.280.717; en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, actuando en representación del **MUNICIPIO DE SAPUYES**, con NIT. 800099149-6; posesionado el veintinueve (29) de diciembre de 2023, y facultada para suscribir el presente documento, (en adelante **EL CONVENIDO**). **LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la Primera prórroga al Convenio, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1.-** El siete (7) de noviembre de 2025, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO,** suscribieron el Convenio No. 2336 de 2025, por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.450.000.000,00)**, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO"**.

**2.-** El once (11) de noviembre de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del convenio, pactando como plazo inicial de ejecución **hasta 31 de julio de 2026.**

**3.-** Mediante oficio SP-080-2025 del 1 de julio de 2026, el Municipio de Sapuyes solicitó al Ministerio del Interior la prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, exponiendo los antecedentes contractuales, el estado de ejecución del proyecto y las razones técnicas, administrativas y contractuales que, a su juicio, justifican la ampliación del plazo de ejecución del convenio.

El municipio inició relacionando la información general del convenio, indicando que su objeto corresponde a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1 del corregimiento El Espino, municipio de Sapuyes, Nariño, con un valor de $2.450.000.000 y un plazo inicial hasta el 31 de julio de 2026. Asimismo, describió los procesos de contratación derivados correspondientes al contrato de obra y al contrato de interventoría, precisando las fechas de publicación, adjudicación, suscripción de los contratos, expedición de otrosíes, actas de inicio y suspensión temporal de ambos contratos.

Señaló que, aunque durante la etapa de planeación se estimó adjudicar los contratos derivados en la primera semana de enero de 2026, el desarrollo de los procesos de selección demandó un tiempo superior al inicialmente previsto debido al cumplimiento de los procedimientos de contratación estatal, la aplicación de los pliegos tipo, la expedición de adendas, la atención de observaciones de los interesados, la evaluación de ofertas, la legalización de los contratos, la expedición de los registros presupuestales, la aprobación de garantías y la actualización del Registro Único Tributario de los contratistas, circunstancias que llevaron a que las actas de inicio se suscribieran el 18 de marzo de 2026.

Manifestó que el contrato de obra fue estructurado bajo la modalidad de llave en mano, contemplando una primera etapa correspondiente a estudios y diseños y una segunda destinada a la ejecución de las obras. Indicó que posteriormente fue necesario suscribir el Otrosí No. 1 para armonizar los plazos de los contratos derivados con la vigencia del convenio y que, el 20 de mayo de 2026, se suspendió temporalmente la ejecución de los contratos con el propósito de atender el



**Sede correspondencia** Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
**Conmutador** (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
**Sitio Web**www.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
**Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia**

proceso de revisión, ajuste y validación de las observaciones formuladas por el Ministerio del Interior sobre los estudios y diseños del proyecto.

El municipio presentó la trazabilidad de la etapa de estudios y diseños, indicando la realización de visitas técnicas, mesas de trabajo, presentaciones presenciales de los estudios y diseños, jornadas de revisión interdisciplinaria y la entrega final del Anexo 22 el 30 de junio de 2026, mediante el cual fueron radicados los estudios y diseños avalados por la interventoría, la supervisión municipal y recibidos por la supervisión del Ministerio del Interior. Como resultado de dicho proceso, señaló que la etapa de estudios y diseños quedó culminada y aprobada, permitiendo el inicio de la fase constructiva.

Respecto del estado de ejecución, informó que el convenio registra un avance consolidado del nueve punto cinco por ciento (9,5 %), correspondiente a la culminación de la etapa de estudios y diseños. Indicó igualmente que fueron consolidados los estudios geotécnicos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, se atendieron todas las observaciones formuladas durante las mesas técnicas, se recibieron los desembolsos efectuados por el Ministerio del Interior y se elaboró el presupuesto definitivo de obra junto con el cronograma detallado de la fase constructiva.

Como fundamento de la solicitud, el municipio sostuvo que la necesidad de ampliar el plazo obedece exclusivamente a circunstancias técnicas, administrativas y contractuales derivadas del proceso de elaboración, revisión, ajuste y aprobación de los estudios y diseños definitivos, precisando que en los contratos ejecutados bajo la modalidad de llave en mano el cronograma definitivo de construcción únicamente puede consolidarse una vez culmina y se aprueba la etapa de diseños, pues solo entonces es posible definir con precisión las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, el presupuesto definitivo, la secuencia constructiva y la ruta crítica del proyecto. En ese sentido, afirmó que la ampliación del plazo no responde a fallas de planeación sino a la naturaleza propia de este tipo de contratación.

Asimismo, indicó que la solicitud presentada por el contratista fue analizada por la interventoría y por la supervisión municipal, las cuales emitieron concepto favorable al considerar que las razones expuestas correspondían a circunstancias objetivas derivadas de la ejecución del contrato y justificaban armonizar los plazos de los contratos derivados con la vigencia del convenio. Agregó que la prórroga no obedece a incumplimientos contractuales, modificaciones del objeto ni deficiencias de planeación, sino a la necesidad de garantizar que la ejecución de la fase constructiva se desarrolle con base en los estudios y diseños definitivamente aprobados.

El municipio explicó igualmente que la aprobación definitiva de los estudios y diseños permitió establecer el presupuesto definitivo, las cantidades reales de obra, las especificaciones constructivas, los procedimientos de ejecución y el cronograma detallado de la fase constructiva, el cual incorpora las actividades de excavación, cimentación, estructuras, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, urbanismo, drenajes, acabados, sistema fotovoltaico, certificaciones RETIE y RETILAP, ensayos de laboratorio, controles de calidad, planes ambientales, planos récord, manuales de operación y demás actividades necesarias para el cierre técnico y administrativo del proyecto. Señaló que dichas actividades responden a una secuencia lógica e interdependiente que impide su ejecución simultánea y exige un plazo suficiente para garantizar la calidad y estabilidad de la infraestructura.

Finalmente, concluyó que la ampliación del plazo constituye una medida técnica y contractualmente procedente para asegurar la correcta ejecución de la fase constructiva, sin modificar el objeto del convenio ni incrementar su valor, solicitando al Ministerio del Interior aprobar la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025 con el fin de garantizar la culminación integral del proyecto conforme a las condiciones técnicas definidas durante la etapa de estudios y diseños.

**4.-** Con ocasión de la solicitud de primera prórroga presentada por el Municipio de Sapuyes respecto del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, el supervisor del



**Sede correspondencia** Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
**Conmutador** (1) 242 74 00 •**Línea gratuita** 018000910403
**Sitio Web**www.mininterior.gov.co•**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
**Código postal 111711 • Bogotá D.C., Colombia**

Ministerio del Interior mediante memorando 2026-3-003122-021874 Id: 816793 del 28 de julio de 2026, emitió concepto técnico, financiero y jurídico favorable para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, al considerar que la modificación resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar la culminación de la fase constructiva, el recibo de la infraestructura y el cierre técnico, administrativo y financiero del convenio.

Desde el componente técnico, el supervisor verificó que el cronograma inicialmente previsto sufrió un desplazamiento como consecuencia del mayor tiempo requerido para adelantar la contratación derivada de la obra y la interventoría. Indicó que dicho desfase obedeció a circunstancias propias del desarrollo de los procesos de selección, entre ellas las actividades de cierre de la vigencia fiscal 2025, la estructuración técnica, jurídica y financiera de los procesos contractuales, la limitada capacidad operativa de la administración municipal y la necesidad de expedir adendas que modificaron los cronogramas de la licitación pública y del concurso de méritos, lo que ocasionó que las actas de inicio de los contratos se suscribieran el 18 de marzo de 2026 y no en las fechas inicialmente proyectadas.

Asimismo, expuso que la etapa de estudios y diseños inició el 25 de marzo de 2026 y comprendió un proceso continuo de mesas técnicas de seguimiento, revisión y validación por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, durante las cuales se formularon observaciones relacionadas con los componentes arquitectónico, estructural, geotécnico, topográfico, hidrosanitario, eléctrico, bioclimático y de energía, requiriéndose sucesivos ajustes hasta obtener la conformidad técnica definitiva mediante la suscripción del Anexo 22 – Acta de Recibo a Satisfacción de los Estudios y Diseños el 30 de junio de 2026, habilitando el inicio de la etapa constructiva a partir del 1 de julio de 2026.

El supervisor explicó que, aunque entre el cronograma inicialmente previsto y la aprobación definitiva de los estudios y diseños transcurrió un período considerable, dicho lapso no corresponde al tiempo efectivo de elaboración de los productos técnicos sino al desplazamiento del cronograma ocasionado por la contratación derivada. Precisó que la elaboración, revisión, ajuste y aprobación de los estudios y diseños se desarrolló efectivamente en un término de tres meses y cinco días, período durante el cual se atendieron las observaciones formuladas por la supervisión y se consolidaron los productos técnicos de todas las especialidades hasta obtener su aprobación definitiva, condición indispensable para iniciar la construcción bajo la modalidad de llave en mano.

Con fundamento en la trazabilidad administrativa y contractual del proyecto, concluyó que la secuencia de ejecución de las etapas de contratación derivada, estudios y diseños y construcción constituye un proceso sucesivo e interdependiente, razón por la cual el tiempo requerido para culminar las primeras etapas redujo el plazo disponible para ejecutar la fase constructiva. No obstante, verificó que el cronograma actualizado presentado por el contratista, avalado por la interventoría y validado por el municipio, resulta técnicamente consistente con las cantidades de obra pendientes, la ruta crítica y la programación de las actividades restantes, proyectando la culminación de la obra durante el mes de diciembre de 2026, incluyendo las pruebas de funcionamiento, certificaciones RETIE y RETILAP, conexión definitiva de servicios públicos, recibo de la infraestructura y cierre del convenio.

El supervisor manifestó igualmente que el plazo vigente del convenio resulta insuficiente para ejecutar integralmente la fase constructiva y las actuaciones posteriores relacionadas con la validación técnica, control de calidad, obtención de certificaciones, puesta en operación, suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Bienes FONSECON y cierre técnico, administrativo y financiero del convenio. Precisó que la modificación propuesta no altera el objeto, alcance, especificaciones técnicas, obligaciones contractuales ni el valor del convenio, limitándose exclusivamente a ampliar el término de ejecución.
En el componente financiero, el supervisor verificó que el Ministerio del Interior ha efectuado dos desembolsos por valor total de $1.592.500.000 y que existen los recursos necesarios para continuar la ejecución del proyecto. Asimismo, dejó constancia de los rendimientos financieros generados y del saldo disponible en la cuenta del convenio, concluyendo que la prórroga no implica



**Sede correspondencia** Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
**Conmutador** (1) 242 74 00 •**Línea gratuita** 018000910403
**Sitio Web**www.mininterior.gov.co•**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
**Código postal 111711 • Bogotá D.C., Colombia**

adición de recursos ni modificación de las condiciones financieras inicialmente pactadas.

Desde el análisis jurídico, el supervisor fundamentó la procedencia de la prórroga en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, el Instructivo de Supervisión de Proyectos FONSECON y los conceptos C-112 de 2024 y C-303 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, señalando que la ampliación del plazo constituye una modificación contractual legítima cuando responde a circunstancias objetivamente justificadas, no altera la naturaleza del negocio jurídico, se encuentra debidamente soportada y busca garantizar el cumplimiento del objeto contractual sin afectar los principios que rigen la contratación estatal. Igualmente concluyó que las causas que originaron la solicitud son ajenas a conductas negligentes del contratista o del municipio, obedecen al desarrollo normal de la contratación derivada y al proceso técnico de revisión y aprobación de los estudios y diseños, y fueron informadas oportunamente antes del vencimiento del plazo contractual.

Finalmente, el supervisor concluyó que la primera prórroga del Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025 constituye el mecanismo jurídico, técnico, financiero y administrativo más adecuado para garantizar la ejecución integral del proyecto, la correcta inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines del convenio, recomendando aprobar la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 por considerar que el término solicitado resulta suficiente para culminar la construcción, obtener las certificaciones técnicas, efectuar el recibo definitivo de la obra y adelantar el cierre integral del convenio.

**5.-** Para la presente modificación contractual, asiste la voluntad de las partes y se efectúa en el marco legal y jurisprudencial. En este caso, la posibilidad que se tiene de modificar un contrato estatal cuenta con una limitación temporal, es decir, que la misma se debe hacer dentro del plazo de ejecución de este. El plazo del Convenio 2336 de 2025, no se ha culminado y, por lo tanto, esta prórroga se encuentra a tiempo de ser suscrita

**6.-** Que según concepto del Consejo de Estado "la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos (…) Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar... diferencias, (ibidem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar (…) Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. (…) De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes"[1].

**7.-** Que en mérito de lo expuesto y la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y con fundamento en lo señalado por el artículo 1602 del Código Civil, acuerdan celebrar el presente otrosí al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2336 de 2025, el cual se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA - PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo 2336 de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo de condiciones del convenio, la cual quedará así:

[1] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. Bogotá,D.G., 13 de agosto de 2009. Radicación No. 1.952. 11001-03-06-000-2009-00033-00.



**Sede correspondencia** Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
**Conmutador** (1) 242 74 00 •**Línea gratuita** 018000910403
**Sitio Web**www.mininterior.gov.co•**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
**Código postal 111711 • Bogotá D.C., Colombia**

> ***"CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026)."*

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONVENIO:** Hace parte integral de la presente modificación, la solicitud presentada por el Supervisor del Convenio, con el Radicado 2026-3-003122-021874 Id: 816793 del 28 de julio de 2026, y los documentos soporte.

**CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 2336 de 2025 que no hayan sido sujeto de modificación.

**CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN DE AMPAROS VIGENTES**. El Municipio se obliga a tramitar ante la Aseguradora que profirió la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, los ajustes de acuerdo con lo establecido en la presente prórroga y cargar el respectivo anexo, para aprobación del Ministerio del Interior a través de la plataforma SECOP II.

**CLÁUSULA QUINTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El presente otrosí se entiende perfeccionado por las partes con la aceptación en la plataforma transaccional SECOP II al Convenio Interadministrativo No. 2336 de 2025. LAS PARTES dejan constancia de su conformidad con la misma, y que dicho acto no causa perjuicios a ninguna de las partes.

**Aprobó:** Diego Armando Lechuga del Hoz– Subdirector de Gestión Contractual (e)
**Proyectó**: Ramon José Mendoza Espinosa – Abogado Contratista S.G.C.



**Sede correspondencia** Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
**Conmutador** (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
**Sitio Web**www.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
**Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia**

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01
# ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA
# 6 DE JULIO DE 2026 A 31 DE JULIO DE 2026

**CONTRATO DE OBRA**
No. L.P. – 2025 – 002 de 25 febrero de 2026

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
No. C.M. – 2026 – 001 de 03 marzo de 2026

**PROYECTO**:

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO "**

Contratista de obra
UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA

Contratista de Interventoría

CONSORCIO C&L SAPUYES

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

## TABLA DE CONTENIDO


**1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO.**

1.1. Localización del proyecto.
1.2. Descripción del proyecto.

**2. OBJETOS GENERALES DEL PROYECTO.**

2.1. Objeto de obra.
2.2. Objeto de interventoría.

**3. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.**

**4. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

**5. EQUIPO DE OBRA.**

**6. EQUIPO DE INTERVENTORÍA.**

**7. ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS.**

**8. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.**

**9. ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

**10. AVANCE FISICO DEL PROYECTO.**

**11. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.**

**12. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.**

**13. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER**

**14. MODIFICACIONES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS**

**15. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA**

**16. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**



Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

## ANEXOS

**ANEXO I.** COMITÉ TÉCNICO Y REUNIONES TÉCNICAS.

**ANEXO II.** EQUIPO DE OBRA E INTERVENTORÍA

**ANEXO III.** CONTROL DE PERSONAL EN OBRA E INTERVENTORÍA.

**ANEXO IV.** CONTROL ESTADOS DEL TIEMPO.

**ANEXO V.** BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO DEL INFORME.

**ANEXO VI.** PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE OBRA.

**ANEXO VII.** PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

**ANEXO VIII.** SEGUIMIENTO A PÓLIZAS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

**ANEXO IX.** RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

**ANEXO X.** INFORME AMBIENTAL Y SST.

**ANEXO XI.** CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD.

**ANEXO XII.** CONTROL DE CAMBIOS Y SEGUIMIENTOS

**ANEXO XIII.** REGISTRO FOTOGRÁFICO.

**ANEXO XIV.** CAPACITACIONES TÉCNICAS.

**ANEXO XV.** INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA.

**ANEXO XVI.** CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA.

**ANEXO XVII.** RESUMEN DE CANTIDADES.

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El presente informe corresponde al seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto denominado "Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana 'Paz a lo Bien' Tipo 1", el cual se ejecuta en el municipio de Sapuyes, departamento de Nariño, bajo la modalidad de contrato de obra pública.

El proyecto es desarrollado por el contratista Unión Temporal Desarrollo Sapuyes, bajo la supervisión de la interventoría Consorcio C&L Sapuyes, y tiene como finalidad la ejecución integral de los estudios, diseños y obras necesarias para la construcción del equipamiento comunitario, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y Ministerio del Interior.

El contrato contempla su desarrollo en dos etapas: una primera etapa correspondiente a la elaboración de los estudios y diseños, y una segunda etapa destinada a la ejecución de las obras. El presente informe corresponde a la Etapa II – Ejecución de Obra, durante la cual se adelantaron actividades relacionadas con excavaciones, conformación y nivelación del terreno, necesarias para la preparación de las áreas destinadas a la construcción de los diferentes elementos contemplados en el proyecto.

| COMPONENTE | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |
|---|---|
| **OBJETO** | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES (NAR.)<br>R.L. DRA. LEIDY YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES<br>NIT. 800099149-6 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. ING. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA<br>NIT. 902033941-1 |
| **VALOR ETAPA I** | CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE ($ 149.827.981,00). |
| **VALOR ETAPA II** | MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.846.883.748,00). |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA** | MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 1.996.711.729,00). |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | U.T. CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA R.<br>NIT. 902042007 – 3 |

| COMPONENTE | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |
|---|---|
| **VALOR ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS** | OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($84.123.457,00) |
| **VALOR ETAPA II – EJECUCIÓN** | TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($369.164.814,00) |
| **VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($453.288.271,00). |
| **FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001** | DOCE (12) DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN** | VEINTE (20) DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN** | SEIS (06) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE ACTA INICIO ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS** | DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA DE ACTA INICIO ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA** | SEIS (06) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ No. 001.** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **PLAZO EN MESES** | CUATRO (04) MESES Y TRECE (13) DIAS |
| **PERIODO DEL INFORME** | DEL SEIS (06) DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **ETAPA ACTUAL** | ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA |

## 1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de intervención del proyecto se localiza en el corregimiento El Espino, jurisdicción del municipio de Sapuyes. Este municipio se encuentra en el departamento de Nariño, al suroccidente del país, a una distancia aproximada de 79 km de Pasto.



*Ilustración 1. Localización general del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño*

El predio destinado para la ejecución del proyecto se encuentra sobre la vía principal de acceso al corregimiento, en un sector central y consolidado de la población, lo que permite una adecuada conectividad con las diferentes áreas residenciales y comunitarias del sector.

La ubicación del lote presenta condiciones favorables de accesibilidad vehicular y peatonal, debido a que se encuentra contiguo a la infraestructura vial existente del corregimiento, facilitando el ingreso de personal, maquinaria, materiales y demás elementos requeridos para el desarrollo de las obras. Así mismo, el predio cuenta con relación directa con las dinámicas urbanas y comunitarias del sector, permitiendo que el futuro equipamiento tenga integración con el entorno inmediato y facilidad de acceso para la población beneficiaria.

El área de intervención corresponde a un terreno en el cual se identificaron elementos existentes como vías, andenes, cerramientos, postes, alcantarillas y demás componentes de infraestructura presentes en el entorno inmediato del proyecto. La localización del predio fue definida estratégicamente con el propósito de garantizar la funcionalidad del equipamiento proyectado y permitir una adecuada implantación arquitectónica, urbanística y estructural dentro del área disponible.

Adicionalmente, el lote cuenta con puntos topográficos materializados y georreferenciados bajo el sistema MAGNA SIRGAS, lo que permite contar con una referencia técnica precisa para el desarrollo de los estudios, diseños y posterior ejecución de las obras. La ubicación del proyecto dentro del corregimiento de El Espino facilita igualmente la articulación con las redes de servicios públicos existentes y con las condiciones de movilidad del sector, aspectos fundamentales para la viabilidad técnica y operativa del proyecto.

La tabla 1. Coordenadas Elipsoidales presenta la ubicación geográfica exacta de los dos puntos de control (GPS 1 y GPS 2) materializados en el predio donde se construirá el Centro de Convivencia “Paz a lo Bien”. Estas coordenadas (latitud, longitud y cota) definen con precisión la localización del proyecto en el corregimiento de El Espino, municipio de Sapuyes, departamento de Nariño.

| Punto | Latitud | Longitud | Altura Elipsoidal | Cota (msnm) |
|---|---|---|---|---|
| **GPS 1** | 1° 02' 44.94539" N | 77° 41' 30.48663" W | 3.177,465 m | **3.145,765** |
| **GPS 2** | 1° 02' 42.52945" N | 77° 41' 29.77664" W | 3.172,733 m | **3.141,033** |

*Tabla 1 Coordenadas Elipsoidales (Grados, minutos, segundos)*

La tabla 2. Coordenadas Planas locales muestra las coordenadas planas (Norte y Este) de los puntos GPS 1 y GPS 2, las cuales sirven como referencia principal para ubicar y delimitar el terreno del proyecto. Estos valores confirman que el predio se encuentra sobre la vía principal

del corregimiento de El Espino y constituyen la base cartográfica para el replanteo y ejecución de todas las obras del Centro de Convivencia "Paz a lo Bien".

| Punto | Norte (m) | Este (m) | Cota (msnm) |
|---|---|---|---|
| **GPS 1** | 607.413,958 | 931.623,664 | 3.145,765 |
| **GPS 2** | 607.339,717 | 931.645,623 | 3.141,033 |

*Tabla 2 Coordenadas Planas Locales*

## 1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Centro de Convivencia Ciudadana Paz a lo Bien Tipo 1", localizado en el corregimiento de El Espino, municipio de Sapuyes – Nariño, se encuentra actualmente en la Etapa II – Ejecución de Obra, correspondiente a la materialización física de las soluciones arquitectónicas, estructurales y complementarias definidas en la fase de estudios y diseños previamente aprobada.

La presente etapa comprende el desarrollo de las actividades constructivas necesarias para la conformación integral del Centro de Convivencia Ciudadana, incluyendo las obras preliminares, movimientos de tierra, excavaciones, cimentación, estructuras, redes hidrosanitarias, sistemas de drenaje, obras arquitectónicas y demás componentes técnicos requeridos para la puesta en funcionamiento de la infraestructura proyectada.

La ejecución de las obras tiene como propósito dotar al corregimiento de El Espino de un espacio físico adecuado para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales, recreativas, deportivas y pedagógicas, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la integración social y la participación comunitaria.

El proyecto se desarrolla conforme a los lineamientos técnicos establecidos para los Centros de Convivencia Ciudadana Tipo 1, en el marco de las políticas nacionales de seguridad y convivencia ciudadana financiadas a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). En esta fase, las labores de interventoría se orientan al seguimiento técnico, administrativo, financiero y de calidad de las actividades ejecutadas en obra, verificando su cumplimiento respecto a los planos, especificaciones técnicas, cronograma contractual y demás documentos que hacen parte del contrato.

La infraestructura beneficiará directamente a la población del corregimiento El Espino y del municipio de Sapuyes, proporcionando un equipamiento comunitario destinado a promover espacios de encuentro, formación, recreación y fortalecimiento del tejido social, con especial impacto en niños, jóvenes y adultos de la región.

A continuación, se presenta un análisis comparativo entre las memorias descriptivas y lineamientos técnicos recomendados por el Ministerio para los Centros de Convivencia Ciudadana Tipo 1, frente a la propuesta arquitectónica desarrollada por el contratista de obra, verificando su concordancia con las necesidades funcionales, técnicas y urbanísticas del proyecto.



| | |
|---|---|
|  |  |
| *Ilustración 2. Proyección Render arquitectónico o 3D tomada de la memoria descriptiva – proyecto de infraestructura para la convivencia* | *Ilustración 3. Diseño arquitectónico render arquitectónico o 3D – Contratista de obra* |

El proyecto contempla una infraestructura con un área total aproximada de 1.116 m², compuesta por zonas cubiertas y descubiertas. Su configuración principal incluye:

- Área multipropósito: Corresponde al espacio central del proyecto, concebido como el principal punto de encuentro e integración social. Está conformado por una plazoleta de carácter polivalente que incluye graderías, acceso por medio de rampas en un nivel bajo de -0.20 m y una tarima con acceso mediante rampa a un nivel de +0.40 m, con un área total de 200.67 m² de toda la edificación, destinada al desarrollo de eventos comunitarios y actividades multiculturales de mediana y baja escala.


  Este espacio se encuentra delimitado por muros perimetrales diseñados para la ergonomía bioclimática en clima frío y la redistribución de vientos, permitiendo la realización de actividades lúdicas y culturales, tales como proyección de material audiovisual, muralismo y expresiones artísticas.

  Adicionalmente, cuenta con una cubierta tipo maloca que garantiza condiciones de confort bioclimático y se constituye como el elemento icónico del proyecto, al evocar referentes tradicionales del contexto colombiano, además de generar una centralidad técnica dentro del proyecto.
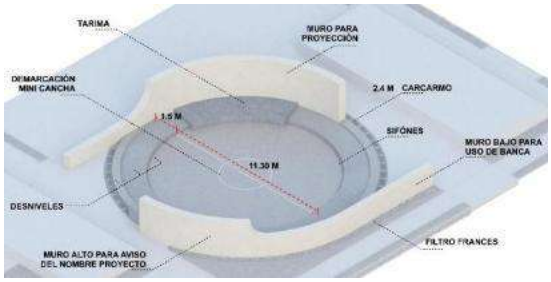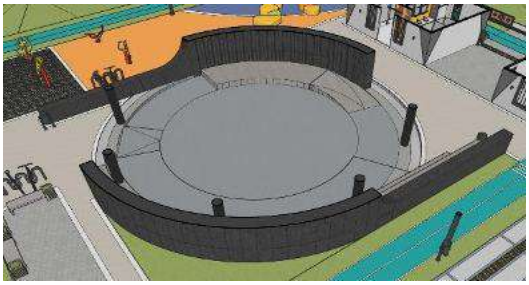
| | |
|---|---|
|  |  |



| | |
|---|---|
| *Ilustración 4. Área multipropósito tomada de la memoria descriptiva – proyecto de infraestructura para la convivencia* | *Ilustración 5. Diseño área multipropósito – contratista de obra* |

- Zona de servicios: Este componente contempla la construcción de una edificación que incluye baterías sanitarias diferenciadas (para hombre y mujeres), incorporando además baños para personas con movilidad reducida conforme a la normativa NTC 6047. Así mismo, integra espacios complementarios destinados para la preparación de alimentos (cocineta), almacenamiento o zona de oficina, además de una zona cubierta multiuso, todo este conjunto arquitectónico cuenta con un área total de 73 m².
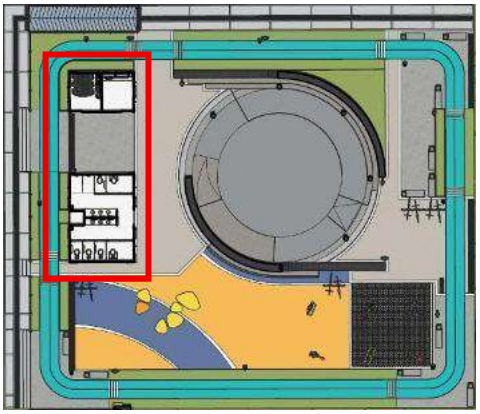
| | |
|---|---|
|  |  |
| *Ilustración 6. Zona de servicios, tomada de la memoria descriptiva – proyecto de infraestructura para la convivencia* | *Ilustración 7. Diseño Zona de servicios – contratista de obra* |



- Zona biosaludable: Corresponde a un componente urbano orientado a promover la actividad física, el bienestar y la salud de la comunidad del municipio de Sapuyes, específicamente en el corregimiento El Espino. Incluye la implementación de un gimnasio biosaludable con equipos de acondicionamiento físico exterior, diseñado para incentivar hábitos de vida saludable en población de todas las edades, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, está conformado por una zona amplia destinada al desarrollo de actividades físicas relacionadas con el ejercicio, tales como bailoterapia. Este espacio cuenta con un área de 203.79 m².

  También, contempla una pista de trote perimetral destinada a la práctica de ejercicio aeróbico y al aprovechamiento del espacio público, con un área de 164.16 m².
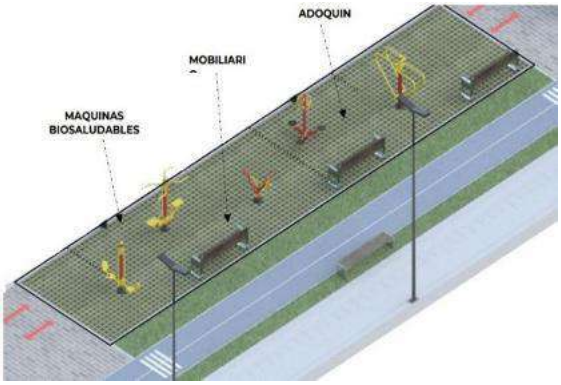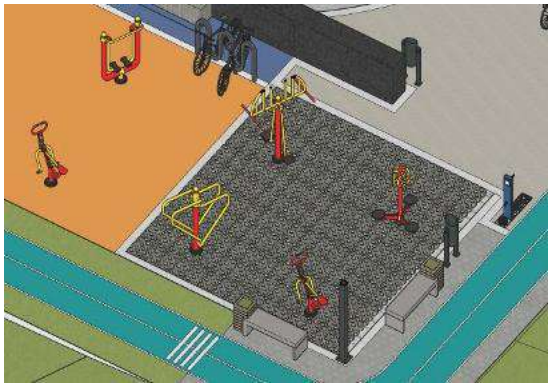
| | |
|---|---|
|  |  |
| *Ilustración 8. Zona biosaludable, tomada de la memoria descriptiva – proyecto de infraestructura para la convivencia* | *Ilustración 9. Diseño zona biosaludable – Contratista de obra* |

La memoria descriptiva, incorpora lineamientos constructivos estandarizados, contemplando una estructura portante compuesta por zapatas, columnas, vigas de desplante, sistemas estructurales en mampostería, cubiertas metálicas y acabados tipo enchape para baterías sanitarias y cocineta. Asimismo, incluye los diseños de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas conforme a la normativa vigente, tales como RETIE, RETILAP y NSR-10, entre otras disposiciones aplicables.

De igual manera, el proyecto contempla la implementación de un sistema fotovoltaico integrado al funcionamiento de la infraestructura, garantizando el cumplimiento de las normativas técnicas y reglamentarias vigentes aplicables al diseño y ejecución de instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación.
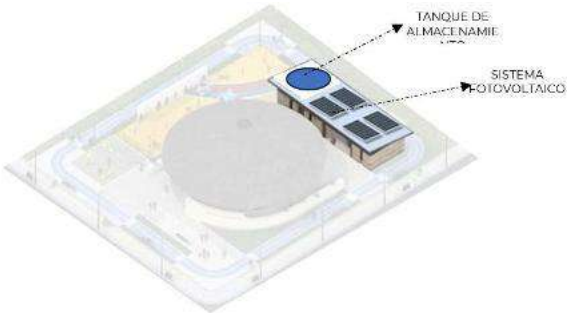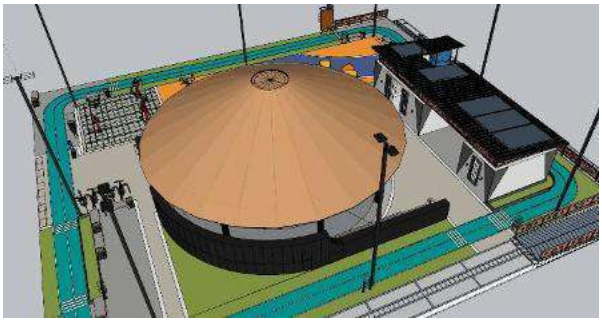
| | |
|---|---|
|  |  |
| *Ilustración 10. Vista en planta Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1, tomada de la memoria descriptiva – proyecto de infraestructura para la convivencia* | *Ilustración 11. Vista en planta de Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1 – Contratista de obra* |

## 2. OBJETOS GENERALES DEL PROYECTO

### 2.2. OBJETO DE OBRA

El contrato de obra tiene por objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

El alcance del contrato incluye, en una primera etapa, la elaboración y validación de los estudios y diseños en sus diferentes componentes, tales como arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico y urbano, garantizando su coherencia técnica y cumplimiento de la normatividad vigente.

En una segunda etapa, contempla la ejecución de las obras, incluyendo actividades de adecuación del terreno, cimentación, construcción de la estructura, desarrollo de elementos arquitectónicos, instalaciones técnicas y obras complementarias, hasta su terminación y entrega en condiciones óptimas de funcionamiento.

### 2.3. OBJETO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoría tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

En desarrollo de este objeto, la interventoría ejerce funciones de verificación permanente sobre la calidad de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los plazos, la adecuada inversión de los recursos y la correcta aplicación de los procedimientos técnicos y administrativos, así como la emisión de observaciones, recomendaciones y conceptos orientados a asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

## 3. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe, se realizó la actualización de las garantías correspondientes al contrato de obra No. L.P. – 2025 – 002 y al contrato de interventoría, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Modificatoria No. 02, mediante la cual se aprobó una prórroga en el plazo de ejecución contractual.

La actualización de las pólizas fue efectuada por las respectivas aseguradoras con el fin de ajustar la vigencia de los amparos contractuales al nuevo plazo establecido en el Acta Modificatoria No. 02, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución de los contratos durante el período adicional otorgado.

En consecuencia, las garantías de cumplimiento, calidad de la obra, estabilidad y demás amparos exigidos contractualmente, tanto para el contrato de obra como para el contrato de

interventoría, quedan actualizadas y vigentes conforme al nuevo término contractual prorrogado, manteniéndose de esta manera el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables para la correcta ejecución y supervisión del proyecto.

| TIPO DE PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE PÓLIZA | NO. DE ANEXO |
|---|---|---|---|
| Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal | Aseguradora solidaria de Colombia | 775 – 47 – 994000004648 | III |
| Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual | Aseguradora solidaria de Colombia | 775 – 74 – 994000000913 | III |

Nota 1. Los términos de vigencia y valores de este amparo fueron actualizados y ajustados en concordancia con lo estipulado en el Acta Modificatoria No.02 suscrita el 31 de julio de 2026.

## 4. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe, se realizó la actualización de las garantías correspondientes al contrato de interventoría No. C.M. – 2026 – 001, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Modificatoria No. 02, mediante la cual se aprobó una prórroga en el plazo de ejecución contractual.

La actualización de la póliza fue efectuada por la respectiva aseguradora con el propósito de ajustar la vigencia de los amparos contractuales al nuevo plazo establecido en el Acta Modificatoria No. 02, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución de las actividades de interventoría durante el período adicional otorgado.

En consecuencia, las garantías de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como los demás amparos exigidos contractualmente, correspondientes al contrato de interventoría, quedan actualizadas y vigentes conforme al nuevo término contractual prorrogado, manteniéndose de esta manera el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables para la correcta ejecución, seguimiento y supervisión integral del proyecto.

| TIPO DE PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE PÓLIZA | NO. DE ANEXO |
|---|---|---|---|
| **Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal** | Seguros del estado S.A. | 41 – 44 – 101303666 | VII |

Nota 1. Los términos de vigencia y valores de este amparo fueron actualizados y ajustados en concordancia con lo estipulado en el Acta Modificatoria No.02 suscrita el 31 de julio de 2026.

## 5. EQUIPO DE OBRA

| CARGO | NOMBRE | PROFESIÓN |
|---|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA** | FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO | -INGENIERO CIVIL<br>-ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA<br>-MAGISTER EN INGENIERIA AMBIENTAL |
| **RESIDENTE DE OBRA** | JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES | -INGENIERO CIVIL<br>-GERENCIA DE PROYECTOS |
| **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** | JAVIER ANDRES RUEDA ZARAMA | -INGENIERO CIVIL<br>-ESPECIALISTA EN<br>-ESTRUCTURAS<br>-MAGISTER EN ESTRUCTURAS<br>-MAGISTER EN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES<br>-MASTER EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS |
| **PROFESIONAL AMBIENTE SST** | KAROL YINETH ROSERO NARVAEZ | -INGENIERA AMBIENTAL<br>-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

## 6. EQUIPO DE INTERVENTORÍA

| CARGO | NOMBRE | PROFESIÓN |
|---|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA** | ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA | -INGENIERO CIVIL<br>-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS<br>-ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS<br>-ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL |
| **RESIDENTE DE OBRA** | JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO | -ARQUITECTO<br>-ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO BIOCLIMATICO<br>-MASTER EN BIM MANAGEMENT |
| **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** | JESUS HERNANDO REVELO BENAVIDES | -INGENIERO CIVIL<br>-ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |
| **PROFESIONAL AMBIENTE SST** | DAYANA PARDO DELGADO | -INGENIERA AMBIENTAL<br>-ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

## 7. ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe, los contratos de obra e interventoría se encuentran vigentes y en ejecución. Asimismo, se deja constancia de que durante el desarrollo contractual se presentó una suspensión temporal de las actividades comprendida entre el 20 de mayo de

2026 y el 6 de julio de 2026, de conformidad con las actas y documentos contractuales suscritos por las partes.

De igual manera, se deja constancia de que el 20 de mayo de 2026 el contratista de obra e interventoría realizaron la radicación de los estudios y diseños correspondientes a la Etapa I – Estudios y Diseños, para su revisión por parte del municipio de Sapuyes y el Ministerio del Interior, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma y en las obligaciones contractuales para esta fase del proyecto.

Posteriormente, el 6 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio de Obra, mediante la cual se autorizó la reanudación de las actividades contractuales una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión. En esta misma fecha se suscribió el Acta de Inicio de la Etapa II – Ejecución de Obra, mediante la cual se dio inicio formal a las actividades correspondientes a esta fase del contrato, de conformidad con las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

Mediante el Modificatorio No. 02 suscrito el 31 de julio de 2026, se acordó prorrogar el plazo de ejecución de los Contratos de Obra No. LP-2025-002 y el contrato de Interventoría No. C.M. – 2026 – 001, modificando formalmente la Cláusula Cuarta del contrato principal en los siguientes términos:

> *"CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del Contrato será desde la suscripción del acta de inicio, hasta el día catorce (14) de diciembre del año 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones."*

Esta prórroga se fundamenta técnicamente en la solicitud presentada por el contratista de obra y el posterior aval de la interventoría (Consorcio C&L Sapuyes), atendiendo a la necesidad de garantizar los tiempos requeridos para los procesos constructivos de la Etapa II (curado de concretos, variaciones climáticas en la zona, logística de suministro de materiales, pruebas de calidad y gestiones de certificaciones RETIE/RETILAP), así como en la previa suscripción del Otro Sí No. 01 al Convenio de Cofinanciación No. 2336 de 2025 entre el Municipio y el Ministerio del Interior - FONSECON, el cual amplió la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026.

A la fecha, el contrato mantiene como fecha límite de terminación de la obra el 14 de diciembre de 2026, encontrándose el contratista en la obligación de mantener actualizadas las garantías contractuales correspondientes.

## 8. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado correspondiente al seis (06) de julio hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026, el proyecto avanza satisfactoriamente en el desarrollo de la Etapa II – Ejecución de Obra, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas para la preparación del terreno, ejecución de redes y conformación de elementos estructurales requeridos para la construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1", en el corregimiento El Espino, municipio de Sapuyes, Nariño.

En atención al reinicio de actividades autorizado mediante el Acta de Reinicio de Obra suscrita el día seis (06) de julio de 2026, el contratista dio inicio a las labores de campo correspondientes a la etapa constructiva, priorizando las actividades relacionadas con el movimiento de tierras, adecuación de áreas de intervención y ejecución de las redes técnicas contempladas en los diseños aprobados.

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se describen a continuación:

- Localización y replanteo: Se ejecutaron las actividades de identificación, demarcación y materialización en campo de los ejes, niveles, alineamientos y puntos de referencia requeridos para la adecuada ejecución de las obras, conforme a los planos, especificaciones técnicas y diseños previamente aprobados del proyecto. Estas labores permitieron establecer con precisión la ubicación de los elementos estructurales y constructivos, garantizando la correcta implantación de la obra y el cumplimiento de las condiciones geométricas definidas en los estudios y diseños.

  De igual manera, se realizó el replanteo individual de las zapatas proyectadas en la cimentación de la maloca, verificando para cada una de ellas su orientación y dirección específica de acuerdo con la disposición estructural establecida en los planos aprobados, asegurando la correcta ubicación de los ejes longitudinales y transversales, así como el adecuado posicionamiento de los elementos de cimentación respecto a la estructura general del proyecto.

  Adicionalmente, se adelantaron actividades de nivelación y verificación altimétrica del terreno, efectuando controles de cotas y pendientes con el fin de garantizar que la superficie intervenida correspondiera a los niveles de diseño establecidos. Estas labores incluyeron la conformación preliminar del terreno y la comprobación de las diferencias de nivel existentes, permitiendo definir las condiciones adecuadas para la excavación, cimentación y posterior ejecución de las obras, minimizando posibles desviaciones geométricas y asegurando la estabilidad y correcta funcionalidad de los elementos estructurales proyectados.



*Ilustración 12 Localización y replanteo*

- Excavación a mano en material común: Esta actividad comprendió la excavación para la construcción de zapatas, vigas de cimentación, cajillas de inspección y la instalación de las redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, garantizando el cumplimiento de las cotas, alineamientos y pendientes definidas en los diseños técnicos. Asimismo, las excavaciones se ejecutaron considerando las condiciones particulares del terreno, en el cual se evidenció la presencia de material rocoso, lo que requirió mayores labores de adecuación y precisión en la conformación de las excavaciones para asegurar la correcta ejecución de los elementos de cimentación y de las redes de servicios proyectadas.



*Ilustración 13 Excavaciones a mano*

- Excavación mecánica sin clasificar: Se ejecutaron labores de remoción de material mediante maquinaria especializada, consistentes en excavaciones mecánicas para la nivelación y conformación del terreno, con el fin de alcanzar las cotas de diseño establecidas en el proyecto. Estas actividades permitieron adecuar las áreas de intervención y generar superficies uniformes y estables para el desarrollo de las obras de cimentación y demás elementos constructivos contemplados, garantizando condiciones adecuadas para la continuidad de los frentes de trabajo.



*Ilustración 14 Excavación mecánica*

- Desalojo de material proveniente de excavación: Se efectuaron actividades de cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de las excavaciones, manteniendo las áreas de trabajo despejadas, seguras y aptas para la continuidad de las obras posteriores. El material excavado fue desalojado mediante el uso de equipos y vehículos adecuados para su transporte, y su disposición final se realizó en el sitio autorizado y suministrado por el municipio, dando cumplimiento a las directrices establecidas para el manejo y disposición de materiales sobrantes de obra y contribuyendo al adecuado control ambiental y operativo del proyecto.



*Ilustración 15 Excavación mecánica*

- Acero de refuerzo PDR 60: Se adelantó la instalación y conformación del acero de refuerzo estructural, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con diámetros, figuración, separación, amarres y disposición del refuerzo para los elementos de concreto reforzado proyectados. Como parte de estas actividades, se realizó el armado de las parrillas de refuerzo para las zapatas, de acuerdo con los planos estructurales y las dimensiones definidas en el diseño, garantizando la correcta ubicación y amarre de las barras para asegurar el adecuado comportamiento estructural de los elementos de cimentación.





*Ilustración 16 Acero de refuerzo*

- Red hidráulica en PVC de 1": se ejecutaron actividades de trazado, instalación de tubería y accesorios, así como las verificaciones preliminares de alineamiento y pendiente requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua. Estas labores se desarrollaron con el propósito de habilitar la conexión hidráulica del proyecto al sistema de suministro existente, asegurando la correcta integración de la acometida principal con las redes internas proyectadas. Asimismo, se verificó la adecuada ubicación de las tuberías, accesorios, uniones y puntos de empalme, garantizando la continuidad del flujo, la hermeticidad de las conexiones y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la posterior puesta en funcionamiento del sistema.




*Ilustración 17 Red hidráulica 1"*

- Red de aguas lluvias en tubería de 6": se realizaron excavaciones, instalación de tubería y demás actividades complementarias necesarias para asegurar la correcta captación y conducción de las aguas pluviales generadas en el proyecto. Asimismo, se efectuaron verificaciones de alineamiento, nivel y pendiente de la tubería instalada, garantizando la adecuada evacuación de las aguas de escorrentía y la correcta integración de la red pluvial con los elementos de drenaje proyectados, conforme a las especificaciones técnicas y planos de diseño establecidos para la obra.




*Ilustración 18 Red de aguas lluvias de 6"*

La interventoría efectuó seguimiento permanente a cada una de las actividades ejecutadas, verificando su desarrollo conforme a los planos aprobados, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, normas aplicables y condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo. Así mismo, se realizaron inspecciones de campo, revisión de materiales, control de ejecución y registro del avance físico de las obras, dejando las observaciones y recomendaciones correspondientes para garantizar la calidad y correcta ejecución del proyecto.

En términos generales, el estado actual del contrato refleja un avance favorable y coherente con la programación establecida para la Etapa II – Ejecución de Obra, observándose una adecuada articulación entre las actividades de movimiento de tierras, instalación de redes y preparación de elementos estructurales, lo que permite dar continuidad a las fases constructivas siguientes y mantener el desarrollo del proyecto dentro de las condiciones técnicas previstas.

## 9. ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ETAPA II | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN DE OBRA** | | | | | |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD** | **% PENDIENTE POR EJECUTAR** | **ESTADO** |
| 1.01 | Excavación a mano en material común | M3 | 100% | 0% | EJECUTADO |
| **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | | | | | |
| Se ejecutaron labores de excavación manual en material común, utilizando herramienta menor, para la conformación de zanjas y excavaciones localizadas requeridas para cimentaciones y redes hidráulicas, sanitarias y pluviales. La actividad comprendió el replanteo del área, corte y remoción manual del terreno, perfilado de paredes y fondo de excavación, control de niveles y disposición temporal del material extraído, garantizando las dimensiones y cotas establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.<br><br>**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**<br><br>la actividad de excavación a mano en material común se medirá en metros cúbicos ($m^3$) de material excavado, calculados con base en las dimensiones indicadas en los planos aprobados y verificadas en obra por la Interventoría, considerando únicamente los volúmenes realmente ejecutados y aceptados. El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato por metro cúbico ($m^3$) de excavación manual debidamente ejecutada y aprobada, precio que incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución. | | | | | |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | | | | | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Detalle excavaciones | Detalle excavaciones |
|  |  |
| Detalle excavaciones | Detalle excavaciones |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | % EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD | % PENDIENTE POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Excavación mecánica sin clasificar | M3 | 100% | 0% | EJECUTADO |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Se realizaron actividades de excavación mecánica en material sin clasificar mediante el uso de maquinaria pesada, con el propósito de efectuar la nivelación general del terreno y adecuar las áreas destinadas a la ejecución del proyecto. La actividad comprendió el corte y remoción de material, conformación de plataformas, perfilado y regularización de la superficie intervenida, de acuerdo con las cotas y niveles establecidos en los planos y especificaciones técnicas. Asimismo, se efectuó el cargue, retiro y disposición del material producto de la excavación, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad, accesibilidad y preparación de los frentes de trabajo para el desarrollo de las actividades posteriores de cimentación y construcción de redes e infraestructura proyectada.

**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

la actividad de excavación mecánica sin clasificar para nivelación del terreno se medirá en metros cúbicos ($m^3$) de material excavado, cortado, removido y conformado, calculados con base en las dimensiones y niveles establecidos en los planos aprobados y verificados en obra por la Interventoría, considerando únicamente los volúmenes realmente ejecutados y aceptados. El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato por metro cúbico ($m^3$) de excavación mecánica sin clasificar debidamente ejecutada y aprobada.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Excavación mecánica.



Excavación mecánica.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | % EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD | % PENDIENTE POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Desalojo de material proveniente de excavación | M3 | 100% | 0% | EJECUTADO |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

se realizaron actividades de cargue, retiro, transporte y disposición del material producto de las excavaciones manuales y mecánicas ejecutadas en los diferentes frentes de obra, incluyendo áreas de cimentación, redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, así como sectores intervenidos para la nivelación del terreno. La actividad comprendió la recolección del material excavado, su cargue mediante medios manuales y mecánicos, el transporte hacia zonas autorizadas de acopio o disposición final y la limpieza de las áreas intervenidas, garantizando la adecuada evacuación del material sobrante y manteniendo los frentes de trabajo en condiciones seguras, ordenadas y aptas para la continuidad de las actividades constructivas posteriores, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y las disposiciones ambientales aplicables.

**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

La actividad de desalojo de material proveniente de excavación se medirá en metros cúbicos ($m^3$) de material efectivamente cargado, transportado y dispuesto, determinados con base en los volúmenes

de excavación ejecutados y aprobados por la Interventoría. El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato por metro cúbico ($m^3$) de material desalojado, el cual incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, tales como recolección del material, cargue manual o mecánico, suministro y operación de equipos y vehículos de transporte.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Desalojo de material.



Desalojo de material.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | % EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD | % PENDIENTE POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Acero de refuerzo PDR 60. | KG | 18.18% | 81.82% | EJECUCIÓN |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Se realizaron actividades correspondientes al suministro, corte, figurado, habilitado y colocación de acero de refuerzo corrugado grado PDR 60, destinado a los elementos estructurales del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos estructurales y detalles de refuerzo aprobados. La actividad comprendió la verificación de diámetros, longitudes, traslapos, ganchos y separaciones, así como el amarre y fijación de las barras mediante alambre recocido, garantizando su adecuada posición, alineación y recubrimiento antes del proceso de fundida del concreto. Asimismo, se efectuó el control y revisión del refuerzo instalado en zapatas, vigas de cimentación, columnas y demás elementos estructurales proyectados, asegurando el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad y calidad establecidos para la estructura.

**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

La actividad de suministro, corte, figurado, habilitado y colocación de acero de refuerzo PDR 60 se medirá en kilogramos (kg) de acero efectivamente instalado y aceptado por la Interventoría, de acuerdo con los planos estructurales, despieces y cantidades verificadas en obra. La cantidad se determinará con base en el peso teórico correspondiente al diámetro, longitud y número de barras colocadas, incluyendo los traslapos, ganchos, dobleces y elementos de amarre contemplados en los diseños aprobados. El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato por kilogramo (kg) de acero de refuerzo PDR 60 debidamente instalado y aprobado.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Diseño eléctrico. | Diseño eléctrico. |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | % EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD | % PENDIENTE POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 | Red hidráulica en PVC de 1” | UND | 100% | 0% | EJECUTADO |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de la red hidráulica en tubería PVC de 1”, destinada al abastecimiento y distribución de agua potable para el proyecto. La actividad comprendió el replanteo de la red, excavación y conformación de zanjas, preparación de la cama de apoyo, suministro e instalación de tubería y accesorios, uniones y conexiones necesarias, así como el alineamiento, nivelación y aseguramiento de la conducción conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

la instalación de la red hidráulica en tubería PVC de 1” se medirá en metros lineales (ml) de tubería efectivamente suministrada, instalada, alineada, nivelada y aceptada por la Interventoría, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y longitudes realmente ejecutadas en obra. La medida incluirá los tramos instalados para la conexión entre la red interna del proyecto y la red del prestador de servicios públicos. El pago se efectuará al precio unitario establecido en el contrato por metro lineal (ml) de red hidráulica en PVC de 1” debidamente ejecutada y aprobada.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Red hidráulica 1” | Red hidráulica 1” |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | % EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD | % PENDIENTE POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | Red Aguas Lluvias 6" | ML | 100% | 0% | EJECUTADO |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Comprende el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de la red de aguas lluvias en tubería de 6", destinada a la captación, conducción y evacuación de las escorrentías generadas dentro del proyecto. La actividad incluye el trazado y replanteo de la red, excavación de zanjas, conformación y nivelación de la cama de apoyo, instalación de la tubería y accesorios, ejecución de uniones, verificación de alineamiento y pendientes, así como el control de cotas y niveles establecidos en los planos de diseño.

**MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

La medición de esta actividad se realizará en metros lineales (ml), conforme a lo establecido en el presupuesto, considerando la instalación completa de la red pluvial en tubería de 6". El pago correspondiente se efectuará con base en el valor unitario pactado, el cual incluye todos los costos asociados al suministro y transporte de la tubería y accesorios, trazado y replanteo, conformación y nivelación de la cama de apoyo, instalación y unión de la tubería, verificación de alineamiento y pendientes.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Red aguas lluvias 6"



Red aguas lluvias 6"

## 10. AVANCE FISICO DEL PROYECTO

| INVERSION | VALOR DE INVERSION | % INVERSION |
|---|---|---|
| **INVERSIÓN PROYECTADA ACUMULADA ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA** | $ 50.037.889,00 | **2.71 %** |
| **INVERSIÓN REAL ACUMULADA ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA** | $ 41.025.090,00 | **2.22 %** |

Con corte al 31 de julio de 2026, la inversión real ejecutada acumulada correspondiente a la Etapa II – Ejecución de Obra alcanzó un valor de CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($41.025.090,00), equivalente al 2,22 % de ejecución financiera acumulada.

Al realizar la comparación con la inversión proyectada acumulada establecida en el cronograma contractual, se evidencia un incumplimiento del 0,49 %, el cual corresponde a un valor de NUEVE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.012.799,00).

Este desfase obedece principalmente a las afectaciones generadas por el racionamiento de agua potable implementado en el municipio, situación que incidió en el normal desarrollo de algunas actividades constructivas que requieren disponibilidad continua del recurso hídrico para procesos de mezcla, curado, limpieza y ejecución de obra.

No obstante, el contratista ha manifestado su compromiso de implementar medidas de recuperación y optimización de los frentes de trabajo, de manera que durante el siguiente mes de ejecución se espera recuperar el atraso presentado e igualar el cronograma contractual, garantizando así la continuidad de las actividades programadas y el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el proyecto.

## 11. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.

**I. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO INICIAL ETAPA I** | **$** | **149.827.981,00** |
| **VALOR CONTRATO INICIAL ETAPA II** | **$** | **1.846.883.748,00** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** | **1.996.711.729.00** |

**II. VALORES RECONOCIDOS AL CONTRATISTA POR OBRA EJECUTADA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO (25% DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN)** | **$** | **00.00** |

**III. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO HASTA 06 DE JULIO DE 2026 ETAPA I**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR EJECUTADO ACUMULADO** | **$** | **149.827.981,00** |
| **% EJECUTADO ACUMULADO** | | **100%** |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | **$** | **0.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **% PENDIENTE POR EJECUTAR** | | **0%** |

**III. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO HASTA 31 DE JULIO DE 2026 ETAPA II**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR EJECUTADO ACUMULADO** | **$** | **41.025.090,00** |
| **% EJECUTADO ACUMULADO** | | **2.22%** |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | **$** | **1.805.858.658.00** |
| **% PENDIENTE POR EJECUTAR** | | **97.78%** |

Con corte al presente periodo, la Etapa II – Ejecución de Obra registra un avance financiero acumulado del 2.22%, reflejando el inicio formal de las actividades constructivas en campo y la consolidación de los primeros productos técnicos contemplados en el alcance contractual.

Durante el mes de reporte, se adelantó la ejecución física de los ítems correspondientes a la fase inicial de adecuación, cimentación e instalaciones hidrosanitarias, destacando las siguientes actividades:

- Movimiento de tierras: Excavación a mano en material común, excavación mecánica sin clasificar y el respectivo desalojo de material proveniente de excavación.

- Cimentación y estructura: Vaciado de solado de limpieza en concreto de 2500 PSI y la figuración, armado e instalación de acero de refuerzo PDR 60.

- Redes técnicas: Instalación y tendido de la red hidráulica en 1" PVC y la red de aguas lluvias en 6".

El cierre del periodo consolida el cumplimiento técnico y la medición de estas unidades de obra, las cuales constituyen la base operativa para la continuidad de los trabajos de cimentación e infraestructura del proyecto.

## 12. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

La interventoría efectuó el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista de obra, actualmente se encuentra adelantando las gestiones necesarias para efectuar los respectivos pagos; sin embargo, manifestó que, debido a las afectaciones ocasionadas por la situación de calamidad derivada del sismo presentado en el departamento del Chocó, se han generado inconvenientes

operativos en la sede de pago ubicada en la ciudad de Cali, circunstancia que ha impedido realizar oportunamente el proceso correspondiente.

En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, el contratista aún no ha presentado los soportes o comprobantes de pago para la validación y verificación por parte de la interventoría.

No obstante, el contratista informó que se pretende contar con la realización efectiva del pago y la entrega de los respectivos soportes a más tardar el día trece (13) de agosto de 2026, una vez se restablezcan las condiciones operativas que permitan efectuar el trámite correspondiente.

La interventoría mantendrá el seguimiento a esta situación y realizará la respectiva validación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales una vez sea recibida la documentación soporte correspondiente.

## 13. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER.

Durante el desarrollo de la Etapa II – Ejecución de Obra, se ha venido presentando una contingencia operativa de carácter externo derivada del racionamiento en la prestación del servicio de agua potable de la zona. De acuerdo con el esquema sectorial, la interrupción del suministro se ejecuta de forma continua en la franja comprendida entre las 10:00 a. m. y las 5:30 p. m.

Esta restricción genera una afectación directa sobre el rendimiento y la continuidad del proyecto, toda vez que se cruza con más del 55% de la jornada laboral oficial (establecida de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.).

Esta limitación compromete el desarrollo normal de los procesos constructivos programados para la fase inicial de cimentación, afectando de manera directa actividades críticas como la fundición de solados y la fundición de zapatas, las cuales requieren de un suministro constante de agua para el vaciado, la mezcla y, fundamentalmente, el proceso de curado continuo para garantizar la resistencia especificada del concreto. Asimismo, se ven impactadas la humectación de materiales para compactación. Como resultado, se registra una reducción imprevista en los rendimientos diarios de las cuadrillas y en el ritmo de ejecución de la ruta crítica.

## 14. MODIFICACIONES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Con el propósito de neutralizar la parálisis de los frentes de trabajo y amortiguar los posibles retrasos en la ruta crítica del proyecto, el Contratista ha dispuesto la instalación e

implementación de tanques de almacenamiento de agua de gran capacidad dentro del campamento de obra.

Esta solución permite hacer acopio del recurso hídrico durante las horas de suministro continuo (en la primera franja de la mañana de 7:00 a. m. a 10:00 a. m.), garantizando una reserva estratégica para surtir de agua a la obra durante el horario de corte. De esta manera, se asegura el insumo básico necesario para mantener la continuidad de las actividades de fundición de solados, fundición de zapatas, procesos de curado e higiene del personal durante el resto de la jornada laboral.

## 15. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

La Interventoría realizó la verificación y seguimiento técnico de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, así como la revisión de los estudios, diseños y cantidades asociadas a los siguientes componentes constructivos:

- Excavación manual en material común.
- Excavación mecánica sin clasificar.
- Desalojo de material proveniente de excavación.
- Solado de limpieza en concreto de 2.500 PSI.
- Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60.
- Instalación de red hidráulica en tubería PVC de 1".
- Instalación de red de aguas lluvias en tubería de 6".

Como resultado de las actividades verificadas, el proyecto presenta un avance acumulado del 2,22 % frente a la programación contractual. No obstante, se evidencia un atraso del 0,49 % respecto al avance previsto para el período evaluado.

La Interventoría considera que este desfase es recuperable y espera que pueda ser disminuido mediante la ejecución continua de las actividades programadas para los próximos períodos, especialmente aquellas relacionadas con la cimentación, redes y demás frentes de trabajo actualmente habilitados, con el fin de garantizar el cumplimiento de la programación general del proyecto.

## 16. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se debe exigir un protocolo estricto de curado. El racionamiento de agua implementado en el municipio interrumpe el servicio entre las 10:00 a.m. y las 5:30 p.m., lo que afecta más del 55% de la jornada laboral. Aunque la instalación de tanques de almacenamiento en el campamento mitiga la parálisis de los frentes de trabajo, la fundición de solados de limpieza (2500 PSI) y zapatas con acero PDR-60 requiere hidratación continua para evitar fisuración prematura. Asimismo, se evidenció la presencia de material rocoso durante las excavaciones, lo cual debe ser monitoreado; si el volumen supera lo previsto en el diseño inicial, se debe requerir al contratista una reevaluación de los equipos mecánicos.

- Debido a que el Modificatorio No. 02 prorrogó el plazo de ejecución hasta el 14 de diciembre de 2026, el contratista tiene la obligación de mantener actualizadas las garantías contractuales correspondientes. Es vital condicionar la firma de futuras actas de obra a la entrega de los anexos modificatorios de la Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil. Igualmente, la aprobación de pagos parciales debe supeditarse a la presentación física de los soportes de Seguridad Social y parafiscales, cuyo plazo máximo argumentado por el contratista es el 19 de agosto de 2026.

- El avance financiero ejecutado acumulado es del 2.22% frente a un proyectado del 2.71%. Este incumplimiento del 0.49% representa un valor de $9.012.799 M/CTE. Es indispensable solicitar formalmente un Plan de Choque o Aceleración que contemple medidas de recuperación y optimización de los frentes de trabajo para el siguiente mes de ejecución, garantizando que este retraso sea mitigado y no se convierta en una tendencia acumulativa.

**CONSORCIO C&L SAPUYES**
R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO
NIT. 902.042.007 – 3

| PROYECTÓ | REVISÓ |
|---|---|
| Arq. Jhonny Mauricio Rosero Carpio | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora |
| Residente de Interventoría | Director de Obra |

***Fecha: 31 de julio de 2026***

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# ANEXOS

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# COMITÉ TÉCNICO Y REUNIONES TÉCNICAS



Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

| | MUNICIPIO DE SAPUYES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COMITÉ TÉCNICO SEMANAL | CÓDIGO | INT.C&L2026 – 001 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| UNIDAD EJECUTORA: | MUNICIPIO DE SAPUYES | FECHA | 17 | JULIO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION TERRITORIAL | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONTRATO No. | LP-2025-002 | | |

**OBJETO DE CONTRATO:**

**CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| LIZA YOHANA ROJAS OJEDA | Ingeniera Civil Contratista/Apoyo a la supervisión | |
| JHON STEVEN BURGOS CAICEDO | Secretario de Planeación Y Obras | |
| FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO | Director de Obra. |  |
| SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA | Representante legal de Interventoría. |  |
| JESSICA STEPHANIE VANEGAS GONGORA | Representante legal de Interventoría. |  |
| | | |
| | | |

**II. OBJETO**

Revisión y análisis del avance físico correspondiente a las dos primeras semanas de ejecución de la obra, verificando su cumplimiento frente al cronograma contractual.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

Inicio de la Etapa II – Ejecución de Obra y seguimiento a las actividades desarrolladas durante las primeras dos semanas.

Apoyo y seguimiento al proceso de contratación y vinculación del personal requerido para la ejecución de la obra.

Presentación y revisión del estado actual de la obra, avance de actividades y cumplimiento de la programación establecida.

**VI. DESARROLLO TEMAS**

Siendo el viernes 17 de julio de 2026, se llevó a cabo el Primer Comité de Seguimiento de Obra mediante la plataforma Microsoft Teams, con la participación de representantes del Ministerio, el Municipio, la Interventoría y el Director de Obra. En el desarrollo del comité se dio seguimiento al inicio de la Etapa II – Ejecución de Obra, formalizada mediante Acta de Inicio suscrita el 6 de julio de 2026, realizando revisión de las actividades adelantadas durante las primeras semanas de ejecución y del estado actual del proyecto.

Durante la sesión, En representación de contratista se realizó la presentación del avance correspondiente a las dos (2) primeras semanas de ejecución del proyecto, exponiendo el porcentaje de avance físico alcanzado, el estado de las actividades ejecutadas, el avance programado frente al ejecutado y los demás aspectos técnicos desarrollados durante el periodo de seguimiento, conforme a la presentación preparada para el comité por parte de obra.

De igual manera, por parte de contratista se dejó constancia ante los representantes del Ministerio y del Municipio que, durante la primera semana posterior al reinicio de la obra, no fue posible iniciar las actividades constructivas programadas, debido a que el Municipio se encontraba ejecutando las labores de descapote y desalojo de la capa vegetal del área de intervención. Estas actividades se extendieron hasta el día sábado de la primera semana, razón por la cual el inicio efectivo de las labores de construcción se dio una vez el área fue entregada en condiciones aptas para la ejecución de las obras.

Como resultado de lo anterior, se informó que el porcentaje de avance correspondiente a la primera semana fue del 0,00 % frente al 0,77 % programado, mientras que en la segunda semana se ejecutó un 1,11 %, permitiendo recuperar parcialmente el avance previsto para el proyecto.

**VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)**

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA / CONDICION |
|---|---|---|
| **El Contratista de Obra continuará con la ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma establecido, implementando las acciones necesarias para recuperar el avance inicialmente afectado por la imposibilidad de intervenir el área durante la primera semana de ejecución.** | **CONTRATISTA** | **Durante la ejecución de la obra.** |
| **La Interventoría realizará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades.** | **INTERVENTORÍA** | **Permanente** |
| **Se compromete a brindar apoyo en la gestión y búsqueda de mano de obra local para el proyecto, con el fin de facilitar la vinculación de personal del corregimiento y zonas aledañas, contribuyendo al desarrollo oportuno de las actividades programadas y al fortalecimiento de la participación de la comunidad en la ejecución de la obra.** | **CONTRATISTA** | **Durante la ejecución de la obra.** |
| | | |
| | | |
| | | |

## VII. PROXIMA REUNION

**FECHA** 24 (DIA) 7 (MES) 2026 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en EL ESPINO (NAR), a los

DIECISIETE (Día en letras) 17 días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)



Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | MUNICIPIO DE SAPUYES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COMITÉ TÉCNICO SEMANAL | CÓDIGO | INT.C&L2026 – 002 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| UNIDAD EJECUTORA: | MUNICIPIO DE SAPUYES | FECHA | 24 | JULIO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION TERRITORIAL | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONTRATO No. | LP-2025-002 | | |

**OBJETO DE CONTRATO:**

**CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| **LIZA YOHANA ROJAS OJEDA** | **Ingeniera Civil Contratista/Apoyo a la supervisión** | |
| **JHON STEVEN BURGOS CAICEDO** | **Secretario de Planeación Y Obras** | |
| **FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO** | **Director de Obra.** |  |
| **SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA** | **Representante legal de Interventoría.** |  |
| **JESSICA STEPHANIE VANEGAS GONGORA** | **Representante legal de Interventoría.** |  |
| | | |

**II. OBJETO**

Revisión y análisis del avance físico correspondiente a la tercera semana de ejecución de la obra, verificando el porcentaje de avance alcanzado frente al avance programado en el cronograma contractual, con el propósito de determinar el nivel de cumplimiento de las actividades previstas, identificar posibles desviaciones y establecer las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas contractuales.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

Instalación de señalización de seguridad y prevención.

Estado de las excavaciones en sitio y seguimiento al avance de la obra.

Presencia de material rocoso de gran magnitud durante las excavaciones.

Avance en la preparación del acero de refuerzo, mediante el corte y habilitado de varillas

**VI. DESARROLLO TEMAS**

Siendo la fecha programada para el segundo comité de seguimiento de obra, la Arquitecta contratista de obra presentó, mediante la plataforma Microsoft Teams, la presentación de avance correspondiente a la tercera semana de ejecución del proyecto, exponiendo las actividades desarrolladas, el estado de avance físico y el comportamiento del cronograma de obra frente a lo ejecutado.

Durante la presentación se informó la finalización de la excavación correspondiente al bloque de servicios, dejando las condiciones técnicas necesarias para dar inicio a las actividades de solado. De igual manera, se reportó la culminación de las excavaciones de las zapatas y vigas de cimentación, permitiendo avanzar con las labores preparatorias para la ejecución de los elementos de cimentación.

Asimismo, se presentó el avance en la preparación del acero de refuerzo, mediante el corte y habilitado de varillas destinadas a la fabricación de estribos para vigas de cimentación y columnas, en diferentes dimensiones, conforme a las especificaciones establecidas en los planos estructurales. Igualmente, se dispuso el acero y los materiales requeridos para iniciar el armado de las parrillas de refuerzo de las zapatas.
En relación con las redes de servicios, se informó la finalización de la excavación para la instalación de las redes sanitarias, dejando preparada el área de intervención para iniciar la instalación de la tubería conforme a la planimetría aprobada del proyecto.

Durante el comité también se dejó constancia de la presencia de material rocoso de gran magnitud durante las excavaciones, condición contemplada en el estudio de suelos; sin embargo, se evidenció una mayor afluencia de este material en la parte superior del terreno y aproximadamente en la mitad de las zapatas correspondientes a la zona multifuncional multipropósito. Se indicó que esta condición representó una mayor exigencia en las actividades de excavación, sin impedir la continuidad de la ejecución de la obra.

Adicionalmente, se informó la instalación de la señalización preventiva e informativa en las áreas requeridas del proyecto, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los trabajadores y visitantes durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Finalmente, la Arquitecta presentó el resumen del avance físico de la semana, indicando que para la Semana 3 se tenía un avance programado del 0,44 %, alcanzándose una ejecución del 0,52 %, con un avance acumulado del 1,62 %. Igualmente, se explicó ante la Supervisión del Ministerio y la Administración Municipal que, aunque se mantiene un atraso acumulado del 0,20 %, el rendimiento de las actividades ejecutadas durante la semana permitió continuar con la recuperación progresiva del cronograma de obra.

**VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)**

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA / CONDICION |
|---|---|---|
| **El Contratista de Obra continuará con la ejecución de las actividades de solado, armado del acero de refuerzo e instalación de las redes sanitarias.** | **CONTRATISTA** | **Durante la semana 4** |
| **La Interventoría realizará seguimiento permanente al rendimiento de las actividades de cimentación y verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución.** | **INTERVENTORÍA** | **Permanente** |
| **El Contratista implementará las medidas técnicas necesarias para mitigar los efectos derivados de la presencia de material rocoso y minimizar su impacto sobre el cronograma de ejecución.** | **CONTRATISTA** | **Durante la ejecución de la obra.** |
| | | |
| | | |
| | | |

## VII. PROXIMA REUNION

**FECHA** 31 (DIA) 7 (MES) 2026 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en EL ESPINO (NAR), a los

VEINTICUATRO (Día en letras) 24 días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)




Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | MUNICIPIO DE SAPUYES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COMITÉ TÉCNICO SEMANAL | CÓDIGO | INT.C&L2026 – 003 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| UNIDAD EJECUTORA: | MUNICIPIO DE SAPUYES | FECHA | 31 | JULIO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION TERRITORIAL | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | CONTRATO No. | LP-2025-002 | | |

**OBJETO DE CONTRATO:**

**CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| LIZA YOHANA ROJAS OJEDA | Ingeniera Civil Contratista/Apoyo a la supervisión | |
| JHON STEVEN BURGOS CAICEDO | Secretario de Planeación Y Obras | |
| FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO | Director de Obra. |  |
| SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA | Representante legal de Interventoría. |  |
| JESSICA STEPHANIE VANEGAS GONGORA | Representante legal de Interventoría. |  |
| CRISTIAN SANTILLAN MOSQUERA | Residente Auxiliar. |  |

**II. OBJETO**

Revisión y análisis del avance físico correspondiente a la cuarta semana de ejecución de la obra, verificando el avance acumulado alcanzado hasta la presente semana frente a lo programado en el cronograma contractual. Asimismo, se realizó el seguimiento a la situación de desabastecimiento de agua que se presenta en el sector, evaluando su incidencia sobre el desarrollo normal de las actividades de obra y las posibles afectaciones en el cumplimiento de la programación contractual.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

Inicio de la Etapa II – Ejecución de Obra y seguimiento a las actividades de instalación e inicio de ejecución de solados.

Se presenta la situación de desabastecimiento de agua en el corregimiento de El Espino y se analizan alternativas de manejo.

Avance de obra mediante frentes de trabajo estratégicos.

## VI. DESARROLLO TEMAS

Durante el desarrollo del comité de obra, el Contratista de Obra presentó el informe correspondiente a los avances ejecutados durante la semana evaluada, exponiendo el estado actual de las actividades que se encuentran en ejecución dentro del proyecto.

En su intervención, el contratista informó que se registraron avances en las siguientes actividades:

- Solado de Limpieza en Concreto 2500 PSI, mediante la preparación, nivelación y vaciado de concreto en las áreas destinadas para cimentación.
- Acero de Refuerzo PDR 60, ejecutando labores de corte, figurado, armado e instalación del refuerzo estructural conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas.
- Red Hidráulica en PVC de 1”, desarrollando actividades de excavación de zanjas, instalación de tubería y accesorios, así como verificaciones preliminares de alineación y conexión.
- Red de Aguas Lluvias en tubería de 6”, realizando excavaciones, conformación de cama de apoyo, instalación de tubería y adecuación de los respectivos tramos para el manejo de las aguas pluviales del proyecto.

Posteriormente, el Contratista de Obra manifestó que el atraso evidenciado en la programación de actividades obedece principalmente a la situación de racionamiento de agua que se presenta actualmente en el municipio, originada por la escasez del recurso hídrico, circunstancia que ha afectado el desarrollo normal de algunas actividades constructivas.

No obstante, el contratista informó al comité que ya se encuentra en ejecución un plan de contingencia, el cual contempla la disposición de tanques de almacenamiento de agua, con el propósito de garantizar la disponibilidad del recurso y minimizar las afectaciones derivadas del racionamiento.

Finalmente, tanto el Contratista de Obra como la Interventoría dejaron constancia ante el comité de que, con la implementación del plan de contingencia y el fortalecimiento de la ejecución mediante la habilitación de frentes de trabajo simultáneos, se proyecta una reducción progresiva del porcentaje de atraso durante las próximas semanas, con el objetivo de recuperar la programación prevista y mantener la continuidad de la ejecución del proyecto.

La Interventoría indicó que continuará realizando el seguimiento correspondiente a las medidas implementadas, verificando su efectividad y el cumplimiento de los compromisos establecidos para la recuperación del cronograma de obra.

## VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)

| B. COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA / CONDICIÓN |
|---|---|---|
| **El Contratista de Obra se compromete a implementar las acciones técnicas, operativas y logísticas necesarias para minimizar el porcentaje de atraso presentado en la ejecución del proyecto** | **CONTRATISTA** | **Inmediato.** |
| **La Interventoría se compromete a realizar un seguimiento permanente al desarrollo de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra, con el fin de verificar la correcta implementación de las medidas adoptadas para la recuperación de la programación del proyecto. Así mismo, la Interventoría manifiesta que estará atenta a las situaciones que puedan generar afectaciones en la ejecución de la obra y brindará acompañamiento técnico al contratista en la identificación y evaluación de alternativas y soluciones que contribuyan a minimizar el atraso presentado.** | **INTERVENTORÍA** | **Inmediato.** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## VII. PRÓXIMA REUNIÓN

**FECHA** 6 (DIA) 8 (MES) 2026 (ANO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en EL ESPINO (NAR), a los

TREINTA UNO (Día en letras) 31 días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE SAPUYES**

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

# ACTA DE SEGUIMIENTO - ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA

Con el fin de realizar seguimiento al avance de la Etapa II – Ejecución de Obra, y precisar el estado de los entregables, observaciones, recomendaciones y compromisos derivados del desarrollo de las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 06 de julio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO** | Municipio de Sapuyes, Vereda El Espino | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **18** (Día) | **de marzo de** (Mes) | **2026** (Año) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ORTO SI** | **31** (Día) | **de julio de** (Mes) | **2026** (Año) |
| **FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN** | **20 DE MAYO** (Fecha en la cual se imparte) | | |
| **FECHA FINALIZACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN** | **6 DE JULIO** (Fecha en la cual se imparte) | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | **Cinco (05) meses y ocho (08) días** | | |
| **VALOR ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS** (Incluido IVA) | $ 149,827,981.00 | | |
| **VALOR ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA** (Incluido IVA) | $ 1,846,883,748.00 | | |
| **VALOR TOTAL** (Incluido IVA) | $ 1,996,711,729.00 | | |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. ING. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | | |
| **SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTRATO** | ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO | | |

**1. Avance Etapa II - Ejecución de Obra.** (incluye revisión de actividades, cumplimiento del cronograma y ajustes requeridos).

## AVANCE DEL PROYECTO - ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **% PROGRAMADO** | 0.61% | 1.38% | **% EJECUTADO** | 1.11% | 1.11% |
| **VALOR PROGRAMADO** | 11.261.786 | 25.422.348 | **VALOR EJECUTADO** | 20.417.111 | 20.417.111 |

A continuación, se presenta el estado actual de obra, acordando realizar reuniones cada 15 días, entre contratista y interventoría para verificar el seguimiento de la primera y segunda fase del proyecto, conforme al cronograma aprobado:

| ENTREGABLE | DESCRIPCION / AVANCE | % AVANCE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Excavación a mano en material común | Se ejecutan las actividades de excavación para la conformación de los elementos de cimentación del proyecto, de acuerdo con las dimensiones, profundidades, niveles y alineamientos establecidos en los planos estructurales y especificaciones técnicas aprobadas | 78% | En proceso |
| Excavación mecanica sin clasificar | Se ejecutan actividades de excavación mecánica destinadas a la nivelación y conformación del terreno, utilizando maquinaria adecuada para alcanzar las cotas, pendientes y condiciones establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. | 100% | Ejecutado |
| Desalojo material proveniente de excavación | Se ejecutan las actividades de cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de las excavaciones realizadas en la obra, utilizando los equipos y medios de transporte adecuados. El material excavado es trasladado al sitio de disposición destinado y autorizado por el municipio. | 78% | En proceso |

*Nota 1. Estado corresponde a Ejecutado/ En proceso*

El avance general de la etapa II denominada EJECUCIÓN DE OBRA corresponde al: 1.11%

Observaciones:

**2. Actividades realizadas por el contratista**

Durante el período, el contratista ejecutó actividades correspondientes a la etapa de movimiento de tierras y preparación de las áreas destinadas a la construcción de los elementos del proyecto, las cuales fueron desarrolladas conforme a los planos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos por la interventoría. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

1. Excavación a mano en material común:

Se realizaron labores de excavación manual en material común, con el fin de conformar excavaciones localizadas para los elementos de cimentación y demás estructuras contempladas en el proyecto. Estas actividades se ejecutaron de acuerdo con las dimensiones, profundidades, niveles y alineamientos definidos en los planos estructurales y especificaciones técnicas aprobadas, garantizando la adecuada limpieza y conformación de las excavaciones para la posterior ejecución de las obras.

2. Excavación mecánica sin clasificar:

Se adelantaron actividades de excavación mecánica, empleando maquinaria adecuada para la conformación, corte y nivelación del terreno en las áreas requeridas por el proyecto. Los trabajos incluyeron la remoción del material existente, la conformación de superficies y la verificación de niveles y pendientes, permitiendo disponer de condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades constructivas posteriores.

3. Desalojo de material proveniente de excavación:

Se ejecutaron las actividades de cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de las excavaciones manuales y mecánicas realizadas en la obra. El material excavado fue trasladado al sitio de disposición destinado y autorizado por el municipio para tal fin, utilizando los equipos y medios de transporte adecuados y cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y de seguridad aplicables. Estas labores permitieron mantener despejadas y limpias las áreas de trabajo, garantizando la continuidad normal de las actividades de obra.

**3. Observaciones de interventoría** (Incluir observaciones técnicas, inconsistencias identificadas, requerimientos de ajuste y recomendaciones emitidas por la interventoría).

* Se verificó que las actividades de excavación a mano en material común se desarrollaron conforme a las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos en los planos y especificaciones técnicas aprobadas. No obstante, se recomendó al contratista mantener un control permanente sobre la estabilidad de los taludes y la limpieza de las excavaciones, con el fin de evitar desprendimientos y garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades posteriores.

*En relación con la excavación mecánica sin clasificar, la interventoría constató que los trabajos de corte, conformación y nivelación del terreno presentan un avance acorde. Se solicitó continuar con la verificación topográfica de niveles y pendientes antes de proceder con las actividades de cimentación, asegurando la conformidad con los diseños aprobados.

**4. Dificultades identificadas y riesgos asociados**

Si bien el estudio de suelos contemplaba la existencia de estratos con presencia de roca y material de alta resistencia, las condiciones encontradas en campo presentaron una mayor proporción y dureza de material rocoso respecto a lo inicialmente previsto, lo que ha generado una disminución en los rendimientos normales de excavación y mayores tiempos requeridos para la conformación de las áreas destinadas a cimentación y demás estructuras del proyecto.

Esta situación representa un riesgo para el cumplimiento de la programación de obra, debido a que puede ocasionar retrasos en las actividades posteriores relacionadas con solados, armado de acero, formaletas y vaciados de concreto. Adicionalmente, la necesidad de emplear procedimientos y equipos más exigentes para la remoción del material rocoso puede generar incrementos en los tiempos de ejecución y mayores requerimientos operativos.

**5. Compromisos**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Tener reuniones cada 15 días** | **Interventoría y Contratista de Obra** | **Cada 15 días de cada mes** |
| **Implementar un plan de acción orientado a reducir el atraso presentado y mitigar su impacto sobre el cronograma de ejecución de la obra.** | **Contratista de Obra** | **Inmediato** |

**6. Conclusiones** (Incluir estado general del contrato, cumplimiento del cronograma y concepto de interventoría sobre la calidad de la ejecución de obra).

Durante el período evaluado se ejecutaron las actividades correspondientes a excavación manual en material común, excavación mecánica sin clasificar y desalojo del material proveniente de excavación, las cuales constituyen labores fundamentales para la preparación de las áreas destinadas a la construcción de los elementos proyectados.

La interventoría verificó que las actividades desarrolladas se ejecutaron conforme a los planos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos, evidenciando cumplimiento en la conformación de excavaciones, nivelación del terreno y disposición adecuada del material excavado.

Se identificaron factores que han afectado parcialmente el rendimiento de la obra, principalmente la presencia de material rocoso en una proporción superior a la prevista en el estudio de suelos, situación que ha requerido mayores esfuerzos operativos y tiempos adicionales para la ejecución de las excavaciones.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de seguimiento los que en ella intervinieron a los (19) días del mes de Julio de 2026.

Firma

**Nombre: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**
R.L. Ing. Camilo Andrés Mesa Acosta

Firma

**Nombre: Ing. Juan Manuel Zúñiga Rosales**
Residente de Obra

Firma

**Nombre: CONSORCIO C&L SAPUYES**
R.L. Ing. Santiago Alejandro Pantoja Rosero

Firma

**Nombre: Arq. Jhonny Mauricio Rosero Carpio**
Residente de Interventoría

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista , Interventor y Dirección Territorial.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE SAPUYES**

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES

CONSORCIO C & L SAPUYES

# ACTA DE SEGUIMIENTO - ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA

Con el fin de realizar seguimiento al avance de la Etapa II – Ejecución de Obra, y precisar el estado de los entregables, observaciones, recomendaciones y compromisos derivados del desarrollo de las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2026 y el 31 de julio de 2026.

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO** | Municipio de Sapuyes, Vereda El Espino | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **18** (Día) | **de marzo de** (Mes) | **2026** (Año) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ORTO SI** | **31** (Día) | **de julio de** (Mes) | **2026** (Año) |
| **FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN** | **20 DE MAYO** (Fecha en la cual se imparte) | | |
| **FECHA FINALIZACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN** | **6 DE JULIO** (Fecha en la cual se imparte) | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | **Cinco (05) meses y ocho (08) días** | | |
| **VALOR ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS** (Incluido IVA) | $ 149,827,981.00 | | |
| **VALOR ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA** (Incluido IVA) | $ 1,846,883,748.00 | | |
| **VALOR TOTAL** (Incluido IVA) | $ 1,996,711,729.00 | | |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. ING. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | | |
| **SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTRATO** | ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO | | |

**1. Avance Etapa II - Ejecución de Obra.** (incluye revisión de actividades, cumplimiento del cronograma y ajustes requeridos).

## AVANCE DEL PROYECTO - ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **% PROGRAMADO** | 0.89% | 2.71% | **% EJECUTADO** | 0.60% | 2.22% |
| **VALOR PROGRAMADO** | 16.408.843,00 | 50.037.889,00 | **VALOR EJECUTADO** | 11.068.212,00 | 41.025.090,00 |

A continuación, se presenta el estado actual del avance de obra, acordando realizar reuniones cada 15 días, entre contratista y interventoría para verificar el seguimiento de la primera y segunda fase del proyecto, conforme al cronograma aprobado:

| ENTREGABLE | DESCRIPCION / AVANCE | % AVANCE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Excavación a mano en material común | Se ejecutan las actividades de excavación para la conformación de los elementos de cimentación del proyecto, de acuerdo con las dimensiones, profundidades, niveles y alineamientos establecidos en los planos estructurales y especificaciones técnicas aprobadas | 100% | Ejecutado |
| Desalojo material proveniente de excavación | Se ejecutan las actividades de cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de las excavaciones realizadas en la obra, utilizando los equipos y medios de transporte adecuados. El material excavado es trasladado al sitio de disposición destinado y autorizado por el municipio. | 100% | Ejecutado |
| Solado de Limpieza Concreto 2500 PSI | Los trabajos realizados comprendieron la preparación y limpieza de las superficies de fundación, verificación de niveles y dimensiones de las excavaciones, así como el vaciado, extendido y nivelación del concreto en las áreas intervenidas, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto. | 50% | En proceso |
| Acero de Refuerzo PDR 60 | Los trabajos ejecutados incluyeron la preparación y organización del acero conforme a las dimensiones y especificaciones indicadas en los planos estructurales, así como el armado y elementos de refuerzo destinados a las cimentaciones y demás componentes estructurales contemplados en el proyecto. | 18% | En proceso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Red Hidráulica 1" PVC | Los trabajos realizados comprendieron el trazado y replanteo de la red, suministro e instalación de la tubería PVC de 1”, así como la ejecución de las uniones, accesorios y elementos necesarios para garantizar la continuidad y funcionalidad del sistema hidráulico. La instalación se efectuó de acuerdo con los planos hidráulicos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos para el proyecto y por el prestador del servicio de acueducto. | 100% | Ejecutado |
| Red Aguas Lluvias 6" | Los trabajos desarrollados incluyeron el replanteo del trazado de la red, conformación de la cama de apoyo, suministro e instalación de la tubería PVC de 6”, así como la colocación de accesorios y conexiones necesarias para garantizar la adecuada conducción de las aguas lluvias generadas en el proyecto. Las actividades se ejecutaron conforme a los planos, especificaciones técnicas y pendientes definidas en el diseño. | 100% | Ejecutado |

*Nota 1. Estado corresponde a Ejecutado/ En proceso*

El avance general de la etapa II denominada EJECUCIÓN DE OBRA corresponde al: 2.22%

Observaciones:

**2. Actividades realizadas por el contratista**

Durante el período evaluado, el contratista de obra ejecutó actividades correspondientes a la Etapa II – Ejecución de Obra, orientadas a la preparación del terreno, conformación de las áreas de cimentación y avance de las redes hidráulicas y estructurales del proyecto. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Excavación a mano en material común: ejecución de excavaciones localizadas para elementos de cimentación y estructuras proyectadas, conforme a las dimensiones y niveles establecidos en los planos aprobados.

Desalojo de material proveniente de excavación: cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de las excavaciones, en el sitio autorizado por el municipio.

Solado de Limpieza en Concreto 2500 PSI: preparación de superficies y vaciado de concreto de limpieza como base para la posterior instalación del acero de refuerzo y construcción de las cimentaciones.

Acero de Refuerzo PDR 60: suministro, corte, figurado, armado y colocación del acero de refuerzo requerido para los elementos estructurales contemplados en el proyecto.

Red Hidráulica en PVC de 1”: instalación de la tubería destinada a la conexión del sistema de acueducto existente con las redes internas del proyecto, garantizando el futuro suministro de agua potable para la edificación.

Red de Aguas Lluvias en PVC de 6”: instalación de la red para la captación, conducción y evacuación de las aguas lluvias generadas en cubiertas y áreas exteriores del proyecto, conforme a los diseños hidráulicos aprobados.

Estas actividades fueron ejecutadas bajo el seguimiento de la interventoría, verificando su desarrollo conforme a los planos, especificaciones técnicas, normas aplicables y lineamientos contractuales establecidos para el proyecto.

**3. Observaciones de interventoría** (Incluir observaciones técnicas, inconsistencias identificadas, requerimientos de ajuste y recomendaciones emitidas por la interventoría).

Durante el período evaluado, la interventoría realizó el seguimiento técnico a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando que los trabajos se desarrollan conforme a los planos, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos para el proyecto.

Se evidenció la ejecución de actividades asociadas a los componentes estructurales e hidráulicos de la obra, observándose cumplimiento en los procedimientos constructivos, control de niveles, alineamientos y condiciones generales de ejecución. No obstante, la interventoría recomendó al contratista fortalecer el seguimiento a la programación de obra y adoptar las medidas operativas necesarias para mitigar el atraso presentado y reducir su impacto en las actividades posteriores.

Así mismo, se solicitó mantener un control permanente sobre la calidad de los materiales y procesos ejecutados, garantizando la realización de las pruebas y verificaciones técnicas correspondientes antes de dar continuidad a las siguientes etapas constructivas.

**4. Dificultades identificadas y riesgos asociados**

Durante el período evaluado se presentó una dificultad asociada al racionamiento del servicio de agua potable en el sector donde se desarrolla el proyecto. De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la suspensión del suministro se realiza desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., situación que afecta la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo de diversas actividades constructivas.

Esta condición ha generado limitaciones operativas para la ejecución continua de algunos procesos de obra que requieren agua para labores de limpieza, preparación de superficies, mezclas y demás actividades propias de la ejecución constructiva, lo cual puede incidir en los rendimientos programados y en la secuencia normal de los trabajos.

Frente a esta situación, el contratista informó la implementación de medidas de contingencia mediante el almacenamiento temporal de agua y la reorganización de las actividades de obra, con el propósito de reducir el impacto generado por el racionamiento y garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto en la medida de lo posible. La interventoría realizará seguimiento a la efectividad de dichas medidas y a su incidencia sobre la programación y desarrollo de las actividades contractuales.

**5. Compromisos**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| **Tener reuniones cada 15 días** | **Interventoría y Contratista de Obra** | **Cada 15 días de cada mes** |
| **Medidas de contingencia frente al racionamiento de agua** | **Contratista de Obra** | **Inmediato** |

**6. Conclusiones** (Incluir estado general del contrato, cumplimiento del cronograma y concepto de interventoría sobre la calidad de la ejecución de obra).

Durante el período evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a los componentes estructurales e hidráulicos del proyecto, las cuales fueron desarrolladas bajo el seguimiento técnico de la interventoría y conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

La interventoría verificó que las actividades ejecutadas cumplen, en términos generales, con los procedimientos constructivos establecidos, manteniéndose los controles técnicos relacionados con niveles, alineamientos, instalación de elementos y calidad de los procesos constructivos adelantados en obra.

Se identificó como principal dificultad operativa el racionamiento del servicio de agua potable entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., situación que afecta la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo continuo de algunas actividades constructivas y puede incidir en los rendimientos de ejecución y en la secuencia normal de los trabajos programados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de seguimiento los que en ella intervinieron a los (31) días del mes de Julio de 2026.

Firma

**Nombre: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**
R.L. Ing. Camilo Andrés Mesa Acosta

Firma

**Nombre: Ing. Juan Manuel Zúñiga Rosales**
Residente de Obra

Firma

**Nombre: CONSORCIO C&L SAPUYES**
R.L. Ing. Santiago Alejandro Pantoja Rosero

Firma

**Nombre: Arq. Jhonny Mauricio Rosero Carpio**
Residente de Interventoría

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista , Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# EQUIPO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# OBRA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

## RELACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA EMPLEADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO DE OBRA No. :** | LP-2025-002 DE 25 DE FEBRERO 2026 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CM 2026 001 |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C δ L SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **PERÍODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 HASTA 13 DE DICIEMRE DE 2026 |

| Equipo ó Maquinaria | Referencia del equipo ó Maquinaria | Modelo | Fecha de mantenimiento | Soporte documental del mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | - | - | 31/07/2026 | N/A |
| MEZCLADORAS | GASOLINA | - | PERIODICO | FACTURA |
| VOLQUETA INTERNATIONAL SNV567 | DIESEL | 2015 | PERIODICO | FACTURA |
| RETROEXCAVADORA NEUMATICOS CATERPILAR | DIESEL | 2013 | PERIODICO | FACTURA |

ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES
**RESIDENTE DE OBRA**

ING. JHONNY MAURICIO ROSERO
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO
**DIRECTOR DE OBRA**

ING. ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

## RELACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARÍA EMPLEADO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIѰN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATO DE OBRA No. :** | LP-2025-002 DE 25 DE FEBRERO 2026 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | CM-2026-001 |
| **CONTRATISTA:** | UNIѰN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C δ L SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | JHON STEVEN BURGOS CAICEDO |
| **PERÍODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 HASTA 13 DE DICIEMRE DE 2026 |

| Equipo ó Maquinaria | Referencia del equipo ó Maquinaria | Modelo | Fecha de mantenimiento | Soporte documental del mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

ING. JHONY MAURICIO ROSERO
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

ING. ANDRES ALEXANDER ORTIZ
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO
**SUPERVISOR MUNICIPAL**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CONTROL DE PERSONAL EN OBRA E INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | No. L.P. – 2025 – 002 de 25 febrero de 2026 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | No. C.M. – 2026 – 001 de 03 marzo de 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO EL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO |
| **PERÍODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 A 31 DE JULIO DE 2026 |

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA**

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo | JULIO 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | | |
| 1 | Francisco Javier Mora Castro | Director de obra | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | 1 | | |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Residente de obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 3 | Javier Andres Rueda Zarama | Especialista en estructuras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 4 | Jessica Stephanie Vanegas Gongora | Arquitecta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 5 | Angel Maria Acosta Cuatindioy | Maestro de obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 6 | Gerardo Henry Mera Benavides | Ayudante | 1 | - | 1 | | - | - | | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 7 | Jose Hugo Olivia Burgos | Ayudante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 8 | Alvaro Giraldo Perez Arteaga | Ayudante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 9 | Karol Yineth Rosero Narvaez | Ayudante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 10 | Alexander Emilio Tarapuez Moncayo | Ayudante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| 11 | Yonny Daniel Martinez Rosas | Ayudante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| **TOTAL PERSONAL DIARIO** | | | **4** | **2** | **4** | **2** | **3** | **0** | **3** | **4** | **3** | **2** | **3** | **2** | **0** | **4** | **16** | **17** | **19** | **16** | **17** | **0** | **17** | | |

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
**DIRECTOR DE OBRA**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CONTROL DE ESTADOS DEL TIEMPO

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

# CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | No. L.P. – 2025 – 002 de 25 febrero de 2026 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. C.M. – 2026 – 001 de 03 marzo de 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO EL ESPINO |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO |
| **PERÍODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 A 31 DE JULIO DE 2026 |

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (HORAS LABORALES)

| No. | CLASE DE TIEMPO | JULIO 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | | |
| 1 | Seco | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 8 | 1 | 5 | - | - | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | | **56** |
| 2 | Lluvias moderadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | | **10** |
| 3 | Lluvias intensas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | **0** |
| 4 | Nublado | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | | **124** |

DIAS EN LOS CUALES SE PRESENTAN LLUVIAS DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL Y/O EN HORAS DE LA MADRUGADA

ELABORÓ:

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

REVISÓ:

**ING. ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO DEL INFORME

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 06 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 1 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 161 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

-Descapote realizado por parte del municipio

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 2 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. Interventoria | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra. | ☒ Mañana | ☐ Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. Obra | ☒ Mañana | ☐ Tarde |
| 5 | Karol Lineth Rosero | ESP. ambiental y SST | ☒ Mañana | ☒ Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O MAÑANA |
| | O TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa | ☐ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa |
| ☐ | Lluvia Moderada | ☒ | Nubosidad | ☐ | Lluvia Moderada | ☒ | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** 06 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 1 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 161 |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA**

El descapote del terreno por parte de municipio, donde se de inicio al retiro de la capa vegetal y el material orgánico superficial de un tramo del área de intervención, con el fin de preparar el terreno para las actividades constructivas.

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Retroexcavadora
- Herramienta menor.

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 07 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 2 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 160 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Descapote realizado por el municipio

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andres Alexander Ortiz. | Dr. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Posero | ESP. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O MAÑANA |
| | O TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Cetulia)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 07 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 2 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 160 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Por parte del municipio se realizó descapote del terreno, donde se continua con el retiro de capa vegetal y material organico superficial, con el fin de preparar el terreno para las actividades constructivas.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retroexcavadora
- herramienta menor

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 08 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |

**DÍAS EJECUCIÓN #** 3

**DÍAS RESTANTES #** 159

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Descapote realizado por el municipio

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [ ] Mañana | [x] Tarde |
| 4 | Andres Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [ ] Mañana | [x] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | Esp. ambiental y SST | [x] Mañana | [x] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O MAÑANA |
| | O TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [x] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [x] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [x] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Catalina)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 08 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 3 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 159 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó descapote de terreno, donde se continua con el retiro de capa vegetal y material organico superficial, para ir preparando el terreno para las actividades de construcción. Esta actividad fue realizá alcaldía.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- retroexcavadora
- herramienta menor.

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 09 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 4 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 158 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó visita inicial con equipo técnico en obra, para realizar implantación de Proyecto.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra. | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. Interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Jessica Vanegas | Arquitecta | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 4 | Santiago Pantoja | Ingeniero civil. | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 5 | Francisco Javier Mora | Dr. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoria | X | |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O MAÑANA |
| | O TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

*Aprueba por Obra*

Ing. Francisco Javier Mora Castro
Director de obra

*Aprueba por Interventoría*

Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora
Director de interventoría

*Suscribe en Sitio (Obra)*

Ing. Residente de obra

*Aprueba en Sitio (Interventoría)*

Ing. Residente de interventoría

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 09 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 4 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 158 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó una visita inicial a la obra con el equipo técnico conformado por: Res. obra | Res. Interventoría, diseñador arquitectónico, Ing. representante legal de interventoría y maestros de obra. Durante esta visita se realizo un replanteamiento manual en campo.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- herramienta menor

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 10 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 5 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 157 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Descapote realizado por el municipio.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andres Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yinet Rosero | ESP. ambiental y SST. | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O **MAÑANA** |
| | O **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [\] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Catuiira)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 10 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 5 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 157 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Por parte de alcaldía se finalizó el descapote de terreno, retiro de material organico y capa vegetal, donde el terreno quedo totalmente nivelado a cota cero.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retroexcavadora
- Herramienta menor

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Aprueba por Obra<br><br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Aprueba por Interventoría<br><br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| Suscribe en Sitio<br><br>Ing. Residente de obra | Aprueba en Sitio<br><br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 11 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 6 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 156 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Retiro de material organico y vegetal por parte de alcaldia

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andres Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | Esp ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | O **MAÑANA** |
| | O **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 11 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 6 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 156 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Por parte de alcaldia se realizó el retiro de todo el material organico con ayuda de Retroexcavadora y Volqueta, para desalojar totalmente el área de trabajo e iniciar las labores de excavación manual.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retroexcavadora
- Volqueta
- herramienta menor.

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 14 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 9 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 153 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- se realizó, la visita del profesional de topografía
- se efectuó, la ubicación y replanteo de los puntos perimetrales
- se efectuó el nivel de referencia +0,00 del proyecto

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas | Arquitecta | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 3 | Jhony Mauricio Rosero | Res. Interventoria. | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | ☒ Mañana | ☐ Tarde |
| 5 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | ☒ Mañana | ☐ Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | | |
|---|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 3 | **MAÑANA** |
| | 3 | **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa | ☒ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa |
| ☐ | Lluvia Moderada | ☐ | Nubosidad | ☐ | Lluvia Moderada | ☐ | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Catalina)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

| BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA | FECHA | 14 | 07 | 2026 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 9 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 153 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Se efectuo la visita del profesional de topografia al frente de obra, con el fin de realizar la ubicación y replanteo de los puntos perimetrales del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo la localización de las zapatas correspondientes a la zona de baterias sanitarias, Oficinas y cocineta, de acuerdo a la planimetria.

Adicionalmente, se realizó el replanteo y materialización del nivel de referencia ±0.00 del proyecto.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- equipo topografico
- herramienta menor.

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Catalina<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 15 | 07 | 2026

**PROYECTO** "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

**CONTRATANTE** MUNICIPIO DE SAPUYES

**CONTRATO OBRA No.** LP - 2025 - 002

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES
R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA

**CONTRATO INT. No.** CM - 2026 - 001

**INTERVENTOR** CONSORCIO C&L SAPUYES
R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO

**DÍAS EJECUCIÓN #** 10

**DÍAS RESTANTES #** 152

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se revisó planimetría de cimentación
- Se efectuó la demarcación de la profundidad de las zapatas.
- Se da inicio con las excavaciones de la zapata
- Se realiza la demarcación y seguimiento de los ejes de excavación.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas | Arquitecta | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuniga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. Obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Andres Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 3 **MAÑANA** |
| | 3 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

*Aprueba por Obra*

Ing. Francisco Javier Mora Castro
Director de obra

*Aprueba por Interventoría*

Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora
Director de interventoría

*Suscribe en Sitio (Obra)*

Ing. Residente de obra

*Aprueba en Sitio (Interventoría)*

Ing. Residente de interventoría

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** 15 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 10 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 152 |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA**

Durante la jornada se realizó la revisión de la planimetría y diseño estructural del proyecto, con el fin de verificar la localización de los elementos de cimentación antes del inicio de las actividades de excavación. Posteriormente se ejecutó el replanteo y demarcación de las zapatas, Dando inicio a las excavaciones de las zapatas D-2, D-1, C1 y C 2, B1.

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

- herramienta menor -

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 16 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 11 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 161 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- avance en la excavación de cimentación en la zona de servicios y batería sanitaria.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas | Arquitecta | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Jhony Mauricio Rosero | Res. Interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. Interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | | |
|---|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 5 | **MAÑANA** |
| | 5 | **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 16 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 16 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 151 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- como ya se había realizado el replanteamiento de la cimentación, se avanzó con la excavación para zapatas y vigas de cimentación para zona de servicios y batería sanitaria.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- herramienta menor.

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Aprueba por Obra<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Aprueba por Interventoría<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| Suscribe en Sitio<br>Ing. Residente de obra | Aprueba en Sitio<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 17 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 12 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 150 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se continúo con la excavación de cimentación para zona de servicios y bateria sanitarias.
- Con equipo topografico se realizó demarcación de área polivalente multiproposito y pista de trote.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | Esp. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 5 MAÑANA |
| | 5 TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [/] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [/] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 17 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 12 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 150 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Con ayuda del equipo topografico se realizó la demarcación de puntos principales para área polivalente multiproposito y pista de trote, para poder continuar con las actividades posteriores

- Se continúo con la excavación manual de cimentación de zapatas y vigas de cimentación para zona de servicios y baterias sanitarias.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- equipo topografico
- herramienta menor

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 18 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 13 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 149 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Demarcación de zapatas de área folivalente y multipropósito.
- Demarcación de cajas de inspección para zona de servicios.
- Descargue de material.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 2 | Jonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | Esp. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 5 MAÑANA |
| | 5 TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Catalina)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 18 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 13 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 149 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Con ayuda del equipo topografico se realizó la demarcación de los zapatos del area polivalente multiproposito.
- De igual manera se realizó la demarcación de cajas de inspeccion de zona de servicios.
- se realizó descargue de material como: cemento, varillas, madera, agregados petreos.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- equipo topografico
- herramienta menor.

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 10 / 07 / 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 15 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 147 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se avanzó con excavación para zapatas de área polivalente multipropósito.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 2 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | ESP. ambiental y SST | [X] Mañana | [ ] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 4 **MAÑANA** |
| | 4 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra* | *Aprueba por Interventoría* |
| Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Catalina) | *Aprueba en Sitio (Interventoría)* |
| Ing. Residente de obra | Ing. Residente de interventoría |

# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 20 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 15 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 149 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se avanzó con la excavación manual de zapatas de área polivalente multipropósito, para así poder continuar con la excavación de vigas de cimentación.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- herramienta menor.

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Aprueba por Obra<br><br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Aprueba por Interventoría<br><br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| Suscribe en Sitio<br><br>Ing. Residente de obra | Aprueba en Sitio<br><br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 21 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 16 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 146 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- excavación manual de vigas de cimentación y zapatas para área equivalente multipropósito.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 2 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria. | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Ori. obra | [x] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Ori. interventoria | [x] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | Esp. ambiental y SST | [x] Mañana | [x] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 7 **MAÑANA** |
| | 7 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [x] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [x] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra* | *Aprueba por Interventoría* |
| Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)* | *Aprueba en Sitio (Interventoría)* |
| Ing. Residente de obra | Ing. Residente de interventoria |

## BITACORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 21 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 16 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 146 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se continuó con la excavación de zapatas y se inició la excavación de vigas de cimentación para área polivalente multipropósito, para así poder continuar con las actividades de concreto de las mismas

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- herramienta menor.

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 22 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |

**DÍAS EJECUCIÓN #** 17

**DÍAS RESTANTES #** 145

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- excavación mecanica para llegar al nivel previsto (nivel cero cero) de la parte superior del proyecto.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res obra | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 2 | Jonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [x] Mañana | [x] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [x] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [x] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Lineth Rosero | ESP. ambiental y SST | [x] Mañana | [x] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 8 **MAÑANA** |
| | 8 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [x] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [x] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Catalina<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 22 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 17 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 148 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- se avanza con la excavación mecanica con retroexcavadora para la conformación y nivelación de terreno, con el fin de alcanzar las cotas establecidas en los planos. Donde se verificó la mayor parte del área de intervención, quedando nivelada a una misma cota. Se avanza 1/3 del area total del proyecto.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retroexcavadora
- herramienta menor.

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 13 / 07 / 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 18 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 144 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Excavación
- Nivelación del terreno
- Desalojo de material

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas Góngora | Arquitecta. | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Jonny Mauricio Rosero. | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. Obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Andres Alexander Ortiz | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 9 **MAÑANA** |
| | 9 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [X] | Lluvia Moderada | [ ] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** 23 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 18 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 144 |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Durante la jornada se ejecutaron las actividades de excavación mecánica con retroexcavadora mixta para la conformación y nivelación de terreno, con el fin de alcanzar las cotas establecidas en los planos. Se verifico que la mayor parte del área de intervención quedo nivelada en una misma cota.

Paralelamente, se realizó el cargue y desalojo del material producto de la excavación mediante dos volquetas, una doble troque y una sencilla, garantizando la evacuación oportuna del material.

Asimismo, se finalizaron las excavaciones correspondientes a las zapatas de cimentación y a las vigas de cimentación del bloque de servicios, verificando que las dimensiones, profundidades y niveles ejecutados correspondieran a los establecidos en los planos estructurales. Durante la jornada se realizo corte de varillas.

## MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retro excavadora Mixta
- Volqueta doble troque
- Volqueta sencilla

## OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>(Catalina)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 24 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 9 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 143 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se da continuidad a las excavaciones con nivel previsto en diseño
- Cargue y desalojo de material producto de excavación.
- Corte de Varillas para Fabricación de estribos y armado de acero.
- Corte de Varilla 0.91 Finalizado.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas | Arquitecta | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. Obra | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 3 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. Interventoria | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | ☒ Mañana | ☐ Tarde |
| 5 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoria | ☒ Mañana | ☐ Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 9 MAÑANA |
| | 9 TARDE |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | TARDE | |
|---|---|---|---|
| ☒ Seco | ☐ Lluvia Intensa | ☒ Seco | ☐ Lluvia Intensa |
| ☐ Lluvia Moderada | ☐ Nubosidad | ☒ Lluvia Moderada | ☐ Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA 24 07 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 19 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 143 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Durante la jornada se dio continuidad a la nivelación del terreno de acuerdo con las cotas y nivel establecido. En la jornada de la mañana, la retroexcavadora, con el apoyo de una volqueta doble troque, realizó el cargue y desalojo del material producto de las excavaciones. Asimismo, se efectuó la remoción del material rocoso encontrado en el frente de trabajo, condición contemplada en el estudio de suelos, con el fin del avance de excavaciones. De manera paralela, se continuó con el proceso habilitado del acero de refuerzo mediante el corte de varillas y la fabricación de estribos para los elementos de cimentación, finalizando con las piezas de 0,91 y la continuidad de 1.30 además de terminar con lado 1.18. conforme al diseño estructural.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- Retro excavadora Mixta - media jornada.
- Volqueta doble troque - media jornada.

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Catalina<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 29 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 20 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 142 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Armado de parrillas para el bloque de servicios se inicia con esta Actividad
- desalojo de material en zapatas y vigas de cimentacion de Area multivalente multiproposito.
- Se continua con corte de Varillas de 1/30.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vanegas | Arquitecta | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. de obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 3 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. de obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | | |
|---|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 12 | **MAÑANA** |
| | 12 | **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [/] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [/] | Lluvia Moderada | [/] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** 25 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 20 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 142 |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA**

Se ejecuto el armado de las parrillas de acero de refuerzo para las zapatas del bloque de servicios utilizando las varillas previamente habilitadas y los estribos elaborados conforme a las especificaciones del diseño estructural. Durante la actividad se verifico el correcto corte y dobles del material.

Se efectuo el cargue transporte y desalojo de material producto de las excavaciones en la zona mal proposito, con el proposito de mantener despejada el área de trabajo por gran cantidad de material rocoso, para garantizar una adecuada movilidad del personal y la maquinaria, para permitir la continuidad de actividades.

Se continua con el corte de varilla de medidas 1,30 para armado de acero.

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

- herramienta menor
- Retroexcavadora Mixta
- Volqueta.

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 27 / 07 / 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 22 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 140 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- se dio continuidad al desalojo de material producto de la excavación y mediante maquinaria pesada
- cargue y desalojo de material fresado de gran magnitud
- Instalación de tubería principal Red sanitaria del proyecto.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoría | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | ESP. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 17 **MAÑANA** |
| | 12 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| MAÑANA | | | | TARDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [X] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Cetuiia)<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** 27 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 22 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 100 |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA**

Se dio continuidad a la actividad de desalojo de material producto de las excavaciones mediante el uso de maquinaria pesada, con el apoyo de una volqueta sencilla para el cargue y transporte del material. Asimismo, se realizó el retiro de material Rocoso de gran magnitud localizado en el predio y zonas correspondientes a las vigas de cimentación del área multiproposito, debido a las condiciones geotecnicas del terreno. Se ejecuto el perfilamiento de las esquinas del proyecto y el Retiro del arco de la cancha que estaba dentro del área del proyecto.

Asimismo se realizo la instalación de la tubería principal sanitaria del proyecto con un diametro de 6", conforme a los planos hidrosanitarios para la continuidad de la infraestructura sanitaria

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Retro excavadora Mixta.
- Volqueta sencilla.

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Catalina<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 29 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA NO.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 23 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 139 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizo Registro fotografico aéreo con el uso de dron
- Se Inicia con la seleccion y clasificacion de material del sitio para actividades de relleno y compactacion de la zona correspondiente a la Instalacion principal sanitaria
- Se Ejecuto instalación de la tuberia principal de la red hidrica con el diametro de 1" conforme a planimetria

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jonny Mauricio Rosero | Res. Interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. Interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Kaiol Yineth Rosero | Esp. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 18 **MAÑANA** |
| | 18 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra* | *Aprueba por Interventoría* |
| Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)* | *Aprueba en Sitio (Interventoría)* |
| Ing. Residente de obra | Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 28 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 23 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 139 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Durante la jornada se realizó el registro fotográfico aéreo del avance mediante el uso de dron, con el propósito de documentar el estado de la ejecución de las actividades. Asimismo se dio el inicio a la selección y clasificación del material proveniente del sitio, destinado a las labores de relleno y compactación en la zona de instalaciones del material proveniente del sitio, destinado a las labores de relleno y compactación en la zona de instalación de la red principal sanitaria, verificando que cumpliera con las condiciones requeridas.

Finalmente se ejecutó la instalación de la tubería principal de la red hídrica en el diámetro de 1" de acerolo con la planimetría y las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. garantizando su correcta alineación, nivelación y ubicación.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- Dron.
- herramienta menor

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Aprueba por Obra<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Aprueba por Interventoría<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| Suscribe en Sitio<br>Ing. Residente de obra | Aprueba en Sitio<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 29 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 24 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 138 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- ubicacion y trazado de 3 cajillas de inspeccion en campo.
- Se termino el relleno de zanja y compactacion de red hca ppal.
- Se continuo con excavacion manual para filtro #1 (22 ml).
- Se avanzo con la instalacion de letreros de señalizacion.
- Se avanzo con desalojo de material organico en bloque de zaro de servicios.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andrés Alexander Ortiz. | Dir. interventoria | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Karol Yineth Rosero | ESP. ambiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 18 **MAÑANA** |
| | 18 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra* | *Aprueba por Interventoría* |
| Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>(Camila) | *Aprueba en Sitio (Interventoría)* |
| Ing. Residente de obra | Ing. Residente de interventoría |

## BITACORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 29 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 24 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 138 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó la ubicacion y trazado en campo de las cajillas de inspeccion segun los planos.
- Se terminó el relleno de zanja con material de sitio y compactacion mediante saltarin, para la red hca principal.
- Se continuó con excavación manual para el filtro #1, donde se incluyó el retiro de material roboso a una profundidad de 50 cm.
- Se avanzó con el armado de tableros para la señalización de seguridad e instalación en campo.
- Se avanzó con el desalojo manual de material de excavación en bloque de zona de servicios.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- Compactador tipo canguro (Saltarin).
- herramienta menor.

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Aprueba por Obra<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Aprueba por Interventoría<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| Suscribe en Sitio<br>Ing. Residente de obra | Aprueba en Sitio<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 30 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 25 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 137 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó la excavación de una cajilla de inspección.
- Se avanzó en la excavación del filito #2 de 22 ml
- Se realizó el solado para la cimentación de zapatas y vigas para maloco y zona de servicios.
- Se avanzó con el armado de canastillas en varilla de 1/2" para las zapatas.
- Se avanzó con el flejado de estribos para las columnas.
- Se realizó visita de ingeniero electrico.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rueda | Contratista electrico | ☐ Mañana | ☒ Tarde |
| 2 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 3 | Jhonny Mauricio Rosero | Res. interventoria | ☒ Mañana | ☒ Tarde |
| 4 | Francisco Javier Mora | Dir. obra | ☒ Mañana | ☐ Tarde |
| 5 | Andrés Alexander Ortiz | Dir. interventoria | ☒ Mañana | ☐ Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 10 **MAÑANA** |
| | 10 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa | ☐ | Seco | ☐ | Lluvia Intensa |
| ☒ | Lluvia Moderada | ☒ | Nubosidad | ☐ | Lluvia Moderada | ☒ | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra* | *Aprueba por Interventoría* |
| Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)* | *Aprueba en Sitio (Interventoría)* |
| Ing. Residente de obra | Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 30 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 25 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 137 |

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó la excavación manual de una cajilla de inspección con una profundidad de 61 cm
- Se avanzó con la excavación manual para filtro #2, con una profundidad de 50 cm y retiro de material rocoso.
- Se realizó el solado de limpieza para la cimentación de zapatas y vigas, donde se empleó concreto de 2.500 Psi y un espesor de 5 cm. para los bloques de maloca y zona de servicios.
- Se avanzó con el armado de canastillas para los zapatas, donde se empleó varilla de 1/2".
- Se avanzó con el flejado de estribos para columnas.
- Se ejecutó visita de ingeniero electrico en obra.

### MAQUINARIA Y EQUIPO

- mezcladora de concreto
- herramienta menor

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

## BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA

**FECHA** 31 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 26 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 136 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

- Se realizó desalojó manual de zona de servicios.
- Se continuó con el armado de canastillas para zapatas
- Se continuó con el figurado de acero para columnas.

### CONTROL DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

| No. | NOMBRE | CARGO | JORNADA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Zuñiga | Res. obra | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 2 | Jhony Mauricio Rosero | Res. Interventoria | [X] Mañana | [X] Tarde |
| 3 | Francisco Javier Mor | Dir. obra | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 4 | Andres Alexander Ortiz | Dir. interventora | [X] Mañana | [ ] Tarde |
| 5 | Korol Lineth Rosero | Esp. ombiental y SST | [X] Mañana | [X] Tarde |

### CONTROL DIARIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

| | |
|---|---|
| **Total Trabajadores en Jornada** | 18 **MAÑANA** |
| | 18 **TARDE** |

### CONTROL DIARIO DE CLIMA

| *MAÑANA* | | | | *TARDE* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa | [ ] | Seco | [ ] | Lluvia Intensa |
| [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad | [ ] | Lluvia Moderada | [X] | Nubosidad |

### CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio (Obra)*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio (Interventoría)*<br>Ing. Residente de interventoría |

**BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRA** | **FECHA** | 31 | 07 | 2026

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES |
| **CONTRATO OBRA No.** | LP - 2025 - 002 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **CONTRATO INT. No.** | CM - 2026 - 001 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **DÍAS EJECUCIÓN #** | 26 |
| **DÍAS RESTANTES #** | 136 |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA**

- Se realizó desalojo de material en zona de servicios, para así poder continuar trabajando y tener una área despejada.
- Se dio continuidad al armado de columnas tillas con varilla de 1/2"
- Para zapatas de zona de servicios y área polivalente multiproposito.
- De igual manera, para los mencionados áreas se continuo con el figurado de varilla 3/8" para estribos de columnas. la actividad incluye corte, corregir varilla y flejado.

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

- herramienta menor.

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| *Aprueba por Obra*<br>Ing. Francisco Javier Mora Castro<br>Director de obra | *Aprueba por Interventoría*<br>Ing. Andrés Alexander Ortiz Mora<br>Director de interventoría |
| *Suscribe en Sitio*<br>Ing. Residente de obra | *Aprueba en Sitio*<br>Ing. Residente de interventoría |

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE OBRA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

Sapuyes, Nariño, 4 de agosto de 2026

**SEGUIMIENTO Y CONTROL DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL – PLANILLAS**

Interventoría deja constancia que, en ejercicio de las funciones de seguimiento y control contractual, se realizó la verificación de las planillas y soportes correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes al personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra No. L.P. – 2025 – 002, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

En virtud de lo anterior, se revisó la información reportada en las respectivas planillas, verificando el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del contratista de obra la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES durante los periodos relacionados a continuación:

| TIPO DE PLANILLA | PERIODO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| **Nomina** | MARZO – 2026 | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | 9503853550 | 2026-04-27 |
| **Nomina** | ABRIL – 2026 | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | 9506413204 | 2026-06-18 |
| **Nomina** | MAYO - 2026 | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | 9509185134 | |
| **Nomina** | JUNIO - 2026 | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | 9509185221 | |

La información anteriormente relacionada corresponde a las planillas verificadas por esta interventoría de acuerdo con los soportes aportados por el contratista.

Cordialmente,

**SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO**
Representante Legal
**UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**
Nit. 902042007 – 3

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902033941 | 1 | UNION TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | CL 2 # 26 - 130 | PASTO-NARIÑO | 3127607845 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | | | E | 2026/08/12 | | | | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 98393451 | ACOSTA ANGEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS037 | 9 | $525,272 | $21,100 | CCF35 | 9 | $525,272 | $21,100 | 14-11 | 9 | $525,272 | $36,600 | 9 | $0 | $0 | Si | $162,900 |
| 2 | CC | 98138288 | MARTINEZ YONNY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 8 | $466,908 | $74,800 | EPSIC5 | 8 | $466,908 | $18,700 | CCF35 | 8 | $466,908 | $18,700 | 14-11 | 8 | $466,908 | $32,500 | 8 | $0 | $0 | Si | $144,700 |
| 3 | CC | 5344580 | MERA GERARDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $408,545 | $65,400 | EPSIC5 | 7 | $408,545 | $16,400 | CCF35 | 7 | $408,545 | $16,400 | 14-11 | 7 | $408,545 | $28,500 | 7 | $0 | $0 | Si | $126,700 |
| 4 | CC | 1085269741 | MESA CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $437,727 | $70,100 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 3 | $437,727 | $17,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 3 | $0 | $0 | No | $209,600 |
| 5 | CC | 5344726 | OLIVA JOSE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS005 | 9 | $525,272 | $21,100 | CCF35 | 9 | $525,272 | $21,100 | 14-11 | 9 | $525,272 | $36,600 | 9 | $0 | $0 | Si | $162,900 |
| 6 | CC | 13062928 | PEREZ ALVARO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPSIC5 | 9 | $525,272 | $21,100 | CCF35 | 9 | $525,272 | $21,100 | 14-11 | 9 | $525,272 | $36,600 | 9 | $0 | $0 | Si | $162,900 |
| 7 | CC | 1087424466 | PULZARA RICARDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $525,272 | $84,100 | ESSC18 | 9 | $525,272 | $21,100 | CCF35 | 9 | $525,272 | $21,100 | 14-11 | 9 | $525,272 | $36,600 | 9 | $0 | $0 | Si | $162,900 |
| 8 | CC | 1085336867 | ROSERO KAROL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $1,313,179 | $210,200 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 15 | $1,313,179 | $52,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 15 | $0 | $0 | No | $384,700 |
| 9 | CC | 12996429 | RUEDA JAVIER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 15 | $1,313,179 | $210,200 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 15 | $1,313,179 | $52,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 15 | $0 | $0 | No | $384,700 |
| 10 | CC | 5345830 | TARAPUEZ ALEXANDER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 9 | $525,272 | $84,100 | EPS005 | 9 | $525,272 | $21,100 | CCF35 | 9 | $525,272 | $21,100 | 14-11 | 9 | $525,272 | $36,600 | 9 | $0 | $0 | Si | $162,900 |
| 11 | CC | 1085342370 | VANEGAS JESSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF35 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 12 | CC | 98397054 | ZUÑIGA JUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | $1,313,179 | $210,200 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 15 | $1,313,179 | $52,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 15 | $0 | $0 | No | $384,700 |
| **Total** | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,629,982 | $1,541,600 | | | $5,252,718 | $210,700 | | | $9,629,982 | $386,100 | | | $12,256,338 | $853,500 | | $0 | $0 | | $2,991,900 |



2026/08/11 03:12 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902033941 | 1 | UNION TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | CL 2 # 26 - 130 | PASTO-NARIÑO | 3127607845 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | | | E | 2026/08/12 | | | | |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 12 | $1,541,600 | $0 | | | | | $0 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $168,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $210,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $953,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $210,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $853,500 | $0 | | | | | $0 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $853,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $386,100 | $0 | | | | | $0 | |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 12 | $386,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 8 | $210,700 | $0 | | | | | $0 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $21,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 3 | $56,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $21,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $42,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 12 | $2,991,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

# Planilla Resumen

| LOR A PAGAR |
|---|
| $1,541,600 |
| $168,200 |
| $210,200 |
| $953,000 |
| $210,200 |
| $853,500 |
| $853,500 |
| $386,100 |
| $386,100 |
| $210,700 |
| $21,100 |
| $56,200 |
| $21,100 |
| $70,100 |
| $42,200 |
| $2,991,900 |

PLANILLA SIN PAGAR

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

Sapuyes, Nariño, 12 de agosto de 2026

**SEGUIMIENTO Y CONTROL DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL – PLANILLAS**

Interventoría deja constancia que, en ejercicio de las funciones de seguimiento y control contractual, se realizó la verificación de las planillas y soportes correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes al personal vinculado para la ejecución del Contrato de Interventoría No. C.M. – 2026 – 001, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

En virtud de lo anterior, se revisó la información reportada en las respectivas planillas, verificando el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del contratista de obra la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES durante los periodos relacionados a continuación:

| TIPO DE PLANILLA | PERIODO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| **Nomina** | MAYO - 2026 | CONSORCIO C&L SAPUYES | 9509185134 | 2026-06-18 |
| **Nomina** | JUNIO - 2026 | CONSORCIO C&L SAPUYES | 9509185221 | |
| **Nomina** | JULIO - 2026 | CONSORCIO C&L SAPUYES | 9509427060 | |

La información anteriormente relacionada corresponde a las planillas verificadas por esta interventoría de acuerdo con los soportes aportados por el contratista.

Cordialmente,

_____

**SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO**
Representante Legal
**UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**
Nit. 902042007 – 3

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902042007 | 3 | CONSORCIO C&L SAPUYES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO C L SAPUYES | CR 33 # 2 - 48 | PASTO-NARIÑO | 3178871245 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | | | E | 2026/08/04 | | | | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1086104859 | LOPEZ DIEGO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $437,727 | $70,100 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 7 | $437,727 | $17,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 7 | $0 | $0 | No | $209,600 |
| 2 | CC | 87069836 | ORTIZ ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | $875,453 | $140,100 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 12 | $875,453 | $35,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 12 | $0 | $0 | No | $297,100 |
| 3 | CC | 1004215772 | PANTOJA SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF35 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 4 | CC | 1233192220 | PARDO DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | $875,453 | $140,100 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 12 | $875,453 | $35,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 12 | $0 | $0 | No | $297,100 |
| 5 | CC | 1233191503 | REVELO JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 8 | $875,453 | $140,100 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 8 | $875,453 | $35,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 8 | $0 | $0 | No | $297,100 |
| 6 | CC | 1084224287 | ROSERO JHONNY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $1,313,179 | $210,200 | | 0 | $0 | $0 | CCF35 | 15 | $1,313,179 | $52,600 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 15 | $0 | $0 | No | $384,700 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,128,170 | $980,800 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $6,128,170 | $245,600 | | | $10,505,430 | $731,400 | | $0 | $0 | | $2,027,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902042007 | 3 | CONSORCIO C&L SAPUYES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO C L SAPUYES | CR 33 # 2 - 48 | PASTO-NARIÑO | 3178871245 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | | | E | 2026/08/04 | | | | |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $980,800 | $0 | | | | | $0 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $980,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $731,400 | $0 | | | | | $0 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $731,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $245,600 | $0 | | | | | $0 | |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 6 | $245,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $70,100 | $0 | | | | | $0 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 6 | $2,027,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

# Planilla Resumen

| LOR A PAGAR |
|---|
| $980,800 |
| $980,800 |
| $731,400 |
| $731,400 |
| $245,600 |
| $245,600 |
| $70,100 |
| $70,100 |
| $2,027,900 |

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# SEGUIMIENTO A POLIZAS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# OBRA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE SAPUYES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 31 | 7 | 2026 |

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAPUYES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO No. LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES
R.L. ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA

**OBJETO DEL CONTRATO:**
CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| | |
|---|---|
| **ADJUDICACION DEL CONTRATO** | 3 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001** | 12 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **ACTA DE INICIO** | 18 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN** | 20 DE MAYO (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA FINALIZACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN** | 6 DE JULIO (Fecha en la cual se imparte) |
| **ACTA DE REINICIO** | 6 DE JULIO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA II SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO No.002** | 5 MESES Y 8 DIAS (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO No.002** | 14 DE DICIEMBRE DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |

| **PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** | | **VIGENCIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garantía Única de Cumplimiento: | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 2. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 3. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 4. Estabilidad y Calidad de la Obra | DESDE: | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | | | | | |
| 5. Calidad del servicio | DESDE: | 14 | 12 | 2026 | HASTA | 14 | 12 | 2029 |

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

**Contratos Adicionales:** Anexo No. 3 Póliza No. 775-47-99-4000004648

| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | **VIGENCIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Predios, Labores y Operaciones: | DESDE: | 31 | 7 | 2026 | HASTA | 14 | 12 | 2026 |
| 4. Contratistas y Subcontratistas | DESDE: | 31 | 7 | 2026 | HASTA | 14 | 12 | 2026 |
| 5. Responsabilidad Civil Patronal | DESDE: | 31 | 7 | 2026 | HASTA | 14 | 12 | 2026 |
| 6. Vehiculos Propios y No Propios | DESDE: | 31 | 7 | 2026 | HASTA | 14 | 12 | 2026 |

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

**Contratos Adicionales:** Anexo No. 3 Póliza No. 775-74-994000000913

Firma:
Nombre: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES
R.L. ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA
Contratista de obra

Firma:
Nombre: CONSORCIO C&L SAPUYES
R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO
Contratista de Interventoría

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**7750190980**

## PÓLIZA No: 775 - 47 - 994000004648 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS PASTO** COD. AGENCIA: 775 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 08 | 2026 | 10 | 08 | 2026 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

DIRECCIÓN: CALLE 2 26 130 TO MAYA APTO102 CIUDAD: PASTO, NARIÑO TELÉFONO: 3127607845

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.149-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 18/03/2026 | 14/04/2027 | 399,342,346.00 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 18/03/2026 | 14/04/2027 | 461,720,937.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 18/03/2026 | 14/12/2029 | 399,342,346.00 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | VER NOTA ACLARATORIA | | 399,342,346.00 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 14/12/2026 | 14/12/2029 | 199,671,173.00 |

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901967328 - CONSTRUCTORA LEGADO FC SAS - PART: 50.00%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 1085269741 - MESA ACOSTA, CAMILO ANDRES - PART: 50.00%
NIT 901967328 - CONSTRUCTORA LEGADO FC SAS - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *1,859,419,148.00 | $ **********825,339 | $*********0.00 | $ ******156,814 | $ **********982,153 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS FRANCISCO ROJAS M | 11041 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000775019098

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C9DF25780D0BF57B5C

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero**

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PASTO COD. AGENCIA: 775 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000004648** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

ASEGURADO: **ALCALDIA MUNICIPAL SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.149-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

**TEXTO ITEM 1**

NIT 800099149 - ALCALDIA MUNICIPAL SAPUYES
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO S/N, DE FECHA FEBRERO 25 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO -DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ASEGURADOS/BENEFICIARIOS NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON NIT 830114475-6 Y MUNICIPIO DE SAPUYES NIT 800099149-6
NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (CINCO) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS HASTA DICIEMBRE 14 DE 2026 DE ACUERDO A OTRO SI NO. 2 DE FECHA JULIO 31 DE 2026

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**7750191004**

## PÓLIZA No: 775 -74 - 994000000913 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS PASTO** COD. AGE: 775 RAMO: 74 PAP:

| DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08 | 2026 | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | 31 | 07 | 2026 | 23:59 | | 14 | 12 | 2026 | 23:59 | 136 | 10 | 08 | 2026 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN | | |

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

| | DIA | MES | AÑO | HORAS | | DIA | MES | AÑO | HORAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA DEL ANEXO | 31 | 07 | 2026 | 23:59 | | 14 | 12 | 2026 | 23:59 | 136 |
| | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

DIRECCIÓN: CALLE 2 26 130 TO MAYA APTO102 CIUDAD: PASTO, NARIÑO TELÉFONO: 3127607845

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

DIRECCIÓN: CALLE 2 26 130 TO MAYA APTO102 CIUDAD: **PASTO, NARIÑO** TELÉFONO: 3127607845

BENEFICIARIO: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES NIT : 902033941

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NARIÑO CIUDAD: SAPUYES

DIRECCION: SAPUYES

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 525,271,500.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 525,271,500.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 525,271,500.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 525,271,500.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 525,271,500.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 902033941 - UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO S/N REFERENTE A PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DEL ESPINO-DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ACLARACION:
LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015 CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:
1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:ASEGURADO: NACION MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON NIT 830114475-6 Y MUNICIPIO DE SAPUYES NIT 800099149-6
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE SAPUYES 800099149-6 Y NACION MINISTERIO DEL INTERIIOR Y FONSECON 830.114.475-6.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***525,271,500.00 | $ **********391,435 | $*********0.00 | $ *******74,373 | $ **********465,808 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS FRANCISCO ROJAS M | 11041 | 100.00 |

COASEGURO CEDIDO

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000775019100

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C9DF25780D0BF57A5F

CLIENTE

MOCAICEDOPAT 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:**Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. - Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero**

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PASTO COD. AGENCIA: 775 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000000913** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

BENEFICIARIO: **UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.033.941-1**

**TEXTO ITEM 1**

3. AMPAROS. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES,CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:
A) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
B) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
C) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
D) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
E) COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GARANTIAS DE ACUERDO A MODIFICATORIO NO. 2 DE FECHA JULIO 31 DE 2026

CLIENTE

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE SAPUYES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 31 | 3 | 2026 |

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAPUYES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO No. CM-2026-001 DEL 03 DE MARZO DE 2026 CONTRATISTA: CONSORCIO C&L SAPUYES
R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANROJA ROSERO

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| | |
|---|---|
| **ADJUDICACION DEL CONTRATO** | 3 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001** | 12 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **ACTA DE INICIO** | 18 DE MARZO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA INICIO ACTA DE SUSPENSIÓN** | 20 DE MAYO (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA FINALIZACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN** | 6 DE JULIO (Fecha en la cual se imparte) |
| **ACTA DE REINICIO** | 6 DE JULIO DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA II SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO No.001** | 5 MESES Y 8 DIAS (Fecha en la cual se imparte) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO No.001** | 14 DE DICIEMBRE DE 2026 (Fecha en la cual se imparte) |

| **PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** | | **VIGENCIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garantía Única de Cumplimiento: | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 2. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 3. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | DESDE: | 18 | 3 | 2026 | HASTA | 14 | 4 | 2027 |
| 4. Estabilidad y Calidad de la Obra | DESDE: | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | | | | | |
| 5. Calidad del servicio | DESDE: | 18 | 9 | 2026 | HASTA | 18 | 9 | 2031 |

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

**Contratos Adicionales:** Anexo No. 7 Póliza No. 41-44-101303666

Firma:
Nombre: CONSORCIO C&L SAPUYES
R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO
Contratista de Interventoría

Firma:
Nombre: Ing. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-44-101303666** | **7** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **08** | **2026** | **18** | **03** | **2026** | **00:00** | **18** | **10** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **CONSORCIO C&L SAPUYES** | **NIT: 902.042.007-3** | CR 33 20 - 48 MZ A CA 14 CASTILLOS DEL NORTE | PASTO, NARIÑO | 3178871245 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE SAPUYES** | **NIT: 800.099.149-6** | SAPUYES | SAPUYES, NARIÑO | . |

ADICIONAL: NACION MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT 830114475-6

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 5 AÑOS A PARTIR ACTA DE ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCION

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **18/03/2026** | **14/04/2027** | **$45,328,827.10** | **$45,328,827.10** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **18/03/2026** | **14/04/2027** | **$60,692,058.00** | **$60,692,058.00** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **18/03/2026** | **14/12/2029** | **$22,664,413.55** | **$22,664,413.55** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **18/09/2026** | **18/09/2031** | **$45,328,827.10** | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DE PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE ACUERDO A MODIFICATORIO No. 2 CON FECHA 31 DE JULIO DE 2026, AL CM-2026-001
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 5 AÑOS A PARTIR ACTA DE ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCION

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******85,784.00 | $ *******8,000.00 | $ ******17,819.00 | $ **********111,603.00 | $ ******174,014,125.75 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| FRANCISCO ROJAS MARTINEZ LTDA | 194663 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101303666

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101303666 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 2026 | 18 | 03 | 2026 | 00:00 | 18 | 10 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO C&L SAPUYES | | **NIT: 902.042.007-3** |
| **DIRECCIÓN:** CR 33 20 - 48 MZ A CA 14 CASTILLOS DEL NORTE | **CIUDAD:** PASTO, NARIÑO | **TELÉFONO:** | 3178871245 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SAPUYES | | **NIT: 800.099.149-6** |
| **DIRECCIÓN:** SAPUYES | **CIUDAD:** SAPUYES, NARIÑO | **TELÉFONO:** | . |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS | 900461601-9 | 50.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ DIEGO ARMANDO | 1086104859 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101303666

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

| | REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE SAPUYES | VERSIÓN: | 01 |
|---|---|---|---|
| | **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA** | VIGENCIA: | |

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | LICITACIѾN PÚBLICA |
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | No. LP- 2025 - 002 |
| **OBJETO:** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **CONTRATISTA:** | UNIѾN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES - R.L. ING. CAMILO ANDRÉS MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES - R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **SUPERVISOR:** | ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO |

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | INFORME SEMANAL No.01 | Entrega Informesemanal de interventoría | INTREVENTORÍA | MUNICIPIO |
| 21/07/2026 | INFORME SEMANAL No.02 | Entrega Informesemanal de interventoría | INTREVENTORÍA | MUNICIPIO |
| 30/07/2026 | INFORME SEMANAL No.03 | Entrega Informesemanal de interventoría | INTREVENTORÍA | MUNICIPIO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES - R.L. ING. CAMILO**
**NIT. 901.888.479 - 3**

**CONSORCIO C&L SAPUYES - R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO**
**NIT. 901.891.613 - 5**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# INFORME AMBIENTAL Y SST

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

2026

# INFORME AMBIENTAL Y SST



UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES

7-2026

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO** | **INFORME AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO C δ L SAPUYES<br>R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **CONTRATO** | LP-2025-002 de 25 de febrero 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |
| **PERIODO DEL INFORME** | 6 -31 DE JULIO DE 2026 |
| **RESPÓNSABLE DEL INFORME** | JUAN DAVID MORA CASTRO / KAROL ROSERO NARVAEZ |

## PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Con el inicio de las actividades del proyecto, se procedió a implementar los planes de manejo establecidos para los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos derivados de la ejecución de las obras. Para ello, se dio inicio a la aplicación de las medidas contempladas en los programas de manejo, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se realizaron actividades de seguimiento y control para verificar la correcta implementación de las acciones previstas, promoviendo la protección de los recursos naturales, el bienestar de los trabajadores y una adecuada relación con la comunidad del área de influencia.

## PROGRAMA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

### PROYECTO DAGA-1.1-01: Conformación del grupo de gestión ambiental

Con el inicio de las actividades del proyecto, se procedió a conformar el Grupo de Gestión Ambiental, el cual será el encargado de coordinar, ejecutar y realizar el seguimiento a las acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este grupo quedó integrado por el personal responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales asociados a la ejecución de las obras.

Asimismo, se socializaron las funciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes, estableciendo los mecanismos de coordinación para garantizar la correcta implementación de los programas ambientales, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el seguimiento permanente a las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto.

### PROYECTO DAGA-1.2-02: Capacitación Ambiental al personal de Obra

Durante el mes de julio se realizó una charla dirigida al personal de obra sobre la disposición de residuos generados en obra, con el objetivo de promover prácticas responsables de disposición, prevenir impactos ambientales, mantener condiciones seguras en el frente de trabajo y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y la normatividad vigente.





**PROYECTO DAGA-1.3-03: Cumplimiento requerimientos legales**

A continuación, se discriminan los permisos requeridos para el proyecto de acuerdo al Plan de Manejo ambiental.

| RECURSO NATURAL | TIPO DE PERMISO | REQUERIDO (SI / NO) | ENTIDAD QUE LO OTORGA |
|---|---|---|---|
| **Hídrico** | Permiso de ocupación de cauces | No | N/A |
| | Permiso de concesión de agua | No | N/A |
| | Permiso o autorización para la disposición de vertimientos de unidades sanitarias | Si | EMPSSAP |
| **Suelo** | Autorización de sitios de disposición de materiales sobrantes. | Si | Secretaria de Planeación municipal |
| | Solicitud copia de Titulo Minero y Licencia Ambiental a la empresa seleccionada para proveer materiales de cantera | No | Los permisos deben ser entregados por el proveedor externo – AGRESUR. |
| **Forestal** | Permiso de aprovechamiento forestal y/o manejo de la vegetación. | No | N/A |
| **Aire** | Permiso de emisiones atmosféricas | No | Los vehículos como volquetas aportan los documentos (SOAT, licencia de tránsito y certificado técnico mecánico y de emisiones contaminantes. De igual forma, la maquinaria. |

De acuerdo al componente hídrico, se cuenta con permiso de vertimientos por parte de la empresa EMPSSAP del municipio de Sapuyes.

Con respecto, al sitio para disposición de materiales provenientes de excavación y desalojo, se describe el proceso a seguir en el apartado de "**Manejo y disposición final de escombros y lodos"** que se menciona más adelante en este informe.

De igual forma, se cuenta con la documentación correspondiente a la licencia ambiental y al contrato minero de la cantera AGRESUR, responsable del suministro de materiales pétreos para el proyecto, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales aplicables.

## PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

### Proyecto PAC-2.1-04: Manejo integral de materiales de construcción

En este periodo se continua, con las inspecciones en los frentes de trabajo y zonas de acopio, verificando el adecuado almacenamiento de agregados, cementos y demás insumos, evitando pérdidas, contaminación del suelo y generación de residuos innecesarios. Se supervisa que los materiales pétreos se encuentren cubiertos con plástico para evitar la proliferación de material particulado por acción del viento o agua.









**PROYECTO PAC-2.3-06: Señalización frentes de obras y sitios temporales**

En este periodo se continua con la instalación de la señalización en los diferentes frentes de obra y en el campamento, con el fin de fortalecer la seguridad, prevenir accidentes, informar adecuadamente al personal y visitantes sobre los riesgos existentes y garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y señalización vigente, como se evidencia a continuación:













De igual forma, se observó la demarcación y delimitación los frentes de trabaja y áreas de mayor riesgo en la obra. Estas acciones permiten garantizar un entorno de trabajo más seguro, ordenado y conforme a los estándares establecidos.





De igual forma, durante el presente periodo se constató la instalación y socialización de las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de las sustancias químicas utilizadas en las diferentes actividades del proyecto, con el fin de garantizar que los trabajadores cuenten con información clara y actualizada sobre los riesgos asociados a su manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final.

Las fichas de seguridad instaladas corresponden a los siguientes productos:

- Gasolina
- ACPM
- Pegante para tubería PVC
- Limpiador PVC

Esta actividad se desarrolló en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa vigente en materia de manejo seguro de sustancias químicas.





**PROYECTO PAC-2.4-07: Manejo y disposición final de escombros y lodos**

El material resultante de las actividades de excavación fue destinado para su aprovechamiento como material de relleno en un predio autorizado, ubicado en el corregimiento del espino, en las coordenadas 1°02'41.68"N – 77°41'26.83"O, a una distancia aproximada de 200 metros del área de intervención.

Cabe mencionar que se cuenta con el correspondiente Certificado de Autorización expedido por la Secretaría de Planeación del Municipio de Sapuyes, el cual autoriza la disposición y aprovechamiento del material en el sitio indicado.



**PROYECTO PAC-2.5-08: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales**

Se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de los residuos convencionales generados en la obra.

Como medida provisional para el manejo de los residuos generados por los sacos de cemento utilizados en obra, se dispuso un área temporal de acopio debidamente delimitada y señalizada, destinada exclusivamente a la recolección y almacenamiento de los sacos vacíos.

Los residuos recolectados de manera periódica, procurando mantenerlos secos, organizados y protegidos de la intemperie, evitando cualquier dispersión, contaminación del suelo o incorporación a otros flujos de residuos. Asimismo, se recomienda realizar la separación en la fuente y mantener el área de acopio en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

Del mismo modo, la recolección en punto cercano a la obra, trasporte y disposición final de residuos la realiza EMSSAP los días martes y viernes antes de las 10:00 a.m. Del mismo modo, los residuos aprovechables son entregados a recicladores del municipio de Sapuyes.

Con estas acciones se garantiza una adecuada gestión de residuos, contribuyendo al orden en la obra, al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y a la promoción de prácticas sostenibles.



**PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA**

**PROYECTO PGH-3.2-10: Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.**

El manejo de las aguas residuales generadas por el personal de la obra se realiza mediante el uso de una unidad sanitaria arrendada, ubicada en un predio contiguo a la oficina del proyecto. Este servicio cuenta con una conexión al sistema de alcantarillado municipal, por lo que la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales son de responsabilidad, de la empresa prestadora del servicio público dirigido por EMSSAP, Con esta medida se garantiza el adecuado manejo de los residuos líquidos generados por el personal, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente y previniendo impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública.

Actualmente debido a la etapa inicial del proyecto y al reducido número de trabajadores (11 trabajadores), se dispone de una (1) unidad sanitaria arrendada, suficiente para atender las necesidades del personal de obra mientras se desarrollan las actividades actuales.

De igual manera, se dispone de un kit antiderrames debidamente equipado, destinado a la atención inmediata de derrames de sustancias peligrosas o contaminantes, con el fin de controlar, contener y mitigar posibles impactos ambientales, así como de proteger la seguridad del personal y dar cumplimiento a los procedimientos de respuesta ante emergencias.

De igual forma, como se evidencia en las imágenes se cuenta con unidades sanitarias para el personal, técnico, operativo y profesional.





**PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.**

**PROYECTO PBSE-4.1-11: Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal**

Durante este periodo, no se presentó descapote de cobertura vegetal, por ende, no fue necesario la implementación de las medidas establecidas en este programa. Aunque se resalta que estas actividades fueron realizadas por el municipio de Sapuyes antes de iniciar las actividades del proyecto.

**PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.**

**PROYECTO PMIT-5.1-15: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.**

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el programa de manejo ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), y de conformidad con la normatividad vigente aplicable al sector de la construcción, durante el presente periodo se evidenció la adecuación e instalación de las facilidades temporales requeridas para el inicio de las actividades del proyecto. Estas instalaciones garantizan las condiciones básicas

de operación, bienestar y seguridad para el personal, asimismo s observo que las instalaciones serán ampliadas o complementadas progresivamente de acuerdo con el avance de la obra y las necesidades operativas. A la fecha de corte del presente informe, se encuentran habilitados los siguientes espacios:

- Oficina técnica
- Almacenamiento de herramientas y materiales.
- Bodegas, almacén general y SST.
- Asistencia de primeros auxilios.
- Unidad sanitaria.

Además, se observó que se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos y con la señalización preventiva e informativa necesaria para el desarrollo seguro de las actividades en etapa inicial de proyecto.

En cuanto a los sitios de acopio temporal, se establecieron zonas delimitadas y señalizadas para el almacenamiento transitorio de materiales provenientes de excavación, asegurando su protección frente a la lluvia, el viento y el escurrimiento superficial, y evitando posibles afectaciones al suelo o a los recursos hídricos.





**PROYECTO PMIT-5.3-1. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.**

En el presente período se continuó con las actividades de desalojo de material proveniente de las excavaciones realizadas en el proyecto. Para tal fin, se empleó maquinaria pesada y volquetas, verificándose previamente que tanto la maquinaria como los vehículos cumplieran con la documentación exigida, incluyendo revisión técnico-mecánica vigente, licencia de conducción, tarjeta de propiedad y afiliación de los conductores al sistema de riesgos laborales y seguridad social.

De igual manera, se mantuvo actualizado el formato de mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos utilizados, asegurando su adecuado

estado de funcionamiento y el cumplimiento de la normativa ambiental, de tránsito y de seguridad y salud en el trabajo aplicable.

Así mismo, se verificó y controló que las volquetas transportaran el material debidamente cubierto durante todo el trayecto, con el fin de evitar la dispersión de partículas, derrames de material y la generación de polvo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la seguridad vial.

De igual manera, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de las herramientas de trabajo, el cual incluyó la limpieza y lavado de las mismas, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir fallas que puedan generar accidentes o retrasos en las actividades operativas.









## PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

### Proyecto PGS-6.1-18: Atención a la comunidad

Se cuenta con un Punto SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) destinado a la recepción, registro y gestión de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes relacionadas con el desarrollo de las actividades de la obra. En este periodo no se recibió ninguna queja o reclamo por parte de la comunidad.

### Proyecto PGS-6.2-19: Información y divulgación.

Se llevaron a cabo inspecciones conjuntas con la veeduría ciudadana, en las cuales se verificaron las condiciones del proyecto, en materia técnica, de seguridad y de cumplimiento de los compromisos establecidos. Estas visitas permitieron recoger observaciones, aclarar inquietudes y evidenciar el compromiso del proyecto con la transparencia y la gestión responsable ante la comunidad y las autoridades competentes.

### Proyecto PGS-6.6-23: Contratación de mano de obra.

En este periodo se registró el ingreso de seis (6) personas residentes del municipio de Sapuyes, lo cual contribuye al fortalecimiento del empleo local y al desarrollo socioeconómico de la región. La incorporación de trabajadores locales no solo genera oportunidades laborales directas, sino que también promueve la economía comunitaria, fortalece el tejido social y favorece la transferencia de conocimientos y habilidades dentro de la obra.

Se cuenta con un letrero y/o pendón informativo instalado a las afueras del proyecto, en el cual se comunica a la comunidad el proceso de recepción de hojas de vida del personal local del municipio de Sapuyes, con el fin de promover la vinculación laboral de la población del área de influencia directa.
Este mecanismo ha permitido facilitar el acceso a oportunidades de empleo y garantizar la transparencia en la selección del personal, priorizando la contratación de mano de obra local tanto calificada como no calificada.

A continuación, como parte del informe ambiental de este periodo se anexan:

- Anexo PMA No.1. Plan de trabajo ambiental.
- Anexo PMA No.2. Registros de capacitaciones ambientales.
- Anexo PMA No.3. Acta de conformación del grupo de gestión ambiental
- Anexo PMA No.4. Certificado disposición RCD.
- Anexo PMA No.4A. Manejo de residuos EMSSAP.
- Anexo PMA No.5. Matriz de aspectos e impactos ambientales actualiza al periodo del informe.

- Anexo PMA No.6. Mantenimiento preventivo de herramientas.
- Anexo PMA No.7. Mantenimiento preventivo de equipos.
- Anexo PMA No.8. Inspección preoperacional de vehículos.
- Anexo PMA No.9. Documentos volquetas.
- Anexo PMA No.10. Inspección preoperacional y documentos retroexcavadora.
- Anexo PMA No.11. Licencia ambiental y contrato de concesión cantera AGRESUR.
- Anexo PMA No.12. Soporte de compra de materiales pétreos.

## COMPONENTE SST - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del proyecto, se dio apertura a las actividades correspondientes al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estableciendo las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en esta área. Como parte del proceso de alistamiento, se verifico la vinculación del personal, la implementación de controles preventivos y el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades constructivas. De igual forma, se veló por el bienestar integral y la protección de todos los trabajadores mediante inducciones, charlas preventivas y el seguimiento continuo a las condiciones de trabajo. A continuación, se describen las acciones ejecutadas en este periodo:

- **AFILIACIONES NUEVOS INGRESOS**

En el marco de inicio de obra, se realizo el proceso de vinculación del personal requerido para la ejecución del proyecto. Se efectuaron las respectivas afiliaciones al sistema general de seguridad social integral, garantizando la cobertura en salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar, en cumplimiento de la normatividad vigente y como requisito previo de las actividades.
Por tanto, durante este periodo se reporta el ingresó de un total de 11 personas.

Mano de obra calificada y no calificada.

| No. | NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel María Acosta Cuatindioy | 98.393.451 | Maestro |
| 2 | Yonny Daniel Martínez Rosas | 98.138.288 | Ayudante |
| 3 | Gerardo Henry Mera Benavides | 5.344.580 | Ayudante |
| 4 | José Hugo Oliva Burgos | 5.344.726 | Ayudante |
| 5 | Álvaro Giraldo Pérez Arteaga | 13.062.928 | Ayudante |
| 6 | Ricardo Fabian Pulzara Casanova | 1.087.424.466 | Ayudante |
| 7 | Alexander Emilio Tarapuez Moncayo | 5.345.830 | Ayudante |

Profesionales

| No. | NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Andrés Mesa Acosta | 1.085.269.741 | RL. Contratista |
| 2 | Jessica Stephanie Vanegas Gongora | 1.085.342.370 | Residente Aux. |
| 3 | Karol Yineth Rosero Narváez | 1.085.336.867 | Prof. Sisoma |
| 4 | Javier Andrés Rueda Zarama | 12.996.429 | Esp. Estructura |

- **INSPECCIÒN Y USO DE EPP**

Como parte de las actividades de alistamiento para el inicio de obra, se verifico la entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado, incluyendo guantes de carnaza, guantes de nitrilo, cascos, gafas de seguridad, protectores auditivos, chalecos reflectivos y botas de seguridad. (Anexo 23)





De igual manera se verifico el estado y uso adecuado de los EPP, diligenciando el correspondiente formato de inspección para una reposición oportuna de ser necesario. Reforzando con estas acciones la contribución de fortalecer la cultura de autocuidado y a prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, durante la ejecución del proyecto.

Además, se establece un protocolo de ingreso para visitantes, a quienes se les asigna un casco de color naranja y un carné de visitante, permitiendo su identificación y asegurando el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad durante su permanencia en la obra.





- **JORNADAS DE ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO**

En este periodo de julio se realizaron jornadas de orden y aseo en los frentes de trabajo con el fin de mantener condiciones adecuadas de limpieza, organización y seguridad en las áreas de labor, minimizando los riesgos de accidentes, mejorando la movilidad del personal y promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable.





- **SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD**

Durante este período se concluyó la instalación de la señalización de seguridad en los distintos frentes de trabajo, priorizando aquellas áreas con mayor nivel de riesgo, como el campamento y zonas operativas críticas. Esta señalización tiene como objetivo prevenir accidentes, orientar al personal y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.










- **COPASST Y COCOLAB**

En este periodo se realizó una reunión con el comité de COPASST y COCOLAB. en donde se socializaron avances, revisaron los compromisos pendientes, y se definieron más acciones para trabajos seguros.





- **INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN OBRA**

Durante este período se llevaron a cabo inspecciones y verificaciones locativas, así como la revisión del estado y correcta ubicación de la señalización en los distintos frentes de trabajo y áreas demarcadas. Estas actividades permitieron identificar condiciones inseguras, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y asegurar que la demarcación existente contribuya a la prevención de riesgos y a la protección del personal.





- **ANALISIS DE TRABAJAO SEGURO (ATS)**

En este mes de julio, se continúa con la aplicación del formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), con el fin de que antes de iniciar las actividades se identifiquen los peligros, evalúen los riesgos y se definan las medidas de control necesarias, garantizando que cada tarea se ejecute bajo condiciones seguras y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- **CAPACITACIONES Y CHARLAS EN OBRA**

Durante este período se llevaron a cabo capacitaciones y charlas de seguridad dirigidas a todo el personal de obra, en las cuales se abordaron temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo y el componente ambiental. Estas actividades fueron debidamente documentadas mediante registros de asistencia, garantizando que tanto el personal de nuevo ingreso como el personal permanente se encuentren informados y actualizados sobre las prácticas, procedimientos y medidas de prevención aplicables.

Durante el mes de julio se desarrolló la siguiente capacitación:

| TEMAS DE CAPACIATACIÓN | FECHA DE CAPACITACIÓN |
|---|---|
| Uso adecuado de EPP | 21 de julio de 2025 |
| | |



- **PROCEDIMIENTO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES**

Antes de iniciar las actividades en excavaciones profundas, se realizan supervisiones y verificaciones previas, mediante las cuales se constata que los equipos y sistemas de protección se encuentren en adecuado estado de funcionamiento. Asimismo, se verifica que todo el personal haga uso correcto y seguro de los equipos de protección personal, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y minimizando los riesgos asociados a este tipo de labores.





- **EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS**

En la obra se dispone de una camilla de primeros auxilios, tres extintores y un botiquín tipo B, conformando los elementos básicos para la atención de emergencias. Estos equipos son verificados y mantenidos de manera periódica, asegurando su correcto funcionamiento y disponibilidad inmediata. Su presencia garantiza una respuesta rápida y eficaz ante accidentes laborales o emergencias médicas, contribuyendo a la protección integral del personal en los frentes de trabajo y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).







- **PASILLOS O CORREDORES**

Se cuenta con pasillos o corredores peatonales, destinados exclusivamente para la circulación segura de trabajadores y visitantes. Estos accesos fueron debidamente delimitados y señalizados, garantizando una adecuada separación respecto a las áreas operativas, el tránsito de maquinaria y las zonas de almacenamiento de materiales. De esta manera, se asegura un desplazamiento ordenado y se reducen los riesgos de incidentes durante la movilización dentro de la obra.





- **INDICADORES DE AT Y AUSENTISMO LABORAL - REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

Durante el período evaluado no se registraron casos de ausentismo laboral por enfermedades laborales, ni se reportaron accidentes de trabajo. Este resultado refleja el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo implementadas, así como la correcta aplicación de los procedimientos operativos y preventivos por parte del personal.

Con base en lo anteriormente descrito, se adjuntan los anexos correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la obra, los cuales incluyen:

A continuación, como parte del informe SST de este periodo se anexan:

- Anexo SG – SST No.13. Listado de personal afiliado.
- Anexo SG – SST No.14. Exámenes de ingreso del personal.
- Anexo SG – SST No.15. Planilla de seguridad social mes de julio.
- Anexo SG – SST No.16. Certificados de afiliación del personal afiliado.
- Anexo SG – SST No.17. Inducción del personal.
- Anexo SG – SST No.18. Plan de capacitación SST y ambiental.
- Anexo SG – SST No.19. registros de capacitación y actividades de promoción y prevención
- Anexo SG – SST No.20. Acta de conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST).
- Anexo SG – SST No.21. Acta de conformación de Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB).

- Anexo SG – SST No.22. Registro de reunión COPASST Y COCOLAB.
- Anexo SG – SST No.23. Registro de entrega de EPP a personal.
- Anexo SG – SST No.24. Inspecciones de uso de EPP.
- Anexo SG – SST No.25. MEDEVAC.
- Anexo SG – SST No.26. Inspecciones de seguridad.
- Anexo SG – SST No.27. Indicadores de AT y ausentismo laboral julio.



Juan David Mora Castro
Ingeniero Ambiental
Esp. Gestión de la SST.



Karol Yineth Rosero Narváez
Ingeniera Ambiental
Esp. Gerencia de la SST

# ANEXO 1
# PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL

**PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO "**

**Fecha de actualización: 31 DE JULIO 2026**

| TEMA GENERAL | TEMA ESPECÍFICO | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | P/E | DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES | EJECUTADO | PROGRAMADO | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | jul-26 / ago-26 / sep-26 / oct-26 / nov-26 | | | | |
| | | Instalación de campamento y señalización. | Profesional Ambiental | Economicos | P | | | 2 | 100 | |
| | | | | | E | | 2 | | | |
| | | Instalación Punto Ecológico y clasificación de residuos. | Profesional Ambiental | Economicos | P | | | 1 | 100 | |
| | | | | | E | | 1 | | | |
| | | Control y mantenimiento preventivo de herramientas y vehículos. | Profesional Ambiental | Tiempo, Personal | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Implementación de canecas o un sistema de lavado de herramientas. | Profesional Ambiental | Economicos | P | | | 1 | 100 | |
| | | | | | E | | 1 | | | |
| | | Implementación de equipo mínimo de aseo para que las instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza. | Profesional Ambiental | Economicos, Tiempo | P | | | 1 | 100 | |
| | | | | | E | | 1 | | | |
| | | Aseo de frentes de obra, campamento y oficinas. | Profesional Ambiental | Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Señalización y demarcación en los diferentes frentes de obra. | Profesional Ambiental | Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Protección con plásticos o lonas en buen estado de materiales dispuestos en obra , debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización. | Profesional Ambiental | Economicos, Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Adecuado manejo de materiales de construcción. | Profesional Ambiental | Economicos, Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Lavado de herramientasn usadas en obra. | Profesional Ambiental | Economicos, Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| | | Disposición final de escombros. | Profesional Ambiental | Economicos, Humanos | P | | | 17 | 18 | |
| | | | | | E | | 3 | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **26** | **124** | **20,97** | |

| | | |
|---|---|---|
| ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | ING. KAROL YINETH ROSERO NARVAEZ |
| **FIRMA DE APROBACIÓN DE CONTRATISTA DE OBRA** | **FIRMA DE APROBACIÓN DE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | **AMBIENTAL Y SST OBRA** |

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 2

# REGISTROS DE CAPACITACIONES AMBIENTALES.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# INFORME DE CAPACITACIÓN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**FECHA**: 28 DE JULIO DE 2026

**RESPONSABLE**: KAROL ROSERO NARAVAEZ

**PROYECTO**:

**NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:** MEDIDAS AMBIENTALES EN OBRA.

**OBJETIVO DE LA CAPACITACION:** La presente capacitación tiene como objetivo principal fortalecer los conocimientos y competencias del personal involucrado en la ejecución de obras respecto a la identificación, aplicación y control de las medidas ambientales establecidas en el proyecto. Busca asegurar que todas las actividades se desarrollen en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, promoviendo prácticas responsables que minimicen los impactos negativos sobre el entorno natural, social y cultural.

**DESARROLLO:** Se inicio presentando al personal el marco normativo aplicable, los principales impactos ambientales asociados a las actividades constructivas y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos; se abordan temas como el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones y ruidos, la protección de suelos, la correcta operación de maquinaria, la señalización de áreas sensibles y los protocolos ante contingencias ambientales, complementándose con la explicación de responsabilidades individuales y colectivas.

**INTRODUCCION**: Durante la ejecución de obras de construcción, es fundamental implementar acciones que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados por las distintas actividades. La incorporación de medidas ambientales no solo responde a requerimientos legales, sino que también contribuye al uso eficiente de recursos, la protección de los ecosistemas y la mejora del desempeño ambiental de la empresa.
Esta capacitación está dirigida a trabajadores, supervisores y jefaturas, con el fin de asegurar que todo el personal cuente con la información necesaria para ejecutar sus labores de manera ambientalmente responsable y conforme al plan de manejo ambiental del proyecto

| NORMATIVA AMBIENTAL EN OBRA | MEDIDAS AMBIENTALES EN OBRA |
|---|---|
| **Ley 99 de 1993** — Crea el marco general de la política ambiental en Colombia, establece las bases para la protección de los recursos naturales, la conservación ambiental, y define las competencias del Estado y las autoridades ambientales.<br>**Ley 9 de 1979** (Código Sanitario Nacional) — Contiene normas para la protección de salud pública y medio ambiente; regula la gestión de residuos, desechos, aguas, descargas y otros aspectos sanitarios, importantes cuando se genera contaminación, residuos o vertimientos en obra.<br>**Decreto 1076 de 2015** — Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, Consolida y actualiza regulaciones ambientales vigentes; incluye normas sobre biodiversidad, recursos naturales, residuos, permisos ambientales, entre otros.<br>**Resolución 0472 de 2017** (modificada por la Resolución 1251 de 2021) — Regula la "gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD)" en obras civiles en todo el | - Manejo de residuos y escombros (RCD): Segregar en la fuente, almacenar en sitios adecuados y disponer únicamente en lugares autorizados.<br>- Control de polvo y material particulado: Humectación de vías y zonas de trabajo, cubrimiento de acopios y limpieza periódica.<br>- Control de ruido y vibraciones: Uso de maquinaria en buen estado, mantenimiento preventivo y ejecución de actividades ruidosas en horarios permitidos.<br>- Protección de aguas y suelos: Instalación de barreras de sedimentación, cunetas de control, bandejas de contención y prevención de descargas no autorizadas.<br>- Prevención y manejo de derrames: Uso de kits de derrames, almacenamiento seguro de Combustibles y sustancias peligrosas, y capacitación del personal.<br>- Protección de la vegetación y biodiversidad: Señalización de áreas sensibles, restricción de accesos y manejo adecuado de tala o poda autorizada.<br>- Control de emisiones atmosféricas de Maquinaria: Revisión técnico–mecánica al día, apagado de motores en reposo y uso de combustible limpio. |

| | |
|---|---|
| territorio nacional; define obligaciones sobre generación, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos de construcción. | - Orden y limpieza en obra: Mantener áreas despejadas, señalizadas y libres de materiales innecesarios.<br>- Educación y sensibilización ambiental: Capacitar al personal sobre buenas prácticas, riesgos y protocolos ambientales. |
| | |

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 3

# ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Corregimiento de El Espino, municipio de Sapuyes **a los 18 días del mes de julio del año 2026,** siendo las 8:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de la obra, los profesionales que a continuación se relacionan, con el fin de conformar el **Grupo de Gestión Ambiental (GGA)**, en cumplimiento de las políticas institucionales y de la normatividad ambiental vigente.

## 1. Antecedentes

La UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES, reconoce la importancia de implementar acciones orientadas a la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, el uso racional de los recursos naturales y el cumplimiento de la legislación ambiental. En este contexto, se hace necesaria la creación de un **Grupo de Gestión Ambiental** que lidere, coordine y promueva las actividades ambientales dentro de la organización.

## 2. Objetivo del Grupo de Gestión Ambiental

El objetivo principal del Grupo de Gestión Ambiental es planificar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar las estrategias, programas y proyectos ambientales que se desarrollen en la obra, garantizando la mejora continua del desempeño ambiental y fomentando la cultura del cuidado ambiental.

## 3. Integrantes del Grupo

El Grupo de Gestión Ambiental queda conformado por las siguientes personas:

| N° | Nombre Completo | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Santillan | Residente Aux obra |
| 2 | Karol Rosero Narvaez | Profesional SiSoma |
| 3 | Angel Maria Acosta | Maestro de Obra |
| 4 | | |

El grupo podrá ampliarse o modificarse según las necesidades de la obra.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

**4. Funciones del Grupo**

Entre las principales funciones del Grupo de Gestión Ambiental se establecen las siguientes:

1. Promover la adopción y cumplimiento de las políticas ambientales institucionales.
2. Diseñar, implementar y evaluar el Plan de Gestión Ambiental (PGA).
3. Identificar impactos ambientales y proponer medidas de mitigación y control.
4. Fomentar campañas de educación y sensibilización ambiental.
5. Realizar seguimiento a los indicadores ambientales.
6. Coordinar acciones con entidades externas y autoridades ambientales competentes.

**5. Compromisos**

Los integrantes del Grupo se comprometen a participar activamente en las reuniones, actividades y proyectos relacionados con la gestión ambiental, así como a difundir las buenas prácticas dentro de la obra.

**6. Clausura**

Siendo las 10: 30 a.m., se da por terminada la reunión de conformación del Grupo de Gestión Ambiental, firmando los asistentes en señal de aceptación y compromiso.

**En constancia, se firma la presente acta:**

Cristian Santillan
Residente Aux. Obra

Angel Maria Acosta
Maestro de obra

Karol Rosero Narvaez
Profesional Sisoma.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 4
# CERTIFICADO DISPOSICIÓN RCD.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAPUYES - NARIÑO**

**CERTIFICA**

Que, para la ejecución del convenio interadministrativo **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO"**, el Municipio de Sapuyes (N) habilitará un predio para la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD), escombros y material sobrante producto de las excavaciones y demás actividades constructivas del proyecto.

El lote destinado para tal fin se encuentra ubicado en el corregimiento de El Espino, en las coordenadas geográficas 1°02'41.68"N – 77°41'26.83"O, a una distancia aproximada de 200 metros del área de intervención, lo que facilita el transporte y manejo adecuado de los materiales. La disposición de los residuos se realizará de manera controlada, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y evitando afectaciones de fondo al predio, terceros y a los recursos naturales del sector.

La presente se firma a los 14 días del mes de mayo de 2026.

**JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**
Secretario de Planeación y Obras
Municipio de Sapuyes

# ANEXO 4A

# MANEJO DE RESIDUOS EMSSAP.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

**EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAPUYES "EMSSAP" S.A. E.S.P. IDENTIFICADA CON NIT 901.013.193-8, VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSPD**

**CERTIFICA**

La Empresa de Servicios Públicos de Sapuyes EMSSAP S.A. E.S.P. cuenta con la capacidad operativa, técnica y administrativa necesaria para prestar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios generados por el proyecto denominado **UNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN". TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO.** ubicado en el corregimiento del Espino, municipio de Sapuyes, departamento de Nariño.

En consecuencia, se deja constancia de que los residuos sólidos ordinarios que se generen durante las etapas de construcción y operación del proyecto podrán ser recolectados por esta empresa, de conformidad con las rutas establecidas, las frecuencias de recolección, las condiciones operativas y la normatividad vigente aplicable al servicio público de aseo en esta jurisdicción.

Así mismo, se certifica que la prestación del servicio estará sujeta al cumplimiento, por parte del generador, de las condiciones establecidas por la empresa en materia de presentación, almacenamiento temporal, separación en la fuente, horarios y demás requisitos necesarios para garantizar una adecuada gestión de los residuos.

Se precisa que los residuos objeto de la presente certificación corresponden exclusivamente a residuos sólidos ordinarios no peligrosos, generados en el desarrollo de las actividades propias del proyecto, cuyo manejo se realizará dentro del esquema de prestación del servicio público de aseo definido para el municipio de Sapuyes.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines pertinentes.

Se firma en el municipio de Sapuyes, a los once (11) días del mes de mayo de 2026.

**LUIS CARLOS ORTEGA AZAÍN**
GERENTE EMSSAP S.A. E.S.P.



Cra.4 No.6-30 Pueyo de Val
Sapuyes - Nariño
314 843 6074
emssapsapuyes@gmail.com
emssapsapuyes@outlook.com

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 5

# MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES JULIO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN". TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – NARIÑO.**

| ETAPA | IMPACTO / ACTIVIDADES | MEDIO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ABIOTICO | | | | | | | BIÓTICO | | | | | |
| | | AGUA | | AIRE | | SUELO | | | FLORA | FAUNA | ECONÓMICO | SOCIAL | | |
| | | Deterioro de la calidad de agua superficial | Alteración de la calidad hidrologica de los cuerpos de agua | Deterioro de la calidad del aire por emisiones de gases de combustión | Incremento en los niveles de ruido | Pérdida o ganancia de suelo | Generación de residuos sólidos | Generación de residuos de construcción y demolición | Afectación cobertura vegetal | Afectación de la fauna terrestre | Generación de empleo | Afectación infraestructura vial | Afectación movilidad vehicular y personas | Generación de conflictos con la comunidad |
| Actividades preliminares | Socialización del proyecto | | | | -1 | | -1 | | | | | | | -1 |
| | Instalación de infraestructura temporal | | | | -1 | | -1 | | -1 | | 1 | | -1 | -1 |
| | Contratación de mano de obra | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fase de construcción | Localización y replanteo | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | -1 |
| | Desmonte, limpieza y descapote | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | -1 | -1 |
| | Excavaciones y rellenos | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | -1 |
| | Cimentaciòn | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | -1 | -1 |
| | Estructura | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | -1 |
| | Mamposterìa | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | -1 |
| | Cielos Rasos | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Pintura y acabados | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Cubierta | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Impermeabilizaciones | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Carpinteria metàlica | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Espacio pùblico | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Accesorios y aparatos sanitarios | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | | | -1 |
| | Instalaciones electricas | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Red de voz y datos | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Instalaciones Hidràulicas | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Sistema fotovoltaico | | | -1 | -1 | | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| Cierre y abandono | Orden, limpieza y aseo de la obra | | | | -1 | -1 | -1 | | | | 1 | | | -1 |
| | Desmantelamiento de infraestructura temporal | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | | 1 | | | -1 |

| | |
|---|---|
| IMPACTOS NEGATIVOS | -1 |
| IMPACTOS POSITIVOS | 1 |

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 6

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO |
|---|---|---|
| | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | FORMATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS | PAGINA 1 DE 1 |

| Inspector | Karol Rosero | | | | | | Cargo | | | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SSST | | | | | | Fecha | | | 16-07-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | DIA 1 | | | DIA 2 | | | DIA 3 | | | DIA 4 | | | DIA 5 | | | DIA 6 | | | Tipo de mantenimiento en caso de ser necesario |
| | Utilice una X para marcar si se encuentra en Buen (B), Regular (R) y Mal (M) estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Herramientas | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | |
| Palendras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| Picos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Martillos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Macetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Barras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Carretas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Seguetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Cinceles | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales | Herramienta menor en buenas condiciones para uso adecuado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO |
|---|---|---|
| | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | FORMATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS | PAGINA 1 DE 1 |

| Inspector | Karol Rosero | | | | | | Cargo | | | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SSST | | | | | | Fecha | | | 23-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | DIA 1 | | | DIA 2 | | | DIA 3 | | | DIA 4 | | | DIA 5 | | | DIA 6 | | | Tipo de mantenimiento en caso de ser necesario |
| | Utilice una X para marcar si se encuentra en Buen (B), Regular (R) y Mal (M) estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Herramientas | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | |
| Palas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Picos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Macetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Martillos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Barras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Seguetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Cinceles | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Carretes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales | Las herramientas continuan en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO |
|---|---|---|
| | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | FORMATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS | PAGINA 1 DE 1 |

| Inspector | Karol Rosero | | | | | | | Cargo | | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SSST | | | | | | Fecha | 30-07-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | DIA 1 | | | DIA 2 | | | DIA 3 | | | DIA 4 | | | DIA 5 | | | DIA 6 | | | Tipo de mantenimiento en caso de ser necesario |
| | Utilice una X para marcar si se encuentra en Buen (B), Regular (R) y Mal (M) estado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Herramientas | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | |
| Barras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Cinceles | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Macetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Martillos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Palas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Picos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Seguetas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Carretillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales | Herramienta menor revisada se encuentra en optimas condiciones para uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 7

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | CODIGO |
|---|---|---|
| | | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | FORMATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | PAGINA 1 DE 1 |

| Inspector | Karol Rosero | | | | | | Cargo | | | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SST | | | | | | Fecha | (24-31) Julio | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | DIA 1 | | | DIA 2 | | | DIA 3 | | | DIA 4 | | | DIA 5 | | | DIA 6 | | | Tipo de mantenimiento en caso de ser necesario |
| | Utilice una X para marcar si se encuentra en Buen (B), Regular (R) y Mal (M) estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Equipos | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | |
| Saltarin | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| Mezclador de concreto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales | Mezclador portatil de concreto en buenas condiciones para uso saltarin presento mal funcionamiento y requiere mantenimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | CODIGO |
|---|---|---|
| | | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | FORMATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | PAGINA 1 DE 1 |

| Inspector | Karol Rosero | | | | | | Cargo | | | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SST | | | | Fecha | (20-25) julio | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | DIA 1 | | | DIA 2 | | | DIA 3 | | | DIA 4 | | | DIA 5 | | | DIA 6 | | | Tipo de mantenimiento en caso de ser necesario |
| | Utilice una X para marcar si se encuentra en Buen (B), Regular (R) y Mal (M) estado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Equipos | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | |
| Saltarin | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales | El equipo inspeccionado se encuentra en buenas condiciones y apto para uso en cualquier actividad requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 8

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | FORMATO<br>INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS | E-2023-1723-235406<br>Version: 1 |
|---|---|---|
| | " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | Vigente desde: Julio de 2025 |

| MARCA: | Inter | CLASE | Carga o mixto | TIPO | Platon |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO: | 2015 | SERIE | 3HTW7AHT7FN545428 | PLACA | SNV-567 |
| INSPECCIONADO POR: | Karol Rosero | | | SEMANAS: | 20-25 |

| FECHA: | CONDICIONES QUE DEBE MANTENER | DIA 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Utilice un ✓ si está en buen estado y un X en caso contrario | | | | |
| LLANTAS | Presión | X | X | X | ✓ | ✓ |
| | Labrado | ✓ | X | X | X | X |
| | Tuercas completas y aseguradas | X | X | X | X | X |
| FRENOS | Freno de parqueo funciona | X | X | X | X | X |
| | Frenos funcionando | X | X | X | X | X |
| | Líquido de frenos dentro de los límites | X | X | X | X | ✓ |
| LUCES | Enciende la luz de reversa | X | X | X | X | X |
| | Encienden luces bajas | ✓ | X | X | X | X |
| | Encienden luces bajas | X | X | X | X | X |
| | Encienden cocuyos | X | X | X | X | X |
| | Encienden luces de freno | X | X | X | X | X |
| | Encienden direccionales (adelante y atrás) | X | X | X | X | X |
| INDICADORES DEL TABLERO | Nivel de combustible | X | ✓ | X | X | X |
| | Indicador de presión de aceite | X | X | X | X | X |
| | Indicador nivel de batería | X | X | X | X | X |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | Espejos retrovisores funcionando | X | X | X | X | X |
| | Todas las puertas cierran y ajustan | X | X | X | X | X |
| | Nivel de aceite del motor | X | X | X | X | X |
| | Nivel del líquido de la dirección | X | X | X | X | ✓ |
| | Nivel del líquido refrigerante | X | X | X | X | X |
| | Nivel del agua del limpiabrisas | X | X | X | X | X |
| | Pito | X | X | X | X | X |
| | Limpiabrisas funcionando | X | X | ✓ | X | X |
| | Radiador con tapa ajustada | X | X | X | X | X |
| | Correa del ventilador tensionada | ✓ | X | X | X | X |
| | Batería sin residuos | X | X | ✓ | X | X |
| SILLETERÍA | Ajuste horizontal sillas delanteras | ✓ | X | X | X | X |
| | Ajuste vertical sillas delanteras | X | X | X | ✓ | X |
| | Tapizado sin roturas o manchas | X | X | X | X | X |

| Observaciones | Vehiculo en condiciones optimas | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del responsable del vehiculo: | | Firma del responsable del vehiculo | |

Código:F-AGS-47 Versión: 00 1 de 1

# ANEXO 9
# DOCUMENTOS VOLQUETAS.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) |
|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-12-10 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10565200406600 | SNV567 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 10831 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | INTERNATIONAL | PLATON |

| LÍNEA VEHICUL |
|---|
| WORKSTAR 7600 SBA 6X4 |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 35324424 | 3HTWYAHT7FN545428 | 3HTWYAHT7FN545428 | 16.58 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MORA CASTRO, FRANCISCO JAVIER | 3182725153 | CC | 13066587 | PASTO |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 41 | 4013 | 0 | PASTO |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $ 1162400 | $ 604400 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1]<br>701,68 [2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Protección de datos personales:**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccíondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

**Topes de cobertura gastos médicos**
**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 13065237
Libertad y Orden
NOMBRE
ANGEL MARINO CORAL GUERRON
FECHA DE NACIMIENTO
22-05-1967
FECHA DE EXPEDICIÓN
04-09-2024
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL TUQUERRES
SANGRE-RH
O+
de Colombia


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
B2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.
04-09-2032
PARTICULAR
C2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.
04-09-2027
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07002598720
COSMOCOLOR COLOMBIA-LC 24

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015453242

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SNV567 | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16580 |

NÚMERO DE MOTOR
35324424

REG
N

VIN
3HTWYAHT7FN545428

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT7FN545428

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
3HTWYAHT7FN545428

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MORA CASTRO FRANCISCO JAVIER Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13066587

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201400031296

I/E
I

FECHA IMPORT.
04/08/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
16/08/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/01/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT02004821627

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182192008

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA TUQUERRES

**NIT:** 900678628

**No. de Certificado de Acreditación:** ONAC:14-OIN-040

**Fecha de expedición:** 2025/07/02

**Fecha de vencimiento:** 2026/07/02

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SNV567

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2015

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35324424

**NRO. CHASIS:** 3HTWYAHT7FN545428

**VIN:** 3HTWYAHT7FN545428

**LÍNEA:** WORKSTAR 7600 SBA 6X4

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** CARMENZA Y. SANCHEZ P. y otro(s)

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

MARIA FABIOLA SILVA PAREDES



Scanned with CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 10
# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y DOCUMENTOS RETROEXCAVADORA.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | REPORTE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y LISTADO DE OBSERVACIONES DE MAQUINARIA | F-MT-01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA: | |
| OPERADOR: | NOMBRE: william calpa |
| | CEDULA: 87. 218. 172 |
| MAQUINA: | MARCA: caterpillar |
| | AÑO MODELO: 2009 |
| | CLASE: Retro excavadora |
| | No. DE SERIE: CAT0430 EER LN 00 246 |

**MODULO 1 - PREOPERACIONAL - ASPECTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA**

| No. | SISTEMA O CONCEPTOS A INSPECCIONAR | CRITERIO A REPORTAR | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN ( DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SINTOMA ) | OBSERVACIÓN DEL JEFE INMEDITO ( Afecta o no la operación y acción a tomar ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de motor | Anomalías en temperatura, ruidos, fugas, perdidas de fuerza, consumos | Si | | | |
| 2 | Freno convencional | Anomalías en bandas, campanas. | Si | | | |
| 3 | Sistema de dirección | Ruido, fuga, bloqueo o endurecimiento | Si | | | |
| 4 | Sistema hidráulico | Anomalías por fugas, ruidos, perdidas de presión | Si | | | |
| 5 | Diferenciales | Anomalíaspor ruido, fugas | Si | | | |
| 6 | Servotransmisión | Anomalías por fugas, ruidos, funcionamiento marcha y contramarcha | Si | | | |
| 7 | Sistema de articulación | Desgastes, desajuste, ruido | Si | | | |
| 8 | Sistema eléctrico | Anomalías en ruido, testigos | Si | | | |
| 9 | Correas | Revisar visualmente tensionamiento y desgaste | Si | | | |
| 10 | Tablero ( Testigos) | Anomalías enel funcionamiento de los testigos auditivo y/o luminoso | Si | | | |

**MODULO 2 - ASPECTOS QUE NECESITAN REVISIÓN DE PERSONLA TÉCNICO**

| No. | SISTEMA O CONCEPTOS A INSPECCIONAR | CRITERIO A REPORTAR | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN ( DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SINTOMA ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Horómetro | Verificar su correcto funcionamiento | Si | | |
| 12 | Sistema de luces | Verificar el correcto funcionamiento de luces, stop, reserva, valizas, parqueo, direcciones y pitos | Si | | |
| 13 | Freno de seguridad | Revisar testigo | Si | | |
| 14 | Sistema hidráulico | Presenta fugas o anomaliasen los cilindros hidráuficos ( Botellas), mangueras, bomba | Si | | |
| 15 | Chasis cabina | Verificar fisuras, ajuste, piezas sueltas y chapas | Si | | |
| 16 | Llantas delanteras y traseras | Verificar su estado, profundidad de labrado, presión, rines | Si | | |
| 17 | Tren de rodaje | Verificar estado de sproket, tensoras, cadenas, rodillos y zapatas | Si | | |
| 18 | Mantenimientos | Verificar el tiempo de cumplimiento de los diferentes mantenimientos y que la tarjeta esta en la maquina y este correctamente actualizada | Si | | |
| 19 | Nivel de refrigerante | Verificar que los niveles de fluidos sean los adecuados de acuerdo a la maquina | Si | | |
| 20 | Nivel aceite motor | | Si | | |
| 21 | Nivel aceite hidráulico | | Si | | |

**MODULO 3 - ASPECTOS QUE SE PUEDEN REVISAR CON INSPECCIÓN VISUAL DEL OPERADOR**

| No. | SISTEMA O CONCEPTOS A INSPECCIONAR | CRITERIO A REPORTAR | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN ( DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SINTOMA ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cinturón de seguridad | Verificar el cinturón de seguridad del operador | Si | | |
| 23 | Extintor en buen estado | Presión del manómetro, pin de seguridad acceso en caso de emergencia, reportar fecha de vigencia de recarga y capacidad. El estado del extintor es responsbilidad del conductor u operador. | Si | | |
| 24 | Espejo retrovisores | Verificar el estado de los espejos retrovisores internos y externos. | Si | | |
| 25 | Inyector de grasa | Inyector completo y correcto funcionamiento | Si | | |
| 26 | Aire acondicionado | Verificar su buen funcionamiento | Si | | |
| 27 | Documentos legales | Se encuentren completos y su fecha este vigente: Licencia de conducción, SOAT y tarjeta de registro | Si | | |

**OBSERVACIONES:**

La pajarita a la fecha no presenta averías o desperfectos de operación

| CONSULTORES CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S | Hoja de vida de maquinaria y equipos | CODIFICACION |
|---|---|---|
| | | F-SGSST-043-24 |
| | | Versión 01 |
| | | 7/03/2025 |

| | |
|---|---|
| Nombre del equipo | PAJARITA 01 |
| Modelo | 416F2 |
| Año | 2018 |
| Numero de Motor | G4D60588 |
| Numero de Chasis | CAT0416FTLBF05826 |
| Marca | CATERPILLAR |
| Clase de Maquinaria | RETROEXCABADORA |

**1.Relacion de materiales instalados**

| Filtro | Referencia | Marca | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Filtro Combustible | BF7675D | FRANING | 1 | MANTENIMIENTO REALIZADO EN TALLER, PASTO N. |
| Filtro Combustible | BF7785D | BALDWIN | 1 | |
| Filtro aceite | HCX17A | FRANING | 1 | |
| Filtro de aire primario | CAT-346-6687 | FRANING | 1 | |
| Filtro de aire secundario | PA5290 | FRANING | 1 | |
| **Aceite** | **Referencia** | **Marca** | **Cantidad** | |
| Motor | 15W40 | Móvil | 3 galones | |

**2.Informacion de fecha del mantenimiento**

| Fecha Del Mantenimiento | Horómetro Actual | Tipo de mantenimiento | Próximo Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 10781,4 | 250 HORAS | 11031.4 HORAS |

**3.Evidencia fotográfica del mantenimiento**








**OBSERVACIONES GENERALES: PROXIMO MANTENIMIENTO A LAS 250 H**

**4. APROBACION**

| | |
|---|---|
|  | 1.086.982.707 |
| Firma. REP LEGAL | Cedula |

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 110609**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC094811 | CATERPILLAR | 416F2 | 2018 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | RETROEXCAVADORA | CAT0416FTLBF05826 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| AMARILLO | G4D60588 | NEUMATICOS |

**PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS**

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 7640 Kg | 3577 mm | 2322 mm | 7140 mm |

**PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)**
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO

**IDENTIFICACIÓN**
C.C. 87.069.865

**LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)**

**IDENTIFICACIÓN**



**LIMITACIONES A LA PROPIEDAD**

**ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR**
STRIA TTOYTTE DPTAL TANGUA/NARIÑO

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 22-12-2022 | 07-02-2023 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482019000118532 | 14/02/2019 |

VALID 121553 05/18

**ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL**

**TM06000012829**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.960.958

ROSERO LAGOS

APELLIDOS

JHON ALEXANDER

NOMBRES

JHon Rosero

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1997

YACUANQUER
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-JUL-2015 YACUANQUER

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2314500-00822561-M-1087960958-20160505 00496 35697A 1 46126049

# ANEXO 11

# LICENCIA AMBIENTAL CANTERA AGRESUR.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

República de Colombia

Libertad y Orden

# AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

**RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO** 230

( 19 SET. 2019 )

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

**EL VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,** en ejercicio de sus facultades legales conferidas por el Artículo 31 de Ley 685 de 2001 modificado por el Artículo 147 del Decreto – Ley 0019 de 10 de enero de 2012 y, en especial, de las establecidas en el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, en la Resolución No. 309 del 5 de mayo de 2016, modificada por la Resolución No. 709 del 29 de agosto de 2016, la Resolución No. 546 de 20 de septiembre de 2017 y la Resolución No. 490 del 30 de julio de 2019 de la Agencia Nacional de Minería y,

**CONSIDERANDO**

Que el Artículo 31 de la Ley 685 de 2001, modificado por el Artículo 147 del Decreto – Ley 0019 de 10 de enero de 2012, establece que la Autoridad Minera tiene la facultad para delimitar Áreas de Reserva Especial por motivos de orden económico o social, en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, con el objeto de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país, en aquellas zonas en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, cuyos beneficiarios serán los miembros de la comunidad minera allí establecida.

Que en virtud del Decreto Ley 4134 del 03 de noviembre de 2011, la Agencia Nacional de Minería – ANM, ejerce actualmente entre otras, las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional.

Que mediante el Artículo 3 de la Resolución No. 309 de 5 de mayo de 2016, corregida por la Resolución No. 709 de 29 de agosto de 2016, se asignó a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento la función de *"Adelantar todo el proceso y las actuaciones administrativas que resulten necesarias para la declaratoria de las áreas de reserva especial que trata el artículo 31 de la Ley 685 de 2001"*, así como todas aquellas que se deriven de tal declaratoria y suscribir los documentos y actos administrativos requeridos dentro de dichos trámites.

Que el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución No. 4 1107 de 18 de noviembre de 2016 *"Por la cual se incluyen y modifican algunas definiciones en el Glosario Técnico Minero"*, estableció las siguientes definiciones:

> *"**Comunidad Minera:** Para efectos de la declaratoria de áreas de reserva especial de que trata el artículo 31 del Código de Minas, se entiende por comunidad minera la agrupación de personas que adelantan explotaciones tradicionales de yacimientos mineros en un área específica en común".*

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

*"**Explotaciones Tradicionales**: Es la actividad minera realizada por personas vecinas del lugar que no cuentan con título minero y que por sus características socioeconómicas se constituye en la principal fuente de ingresos de esa comunidad. Las explotaciones mineras deberán haber sido ejercidas desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, por parte de la comunidad minera solicitante (...)".*

Que a través de la Resolución No. 546[1] de 20 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería estableció el trámite administrativo para la declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial para comunidades mineras, la cual en su Artículo 2° establece:

*"**Artículo 2°. Ámbito de aplicación.** La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial, que se encuentren en trámite, que hayan sido iniciadas de oficio por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, o por solicitud expresa de una comunidad minera; así como a las solicitudes que se radiquen con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Resolución y, a las Áreas de Reserva Especial declaradas y delimitadas a la entrada en vigencia del presente acto administrativo.*

*Parágrafo 1. Para efectos del trámite de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial, se entiende por explotaciones tradicionales aquellas realizadas por personas vecinas del lugar que no cuenten con título minero y que por sus características socioeconómicas se constituye en la principal fuente de ingresos de esa comunidad. Las explotaciones mineras deberán haber sido ejercidas desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001, por parte de la comunidad minera solicitante, para lo cual deberán acreditar su existencia mediante pruebas que permitan evidenciar, por parte de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, que son explotaciones tradicionales y que sus actividades mineras corresponden a lo establecido en el Decreto 1666 de 2016, en relación con la clasificación de la minería.*

*Parágrafo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, se requiere que las personas que integren la respectiva comunidad minera, acrediten la mayoría de edad a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001".*

Que frente al tema de la declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial para comunidades mineras, el Artículo 11° de la citada Resolución, dispone:

*"**Artículo 11°. Delimitación y declaratoria del área de reserva especial.** Una vez se determine la viabilidad técnica y socioeconómica para la declaración y delimitación del Área de Reserva Especial, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, expedirá el acto administrativo a través del cual se declara y delimita el Área de Reserva Especial, se identifique la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial y se impongan las obligaciones a que hace alusión el artículo 14 de la presente resolución y las que se deriven del informe de visita de verificación. En firme este acto administrativo, se incluirá en el Catastro Minero Colombiano y los integrantes de la comunidad minera beneficiaria, en el Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM (...)".*

Que atendiendo a la normatividad que antecede, la Agencia Nacional de Minería mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018** (Folios 1-39), recibió solicitud de declaración y delimitación de un Área de Reserva Especial para la explotación de arena de cantera, ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, suscrita por las personas que se relacionan a continuación:

| Nombres y Apellidos | Cédula de Ciudadanía No. |
|---|---|
| Vicente Arnulfo Escobar Yela | 5.344.313 |
| Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 |
| Luis Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 |
| Justiniano Marcillo Ruano | 1.887.440 |

Que respecto del área de interés, en los planos anexos a la respectiva solicitud se suministraron las siguientes coordenadas (Folios 17-18):

[1] La Resolucion No. 546 del 20 de septiembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial # 50364 del 22/09/2017, fecha desde la cual inicia su vigencia. De igual forma se publico en la Página Web de la ANM.

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

| PUNTO | NORTE | ESTE |
|---|---|---|
| 1 | 606601 | 929305 |
| 2 | 606885 | 928518 |
| 3 | 606811 | 928329 |
| 4 | 607105 | 927991 |
| 5 | 606848 | 927991 |
| 6 | 606848 | 927363 |
| 7 | 607295 | 927363 |
| 8 | 607328 | 927413 |
| 9 | 607285 | 927485 |
| 10 | 607155 | 927541 |
| 11 | 607148 | 927618 |
| 12 | 607223 | 927693 |
| 13 | 607365 | 927688 |
| 14 | 607418 | 927713 |
| 15 | 607448 | 927745 |
| 16 | 607448 | 927781 |
| 17 | 607425 | 927818 |
| 18 | 607248 | 927855 |
| 19 | 607248 | 927888 |
| 20 | 607281 | 927922 |
| 21 | 607365 | 927931 |
| 22 | 607456 | 927998 |
| 23 | 607455 | 928025 |

| PUNTO | NORTE | ESTE |
|---|---|---|
| 24 | 607333 | 928085 |
| 25 | 607281 | 928225 |
| 26 | 607028 | 928245 |
| 27 | 606942 | 928275 |
| 28 | 606942 | 928410 |
| 29 | 607198 | 928410 |
| 30 | 607282 | 928508 |
| 31 | 607365 | 928545 |
| 32 | 607385 | 928575 |
| 33 | 607388 | 928615 |
| 34 | 607348 | 928641 |
| 35 | 607245 | 928648 |
| 36 | 607215 | 928688 |
| 37 | 607215 | 928758 |
| 38 | 607225 | 928785 |
| 39 | 607222 | 928815 |
| 40 | 607205 | 928825 |
| 41 | 607071 | 928845 |
| 42 | 607000 | 928880 |
| 43 | 606933 | 928941 |
| 44 | 607049 | 929065 |
| 45 | 607173 | 929172 |
| 46 | 607102 | 929305 |

Que mediante oficio de **radicado ANM No. 20184110276541 del 22 de junio de 2018** (Folio 44), el Grupo de Fomento de la Agencia Nacional de Minería informó a los solicitantes del inicio del trámite de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 546 de 2017.

Que mediante oficio de **radicado ANM No. 20184110277221 del 06 de julio de 2018** (Folio 46), el Grupo de Fomento de la Agencia Nacional de Minería solicitó a la alcaldía de Sapuyes – Nariño, copia del diagnóstico minero de dicho municipio.

Que mediante **radicado No. 20185500567652 del 06 de agosto de 2018** (Folios 47-146), se allegó la documentación tendiente a dar respuesta a la anterior solicitud.

Que se incorporó al expediente **Reporte de Superposiciones del 22 de junio de 2018** (Folio 149), en el cual se determinó:

***REPORTE DE SUPERPOSICIONES VIGENTES***
***SOLICITUD DE ÁREA DE RESERVA ESPECIAL CORREGIMIENTO EL ESPINO - SAPUYES***
***DEPARTAMENTO DE NARIÑO***

***ÁREA SOLICITADA*** *74,8279 Hectáreas*
***MUNICIPIOS*** *Sapuyes - Nariño*

| CAPA | EXPEDIENTE | MINERALES | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | RCA-09501 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 4,62% |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | RDP-09221 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2,80% |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | SGA-08141 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 51,18% |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | SIE-15181 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 33,66% |
| ÁREAS AMBIENTALES DE EXCLUSIÓN MINERA | ZP - CHILES - CUMBAL | ZONA DE PARAMO CHILES - CUMBAL - ESCALA 100K RADICADO ANM 20145510329222 - INCORPORADO 03/09/2014 | 0,24% |

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

Que efectuado el estudio de la documentación aportada dentro de la respectiva solicitud, el Grupo de Fomento mediante **Informe de Evaluación Documental ARE No. 353 del 13 de agosto de 2018** (Folios 150-154), determinó:

| *OBSERVACIONES/CONCLUSIONES* |
|---|
| *Revisada y analizada la documentación que reposa en el expediente del área de reserva especial en el corregimiento El Espino, jurisdicción del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño, solicitada mediante radicado 20175500273722 del 201890802772422 del 28 de mayo de 2018, por Vicente Arnulfo Escobar Yela identificado con cédula de ciudadanía número 5.344.313, Francisco Germán Marcillo Casanova identificado con cédula de ciudadanía número 13.064.136, Luis Francisco Marcillo Quiroz identificado con cédula de ciudadanía número 12.755.267 y Justiniano Marcillo Ruano identificado con cédula de ciudadanía número 1.887.440, para explotación de materiales de arena de cantera, de conformidad con lo dispuesto en la resolución ANM 546 de 2017, se observó:*<br><br>1. *Se aporta las fotocopias legibles de las cédulas de ciudadanía de los cuatro (4) solicitantes mayores de edad a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001. (Fs. 12, 13, 14 y 15)*<br><br>2. *La solicitud se encuentra suscrita por todos y cada uno de los cuatro (4) solicitantes, y se aportan datos de contacto de cada uno de los integrantes de la comunidad minera solicitante. (Fs. 7 y 8)*<br>3. *Se presenta las coordenadas del polígono solicitado y seis (6) frentes de explotación y responsables. (Fs. 2 y 3)*<br><br>4. *Se indica el nombre del mineral explotado: arena de cantera. (F.3)*<br><br>5. *Se presenta descripción de la infraestructura, métodos de explotación, herramientas, equipos utilizados y tiempo aproximado del desarrollo de las actividades que se relacionen con el desarrollo tradicional de la actividad minera. (Fs. 3 y 4)*<br><br>6. *Se presenta descripción y cuantificación de los avances en el área solicitada que sustenten el tiempo de antigüedad de la actividad minera desarrollada en cada uno de los seis (6) frentes. (Fs. 4 y 5)*<br><br>7. *Se presenta manifestación suscrita por los solicitantes, en la cual manifiestan la presencia o no de comunidades étnicas en el área solicitada (Fs. 6 y 7).*<br><br>8. *Se presenta los siguientes documentos como medios de pruebas que demuestren la actividad de explotación tradicional por cada uno de los solicitantes dentro del área solicitada, así:*<br><br>• *Certificaciones emitidas por el Secretario de Tesorería de Sapuyes el 5/04/1994 y 16/06/1998 en las que acredita que acredita que Vicente Arnulfo Escobar Yela identificado con cédula de ciudadanía número 5.344.313 (F. 21), Francisco Germán Marcillo Casanova identificado con cédula de ciudadanía número 13.064.136 (F. 30), Luis Francisco Marcillo Quiroz identificado con cédula de ciudadanía número 12.755.267 (F. 32) y Justiniano Marcillo Ruano identificado con cédula de ciudadanía número 1.887.440 (F. 34 se encuentra realizando explotación de arena de cantera localizada en la vereda Panamal, jurisdicción del municipio de Sapuyes de acuerdo con la información del Diagnóstico Minero Municipal.*<br>• *Documentos de Vicente Arnulfo Escobar: Oficios dirigidos a ingeominas y Minercol, información catastro minero sobre licencia especial materiales de construcción 0233 52, Certificado Registro Minero Licencia de explotación 233-52, resolución Corpornariño 624 2/10/2000, certificación pago a impuestos. (Fs. 22-28)*<br>• *Requerimiento de Minercol a Justiniano Marcillo del 21/11/2002, oficio de Minercol del 5/12/2002 remitiendo concepto técnico solicitud de legalización minería de hecho No. DI5-161 a Justiniano Marcillo (Fs. 34-39)*<br><br>9. *De acuerdo con el Reporte de Superposiciones y Reporte Gráfico 1282-18 del 21 de junio de 2018 (Folios 147 - 149) expedido por el Grupo de Catastro y Registro Minero, se tiene que el área solicitada se superpone en un 94.11% con:*<br><br>***PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA***<br>• *RCA-09501. Materiales de construcción. 4,62%*<br>• *RCA- RDP-09221. Materiales de construcción. 2,80%*<br>• *RCA- SGA-08141. Materiales de construcción. 51,18%*<br>• *RCA- SIE-15181. Materiales de construcción. 33,66%* |

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

***ÁREAS AMBIENTALES DE EXCLUSIÓN MINERA***

- *ZP - CHILES – CUMBAL. ZONA DE PARAMO CHILES - CUMBAL - ESCALA 100K RADICADO ANM 20145510329222 - INCORPORADO 03/09/2014. 0,24%*

10. *Consultado el C.M.C el 12 de enero de 2018, se reporta la siguiente información:*

***Vicente Arnulfo Escobar Yela C.C. 5.344.313***

- *Títulos: IFF-10141. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Vigente en ejecución*
- *Solicitudes: Solicitud de legalización NIA-16581 del 10/09/2012. Archivada y Solicitud contrato de concesión RCA-09501 del 10/03/2016. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Vigente en curso.*

***Francisco Germán Marcillo Casanova C.C. 13.064.136***

- *Títulos: No reporta*
- *Solicitudes: Solicitud contrato de concesión RDP-09221 del 25/04/2016. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Vigente en curso y Solicitud contrato de concesión SGA-08141 del 10/07/2017. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Vigente en curso.*

***Luis Francisco Marcilla Quiroz C.C. 12.755.267***

- *Títulos: No reporta*
- *Solicitudes: Solicitud contrato de concesión SIE-15181 del 14/09/2014. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Vigente en curso y Solicitud contrato de concesión RK9-10041 del 09/11/2016. Materiales de construcción. Sapuyes Nariño. Archivada rechazada.*

***Justiniano Marcillo Ruano C.C. 1.887.440***

- *Títulos: No reporta*
- *Solicitudes: Solicitud legalización ODG-08361 del 16/04/2013*

11. *Mediante radicado 20184110277221 del 6 de julio de 2018 (Folio 46) la ANM solicitó a la Alcaldía de Sapuyes Nariño, copia del diagnóstico minero municipal relacionado en las certificaciones emitidas por el Secretario de Tesorería del municipio, para posibilitar una valoración integral de las pruebas aportadas que permitan establecer la tradicionalidad de las explotaciones mineras tradicionales de los solicitantes.*

12. *Mediante radicado 20185500567652 del 8 de junio de 2018 (Folios 47 – 146), el alcalde de Sapuyes Nariño informa que en 2010 en la demolición de la sede de la alcaldía se extraviaron algunos documentos entre ellos el Diagnóstico Minero de Sapuyes. Así mismo informa que el señor Jaime Armando Guarán, secretario de tesorería del Municipio de Sapuyes, es funcionario de carrera administrativa y las certificaciones que en momento emitió sobre tradicionalidad de los solicitantes del ARE, son totalmente válidas.*

***RECOMENDACION***

*Teniendo en cuenta la evaluación documental del área de reserva especial Mandiva Santander de Quilichao solicitud 529, en jurisdicción del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño radicada con el número 20189050309322 del 14 de junio de 2018, se recomienda* ***realizar visita técnica de tradicionalidad*** *a* ***Francisco Germán Macillo Casanova*** *identificado con cédula de ciudadanía número 13.064.136,* ***Luis Francisco Macillo Quiroz*** *identificado con cédula de ciudadanía número 12.755.267 y* ***Justiniano Marcillo Ruano*** *identificado con cédula de ciudadanía número 1.887.440 por cuanto cumplen con lo establecido en el artículo 3º de la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017.*

*Frentes de explotación:*

| *Mina* | *ESTE* | *NORTE* | *RESPONSABLE* |
|---|---|---|---|
| *Frente 1* | *928.878* | *607.196* | *Justiniano Marcillo* |
| *Frente 2* | *928.762* | *607.098* | *Germán Marcillo* |
| *Frente 5* | *927.789* | *607.297* | *Luis Marcillo* |
| *Frente 6* | *927.799* | *607.827* | *Luis Marcillo* |

***NOTA:*** *El señor* ***Vicente Arnulfo Escobar Yela*** *identificado con cédula de ciudadanía número 5.344.313, es titular del título minero con placa IFF-10141, para explotación de Materiales de construcción, en jurisdicción del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño, el cual se encuentra vigente en ejecución, razón por la cual no cumple con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2º de la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017.*

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

Que mediante **radicados ANM No. 20194110291381, No. 20194110291371** y **No. 20194110291431 del 25 de febrero de 2019** (Folios 155-157), el Grupo de Fomento de la Agencia Nacional de Minería informó tanto a las personas que obran como solicitante dentro del presente trámite, como a la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO y a la Alcaldía municipal de Sapuyes[2], acerca de la fecha, hora y lugar de realización de la respectiva visita de verificación a efectuarse con ocasión de la solicitud de declaración y delimitación de un Área de Reserva Especial de **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018**.

Que en el **Informe de Visita de Áreas de Reserva Especial No. 258 del 16 de mayo de 2019** (Folios 159-178), se determinó:

*(...) 8. RESULTADOS DE LA VISITA.*

***Acceso al Área:*** *para llegar al área solicitada se realizó desplazamiento por vía terrestre desde el municipio de Pasto por la vía nacional hasta el municipio de Túquerres y luego se toma la vía nacional pavimentada Túquerres - Tumaco, hasta la vereda El Espino, y a la margen derecha en este sentido contigua a la misma está ubicada el área de influencia de la solicitud.*

***Socialización****: se realizó en el salón comunal del corregimiento el Espino – Vereda Pamanal, el día 8 de marzo de 2019, entre las 8:00 y 10:00 am, se contó con la participación de 25 personas, entre los que se encontraban los anteriormente descritos (Anexo - Acta de Asistencia).*

*La reunión fue muy participativa y muchos de los asistentes realizaron preguntas sobre el proceso, beneficios del ARE, a la comunidad, duración, como hacer para formalizarse, medio ambiente, oct., se desarrolló en un buen ambiente y se notó la integración y conocimiento de la comunidad con el proyecto.*
***Trabajos Mineros:*** *de acuerdo a la comunidad minera solicitante del ARE, los frentes de explotación ubicados dentro del ARE solicitada por la comunidad están INACTIVOS desde hace tres (3) años, por orden de la Alcaldía Municipal de Sapuyes, que ordeno parar todas las actividades de explotación en la zona, muy a pesar de estas se realizaban a pico y pala, amparados como mineros de subsistencia y los solicitantes han buscado el acercamiento con el alcalde actual y el permiso para seguir trabajando, manifestándole que son mineros de subsistencia y que han ejercido esta actividad desde antes de 1985 y amparados en el artículo 2.2.5.1.5.3 del decreto N° 1073 de 2015, los solicitantes manifiestan que la alcaldía, bajo ese mismo decreto sustenta su decisión de no permitirles trabajar, ya que esa norma establece que los materiales son Arenas y Gravas de Rio y no arenas de peña, como es el caso y material que ellos explotan en este sector de Sapuyes.*

*La comunidad agrega que los perjuicios que les han ocasionado por no dejarlos trabajar son inmensos, que se han visto a punto de pasar hambre, obligándose a buscar otras actividades como emplearse en otras minas o fincas, porque a pesar de que son propietarios de los terrenos donde realizan las explotaciones y del área de la Solicitud presentada, su tierra no sirve para la agricultura y solo se pueden tener pocas vacas, debido a que la capa de suelo es mínima y los cultivos no dan y el pasto es muy pobre y de difícil crecimiento.*

*En efecto en la visita se pudo evidenciar en el recorrido realizado que el espesor del perfil de suelo en su capa orgánica y su espesor va de 0,1 a 0,3 metros y luego siguen los bancos de arena tradicionalmente explotada.*

***Sistema de Explotación:*** *En términos generales en todos los frentes se identificó un sistema de explotación a Cielo Abierto, empleando el método de explotación por terrazas descendentes.*

*Se pudo verificar que la comunidad minera solicitante realizaba un buen trabajo en las labores de explotación de la ARENA, iniciaban con el descapote, pero con la buena práctica de retirar la capa de suelo orgánico, la cual la apartaban y depositaban en sitios distantes de la explotación, evitando su contaminación para utilizarla posterior en la recuperación paisajística y en la revegetalización.*

*En todos los frentes visitados se evidenció:*

*-Depósitos temporales de capa orgánica.*
*- Zonas revegetalizados.*
*- Señalización.*
*- Buen manejo del agua de escorrentía*
*- Depósitos para residuos (deteriorados por desuso), existe compromiso con el medio ambiente en el aprovechamiento razonable de los recursos, y la compensación por los mismos.*

---

[2] Comunicación en entregada el día 08 de marzo de 2019 en la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO tal como se puede apreciar en la guía generada por la respectiva empresa de correspondencia (Folio 156, al respaldo). Para el caso a los miembros de la comunidad minera y de la Alcaldía Municipal de Sapuyes, se entiende surtida por conducta concluyente a partir de su participación en la diligencia de visita como consta en la planilla de asistencia (Folio 179).

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

*Una vez retirada la capa orgánica queda descubierto el yacimiento de interés, y de acuerdo al literatura geológica de la región el ÁREA solicitada se encuentra sobre la unidad* ***TQvp****, Terciario – Cuaternario, conformada por rocas volcánicas, consolidadas y no consolidadas encontrándose: tobas, ignimbritas, capas de cenizas y lapilli, con intercalaciones de lava andesitica, de este depósito explotan la arena (ceniza volcánica), que en el área tiene un potente y continuo espesor que va de 15 a 20 metros aproximadamente.*

*En la explotación realizada en los frentes visitados aún se denotan las terrazas, que trabajaron y van entre 5 y de 8 m de altura y bermas de 3 y 4 m, en algunos frentes y en otros se lleva un frente único, los avances denotan un trabajo bien llevado y la comunidad minera ha venido realizando una minería tradicional.*

***Herramientas:*** *la explotación la venían trabajando de manera tradicional y de forma manual, realizando el arranque a pico y pala y el transporte interno en carretillas, se evidenciaron que aún tienen 6 carretillas, 15 palas, 8 picas, 4 barras, 5 macetas, 10 azadones, zarandas ya muy deterioradas.*

*Se realizó una georreferenciación utilizando el dispositivo GPS marca GARMIN, un levantamiento de los avances, como reposa en esquemas de las Actas de Visita y se tomó un registro fotográfico, el cual forma parte integral de este informe, de esta manera se identificó la ubicación y características de los trabajos realizados; además se determinó el inventario de los mineros tradicionales responsables de las labores mineras y de la solicitud del ARE, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:*

*Tabla N° 5. Puntos Georreferenciados Explotación Inventario de trabajos Mineros.*

| PUNTOS | FRENTE | NORTE | ESTE | MSNM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justiniano Marcillo Ruano y Francisco Germán Marcillo Casanova | 606.811 | 928.745 | 3175 |
| 2 | | 607.716 | 928.740 | 3187 |
| 3 | | 607.098 | 928.762 | 3197 |
| 4 | Francisco Germán Marcillo Casanova | 607.103 | 928.463 | 3170 |
| 5 | | 607.152 | 928.536 | 3185 |
| 6 | Luis Francisco Marcillo Quiroz | 607.690 | 927.790 | 3213 |
| 7 | | 607.740 | 927.797 | 3202 |
| 8 | | 607.295 | 927.773 | 3198 |

*Fuente: El Autor en trabajo de campo.*

- ***Trabajos visitados y Georreferenciados como verificación de la visita:***

***Frente N° 1. Justiniano Marcillo Ruano y Francisco Germán Marcillo Casanova:*** *frentes de explotación minera INACTIVOS desde hace tres (3) años, por orden de la Alcaldía Municipal de Sapuyes, que ordeno parar todas las actividades de explotación en la zona, muy a pesar de estas se realizaban a pico y pala, amparados como mineros de subsistencia y los solicitantes han buscado el acercamiento con el alcalde actual y el permiso para seguir trabajando, manifestándole que son mineros de subsistencia y que han ejercido esta actividad desde antes de 1985 y amparados en el artículo 2.2.5.1.5.3 del decreto N° 1073 de 2015, los solicitantes manifiestan que la alcaldía, bajo ese mismo decreto sustenta su decisión de no permitirles trabajar, ya que esa norma establece que los materiales son Arenas y Gravas de Rio y no arenas de peña, como es el caso y material que ellos explotan en este sector de Sapuyes.(la comunidad manifiesta que es por caprichos del alcalde por beneficiar a otros, ya que ellos estaban con el otro candidato)*

*Las actividades mineras de este frente están ubicadas y se han desarrollado en predios de propiedad del señor Justiniano Marcillo y familia y forman parte del área solicitada por la comunidad minera, uno de los puntos georeferenciados en los frentes de explotación tiene las coordenadas: N:606.811, E:928.745, altura 3.175 msnm, N:607.716, E: 928.740 altura 3.187 msnm, N:607.098, E:928.762, altura 3.197 msnm*

*Es preciso resaltar que las labores visitadas y levantadas esquemáticamente de este frente, están dentro de la zona de la Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515, ubicada en la vereda El Espino municipio de Sapuyes, se pudo verificar que ha existido un trabajo de explotación minera tradicional, trabajos bien llevados realizados de manera continua desde el año 1993 y hasta el 2016 (parados por alcaldía), a pesar de que las actividades están suspendidas hace tres años, aun se puede verificar de forma clara que:*

1. *La explotación minera se ha realizado sobre arena de peña, por los señores Justiniano Marcillo y su Hijo German Marcillo, quienes trabajan de manera asociativa.*
2. *Los trabajos de minería se han desarrollado a cielo abierto y se han realizado de manera tradicional a pico y pala, con un avance organizado el cual demuestra un trabajo de más de veinte años de actividad minera, en el año 2013 se acogieron al programa de legalización y le adjudicaron la placa ODG 08361, pero el proceso se suspendió.*

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

3. *La explotación se ha realizado en terrazas descendentes en bancos de 5 a 8 metros de altura.*
4. *Las vías internas de los frentes son amplias más de 10 metros de ancho, cuentan con buen manejo de aguas de escorrentía, tienen una pendiente menor al 8 %, y una buena capa de rodadura (recebo).*
5. *El trabajo de descapote ha sido bien llevado, se evidencio que recuperaban la capa orgánica aun cuando esta es pobre en espesor (0,1 a 0,30 metros), la retiraban y ubicaban en lugares apartados de la explotación, conservándola para después reutilizarla en trabajos de tipo ambiental.*
6. *En la comunidad solicitante, se denota amplio conocimiento de los trabajos de minería realizados, dando una descripción detallada y cronológica de las labores adelantadas, lo cual se evidencia con los trabajos en campo. Las primera explotación la realizaron contigua a la casa donde habitan actualmente y fueron avanzando con el desarrollo de la vía la cual formaba parte de la explotación (material apto), hasta llegar al sector de la loma donde se encuentra el mayor espesor de los bancos de arena (hasta 20 metros), sector en los cuales se realizaban las terrazas de trabajo de 5 a 8 metros de altura.*
   *En un principio las venta de material era una competencia vendían el viaje de 6 m3 a 3000 pesos.*
7. *Existe un compromiso con el medio ambiente, evidenciado en el manejo de estériles, canalización de las aguas, revegetalización de algunas zonas, señalización, manejo de residuos, orden y aseo todas estas registradas mediante fotografías que se muestran a continuación.*
8. *La comunidad del área de influencia de la solicitud, habla con agrado de los solicitantes calificándolos como buenas personas y mineros tradicionales generadores de trabajo y se percibe un buen ambiente social en pro de la minería (expresiones manifestadas en la socialización y en las entrevistas realizadas).*
9. *Se realizó un levantamiento de los sectores explotados desde el año 1993, con el fin de tener un dato aproximado del material extraído y tener una idea de los trabajos realizados durante la ejecución del proyecto; para facilitar el cálculo de este volumen se asemejo una geometría (cubo) y se muestran en la siguiente tabla:*

*Tabla N° 6. Calculo Estimado del Material Explotado en la actividad minera.*

| FRENTE | LARGO M | ANCHO M | ÁREA M² | ESPESOR M | VOLUMEN M³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Justiniano Marcillo Ruano y Francisco Germán Marcillo Casanova | 130 | 40 | 5.200 | 20 | 104.000 |

*Fuente: El Autor en trabajo de campo.*

*(...)* ***Frente N° 2. Francisco Germán Marcillo Casanova:*** *frentes de explotación minera INACTIVO desde hace tres (3) años, por orden de la Alcaldía Municipal de Sapuyes, que ordeno parar todas las actividades de explotación en la zona, muy a pesar de estas se realizaban a pico y pala, amparados como mineros de subsistencia y los solicitantes han buscado el acercamiento con el alcalde actual y el permiso para seguir trabajando, manifestándole que son mineros de subsistencia y que han ejercido esta actividad desde antes de 1995 y amparados en el artículo 2.2.5.1.5.3 del decreto N° 1073 de 2015, los solicitantes manifiestan que la alcaldía, bajo ese mismo decreto sustenta su decisión de no permitirles trabajar, ya que esa norma establece que los materiales son Arenas y Gravas de Rio y no arenas de peña, como es el caso y material que ellos explotan en este sector de Sapuyes.(la comunidad manifiesta que es por caprichos del alcalde por beneficiar a otros, ya que ellos estaban con el otro candidato)*

*Este frente está dentro del área de la solicitud de la comunidad beneficiaria, y ha sido trabajado por el Francisco Germán Marcillo Casanova, de manera asociativa (el señor German Marcillo también ha trabajado en la explotación de Arena desde antes del año 1995, estos terrenos son colindantes pegados con los del señor Justiniano Marcillo y forman parte del área de interés de la comunidad, las actividades mineras de este frente están ubicadas y se han desarrollado en predios de propiedad del Vicente Escobar Yela y familia y están dentro del área solicitada por la comunidad minera, puntos georeferenciados en los frentes de explotación tiene las coordenadas N: 607.103, E: 928.463, altura de 3.170 msnm y N: 607.152, E: 928.536, altura 3.185 msnm*

*Las labores visitadas y levantadas esquemáticamente de este frente, están dentro de la zona de la Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515, ubicada en la vereda El Espino municipio de Sapuyes, se pudo verificar que ha existido un trabajo de explotación minera tradicional, trabajos bien llevados realizados de manera continua desde el año 1998 y hasta el 2016 (parados por alcaldía), a pesar de que las actividades están suspendidas hace tres años, aun se puede verificar de forma clara que:*

1. *La explotación minera se ha realizado sobre arena de peña.*
   *Los trabajos de minería se han desarrollado a cielo abierto y se han venido realizando de manera tradicional a pico y pala, con un avance organizado el cual demuestra un trabajo de más de veinte años de actividad minera, en el año 2013 se acogieron al programa de legalización*
   *La explotación se ha realizado en terrazas descendentes en bancos de 5 a 8 metros de altura.*
2. *Las vías internas de los frentes son amplias más de 8 metros de ancho, cuentan con buen manejo de aguas de escorrentía, tienen una pendiente menor al 6 %, y una buena capa de rodadura (recebo).*

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

3. *El trabajo de descapote ha sido bien llevado, se evidencio que recuperaban la capa orgánica aun cuando esta es pobre en espesor (0,1 a 0,30 metros), la retiraban y ubicaban en lugares apartados de la explotación, conservándola para después reutilizarla en trabajos de tipo ambiental.*
4. *Se denota amplio conocimiento de los trabajos de minería realizados, realizando una descripción detallada y cronológica de las labores adelantadas.*
5. *Existe un compromiso con el medio ambiente, evidenciado en el manejo de estériles, canalización de las aguas, revegetalización de algunas zonas, manejo de residuos, orden y aseo todas estas registradas mediante fotografías que se muestran a continuación.*
6. *La comunidad del área de influencia de la solicitud, habla con agrado de los solicitantes calificándolos como buenas personas y mineros tradicionales generadores de trabajo y se percibe un buen ambiente social en pro de la minería (expresiones manifestadas en la socialización y en las entrevistas realizadas).*
7. *Se realizó un levantamiento de los sectores explotados desde el año 1998, con el fin de tener un dato aproximado del material explotado y tener una idea de los trabajos realizados durante la ejecución de este proyecto, para facilitar el cálculo de este volumen se asemejo una geometría (cubo) y se muestran en la siguiente tabla:*

*Tabla N° 7 Calculo Estimado del Material Explotado en la actividad minera.*

| FRENTE N° 2 | LARGO M | ANCHO M | ÁREA M² | ESPESOR M | VOLUMEN M³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Germán Marcillo Casanova | 110 | 35 | 3.850 | 15 | 57.750 |

*Fuente: El Autor en trabajo de campo*

*(...)* ***Frente N° 3. Luis Francisco Marcillo Quiroz:*** *frente de explotación minera INACTIVO desde hace tres (3) años, por orden de la Alcaldía Municipal de Sapuyes, que ordeno parar todas las actividades de explotación en la zona, muy a pesar de estas se realizaban a pico y pala, amparados como mineros de subsistencia y los solicitantes han buscado el acercamiento con el alcalde actual y el permiso para seguir trabajando, manifestándole que son mineros de subsistencia y que han ejercido esta actividad desde antes de 1985 y amparados en el artículo 2.2.5.1.5.3 del decreto N° 1073 de 2015, los solicitantes manifiestan que la alcaldía, bajo ese mismo decreto sustenta su decisión de no permitirles trabajar, ya que esa norma establece que los materiales son Arenas y Gravas de Rio y no arenas de peña, como es el caso y material que ellos explotan en este sector de Sapuyes.(la comunidad manifiesta que es por caprichos del alcalde por beneficiar a otros, ya que ellos estaban con el otro candidato)*

*Este frente está dentro del área de la solicitud de la comunidad beneficiaria, y el señor Luis Marcillo viene trabajado de manera tradicional en la explotación de Arena desde el año 1992, las actividades mineras de este frente están ubicadas y se han desarrollado en predios de propiedad del Luis Marcillo y familia y están dentro del área solicitada por la comunidad minera, puntos georeferenciados en los frentes de explotación tiene las coordenadas N: 607.690, E: 927.790 y una altura de 3.213 msnm, N: 607.740, E: 927.797 y una altura de 3.202 msnm, N: 607.295, E: 927.773 y una altura de 3.198 msnm*

*Es preciso resaltar que las labores visitadas y levantadas esquemáticamente de este frente, están dentro de la zona de la Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515, ubicada en la vereda El Espino municipio de Sapuyes, se pudo verificar que ha existido un trabajo de explotación minera tradicional, trabajos bien llevados realizados de manera continua desde el año 1998 y hasta el 2016 (parados por alcaldía), a pesar de que las actividades están suspendidas hace tres años, aun se puede verificar de forma clara que:*

1. *La explotación minera se ha realizado sobre arena de peña, por el señor luis marcillo y su familia.*
2. *Los trabajos de minería se han desarrollado a cielo abierto y se han venido realizando de manera tradicional a pico y pala, con un avance organizado el cual demuestra un trabajo de más de veinte años de actividad minera, en el año 2013 se acogieron al programa de legalización*
3. *La explotación se ha realizado en terrazas descendentes en bancos de 5 a 8 metros de altura, en el año 2016 por exigencias de CORPONARIÑO hicieron una campaña de reconformación ambiental y terrazeo utilizando 63 horas de retroexcavadora.*
4. *Las vías internas de los frentes son amplias más de 8 metros de ancho, cuentan con buen manejo de aguas de escorrentía, tienen una pendiente menor al 6 %, y una buena capa de rodadura (recebo).*
5. *El trabajo de descapote ha sido bien llevado, se evidencio que recuperaban la capa orgánica aun cuando esta es pobre en espesor (0,1 a 0,30 metros), la retiraban y ubicaban en lugares apartados de la explotación, conservándola para después reutilizarla en trabajos de tipo ambiental.*
6. *Se denota amplio conocimiento de los trabajos de minería realizados, realizando una descripción detallada y cronológica de las labores adelantadas.*
7. *Existe un compromiso con el medio ambiente, evidenciado en el manejo de estériles, canalización de las aguas, revegetalización de algunas zonas, manejo de residuos, orden y aseo todas estas registradas mediante fotografías que se muestran a continuación.*

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

8. *La comunidad del área de influencia de la solicitud, habla con agrado de los solicitantes calificándolos como buenas personas y mineros tradicionales generadores de trabajo y se percibe un buen ambiente social en pro de la minería (expresiones manifestadas en la socialización y en las entrevistas realizadas).*
9. *Se realizó un levantamiento de los sectores explotados desde el año 1998, con el fin de tener un dato aproximado del material explotado y tener una idea de los trabajos realizados durante la ejecución de este proyecto, para facilitar el cálculo de este volumen se asemejo una geometría (cubo) y se muestran en la siguiente tabla:*

*Tabla N° 8. Calculo Estimado del Material Explotado en la actividad minera.*

| FRENTE N° 2 | LARGO M | ANCHO M | ÁREA M² | ESPESOR M | VOLUMEN M³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Francisco Marcillo Quiroz | 120 | 32 | 3.840 | 16 | 61.440 |

*Fuente: El Autor en trabajo de campo*

*(...)* ***Vías de Acceso:*** *para llegar al área solicitada se realizó desplazamiento por vía terrestre desde el municipio de Pasto por la vía nacional hasta el municipio de Túquerres y luego se toma la vía nacional pavimentada Túquerres - Tumaco, hasta la vereda El Espino, y a la margen derecha en este sentido contigua a la misma está ubicada el área de influencia de la solicitud.*

***Vías internas:*** *las vías internas en el área del ARE y en todos los frentes se encuentra en buenas condiciones, con baja pendiente (- 10%) y ancho de trabajo superior a 12 mts, son vías destapadas y recebadas, se nota la construcción de cunetas algunas ya tapadas por falta de mantenimiento (la mina esta inactiva hace tres años).*

*La producción la sacaban en volquetas sencillas, con capacidad de 6 y 7 metros cúbicos, que llegaban a cargar a la mina*

***Estado Ambiental de la Zona:*** *a pesar de que la capa de suelo orgánica es pobre en el sector del área visitada se observó una vegetación propia de la zona, que cubre las zonas no intervenidas por las labores mineras, la comunidad solicitante ha realizado trabajos de reforestación, empradización en zonas intervenidas y aledañas, trabajo de manejo de aguas y otros trabajados de terrajaos en los frentes de explotación, todos guiados por CORPONARIÑO.*

*NO se evidencio tala de árboles, NO realizan el beneficio de material, por lo que se minimizan los impactos, y se notó un compromiso con el cuidado del medio ambiente, identificado además en el orden y aseo de los sitios visitados.*

*No hay campamentos, la comunidad solicitante del ARE, vive en el área aledaña y cerca a la mina.*

*Sin embargo, se les resaltó que siempre se debe cumplir con la normatividad ambiental y disposiciones de CORPONARIÑO, relativo al uso manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, so pena de las medidas que adopte la autoridad ambiental competente en el marco de sus competencias y mucho más en la eventualidad que fuese declarada el ARE.*

***9. ANÁLISIS DE TRADICIONALIDAD DE LOS TRABAJOS MINEROS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA DE INTERÉS.***

*Teniendo en cuenta el concepto Mediante el informe de evaluación documental ARE No.353 de 13 de agosto de 2019, el cual en sus recomendaciones indica que la solicitud de ARE con radicado No. 2018909080277242 de 05/28/2018, cumple con los requisitos documentales necesarios y recomienda realizar visita de verificación (folios No.17 al 173), aportados al expediente ARE – EL ESPINO - SAPUYES Solicitud N° 515, en el cual se evidencian las certificaciones de las personas que desarrollan operaciones comerciales y actividades en el entorno minero, certificaciones emitidas por el secretario de la tesorería de la alcaldía de Sapuyes donde certifica que según el diagnóstico minero municipal, los señores: Francisco Germán Marcillo Casanova identificado con cedula de ciudadanía No. 13.064.136, Luis Francisco Marcillo Quiroz identificado con cedula de ciudadanía No. 12.755.267, Justiniano Marcillo Ruano identificado con cedula de ciudadanía No. 1.887.440, realizan explotación de arena de cantera en la vereda Pamanal desde la década de 1990.*

*Otros documentos como requerimientos de Minercol a Justiniano Marcillo el 21/11/2002, sobre un concepto técnico de legalización Minera, como minera como minería de hecho N° D15-161.*

*Documentos con los cuales la evaluación documental realizada, recomendó hacer esta visita de verificación y en la misma se ha podido constatar que:*

*- Los trabajos mineros desarrollados y documentados en este informe, demuestran el desarrollo de una actividad minera de más de 25 años, en las labores visitadas se evidencio el desarrollo de una actividad manual*

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

*o artesanal utilizando picos, palas y barras para el arranque del mineral, para el transporte interno en carretillas, siempre en explotación de arenas de peña.*

*- Vestigios de explotaciones antiguas, la huella dejada por la actividad minera producto del impacto del desarrollo de dicha actividad tanto en superficie (botaderos de material ya revegetalizados por acción natural).*

*- El testimonio recogido a integrantes de la comunicad de la zona, las condiciones sociales y económicas de los solicitantes*

*- El conocimiento de la comunidad minera interesada y solicitante del ARE en el desarrollo de los trabajos mineros realizados.*

*- Las declaraciones tomadas a varias personas que habitan en el municipio de Sapuyes y en la vereda el Espino, quienes manifiestan el conocimiento de la actividad minera en el área solicitada, durante más de 25 años e identifican plenamente a la comunidad minera solicitante. Se documentan dos entrevistas realizadas (ANEXOS), en donde manifiestan que los solicitantes descritos desarrollan una actividad minera en el municipio de Sapuyes, departamento de Nariño Vereda El Espino – Panamal.*

*-Todas las anteriores son claras evidencias de la existencia de un trabajo minero realizado de manera tradicional de años de continuidad, y con la antigüedad demostrada en los documentos y entrevistas realizadas, se puede concluir que el desarrollo de estos trabajos son anteriores a la promulgación del código de minas Ley 685 del 2001.*

*Entrevistas Realizadas: en la visita de verificación, se realizaron dos entrevistas a personas de la comunidad del área de influencia las cuales se aportan como evidencia en los anexos de este informe. Los entrevistados manifestaron:*

*El día 9 de marzo de 2019, se entrevistó al señor Efraín Ricardo Reina, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.990.736 de Pasto quien es vecino y residente en la vereda de Pamanal municipio de Sapuyes, manifestó que ha vivido en la vereda hace 52 años, manifiesta que es obrero en actividades agropecuarias y que conoce de la actividad minera desde hace más de veintiocho (25) años o más, y que se ha explotado arena.*
*Indicó que identificaba a las personas que han ejercido la actividad de la explotación minera y además de otros mineros reconoce a la comunidad minera solicitante de quienes dice que:*

*El señor Justiniano Marcillo, empezó a explotar la arena desde la entrada de la panamericana pegado a su casa y siguió hasta que lo paro la alcaldía hace unos 3 años, desde el año 1992 venía trabajando y le ayudaba su hijo Germán Marcillo desde 1996; al lado de ellos y desde explotaba la arena el señor Vicente Escobar más o menos desde el año 1983, habla de la señora Cruz Helena Tovar (interesada en ingresar al proceso) y del señor Francisco Marcillo dice que explota arena hace 25 años.*

*El señor Efraín Ricardo Reina, indica que siempre se ha trabajado a pica y pala y con eso la gente ganaba sustento y el de su familia y en esa época una volquetada valía como 3.000 pesos.*

*El día 9 de marzo de 2019 se entrevistó al señor José Tomas Martínez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.888.755 de Sapuyes, quien es vecino y residente en la vereda de Pamanal municipio de Sapuyes, manifestó que ha vivido en la vereda hace 58 años, manifiesta que es obrero en actividades agropecuarias y que conoce de la actividad minera desde hace más de treinta (30) años y que en la vereda se ha explotado arena, algunos con pico y pala y otras minas que tiene permiso con maquinaria.*
*Indicó que identificaba a las personas que han ejercido la actividad de la explotación minera y además de otros mineros y además reconoce a la comunidad minera solicitante de quienes dice que:*

*El papá de don Vicente Escobar, inicio la minería desde el año 1983 y el señor Vicente en 1990, a El señor Justiniano Marcillo soy conocedor de que trabaja desde 1995 o 1996, y le ayudaba el hijo Germán Marcillo, han trabajado a pico y pala explotando la arena desde la entrada de a su casa hasta bien atrás, también explotaba la arena Francisco Marcillo con su hermano dice que explota arena hace 25 años. Y a todos los paro la alcaldía hace unos 3 años, lo cual ha perjudicado la vereda ya que muchos trabajaban en la mina.*

*El señor Efraín Ricardo Reina, indica que siempre se ha trabajado a pica y pala y con eso la gente ganaba sustento y el de su familia y en esa época una volquetada valía como 3.000 pesos.*

*(...)* ***13. CONCLUSIONES***

- *Con la visita realizada a la Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515 "El Espino- Sapuyes", con radicado N° 2018905309322 del 14 de junio de 2018, se pudo evidenciar trabajos de minería tradicional y se levantó la información existente de los frentes de explotación, vías, forma de trabajo, ubicación e inventario de los trabajos mineros que ejercen la actividad, esta información se presenta en la siguiente tabla:*

  *Tabla N° 9. Puntos georreferenciados en frentes de explotación e inventario de mineros y tradicionalidad.*

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

| PUNTOS | NORTE | ESTE | FRENTE | CEDULA | DEMUESTRAN TRADICIONALIDAD SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606.811 | 928.745 | Justiniano Marcillo Ruano. | 1.887.440 | SÍ |
| 2 | 607.716 | 928.740 | Francisco Germán Marcillo Casanova | | |
| 3 | 607.098 | 928.762 | | 13.064.136 | SÍ |
| 4 | 607.103 | 928.463 | Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 | SÍ |
| 5 | 607.152 | 928.536 | | | |
| 6 | 607.690 | 927.790 | Luis Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 | SÍ |
| 7 | 607.740 | 927.797 | | | |
| 8 | 607.295 | 927.773 | | | |

*Fuente: El Autor en trabajo de campo.*

- *En la visita también se realizó levantamiento de las actividades mineras levantando actas de la misma anexas a este informe, y se realizó un recorrido por el área solicitada, con el fin de observar la viabilidad de la solicitud con proyecciones a mediano plazo, el recorrido fue acompañado por la comunidad solicitante de ARE, profesional de CORPONARIÑO, funcionarios de la Alcaldía de Sapuyes, miembros de la comunidad, y antiguos trabajadores.*

- *En la visita de verificación, se realizaron dos entrevistas a personas de la comunidad del área de influencia del ARE solicitada, las cuales y por separado manifestaron conocer a los solicitantes del ARE como miembros de la comunidad y como mineros tradicionales, manifestando además que realizan trabajos desde el año 1993. Estas entrevistas se aportan como evidencia de la tradicionalidad en los anexos de este informe.*

- *Por medio de la visita de verificación realizada en campo, por las entrevistas realizadas, y se puedo concluir que los señores relacionados en la siguiente tabla, demostraron trabajos de tradicionalidad en el área solicitada para declarar y delimitar como área de reserva especial:*

*Tabla No.10. Comunidad de mineros solicitantes que demostraron trabajos de Tradicionalidad*

| PUNTOS | NORTE | ESTE | FRENTE | CEDULA | DEMUESTRAN TRADICIONALIDAD SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606.811 | 928.745 | Justiniano Marcillo Ruano. | 1.887.440 | SÍ |
| 2 | 607.716 | 928.740 | Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 | SÍ |
| 3 | 607.098 | 928.762 | | | |
| 4 | 607.103 | 928.463 | Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 | SÍ |
| 5 | 607.152 | 928.536 | | | |
| 6 | 607.690 | 927.790 | Luis Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 | SÍ |
| 7 | 607.740 | 927.797 | | | |
| 8 | 607.295 | 927.773 | | | |

- *Se concluye que la Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515 "El Espino- Sapuyes", con radicado N° 2018905309322 del 14 de junio de 2018 en el departamento de Nariño, cumple con los requisitos y se recomienda delimitar como área de reserva especial, el área libre identificada en el polígono comprendido en el certificado de área libre,* ***ANM- CAL-0065-19*** *y reporte gráfico,* ***ANM-RG-0967-19*** *según Catastro Minero Colombiano, correspondiente a un polígono (1) con un área total de 72,4374 hectáreas, localizada en jurisdicción del municipio de Sapuyes departamento de Nariño, con la visita realizada se recomienda el ajusta el polígono solicitado debido a que las mineralizaciones y trabajos realizados se encuentran en esta nueva área al igual que las proyecciones de desarrollo, (...)*

- *El área de Solicitud de Área de Reserva Especial N° 515 "El Espino- Sapuyes", con radicado N° 2018905309322 del 14 de junio de 2018 en el departamento de Nariño, cumple las condiciones técnicas, para la delimitación un área de reserva especial en esta zona.*

- *Geológicamente se puede inferir, que el área cuenta con un buen potencial de Arenas las cuales son técnica y económicamente explotables, se identificó en el recorrido realizado en el área solicitada la continuidad y espesor del material.*

- *Según el análisis de superposiciones realizado utilizando como base el Catastro Minero Colombiano, se evidencio que el área susceptible de declarar y delimitar se encuentra superpuesta con INFORMATIVO - ZONAS MICRO FOCALIZADAS RESTITUCIÓN DE TIERRAS - UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS -*

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

*ACTUALIZACIÓN 09/04/2018 - INCORPORADO AL CMC 12/07/2018 en un 100%, SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN MINERA TRADICIONAL DEC. 933 con placa NGG-10181 en un 44,19%, PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA (LGR-08083X en un 74,69%, SB6-08291 en un 18,85% y THD-08211 en un 78,65%), sobre esta no existen títulos ni áreas excluibles de la minería, lo cual no representa restricciones al momento de una eventual declaración y delimitación de un área de reserva especial.*

- *El señor Vicente Arnulfo Escobar Yela, tiene título minero vigente con placa IFF-10141, para materiales de construcción en el municipio de Sapuyes – por lo que no cumple con el parágrafo 2° de la resolución 546 del 20 de septiembre de 2017*

14. ***RECOMENDACIONES.***

- *Se recomienda delimitar como área de reserva especial, el área libre identificada en el polígono comprendido en el certificado de área libre,* ***ANM- CAL-0065-19*** *y reporte gráfico,* ***ANM-RG-0967-19*** *según Catastro Minero Colombiano, correspondiente a un polígono (1), con un área total de 72,4374 Hectáreas, localizado en jurisdicción del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño, (...)*

- *Se recomienda identificar como mineros tradicionales a las siguientes personas:*

*Tabla N° 13 Comunidad de Mineros Tradicionales ARE.*

| NOMBRE | CEDULA | DEMUESTRAN TRADICIONALIDAD SI / NO |
|---|---|---|
| Justiniano Marcillo Ruano. | 1.887.440 | SÍ |
| Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 | SÍ |
| Luis Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 | SÍ |

- *En cuanto a seguridad con la eventual declaratoria del ARE, se recomienda que la comunidad minera beneficiaria de aplicación total en todo lo que concierna a este tipo de explotación tal como está descrito en la normatividad de seguridad vigente y a todo lo determinado en el decreto N° 2222 de 1993 por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto.*

- *Además en una eventual declaración y delimitación tener en cuenta las siguientes recomendaciones:*

- *Socializar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.*
- *Realizar y mantener actualizados los planos de la mina (...).*

Que mediante **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0065-19** y **Reporte Gráfico ANM-RG-0967-19 del 15 de mayo de 2019** (Folios 200-202, 203), los cuales fueron relacionados dentro del informe previamente citado, se dispuso lo siguiente:

1. ***ÁREA INICIAL*** *(...)*

***ESTUDIO DE ÁREA***

| | |
|---|---|
| ***DESCRIPCIÓN DEL P.A.*** | *PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL* |
| ***PLANCHA IGAC DEL P.A.*** | *428* |
| ***DATUM*** | *BOGOTÁ* |
| ***ORIGEN*** | *OESTE* |
| ***MUNICIPIOS*** | *SAPUYES - NARIÑO* |
| ***AREA TOTAL INICIAL*** | *72,4374 Hectáreas* |

1. ***COORDENADAS DEL ÁREA***

| VÉRTICE | ESTE | NORTE |
|---|---|---|
| 1 | 928643,2415 | 607315,0187 |
| 2 | 928643,2238 | 607304,0492 |
| 3 | 928644,7577 | 607289,3708 |

| VÉRTICE | ESTE | NORTE |
|---|---|---|
| 32 | 929177,6561 | 607169,9806 |
| 33 | 929192,0012 | 607162,3227 |
| 34 | 929207,7023 | 607121,5138 |

| VÉRTICE | ESTE | NORTE |
|---|---|---|
| 63 | 927818,0000 | 607425,0000 |
| 64 | 927827,7845 | 607378,1931 |
| 65 | 927827,7841 | 607378,1875 |

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 928645,1043 | 607287,6079 | 35 | 929216,4977 | 607104,0349 | 66 | 927828,2124 | 607368,7230 |
| 5 | 928648,0000 | 607245,0000 | 36 | 929220,7834 | 607098,1772 | 67 | 927829,8071 | 607358,1496 |
| 6 | 928688,0000 | 607215,0000 | 37 | 929230,1537 | 607088,0724 | 68 | 927832,7657 | 607345,1926 |
| 7 | 928754,2699 | 607215,0000 | 38 | 929243,2930 | 607076,4642 | 69 | 927835,6594 | 607337,7506 |
| 8 | 928795,2824 | 607202,9966 | 39 | 929251,5321 | 607071,6752 | 70 | 927836,5210 | 607336,3997 |
| 9 | 928823,6144 | 607207,3555 | 40 | 929261,5941 | 607068,1764 | 71 | 927855,0000 | 607248,0000 |
| 10 | 928825,0000 | 607205,0000 | 41 | 929274,1545 | 607065,7549 | 72 | 927888,0000 | 607248,0000 |
| 11 | 928845,0000 | 607071,0000 | 42 | 929288,9803 | 607064,4543 | 73 | 927922,0000 | 607281,0000 |
| 12 | 928880,0000 | 607000,0000 | 43 | 929298,4426 | 607064,9704 | 74 | 927928,5836 | 607342,4464 |
| 13 | 928941,0000 | 606933,0000 | 44 | 929305,0001 | 607066,5386 | 75 | 927935,9712 | 607347,9585 |
| 14 | 928993,5074 | 606982,1198 | 45 | 929305,0000 | 606601,0000 | 76 | 927944,9074 | 607356,0620 |
| 15 | 928999,3835 | 606974,9188 | 46 | 928518,0000 | 606885,0000 | 77 | 927954,7690 | 607368,0005 |
| 16 | 929011,3963 | 606964,2296 | 47 | 928329,0000 | 606811,0000 | 78 | 927994,2898 | 607424,8841 |
| 17 | 929023,4743 | 606956,9028 | 48 | 927991,0000 | 607105,0000 | 79 | 928004,1197 | 607442,5484 |
| 18 | 929036,7907 | 606952,1040 | 49 | 927991,0000 | 606848,0000 | 80 | 928008,7357 | 607455,6024 |
| 19 | 929050,6753 | 606950,1912 | 50 | 927363,0000 | 606848,0000 | 81 | 928025,0000 | 607455,0000 |
| 20 | 929057,6723 | 606950,6604 | 51 | 927363,0000 | 607295,0000 | 82 | 928085,0000 | 607333,0000 |
| 21 | 929063,0099 | 606951,9636 | 52 | 927413,0000 | 607328,0000 | 83 | 928225,0000 | 607281,0000 |
| 22 | 929075,9649 | 606959,7736 | 53 | 927485,0000 | 607285,0000 | 84 | 928245,0000 | 607028,0000 |
| 23 | 929086,9302 | 606969,9833 | 54 | 927541,0000 | 607155,0000 | 85 | 928275,0000 | 606942,0000 |
| 24 | 929096,6052 | 606983,7423 | 55 | 927618,0000 | 607148,0000 | 86 | 928410,0000 | 606942,0000 |
| 25 | 929105,1479 | 607000,7876 | 56 | 927693,0000 | 607223,0000 | 87 | 928410,0000 | 607198,0000 |
| 26 | 929123,9484 | 607045,8559 | 57 | 927690,4317 | 607295,9418 | 88 | 928508,0000 | 607282,0000 |
| 27 | 929145,9038 | 607086,4099 | 58 | 927699,3717 | 607299,8288 | 89 | 928545,0000 | 607365,0000 |
| 28 | 929155,5504 | 607105,8187 | 59 | 927715,2467 | 607320,9957 | 90 | 928575,0000 | 607385,0000 |
| 29 | 929160,7545 | 607119,8482 | 60 | 927736,4132 | 607363,3293 | 91 | 928615,0000 | 607388,0000 |
| 30 | 929173,3418 | 607161,0871 | 61 | 927776,1005 | 607424,1841 | 92 | 928641,0000 | 607348,0000 |
| 31 | 929177,3811 | 607169,6988 | 62 | 927786,8596 | 607444,3576 | 93 | 928643,2415 | 607315,0187 |

**2. *ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES***

*A continuación el Reporte de Superposiciones con Titulos, Solicitudes Mineras vigentes y demás áreas.*

| CAPA | EXPEDIENTE | MINERALES/DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | RCA-09501 | MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 4,7759 |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | RDP-09221 | MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 2,8913 |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | SGA-08141 | MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 50,4084 |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | SIE-15181 | MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 33,9861 |
| PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA | TKM-10351 | MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 5,2903 |

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA* | *UBQ-10141* | *MATERIALES DE CONSTRUCCIóN* | *0,6788* |
| *RESTRICCIÓN* | *ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE ACTIVIDAD MINERA - CONCERTACIÓN MUNICIPIO SAPUYES* | *ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE ACTIVIDAD MINERA. MUNICIPIO SAPUYES - NARIÑO - MEMORANDO ANM 20172100268353. REMISIÓN ACTAS DE CONCERTACIÓN- https://www.anm.gov.co/sites/default/files/actas-de-concertaciones/120.%20ACTA%20MUNICIPIO%20SAPUYES.pdf - FE* | *99,4867* |
| *RESTRICCIÓN* | *INFORMATIVO - ZONAS MICROFOCALIZADAS RESTITUCIÓN DE TIERRAS* | *INFORMATIVO - ZONAS MICROFOCALIZADAS RESTITUCIÓN DE TIERRAS - UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - ACTUALIZACION 09/04/2018 - INCORPORADO AL CMC 12/07/2018* | *99,6061* |


***3. ÁREA LIBRE***

*Sobre el área de interés, no existen títulos mineros vigentes ni áreas de exclusión minera por lo cual no se hacen recortes al polígono.*

***4. REPRESENTACION GRÁFICA***

*La representación gráfica del área anteriormente descrita se presenta en el reporte gráfico ANM RG-0967-19 adjunto a la presente certificación.*

***REPORTE GRÁFICO ANM-RG-0967-19 DEL 15 DE MAYO DE 2019***

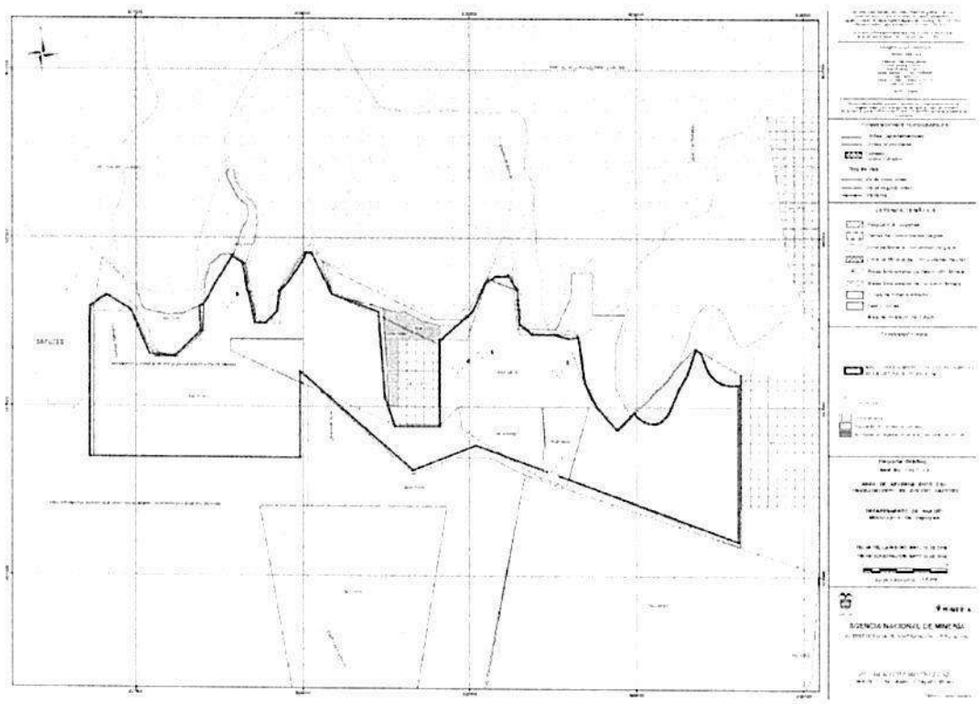

## FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS PARA PROCEDER A DECLARAR Y DELIMITAR EL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL SOLICITADA ANTE ESTA ENTIDAD

El procedimiento administrativo dispuesto por la Agencia Nacional de Minería mediante Resolución No. 546 de 2017, se divide en varias etapas compuestas por actuaciones administrativas regladas en el mismo procedimiento, siendo estas acorde a las disposiciones del Código de minas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

*"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"*

y demás normatividad minera aplicable a las Áreas de Reserva Especial, en su condición de figura excepcional para el reconocimiento de zonas en las cuales existan explotaciones tradicionales adelantadas por un grupo de personas:

La primera, de evaluación documental, se surte conforme bajo las normas del procedimiento administrativo, e inicia desde el momento en que se formula la petición ante la autoridad minera hasta que se determine mediante evaluación de la documentación, que esta reúne los requisitos formales señalados en el artículo 3 de la resolución 546 de 2017. Entre los cuales, el numeral 9 dispone la presentación de medios de prueba que demuestren el ejercicio tradicional de las actividades.

Habiéndose surtido la etapa documental, inicia la etapa de verificación en campo, en la cual, la autoridad minera visita la zona en la cual se ubican las pretendidas explotaciones, para determinar la antigüedad de las mismas y la existencia de una comunidad que haya adelantado tales explotaciones, y si es necesario recolectar nueva documentación. Es decir, verificar o corroborar con evidencias técnicas lo plasmado en los documentos aportados al expediente.

Paso seguido, en la etapa de determinación de tradicionalidad, conforme el análisis de la información obrante en el expediente, tanto la inicial como la allegada en el curso del trámite, y las evidencias técnicas recolectadas en campo, se procede a determinar mediante informe de visita las conclusiones respecto de la existencia de las explotaciones, su antigüedad y que estas han sido desarrolladas por la comunidad minera verificada en campo, en aplicación al concepto de explotaciones tradicionales dispuesto a través de la Resolución No. 4 1107 de 18 de noviembre de 2016 y el artículo 2 de la Resolución No. 546 de 2017.

Bajo tales presupuestos, y de acuerdo con las funciones otorgadas a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, el Grupo de Fomento de la Agencia Nacional de Minería, conforme las disposiciones de la Resolución No. 546 de 20 de septiembre de 2017, adelantó el procedimiento administrativo aplicable en el trámite de la solicitud de declaración y delimitación de un Área de Reserva Especial para la explotación de arena de cantera, ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018**.

En ese sentido y con sustento en los estudios adelantados por el Grupo de Fomento, en la presente providencia se procede a resolver respecto de los siguientes aspectos:

I. Cumplimiento de los requisitos del Artículo 3 de la Resolución No. 546 de 2017.

II. Existencia de comunidad minera y de explotaciones tradicionales.

III. Titularidad Minera por parte de uno de los solicitantes.

IV. Condiciones sociales y económicas de la comunidad minera tradicional.

V. Consideraciones frente al Área de Reserva Especial a declarar.

VI. Obligaciones de la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial.

## I. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN No. 546 DE 2017.

En primera instancia se realizó el análisis de la documentación aportada en la solicitud de declaración y delimitación de Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018**, y a través de **Informe de Evaluación Documental ARE No. 353 del 13 de agosto de 2018** (Folios 150-154), el Grupo de Fomento determinó que la documentación **CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS** establecidos en el artículo 3 de la Resolución No. 546 de 2017, entre los que se resalta:

- Solicitud suscrita por los integrantes de la comunidad minera.
- Fotocopia legible de los documentos de identidad de los solicitantes.
- Coordenadas en "Datum Bogotá" de los frentes de explotación.
- Nombre de los minerales explotados.
- Descripción de la infraestructura, métodos de explotación, herramientas, equipos utilizados y tiempo aproximado del desarrollo de las actividades que se relacionen con el desarrollo tradicional de la actividad minera.
- Descripción y cuantificación de los avances en cada uno de los frentes de explotación que sustenten el tiempo de antigüedad de la actividad minera desarrollada.
- Manifestación escrita de la comunidad minera tradicional en la cual se indicó la presencia de comunidades indígenas en el área de interés, así como la respectiva autorización (aval) en donde sus dirigentes manifiestan estar de acuerdo con la actividad minera adelantada por los peticionarios.
- Medios de prueba que demostraron la antigüedad de la actividad de la explotación minera tradicional dentro del área solicitada.

En atención a los ***medios de prueba*** contemplados en el Numeral 9 del Artículo 3° de la Resolución previamente citada, una vez evaluada la documentación aportada se tiene que aquellos que permitieron determinar la existencia de indicios de tradicionalidad en las explotaciones de carbón mineral triturado o molido por parte de los solicitantes, fueron los siguientes:

- Certificación del 16 de junio de 1998 (Folio 30) suscrita por el Secretario de la Tesorería Municipal de Sapuyes en la cual se indicó: *"(...) el municipio de Sapuyes realizó el Diagnóstico Minero Municipal mediante el cual se pudo constar que el señor **FRANCISCO GERMÁN MACILLO CASANOVA**, identificado con C.C. No. 13.064.136 expedida en la ciudad de Túquerres, se encuentra realizando explotación de arena de cantera localizada en la vereda Panamal, jurisdicción de este municipio, según registros desde hace unos tres años aproximadamente (...)".* (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

- Certificación del 05 de abril de 1994 (Folio 32) suscrita por el Secretario de la Tesorería Municipal de Sapuyes en la cual se indicó: *"(...) el municipio de Sapuyes realizó el diagnóstico minero municipal mediante el cual se pudo constar que el señor **LUIS FRANCISCO MARCILLO QUIROZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.755.267 expedida en Cumbal (Nar.), se encuentra realizando labores de explotación de arena de cantera, localizada en la vereda Panamal, jurisdicción de este municipio, según registros desde hace unos 6 años aproximadamente (...)".* (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

- Certificación del 16 de junio de 1998 (Folio 34) suscrita por el Secretario de la Tesorería Municipal de Sapuyes en la cual se indicó: *"(...) el municipio de Sapuyes realizó el Diagnóstico Minero Municipal mediante el cual se pudo constar que el señor **JUSTINIANO MARCILLO RUANO**, identificado con C.C. No. 1.887.440 expedida en Sapuyes se encuentra realizando explotación de arena de cantera localizada en la vereda Panamal, jurisdicción de este municipio, según los registros desde hace unos cinco años aproximadamente (...)".* (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

- Manifestación emitida por la Alcaldía de Sapuyes en el que indica que revisados los archivos del antiguo Centro Administrativo Municipal se encontró que los señores FRANCISCO GERMÁN MACILLO CASANOVA, LUIS FRANCISCO MARCILLO QUIROZ y JUSTINIANO

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

MARCILLO RUANO, han realizado actividades de minería. Validando además la calidad de funcionario de carrera administrativa del señor Jaime Armando Guanaran (folios 47-49).

Ahora bien, una vez determinada la existencia de indicios de tradicionalidad y el cumplimiento de la totalidad de requisitos documentales por parte de los solicitantes, el Grupo de Fomento en el **Informe de Evaluación Documental ARE No. 353 del 13 de agosto de 2018** (Folios 150-154), recomendó realizar ***visita de verificación*** al área de interés, a fin de establecer y/o identificar tanto las coordenadas correspondientes a cada uno de los respectivos frentes de explotación, la tradicionalidad en el ejercicio de las labores (es decir, que hayan venido siendo efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas), así como a las personas que las hayan venido ejecutando bajo ese contexto y en el marco de la normatividad minera aplicable.

## II. EXISTENCIA DE COMUNIDAD MINERA Y EXPLOTACIONES TRADICIONALES.

La visita de verificación se realizó los días 8 y 9 de marzo de 2019 con el acompañamiento de la tanto de los miembros de la comunidad minera interesada, así como de la alcaldía municipal de Sapuyes y de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, con el objetivo de establecer la existencia o no de explotaciones tradicionales, los responsables de ellas, los integrantes de la comunidad minera tradicional, la localización de los frentes de trabajo minero y definir técnicamente el área viable para la delimitación del Área de Reserva Especial y demás aspectos que permitieran determinar la viabilidad de declarar y delimitar el área solicitada.

Durante la visita se elaboró acta de visita y posteriormente se documentaron sus resultados mediante **Informe de Visita de Áreas de Reserva Especial No. 258 del 16 de mayo de 2019** (Folios 159-178), del que se extraen los siguientes aspectos:

- Se identificaron tres (3) frentes de explotación dentro del área indicada por la comunidad minera, cuyas coordenadas y responsables se relacionan a continuación:

| *FRENTES* | *COORDENADAS* | | *RESPONSABLE(S)* | *No. DE CÉDULA* |
|---|---|---|---|---|
| | *NORTE* | *ESTE* | | |
| *1* | *606.811* | *928.745* | *Justiniano Marcillo Ruano. Francisco Germán Marcillo Casanova* | *1.887.440 13.064.136* |
| *2* | *607.716* | *928.740* | | |
| *3* | *607.098* | *928.762* | | |
| *4* | *607.103* | *928.463* | *Francisco Germán Marcillo Casanova* | *13.064.136* |
| *5* | *607.152* | *928.536* | | |
| *6* | *607.690* | *927.790* | *Luis Francisco Marcillo Quiroz* | *12.755.267* |
| *7* | *607.740* | *927.797* | | |
| *8* | *607.295* | *927.773* | | |

- Se extrae del informe de visita que el sistema de explotación es a cielo abierto utilizando métodos de terrazas descendientes de aproximadamente 5 a 8 metros de altura y bermas de 3 y 4 metros en algunos frentes y en otro ha desarrollado un frente único (folios 165-166); en cuanto a las dimensiones de los frentes evidenciadas en campo, estos oscilan entre 130x40; 110x35; 120x32.

- Se identificó como tradicional a la comunidad minera conformada por los señores Francisco Germán Marcillo Casanova, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.064.136, Luis Francisco Marcillo Quiroz, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.755.267 y Justiniano Marcillo Ruano, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.887.440.

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

No se predica lo mismo para el caso del señor Vicente Arnulfo Escobar Yela, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.344.313, por las razones que se expondrán en el siguiente numeral tal como se anticipó desde la elaboración del **Informe de Evaluación Documental ARE No. 353 del 13 de agosto de 2018**.

- Se determinó que en el área de influencia de las labores de explotación desarrollada por los la comunidad minera antes identificada, con base en la ubicación de las bocaminas, la huella que ha dejado la actividad desarrollada en la zona, las longitudes de los frentes (avances), avances diarios, volúmenes explotados (área explotada), forma de trabajo, así como los medios y herramientas empleadas para efectuar la explotación del mineral de interés; es viable continuar el proceso de declaratoria de un Área de Reserva Especial.

- De otra parte, en visita se pudo identificar la antigüedad de los avances mineros desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001, así como que los solicitantes son conocidos como mineros tradicionales en la región.

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta lo observado en campo, para la verificación de tradicionalidad se determinó la existencia de trabajos antiguos desde antes de la promulgación de la Ley 685 del 2001, tradicionalidad identificada en las diferentes labores, las longitudes de las misma (avances), volúmenes explotados (área explotada), forma de trabajo, herramientas utilizadas en el arranque del mineral, guías, huella dejada por la actividad en los diferentes caminos; así como las condiciones sociales y económicas de los miembros de la comunidad.

Así las cosas, conforme al **material probatorio aportado al expediente** y las **evidencias recaudadas en campo** por el Grupo de Fomento de esta Agencia en la visita realizada a la bocaminas antes mencionadas ubicadas en área rural del municipio de Sapuyes, departamento de Nariño, las personas abajo relacionadas, reúnen los requisitos exigidos en la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, para tener la calidad de beneficiarios del Área de Reserva Especial a declararse y delimitarse a través del presente acto administrativo:

| Nombres y Apellidos | Cédula de Ciudadanía No. |
|---|---|
| Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 |
| Luís Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 |
| Justiniano Marcillo Ruano | 1.887.440 |

Evaluados los documentos de identificación de las personas antes citadas, se determinó que estas contaban con la mayoría de edad para ejercer las labores mineras a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001.

De igual forma, consultados los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y contractuales de los miembros de la comunidad minera tradicional, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación y en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, se corroboró que las personas en mención no presentan sanciones, inhabilidades y/o incompatibilidades para contratar con el Estado, ni reportes como responsables fiscales. También fueron consultados en la plataforma de consulta de Policía Nacional los antecedentes judiciales y reporte de medidas correctivas respecto de la comunidad a declarar, encontrándose que estas no cuentas con antecedentes. Se adjuntan certificados al expediente de la información antes mencionada (Folios 206-208).

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

## III. TITULARIDAD MINERA POR PARTE DE UNO DE LOS SOLICITANTES.

Ahora bien, teniendo en cuenta la documentación presentada y la normativa que reglamenta la materia, el Grupo de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento realizó valoración documental a través del informe de **Informe de Evaluación Documental ARE No. 353 del 13 de agosto de 2018** (Folios 150-154), en el cual se pudo determinar y se estableció que el señor **VICENTE ARNULFO ESCOBAR YELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.344.313, cuenta con el Título Minero **IFF-10141** (Folio 205), el cual una vez verificada la plataforma de consulta del Catastro Minero Colombiano – CMC, se observó que a la fecha se encuentra en estado **VIGENTE** y **EN CURSO**.

Frente a la situación antes descrita, la Resolución No. 546 del 20 de septiembre de 2017 establece dentro de su Artículo 10 que su configuración dentro de las solicitudes de Áreas de Reserva Especial se constituye en causal de rechazo, en los siguientes términos:

> *Artículo 10°. **Causales de rechazo de las solicitudes de áreas de reserva especial.** Las solicitudes de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial serán rechazadas mediante acto administrativo motivado cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:*
>
> *(...) 11. Cuando los integrantes de la comunidad minera o, **uno de ellos, cuente con título minero vigente inscrito en el Registro Minero Colombiano**, se procederá a **rechazar la petición de quien se encuentre en dicha situación y se continuará frente a los demás peticionarios**. (Subrayado fuera de texto)*
>
> ***Parágrafo.** En firme la decisión de rechazo de la solicitud de delimitación del Área de Reserva Especial -ARE, ésta será comunicada a los alcaldes municipales o distritales y a la autoridad ambiental de la jurisdicción en la que se ubique la explotación minera para lo de su competencia.* (Subrayado fuera de texto)

Conforme a la normatividad que antecede, es procedente ordenar el **RECHAZO** de la Solicitud de Área de Reserva Especial de **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018**, respecto del señor **VICENTE ARNULFO ESCOBAR YELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.344.313. Dicho esto, se indica que en atención a tal circunstancia no se hizo mención dentro del presente acto administrativo a los medios de prueba presentados por este último.

Se precisa, que es el legislador quien ha fijado las condiciones bajo las cuales es plausible la formalización de explotaciones tradicionales, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos sustanciales que acrediten la calidad para acceder a la declaración y delimitación de un área de reserva especial, y el posterior beneficio de la prerrogativa de explotación acorde con el ordenamiento jurídico y sostenible con el medio ambiente. Dicho lo anterior, el Estado no puede garantizar la declaración y delimitación de un área de reserva especial, sin corroborar dentro del marco del debido proceso, el cumplimiento de los requisitos legales que acrediten a los beneficiarios como aptos para continuar con el trámite hasta el otorgamiento del Contrato Especial de Concesión Minera.

## IV. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD MINERA TRADICIONAL.

Con la visita de verificación a la comunidad minera se identificaron algunas **características sociales y económicas** referentes a las condiciones de vida de sus miembros, estableciéndose lo siguiente (Folio 174, al respaldo):

a. El 100% de los mineros visitado cuenta con casa propia producto de trabajo realizado en la minería.
b. El 100% de los solicitantes pertenecen al Estrato 2.
c. El 100% cuentan con servicios públicos básicos agua, energía.
d. El 100% de los solicitantes cuenta con un nivel de primaria.

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

e. Para el 100% de la comunidad minera esta actividad es su principal fuente de ingreso.
f. La comunidad manifiesta que para el desarrollo de la actividad minera no han perjudicado a nadie ya que trabajan en predios propios.

La delimitación del área de reserva especial Solicitud Área de Reserva Especial N° 515 "El Espino-Sapuyes", beneficiaría directa e indirectamente a un grupo mayor a veinticinco (25) familias, que corresponde a la comunidad solicitante del ARE y antiguos empleados, algunos acompañaron la visita y ven positivamente los beneficios de la legalización, ya que impacta de forma positiva a la comunidad debido a: oportunidades de empleos y mayor número de personas vinculadas en la explotación, crecimiento de los distintos procesos, además de las siguientes mejoras y beneficios:

1. Generación de empleo formal, con la legalización.
2. Optimización de la explotación de los recursos minerales más aprovechamiento.
3. Mejora en la comercialización del mineral en precios y legalización.
4. Cumplimiento con el estipulado en la legislación minera y ambiental vigente.
5. Mejora en afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de EPS y ARL.
6. Optimización en los procesos, de explotación y beneficios de los minerales.
7. Mejoramiento de los ingresos económicos.
8. Traslado de comercio y otras actividades económicas (alimentación, etc.).

Crecimiento de la infraestructura municipal y vial. En este sentido, queda demostrado que se encontraron motivos de orden social y económico que fundamentan la declaración del área de reserva especial solicitada, máxime cuando se lograría generar empleo y beneficio económico para las personas que puedan emplear, y beneficio social que impactará positivamente a la comunidad del municipio de Sapuyes, en los términos del referido Informe de Visita.

## V. CONSIDERACIONES FRENTE AL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL A DECLARAR.

Definida la comunidad minera y las explotaciones tradicionales dentro del área de reserva especial ubicada en el municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018**, para la explotación de arena de cantera se procedió a determinar el polígono final de la misma atendiendo al área libre existente y a las condiciones de explotación de los frentes visitados.

El área se identificó atendiendo la influencia de las labores mineras de explotación desarrollada por los solicitantes y la proyección de la futura explotación y proyecto a desarrollar dentro de la misma y la cual corresponde a la identificada en el con una extensión total de **72,4374 Hectáreas**, en un (01) solo polígono, según el **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0065-19** y el **Reporte Gráfico ANM-RG-0967-19 del 15 de mayo de 2019** (Folios 200-202, 203), relacionados en el **Informe de Visita de Áreas de Reserva Especial No. 258 del 16 de mayo de 2019** (Folios 159-178), cuyas coordenadas se plasmarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Es del caso mencionar que una vez verificados los frentes de explotación, en el **Reporte Gráfico ANM-RG-0967-19 del 15 de mayo de 2019** (Folio 203), se determinó que estos se ubican dentro del área susceptible de ser declarada como Área de Reserva Especial, por lo cual la declaración del área de reserva se circunscribe al polígono de **72,4374**, como se indica en **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0065-19 de esa misma fecha** (Folios 200-202), el cual encierra los frentes de explotación.

En el estudio de superposiciones contenido en el **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0065-19** y el **Reporte Gráfico ANM-RG-0967-19 del 15 de mayo de 2019** (Folios 200-202, 203), se determinó que

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

una vez graficadas las coordenadas que delimitan el polígono, en el área de interés no se observan superposiciones con títulos mineros ni áreas excluibles a la minería.

De conformidad al certificado de área libre, se evidencia superposición con Zonas Microfocalizadas de restitución de tierras, frente a lo cual la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, mediante **Concepto de radicado con No. 20161200364821 del 28 de octubre de 2016**, manifestó lo siguiente:

> *"Así pues, la Ley 1448 de 2011 no hizo alusión alguna a las zonas macro y Microfocalizadas como zonas restringidas para la minería, por lo que estas no son consideradas en el estudio de la solicitud minera como áreas restringidas de la actividad minera, no obstantes constituyen un referente de información para los solicitantes de las posibles controversias que se puedan suscitar en el área.*
>
> *(...) En principio no se tiene carga jurídica adicional, de conformidad con lo manifestado en la respuesta, pero teniendo en cuenta que, "(...) la capa correspondiente a las Zonas Macro y Microfocalizadas de restitución de tierras que están incorporadas en el Catastro Minero Colombiano no genera efectos como capa excluida o restringida de la minería, sino como una capa a nivel informativo; es decir, no genera restricción alguna (...) para la minería y su fin último es informar a los interesados en la actividad minera (solicitante, titulares mineros, terceros, etc.) que existen unas situaciones particulares enmarcadas en la Ley de víctimas que se encuentran ubicadas en áreas específicas derivadas de los desplazamientos y despojos por actos violentos".*

En ese orden, la superposición de áreas Microfocalizadas que se informa en el área objeto de la solicitud, no impide la declaración y delimitación del área de reserva especial, por lo conceptuado.

Así las cosas, revisado el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto por el Artículo 31 de la Ley 685 de 2001 de aquellos establecidos en la Resolución No. 546 de 20 de septiembre de 2017 expedida por la Agencia Nacional de Minería, se procederá a declarar y delimitar el área de reserva especial ubicada en el municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018** para la extracción de arena de cantera, con el fin de adelantar proyectos que propendan por el desarrollo de la actividad minera, el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables y el bienestar socioeconómico de la población vinculada tradicionalmente a dicha actividad. Estos proyectos se diseñarán bajo condiciones técnicas de planeamiento minero y de seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y seguridad social, de acuerdo con los planes de manejo ambiental, constituyéndose como una actividad ambientalmente sostenible, con una extensión total de **72,4374 Hectáreas** de conformidad con lo establecido en el **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0065-19** y el **Reporte Gráfico ANM-RG-0967-19 del 15 de mayo de 2019** (Folios 200-202, 203), delimitadas en un (1) polígono que se indicará como ya se mencionó, en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

## VI. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD MINERA BENEFICIARIA DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL.

Finalmente, se debe advertir a la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial que se declarará y delimitará a través del presente acto administrativo, que el Artículo 14 de la Resolución No. 546 de 20 de septiembre de 2017, dispone las obligaciones que se deben cumplir por parte de los beneficiarios en los siguientes términos:

> ***Artículo 14° Obligaciones de la Comunidad Minera Tradicional del Área de Reserva Especial Declarada.*** *En atención, a que la condición de explotador minero autorizado se obtiene una vez se encuentre en firme el acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y mientras se otorgue el correspondiente contrato especial de concesión o, se termine el Área de Reserva Especial declarada y delimitada por las causales establecidas en el artículo 23 del presente acto administrativo, la comunidad beneficiaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:*
>
> 1. *Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de seguridad minera de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código de Minas;*

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

2. *Presentar o ajustar el correspondiente Programa de Trabajos y Obras –PTO, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 685 de 2001, en los términos establecidos en la presente resolución.*
3. *Cumplir con la normatividad ambiental relativa al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, so pena de las medidas que adopte la autoridad ambiental competente en el marco de sus competencias.*
4. *Declarar, liquidar y pagar las regalías correspondientes a la explotación minera realizada en el formulario diseñado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería, dentro de los diez (10) días hábiles a la finalización de cada trimestre de conformidad con la normatividad vigente.*
5. *Dar cumplimiento a las normas que regulen la comercialización de minerales.*
6. *Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas.*
7. *Adelantar el trámite ante la autoridad ambiental competente para la sustracción del área de reserva forestal que se superponga con el Área de Reserva Especial declarada y delimitada, si a ello hubiere lugar.*
8. *Las demás que se deriven de la presente resolución y la normatividad que regule la materia.*

***Parágrafo 1.*** *El Grupo de Fomento de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces procederá a realizar visitas de seguimiento a las obligaciones impuestas a la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial, las cuales podrán ser acompañadas por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de esta Agencia.*

***Parágrafo 2.*** *Se excluirán como beneficiarios del Áreas de Reserva Especial, aquellos miembros de la comunidad minera, que de acuerdo con los informes de seguimiento que se generen con ocasión de las visitas de verificación de las obligaciones contraídas, no cumplan con los requisitos de seguridad minera y pongan en riesgo inminente la vida de las personas que allí laboran."*

En este sentido, la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial a declararse y delimitarse en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018** para la extracción de arena de cantera, será responsable **de forma solidaria** de las obligaciones antes indicadas so pena de incurrir en las causales de terminación del área aquí aludida, en especial los establecidos por el Artículo 23 de la Resolución 546 de 2017, a saber:

*"**Artículo 23°. Terminación Del Área De Reserva Especial.** La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, mediante acto administrativo motivado dará por terminada el Área de Reserva Especial declarada y delimitada por algunas de las siguientes causas:*

1. *Cuando los estudios geológico-mineros establezcan que no es viable desarrollar un proyecto de minería especial, de que trata el artículo 248 de la Ley 685 de 2001.*
2. *Por la no presentación del Programa de Trabajos y Obras -PTO en el plazo establecido, o por el incumplimiento de los requerimientos que efectúe la Agencia Nacional de Minería frente a la complementación del mismo.*
3. *Como consecuencia de la expedición del acto administrativo que no acceda a la sustracción del área de reserva forestal creada por la Ley 2ª de 1959 o de reserva forestal regional que presente superposición con el Área de Reserva Especial declarada y delimitada.*
4. *Por incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través del acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y de las normas de seguridad minera.*
5. *Por el no pago o el pago incompleto de las regalías en los términos y condiciones establecidos por la ley.*
6. *Por solicitud de la comunidad minera tradicional.*
7. *Por la extinción de la comunidad minera tradicional que dio origen a la delimitación del Área de Reserva Especial.*
8. *Por realizar explotación fuera del Área de Reserva Especial declarada y delimitada o por el abandono injustificado de los trabajos mineros.*
9. *Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada no cumple con las condiciones de seguridad minera de conformidad con el artículo 97 de la Ley 685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos inminentes para la vida de los trabajadores.*
10. *Por incumplimiento de las normas que regulen la comercialización de minerales.*

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

11. *Por providencia judicial o administrativa emitida por la autoridad competente y que esté debidamente ejecutoriada que impida ejercer la actividad minera a la comunidad beneficiaria del Área de Reserva Especial.*
12. *Por la no suscripción del contrato especial de concesión por parte de los integrantes de la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial, dentro del término establecido a través del correspondiente requerimiento realizado para tal fin por la Agencia Nacional de Mineria".*

De igual forma, se advierte a la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial, que no podrá realizar ningún tipo de transacción comercial, sobre la **prerrogativa** que le confiere el inciso final del Artículo 165 de la Ley 685 de 2001, atendiendo a que aún no les asiste derecho alguno sobre el área declarada y delimitada por esta Entidad. Es una **mera expectativa** que se tiene por parte de los mineros hasta tanto se firme el correspondiente Contrato Especial de Concesión en los términos del Artículo 248 del Código de Minas. En este sentido, la prerrogativa de Ley aquí aludida, no es un derecho real y material que les asiste a las personas que demostraron la existencia de explotaciones tradicionales en dicha área sobre el área de reserva especial, sino una mera expectativa conferida por Ley para permitirles la continuidad de los trabajos mineros sin que se les aplique las acciones penales a que haya lugar por la explotación de minerales sin título legalmente otorgado por la autoridad minera competente, **razón por la cual no pueden disponer de esta o efectuar negociaciones de la prerrogativa de explotación que se permite a las personas que demostraron la existencia de las explotaciones tradicionales en dicha área.**

Con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial, la autoridad competente practicará las correspondientes visitas de seguimiento y/o fiscalización, y expedirá los informes y actos administrativos a que haya lugar para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parágrafos 1 y 2 del Artículo 14° de la Resolución No. 546 de 2017 de esta Agencia, así como en los Artículos 22 y 30 de la Ley 1955 de 2019[3].

**EL VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, toma la presente decisión basada en los estudios y análisis efectuados por el Grupo de Fomento.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR Y DELIMITAR** como Área de Reserva Especial, el área localizada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018** para la extracción de arena de cantera, con el objeto de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos estratégicos para el país de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 31 y 248 de la Ley 685 de 2001, con una extensión total de **72,4374 Hectáreas** en un (01) solo polígono y delimitada en las siguientes coordenadas:

| | |
|---|---|
| ***DESCRIPCIÓN DEL P.A.*** | *PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL* |
| ***PLANCHA IGAC DEL P.A.*** | *428* |
| ***DATUM*** | *BOGOTÁ* |
| ***ORIGEN*** | *OESTE* |
| ***MUNICIPIOS*** | *SAPUYES - NARIÑO* |
| ***AREA TOTAL INICIAL*** | *72,4374 Hectáreas* |

***5. COORDENADAS DEL ÁREA***

[3] "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipios de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

| VÉRTICE | ESTE | NORTE |
|---|---|---|
| 1 | 928643,2415 | 607315,0187 |
| 2 | 928643,2238 | 607304,0492 |
| 3 | 928644,7577 | 607289,3708 |
| 4 | 928645,1043 | 607287,6079 |
| 5 | 928648,0000 | 607245,0000 |
| 6 | 928688,0000 | 607215,0000 |
| 7 | 928754,2699 | 607215,0000 |
| 8 | 928795,2824 | 607202,9966 |
| 9 | 928823,6144 | 607207,3555 |
| 10 | 928825,0000 | 607205,0000 |
| 11 | 928845,0000 | 607071,0000 |
| 12 | 928880,0000 | 607000,0000 |
| 13 | 928941,0000 | 606933,0000 |
| 14 | 928993,5074 | 606982,1198 |
| 15 | 928999,3835 | 606974,9188 |
| 16 | 929011,3963 | 606964,2296 |
| 17 | 929023,4743 | 606956,9028 |
| 18 | 929036,7907 | 606952,1040 |
| 19 | 929050,6753 | 606950,1912 |
| 20 | 929057,6723 | 606950,6604 |
| 21 | 929063,0099 | 606951,9636 |
| 22 | 929075,9649 | 606959,7736 |
| 23 | 929086,9302 | 606969,9833 |
| 24 | 929096,6052 | 606983,7423 |
| 25 | 929105,1479 | 607000,7876 |
| 26 | 929123,9484 | 607045,8559 |
| 27 | 929145,9038 | 607086,4099 |
| 28 | 929155,5504 | 607105,8187 |
| 29 | 929160,7545 | 607119,8482 |
| 30 | 929173,3418 | 607161,0871 |
| 31 | 929177,3811 | 607169,6988 |
| 32 | 929177,6561 | 607169,9806 |
| 33 | 929192,0012 | 607162,3227 |
| 34 | 929207,7023 | 607121,5138 |
| 35 | 929216,4977 | 607104,0349 |
| 36 | 929220,7834 | 607098,1772 |
| 37 | 929230,1537 | 607088,0724 |
| 38 | 929243,2930 | 607076,4642 |
| 39 | 929251,5321 | 607071,6752 |
| 40 | 929261,5941 | 607068,1764 |
| 41 | 929274,1545 | 607065,7549 |
| 42 | 929288,9803 | 607064,4543 |
| 43 | 929298,4426 | 607064,9704 |
| 44 | 929305,0001 | 607066,5386 |
| 45 | 929305,0000 | 606601,0000 |
| 46 | 928518,0000 | 606885,0000 |
| 47 | 928329,0000 | 606811,0000 |
| 48 | 927991,0000 | 607105,0000 |
| 49 | 927991,0000 | 606848,0000 |
| 50 | 927363,0000 | 606848,0000 |
| 51 | 927363,0000 | 607295,0000 |
| 52 | 927413,0000 | 607328,0000 |
| 53 | 927485,0000 | 607285,0000 |
| 54 | 927541,0000 | 607155,0000 |
| 55 | 927618,0000 | 607148,0000 |
| 56 | 927693,0000 | 607223,0000 |
| 57 | 927690,4317 | 607295,9418 |
| 58 | 927699,3717 | 607299,8288 |
| 59 | 927715,2467 | 607320,9957 |
| 60 | 927736,4132 | 607363,3293 |
| 61 | 927776,1005 | 607424,1841 |
| 62 | 927786,8596 | 607444,3576 |
| 63 | 927818,0000 | 607425,0000 |
| 64 | 927827,7845 | 607378,1931 |
| 65 | 927827,7841 | 607378,1875 |
| 66 | 927828,2124 | 607368,7230 |
| 67 | 927829,8071 | 607358,1496 |
| 68 | 927832,7657 | 607345,1926 |
| 69 | 927835,6594 | 607337,7506 |
| 70 | 927836,5210 | 607336,3997 |
| 71 | 927855,0000 | 607248,0000 |
| 72 | 927888,0000 | 607248,0000 |
| 73 | 927922,0000 | 607281,0000 |
| 74 | 927928,5836 | 607342,4464 |
| 75 | 927935,9712 | 607347,9585 |
| 76 | 927944,9074 | 607356,0620 |
| 77 | 927954,7690 | 607368,0005 |
| 78 | 927994,2898 | 607424,8841 |
| 79 | 928004,1197 | 607442,5484 |
| 80 | 928008,7357 | 607455,6024 |
| 81 | 928025,0000 | 607455,0000 |
| 82 | 928085,0000 | 607333,0000 |
| 83 | 928225,0000 | 607281,0000 |
| 84 | 928245,0000 | 607028,0000 |
| 85 | 928275,0000 | 606942,0000 |
| 86 | 928410,0000 | 606942,0000 |
| 87 | 928410,0000 | 607198,0000 |
| 88 | 928508,0000 | 607282,0000 |
| 89 | 928545,0000 | 607365,0000 |
| 90 | 928575,0000 | 607385,0000 |
| 91 | 928615,0000 | 607388,0000 |
| 92 | 928641,0000 | 607348,0000 |
| 93 | 928643,2415 | 607315,0187 |

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **ENTIENDEN EXCLUIDAS** del área declarada y delimitada a través de la presente Resolución, las zonas que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero Nacional y demás zonas excluibles de la minería.

**ARTÍCULO TERCERO.-** La Agencia Nacional de Minería realizará los estudios geológico - mineros, en los términos establecidos en el Artículo 31 de la Ley 685 de 2001.

**ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER** como integrantes de la comunidad minera tradicional, a las personas que se relacionan a continuación, quienes cumplen con los requisitos exigidos en la Ley para ser tenidos en cuenta como mineros tradicionales dentro del área de reserva especial

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipios de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

declarada y delimitada a través del Artículo Primero de la presente Resolución, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo:

| Nombres y Apellidos | Cédula de Ciudadanía No. |
|---|---|
| Francisco Germán Marcillo Casanova | 13.064.136 |
| Luis Francisco Marcillo Quiroz | 12.755.267 |
| Justiniano Marcillo Ruano | 1.887.440 |

**ARTÍCULO QUINTO.- ADVERTIR** a los integrantes de la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial que se declara y delimita a través del presente acto administrativo que son responsables **de forma solidaria** del cumplimiento de las siguientes obligaciones y demás que se deriven del presente acto administrativo:

1. Ejecutar las labores mineras acatando las normas mínimas de seguridad minera de conformidad con lo establecido en el Artículo 97 del Código de Minas;
2. Presentar o ajustar el correspondiente Programa de Trabajos y Obras – PTO, de conformidad con el Artículo 84 de la Ley 685 de 2001, en los términos establecidos en la presente Resolución.
3. Cumplir con la normatividad ambiental relativa al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, so pena de las medidas que adopte la autoridad ambiental competente en el marco de sus competencias.
4. Declarar, liquidar y pagar las regalías correspondientes a la explotación minera realizada en el formulario diseñado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería, dentro de los diez (10) días hábiles a la finalización de cada trimestre de conformidad con la normatividad vigente.
5. Dar cumplimiento a las normas que regulen la comercialización de minerales.
6. Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas.
7. Las demás que se deriven de la presente Resolución y la normatividad que regule la materia.

**ARTÍCULO SEXTO.- ADVERTIR** a la Comunidad minera reconocida en la presente Resolución, que la Agencia Nacional de Minería podrá dar por terminada el área de reserva especial declarada y delimitada mediante el presente acto administrativo, por las siguientes causales, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo:

1. Cuando los estudios geológico-mineros establezcan que no es viable desarrollar un proyecto de minería especial, de que trata el Artículo 248 de la Ley 685 de 2001.
2. Por la no presentación del Programa de Trabajos y Obras -PTO. en el plazo establecido, o por el incumplimiento de los requerimientos que efectúe la Agencia Nacional de Minería frente a la complementación del mismo.

3. Por incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través del acto administrativo que declara y delimita el Área de Reserva Especial y de las normas de seguridad minera.
4. Por el no pago o el pago incompleto de las regalías en los términos y condiciones establecidos por la Ley.
5. Por solicitud de la comunidad minera tradicional.
6. Por la extinción de la comunidad minera tradicional que dio origen a la delimitación del Área de Reserva Especial.
7. Por realizar explotación fuera del Área de Reserva Especial declarada y delimitada o por el abandono injustificado de los trabajos mineros.
8. Cuando técnicamente se determine que la actividad minera adelantada no cumple con las condiciones de seguridad minera de conformidad con el Artículo 97 de la Ley 685 de 2001, siempre que se evidencien riesgos inminentes para la vida de los trabajadores.
9. Por incumplimiento de las normas que regulen la comercialización de minerales.
10. Por providencia judicial o administrativa emitida por la autoridad competente y que esté debidamente ejecutoriada que impida ejercer la actividad minera a la comunidad beneficiaria del Área de Reserva Especial.
11. Por la no suscripción del contrato especial de concesión por parte de los integrantes de la comunidad minera beneficiaria del Área de Reserva Especial, dentro del término establecido a través del correspondiente requerimiento realizado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.- ADVERTIR** a la comunidad minera beneficiara del área de reserva especial que se declara y delimita mediante el presente acto administrativo, que no podrán utilizar mano de obra infantil dentro de la cadena productiva de la actividad minera a desarrollar y que tampoco podrán transferir, a cualquier título, la prerrogativa concedida por la Ley en los términos del último inciso del Artículo 165 de la Ley 685 de 2001. De igual forma, deberán denunciar ante las alcaldías municipales los trabajos mineros adelantados por terceros ajenos a la comunidad minera establecida a través del Artículo segundo del presente acto administrativo, para que se tomen las medidas a que haya lugar.

**ARTÍCULO OCTAVO.- RECHAZAR** el trámite de la solicitud de declaración y delimitación de un Área de Reserva Especial, presentada mediante presentada mediante **radicado No. 20189080277242 del 28 de mayo de 2018** para la extracción de arena de cantera, ubicada en jurisdicción del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución, respecto de la persona que se relaciona a continuación:

| Nombres y Apellidos | Cédula de Ciudadanía No. |
|---|---|
| Vicente Arnulfo Escobar Yela | 5.344.313 |

**ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR** la presente Resolución personalmente a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, a las personas relacionadas en el Artículo **CUARTO** de la presente Resolución, o en su defecto,

***"Por medio de la cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial ubicada en jurisdicción del municipios de Sapuyes – departamento de Nariño, se identifica la comunidad minera beneficiaria, se imponen unas obligaciones y se toman otras determinaciones"***

procédase mediante aviso en los términos establecidos en los Artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO DÉCIMO.- COMUNICAR** la presente Resolución, a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, al Alcalde del municipio de Sapuyes – departamento de Nariño, y a la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** Una vez ejecutoriada la presente decisión, **REMITIR** copia de la misma al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, para que se tomen las medidas pertinentes frente a lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 685 de 2001.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse por escrito ante la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación personal o por aviso, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 77 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

Dada en Bogotá D.C.,

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**DAVID ANDRÉS GONZÁLEZ CASTAÑO**
Vicepresidente de Promoción y Fomento

*Proyectó: Juan Ernesto Puentes - Abogado Grupo de Fomento.*
*Aprobó: Katia Romero Molina - Coordinadora Grupo de Fomento.*
*Revisó y ajustó: Adriana Rueda Guerrero - Abogada VPPF.*

EXP. 621
SOCIEDAD AGRESUR S.A.S
MUNICIPIO DE FUNES

0 4 ABR 202

**RESOLUCION No. 117 - 1**

**Por medio de la cual se autoriza una Cesión de Derechos y Obligaciones Ambientales**

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO "CORPONARIÑO", EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015 NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y**

**CONSIDERANDO**

Que mediante **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996**, **CORPONARIÑO** concedió una **LICENCIA AMBIENTAL** a favor de **INCONAL LTDA**, para el proyecto "Explotación Material de Arrastre Quebrada Téllez y Producción de Concreto Asfaltico" ubicado en la vereda San José, Municipio de Funes, Departamento de Nariño.

Que mediante **Resolución No. 412 del 9 de septiembre de 1998**, **CORPONARIÑO** concedió la cesión los derechos ambientales de la licencia ambiental a la señora CIELO VELA DE LA ROSA identificada con cédula de ciudadanía No. 20.232.200 de Bogotá D.C.

Que mediante **Resolución No. 780 del 23 de noviembre de 2004**, **CORPONARIÑO** reconoció al señor **SEGUNDO OLMEDO YANDAR ROSALES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.798.063 en calidad de asignatario único de la difunta señora CIELO VELA DE LA ROSA el derecho de subrogarse como beneficiario de la licencia ambiental otorgada mediante **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996.**

Que mediante **Resolución No. 375 del 08 de julio de 2005** CORPONARIÑO modifico la Licencia Ambiental en el sentido de incluir la planta de trituración.

Que mediante **Resolución No. 000879 del 15 de mayo de 2015,** la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**, aceptó la solicitud de derecho de preferencia dentro de la licencia especial de explotación No. 00222-52 sobre los derechos que le correspondían al señor **SEGUNDO OLMEDO YANDAR ROSALES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.798.063, a favor de los señores **SANDRA XIMENA YANDAR GUERRERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 59.816.931 de Pasto (N), **LILIANA DEL CARMEN DAVID PAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.085.245 de Pasto (N) en nombre de su hija menor **MAYERLI MERCEDES YANDAR DAVID** identificada con tarjeta de identidad No. 1.080.043.581 de Pasto (N), **SANDRA MABEL YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.951.932 de Cali (V), **MARIO ANDRES YANDAR LOBON** identificado con cédula de ciudadanía No. 94.503.677 de Cali (V) y **TRYNY MARCELA YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 69.026.796 de Puerto Asís (P).

Que mediante **Resolución No. 00523 del 29 de mayo de 2018** la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA** prorrogó la vigencia de la Licencia Especial de Explotación No. 00222-52 hasta el 18 de noviembre de 2022 y autorizó la cesión de los derechos y obligaciones que le correspondían a la señora **SANDRA XIMENA YANDAR GUERRERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 59.816.931 de Pasto (N), a favor de la sociedad **AGRESUR S.A.S** identificada con Nit No. 900031078-1.

Que mediante **Resolución No. 001510 del 27 de diciembre de 2019** la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**, aceptó y ordenó la inscripción de una cesión de derechos dentro de la licencia especial de explotación No. 00222-52 de los señores, **LILIANA DEL CARMEN DAVID PAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.085.245 de Pasto (N) en nombre de su hija menor **MAYERLI MERCEDES YANDAR DAVID** identificada con tarjeta de identidad No. 1.080.043.581 de Pasto (N), **SANDRA MABEL YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.951.932 de Cali (V), **MARIO ANDRES YANDAR LOBON** identificado con cédula de ciudadanía No. 94.503.677 de Cali (V) y **TRYNY MARCELA YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 69.026.796 de Puerto Asís (P) a favor de **AGRESUR S.A.S** identificada con Nit No. 900031078-1 representada legalmente por el señor **CARLOS OLMER GUERRERO YANDAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.383.763 de Pasto (N).

Que mediante **oficio con radicado interno No. 7078 del 29 de septiembre de 2022**, los señores **MARIO ANDRES YANDAR LOBON** identificado con cédula de ciudadanía No. 94.503.677 de Cali (V), **LILIANA DEL CARMEN DAVID PAZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.085.245 de Pasto (N) en nombre de su hija menor **MAYERLI MERCEDES YANDAR DAVID** identificada con tarjeta de identidad No. 1.080.043.581 de Pasto (N), **SANDRA MABEL YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.951.932 de Cali (V) y **TRYNY MARCELA YANDAR LOBON** identificada con cédula de ciudadanía No. 69.026.796 de Puerto Asís (P), solicitan a CORPONARIÑO la cesión total de los derechos y obligaciones de la Licencia Especial de Explotación No. 00222-52 a favor de la sociedad **AGRESUR S.A.S** identificada con Nit No. 900031078-1 representada legalmente por el señor **CARLOS OLMER GUERRERO YANDAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.383.763 de Pasto (N).

Que mediante **Resolución No. VCT-46 del 17 de febrero de 2023** la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA** renovó la licencia especial de materiales de construcción No. 00222-52 hasta el 18 de noviembre de 2027.

Que mediante oficio del 19 de febrero de 2024, el señor **CARLOS OLMER GUERRERO YANDAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.383.763 de Pasto (N) en calidad de representante legal de **AGRESUR S.A.S** identificada con Nit No. 900031078-1, solicitó cesión total de derechos y obligaciones ambientales de la licencia ambiental con **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996** otorgada al señor **SEGUNDO OLMEDO YANDAR ROSALES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.798.063, a favor de la sociedad **AGRESUR S.A.S.**

## FUNDAMENTO JURIDICO

Que la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO en virtud de las facultades otorgadas por el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente

La Ley 99 de 1993 establece:

*"**Artículo 31°**.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:*

*(...)*

*9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o*

*para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (...)*

*11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. (...)".*

***"Artículo 50°.-** De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."*

Que el Decreto 1076 del 2015, establece sobre licencias ambientales, lo siguiente:

***"Artículo 2.2.2.3.1.2. Autoridades ambientales competentes.** Son autoridades competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:*
*1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).*
*2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para ejercer las funciones delegadas.*
*3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.*
*4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002."*

*"**Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental.** La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. (...)"*

***"Artículo 2.2.2.3.1.6. Término de la licencia ambiental**. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación."*

***"Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental.** El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.*

*En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:*

*a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;*

*b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;*

*c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.*

*La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.*

*En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.*

***Parágrafo 1.** La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles.*

***Parágrafo 2.** En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo."*

## CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con lo señalado, esta Corporación atendiendo los principios de eficacia, economía y celeridad, consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo, se considera viable conceder la cesión de los derechos y obligaciones ambientales de una licencia especial de materiales de construcción No. 00222-52, contenidas en la **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996** y en sus actualizaciones a favor de la sociedad **AGRESUR S.A.S.**

En virtud de lo expuesto, éste Despacho,

## RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO. -** Autorizar la **CESIÓN TOTAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES** de licencia especial de materiales de construcción No. 00222-52 a favor de la sociedad **AGRESUR S.A.S** identificada con Nit No. 900031078-1 representada legalmente por el señor **CARLOS OLMER GUERRERO YANDAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 98.383.763 de Pasto (N) contenidas en la **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996**, ubicada en la vereda San José, Municipio de Funes, Departamento de Nariño, de conformidad con la parte motiva de la presente.

**ARTICULO SEGUNDO. -** Adviértase al nuevo titular, que la Licencia Ambiental queda sujeta al cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en la **Resolución No. 217 del 25 de junio de 1996** y sus respectivas actualizaciones, la Corporación realizará visitas de control y monitoreo, y efectuará nuevas exigencias técnicas en caso

117 - [redacted]

de que surja la necesidad, así mismo deberá darse estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

**ARTICULO TERCERO.** - Comuníquese el presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería para lo de su competencia, en un término no mayor a cinco (05) días calendario.

**ARTICULO CUARTO. –** Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la sociedad **AGRESUR S.A.S**, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO QUINTO.** - De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante el Director General, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO SEPTIMO.-** La presente providencia rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Dada en San Juan de Pasto, - 3 APR 2024

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ**
**Director General**

*Reviso:* *Dra. Tatiana Villarreal E.*
*Jefe Oficina Jurídica*

*Proyecto:* *Dr. José Luis Realpe B.*
*Profesional Universitario*

# ANEXO 12
# SOPORTE DE COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS.
# (No reporta)

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 13
# LISTADO DE PERSONAL AFILIADO – MES DE JULIO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| PERSONAL AFILIADO JULIO | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **No.** | **NOMBRE** | **CEDULA** | **CARGO** |
| **1** | Angel Maria Acosta Cuatindioy | 98.393.451 | Maestro |
| **2** | Yonny Daniel Martinez Rosas | 98.138.288 | Ayudante |
| **3** | Gerardo Henry Mera Benavides | 5.344.580 | Ayudante |
| **4** | Jose Hugo Oliva Burgos | 5.344.726 | Ayudante |
| **5** | Alvaro Giraldo Perez Arteaga | 13.062.928 | Ayudante |
| **6** | Ricardo Favian Pulzara Casanova | 1.087.424.466 | Ayudante |
| **7** | Alexander Emilio Tarapuez Moncayo | 5.345.830 | Ayudante |
| **8** | Luis Armando Carlosama Chapuel | 98.391.342 | Maestro |
| **9** | Kevin Yesid Carlosama Oliva | 1.010.149.452 | oficial |
| **10** | Cristian Alejandro Tarapuez Coral | 1.087.419.206 | Ayudante |
| **11** | Edwin Dario Luna | | Ayudante |
| **12** | Guerlin Armando Vallejo Benavides | 1.087.408.362 | Ayudante |
| | | | |
| | | | |
| **No.** | **NOMBRE** | **CEDULA** | **cargo** |
| **1** | Camilo Andres Mesa Acosta | 1.085.269.741,00 | RL contratista |
| **2** | Jessica Stephanie Vanegas Gongora | 1.085.342.370,00 | residente aux obra |
| **3** | Karol Yineth Rosero Narvaez | 1.085.336.867,00 | Profesional SiSOMA |
| **4** | Javier Andres Rueda Zarama | 12.996.429,00 | Esp. Estructuras |

# ANEXO 14
# EXÁMENES DE INGRESO DEL PERSONAL.
# (NO REPORTA)

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 15
# PLANILLAS DE SEGURIDAD.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 16
# CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Medellín, 29 de Julio de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES, en el centro de trabajo 0000000001 - UNIÒN TEMPROAL DESARROLLO SAPUYES, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C98393451 | ACOSTA CUATINDIOY ANGEL MARIA | 22/07/2026 | | 41522159 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C98138288 | MARTINEZ ROSAS YONNY DANIEL | 23/07/2026 | | 22020718 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C5344580 | MERA BENAVIDES GERARDO HENRY | 24/07/2026 | | Jd203e12 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C1085269741 | MESA ACOSTA CAMILO ANDRES | 17/05/2026 | | 124F1671 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | MORA |
| C5344726 | OLIVIA BURGOS JOSE HUGO | 22/07/2026 | | 24643223 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C13062928 | PEREZ ARTEAGA ALVARO GIRALDO | 22/07/2026 | | 9D219214 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C1087424466 | PULZARA CASANOVA RICARDO FABIAN | 22/07/2026 | | Q7331542 | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C1085336867 | ROSERO NARVAEZ KAROL YINETH | 25/03/2026 | | 59145921 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | MORA |
| C12996429 | RUEDA ZARAMA JAVIER ANDRES | 25/03/2026 | | 18418327 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | MORA |
| C5345830 | TARAPUEZ MONCAYO ALEXANDER EMILIO | 22/07/2026 | | 250³159j | DEPENDIENTE | EN COBERTURA |
| C1085342370 | VANEGAS GONGORA JESSICA STEPHANIE | 01/04/2026 | | 24175183 | DEPENDIENTE | MORA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10853368672621042917

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/07/2026 11:55:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.51.243.37, 107.154.67.13, 172.16.42.57

## LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES, en el centro de trabajo 0000000001 - UNIÒN TEMPROAL DESARROLLO SAPUYES, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C98397054 | ZUÑIGA ROSALES JUAN MANUEL | 09/04/2026 | | 187190m2 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | MORA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10853368672621042917

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/07/2026 11:55:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.51.243.37, 107.154.67.13, 172.16.42.57

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 17
# INDUCCION DE PERSONAL AFILIADO
# MES DE JULIO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Angel Maria Acosta

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rosero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-03-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | INDUCCION AL CARGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA |
| FECHA RECIBIDO : 13-02-26 | No. CC 98383457 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Alexander Emilio Tarapuez

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rosero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-20 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | INDUCCIONAL CARGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA Emilio Tovar Suarez |
| FECHA RECIBIDO : 13-02-26 | No. CC 5345 830 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

17 Funciones y responsabilidades del

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

**INDUCCIÓN DE PERSONAL**

**PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO "**

**INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Yonny Daniel Martinez

**Nombre de las personas que realiza(n):** Farol Rosero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

**General** [X] **Especifica** [ ] **HSEQ** [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA Yhony O. Martinez |
| FECHA RECIBIDO: 13-07-26 | No. CC 98.138.280 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Ricardo Fabian Pulzara

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rosero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A |
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | INDUCCION AL CARGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| PROFESIONALES ENCARGADOS | CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA Ricardo pulzara |
| FECHA RECIBIDO : 13-02-26 | No. CC 1087424466 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Gerardo Henry Mena

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rosero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | |
| FECHA RECIBIDO: 13-07-26 | FIRMA Jesus M Mena B<br>No. CC 5.344.580 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Alvaro Giraldo Perez

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rojero Narvaez

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA |
| FECHA RECIBIDO : 13-07-26 | No. CC 13.062.928 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | INDUCCIÓN DE PERSONAL |
|---|---|
| | PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

**Nombre de la persona que recibe:** Jose Oliver Burgos

**Nombre de las personas que realiza(n):** Karol Rosero Navarro

**Fecha de realización:** **Desde:** 13-07-26 **Hasta:** _____

**TIPO:**

General [X] Especifica [ ] HSEQ [ ]

| ITEM | DESCRIPCION | REALIZADO SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|
| | **GENERAL** | | | |
| 1 | Información general de la empresa | X | | |
| 2 | Presentación al grupo de trabajo | X | | |
| | **SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 3 | Política Integral | X | | |
| 4 | Política de alcohol y drogas | X | | |
| 5 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | X | | |
| 6 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | | X | |
| 7 | Comité de Convivencia | | X | |
| | **SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | |
| 8 | Panorama General de Riesgos (Factores Riesgo Prioritarios) | | X | |
| 9 | Plan de Emergencias y de Contingencia<br>Ubicación y uso de camillas, extintores, botiquines, alarma, etc.<br>Plan, rutas y salidas de evacuación<br>Sistema contra incendio | X | | |
| 10 | Inspecciones de Seguridad | X | | |
| 11 | Brigadas de Emergencia | | X | |
| | **MEDIO AMBIENTE** | | | |
| 12 | Conceptos Básicos | X | | |
| 13 | Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | X | | |
| 14 | Plan de Manejo Ambiental | X | | |
| 15 | Identificación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Presentación de Jefes Inmediatos | X | | |
| 17 | Funciones y responsabilidades del cargo | X | | |
| 18 | Autoridades del cargo | X | | |
| 19 | Reconocimiento de Áreas de trabajo | X | | |
| 20 | Riesgos a los que va a estar expuesto | X | | |
| 21 | Procedimientos de Trabajo | X | | |
| 22 | Permisos de Trabajo - Permisos especiales | | X | |
| 23 | Uso de Implementos de Trabajo | X | | |
| 24 | Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP y dotación | X | | |

**OBSERVACIONES:**

| **PROFESIONALES ENCARGADOS** | **CERTIFICO QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO AL INSTRUTIVO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL** |
|---|---|
| FIRMAS | FIRMA Jose Hildo Oliva |
| FECHA RECIBIDO : 13-07-26 | No. CC 5344726 |



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 18
# PLAN DE CAPACITACIÓN.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# PLAN DE CAPACITACIONES SST Y AMBIENTALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

| CAPACITADOR: | KAROL ROSERO NARVAEZ | PERSONAL CAPACITADO: | Ayudantes de obra |
|---|---|---|---|

| ACTIVIDADES | P/E | FRECUENCIA/PERIOCIDAD | DURACIÓN | FECHA DE CAPACITACIÓN | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 | | | | Mes 4 | | | | Mes 5 | | | | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| **ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inducción al personal: Sistema general de riesgos laborales, reglamento de higiene y seguridad en el trabjao, politica de SST, comité de convivencia, plan de emergencias, inspecciones de seguridad, procedimiento en caso de accidentes | P | UNICO | 1,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal | P | UNICO | 1 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre prevención de enfermedad laboral | P | UNICO | 1 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre prevención de incidentes y accidentes laborales | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmaco de pendencia | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre estilos de vida saludable | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación en autocuidado | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre manejo de sustancias químicas | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre como actuar en caso de alguna emergencia | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre estandares de seguridad | P | UNICO | 1h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **10** | **0%** |

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 19
# REGISTROS DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# INFORME DE CAPACITACIÓN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**FECHA**: 21 DE JULIO DE 2026

**RESPONSABLE**: KAROL ROSERO NARAVAEZ

**PROYECTO**:

**NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:** USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**OBJETIVO DE LA CAPACITACION:** Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto, constante y obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar la seguridad y salud en el entorno de trabajo.

**DESARROLLO:** "Inicialmente, se socializará el significado de los Elementos de Protección Personal (EPP). A continuación, se abordarán su clasificación, el uso correcto de cada uno, los errores más comunes asociados a su utilización, y la normativa vigente que regula su implementación en el entorno laboral."

**INTRODUCCION**: En todos los entornos laborales, especialmente aquellos con riesgos físicos, químicos, biológicos o mecánicos, el uso de los Elementos de Protección Personal es fundamental.
Los EPP no sustituyen los controles de riesgo, pero actúan como una última barrera de defensa para proteger al trabajador. Esta capacitación busca fomentar una cultura de prevención y concienciación sobre la importancia de su uso continuo y adecuado.

**Concepto de EPP**

El EPP, que incluye elementos como cascos, gafas de seguridad, guantes, protectores auditivos, está diseñado para proteger a los trabajadores de los riesgos asociados con sus tareas diarias.
El uso del EPP representa el compromiso del trabajador y la empresa con la seguridad y la prevención de riesgos laborales. Más allá de un cumplimiento normativo, es un acto de responsabilidad individual y colectiva.



**Clasificación de los EPP según el tipo de riesgo**

- Protección para la cabeza (cascos).
- Protección ocular y facial (gafas, caretas).
- Protección auditiva (tapones, orejeras)
- Protección respiratoria (mascarillas, respiradores).
- Protección de manos (guantes).

**Uso adecuado de los EPP**

- Elección del EPP según el riesgo identificado.

- Verificar su estado antes de cada uso y cómo identificar cuándo el EPP está dañado o no es efectivo. Esto reduce el riesgo de lesiones y asegura que el equipo proteja de manera óptima.

- Antes de utilizar cualquier Elemento de Protección Personal (EPP), es obligatorio realizar una inspección previa para asegurarse de que se encuentra en condiciones óptimas de uso. Esta revisión

**Errores comunes en el uso de EPP**

•Uno de los errores más comunes en el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) es no utilizarlos en todo momento durante la jornada laboral, especialmente en áreas donde los riesgos están presentes de forma continua. Algunos trabajadores tienden a retirarse el EPP por incomodidad, confianza excesiva en su experiencia o por realizar tareas que consideran "rápidas" o "sin peligro", lo que incrementa significativamente la posibilidad de accidentes.

| | |
|---|---|
| rápida pero cuidadosa ayuda a detectar daños, desgaste o irregularidades que puedan comprometer su efectividad y, por ende, la seguridad del trabajador.<br><br>• Después de cada uso, los EPP deben limpiarse según las recomendaciones del fabricante, retirando suciedad, residuos o contaminantes que puedan deteriorar sus materiales. Es importante revisar periódicamente su estado, reparar lo que sea posible y reemplazar los elementos dañados o vencidos. Además, deben almacenarse en lugares secos, limpios, ventilados y protegidos de la luz solar directa, el calor excesivo o sustancias químicas que puedan dañarlos.<br><br>• El reemplazo oportuno de los Elementos de Protección Personal (EPP) en caso de daño o vencimiento es esencial para mantener la seguridad del trabajador. Un EPP deteriorado, roto, con piezas faltantes o vencido pierde su capacidad de protección y puede generar un riesgo mayor al ofrecer una falsa sensación de seguridad. | • Usar un equipo que no cumple con las características necesarias o que está añado reduce significativamente su capacidad de protección, exponiendo al trabajador a lesiones, enfermedades o accidentes.<br><br>• Otro error común en el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) es descuidar su limpieza y conservación. La acumulación de suciedad, polvo, residuos químicos o biológicos puede deteriorar los materiales del EPP, afectar su funcionamiento y reducir su capacidad de protección. Además, la falta de mantenimiento adecuado puede provocar daños ocultos que pasen desapercibidos durante la inspección, poniendo en riesgo la seguridad del trabajador.<br><br>**NOTA:** se aclaró al personal de obra que si no se usaban los elementos de protección personal constantemente se procedería a realizar memorandos, los cuales quedaran consignados en las carpetas de cada trabajador. |

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

| LISTA DE ASITENCIA A CAPACITACIÓN | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES<br>R.L. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE SST** | Karol Rosero Narvaez |
| **MUNICIPIO / DEPARTAMENTO:** | Corregimiento de El Espino municipio de Sapuyes - Nariño |
| **FECHA:** | 21-07-2026 |
| **NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN** | Uso adecuado de EPP |

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Maria Acosta | 98.393.451 | |
| 2 | Gerardo Henry Mera | 5.344.580 | |
| 3 | José Hugo Oliva | 5.344.726 | |
| 4 | Alexander Emilio Tarapuez | 5.345.830 | |
| 5 | Alvaro Gualdo Perez | 13.062.928 | |
| 6 | Ricardo Favian Pulzara | 1.087.424.466 | |
| 7 | Yonny Daniel Martinez | 98.138.288 | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 20

# ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (COPASST).

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

| | |
|---|---|
| **CONVOCADO POR** | Líder de seguridad y salud en el trabajo |
| **TEMA PRINCIPAL** | Conformación equipo de comité de COPASST |
| **FECHA DE CONFORMACIÒN** | 14 de julio 2020 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
|---|
| Creación de los comités de COPASST |

| **NORMATIVIDAD** | | |
|---|---|---|
| **TÍTULO DE LA LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN, ENTRE OTROS.** | **DESCRIPCIÓN** | **AÑO** |
| Decreto 614 | Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. | 1984 |
| Resolución 2013 | Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo. | 1986 |
| Decreto 1072 | Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo | 2015 |

El contratista **UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES**, REPRESENTADO LEGALMENTE POR **CAMILO ANDRES MEZA ACOSTA**, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, emanado del Ministerio de Trabajo ha determinado conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo del comité será promover y vigilar las normas de



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

seguridad y salud en el trabajo y servirá como medio de comunicación entre el empleador y los empleados.

En el tramo Pilispí – Alemania, municipio de Ricaurte (Nariño), donde se ejecuta el proyecto denominado "Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el municipio de Ricaurte, Nariño", se dio inicio a la jornada con la socialización de las funciones y responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de elección de los representantes del empleador y de los trabajadores que conformarán dicho comité, garantizando la participación de las partes y dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Por parte del empleador:**

Se designó como principal a:

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Santillan Mosquera | |

**Los trabajadores eligen como principal a:**

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Emilio Tarapuez | |

**Y como suplentes a:**

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Angel Maria Acosta | |

Integrado el comité, se procedió de acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 a nombrar un presidente y un secretario con el objeto de mantener la coordinación, organización y mantenimiento del comité.

Entre los miembros del Comité la empresa designa a Cristian Santillan Mosquera, como presidente, y por votación del comité se nombra secretario del mismo a Emilio Tarapuez, una vez asignadas las personas, que van a



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

ser cabezas visibles del Comité se procedió, a darle la instalación al mismo, para lo cual, se hizo conocer lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros; así como también, las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo.

| FUNCIONES DEL COMITÉ |
|---|
| 1. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.<br>2. Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.<br>3. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.<br>4. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal en los frentes de trabajo e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.<br>5. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. |

| FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ |
|---|
| 1. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.<br>2. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.<br>3. Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes.<br>4. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.<br>5. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades.<br>6. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. |

| FUNCIONES DEL SECRETARIO |
|---|



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

1. Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas
2. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y aprobación del Comité.
3. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores.

**FUNCIONES DEL EMPLEADOR**

1. Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2 de esta Resolución, garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones.
2. Designar sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité.
4. Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto.

**FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES**

1. Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la empresa.
3. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador.

Por lo anteriormente expuesto y según Resolución 2013 de 1986, el Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar todas las actividades que estén a su alcance para prevenir las conductas de Acoso Laboral.

Presidente comité de COPASST

secretario Comité COPASST

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 21
# ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLAB).

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – COCOLAB No. 001

| | |
|---|---|
| **CONVOCADO POR** | Líder de seguridad y salud en el trabajo. |
| **TEMA PRINCIPAL** | Conformación equipo de comité de convivencia laboral. |

**ORDEN DEL DÍA**

Conformación del comité de convivencia laboral

**NORMATIVIDAD**

| RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| **Resolución 652** | Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. | **2012** |
| **Resolución 1356** | Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012 | **2012** |

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ**

| RESOLUCIÓN 1356 DE 2012 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. TOTAL DE TRABAJADORES POR EMPRESA** | **REPRESENTANTE POR EL TRABAJADOR** | **REPRESENTANTE POR EL EMPLEADOR** | **SUPLENTE EMPLEADOR Y TRABAJADOR** |
| Menos de 20 | 1 | 1 | 2 |
| Mas de 20 | 2 | 2 | 4 |

**ELECCIÒN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ**

El empleador designará directamente sus representantes y los trabajadores elegirán a los suyos por votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores.

**COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y COMPORTAMENTALES QUE DEBEN TENER LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ**

Los integrantes del Comité contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

| FUNCIONES DEL COMITÈ |
|---|
| • Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir conflicto laboral, así como las pruebas que las soportan.<br>• Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de conflicto laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.<br>• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.<br>• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.<br>• Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad.<br>• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.<br>• En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.<br>• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. |

El día viernes 24 de julio, en las instalaciones del proyecto denominado: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Ubicado en el corregimiento El Espino del municipio de Sapuyes, se reunió el responsable de la seguridad y salud en el trabajo y los demás trabajadores para conformar el Comité de Convivencia Laboral dando cumplimiento a la



Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

Resolución 652 de 2012, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST).

Dando cumplimiento a las resoluciones 652 de abril 30 de 2012 y 1356 del 18 de julio de 2012 "por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones", así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST). Se procedió a conformar el comité de convivencia laboral, cabe mencionar, que el periodo de los miembros del Comité se establece de acuerdo a la fecha de finalización del contrato y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros del Comité, así como la capacitación requerida.

Haciendo uso de sus facultades, el Representante Legal de la Empresa nombra a las siguientes personas:

1. Karol Rosero Narvaez _____ Principal
2. Jessica Stephanie Vanegas _____ Suplente

Y los trabajadores eligieron por votación a:

1. Angel Maria Acosta _____ Principal
2. Ricardo Fabian Pulsara _____ Suplente

Firma integrante del Comité
Representante principal por el Empleador

Firma integrante del Comité
Representante suplente por el Empleador

Firma integrante del Comité
Representante Principal trabajadores

Ricardo pulzara
Firma integrante del Comité
Representante suplente de trabajadores

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 21
# INFORME DE CAPACITACIÓN COPASST Y COCOLAB.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| INFORME DE CAPACITACIÓN USO CORRECTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | |
|---|---|
| **FECHA**: 21 DE JULIO DE 2026 | |
| **RESPONSABLE**: KAROL ROSERO NARAVAEZ | |
| **PROYECTO**: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES – SEDE BARRIO LA FLORESTA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | |
| **NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:** INDUCCIÓN COPASST Y COCOLAB | |
| **OBJETIVO DE LA CAPACITACION:** Capacitar Y Brindar a los nuevos colaboradores la información esencial sobre el COPASST, sus funciones, responsabilidades, mecanismos de reporte y los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. | |
| **DESARROLLO:** " La capacitación de inducción del COPASST y COCOLAB se desarrolla mediante una presentación inicial de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguida de la explicación de qué es el COPASST, sus funciones, los integrantes del comité y los procedimientos para reportar riesgos, incidentes o condiciones inseguras. Posteriormente, se abordan las normas internas de seguridad, el uso de los elementos de protección personal, los protocolos de emergencia y las medidas preventivas de acuerdo con las labores del colaborador. Paralelamente, se integra el enfoque COCOLAB a través de dinámicas de comunicación, trabajo en equipo y participación activa, promoviendo un ambiente de confianza y colaboración. Finalmente, se realiza un espacio para preguntas, retroalimentación y verificación del aprendizaje, asegurando que el nuevo colaborador comprenda sus responsabilidades y los canales de apoyo disponibles." | |
| **INTRODUCCION**: En La capacitación de inducción del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y del enfoque COCOLAB busca integrar a los nuevos colaboradores en los procesos esenciales de prevención, seguridad, salud laboral y trabajo colaborativo dentro de la organización. El COPASST desempeña un papel clave en la identificación, control y seguimiento de los riesgos laborales, promoviendo espacios de trabajo seguros y saludables. Por su parte, COCOLAB fortalece la comunicación, el trabajo en equipo y la participación activa, facilitando que los nuevos colaboradores se adapten de manera rápida y efectiva a la cultura organizacional. Juntos, ambos componentes aseguran una integración completa que combina seguridad, bienestar e interacción colaborativa. | |
| **FUNCIONES DEL COPASST**<br>1. Vigilar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dentro de la empresa.<br>2. Promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales mediante campañas, capacitaciones y acciones preventivas.<br>3. Identificar y evaluar riesgos y condiciones inseguras en los diferentes puestos o áreas de trabajo.<br>4. Investigar accidentes de trabajo e incidentes, proponiendo medidas correctivas y preventivas.<br>5. Acompañar la implementación de controles y mejoras en seguridad, salud y bienestar laboral.<br>6. Recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes realizados por los trabajadores sobre riesgos o anomalías en las condiciones de trabajo. | **FUNCIONES DE COCOLAB**<br>1. Fomentar la comunicación abierta y efectiva entre los colaboradores para fortalecer el trabajo en equipo.<br>2. Promover la participación activa en actividades, proyectos y espacios de integración laboral.<br>3. Impulsar un clima laboral positivo, basado en el respeto, la empatía y la colaboración.<br>4. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda colectiva de soluciones.<br>5. Apoyar procesos de integración e inducción, ayudando a que nuevos colaboradores se adapten a la cultura organizacional.<br>6. Motivar la creatividad y el trabajo colaborativo generando ideas,<br>7. Fortalecer la cultura institucional, reforzando valores corporativos a través del trabajo conjunto. |

| | |
|---|---|
| 7. Fomentar la participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud laboral, promoviendo el autocuidado.<br>8. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones, equipos y procesos de la empresa.<br>9. Proponer actividades de formación y capacitaciones relacionadas con seguridad, salud y prevención de riesgos.<br>10. Mantener comunicación directa con la alta dirección, presentando informes, recomendaciones y resultados.<br>11. Servir como enlace entre empleador y trabajadores para mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo.<br>12. Participar en la elaboración, revisión y actualización de protocolos, programas y procedimientos de seguridad. | 8. Coordinar actividades de bienestar e integración, como dinámicas, talleres o ejercicios de cohesión grupal.<br>9. Identificar necesidades del equipo, proponiendo acciones que mejoren el ambiente y las relaciones laborales.<br>10. Acompañar procesos de cambio, brindando apoyo para facilitar la adaptación del |
| | |

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 23
# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP A PERSONAL TÉCNICO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

## ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: " CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO "

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO/ACTIVIDAD | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO DE ENTREGA | | FECHA | FIRMA DEL TRABAJADOR Nota: Recibo los elementos y me responsabilizo del cuidado y uso de los mismos | OBSERVACIONES (otras especificaciones del EPP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CABEZA | VISUAL | RESPIRATORIA | AUDITIVA | | | MANOS | | | DOTACIÓN | | | | ALTURAS | | | PROTECCIÓN INTEGRAL | OTRO EPP: | | | | | |
| | | Casco con barbuquejo | Gafas de seguridad | Tapabocas | Protectores auditivos | Protector auditivo de inserción | | Guantes de carnaza | Guantes anticorte | Guantes de latex cubiertos | Impermeables | Camisetas Jean manga larga | | Botas punteras | Arnés | Eslingas | Impermeable en PVC | | | INICIAL | REPOSICIÓN | | | |
| Angel Maria Acosta | Maestro | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Ricardo pulzara | |
| Ricardo F. Pulzara | Ayudante | X | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | | |
| Emilio Tarapuez | Ayudante | X | X | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Emilio Tarapuez | |
| Kevin Yesid Carlosama | Oficial | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 1-08-2026 | Kevin carlosama | |
| Yonny Martinez | Ayudante | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Yony Martinez | |
| Luis Armando Carlosama | Maestro | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 1-08-2026 | Luis Carlosama | |
| Jose Hugo Oliva | Ayudante | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Jose Hugo Oliva | |
| Leonardo Henry Mera | Ayudante | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Leonardo Henry Mera | |
| Marco Aurelio Perez | Ayudante | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | 13-07-2026 | Marco Aurelio Perez | |
| Cristian Tarapuez | Ayudante | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | 1-08-2026 | Cristian Tarapuez | |
| Edwin Dario Luna | Ayudante | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | 1-08-2026 | | |
| Gerlin Vallejo | Oficial | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | 1-08-2026 | Gerlin Vallejo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma Profesional :

# ANEXO 24

# INSPECCIONES DE USO DE EPP.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO FIEPP |
|---|---|---|
| "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | | FECHA 22-07-2025 |
| | | VERSION 1 |
| INSPECCIÓN AL USO Y ESTADO DE LOS EPP | | PAGINA 1 DE 1 |

| NOMBRE DEL INSPECTOR | Karol Rosero | CARGO | Prof. SST |
|---|---|---|---|
| | FECHA INSPECCIÓN | 31 07 2026 | |

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

| Nombre y Apellido | Cédula | Cargo | CONDICION | ELEMENTO: Casco | Guantes de carnaza | Guantes anticorte | chaleco | Gafas | Protectores auditivos | Botas de caucho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Tarapuez | Ayud | 5345830 | c | B | R | - | B | B | B | - | EPP con 3 semanas de uso, cierto desgaste en guantes |
| | | | • | B | R | - | B | B | B | - | |
| Ricardo Pulzara | Ayud | 1087422466 | c | B | R | - | B | B | B | - | |
| | | | • | B | R | - | B | B | B | - | |
| Angel M. Acosta | Maestr | 97394451 | c | B | R | - | B | B | B | - | |
| | | | • | B | R | - | B | B | B | - | |
| Yonny Martinez | Ayud | 98138288 | c | B | R | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Alvaro G. Perez | Ayud | 13062928 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Gerardo Mena | Ayud. | 5344580 | c | B | R | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | R | - | B | B | - | - | |
| Jose Hugo Otiva | Ayud. | 5344726 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |

FIRMA INSPECTOR

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO FIEPP |
|---|---|---|
| "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | | FECHA 22-07-2025 |
| | | VERSION 1 |
| INSPECCIÓN AL USO Y ESTADO DE LOS EPP | | PAGINA 1 DE 1 |

| NOMBRE DEL INSPECTOR | Ecval Rosero | CARGO | Sst. SST |
|---|---|---|---|
| | FECHA INSPECCIÓN | 24 07 2026 | |

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

| Nombre y Apellido | Cédula | Cargo | | ELEMENTO | | | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONDICIÓN | Casco | Guantes de carnaza | Guantes anticorte | chaleco | Gafas | Protectores auditivos | botas de caucho | |
| Gerardo Mena | Ay. | 5344580 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Alvaro G. Perez | Ay. | 13062928 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Emilio Tarapuez | Ay | 5345830 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Ricardo Bolzara | Ay | 1087424466 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Jose Hugo Oliva | Ay. | 5344726 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Yonny Martinez | Ay | 9138298 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| Angel M. Acosta | Maestro | 98394451 | C | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | U | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |
| | | | C | | | | | | | | |
| | | | U | | | | | | | | |

FIRMA INSPECTOR

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CODIGO FIEPP |
|---|---|---|
| "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | | FECHA 22-07-2025 |
| | | VERSION 1 |
| INSPECCIÓN AL USO Y ESTADO DE LOS EPP | | PAGINA 1 DE 1 |

| NOMBRE DEL INSPECTOR | Karol Acosta | CARGO | Prof. SST |
|---|---|---|---|
| | FECHA INSPECCIÓN | 17 / 03 / 2026 | |

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

| Nombre y Apellido | Cédula | Cargo | CONDICION | ELEMENTO: Casco | Guantes de carnaza | Guantes anticorte | chaleco | Gafas | Protectores auditivos | Botas de caucho | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Pulzara | Ayudante | 1087424466 | c | B | B | - | B | B | - | - | EPP con 1 semana de uso en buenas condiciones |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Jose Hugo Oliva | Ayudante | 5344426 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Angel M. Acosta | Maestro | 9839451 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Alvaro G. Perez | Ayudante | 13062428 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Emilio Tarapuez | Ayudante | 5345830 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Yonny Martinez | Ayudante | 98138288 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| Gerardo Mena | Ayudante | 5344580 | c | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | • | B | B | - | B | B | - | - | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | c | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |

FIRMA INSPECTOR

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

# ANEXO 25
# MEDEVAC ACTUALIZADO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

**FORMATO MEDEVAC**

**PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO**

**PLAN DE EMERGENCIA**

| MUNICIPIO: | SAPUYES, NARIÑO | "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | CONTRATO: 0-2020-1723-235400 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN OBRA**

| Nº | NOMBRE | F. DE NACIMIENTO | FECHA EXP. CEDULA | ID | CARGO | R.H | TELEFONO | ENTRENADO EN PRIMEROS AUXILIOS | EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR A | TELEFONO | EPS | ALERGIAS Y/O MEDICAMENTOS PERMANENTES | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Maria Agreda | 9-02-1971 | 20-06-1994 | 98393451 | Maestro | O+ | 3122015716 | si | Alexander Builes | 3107960515 | N. EPS | No | |
| 2 | Jose Hugo Oliva | 8-02-1969 | 31-03-1989 | 5344726 | Ayudante | O- | 3226044943 | - | Stiven Oliva | 3154384540 | Sanitas | No | |
| 3 | Alvaro Gualdo Pantoja | 12-11-1969 | 31-10-1989 | 13062928 | Ayudante | O+ | 3147031518 | - | Ana Lopez | 3147031518 | Hallamos | No | |
| 4 | Ricardo Fabian Polzara | 25-05-97 | 6-08-2015 | 1087424466 | Ayudante | | 3205329123 | si | Oscar Polzara | 3227452763 | EMSANAR | No | |
| 5 | Alexander Emilio Tarapues | 06-01-1988 | 26-04-2003 | 5345837 | Ayudante | O+ | 3127304000 | - | Yaneth Coral | 3122091523 | Sanitas | NO | |
| 6 | Yonny Daniel Martinez | 24-08-1992 | 8-02-2002 | 98193238 | Ayudante | O+ | 3164119525 | si | Martha Pircan | 3001534615 | Emsanar | No | |
| 7 | Gerardo Henry Meza | 27-11-1956 | 24-03-1975 | 5344580 | Ayudante | O+ | 3146226469 | - | Maria Cortez | 3146037431 | Hallamos | No | |
| 8 | Luis Armando Carlosama | 4-06-1969 | 29-90-1993 | 98391342 | Maestro | A+ | 3112325127 | - | Lucy Oliva | 3217085522 | Emsanar | No | |
| 9 | Kevin Yesid Carlosama | 17-05-1999 | 20-11-2017 | 1010148457 | Oficial | A+ | 3214078312 | - | Luis Carlosama | 3112325128 | Emsanar | No | |
| 10 | Cristian Alejandro Tuc | 14-05-2011 | 20-11-2017 | 1087419206 | Ayudante | O+ | 3234587878 | - | Emilio Tarapues | 3127304002 | Emsanar | No | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |

**INFORMACIÓN DE LOS CENTROS MEDICOS CERCANOS**

| ENTIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN | BARRIO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de salud El Espino y Centro de salud Sapuyes ESE Hospital San Jose del Tuquerres ESE | primario (nivel I) nivel II (complejidad media) | Sapuyes Tuquerres | (CIRCA) El Salado (CLL 23 No 14-52 | 315 777 9334 7258470 | El Espino Los Alcazares |

**INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

| ORGANISMO DE ATENCIÓN | DESCRIPCIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN | BARRIO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARL SURA | Reporte de accidente de trabajo | PASTO | | | 5214713288 |
| POLICIA NACIONAL | Atención de emergencias de orden público, robos, movilidad | SAPUYES | Carrera 28, Los Cuadros | | |
| DEFENSA CIVIL | Rescate de personas, evacuación | SAPUYES | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA | Reparación de redes eléctricas, alumbrado público | SAPUYES | | | |
| TRANSITO | Protección del uso del espacio público | SAPUYES | | | |

# ANEXO 26
# INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | SISTEMA PROCESOS DE APOYO | CODIGO |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN | PAGINA 1 DE 1 |

| 1. INFORMACION GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA/LUGAR: | Frente de obra / Oficina / Almacen | | | | |
| Fecha de Inspección | 25 | 01 | 2026 | Responsable | Karol Rosero |

**Marque con una equis(X) según corresponda**

| 2. ASPECTOS A VERIFICAR | Lunes | | Martes | | Miércoles | | Jueves | | Viernes | | Sábado | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| Hay señales informativas y preventivas en la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay carteles que recuerden la importancia de utilizar los EPP en la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay carteles que induzcan a mantener las áreas de trabajo ordenadas y limpias | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales de prohibido fumar en la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Están demarcadas las zonas donde se encuentran el extintor dentro de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Están demarcadas las zonas donde se encuentra la camilla dentro de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Están demarcadas la zona donde se encuentra el punto ecológico dentro de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Están demarcadas las áreas de trabajo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales en las áreas de almacenamiento donde hay sustancias, grasas, aceites o productos inflamables dentro de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales preventivas en las zonas de alto riesgo dentro de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales de información para el personal que ingresa o es ajeno a la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales de entrada y salida de vehículo pesado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Hay señales de inicio y fin de la obra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| En el caso de que se esté realizando trabajo en excavación, en el lugar se cuentan con avisos y cintas adecuadas para el aislamiento. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

Residente SST

| UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES | PROCESO DE APOYO | CODIGO |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA |
| | | VERSION 1 |
| | INSPECCIÓN LOCATIVA | PAGINA 1 DE 1 |

| Fecha inspección: | 29/04/26 | Nombre de inspector: | Karol Ruyero |
|---|---|---|---|

| Ítem | Aspectos a inspeccionar | Si | No | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SEÑALIZACIÓN** | | | | |
| 1.1 | Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas | X | | | |
| 1.2 | Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas | X | | | |
| 1.3 | Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados | X | | | |
| 1.4 | La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado | X | | | |
| **Ítem** | **Aspectos a inspeccionar** | **Si** | **No** | **N/A** | **Observaciones** |
| 2 | **ORDEN Y ASEO** | | | | |
| 2.1 | Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas | X | | | |
| 2.2 | Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes | X | | | |
| 2.3 | Existen recipientes para disposición de residuos | | | | |
| 2.4 | El nivel de iluminación es adecuado | X | | | |
| 2.5 | La ventilación es adecuada | X | | | |
| **Ítem** | **Aspectos a inspeccionar** | **Si** | **No** | **N/A** | **Observaciones** |
| 4 | **EQUIPO DE EMERGENCIA** | | | | |
| 4.1 | Se cuenta con botiquines en un número suficiente | X | | | |
| 4.2 | Se cuenta con extintores en un número suficiente | X | | | |

| Firma Inspector: | |
|---|---|

## SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO * | | | | | | | | | | FECHA | |
| FORMATO DE INSPECCIÓN BOTIQUIN Y CAMILLA | | | | | | | | | | VERSION 1 | |
| | | | | | | | | | | PAGINAS 1 DE 1 | |
| ÁREA: | Oficina / Almacen | | UBICACIÓN DEL BOTIQUIN | | | Oficina | | | | Nº DE INSPECCIÓN | 1 |
| FECHA INSPECCIÓN: | | | | | DIA | 31 | MES | 07 | AÑO | | 2026 |
| RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | Karol Rosero | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN: | SI | X | NO | | FACIL ACCESO | | SI | X | NO | | |

DILIGENCIA ESTE FORMATO MARCANDO SEGÚN CORRESPONDA

**INSPECCION DE BOTIQUIN**

| DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | CANT | ESTADO | | FECHA VENCIMIENTO (SI Aplica) | | | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bueno | Malo | Día | Mes | Año | | |
| Guantes latex | 10 | X | | | | | | |
| Gasas 10x10 cm | 20 | X | | | | | | |
| Apositos Adhesivos | 30 | X | | | | | | |
| Venda elastica 2" | 2 | X | | | | | | |
| Venda elastica 3" | 2 | X | | | | | | |
| Venda de gasa 5cm | 2 | X | | | | | | |
| Venta de gasa 10cm | 2 | X | | | | | | |
| Esparadrapo tela 2" | 2 | X | | | | | | |
| Microporo 1" | 1 | X | | | | | | |
| Algodon | 1 | X | | | | | | |
| Solucion salina | 2 | X | | | | | | |
| Antiseptico | 1 | X | | | | | | |
| Tijeras | 1 | X | | | | | | |
| Pinza de pantalina | 1 | X | | | | | | |
| Termometro | 1 | X | | | | | | |
| Compresa fria | 2 | X | | | | | | |
| Manta termica | 1 | X | | | | | | |
| Mascarilla RCP | 1 | X | | | | | | |
| Toallitas desechable | 10 | X | | | | | | |
| Bolsa residuo biosanitar. | 5 | X | | | | | | |
| Linterna | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**INSPECCION DE CAMILLA**

| DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Estado general | X | | |
| Arnés | X | | |
| Inmovilizadores extremidades superiores | X | | |
| Inmovilizadores extremidades inferiores | X | | |
| Cuello inmovilizador cervical tipo AMBU | X | | |
| FIRMA DEL RESPONSABLE | | | |
| CARGO | Profesional SST | | |

| SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES |
|---|---|
| "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO " | FECHA |
| | VERSION 7 |
| FORMATO DE INSPECCIÓN EXTINTOR | PAGINAS 1 DE 1 |

| | |
|---|---|
| ÁREA: | Oficina / Almacen |
| FECHA INSPECCIÓN: | 31-07-2028 — Nº INSPECCIÓN: 1 |
| RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | Karol Roseso |
| DILIGENCIAR ESTE FORMATO A MÁQUINA O LETRA IMPRENTA LEGIBLE Y CLARA, SIN BORRONES NI TACHONES Y EN ESFERO DE TINTA NEGRA | |

| ITEM | TIPO DE EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA RECARGA | | UBICACIÓN | ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACTUAL | PROXIMA | | PRESION | | SELLO DE SEGURIDAD | | MANOMETRO | | VALVULA | | MANGUERA | | BOQUILLA | | PASADOR | | SOPORTE | | MANIJA | | ESCRIBIR | | PINTURA | | SEÑALIZACION | | DEMARCACION | |
| | | | | | | B | M | S | N | B | M | B | M | B | M | B | M | S | N | S | N | B | M | B | M | S | N | S | N | S | N | |
| 1 | ABC | 10 Lb | — | — | oficina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | · | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: SI EL EXTINTOR ES DEVUELTO ESPECIFIQUE LA FECHA

B: BUENO M: MALO S : SI TIENE N: NO TIENE

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARGO Profesional SST

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

UNIÓN TEMPORAL
DESAROLLO SAPUYES

# ANEXO 27

# INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL JULIO.

Calle 2 No. 26-130 Torre Maya Apto 102
ut.desarrollosapuyes@gmail.com
3127607845

**FORMATO INDICADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMO**

**" CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y COSNTRUCCIÒN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA " PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO "**

**GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSST)**

Objetivo: El Formato de Indicadores de accidentes de trabajo y ausentismo es una evidencia del Procedimiento para el reporte, Investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades laborales; tiene como proposito realizar el análisis de los indicadores de accidentalidad y ausentiso con el fin de establecer las medidas de intervención necesarias.

**AREA QUE SE DESEA EVALUAR**

| MES | NÚMERO DE TRABAJADORES | DÍAS DE INCAPACIDAD | | | HORAS HOMBRE TRABAJADAS MES | DÍAS DE INACAPACIDAD | NÚMERO DE ACCIDENTES | INDICADORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMEDAD COMÚN | ACCIDENTE DE TRABAJO | ENFERMEDAD LABORAL | | | | INDICE DE AUSENTISMO | INDICE DE FRECUENCIA | INDICE DE SEVERIDAD | INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES | TASA DE ACCIDENTALIDAD |
| JULIO | 11 | 0 | 0 | 0 | 209572 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0 | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | | 0 | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | | 0 | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | | 0 | | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO | 11 | | | | 209572 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| ÍNDICE | SIGLA | MÉTODO |
|---|---|---|
| ÍNDICE DE FRECUENCIA | IF | NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERÍODO X K / HORAS HOMBRE TRABAJADA EN EL PERÍODO |
| ÍNDICE DE SEVERIDAD | IS | NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS O CARGADOS EN EL PERÍODO X K / HORAS HOMBRE TRABAJADA EN EL PERÍODO |
| ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES | ILI | ÍNDICE DE FRECUENCIA X ÍNDICE DE SEVERIDAD / 1000 |
| TASA DE ACCIDENTALIDAD | TA | NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PERIODO X 100 / SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES |
| CONSTANTE | K | 240000 |
| ÍNDICE DE AUSENTISMO | IA | TOTAL DE DÍAS PERDIDOS O CARGADOS POR INCAPACIDAD X 100 / DÍAS TRABAJADOS EN EL PERÍODO |

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

**SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA**
(CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD)

**PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INFORME: | 31/07/2026 | TIPO DE INFORME: | Aprobado Inicial / ~~Parcial~~ / Final | **INFORME DE INTERVENTORÍA N°:** | 1 | PERÍODO DEL | 6/07/2026 |
| | | | | | | AL | 31/07/2026 |
| | | | | **ETAPA:** | II - EJECUCION DE OBRA | | |
| N° DE CONTRATO DE OBRA: | LP-2025-002 | OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | | **DEPARTAMENTO** | NARIÑO |
| CONTRATISTA DE OBRA: | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES - R.L. ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA | RESIDENTE DE OBRA | ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES | | | **MUNICIPIO** | SAPUYES, CORREGIMIENTO DE EL ESPINO |
| N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CM-2026-001 | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | | | **LOCALIZACION** | UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE IPIALES |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO C&L SAPUYES - R.L. ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO | | | **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES (NAR.) - R.L. LEYDI YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES |

| N° | Actividad / Prueba ó Ensayo | Norma que aplica | Variable de control | Método de control | Criterio de aceptabiliad | Frecuencia de control | Responsable del control | Registro de Verificación | Ubicación | Fecha de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Excavaciones | ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Cualquier otra vigentes o aquellas que la modifiquen | Volumenes de material excavado con base en dimensiones de los estudios y diseños | Cuantificacion en campo de acuerdo a estudios y diseños | Dimensiones de las excavaciones de acuerdo a tolerancias dentro de los rangos permitidos<br>Retiro del material especificado en el estudio de suelos y de conformidad con el diseños estructural de la cimentacion<br>Material de prestamo acorde a lo especificado en estudios y diseños, con la compactacion segun corresponda | Semanal | Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas | **Anexo C-1** | 31/07/2026 | SE ANEXA REGISRO FOTOGRÁFICO, UBICADO EN EL ANEXO C-1. |
| **BASES, SUB BASE Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Relleno con Recebo y Subbase | ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS 2022<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Cualquier otra vigentes o aquellas que la modifiquen | Tipo y calidad del material; granulometría<br>Contenido de humedad<br>Espesor de capas<br>Niveles y pendientes<br>Densidad y grado de compactación<br>Dimensiones y cotas finales | Inspección visual del material y verificación de certificados<br>Control de cotas, espesores, niveles y pendientes<br>Ensayo de compactación de laboratorio y determinación de densidad en campo<br>Verificación de la colocación y compactación por capas | Material conforme al estudio de suelos y diseño estructural, planos y especificaciones<br>Para subbase granular clase C, cuando aplique el Art. 320 INVÍAS, grado de compactación GCI(90) ≥ 95 %; espesor medio no inferior al de diseño y espesor individual conforme a las tolerancias establecidas<br>Superficie uniforme, sin segregaciones, deformaciones o zonas blandas. | Durante la ejecucion de la actividad | Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas<br>Resultados de ensayos de densidad y compactación<br>Certificados de calidad del material<br>Registro fotográfico | **Anexo C-2** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| **ESTRUCTURA Y CONCRETOS** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Elementos en Concreto | NSR 10<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Geometria, pendiente y alineacion acorde al diseño estructural<br>Verificacion de la resistencia y asentamiento del concreto<br>Cumplimiento del recubrimiento minimo al acero de refuerzo<br>Deflexiones y fisuras posterior a la fundicion<br>Cumplimiento en profundidad de desplante<br>Calidad en los procesos de fundicion, encofrado, desencofrado, curado del concreto y cualquier otro que asegure la calidad del elemento fundido | Verificacion de geometria, pendiente y alineacion del elemento<br>Toma de muestras para ensayos de asentamiento y resistencia de concreto<br>Inspeccion del proceso constructivo, calidad de materiales y demas<br>Verificacion visual por parte del inspector de interventoria | Geometria, pendiente y alineacion con tolerancias dentro de la desviacion maxima permitida<br>Conformidad de resultados de ensayos de laboratorio de acuerdo a valores de diseño<br>Ausencia de fisuras, grietas y daños de afectacion estructural<br>Cumplimiento de especificaciones tecnicas en los procesos constructivos y recomendaciones suministradas por la interventoria | Semanal | Residente de Interventoria<br>Asesor Estructural<br>Inspectores de Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas<br>Resultados de ensayos de laboratorio y registro fotografico de la toma de la muestra en sitio | **Anexo C-3** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| 4 | Elementos Metalicos | NSR 10<br>NTC 5832<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Disposicion, despiece, cuantia, empalmes, dimensiones de ganchos | Inspeccion visual<br>Medicion de geometria, disposicion, despiece, empalmes, entre otros<br>Certificados de calidad | Cumplimiento de despieces de acuerdo a los estudios y diseños estructurales<br>Elementos almacenados correctamente y sin presencia de corrosion | Semanal | Residente de Interventoria<br>Asesor Estructural<br>Inspectores de Interventoria | Compilado de certificados de calidad de los lotes con sus respectivos ensayos de laboratorio por parte del fabricante<br>Reporte de cantidades ejecutadas con previa aprobacion de interventoria | **Anexo C-4** | EN EJECUCION | SE ANEXA REGISRO FOTOGRÁFICO, UBICADO EN EL ANEXO C-4. |
| **PLACAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Placa de Contrapiso, Rampa de Acceso | NSR 10<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto | Espesor de placa<br>Geometria, niveles, pendientes de la rampa, alineación<br>Resistencia especificada del concreto, condiciones de fundicion, vibrado y acabado, juntas, curado, fisuras y estado superficial | Verificación dimensional<br>Inspección del armado y formaleta cuando corresponda según planos<br>Toma de muestras para asentamiento y cilindros<br>Inspección del proceso de colocación, vibrado, acabado y curado<br>Inspección visual posterior y control de fisuras. | Espesor, dimensiones, niveles y pendientes conforme a planos y especificaciones<br>Concreto con resistencia de diseño 3000 PSI<br>Resultados de resistencia conformes con los criterios de aceptación del proyecto/NSR-10<br>Superficie uniforme, sin segregación, hormigueros, fisuras o daños que afecten su desempeño. | Durante la ejecucion de la actividad y despues de la fundicion | Residente de Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas<br>Resultados de ensayos de laboratorio y registro fotografico de la toma de la muestra en sitio | **Anexo C-5** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| **MAMPOSTERIA Y REPELLOS** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Divisiones, Repellos entre otros. | NSR 10<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Correcto suministro de los materiales y ejecución teniendo en cuenta los lineamientos y detalles indicados en los planos arquitectonicos y en le presupuesto de obra. | Verificación del material y unidades de medida con respecto al diseño. | Verificación de las especificaciones y calidad de los materiales conforme a los detalles arquitectonicos.<br>Cumplimiento de las dimensiones contempladas en el diseño. | Durante la ejecucion de la actividad | Residente de Interventoria<br>Inspectores de Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas y verificación de las mismas mediante actividades de medición realizadas por la interventoria. | **Anexo C-6** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| **ENCHAPES** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Acabados, Enchapes, Pinturas, entre otros. | NTC 4294<br>NTC 5828<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Coincidencia de material, geometria y disposicion con respecto a los planos y diseños arquitectonicos | Verificación de coincidencia del material, geometria y disposicion con respecto a los planos y diseños arquitectonicos<br>Certificados de calidad de materiales | Conformidad de color, textura y material con los estudios y diseños arquitectonicos<br>Comprobacion de tolerancias geometricas, de desniveles, juntas, adherencia y cualquier detecto superficial, estanqueidad o humedad en el sustrato. | Durante y despues de la ejecucion de la actividad | Residente de Interventoria<br>Inspectores de Interventoria | Recepcion de materiales de acuerdo a los estudios y diseños arquitectonicos<br>Certificados de calidad de los materiales empleados<br>Reporte de cantidades ejecutadas con previa aprobacion de interventoria | **Anexo C-7** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRA**<br>(CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD)<br>**PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos** | | | | | | | | | |
| FECHA DE INFORME: | 31/07/2026 | TIPO DE INFORME: | Aprobado Inicial<br>~~Ajustado~~<br>Final | **INFORME DE INTERVENTORÍA N°:** | 1 | PERÍODO DEL<br>AL | 6/07/2026<br>31/07/2026 | | | | |
| | | | | **ETAPA:** | II - EJECUCION DE OBRA | | | | | | |
| N° DE CONTRATO DE OBRA: | LP-2025-002 | OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | | **DEPARTAMENTO** | NARIÑO | | | | |
| CONTRATISTA DE OBRA: | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES - R.L. ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA | RESIDENTE DE OBRA | ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES | | | **MUNICIPIO** | SAPUYES, CORREGIMIENTO DE EL ESPINO | | | | |
| N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CM-2026-001 | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" | | | **LOCALIZACION** | UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE IPIALES | | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO C&L SAPUYES - R.L.<br>ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO | | | **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAPUYES (NAR.) - R.L. LEYDI YAQUELINE RODRIGUEZ MENESES | | | | |
| **COMPONENTE HIDROSANITARIO** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Elementos de Instalaciones Sanitarias | NTC 1500<br>NTC 4457<br>NTC 5761<br>RESOLUCION 0330 DE 2017 - MinVivienda<br>RESOLUCION 0799 DE 2021 - MinVivienda<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Ubicación de pendiente y alineacion acorde al diseño hidrosanitario.<br>Verificar el tipo y diametro de los elementos instalados.<br>Seguimiento y control a la actividad de conexión de la red, cumpliendo con las especificaciones del diseño.<br>Cumplimiento de los niveles según los planos y especificaciones. | Inspección visual y fotografica con respecto a los diseños hidrosanitarios.<br>Pruebas y ensayos para verificar el estado y funcionabilidad de los elementos.<br>Certificados de calidad de los materiales. | Cumplimiento de la norma que garantice su correcta nivelación, fijación y funcionamiento.<br>Cumplimiento de las especificaciones según los certificados de calidad de los materiales. | Durante la ejecución de la actividad | Especialista Hidrosanitario | Reporte de cantidades ejecutadas<br>Resultados de pruebas y ensayos realizados en sitio. | **Anexo C-8** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| 9 | Elementos de Instalaciones Hidraulicas | NTC 1500<br>NTC 5123<br>RESOLUCION 0330 DE 2017 - MinVivienda<br>RESOLUCION 0799 DE 2021 - MinVivienda<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Verificar la correcta ubicación, alineación y nivelación según los panos y especificaciones.<br>Coincidencia de los diametros y deimensiones de los elementos relacionados en el diseño hidraulico.<br>Verificar pendientes minimas que garanticen el correcto fiujo. | Inspección visual de los materiales suministrados.<br>Registro fotografico de las pruebas realizadas a los elementos empleados.<br>Verificación del trazado y ubicación de las tuberías y accesorios correspondientes a las especificaciones del diseño. | Coincidencia con los planos y especificaciones comprobando su correcto funcionamiento.<br>Cumplimiento con lo establecido en la normatividad relacionada.<br>Cumplimiento de las especificaciones según los certificados de calidad de los materiales. | Durante la ejecución de la actividad | Especialista Hidrosanitario | Reporte de cantidades ejecutadas | **Anexo C-9** | EN EJECUCION | SE ANEXA REGISRO FOTOGRÁFICO, UBICADO EN EL ANEXO C-9. |
| **COMPONENTE ELECTRICO** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Alumbrado Público | RETIE vigente<br>NTC 5536<br>RETILAP vigente<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Concordancia en diametros y tipo de conductor.<br>Disposición de ductos, canalizaciones, empalmes electricos, cuantia de elementos instalados, medicion de resistencia, señalización y accesibilidad para mantenimiento. | Inspeccón visual y medición.<br>Verificación en campo según planos y meoria tecnica del componente. | Cumplimiento de los diseños, memorias y especificaciones técnicas.<br>Aseguramiento del funcionamiento del sistema y equipos eléctricos.<br>Certificación del buen uso de materiales, sin daños ni defectos visibles. | Durante y despues de la ejecucion de la actividad | Ingeniero electrico | Registro fotografico de la ejecución de las actividades de instalación.<br>Certificados de ensayo para verificar la resistencia y función de los elementos.<br>Reporte de cantidades ejecutadas y verificadas por el equipo de interventoria. | **Anexo C-10** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Carpinterías Metalicas y de Madera, entre otros. | NTC 4294<br>NTC 2500<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto<br>Vigentes o aquellas que la modifiquen | Cumplimiento en las dimensiones referenciadas en los planos de detalle arquitectonico. | Verificación de las especificaciones del material, dimensiones y detalles según el diseño arquitectonico | Corcondancia con la tonalidad, textura y acabado según el tipo de material y respetando los parametros superficiales requeridos según las especificaciones mencionadas en los diseños arquitectonicos.<br>Revisión e las posibles inconsistencias para posteriormente validar su calidad, funcionalidad y estetica.<br>Compromación de medidas, alineación y nivelación de los elementos. | Durante y despues de la ejecucion de la actividad | Residente de Interventoria<br>Inspectores de Interventoria | Recolección de los certificados de calidad de los materiales adquiridos, Control del suministro del material en obra y verificación del estado antes de utilizarse.<br>Registro de cantidades revisadas y aprobadas previamente por parte de la interventoría. | **Anexo C-11** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |
| **URBANISMO Y OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Elementos de Urbanismo, Accesibilidad y Filtro Perimetral | NTC 6047<br>NTC 5610<br>NTC 4279<br>Especificaciones Tecnicas del Proyecto | Localización, dimensiones, niveles, pendientes y alineación<br>Calidad y caracteristicas de adoquines y losetas podotáctiles<br>Continuidad y accesibilidad de circulaciones<br>Estabilidad y anclaje de mobiliario y juegos biosaludables<br>Dimensiones y acabado de pista de trote<br>Localización y correcta instalación del sistema de drenaje<br>Características del geocompuesto; funcionamiento y evacuación del agua. | Inspección visual y medición en campo<br>Verificación de niveles, pendientes, alineación y dimensiones<br>Revisión de certificados y fichas técnicas<br>Inspección de anclajes y elementos de fijación<br>Verificación de continuidad de las rutas accesibles<br>Inspección de colocación, traslapos, uniones y protección del geocompuesto. | Correspondencia con planos, diseños y especificaciones<br>Elementos correctamente alineados, nivelados, fijados y sin daños<br>Superficies peatonales uniformes, estables y sin obstáculos<br>Losetas guía y alerta correctamente ubicadas y continuas<br>Juegos biosaludables firmemente anclados y funcionales<br>Pista de trote con geometría, pendiente y acabado conforme al diseño<br>Geocompuesto instalado de acuerdo con ficha técnica y especificaciones, garantizando continuidad y adecuada conducción/drenaje del agua. | Durante la ejecución y después de terminada cada actividad | Residente de Interventoria | Reporte de cantidades ejecutadas y verificadas<br>Certificados de calidad<br>Fichas técnicas<br>Registro fotográfico<br>Actas o formatos de inspección y pruebas funcionales. | **Anexo C-12** | SIN INICIAR | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DURANTE EN EL PRESENTE MES |

**Nota 1** Las verificaciones consideradas anteriormente no eximen al interventor y al contratista de realizar los controles a las actividades complementarias necesarias para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su pertinencia y a otras actividades que no estén contempladas en el listado, con base en la normatividad vigente, criterio del interventor y/o el contrato de Interventoría.

| **APROBADO POR : (Interventoría)** | **NOMBRES** | **APELLIDOS** | **CARGO** | **ENTIDAD** | **FIRMA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | JHONNY MAURICIO | ROSERO CARPIO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | INTERVENTOR - CONSORCIO C&L SAPUYES - R.L.<br>ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO C & L SAPUYES | **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD**<br>**ANEXO C-1 EXCAVACIONES** | UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES |

N° DE CONTRATO DE OBRA: LP-2025-002

N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM-2026-001

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

FECHA: 31 DE JULIO DE 2026

PERIODO: 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

MUNICIPIO: SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO

SECTOR: EDIFICACIONES

FASE: CONSTRUCTIVA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Texto explicativo de la fotografia:** En el periodo comprendido, el contratista de obra ejecuto las excavaciones de la cimentacion, incluyendo zapatas y vigas de cimentacion. Las excavaciones se realizaron conforme a las dimensiones y profundidad necesarias para la ejecucion de la cimentacion.

Adicionalmente, se realizaron las excavaciones para la instalacion de tuberia de aguas lluvias, se verifico las profundidades de excavacion asi como las pendientes para la instalacion de la tuberia.

A continuación, se detallan las imagenes que explican los procesos constructivos realizados en campo, los cuales fueron supervisados por parte de la interventoría, dando cumplimiento al seguimiento y control de las actividades:





Observación:
Por parte de la interventoría se llevó a cabo la verificación de las actividades ejecutadas, constatando que estas se realizaran conforme a los alcances establecidos.

ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO C & L SAPUYES | **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| | **ANEXO C-4 ELEMENTOS METALICOS** | |

N° DE CONTRATO DE OBRA: LP-2025-002

N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM-2026-001

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

FECHA: 31 DE JULIO DE 2026

PERIODO: 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

MUNICIPIO: SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO


SECTOR: EDIFICACIONES

FASE: CONSTRUCTIVA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Texto explicativo de la fotografía:** Se evidencia el avance en el suministro, corte, figurado y armado de acero de refuerzo. Este elemento de acero fue destinado a las parrillas de refuerzo para las zapatas, se verificaron las cuantias, separacion, distribucion, longitudes, diametros, alineacion y recubrimiento de los elementos armados conforme a los diseños estructurales y sus detalles tras la implantacion en campo.



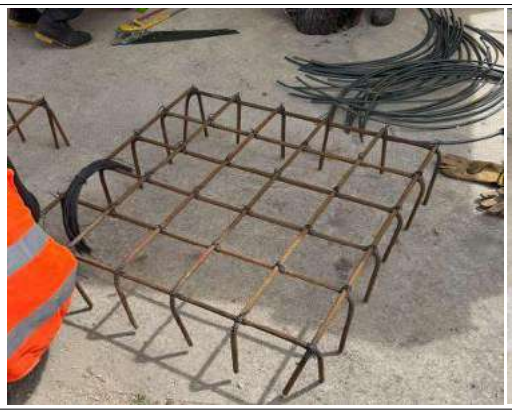



Observación:

Se revisó que lo elementos de refuerzo garantice y cumplan on los requisitos de calidad, resistencia y geometría necesarios para la correcta ejecución de la cimentación y demas elementos estructurales.

ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA
Sucursal:
Ciudad: Yumbo
Dirección: .
Remisiones: 490161,

CDP#: 398138
Placa: LFL345
Tiquete: 183.792
Despacho: 163.077
Tren: POMINI

Fecha Impresión: sábado, 18 de abril de 2026

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

- Chipa 3/8 -

**Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm**

**Area Nom. (mm2)** 71,00 **Designación:** 3 **Norma** NTC-2289
**Marcado:** COL SO 3 W 60 **Grado:** 60 (420)

| | | | PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | | | | | | CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Recepción y Ensayo | N° Reg Físico | Colada | Esfuerzo Fluencia [Mpa] | Esfuerzo Máximo [Mpa] | Relación [Rm/Rf] | % de Elong | Doblado | Peso Lineal [Kg/m] | Altura del Resalte [mm] | Espa entre Resaltes [mm] | Ángulo del Resalte [°] | Separación Resaltes [mm] | N° Reg Químico | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Nb | %Cu | %Ni | %Cr | %Mo | %V | %CE |
| 11/04/2026 | 143311 | 49685 | 430 | 602 | 1,40 | 18,40 | Sin grieta | 0,551 | 0,54 | 6,30 | 53 | 1,46 | 333.277 | 0,278 | 0,950 | 0,012 | 0,033 | 0,160 | 0,002 | 0,200 | 0,060 | 0,110 | 0,016 | 0,026 | 0,452 |
| 11/04/2026 | 143293 | 49849 | 454 | 630 | 1,39 | 18,70 | Sin grieta | 0,548 | 0,69 | 6,30 | 53 | 1,36 | 333.959 | 0,262 | 0,930 | 0,011 | 0,029 | 0,210 | 0,001 | 0,180 | 0,060 | 0,150 | 0,015 | 0,027 | 0,437 |
| 11/04/2026 | 143295 | 49852 | 432 | 611 | 1,41 | 19,00 | Sin grieta | 0,546 | 0,56 | 6,30 | 53 | 1,16 | 333.971 | 0,267 | 0,950 | 0,011 | 0,027 | 0,180 | 0,002 | 0,170 | 0,060 | 0,080 | 0,013 | 0,026 | 0,438 |
| 11/04/2026 | 143297 | 49853 | 433 | 618 | 1,43 | 17,50 | Sin grieta | 0,544 | 0,57 | 6,30 | 53 | 1,25 | 333.976 | 0,266 | 0,970 | 0,010 | 0,028 | 0,170 | 0,002 | 0,190 | 0,070 | 0,100 | 0,014 | 0,027 | 0,443 |
| Especificaciones del Producto | Minimos | 420 | 550 | 1,25 | 14 | Sin grieta | 0,526 | 0,38 | | 45 | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Maximos | 540 | | | | Con grieta | | | 6,70 | 70 | 3,60 | | 0,300 | 1,500 | 0,035 | 0,045 | 0,500 | | | | | | | 0,550 |
| | Validaciones | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | | OK | OK | OK | OK | OK | | | | | | | OK |

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".
SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

**FIN DEL REPORTE**

NEIR ARLEX MOSQUERA
Analísta Físico:

MARCELO DUARTE AZCARATE
Analísta Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:


Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **1 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | % C | % Mn | % Si | % S | % P * | % Ce | % Cr | % Ni | % Cu | % V * |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121614 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121606 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121613 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121608 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121616 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121607 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121615 | 1,980.38 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121610 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121618 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121609 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121617 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121612 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121619 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121611 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121605 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121603 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121604 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.26 | 0.90 | 0.15 | 0.023 | 0.016 | 0.43 | 0.140 | 0.055 | 0.140 | 0.003 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **2 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

**DATOS GENERALES** | **PROPIEDADES QUIMICAS**

| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | % Mo * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121614 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121606 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121613 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121608 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121616 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121607 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121615 | 1,980.38 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121610 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121618 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121609 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121617 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121612 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121619 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121611 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121605 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121603 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121604 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.010 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **3 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Resistencia Fluencia MPa | Resistencia Tracción MPa | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Fecha Ensayo |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121614 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121606 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121613 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121608 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121616 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121607 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121615 | 1,980.38 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121610 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121618 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121609 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121617 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121612 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121619 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121611 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121605 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **4 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Resistencia Fluencia MPa | Resistencia Tracción MPa | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Fecha Ensayo |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121603 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121604 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 464 | 610 | 17 | SinGrieta | 1.31 | 20250929 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **5 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Peso Metro (Masa) | Altura Resalte | Separación Extremos | Espaciamiento |
| | | | | | | Kg/m | mm | mm | mm |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121614 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121606 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121613 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121608 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121616 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121607 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121615 | 1,980.38 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121610 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121618 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121609 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121617 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121612 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121619 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121611 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121605 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121603 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: | **Ternium Colombia S.A.S.** | Página Web: | **www.ternium.com.co** |
| NIT: | **890932389-8** | | |
| Teléfono: | **01 8000 423 724** | | |
| Dirección: | **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales** | | |

**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **6 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Peso Metro (Masa) | Altura Resalte | Separación Extremos | Espaciamiento |
| | | | | | | Kg/m | mm | mm | mm |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121604 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 0.974 | 0.82 | 2.2 | 8.2 |

| DATOS GENERALES | | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Angulo Resalte |
| | | | | | | ° |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121614 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121606 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121613 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121608 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121616 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121607 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121615 | 1,980.38 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121610 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121618 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121609 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121617 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


## INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA PASTO**
Dirección: **CR 19 22 B 03 PASTO**
Teléfono: **7330511**
Fecha Impresión **25/09/29**
No. Remisión: **187243896**
Página: **7 de 9**
Informe N°: **124676**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

## DATOS GENERALES

## PROPIEDADES DIMENSIONALES

| MATERIAL | DESCRIPCION | COLADA/LOTE | PESOPQ(KG) | NORMA.PROD | FABRICANTE | Angulo Resalte ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121612 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121619 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121611 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121605 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121603 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |
| C9001212 | BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60 | A012121604 | 2,004.24 | NTC 2289 GR60 | Ternium | 61 |

## Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2024
* Doblado: NTC 2289:2020 Num. 10, NTC 3353: 2024, Num. 15, NTC 1:2024
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **8 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|
| % C | ± 0.009935 % |
| % Mn | ± 0.0125 % |
| % Si | ± 0.0200 % |
| % S | ± 0.0021 % |
| % P | ± 0.0013 % |
| % Cr | ± 0.0145 % |
| % Ni | ± 0.0071 % |
| % Cu | ± 0.0098 % |
| % V | ± 0.0009 % |
| % Nb | ± 0.0005 % |
| % Mo | ± 0.0035% |
| Resistencia a la Fluencia | ± 4.32 MPA |
| Resistencia a la Tracción | ± 4.32 MPA |
| Alargamiento | ± 0.36 % |
| Altura Resalte | ± 1 % |
| Separación entre extremos | ± 1 % |
| Espaciamiento | ± 0.15 % |

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**


**INFORMACION GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | **GYJ FERRETERIAS SA PASTO** | Fecha Impresión | **25/09/29** | Informe N°: | **124676** |
| Dirección: | **CR 19 22 B 03 PASTO** | No. Remisión: | **187243896** | Informe Ant N°: | |
| Teléfono: | **7330511** | Página: | **9 de 9** | Centro: | **Centro Planta Manizales** |

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|
| Angulo de Resalte | ± 0.09 ° |
| Peso metro (masa) | ± 0.21% |

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.**
**Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.**
**No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.**

**Autoriza**
**Sebastian Carmona Restrepo**
**Plant Quality & Laboratory Manager**

# INFORME DE ENSAYOS

**Razón Social:** Ternium del Atlantico S.A.S.
**NIT:** 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
**Teléfono:** 01 8000 423 724
**Dirección:** Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

## INFORMACIÓN GENERAL

**Cliente:** GYJ FERRETERIAS SA YUMBO
**Dirección:** CL 12 36 410 YUMBO
**Teléfono:** 6645020

**Fecha Impresión:** 2026/05/20
**Nro.Remisión:** 187359593

**Nro.Informe:** 174007
**Nro.Informe Ant:**
**Centro:** Centro Planta Atlantico

## DATOS GENERALES

| MATERIAL | DESCRIPCIÓN | COLADA/LOTE | PESO.PAQ(KG) | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002131N | 1961 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002131P | 1972 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002131Q | 1972 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002132A | 1956 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002132U | 1935 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002132X | 1977 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002132Y | 1951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS002132Z | 1961 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021377 | 1988 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021378 | 1951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021379 | 1988 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021380 | 1999 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021381 | 1956 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021382 | 1999 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021385 | 1993 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021386 | 1983 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |
| C8001354 | BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60 | BNS0021387 | 1945 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántico |

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

**Autoriza**
Sebastian Carmona Restrepo
**Plant Quality & Laboratory Manager**

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| MATERIAL | COLADA/LOTE | % C | % Mn | % Mo | % Si | % S | % P | % Cr | % Ni | % Cu | % V | % CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8001354 | BNS0021377 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021378 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021379 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021380 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021381 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021382 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021385 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021386 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS0021387 | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002131N | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002131P | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002131Q | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002132X | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002132Y | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002132Z | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002132A | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |
| C8001354 | BNS002132U | 0.28 | 0.94 | 0.014 | 0.24 | 0.021 | 0.025 | 0.220 | 0.070 | 0.18 | 0.005 | 0.46 |

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

**Autoriza**
Sebastian Carmona Restrepo
**Plant Quality & Laboratory Manager**

## PROPIEDADES FÍSICAS

| MATERIAL | COLADA/LOTE | Resistencia Fluencia MPa | Resistencia Tracción MPa | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Fecha Ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8001354 | BNS0021377 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021378 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021379 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021380 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021381 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021382 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021385 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021386 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS0021387 | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002131N | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002131P | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002131Q | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002132X | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002132Y | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002132Z | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002132A | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |
| C8001354 | BNS002132U | 505 | 656 | 17.8 | SinGrieta | 1.30 | 20260518 |

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

**Autoriza**
Sebastian Carmona Restrepo
**Plant Quality & Laboratory Manager**

## PROPIEDADES DIMENSIONALES

| MATERIAL | COLADA/LOTE | Espaciamiento mm | Peso Metro (Masa) Kg/m | Altura Resalte mm | Separación Extremos mm | Angulo Resalte ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8001354 | BNS0021377 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021378 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021379 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021380 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021381 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021382 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021385 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021386 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS0021387 | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002131N | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002131P | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002131Q | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002132X | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002132Y | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002132Z | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002132A | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |
| C8001354 | BNS002132U | 7.38 | 0.871 | 0.55 | 2.01 | 50 |

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

**Autoriza**
Sebastian Carmona Restrepo
**Plant Quality & Laboratory Manager**

## MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

**Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:**

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

| VARIABLE | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1) |
|---|---|
| Resistencia a la Fluencia | ± 2.69 MPA |
| Resistencia a la Tracción | ± 2.45 MPA |
| Alargamiento | ± 0.60 % |
| Altura Resalte | ± 2 % |
| Separación entre extremos | ± 4 % |
| Espaciamiento | ± 0.30 % |
| Angulo de Resalte | ± 0.53 ° |
| Peso metro (masa) | ± 0.20 % |

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

**Fin del Informe**

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



**Autoriza**
Sebastian Carmona Restrepo
**Plant Quality & Laboratory Manager**

**ENSAYO TRACCION ALAMBRE NEGRO RECOCIDO**
**NTC 115 VERSION 2019 NUMERAL 7.1, TABLA 1**
**METODO DE ENSAYO NTC 3353**

**CODIGO: PE-CAL-R-50**
**VERSION 1**
**VIGENTE DESDE: 15/05/2020**


DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL** ..... | CONALDESA | **NIT**..... | 805017736-7 |
| **DIRECCION** ..... | CALLE 4 TRANS 4 # 4-160 | **CIUDAD** ..... | PALMIRA |
| **DATOS DE CONTACTO** ..... | MIGUEL ANGEL URIBE | **TELEFONO MOVIL**..... | 6669038 |
| **CORREO ELECTRONICO**..... | PLANEACION.CALI@CONALDESA.COM. | **ENSAYO NUMERO** ..... | 2071 |
| **ORDEN PROD/LOTE/COLADA**... | 25G191314 | . | |

**FECHA DE REALIZACION ENSAYO** may-29-2026

**OBSERVACIONES:** RESISTENCIA A LA TRACCION MAXIMO NORMA 415 MPa

**DESIGNACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA ALAMBRE NEGRO BWG 17** **Diametro: 1.46mm.** **Area: 1.674**

**REPRESENTACION GRAFICA**




**Carga Máxima** ..... 66. Kg/mm. 386.6 MPa.

Datos del laboratorio que realiza ensayo. Los datos reportados pertenecen a las muestras ensayadas

PLANTA: COMP. NACIONAL ESTRUCTURAS Y ACEROS S.A.
DIRECCION: Calle 4 Transversal No. 4 160
Parcelación Industrial LA DOLORES
Palmira/Valle del Cauca
TELEFONO: PBX 6669038
EMAIL: calidadcdpyp@gmail.comFalso

**REALIZADO POR: NELSON RAMIREZ**
**AUXILIAR DE CALIDAD**

**VERIFICADO POR: MARTHA MORAN**
**COORDINADORA DE CALIDAD**

FIN DEL CERTIFICADO

# Certificado de calidad ECOART

Interval From 01.01.2026 00:00 To 01.02.2026 00:00 Max. Records Period Primary log values

23.02.2026 18:00:43

| | |
|---|---|
| **INFORME DE RESULTADOS**<br>**Cemento hidráulico tipo ART**<br>**INDUSTRIAL ECOPLANET** | Proveedor: Holcim Colombia S.A.<br>Planta: Nobsa:<br>Dirección: Km 15 vía Duitama - Belencito<br>Municipio: Nobsa, Boyacá, Colombia<br>Teléfono: 57 608 7730555<br>Cliente: **General** |

| Autor: Ingeniero de Control de Calidad | Revisa: Coordinador de Control de Calidad | Aprueba: Coordinador de Control de Calidad |
|---|---|---|

## Alcance

El cemento ECOART cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo ART. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento ECOART producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

**METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS**

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

**Composición Química - Oxidos (%)**

| FECHA | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | P.I. | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Mn2O3 | Cl | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 21.8 | 5.1 | 3.5 | 61.2 | 1.3 | 3.3 | 2.1 | 0.04 | 0.73 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0.08 | 100.0 |
| 14/01/2026 | 25.3 | 7.7 | 2.8 | 56.3 | 1.3 | 3.1 | 1.7 | 0.08 | 0.64 | 0.38 | 0.29 | 0.95 | 0.04 | 100.5 |
| 17/01/2026 | 25.4 | 7.8 | 2.8 | 56.2 | 1.3 | 3.3 | 1.4 | 0.05 | 0.68 | 0.37 | 0.28 | 0.96 | 0.07 | 100.5 |
| 21/01/2026 | 25.2 | 7.7 | 2.9 | 56.4 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 0.11 | 0.60 | 0.37 | 0.27 | 0.97 | 0.07 | 100.9 |
| 24/01/2026 | 25.0 | 7.7 | 2.9 | 55.8 | 1.3 | 3.5 | 2.0 | 0.10 | 0.67 | 0.36 | 0.28 | 0.98 | 0.08 | 100.6 |
| 28/01/2026 | 25.4 | 7.7 | 2.7 | 55.2 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 0.10 | 0.67 | 0.36 | 0.30 | 1.07 | 0.09 | 100.5 |
| 31/01/2026 | 24.7 | 7.0 | 2.8 | 56.5 | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.28 | 0.78 | 0.04 | 100.2 |
| Min | 21.8 | 5.1 | 2.7 | 55.2 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 0.04 | 0.60 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.04 | 100.0 |
| Max | 25.4 | 7.8 | 3.5 | 61.2 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 0.11 | 0.73 | 0.38 | 0.33 | 1.07 | 0.09 | 100.9 |
| Avg | 24.7 | 7.2 | 2.9 | 56.8 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 0.08 | 0.67 | 0.36 | 0.29 | 0.84 | 0.07 | 100.5 |
| Std | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.3 |

| | Finura | | | Fraguado Vicat | | | Resistencias a la compresión | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Blaine | Densidad | Ret. 45 um | Inicial | Final | C.Nor | 1 día | 3 días | 7 días | 28 días | A/C |
| | m2/kg | g/cm3 | % | min | min | % | MPa | MPa | MPa | MPa | % |
| 10/01/202 | 435 | 3.13 | 1.67 | 173 | 252 | 24.8 | 12.1 | 21.2 | 28.5 | 44.7 | 47.3 |
| 14/01/202 | 401 | 3.11 | 1.08 | 193 | 285 | 24.8 | 13.2 | 20.6 | 30.3 | 44.5 | 47.3 |
| 17/01/202 | 399 | 3.10 | 1.10 | 170 | 256 | 23.9 | 11.8 | 22.5 | 34.0 | 46.7 | 47.4 |
| 21/01/202 | 382 | 3.11 | 3.04 | 149 | 230 | 25.4 | 17.8 | 29.8 | 37.6 | 51.4 | 47.7 |
| 24/01/202 | 415 | 3.07 | 2.40 | 151 | 262 | 25.7 | 17.4 | 27.1 | 35.2 | 49.3 | 47.4 |
| 28/01/202 | 418 | 3.07 | 0.90 | 175 | 301 | 24.4 | 15.8 | 24.1 | 30.7 | | 45.9 |
| 31/01/202 | 434 | 3.08 | 0.88 | 146 | 252 | 24.4 | 16.6 | 27.1 | 35.8 | | 46.9 |
| Min | 382 | 3.07 | 0.88 | 146 | 230 | 23.9 | 11.8 | 20.6 | 28.5 | 44.5 | 45.9 |
| Max | 435 | 3.13 | 3.04 | 193 | 301 | 25.7 | 17.8 | 29.8 | 37.6 | 51.4 | 47.7 |
| Avg | 412 | 3.10 | 1.58 | 165 | 263 | 24.7 | 15.0 | 24.6 | 33.2 | 47.3 | 47.1 |
| Std | 19 | 0.02 | 0.84 | 17 | 23 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 0.6 |

**NTC 4927**
**Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)**

| Holcim | NTC 121 |
|---|---|
| 0.02 | Máximo 0.02% |

**NTC 224**
**Contenido de aire en mortero de cemento (%)**

| Holcim | NTC 121 |
|---|---|
| 2.0 | Máximo 12 % |

**Comentarios**

**N/D.: Resultado de ensayo no disponible.**

**Fecha de reporte:** **23.02.2026**

*Wilson Cárdenas*

**Jennifer Paola Pineda**
**Coordinador Control Calidad**
**Holcim Colombia S.A.**
**Planta Nobsa**

# Certificado de calidad Fuerte Ecoplanet

Interval From 01.01.2026 00:00 To 01.02.2026 00:00 Max. Records Period Primary log values

23.02.2026 18:04:18

| INFORME DE RESULTADOS<br>Cemento hidráulico tipo UG<br>FUERTE ECOPLANET | | |
|---|---|---|
| | Proveedor: | Holcim Colombia S.A. |
| | Planta: | Nobsa: |
| | Dirección: | Km 15 vía Duitama - Belencito |
| | Municipio: | Nobsa, Boyacá, Colombia |
| | Teléfono: | 57-8-730555 |
| | Cliente: | **General** |

| Autor: Ingeniero de Control de Calidad | Revisa: Coordinador de Control de Calidad | Aprueba: Coordinador de Control de Calidad |
|---|---|---|

## Alcance

El cemento Fuerte Ecoplanet cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento Fuerte Ecoplanet producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

**METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS**

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

**Composición Química - Oxidos (%)**

| FECHA | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | P.I. | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Cl | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 26.9 | 6.2 | 2.8 | 52.5 | 0.8 | 2.2 | 7.5 | 0.05 | 0.71 | 0.36 | 0.27 | 0.06 | 100.9 |
| 13/01/2026 | 27.6 | 6.4 | 2.9 | 51.9 | 0.9 | 2.2 | 5.7 | 0.06 | 0.72 | 0.32 | 0.29 | 0.06 | 99.7 |
| 16/01/2026 | 22.2 | 4.9 | 3.3 | 53.1 | 0.8 | 2.0 | 6.9 | 0.02 | 0.70 | 0.32 | 0.27 | 0.06 | 100.1 |
| 20/01/2026 | 27.4 | 6.3 | 2.8 | 50.8 | 0.8 | 1.9 | 7.0 | 0.13 | 0.74 | 0.33 | 0.27 | 0.11 | 99.2 |
| 27/01/2026 | 27.1 | 6.3 | 2.7 | 50.8 | 0.8 | 1.9 | 8.7 | 0.06 | 0.72 | 0.36 | 0.26 | 0.05 | 100.3 |
| 30/01/2026 | 26.2 | 6.1 | 2.6 | 51.4 | 0.8 | 2.0 | 9.8 | 0.05 | 0.73 | 0.34 | 0.26 | 0.05 | 100.8 |
| Min | 22.2 | 4.9 | 2.6 | 50.8 | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 0.02 | 0.70 | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 99.2 |
| Max | 27.6 | 6.4 | 3.3 | 53.1 | 0.9 | 2.2 | 9.8 | 0.13 | 0.74 | 0.36 | 0.29 | 0.11 | 100.9 |
| Avg | 26.2 | 6.0 | 2.9 | 51.8 | 0.8 | 2.0 | 7.6 | 0.06 | 0.72 | 0.34 | 0.27 | 0.06 | 100.2 |
| Std | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.6 |

| | Finura | | | Fraguado Vicat | | | Resistencias a la compresión | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Blaine | Densidad | Ret. 45 um | Inicial | Final | C.Nor | 1 día | 3 días | 7 días | 28 días | A/C |
| | m2/kg | g/cm3 | % | min | min | % | MPa | MPa | MPa | MPa | % |
| 06/01/2026 | 521 | 2.97 | 6.78 | 159 | 276 | 26.8 | 7.5 | 15.6 | 20.0 | 35.0 | 50.7 |
| 13/01/2026 | 462 | 3.02 | 9.26 | 172 | 280 | 25.1 | 7.9 | 15.7 | 22.9 | 33.6 | 48.9 |
| 16/01/2026 | 470 | 3.04 | 7.30 | 144 | 249 | 25.2 | 6.9 | 14.1 | 21.3 | 32.7 | 49.7 |
| 20/01/2026 | 415 | 2.97 | 8.47 | 150 | 238 | 25.2 | 6.7 | 15.2 | 20.7 | 34.4 | 50.7 |
| 27/01/2026 | 463 | 2.98 | 9.92 | 136 | 246 | 25.5 | 7.4 | 15.1 | 20.4 | | 47.3 |
| 30/01/2026 | 496 | 2.98 | 6.39 | 123 | 299 | 26.3 | 7.7 | 14.4 | 18.5 | | 50.1 |
| Min | 415 | 2.97 | 6.39 | 123 | 238 | 25.1 | 6.7 | 14.1 | 18.5 | 32.7 | 47.3 |
| Max | 521 | 3.04 | 9.92 | 172 | 299 | 26.8 | 7.9 | 15.7 | 22.9 | 35.0 | 50.7 |
| Avg | 471 | 2.99 | 8.02 | 147 | 265 | 25.7 | 7.3 | 15.0 | 20.6 | 33.9 | 49.6 |
| Std | 36 | 0.03 | 1.42 | 17 | 24 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |

**NTC 4927**
**Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)**

| Holcim | NTC 121 |
|---|---|
| 0.00 | Máximo 0.02% |

**NTC 224**
**Contenido de aire en mortero de cemento (%)**

| Holcim | NTC 121 |
|---|---|
| 5.0 | Máximo 12 % |

**Comentarios**

**N/D.: Resultado de ensayo no disponible.**

**Fecha de reporte:** 23.02.2026

*Wilson Cárdenas*

**Jennifer Paola Pineda**
**Coordinador Control Calidad**
**Holcim Colombia S.A.**
**Planta Nobsa**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO C & L SAPUYES | **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD** | UNIÓN TEMPORAL DESAROLLO SAPUYES |
| | **ANEXO C-9 ELEMENTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS** | |

N° DE CONTRATO DE OBRA: LP-2025-002

N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM-2026-001

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CORREGIMIENTO EL ESPINO, MUNICIPIO DE SAPUYES

FECHA: 31 DE JULIO DE 2026

PERIODO: 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

MUNICIPIO: SAPUYES, CORREGIMIENTO EL ESPINO

SECTOR: EDIFICACIONES

FASE: CONSTRUCTIVA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Texto explicativo de la fotografía:** Se inspecciona el suministro e instalacion de tuberia hidraulica para el suministro de agua para la conexion del sistema de suministro de agua conforme a los estudios y diseños aprobados. Para ello, se verifico la correcta ubicacion de la tuberia y comprobar la soldadura en la union de la tuberia con los accesorios.





Observación:

Se verifica que no hayan fugas de agua.

ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CONTROL DE CAMBIOS Y SEGUIMIENTOS

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

# INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRATOS DE OBRA

e s

| Fecha: 31 DE JULIO DE 2026 | Informe No. 1 | Periodo de Seguimiento: JULIO 06 DE 2026 A JULIO 31 DE 2026 |
|---|---|---|

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL INTERVENTOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-2026-001 DEL 3 DE MARZO DE 2026 | Fecha de Inicio: 18 DE MARZO 2026 | Fecha de Suspensión No. 01: 20 de MAYO de 2026 | Fecha de Reinicio No. 01: 06 de JULIO de 2026 | Fecha de terminación 31 de JULIO de 2026 | Valor del Contrato: $ 453.288.271,00 |

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| Interventor: CONSORCIO C&L SAPUYES | Contratante: ALCALDIA-SAPUYES NARIÑO |
|---|---|

**PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA:**

| NOMBRE | PROFESIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO | INGENIERA CIVIL | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| JESUS HERNANDO REVELO BENAVIDES | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |
| DAYANA CAROLINA PARDO DELGADO | INGENIERA AMBIENTAL | RESIDENTE AMBIENTAL SST |

## 2. ASPECTOS GENERALES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 | Fecha de Inicio: 18 DE MARZO 2026 | Fecha de Suspensión No. 01: 20 de MAYO de 2026 | Fecha de Reinicio No. 01: 06 de JULIO de 2026 | Fecha de terminación 31 de JULIO de 2026 | Valor del Contrato: $ 1.846.883.748,00 |

Objeto del Contrato: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| Contratante: ALCALDIA-SAPUYES NARIÑO | Contratista: UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
|---|---|

**PERSONAL DE OBRA:**

| NOMBRE | PROFESIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR DE OBRA |
| JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES | INGENIERA CIVIL | RESIDENTE DE OBRA |
| JAVIER ANDRES RUEDA ZARAMA | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |
| KAROL YINETH ROSERO NARVAEZ | INGENIERA AMBIENTAL | RESIDENTE AMBIENTAL SST |

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, EL AVANCE DE LA OBRA SE SITUA EN UN 2,22%, INDICADOR QUE REFLEJA UN NIVEL DE EJECUCION CERCANO A LO PROGRAMADO PARA EL PERIODO EVALUADO. LA DESVIACION NEGATIVA DEL 0,49% CORRESPONDE A UN DESFASE MODERADO QUE REQUIERE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EVITAR SU INCREMENTO EN LOS PRÓXIMOS PERIODOS DE EJECUCIÓN.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHA DESVIACIÓN SE ENCUENTRA ASOCIADA PRINCIPALMENTE A LAS RESTRICCIONES OPERATIVAS DERIVADAS DEL RACIONAMIENTO DE AGUA POTABLE, SITUACIÓN QUE HA LIMITADO EL DESARROLLO CONTINUO DE ALGUNAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS QUE REQUIEREN DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.

EL ANÁLISIS DETALLADO DEL CONTROL DE TIEMPOS EVIDENCIA QUE, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO, LAS PRECIPITACIONES REPRESENTARON APROXIMADAMENTE EL 5% DEL TOTAL DEL TIEMPO PROGRAMADO, CONDICIÓN QUE FUE CONSIDERADA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA HA MANIFESTADO SU COMPROMISO DE FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS FRENTES DE TRABAJO, OPTIMIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y ADOPTAR MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE AL RACIONAMIENTO DE AGUA, CON EL PROPÓSITO DE RECUPERAR EL DESFASE PRESENTADO Y LOGRAR LA NIVELACIÓN DEL CRONOGRAMA DURANTE EL SIGUIENTE MES DE EJECUCIÓN.

**RELACIÓN DE TIEMPOS**

| PERIODO DE ACTIVIDADES | | | TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL PERIODO (DÍAS) | PORCENTAJE RESPECTO AL PLAZO | PLAZO TRANSCURRIDO ACUMULADO (DIAS) | PORCENTAJE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/07/2026 | A | 12/07/2026 | 7 | 4.35 | 7 | 4.35 |
| 13/07/2026 | A | 19/07/2026 | 7 | 4.35 | 14 | 8.70 |
| 20/07/2026 | A | 26/07/2026 | 7 | 4.35 | 21 | 13.04 |
| 27/07/2026 | A | 31/07/2026 | 5 | 3.11 | 26 | 16.15 |

**SEGUIMIENTO PERSONAL DEL CONTRATISTA**


| PERIODO | 06 DE JULIO DE 2026 A 31 DE JULIO DE 2026 |
|---|---|

| AÑO | 2026 |
|---|---|

| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 23 |
|---|---|

| PERSONAL | | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CARGO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | I | | - | | - | | - | - | | | - | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2 | SI | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| | SI M I SS | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| | S I IS S S | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| | M S | | | | | | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | I I | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| 7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | | | | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | TOTAL PERSONAL / DÍA | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |

| RESUMEN | |
|---|---|
| DÍAS POR MES | % DE ASISTENCIA |
| 12 | 52% |
| 23 | 100% |
| 23 | 100% |
| 23 | 100% |
| 22 | 96% |
| 17 | 74% |
| 14 | 61% |
| | |

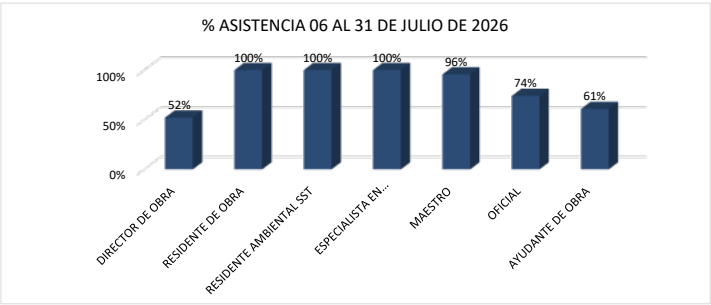


## ESTADO DEL TIEMPO

| PERIODO | 06 AL 31 DE JULIO DE 2026 | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|

S 1 I M 2 I I S 3 SI 4

| HORAS | FECHA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 - 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| - 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - | | | | | | | | | | | | | | |

| HORAS | FECHA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6 - 7 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - 6 | | | | | | | | | | | | |
| 6 - 7 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - | | | | | | | | | | | | |

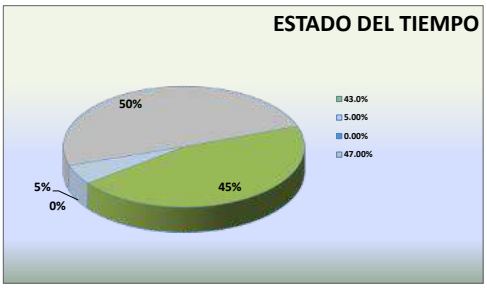



| RESUMEN PERIODO | |
|---|---|
| 1 | 43.0% |
| 2 | 5.00% |
| 3 | 0.00% |
| 4 | 47.00% |

## 3. ASPECTOS FINANCIEROS

### PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

| No SEMANA | FECHA | PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO | % PROGRAMADO | PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/07/2026 A 12/07/2026 | $ 14,160,562.00 | 0.77% | $ 0.00 | 0.00% |
| 2 | 13/07/2026 A 19/07/2026 | $ 11,261,786.00 | 0.61% | $ 20,417,111.00 | 1.11% |
| 3 | 20/07/2026 A 26/07/2026 | $ 8,206,698.00 | 0.44% | $ 9,539,767.00 | 0.52% |
| 4 | 27/07/2026 A 31/07/2026 | $ 16,408,843.00 | 0.89% | $ 11,068,212.00 | 0.60% |

### RELACIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

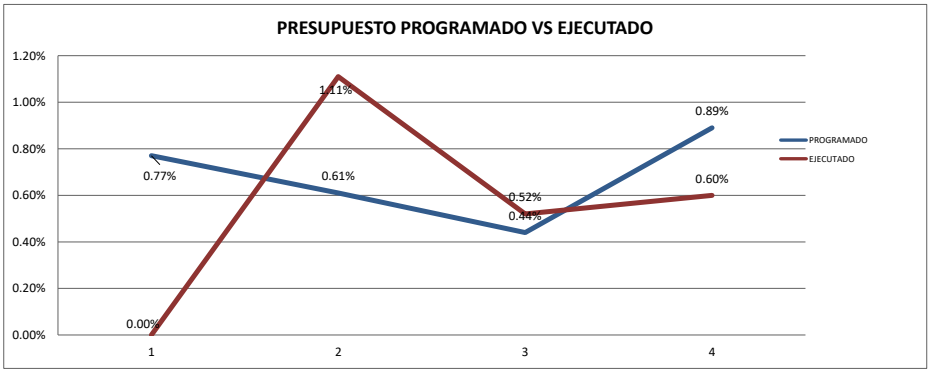


### RELACIÓN DE COMUNICACIONES

| FECHA | REMITENTE | DESTINATARIO | OBJETO |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | INTERVENTORIA | MUNICIPIO | ENTREGA INFORME SEMANAL |
| 21/07/2026 | INTERVENTORIA | MUNICIPIO | ENTREGA INFORME SEMANAL |
| 30/07/2026 | INTERVENTORIA | MUNICIPIO | ENTREGA INFORME SEMANAL |

## 4. ASPECTOS TÉCNICOS

### ANÁLISIS ENSAYOS DE LABORATORIO

S S I S S

### RECOMENDACIONES

S MI IS IM M M I M I M I S I I I MI I MI IMI S I S
S I S I I S M S I M S S S M S I S S I S S IS SI I S
M MI M

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**TÉCNICAS**

**EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE DESARROLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN OBRA:**

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**
- **EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN**
- **EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR**
- **DESALOJO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN**
- **ACERO DE REFUERZO PDR 60**
- **RED HIDRÁULICA EN PVC DE 1"**
- **RED DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE 6"**

## 6. ANEXOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Copia de la bitácora de obra | | Balance de mayores y menores cantidades de obra contratadas. |
| | Copia de las afiliaciones del personal | | Requerimiento de obra adicional para aprobación por la Universidad. (Ordenador del Gasto, Planeación y Consejo Superior). |
| | Ensayos de Laboratorio | X | Registro fotográfico detallado |
| | Actas suscritas durante el periodo | | FCO.07 Evaluación de Proveedores Cuantía Mayor o Igual a 50 SMLMV |
| X | Correspondencia entre el contratista y el interventor | | FCO.19 Lista de Chequeo Informe de Supervisión e Interventoría |
| X | Control de Equipos | | Otro: |
| | Control de Seguridad Industrial | | |
| | Acta Ítems no previstos. | | |

a

**Nombre: FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**

I I

a

**Nombre: SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO**

S I S S

IS I

a

**Nombre: JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**

S IS M I I

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÙN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 13/06/2026 |



Reconocimiento de área a intervenir



Uso de equipo topográfico para localización de estructuras



Se realiza rectificación de medidas en sitio



Se realiza actividad de localización y replanteo

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 14/06/2026 |



Se realizo retira de materia organica sobre el área a intervenir



Se realiza limpieza del terreno en el área a intervenir



Se realiza actividades de excavación



Se rectifica medidas en sitio


| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 15/06/2026 |



Se realiza adecuación de sitio



Se realiza actividades de excavación

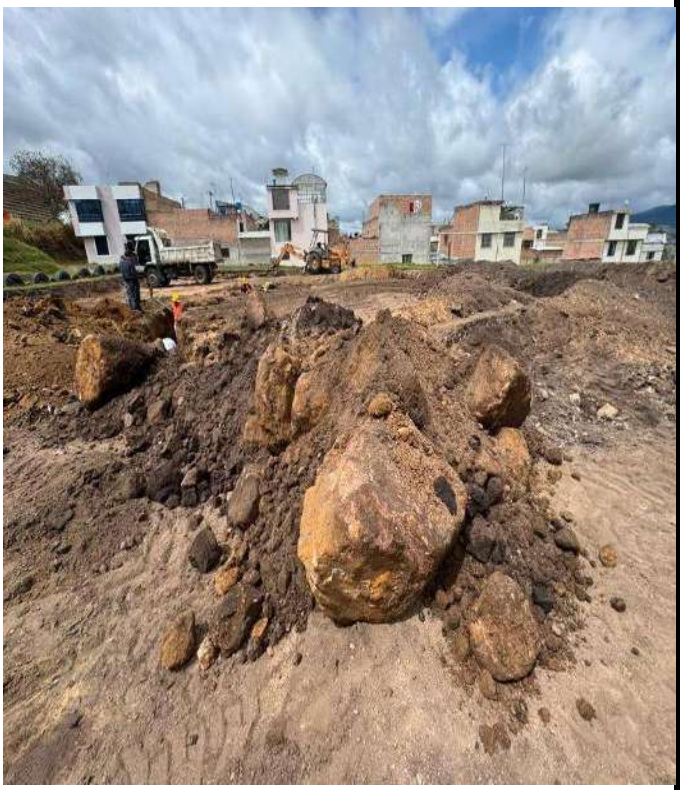

Se realiza retiro de roca de gran tamaño encontrada en sitio de excavación



Se realiza retiro de material de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 16/06/2026 |



Se realiza localización de zapatas



Se inicia actividades de excavación manual para zapatas



Se realiza actividades de excavación




Se realiza actividades de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 17/06/2026 |



Se continua con actividades de excavación para zapata

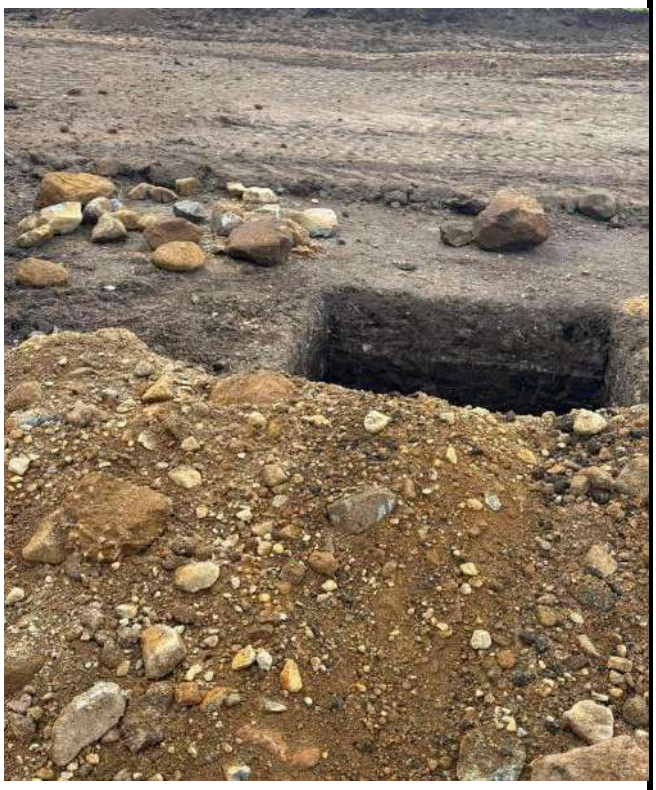

Se continua con actividades de excavación para zapata



Se continua con actividades de excavación para zapata



Se realiza retiro de material de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 18/06/2026 |



Se continua con actividades de excavación para zapatas



Se realiza localización de excavación para redes hidráulicas



Se inicia actividades de excavación



Se continua con actividades de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 19/06/2026 |




Se continua con actividades de excavación



Se continua con actividades de excavación



Se continua con actividades de excavación

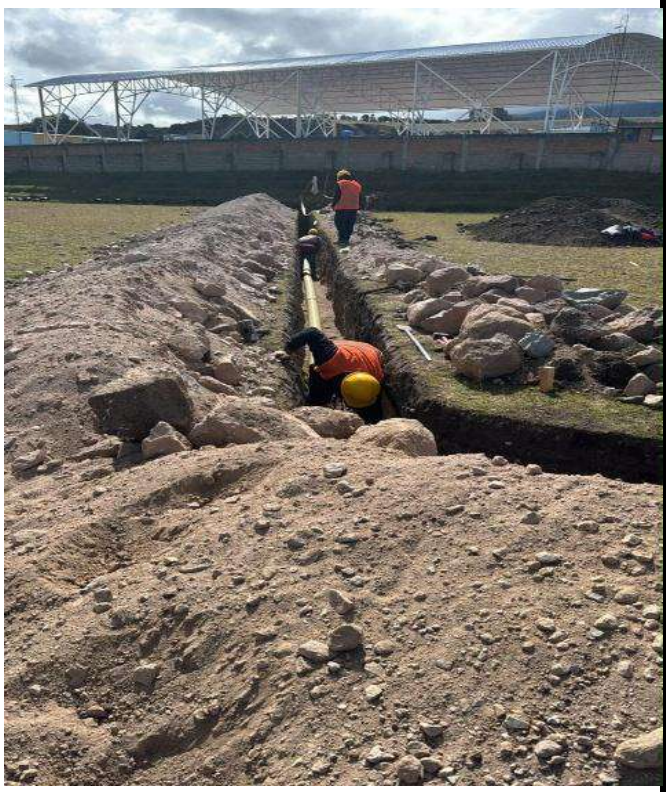

Se continua con actividades de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 20/06/2026 |



Se realiza localización para excavación de pedestales



Se inicia actividades de excavación para pedestales



Se continua con actividades de excavación



Se continua con actividades de excavación

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÙN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 21/06/2026 |



Se continua con actividades de excavación



Se inicia actividades de instalación de tubería sanitaria



Instalación de tubería sanitaria



Instalación de tubería sanitaria

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATO No.:** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | SAPUYES, NARIÑO MUNICIPIO DEL ESPINO |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **SUPERVISOR MUNICIPAL:** | ING. JHON STEVEN BURGOS |
| **FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:** | 22/06/2026 |



Se inicia actividades de instalación de red hidráulica



Instalación de red hidráulica



Instalación de red hidráulica



Instalación de red hidráulica

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CAPACITACIONES TÉCNICAS

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE SAPUYES**

## LISTADO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **OBJETO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIѰN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **PERIODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 A 14 DE DICIEMBRE DE 2026 |

| Fecha de capacitación | Tema de capacitación | Nombre del capacitador | No. de asistentes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 13-jul-26 | Identificación y prevención de riesgos en excavaciones | Juan Manuel Zuñiga | 9 | N/A |

**DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:**

El objetivo de la capacitación es proporcionar a los trabajadores los conocimientos y habilidades necesarios para reconocer, evaluar y mitigar los peligros asociados con las actividades de excavación, garantizando la seguridad de las operaciones y la protección de la integridad física de todos los involucrados.

**1. Identificación de riesgos: (Explicación de los riesgos comunes)**

* Derrumbes por inestabilidad del terreno

* Posibilidad de inundaciones por agua subterránea o lluvia

* Caída de materiales o trabajadores desde bordes o dentro de la excavación

**2. Reglas de seguridad: (Uso de EPP)**

* Presentar el equipo necesario: Cascos, guantes, botas.

* Demostración de uso correcto de los EPP

* Inspección del terreno : Técnicas de inspección previa para identificar inestabilidades o condiciones desfavorables.

* Control de accesos: Instalación de barreras, señalización y zonas restringidas

* Revisión de equipo y herramienta: Procedimientos para garantizar que las herramientas y equipos funcionen correctamente.

**3. Procedimientos de manejo:**

* Apuntalamiento del terreno: Métodos para prevenir derrumbes, como el uso de entibados y sistemas de apuntalamiento e identificación de signos tempranos de fallas o soportes.

* Manejo del Agua: Uso de sistema de drenaje provisional para prevenir inundaciones

* Protocolo de emergencia: Procedimientos de evacuación y rescate en caso de colapso

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



**Firma:** _____
**Nombre: ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
**RESIDENTE DE OBRA**

**Firma:** _____
**Nombre: ING. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
**MUNICIPIO DE RICAURTE**

## LISTADO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | L.P. - 2025 - 002 DE 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **OBJETO:** | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIѰN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. CAMILO ANDRES MESA ACOSTA |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ING. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO |
| **PERIODO:** | 6 DE JULIO DE 2026 A 14 DE DICIEMBRE DE 2026 |

| Fecha de capacitación | Tema de capacitación | Nombre del capacitador | No. de asistentes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 27-jul-26 | Procedimientos técnicos para la instalación de tuberías hidráulica y sanitarias | Juan Manuel Zuñiga | 9 | N/A |

**DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:**

El objetivo de la capacitación es instruir en los procesos técnicos para la instalación correcta de tuberías hidraulicas y sanitarias, garantizando alineación, conexión precisa entre tubos, con el fin de asegurar la calidad y correcta instalacion de la red.

1. Identificación de riesgos:

* Riesgos asociados con la manipulación de herramientas manuales y electricas.
* Errores en la nivelación y alineación de tuberías que pueden ocasionar fugas o mal funcionamiento.
* Proyección de partículas durante el corte de tuberías.

2. Reglas de seguridad:

* Inspección de equipos y herramientas antes de iniciar los trabajos.
* Aplicar técnicas seguras para el levantamiento y transporte manual de materiales.
* Uso obligatorio de equipos de protección personal.

3. Procedimientos de manejo:

*Revisar los planos hidráulicos y sanitarios, las especificaciones técnicas y verificar las medidas en campo.
* Uso de equipos de precisión para garantizar la alineación horizontal y vertical de la tubería. *Fijar y soportar adecuadamente la tubería para evitar desplazamientos o deformaciones.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



**Firma:** _____
**Nombre: ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
**RESIDENTE DE OBRA II**

**Firma:** _____
**Nombre: ING. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

| | Formato | Direccion de Infraestructura |
|---|---|---|
| Libertad y Orden<br>Ministerio del Interior y de Justicia | **ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 01** | Código Formato:<br>Pagina 1 de 1 |

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

**CONTRATO OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **Contrato No.** | LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 149,827,981.00 |
| **Valor etapa II:** | $ 1,846,883,748.00 |
| **Valor total:** | $ 1,996,711,729.00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Inicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**CONTRATO INTEVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **Contrato No.** | CM-2026-001 de 3 de marzo 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 84,123,457 |
| **Valor etapa II:** | $ 369,164,814 |
| **Valor total:** | $ 453,288,271 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Inicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**Semana Número:** 1 **Del:** 6/07/2026 **Al:** 12/07/2026 **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato** 7 **días**

**Nombre del Supervisor:** ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO


**AVANCE DE ETAPA II**

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra programado (%)** | 0.77% | 0.77% |
| **Valor de la Etapa II programada:** | $ 14,160,562.00 | $ 14,160,562.00 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra Ejecutado (%)** | 0.00% | 0.00% |
| **Valor de la Etapa II Ejecutada:** | $ - | $ - |

**GRÁFICA DE AVANCE DE ETAPA II**

| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Acumulado anterior** | 0.00% | 0.00% | -0.77% |
| **Durante el periodo** | 0.77% | 0.00% | |
| **Acumulado actual** | 0.77% | 0.00% | |

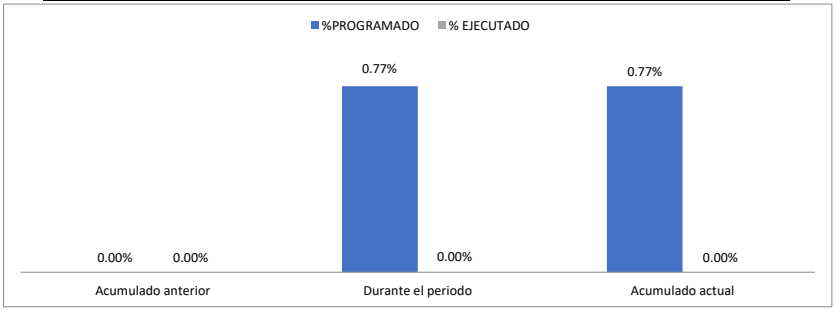


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

***1. PROGRAMA SISOMA***

El contratista inicia su programa de vinculación de personal. Por tanto, inicia con el proceso de afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales de cada uno de sus integrantes y equipo de trabajo.

***2. ASPECTO TECNICO***

Durante el período objeto del presente informe, el contratista de obra ejecutó las actividades correspondientes a la localización y replanteo del proyecto, las cuales constituyen una etapa fundamental para el inicio de la ejecución física de las obras. Estas labores permitieron materializar en terreno la información contenida en los planos y diseños aprobados, verificando la correcta ubicación de los ejes, referencias, alineamientos, niveles y demás elementos necesarios para garantizar que la construcción se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Es importante precisar que la actividad de localización y replanteo no se encuentra contemplada como un ítem independiente dentro del presupuesto de obra, esta actividad hace parte de los costos indirectos asociados a la administración del contrato, incluidos en el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AUI). En consecuencia, su ejecución corresponde al cumplimiento de las obligaciones técnicas inherentes al contratista para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, las cuales no generan un avance en el cronograma aprobado.

**REUNIÓN TÉCNICA CON EL EQUIPO DE OBRA**

Durante la primera semana de ejecución se llevó a cabo la reunión técnica entre el contratista de obra y el equipo de interventoría, con el propósito de coordinar el inicio de las actividades constructivas y establecer los lineamientos técnicos, administrativos y operativos para el adecuado desarrollo del contrato.

En el desarrollo de la reunión se revisó el cronograma de ejecución aprobado, definiendo las actividades correspondientes a la primera etapa de obra y verificando la disponibilidad del personal profesional, técnico y operativo, así como de los equipos requeridos para el inicio de los trabajos. Igualmente, se socializaron los procedimientos para el control de calidad, el manejo de la documentación técnica, la presentación de informes de avance y el procedimiento para la atención de observaciones que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Para la siguiente semana se tiene prevista la ejecución de las actividades correspondientes a excavaciones manuales, mecánicas y desalojo, de acuerdo con las condiciones del terreno y los requerimientos establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Estas labores estarán orientadas a la conformación de las áreas de intervención necesarias para el desarrollo de las obras, garantizando el cumplimiento de las dimensiones, cotas y alineamientos definidos en los documentos contractuales.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Durante el período objeto del presente informe se desarrollaron las actividades preliminares requeridas para el inicio de la etapa constructiva, entre ellas la coordinación técnica entre el contratista y la interventoría, la ejecución de la actividad de localización y replanteo y las verificaciones necesarias para garantizar la correcta implantación del proyecto en campo. Estas labores constituyen la base técnica para el desarrollo de las actividades constructivas posteriores y permiten establecer las condiciones necesarias para la ejecución de la obra conforme a los documentos contractuales.

Es importante precisar que la actividad de localización y replanteo no corresponde a un ítem de pago dentro del presupuesto de obra, toda vez que hace parte de los costos indirectos contemplados en el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AUI). En consecuencia, aunque su ejecución resulta indispensable para el desarrollo del proyecto, no genera avance físico medible dentro de la programación de obra.

Como resultado del seguimiento efectuado durante el período, se evidencia que el proyecto presenta un atraso del 0,80 % respecto al avance físico programado. Esta variación obedece a que, durante la semana evaluada, las actividades ejecutadas corresponden principalmente a labores preliminares y de preparación, las cuales no representan un porcentaje de avance dentro de los ítems del presupuesto contractual.

| **OBSERVACIONES** | **FIRMAS** |
|---|---|
| Durante el período evaluado se ejecutaron las actividades preliminares de localización y replanteo, las cuales son indispensables para el inicio de la etapa constructiva; sin embargo, estas no corresponden a un ítem del presupuesto de obra, al estar contempladas dentro de los costos indirectos (AUI), razón por la cual no generan avance físico cuantificable.<br><br>De acuerdo con el seguimiento efectuado por la interventoría, el proyecto presenta un atraso del 0,80 % respecto al avance programado para la fecha de corte, por lo que se recomienda al contratista optimizar la programación de las actividades constructivas con el fin de evitar que dicho desfase se incremente en las siguientes semanas. | *Interventoría:*<br><br>**CONSORCIO C&L SAPUYES**<br>**R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**<br>**NIT: 902042007-3**<br><br>*Supervisor Municipio:*<br><br>**ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**<br>**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS** |

| | Formato | Direccion de Infraestructura |
|---|---|---|
| Libertad y Orden<br>Ministerio del Interior y de Justicia | **ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 02** | Código Formato:<br>Pagina 1 de 1 |

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

**CONTRATO OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **Contrato No.** | LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 149,827,981.00 |
| **Valor etapa II:** | $ 1,846,883,748.00 |
| **Valor total:** | $ 1,996,711,729.00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**CONTRATO INTEVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **Contrato No.** | CM-2026-001 de 3 de marzo 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 84,123,457 |
| **Valor etapa II:** | $ 369,164,814 |
| **Valor total:** | $ 453,288,271 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**Semana Número:** 2 **Del:** 13/07/2026 **Al:** 19/07/2026 **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato** 14 **días**

**Nombre del Supervisor:** ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO


**AVANCE DE ETAPA II**

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra programado (%)** | 0.61% | 1.38% |
| **Valor de la Etapa II programada:** | $ 11,261,786.00 | $ 25,422,348.00 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra Ejecutado (%)** | 1.11% | 1.11% |
| **Valor de la Etapa II Ejecutada:** | $ 20,417,111.00 | $ 20,417,111.00 |

**GRÁFICA DE AVANCE DE ETAPA II**

| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Acumulado anterior** | 0.77% | 0.00% | -0.27% |
| **Durante el periodo** | 0.61% | 1.11% | |
| **Acumulado actual** | 1.38% | 1.11% | |

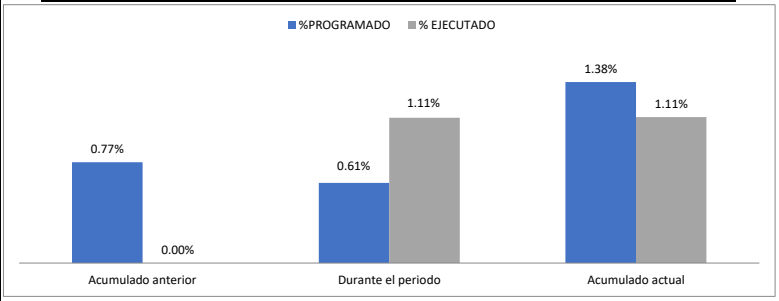


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

***1. PROGRAMA SISOMA***

El contratista continúa con el desarrollo del programa de vinculación de personal especificamente mano de obra no calificada de la región, adelantando el proceso de afiliación de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social Integral, que comprende salud, pensión, riesgos laborales, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. De manera complementaria, se instalaron elementos de señalización preventiva, como cinta de peligro alrededor de las áreas de excavación, con el propósito de delimitar las zonas de trabajo, prevenir caídas y reducir los riesgos para el personal y terceros durante la ejecución de las actividades.

***2. ASPECTO TÉCNICO***

Durante el período objeto del presente informe, el contratista de obra ejecutó actividades correspondientes a la excavación y al desalojo del material proveniente de las excavaciones, conforme a las necesidades del proyecto y a las condiciones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. Estas labores comprendieron la remoción del material existente en las áreas definidas para la ejecución de las obras, garantizando las dimensiones, cotas y alineamientos requeridos para la correcta conformación de las estructuras proyectadas.

De manera complementaria, se realizó el cargue, transporte y disposición del material producto de las excavaciones hacia los sitios autorizados, manteniendo las condiciones de orden, limpieza y seguridad en el frente de trabajo. La ejecución eficiente de estas actividades permitió obtener un rendimiento superior al previsto para el período evaluado, contribuyendo a la recuperación del avance físico del proyecto y favoreciendo la alineación progresiva con los porcentajes establecidos en el cronograma contractual.

La interventoría efectuó el seguimiento técnico permanente a estas actividades, verificando que los procedimientos constructivos, el manejo del material excavado y las condiciones de ejecución se desarrollaran de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, las normas aplicables y las buenas prácticas de ingeniería. Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció que el mayor rendimiento alcanzado durante la semana permitió disminuir el desfase presentado en períodos anteriores, reflejando una mejora en el desempeño de la ejecución de la obra.

**REUNIÓN TÉCNICA CON EL EQUIPO DE OBRA**

Durante la presente semana se realizó una reunión de seguimiento técnico entre la interventoría y el contratista de obra, con el fin de evaluar el avance de las actividades ejecutadas, revisar las condiciones encontradas en el frente de trabajo y coordinar las labores programadas para la siguiente etapa de ejecución.

En el desarrollo de la reunión se efectuó la revisión de las actividades de excavación y del desalojo del material producto de las excavaciones, verificando el cumplimiento de las dimensiones proyectadas, los procedimientos constructivos implementados y el manejo adecuado del material retirado. Asimismo, se analizaron las condiciones del terreno evidenciadas durante la ejecución de las excavaciones y su incidencia en la programación de las actividades posteriores.

De igual manera, se definieron las medidas necesarias para optimizar el rendimiento de los frentes de trabajo, fortalecer los controles de seguridad industrial y garantizar la adecuada coordinación entre el personal de obra y la interventoría. Finalmente, se establecieron los compromisos correspondientes para la continuidad de las actividades programadas, reiterando la importancia de mantener el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los requisitos contractuales y el cronograma de ejecución del proyecto.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Para la siguiente semana se tiene prevista la ejecución de las actividades correspondientes al vaciado de concreto para el solado de limpieza en las áreas previamente excavadas y conformadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y los niveles definidos en los planos de diseño. Esta actividad tendrá como finalidad proporcionar una superficie uniforme, estable y limpia que sirva de base para la posterior construcción de los elementos estructurales proyectados.

Durante su ejecución se verificará el adecuado acondicionamiento del fondo de la excavación, el cumplimiento de los espesores y cotas establecidos, así como la correcta colocación y nivelación del concreto, garantizando que la actividad se desarrolle conforme a los procedimientos constructivos, las especificaciones contractuales y las buenas prácticas de ingeniería.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Durante el período objeto del presente informe, el contratista ejecutó las actividades de excavación y desalojo del material producto de las excavaciones, las cuales constituyen una etapa fundamental para la preparación de las áreas donde se construirán los diferentes elementos del proyecto. Estas labores fueron desarrolladas de acuerdo con las dimensiones, niveles y alineamientos definidos en los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

La interventoría realizó el seguimiento permanente a la ejecución de estas actividades, verificando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, las condiciones de estabilidad de las excavaciones, el adecuado manejo del material excavado y su disposición en los sitios autorizados, así como la utilización de los equipos y recursos requeridos para el desarrollo de los trabajos.

Las actividades ejecutadas permitieron dejar las áreas intervenidas en condiciones técnicas adecuadas para la continuación de las obras, garantizando que las etapas constructivas posteriores se desarrollen sobre una base conforme a los requisitos establecidos en los documentos contractuales, las especificaciones técnicas y las buenas prácticas de ingeniería.

| **OBSERVACIONES** | **FIRMAS** |
|---|---|
| Durante la presente semana se evidenció un rendimiento satisfactorio en la ejecución de las actividades de obra, alcanzándose un avance superior al inicialmente previsto para el período evaluado. Este incremento en la productividad ha permitido reducir el desfase registrado en semanas anteriores, logrando una mayor alineación entre el avance físico ejecutado y los porcentajes establecidos en el cronograma contractual.<br><br>La interventoría continuará realizando el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos y el desempeño del contratista, con el propósito de mantener la tendencia de recuperación del proyecto y asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales. | *Interventoría:*<br>**CONSORCIO C&L SAPUYES**<br>**R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**<br>**NIT: 902042007-3**<br><br>*Supervisor Municipio:*<br>**ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**<br>**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS** |

| | Formato | Direccion de Infraestructura |
|---|---|---|
| Libertad y Orden<br>Ministerio del Interior y de Justicia | **ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 03** | Código Formato:<br>Pagina 1 de 1 |

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

| **CONTRATO OBRA** | |
|---|---|
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **Contrato No.** | LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 149,827,981.00 |
| **Valor etapa II:** | $ 1,846,883,748.00 |
| **Valor total:** | $ 1,996,711,729.00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

| **CONTRATO INTEVENTORÍA** | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **Contrato No.** | CM-2026-001 de 3 de marzo 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 84,123,457 |
| **Valor etapa II:** | $ 369,164,814 |
| **Valor total:** | $ 453,288,271 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**Semana Número:** 3 **Del:** 20/07/2026 **Al:** 26/07/2026 **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato** 21 **días**
**Nombre del Supervisor:** ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO


**AVANCE DE ETAPA II**

| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra programado (%)** | 0.44% | 1.82% |
| **Valor de la Etapa II programada:** | $ 8,206,698.00 | $ 33,629,046.00 |

| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra Ejecutado (%)** | 0.52% | 1.62% |
| **Valor de la Etapa II Ejecutada:** | $ 9,539,767.00 | $ 29,956,878.00 |

**GRÁFICA DE AVANCE DE ETAPA II**

| | **%PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** | **DIFERENCIA** |
|---|---|---|---|
| **Acumulado anterior** | 1.38% | 1.11% | -0.20% |
| **Durante el periodo** | 0.44% | 0.52% | |
| **Acumulado actual** | 1.82% | 1.62% | |

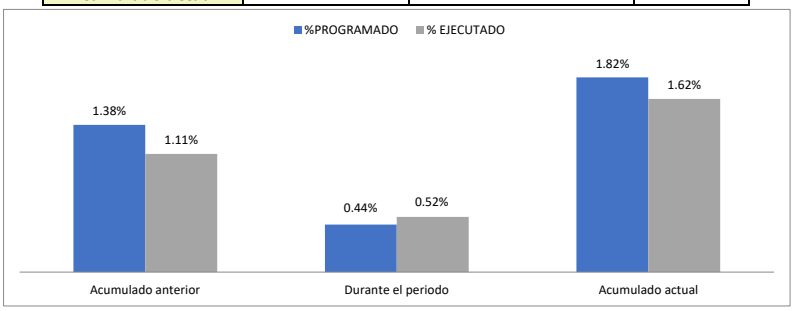


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
|  |  |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|  |  |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

***1. PROGRAMA SISOMA***

Durante la presente semana, el contratista dio continuidad a la implementación del Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SISOMA), realizando inspecciones periódicas en los frentes de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos durante las actividades de excavación y preparación del acero de refuerzo.

Se efectuó la socialización de los riesgos asociados a las labores programadas, haciendo énfasis en los trabajos en excavaciones, la manipulación y figurado del acero, el uso seguro de herramientas y equipos, así como en la importancia del uso permanente de los elementos de protección personal (EPP). Adicionalmente, se verificó el adecuado estado de la señalización preventiva, el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, con el fin de reducir la probabilidad de incidentes y garantizar condiciones seguras para el personal.

En el componente ambiental, se realizó el manejo adecuado del material producto de las excavaciones, verificando su disposición en los sitios autorizados y manteniendo el control sobre la limpieza de los frentes de trabajo para minimizar impactos al entorno. Asimismo, se promovió el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la ejecución del proyecto.

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, se evidenció el cumplimiento de las disposiciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin registrarse accidentes laborales, incidentes de gravedad o situaciones que comprometieran el normal desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

***2. ASPECTO TÉCNICO***

Durante el período objeto del presente informe, el contratista de obra tenía programado dar continuidad a la ejecución de la actividad correspondiente al solado de limpieza, de acuerdo con la secuencia constructiva establecida en el cronograma de obra. Sin embargo, debido a que las actividades de excavación se extendieron hasta el viernes 24 de julio, fue necesario reprogramar el inicio de esta actividad para la semana siguiente, una vez culminadas las excavaciones y verificada la adecuada conformación de las áreas de trabajo.

Con el propósito de mantener la productividad del proyecto y compensar la reprogramación del solado de limpieza, durante la presente semana se adelantaron las labores de preparación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo correspondiente a los elementos estructurales proyectados, dejando un importante frente de trabajo preparado para su instalación una vez se ejecuten los solados. De manera paralela, se concentraron esfuerzos en la finalización de las excavaciones, logrando culminar la totalidad de esta actividad conforme a las dimensiones, cotas y alineamientos definidos en los planos y especificaciones técnicas del contrato.

La interventoría realizó el seguimiento técnico permanente a las actividades ejecutadas, verificando que la culminación de las excavaciones y la preparación del acero se desarrollaran de acuerdo con las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos establecidos y las buenas prácticas de ingeniería. Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció que la reprogramación del solado de limpieza no generó tiempos improductivos, toda vez que el contratista optimizó los recursos disponibles mediante el avance de actividades preparatorias que permitirán dar continuidad al proceso constructivo de manera eficiente durante la siguiente semana.

**REUNIÓN TÉCNICA CON EL EQUIPO DE OBRA**

Durante la presente semana se llevó a cabo una reunión de seguimiento técnico entre la interventoría y el contratista de obra, con el propósito de verificar el estado de avance del proyecto, evaluar el cumplimiento de las actividades programadas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra.

En el desarrollo de la reunión se revisó la culminación de las actividades de excavación, confirmando que estas fueron ejecutadas conforme a las dimensiones, cotas y alineamientos establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Asimismo, se analizó la reprogramación de la actividad correspondiente al solado de limpieza, determinando que su inicio se realizará durante la siguiente semana debido a que las excavaciones finalizaron el viernes 24 de julio, permitiendo contar con las condiciones adecuadas para su ejecución.

De igual manera, se verificó el avance alcanzado en la preparación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo, actividad desarrollada con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y mantener la productividad del proyecto mientras se habilitaban los frentes de trabajo para la construcción de los elementos estructurales. La interventoría constató que estas labores se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas y a los planos estructurales aprobados.

Finalmente, se establecieron los compromisos para la semana siguiente, orientados al inicio de los solados de limpieza, la instalación del acero de refuerzo preparado y la continuidad de las actividades estructurales, reiterando la importancia de mantener una adecuada coordinación entre el contratista y la interventoría, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de seguridad y el cronograma contractual del proyecto.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Para la siguiente semana se tiene prevista la ejecución de actividades correspondientes al inicio de los elementos de cimentación y de las redes técnicas asociadas al proyecto, conforme a la programación establecida y a las especificaciones técnicas, planos de diseño y demás documentos contractuales.

Las labores contemplan la ejecución del solado de limpieza en concreto de 2500 PSI, como base para la construcción de las cimentaciones, seguido de la instalación y amarre del acero de refuerzo PDR 60 y el posterior vaciado de las zapatas en concreto de 3000 PSI, garantizando el cumplimiento de las dimensiones, niveles, recubrimientos y demás requisitos estructurales definidos en el diseño.

De manera complementaria, se adelantará la instalación del filtro con geocompuesto de drenaje Dualdren de 4", con el propósito de facilitar el adecuado manejo de las aguas y garantizar las condiciones de drenaje requeridas para la infraestructura. Asimismo, se ejecutarán las actividades correspondientes a la canalización en tubería conduit PVC de 1" y de 1/2", así como la instalación de la red hidráulica en tubería PVC de 1/2", verificando su correcta ubicación, alineamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada sistema.

Durante la ejecución de estas actividades, la interventoría realizará el seguimiento técnico permanente para verificar la calidad de los materiales, los procedimientos constructivos, el cumplimiento de las especificaciones contractuales y la correcta secuencia de ejecución, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la obra y la continuidad de los frentes de trabajo programados.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Durante el período objeto del presente informe, el contrato continuó su ejecución conforme a la programación establecida, desarrollando actividades orientadas a la preparación de los frentes de trabajo y al inicio de la construcción de los elementos estructurales del proyecto. La culminación de las excavaciones permitió dejar las áreas intervenidas en condiciones aptas para dar continuidad a las actividades de cimentación, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en los documentos contractuales.

De manera complementaria, el contratista adelantó actividades preparatorias, entre ellas la preparación del acero de refuerzo, con el propósito de optimizar la secuencia constructiva y mantener la continuidad de la ejecución de la obra. Asimismo, se programó el inicio de los solados de limpieza, la construcción de zapatas y la instalación de las redes y sistemas contemplados en el proyecto, permitiendo la apertura de nuevos frentes de trabajo durante el siguiente período.

La interventoría efectuó el seguimiento técnico, administrativo y de control a las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, la calidad de los materiales, la correcta utilización de los recursos y la observancia de las especificaciones técnicas, las normas aplicables y las obligaciones contractuales. En términos generales, el estado del contrato evidencia una ejecución satisfactoria, con condiciones técnicas adecuadas para continuar el desarrollo de las actividades programadas y avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.

| **OBSERVACIONES** | **FIRMAS** |
|---|---|
| * Durante la presente semana se culminaron las actividades de excavación contempladas para esta etapa del proyecto, dejando los frentes de trabajo en condiciones adecuadas para el inicio de las actividades de cimentación.<br><br>* La actividad correspondiente al solado de limpieza fue reprogramada para la siguiente semana, debido a que las excavaciones finalizaron el viernes 24 de julio, garantizando así que su ejecución se realice sobre superficies debidamente conformadas y verificadas.<br><br>* Con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y mantener la productividad del proyecto, el contratista adelantó la preparación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo, actividad que permitirá agilizar el inicio de la construcción de las zapatas. | *Interventoría:*<br>**CONSORCIO C&L SAPUYES**<br>**R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**<br>**NIT: 902042007-3**<br><br>*Supervisor Municipio:*<br>**ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**<br>**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS** |

| | Formato | Direccion de Infraestructura |
|---|---|---|
| | **ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 04** | Código Formato:<br>Pagina 1 de 1 |

**"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

**CONTRATO OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES |
| **Contrato No.** | LP-2025-002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 149,827,981.00 |
| **Valor etapa II:** | $ 1,846,883,748.00 |
| **Valor total:** | $ 1,996,711,729.00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**CONTRATO INTEVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO C&L SAPUYES |
| **Contrato No.** | CM-2026-001 de 3 de marzo 2026 |
| **Valor etapa I:** | $ 84,123,457 |
| **Valor etapa II:** | $ 369,164,814 |
| **Valor total:** | $ 453,288,271 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **Inicio Etapa I:** | 18 DE MARZO DE 2026 |
| **Suspensión:** | 20 DE MAYO DE 2026 |
| **Reinicio Etapa II:** | 6 DE JULIO DE 2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

**Semana Número:** 3 **Del:** 27/07/2026 **Al:** 2/08/2026 **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato** 28 **días**

**Nombre del Supervisor:** ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO


**AVANCE DE ETAPA II**

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra programado (%)** | 0.89% | 2.71% |
| **Valor de la Etapa II programada:** | $ 16,408,843.00 | $ 50,037,889.00 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ejecución de obra Ejecutado (%)** | 0.60% | 2.22% |
| **Valor de la Etapa II Ejecutada:** | $ 11,068,212.00 | $ 41,025,090.00 |

**GRÁFICA DE AVANCE DE ETAPA II**

| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Acumulado anterior** | 1.82% | 1.62% | |
| **Durante el periodo** | 0.89% | 0.60% | -0.49% |
| **Acumulado actual** | 2.71% | 2.22% | |

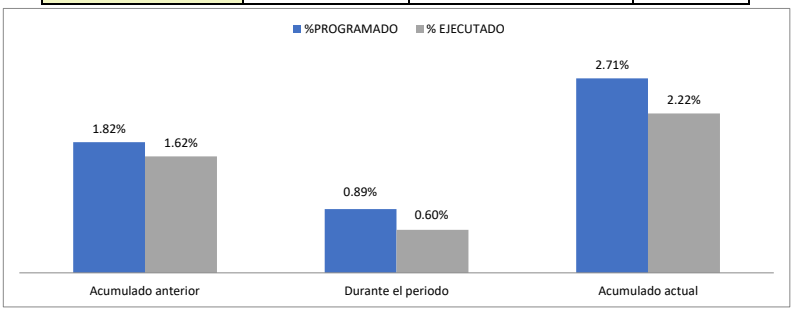


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| REGISTRO FOTOGRÁFICO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
|  |  |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|  |  |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

***1. PROGRAMA SISOMA***

Durante la presente semana, el contratista dio continuidad a la implementación del Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SISOMA), realizando inspecciones periódicas en los frentes de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos durante las actividades de excavación y preparación del acero de refuerzo.

Se efectuó la socialización de los riesgos asociados a las labores programadas, haciendo énfasis en los trabajos de excavación, la manipulación y figurado del acero, así como en la charla sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Adicionalmente, se verificó el adecuado estado de la señalización preventiva, el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, con el fin de reducir la probabilidad de incidentes y garantizar condiciones seguras para el personal. De igual manera, se informó que durante la próxima semana se adelantará el cierre del área de intervención mediante la instalacion polisombra y otros elementos de cerramiento, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad en el frente de trabajo.

En el componente ambiental, se realizó el manejo adecuado del material producto de las excavaciones, verificando su disposición en los sitios autorizados y manteniendo el control sobre la limpieza de los frentes de trabajo para minimizar impactos al entorno. Asimismo, se promovió el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, se desarrolló una charla sobre el manejo adecuado de residuos, reforzando la correcta separación, almacenamiento y disposición de los mismos conforme a la normativa ambiental vigente.

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, se evidenció el cumplimiento de las disposiciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin registrarse accidentes laborales, incidentes de gravedad o situaciones que comprometieran el normal desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

***2. ASPECTO TÉCNICO***

Durante el período objeto del presente informe, el contratista de obra ejecutó las actividades correspondientes al solado de limpieza en las áreas previamente excavadas, conforme a la secuencia constructiva. Esta actividad se desarrolló una vez verificada la adecuada conformación de las excavaciones, garantizando superficies uniformes y estables para la posterior instalación del acero de refuerzo y la construcción de los elementos de cimentación.

De manera complementaria, se adelantaron las labores de armado de parrillas de acero para las zapatas, incluyendo las actividades de corte, figurado, disposición y amarre del refuerzo, de acuerdo con las especificaciones estructurales, dimensiones y recubrimientos definidos en los planos del proyecto. Con ello, se dejó preparado un importante frente de trabajo para la posterior fundida de los elementos de cimentación.

Así mismo, durante la presente semana se avanzó en la instalación de las redes hidráulicas de 1" y de la red de aguas lluvias de 6", ejecutando las labores de localización, tendido, alineamiento y conformación de las zanjas requeridas para dichos sistemas, en concordancia con los diseños hidrosanitarios aprobados y las especificaciones técnicas del contrato.

Es importante señalar que el desarrollo de las actividades constructivas se ha visto condicionado por el racionamiento de agua implementado en la zona, situación derivada de la disminución de las precipitaciones durante la actual temporada de menores lluvias. Esta condición ha requerido una planificación más rigurosa para el suministro y uso eficiente del recurso hídrico, especialmente en las actividades relacionadas con mezclas, curado y limpieza de obra, adoptándose medidas de control y almacenamiento temporal para evitar afectaciones significativas en el avance del proyecto.

La interventoría realizó el seguimiento técnico permanente a las actividades ejecutadas, verificando que el solado de limpieza, el armado de las parrillas de zapata y la instalación de las redes hidráulicas y pluviales se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos establecidos y las buenas prácticas de ingeniería. Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció que las actividades ejecutadas mantienen la continuidad del proceso constructivo y permiten consolidar los frentes de trabajo previstos para la siguiente etapa de cimentación y obras hidrosanitarias.

**REUNIÓN TÉCNICA CON EL EQUIPO DE OBRA**

Durante la presente semana se llevó a cabo una reunión de seguimiento técnico entre la interventoría y el contratista de obra, con el propósito de verificar el estado de avance del proyecto, evaluar el cumplimiento de las actividades programadas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra.

En el desarrollo de la reunión se revisó la culminación de las actividades de excavación, confirmando que estas fueron ejecutadas conforme a las dimensiones, cotas y alineamientos establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Asimismo, se analizó la reprogramación de la actividad correspondiente al solado de limpieza, determinando que su inicio se realizará durante la siguiente semana debido a que las excavaciones finalizaron el viernes 24 de julio, permitiendo contar con las condiciones adecuadas para su ejecución.

De igual manera, se verificó el avance alcanzado en la preparación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo, actividad desarrollada con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y mantener la productividad del proyecto mientras se habilitaban los frentes de trabajo para la construcción de los elementos estructurales. La interventoría constató que estas labores se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas y a los planos estructurales aprobados.

Finalmente, se establecieron los compromisos para la semana siguiente, orientados al inicio de los solados de limpieza, la instalación del acero de refuerzo preparado y la continuidad de las actividades estructurales, reiterando la importancia de mantener una adecuada coordinación entre el contratista y la interventoría, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de seguridad y el cronograma contractual del proyecto.

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Para la siguiente semana se tiene programada la continuidad de las actividades correspondientes a la construcción de los elementos de cimentación y obras complementarias de drenaje del proyecto, de conformidad con la programación de obra, las especificaciones técnicas, los planos de diseño y los demás documentos contractuales aplicables.

Las actividades previstas contemplan la instalación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo PDR 60, garantizando el cumplimiento de las dimensiones, separaciones, traslapos, recubrimientos y demás requisitos estructurales definidos en los diseños aprobados para los elementos de cimentación.

Posteriormente, se prevé la ejecución de las zapatas en concreto de 3000 PSI, incluyendo las labores de preparación del área, verificación de niveles y dimensiones, vaciado, vibrado, acabado y curado del concreto, con el fin de asegurar la adecuada resistencia, estabilidad y comportamiento estructural de las cimentaciones proyectadas.

De manera complementaria, se tiene programada la instalación del filtro con geocompuesto de drenaje Dualdren d = 4", el cual permitirá mejorar las condiciones de drenaje y facilitar el adecuado manejo de las aguas en las zonas intervenidas, contribuyendo a la protección de las cimentaciones y a la durabilidad de la infraestructura.

Durante el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizará el seguimiento técnico permanente, verificando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de los procedimientos constructivos, el cumplimiento de las especificaciones contractuales y la adecuada secuencia de trabajo, con el propósito de garantizar el normal avance de la obra y la continuidad de los frentes programados.

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Durante el período objeto del presente informe, el contrato continuó su ejecución, desarrollando actividades correspondientes a la construcción de los elementos iniciales de cimentación y a la instalación de las redes hidrosanitarias proyectadas. En la presente semana se ejecutaron actividades de solado de limpieza, armado de parrillas de acero para zapatas, instalación de la red hidráulica de 1" y ejecución de la red de aguas lluvias de 6", permitiendo consolidar nuevos frentes de trabajo y garantizar la continuidad del proceso constructivo conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

La interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero permanente a las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de los procedimientos constructivos, la calidad de los materiales empleados, la correcta disposición del acero de refuerzo y la adecuada instalación de las redes hidráulicas y pluviales, así como la observancia de las especificaciones técnicas, las normas aplicables y las obligaciones contractuales.

Como resultado de las actividades desarrolladas durante la semana, se registra un avance físico semanal del 0,60 %, alcanzando un avance físico acumulado total del 2,22 % de ejecución de obra. Desde el punto de vista financiero, este avance representa una ejecución semanal por valor de ONCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($11.068.212) y un valor acumulado ejecutado de CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($41.025.090).

No obstante, al comparar el avance ejecutado frente al avance programado para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un atraso físico del 0,49 %, situación que obedece principalmente a ajustes en la secuencia constructiva derivados de la prolongación de actividades previas de excavación y de las condiciones operativas relacionadas con el suministro de agua durante la temporada de menores lluvias. Pese a ello, el contratista ha implementado medidas de optimización de recursos y reorganización de frentes de trabajo, orientadas a mitigar el impacto del desfase y recuperar progresivamente el rendimiento programado.

En términos generales, el estado actual del contrato evidencia una ejecución con avances físicos y financieros acordes con las actividades desarrolladas durante el período evaluado. Las condiciones técnicas verificadas por la interventoría permiten continuar con la ejecución de las actividades programadas para las siguientes semanas, particularmente las relacionadas con la construcción de las zapatas, vigas de cimentación y la continuidad de las obras hidrosanitarias contempladas en el proyecto.

**OBSERVACIONES**

* Se verificó que las actividades de solado de limpieza se ejecutaron en las áreas previamente excavadas y aprobadas, cumpliendo con los niveles y dimensiones establecidos en los planos del proyecto..

*El armado de parrillas de acero para las zapatas presenta un avance acorde con la programación semanal, observándose una adecuada disposición, amarre y separación del refuerzo conforme a las especificaciones estructurales.

* La instalación de la red hidráulica de 1" y de la red de aguas lluvias de 6" se desarrolla de acuerdo con los alineamientos y pendientes definidos en los diseños hidrosanitarios, sin evidenciarse novedades técnicas relevantes durante el período evaluado.

* Se recomienda al contratista mantener un control permanente sobre el suministro y almacenamiento de agua, considerando las restricciones y racionamientos presentados en la zona por la temporada de menores lluvias, a fin de evitar afectaciones en actividades de mezclas, curado y limpieza de obra.

**FIRMAS**

*Interventoría:*



**CONSORCIO C&L SAPUYES**
**R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA**
**NIT: 902042007-3**

*Supervisor Municipio:*

**ING. JHON STEVEN BURGOS CAICEDO**
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS**

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

# CERTIFICADO PARCIAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA

El CONSORCIO C&L SAPUYES, identificada con NIT 902042007 – 3, representada legalmente por el ingeniero Santiago Alejandro Pantoja Rosero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.215.772 de Pasto (N), en su calidad de Interventor del Contrato de Obra No. LP-2025-002, cuyo objeto es el "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE NARIÑO",

## CERTIFICA QUE:

**Primero:** Que el Contratista de Obra, la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES, identificada con NIT 902033941-1, representada legalmente por el Ingeniero Camilo Andrés Mesa Acosta, ha ejecutado a la fecha treinta y uno (31) de julio de 2026, un 2.22 % del total de la etapa II del proyecto contratado.

Conforme al cronograma inicialmente establecido, se tenía programado un avance del 2.71 % para este mismo período. Por lo tanto, se evidencia un retraso mínimo del 0.49% con respecto a lo planificado en el cronograma.

**Segundo:** Durante el periodo evaluado, no se evidenció el pago de las planillas correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista, relacionadas con los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. El contratista manifestó que dichos pagos se efectúan el doceavo día hábil de cada mes; por lo anterior, esta interventoría establece como fecha límite el día diecinueve (19) de agosto para la entrega de los soportes correspondientes. En consecuencia, no se cuenta con la documentación que acredite el cumplimiento de dichas obligaciones para el periodo objeto de seguimiento.

**Tercero:** El contratista ejecutó las actividades de localización y replanteo correspondientes al proyecto, realizando la materialización en campo de los ejes, niveles, alineamientos y puntos de referencia establecidos en los planos topográficos y de diseño. Para ello se efectuaron verificaciones de coordenadas, cotas y dimensiones generales de la obra, garantizando que la implantación de las cimentaciones, estructuras y redes se desarrollara conforme a las especificaciones técnicas y a la información contenida en los estudios y diseños aprobados.

El contratista ejecutó las actividades de excavación a mano en material común en los sectores definidos para la construcción de cimentaciones y redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, de acuerdo con las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos en los planos

del proyecto. Estas labores permitieron conformar las excavaciones localizadas en zonas donde, por condiciones de espacio, precisión constructiva y presencia de material rocoso, fue necesaria la intervención manual para garantizar el adecuado desarrollo de las obras posteriores.

De igual manera, se realizaron las actividades de excavación mecánica sin clasificar, orientadas a la conformación y nivelación de las áreas de trabajo requeridas para la implantación de las estructuras y redes proyectadas. Las excavaciones se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas y cotas definidas en los diseños aprobados, permitiendo preparar el terreno para la continuidad de las actividades de cimentación y urbanismo contempladas en el contrato.

Como complemento a las excavaciones efectuadas, el contratista llevó a cabo el desalojo del material proveniente de excavación, realizando el cargue, transporte y disposición final del material sobrante en el sitio autorizado por el municipio. Esta actividad permitió mantener los frentes de trabajo en condiciones adecuadas de orden, seguridad y operatividad, facilitando el avance normal de las actividades constructivas programadas.

Posteriormente, se ejecutó el solado de limpieza en concreto de 2500 PSI, el cual fue colocado en el fondo de las excavaciones destinadas a las cimentaciones, con el propósito de proporcionar una superficie uniforme, limpia y estable para la instalación del acero de refuerzo y el posterior vaciado del concreto estructural. La actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de elemento no estructural.

De manera complementaria, se realizó el suministro, corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo PDR 60, utilizado en la conformación de las parrillas y demás elementos de refuerzo requeridos para las zapatas y componentes estructurales asociados. La colocación del acero se efectuó atendiendo las especificaciones de los planos estructurales y las disposiciones técnicas aplicables, verificando diámetros, separaciones, traslapos y recubrimientos correspondientes.

En cuanto a las redes de servicios, el contratista ejecutó la instalación de la red hidráulica en tubería PVC de 1”, desarrollando las actividades de trazado, excavación de zanjas, conformación de cama de apoyo, instalación de tubería y accesorios, así como las verificaciones preliminares de alineación, nivel y estanqueidad. Esta red permitirá la conexión del proyecto con el sistema de abastecimiento de agua potable operado por el prestador de servicios públicos correspondiente.

Finalmente, se adelantó la construcción de la red de aguas lluvias en tubería de 6”, mediante la ejecución de excavaciones, conformación de la cama de apoyo, instalación de la tubería y demás actividades complementarias necesarias para asegurar la correcta captación y conducción de las aguas pluviales generadas en el proyecto. La ejecución de esta red

contribuirá al adecuado manejo hidráulico del área intervenida y a la protección de las estructuras y zonas urbanas proyectadas.

**Cuarto:** En el seguimiento realizado durante el período evaluado, se constató el cumplimiento adecuado y permanente en el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal vinculado a la ejecución de la obra. Durante las visitas de inspección efectuadas por la interventoría, se evidenció que los trabajadores portaban los EPP requeridos para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con los riesgos asociados a cada frente de trabajo y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normativa vigente aplicable.

Así mismo, se verificó que el contratista mantiene controles y acciones de seguimiento orientados a garantizar condiciones seguras de trabajo, incluyendo la socialización de normas de seguridad, supervisión en campo y promoción de buenas prácticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades contractuales y a la prevención de incidentes y accidentes laborales.

Para constancia, se firma la presente acta en el municipio de Sapuyes, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).



**CONSORCIO C&L SAPUYES**
NIT. 902042007 – 3
R.L. SANTIAGO ALEJANDRO PANTOJA ROSERO

CONSORCIO C & L
SAPUYES

CONSORCIO C & L
SAPUYES

# RESUMEN DE CANTIDADES

Cra 33 No. 2-48 Mz A Casa 14 Pasto
consorcioclsapuyes@gmail.com
3178871245

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.01 | Excavación a Mano en Material Común | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| **ZONA CUBIERTA MULTI USO** | | | | | | | | | | | |
| ZAPATAS | 8 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | | 0.30 | | | | | 2.40 |
| VIGAS CIMENTACION 1,2 (EJE A-D) | 2 | 0.25 | 14.00 | 0.30 | | 1.05 | | | | | 2.10 |
| VIGAS CIMENTACION A,B,C,D (EJES 1-2) | 4 | 0.25 | 4.40 | 0.30 | | 0.33 | | | | | 1.32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **5.820** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**



**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.01 | Excavación a Mano en Material Común | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| ACUMULADO HOJA ANTERIOR | | | | | | | | | | | | 5.820 |
| **MALOCA** | | | | | | | | | | | | |
| SOLADO ZAPATAS | | 8 | 1.10 | 1.10 | 0.05 | | 0.06 | | | | | 0.48 |
| SOLADO VIGAS CIMENTACION | | 8 | 0.35 | 4.78 | 0.05 | | 0.08 | | | | | 0.64 |
| SOLADO GRADERIAS | | 1 | | | 0.05 | 16.24 | 0.81 | | | | | 0.81 |
| ZAPATAS | | 8 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | | 0.30 | | | | | 2.40 |
| VIGAS DE CIMENTACION | | 8 | 0.25 | 4.78 | 0.30 | | 0.36 | | | | | 2.88 |
| LOSA DE CONTRAPISO | | 1 | | | 0.10 | 140.92 | 14.09 | | | | | 14.09 |
| PEDESTALES | | 8 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | | 0.30 | | | | | 2.40 |
| VIGA LONGITUDINAL DE CIMENTACION DE GRADERIA (rojo) | | 1 | 0.25 | 20.39 | 0.3 | | 1.53 | | | | | 1.53 |
| VIGAS TRANSVERSAL DE CIMENTACION DE GRADERIA (azul) | | 22 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | | 0.04 | | | | | 0.88 |
| GRADERIA PELDAÑO SUPERIOR | | 1 | 0.45 | 21.25 | 0.45 | | 4.30 | | | | | 4.30 |
| GRADERIA PELDAÑO INFERIOR | | 1 | 0.45 | 25.55 | 0.45 | | 5.17 | | | | | 5.17 |
| **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| GIMNASIO BIOSALUDABLE | | 1 | | | 0.10 | 162.62 | 16.26 | | | | | 16.26 |
| ANDENES | A1 | 1 | 0.80 | 25.50 | 0.10 | | 2.04 | | | | | 2.04 |
| | A2 | 1 | 0.90 | 25.50 | 0.10 | | 2.30 | | | | | 2.30 |
| | A3 | 1 | | | 0.10 | 5.89 | 0.59 | | | | | 0.59 |
| | A4 | 1 | 0.90 | 6.80 | 0.10 | | 0.61 | | | | | 0.61 |
| | A5 | 1 | 0.90 | 4.20 | 0.10 | | 0.38 | | | | | 0.38 |
| | A6 | 1 | | | 0.10 | 25.61 | 2.56 | | | | | 2.56 |
| REDES HIDROSANITARIAS | | 1 | | 42.78 | 0.90 | | 38.50 | | | | | 38.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | | | | | | | 104.640 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**





**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.01 | Excavación a Mano en Material Común | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| **ACUMULADO HOJA ANTERIOR** | | | | | | | | | | | **104.640** |
| Red Aguas Lluvias 3" | 1 | | 65.77 | 0.4 | | 26.31 | | | | | 26.31 |
| Red Aguas Lluvias 4" | 1 | | 105.96 | 0.4 | | 42.38 | | | | | 42.38 |
| Red Aguas Lluvias 6" | 1 | | 11.02 | 0.4 | | 4.41 | | | | | 4.41 |
| Red Aguas Lluvias 8" | 1 | | 4.54 | 0.4 | | 1.82 | | | | | 1.82 |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **179.560** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**





**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.02 | Excavación mecanica sin clasificar | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| **ZONA CUBIERTA MULTI USO** | | | | | | | | | | | |
| NIVELACIÓN DE TERRENO | 1 | 6.70 | 31.00 | 0.13 | | 27.00 | | | | | 27.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **27.000** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**




**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.02 | Excavación mecanica sin clasificar | M3 | CONTRACTUAL |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**









Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUNIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 1 | COMPONENTE ESTRUCTURAL | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 1.02 | | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| **ZONA CUBIERTA MULTI USO** | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIÓN MANUAL | 1 | | | | 179.56 | 179.56 | | | | | 179.56 |
| EXCAVACIÓN CON MAQUINA | 1 | | | | 27 | 27.00 | | | | | 27.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **206.560** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**





**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 31 | MES: | 7 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 3 | ESTRUCTURA Y CONCRETOS | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 3.01 | Solado de Limpieza Concreto 2500 PSI | M3 | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | |
| SOLADO ZAPATAS | 8 | 1.10 | 1.10 | 0.05 | | 0.06 | | | | | 0.48 |
| SOLADO VIGAS CIMENTACION | 8 | 0.35 | 4.78 | 0.05 | | 0.08 | | | | | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| GAS CIMENTACION 1,2 (EJE A-I | 2 | 0.35 | 14.00 | 0.05 | | 0.25 | | | | | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **1.620** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**





**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | **FECHA** | **DIA** | 30 | **MES** | 6 | **AÑO** | 2026 |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **3** | **ESTRUCTURA Y CONCRETOS** | **UNIDAD** / **ESTADO** |
| **ÍTEM** | **3.10** | **ACERO DE REFUERZO FY = 420 Mpa (60.000 psi) INCLUYE FIGURADO E INSTALACIÓN** | **KG** / **CONTRACTUAL** |

| Elemento | L (m) | B (m) | H (m) | Figura (medidas en ml) | Diámetro pulg | Cantidad (und) | 5/8 (1.56) | 1/2 (1.00) | 3/8 (0.56) | 7/8 (3.042) | 3/4 (2.24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T1** | | | | 0.2 — L= 1.30 — 0.2; 0.90 | 1/2 | 192 | | 249.60 | | | |
| **T6** | | | | 0.1; 0.1; L= 0.62; 0.42 | 3/8 | 224 | | | 77.77 | | |
| **T6** | | | | 0.42; Gancho 0.2; 0.42; 0.42; L= 1.88; 0.42 | 3/8 | 112 | | | 117.91 | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | **0.00** | **250.00** | **196.00** | **0.00** | **0.00** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**



**OBSERVACIONES:**

**Vo. Bo.**

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Revisó y aprobó**

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
**RESIDENTE DE OBRA**

**Revisó y aprobó**

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**Elaboró**

**ARQ. JHONNY MURICIO ROSERO CARPIO**
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | **FECHA** | **DIA** | 30 | **MES** | 6 | **AÑO** | 2026 |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 | | | | |

| **CAPITULO** | **3** | **ESTRUCTURA Y CONCRETOS** | **UNIDAD** | **ESTADO** |
|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **3.10** | **Acero de Refuerzo PDR 60** | **KG** | **CONTRACTUAL** |

| Elemento | L (m) | B (m) | H (m) | Figura (medidas en ml) | Diámetro pulg | Cantidad (und) | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 7/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.56 | 1.00 | 0.56 | 3.042 | 2.24 |
| **T1** | | | | 0.2 — **L= 1.30** — 0.2; 0.90 | 1/2 | 96 | | 124.80 | | | |
| **T8** | | | | 0.17; Gancho 0.2; 0.185; 0.185; 0.17; **L= 0.91** | 3/8 | 332 | | | 169.19 | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | **0.00** | **125.00** | **169.00** | **0.00** | **0.00** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD**



**OBSERVACIONES:**

**Vo. Bo.**

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Revisó y aprobó**

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
**RESIDENTE DE OBRA**

**Revisó y aprobó**

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**Elaboró**

**ARQ. JHONNY MURICIO ROSERO CARPIO**
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

# RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA

| CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FECHA | DIA: | 30 | MES: | 6 | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | UNION TEMPORAL DESARROLLO SAPUYES | **CONTRATO No.** | LP-2025-002 |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO C&L SAPUYES | **CONTRATO No.** | CM-2026-001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | 8 | INSTALACIONES HIDROSANITRIAS | **UNIDAD** | **ESTADO** |
| **ÍTEM** | 8.02 | Red Hidráulica 1" PVC | ML | CONTRACTUAL |

| AREA O LUGAR | ELEMENTOS LLENOS | | | | | VALOR PARCIAL | VANOS | | | VALOR PARCIAL | TOTAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMATICO DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | | L | a | h | | | |
| Red | 1 | | 68.72 | | | 68.72 | | | | | 68.72 |  |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL** | | | | | | | | | | | **68.720** | |

**OBSERVACIONES:**

Vo. Bo.

**ING. FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO**
DIRECTOR DE OBRA

Revisó y aprobó

**ING. ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ MORA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó y aprobó

**ING. JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**
RESIDENTE DE OBRA

Elaboró

**ARQ. JHONNY MAURICIO ROSERO CARPIO**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
