MES 10		MES 11		MES 12		MES 13		MES 14		MES 15	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 1,198,452,442.08	5.76%	$ 1,198,452,442.08	5.76%	$ 1,198,452,442.08	5.76%	$ 1,198,452,442.08	5.76%	$ 1,198,452,442.08	5.76%	$ 1,198,452,442.08	5.76%
$ 158,198,405.36	4.24%	$ 158,198,405.36	4.24%	$ 118,648,804.02	3.18%	$ 79,099,202.68	2.12%	$ 79,099,202.68	2.12%	$ 79,099,202.68	2.12%
$ 158,198,405.36	4.41%	$ 158,198,405.36	4.41%	$ 118,648,804.02	3.31%	$ 79,099,202.68	2.21%	$ 79,099,202.68	2.21%	$ 79,099,202.68	2.21%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 178,032,262.50	50.00%
$ 1,356,650,847	3.37%	$ 1,356,650,847	3.37%	$ 1,317,101,246	3.28%	$ 1,277,551,645	3.18%	$ 1,277,551,645	3.18%	$ 1,455,583,907	3.62%
$ 32,326,763,654.44	80.38%	$ 33,683,414,501.88	83.76%	$ 35,000,515,747.98	87.03%	$ 36,278,067,392.74	90.21%	$ 37,555,619,037.50	93.38%	$ 39,011,202,944.76	97.00%

MES 16		MES 17		MES 18	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 987,258,137.40	4.74%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 39,549,601.34	1.06%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 39,549,601.34	1.10%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 178,032,262.50	50.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 1,204,840,001	3.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
$ 40,216,042,946	100.00%	$ 40,216,042,946	100.00%	$ 40,216,042,946	100.00%

VIA LA MESA - EL PALMAR										
					MES 1		MES 2		MES 3	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	PRELIMINARES			$ 263,132,604	$ 0.00	0.00%	$ 263,132,604.00	100.00%	$ 0.00	0.00%
2	DEMOLICIONES			$ 40,426,650	$ 20,213,325.00	50.00%	$ 20,213,325.00	50.00%	$ 0.00	0.00%
3	EXCAVACION			$ 562,306,857	$ 0.00	0.00%	$ 72,321,860.78	12.86%	$ 144,643,721.55	25.72%
4	TRANSPORTE			$ 468,820,425	$ 0.00	0.00%	$ 35,161,531.88	7.50%	$ 105,484,595.63	22.50%
5	RELLENO			$ 1,282,708,692	$ 78,059,549.25	6.09%	$ 281,014,377.30	21.91%	$ 187,342,918.20	14.61%
6	SUB BASE Y BASE			$ 2,853,484,292	$ 0.00	0.00%	$ 114,139,371.68	4.00%	$ 456,557,486.72	16.00%
7	PAVIMENTO			$ 17,007,774,823	$ 344,798,585.40	2.03%	$ 190,233,702.29	1.12%	$ 2,635,638,805.81	15.50%
8	OBRAS HIDRAULICAS			$ 3,457,156,046	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 232,523,450.13	6.73%
	ALCANTARILLAS			$ 3,338,063,973	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 232,523,450.13	6.97%
	BOX CULVERT DE 1.0X1.0 MTS			$ 119,092,074	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION			$ 130,474,772	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
11	OBRAS DE CONTENCION			$ 109,436,654	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
SUB TOTAL				$ 26,175,721,816	$ 443,071,460	1.69%	$ 976,216,773	3.73%	$ 3,762,190,978	14.37%
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADA					$ 443,071,459.65	1.69%	$ 1,419,288,232.57	5.42%	$ 5,181,479,210.60	19.79%

ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RED VIAL DEL

Daniela Maria Granados Miranda

DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERNORTE PC

MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 184,783,232.18	32.86%	$ 160,558,042.50	28.55%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 140,646,127.50	30.00%	$ 187,528,170.00	40.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 187,342,918.20	14.61%	$ 187,342,918.20	14.61%	$ 187,342,918.20	14.61%	$ 174,263,092.65	13.59%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 456,557,486.72	16.00%	$ 456,557,486.72	16.00%	$ 456,557,486.72	16.00%	$ 456,557,486.72	16.00%	$ 456,557,486.72	16.00%	$ 0.00	0.00%
$ 2,635,638,805.81	15.50%	$ 2,635,638,805.81	15.50%	$ 2,635,638,805.81	15.50%	$ 2,635,638,805.81	15.50%	$ 2,635,638,805.81	15.50%	$ 658,909,701.45	3.87%
$ 337,032,322.99	9.75%	$ 337,032,322.96	9.75%	$ 337,032,322.96	9.75%	$ 297,334,964.69	8.60%	$ 297,334,964.69	8.60%	$ 297,334,964.69	8.60%
$ 297,334,964.69	8.91%	$ 297,334,964.69	8.91%	$ 297,334,964.69	8.91%	$ 297,334,964.69	8.91%	$ 297,334,964.69	8.91%	$ 297,334,964.69	8.91%
$ 39,697,358.30	33.33%	$ 39,697,358.27	33.33%	$ 39,697,358.27	33.33%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 43,774,661.60	40.00%	$ 43,774,661.60	40.00%	$ 21,887,330.80	20.00%
$ 3,942,000,893	15.06%	$ 3,964,657,746	15.15%	$ 3,616,571,534	13.82%	$ 3,607,569,011	13.78%	$ 3,433,305,919	13.12%	$ 978,131,997	3.74%
$ 9,123,480,104.00	34.85%	$ 13,088,137,850.19	50.00%	$ 16,704,709,383.88	63.82%	$ 20,312,278,395.36	77.60%	$ 23,745,584,314.18	90.72%	$ 24,723,716,311.13	94.45%

MES 10		MES 11		MES 12		MES 13		MES 14		MES 15	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 297,334,964.69	8.60%	$ 185,527,007.65	5.37%	$ 129,623,029.13	3.75%	$ 129,623,029.13	3.75%	$ 129,623,029.13	3.75%	$ 129,623,029.13	3.75%
$ 297,334,964.69	8.91%	$ 185,527,007.65	5.56%	$ 129,623,029.13	3.88%	$ 129,623,029.13	3.88%	$ 129,623,029.13	3.88%	$ 129,623,029.13	3.88%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 88,084,916.75	67.51%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 297,334,965	1.14%	$ 185,527,008	0.71%	$ 129,623,029	0.50%	$ 129,623,029	0.50%	$ 129,623,029	0.50%	$ 217,707,946	0.83%
$ 25,021,051,275.82	95.59%	$ 25,206,578,283.48	96.30%	$ 25,336,201,312.61	96.79%	$ 25,465,824,341.74	97.29%	$ 25,595,447,370.88	97.78%	$ 25,813,155,316.76	98.61%

MES 16		MES 17		MES 18	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 129,623,029.13	3.75%	$ 129,623,029.13	3.75%	$ 60,930,585.57	1.76%
$ 129,623,029.13	3.88%	$ 129,623,029.13	3.88%	$ 60,930,585.57	1.83%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 88,084,916.75	67.51%	$ 88,084,916.75	67.51%	$ 88,084,916.75	67.51%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 217,707,946	0.83%	$ 217,707,946	0.83%	$ 149,015,504	0.57%
$ 26,030,863,263	99.45%	$ 26,248,571,209	100.28%	$ 26,397,586,713	100.85%

VIA LA MESA - EL MAMON										
					MES 1		MES 2		MES 3	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	PRELIMINARES			$ 516,793,292	$ 0.00	0.00%	$ 103,358,658.40	20.00%	$ 206,717,316.80	40.00%
2	DEMOLICIONES			$ 48,380,404	$ 9,446,740.50	19.53%	$ 37,140,307.50	76.77%	$ 1,793,356.00	3.71%
3	EXCAVACION			$ 319,387,712	$ 0.00	0.00%	$ 29,824,589.25	9.34%	$ 119,298,357.00	37.35%
4	TRANSPORTE			$ 250,647,321	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 125,323,660.50	50.00%
5	RELLENO			$ 653,603,617	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 12,718,439.06	1.95%
6	SUB BASE Y BASE			$ 1,386,748,774	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
7	PAVIMENTO			$ 8,660,150,495	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
8	OBRAS HIDRAULICAS			$ 1,744,418,535	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	ALCANTARILLAS			$ 1,684,872,512	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	BOX CULVERT DE 1.0X1.0 MTS			$ 59,546,022	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION			$ 186,134,149	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
11	OBRAS DE CONTENCION			$ 109,436,654	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
SUB TOTAL				$ 13,875,700,953	$ 9,446,741	0.07%	$ 170,323,555	1.23%	$ 465,851,129	3.36%
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADA					$ 9,446,740.50	0.07%	$ 179,770,295.65	1.30%	$ 645,621,425.01	4.65%


ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RED VIAL DEL

DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERNORTE PC


MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 206,717,316.80	40.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 136,970,390.75	42.89%	$ 33,294,375.00	10.42%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 83,549,107.00	33.33%	$ 41,774,553.50	16.67%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 68,555,420.24	10.49%
$ 55,469,950.96	4.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%
$ 17,561,697.03	0.20%	$ 686,134,877.67	7.92%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%
$ 139,371,436.80	7.99%	$ 139,371,436.80	7.99%	$ 218,412,663.04	12.52%	$ 218,412,663.04	12.52%	$ 218,412,663.04	12.52%	$ 108,814,237.74	6.24%
$ 139,371,436.80	8.27%	$ 139,371,436.80	8.27%	$ 218,412,663.04	12.96%	$ 218,412,663.04	12.96%	$ 218,412,663.04	12.96%	$ 79,041,226.24	4.69%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 29,773,011.50	50.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 690,513,656	4.98%	$ 1,062,388,901	7.66%	$ 1,073,038,361	7.73%	$ 1,073,038,361	7.73%	$ 1,073,038,361	7.73%	$ 981,121,599	7.07%
$ 1,336,135,080.59	9.63%	$ 2,398,523,981.71	17.29%	$ 3,471,562,342.50	25.02%	$ 4,544,600,703.29	32.75%	$ 5,617,639,064.08	40.49%	$ 6,598,760,663.57	47.56%

MES 10		MES 11		MES 12		MES 13		MES 14		MES 15	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%	$ 50,873,756.24	7.78%
$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%	$ 110,939,901.92	8.00%
$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 692,812,039.59	8.00%	$ 697,202,463.85	8.05%
$ 108,814,237.74	6.24%	$ 79,041,226.24	4.53%	$ 79,041,226.24	4.53%	$ 79,041,226.24	4.53%	$ 79,041,226.24	4.53%	$ 79,041,226.24	4.53%
$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%
$ 29,773,011.50	50.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 46,905,805.55	25.20%	$ 46,905,805.55	25.20%
$ 0.00	0.00%	$ 54,718,327.00	50.00%	$ 54,718,327.00	50.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 963,439,935	6.94%	$ 988,385,251	7.12%	$ 988,385,251	7.12%	$ 933,666,924	6.73%	$ 980,572,730	7.07%	$ 984,963,154	7.10%
$ 7,562,200,599.06	54.50%	$ 8,550,585,850.05	61.62%	$ 9,538,971,101.04	68.75%	$ 10,472,638,025.03	75.47%	$ 11,453,210,754.56	82.54%	$ 12,438,173,908.36	89.64%

MES 16		MES 17		MES 18	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 12,718,439.06	1.95%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 110,939,901.92	8.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 675,250,342.56	7.80%	$ 348,692,757.46	4.03%	$ 0.00	0.00%
$ 79,041,226.24	4.53%	$ 79,041,226.24	4.53%	$ 39,520,614.12	2.27%
$ 79,041,226.24	4.69%	$ 79,041,226.24	4.69%	$ 39,520,614.12	2.35%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 46,905,805.55	25.20%	$ 45,416,732.36	24.40%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 924,855,715	6.67%	$ 473,150,716	3.41%	$ 39,520,614	0.28%
$ 13,363,029,624	96.31%	$ 13,836,180,340	99.72%	$ 13,875,700,954	100.00%

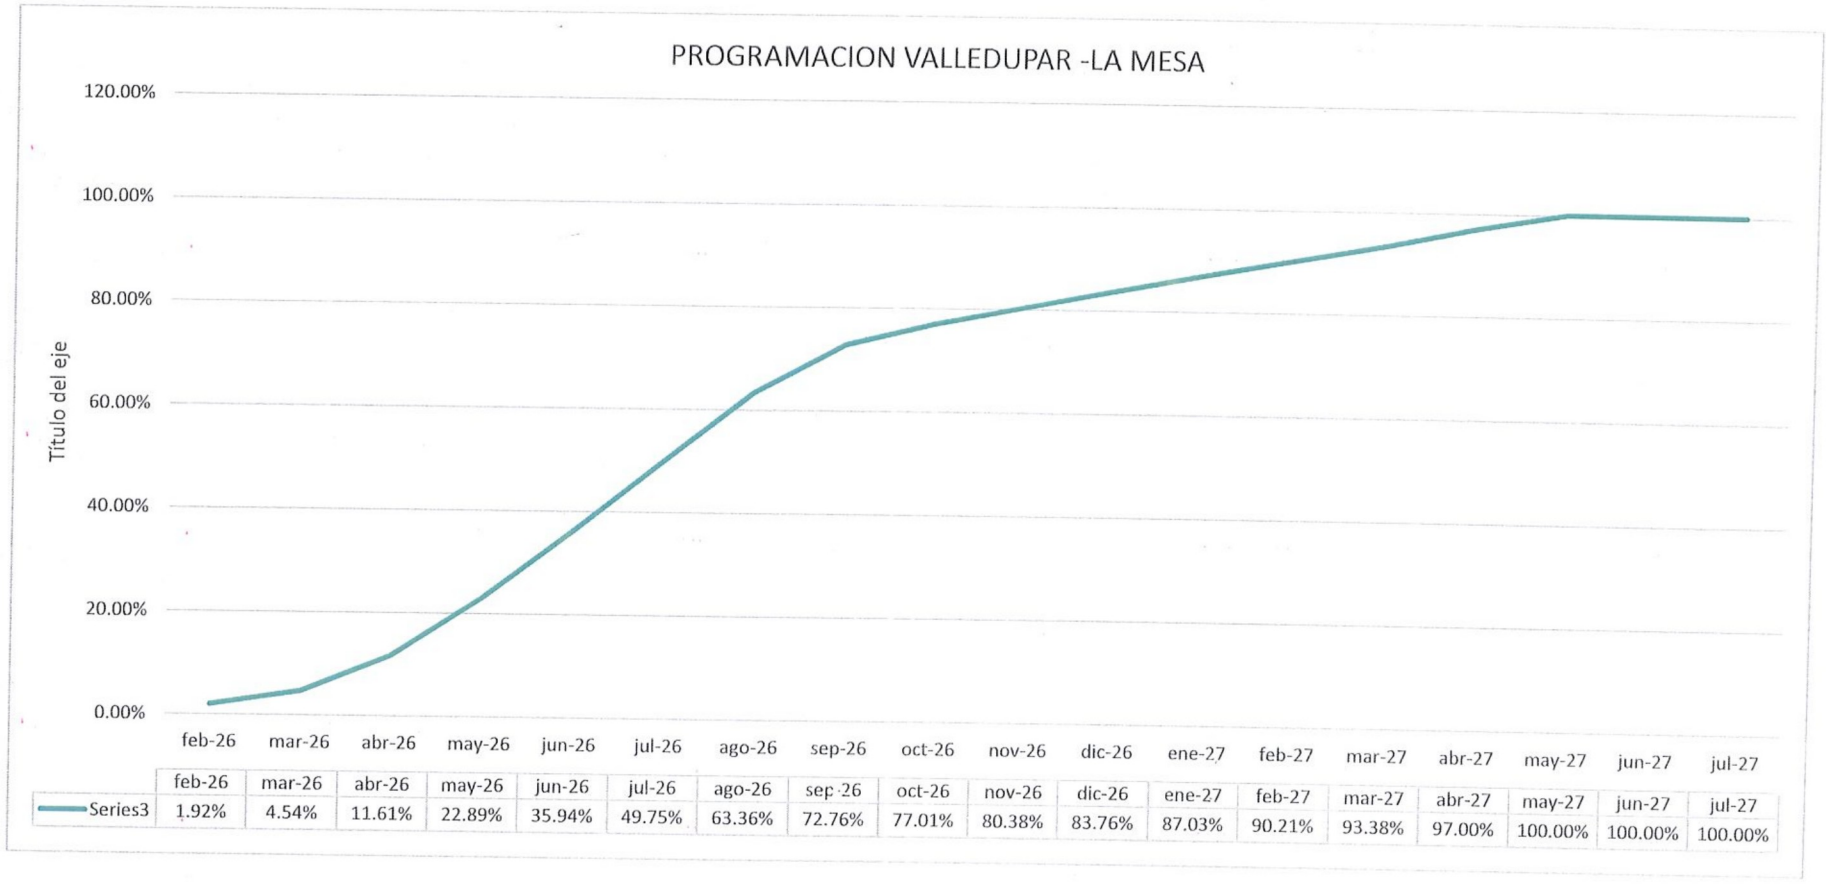

	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27
Series3	1.92%	4.54%	11.61%	22.89%	35.94%	49.75%	63.36%	72.76%	77.01%	80.38%	83.76%	87.03%	90.21%	93.38%	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%

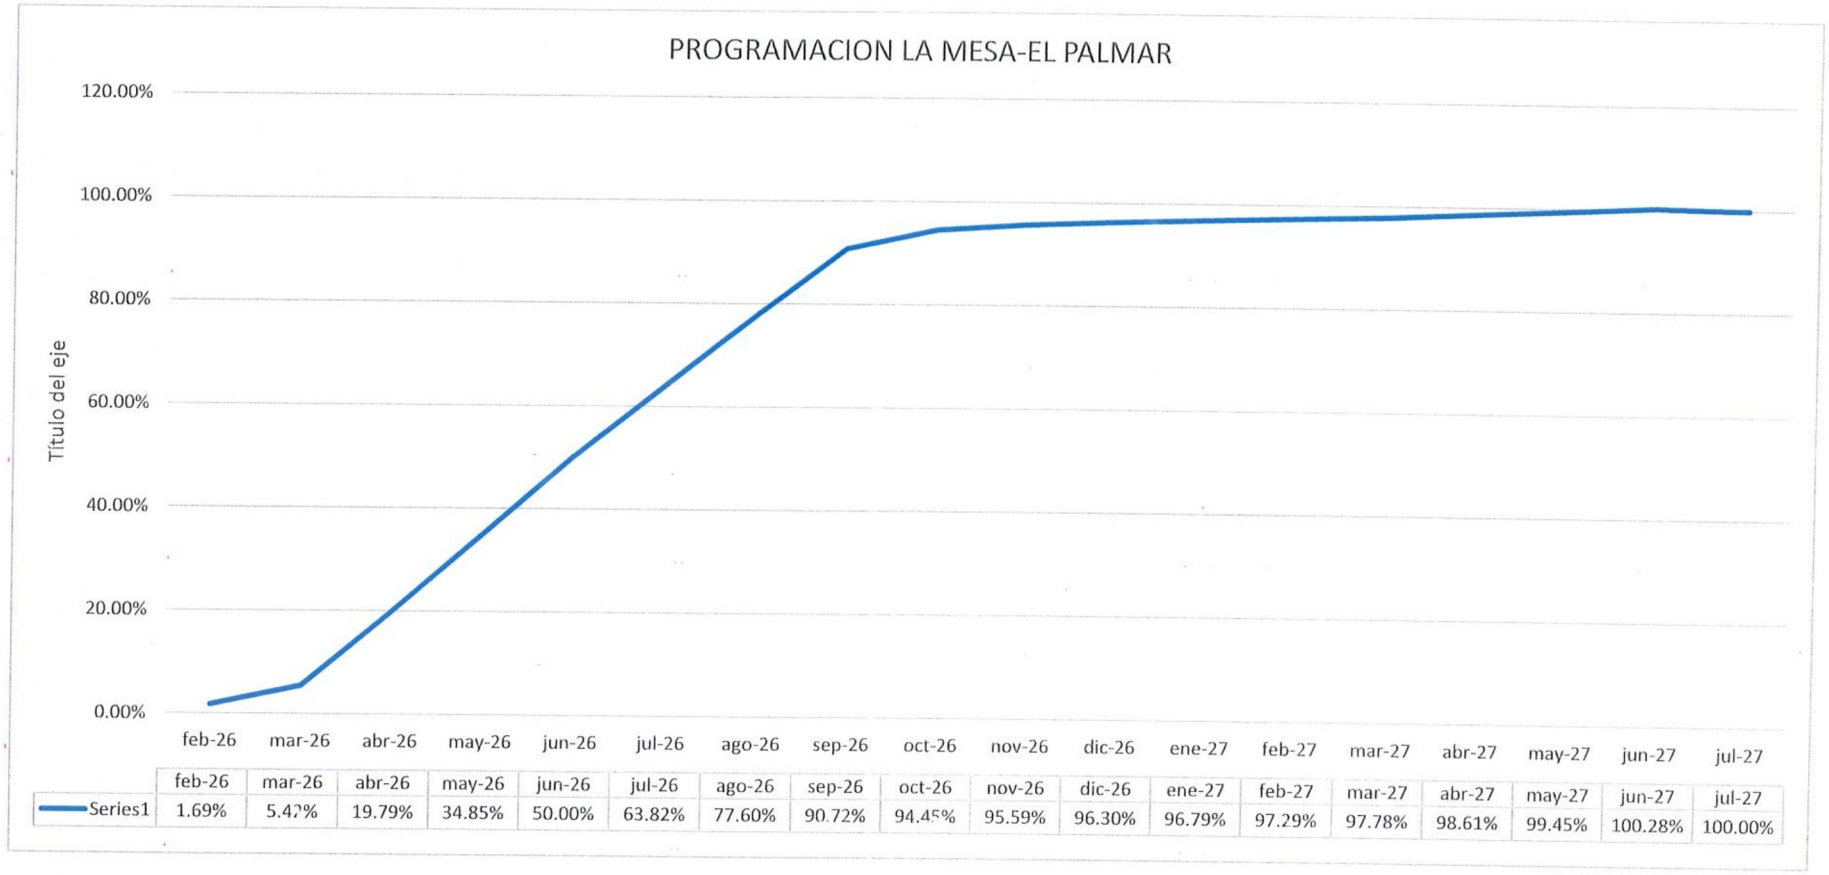
PROGRAMACION LA MESA-EL PALMAR
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Título del eje
feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27
Series1 1.69% 5.47% 19.79% 34.85% 50.00% 63.82% 77.60% 90.72% 94.45% 95.59% 96.30% 96.79% 97.29% 97.78% 98.61% 99.45% 100.28% 100.00%


PROGRAMACION LA MESA - EL MAMON
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Título del eje
feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27
Series1
feb-26 0.07%
mar-26 1.30%
abr-26 4.65%
may-26 9.63%
jun-26 17.29%
jul-26 25.02%
ago-26 32.75%
sep-26 40.49%
oct-26 47.56%
nov-26 54.50%
dic-26 61.62%
ene-27 68.75%
feb-27 75.47%
mar-27 82.54%
abr-27 89.64%
may-27 96.31%
jun-27 99.72%
jul-27 100.00%

PROGRAMACION INICIAL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA DE LA SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR								
PROGRAMACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR								
			MES 1		MES 2		MES 3	
No.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	PRELIMINARES	$ 635,210,302	$ 0.00	0.00%	$ 317,605,151.00	50.00%	$ 317,605,151.00	50.00%
2	DEMOLICIONES	$ 107,118,510	$ 0.00	0.00%	$ 91,189,657.25	85.13%	$ 15,928,852.75	14.87%
3	EXCAVACION	$ 1,006,215,340	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 503,107,670.00	50.00%
4	TRANSPORTE	$ 322,754,557	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 121,032,958.88	37.50%
5	RELLENO	$ 19,335,081,751	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 697,772,097.48	3.61%
6	SUB BASE Y BASE	$ 5,860,958,780	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
7	PAVIMENTO	$ 22,607,563,966	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
8	OBRAS HIDRAULICAS	$ 8,690,522,194	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	ALCANTARILLAS Y CUNETAS	$ 5,049,607,876	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	BOX CULVERT DE 2MX2M	$ 718,145,667	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	BOX CULVERT 3.0 X 2.0 M	$ 633,964,130	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
	CANAL RECTANGULAR	$ 2,288,804,520	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION	$ 367,665,210	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
10	GAVIONES	$ 2,307,717,000	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
11	PUENTE	$ 2,701,836,198	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
SUB TOTAL		$ 63,942,643,808	$ 0.00	0.00%	$ 408,794,808	0.64%	$ 1,655,446,730	2.59%
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADA			$ 0.00	0.00%	$ 408,794,808.25	0.64%	$ 2,064,241,538.35	3.23%
TOTAL PROGRAMAS		$ 563,028,283	$ 67,551,326.83	12.00%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADA PROGRAMAS			$ 67,551,326.83	12.00%	$ 95,793,084.86	17.01%	$ 124,034,842.90	22.03%


ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RED VIAL DEL

DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERNORTE PC

MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 503,107,670.00	50.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 161,377,278.50	50.00%	$ 40,344,319.63	12.50%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 1,251,456,870.95	6.47%	$ 1,192,679,370.95	6.17%	$ 2,961,037,423.84	15.31%	$ 5,922,074,847.68	30.63%	$ 5,551,945,169.70	28.71%
$ 439,571,908.50	7.50%	$ 1,172,191,756.00	20.00%	$ 1,172,191,756.00	20.00%	$ 1,172,191,756.00	20.00%	$ 1,172,191,756.00	20.00%
$ 881,047,367.82	3.90%	$ 1,800,148,684.26	7.96%	$ 2,123,406,331.83	9.39%	$ 3,093,179,274.54	13.68%	$ 3,093,179,274.54	13.68%
$ 1,490,138,132.80	17.15%	$ 1,058,376,750.06	12.18%	$ 922,591,562.34	10.62%	$ 508,540,469.20	5.85%	$ 712,715,720.80	8.20%
$ 1,490,138,132.80	29.51%	$ 627,489,350.00	12.43%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%
$ 0.00	0.00%	$ 430,887,400.06	60.00%	$ 287,258,266.94	40.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 380,378,478.60	60.00%	$ 253,585,652.40	40.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 457,760,904.00	20.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 4,726,699,229	7.39%	$ 5,263,740,881	8.23%	$ 7,179,227,074	11.23%	$ 10,695,986,347	16.73%	$ 10,530,031,921	16.47%
$ 6,790,940,766.92	10.62%	$ 12,054,681,647.82	18.85%	$ 19,233,908,721.82	30.08%	$ 29,929,895,069.24	46.81%	$ 40,459,926,990.27	63.28%
$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%
$ 152,276,600.93	27.05%	$ 180,518,358.96	32.06%	$ 208,760,116.99	37.08%	$ 237,001,875.02	42.09%	$ 265,243,633.06	47.11%

MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		MES 13	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 1,758,115,970.41	9.09%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 732,619,847.50	12.50%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 1,800,148,684.26	7.96%	$ 1,800,148,684.26	7.96%	$ 1,800,148,684.26	7.96%	$ 1,800,148,684.26	7.96%	$ 938,128,290.74	4.15%
$ 712,715,720.80	8.20%	$ 712,715,720.80	8.20%	$ 712,715,720.80	8.20%	$ 712,715,720.80	8.20%	$ 254,954,816.80	2.93%
$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 457,760,904.00	20.00%	$ 457,760,904.00	20.00%	$ 457,760,904.00	20.00%	$ 457,760,904.00	20.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 540,367,239.49	20.00%	$ 540,367,239.52	20.00%	$ 540,367,239.52	20.00%	$ 540,367,239.52	20.00%
$ 5,003,600,223	7.83%	$ 3,053,231,645	4.77%	$ 3,053,231,645	4.77%	$ 3,053,231,645	4.77%	$ 1,733,450,347	2.71%
$ 45,463,527,213.23	71.10%	$ 48,516,758,857.78	75.88%	$ 51,569,990,502.35	80.65%	$ 54,623,222,146.92	85.43%	$ 56,356,672,493.97	88.14%
$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%
$ 293,485,391.09	52.13%	$ 321,727,149.12	57.14%	$ 349,968,907.15	62.16%	$ 378,210,665.18	67.17%	$ 406,452,423.22	72.19%

MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 938,128,290.74	4.15%	$ 938,128,290.74	4.15%	$ 938,128,290.74	4.15%	$ 614,870,643.17	2.72%	$ 48,624,489.89	0.22%
$ 254,954,816.80	2.93%	$ 254,954,816.80	2.93%	$ 254,954,816.80	2.93%	$ 127,477,408.40	1.47%	$ 0.00	0.00%
$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 254,954,816.80	5.05%	$ 127,477,408.40	2.52%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 73,533,042.00	20.00%	$ 73,533,042.00	20.00%	$ 73,533,042.00	20.00%	$ 73,533,042.00	20.00%	$ 73,533,042.00	20.00%
$ 461,543,400.00	20.00%	$ 923,086,800.00	40.00%	$ 923,086,800.00	40.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 540,367,238.97	20.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%
$ 2,268,526,789	3.55%	$ 2,189,702,950	3.42%	$ 2,189,702,950	3.42%	$ 815,881,094	1.28%	$ 122,157,532	0.19%
$ 58,625,199,282.47	91.68%	$ 60,814,902,232.01	95.11%	$ 63,004,605,181.55	98.53%	$ 63,820,486,275.11	99.81%	$ 63,942,643,808.4	100.00%
$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 28,241,758.03	5.02%	$ 31,780,680.43	5.64%	$ 40,069,905.05	7.12%
$ 434,694,181.25	77.21%	$ 462,935,939.28	82.22%	$ 491,177,697.31	87.24%	$ 522,958,377.74	92.88%	$ 563,028,283	100.00%

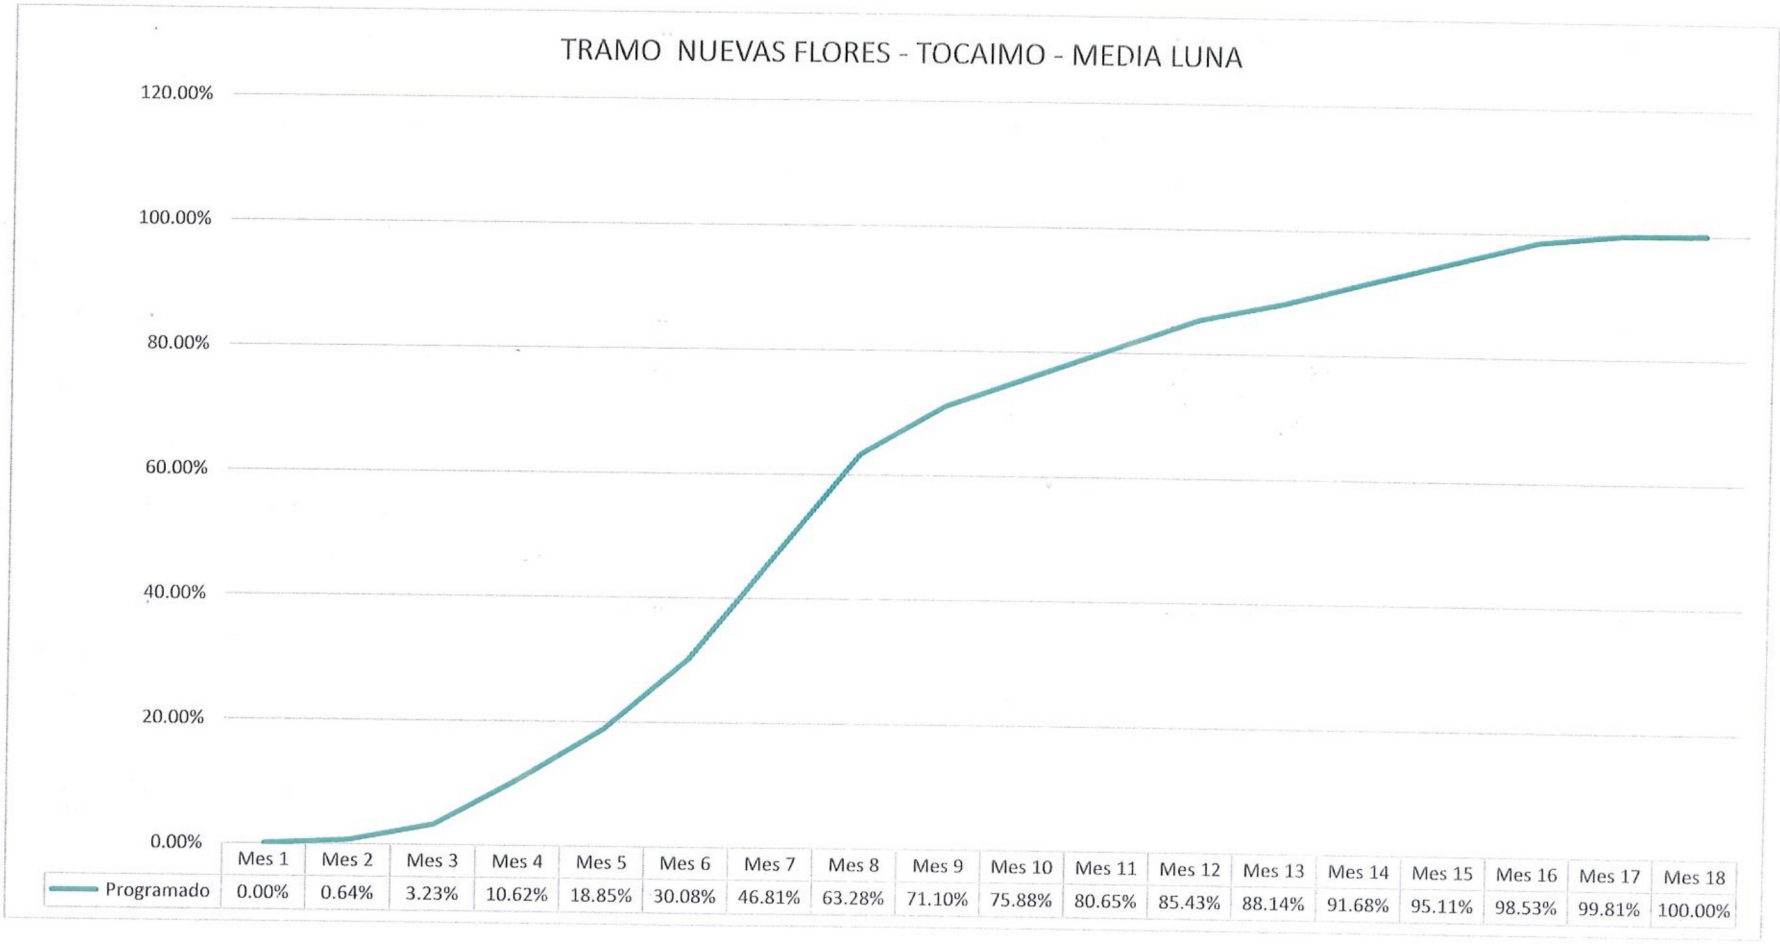

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18
Programado	0.00%	0.64%	3.23%	10.62%	18.85%	30.08%	46.81%	63.28%	71.10%	75.88%	80.65%	85.43%	88.14%	91.68%	95.11%	98.53%	99.81%	100.00%

ANEXO - 6. INFORMES SEMANALES – UNION TEMPORAL RED VIAL.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	SEMANA INFORME:	1	DEL: 10-feb-2026	AL:	15-feb-2026


II. AVANCE POR TRAMO


			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO POR TRAMO	% AVANCE EJECUTADO POR TRAMO	
1.	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	0,000%	0,091%	✓	0,000%	0,250%	✓
2.1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANILLO VIAL-LA TRAMACUA- LA MESA	0,078%	0,164%	✓	0,341%	0,722%	✓
2.2	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA - EL PALMAR	0,000%	0,101%	✓	0,003%	0,676%	✓
2.3	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA -EL MAMON	0,000%	0,051%	✓	0,000%	0,654%	✓
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	0,028%	0,043%	✓	0,152%	0,238%	✓


% AVANCE DEL CONTRATO	0,11%	0,45%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO	1,86

III. CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

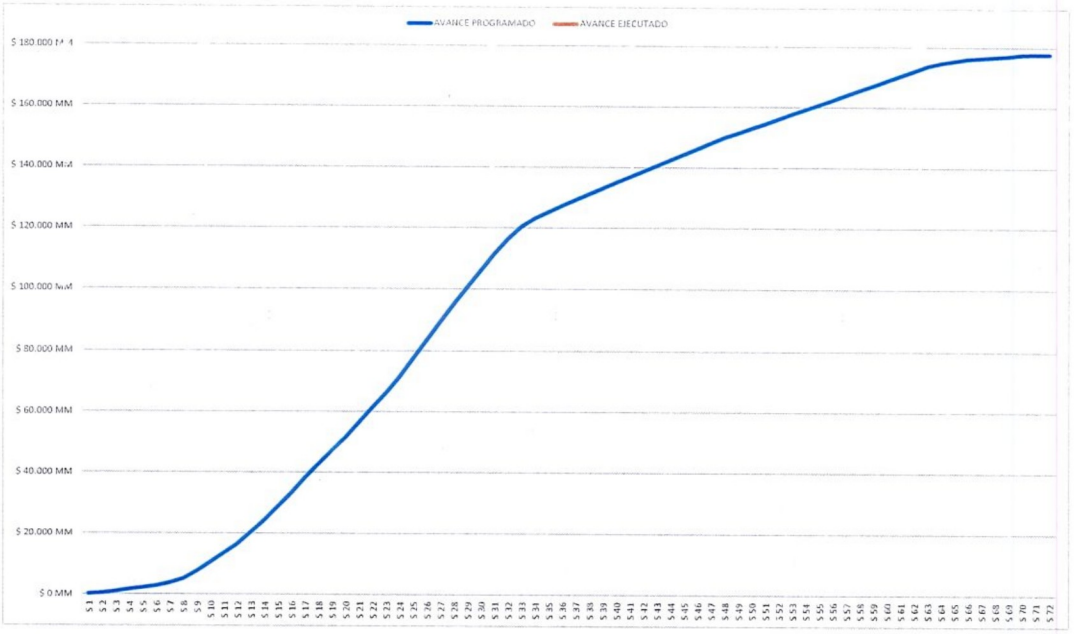












VALORES EXPRESADOS EN MILLONES (MM)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 64.505.672.090,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	1	DEL:	10-feb-2026	AL:	15-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	POR:	1	TRAMO:			A

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 0
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 171.500.564
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 186.113.869,51
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.659.804.884,76
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FISICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	635,21	0,00	0,00%	57,30	9,02%	9,02%	9,02%
2. DEMOLICIONES	107,12	0,00	0,00%	3,95	3,69%	3,69%	3,69%
3. EXCAVACION	1.006,22	0,00	0,00%	82,65	8,21%	8,21%	8,21%
4. TRANSPORTE	322,75	0,00	0,00%	26,51	8,21%	8,21%	8,21%
5. RELLENO	19.335,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. SUB BASE Y BASE	5.860,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	22.607,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	8.690,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	367,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. GAVIONES	2.307,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. PUENTE	2.701,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	290,94	0,00	0,00%	0,58	0,20%	0,20%	0,20%
13. PMT	254,39	0,00	0,00%	0,51	0,20%	0,20%	0,20%
14. CV	17,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

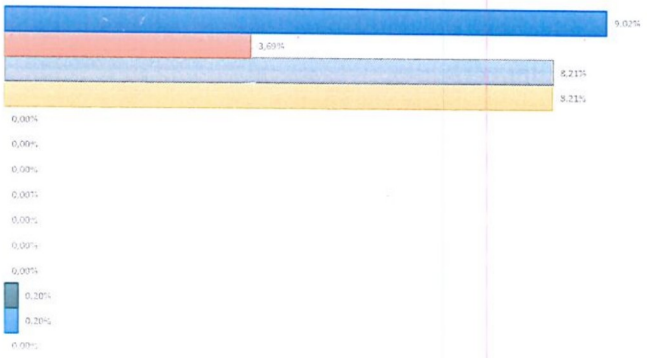

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERÍODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	6

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7	HITO 8
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	PUENTE	
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00		

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

#	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	9885,5	$ 57.296.358,00	9,0%	9,0%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,6	$ 3.949.634,40	9,5%	9,5%
3. EXCAVACION	1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	2359	$ 82.652.283,00	8,2%	8,2%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	15333,5	$ 26.511.621,50	8,2%	8,2%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,002	$ 581.885,64	0,2%	0,2%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,002	$ 508.781,70	0,2%	0,2%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 1

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,10%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,27%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,10%	1,44

VII. OBSERVACIONES

Se inicia la semana con actividades relativas a localización y replanteo e implantación del proyecto donde se encontró un sector entre la via nacional y el K5+000 con condiciones favorables para el inicio de actividades constructivas en ese sector. En ese orden de ideas se iniciaron labores relativas a mejoramiento de subrasante, desmonte y limpieza excavaciones y terraplén y el retiro de los materiales provenientes de estas actividades constructivas.

Así mismo se inicio el proceso de elaboración de actas de vecindad por parte de los profesionales del área social.

No se presentaron novedades climáticas que afectaran las labores.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR - LA MESA

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
VR. CONT. TRAMO :	$ 40.489.091.536,22	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	1	DEL:	10-feb-2026	AL: 15-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	BUE:	2	TRAMO:	B	

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 136.881.270
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 293.837.945
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 186.113.869,51
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.537.467.503,76
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	811,39	0,00	0,00%	34,71	4,28%	4,28%	4,28%
2. DEMOLICIONES	818,59	136,84	16,72%	76,78	9,38%	-7,34%	9,38%
3. EXCAVACION	773,65	0,00	0,00%	30,66	3,96%	3,96%	3,96%
4. TRANSPORTE	601,34	0,00	0,00%	27,50	4,57%	4,57%	4,57%
5. RELLENO	2.790,90	0,00	0,00%	122,49	4,39%	4,39%	4,39%
6. SUB BASE Y BASE	9.520,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	20.808,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.735,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	356,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. PAGA	123,66	0,02	0,02%	0,83	0,68%	0,66%	0,68%
1.. PMT	127,50	0,02	,02%	0,86	0,68%	0,66%	0,68%
12. CV	21,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

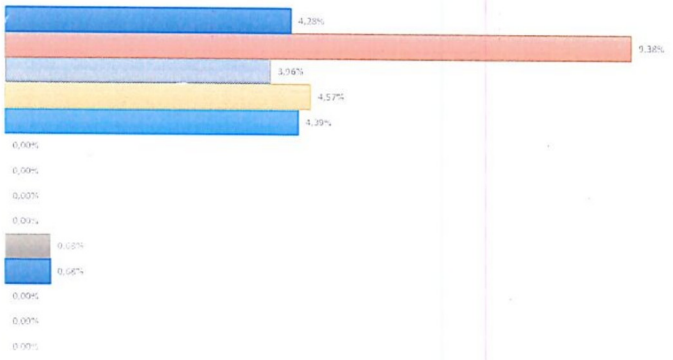

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
RETROCARGADOR	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 18m3	6								6
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
FRESADORA DE PAVIMENTO	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	10
CONDUCTOR VEHICULO PESADO	7
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	5
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	4

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERÍODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	5989	$ 34.712.244,00	4,3%	4,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,69	$ 4.917.921,87	10,4%	10,4%
2. DEMOLICIONES	4	FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (H=0.07)	M2	7058	$ 71.857.498,00	9,6%	9,6%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	875	$ 30.657.375,00	4,2%	4,2%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	15925	$ 27.502.857,20	4,6%	4,6%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	874,5	$ 122.494.713,00	4,5%	4,5%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,00675	$ 834.726,09	0,7%	0,7%
11. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,00675	$ 860.610,08	0,7%	0,7%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR - LA MESA

INFORME SEMANAL N° 1

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,34%
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,10%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,73%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,17%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO: 2,10

VII. OBSERVACIONES

Durante el periodo de inicio del proyecto se adelantaron las primeras intervenciones sobre el corredor vial. En materia de obras civiles se ejecutaron trabajos de mejoramiento de subrasante, desmonte y limpieza de zonas de cobertura boscosa, remoción de alcantarillas existentes. fresado y excavaciones para la ampliación de la banca, con el correspondiente cargue y transporte de materiales a los sitios de disposición autorizados.

La comisión topográfica mantuvo presencia permanente en campo, garantizando la correcta localización y replanteo de las obras. El equipo social avanzó en el diligenciamiento de actas de vecindad con los propietarios y ocupantes de predios en el área de influencia directa del proyecto.

En cuanto al manejo de tránsito y control ambiental, se implemento señalización preventiva y personal de paleteros en los frentes de trabajo, así como hidratación periódica de la superficie de rodadura para mitigar la generación de material particulado. Las condiciones climáticas fueron secas durante todo el periodo, sin afectaciones sobre el desarrollo de las actividades.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO







ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 26.576.814.286,91	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	1	DEL:	10-feb-2026	AL:	15-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	2		TRAMO:		C

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 28.060
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 179.779.076
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 186.113.869,51
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.651.526.372,66
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	263,13	0,00	0,00%	36,16	13,74%	13,74%	13,74%
2. DEMOLICIONES	40,43	0.00	0,00%	2,28	5,64%	5,64%	5,64%
3. EXCAVACION	562,31	0,00	0,00%	31,17	5,54%	5,54%	5,54%
4. TRANSPORTE	468,82	0,00	0,00%	27,99	5,97%	5,97%	5,97%
5. RELLENO	1.282,71	0,00	0,00%	81,03	6,32%	6,32%	6,32%
6. SUB BASE Y BASE	2.853,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	17.007,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.457,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	352,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	81,17	0,01	0,02%	0,57	0,70%	0,68%	0,70%
13. PMT	83,69	0,01	0,02%	0,59	0,70%	0,68%	0,70%
14. CV	14,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

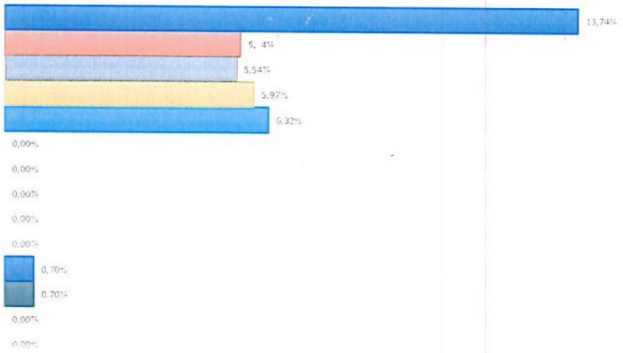

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
VOLQUETA 18m3	3								3
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	6
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	1

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	6238	$ 36.155.448,00	13,7%	13,7%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,32	$ 2.280.775,36	11,9%	11,9%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	889,5	$ 31.165.411,50	6,7%	6,7%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	16188,9	$ 27.990.608,10	6,0%	6,0%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	578,5	$ 81.032.809,00	6,5%	6,5%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 568.202,50	0,7%	0,7%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 585.821,88	0,7%	0,7%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 1

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,10%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,68%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,10%	3,66

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana se ejecutaron las actividades iniciales del proyecto, incluyendo desmonte y limpieza en zona boscosa, así como el mejoramiento de la subrasante mediante la adecuación y conformación del suelo existente, conforme a los criterios técnicos de capacidad de soporte y nivelación. Igualmente, se realizó ejecución de excavaciones sin clasificar para la conformación de la explanación, canales y zonas de préstamo, de acuerdo con los diseños y especificaciones del proyecto.

La comisión de topografía desarrolló actividades de localización y replanteo, asegurando el control geométrico de los ejes, cotas y secciones transversales requeridas para la correcta ejecución de las obras.

Se dio inicio a la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), garantizando el control de impactos ambientales y la adecuada regulación del tránsito en el área de influencia.

Las condiciones climáticas se mantuvieron favorables, permitiendo la ejecución continua de las actividades sin interferencias operativas. En términos generales, el desarrollo de la obra se ajusta a la programación establecida y a las especificaciones técnicas del proyecto.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO:	$ 13.969.910.634,72	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	1	DEL:	10-feb-2026	AL:	15-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	BOE:	2	TRAMO:			D

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 14.749
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 39.226.302
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 186.113.869,51
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.792.079.147,15
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	516,79	0,00	0,00%	11,01	2,13%	2,13%	2,13%
2. DEMOLICIONES	48,38	0,00	0,00%	0,95	1 96%	1,96%	1,96%
3. EXCAVACION	319,39	0,00	0,00%	15,77	4,94%	4,94%	4,94%
4. TRANSPORTE	250,65	0,00	0,00%	10,89	4,35%	4,35%	4,35%
5. RELLENO	653,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. SUB BASE Y BASE	1.386,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	8.660,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	1.744,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	186,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	42,67	0,01	0,02%	0,30	0 70%	0,68%	0,70%
13. PMT	43,99	0,01	0,02%	0,31	0,70%	0,68%	0,70%
14. CV	7,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

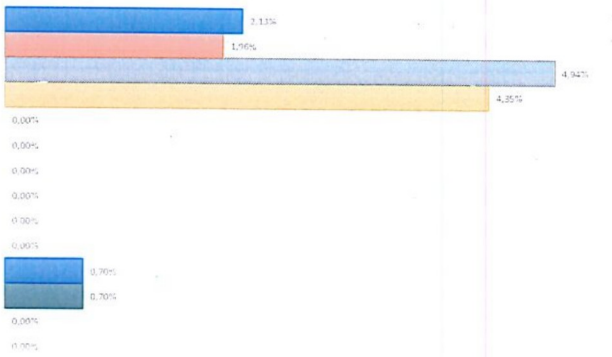

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 18m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	3248	$ 18.825.408,00	3,6%	3,6%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,1	$ 712.742,30	1,9%	1,9%
2. DEMOLICIONES	3	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5M)	ML	8	$ 1.085.720,00	31,7%	31,7%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	428,6	$ 15.016.858,20	6,3%	6,3%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	7800,52	$ 13.487.099,08	5,4%	5,4%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	297	$ 41.601.978,00	6,5%	6,5%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 298.671,55	0,7%	0,7%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 298.671,55	0,7%	0,7%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE NIT. 901021182-9

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 1

ELABORADO POR:

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 1

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,10%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,28%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,02%	1,52

VII. OBSERVACIONES


Durante la semana 1 se ejecutaron actividades iniciales en el Tramo D, enfocadas en la adecuación de la plataforma vial. Se desarrollaron labores de MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE, junto con DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA, permitiendo la habilitación de las áreas de trabajo.


Así mismo, se realizó la REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5 m) y la EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES, necesarias para la conformación de la sección vial.

El material resultante fue objeto de TRANSPORTE DE MATERIALES, y se adelantaron trabajos de TERRAPLÉN para la conformación de la rasante de diseño.

En paralelo, se inició la implementación del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), garantizando el manejo adecuado de los impactos asociados a la obra.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

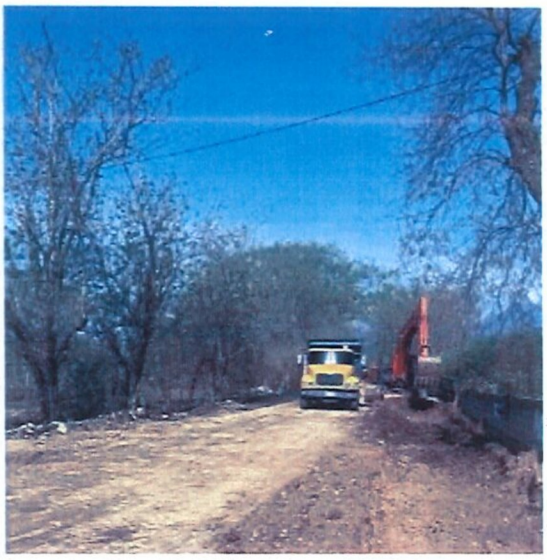

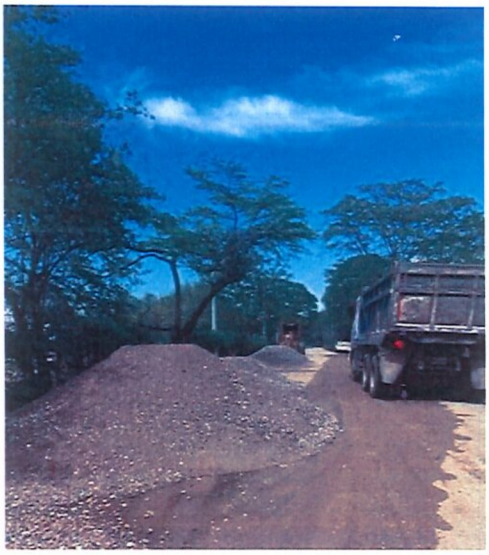

ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 1

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 32.289.816.901,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	1	DEL:	10-feb-2026	AL:	15-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	EDT:	3	TRAMO:			E

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 49.189.790
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 84.546.110
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 186.113.869,51
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.746.759.339,06
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FISICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	2.285,31	34,28	1,50%	20,35	0,89%	-0,61%	0,89%
2. MATERIALES GRANULARES	3.089,52	13,08	0,42%	54,37	1,76%	1,34%	1,76%
3. CAPA DE RODADURA	19.752,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. ESPACIO PÚBLICO	6.424,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	159,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. REPOSICION DE REDES HIDRAULICAS	74,54	0,00	0,00%	7,81	10,48%	10,48%	10,48%
7. PMT	309,30	1,13	0,36%	1,24	0,40%	0,04%	0,40%
8. PMA	194,70	0,71	0,36%	0,78	0,40%	0,04%	0,40%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

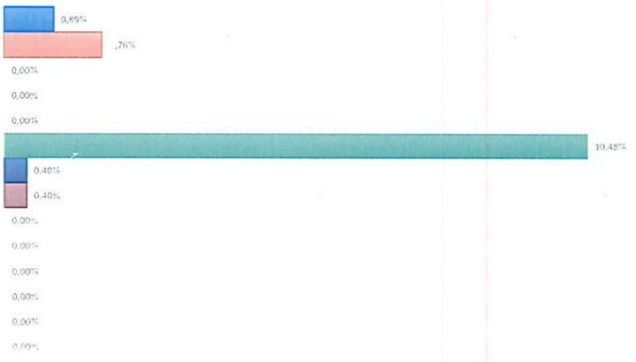

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

V. EJECUTADO EN EL PERÍODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE LA EXPLANACIÓN	m3	300	$ 10.511.100,00	0,9%	0,9%
1. PRELIMINARES	2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1075	$ 4.441.900,00	1,2%	1,2%
1. PRELIMINARES	3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3-km	3900	$ 5.394.480,00	0,7%	0,7%
2. MATERIALES GRANULARES	1	SUBBASE GRANULAR	m3	378	$ 54.368.496,00	2,1%	2,1%
7. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,004	$ 1.237.200,00	0,4%	0,4%
8. PMA	1	PMA	GLOBAL	0,004	$ 778.812,98	0,4%	0,4%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE NIT. 901052182-9

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 1

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,15%
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,10%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,26%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,05%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO: 0,59

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana se ejecutaron actividades iniciales correspondientes a la excavación mecánica de la explanación, conformación de la calzada existente y transporte de material proveniente de las excavaciones. De igual manera, se adelantó la colocación de subbase granular y la ejecución de excavaciones mecánicas y manuales para la instalación de tuberías de alcantarillado y acometidas domiciliarias, conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.

Se contó con acompañamiento permanente de la comisión de topografía, garantizando el control de niveles, alineamientos y localización de las intervenciones. Asimismo, se realizó la gestión social mediante la elaboración de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto.

Durante la ejecución se identificaron redes de tuberías existentes en materiales que no cumplen con las especificaciones normativas, por lo cual fue necesario realizar su reemplazo por tubería PVC sanitaria de 8", asegurando la funcionalidad y durabilidad del sistema.

Se dio inicio a la implementación de los planes de manejo de tránsito (PMT) y manejo ambiental (PMA), en cumplimiento de la normativa vigente.

Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades. En general, el avance de obra se ajusta a la programación establecida y a los lineamientos técnicos del proyecto.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	SEMANA INFORME:	2	DEL:	16-feb-2026	AL:	22-feb-2026


II. AVANCE POR TRAMO

			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO POR TRAMO	% AVANCE EJECUTADO POR TRAMO	
1.	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	0,000%	0,264%	✓	0,000%	0,726%	✓
2.1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANILLO VIAL-LA TRAMACUA- LA MESA	0,184%	0,467%	✓	0,807%	2,051%	✓
2.2	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA - EL PALMAR	0,001%	0,286%	✓	0,005%	1,913%	✓
2.3	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA -EL MAMÓN	0,000%	0,143%	✓	0,000%	1,823%	✓
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	0,094%	0,117%	✓	0,519%	0,644%	✓

% AVANCF DEL CONTRATO	0,28%	1,28%


DÍAS DE AVANCE O RETRASO	5,39

III. CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

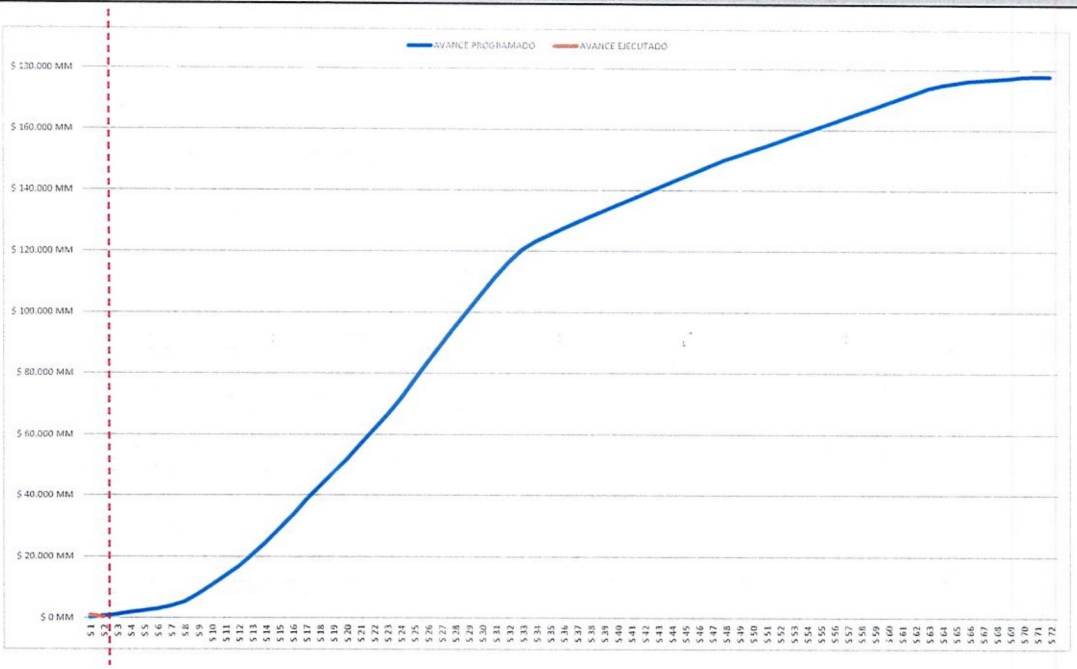












VALORES EXPRESADOS EN MILLONES (MM)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARÉO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO:	$ 64.505.672.090,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	2	DEL:	16-feb-2026	AL:	22-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	ZUE:	1	TRAMO:			A

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 0
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 479.043.319
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 492.200.740,09
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.352.262.130,45
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FISICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	635,21	0,00	0,00%	158,05	24,88%	24,88%	24,88%
2. DEMOLI :IONES	107,12	0,00	0,00%	11,57	10,80%	10,80%	10,80%
3. EXCAVACION	1.006,22	0,00	0,00%	232,63	23,12%	23,12%	23,12%
4. TRANSPORTE	322,75	0,00	0,00%	74,62	23,12%	23,12%	23,12%
5. RELLENO	19.335,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. SUB BASE Y BASE	5.860,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	22.607,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	8.690,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	367,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. GAVIONES	2.307,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. PUF ITE	2.701,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	290,94	0,00	0,00%	1,16	0,40%	0,40%	0,40%
13. PMT	254,39	0,00	0,00%	1,02	0,40%	0,40%	0,40%
14. CV	17,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

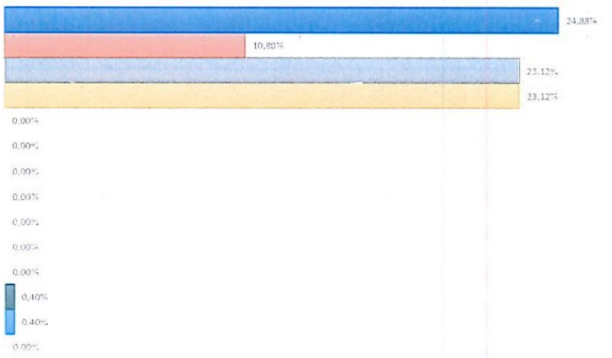

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
RETROCARGADOR		1							1
VOLQUETA 18m3	5	1							6
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	6
CONDUCTOR VEHICULO PESADO	7
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7	HITO 8
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	PUENTE	
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00		

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERÍODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	17382,500	$ 100.748.970,00	15,9%	24,9%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,157	$ 7.616.211,67	18,4%	27,9%
3. EXCAVACION	1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	4280,600	$ 149.979.382,20	14,9%	23,1%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	27823,900	$ 48.107.523,10	14,9%	23,1%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,002	$ 581.885,64	0,2%	0,2%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,002	$ 508.781,70	0,2%	0,2%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 2

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,28%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,74%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,27%	4,02

VII. OBSERVACIONES

Durante el transcurso de la segunda semana el frente de trabajo consolidó su avance sobre el corredor vial, manteniendo la continuidad de las actividades iniciadas en el período anterior.

Las labores constructivas se desarrollaron de manera ininterrumpida en el sector comprendido entre la vía nacional y el K5+000, donde las condiciones del terreno permitieron sostener el ritmo de ejecución. Las actividades de desmonte y limpieza, excavaciones, mejoramiento de subrasante y conformación de terraplén continuaron su curso normal, incluyendo el retiro oportuno de los materiales provenientes de dichas intervenciones. De igual forma, se mantuvo el proceso de localización, replanteo e implantación del proyecto como soporte técnico permanente de las operaciones en campo.

En el componente social, los profesionales responsables continuaron con la elaboración de actas de vecindad, avanzando en la consolidación de este proceso con los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto.

Las condiciones climáticas durante la semana fueron estables y no generaron ningún tipo de afectación sobre el desarrollo de las actividades.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR - LA MESA

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
VR. CONT. TRAMO :	$ 40.489.091.536,22	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	2	DEL: 16-feb-2026	AL:	22-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	?	TRAMO:		B

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 324.474.642
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.343.815.713
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 492.200.740,09
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 176.487.489.735,86
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FISICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	811,39	50,71	6,25%	205,41	25,32%	19,07%	25,32%
2. DEMOLICIONES	818,59	273,58	33,43%	278,05	33,97%	0,53%	33,97%
3. EXCAVACION	773,65	0,00	0,00%	145,83	18,85%	18,85%	18,85%
4. TRANSPORTE	601,34	0,00	0,00%	130,97	21,78%	21,78%	21,78%
5. RELLENO	2.790,90	0,00	0,00%	580,03	20,78%	20,78%	20,78%
6. SUB BASE Y BASE	9.520,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	20.808,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.735,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	356,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. PAGA	123,66	0,04	0,03%	1,73	1,40%	1,37%	1,40%
11. PMT	127,50	0,04	0,03%	1,73	1,40%	1,37%	1,40%
12. CV	21,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

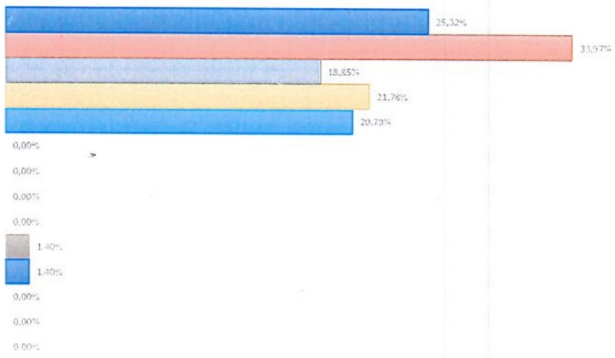

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
RETROCARGADOR	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	2								2
VOLQUETA 18m3	6								6
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
FRESADORA DE PAVIMENTO		1							1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	10
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	7
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	4
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	23247	$ 134.739.612,00	16,6%	25,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,25	$ 8.909.278,75	18,9%	33,6%
2. DEMOLICIONES	3	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIÁMETRO 1.5M)	ML	16	$ 2.171.440,00	31,7%	47,6%
2. DEMOLICIONES	4	FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (H=0.07)	M2	16726,3	$ 170.290.460,30	22,7%	34,9%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	2675,29	$ 93.734.135,73	12,7%	19,8%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	48690,278	$ 84.185.490,66	14,0%	21,8%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	2687,06	$ 376.387.242,44	13,7%	21,1%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,007	$ 865.641,87	0,7%	1,4%
11. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,007	$ 892.484,53	0,7%	1,4%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR LA MESA

INFORME SEMANAL N° 2

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,80%
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,28%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	3,32%
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,76%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO: 13,62

VII. OBSERVACIONES

Durante el periodo reportado se dio continuidad a las actividades constructivas iniciadas en la semana anterior, registrando avance en los frentes de trabajo activos. Se ejecutaron trabajos de mejoramiento de subrasante, desmonte y limpieza, fresado y excavaciones para ampliación de banca y transporte de materiales a los sitios de disposición autorizados. Se incorporaron adicionalmente las actividades de fresado de la superficie de rodadura existente y rellenos en los sectores intervenidos, avanzando en la conformación de las secciones transversales definidas en el diseño.

La comisión topográfica mantuvo presencia permanente en campo, brindando soporte técnico a los frentes de obra mediante labores de localización y replanteo. El equipo social continuó con el diligenciamiento de actas de vecindad en el área de influencia directa del proyecto.

Se mantuvo la implementación de señalización preventiva, personal de paleteros y hidratación periódica de la superficie de rodadura para el control de material particulado. Las condiciones climáticas fueron secas durante el periodo, sin afectaciones sobre el desarrollo normal de las actividades.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO








ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 26.576.814.286,91	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	2	DEL:	16-feb-2026	AL:	22-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	2	TRAMO:		C	

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.383.555
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 508.438.319
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 495.821.610,22
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.322.867.130,06
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	263,13	0,00	0,00%	98,55	37,45%	37,45%	37,45%
2. DEMOLICIONES	40,43	0,00	0,00%	6,56	16,22%	16,22%	16,22%
3. EXCAVACION	562,31	0,00	0,00%	88,12	15,67%	15,67%	15,67%
4. TRANSPORTE	468,82	0,00	0,00%	79,14	16,88%	16,88%	16,88%
5. RELLENO	1.282,71	0,00	0,00%	234,92	18,31%	18,31%	18,31%
6. SUB BASE Y BASE	2.853,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	17.007,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.457,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	352,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	81 17	0,68	0,34%	0,57	0,70%	-0,14%	0,70%
13. PMT	83,69	0,70	0,84%	0,59	0,70%	-0,14%	0,70%
14. CV	14,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

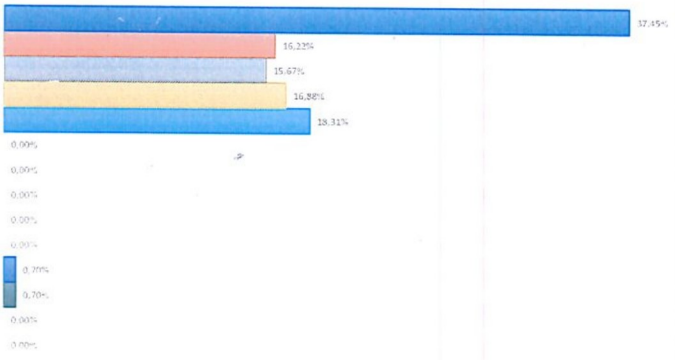

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERIODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
VOLQUETA 18m3	3								3
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	6
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	1

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	10765	$ 62.393.940,00	23,7%	37,5%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,6	$ 4.276.453,80	22,2%	34,1%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	1625,5	$ 56.952.643,50	12,2%	18,8%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	1098,6	$ 153.885.296,40	12,3%	18,8%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	29584,1	$ 51.150.908,90	10,9%	16,9%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 568.202,50	0,7%	1,1%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 585.821,88	0,7%	1,1%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 2

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,01%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,28%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	1,91%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,29%	10,32

VII. OBSERVACIONES


Durante la semana se continuaron las actividades de desmonte y limpieza en zona boscosa, así como las excavaciones sin clasificar para la conformación de la explanación, canales y zonas de préstamo. Se avanzó en el mejoramiento de la subrasante y se inició la colocación de terraplén, mediante el extendido, humectación y compactación de material, cumpliendo con los parámetros de densidad y espesor establecidos en las especificaciones técnicas.

Se mantuvo el acompañamiento de la comisión de topografía, garantizando el control geométrico de ejes, niveles y secciones transversales durante la conformación de la vía.

En cuanto a la gestión ambiental y operativa, se continuó con la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), asegurando el control de impactos y la adecuada movilidad en el corredor intervenido.

Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo un desarrollo continuo de las actividades. En general, el avance de obra se mantiene conforme a la programación y a los lineamientos técnicos del proyecto.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

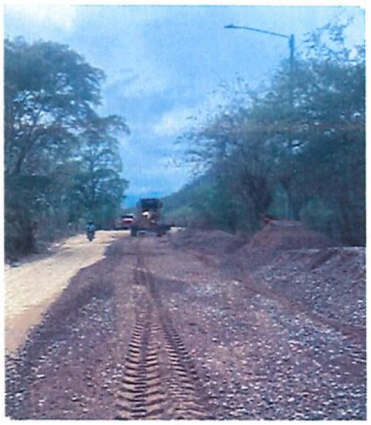



ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 13.969.910.634,72	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	2	DEL:	16-feb-2026	AL:	22-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	PUE:	2	TRAMO:		D	

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 29.499
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 248.407.793
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 495.821.610,22
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.582.897.656,01
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60

III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	516,79	0,00	0,00%	39,41	7,63%	7,63%	7,63%
2. DEMOLICIONES	48,38	0,00	0,00%	2,98	6,16%	6,16%	6,16%
3. EXCAVACION	319,39	0,00	0,00%	51,50	16,13%	16,13%	16,13%
4. TRANSPORTE	250,65	0,00	0,00%	42,99	17,15%	17,15%	17,15%
5. RELLENO	653,60	0,00	0,00%	110,31	16,88%	16,88%	16,88%
6. SUB BASE Y BASE	1.386,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	8.660,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	1.744,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	186,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	42,67	0,01	0,03%	0,60	1,40%	1,37%	1,40%
13. PMT	43,99	0,01	0,03%	0,62	1,40%	1,37%	1,40%
14. CV	7,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 18m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	5348	$ 30.997.008,00	6,0%	9,6%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,285	$ 2.031.315,56	5,4%	7,9%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	205,6	$ 28.799.214,40	4,5%	11,1%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	820,6	$ 28.751.362,20	12,1%	18,3%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	14934,92	$ 25.822.476,68	10,3%	15,7%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	536,5	$ 75.149.701,00	11,8%	18,4%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 298.671,55	0,7%	1,4%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 307.933,04	0,7%	1,4%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE NIT. 902027182-9

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 2

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,28%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	1,78%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,14%	9,62

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana se dio continuidad a las actividades de desmonte y limpieza, manteniendo la habilitación progresiva del corredor vial. Se ejecutaron excavaciones para la conformación de la explanación, en concordancia con los alineamientos y niveles de diseño.

Se avanzó en el mejoramiento de la subrasante mediante la adecuación del suelo existente, asegurando condiciones adecuadas de soporte. El material producto de las excavaciones fue cargado, transportado y dispuesto en los sitios definidos, garantizando la correcta gestión de materiales en obra.

Las actividades se desarrollaron bajo control técnico, manteniendo un avance acorde con la programación establecida.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTABLE:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 32.289.816.901,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	2	DEL:	16-feb-2026	AL:	22-feb-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	DUE:	3	TRAMO:			E

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 167.640.480
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 215.763.974
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 492.200.740,09
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.615.541.475,06
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	2.285,31	68,56	3,00%	53,76	2,35%	-0,65%	2,35%
2. MATERIALES GRANULARES	3.089,52	28,52	0,92%	152,17	4,93%	4,00%	4,93%
3. CAPA DE RODADURA	19.752,24	66,14	0,33%	0,00	0,00%	-0,33%	0,00%
4. ESPACIO PÚBLICO	6.424,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	159,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. REPOSICION DE REDES HIDRAULICAS	74,54	0,75	1,00%	7,81	10,48%	9,48%	10,48%
7. PMT	309,30	2,25	0,73%	1,24	0,40%	-0,33%	0,40%
8. PMA	194,70	1,42	0,73%	0,78	0,40%	-0,33%	0,40%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

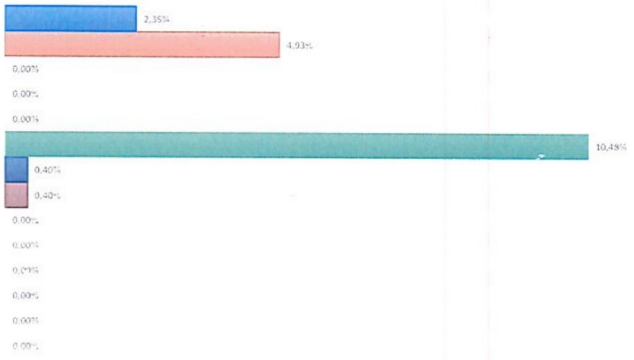

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1C00 GALONES)	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

CAPÍTULO	ITEM	DESCRIPCIÓM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	EXCAVACIÓN MECANICA DE LA EXPLANACIÓN	m3	406	$ 14.225.022,00	1,2%	2,1%
1. PRELIMINARES	2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2435	$ 10.061.420,00	2,7%	3,9%
1. PRELIMINARES	3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3-km	5278	$ 9.125.662,00	1,2%	2,0%
2. MATERIALES GRANULARES	1	SUBBASE GRANULAR	m3	680	$ 97.805.760,00	3,7%	5,8%
7. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,004	$ 1.237.200,00	0,4%	0,4%
8. PMA	1	PMA	GLOBAL	0,004	$ 778.812,98	0,4%	0,4%

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 2

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,52%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,28%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	0,67%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,12%	0,81

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana se ejecutaron actividades iniciales correspondientes a la excavación mecánica de la explanación, conformación de la calzada existente y transporte de material proveniente de las excavaciones. De igual manera, se adelantó la colocación de subbase granular y la ejecución de excavaciones mecánicas y manuales para la instalación de tuberías de alcantarillado y acometidas domiciliarias, conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.


Se contó con acompañamiento permanente de la comisión de topografía, garantizando el control de niveles, alineamientos y localización de las intervenciones. Asimismo, se realizó la gestión social mediante la elaboración de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto.

Durante la ejecución se identificaron redes de tuberías existentes en materiales que no cumplen con las especificaciones normativas, por lo cual fue necesario realizar su reemplazo por tubería PVC sanitaria de 8", asegurando la funcionalidad y durabilidad del sistema.

Se dio inicio a la implementación de los planes de manejo de tránsito (PMT) y manejo ambiental (PMA), en cumplimiento de la normativa vigente.

Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades. En general, el avance de obra se ajusta a la programación establecida y a los lineamientos técnicos del proyecto.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

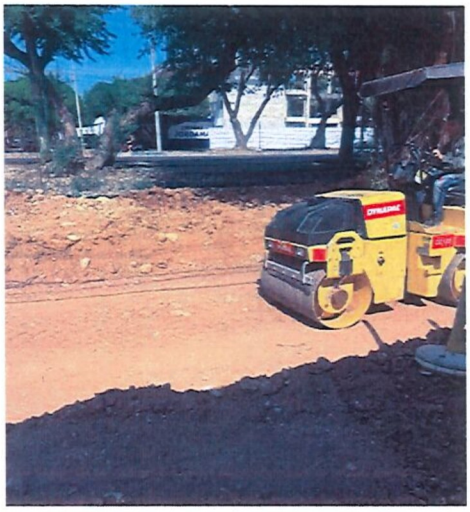



ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 3

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	SEMANA INFORME:	3	DEL:	23-feb-2026	AL:	1-mar-2026


II. AVANCE POR TRAMO


			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO POR TRAMO	% AVANCE EJECUTADO POR TRAMO	
1.	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	0,000%	0,408%	✓	0,000%	1,125%	✓
2.1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANILLO VIAL-LA TRAMACUA- LA MESA	0,302%	0,680%	✓	1,326%	2,985%	✓
2.2	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA - EL PALMAR	0,104%	0,315%	✓	0,695%	2,110%	✓
2.3	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA -EL MAMÓN	0,000%	0,252%	✓	0,000%	3,214%	✓
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	0,179%	0,075%	✗	0,988%	0,412%	✗

% AVANCE DEL CONTRATO	0,58%	1,73%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO	6,18

III. CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

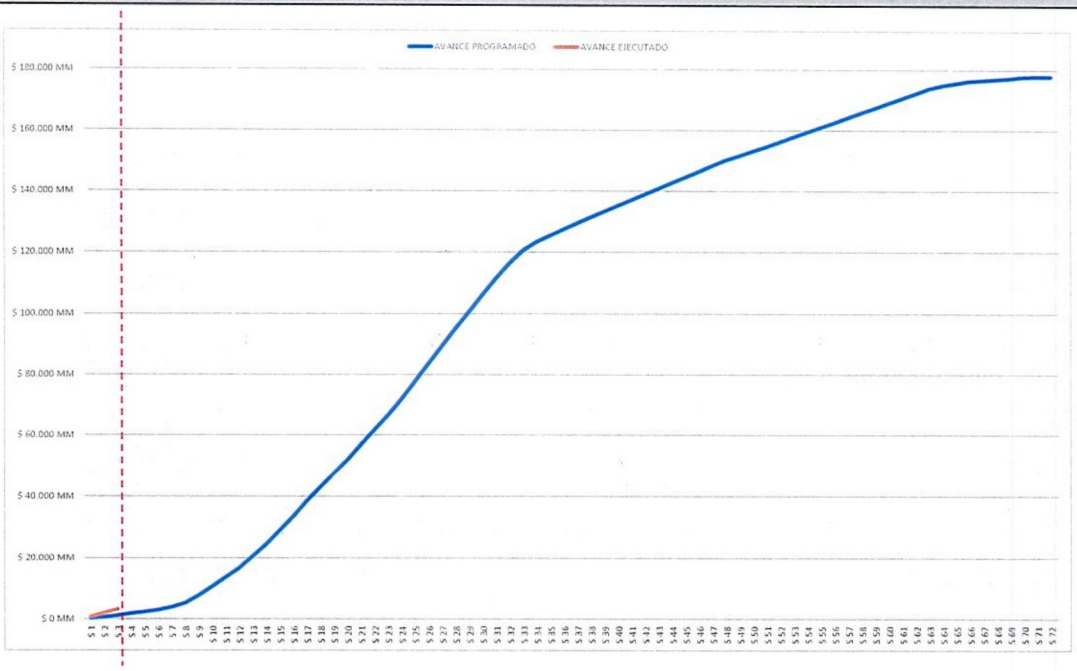












VALORES EXPRESADOS EN MILLONES (MM)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 3

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 64.505.672.090,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	3	DEL:	23-feb-2026	AL:	1-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	BOB	1	TRAMO:	A		

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 0
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 725.849.836
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 1.040.212.459,34
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.105.455.613,20
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	635,21	0,00	0,00%	211,23	33,25%	33,25%	33,25%
2. DEMOLICIONES	107,12	0,00	0,00%	12,32	11,50%	11,50%	11,50%
3. EXCAVACION	1.006,22	0,00	0,00%	399,96	39,75%	39,75%	39,75%
4. TRANSPORTE	322,75	0,00	0,00%	98,69	30,58%	30,58%	30,58%
5. RELLENO	19.335,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. SUB BASE Y BASE	5.860,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	22.607,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	8.690,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	367,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. GAVIONES	2.307,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. PUENTE	2.701,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	290,94	0,00	0,00%	1,95	0,67%	0,67%	0,67%
13. PMT	254,39	0,00	0,00%	1,70	0,67%	0,67%	0,67%
14. CV	17,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

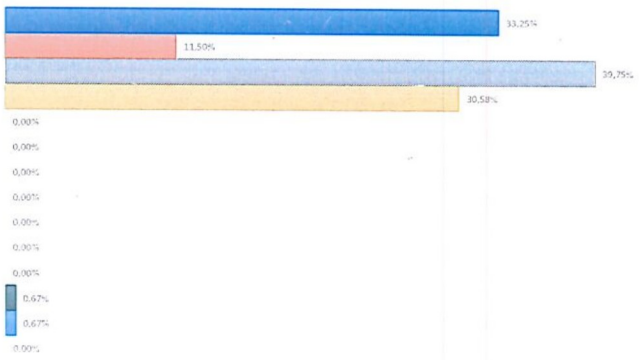

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
RETROCARGADOR		1							1
VOLQUETA 18m3	4	2							6
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	10
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	7
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	H	4	5	6	7	8
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	PUENTE	
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00		

V. EJECUTADO EN EL PERÍODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERÍODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	11006	$ 63.790.776,00	10,0%	33,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,66	$ 4.344.597,84	10,5%	29,7%
3. EXCAVACION	1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	5365	$ 187.973.505,00	18,7%	39,7%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	26825	$ 46.380.425,00	14,4%	30,6%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,0027	$ 785.545,62	0,3%	0,7%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,0027	$ 686.855,29	0,3%	0,7%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE NIT. 901027152-1

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 3

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,00%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,58%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	1,13%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,41%	6,09

VII. OBSERVACIONES

En el periodo reportado se dio continuidad a las actividades constructivas en el sector comprendido entre la vía nacional y el K5+000. Se ejecutaron los items de localización y replanteo, desmonte y limpieza, excavaciones, mejoramiento de subrasante y conformación de terraplén, con el correspondiente retiro y disposición de materiales producto de las intervenciones.

El equipo social continuó con el diligenciamiento de actas de vecindad en el área de influencia directa del proyecto.

No se registraron eventos climáticos que afectaran el desarrollo normal de las obras

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR - LA MESA

INFORME SEMANAL N° 3

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
VR. CONT. TRAMO :	$ 40.489.091.536,22	PRORROGA:	0 meses	SEMANA INFORME:	3	DEL: 23-feb-2026	AL:	1-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	BUR:	2	TRAMO:		B

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 536.695.050
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.266.375.193
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 1.040.212.459,34
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 176.564.930.256,17
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FISICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	811,39	101,42	12,50%	172,81	21,30%	8,80%	21,30%
2. DEMOLICIONES	818,59	431,70	52.74%	408,25	49,87%	-2,87%	49,87%
3. EXCAVACION	773,65	0,00	0,00%	206,90	26,74%	26,74%	26,74%
4. TRANSPORTE	601,34	0,00	0,00%	141,06	23,46%	23,46%	23,46%
5. RELLENO	2.790,90	0,00	0,00%	332,45	11,91%	11,91%	11,91%
6. SUB BASE Y BASE	9.520,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	20.808,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.735,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	356,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. PAGA	123,66	1,76	1,42%	2,41	1,95%	0,53%	1,95%
11. PMT	127,50	1,81	1,42%	2,49	1,95%	0,53%	1,95%
12. CV	21,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS

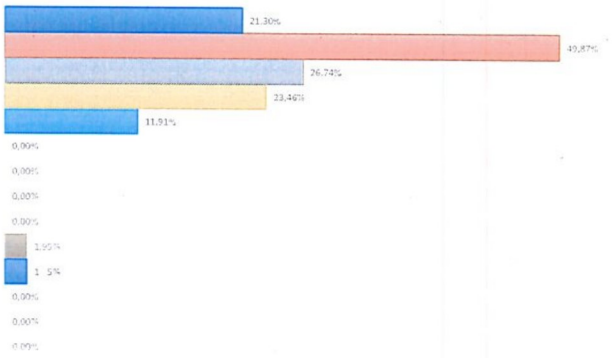

CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP		1							1
RETROCARGADOR	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	2								2
VOLQUETA 18m3	6	2							8
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
FRESADORA DE PAVIMENTO		1							1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	12
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	9
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	5
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	9525	$ 55.206.900,00	6,8%	21,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,02	$ 7.269.971,46	15,4%	35,7%
2. DEMOLICIONES	4	FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (H=0.07)	M2	14600	$ 148.642.600,00	19,8%	51,7%
3. EXCAVACION	1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	1492	$ 52.275.204,00	137,9%	137,9%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	45754,8	$ 79.110.049,20	13,2%	23,5%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	436,36	$ 61.122.690,64	2,2%	12,1%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,007	$ 865.641,87	0,7%	2,0%
11. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,007	$ 892.484,53	0,7%	2,0%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VALLEDUPAR – LA MESA

INFORME SEMANAL N° 3

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	1,33%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,58%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	3,13%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,71%	9,75

VII. OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas durante el periodo corresponden a la continuidad de los ítems de mejoramiento de subrasante, desmonte y limpieza, excavaciones para ampliación de banca, fresado, rellenos y transporte de materiales excedentes, consolidando el avance sobre los frentes de intervención del corredor vial.

La comisión topográfica ejerció control geométrico permanente sobre las obras ejecutadas. El equipo social mantuvo el ritmo de diligenciamiento de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto.

Las medidas de manejo de tránsito y mitigación de material particulado se mantuvieron operativas durante toda la semana. No se presentaron novedades climáticas en el periodo reportado.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO













ELABORADO POR:
JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo:
RODRIGO CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
