Contratista.
Sandra liliana molano Romero

Contrato # 9438932

Objeto: Adecuacion y mantenimiento de los escenarios deportivos de la comuna la Estacion del municipio de Manizales, Por monto agotable

Interventoria:
Innova Proyectos SAS.

Plazo: 2 meses

fecha de Inicio: Junio 2026

fecha Entrega Agosto 2026

9 de Junio de 2026

En el día de hoy se Reunieron la Ing Sandra Liliana Molano Romero con CC 33818668 de Colorco como Contratista el Ingeniero Alejandro por Parte de la Interventoría Innova Proyectos Sas en se reunieron. con el fin de firmar el Acta de inicio. con fecha de 9 de Junio del 2026 y un plazo de 2 meses. fon fecha de entrega el 9 de. Agosto del 2026.

En el día de hoy se realiza un recorrido de los sitios a intervenir en dicho contrato. los Recorridos fueron a

El barrio la Castilla. (Detras de la Iglesia del barrio.)

2- El Parque el Faneon.
3- la cancha de fubbol de la Asuncion.

-durante el recorrido se entrego Por Parte de la Interventoria, los Presupuestos Presentados Por la alcaldia y Recibidos Por el Contratista.
en dicho documento se describi-ran las diferentes actividades en cada uno de los frentes de trabajo.

Ing Civil
Jaime A. Angel L
Ing. Residente

Ing. Civil Juan Camilo Hernandez
Director. Interventoria.

10 de junio del 2026

En el dia de hoy se comienzan las actividades laborales a las 7:00 am. en los 3 frentes de trabajo.
frente 1. Barrio castilla
frente 2 Parque Asuncion
frente 3 Cancha la Asuncion

En los 3 frentes. se les hace la entrega. de los Implementos de seguridad. y los diferentes herramientas de trabajo..
Por Parte. de la Profesional. Sisso se les da una charla a los trabajadores sobre. Induccion general.

Castilla: hay 3 Personas trabajando en este frente y comienzan con la Poceria de la cancha, como tambien con

la Excavacion de el borde de la cancha Para la Realizacion de la Cuneta Propuesta.

funcion en este frente de trabajo hay 4 trabajadores y se comienza con el cerramiento en yute toda la cancha, tambien se trabaja con el frente de pelar y limpiar grada para la preparacion de pintura

Cancha la Asunción: se comienza con 4 Personas y se realizo el cerramiento del sitio de trabajo con yute.

Ing Residente
Jaime Alberto Angel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

11 de junio del 2026

se comienzan actividades a las 7:00 Am en los 3 frentes de trabajo

En el dia de hoy llueve de 9:30 am hasta las 11:00 Am.

Castilla: continuan los 3 trabajadores en las actividades de excavacion y roceria
tambien se comienza a Retirar el material de Rocero y excavacion del sector de la obra

funcion: continuan los 4 trabajadores se continua con la limpieza de las gradas y se comienza con el retiro de las mallas eslabonadas definidas para su cambio

Cancha la Asunción. después del cerramiento se comienza a realizar un descapote de aproximadamente 50m², también se realiza un replanteo inicial en el sector de la cancha para comenzar ha realizar la excavación del sector.

Se terminan actividades de trabajo a las 5:00Pm en los 3 frentes sin ninguna novedad por parte de la SISSO de incidente ó accidente dentro los frentes de obra.

Ing Residente
Jaime Alberto Angel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

12 de junio 2026.


Se inician labores a las 7:00 Am por parte de la SISSO se da una inducción de manejo Herramienta y supervisión de los elementos de trabajo al Personas de obra

Castilla se termina la Bocera se continua con excavación. Para la cuneta de cancha, se encuentra una caja en el centro de la cancha.



Se continua con el Retiro de material sobrante.

faneon: se continuo con limpieza de graderias.
se realiza la limpieza de una canal en U al lado de la concha, hablado con la Arq Martha de parte de la interventoria.
tambien se realiza el sondeo de una tuberia dentro de la concha al lado Izq. de la tuberia.



Asuncion. en el dia de hoy se continua con el descapote y la excavacion del muro a realizar se comienza con la demolicion de las 3 primeras gradas en la concha.
Por parte de la Ing. sandra

contratista se le hace una solicitud a la interventoria que haya una entrega del muro a Realizar en este sitio.
Entrega que consta de planos y diseños y memorias de despiece. con el fin de poder comenzar el corte y figurado del hierro.
se queda con la interventoria que en las horas de la mañana mañana se realizara una reunion con alcaldia Interventoria y contratista en el sitio de obra Para definir dicha solucion a la inquietud.

Se terminan las labores a las 5.00Pm sin ningun Reporte de Novedad de incidentes ó accidentes dentro de los frentes de trabajo por

Parte del Profesional SISSO,

Ing Residente
Jaime A. Angel


Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

13 de Junio del 2026

En el dia de hoy se comienzan las actividades a las 7:00 Am, en los 3 frentes, Por Parte de la SISSO se les da una capacitacion a los trabajadores sobre los diferentes riesgos Que estan espuestos en cada frente de trabajo.

Para el dia de hoy se realizo la Reunion con: Ing Oscar por Parte de la alcaldia, la Arq. martha. Por Parte de la interventoria el Ing estructural de la interventoria y el Ing. Jaime por Parte de la "Contratista"

La reunion se llevo a cabo en la cancha de la Asuncion con el fin de los diseños definitivos Que son los planos Estructurales del muro de contencion Que se realizaran en la cancha la Asuncion; estos diseños son con un concreto de 28 MPa.

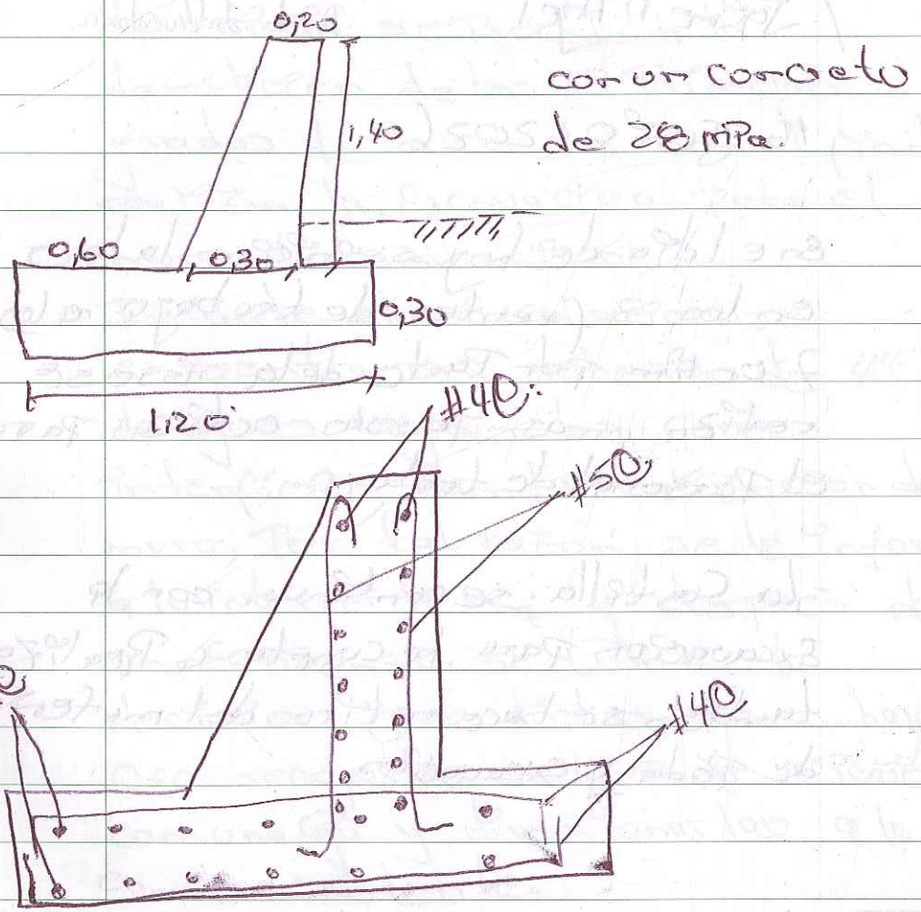

se terminan las labores a la 12:00 A
sin ningun Reporte de novedad de
incidente o accidente laboral
en las obras

Ing Civil
Jaime A. Angel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

16 Junio 2026


En el dia de hoy se inician las labores
en los 3 frentes de trabajo a las
7:00 Am. Por Parte de la SISSO se
realiza unas Pausas activas para
el Personal de trabajo.

- La Castilla se continua con la
Excavacion para la cuneta a Realizar.
tambien se hace retiro del material
de Poda y excavacion

faltan: Para el dia de hoy
se comienza a retirar la malla
eslabonada a cambiar,
tambien se comienza con el lavado
y Resane de de las gradas

Asuncion: terminado el acordamiento
del sitio se Procede a la
demolicion de las 3 Primeras
gradas de la cancha con el fin de
realizar la Excavacion para el
muro de contencion.
Durante la Excavacion se
encuentra una tuberia de 4"
de aguas negras las cuales
interfieren con la realizacion del
muro, Por tal razon se le informa
a la interventora y despues de
un consenso se toma la
decision que dichas aguas hay
que recogerlas en la Parte superior
con una caja y direccionarlas a la
camara existente

se terminan labores a las 5:00 Pm.
sin ningun Reporte Por Parte de accidentes ó incidentes laborales



Ing Residente
Jaime A. Angel

Ing Civil Juan C. Hernandez
Director Interventoria

17 de Junio del 2026

En el dia de hoy. se inician obras a las 7:00 am.
Castilla
hay 3. trabajadores los cuales ya realizaron. la rocería. y les falta 6 ml. de excavación para la cuneta.
se comienza. a. ingresar el material de río para. la. cuneta.
se comienza a realizar la. instalación del afirmado al lado de la cancha., también se retería. el material excavado

fancon.
En. el dia de hoy se continua con la rosprde y limpieza de grados y se comienza con la aplicacion de revoque. en los sectores Necesarios Para la. Pintura.
tambien se continua con el retiro de malla en labonada. actividad Que se termino hoy.
tambien se continua. con la. aplicacion de la. Pintura. Para. la malla. existente.

Asuncion
- se continua con excavacion Para el sector Izq) Derecho. de la. Porteria Para realizacion del muro
.se continua con la demolicion de los 3 primeras gradas.
hay Que Especificar Que el Espesor de los grados tine entre 20-25 cm de Espesor en su mayor Parte.

Por Parte de la SISSO se realizo una supervision de afiliaciones de trabajadores A. Salud, Pension y Arl

Se terminan. actividades a las 5:00Pm. sin ningun reporte. de Novedad. en incidentes ó accidentes laborales

Ing Residente
Jaime A. Angel L

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoría.

18 de junio 2026

Se inician labores a las 7:00am en los 3 frentes

Castilla
Para el dia de hoy. se. termina la Excavacion de cuneta y la. Instalacion del afirmado., se Comienza el Corte de Perfil Para. su Instalacion

y Posteriormente la fundicion de la Cuneta.
con Interventoria se hablo de realizar los topes en concreto con Perforaciones ya Que en la Parte Posterior de la Cancha hay un desnivel muy fuerte Portal razon, con estos topes se Nivelarian el terreno

Castilla faneon.
Se comienza a. aplicar la Primera mano de Pintura a las gradas tambien se continua Pintando el Cerramiento en malla eslabonada.

Asuncion.
Se continua con. Excavacion y demolicion de gradas.
Se habla con Interventoria Para el retiro del Poste Que esta en la Zona donde se va ha ampliar las gradas, tambien se les informa sobre la tuberia de 18" en concreto. Que

Nos encontramos para la realización de la pata del muro. se hablo con el Ing. Juan. sobre estos detalles y Quedo Que nos dara solucion a estas inquietudes.

Se terminan labores a las 5:00 Pm en los 3 frentes sin reporte de Novedad por parte de la SSSO.

Ing Residente
Jaime A. Angel.

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

19 de Junio 2026

Se inician labores a las 7:00 Am en los frentes de trabajo

La castilla
hoy se realiza la fundicion de la cureta Que se programo con Interventoria

se realizo el Retiro de material sobrante.
Se comienza la realizacion de limpieza de camara. y la realizacion de la caja de 1x1 Programada.

Asuncion fancon

Se continua con el Retiro é instalacion de malla eslabonada con pintura de la misma
se realiza resanes de los postes en sus mejoras.

Asuncion.

se continua con la Excavacion para fundicion de muros, con el suministro é instalacion del afirmado en la base del muro de.

Alimentacion,
tambien se comienza con la instalacion de la tuberia superior con el fin de recojer las aguas superiores donde se realizaran las gradas Nuevas.

Se terminan labores 5:00 pm sin ningun Reporte de Novedad por parte del Personal asso.

Ing Civil
Julio C A - Angel.

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

22 de junio del 2026

Se inician labores a las 7:00 con una charla por parte de la asso en los 3 frentes de trabajo sobre temas de seguridad en el trabajo.

Castilla.
Se continua con la realizacion de la caja e instalacion de la tuberia de 8". sanitario

Tarcon.
Se continua con pintado gradas pintada de malla. Elaborada y su respectivo cambio.

Asuncion.
Actividades que se ejecutan
- Excavacion
- lleno y compactado
- Instalacion tuberia 6"

- Corte y figurado de hierro
- formatetear muro de contención
- fundición de muro.

Se terminan labores 6:00pm
de la tarde. sin ningun reporte
de incidentes ó accidentes laborales

Jaime A. Angel
Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

24 Junio del 2026.

Se inician labores a las 7:00 Am
en los 3 frentes de trabajo

Castilla.
se esta terminando Caja de 1x1
é instalación y llenado de tubería de 8"
se comenzo con la instalada de los
Porticos. de micro futbol y baloncesto

fueron.
Se continua con Cambio, Reparación
y Pintura de trabajo Elaborado

Asunción.
Actividades A. ejecutar

- Excavación
- Afirmado y compactado material
- Corte y figurado de Hierro Instalación
- formateteas - muro
- fundición muro
- Demolición y rados.

se terminan labores en la
Asunción a las 6:00 Pm.
Sin ningun reporte de incidente
ó accidentes laborales dentro la
Obra.

Ing Residente.

Ing Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

26 Junio del 2026.

Se inician labores a la 7:00 Am en los 3 frentes con una charla por parte de la SSO sobre temas relacionados a la construcción

- Castilla.
- en este frente se trabaja en la instalación de la cancha de microfutbol y baloncesto.
Se ha terminado excavación y Retiro de material y Realización de la Concreto en un 100%. instalación y suministro de tapas en concreto

Farcon.
Se esta trabajando en la reparación de las canchas de microfutbol y baloncesto en Pintada y reparación de malla Eslabonada como en los predios

en el filo de las mismas.

Asunción.
Se continuo con las mismas Actividades
- Excavación
- Lleno
- Corte figurado de Hierro
- fundición de muro Contención
- Instalación de filtro en muro de contención

Se terminan labores a las 6:00Pm sin ninguna novedad.

Ing Civil
Jaime A. Anyel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

29 junio del 2026.

Se empiezan labores en los 3 frentes a las 7:00 Am.

Asunción.
- corte figurado de hierro
- fundición muro contención
- Excavación
- llenos
- filtro de drenaje
- Excavación e instalación de Drenes

Castilla
Instalación cancha de microfutbol y baloncesto

Faltan:
Encofrado malla esfabonada arreglo de cancha microfutbol Pintado graderías y muro

Castilla.
- Instalación cancha Nueva de microfutbol y baloncesto
- Demarcación canchas

Se terminan labores a las 6:00pm sin ningún reporte de incidentes o accidentes en obra

Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

1 Julio del 2026.

Se inician labores a las 7:00 Am. en los 3 frentes

En Asunción:
fundición Pata y Alcta de muro de contención, Excavación

Para la tubería superior é instalación de la misma se realizo instalación de drenes Horizontales, llenó y compactación de gradérias.

se terminan labores a la 6:00Pm sin ningun reporte de Novedad de incidentes ó accidentes laborales

Jaime A. Angel L
Ing residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

Julio 2 del 2026

se inician labores a las 7:00Am Durante el dia se presentas lluvias en las horas de la tarde (2-4)Pm se realizan actividades en Avancion.
-

- corte y figurado Hierro
- formaleteo de muro contención.
- Excavación muro
- compactación de afirmado. Para muro
- Vaciado de muro
- llenó y compactado de tierra de prestamo

Se tiene una reunion con el Ing Juan Camilo y la Ing. manuela por parte de la Interventoria con el Ing Jaime A. Angel residente de obra.

se tocan los temas: de obra.
- Avance de obra. y Programación de obra
- balance financiero de obra.
- Se habla sobre la canal que se realizara al lado de la Portería en todo el Ancho de la cancha para su aprobación.

- se habla sobre las Rejillas Prefabricadas que se instalaran en la canal a realizar.
- se toca el tema de las mallas elaboradas a cambiar y pintar
- se habla sobre la pintada y mantenimiento a todas las vigas existentes y las nuevas a realizar
- se les muestra la forma como quedaran las escaleras de ingreso a la portería ó tribunas

Se terminan labores a las 5:00 Pm sin ningun reporte de incidentes ó accidentes laborales en obra.

Ing. Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

Julio 4 del 2026

Se inician labores a las 7:Am.
El Personal que esta trabajando es el syte
1 Ing Residente
1 sisso
1 maestro
2 oficiales
13 ayudantes
se realizan las mismas actividades de toda la semana en Asunción.
se esta a la espera de la aprobacion de la canal Perimetral para abrir este frente, se comienza con la demolicion de las escaleras existentes

Se terminan labores a las 5:00 Pm sin ninguna Novedad en la obra

Ing residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

Julio 6 del 2026.

Se inician labores a las 7:00Am.
en los frentes de trabajo.
en faenas se esta realizando el
mantenimiento de canchas de micro y
baloncesto, y asi se realizo el
mantenimiento de las Puertas,
se esta realizando demarcacion
de canchas (microfutbol, Voley, Baloncesto
y Balon en mano)
Castilla: se realiza instalacion
y cambio de porterias Por las
Nuevas a instalar.
Asuncion: en el muro #I-3c no
realizo un derrumbe cuando se estaba
realizando la excavacion:
se Procede a realizar retiro y
entibado del dicho tramo.
se continua con fundicion de muro
de contencion;
se realiza el filtro Que esta
detras del muro (50x50) como
tambien el correspondiente lleno y

compactado con material de sitio.
tambien se comienza con la
demolicion de escaleras y su
respectivo localizacion de las
Nuevas Escaleras.
se terminan labores a las
6:00Pm. sin ningun reporte
de Novedad en la obra

Ing. residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

Julio 7 del 2026

se inician labores a las 7:00 Am
con el sgt Personal
faenas: 1 soldador, 2 Pintores
As Castilla: 1 soldador, 1 pintor
Asuncion: 1 maestro, 2 oficiales
13 ayudantes
Ing. residente, una visita
faenas se continua con arreglo de

Julio 6 del 2026

se inician labores a las 7:00Am.
en los frentes de trabajo.
en fancon se esta. realizando el
mantenimiento de canchas de micro y
baloncesto, ya se realizo el
mantenimiento de las Puertas,
se esta. realizando demarcacion
de. canchas (microfutbol, voley, Baloncesto
y Balon en mano)
Castilla.: se realiza instalacion
y cambio de porterias Por las
Nuevas a. instalar.
Asunción: en el muro #I-3c no
realizo un derrumbe. cuando. se estaba
realizando. la excavacion.
se Procede a realizar retiro y
entibado. del dicho tramo.
se continua con fundicion de muro
de contencion;
se realiza el filtro Que esta
detras del muro. (50x50) como
tambien el correspondiente lleno. y

compactado. con material de sitio.
tambien se comienza con la
demolicion. de escaleras y su.
respectivo. localizacion de las
Nuevas Escaleras.
se terminan labores a las
6:00Pm. sin ninguna reporte
de Novedad. en la obra

Ing. residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

Julio 7. del 2026

se inician labores a las 7:00 Am
con el syt. Personal
fancon: 1 soldador, 2 Pintores
Ac Castilla: 1 soldador, 1 pintor
Asuncion. 1 maestro, 2 oficiales
13 ayudantes.
Ing. residente, una visita
fancon se continua con arreglo de

Cancha y demarcacion de canchas
Varias
Castilla: se continua con cancha.
de micto y baloncesto.
Asuncion: - Excavacion
- lleno y compactado
- fundicion muro contencion
- corte y figurado de hierro
- Instalacion filtro y drenes

se termina labores a las 6:00 pm.
sin reporte de Novedad en obra
por parte de la SESSO.

Ing Residente
Jaime A Angel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

Julio 8 del 2027.
Para el dia de hoy se comienzo. d
actividades laborales a la 7:00 Am
- en fancors se termina la demarcacion
de las canchas.

- en Asuncion se continua con
- figurado y corte de hierro
- Excavacion para muros
- realizacion de filtros.
- realizacion de Drenes
- realizacion fundicion de muro
de contencion.

se habla con la Interventoria
el Ing. Juan camilo y la Ing.
manuela sobre los posibles
tramos a cambiar de la malla
eslabonada Para el cerramiento
Perimetral de la cancha.
tambien se Habla del tramo de
muro en toda la esquina al norte
de la cancha con el fin de ver
su viabilidad, tambien de la
canal perimetral para la evacuacion
de las aguas.

se terminan labores 6:00 pm sin
ningun reporte de Novedad

de incidente o accidente en obra

Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

9 de julio 2026

Para el dia de hoy se comienza a las 7:00 Am

- en fanson se cuenta con soldadores y 1 pintor. Para arreglo de Porterias y Pinturas retoque en varios sitios

- En Asuncion se cuenta con 15 ayudantes 2 oficiales y 1 maestro. Para las diferentes actividades de la obra.

- en el muro 10 se Presento un derrumbe lo mismo Que el muro #1

se realizo las mismas actividades Que el dia anterior.
tambien se comienza la actividad del pasamano Que va encima de el muro de contenos en los grados.
se terminan labores a las 6:00pm sin ningun reporte de Novedad de accidentes en obra

Ing Residente.

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

8 de julio del 2026

Para el dia de hoy se comienzan labores a las 7:00 Am.

- en fanson se Presento el dia domingo un acto de cobraction Por Parte de los Barras del once

lo cual desmontaron el cerramiento que existía, y realizaron actividades dentro de la concha lo cual afectaron diferentes sitios de trabajos ya terminados, como fue la Pintura de las gradas, Pintura de demarcación. Conchas Pintura de Porterías Por tal motivo se Presentaron dificultades Para la entrega Parcial del escenario y se reprograma para el Próximo Viernes con interventoría y la alcaldía.

En Avanzon se continua con las actividades de

- corte y figurado de hierro
- fundición de muro contención
- lleno y compactado material Para gradas y muro
- realización de filtro
- realización de barandas
- Enchibado

se terminan labores a las 4:00 Pm. sin ningún reporte por parte de Sisso.

Ing. Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

14 de Julio del 2026

Se inician labores a las 7:00 Am en Fanor se realizar Actividades de acondicionamiento de obras que dañaron.
En Avanzon se continuar con las mismas actividades del día Anterior.
con Interventoría se realiza una reunión con el fin de considerar la realización del muro en la parte Norte. ya que el talud existente es muy alto y en la Posible Intervención que se tiene Programada existe la

Posibilidad de deslizar el terreno por lo cual se toma la decisión de parar dicha intervención por el momento hasta que por parte de la alcaldía y la interventoría se reúnan y tomen una decisión definitiva.

se terminan labores a las 5:00pm sin ninguna novedad por parte de lo mismo

Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

16 Julio del 2026.

se inician labores a la 7:00 Am. en donde se terminan labores y se programa la entrega para el día viernes con alcaldía e interventoría en la castillo se realiza Pintura de demarcación de canchas. y Realizado de porterías.

en donde se continua con las Actividades de:

- corte y figurado de Hierro
- excavación muro
- Entibado
- filtro y drenes
- lleno y compactado material de sitio y de Prestamo
- Barandas
- Realización y fundición de gradas

se terminan labores a las 6:00Pm sin ningun Reporte de novedad

Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria.

17 de Junio del 2026.

en el día de hoy se comienza labores a las 7:00Am

En el frente de fanson se realizo la entrega a la interventoria y a la alcaldia lo cual recibieron a satisfaccion la obra.

en castilla se termina demarcacion y se comienza las Porterias.

en Asuncion se continua con las actividades de:
- corte figurado de hierro
- Excavacion
- lleno y compactado de material de prestamo y de sitio
- fundicion de muro de contencion
-

se le reitera a la interventoria la necesidad de definir el diseño del muro Para poder intervenir la Parte Norte de la cancha. ya que en reuniones Pasada se Paro dicho tramo con el fin ver que intervencion se realizara.

se terminan labores a las 5:00Pm sin ningun reporte de incidente o accidente laboral en obra


Ing Residente

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

21 Julio del 2026

se inician labores a las 7:00Am se realiza entrega del sitio en fanson y se le dice a la interventoria que Castilla se han terminado labores y Quedamos atentos a la reunion para su entrega. Por Parte del Contratista
En el sector de la Asuncion Se continua con corte y figurado de Hierro, Excavacion, retiro de material, fundicion de vigas y muros de contencion instalacion de filtros

y se sigue ala espera de los diseños definitivos para la parte sur de la cancha.
se terminan laboras a las 6:00 Pm. sin ningun reporte de novedad por parte de la sisso en dicha Area.



Ing. Residente
Jaime A. Angel

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria


23 de julio del 2026

se inician labores a las 7:00 Am

el personal que esta en obra son
1. Ing Civil Residente
1 sisso
1 maestro
3. Oficiales
12. trabajadores ayudantes

se continua con las sgts actividades
- Excavacion para muro
- lleno y compactado de material de sitio y prestamo
- fundicion de graderias y muro
- Realizacion de cajas de Inspeccion
- Realizacion de filtro
- Realizacion de bordos
- Realizacion de lavado de graderias y resanes

se terminan labores a las 5:00Pm sin ningun reporte de accidentes o incidentes de obra por parte de la sisso.



Ing. Residente
Jaime A. Angel

Ing Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

24 de julio de 2026.

Se inician labores a las 7:00 Am

- Se le reitera a la interventoría que el frente de trabajo de la Castilla esta terminado, como también la necesidad. Improrrogable de los diseños definitivos para el sector de la concha en asunción.

Se continuan con las mismas actividades del día de ayer, cabe decir que se han presentado derrumbes en los muros 11-12-9.

Se terminan labores a la 6:00pm sin ningun reporte de incidentes ó accidentes laborales

Ing Residente
Jaime R. Angel.

Ing. Civil Juan C Hernandez
Director Interventoria

27 de julio del 2026.

Se inician labores a las 7:00 Am en el frente de la Asunción con el syte. Personal.

1 sisso.
1 maestro
20 oficiales
12 ayudantes
1 Ing Residente

de parte de la sisso se da una charla sobre sustancias sicoactivas

Para el día de hoy se. realiza Retiro de material sobrante, Escombros, también se. continua con Excavación, filtro, drenes, Ademe. En tierra de Prestamo y su compactación, formaleteada de grados Para su fundición. Para el día de hoy. se. le recuerda a la interventoría y la la
