CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020





NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 05

PERIODO DEL 01 al 31 DE ENERO DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORME MENSUAL NO. 5 **MES O PERIODO:** ENERO 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**			X	6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**			X	7
2.1	Localización			X	7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	9
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**			X	16
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		41
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		43
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		45
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		47
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		49
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		51
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		53
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		55
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		58
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		61
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		64
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		64
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		67
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				20
5.1	Información general del contrato			X	20
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	21
5.3	Informes especialistas			X	22

5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	22
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				22
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		76
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		78
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		80
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		82
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		84
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		87
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				24
8	**Anexos**				25
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		26
8.2	Registro fotográfico		X		27
8.3	Bitácora de obra		X		30
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

Localización 7

Estado inicial de la Vía 9

Características Técnicas del Proyecto 10

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

3.1 Información general del contrato de obra 12

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 13

3.3 Seguimiento ítems no previstos 15

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 15

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto 16

4.2 Maquinaria y equipo del contrato 16

4.3 Personal del contrato de obra 17

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra 17

4.5 Estado general del tiempo 17

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 17

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 17

4.8 Informe avance físico financiero 17

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 18

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 18

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra 18

4.12 Seguimiento a la programación de obra 18

4.13 Seguimiento programa de inversiones 18

4.14 Actas comité de obra 19

4.15 Acta reunión 19

4.16 Informe semanal 19

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

5.1 Información general del contrato de interventoría 20

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 21

5.3 Informes especialistas 22

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 22

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

6.1 Equipo contrato de interventoría 22

6.2 Personal contrato de interventoría 23

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 23

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 23

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría 23

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 23

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo 23

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 24

8. ANEXOS 25

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. 25

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras. 26

8.3 Bitácora de obra. 29

8.4 Video del avance de las obras. 39

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de $685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de $1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE",** con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra, está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°3 correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE del 2020, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.

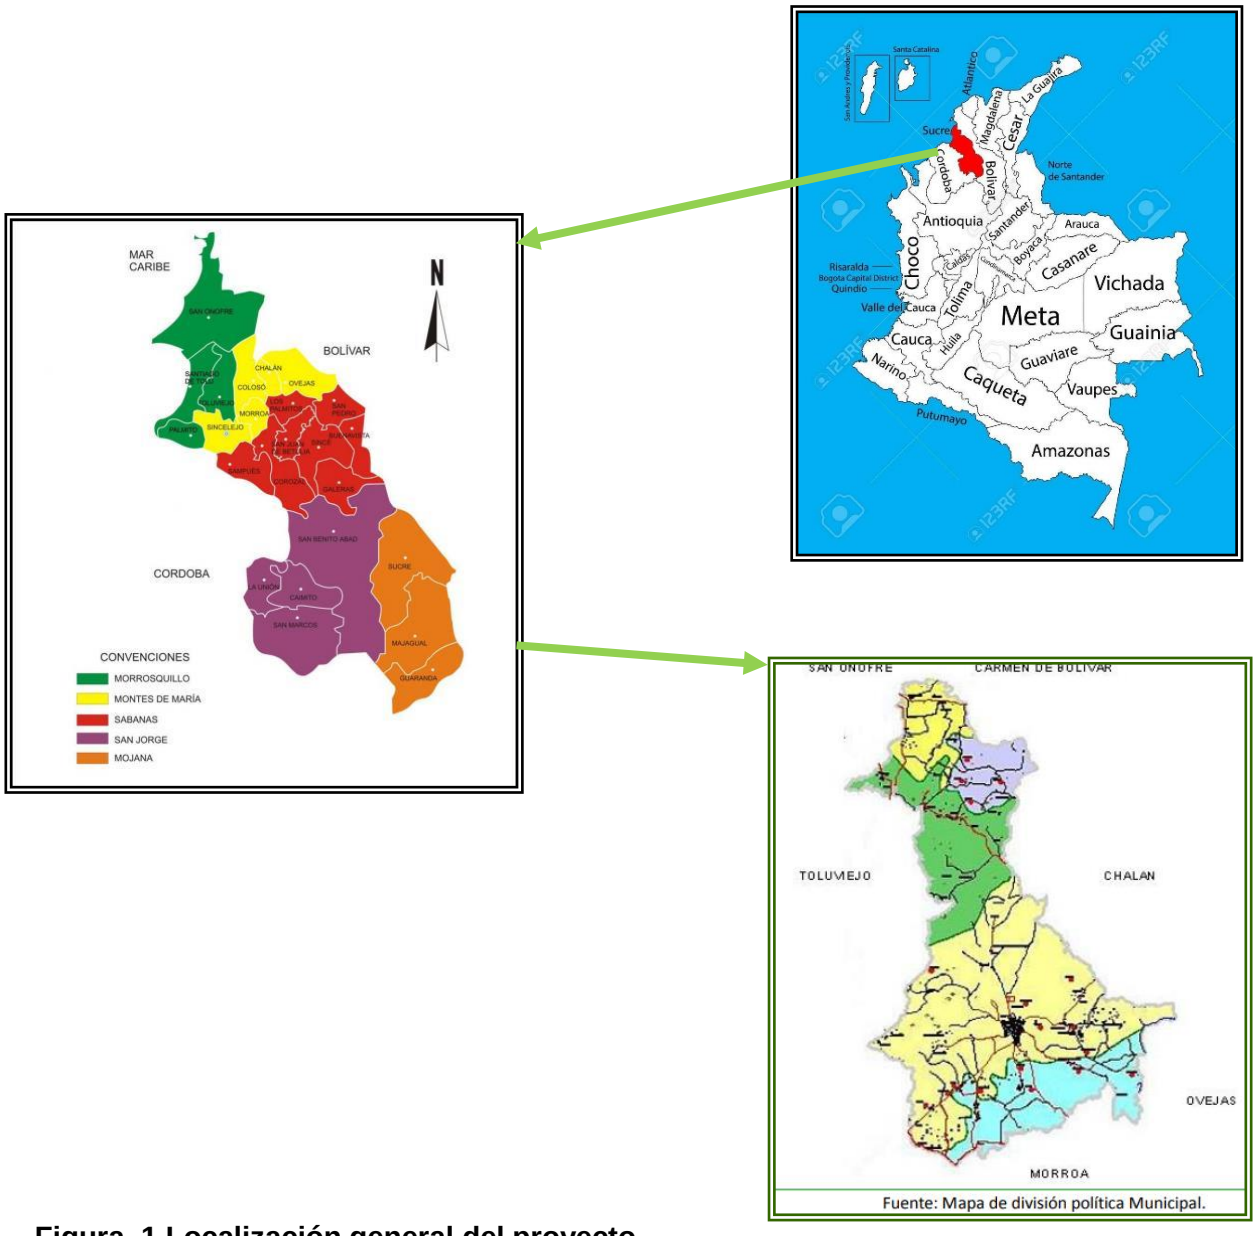


Figura. 1 Localización general del proyecto
Fuente: (INFOGRAFÍA DE INTERNET)

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9º 35' de latitud Norte, 9º 26' de latitud sur; 75º 22' longitud este y 75º 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km2, -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

.

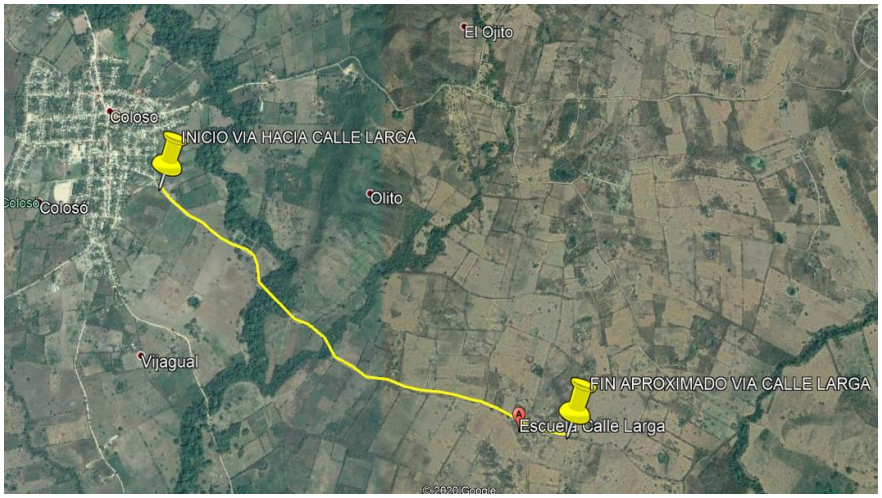


Figura. 2 Localización Vía Vereda Calle Larga
Fuente: Google Earth

Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598
		TOTAL	1280

TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar, se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.

- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.

- El manejo de drenaje para este este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.

- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

La vía a pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- Socialización de los trabajos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento reprogramada	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	$ 1.055.799.942,50
Residente de Obra	JESUS MANUEL ROMERO GARCÍS
Director de Obra	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

OBRA

Durante el transcurso del mes, el contratista realizó las siguientes actividades:

- Colocación y compactación de material granular, subbase Tipo C en el Tramo N°4.
- Figuración de acero y construcción de formaleta en madera para vigas riostras para tramo N°4.

Hasta el mes de enero se encuentran ejecutados 300 ml de extendido y compactación de material granular, subbase Tipo C en el tramo N°4.

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	0,0
TRAMO N°2	72 ml	0,0
TRAMO N°3	340 ml	0,0
TRAMO N°3"	70 ml	0,0
TRAMO N°4	500 ml	7,0%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	0,0

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de enero.

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ENERO		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT								
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25.60	$ 26,127.00	$ 668,851.20	0.00	$ -	0.00	0%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8.40	$ 46,897.00	$ 393,934.80	0.00	$ -	0.00	0%
1.3	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	m3	17.50	$ 491,409.00	$ 8,599,657.50	0.00	$ -	0.00	0%
1.4	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	m3	1.40	$ 402,347.00	$ 563,285.80	0.00	$ -	0.00	0%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1,565.00	$ 4,879.00	$ 7,635,635.00	0.00	$ -	0.00	0%
				SUBTOTAL	$ 17,861,364.30	SUBTOTAL	$ -		
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.40	$ 26,127.00	$ 6,019,660.80	0.00	$ -	0.00	0%
2.2	Subbase Granular Clase C	m3	960.00	$ 114,944.00	$ 110,346,240.00	225.00	$ 25,862,400.00	225.00	23%
2.3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21Mpa)	m3	652.80	$ 570,922.00	$ 372,697,881.60	0.00	$ -	0.00	0%
2.4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320.00	$ 330,557.00	$ 105,778,240.00	0.00	$ -	0.00	0%
2.5	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281.60	$ 487,978.00	$ 137,414,604.80	0.00	$ -	0.00	0%
2.6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	51,072.00	$ 4,879.00	$ 249,180,288.00	0.00	$ -	0.00	0%
2.7	Sello Asfaltico para Juntas	m	13,658.00	$ 2,301.00	$ 31,427,058.00	0.00	$ -	0.00	0%
				SUBTOTAL	$ 1,012,863,973.20	SUBTOTAL	$ 25,862,400.00		
TOTAL					$ 1,030,725,337.50	$	25,862,400.00		

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

INTERVENTORIA

- La interventoría continúa solicitando al consorcio constructor la entrega de la reprogramación de los trabajos con su plan de contingencia a aplicar.
- La interventoría reitera solicitud al consorcio constructor, dar cumplimiento y entrega de documentos, de pago de los aportes sociales y parafiscal de todo el personal que está laborando en el proceso constructivo de la pavimentación.
- Igualmente, la interventoría solicita al consorcio constructor, la entrega oportuna de diseño de mezclas, certificados de calidad de materiales a utilizar en el desarrollo de las obras e instalación de valla informativa en el área de trabajo
- La interventoría solicita al consorcio constructor, realizar modificaciones en el plan de contingencia entregado, y dar cumplimiento y aplicación a este mismo, una vez aprobadas sus modificaciones.
- La interventoría solicita al municipio de Colosó, aplicar multa contra el contratista, por incumplimiento de plan de contingencia en la ejecución de los trabajos.
- La interventoría extiende invitación de reunión técnica al consorcio constructor y alcaldía del municipio Colosó.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No aplica, ya que aún no se tienen ítems no previstos para tramitar.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El contratista no avanzó con las partidas de trabajo contratadas, por consiguiente, se reporta un avance de obra física ejecutada del 2,54%, con un porcentaje de obra programado, del 23.6%, presentando un retraso del 21,08%, de acuerdo al plan de contingencia aprobado.

El contratista en su reprogramación y plan de contingencia, debido al incumplimiento de las obras programadas, se comprometió a aumentar las horas máquina de trabajo mediante el nombramiento de un operador adicional, por lo que interventoría le ha solicitado, relacionar identificación y nombre de los dos operadores. De igual manera, le reitera al consorcio

contratante la solicitud de diseño de mezclas, certificados de calidad de materiales e instalación de la valla informativa en el área de ejecución de las obras.

La interventoría continúa haciendo ejerciendo de sus actividades de revisión, seguimiento, y cumplimiento del plan de contingencia presentado para la ejecución de las diferentes actividades con objeto del contrato de obra; el cual no se ha llevado a cabalidad, en base a los tiempos, actividades y recursos estipulados en este mismo documento, por lo que, interventoría, mediante oficio N°105 2020, el día 19 de enero, de 2021, solicita al contratista, inmediata aplicación de este y reitera, la obligación de interponer multas y/o sanciones en caso omiso de estas solicitudes y requerimientos.

El director de interventoría del consorcio CIU TERCIARIA, solicita reunión técnica el día 28 de enero de 2021, con el contratista de esas obras y el ente contratante, para tratar asuntos específicos del contrato en referencia; resultado de este encuentro, se programa visita técnica para el día 1 de febrero de 2021, con el fin de realizar ubicación del Box Coulvert, localizado en la abscisa K0+ 098 y su socialización. La interventoría ratifica al ente contratante, Alcaldía de Colosó, aplicar la sanción pecuniaria en contra del contratista, por el incumplimiento parcial cualificado y cuantificado al corte del presente informe.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 2

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 4

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 5

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 6

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 9

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 10

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

N.A. (El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, pero a la fecha del corte del informe, aún no se había dado el pago de este)

4.12 Seguimiento a la programación de obra

El contratista entregó la reprogramación de los trabajos y plan de contingencia, requerido por la interventoría, para garantizar al contratante entregar las obras dentro de los términos de tiempo y calidad exigidos; no obstante, mediante visita técnica, interventoría ha constatado que no se encuentran cumpliendo este plan de contingencia, por lo que en el presente mes el retraso en obra equivale a 21.08%.
Interventoría ha solicitado mediante oficio, la inmediata aplicación y cumplimiento del plan de contingencia, con el fin de cumplir con lo pactado en el contrato.

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre).

4.14 Actas comité de obra

Para este mes no se realizaron comité de obra.

4.15 Acta reunión

El día 28 de enero de 2021, se realizó reunión técnica, contratista e interventoría, con la finalidad de tratar aspectos del contrato en cuestión**. Ver anexo 11**

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 12**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Fecha de terminación actualizada	31 marzo de 2021
Valor Total Contrato	$ 685.270.884
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

La interventoría continúa haciendo seguimiento permanente a las actividades preliminares en el eje vial, tales como: conformación de la vía, cortes de la banca y adecuación de la subrasante estable.

La interventoría mediante OFICIO N° 094 2020 CIU/ COLOSO 4 de enero de 2021, solicita al contratista, con carácter urgente, remitir la reprogramación de obra y plan de contingencia a aplicar, -debido al atraso del 45,25% detectado-; de igual manera, se solicita al consorcio constructor, atender requerimiento ante la solicitud de apremio, que ese mismo tiene, debido al atraso por incumplimiento de contrato. Por último, la interventoría, solicita al consorcio PLACA HUELLA COLOSÓ, presentar en campo listado de personal, equipos, materiales y maquinaria – para su revisión-.

La interventoría mediante OFICIO N° 104 2020 CIU/ COLOSÓ de 10 de enero de 2021, reitera al consorcio constructor dar cumplimiento y entregar oportunamente documentos de pago seguridad social y aportes parafiscales de los trabadores que hacen parte de la construcción de la estructura vial; así mismo, la solicitud de entrega de diseño de las mezclas, certificados de calidad de materiales a utilizar en el desarrollo de las obras y la instalación de la valla informativa en el área de ejecución de los trabajos ; así como, también se reitera la necesidad de mantener copia de todos los planos y diseños de obras civiles en campo.

La interventoría mediante OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ de 10 de enero de 2021, solicitó al contratista, ajustes en el plan de contingencia presentado, tales como, remitir información de todos los trabajadores vinculados en las diferentes actividades programadas, información referente al horario de trabajo los fines de semana y festivos, propuestos por el contratista - con el fin de programar control técnico de las obras – e información correspondiente al proveedor de la nueva cantera.

La interventoría por conducto de OFICIO N° 107 2020 CIU/ COLOSÓ, de 19 enero de 2021, requirió al contratista, dar cumplimiento y aplicación inmediata al plan de contingencia, debido a que, en la visita técnica realizada, se encontró las obras y ejecución de estas, totalmente paralizadas; reiterando al consorcio constructor, que, al no cumplir el

plan de contingencia presentado, se procederá a aplicar las multas y sanciones correspondientes.

La interventoría mediante OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ de 25 de enero de 2020, ratifica a la Alcaldía Municipal de Colosó – Sucre, la aplicación de Multa contra el contratista, por el incumplimiento contractual, por parte de la firma constructora y la no respuesta de los oficios y requerimientos enviados por parte de interventoría, por el quebrantamiento en la programación de ejecución de las obras.

La interventoría mediante OFICIO N° 122 2020 CIU/ COLOSÓ de 26 de enero de 2020, requirió a Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Colosó Sucre, invitación a reunión técnica, con la finalidad de tratar asuntos específicos del contrato de obra de mejoramiento de la vía Colosó Calle Larga, en el Municipio de Colosó Sucre.

La interventoría mediante OFICIO N° 123 2020 CIU/ COLOSÓ de 26 de enero de 2020, requirió al contratista a una invitación a reunión técnica, con la finalidad de tratar asuntos específicos del contrato de obra de mejoramiento de la vía Colosó Calle Larga, en el Municipio de Colosó Sucre.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente informe, no se requirió concepto de los especialistas para este contrato.

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 15

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021. **Ver anexo 17**

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de enero al 31 de enero de 2021.
Ver anexo 18

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticipo

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo al desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. La interventoría continuará con el control, seguimiento y acompañamiento a todas las actividades de obra por parte de la Interventoría.

2. La interventoría viene solicitando al contratista, la entrega de diseño de las mezclas y certificado de calidad de materiales, a utilizar en el desarrollo de los trabajados, así como la instalación de la valla informativa en el área de ejecución de las obras.

3. La interventoría en vista del incumplimiento del plan de contingencia y avance de las obras, según la programación del contrato, solicitó al ente contratante, Alcaldía Municipal de Colosó, ratificación de multa contra el consorcio constructor.

4. La interventoría ha sido reiterativa que el contratista allegue a la interventoría copia de las afiliaciones del personal vinculado a las obras, correspondientes al pago de la seguridad social y aportes parafiscales, para dar cumplimiento a normatividad específica.

5. La interventoría reiteró solicitud al contratista allegar copia del título minero y licencia ambiental de la nueva cantera proveedora del material de arena, agregado y material de subbase tipo C a utilizar durante la ejecución de los trabajos.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido.

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA			
FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
4 DE ENERO DE 2021	SOLICITUD PRESENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
10 DE ENERO DE 2021	REITERACION CUMPLIMIENTO ASPECTOS VARIOS	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
10 DE ENERO DE 2021	SOLICITUD DOCUMENTOS PARA AVALAR PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
19 DE ENERO DE 2021	SOLICITUD APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y REQUERIMIENTOS DEL OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
26 DE ENERO DE 2021	RATIFICACIÓN APLICACIÓN MULTA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDÍA MUNICIPAL COLOSÓ
26 DE ENERO DE 2021	INVITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
26 DE ENERO DE 2021	INVITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	SECREARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS COLOSÓ

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras.



1. Foto: Conformación de calzada del tramo N° 4 sector Calle Larga



2. Foto: Conformación de calzada sector Calle Larga



3. Foto: Trabajos de conformación calzada, tramo N°4.



4. Foto: Trabajos de Figuración de acero para vigas riostras.




5. Foto: Construcción de formaletería en madera.



6. Foto: Acopio de materiales.

8.3. Bitácora de obra

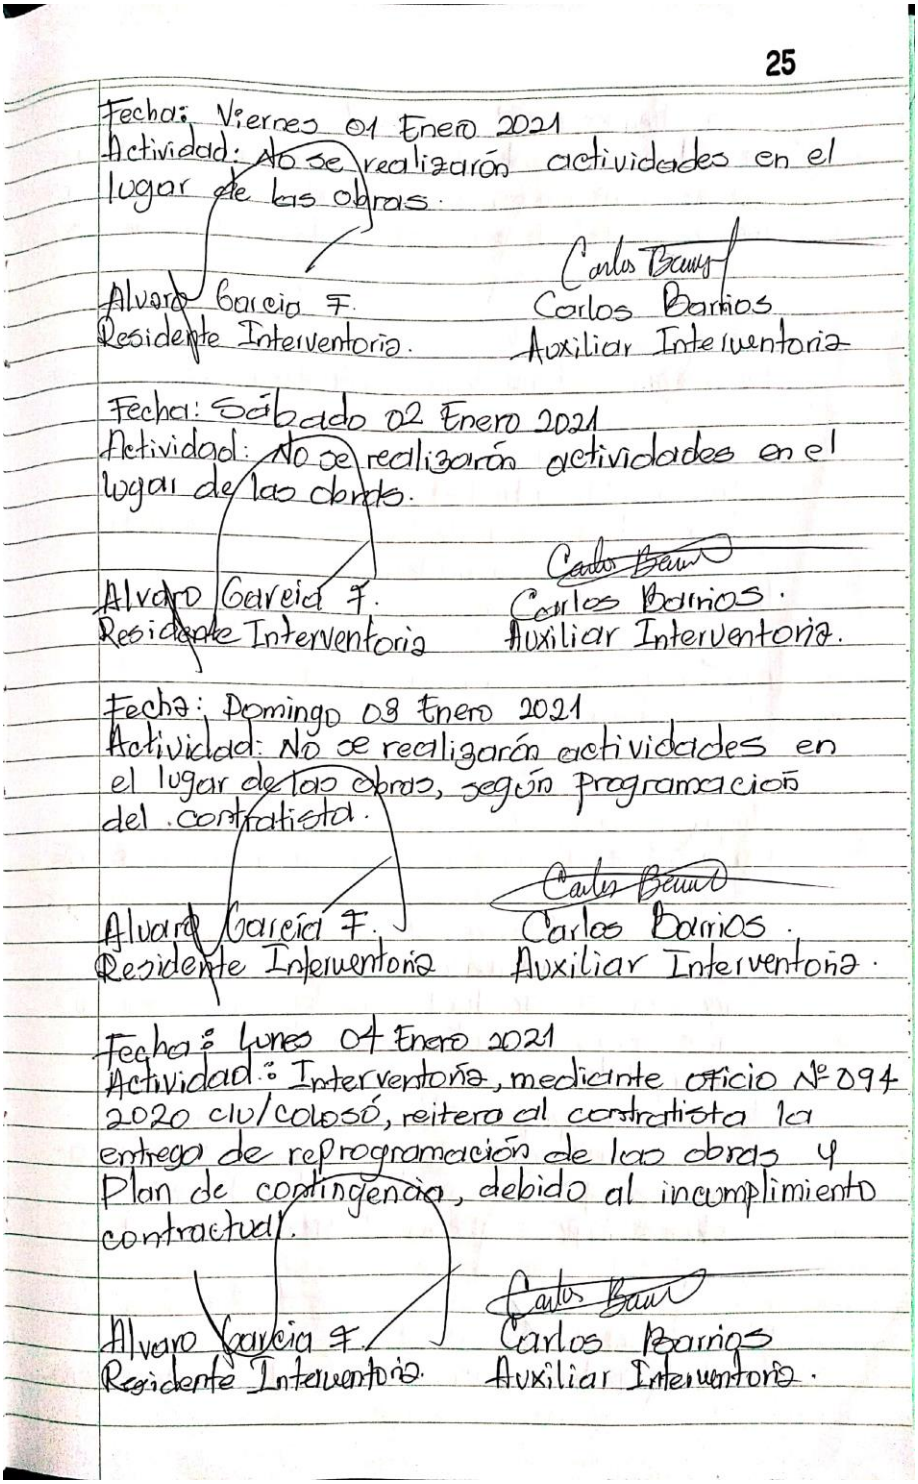

25

Fecha: Viernes 01 Enero 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el lugar de las obras.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios — Auxiliar Interventoria

Fecha: Sábado 02 Enero 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el lugar de las obras.


Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria
Carlos Barrios. — Auxiliar Interventoria.

Fecha: Domingo 03 Enero 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el lugar de las obras, según programación del contratista.

Alvaro García F. — Residente Interventoria
Carlos Barrios. — Auxiliar Interventoria.

Fecha: Lunes 04 Enero 2021
Actividad: Interventoría, mediante oficio Nº 094 2020 ciu/colosó, reitera al contratista la entrega de reprogramación de las obras y Plan de contingencia, debido al incumplimiento contractual.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios — Auxiliar Interventoria.

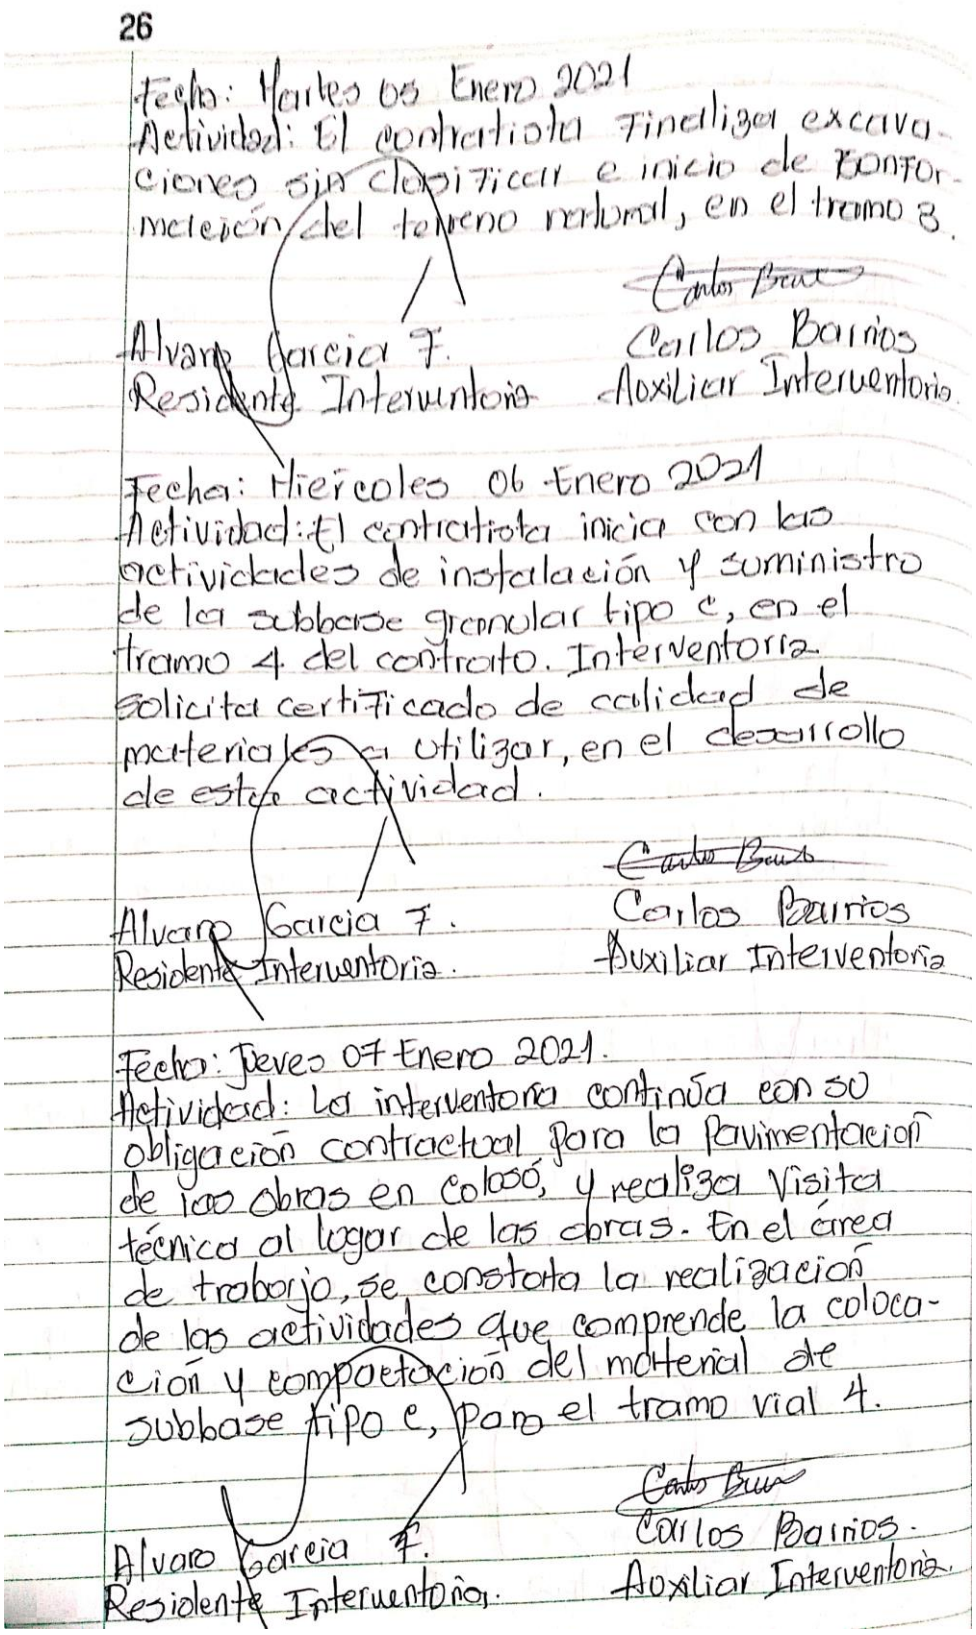

26

Fecha: Martes 05 Enero 2021
Actividad: El contratista Finalizar excavaciones sin clasificar e inicio de conformación del terreno natural, en el tramo 3.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Miercoles 06 Enero 2021
Actividad: El contratista inicia con las actividades de instalación y suministro de la subbase granular tipo c, en el tramo 4 del contrato. Interventoria solicita certificado de calidad de materiales a utilizar, en el desarrollo de esta actividad.


Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 07 Enero 2021.
Actividad: La interventoria continúa con su obligación contractual para la pavimentación de las obras en Colosó, y realiza visita técnica al lugar de las obras. En el área de trabajo, se constata la realización de las actividades que comprende la colocación y compactación del material de subbase tipo c, para el tramo vial 4.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios.
Auxiliar Interventoria.

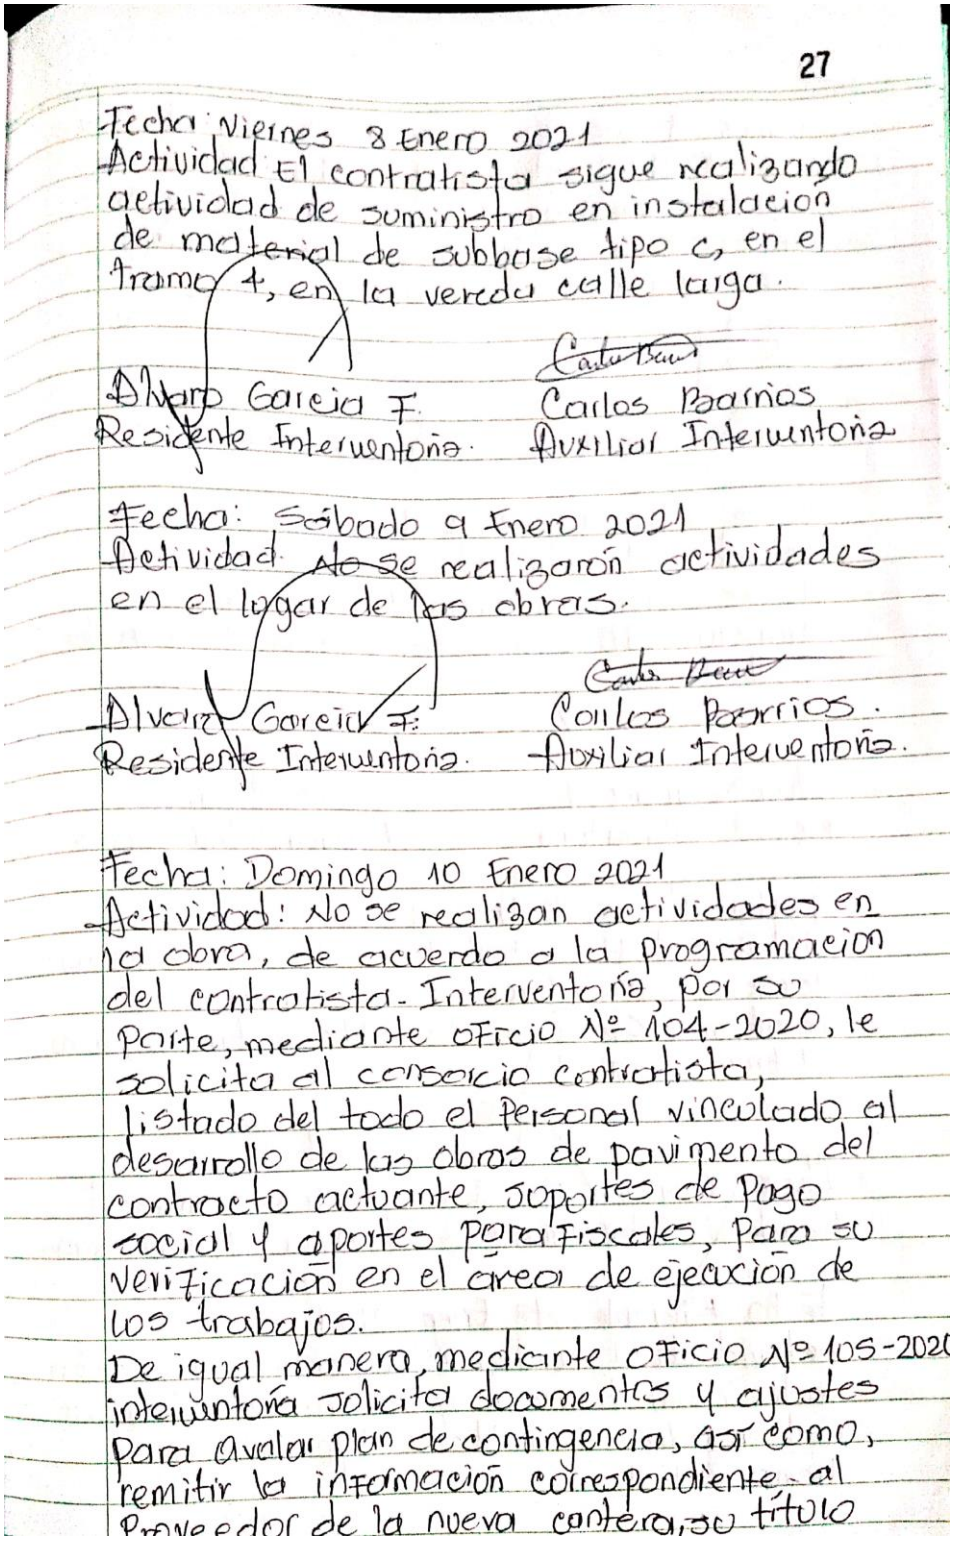

27


Fecha: Viernes 8 Enero 2021
Actividad: El contratista sigue realizando actividad de suministro en instalacion de material de subbase tipo c, en el tramo 4, en la vereda calle larga.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios — Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 9 Enero 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el lugar de las obras.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios. — Auxiliar Interventoria.

Fecha: Domingo 10 Enero 2021
Actividad: No se realizan actividades en la obra, de acuerdo a la programacion del contratista. Interventoria, por su parte, mediante oficio N° 104-2020, le solicita al consorcio contratista, listado del todo el personal vinculado al desarrollo de las obras de pavimento del contracto actuante, soportes de pago social y aportes parafiscales, para su verificacion en el area de ejecucion de los trabajos.
De igual manera, mediante oficio N° 105-2020 interventoria solicita documentos y ajustes para avalar plan de contingencia, asi como, remitir la informacion correspondiente al Proveedor de la nueva cantera, su titulo

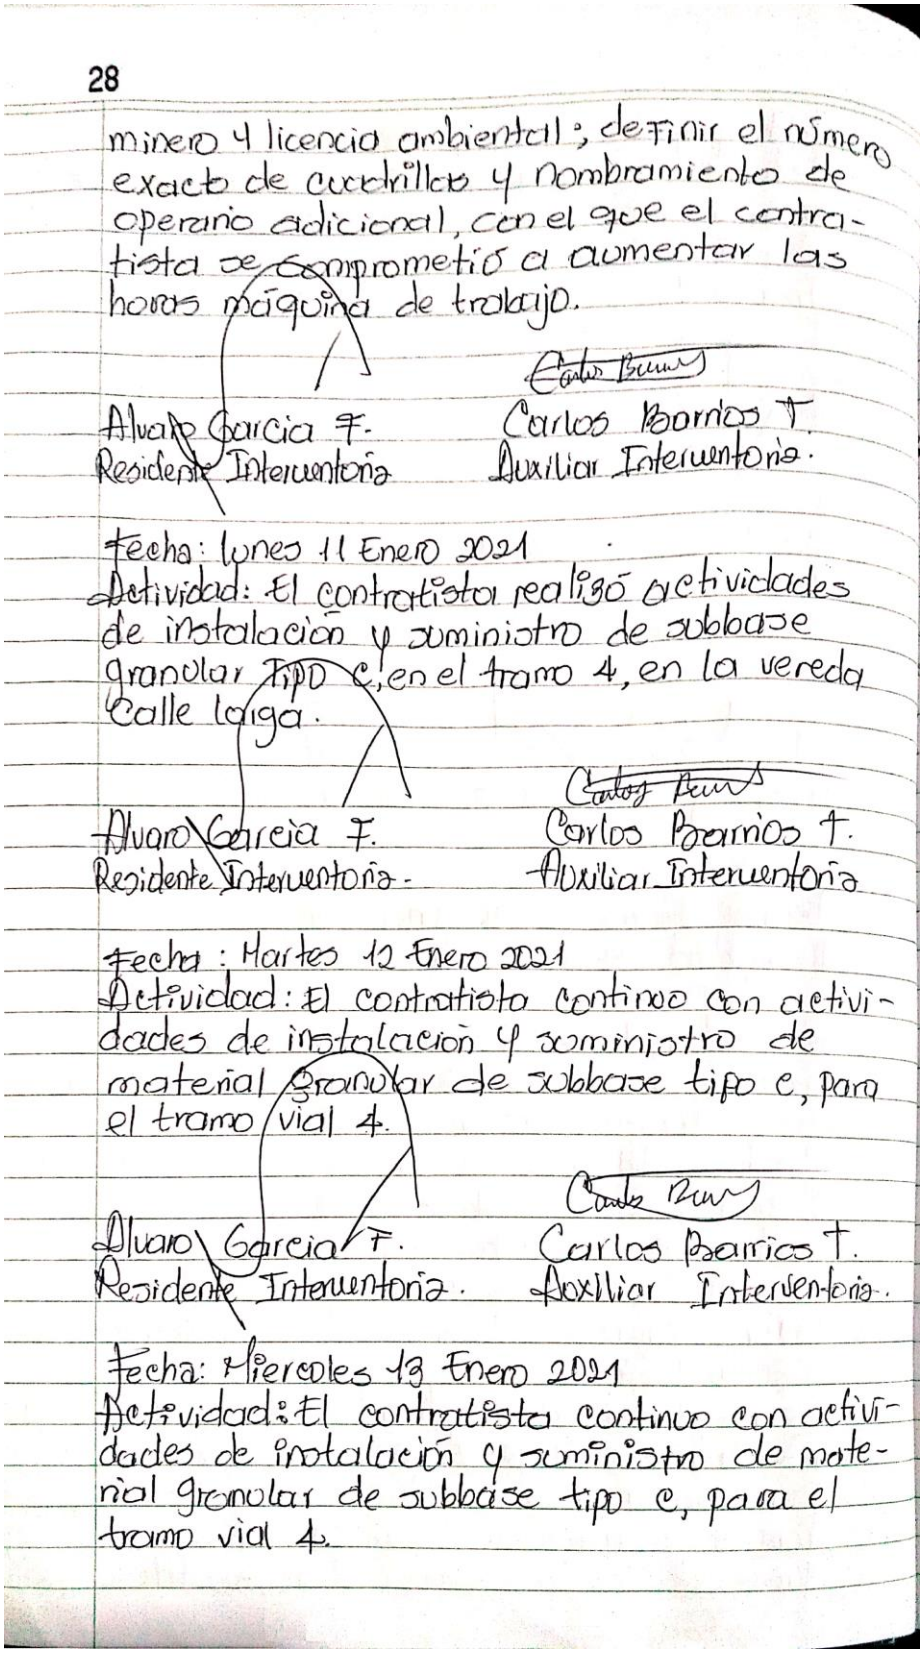

28

minero y licencia ambiental; definir el número exacto de cuadrillas y nombramiento de operario adicional, con el que el contratista se comprometió a aumentar las horas máquina de trabajo.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoría
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría.


Fecha: lunes 11 Enero 2021
Actividad: El contratista realizó actividades de instalación y suministro de subbase granular Tipo C, en el tramo 4, en la vereda Calle larga.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoría.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría

Fecha: Martes 12 Enero 2021
Actividad: El contratista continuo con actividades de instalación y suministro de material granular de subbase tipo c, para el tramo vial 4.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoría.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría.

Fecha: Miercoles 13 Enero 2021
Actividad: El contratista continuo con actividades de instalación y suministro de material granular de subbase tipo c, para el tramo vial 4.

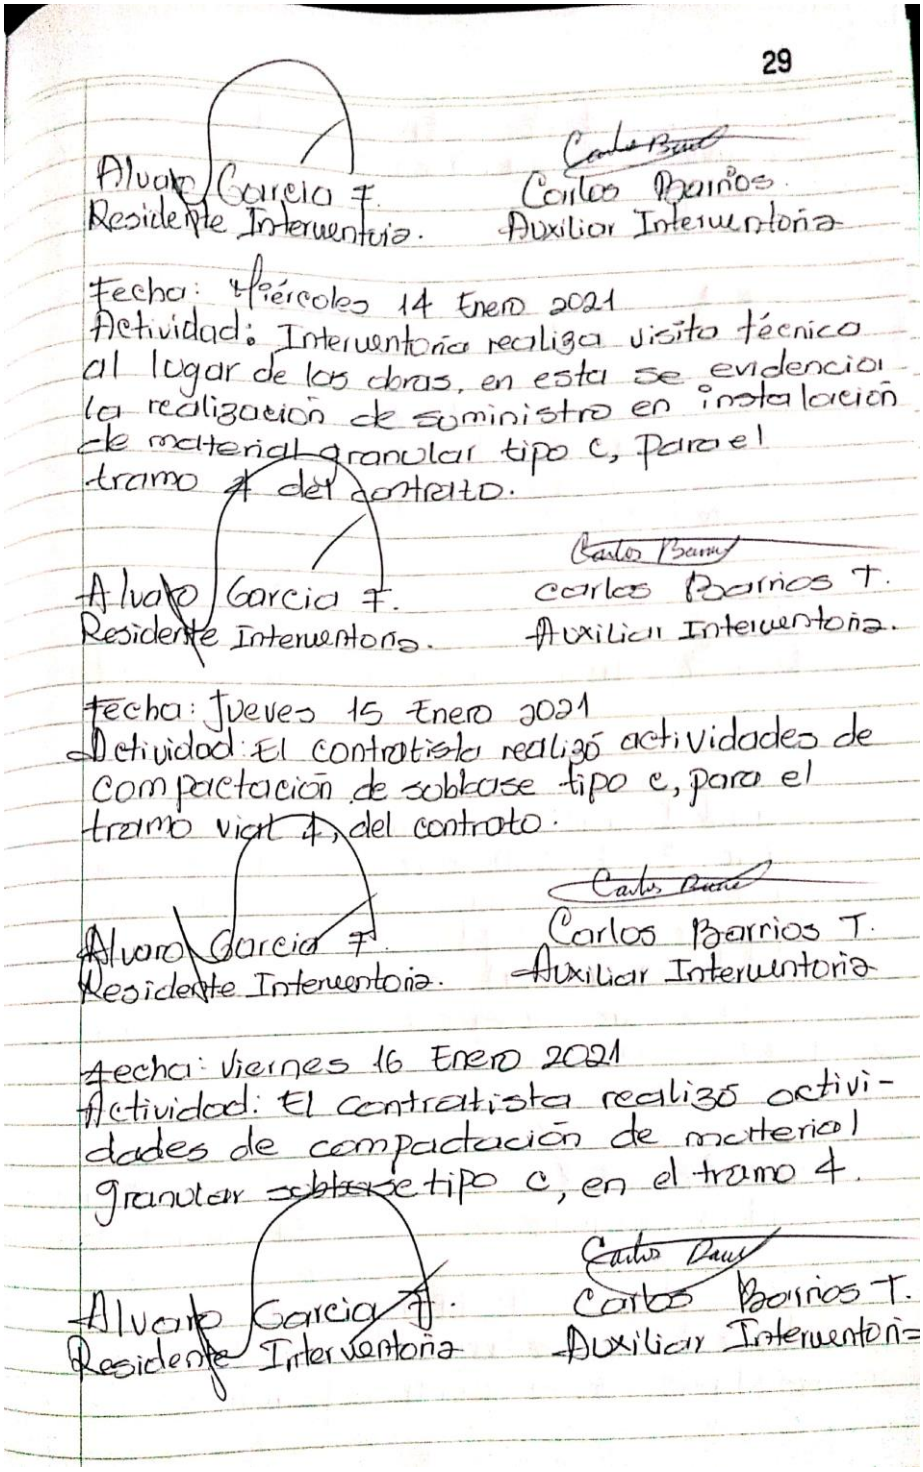

29

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Miércoles 14 Enero 2021
Actividad: Interventoria realiza visita técnico al lugar de las obras, en esta se evidencia la realización de suministro en instalación de material granular tipo C, para el tramo 4 del contrato.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Jueves 15 Enero 2021
Actividad: El contratista realizó actividades de compactación de sobbase tipo C, para el tramo vial 4, del contrato.


Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 16 Enero 2021
Actividad: El contratista realizó actividades de compactación de material granular ~~sobbase~~ tipo C, en el tramo 4.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

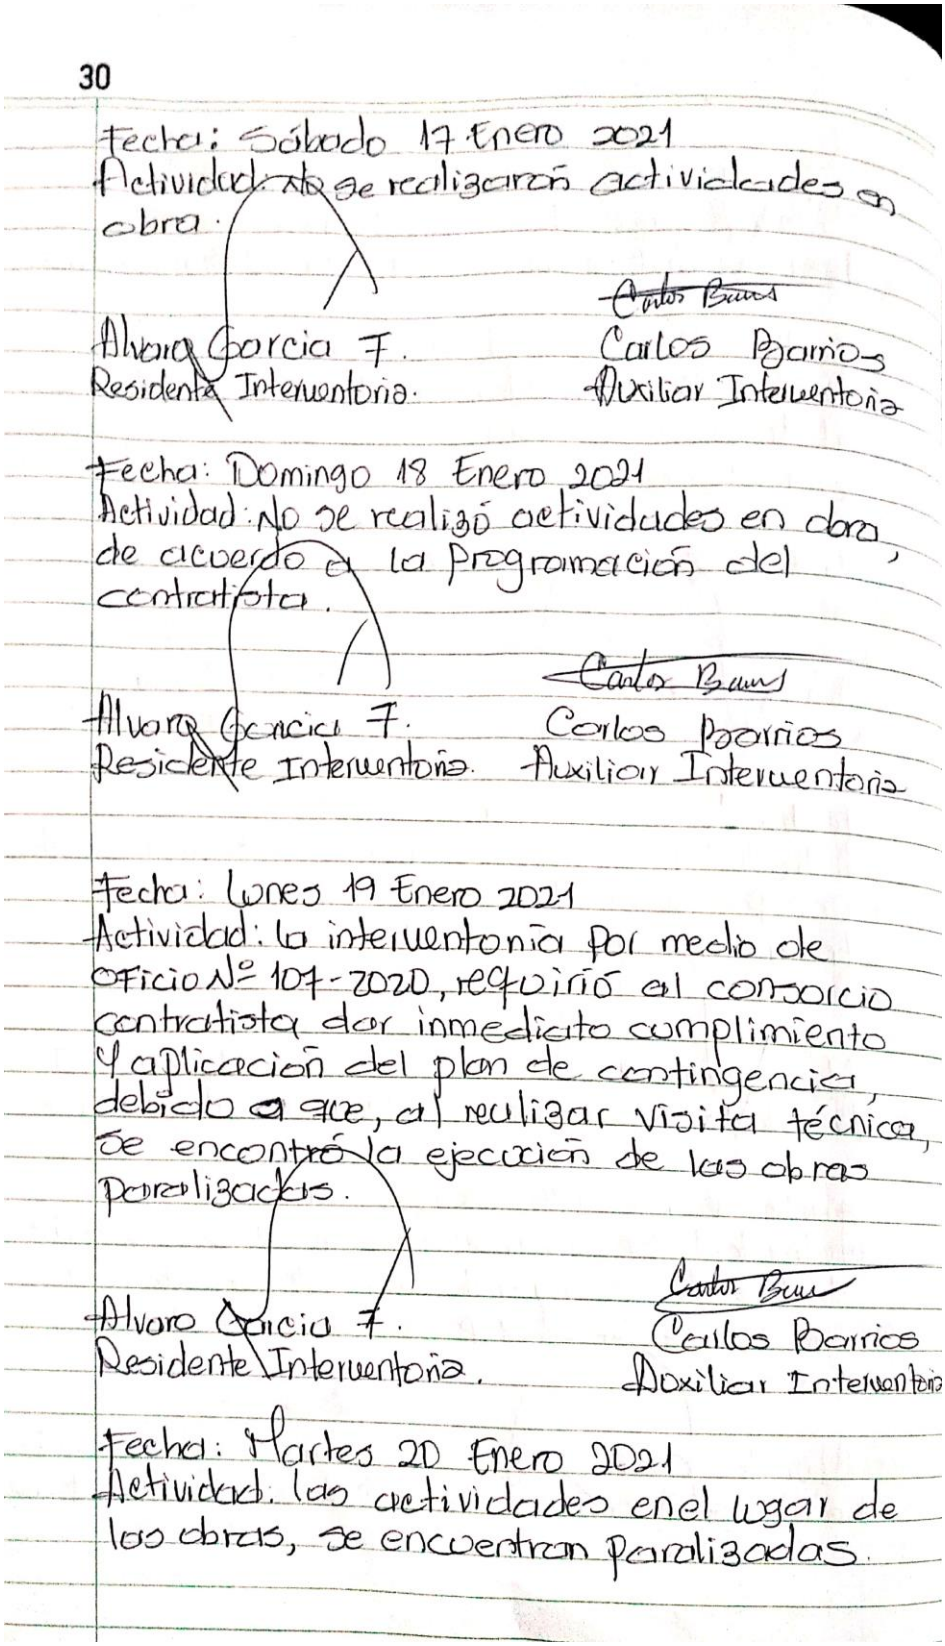

30

Fecha: Sábado 17 Enero 2021
Actividad: No se realizaron actividades en obra.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Domingo 18 Enero 2021
Actividad: No se realizó actividades en obra, de acuerdo a la programación del contratista.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.


Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 19 Enero 2021
Actividad: La interventoria por medio de OFICIO Nº 107-2020, requirió al consorcio contratista dar inmediato cumplimiento y aplicación del plan de contingencia, debido a que, al realizar visita técnica, se encontró la ejecución de las obras paralizadas.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Martes 20 Enero 2021
Actividad: las actividades enel lugar de las obras, se encuentran paralizadas.

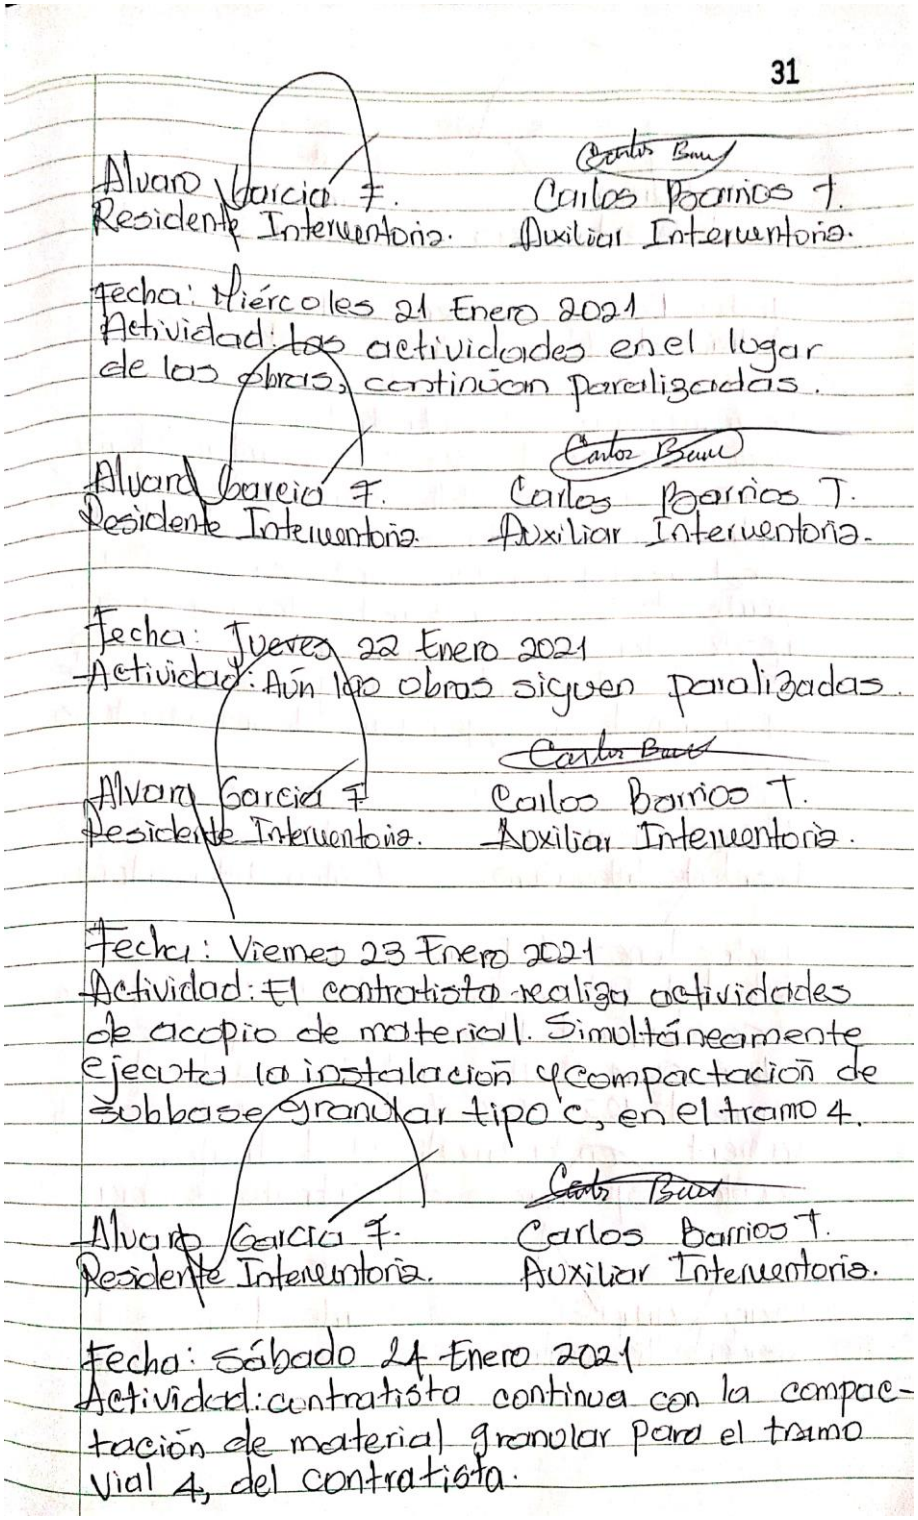

31

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Miércoles 21 Enero 2021
Actividad: las actividades en el lugar de las obras, continúan paralizadas.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Jueves 22 Enero 2021
Actividad: Aún las obras siguen paralizadas.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Viernes 23 Enero 2021
Actividad: El contratista realiza actividades de acopio de material. Simultáneamente ejecuta la instalación y compactación de subbase granular tipo C, en el tramo 4.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Sábado 24 Enero 2021
Actividad: contratista continua con la compactación de material granular para el tramo vial 4, del contratista.

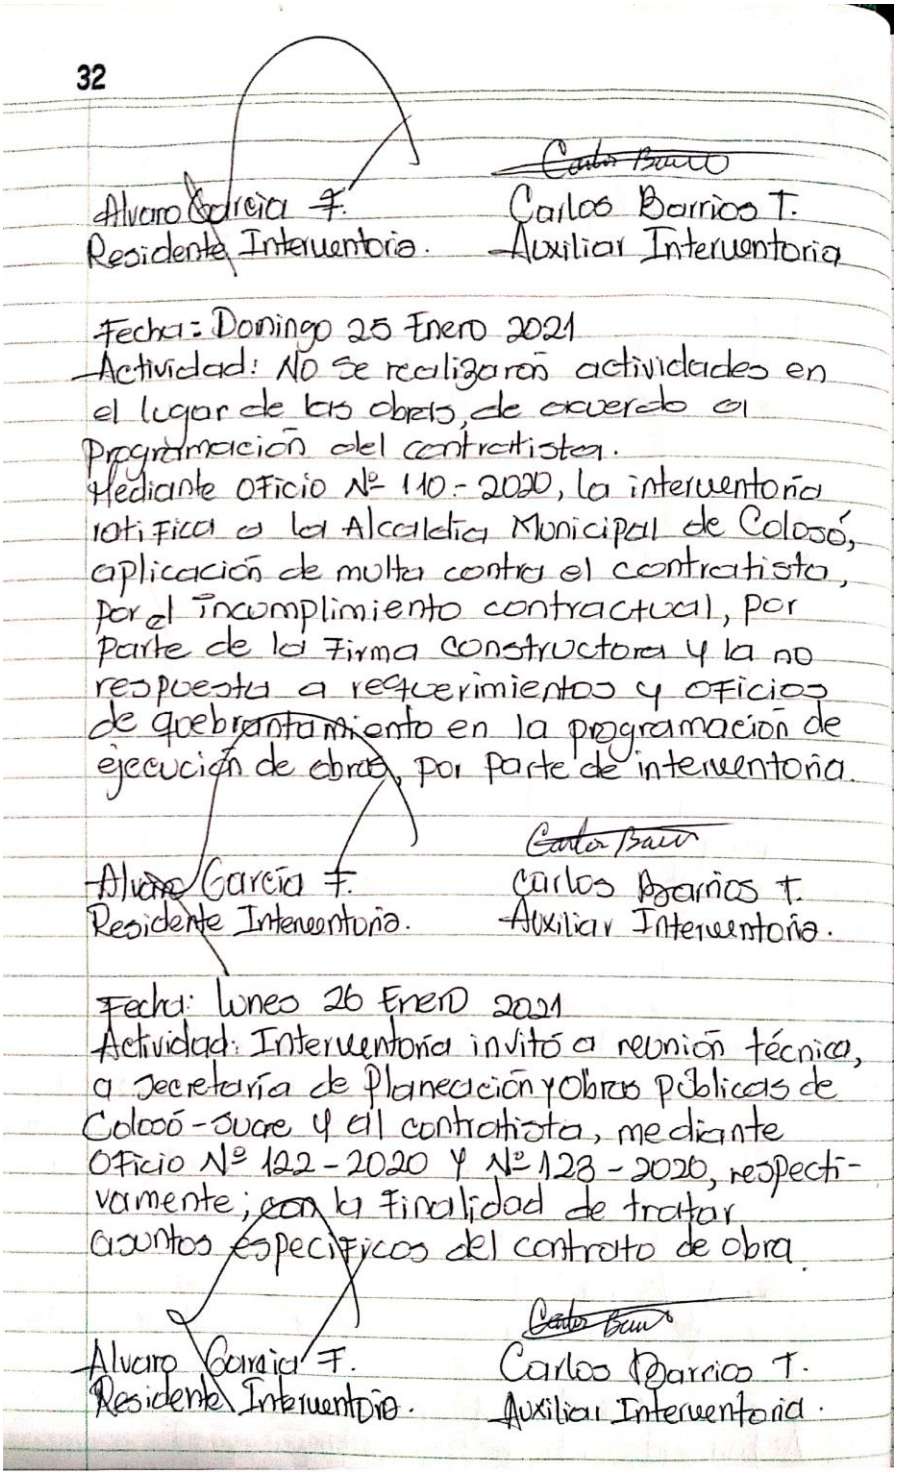

32

Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Domingo 25 Enero 2021
Actividad: NO se realizaron actividades en el lugar de las obras, de acuerdo al Programación del contratista.
Mediante Oficio Nº 110-2020, la interventoría notifica a la Alcaldía Municipal de Colosó, aplicación de multa contra el contratista, por el incumplimiento contractual, por parte de la Firma constructora y la no respuesta a requerimientos y oficios de quebrantamiento en la programación de ejecución de obras, por parte de interventoría.


Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoría.

Fecha: Lunes 26 Enero 2021
Actividad: Interventoría invitó a reunión técnica, a Secretaría de Planeación y Obras públicas de Colosó-Sucre y el contratista, mediante Oficio Nº 122-2020 y Nº 123-2020, respectivamente; con la finalidad de tratar asuntos específicos del contrato de obra.

Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

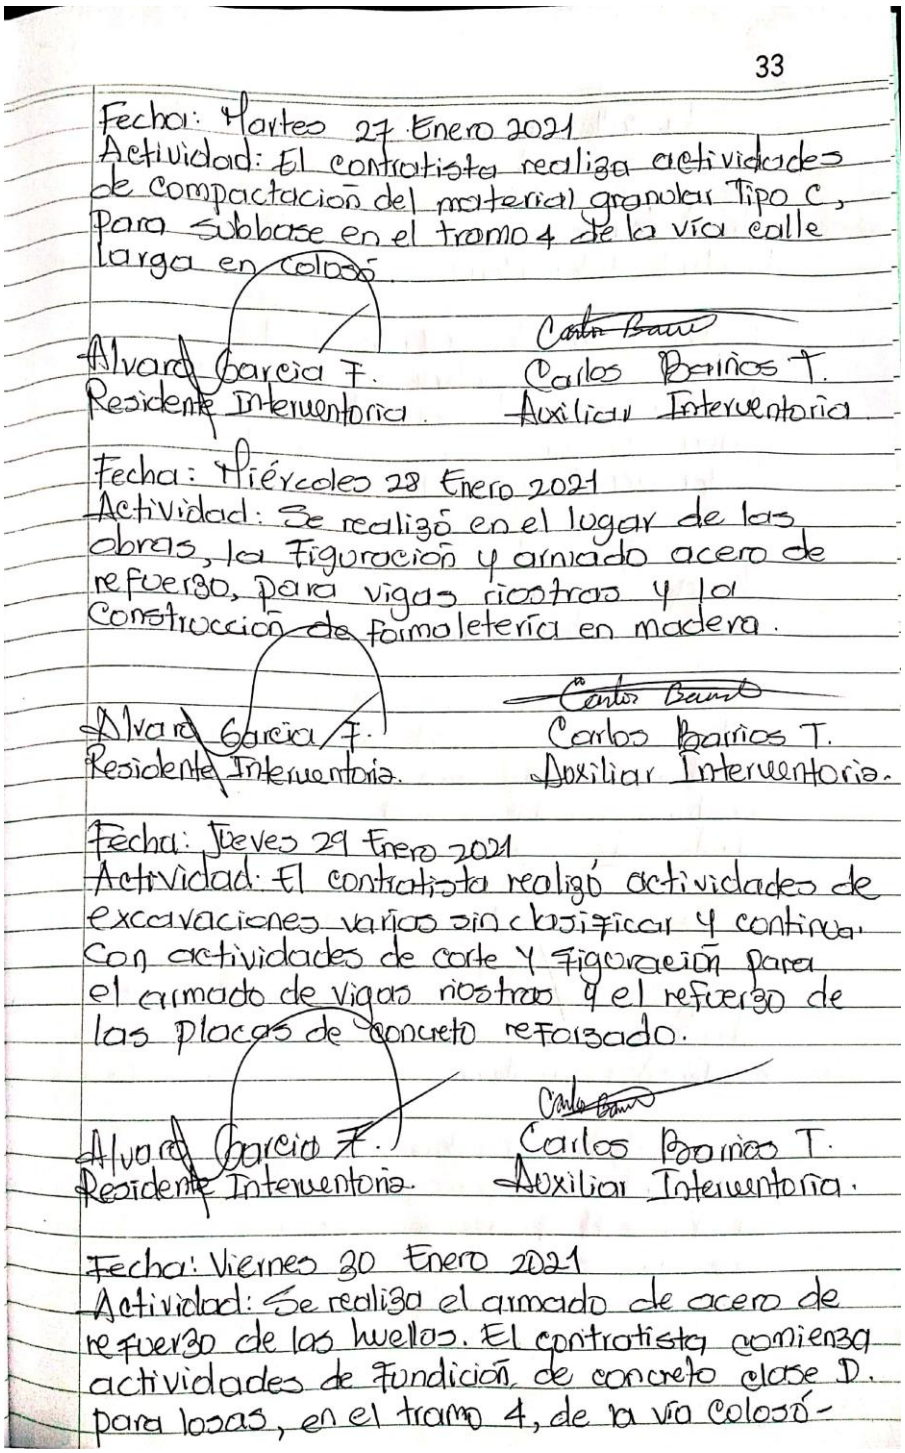

33

Fecha: Martes 27 Enero 2021
Actividad: El contratista realiza actividades de compactación del material granular Tipo C, para subbase en el tramo 4 de la vía calle larga en Colosó.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Miércoles 28 Enero 2021
Actividad: Se realizó en el lugar de las obras, la figuración y armado acero de refuerzo, para vigas riostras y la construcción de formaletería en madera.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Jueves 29 Enero 2021
Actividad: El contratista realizó actividades de excavaciones varias sin clasificar y continua con actividades de corte y figuración para el armado de vigas riostras y el refuerzo de las placas de concreto reforzado.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Viernes 30 Enero 2021
Actividad: Se realiza el armado de acero de refuerzo de las huellas. El contratista comienza actividades de fundición de concreto clase D. para losas, en el tramo 4, de la vía Colosó-

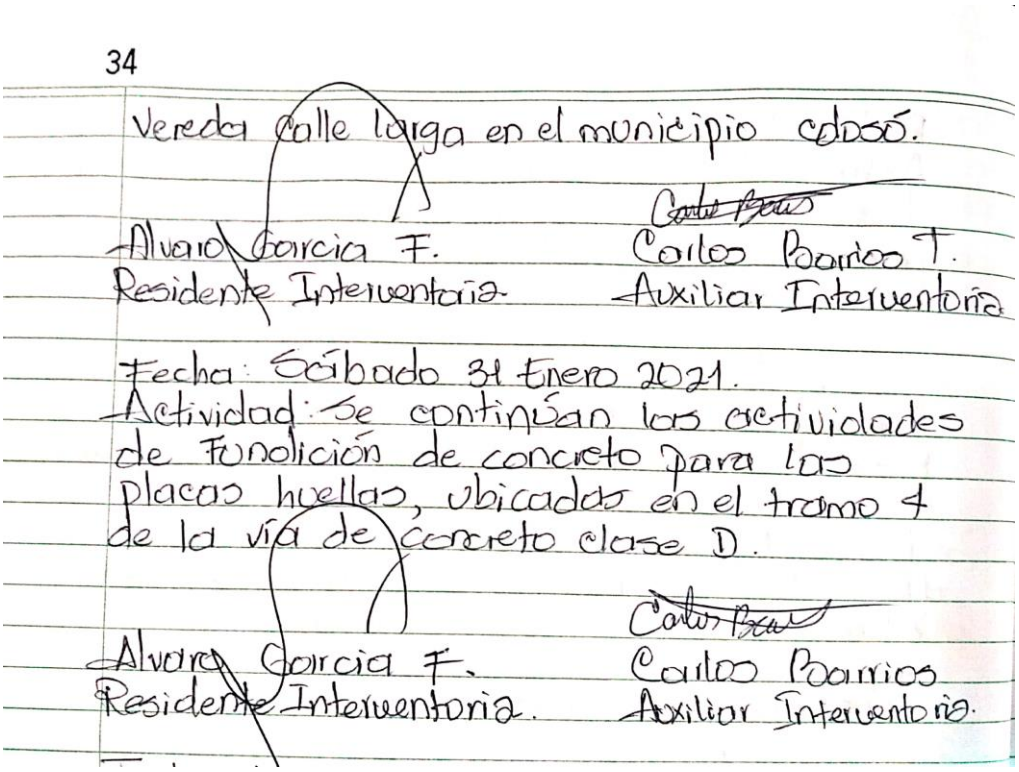

34

Vereda Calle larga en el municipio Cabosó.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Sábado 31 Enero 2021.
Actividad: Se continúan las actividades de Fundición de concreto para las placas huellas, ubicadas en el tramo 4 de la vía de concreto clase D.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria.

ANEXO 1

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: LP – 085 – 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES
FECHA DE INICIACION:	10/09/2020	FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN N°2:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,055,799,942.50	VALOR ADICIÓNALES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 1,055,799,942.50	AMORTIZACION ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO CONCEDIDO:	N/A		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Ml	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Ml	0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	229,300,101	$ -	$ -	$ -	0.00	$ 69,096,129.00	-	-
Acumulado:	249,388,817	$ 25,862,400	$ -	$ 25,862,400	0.10	$ 266,319,762.00	1.000	10.298

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1,055,799,942.50
Total	$ 1,055,799,942.50

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0.02	5.00	0.71	2	1,029,937,543	0	1,055,799,943	806,411,126
Interventor:	0.39	5.00	1.00	0	418,951,122	0	418,951,122	418,951,122

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	10/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	10/08/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	11/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-
Estabilidad y Calidad de Obra	09/04/2021	08/04/2026

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	12/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 10/07/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ EL DIA 25 DE ENERO DE 2021 APLICAR MULTA AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO CONSTRACTUAL DE SUS OBLIGACIONES Y LA OMISION Y NO RESPUESTA DE LOS OFICIOS REQUERIMIENTOS ENVIADOS POR INTERVENTORIA

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°094 2020 CIU/COLOSO SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA A APLICAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LISADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA , ACTUALIZADO DE LAS OBRAS, PARA SU REVISIÓN.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°104 2020 CIU/COLOSÓ REITERA AL CONTRATISTA, ENTREGA OPORTUNA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SOLICITA DOCUMENTOS DE DISEÑO DE MEZCLAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES E INSALACION DE LA VALLA INFORMAIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°105 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 10 DE ENERO DE 2021, SOLICIÓ AL CONTRATISTA AJUSTES EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO PARA SU APROBACIÓN.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°107 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA 19 DE ENERO DE 2020 REQUIRIÓ AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN INMEDIATA AL PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°110 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA 25 DE ENERO DE 2021 RATIFICÓ A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ, APLICACIÓN DE MULTA CONTRA CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°122 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 26 DE ENERO DE 2021 REQUIRIÓ INVITACIÓN REUNION TÉCNICA A SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DE COLOSÓ, PARA TRATAR ASUNTOS ESPECIFICOS DE CONTRATO DE OBRA, MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSÓ CALLE LARGA.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°123 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 26 DE ENERO DE 2021 REQUIRIÓ INVITACIÓN REUNION TÉCNICA AL CONTRATISTA, PARA TRATAR ASUNTOS ESPECIFICOS DE CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSÓ CALLE LARGA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA ALCANZAR LOS PORCENTAJES DE OBRA PROGRAMADOS, Y PODER CUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS, DEBIDO AL ATRASO DETECTADO EN EL CUMPLIMEINTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

LA INTERVENTORÍA RATIFICA AL ENTE CONTRATANTE APLICAR MULTA AL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA PLACA HUELLA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON EL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE.

Firma

Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	10

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** LP – 085 – 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aspersor manual	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de ho	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua(1000 Galones)	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta 6 m3	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** **LP – 085 – 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MARTINEZ AMADOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GARRIDO HERNANDEZ CARLOS ALFONSO	DIRECTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROMERO GARCIS JESUS MANUEL	RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INERVENTORÍA MEDIANTE OFICIOS, HA SOLICITADO AL CONTRATISTA, ENTREGA DE LA INFORMACION PERTINENTE AL PAGO DE APORTES SOCIALES Y PARAFISCALES, DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS OBRAS DEL CONTRATO; SIN EMBARGO, HAN HECHO CASO OMISO A ESTOS REQUERIMIENTOS

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No.:22202-242017 COR

Firma
Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,055,799,942.50

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 834,887,523.38	$ 195,837,814.13	$ 1,030,725,337.50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11,605,649.22	$ 2,722,312.78	$ 14,327,962.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 8,704,780.83	$ 2,041,862.17	$ 10,746,643.00
VALOR TOTAL	$ 855,197,953.43	$ 200,601,989.08	$ 1,055,799,942.50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **FERREA Y TERCIARIA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: **LP – 085 – 2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: EN EL PRESENTE MES NO SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	6	DE	10

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	24/11/2020	DENSIDAD EN EL TERRENO	INV E-730	TRAMO 4 (K2+815)	1	COMPACTACIÓN 95%	95.46% DE COMPACTACIÓN	SI	
2	24/11/2020	DENSIDAD EN EL TERRENO	INV E-730	TRAMO 4 (K2+960)	1	COMPACTACIÓN 95%	95.49% DE COMPACTACIÓN	SI	
1	07/01/2021	DENSIDAD EN EL TERRENO	INV E-730	TRAMO 4 (K3 +040)	1	COMPACTACIÓN 95%	95,44% DE COMPACTACIÓN	SI	
2	07/01/2021	DENSIDAD EN EL TERRENO	INV E-730	TRAMO 4 (K3+980)	1	COMPACTACIÓN 95%	95.99% DE COMPACTACIÓN	SI	

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ENSAYOS DE LABORATORIOS

PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO*

LOCALIZACION: *VEREDA CALLE LARGA - MUNICIPIO DE COLOSO*

PETICIONARIO: *CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO*

CONSTRUCCION: *PLACA HUELLA - MATERIAL DE SUBBASE*

PUNTOS	1	2	3	4	5	6	7	8
	8,40	8,60	7,50	7,80				

CALCULOS DE DENSIDADES								
ABSCISA	K2+815 CALLE LARGA	K2+960 CALLE LARGA	K3+040 CALLE LARGA	K3+980 CALLE LARGA				
FECHA	24-nov-20	24-nov-20	7-ene-21	7-ene-21				
W. material extraído(gr)	2593	2594	2895	2815				
W. equipo de arena inicial(gr)	6075	6074	6352	6307				
W. equipo de arena final(gr)	2792	2794	2857	2880				
W. Arena en el cono + hueco(gr)	3283	3280	3495	3427				
W. arena en el cono(gr)	1600	1600	1600	1600				
W. arena en el hueco (gr)	1683	1680	1895	1827				
densidad de la arena(gr/cm3)	1,45	1,45	1,45	1,45				
volumen del hueco (cc)	1160,69	1158,62	1306,90	1260,00				
densidad humedad (KN/m3)	21,92	21,96	21,73	21,92				
densidad seca (KN/m3)	20,22	20,22	20,21	20,33				
densidad seca máxima lab.(KN/m3	21,18	21,18	21,18	21,18				
porcentaje de compactación%	**95,46**	**95,49**	**95,44**	**95,99**				

PUNTOS	9	10	11	12	13	14	15	16

CALCULOS DE DENSIDADES								
ABSCISA								
FECHA								
W. material extraído(gr)								
W. equipo de arena inicial(gr)								
W. equipo de arena final(gr)								
W. Arena en el cono + hueco(gr)								
W. arena en el cono(gr)								
W. arena en el hueco (gr)								
densidad de la arena(gr/cm3)								
volumen del hueco (cc)								
densidad humedad (KN/m3)								
densidad seca (KN/m3)								
densidad seca máxima lab.(KN/m3								
porcentaje de compactación%								

Daniel J. Almanza M.

Ing. Daniel J. Almanza Mercado

MP#22202339020COR

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION.

ANEXO 7

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

VERIFICACION DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
MARTINEZ AMADOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	Enero	31	1,102,821,160	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		Nueva EPS	31	Vida Colpatria S.A.	Porvenir	31	Caja Fliar Sucre	31	-	
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	Enero	31	1,102,831,446	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		Salud Total EPS	31	Vida Colpatria S.A.	Porvenir	31	Caja Fliar Sucre	31	-	
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	Enero	31	1,108,760,729	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		Caja Fliar Sucre	31	Vida Colpatria S.A.	Porvenir	31	Caja Fliar Sucre	31	-	
GARRIDO HERNANDEZ CARLOS	CARLOS GARRIDO	Enero	31	92,641,675	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		Salud Total EPS	31	Vida Colpatria S.A.	Colpensiones	31	Caja Fliar Sucre	31	-	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8

FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 5 **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP – 085 – 2020 PLAZO INICIAL: 7 MESES PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

SECTOR: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIONALES:

RUTA VALOR ACUMULADO: $ 1,055,799,942.50 AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	7 MESES	10/04/2021	1,055,799,942.50	1,055,799,942.50

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1,055,799,942.50
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	7 MESES	31/03/2021	$ 685,270,884	685,270,884

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	229,300,101	$ -	$ -	$ -	0.00	$ 69,096,129.00	-	-
Acumulado:	249,388,817	$ 25,862,400	$ -	$ 25,862,400	0.10	$ 266,319,762.00	-	-

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0.02	5.00	0.71	1	1,055,799,943	0	1,055,799,943	806,411,126
Interventor:	0.39	5.00	1.00	0	418,951,122	0	418,951,122	418,951,122

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	3.6
Calzada:	3.6
Bermas:	
Sub base:	0.15
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:
- LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA
- ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS
- NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE
- CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA
- DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN
- TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	0.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10-abr-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,055,799,942.50

VALOR ACUMULADO: $ 1,055,799,942.50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,327,962.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,327,962.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105,579,994.25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316,739,982.75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211,159,988.50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316,739,982.75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16.63%	$ 175,560,600.00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.** **-**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

Firma _____
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10-abr-21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma N.A.
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA **PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**	CÓDIGO	MSE-FR-20	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE COLOSÓ SUCRE — FECHA: 28 / 1 / 2021

DIRECCION TERRITORIAL: INVIAS SUCRE — CONTRATO No.: LP 085 2020

OBJETO DE CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE LA VIA COLOSO VEREDA CALLE LARGA, MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MAGIER DUPPERLEY	
ANA GUTIERREZ FERNÁNDEZ	
JORGE VELASQUEZ	
FERNANDO SILVA	
JOSE VARGAS	
ALVARO GARCIA FLOREZ	
RAFAEL MANJARREZ	
NILSON MONTERROSA	

II. OBJETO

INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

EL SEÑOR NILSON MONTEROSA SE PRESENTA COMO EL NUEVO REPRESANTE LEGAL DEL CONSORCIO CONSTRUCTOR. INTERVENTORIA INFORMA DEL INCUMPLIMIENTO A PESAR DEL PLAN DE CONTIN GENCIA APROBADO. EL CONTRATO TIENE ANTICIPO, LA RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORIA ES QUE SE GIRE EL ANTICIPO. JORGE SOLICITA QUE LA ALCALDIA ENVIE CARTA PARA INCLUIR EL NOM BRE DE JORGE MAURICIO CASAS VERA PARA EL MANEJO CONJUNTO DE LA CUENTA DEL CONTRATO. PARA EL REEMBOLSO DEL ANTICIPO SE NECESITAN FACTURAS DIAN, CON TODOS LOS REQUISITOS, LO SOLICITA JORGE VELLASQUEZ. EL MUNICIPIO ENTREGARA VEEDURIA CIUDADANA LA PROXIMA SEMA NA. LA INTERVENTORIA SOLICITA A LA ALCALDIA DE COLOSO DAR TRAMITE AL PROCESO DE APREMIO CONTRA EL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO , EN OBSERVANCIA AL DEBIDO PROCESO, SALVA GUARDANDO LOS DERECHOS QUE LE ASISTAN AL CONTRATISTA.
LUNES 1° FEBRERO VISITA TECNICA PARA UBICAR EL BOX COULVERT Y SU SOCIALIZACION

Escaneado con CamScanner

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUION Y SEGUIMIENTO A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.	CÓDIGO	MSE-FR-20		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	28	1	2021

VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] [ ] [ ]
DÍA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

_____ ( ) días del mes de _____ de _____
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)

Escaneado con CamScanner

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 14	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	7 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: DIECIOCHO (18) **del** 01/01/2021 **al** 07/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9

INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No.	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,055,799,943	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26,922,898.53
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8,620,800
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,620,800.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 56,254,321.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	3	3*	4	TOTAL
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	75	**75**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	0	**0**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6¨ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
OTROS:	0		

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZO ACTIVIDADES INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 4 EN LA VEREDA CALLE LARGA.

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** DIECIOCHO (18) **del** 01/01/2021 **al** 07/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FINALIZAR LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR CLASE C

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGI (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K3+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT					BOXCOULVERT K0+098										
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C



FOTO 2. TRAMO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C INSTALADA Y COMPACTADA.



FOTO 3. INICIO DE CONFORMACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL TRAMO 3"

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA ANTERIORMENTE LE SOLICITÓ A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ, INICIAR CON LOS TRAMITES DE APREMIO HACIA EL CONTRATISTA DEBIDO AL INCUMPLIMIENDO PARCIAL QUE A LA FECHA VIENE PRESENTADO ,PROMOVIENDO ASÍ UN COMITÉ DE REUNION ENTRE LAS PARTES RESPONSABLES DE LAS OBRAS, OBTENIENDO COMO COMPROMISO A QUE EL CONTRATISTA CONTINUARÁ CON LAS LABORES PERO A UN RENDIMIENTO DILIGENTE PARA PODER CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES, COMO ASÍ LO INDICA EL PLAN DE CONTIGENCIA PRESENTADO A LA INTERVENTORÍA EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO POR LA ALCADIA MUNICIPAL.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 094 2020 CIU/ COLOSÓ CON FECHA DE 4 ENERO DE 2021 LE REITERA AL CONTRATISTA ENTREGAR REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS CON SU PLAN DE CONTIGENCIA A APLICAR DEBIDO AL ATRASO QUE A LA FECHA ESTÁ DETECTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN CONTRACTUTAL,DILIGENCIA QUE NO HAN ATENDIDO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 15	CÓDIGO	MINFRA-M-N-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	14 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** DIECINUEVE (19) **del** 08/01/2021 **al** 14/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9

INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No.	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,055,799,943	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 86,786,755.27
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12,931,200
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12,931,200.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 56,254,321.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3***	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	112.5	**112.5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	0	**0**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6¨ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZO ACTIVIDADES INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 4 EN LA VEREDA CALLE LARGA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 15	CÓDIGO	MINFRA-M-N-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	14 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** DIECINUEVE (19) **del** 08/01/2021 **al** 14/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FINALIZAR LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR CLASE C
3	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
4	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
5	INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGI (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K1+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 104 2020 CIU/ COLOSÓ CON FECHA 10 DE ENERO DE 2021 Y ASUNTO "REITERACION CUMPLIMIENTO ASPECTOS VARIOS" LE SOLICITA AL CONSORCIO CONTRATISTA 1.- LISTADO DE TODO EL PERSONAL VINCULADO AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA N° MM-LP-OP-085-2020, CON LOS SOPORTES DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES; ACLARANDOSE QUE SE VERIFICARÁ EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ CON FEHCA DE 10 DE ENERO DE 2021 Y ASUNTO "SOLICITUD DOCUMENTOS PARA AVALAR PLAN DE CONTINGENCIA"SOLICITA AL CONTRATISTA APLICAR
1.- PARA EL COMPONENTE DE EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR, DONDE USTEDES SE COMPROMETEN A AUMENTAR LAS HORAS MÁQUINA DE TRABAJO, MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE UN OPERADOR ADICIONAL .
2.- DEFINIR CON PRECISIÓN CUAL ES EL NÚMERO EXACTO DE CUADRILLAS, PERO POR EL MOMENTO DEBE ENVIARNOS LA RELACIÓN DE TRABAJADORES QUE CONFORMARAN ESTAS CUADRILLAS DE TRABAJO.
3.- REMITIR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR DE LA NUEVA CANTERA, INCLUYE TITULO MINERO, LICENCIA AMBIENTAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTE (20) **del** 15/01/2021 **al** 21/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9

INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No.	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,055,799,943	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 168,083,350.85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17,241,600
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1.63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17,241,600.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 56,254,321.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	3	3*	4	TOTAL
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	150	**150**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	0	**0**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6¨ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZAN ACTIVIDADES INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 4 EN LA VEREDA CALLE LARGA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 16	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	
		FECHA	21 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)	

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTE (20) **del** 15/01/2021 **al** 21/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FINALIZAR LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR CLASE C
3	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
4	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
5	INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGI (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K3+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 1. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C





FOTO 2. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 107 2020 CIU/ COLOSÓ CON FECHA 19 DE ENERO DE 2021 Y ASUNTO " SOLICITUD APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y REQUERIMIENTOS DEL OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ" SOLICITA RESPETUOSAMENTE,DAR CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN INMEDIATA DEL PLAN DE CONTIGENCIA, COMO MEDIDA RESARCITORIA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL, QUE A LA FECHA VIENEN PRESENTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CON EL MUNICIPIO DE COLOSÓ.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 16	CÓDIGO	MINFRA-M-N-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: VEINTIUNO (21) **del** 22/01/2021 **al** 28/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9

INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No.	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,055,799,943	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 249,379,946.42
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25,862,400
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25,862,400.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 56,254,321.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3***	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	225	**225**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	0	**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≤ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	0	**0**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6¨ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZAN ACTIVIDADES INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 4 EN LA VEREDA CALLE LARGA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 16	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTIUNO (21) **del** 22/01/2021 **al** 28/01/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FINALIZAR LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR CLASE C
3	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
4	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
5	INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGI (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K1+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 1. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C





FOTO 2. ACOPIO DE MATERIALES





FOTO 3. INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C





FOTO 4.FIGURACIÓN DE ACERO Y CONSTRUCCION DE FORMALETERIA EN MADERA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA EL DIA 26 DE NERO DE 2021 EMITE OFICIO N°123 2020 CIU/COLOSÓ CON ASUNTO "INVITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA" DE MANERA RESPETUOSA Y EN VIRTUD DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DEL CONTRATO EN REFERENCIA INVITA A REUNION TENICA EL JUEVES 28 DE ENERO EN LAS OFICIONAS DE LA INTERVENTORPIA LOCALIZADA EN SINCELEJO SUCRE. CON LA FINALIDAD DE TRATA ASUNTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	6

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTHA YURY GARCIA	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	INSPECTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE MARIA MENDOZA DE VARGAS	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 6	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
				TOTAL		

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 685,270,884.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	$ 16,447,491	$ 3,858,053	$ 20,305,544	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 20,305,544	$ 685,270,884		ACTAS EN TRAMITE
2	octubre	$ 35,518,064	$ 8,331,398	$ 43,849,462	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 64,155,006	$ 621,115,878		ACTAS EN TRAMITE
3	noviembre	$ 51,817,723	$ 12,154,775	$ 63,972,498	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 128,127,504	$ 557,143,380		ACTAS EN TRAMITE
4	diciembre	$ 55,967,864	$ 13,128,265	$ 69,096,129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2020	$ 197,223,633	$ 488,047,251		ACTAS EN TRAMITE
5	enero	$ 55,967,864	$ 13,128,265	$ 69,096,129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2021	$ 266,319,762	$ 418,951,122		ACTAS EN TRAMITE
TOTALES		**$ 215,719,007**	**$ 50,600,755**	**$ 266,319,762**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Escriba el te

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 2,250,000.00	$ 2,250,000.00	$ 156,600.00	$ 90,000.00	$ 360,000.00	$ 90,000.00	$ -	$ -
2	MARTHA YURY GARCIA	41708526	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	$ 52,000.00	$ -	$ 52,000.00	$ -	$ -
3	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	1109842513	INSPECTOR	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 208,800.00	$ 120,000.00	$ 480,000.00	$ 120,000.00	$ -	$ -
4	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3,450,000.00	$ 3,450,000.00	$ 240,200.00	$ 138,000.00	$ 552,000.00	$ 138,000.00	$ -	$ -
5	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2,360,000.00	$ 2,360,000.00	$ 164,300.00	$ 94,400.00	$ 377,600.00	$ 94,400.00	$ -	$ -
6	ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	1104011109	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 922,000.00	$ 922,000.00	$ 64,200.00	$ 36,900.00	$ 147,600.00	$ 36,900.00	$ -	$ -
7	JORGE MARIO MENDOZA DE VARGAS	1063177819	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2,360,000.00	$ 2,360,000	$ 164,300	$ 94,400	$ 377,600	$ 94,400	$ -	$ -
8	FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	6816630	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3,450,000.00	$ 3,450,000	$ 240,200	$ 138,000	$ 552,000	$ 138,000	$ -	$ -
9	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 2,970,000.00	$ 2,970,000	$ 206,800.00	$ 118,800.00	$ 475,200.00	$ 118,800.00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$							22,062,000.00

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 17

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **732-2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 01/09/2019

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIMEBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 685,270,884.00

VALOR ACUMULADO: $ 685,270,884.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68,527,088.40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137,054,176.80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205,581,265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68,527,088.40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137,054,176.80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205,581,265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

FECHA DE INICIO: 01/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2020 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 4 de enero de 2021 OFICIO N° 094 2020 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD PRESENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA**

Cordial saludo,

Esta interventoría, en múltiples ocasiones, les ha solicitado entregar reprogramación de los trabajos con su plan de contingencia a aplicar, -debido al atraso que a la fecha está detectado en el cumplimiento de su obligación contractual-, diligencia que no han atendido, motivándonos a aplicar la última programación de los trabajos entregada por ustedes en noviembre de 2020.

Revisada la programación, es deducible que, a la fecha, los trabajos deben estar en un avance del 45,25%, sin embargo, ustedes han podido avanzar aproximadamente en un 3%. Razones por las cuales, se les solicita con carácter urgente, presentar un plan de contingencia, donde se detalle día a día, el orden de ejecución de las actividades, -que en estos momentos son críticas-, donde se demuestre la recuperación del tiempo perdido, y, sea posible constatar que la totalidad de los trabajos se entregaran el día 8 de abril de 2021, según lo presentado en la última programación de obra.

Por lo anterior, el consorcio constructor, -debe reprogramar los trabajos-, documento que debe acompañarse con el plan de contingencia donde detallen, expliquen y demuestren, el orden de ejecución de las actividades, -que en estos momentos son críticas-, como la colocación de la subbase, inicio de la construcción de la placa huella y construcción del box coulvert. Por ende, esta interventoría, solicita remitir en el término de la instancia, el plan de contingencia con la reprogramación de obra, donde se detallen acuciosamente los recursos humanos,

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

maquinaria, materiales y logísticos, indispensables para el cumplimiento de las metas, para cada una de las semanas remanentes de lo programado.

Lo más probable que en la reprogramación de los trabajos, -que estamos solicitando-, es posible que se presenten la ejecución de muchas actividades simultáneamente, con la ventaja que están dispersas su ejecución en el área de los trabajos, lo que no impide establecer, simultáneamente múltiples frentes de trabajo, por ende, la interventoría recomienda aplicar esta estrategia organizativa operacional, como medida clave para el cumplimiento contractual por parte del consorcio.

A la fecha, el consorcio constructor, tiene una solicitud de aplicación de apremio, -ante el ente contratante-, por el incumplimiento parcial tasado a la fecha, por tal motivo, se requiere que atiendan nuestro requerimiento, para el logro del cumplimiento del contrato en comento, evitando una nueva solicitud de apremio en el evento de continuarse el incremento del atraso.

En últimas, esta interventoría, solicita al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA, presentar en campo a interventoría, los equipos, maquinaria, materiales, listado de personal, -para verificación-, así mismo indicar en el plan de contingencia, el número de frentes de trabajo a establecer, con la finalidad de su revisión y comprobación, para de esta manera poder avalar el plan de contingencia.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

c.c. Señor Isaías Javier Díaz Barrios, Alcalde Municipal Colosó Sucre

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 10 de enero de 2021 OFICIO N° 104 2020 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REITERACION CUMPLIMIENTO ASPECTOS VARIOS**

Cordial saludo,

Se reitera al consorcio constructor, dar cumplimiento mes a mes, -mientras esté vigente el contrato de obra-, entregar oportunamente la siguiente documentación con sus soportes a paz y salvo:

1.- Listado de todo el personal vinculado al desarrollo de los trabajos de pavimentación estipulados en el contrato de obra N° MM-LP-OP-085-2020, con los soportes del pago de la seguridad social y aportes parafiscales; aclarándose que se verificará en el área de ejecución de los trabajos, trabajador que se encuentre sin el respectivo cubrimiento de todos estos aportes exigidos por normas laborales, la interventoría procederá al retiro del mismo.

2.- En el campo deben mantenerse copia de todos los planos y de detalles constructivos de las obras civiles a construir, que sirvan de guía y soporte permanente al proceso constructivo de la placa huella y del box.

3.- Desde el inicio de las obras se la ha solicitado enviar el diseño de las mezclas a utilizar para el desarrollo de las obras, información que a la fecha no han remitido, al igual, tampoco han remitido los ensayos granulométricos del agregado grueso y arena a utilizar en las mezclas de concreto, como tampoco de la subbase a utilizar para las placas huellas.

4.- Esta interventoría solicita, le remitan los certificados de calidad de los materiales a emplear tales como, el del acero, cemento, epoxicos si piensan utilizarlos, y el de la cinta de sello asfaltico.

5.- Se le solicita con carácter urgente, instalar en el área de ejecución de los trabajos, la correspondiente valla informativa con las dimensiones establecidas por el ente contratante, ya ustedes tienen el diseño definitivo aprobado por el INVIAS.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 10 de enero de 2021 OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD DOCUMENTOS PARA AVALAR PLAN DE CONTINGENCIA**

Cordial saludo,

Revisado el plan de contingencia, la interventoría solicita precisa apliquen los siguientes ajustes:

1.- Para el componente de excavaciones sin clasificar, donde ustedes se comprometen a aumentar las horas máquina de trabajo, mediante el nombramiento de un operador adicional, se solicita relacionar en documento el nombre y número de cedula de los dos operadores.
2.-Definir con precisión cual es el número exacto de cuadrillas, pero por el momento debe enviarnos la relación de trabajadores que conformaran estas cuadrillas de trabajo, con sus respectivos nombres y cedulas, así mismo, debe relacionarse el número y tipo de equipos de preparación de los concretos.
3.- Remitir la información correspondiente al proveedor de la nueva cantera, incluye título minero, licencia ambiental.
4.-Relación de todos los trabajadores vinculados al corte y figuración del acero, y, remitir la información del otro proveedor de subbase y acero.
Se aclara que las secciones a aplicar para la construcción del box –coulvert, son los datos que arroje el análisis hidrológico.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

De parte de la interventoría, se le solicita al contratista, -debido que propone trabajar sábados, domingos y feriados-, informar anticipadamente los viernes en la mañana si va a laborar, con la finalidad de programar nuestras jornadas de trabajo para el control técnico de las obras.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 19 de enero de 2021 OFICIO N° 107 2020 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y REQUERIMIENTOS DEL OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ**

Cordial saludo,

En el día de ayer, 18 de enero de 2021, se realizó visita técnica al sitio de ejecución de los trabajos, con la finalidad de evaluar el avance del contrato referenciado; encontrándose que los trabajos prácticamente volvieron al estado de parálisis del mes de diciembre.

De acuerdo a estas circunstancias, la interventoría solicita respetuosamente, dar cumplimiento y aplicación inmediata del plan de contingencia, como medida resarcitoria del incumplimiento parcial, que a la fecha vienen presentando en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para con el municipio de Colosó.

En la eventualidad que ustedes desconozcan aplicar el plan de contingencia, esta interventoría reiterará y dejará en firme ante el ente contratante, procedan a aplicar las multas y sanciones que correspondan, con la finalidad de proteger la inversión oportuna de los dineros públicos.

Se solicita, remitir en el término de la instancia, la veeduría ciudadana de los trabajos, debidamente registrada ante la personería del municipio de Colosó Sucre.
Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 25 de enero de 2021 OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **RATIFICACIÓN APLICACIÓN MULTA**

Cordial saludo,

El 22 de diciembre de 2020, esta interventoría informó al municipio de Colosó del incumplimiento parcial por parte del CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Paola Miranda Vergara, y se expuso toda la información y argumentación demostrativa, del incumplimiento parcial por parte de la firma constructora de las obras del contrato N° MM-LP-OP-085-2020, cuyo objeto social es el MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE, razones por las cuales, esta interventoría solicitó a esta alcaldía aplicar el apremio correspondiente, ante el incumplimiento contractual por parte de la firma constructora.

Previamente al requerimiento del apremio, la interventoría requirió al contratista, mediante los oficios relacionados a continuación, con la finalidad de actualizar, plantear y acordar medidas conjuntas, como medida resarcitoria ante el ente contratante y poder terminar los trabajos dentro del plazo acordado.

La interventoría desde sus inicios, ha estado atenta al proceso constructivo de las obras, tan así, que mediante comunicación NV-732-2020-073, de 24 de septiembre de 2020, solicitó al contratista, le informase del estado de avance de los diseños de las obras del contrato en referencia.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

A continuación, mediante OFICIO N° 004 2020 CIU/COLOSÓ, 19 de octubre de 2020, la interventoría requirió al contratista para que allegase toda la información pertinente al normal desarrollo de las obras, y poder ejercer el control integral al proceso constructivo.

Posteriormente, mediante OFICIO N° 009 2020 CIU/COLOSÓ 21 de octubre de 2020, la interventoría informó a la alcaldía de Colosó, Sucre, sobre la reubicación de ciertos tramos de las obras, demostrando la interventoría estar realizando seguimiento a la ejecución de los trabajos.

Prosigue la interventoría mediante OFICIO N° 010 2020 CIU/COLOSÓ, 21 de octubre de 2020, instando al contratista para que inicie a las obras, petición que acoge el consorcio constructor, e inicia sus trabajos de reconformación en el tramo 4 del sector de la Vereda Calle Larga.

Posteriormente, mediante OFICIO N° 041 2020 CIU/ COLOSÓ, de 30 de noviembre de 2020, se solicitó al contratista reprogramar las actividades del contrato de obra, debido al incumplimiento detectado a esta fecha, petición reiterada mediante OFICIO N° 049 2020 CIU/ COLOSO, de 5 de diciembre de 2020, reprogramación que a la fecha aún no han remitido.

Mediante OFICIO N° 073 2020 CIU/ COLOSÓ, 21 de diciembre de 2020, la interventoría, en vista del abandono en que se encuentran los trabajos de pavimentación, solicitó al contratista, una reunión de carácter urgente con el director de las obras, con la finalidad de organizar conjuntamente, la reprogramación de los trabajos, para subsanar el atraso de las obras.

Posteriormente, y, en vista que la contratista no atendió los requerimientos anteriores, se realizó reunión virtual el día 29 de diciembre de 2020, con la finalidad de establecer nuevo esquema de trabajo e implementarlo en la ejecución de las actividades, garantizando al ente contratante, la construcción y terminación de todos los ítems contractuales dentro de los términos de plazo establecido en el contrato de obra N° MM-LP-OP-085-2020, por lo tanto, la interventoría exigió al contratista, la presentación de un plan de contingencia para revisión, y, posterior aprobación por parte del ente contratante, quedando comprometidos a entregarlo el 4 de enero de 2021.

La interventoría mediante OFICIO N° 094 2020 CIU/ COLOSÓ 4 de enero de 2021, reiteró al contratista presentar el plan de contingencia, documento entregado a interventoría el día 5 de enero de 2021, quien lo

avaló, - bajo las condiciones del OFICIO N° 105 2020 CIU/ COLOSÓ de 10 de enero de 2021-, y se remitió a la alcaldía de Colosó para su aprobación.

A la fecha, y, de acuerdo a la reprogramación de los trabajos, el avance debe ser del 37,6%, sin embargo, las obras ejecutadas a la fecha alcanzan el 3,2%, mostrando un atraso del 34,4 %, equivalentes a 72 días; con base en estos antecedentes, esta interventoría solicita a la alcaldía de Colosó Sucre, aplicar al consorcio constructor, la multa por incumplimiento parcial del contrato.

En síntesis, y, con fundamento que el contratista no ha cumplido la ejecución de los trabajos, -acorde con el plan de contingencia presentado-, la interventoría ratifica y solicita a usted como representante del ente contratante, proceder a aplicar y dejar en firme la multa contra el contratista, por las razones antes expuestas, multa cuyo valor se despieza a continuación:

Valor total de la multa = 10% * $1.055.799.942,5 = $ 105.579.994,2

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 26 de enero de 2021 OFICIO N° 122 2020 CIU/ COLOSO

Doctora
AYDA PAOLA URZOLA MARQUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INVITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA**

Cordial saludo,

La interventoría dentro de sus funciones de control del contrato de la referencia, de manera respetuosa la invita a reunión técnica el próximo jueves 28 de Enero de 11:00 A.M a 12:00 A.M en nuestras oficinas localizada en KR12 25A 79 APTO 201, Calle Principal de Los Tejares, Sincelejo Sucre, (cerca de la Institución Educativa Preuniversidad), con la finalidad de tratar asuntos específicos del contrato en referencia

Agradecemos su puntual asistencia

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 26 de enero de 2021 OFICIO N° 123 2020 CIU/ COLOSO

Doctora
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INVITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA**

Cordial saludo,

La interventoría dentro de sus funciones de control del contrato de la referencia, de manera respetuosa la invita a reunión técnica el próximo jueves 28 de Enero de 11:00 A.M a 12:00 A.M en nuestras oficinas localizada en KR12 25A 79 APTO 201, Calle Principal de Los Tejares, Sincelejo Sucre, (cerca de la Institución Educativa Preuniversidad), con la finalidad de tratar asuntos específicos del contrato en referencia

Agradecemos su puntual asistencia

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C
