CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020





NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 07

PERIODO DEL 01 al 31 DE MARZO DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORME MENSUAL NO. 7 **MES O PERIODO:** MARZO 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**			X	6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**			X	7
2.1	Localización			X	7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	9
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**			X	12
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**			X	18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		52
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		54
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		56
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		58
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		60
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		62
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		64
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		66
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		69
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		72
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra			X	19
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		75
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		80
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				21
5.1	Información general del contrato			X	21
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	22
5.3	Informes especialistas			X	23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	23

5.5	Información otros programas y aplicativos			N/A	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		91
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		93
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		95
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		97
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		99
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		101
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		27
8.2	Registro fotográfico		X		28
8.3	Bitácora de obra		X		34
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

Localización 7

Estado inicial de la Vía 9

Características Técnicas del Proyecto 10

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

3.1 Información general del contrato de obra 12

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 13

3.3 Seguimiento ítems no previstos 15

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 15

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 18

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto 18

4.2 Maquinaria y equipo del contrato 18

4.3 Personal del contrato de obra 18

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra 18

4.5 Estado general del tiempo 18

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 18

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 18

4.8 Informe avance físico financiero 19

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 19

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 19

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra 19

4.12 Seguimiento a la programación de obra 19

4.13 Seguimiento programa de inversiones 20

4.14 Actas comité de obra..... 20

4.15 Acta reunión..... 20

4.16 Informe semanal 20

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21

5.1 Información general del contrato de interventoría..... 21

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor..... 22

5.3 Informes especialistas..... 23

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC..... 23

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24

6.1 Equipo contrato de interventoría..... 24

6.2 Personal contrato de interventoría..... 24

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 24

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 24

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría 24

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 25

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo..... 25

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 26

8. ANEXOS..... 27

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. 27

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras. 28

8.3 Bitácora de obra. 34

8.4 Video del avance de las obras. 50

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de $685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de $1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE",** con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra, está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°7 correspondiente al periodo del mes de MARZO del 2021, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la

interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.

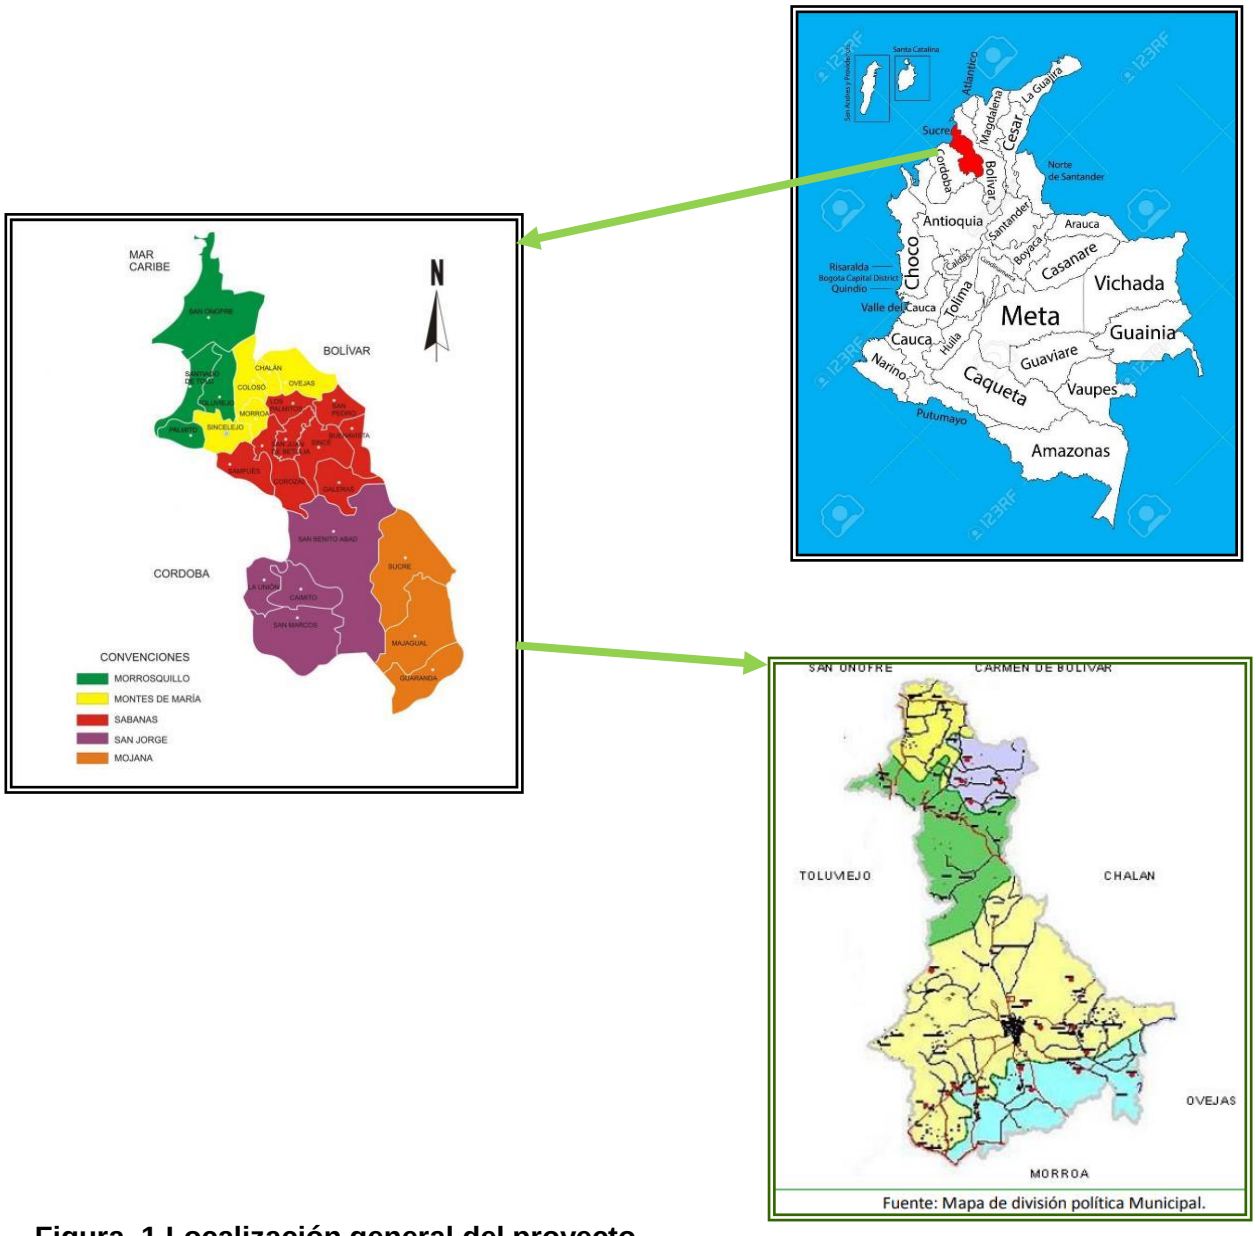


Figura. 1 Localización general del proyecto
Fuente: (INFOGRAFÍA DE INTERNET)

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9º 35' de latitud Norte, 9º 26' de latitud sur; 75º 22' longitud este y 75º 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km2, -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

.

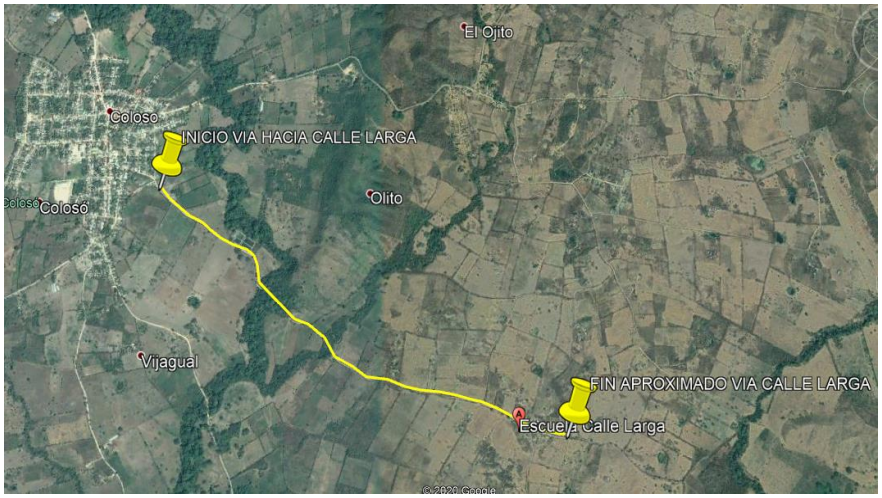


Figura. 2 Localización Vía Vereda Calle Larga
Fuente: Google Earth

Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598
		TOTAL	1280

TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar, se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.

- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.

- El manejo de drenaje para este este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.

- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

La vía a pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- Socialización de los trabajos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento reprogramada	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de terminación actualizada	24 de mayo de 2021
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	$ 1.055.799.942,50
Residente de Obra	JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Director de Obra	MAGGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

OBRA

En el mes de marzo, el contratista realizó las siguientes actividades en obra:

- Excavaciones varias sin clasificar, en el tramo N°4.
- Figuración de acero para vigas riostras y placa huellas, dentro del tramo N°4.
- Instalación de acero de refuerzo para vigas riostras y losas.
- Fundición de concreto Clase D, con resistencia de 21 MPa para losas, para el tramo N°4.
- Fundición de concreto clase D, con resistencia de 21 MPa para vigas riostras.
- Fundición de concreto ciclópeo clase G, con resistencia de 14MPa, en el tramo N°4.
- Figuración e instalación de acero de refuerzo, para cunetas y bordillas.
- Fundición de concreto clase D, para cunetas y bordillos.

Hasta el mes de marzo, el avance de obra acumulado es del 34.18%, lo que representa un retraso en las obras del 58% de acuerdo a lo programado.

Hasta el mes de marzo, el contratista ha ejecutado a través de las diferentes actividades todo el tramo 5; de estos 500 metros, 200 ml están construidos con bordillos y cunetas, por lo que faltarían 300 metros lineales para bordillos y cunetas.

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	0,0
TRAMO N°2	72 ml	0,0
TRAMO N°3	340 ml	0,0
TRAMO N°3”	70 ml	0,0
TRAMO N°4	500 ml	91%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	0,0

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de marzo.

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS HASTA MARZO		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT								
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25.60	$ 26,127.00	$ 668,851.20	0.00	$ -	0.00	0%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8.40	$ 46,897.00	$ 393,934.80	0.00	$ -	0.00	0%
1.3	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	m3	17.50	$ 491,409.00	$ 8,599,657.50	0.00	$ -	0.00	0%
1.4	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	m3	1.40	$ 402,347.00	$ 563,285.80	0.00	$ -	0.00	0%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1,565.00	$ 4,879.00	$ 7,635,635.00	0.00	$ -	0.00	0%
				SUBTOTAL	$ 17,861,364.30	SUBTOTAL	$ -		
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.40	$ 26,127.00	$ 6,019,660.80	110.70	$ 2,892,258.90	110.70	48%
2.2	Subbase Granular Clase C	m3	960.00	$ 114,944.00	$ 110,346,240.00	450.00	$ 51,724,800.00	450.00	47%
2.3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21Mpa)	m3	652.80	$ 570,922.00	$ 372,697,881.60	212.10	$ 121,092,556.20	212.10	32%
2.4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320.00	$ 330,557.00	$ 105,778,240.00	151.20	$ 49,980,218.40	151.20	47%
2.5	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281.60	$ 487,978.00	$ 137,414,604.80	133.47	$ 65,130,423.66	133.47	47%
2.6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	51,072.00	$ 4,879.00	$ 249,180,288.00	14,366.54	$ 70,094,348.66	14,366.54	28%
2.7	Sello Asfaltico para Juntas	m	13,658.00	$ 2,301.00	$ 31,427,058.00	0.00	$ -	0.00	0%
				SUBTOTAL	$ 1,012,863,973.20	SUBTOTAL	$ 360,914,605.82		
TOTAL					$ 1,030,725,337.50	$	360,914,605.82		

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

INTERVENTORIA

- Solicitud de ensayos para verificar si la resistencia a compresión del concreto instalado clase D y clase G, cumple con lo establecido en el diseño de mezcla presentado por el contratista y la calidad exigida por INVIAS.
- La interventoría realiza control, seguimiento y acompañamiento a todas las actividades que se ejecutan en obra y de índole administrativa.
- Interventoría solicita información sobre el estado de avance del proceso administrativo, al ente contratante, Alcaldía Municipal de Colosó, debido a que la interventoría solicitó, con base a la cláusula 12 del contrato de referencia, iniciar proceso administrativo de apremio contra el consorcio contratista por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Solicitud de información al contratista acerca de la geometría del sector de curvas en la vía Colosó, vereda Calle Larga, con la corrección de los planos enviados, incluyendo los respectivos radios de las curvas; para la asignación de sobreanchos estandarizadas en la Guia de Diseño de Pavimentos con Placa – huella del INVIAS, en los elementos curvos horizontales del eje vial
- Solicitud de información de pago social y aportes parafiscales del personal vinculado a las obras.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No aplica, ya que aún no se tienen ítems no previstos para tramitar.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el mes de marzo, el avance físico acumulado de las obras del contrato en referencia es de 34.18%. Según la programación, entregada por el contratista y el flujo de caja, para la fecha, el avance programado sería de 92.14%, lo que indica un retraso total en las obras de aproximadamente 58%.

Interventoría fue reiterativa al solicitar al contratista dar cumplimiento a la programación de obra y plan de contingencia presentado por el contratista, así como abrir otros frentes de trabajo para cumplir con lo acordado en el contrato; sin embargo, el contratista no ejecutó lo acordado, lo que conllevó a un incremento de retraso y la no entrega acordada en el

acta de inicio de las obras. Durante todo el tiempo de desarrollo de las obras, en virtud del seguimiento realizado al contrato de obra, interventoría solicitó reiteradas veces, al ente contratante, iniciar procedimiento administrativo de apremio contra el contratista; sin a la fecha, recibir respuesta positiva por parte del municipio. En vista de que el contratista no finalizará las obras para la fecha de vencimiento estipulada; la interventoría ha solicitado nuevamente a la alcaldía de Colosó, información sobre el estado de avance del proceso administrativo de aplicación de multa contra el consorcio placa huella Colosó y la toma de acciones respectivas.

La interventoría solicitó al contratista la toma de cilindros, realización de ensayos de resistencia a compresión y allegar esta información, para verificar la calidad del concreto instalado.

A través de su personal, la interventoría realiza y continuará con el seguimiento de los procesos constructivos, así como la verificación del acero de refuerzo instalado, en los diferentes elementos de la placa huella y el concreto realizado en obra, con el fin, de que cumplan con las especificaciones de los diseños entregados por el contratista y aprobados por interventoría.

El CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO, a través de oficio de fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, se dirigió al señor, al MUNICIPIO DE COLOSO y al INTERVENTOR CONSORCIO CIU TERCIARIA, solicitó suscribir CONTRATO MODIFICATORIO-PRÓRROGA DEL PLAZO DE CONTRATO N° 1 correspondiente al contrato de referencia, aduciendo lo siguiente: Primero: los tiempos para revisión conjunta y aprobación de los estudios y diseños pertinentes al contrato se extendieron más de lo programado, afectando los tiempos de ejecución; Segundo, para la aprobación y certificación de ocupación de cauce y/o autorización de intervención previa en obra por parte de CARSUCRE, se requieren los diseños definitivos aprobados, lo que conlleva retrasos a la hora de radicar; tercero: la implementación de los protocolos de bioseguridad derivados del COVID-19, disminuyen el rendimiento en obra; cuarto: se notificó cierre vial de la calle 9 con la vía de acceso a la vereda calle larga, el 11 de febrero de 2021, durante el periodo necesario para su construcción sumando el tiempo para obtener la resistencia requerida. La Secretaria de Planeación e Infraestructura ha dado aval para la prórroga, expresando con su documento de forma tácita de la existencia de causas ajenas a la voluntad del contratista que han

impedido el cumplimento del objeto del contrato en el plazo establecido le correspondería a esta entidad acceder a lo planteado.

La interventoría dio su concepto previo de la prórroga del contrato en plazo y finalmente que dicha prorroga se ha establecido antes del fenecimiento del plazo contractual.

Finalmente se concedió prorrogar por cuarenta y cinco (45) días calendarios el plazo del contrato de Obra Pública N° LP – 085 – 2020, MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - DEPARTAMENTO DE SUCRE, iniciando desde el diez (10) de abril de 2021.

En reunión virtual realizada, el 19 de marzo de 2021, con la participación del Director de Interventoría Ingeniero Jorge Velásquez, Residente de obra de interventoría Ingeniero Álvaro García y coordinador de INVIAS, Ingeniero Luis Gonzales Ozuna, se le explicó a la Secretaría de Planeación del municipio de Colosó, Ayda Urzola, que el contrato de referencia está por vencerse, y por parte de interventoría se está haciendo todo lo posible para que el municipio no pierda los recursos que ha recibido por regalías, así como en visa de que el municipio de Colosó no ha dado respuesta las comunicaciones respecto a la multas solicitadas por la interventoría, la interventoría procederá a informar a los entes de control.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 2**

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 4**

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 5.**

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021**. Ver anexo 6**

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 9**

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 10**

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

N.A. (El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, pero a la fecha del corte del informe, aún no se había dado el pago de este).

4.12 Seguimiento a la programación de obra

Interventoría realiza constantemente visitas a obra a través de su personal profesional, para constatar que las actividades se encuentren en ejecución de acuerdo a la reprogramación y plan de contingencia aprobado y que la realización de estas tareas cuente con la calidad exigida por INVIAS.

En las visitas realizadas y el seguimiento del contrato, se ha podido constatar que el contratista no ha cumplido con la programación de obras ni plan de contingencia presentado; a la fecha de este informe, resta una semana para el vencimiento del contrato, de acuerdo al acta de inicio y se ha informado al ente contratante de tal situación, así como, de los retrasos presentados durante la ejecución del contrato y la solicitud de apremio contra el consorcio contratista desde hace 3 meses; sin embargo, la Alcaldía de Colosó no ha dado respuesta a las solicitudes respecto a aplicación de multa como a la

solicitud de información del proceso administrativo requerido por parte de interventoría, para dar cumplimiento a la cláusula 12, del contrato de referencia.

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

4.14 Actas comité de obra

Se realizó comité de obra el día 10 de marzo de 2021, con la participación de Auxiliar de Secretaría de planeación de la alcaldía de Colosó, ingeniero residente de interventoría CIU Terciaria y Gestor técnico de INVIAS; con el objetivo de verificar y controlar por pare del gestor INVIAS, William Felipe Gutiérrez e interventoría, el estado actual del trámite de apremio solicitado contra el contratista, por el incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales. Se levantó acta con detalles del comité y observaciones. **Ver anexo 11**

4.15 Acta reunión

Se realizó reunión virtual el día 19 de marzo de 2021, para aclarar dudas, preocupaciones y buscar posibles soluciones en el contrato del Municipio de Colosó, debido al próximo vencimiento del contrato y la no conclusión de las obras. La reunión contó con la participación del Director de Interventoría, Residente de Obras Interventoría CIU Terciaria y Coordinador de INVIAS, ingeniero Luis Gonzáles Ozuna. Se levantó acta con los detalles de la reunión. **Ver anexo 11**

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 12**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Prorroga No. 2	Tres (3) meses
Fecha terminación actualizada	30 de junio de 2021
Valor Total Contrato	$ 685.270.884
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

La interventoría se encuentra haciendo seguimiento permanente a los procesos constructivos ejecutados en la obra, tales como, supervisión del acero de refuerzo instalado, para placas, vigas riostras, cunetas y bordillos; de igual forma se realiza el control correspondiente al concreto hidráulico realizado en obra, el cual debe respetar las dosificaciones presentadas en el diseño de mezcla por parte del contratista, de esta manera la interventoría corrobora que haya un buen proceso constructivo de las obras de pavimentación.

Interventoría solicitó realizar la toma de muestras y ensayos correspondientes, para la verificación del concreto reforzado instalado en cunetas, bordillos, placas, vigas riostras y el concreto ciclópeo de las huellas.

Interventoría solicitó información de asistencia y pago social y aportes parafiscales del personal vinculado a las obras, con el fin de dar cumplimiento a la ley 828 de 2003.

A través de OFICIO N° 177 2021 CIU/COLOSÓ de 12 de marzo de 2021, la interventoría extiende invitación de reunión virtual al Consorcio Placa Huella Colosó, en aras de mantener información al Instituto Nacional de Vías, INVIAS, sobre el estado actual de las obras y los procesos administrativos en proceso del contrato de obra No. MM-LP-OP-085-2020 del municipio de Colosó.

Mediante OFICIO N° 194 2021 CIU/COLOSÓ con fecha 18 de marzo de 2021, la interventoría reitera invitación al Consorcio Placa Huella Colosó a participar de la reunión virtual programada para el día 19 de marzo, con el fin de informar a INVIAS, sobre el estado del contrato de referencia.

Mediante OFICIO N° 204 2021 CIU/COLOSÓ, de 24 de marzo de 2021, la interventoría solicita al Alcalde Municipal de Colosó – Sucre, señor Isaías Javier Díaz Barrios, información acerca del estado de avance de proceso administrativo de aplicación de apremio contra el consorcio contratista, debido al incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, solicitud que interventoría ha realizado de manera reiterada en diferentes oficios, y que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

A través de OFICIO N° 216 2021 CIU/COLOSÓ, de 31 de marzo de 2021, la interventoría solicita al contratista, información geométrica del sector de curvas de la Vía Calle Larga,

con la finalidad de poder definir el tipo de sobreanchos en las curvas de las obras, las cuales están estandarizadas en la Guia de Diseño de Pavimentos con Placa- huella del INVIAS.

Mediante OFICIO N° 217 2021 CIU/ COLOSÓ, con fecha 31 de marzo de 2021, se solicita al contratista, corregir los planos enviados, incluyendo los respectivos radios de curvas, para constatar la geometría constructiva a aplicar en cada uno de los elementos curvos horizontales.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente se requirió el concepto del especialista ambiental; el cual ha realizado actividades de control y seguimiento a la parte ambiental del contrato. La información del profesional se relaciona en los semanales del mes. Ver anexo 12

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021.
Ver anexo 15

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021. **Ver anexo 17**

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2021.

Ver anexo 18

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticip

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo al desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. Tomar los ensayos de calidad correspondientes a las obras que se vienen ejecutando para la corroboración de su calidad y eficiencia de acuerdo a la normas y requerimientos exigidos por INVIAS.

2. Interventoría reitera al ente contratante, la solicitud de entrega de información, del estado actual de proceso administrativo de la solicitud de apremio contra el consorcio constructor, solicitada por interventoría.

3. Interventoría informará a los entes de control, acerca de la no respuesta del ente contratante, Alcaldía de Colosó de la solicitud reiterativa de aplicación de multa contra el consorcio contratista, debido al incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales y solicitud de información acerca del estado de dicho proceso administrativo.

4. Entregar información geométrica de la zona de curvas, vereda Calle Larga, así como la indicación en los planos de los radios de los elementos curvos, para el control de asignación de sobreanchos, de acuerdo a la Guia de Diseño de Pavimentos placa-huella del INVIAS.

5. La interventoría continuará realizando control, seguimiento y acompañamiento a todas las actividades, que contribuyan al cumplimiento del contratista con sus obligaciones contractuales.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. **Ver anexo 19**

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA			
FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
01/03/2021	RESULTADOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCREO 3000 PSI	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ	CONSORCIO CIU TERCIARIA
12/03/2021	INVITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
18/03/2021	INVITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
23/03/2021	SOLICITUD INFORMACION ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE
24/03/2021	SOLICITUD INFORMACION ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE
31/03/2021	SOLICITUD INFORMACION GEOMETRICA SECTOR CURVAS VIA CALLE LARGA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
31/03/2021	COMPLEMENTACIÓN INFORMACION GEOMETRICA SECTOR CURVAS VIA CALLE LARGA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras.



1. Foto: Trabajos ejecutados de placa huella en el tramo 4 de la vía



2. Foto: Suministro de concreto de refuerzo con resistencia de 21 MPA, para cunetas



3. Foto: Instalación de acero de refuerzo y fundición de concreto para bordillos y cunetas en el tramo N° 4.



4. Foto: Ejecución de fundición de concreto de refuerzo 21 MPA, para placa huella.



5. Foto: Suministro de concreto de refuerzo con resistencia de 21 MPA.



6. Foto: Instalación de acero de refuerzo para bordillos y cunetas.



7. Foto: Trabajos de suministro de concreto ciclópeo, Tramo N°4.



8. Foto: suministro de concreto de refuerzo con resistencia de 21 MPa



9. Foto: Instalación de acero de refuerzo para placas, tramo 4.



10. Instalación acero de refuerzo para cunetas y bordillos tramo 4




11. Foto: Suministro de concreto de refuerzo con resistencia de 21 MPa



12. : Suministro de concreto de refuerzo con resistencia de 21 MPa

8.3 Bitácora de obra.

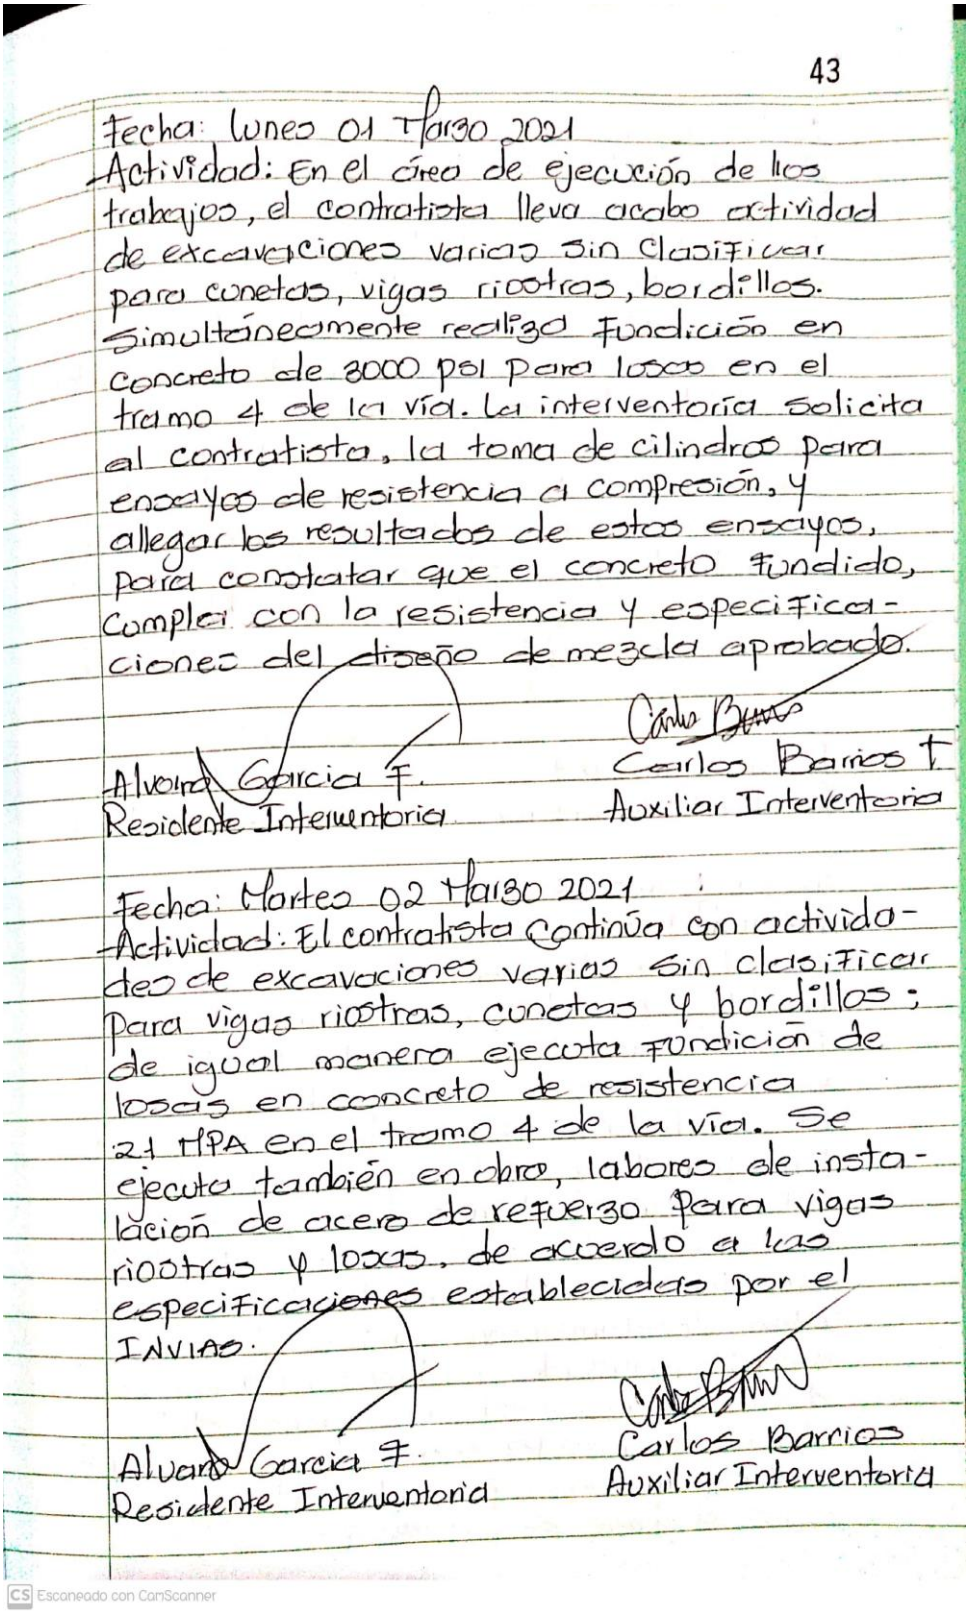

43

Fecha: Lunes 01 Marzo 2021
Actividad: En el área de ejecución de los trabajos, el contratista lleva acabo actividad de excavaciones varias sin clasificar para cunetas, vigas riostras, bordillos. Simultáneamente realizó fundición en concreto de 3000 psi para losas en el tramo 4 de la vía. La interventoría solicita al contratista, la toma de cilindros para ensayos de resistencia a compresión, y allegar los resultados de estos ensayos, para constatar que el concreto fundido, cumplan con la resistencia y especificaciones del diseño de mezcla aprobado.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Martes 02 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con actividades de excavaciones varias sin clasificar para vigas riostras, cunetas y bordillos; de igual manera ejecuta fundición de losas en concreto de resistencia 21 MPA en el tramo 4 de la vía. Se ejecuta también en obra, labores de instalación de acero de refuerzo para vigas riostras y losas, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el INVIAS.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

CS Escaneado con CamScanner

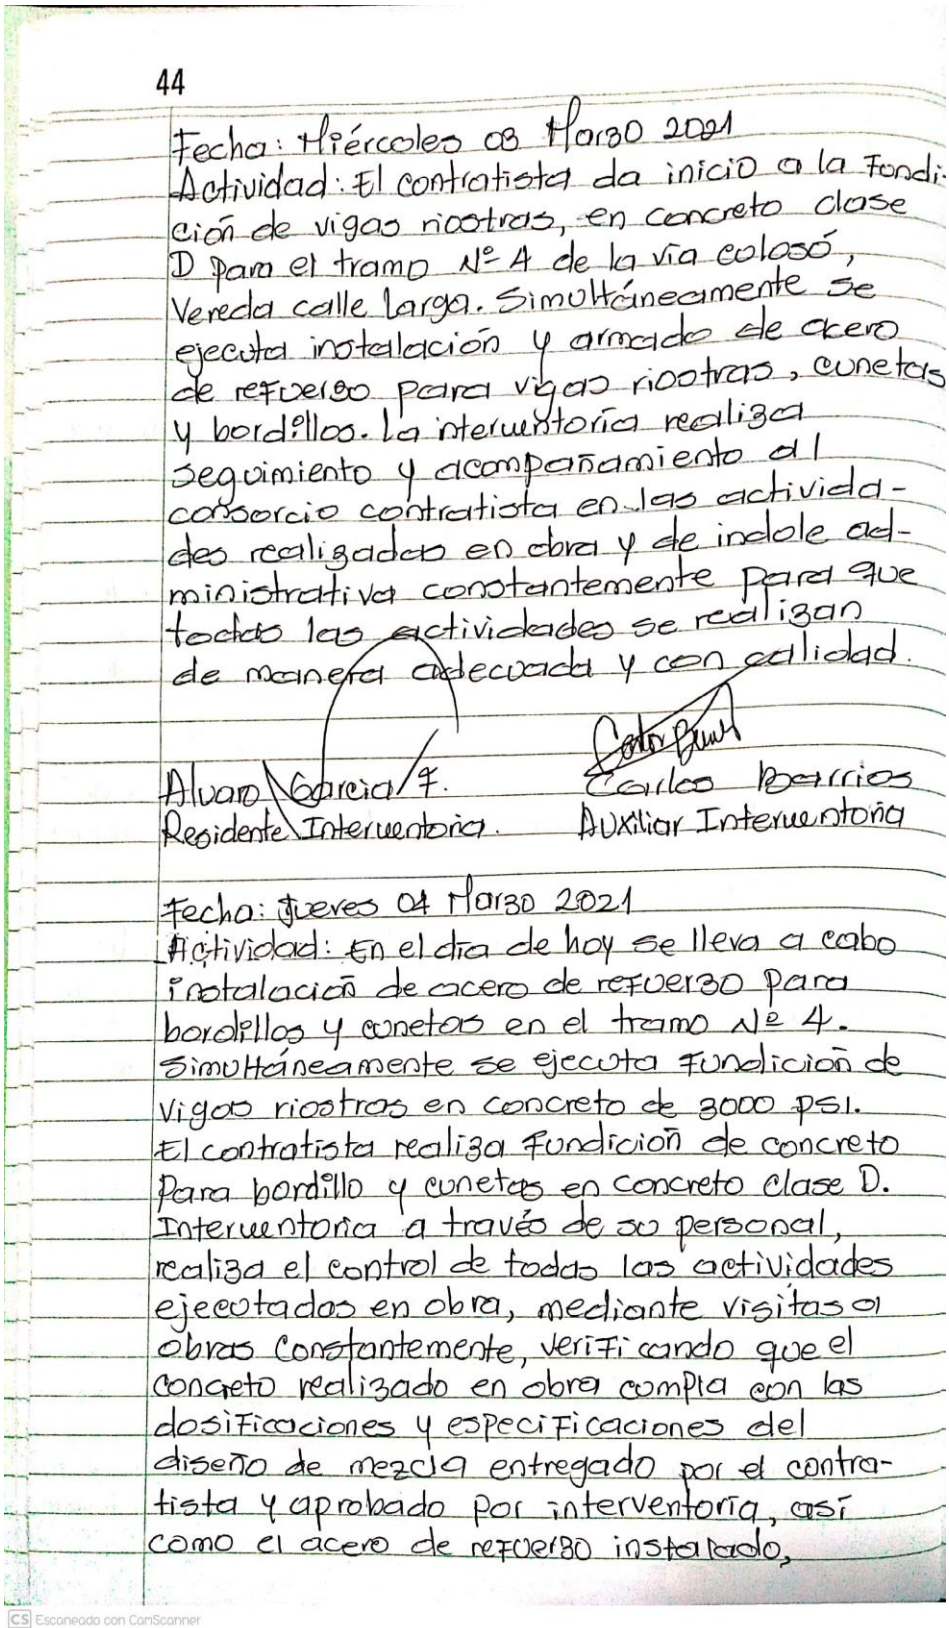

44


Fecha: Miércoles 03 Marzo 2021
Actividad: El contratista da inicio a la fundición de vigas riostras, en concreto clase D para el tramo Nº 4 de la vía colosó, Vereda calle larga. Simultáneamente se ejecuta instalación y armado de acero de refuerzo para vigas riostras, cunetas y bordillos. La interventoría realiza seguimiento y acompañamiento al consorcio contratista en las actividades realizadas en obra y de índole administrativa constantemente para que todas las actividades se realizan de manera adecuada y con calidad.

Alvaro García F.
Residente Interventoría.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Jueves 04 Marzo 2021
Actividad: En el día de hoy se lleva a cabo instalación de acero de refuerzo para bordillos y cunetas en el tramo Nº 4. Simultáneamente se ejecuta fundición de vigas riostras en concreto de 3000 psi. El contratista realiza fundición de concreto para bordillo y cunetas en concreto clase D. Interventoría a través de su personal, realiza el control de todas las actividades ejecutadas en obra, mediante visitas a obras constantemente, verificando que el concreto realizado en obra cumpla con las dosificaciones y especificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista y aprobado por interventoría, así como el acero de refuerzo instalado,

CS Escaneado con CamScanner

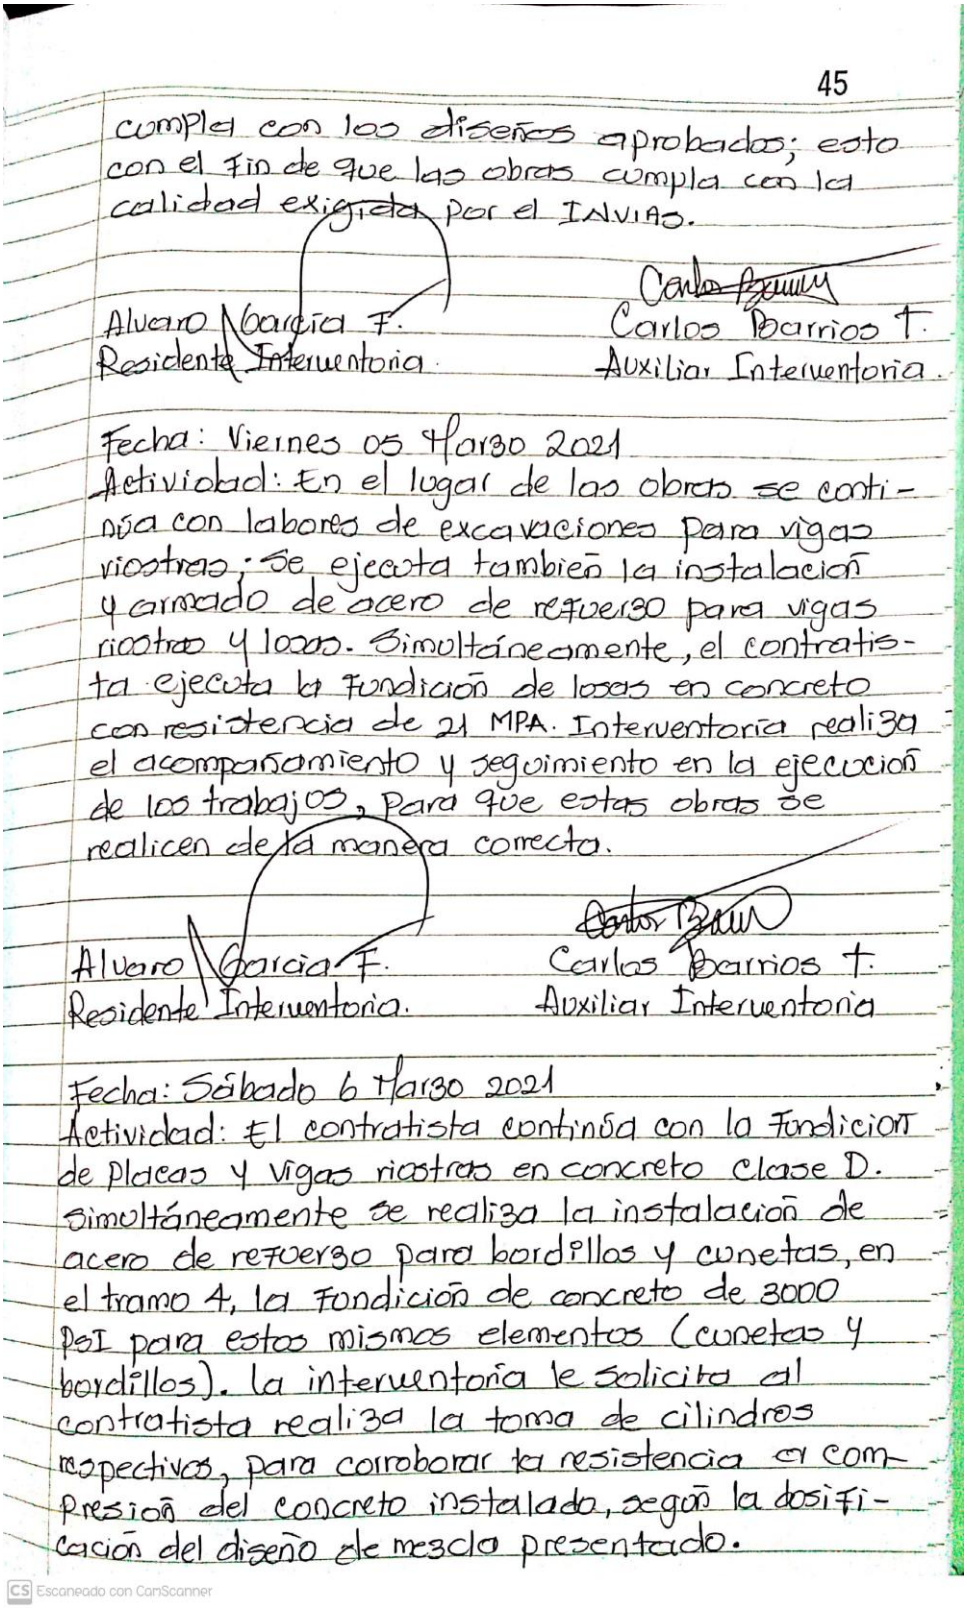

45

cumpla con los diseños aprobados; esto con el fin de que las obras cumpla con la calidad exigida por el IDVIAS.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.


Fecha: Viernes 05 Marzo 2021
Actividad: En el lugar de las obras se continúa con labores de excavaciones para vigas riostras; se ejecuta también la instalación y armado de acero de refuerzo para vigas riostras y losas. Simultáneamente, el contratista ejecuta la fundición de losas en concreto con resistencia de 21 MPA. Interventoria realiza el acompañamiento y seguimiento en la ejecución de los trabajos, para que estas obras se realicen de la manera correcta.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sábado 6 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con la fundicion de Placas y vigas riostras en concreto clase D. Simultáneamente se realiza la instalación de acero de refuerzo para bordillos y cunetas, en el tramo 4, la fundición de concreto de 3000 psi para estos mismos elementos (cunetas y bordillos). la interventoria le solicita al contratista realiza la toma de cilindros respectivos, para corroborar la resistencia a compresión del concreto instalado, según la dosificación del diseño de mezcla presentado.

CS Escaneado con CamScanner

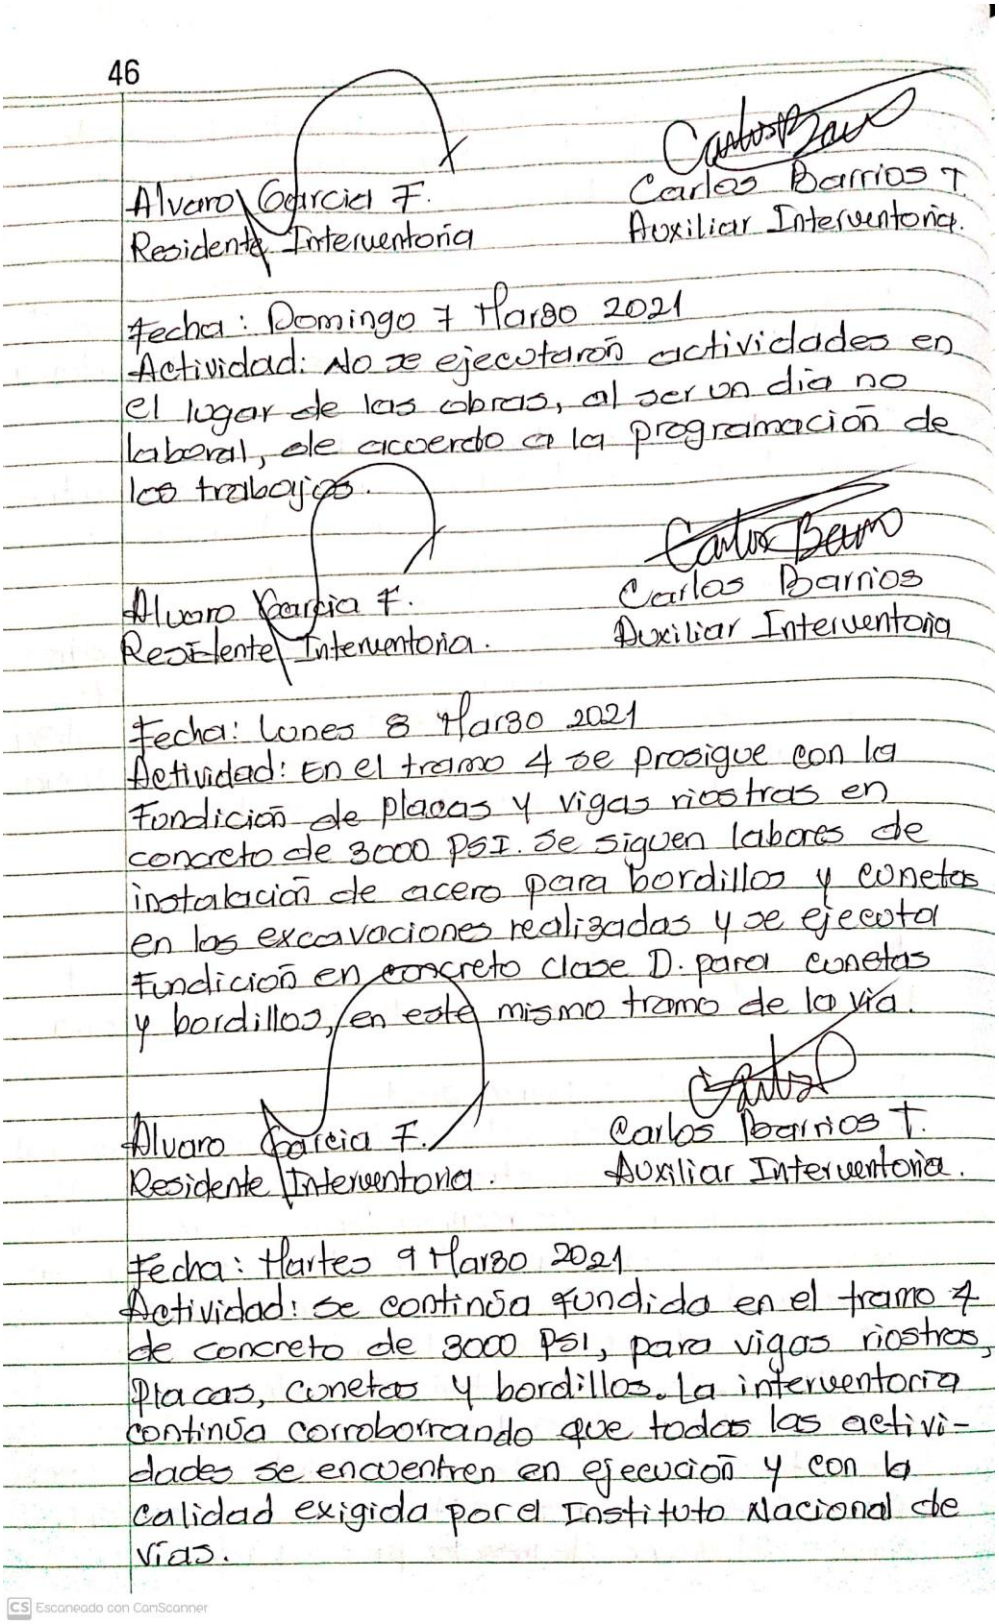

46

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Domingo 7 Marzo 2021
Actividad: No se ejecutaron actividades en el lugar de las obras, al ser un dia no laboral, de acuerdo a la programación de los trabajos.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria


Fecha: Lunes 8 Marzo 2021
Actividad: En el tramo 4 se prosigue con la Fundición de placas y vigas riostras en concreto de 3000 PSI. Se siguen labores de instalación de acero para bordillos y cunetas en las excavaciones realizadas y se ejecuta Fundición en concreto clase D. para cunetas y bordillos, en este mismo tramo de la vía.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Martes 9 Marzo 2021
Actividad: Se continua fundida en el tramo 4 de concreto de 3000 PSI, para vigas riostras, Placas, Cunetas y bordillos. La interventoria continua corroborrando que todas las actividades se encuentren en ejecución y con la calidad exigida por el Instituto Nacional de Vias.

Escaneado con CamScanner

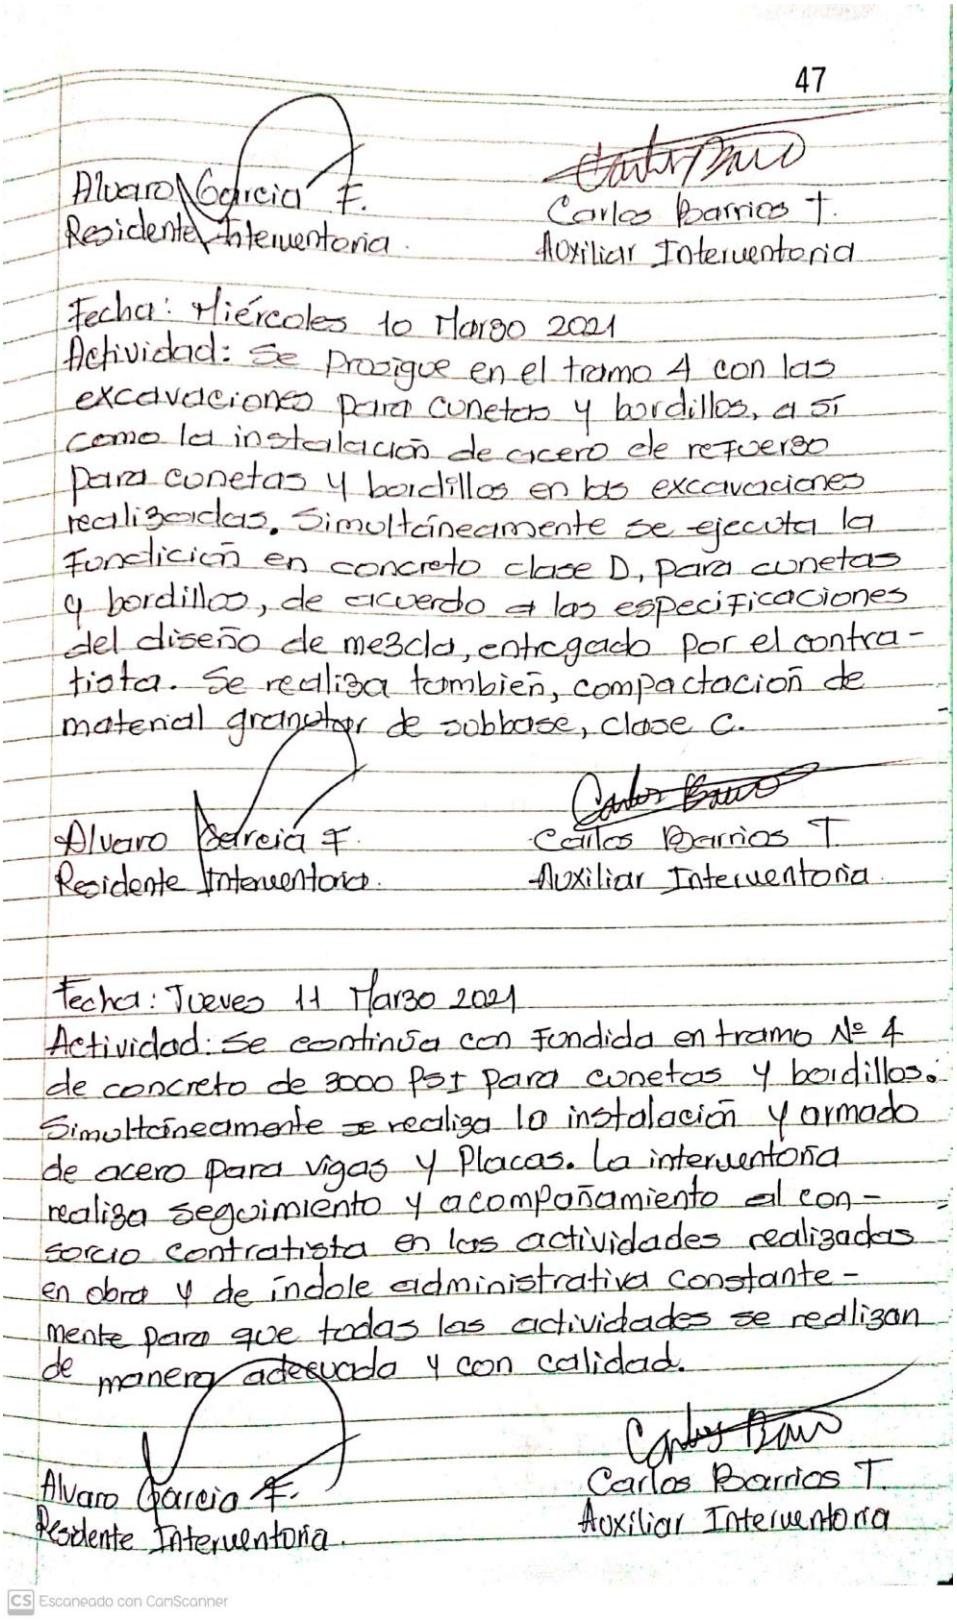

47

Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

Fecha: Miércoles 10 Marzo 2021
Actividad: Se Prosigue en el tramo 4 con las excavaciones para cunetas y bordillos, así como la instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos en las excavaciones realizadas. Simultáneamente se ejecuta la Fundición en concreto clase D, para cunetas y bordillos, de acuerdo a las especificaciones del diseño de mezcla, entregado por el contratista. Se realiza también, compactación de material granular de subbase, clase C.

Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Jueves 11 Marzo 2021
Actividad: Se continúa con fundida en tramo Nº 4 de concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos. Simultáneamente se realiza la instalación y armado de acero para vigas y Placas. La interventoría realiza seguimiento y acompañamiento al consorcio contratista en las actividades realizadas en obra y de índole administrativa constantemente para que todas las actividades se realizan de manera adecuada y con calidad.

Alvaro García F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

CS Escaneado con CamScanner

48

Fecha: Viernes 12 Marzo 2021
Actividad: En el dia de hoy se llevan a cabo actividades de excavaciones para vigas riostras, cunetas y bordillos; asi como la instalación de acero de refuerzo para riostras, placas, cunetas y bordillos. Simultáneamente se ejecutan la Fundición de concreto clase D para placas y vigas riostras de acuerdo al diseño de mezcla presentado por el contratista. La interventoria mediante oficio, realiza invitación al consorcio placa huella Colosó con el Fin de informar al INVIAS, el estado de avance de las obras, y estado actual de cumplimiento del concreto.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.


Carlos Barrios T.
Axiliar Interventoria

Fecha: Sábado 13 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con la Fundición de placas y vigas riostras en concreto de 3000 PSI, de acuerdo al diseño de mezcla entregado por el contratista. Simultáneamente se ejecuta Fundición en concreto clase D para cunetas y bordillos en el tramo Nº 4. La interventoria le solicita al contratista la toma de cilindros, así como la realización de ensayo de resistencia a compresión; con el Fin de realizar el control de concreto instalado.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios F
Auxiliar Interventoria

CS Escaneado con CamScanner

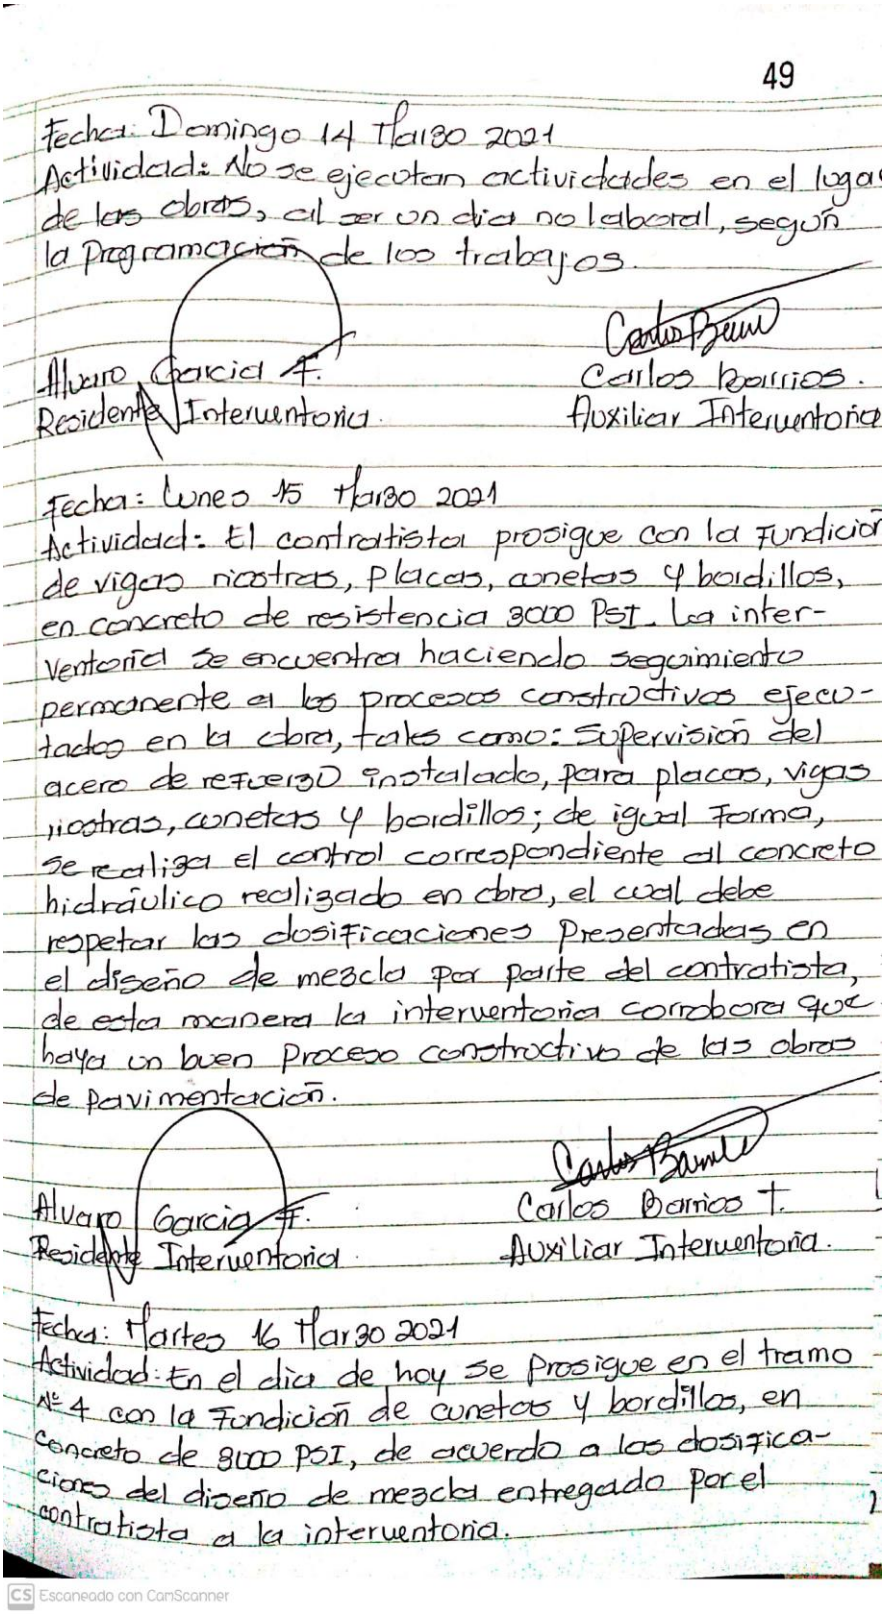

49

Fecha: Domingo 14 Marzo 2021
Actividad: No se ejecutan actividades en el lugar de las obras, al ser un día no laboral, según la Programación de los trabajos.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios.
Auxiliar Interventoria


Fecha: Lunes 15 Marzo 2021
Actividad: El contratista prosigue con la Fundición de vigas riostras, Placas, cunetas y bordillos, en concreto de resistencia 3000 PSI. La interventoría se encuentra haciendo seguimiento permanente a los procesos constructivos ejecutados en la obra, tales como: Supervisión del acero de refuerzo instalado, para placas, vigas riostras, cunetas y bordillos; de igual forma, se realiza el control correspondiente al concreto hidráulico realizado en obra, el cual debe respetar las dosificaciones Presentadas en el diseño de mezcla por parte del contratista, de esta manera la interventoria corrobora que haya un buen Proceso constructivo de las obras de pavimentación.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Martes 16 Marzo 2021
Actividad: En el dia de hoy se prosigue en el tramo N° 4 con la Fundición de cunetas y bordillos, en concreto de 3000 PSI, de acuerdo a las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista a la interventoria.

Escaneado con CamScanner

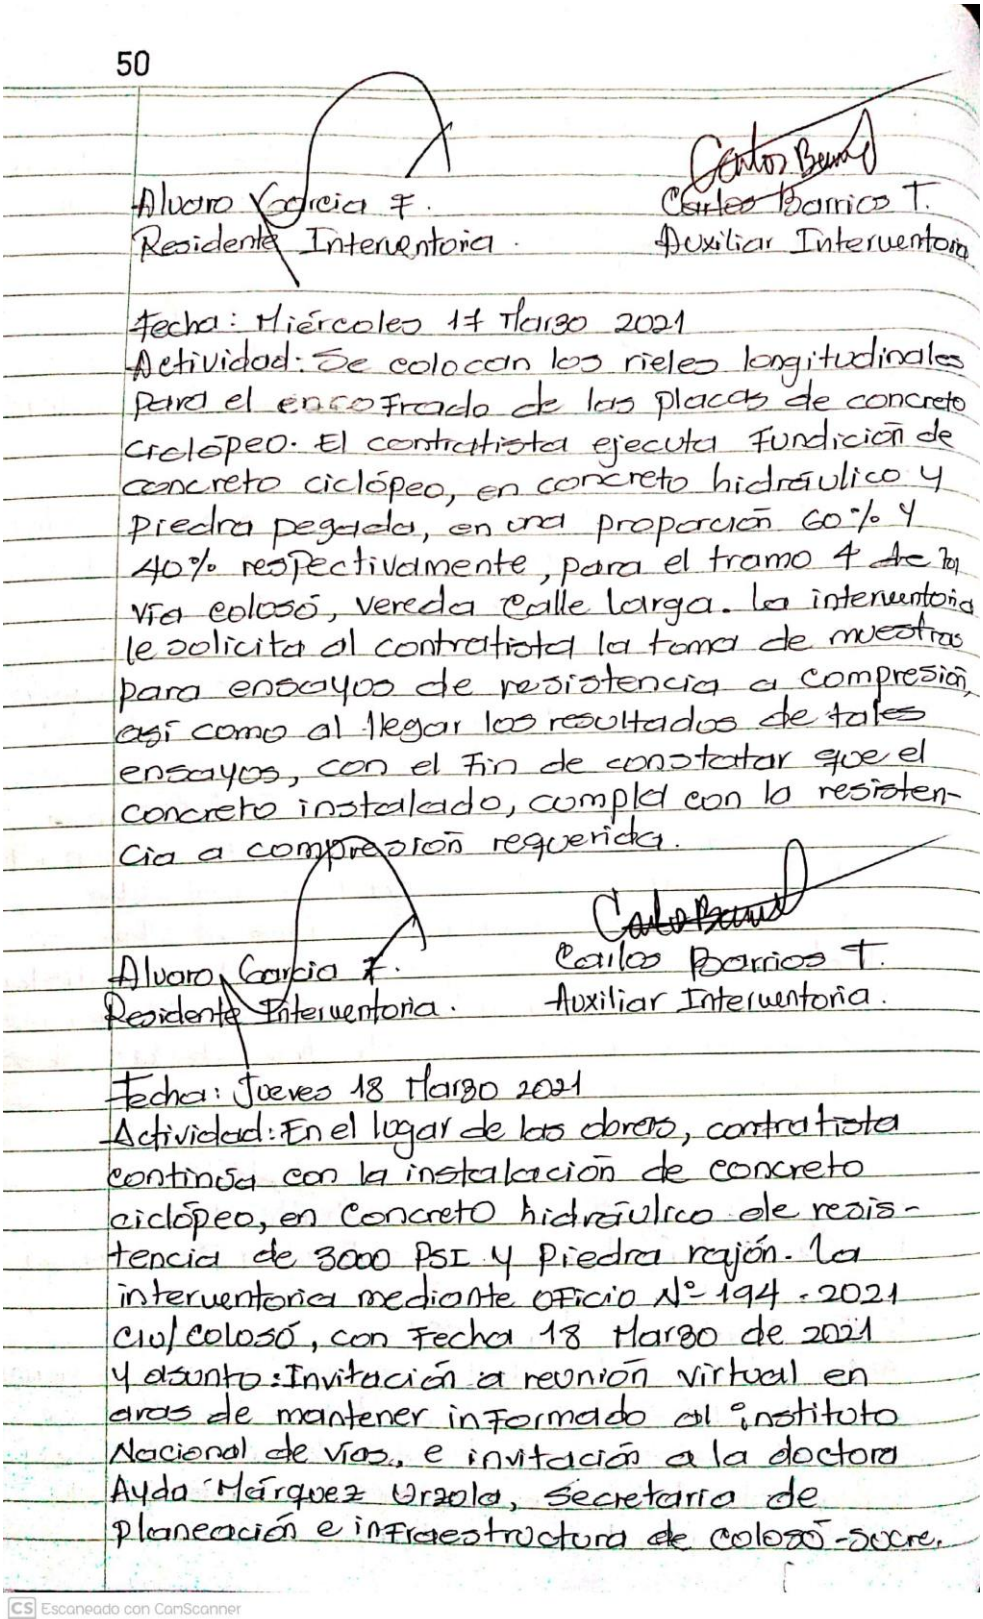

50

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria


Fecha: Miércoles 17 Marzo 2021
Actividad: Se colocan los rieles longitudinales para el encofrado de las placas de concreto ciclópeo. El contratista ejecuta Fundición de concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra pegada, en una proporción 60% y 40% respectivamente, para el tramo 4 de la vía colosó, vereda Calle larga. la interventoria le solicita al contratista la toma de muestras para ensayos de resistencia a compresión, así como al llegar los resultados de tales ensayos, con el fin de constatar que el concreto instalado, cumpla con la resistencia a compresión requerida.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Jueves 18 Marzo 2021
Actividad: En el lugar de las obras, contratista continúa con la instalación de concreto ciclópeo, en Concreto hidráulico de resistencia de 3000 PSI y Piedra rajón. la interventoria mediante OFICIO N° 194 - 2021 CIU/Colosó, con Fecha 18 Marzo de 2021 y asunto: Invitación a reunión virtual en aras de mantener informado al instituto Nacional de vías, e invitación a la doctora Ayda Márquez Urzola, Secretaria de planeación e infraestructura de Colosó-Sucre.

CS Escaneado con CamScanner

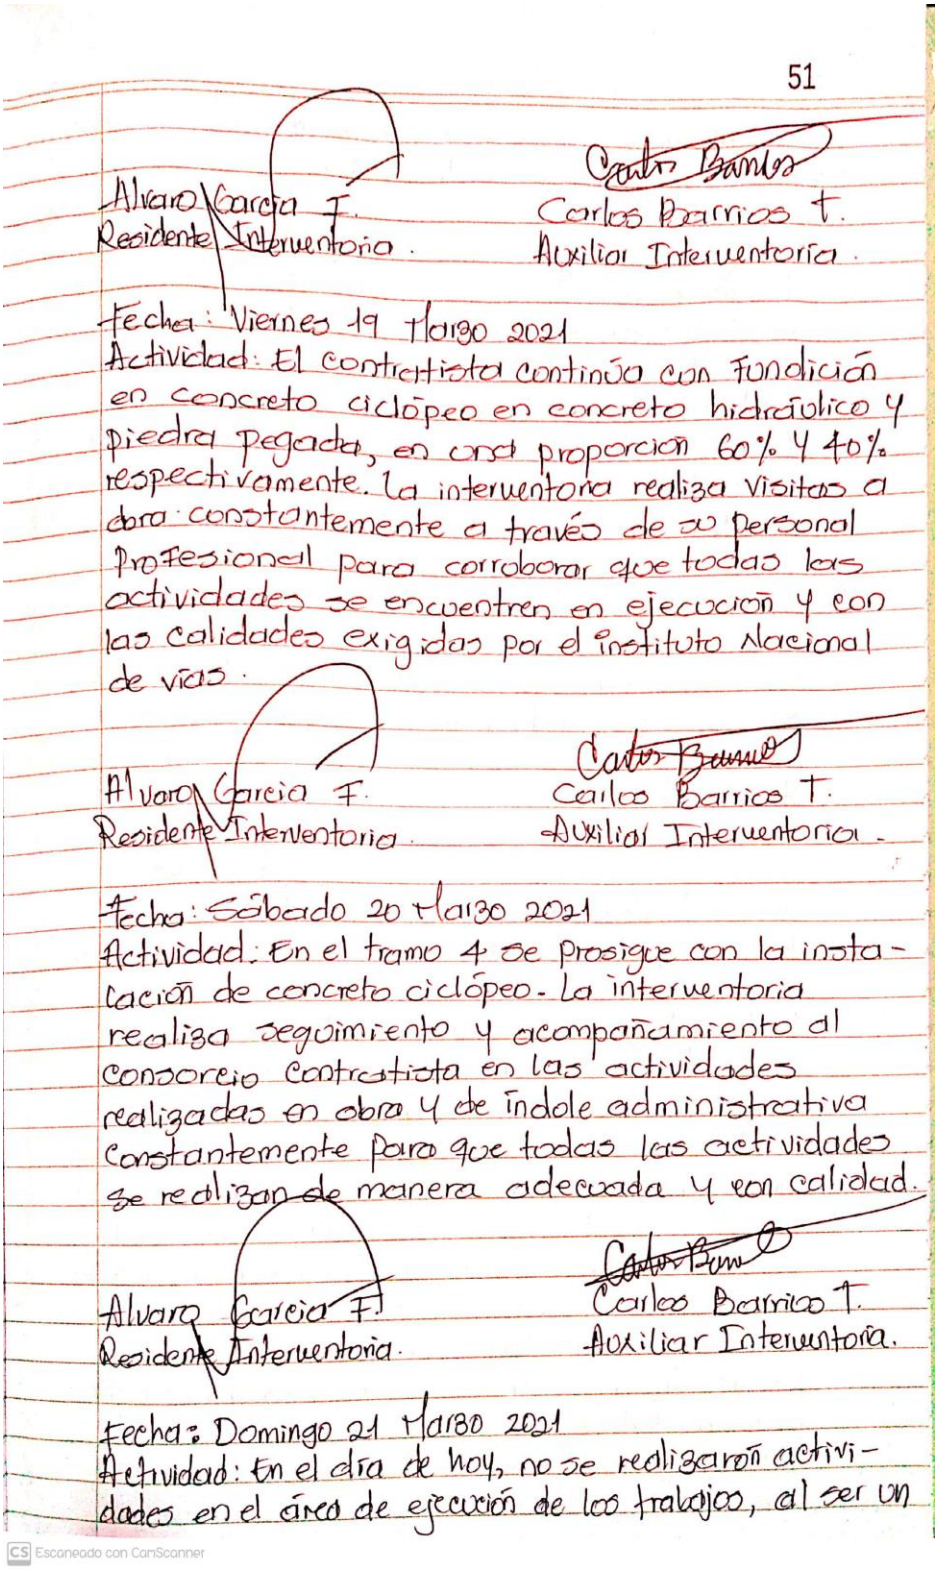

51

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Viernes 19 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con fundición en concreto ciclopeo en concreto hidráulico y piedra pegada, en una proporción 60% y 40% respectivamente. La interventoria realiza visitas a obra constantemente a través de su personal profesional para corroborar que todas las actividades se encuentren en ejecución y con las calidades exigidas por el instituto Nacional de vías.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.


Fecha: Sábado 20 Marzo 2021
Actividad: En el tramo 4 se prosigue con la instalación de concreto ciclópeo. La interventoria realiza seguimiento y acompañamiento al consorcio contratista en las actividades realizadas en obra y de índole administrativa constantemente para que todas las actividades se realizan de manera adecuada y con calidad.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Domingo 21 Marzo 2021
Actividad: En el dia de hoy, no se realizaron activi-
dades en el área de ejecución de los trabajos, al ser un

CS Escaneado con CamScanner

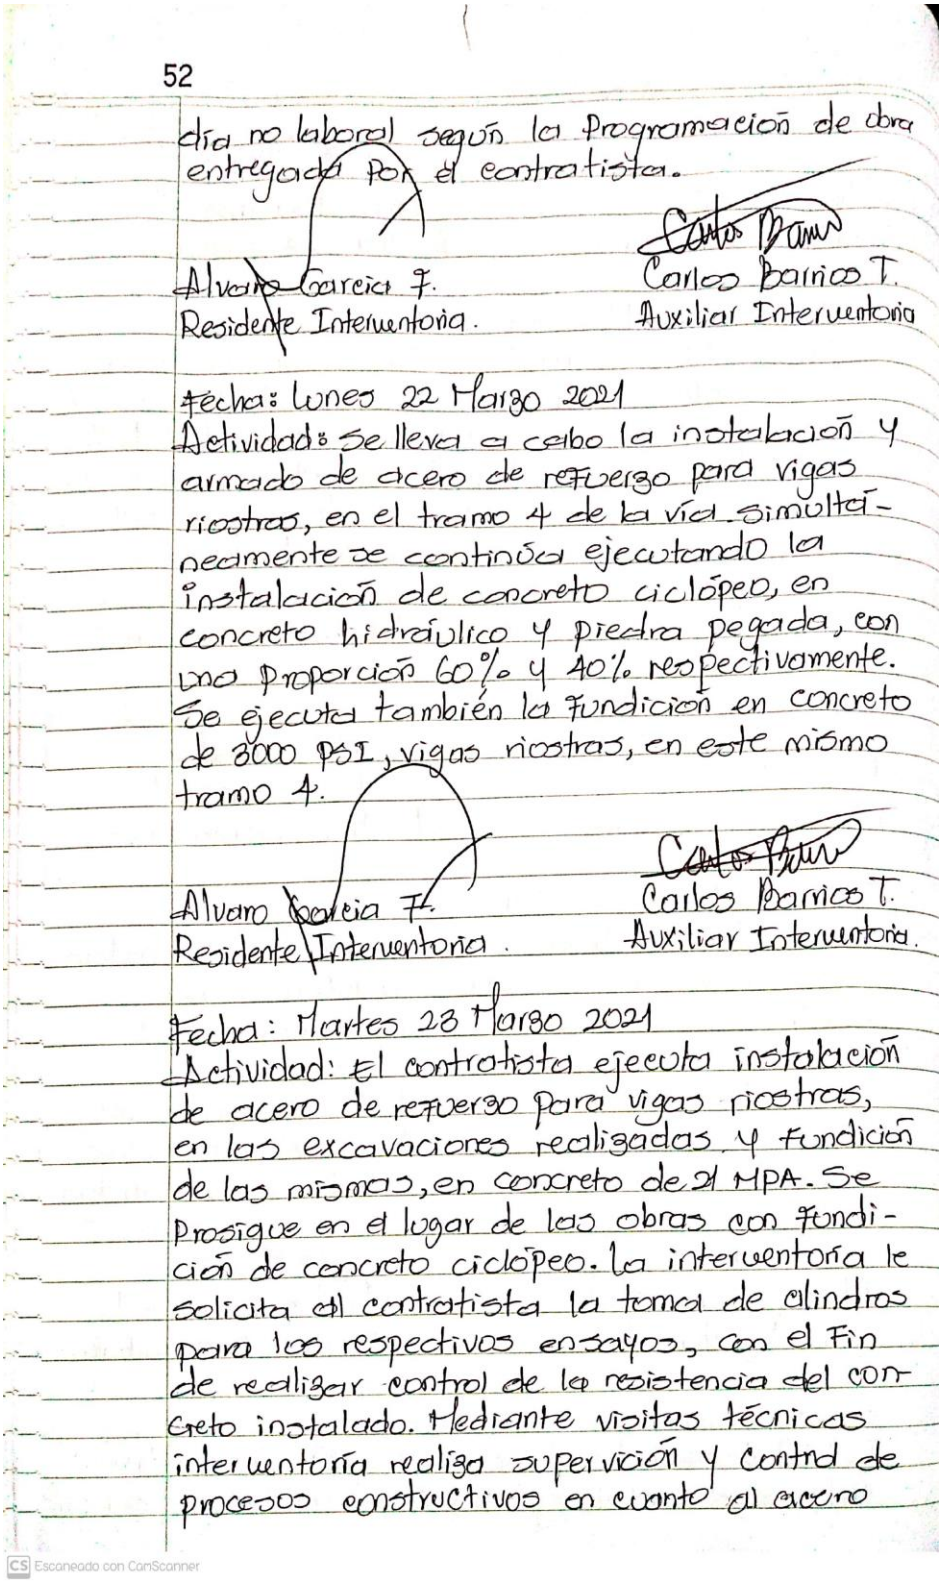

52

día no laboral según la Programación de obra entregada por el contratista.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria


Fecha: Lunes 22 Marzo 2021
Actividad: Se lleva a cabo la instalación y armado de acero de refuerzo para vigas riostras, en el tramo 4 de la vía. Simultáneamente se continúa ejecutando la instalación de concreto ciclópeo, en concreto hidráulico y piedra pegada, con una proporción 60% y 40% respectivamente. Se ejecuta también la fundición en concreto de 3000 PSI, vigas riostras, en este mismo tramo 4.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Martes 23 Marzo 2021
Actividad: El contratista ejecuta instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, en las excavaciones realizadas y fundición de las mismas, en concreto de 21 MPA. Se prosigue en el lugar de las obras con fundición de concreto ciclópeo. La interventoría le solicita al contratista la toma de cilindros para los respectivos ensayos, con el Fin de realizar control de la resistencia del concreto instalado. Mediante visitas técnicas interventoría realiza supervición y contrl de procesos constructivos en cuanto al acero

CS Escaneado con CamScanner

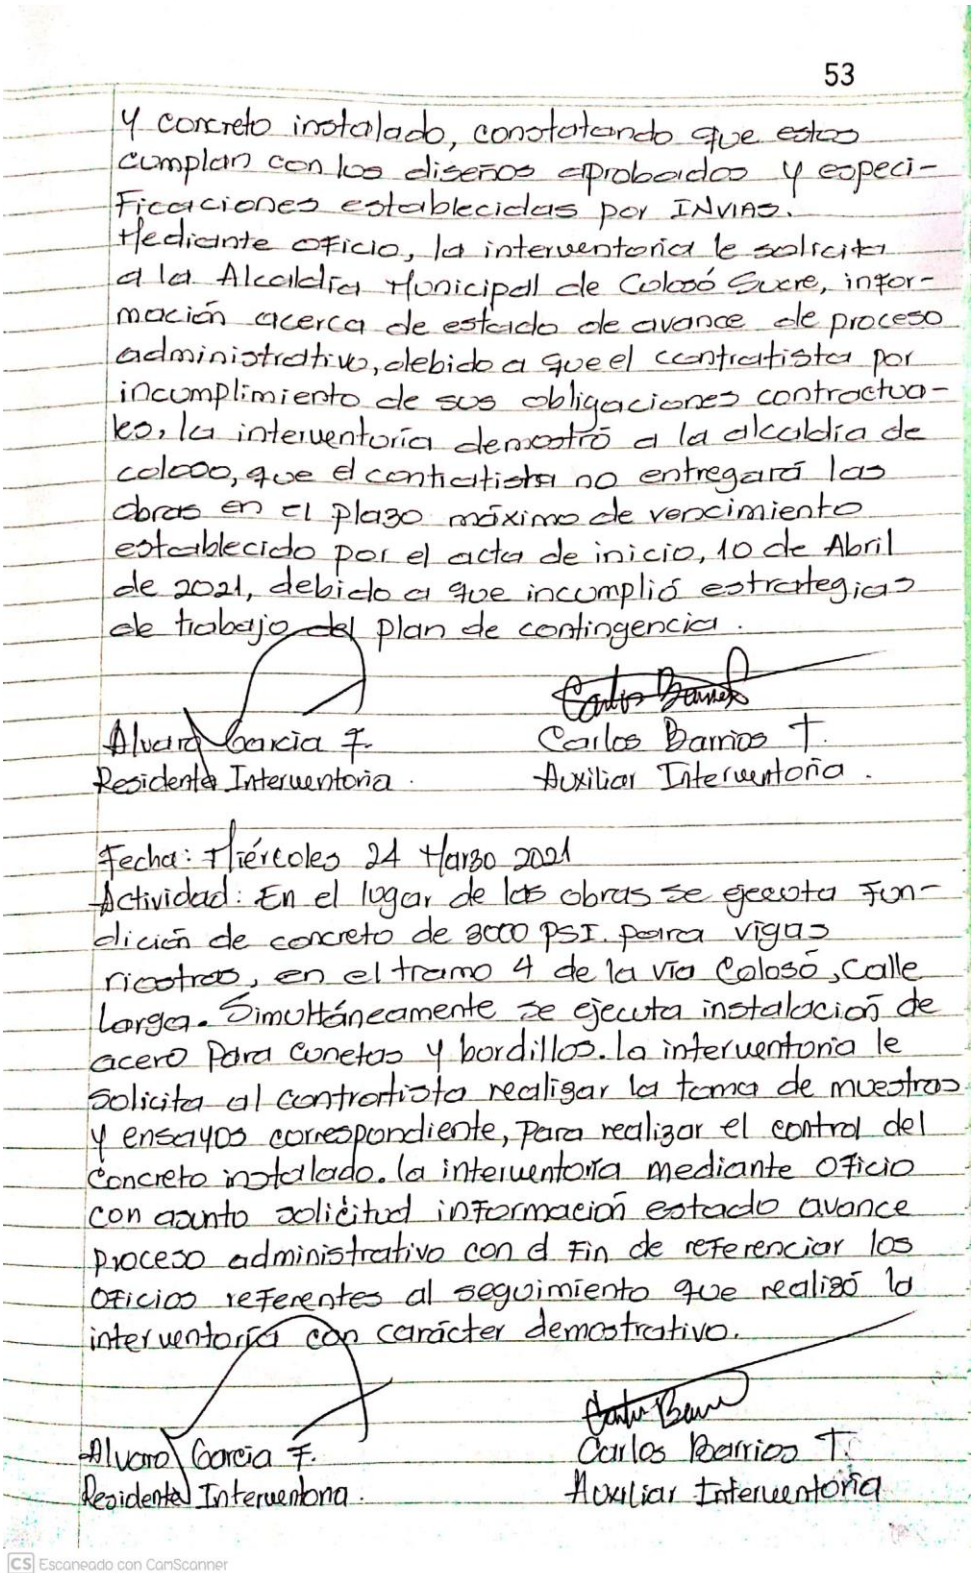

53

y concreto instalado, constatando que estos cumplan con los diseños aprobados y especificaciones establecidas por INVIAS.
Mediante oficio, la interventoría le solicita a la Alcaldía Municipal de Colosó Sucre, información acerca de estado de avance de proceso administrativo, debido a que el contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la interventoría demostró a la alcaldía de colosó, que el contratista no entregará las obras en el plazo máximo de vencimiento establecido por el acta de inicio, 10 de Abril de 2021, debido a que incumplió estrategias de trabajo del plan de contingencia.

Alvaro García F.
Residente Interventoría.


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoría.

Fecha: Miércoles 24 Marzo 2021
Actividad: En el lugar de las obras se ejecuta Fundición de concreto de 3000 PSI. para vigas riostras, en el tramo 4 de la vía Colosó, Calle Larga. Simultáneamente se ejecuta instalación de acero para cunetas y bordillos. la interventoría le solicita al contratista realizar la toma de muestras y ensayos correspondiente, para realizar el control del concreto instalado. la interventoría mediante oficio con asunto solicitud información estado avance proceso administrativo con el Fin de referenciar los oficios referentes al seguimiento que realizó la interventoría con carácter demostrativo.

Alvaro García F.
Residente Interventoría.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoría

CS Escaneado con CamScanner

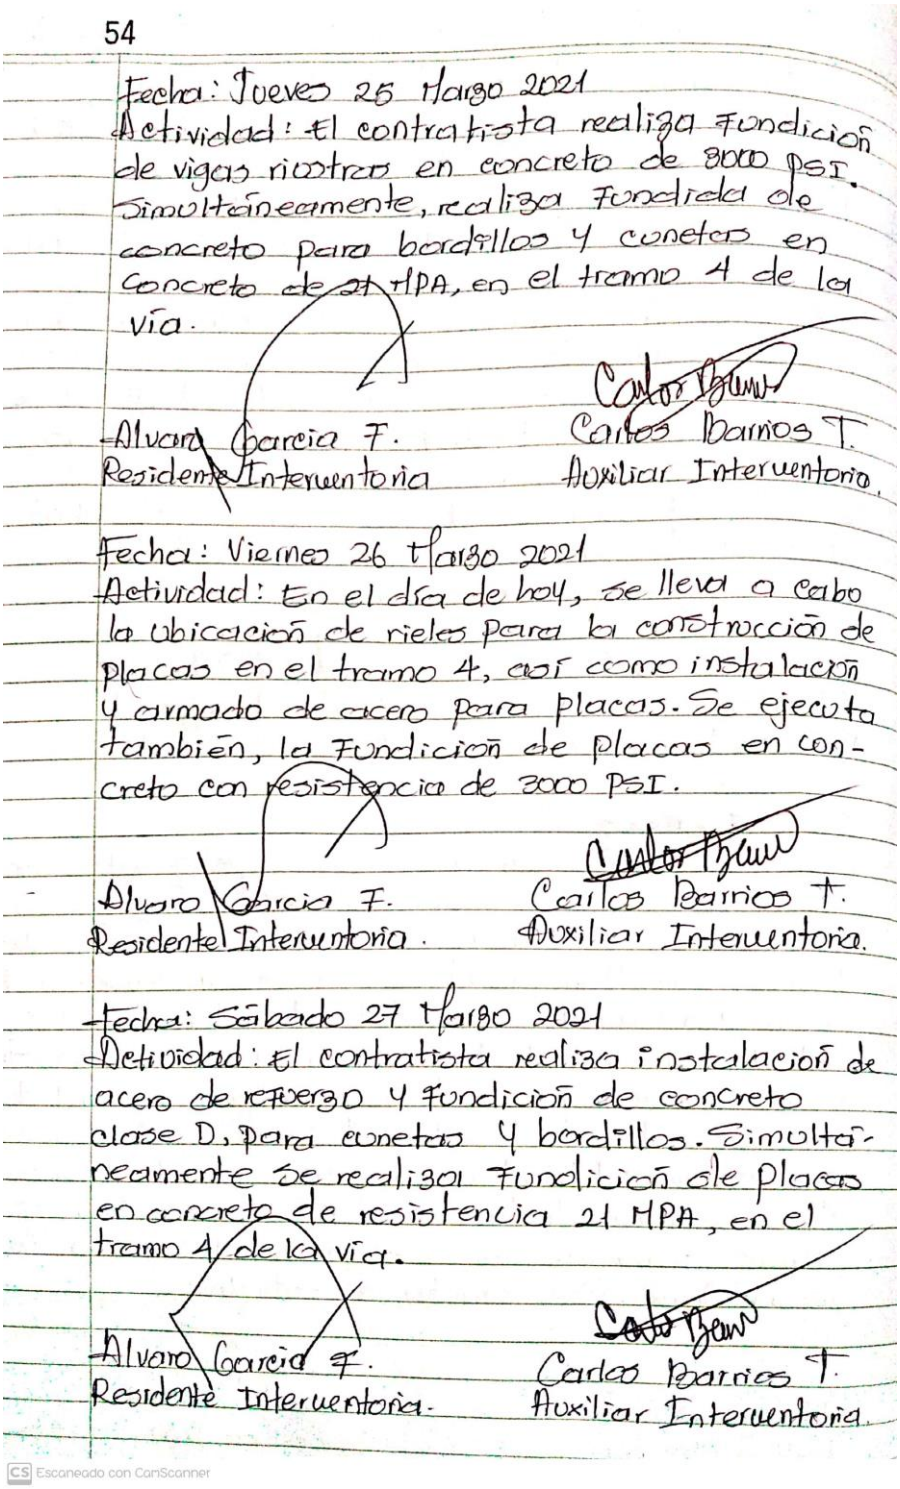

54

Fecha: Jueves 25 Marzo 2021
Actividad: El contratista realiza Fundición de vigas riostras en concreto de 3000 PSI. Simultáneamente, realiza Fundida de concreto para bordillos y cunetas en concreto de 21 MPA, en el tramo 4 de la vía.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoria.


Fecha: Viernes 26 Marzo 2021
Actividad: En el día de hoy, se lleva a cabo la ubicación de rieles para la construcción de placas en el tramo 4, así como instalación y armado de acero para placas. Se ejecuta también, la Fundición de placas en concreto con resistencia de 3000 PSI.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoria.

Fecha: Sábado 27 Marzo 2021
Actividad: El contratista realiza instalación de acero de refuerzo y Fundición de concreto clase D, para cunetas y bordillos. Simultáneamente se realizo Fundición de placas en concreto de resistencia 21 MPA, en el tramo 4 de la vía.

Alvaro Garcia F. — Residente Interventoria.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoria.

CS Escaneado con CamScanner

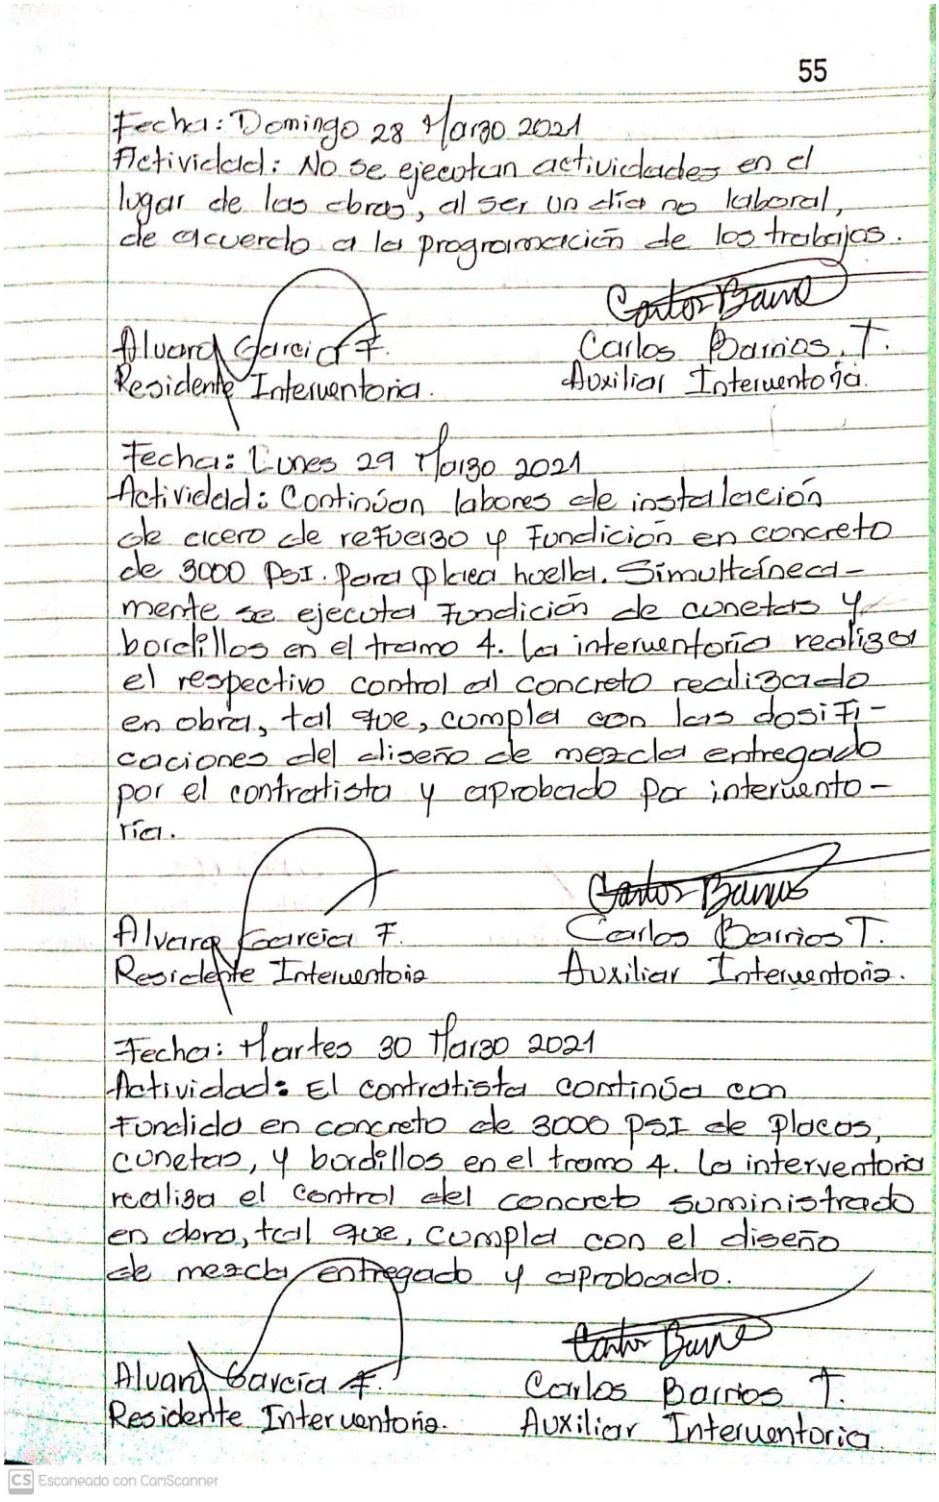

55

Fecha: Domingo 28 Marzo 2021
Actividad: No se ejecutan actividades en el lugar de las obras, al ser un día no laboral, de acuerdo a la programación de los trabajos.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoría.

Fecha: Lunes 29 Marzo 2021
Actividad: Continúan labores de instalación de acero de refuerzo y Fundición en concreto de 3000 PSI. para placa huella. Simultáneamente se ejecuta Fundición de cunetas y bordillos en el tramo 4. La interventoría realiza el respectivo control al concreto realizado en obra, tal que, cumpla con las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista y aprobado por interventoría.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Martes 30 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con Fundido en concreto de 3000 PSI de placas, cunetas, y bordillos en el tramo 4. La interventoría realiza el control del concreto suministrado en obra, tal que, cumpla con el diseño de mezcla entregado y aprobado.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoría.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

CS Escaneado con CamScanner

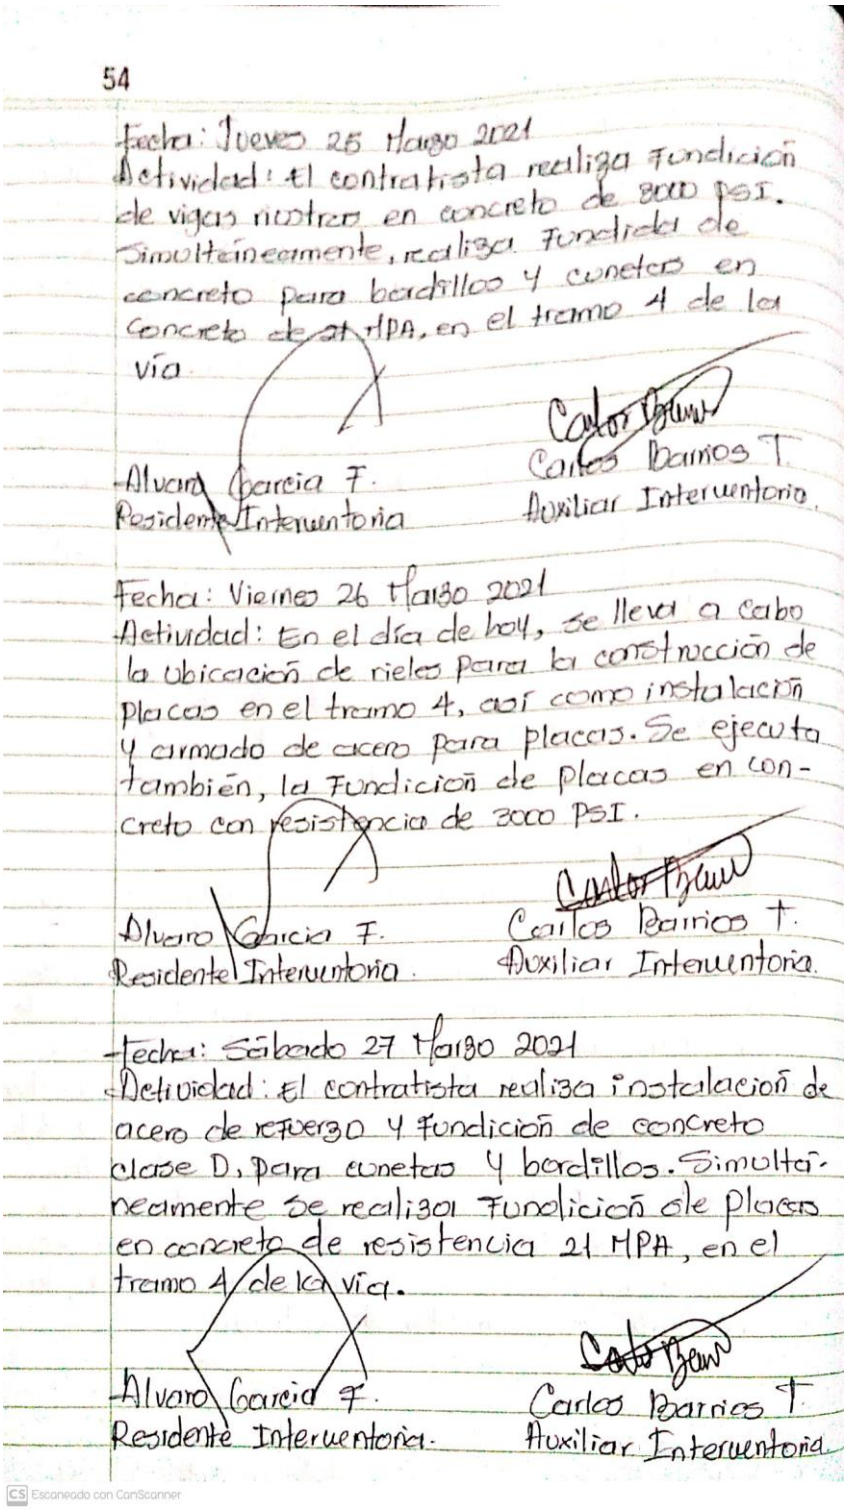

54

Fecha: Jueves 25 Marzo 2021
Actividad: El contratista realiza Fundición de vigas niostras en concreto de 3000 PSI. Simultáneamente, realiza Fundición de concreto para bordillos y cunetas en concreto de 21 MPA, en el tramo 4 de la vía.

Alvaro García F. — Residente Interventoría
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría


Fecha: Viernes 26 Marzo 2021
Actividad: En el día de hoy, se lleva a cabo la ubicación de rieles para la construcción de placas en el tramo 4, así como instalación y armado de acero para placas. Se ejecuta también, la Fundición de placas en concreto con resistencia de 3000 PSI.

Alvaro García F. — Residente Interventoría.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría.

Fecha: Sábado 27 Marzo 2021
Actividad: El contratista realiza instalación de acero de refuerzo y Fundición de concreto clase D, para cunetas y bordillos. Simultáneamente se realizó Fundición de placas en concreto de resistencia 21 MPA, en el tramo 4 de la vía.

Alvaro García F. — Residente Interventoría.
Carlos Barrios T. — Auxiliar Interventoría

CS Escaneado con CamScanner

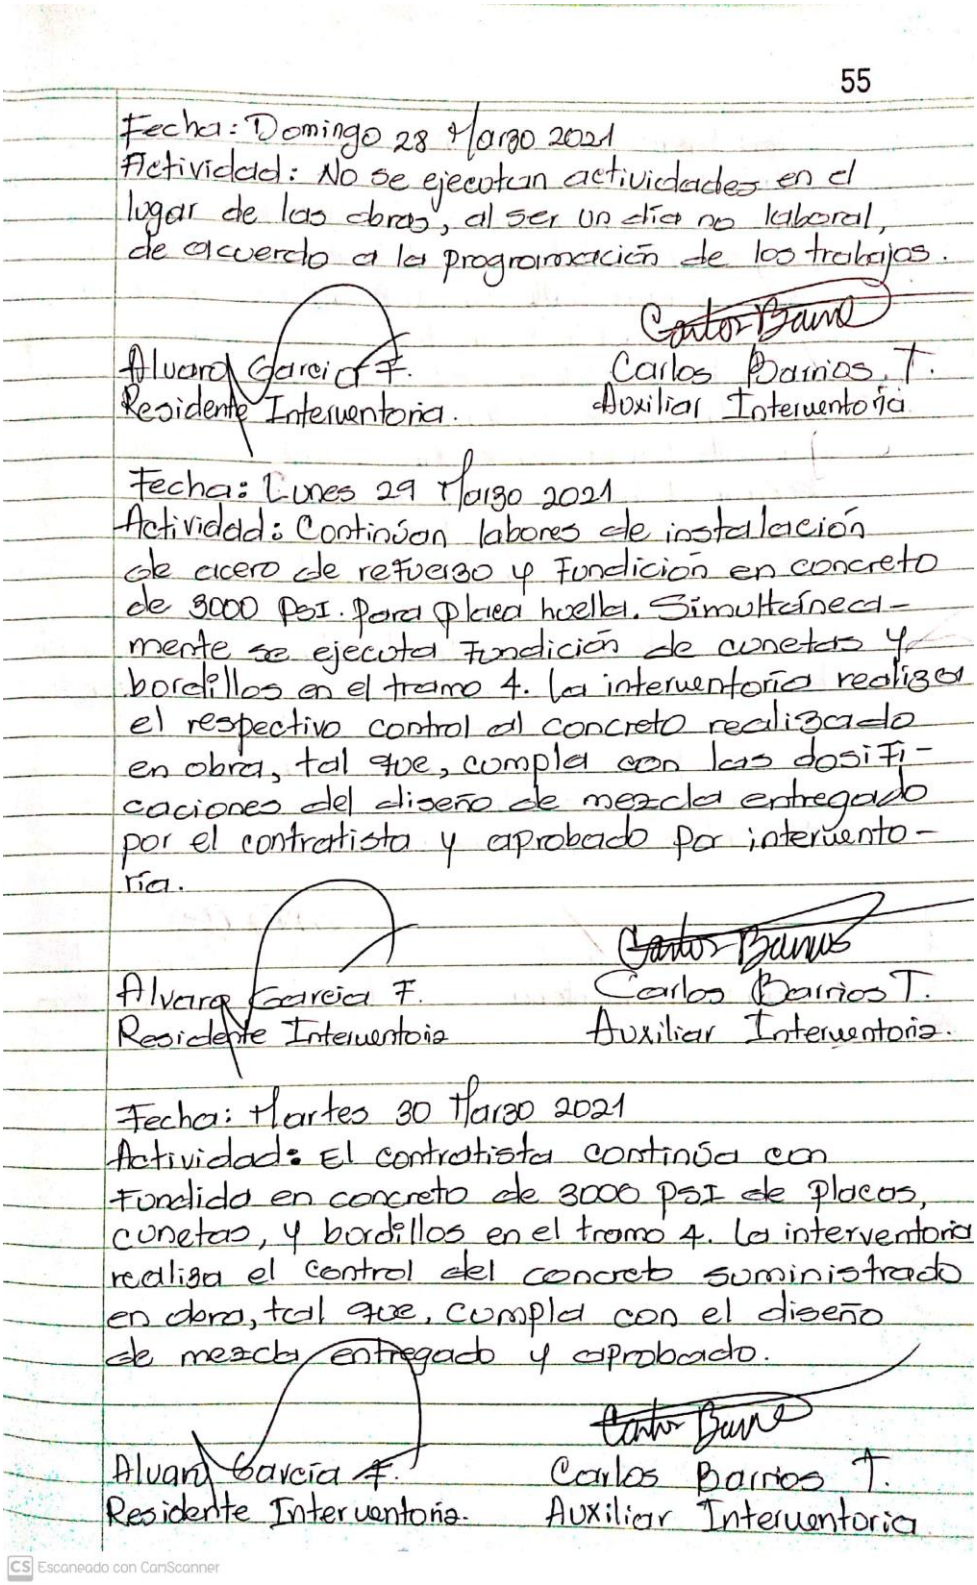

55

Fecha: Domingo 28 Marzo 2021
Actividad: No se ejecutan actividades en el lugar de las obras, al ser un día no laboral, de acuerdo a la programación de los trabajos.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 29 Marzo 2021
Actividad: Continúan labores de instalación de acero de refuerzo y Fundición en concreto de 3000 psi. para placa huella. Simultáneamente se ejecuta Fundición de cunetas y bordillos en el tramo 4. La interventoría realiza el respectivo control al concreto realizado en obra, tal que, cumpla con las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista y aprobado por interventoría.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria


Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria.

Fecha: Martes 30 Marzo 2021
Actividad: El contratista continúa con Fundido en concreto de 3000 psi de placas, cunetas, y bordillos en el tramo 4. La interventoria realiza el control del concreto suministrado en obra, tal que, cumpla con el diseño de mezcla entregado y aprobado.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoría.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

CS Escaneado con CamScanner

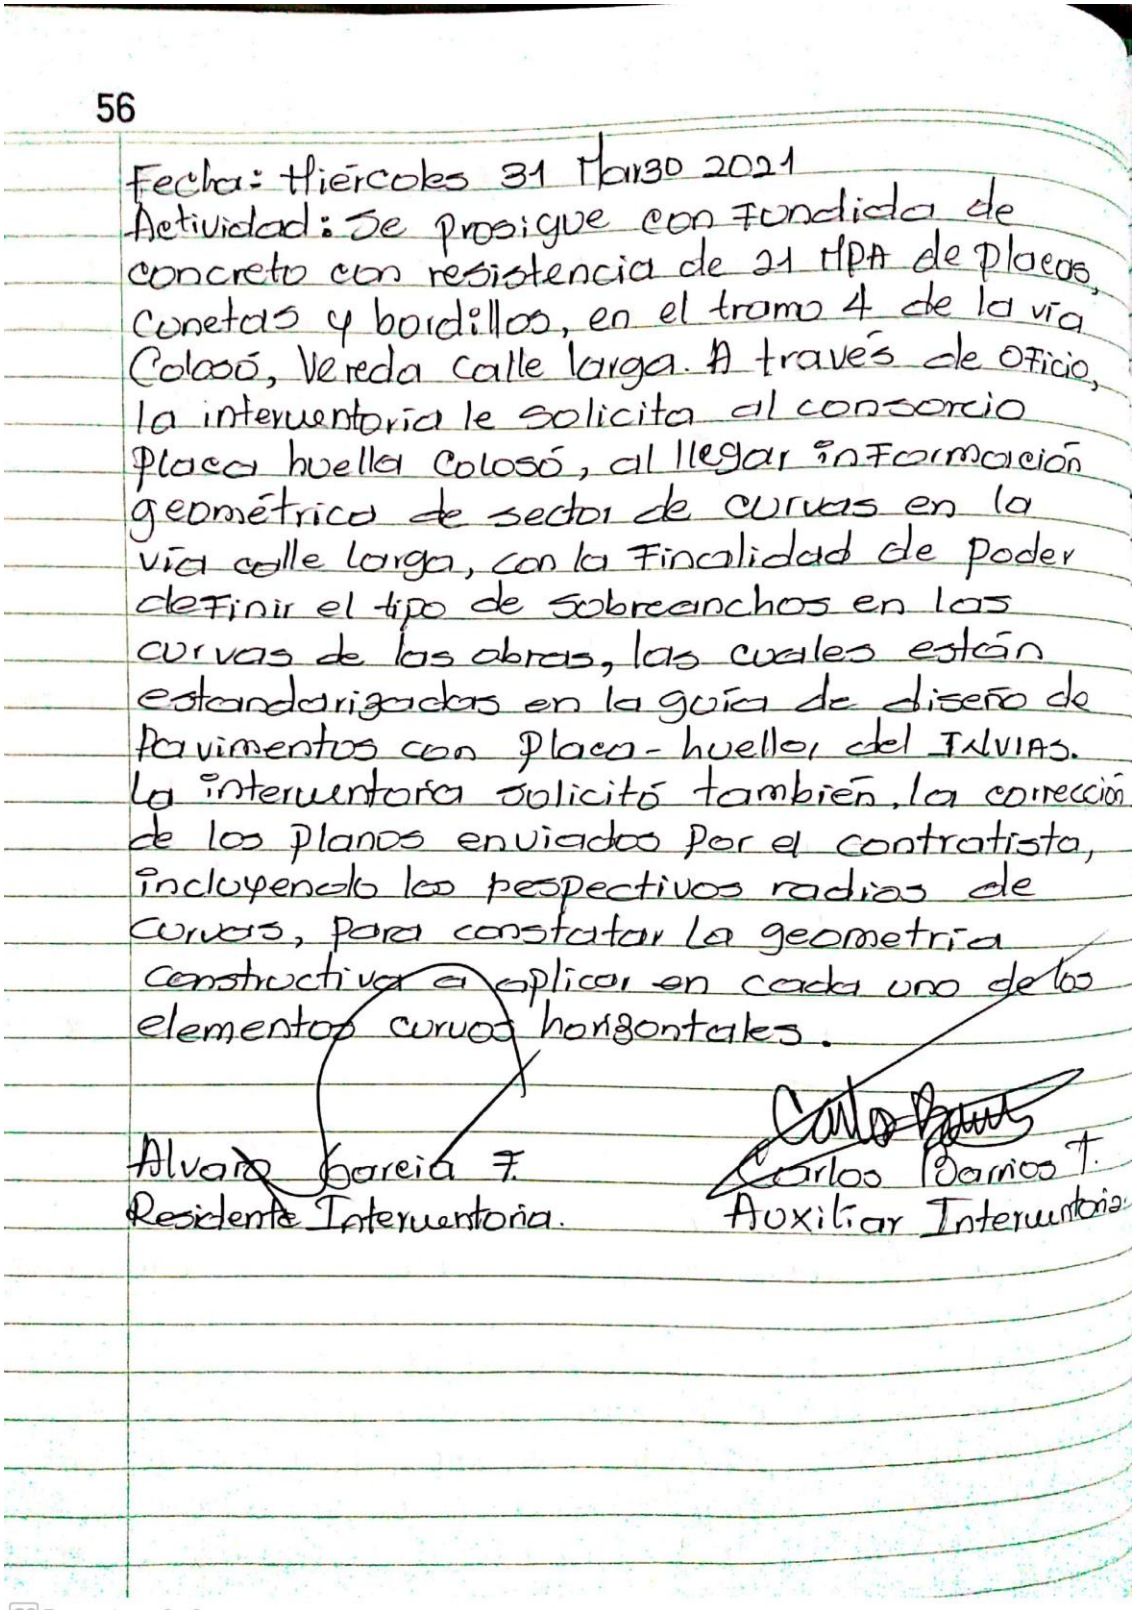

56

Fecha: Miercoles 31 Marzo 2021
Actividad: Se prosigue con fundida de concreto con resistencia de 21 MPA de placas, cunetas y bordillos, en el tramo 4 de la vía Colosó, Vereda calle larga. A través de Oficio, la interventoria le solicita al consorcio placa huella Colosó, al llegar información geométrica de sector de curvas en la vía calle larga, con la Finalidad de poder definir el tipo de sobreanchos en las curvas de las obras, las cuales están estandarizadas en la guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella del INVIAS. La interventoria solicitó también, la corrección de los planos enviados por el contratista, incluyendo los respectivos radios de curvas, para constatar la geometria constructiva a aplicar en cada uno de los elementos curvos horizontales.

Alvaro Garcia T.
Residente Interventoria.

Carlos Barrios T.
Auxiliar Interventoria

CS Escaneado con CamScanner

ANEXO 1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: LP – 085 – 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	8.5 MESES
FECHA DE INICIACION:	10/09/2020	FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
FECHA DE REANUDACION N° 2:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,055,799,942.50	VALOR ADICIÓNALES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 1,055,799,942.50	AMORTIZACION ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO CONCEDIDO:	N/A		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

96015535.84

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	MI	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	MI	200
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	379,748,696	$ 264,898,974.4	$ -	$ 264,898,974.35	0.70	$ 69,096,129	1.000	0.26
Acumulado:	972,796,025	$ 360,914,508.24	$ -	$ 360,914,508	0.37	$ 404,512,020	1.000	1.121

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1,055,799,942.50
Total	$ 1,055,799,942.50

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0.34	7.00	0.82	1.5	694,885,434	0	1,055,799,943	83,003,918
Interventor:	0.59	7.00	0.70	3	280,758,864	0	280,758,864	280,758,864

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11,605,649.22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11,605,649.22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	10/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	10/08/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	11/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-
Estabilidad y Calidad de Obra	09/04/2021	08/04/2026

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	12/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 10/07/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N° 177 CIU/COLOSÓ, INVITA A CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ A REUNION VIRUAL, CON EL FIN DE INFORMAR A INVIAS Y ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO COLOSÓ

INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N° 194 CIU/COLOSÓ, INVIA A REUNIÓN VIRUAL AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ , CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS Y BUSCAR POSIBLES SOLUCION AL CONTRATO DE REFERENCIA, DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HA PRESENTADO

A TRAVÉS DE OFICIO N° 1204 2021 CIU/COLOSÓ. CON FECHA 24 DE MARZO LA INTERVENTORIA SOLICITA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ SUCRE, INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE PROCESO ADMINISTRATIVO, PARA QUE EL CONSORCIO CONTRATISTA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONRATO DE REFERENCIA,

YA QUE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DARÁ INCUMPLIMIENTO A ESTE Y AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 000645 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE COLOSÓ E INVIAS

MEDIANTE OFICIO N°216 CIU/COLOSÓ, DE 31 DE MARZO DE 2021, LA INERVENORÍA SOLICITÓ AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ INFORMACIÓN GEOMERICA SECOR CURVAS DE LA VIA VEREDA CALLE LARGA, CON EL FIN DE DEFINIR EL TIPO DE SOBREANCHOS EN LAS CURVAS DE LAS OBRAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN , Y ALLEGAR ESA INFORMACIÓN CON LOS RESULADOS, PARA CORROBORAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS

INTERVENTORIA SOLICITÓ INFORMACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, AL ENTE CONTRATANTE, CON EL FIN DE QUE CONTRATISTA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTO DEBIDO A QUE SEGÚN LO EJECUADO, EL CONTRATISTA NO TERMINARÁ LAS OBRAS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO

INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA INFORMACION DE PAGO SOCIAL Y APORTE PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO A OBRA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 828 DE 2003

Firma

Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	10

	FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: MARZO **CONTRATO No.** LP – 085 – 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aspersor manual	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de ho	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua(1000 Galones)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Cizalla manual de 90 cm.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta 6 m3	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: MARZO **CONTRATO DE OBRA No.** **LP – 085 – 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOVAR GOMEZ ALBEIRO SEGUNDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOBIOS ROBLES WISMAN ALBERTO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTINEZ ADAMOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	**RESIDENTE DE OBRA**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX		X	X	X	X
DUPPERPLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MERCADO CONTRERAS EDILSON YAMITH	MAESTRO DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MENDOZA MADERA FRANKLIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROBLES MONTES OSCAR SEGUNDO	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PEREZ OCHOA ENARDO ANTONIO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROBLES HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

FECHA 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES INFORME MENSUAL: MARZO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	201067-01	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP -085-2020	201067	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.055.799.942,50
			TOTAL			**$ 1.055.799.942,50**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.055.799.942,50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 834.887.523,38	$ 195.837.814,13	$ 1.030.725.337,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22	$ 2.722.312,78	$ 14.327.962,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 8.704.780,83	$ 2.041.862,17	$ 10.746.643,00
VALOR TOTAL	$ 855.197.953,43	$ 200.601.989,08	$ 1.055.799.942,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	5	DE	10

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **FERREA Y TERCIARIA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: **LP – 085 – 2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: MARZO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													**Total**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	
Seco	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	738
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	6	DE	10

FECHA	31	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
4	01/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K3+040) HUELLA DERECHA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3358 PSI	SI	
6	03/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K3+000) HUELLA DERECHA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3296 PSI	SI	
6	04/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 VIGA RIOSTRA (K3 + 041)	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3247 PSI	SI	
8	05/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K2+995) HUELLA IZQUIERDA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3268 PSI	SI	
2	07/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K2+980) HUELLA IZQUIERDA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3016 PSI	SI	
4	07/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K2+985) HUELLA DERECHA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3217 PSI	SI	
6	10/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K2+950) HUELLA DERECHA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3270 PSI	SI	
8	12/03/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS	INVIAS -E-410-13	TRAMO 4 (K2+940) HUELLA DERECHA	1	>=100% A LOS 28 DIAS	3374 PSI	SI	

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	10

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
TOVAR GOMEZ ALBEIRO SEGUNDO	AYUDANTE	MARZO	30	1,101,784,046	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
TOBIOS ROBLES WISMAN ALBERTO	AYUDANTE	MARZO	30	11,027,906,849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	COLPENSIONES		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
MARTINEZ ADAMOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	MARZO	30	1,102,821,160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PROTECCION		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	RESIDENTE DE OBRA	MARZO	30	1,102,831,226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL EPS	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE		PLACA HUELLA COLOSO	
DUPPERPLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	DIRECTOR DE OBRA	MARZO	30	1,102,837,708	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SANITAS EPS	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PROTECCION		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	MARZO	30	1,108,760,729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
MERCADO CONTRERAS EDILSON YAMITH	MAESTRO DE OBRA	MARZO	30	92,277,280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS-S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	COLPENSIONES		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
MENDOZA MADERA FRANKLIN	AYUDANTE	MARZO	30	92,549,138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
ROBLES MONTES OSCAR SEGUNDO	ALMACENISTA	MARZO	30	92,601,254	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
PEREZ OCHOA ENARDO ANTONIO	OFICIAL	MARZO	30	92,601,816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	PORVENIR		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	
ROBLES HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AYUDANTE	MARZO	30	92,601,832	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EPS -S MUTUAL SER	30	VIDA COLPATRIA. S,A	COLPENSIONES		CAJA FILAR SUCRE	30	PLACA HUELLA COLOSO	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 7 **PERIODO MES:** MARZO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LP – 085 – 2020	PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	8.5 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A		
SECTOR:	VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.055.799.942,50	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	24 DE MAYO DE 2021
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 1.055.799.942,50	VALOR ADICIONALES:	N/A
TRAMO:		ANTICIPO CONCEDIDO:	N/A	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	7 MESES	10/04/2021	1.055.799.942,50	1.055.799.942,50

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	10 MESES	30/06/2021	$ 685.270.884,00	685.270.884,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 379.748.696,00	$ 264.898.974,35	$ -	$ 264.898.974	0,70	$ 69.096.129,00	1,000	0,26
Acumulado:	$ 972.796.025,00	$ 360.914.508,24	$ -	$ 360.914.508	0,37	$ 404.512.020,00	1,000	1,121

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,34	7,00	0,82	1,50	694.885.434	0	1.055.799.943	83.003.918
Interventor:	0,59	7,00	0,70	3,00	280.758.864	0	280.758.864	280.758.864

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	3,6
Calzada:	3,6
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	N/A
Carpeta:	N/A

Observaciones: LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	$ 13.372.764,0 / $ 16.010.879,0 / $ 17.823.251,0 / $ 19.635.623,0 / $ 168.096.335,0 / $ 493.266.263,0 / $ 876.047.752,0 / $ 1.055.799.942,0	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT		N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 668.851,0	$ 0,0	$ 668.851,0	$ 0,0
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$ 957.799.212,0 / $ 360.914.508,2	0,40	0,05	1.245	0,2	0,16	$ 379.079.845,0	$ 70.153.133,9	$ 957.799.212,0	$ 360.914.508,2
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.327.962,0 / $ 11.605.649,2	N/A	N/A	N/A	NA	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 14.327.962,0	$ 11.605.649,2
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24-may-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,055,799,942.50

VALOR ACUMULADO: $ 1,055,799,942.50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,327,962.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14,327,962.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105,579,994.25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316,739,982.75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211,159,988.50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316,739,982.75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16.63%	$ 175,560,600.00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.** **-**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.



Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24-may-21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma N.A.
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 10 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 03
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-085 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio Placa Huella Colosó R/L Greys Miranda

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Colosó – Vereda Calle Largo en el municipio de Colosó – Departamento de Sucre

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio CIV Terciaria

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Rafael Manjarrez Herrera	APOY. Spe. Planeación	Alcaldía de Colosó
Almas E. Gross F	Ing Residente	CIV TERCIARIO
William Felipe Gutiérrez Barrios	Gestor Técnico	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar y constatar por parte del Gestor INVIAS – William Felipe Gutiérrez – e interventoría del Estado actual del trámite de la solicitud de apremio contra el contratista debido al incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Nos atendió el Ingeniero Rafael Manjarrez – Profesional de apoyo en la Secretaría de Planeación –, a quien se le solicitó la información respecto al estado actual del trámite y aplicación del apremio contra el contratista debido al incumplimiento parcial en la ejecución de los trabajos. El ingeniero Manjarrez se comprometió a radicar la consulta pertinente y proceder a informar al INVIAS e interventoría.

El Gestor del INVIAS – Ing. William Gutiérrez –, le solicitó al Ingeniero Manjarrez preparará una fecha y hora para reunión

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 10 (Día) 03 (Mes) 2024 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Virtual donde asiste la Secretaria de Planeación para que explique en detalle el estado de avance de la Solicitud de aprobación contra el contratista debido al incumplimiento parcial de la programación de los trabajos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Preparar reunión virtual		Rafael Manjarrez

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
William Felipe Gutierrez Bandgui	
Rafael Manjarrez Herrera	
Alvaro Lopez Flor	

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	19 (Día)	03 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 04
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre.

CONTRATO DE OBRA No. LP-085 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio Placa Huella Colosó 2/L Grey Miranda

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Colosó - Vereda Calle Larga en el municipio de Colosó Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio CIV Terciaria

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jorge Velazquez	Director Interventoría	Consorcio CIV Terciaria
Alvaro Garcia F.	Residente Interventoría	Consorcio CIV Terciaria
Luis Gonzalez O	Coord INVIAS	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: Reunión virtual para aclarar dudas, preocupaciones y buscar posibles soluciones en el contrato del municipio Colosó.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Aclarar inquietudes y preocupaciones del contrato con la Gobernación
- Peticion de compromiso al municipio de Colosó ya que la interventoría hizo todo lo posible para salvar el contrato debido a que el contratista viene incumpliendo gravemente. Se solicitará la caducidad de este contrato.
- Diligencia informe de este contrato ante los entes de control

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 19 (Día) 03 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En la sesión la día hoy Bogotá, se efectuó la planeación del desarrollo de la obra, ya que por tal motivo se efectuó la visita de obra en la cual por parte de la interventoría se está haciendo todo lo posible para que el municipio no pueda los recursos que ya recibido para negativo. Asimismo, hemos comunicado en esta de que el de Colombia se da respuesta a las comunicaciones respecto a las fallas solicitadas por la interventoría; la interventoría procedió a informar a los entes de control.
Se le informa que le quedan 1 día para que termine el contrato, se le solicita de ratificar el proceso adicional del anticipo, que hay 3 meses de labor solicitado.
la administración del contrato, pero en cabeza del municipio, la interventoría no puede prorrogar el contrato, no somos administradores del contrato

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jorge Velazquez	
Alvaro Garcia	
Luis Gonzalez	

DILIGENCIAR EN EL PRESENTE

Escaneado con CamScanner

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 22	CÓDIGO	MINFRA-M-N-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	4 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTISEIS(26) **del** 26/02/2021 **al** 04/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA

CONTRATO No. LP – 085 – 2020 **VALOR INICIAL:** $ 1,055,799,942.50
PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES **ADICIONES:** $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020 **VALOR ACUMULADO:** $ 1,055,799,942.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9

INTEGRANTES: (Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)

CONTRATO No. 732-2020 **VALOR INICIAL:** $ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES **ADICIONES:** $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **VALOR ACUMULADO:** $ 685,270,884.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,055,799,943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 683,841,622.76
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 126,989,113
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	12.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 126,989,113.01

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 69,096,129.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	3	3*	4	TOTAL
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	90.45	**90.45**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	262.5	**262.5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	70.8	**70.8**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	50.4	**50.4**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	36.3	**36.3**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	4029.14	**4029.14**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	3	4	TOTAL
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6¨ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL); potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3* - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO DOCUEMNTACION DEL PROVEEDOR DE MATERIAL PETREO
PERMISO MINERO: SI NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO DOCUEMNTACION DEL PROVEEDOR DE MATERIAL PETREO

OBSERVACIONES: El contratista debe solicitar visita a la corporación ambiental, para definir permiso ocupación de cauce

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO DA RESPUESTA AL OFICIO INV-732-2020-134

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SINCELEJO - SUCRE

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZAS LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR ,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.

EL CONTRATISTA COMIENZA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS Y LOSAS.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 22	CÓDIGO	MINFRA-M-N-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	4 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTISEIS(26) **del** 26/02/2021 **al** 04/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
2	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
3	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
4	CONCRETO CLASE D (f'c = 21 Mpa) - PARA CUNETAS
5	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS.

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

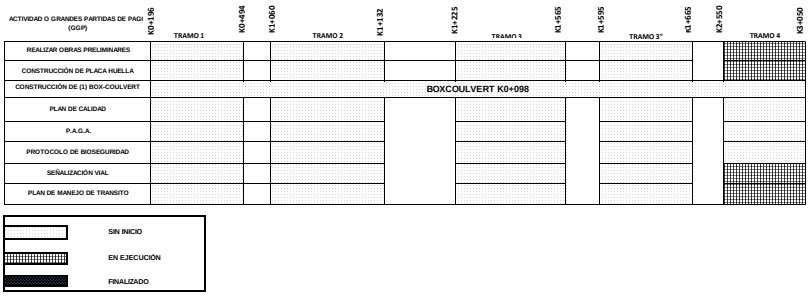

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.





FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORCIO CONTRATISTA EN LAS ACTVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.

LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTAMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 23**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	11 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTISIETE(27) **del** 05/03/2021 **al** 11/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,055,799,943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	779,919,417.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	187,456,754
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		17.75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	187,456,753.69

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 69,096,129.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	95.40	**95.4**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	225	**225**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	105.9	**105.9**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	75.6	**75.6**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	50.05	**50.05**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	8322.81	**8322.81**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

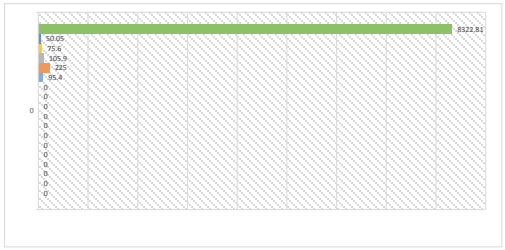

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO INFORMACION DE FUENTE DE MATERIALES PETREOS	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO INFORMACION DE FUENTE DE MATERIALES PETREOS

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES LEGALES AMBIENTALES VIGENTES, ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN A LA LUZ DEL DECRETO 2041 DE 2014 NO REQUIERE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR CONCEPTO A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE LA CERTIFICACION DE LA OCUPACION DE CAUCE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HE REALIZADO LAS CORRECCIONES DE LA VERSION 2
LA INTERVENTORIA HA HECHO ENFASIS AL CONTRATISTA EN LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA Y LOS INFORMES AMBIENTALES Y HASTA LA FECHA ESTE HA HECHO CASO OMISO A DICHAS PETICIONES.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	No. DE SOCI ALIZACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoria se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZAS LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR .

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.

EL CONTRATISTA COMIENZA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS Y LOSAS.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 23**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	11 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTISIETE(27) **del** 05/03/2021 **al** 11/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
2	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
3	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
4	CONCRETO CLASE D (f´c = 21 Mpa) - PARA CUNETAS
5	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAG (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K1+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.



FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .



FOTO 4. COMPATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORCIO CONTRATISTA EN LAS ACTVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.	
LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTAMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 24**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	18 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTIOCHO(28) **del** 12/03/2021 **al** 18/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,055,799,943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	875,997,212.29
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	214,301,583
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		20.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	214,301,583.24

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
	X	

MES FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 69,096,129.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO **1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCION DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	96.45	**96.45**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	337.5	**337.5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	113.04	**113.04**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	80.64	**80.64**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	80.34	**80.335**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	8729.9	**8729.9**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

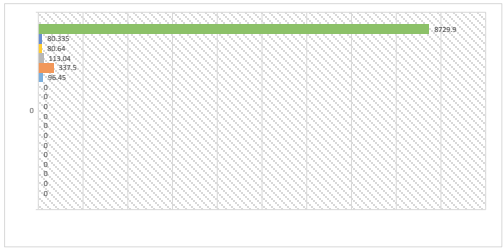

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	0	0
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales.	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales.

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	No. DE SOCI ALIZACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZAS LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR .

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 24**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	18 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTIOCHO(28) **del** 12/03/2021 **al** 18/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
2	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
3	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
4	CONCRETO CLASE D (f´c = 21 Mpa) - PARA CUNETAS
5	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAG (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K1+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.



FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .



FOTO 4. COMPATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORCIO CONTRATISTA EN LAS ACTVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.	
LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTAMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO 194 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 18 DE MARZO DE 2021 Y ASUNTO INVITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL EN ARAS DE MANTENER INFORMADO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,Y CON INVITACION A LA DOCTORA AYDA MARQUEZ URZOLA ,SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE COLOSÓ SUCRE.	
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 25**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTINUEVE(29) **del** 19/03/2021 **al** 25/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,055,799,943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 875,997,212.29
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 270,975,824
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	25.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 270,975,824.45

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69,096,129.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar	0					**0**
Relleno para estructuras con suelo	0					**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)	0					**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)	0					**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	0					**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	100.50	**100.5**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	337.5	**337.5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	141.3	**141.3**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	100.8	**100.8**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	133.47	**133.47**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	10337.38	**10337.38**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL PRESENTE CONTRATO REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE - EN TRAMITE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2 EL CONTRATISTA PRESENTA DOCUMENTO PAGA VERSION 1 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, SE SOLICITAN AJUSTES E INFORMES AMBIENTALES HASTA LA FECHA, SIN RESPUESTA A LAS REITERACIONES HECHAS CON COPIA AL INVIAS

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 26
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SINCELEJO - SUCRE

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZAS LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR .

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** VEINTINUEVE(29) **del** 19/03/2021 **al** 25/03/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	FUNDICION DE CONCREOT HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPA .
2	FUNDICION DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 14 MPA PARA PLACA HUELLA.
3	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
4	CONCRETO CLASE D (f´c = 21 Mpa) - PARA CUNETAS
5	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS.
6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD O GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	K0+196	TRAMO 1	K0+494	K1+060	TRAMO 2	K1+132	K1+225	TRAMO 3	K1+565	K1+595	TRAMO 3"	K1+665	K2+550	TRAMO 4	K3+050
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES															
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA															
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT	BOXCOULVERT K0+098														
PLAN DE CALIDAD															
P.A.G.A.															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD															
SEÑALIZACIÓN VIAL															
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO															

SIN INICIO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.



FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .



FOTO 4. COMPATACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO C.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORCIO CONTRATISTA EN LAS ACTVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.
LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTAMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°204 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 24 DE MARZO DE 2021 Y ASUNTO SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE REFERENCIAR LOS OFICIOS REFERENTES AL SEGUIMIENTO QUE REALIZO LA INTERVENTORÍA CON CARACTER DEMOSTRATIVO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

No. MAT: 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 26**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	1 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** TREINTA(30) **del** 26/03/2021 **al** 01/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1,055,799,942.50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685,270,884.00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1,055,799,942.50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685,270,884.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,055,799,943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,055,799,942.50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 360,914,508
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	34.18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 360,914,508.24

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685,270,884.00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69,096,129.00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	0	0	100.50	**100.5**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	0	0	337.5	**337.5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f´c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	0	0	141.3	**141.3**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	0	0	100.8	**100.8**
Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	0	0	133.47	**133.47**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	0	0	10337.38	**10337.38**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL PRESENTE CONTRATO REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE - EN TRAMITE

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1 -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZAS LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR .

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE SUBBASE GRANULAR TIPO C.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN CONCRETO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL No. 26	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	1 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** CALLE LARGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** TREINTA(30) **del** 26/03/2021 **al** 01/04/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1,280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)
8	Obras de compensacion ambiental.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

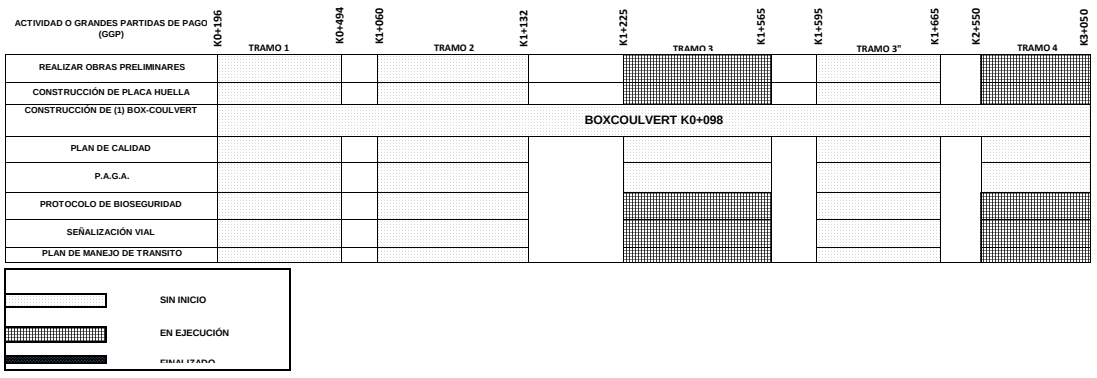

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1. SUMINISTRO DE CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21 MPA Y FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.





FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA.





FOTO 3. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO PARA BORDILLOS Y CUNETA .

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSORCIO CONTRATISTA EN LAS ACTVIDADES REALIZADAS EN OBRA Y DE INDOLE ADMINISTRATIVA CONSTANTEMENTE PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA ADECUADA Y CON CALIDAD.	
LA INTERVENTORÍA REALIZA VISITAS A OBRA CONSTAMENTE A TRAVES DE SU PERSONAL PROFESIONAL PARA CORROBORAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y CON LAS CALIDADES EXIGIDADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°217 2021 CIU/COLOSÓ Y FECHA 31 DE MARZO DE 2021 ASUNTO COMPLEMENTACION INFORMACION GEOMETRICA SECTOR CURVA VIA CALLE LARGA,DONDE SE ACLARA TODOS LOS DATOS FALTANTES EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA DE LOS PLANOS TOPOGRAFICOS DEFINITIVOS.	

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: MARZO **CONTRATO No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 14

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: MARZO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTHA YURY GARCIA	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	INSPECTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE MARIA MENDOZA DE VARGAS	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	INSPECTORA SOCIAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YINA JUDITH CARO COHEN	INSPECTORA SST		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MES ES LA SIGUIENTE: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 0.429/1 , ESPECIALISTA AMBIENTAL 0. 66/1, INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 3 : 0.667/1, INSPECTORA SOCIAL 0.7/1 , INSPECTORA SST 0.7/1 ; DEMAS RECURSO PERSONAL: 1/1

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 6	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL: MARZO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **685.270.884,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	$ 16.447.491	$ 3.858.053	$ 20.305.544	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 20.305.544	$ 685.270.884		ACTAS EN TRAMITE
2	octubre	$ 35.518.064	$ 8.331.398	$ 43.849.462	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 64.155.006	$ 621.115.878		ACTAS EN TRAMITE
3	noviembre	$ 51.817.723	$ 12.154.775	$ 63.972.498	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 128.127.504	$ 557.143.380		ACTAS EN TRAMITE
4	diciembre	$ 51.085.377	$ 11.982.990	$ 63.068.367	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 191.195.871	$ 494.075.013		ACTA EN ELABORACION
5	enero	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 260.292.000	$ 424.978.884		ACTA EN ELABORACION
6	Febrero	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 329.388.129	$ 355.882.755		ACTA EN ELABORACION
7	marzo	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 398.484.258	$ 286.786.626		ACTA EN ELABORACION
TOTALES		**$ 322.772.249**	**$ 75.712.009**	**$ 398.484.258**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ 156.600,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ -
2	MARTHA YURY GARCIA	41708526	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 922.000,00	$ 922.000,00	$ 64.171,20	$ 36.880,00	$ -	$ 36.880,00	$ -	$ -
3	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	1109842513	INSPECTOR	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 480.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -
4	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.200,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00	$ -	$ -
5	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.300,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
6	ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	1104011109	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 922.000,00	$ 922.000,00	$ 64.200,00	$ 36.900,00	$ 147.600,00	$ 36.900,00	$ -	$ -
7	JORGE MARIO MENDOZA DE VARGAS	1063177819	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.300,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
8	FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	6816630	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.200,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00	$ -	$ -
9	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000	$ 206.800,00	$ 118.800,00	$ 475.200,00	$ 118.800,00	$ -	$ -
10	CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	32670053	INSPECTOR SOCIAL	$ 1.600.000,00	$ 1.493.333,00	$ 103.935,98	$ 59.733,32	$ -	$ 59.733,32	$ -	$ -
11	YINA JUDITH CARO COHEN	1102847188	INSPECTOR SST	$ 1.600.000,00	$ 1.493.333,00	$ 103.935,98	$ 59.733,32	$ 238.933,28	$ 59.733,32	$ -	$ -
12	MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	1099965566	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 1.573.333,00	$ 109.503,98	$ 62.933,32	$ 251.733,28	$ 62.933,32	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$							25.744.000,00

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 17

FECHA	31	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **732-2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 01/09/2019

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIMEBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 685,270,884.00

VALOR ACUMULADO: $ 685,270,884.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68,527,088.40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137,054,176.80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205,581,265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68,527,088.40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137,054,176.80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205,581,265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

FECHA DE INICIO: 01/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ANEXO 19

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciosantander2019@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

Sincelejo, 01 marzo de 2021

Señores

CONSORCIO CIU TERCIARIA
Atn. JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante legal del consorcio

OFI 017 PH COLOSÓ

REFERENCIA: Contrato de obra N° LP-085-2020 "MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSO – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: RESULTADOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO 3000PSI.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hacemos entrega de los ensayos realizados en la placa huella Colosó, se envían los resultados de las muestras que alcanzaron los 28 días hasta el 15 de marzo, quedamos atento a sus comentarios.

Atentamente,

Greys Paola Miranda V.

GREYS MIRANDA VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLACA HUELLA CHALAN

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 12 de marzo de 2021 OFICIO N° 177 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INVITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL**

Cordial saludo,

La interventoría, en aras de mantener informado al Instituto Nacional de Vías INVÍAS, formalmente la invita a participar en reunión virtual a realizarse el próximo miércoles 17 de marzo de 2021, invitación que es extensiva a la Doctora Ayda Márquez Urzola, Secretaria de Planeación e Infraestructura de Colosó Sucre.

Hora reunión: 10:45 A.M

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 18 de marzo de 2021 OFICIO N° 194 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INVITACIÓN REUNIÓN VIRTUAL**

Cordial saludo,

La interventoría, en aras de mantener informado al Instituto Nacional de Vías INVÍAS, formalmente la invita a participar en reunión virtual a realizarse el próximo viernes 19 de marzo de 2021, invitación que es extensiva a la Doctora Ayda Márquez Urzola, Secretaria de Planeación e Infraestructura de Colosó Sucre.

Hora reunión: 2:00 P.M

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 23 de marzo de 2021 OFICIO N° 197 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO**

Cordial saludo,

Mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, esta interventoría alertó al municipio de Colosó Sucre, sobre un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales del contrato referenciado, para con este ente territorial, - por parte del contratista-, todo de acuerdo a lo motivado en esa comunicación.

Posteriormente, mediante OFICIO N°110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021 la interventoría se ratificó sobre lo solicitado mediante el OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020; debido que las circunstancias que originaron la aplicación de la multa se agravaron, y, el atraso del contratista pasó del 26,9% al 34,40%, denotándose el poco compromiso de la firma constructora en cumplir sus obligaciones contractuales.

Finalmente, mediante OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, de 15 de marzo de 2021, la interventoría reafirmó lo ratificado con OFICIO N°110 2020 CIU/COLOSÓ, 25 enero de 2021, demostrando la interventoría que a 15 de marzo de 2021 el atraso del contratista era del 52,67 %, lo cual es muy grave, debido al escaso tiempo que le queda, para terminar de construir todas las actividades del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020

De acuerdo a estos indicadores de incumplimiento, la interventoría demostró a la alcaldía de Colosó Sucre, que el contratista, no entregará las obras el 10 de abril de 2021, -plazo máximo establecido por el acta de inicio-,

debido que incumplió las estrategias de trabajo, -aprobadas por esta alcaldía-, del plan de contingencia solicitado, cuya finalidad es finiquitar el proceso constructivo de las obras, en el plazo establecido contractualmente.

El Instituto Nacional de Vías, INVIÍAS, por conducto del gestor de proyectos, - ingeniero William Felipe Gutiérrez- e interventoría representada por Álvaro García Flórez, el día 10 de marzo de 2021, en cumplimiento de sus funciones, realizaron comité de obra en las oficinas de la Secretaría de Planeación del Municipio de Colosó, acompañó por parte de la Alcaldía de Colosó el ingeniero Rafael Manjarrez,-profesional de apoyo de esta oficina técnica-, debido que la Secretaria de Planeación se encontraba realizando otras actividades de sus funciones, quedando comprometido informar al INVIAS e interventoría del estado de aplicación de la multa solicitada contra el contratista, por el incumplimiento del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020. El gestor del INVIAS, solicitó al ingeniero Rafael Manjarrez, preparar una reunión virtual donde asista la Secretaria de Planeación, Doctora Ayda Márquez Urzola, para que explique en detalle, en qué estado se encuentra el trámite de la solicitud de apremio contra el contratista de las obras, a la fecha no han informado nada al respecto, adjunto facsímil de esta acta.

Revisado el contrato de obra, su cláusula 12 establece las multas a aplicar por el incumplimiento del contrato, al igual la cláusula 13, cláusula penal pecuniaria pactada entre las partes por el 10% del valor total del contrato.

Con base a lo anterior, la interventoría demuestra la gravedad de la situación actual del contrato de obra No. No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE, situación que conllevó que la interventoría solicitara oportunamente al ente contratante, aplicar las multas correspondientes por el incumplimiento detectado y tasado por esta interventoría, diligencia que a la fecha no se ha informado del estado actual de su aplicación, motivo por el cual, se solicita que la Alcaldía de Colosó Sucre, aplique la cláusula penal pecuniaria,- en los términos pactados en la cláusula 13 del contrato de obra, al no haber aplicado oportunamente el ente contratante las multas por los incumplimientos por parte del contratista de las obras, diligencia del cual esperamos pronta información.

El contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020, -finaliza el 10 de abril de 2021-; se deduce de lo anteriormente expuesto, que la firma constructora CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA no va a dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales para con el municipio de Colosó Sucre; se les informa, que la interventoría, una vez, ocurra el plazo final de ejecución y entrega de los trabajos,

procederá a la fase de liquidación del contrato, según lo previsto en la cláusula 10 del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020, y, a tono con el dispuesto en el convenio interadministrativo 000645 de 2020, específicamente lo consignado en la cláusula DECIMA NOVENA, inciso b, y, posteriormente, proceder con lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del convenio interadministrativo, que estipula que el municipio deberá reintegrar los recursos a la cuenta designada por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, para de esta manera proceder a la liquidación del convenio

De no aplicar la alcaldía de Colosó Sucre las medidas precautelares solicitadas por interventoría, esta interventoría solicitará la obligación establecida en la cláusula 11 del contrato de obra, -que estableció que al contrato están incorporadas las cláusulas excepcionales establecidas por el Estatuto General De Contratación de la Administración Pública-, en síntesis, la interventoría procederá a solicitar, -antes del vencimiento contractual-, la caducidad administrativa del contrato de obra No. MM-LP-OP-085-2020, como control exorbitante de los contratos estatales

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 24 de marzo de 2021 OFICIO N° 204 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO**

Cordial saludo,

El contrato de la referencia se suscribió el 26 de junio de 2020, con acta de inicio datada 10 de septiembre de 2020, con plazo de ejecución siete (7) meses, con fecha de finalización 9 de abril de 2021,

Cuantificado por la interventoría el bajo rendimiento obtenido por el contratista, - durante el tiempo de desarrollo de las obras-, y en virtud del seguimiento acucioso realizado al contrato de obra, se solicitó con base en la cláusula doce (12) del contrato de la referencia, se iniciara el procedimiento administrativo de apremio, sin a la fecha, tengamos respuesta positiva por parte del municipio.

La interventoría mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, solicitó a esta alcaldía, iniciar trámite administrativo consistente en la aplicación de multa por el incumplimiento parcial del contratista de las obras del contrato referenciado.

Seguidamente, mediante OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021, la interventoría ratificó ante la Alcaldía de Colosó, proseguir con el trámite administrativo de aplicación de multa, por no mejorar el contratista, los rendimientos que garanticen cumplir la programación de las obras del contrato referenciado.

Finalmente, mediante 15 de marzo de 2021 OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, esta interventoría reiteró en nueva oportunidad a la alcaldía de Colosó Sucre, proseguir el proceso de trámite administrativo, con la finalidad de sancionar al contratista, por el incumplimiento al plan de contingencia presentado,- como medida aprobada

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

por esta alcaldía-, para lograr el cumplimiento y terminación de las obras en el plazo estipulado en el contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020.

Teniendo en cuenta lo reglado en la cláusula novena del convenio interadministrativo 000645 de 2020 "OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO", - y en particular en el literal i) de dicha cláusula-, que reza……*Garantizar la ejecución de las obras conllevando al logro del alcance del proyecto, para ello deberá contemplar mecanismos de acción necesarios que propendan por el cumplimiento dentro del plazo contractual* (sic).

Con base en lo anterior, se solicita al municipio de Colosó Sucre, aplicar los mecanismos administrativos que le brinda la ley, para que conmine al contratista CONSORCIO PLACA HUELLA CHALAN R/L Greys Miranda Vergara, al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, ya que la terminación del plazo de dicho contrato dará al incumplimiento no solo de éste, sino del convenio interadministrativo N° 000645 de 2020, celebrado entre Alcaldía de Colosó Sucre e INVIAS, y, del cual dependen los recursos asignados para la ejecución de las obras de pavimentación de placa huella.

Por lo tanto, es menester, que la administración en cumplimiento de sus obligaciones, vele por la ejecución oportuna de los recursos asignados.

Agradecemos nos notifique el inicio del proceso administrativo, solicitado en repetidas oportunidades por esta interventoría, quedamos atentos a coadyuvar, con el propósito de brindar a la comunidad el beneficio de la ejecución de las obras.

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

C.C. INVÍAS
Procuraduría General de la Nación, Seccional Sucre
Contraloría General de la República, Seccional Sucre

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 31 de marzo de 2021 OFICIO N° 216 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACION GEOMETRICA SECTOR CURVAS VIA CALLE LARGA**

Cordial saludo,

Revisado los planos remitidos a esta interventoría del eje vial de sus trabajos, se precisa colocar en planos la siguiente información, con la finalidad de poder definir el tipo de sobreanchos en las curvas de las obras, las cuales están estandarizadas en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del INVIAS.

1.- Localizar los PI, PC Y PT de las curvas horizontales en cada uno de ellas
2.- Localizar los deltas de cada una de estas curvas.

Una vez suministrada esta información, con base en la cartilla antes mencionada, ustedes pueden localizar el tipo de curvas que deben construirse en cada uno de los sectores donde se produzca el cambio de alineamiento horizontal.

En la cartilla están especificadas doce (12) tipos de curvas, de acuerdo al delta característico de esta, de aquí se derivan las transiciones y los sobreanchos necesarios a construir en cada sección de curva.

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 31 de marzo de 2021 OFICIO N° 217 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **COMPLEMENTACION INFORMACION GEOMETRICA SECTOR CURVAS VIA CALLE LARGA**

Cordial saludo,

Como complemento al oficio 217 2021 CIU/ COLOSÓ, de 31 de marzo de 2021, esta interventoría una vez revisados los planos, -no se encontraron los radios de curvaturas de las diferentes curvas presentadas en el trazado vial-, por consiguiente, se les recomienda determinar cada uno de estos radios de curvaturas, para que ustedes, puedan aplicar los elementos de diseño establecidos en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del INVIAS, páginas 18 a la 29, que les permita definir la totalidad de los elementos como sobreanchos, deflexiones y transiciones de cada una de las curvas horizontales.

Se les solicita corregir los planos enviados, incluyéndoles los respectivos radios de las curvas, para constatar la geometría constructiva a aplicar en cada uno de los elementos curvos horizontales.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 15 de marzo de 2021 OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REAFIRMACIÓN APLICACIÓN MULTA**

Cordial saludo,

Esta interventoría reafirma lo ratificado mediante comunicación de 25 de enero de 2021, mediante el cual se solicitó la aplicación de multa, -contra el CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Miranda Vergara- , debido al incumplimiento parcial reiterado e incremental, de sus obligaciones contractuales para con el municipio de Colosó, y, de acuerdo al último corte de obra, presenta un atraso de ejecución de obra equivalente al 52,67 %.

Previamente al requerimiento del apremio, la interventoría requirió al contratista, mediante los oficios relacionados a continuación, con la finalidad de actualizar, plantear y acordar medidas conjuntas, como medida resarcitoria ante el ente contratante y poder terminar los trabajos dentro del plazo acordado.

A continuación, se presenta relación de comunicaciones emitidas por parte de la interventoría, donde se expone la información y argumentación demostrativa, del incumplimiento parcial por parte de la firma constructora de las obras del contrato No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE, razones por las cuales esta interventoría, solicitó a esta alcaldía aplicar el apremio correspondiente, ante el incumplimiento contractual por parte de la firma constructora.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

según lo previsto en el contrato de obra N° No.MM-LP-OP-085-2020, y, a tono con el dispuesto en el convenio interadministrativo 000645 de 2020, especificamente lo consignado en la cláusula DECIMA NOVENA, inciso b, y, posteriormente, proceder con lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del convenio interadministrativo, que estipula que el municipio deberá reintegrar los recursos a la cuenta designada por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, para de esta manera proceder a la liquidación del convenio

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA GENERAL
Y DE GOBIERNO
Ceidis Perez
15-mar-2021

c.c: Contraloría General de la República
Procuraduría General de la Nación
Seguros del Estado S.A.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 23 de marzo de 2021

OFICIO N° 197 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO**

Cordial saludo,

Mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, esta interventoría alertó al municipio de Colosó Sucre, sobre un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales del contrato referenciado, para con este ente territorial, - por parte del contratista-, todo de acuerdo a lo motivado en esa comunicación.

Posteriormente, mediante OFICIO N°110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021 la interventoría se ratificó sobre lo solicitado mediante el OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020; debido que las circunstancias que originaron la aplicación de la multa se agravaron, y, el atraso del contratista pasó del 26,9% al 34,40%, denotándose el poco compromiso de la firma constructora en cumplir sus obligaciones contractuales.

Finalmente, mediante OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, de 15 de marzo de 2021, la interventoría reafirmó lo ratificado con OFICIO N°110 2020 CIU/COLOSÓ, 25 enero de 2021, demostrando la interventoría que a 15 de marzo de 2021 el atraso del contratista era del 52,67 %, lo cual es muy grave, debido al escaso tiempo que le queda, para terminar de construir todas las actividades del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020

De acuerdo a estos indicadores de incumplimiento, la interventoría demostró a la alcaldía de Colosó Sucre, que el contratista, no entregará las obras el 10 de abril de 2021, -plazo máximo establecido por el acta de

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Recibido
Zain R. Salcedo A
23/03/2021


Escaneado con CamScanner

La info

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.

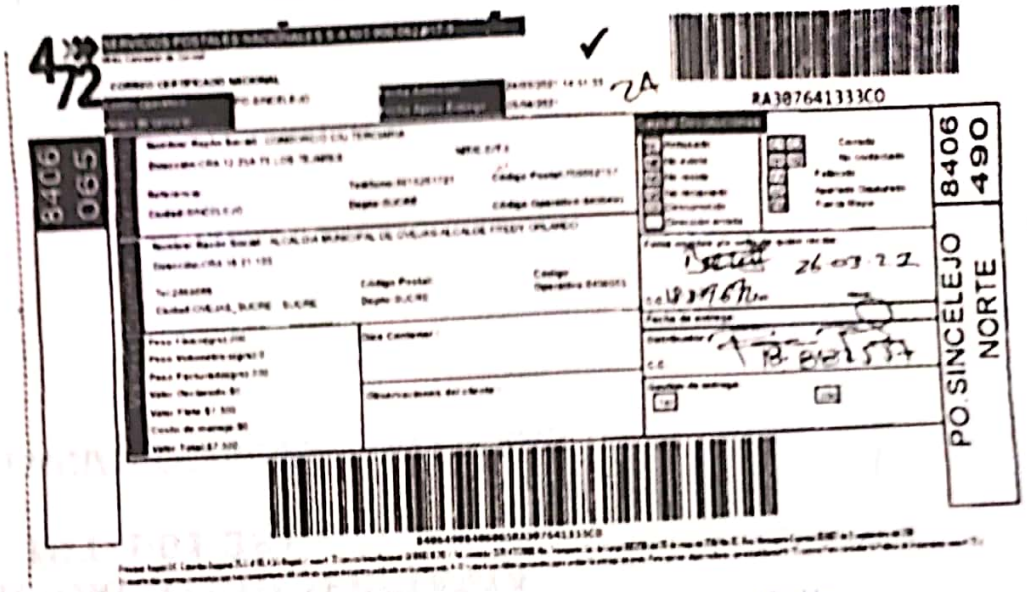

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

El contrato de la referencia se suscribió el 26 de junio de 2020, con acta de inicio datada 10 de septiembre de 2020, con plazo de ejecución siete (7) meses, con fecha de finalización 9 de abril de 2021,

Cuantificado por la interventoría el bajo rendimiento obtenido por el contratista, - durante el tiempo de desarrollo de las obras-, y en virtud del seguimiento acucioso realizado al contrato de obra, se solicitó con base en la cláusula doce (12) del contrato de la referencia, se iniciara el procedimiento administrativo de apremio, sin a la fecha, tengamos respuesta positiva por parte del municipio.


La interventoría mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, solicitó a esta alcaldía, iniciar trámite administrativo consistente en la aplicación de multa por el incumplimiento parcial del contratista de las obras del contrato referenciado.

Seguidamente, mediante OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021, la interventoría ratificó ante la Alcaldía de Colosó, proseguir con el trámite administrativo de aplicación de multa, por no mejorar el contratista, los rendimientos que garanticen cumplir la programación de las obras del contrato referenciado.

Finalmente, mediante 15 de marzo de 2021 OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, esta interventoría reiteró en nueva oportunidad a la alcaldía de Colosó Sucre, proseguir el proceso de trámite administrativo, con la finalidad de sancionar al contratista, por el incumplimiento al plan de contingencia presentado,- como medida

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C.

Escaneado con CamScanner

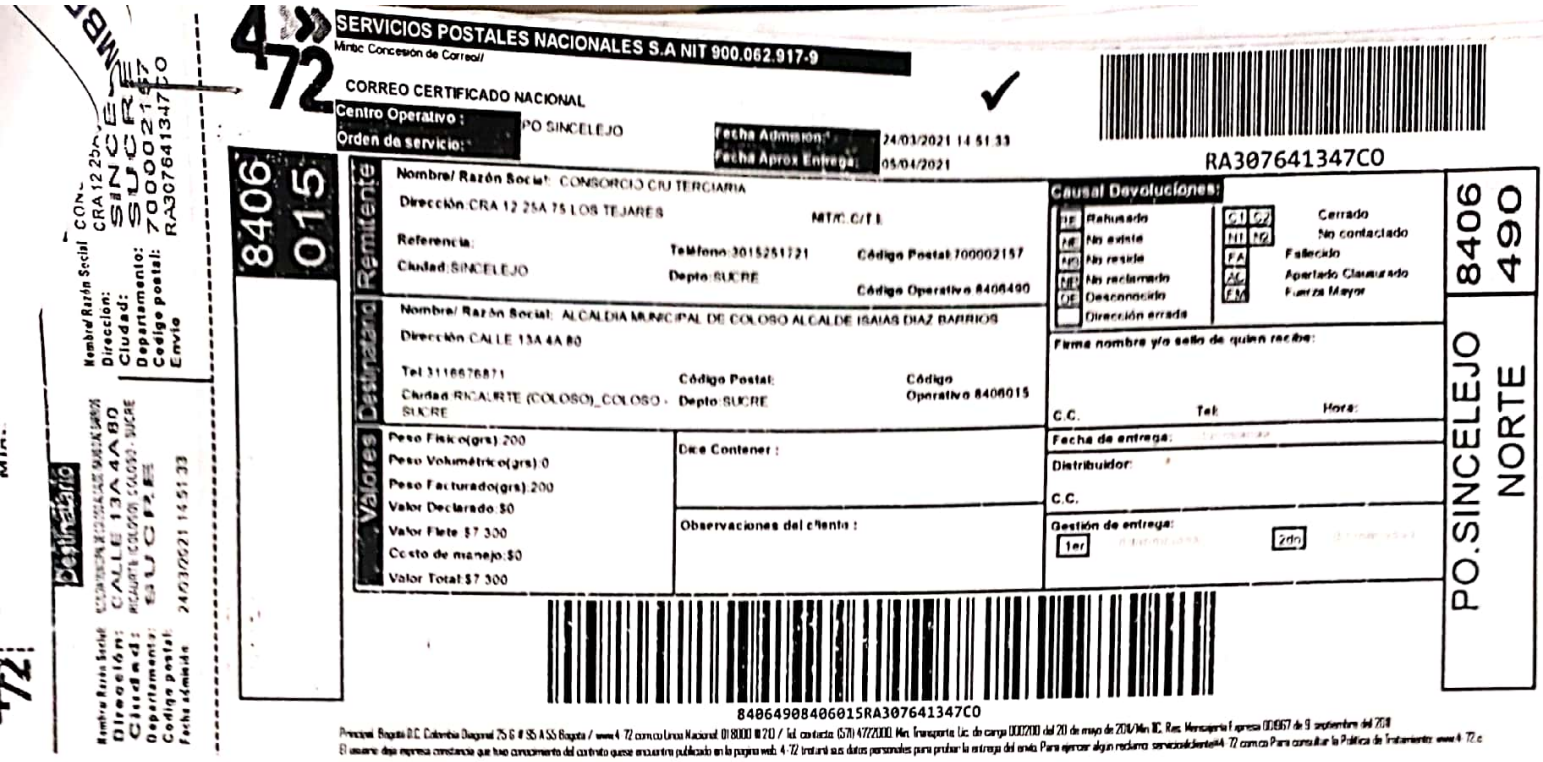
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Mintic Concesión de Correos
CORREO CERTIFICADO NACIONAL
RA307641347CO
Nombre/ Razón Social: CONSORCIO CIU TERCIARIA
Dirección: CRA 12 25A 75 LOS TEJARES
Ciudad: SINCELEJO
Depto: SUCRE
Código Postal: 700002157
Código Operativo 8406490
Nombre/ Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO ALCALDE ISAIAS DIAZ BARRIOS
Dirección: CALLE 13A 4A 80
Ciudad: RICAURTE (COLOSO)_COLOSO - SUCRE
Depto: SUCRE
Código Operativo 8406015
8406490808406015RA307641347CO

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO**

Cordial saludo,

El contrato de la referencia se suscribió el 26 de junio de 2020, con acta de inicio datada 10 de septiembre de 2020, con plazo de ejecución siete (7) meses, con fecha de finalización 9 de abril de 2021,

Cuantificado por la interventoría el bajo rendimiento obtenido por el contratista, - durante el tiempo de desarrollo de las obras-, y en virtud del seguimiento acucioso realizado al contrato de obra, se solicitó con base en la cláusula doce (12) del contrato de la referencia, se iniciara el procedimiento administrativo de apremio, sin a la fecha, tengamos respuesta positiva por parte del municipio.

La interventoría mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, solicitó a esta alcaldía, iniciar trámite administrativo consistente en la aplicación de multa por el incumplimiento parcial del contratista de las obras del contrato referenciado.

Seguidamente, mediante OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021, la interventoría ratificó ante la Alcaldía de Colosó, proseguir con el trámite administrativo de aplicación de multa, por no mejorar el contratista, los rendimientos que garanticen cumplir la programación de las obras del contrato referenciado.

Finalmente, mediante 15 de marzo de 2021 OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, esta interventoría reiteró en nueva oportunidad a la alcaldía de Colosó Sucre, proseguir el proceso de trámite administrativo, con la finalidad de sancionar al contratista, por el incumplimiento al plan de contingencia presentado,- como medida

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 24 de marzo de 2021 OFICIO N° 204 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO AVANCE PROCESO ADMINISTRATIVO**

Cordial saludo,

El contrato de la referencia se suscribió el 26 de junio de 2020, con acta de inicio datada 10 de septiembre de 2020, con plazo de ejecución siete (7) meses, con fecha de finalización 9 de abril de 2021,

Cuantificado por la interventoría el bajo rendimiento obtenido por el contratista, - durante el tiempo de desarrollo de las obras-, y en virtud del seguimiento acucioso realizado al contrato de obra, se solicitó con base en la cláusula doce (12) del contrato de la referencia, se iniciara el procedimiento administrativo de apremio, sin a la fecha, tengamos respuesta positiva por parte del municipio.

La interventoría mediante OFICIO N° 077 2020 CIU/ COLOSÓ, 22 de diciembre de 2020, solicitó a esta alcaldía, iniciar trámite administrativo consistente en la aplicación de multa por el incumplimiento parcial del contratista de las obras del contrato referenciado.

Seguidamente, mediante OFICIO N° 110 2020 CIU/ COLOSÓ, 25 de enero de 2021, la interventoría ratificó ante la Alcaldía de Colosó, proseguir con el trámite administrativo de aplicación de multa, por no mejorar el contratista, los rendimientos que garanticen cumplir la programación de las obras del contrato referenciado.

Finalmente, mediante 15 de marzo de 2021 OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ, esta interventoría reiteró en nueva oportunidad a la alcaldía de Colosó Sucre, proseguir el proceso de trámite administrativo, con la finalidad de sancionar al contratista, por el incumplimiento al plan de contingencia presentado,- como medida

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 15 de marzo de 2021

OFICIO N° 183 2021 CIU/ COLOSÓ

Contraloría General de la República :: SQD 06-04-2021 10:07
Al Contestar Cite Este No.: 2021ER0038945 Fol:4 Anex:0 FA:0
ORIGEN JORGE ISAAC VELASQUEZ
DESTINO 80704-GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SUCRE / MARTHA BARROS PEDROZO
ASUNTO DENUNCIA EN CONTRATO DE OBRA N° MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBS DENUNCIA EN CONTRATO DE OBRA N° MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSO CALLE LARGA- MUNICIPIO DE COLOSO DPTO SUCRE
2021ER0038945

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REAFIRMACIÓN APLICACIÓN MULTA**

Cordial saludo,

Esta interventoría reafirma lo ratificado mediante comunicación de 25 de enero de 2021, mediante el cual se solicitó la aplicación de multa, -contra el CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Miranda Vergara-, debido al incumplimiento parcial reiterado e incremental, de sus obligaciones contractuales para con el municipio de Colosó, y, de acuerdo al último corte de obra, presenta un atraso de ejecución de obra equivalente al 52,67 %.

Previamente al requerimiento del apremio, la interventoría requirió al contratista, mediante los oficios relacionados a continuación, con la finalidad de actualizar, plantear y acordar medidas conjuntas, como medida resarcitoria ante el ente contratante y poder terminar los trabajos dentro del plazo acordado.

A continuación, se presenta relación de comunicaciones emitidas por parte de la interventoría, donde se expone la información y argumentación demostrativa, del incumplimiento parcial por parte de la firma constructora de las obras del contrato No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE, razones por las cuales esta interventoría, solicitó a esta alcaldía aplicar el apremio correspondiente, ante el incumplimiento contractual por parte de la firma constructora.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

Escaneado con CamScanner
