CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020





NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10

PERIODO DEL 01 al 30 DE JUNIO DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciosantander2019@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORME MENSUAL NO. 10 **MES O PERIODO:** JUNIO 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**			X	6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**			X	7
2.1	Localización			X	9
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	10
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**			X	12
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**			X	18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		50
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		52
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		54
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		56
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		58
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		60
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		62
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		64
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		66
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		69
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra			X	20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		72
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		75
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	21
5.1	Información general del contrato			X	21
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	22
5.3	Informes especialistas			X	23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	23

5.5	Información otros programas y aplicativos			X	23
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	23
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		86
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		88
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		90
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		92
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		94
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		97
6.7	Otros documentos seguimiento mensual			N/A	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**			X	26
8	**Anexos**		X		27
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		27
8.2	Registro fotográfico		X		28
8.3	Bitácora de obra		X		36
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1 Localización 7

2.2 Estado inicial de la Vía 9

2.3 Características Técnicas del Proyecto 10

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

3.1 Información general del contrato de obra 12

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 13

3.3 Seguimiento ítems no previstos 15

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 17

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto 17

4.2 Maquinaria y equipo del contrato 17

4.3 Personal del contrato de obra 17

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra 17

4.5 Estado general del tiempo 17

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 17

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 18

4.8 Informe avance físico financiero 18

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 18

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 18

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra 18

4.12 Seguimiento a la programación de obra 18

4.13 Seguimiento programa de inversiones 19

4.14 Actas comité de obra 19

4.15 Acta reunión 19

4.16 Informe semanal 19

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

5.1 Información general del contrato de interventoría 20

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 21

5.3 Informes especialistas 22

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 22

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.1 Equipo contrato de interventoría 23

6.2 Personal contrato de interventoría 23

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 23

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 23

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría 23

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 23

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo 24

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 25

8. ANEXOS 26

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. 26

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras. 27

8.3 Bitácora de obra. 35

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de $685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de $1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE",** con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10 correspondiente al periodo del mes de JUNIO del 2021, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.

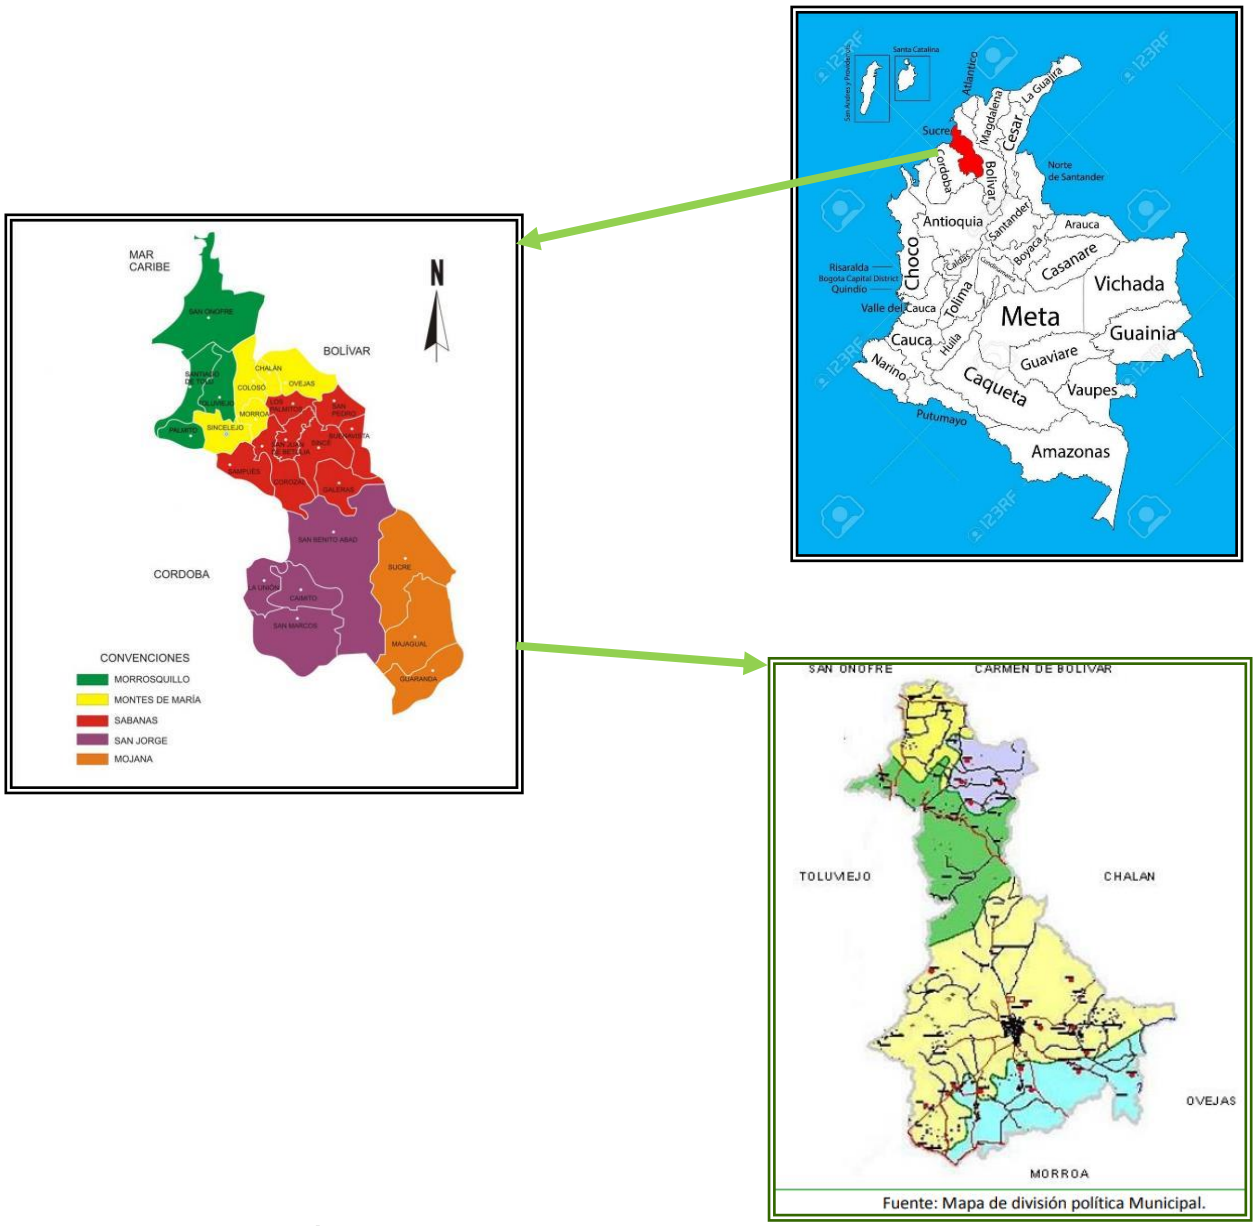


Figura. 1 Localización general del proyecto
Fuente: (INFOGRAFÍA DE INTERNET)

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9º 35' de latitud Norte, 9º 26' de latitud sur; 75º 22' longitud este y 75º 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km2, -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

.

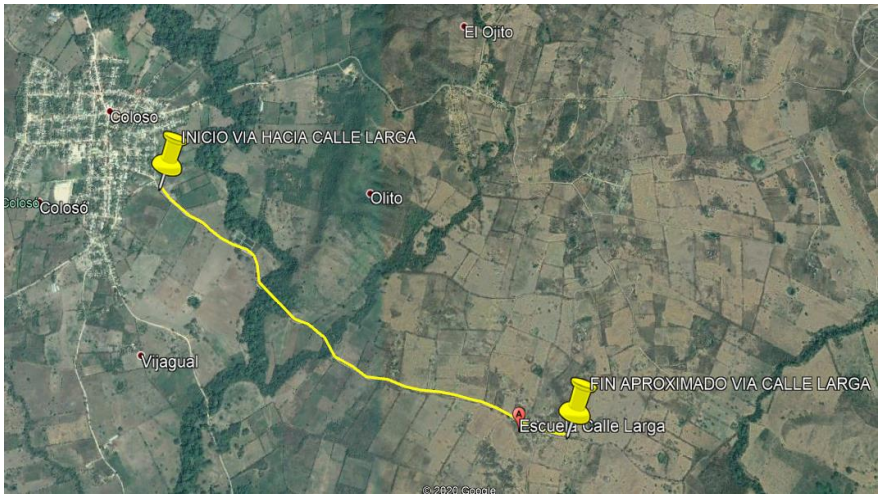


Figura. 2 Localización Vía Vereda Calle Larga
Fuente: Google Earth

2.2 Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598
		TOTAL	1280

TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.

- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.

- El manejo de drenaje para este este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.

- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

La vía a pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- Socialización de los trabajos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento inicial	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
Prórroga No. 2	Treinta (30) días
Prórroga No .3	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de terminación actualizada	8 de agosto de 2021
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	$ 1.055.799.942,50
Residente de Obra	JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Director de Obra	MAGIER ALDAI DUPPERLEY

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

OBRA

En el mes de junio, el consorcio contratista realizó las siguientes actividades de obra:

- Excavaciones varias sin clasificar en el tramo 2 y 3
- Fundición de losas en concreto de 3000 psi en el tramo 3 de la vía.
- Fundición de vigas riostras en concreto de 21 MPA para el tramo 3 de la vía.
- Instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, losas, bordillos y cunetas en el tramo 3.
- Fundición de placas de concreto ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pegada en el tramo 3 de la vía.
- Transporte de materiales para la construcción del box-culvert contemplado en el contrato de referencia.
- Excavaciones sin clasificar para la construcción del box – culvert.
- Fundición de elementos en concreto tales como losas y vigas riostras en concreto hidráulico en el tramo 2.
- Fundición de elementos en concreto reforzado para el box-culvert.
- Instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, cunetas, losas y bordillos en el tramo 2 de la vía.

En el mes de junio, el contrato de obra de referencia presenta un avance en obras que se detalla de la siguiente forma:

En el tramo 1 de 298 metros lineales, el contratista lleva una ejecución de 50 metros lineales aproximadamente; el box – culvert se encuentra en construcción – durante este mes, el contratista fundió gran número de los elementos que conforman esta estructura y se encuentra prácticamente terminado. En el tramo 2 de la vía, se muestra un avance ejecutado de 72 metros lineales, faltando la fundición de cunetas y bordillos; para el tramo 3, se llevan 310 metros lineales aproximadamente en construcción de placa huella. Finalmente, los tramos 3” y 4 tienen 70 metros lineales y 500 metros líneas construidos en placa huella, respectivamente, faltando en estos dos últimos la instalación de sello asfaltico.

En la tabla 2, se puede observar el porcentaje de avance de cada uno de los tramos que conforman la placa huella.

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	16.7%
TRAMO N°2	72 ml	60%
TRAMO N°3	340 ml	91%
TRAMO N°3”	70 ml	97%
TRAMO N°4	500 ml	97%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	70%

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de junio.

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS HASTA JUNIO		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT								
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,60	$ 26.127,00	$ 668.851,20	25,60	$ 668.851,20	0,00	0%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8,40	$ 46.897,00	$ 393.934,80	0,00	$ -	0,00	0%
1.3	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	m3	17,50	$ 491.409,00	$ 8.599.657,50	17,50	$ 8.599.657,50	17,50	208%
1.4	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	m3	1,40	$ 402.347,00	$ 563.285,80	1,40	$ 563.285,80	1,40	8%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1.565,00	$ 4.879,00	$ 7.635.635,00	1565,00	$ 7.635.635,00	1565,00	111786%
				SUBTOTAL	$ 17.861.364,30	SUBTOTAL	**$ 17.467.429,50**		
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,40	$ 26.127,00	$ 6.019.660,80	272,10	$ 7.109.156,70	272,10	118%
2,2	Subbase Granular Clase C	m3	960,00	$ 114.944,00	$ 110.346.240,00	960,00	$ 110.346.240,00	960,00	100%
2,3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21Mpa)	m3	652,80	$ 570.922,00	$ 372.697.881,60	346,56	$ 197.858.728,32	346,56	53%
2,4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320,00	$ 330.557,00	$ 105.778.240,00	246,96	$ 81.634.356,72	246,96	77%
2,5	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281,60	$ 487.978,00	$ 137.414.604,80	326,993	$ 159.565.390,15	326,99	116%
2,6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	51.072,00	$ 4.879,00	$ 249.180.288,00	37935,18	$ 185.085.743,22	37.935,18	74%
2,7	Sello Asfaltico para Juntas	m	13.658,00	$ 2.301,00	$ 31.427.058,00	0,00	$ -	0,00	0%
				SUBTOTAL	$ 1.012.863.973,20	SUBTOTAL	**$ 741.599.615,11**		
TOTAL					**$ 1.030.725.337,50**	$	759.067.044,61		

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

INTERVENTORIA

La interventoría desarrolló las siguientes actividades en el mes de junio:

- Seguimiento y control a las actividades de obra realizadas por el contratista, con el objetivo de verificar que estas cumplan con las especificaciones técnicas de los diseños aprobados y calidad exigida por el Instituto Nacional de Vías.
- Solicitud al contratista de resultados de ensayos de laboratorio.
- Visitas y recorridos técnicos en la vía, para corroborar la correcta ejecución de los trabajos y hacer acompañamiento al contratista en la realización de las obras de pavimentación en búsqueda de buenos resultados constructivos.
- Solicitud a la entidad contratante, de dar trámite a la prórroga N° 3 por término de 45 días, solicitada por el CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ.
- Solicitud al consorcio contratista del balance de obra y copia APUS del contrato de referencia con el objetivo de realizar un análisis detallado de la inversión programada y ejecutada a la fecha.
- Seguimiento al cumplimiento e implementación de protocolo de bioseguridad contra la propagación del virus COVID – 19, implementación de elementos de protección personal y elementos de emergencia.
- Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal vinculado en la ejecución de las obras.
- Solicitud al consorcio contratista de entrega reprogramación de los trabajos, plan de contingencia y flujo de caja semanal en Excel actualizados.
- Derecho de petición a la entidad contratante alcaldía de Colosó para entrega de información de documentos correspondientes a prórroga N° 2 Y N° 3 del contrato de obra del municipio de Colosó – Sucre.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No aplica, ya que aún no se tienen ítems no previstos para tramitar.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Actualmente, el contrato de obra N° LP-085-2020 muestra una inversión del 71.89% del valor total del contrato; lo que indica, que para la terminación total de las obras faltaría ejecutar un 28.11% de la valía total del contrato. La interventoría solicitó al contratista entregar la nueva reprogramación de obras y flujo de caja semanal de las obras, teniendo en cuenta, la aprobación de prórroga n°3 de la alcaldía de Colosó al contrato de referencia por término de 45 días, para la entrega total de las obras, con una fecha establecida el día 8 de agosto de 2021.

En comité técnico realizado el día 22 de junio de 2021, con la participación del ingeniero Álvaro García residente de interventoría, ingeniero Jorge Velázquez director de interventoría, William Felipe Gutiérrez gestor técnico de INVIAS e ingeniero Luis Miguel González Ozuna , supervisor del contrato de interventoría por parte de INVIAS.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo del 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 2**

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 4**

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 5.**

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021**. Ver anexo 6**

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 9**

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 10**

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, a la fecha de este informe se desembolsado el 30% del valor total, que corresponde a $117,412,221.

4.12 Seguimiento a la programación de obra

El contratista presenta un avance del 71.89% del valor total del contrato. A la fecha no existe programación considerando el nuevo plazo de entrega de las obras establecido por la entidad contratante. La interventoría ha solicitado al contratista reprogramación de las obras, flujo de caja semanal y plan de contingencia actualizado teniendo en cuenta la prórroga N° 3 por término de 45 días.

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

4.14 Actas comité de obra

Se realizó acta de comité de obra el día 22 de junio de 2021 con el objetivo de hacer seguimiento semanal al contrato de obra del municipio de Colosó – Sucre. Se levantó acta con detalles y desarrollo de la reunión. **Ver anexo 11**

4.15 Acta reunión

N. A. En este mes no se realizaron actas de reunión.

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de junio al 30 de junio de 2021. **Ver anexo 12**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Prorroga No. 2	Tres (3) meses
Fecha terminación actualizada	30 de junio de 2021
Valor Total Contrato	$ 685.270.884
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A través de OFICIO N° 294 2021 CIU / COLOSÓ de fecha 2 de junio de 2021; la interventoría respondió a oficio OFI 047 OH COLOSÓ DE 31 MAYO DE 2021 a CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ, invitando al consorcio contratista a redoblar esfuerzos técnicos, económicos, de personal y logísticos que redunden positivamente y hagan entrega de las obras en la fecha establecida por el municipio de Colosó – Sucre.

Mediante OFICIO N° 296 2021 CIU/COLOSÓ de fecha 3 de junio de 2021, la interventoría informó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/Ñ GREYS MIRANDA VERGARA , que a través de la inspección realizada a cargo de la SST por parte de interventoría se observó que el personal vinculado a las obras no cuentan con lo elementos de protección personal adecuados y manifestaron no haber recibió la dotación apropiada para la realización de las actividad; por tanto, la interventoría solicitó al contratista reposición y dotación respectiva de EPP, así como la implementación de medidas COVID-19.

La interventoría mediante OFICIO N° 299 2021 CIU/COLOSÓ de 10 de junio de 2021, solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS MIRANDA VERGARA remitir resultados de las densidades de la subbase colocada en el tramo 2 de la vía, con la finalidad de constatar que están dando cumplimiento a las calidades de densificación exigida, además de requisito para autorización de colocación de concreto hidráulico.

Mediante OFICIO N° 306 2021 CIU/COLOSÓ de 18 de junio de 2021 la interventoría, fundamentado en el oficio OFI 49 PH COLOSÓ de 17 de junio de 2021 enviado por parte del contratista, solicitó al alcalde municipal de Colosó Sucre, señor Isaías Javier Díaz Barrios tramitar prórroga N° 03 por término de 45 días calendario, a partir del 24 de junio de 2021 para el contrato de obra No. MM-LP-OP-085-2020, consideran válidos los motivos expresados por el contratista que han incidido negativamente en la ejecución continúa de las obras civiles. Además de esto, recomendó al municipio de Colosó Sucre, que dentro del documento de la prórroga N° 03 exija a la firma constructora presentar plan de contingencia, reprogramación de los trabajos y flujo de caja semanal en Excel.

A través de OFICIO N° 311 2021 CIU/ COLOSÓ de 23 de junio de 2021; la interventoría solicitó al consorcio contratista actualizar plan de contingencia, reprogramación de los

trabajos y flujo de caja semanal en Excel, teniendo en cuenta la prórroga contractual solicitada por término de 45 días.

La interventoría mediante OFICIO N° 315 2021 CIU/COLOSÓ de fecha 24 de junio de 2021; solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ balance de obras del contrato referenciado para un análisis mas detallado por parte de la interventoría APU´S del contrato original y APU´S de ítems no previstos.

La interventoría a través de OFICIO N° 323 2021 CIU/COLOSÓ de 28 de junio de 2021, debido a que de manera informal se ha solicitado a la alcaldía de Colosó por conducto de la secretaria de planeación allegar información acerca de copia de otro sí N° 2 y N° 3 con copias de las pólizas actualizadas y su respectiva aprobación , sin a la fecha recibir respuesta, por lo que en fundamento en el artículo 23 de la constitución política de Colombia, solicitó al señor alcalde mediante derecho de petición dicha información.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente informe, no se requirió concepto de los especialistas para este contrato.

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de junio al 30 de junio 2021.**Ver anexo 15**

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de junio al 30 de junio 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de junio al 30 de junio 2021. **Ver anexo 17**

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de junio al 30 de junio 2021. **Ver anexo 18**

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticipo).

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. La interventoría solicita al consorcio contratista entregar resultados de laboratorio con carácter urgente de los elementos de placa huella fundidos en el tramo 3 de la vía y densidades en campo de la subbase instalada en el tramo 2.

2. La interventoría solicita al contratista flujo de caja semanal en Excel, reprogramación de los trabajos y plan de contingencia actualizados, teniendo en cuenta el plazo adicional de 45 días calendario solicitado por el consorcio contratista.

3. La interventoría solicita al contratista con carácter urgente entregar al personal vinculado a las obras la dotación apropiada de EPP para la ejecución de los trabajos, así como la implementación de protocolo de bioseguridad contra la propagación del virus COVID -19.

4. La interventoría solicita a la entidad contratante entregar con carácter urgente, documentos administrativos de otro sí N° 1 Y N° 2, pólizas actualizadas y aprobación de pólizas.

5. La interventoría continuará realizando el control técnico y administrativo del contrato de obra N° LP- 085-2020.

6. La interventoría mantendrá informado al ente contratante e INVIAS del estado de avance del contrato referenciado y las acciones a tomar por parte de la interventoría, con el fin de que las obras de pavimentación se realicen con la calidad deseada y se cumpla con los compromiso pactados del contratista al municipio de Colosó – sucre.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido.
Se presentan como archivos adjuntos la relación de correspondencia durante el mes de junio entre interventoría – entidad contratante e interventoría – contratista. **Ver anexo 19.**

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA				
FECHA	REFERENCIA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
02/06/2021	OFICIO N° 294 2021 CIU/COLOSÓ	RESPUESTA A SU OFICIO OFI 047 PH COLOSÓ DE 31 MAYO DE 2021	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
03/06/2021	OFICIO N° 296 2021 CIU/COLOSÓ	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SST.	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
10/06/2021	OFICIO N° 299 2021 CIU/COLOSÓ	REMISIÓN ENSAYOS DENSIDADES SUBBASE TRAMO 2	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
18/06/2021	OFICIO N° 306 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD Y TRAMITE DE PRORROGA N° 03	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ -SUCRE
23/06/2021	OFICIO N° 311 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
24/06/2021	OFICIO N° 315 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD REMISIÓN BALANCE GENERAL CONTRATO, APUS DEL CONTRATO Y APUS DE ITEMS NO PREVISTOS	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
28/06/2021	OFICIO N° 232 2021 CIU/COLOSÓ	DERECHO DE PETICION PARA ENTREGA DE INFORMACION	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ -SUCRE

8.2 Registro fotográfico del avance de obras.



1. Foto: Avance de obra tramo 3.



2. Foto: Excavaciones varias sin clasificar para el box – culvert.



3. Foto: Trabajos de pavimentación placa huella tramo 3 de la vía.



4. Foto: Trabajos de pavimentación placa huella tramo 3 de la vía.



5. Foto: Fundición de bordillos en concreto de 21 MPA, tramo 3.



6. Foto: Recorrido técnico con Gestor INVIAS, manejador de GESPROY.



7. Foto: Instalación de acero de refuerzo placa huella



8. Foto: Fundición de placas en concreto ciclópeo.



9. Foto: Inicio suministro y compactación de subbase granular tramo 1.



10. Ensayo toma de densidades en el terreno – tramo 1.



11. Foto: Construcción Box – Culvert.



12. Foto: Construcción box – culvert.



13. Foto: fundición de placas en concreto hidráulico de 3000 psi – tramo 1



14. Foto: fundición de placas en concreto hidráulico de 3000 psi – tramo 1




15. Foto: Fundición de placas en concreto ciclópeo. tramo 1



16. Foto: Fundición de placas en concreto ciclópeo. tramo 1

8.3 Bitácora de obra.

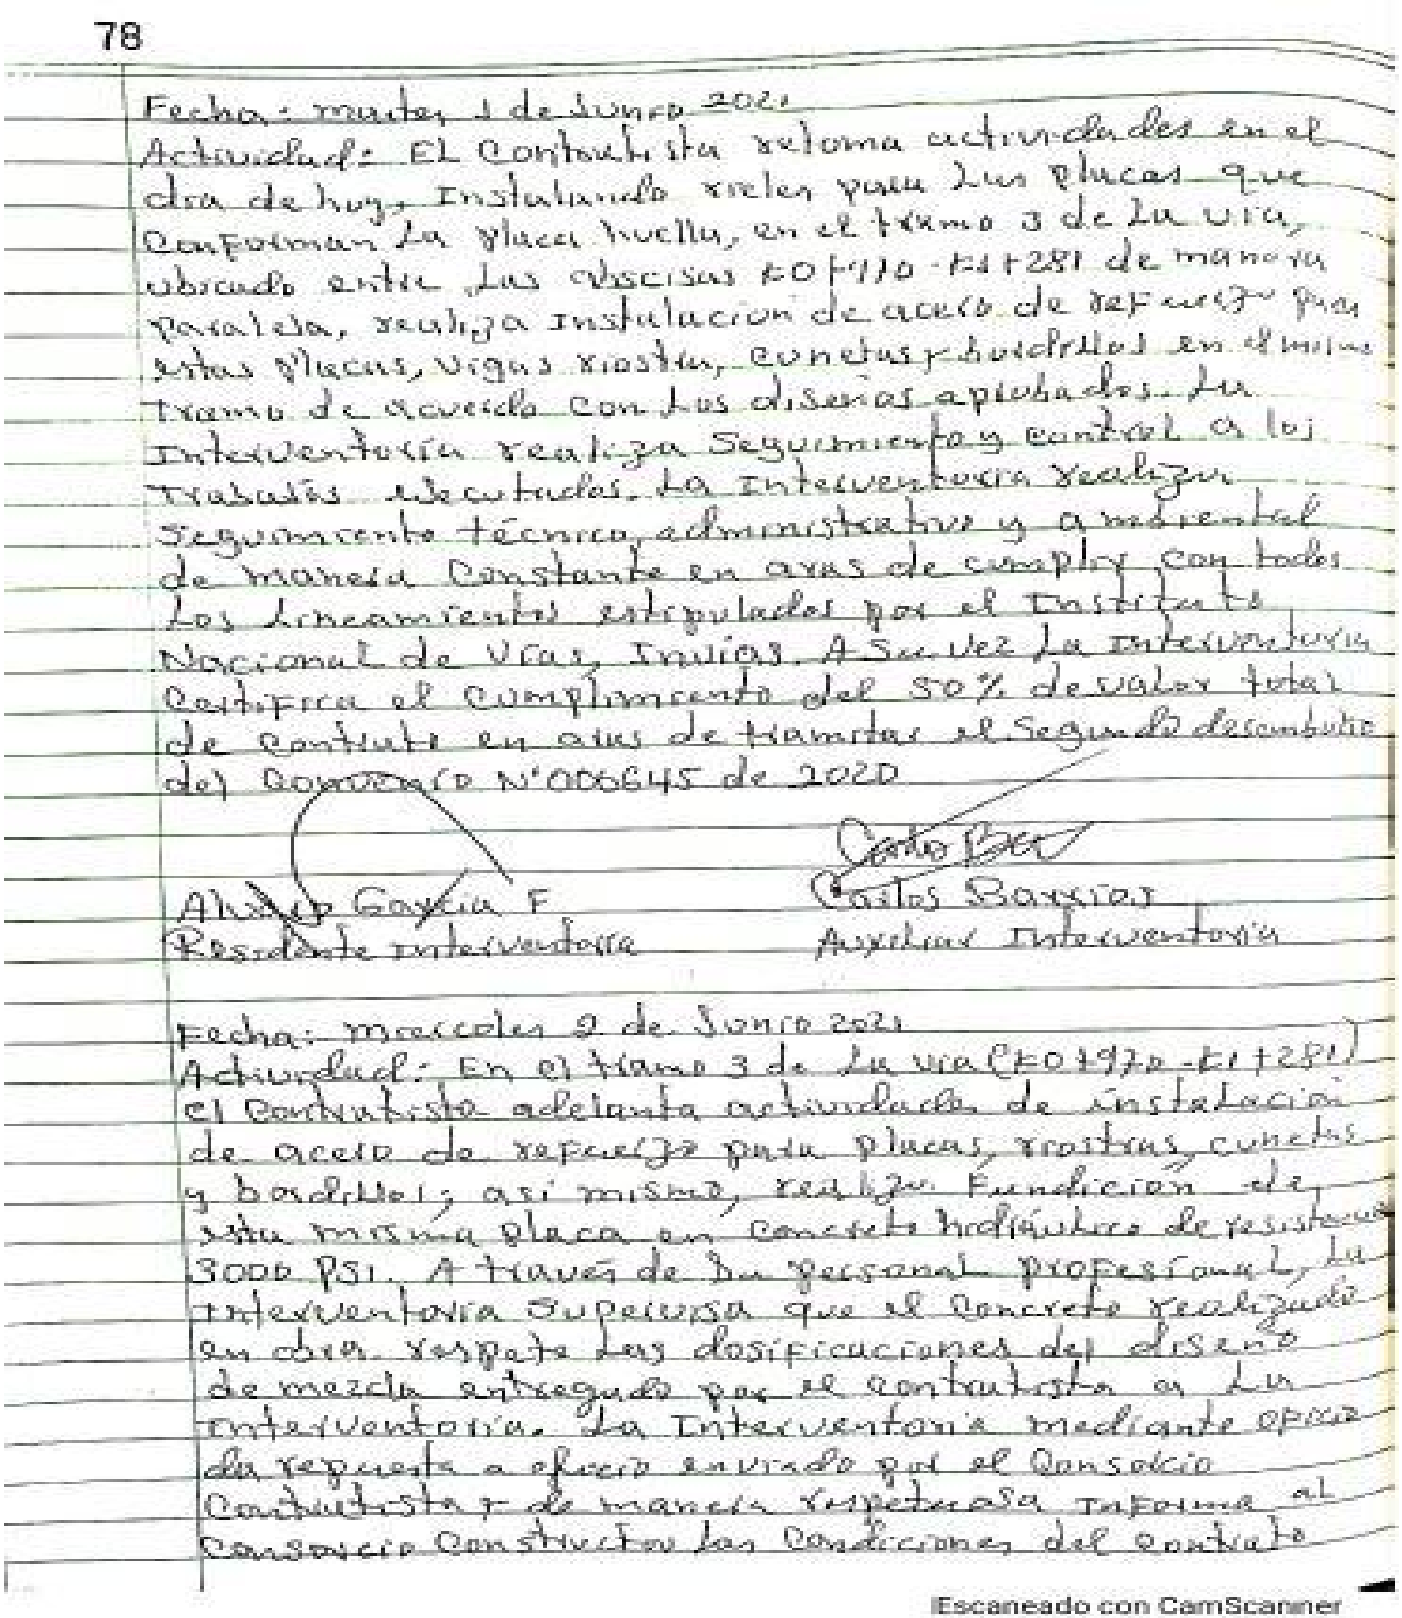

78

Fecha: martes 1 de Junio 2021
Actividad: El Contratista retoma actividades en el dia de hoy. Instalando reles para las placas que conforman la placa huella, en el tramo 3 de la via, ubicado entre las abscisas K0+770 - K1+281 de manera paralela, realiza instalacion de acero de refuerzo para estas placas, vigas riostras, cunetas y bordillos en el mismo tramo de acuerdo con los diseños aprobados. La Interventoria realiza Seguimiento y control a los trabajos ejecutados. La Interventoria realiza Seguimiento técnico, administrativo y ambiental de manera Constante en aras de cumplir con todos los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Vias, Invias. A su vez la interventoria Certifica el cumplimiento del 50% de valor total de contrato en aras de tramitar el Segundo desembolso del Convenio N°000645 de 2020

Ahyde Garcia F
Residente interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 2 de Junio 2021
Actividad: En el tramo 3 de la via (K0+770 - K1+281) el Contratista adelanta actividades de instalacion de acero de refuerzo para placas, riostras, cunetas y bordillos; asi mismo, realiza Fundicion de una misma placa en concreto hidraulico de resistencia 3000 PSI. A traves de su personal profesional, la interventoria supervisa que el Concreto realizado en obra respete las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista a la interventoria. La Interventoria mediante oficio de respuesta a oficio enviado por el Consorcio Contratista y de manera respetuosa informa al Consorcio Constructor las condiciones del contrato

Escaneado con CamScanner

en referencia, las cuales la interventoría ha sido clara y concisa que el desperdicio de tiempo atmosferico varios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre que fueron los causales de originarse el atraso acumulado hasta la fecha por ende, reconocemos que existen precipitaciones constantes en la zona de ejecución del Proyecto pero no es obice para que no cumplan con los tiempos contractuales.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 3 de Junio 2021
Actividad: En el dia de hoy, el Consorcio Constructor Iturria con el Suministro e instalación de material de Subbase granular Tipo C, en el tramo 2 de la via ubicado entre las abscisas K0+391 - K0+499, de manera simultánea en el Tramo 3 se continua con la instalación de acero de refuerzo para vigas riostras y Placas; y Fundición de cunetas y bordillos en concreto reforzado de 3000 PSI. La interventoría le solicita al constructor, tomar las muestras y realizar ensayos de resistencia a compresión, con el Fin de verificar la calidad del material instalado y su resistencia ultima.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 4 de Junio 2021
Actividad: En la via Roloso - Vereda calle larga, el contratista realiza actividades de excavaciones varias sin clasificar para viga riostra, cunetas y bordillos en el tramo 3 (K0+970 - K1+281); Simultaneamente instala acero de refuerzo en la excavaciones realizadas

Escaneado con CamScanner

de acuerdo con las especificaciones técnicas de los diseños aprobados.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoria

Fecha: Sabado 5 de Junio 2021
Actividad: El Contratista Funde placa, cunetas y bordillos en el tramo 3 de la Via, ubicado entre las abscisas K0+970 - K1+281 en concreto hidráulico con resistencia de 3000 psi. La Interventoria le solicita al contratista tomar los cilindros, realizar ensayo de resistencia a compresión y remitir los resultados a la Interventoría, con el objetivo de verificar la calidad del concreto instalado, y que este último cumpla con la resistencia requerida para la estructura de placa huella.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoría

Fecha: domingo 6 de Junio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, ya Sea un día no laboral de acuerdo con la programación de obra, entregada por el contratista a la Interventoría.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 7 de Junio 2021
Actividad: En el lugar de las obras Se ejecuta Fundición de placas en placas en concreto de 21 MPA y paralelamente Fundición de placas de ciclópeo en Concreto hidráulico y piedra pegada en una

Escaneado con CamScanner

Proporción 60% y 40% respectivamente en el tramo 3 de la vía. La Interventoría supervisa que el concreto realizado en obra, cumpla con las clasificaciones de los diseños de mezcla entregados por el contratista.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: martes 8 de Junio 2021
Actividad: El contratista realiza excavaciones varias sin clasificar para la construcción del box-culvert, ubicado en la abscisa K1+956; de manera simultánea ejecuta Fundición de losas en concreto hidráulico de 21 MPA, losas en concreto hidraulico y piedra pegada en el tramo 3 de la vía e instalación y armado de acero para vigas riostras según las especificaciones técnicas de los diseños entregados por el contratista y aprobado por la Interventoría.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: miercoles 9 de Junio 2021
Actividad: En el dia de hoy se realizo recorrido técnico al eje vial con la presencia del Gestor de INVIAS, ingeniero William Felipe Gutierrez, manejador de GESPROY y acompañamiento del residente de interventoría, para chequear los avances y contemplar la ejecución de los trabajos del contrato de referencia. El contratista en el lugar de los trabajos realiza Fundición de placas en concreto hidráulico de 21 MPA, Fundición de placas de ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente, e instalación de acero de refuerzo para placas de acuerdo con las especificaciones técnicas de los diseños aprobados para el tramo 3 de la vía

Escaneado con CamScanner

Ubicado entre las abscisas K0+970 - K1+250.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 10 de Junio 2021
Actividad: El contratista continua con Fundicion de Placas en concreto reforzado de resistencia 3000 PSI y Fundicion de losas en concreto ciclopeo en el tramo 3 de la via. La Interventoria realiza control tecnico de las obras ejecutadas en ejecucion, de manera que estas cumplan con la calidad y lineamiento estipulados por el Instituto Nacional de Vias para este tipo de obras. A traves de oficio la Interventoria le solicita al consorcio contratista, remitir ensayo de densidad de la Subbase instalada en el tramo 2 de la via, para verificar la calidad de compactacion exigida por INVIAS y poder proceder con las actividades posteriores a la instalacion del material granular de subbase.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 11 de Junio 2021
Actividad: El contratista realiza actividades para la Construccion del box - culvert ubicado en la abscisa K1+950, instalando concreto de solado y armado de acero de la estructura, de acuerdo con las especificaciones tecnicas de los diseños aprobados. La Interventoria realiza acompañamiento y control de la ejecucion de los trabajos, con el Fin de que se realice de manera correcta, cumpliendo con los lineamientos establecidos por INVIAS.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 12 de Junio 2021
Actividad: El Contratista inicia Fundicion en concreto hidraulico de elementos que conforman la estructura de box-culvert con Seccion de 2 metros x 1 metro, que se ubica en la abscisa K1+950; posterior a la actividad, continua con el armado de acero de refuerzo para esta estructura. En el tramo 3 de la via, de manera simultánea, ejecuta excavaciones varias sin clasificar e instalacion de acero de refuerzo para vigas.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: domingo 13 de Junio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, al ser un dia no laboral de acuerdo con la Programacion de obra, entregada por el contratista a la interventoria.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 14 de Junio 2021
Actividad: El contratista prosigue con el armado e instalacion de acero de refuerzo para el box-culvert ubicado en la abscisa K1+950 Siguiendo las Especificaciones tecnicas de los diseños aprobados por la interventoria Simultáneamente, en el tramo 2 (K0+391 - K0+499) y 3 (K0+970 - K1+281) Se realiza excavaciones Varias Sin Clasificar para Vigas riostras.

Escaneado con CamScanner

Alvaro García F.
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: martes 15 de junio 2021
Actividad: En el día de hoy, el contratista funde en concreto faltante elemento del box-culvert. La interventoría verifica que el concreto realizado en obra cumpla con las especificaciones del diseño de mezcla entregado por el Contratista. De manera paralela, en el tramo 3 de la vía, se adelanta fundición de vigas riostras en concreto de 21 MPA. La Interventoría le solicita al Contratista, tomar las muestras correspondientes del concreto instalado y realizar ensayos de resistencia a compresión, con el fin de verificar la calidad y resistencia del material instalado. En el tramo 1 de la vía, se realiza suministro, instalación y compactación de material granular de Subbase Tipo C.

Alvaro García F.
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: miercoles 16 de junio 2021
Actividad: En el lugar de las obras se realiza en el tramo 3 de la vía Coloso-vereda Calle Larga, fundición de vigas riostras en concreto reforzado con resistencia de 3000 PSI. La Interventoría solicita al consorcio contratista, remitir resultados de ensayo de resistencia a la compresión de los elementos fundidos de la placa huella con el objetivo de verificar la resistencia de la estructura.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 17 de Junio 2021
Actividad: Se realiza Fundicion de huellas de concreto ciclopeo en piedra rasoñ y concreto hidraulico y Fundicion de vigas riostras en concreto de 21 MPA para el tramo 3 ubicado entre las abscisas K0+970-K1+281 de la via Coloso - Vereda Calle Larga en el municipio de Coloso - Sucre.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 18 de Junio 2021
Actividad: El contratista realiza excavaciones Varias sin Clasificar en los tramos 2 y 3, instalacion de acero de refuerzo para cunetas, bordillos y riostras en el tramo 3 y Fundicion de vigas en el tramo en concreto reforzado clase D. La Interventoria realizo control técnico, administrativo, Ambiental. La Interventoria Solicita al contratista entregar reprogramacion de los trabajos y Flujo de caja Semanal, Considerando las prorrogas aprobadas por la entidad Contratante.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 19 de Junio 2021
Actividad: El contratista continua con la Fundacion de vigas riostras, cunetas y bordillos en concreto reforzado de 3000 PSI en el tramo 3 de la via. La interventoria realiza Seguimiento técnico administrativo y ambiental

Escaneado con CamScanner

de manera constante en aras de cumplir con todos los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Vias - Invias.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: domingo 20 de Junio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, al ser un dia no Laboral de acuerdo con la Programacion de obra, entregada por el contratista a la Interventoria.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 21 de Junio 2021
Actividad: En el dia de hoy se realiza colocacion de rieles para las placas en el tramo 2 de la via ubicado entre las abscisas K0+391 - K0+499; posterior a esta actividad, el Constructor ejecuta instalacion y armado de acero de placas y vigas riostras en el mismo Tramo, Segun las especificaciones técnicas de los diseños entregados por el Contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 22 de Junio 2021
Actividad: Continua instalacion y armado de acero de refuerzo para vigas riostras y placas en el tramo 2 de la via entre la abscisas K0+391 - K0+499; y Simultaneamente realizan excavaciones varias Sin

Escaneado con CamScanner

Clasificar para vigas rioscas en el tramo mismo. paralelamente inicia con Fundicion de Placas en concreto reforzado de 3000 PSI en el tramo 2. Mediante OFICIO, la Interventoria Solicita a la Alcaldia de Coloso, Iniciar Tramite de Prorroga N°3 al contrato de obra LP-OBS-2020 por término de 45 dias calendario a partir del dia 24 de Junio.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Miercoles 23 de Junio 2021
Actividad: prosiguen las actividades en el tramo 2 de la via ejecutando Fundicion de placas en concreto reforzado de 21 MPA. La Interventoria verifica la ejecucion de los trabajos de manera tal, que estos sigan los lineamientos estipulados por INVIAS, y respeten las especificaciones tecnicas de los diseños aprobados por la Interventoria.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 24 de Junio 2021
Actividad: En el dia de hoy, el consorcio constructor realiza Fundicion de placas de concretos ciclopeo en concreto hidraulico y piedra pegada, en una proporcion 60% y 40% respectivamente. La Interventoria le solicita al contratista Tomar los cilindros de concreto, realizar ensayo de resistencia a la compresion y remitir los resultados a la Interventoria, con el objetivo de corroborar la Calidad y resistencia del concreto instalado. A través de oficio. La Interventoria solicita al consorcio contratista remitir balance de obra del contrato de referencia. Con el Fin de hacer un analisis detallado

Escaneado con CamScanner

de este; también responde comunicación por parte del Contratista OFI 45 PH coluso de 17 de Junio, donde le informa que la interventoría ya requirió al municipio de Coluso Sucre, olar tramite a la prórroga Solicitada por el Consorcio placa HUELLA COLUSO y Solicito documentos que oficialice la adición en tiempo del contrato, con el Fin de Finiquitar los trabajos pendientes.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 25 de Junio 2021
Actividad: El contratista continúa con las actividades en el tramo 2 de la via (KO+391-KO+499); en el dia de hoy, realiza armado e instalación de acero de refuerzo de placas y viga riostras, Según las especificaciones técnica de los diseños aprobados; Simultáneamente Funde placas en concreto reforzado de 3000 PSI en este mismo tramo.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 26 de Junio 2021
Actividad: En el tramo 2 (KO+391-KO+499, continúa Fundición de placas en Concreto reforzado de 3000 PSI. La Interventoria realiza visitas constantes a obra con el objeto de hacer acompañamiento al contratista y control en la ejecución de los trabajos, de manera de que estos se realicen de la mejor manera Cumpliendo con los Lineamientos y calidades estipuladas por INVIAS.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoria

Fecha: domingo 27 de Junio 2021
Actividad: No se realizan actividades en el dia de hoy, al ser no laboral, teniendo en cuenta la programacion de los trabajos entregada por el contratista.

Alvaro Garcia F
Residente interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoria

Fecha: Lunes 28 de Junio 2021
Actividad: Se realiza en el dia de hoy en el lugar de las obras, tramo 2 de la via ubicada entre las abscisas K0+390 - K0+499, Fundicion de placas en concreto hidraulico de 21 MPA. Paralelamente el constructor ejecuta excavaciones varias sin clasificar para vigas riostras en este mismo tramo.

Alvaro Garcia F
Residente interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoria

Fecha: martes 29 Junio 2021
Actividad: El contratista ejecuta Fundicion de huellas de concreto ciclopeo en concreto hidraulico y piedra pegada, en una proporcion 60% y 40% respectivamente, en el tramo 2 de la via colosó - vereda calle larga en el municipio de Colosó Sucre.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: miercoles 30 Junio 2021
Actividad: Continua la Fundicion de placas de concreto hidraulico y piedra pegada en el tramo 2 de la via (K0+391-K0+499); a traves de su personal profesional y mediante visitas constantes a obra, la Interventoria Supervisa que el concreto realizado en obra cumpla con las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista a la Interventoria.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 10	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: LP – 085 – 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 10/09/2020
FECHA DE REANUDACION N°2: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.055.799.942,50
VALOR ACUMULADO: $ 1.055.799.942,50
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 117.412.221,00

PLAZO ACUMULADO: 11 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: N/A
VALOR ADICIÓNALES: N/A
AMORTIZACION ANTICIPO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Ml	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Ml	850
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 213.074.903	$ -	$ 213.074.903	-	$ 69.096.129	1,000	0,32
Acumulado:	1.055.799.943	$ 759.067.045	$ -	$ 759.067.045	0,72	$ 605.772.645	1,000	0,80

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	$ 1.055.799.942,50

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,72	10,00	1,05	1,00	296.732.898	0	1.055.799.943	-
Interventor:	0,88	10,00	1,00	0,00	79.498.239	0	79.498.239	79.498.239

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	10/12/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	10/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	10/08/2024
Calidad de Estudios y Diseños	12/04/2021	12/04/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	12/04/2021	12/04/206

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	10/08/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 28/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

EL ENTE CONTRATANTE A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HA CITADO A AUDIENCIA AL CONSORCIO CONTRATISTA POR LA SOLICITUD DE APREMIO REALIZA POR LA INTERVENTORÍA, MOTIVADA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO CONTRATISTA PARA CON EL MUNICIPIO DE COLOSÓ SUCRE

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°294 2021 CIU / COLOSO CON FECHA 2 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO OFI047 PH COLOSO DE 31 DE MAYO DE 2021", DA RESPUESTAL AL OFICIO EN ASUNTO Y DE MANERA RESPETUOSA INFORMA AL CONSORCIO CONSTRUCTOR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN REFENRENCIA, LAS CUALES LA INTERVENTORÍA HA SIDO CLARA Y CONSISA QUE EL DESPECIO DE TIEMPO ATMOSFERICO VALIOSO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICEMBRE, QUE FUERON LOS CAUSALES DEL ORIGINARSE EL ATRASO ACUMULADO HASTA LA FECHA POR ENDE , RECONOCEMOS QUE EXITEN PRECIPITACIONES CONSTANTES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO PERO NO ES OBICE PARA QUE NO CUMPLAN CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°299 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO " REMISION ENSAYOS DENSIDADES SUBBASSE TRAMO 2" LE SOLICITA AL CONSORCIO CONSTRUCTOR LE HAGA LLEGAR EN TERMINO DE INSTANCIA , LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES DE LA SUBBASE GRANULAR COLOCADA EN EL TRAMO 2 EN ARAS DE VEELAR CON LAS CALIDAD DE COMPACTACION EXIGIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PARA PROCEDER A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA INSTALACIÓN DE LA SUBBASE GRANULAR TIPO C.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°306 2021 CIU/COLOSÓ DE 18 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO "SOLICITUD Y TRAMITE DE PRORROGA N°03" DONDE ESTA INTERVENTORIA SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL TRAMITE DE LA PRORROGA N°03 POR TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°311 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 23 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO " SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS" DONDE SE DA RESPUESTA AL OFICIO OFI 45 PH COLOSO DE 17 DE JUNIO DE 2021 DONDE EL CONTRATISTA SOLICTO PRORROGA CONTRACTUAL DE 45 DIAS, ESTA INTERVENTORPIA YA REQUIRIO AL MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE, CON LA FINALIDAD DE OFICIALIZAR DICHA PRORROGA PARA FINIQUITAR LOS TRABAJOS REMANENTES.

LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N°315 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO "SOLICITUD REMISION BALANCE GENRAL CONTRATO, APUS DEL CONTRATO Y APUS DE ITEM NO PREVISTOS DONDE SE HACE REFERENCIA A LA REVISION APROXIMADA DEL BALANCE GENERAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO, EL CUAL SE SOLICITA REMITIR ESTE BALANCE DE OBRAS, PARA ANALISIS MAS DETALLADO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA

MEDIANTE OFICIO N° 323 2021 CIU/ COLOSÓ DE 28 DE JUNIO DE 2021, CON AUSNTO " DERECHO DE PETICIÓN PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN" LA INTERVENTORIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA SOLICITÓ AL ALCALDE SEÑOR ISAIAS DIAZ BARRIOS , ALLEGAR INFORMACION CORRESPONIDNETE COPIA OTRO SÍ N° 2 Y 3, CON COPIAS DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS Y RESPECTIVA APROBACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDIA DE COLOSÓ.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARÁ CON EL CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, CON EL FIN DE QUE SE REALICEN CON LA CALIDAD Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

LA INTERVENTORÍA LE SOLICITA AL CONTRATISTA, ENTREGAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FALTANTES REFERENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES APROBADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONTRATISTA, ALLEGAR REPROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, FLUJO DE CAJA SEMANAL EN EXCEL Y PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZADO, CONSIDERANDO EL PLAZO ADICIONAL DE 45 DIAS APROBADO POR EL ENTE CONTRATANTE PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN.

Firma

Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** LP – 085 – 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Aspersor manual	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoj	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua(1000 Galones)	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm.	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta 6 m3	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** **LP – 085 – 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TOVAR GOMEZ ALBEIRO SEGUNDO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOBIOS ROBLES WISMAN ALBERTO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTINEZ ADAMOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLLAUS	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DUPPERPLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MERCADO CONTRERAS EDILSON YAMITH	MAESTRO DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MENDOZA MADERA FRANKLIN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROBLES MONTES OSCAR SEGUNDO	ALMACENISTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PEREZ OCHOA ENARDO ANTONIO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ROBLES HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	201067-01 de 26/06/2020	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-085-2020	201067	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.055.799.942,50
TOTAL						**$ 1.055.799.942,50**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.055.799.942,50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 834.887.523,38	$ 195.837.814,13	$ 1.030.725.337,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22	$ 2.722.312,78	$ 14.327.962,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 8.704.780,83	$ 2.041.862,17	$ 10.746.643,00
VALOR TOTAL	$ 855.197.953,43	$ 200.601.989,08	$ 1.055.799.942,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	5 DE 10	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021

UNIDAD EJECUTORA: FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	23	24	24	24	22	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	23	24	24	24	24	23	24	737
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6
Lluvias intensas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	6 DE 10	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO CONTRATISTA NO PRESENTÓ RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE ESTE MES. LA INTERVENTORÍA HA SOLICITA REITERADAS VECES HACER LLEGAR TAL INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	7	DE 10

FECHA	30 (Dia)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
TOVAR GOMEZ ALBEIRO SEGUNDO	AYUDANTE	JUNIO	30	1.101.784.046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
TOBIOS ROBLES WISMAN ALBERTO	AYUDANTE	JUNIO	30	1.027.906.849	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	COLPENSIONES	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
MARTINEZ ADAMOR LUISA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	JUNIO	30	1.102.821.160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NUEVA EPS	30	Vida Colpatria S.A.	PROTECCION	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
CHAVEZ BENITEZ JEFFERSON KLAUS	RESIDENTE DE OBRA	JUNIO	30	1.102.831.226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SALUD TOTAL EPS	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	DIRECTOR DE OBRA	JUNIO	30	1.102.837.708	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SANITAS EPS	30	Vida Colpatria S.A.	PROTECCION	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
ROMERO COLON RAFAEL ANTONIO	TOPOGRAFO	JUNIO	30	1.108.760.729	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CAJA COMPENSACION FAMILIAR SUCRE	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
MERCADO CONTRERAS EDILSON YAMITH	MAESTRO DE OBRA	JUNIO	30	92.277.280	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	COLPENSIONES	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
MENDOZA MADERA FRANKLIN	AYUDANTE	JUNIO	30	92.549.138	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
ROBLES MONTES OSCR SEGUNDO	ALMACENISTA	JUNIO	30	92.601.254	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
PEREZ OCHOA ENARDO ANTONIO	OFICIAL	JUNIO	30	92.601.816	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	PORVENIR	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	
ROBLES HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AYUDANTE	JUNIO	30	92.601.832	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EPS-S Mutual Ser	30	Vida Colpatria S.A.	COLPENSIONES	30	Caja Fliar Sucre	30	PLACA HUELLA COLOSÓ	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	8	DE 10

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 10 **PERIODO MES:** JUNIO **VALOR BÁSICO ACTA: $** -

CONTRATO DE OBRA No :	LP – 085 – 2020	PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	11 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A		
SECTOR:	VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.055.799.942,50	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	8 DE AGOSTO DEL 2021
RUTA	N/A	VALOR ACUMULADO:	$ 1.055.799.942,50	VALOR ADICIONALES:	N/A
TRAMO:	N/A	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 117.412.221,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	9.5 MESES	8/08/2021	1.055.799.942,50	1.055.799.942,50

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	**$ 1.055.799.942,50**

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 117.412.221
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	10 MESES	30/06/2021	$ 685.270.884,00	685.270.884,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 213.074.902,55	$ -	$ 213.074.903	-	$ 69.096.129,00	1,000	0,32
Acumulado:	$ 1.055.799.942,50	$ 759.067.045	$ -	$ 759.067.045	0,72	$ 605.772.645,00	1,000	0,80

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,72	10,00	1,05	1,00	$ 296.732.897,50	0	$ 1.055.799.942,50	-
Interventor:	0,88	10,00	1,00	0,00	$ 79.498.239,00	0	$ 79.498.239,00	$ 79.498.239,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	3,6
Calzada:	3,6
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	N/A
Carpeta:	N/A

Observaciones:
- LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA
- ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS
- NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE
- CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA
- DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN
- TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	$ 13.372.764,0	$ 16.010.879,0	$ 17.823.251,0	$ 19.635.623,0	$ 168.096.335,0	$ 493.266.263,0	$ 876.047.752,0	$ 1.055.799.942,0	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT			$ 17.861.364,3	$17.467.429,5					N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 0,0	$ 17.467.429,5	$ 17.861.364,3	$ 17.467.429,5
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO						$ 1.012.863.973,2	$ 741.599.615,1		0,435	0,245	1,28	0,745	0,582	$ 0,0	$ 195.607.472,7	$ 1.012.863.973,2	$ 741.599.615,1
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.327.962,0	$ 11.605.649,2							N/A	N/A	N/A	NA	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 14.327.962,0	$ 11.605.649,2
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$ 10.746.643,0								N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 10.746.643,0	$ 0,0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8-ago-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO: $ 1.055.799.942,50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.** **-**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	12	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	10	8	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	12	4	2021	12	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	10	8	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 28/06/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8-ago-21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma N.A.	Firma	Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	Nombre:	Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	Nombre:
Director de Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:22202-246559 COR	Matrícula No.:	Matrícula No.: 25202-60909 CND	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	22 (Día)	06 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Ferrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. 4-085 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio Placa Huella Coloso.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la via Coloso - Vereda Calle larga en el municipio de Coloso Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio CW Terciaria.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Alvaro Garcia F.	Residente Interv.	Consorcio CW Terciaria
Jorge Velasquez.	Director Interv.	Consorcio CW Terciaria
William F. Gutierrez	Gestor	INVIAS
Luis Gonzalez.	Coordinador	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Reunión Virtual Seguimiento semanal del contrato de obra del municipio de Coloso - Sucre)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

N/A

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	22 (Día)	06 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Fecha de terminación 21 Julio de 2021. Ya se le pasa la prorroga. (vencida) Avance 85% Retrasado en Plaga Huella, en porcentaje 32%. se le notifico al contratista que como hay nueva prorroga y deben de realizar nuevo Plan de contingencia y nueva reprogramación. Los cadros de costos y balance también se le informo que no los envien para su respectiva revisión, estamos a la espera que el contratista envie todo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
	N/A	

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ____ (Día) ____ (Mes) ____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Alvaro Garcia Florez.	
Jorge Velasquez.	
Luis M. Gonzalez O.	
William F. Gutierrez B.	

Escaneado con CamScanner

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 35**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	3 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** TREINTA Y NUEVE (39) **del** 28/05/2021 **al** 3/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 758.381.098,70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 545.992.142
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	51,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 545.992.142,45

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	30,45	19,5	137,70	**187,65**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	90	52,5	375	**517,5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	45,66	25,14	176,4	**247,2**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	32,76	17,64	126	**176,4**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	36,703	23,357	166,83	**226,893**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	4998,48	2750,64	19311,88	**27061**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

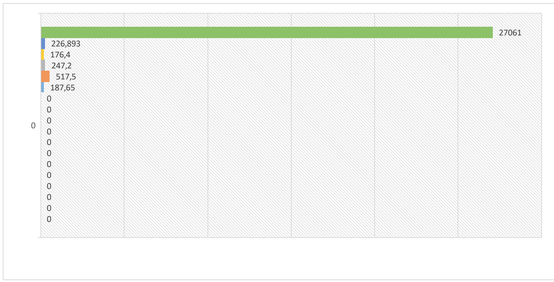

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR SOPORTE DE FUENTE DE MATERIALES COMO ANEXO DEL PAGA CON LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR EL ESPECIALISTA AMBIENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES: EL CONTRATO REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE - EN TRÁMITE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE LA OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL. NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 3.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 3

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL BOX COULVERT A CONSTRUIR.

EL CONTRATISTA INICIA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA LA CONSTRUCCION DEL BOX COULVERT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 35**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA	3 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** TREINTA Y NUEVE (39) **del** 28/05/2021 **al** 3/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)
8	Obras de compensacion ambiental.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

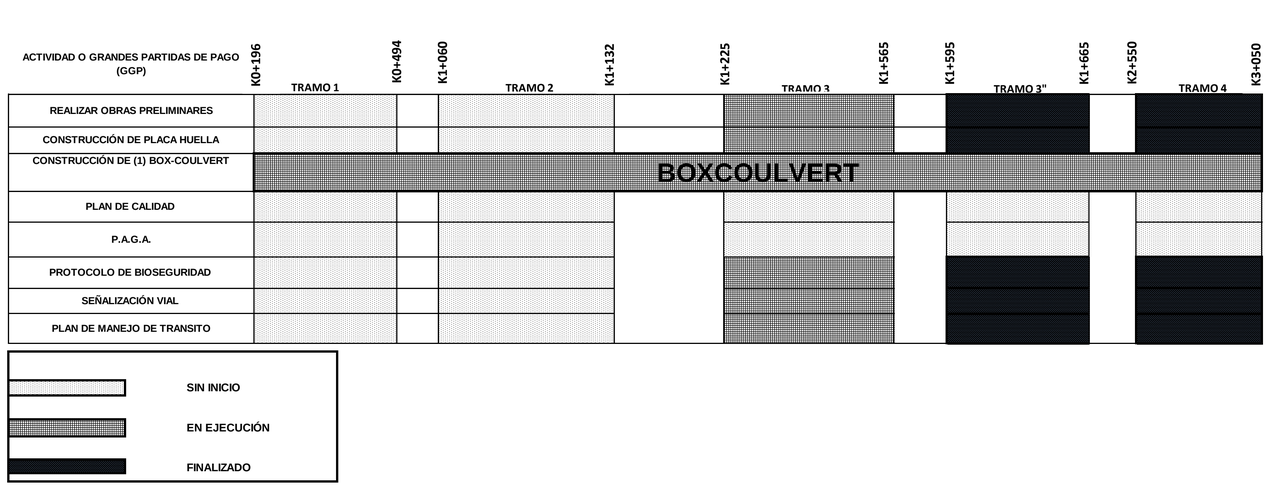

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .AVANCE TRAMO 3



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA EN EL TRAMO 3.





FOTO 3. INICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBAS GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 2.





FOTO 4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN EL TRAMO 3.



FOTO 5. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 3.



FOTO 6. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CUNETAS Y BORDILLO EN EL TRAMO 3.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS. A SU VEZ LA INTERVENTORIA CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 50% DE VALOR TOTAL DE CONTRATO EN ARAS DE TRAMITAR EL SEGUNDO DESEMBOLOSO DEL CONVENIO N°000645 DE 2020.	
LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICO N° 289 2021 CIU /COLOSO CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2021 Y ASUNTO "SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FALTANTES" ,DONDE SOLICITA AL CONSORCIO CONSTRUCTOR ENTREGASE DE MANERA PRONTA Y PRECISA LAS POLIZAS DEL OTROSÍ N°1 Y POLIZAS OTROSI N°2 ASI MISMO LA APROBACION DE POLIZAS DEL OTROSÍ N°2.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°294 2021 CIU / COLOSO CON FECHA 2 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO OFI047 PH COLOSO DE 31 DE MAYO DE 2021", DA RESPUESTAL AL OFICIO EN ASUNTO Y DE MANERA RESPETUOSA INFORMA AL CONSORCIO CONSTRUCTOR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN REFENRENCIA, LAS CUALES LA INTERVENTORÍA HA SIDO CLARA Y CONSISA QUE EL DESPECIO DE TIEMPO ATMOSFERICO VALIOSO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICEMBRE, QUE FUERON LOS CAUSALES DEL ORIGINARSE EL ATRASO ACUMULADO HASTA LA FECHA POR ENDE , RECONOCEMOS QUE EXITEN PRECIPITACIONES CONSTANTES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO PERO NO ES OBICE PARA QUE NO CUMPLAN CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.	

Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 36**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	10 (Día)	6 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA (40) **del** 4/06/2021 **al** 10/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 758.381.098,70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 560.552.658
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	53,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 560.552.658,40

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	30,45	19,5	137,70	**187,65**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	0	90	52,5	375	**517,5**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	45,66	25,14	176,4	**247,2**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	32,76	17,64	126	**176,4**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	36,703	23,357	166,83	**226,893**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	4998,48	2750,64	19311,88	**27061**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

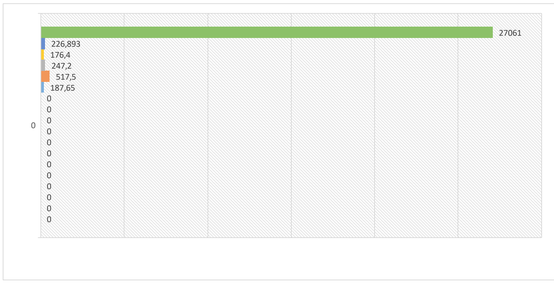

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL ESPECIALISTA AMBIENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, UBICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS, LICENCIA AMBIENTAL Y PERMISO MINERO COMO ANEXO DEL DOCUMENTO PAGA PARA VALIDAR SU APROBACIÓN

OBSERVACIONES: EL CONTRATO REQUIERE DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE - EN TRÁMITE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE LA OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL. NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 3.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 3

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA LA CONSTRUCCION DEL BOX COULVERT.

EL CONTRATISTA TRABAJA EN VIAS INTERMITENTES DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES PRESENTADAS EN LA SEMANA QUE HAN IMPEDIDO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA DE MANERA CONSTANTE Y EFICAZ.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 36**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	
		FECHA	10 (Día)	6 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA (40) **del** 4/06/2021 **al** 10/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)
8	Obras de compensacion ambiental.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

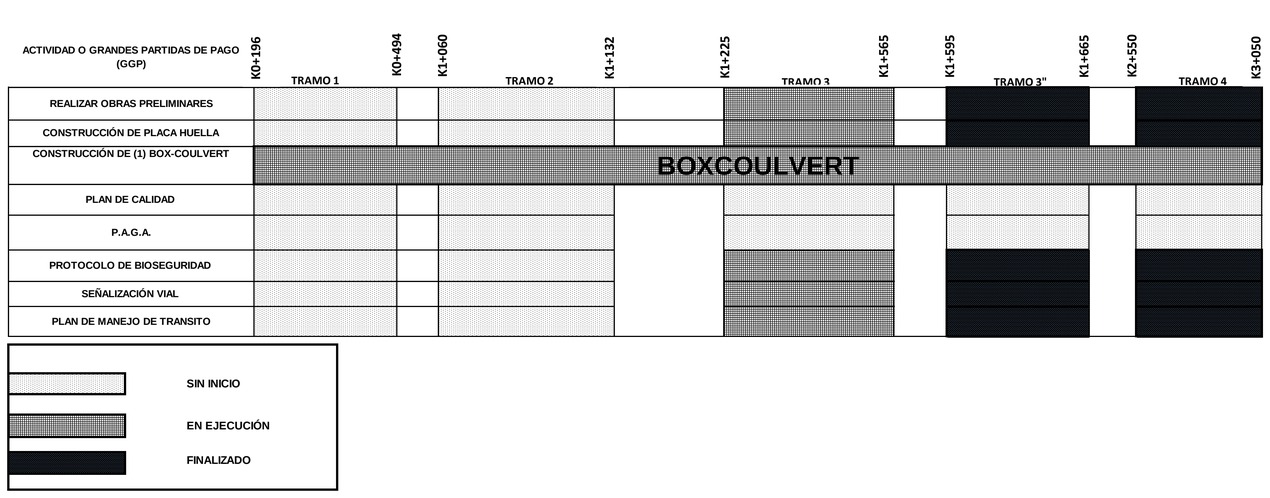

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .RECORRIDO TECNICO CON GESTOR INVIAS , MANEJADOR DE GESPROY.



FOTO 2. SUMINISTRO DE CONCRETO DE REFUERZO CON RESISTENCIA DE 21 MPA .



FOTO 3. INICIO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.



FOTO 4. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 5, FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°299 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO " REMISION ENSAYOS DENSIDADES SUBBASSE TRAMO 2" LE SOLICITA AL CONSORCIO CONSTRUCTOR LE HAGA LLEGAR EN TERMINO DE INSTANCIA , LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES DE LA SUBBASE GRANULAR COLOCADA EN EL TRAMO 2 EN ARAS DE VEELAR CON LAS CALIDAD DE COMPACTACION EXIGIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PARA PROCEDER A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA INSTALACIÓN DE LA SUBBASE GRANULAR TIPO C.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
LA INTERVENTORÍA REALIZA RECORRIDO TECNICO AL EJE VIAL DE LA PLACA HUELLA REFERENTE A ESTE CONTRATO EN CONJUNTO CON EL GESTOR DE PROYECTO, EL INGENIERO WILLIAM FELIPE GUTIERREZ BARRANGAN PARA CHEQUIAR LOS AVANCES Y CONTEMPLAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	*Invias - Gestión Pública con Calidad*

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 37**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	17 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y UNO(41) **del** 11/06/2021 **al** 17/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 850.763.593,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 663.396.644
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	62,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 663.396.643,85

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	0	77,25	19,5	137,70	**234,45**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	52,5	255	52,5	375	**735**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	0	0	99,06	25,14	176,4	**300,6**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	0	70,56	17,64	126	**214,2**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	0	93,427	23,357	166,83	**283,617**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	0	10843,66	2750,64	19311,88	**32906,18**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

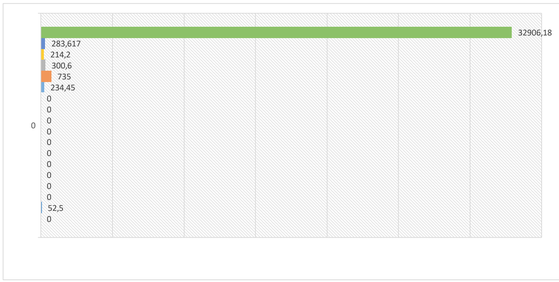

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR EN LOS AJUSTES REQUERIDOS DEL PAGA LA UBICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES, PERMISO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL COMO ANEXO DEL DOCUMENTO PAGA PARA SER REVISADA POR EL ESPECIALISTA AMBIENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES: ESTE CONTRATO REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE - EN TRÁMITE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V2

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE LA OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL. NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 2 Y 3.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 2 Y 3.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA REALIZA FUNIDICONES DE CONCRETO PARA BOX COULVERT,

EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDICION DE CONCRETO CLASE F PARA LA CONSTRUCCION DEL BOX COULVERT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 37**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA	17 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y UNO(41) **del** 11/06/2021 **al** 17/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)
8	Obras de compensacion ambiental.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

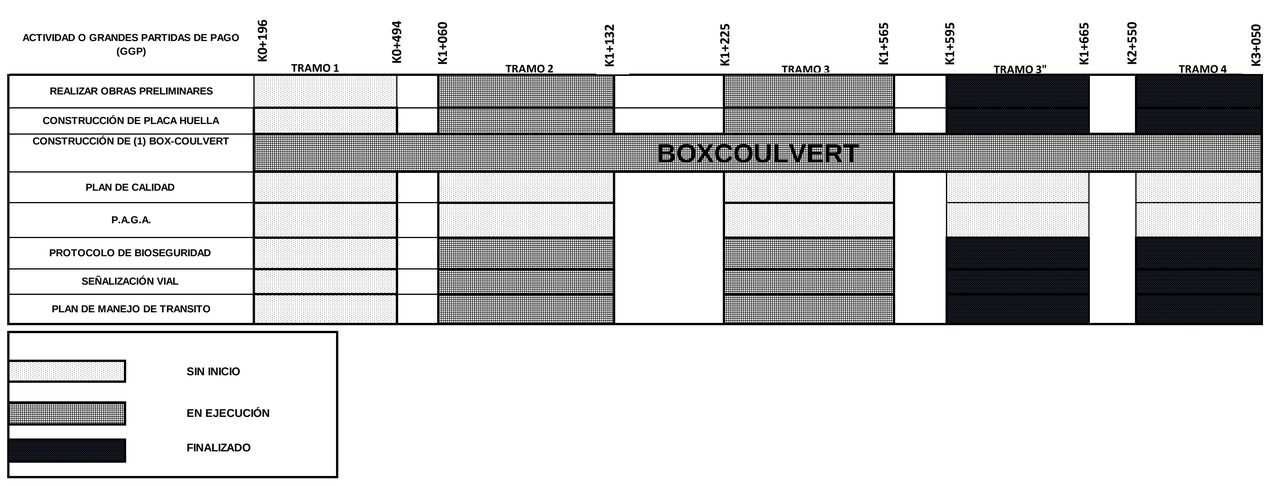

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .INICIO DE SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 1.



FOTO 2. ENSAYO DE DENSIDADES DE CAMPO EN EL TRAMO 1.



FOTO 3. CONSTRUCCION DE BOX COULVERT.



FOTO 4. FUNIDION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 2X1.



FOTO 5, FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO 3.



FOTO 6. FUNDIICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIGAS RIOTRAS EN EL TRAMO 3.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND

Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 38**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	24 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y DOS(42) **del** 18/06/2021 **al** 24/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 700.208.596
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	66,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 700.208.596,41

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	13,95	77,25	19,5	137,70	**248,4**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	52,5	255	52,5	375	**735**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	0	18	99,06	25,14	176,4	**318,6**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	12,6	70,56	17,64	126	**226,8**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	16,683	93,427	23,357	166,83	**300,3**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	1969,69	10843,66	2750,64	19311,88	**34875,87**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

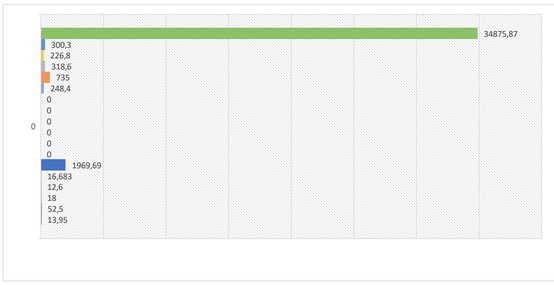

MAQUINARIA Y EOUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	NO HAY FUENTE DE MATERIALES REGISTRADOS	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V1 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha.

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista presenta documento PAGA VERSION 1 de fecha 17 de diciembre de 2020, se solicitan ajustes e informes ambientales hasta la fecha, sin respuesta a las reiteraciones realizadas con copia al INVIAS
La interventoría solicito el documento PAGA e informes ambientales, mediante oficio, pero a la fecha del presente informe el contratista aún no ha hecho entrega

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: El contrato de obra no tiene Gestión Predial, no hay ampliaciones del trazado que obliguen a la adquisición de predios

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 2.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 2.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 38**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	24	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y DOS(42) **del** 18/06/2021 **al** 24/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

	Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :
1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f´c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f´c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f´c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

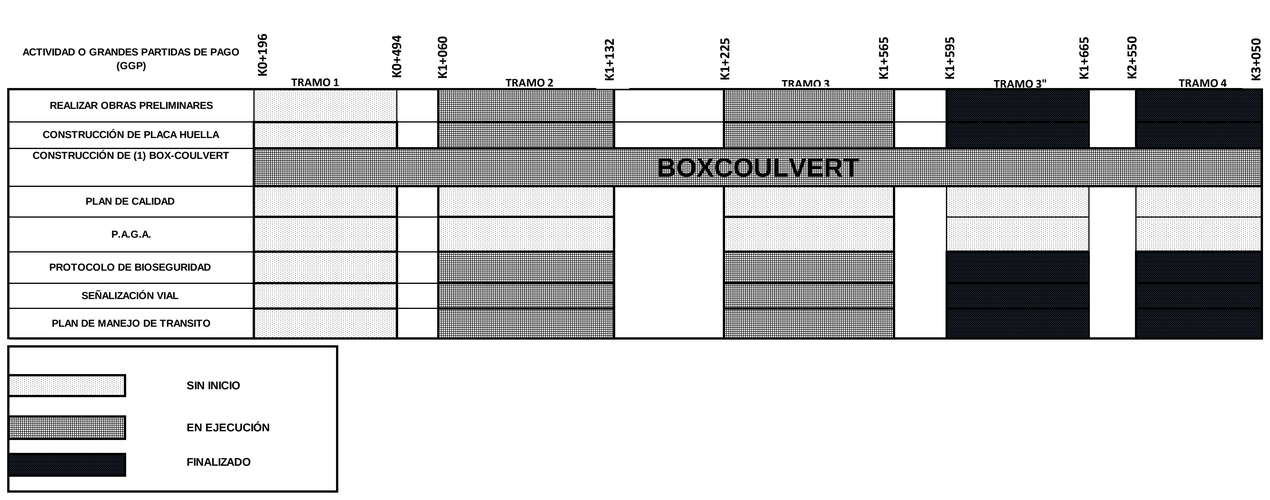

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .INICIO DE SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO C EN EL TRAMO 1.



FOTO 2. SUBBASE GRANULAR TIPO C.



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 4. FUNIDION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 5. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO .

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°306 2021 CIU/COLOSÓ Y ASUNTO "SOLICITUD Y TRAMITE DE PRORROGA N°03" DONDE ESTA INTERVENTORIA SOLICITA RESPETUOSAMENTE EL TRAMITE DE LA PRORROGA N°03 POR TERMINO DE 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	
LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N°315 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO "SOLICITUD REMISION BALANCE GENRAL CONTRATO, APUS DEL CONTRATO Y APUS DE ITEM NO PREVISTOS DONDE SE HACE REFERENCIA A LA REVISION APROXIMADA DEL BALANCE GENERAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO, EL CUAL SE SOLICITA REMITIR ESTE BALANCE DE OBRAS, PARA ANALISIS MAS DETALLADO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°311 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 23 DE JUNIO DE 2021 Y ASUNTO " SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS" DONDE SE DA RESPUESTA AL OFICIO OFI 45 PH COLOSO DE 17 DE JUNIO DE 2021 DONDE EL CONTRATISTA SOLICTO PRORROGA CONTRACTUAL DE 45 DIAS, ESTA INTERVENTORPIA YA REQUIRIO AL MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE, CON LA FINALIDAD DE OFICIALIZAR DICHA PRORROGA PARA FINIQUITAR LOS TRABAJOS REMANENTES.	**No. MAT:** 25202-60909 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 39**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y TRES(43) **del** 25/06/2021 **al** 1/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 759.067.045
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	71,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 759.067.044,61

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	0	13,95	85,50	19,5	137,70	**256,65**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	0	52,5	255	52,5	375	**735**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	0	18	127,62	25,14	176,4	**347,16**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	0	12,6	90,72	17,64	126	**246,96**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	0	16,683	120,12	23,357	166,83	**326,993**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	0	1969,69	13744,38	2750,64	19311,88	**37776,59**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

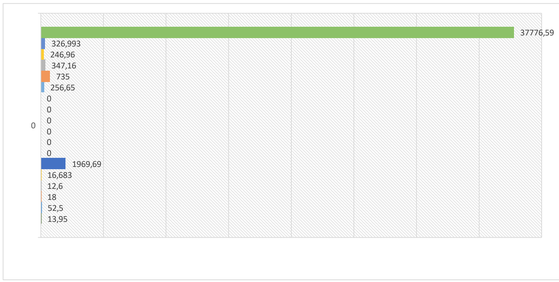

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR EN LOS AJUSTES REQUERIDOS DEL PAGA LA UBICACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES, PERMISO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL COMO ANEXO DEL DOCUMENTO PAGA PARA SER REVISADA POR EL ESPECIALISTA AMBIENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES: EL PROYECTO REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE - EN TRÁMITE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE ENTREGA PAGA V3

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INV-732-2020-212 ASUNTO OBSERVACIONES AMBIENTALES DOCUMENTO PAGA VERSION 2, SE LE INFORMA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ DE LAS MULTIPLES FALENCIAS QUE DEBEN SUBSANAR PARA PRODECER A LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE LA OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL. NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 2.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 2.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 39**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	1 (Dia)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y TRES(43) **del** 25/06/2021 **al** 1/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	Relleno para estructuras con suelo para box coulvert
2	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)
3	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)
4	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella
6	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas
7	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

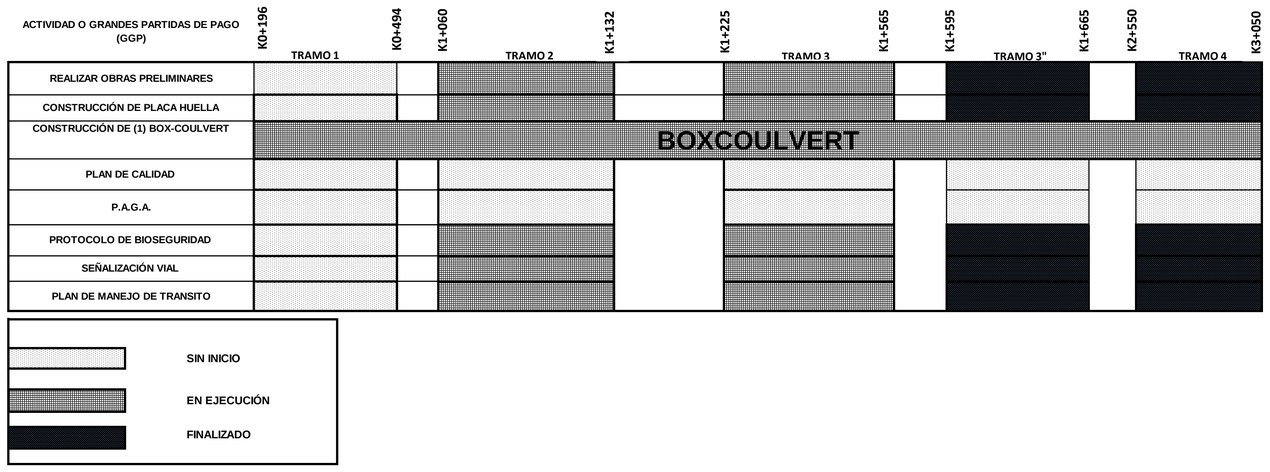

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA HUELLA



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 4. FUNIDION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 5.INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 2		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 14

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTHA YURY GARCIA	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	INSPECTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	SECRETARIA INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE MARIA MENDOZA DE VARGAS	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	INSPECTORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YINA JUDITH CARO COHEN	INSPECTORA SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MES ES LA SIGUIENTE: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 0.429/1 , ESPECIALISTA AMBIENTAL 0. 66/1, RESIDENTE INTERVENTORIA 2: 0.5/1 ;DEMÁS RECURSO PERSONAL: 1/1

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEN GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **685.270.884,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	$ 16.447.491	$ 3.858.053	$ 20.305.544	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 20.305.544	$ 685.270.884		ACTA CONCILIADA
2	octubre	$ 35.518.064	$ 8.331.398	$ 43.849.462	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 64.155.006	$ 621.115.878		ACTA CONCILIADA
3	noviembre	$ 51.817.723	$ 12.154.775	$ 63.972.498	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 128.127.504	$ 557.143.380		ACTA CONCILIADA
4	diciembre	$ 51.085.377	$ 11.982.990	$ 63.068.367	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 191.195.871	$ 494.075.013		ACTA CONCILIADA
5	enero	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 260.292.000	$ 424.978.884		ACTA EN ELABORACION
6	Febrero	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 329.388.129	$ 355.882.755		ACTA EN ELABORACION
7	marzo	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 398.484.258	$ 286.786.626		ACTA EN ELABORACION
8	abril	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 467.580.387	$ 217.690.497		ACTA EN ELABORACION
9	mayo	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 536.676.516	$ 148.594.368		ACTA EN ELABORACION
10	junio	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 605.772.645	$ 79.498.239		ACTA EN ELABORACION
TOTALES		**$ 490.675.842**	**$ 115.096.803**	**$ 605.772.645**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ 156.600,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ -
2	MARTHA YURY GARCIA	41708526	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 922.000,00	$ 922.000,00	$ 64.171,20	$ 36.880,00	$ -	$ 52.000,00	$ -	$ -
3	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	1109842513	INSPECTOR	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -
4	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.200,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00	$ -	$ -
5	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.300,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
6	ANA MILENA GUTIERREZ FERNANDEZ	1104011109	SECRETARIA INTERVENTORÍA	$ 922.000,00	$ 922.000,00	$ 64.200,00	$ 36.900,00	$ 147.600,00	$ 36.900,00	$ -	$ -
7	JORGE MARIO MENDOZA DE VARGAS	1063177819	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000	$ 164.300,0	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
8	FERNANDO ANTONIO SILVA LARA	6816630	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000	$ 120.060,00	$ 69.000,00	$ 276.000,00	$ 69.000,00	$ -	$ -
9	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000	$ 206.800,00	$ 118.800,00	$ 475.200,00	$ 118.800,00	$ -	$ -
10	CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	32670053	INSPECTOR SOCIAL	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00		$ 64.000,00	$ -	$ -
11	YINA JUDITH CARO COHEN	1102847188	INSPECTOR SST	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00	$ 256.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ -
12	MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	1099965566	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.256,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$							24.019.000,00

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 6	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **732-2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 1/09/2019

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIMEBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 685.270.884,00

VALOR ACUMULADO: $ 685.270.884,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	24	3	2021	30	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	24	3	2021	30	6	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	30	6	2021	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

FECHA DE INICIO: 1/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 2 de junio de 2021 OFICIO N° 294 2021 CIU / COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍASCOLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **RESPUESTA A SU OFICIO OFI 047 PH COLOSÓ DE 31 MAYO DE 2021**

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto, la interventoría, respetuosamente le informa, que ustedes como consorcio constructor al momento de suscribir el contrato de obra N° MM-LP-OP-085-2020, afirmaron conocer todas las condiciones de localización, de comportamiento climatológico y de clima social del corredor vial donde se ejecutan las obras viales del contrato de la referencia, lo cual ustedes debieron tener en cuenta en la programación y ejecución de los trabajos, con la finalidad de ejecutar los trabajos durante el plazo aprobado en su contrato.

Al inicio de las obras, el consorcio constructor desperdició tiempo atmosférico valioso durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; que fueron las causales de originarse el atraso acumulado manifiesto a la fecha, por tal motivo, reconocemos que existen lluvias intensas, pero esta condición atmosférica no es óbice para que ustedes como contratistas no cumplan durante el tiempo contractual, su obligación contractual ante el Municipio de Colosó; por tal motivo, los invitamos que redoblen esfuerzos técnicos, económicos, de personal y logísticos , que redunden positivamente y hagan entrega de las obras en la fecha programada por el municipio de Colosó Sucre.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

No siendo otro el motivo



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 03 de junio de 2021 OFICIO N° 296, 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° LP-085-2020, MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSO-VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO- DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SST.**

Cordial saludo,

El presente, se hizo con el fin de informales, que, a través de la inspección realizada a cargo de la SST de interventoría, se observó que algunos trabajadores no cuentan con los EPP adecuados, y manifestaron que no han recibo la dotación adecuada para realizar sus actividades y ellos se encuentras trabajando con varillas, concreto, etc, y los elementos que tienen algunos se encuentran averiados, dañados, en mal estado por su uso constante, por tanto se exige hacer la reposición y dotación respectiva, de tal manera que es de gran importancia que ellos cuenten con los equipos adecuados para protegerlos ante eventualidades llámese accidentes y/o enfermedad laboral.

Lo anterior es para dar Haciendo cumplimiento a los requisitos legales exigidos por esta materia SST; además se solicita con carácter urgente seguir aplicando las medidas covid-19, según lo exigido en la resolución 666 de 2020, que fue aprobado mediante la administradora de riesgos laborales ARL, lo cual incluye tomar medidas y aplicar protocolos de bioseguridad, en cuanto al uso de tapabocas y el lavado constante de las manos.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 10 de junio de 2021 OFICIO N° 299 2021 CIU / COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Atn. Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REMISIÓN ENSAYOS DENSIDADES SUBBASE TRAMO 2**

Cordial saludo,

En el día de ayer, - 9 de Junio de 2021-, la interventoría conjuntamente con el INVIAS, estuvieron en el área de ejecución de los trabajos del contrato en referencia, motivo por el cual, respetuosamente se le solicita a este consorcio constructor, remitir en el término de la instancia, los resultados de las densidades de la subbase colocada en este tramo 2, con la finalidad de constatar que están dando cumplimiento a las calidades de densificación exigidas, además es requisito de autorización de colocación del concreto hidráulico.

Se le reitera, que ustedes deben remitir estas pruebas de calidades, ex ante de colocación del concreto, por ende, para lo faltante del tramo 2 y todo el tramo 1, antes de colocar el concreto, ustedes deben enviar estos resultados de densidades para poder autorizarlos colocar la mezcla de concreto para la placa huella.

No siendo otro el motivo



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 18 de junio de 2021 OFICIO N°306 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD Y TRAMITE DE PRORROGA N° 03**

Cordial saludo,

Motiva el presente, -y con fundamento en el oficio OFI 49 PH COLOSÓ de 17 de junio 2021, enviado por parte del contratista de las obras referenciadas-, esta interventoría solicita respetuosamente, se tramite la prorroga N° 03, por término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del día 24 de junio de 2021, fecha que se tenía estipulada para terminación y entrega de los trabajos del contrato de obra No. No.MM-LP-OP-085-2020.

La interventoría considera que las razones y motivos expuestos por el CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Miranda Vergara, son validados por esta interventoría, las lluvias frecuentes presentes en el área de ejecución de los trabajos, inciden negativamente en la ejecución continuada de las obras civiles del contrato referenciado, afectando el rendimiento programado por esta firma constructora; además, la dificultad en consecución de materiales, especialmente el acero ,-que se ha venido generando producto de la pandemia-, agudizado aún más, como consecuencia del paro nacional presente en todo el territorio nacional, -como consecuencia de las protestas ciudadanas-; estas causas son sinérgicas, e inciden negativamente en el rendimiento programado por la firma constructora de las obras del contrato en comento, debido a la dificultad de contar dentro de su stock de materiales con las cantidades y volúmenes requeridos por la programación de los trabajos, que facilite continuar con el ritmo y avance normal de las actividades faltantes del contrato No. No.MM-LP-OP-085-2020.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

La interventoría recomienda al municipio de Colosó Sucre, que dentro del documento de la prorroga N° 03, exigir a la firma constructora presenten un plan de contingencia donde se detallen los recursos económicos, logísticos, equipos, personal profesional, técnicos, ayudantes y obreros requeridos para la terminación y entrega de los trabajos de acuerdo a los tiempos de la prorroga N° 03; así mismo, exigir que presenten la nueva reprogramación de los trabajos, y, el flujo de caja semanal en la aplicación Excel, incluyendo el avance semanal y acumulado en porcentaje de avance de los trabajos

No siendo otro el motivo

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 23 de junio de 2021 OFICIO N°311 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS**

Cordial saludo,

La interventoría, teniendo en cuenta el OFI 49 PH COLOSÓ de 17 de junio 2021, -donde ustedes solicitaron prorroga contractual por término de cuarenta y cinco (45) días calendario -, esta interventoría ya requirió al municipio de Colosó, Sucre, con la finalidad que se oficialice la prorroga requerida, para finiquitar los trabajos remanentes del contrato de obra referenciado.

Esta ampliación de tiempo, conlleva que ustedes como consorcio constructor, -deben en el término de la instancia-, actualizar nuevamente el plan de contingencia, donde se detallen los recursos económicos, logísticos, equipos, personal profesional, técnicos, ayudantes y obreros requeridos para la terminación y entrega de los trabajos de acuerdo a los tiempos de la prorroga N° 03; así mismo, solicitamos con el mismo rigor, actualicen y presenten la nueva reprogramación de los trabajos, y, el flujo de caja semanal en la aplicación Excel, incluyendo el avance semanal y acumulado en porcentaje de avance de los trabajos

No siendo otro el motivo
Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 24 de junio de 2021 OFICIO N°315 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD REMISIÓN BALANCE GENERAL CONTRATO, APUS DEL CONTRATO Y APUS DE ITEMS NO PREVISTOS**

Cordial saludo,

En las horas de la tarde del día de ayer, -en coordinación del equipo técnico de interventoría y el de ustedes como contratistas-, se hizo revisión aproximada del probable balance general de las obras del contrato referenciado, por tal motivo, respetuosamente solicitamos nos remitan este balance de obras, para análisis más detallado por parte de la interventoría, al igual solicitamos nos remitan copia de los APU's del contrato original, como también nos remitan los APU's de los ítems no previstos.

No siendo otro el motivo

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 28 de junio de 2021 OFICIO N° 323 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **DERECHO DE PETICION PARA ENTREGA DE INFORMACION**

Cordial saludo,

A la fecha, el contratista del contrato de la referencia -CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Miranda Vergara-, la interventoría le ha tramitado tres prorrogas en tiempo, para que éste, de cumplimiento a sus obligaciones contractuales para con el municipio de Colosó Sucre.

De manera informal se ha solicitado a la alcaldía de Colosó, - por conducto de la Secretaría de Planeación-, allegar la información correspondiente a entregar copia de otrosí N° 2 y 3, con las copias de pólizas actualizadas y su respectiva aprobación por parte de la oficina jurídica de la alcaldía de Coloso Sucre, sin que a la fecha haya atendido nuestro requerimiento.

Con fundamento en el artículo 23 de la constitución política de Colombia, solicito usted señor alcalde, allegar la información requerida, para de esta manera, la firma interventora de estas obras, tenga a su disposición toda la información técnica que le permita controlar idóneamente la ejecución y liquidación de este contrato de obra pública.

Se recibe información a la siguiente dirección electrónica: viasruralesdelasabana@gmail.com

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C
