CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020





NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11

PERIODO DEL 01 al 31 DE JULIO DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciosantander2019@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORME MENSUAL NO. 11 **MES O PERIODO:** JULIO 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**			X	6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**			X	7
2.1	Localización			X	9
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	10
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**			X	12
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**			X	18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		46
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		48
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		52
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		54
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		56
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		58
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		60
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		62
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		65
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra			X	20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		68
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		73
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	21
5.1	Información general del contrato			X	21
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	22
5.3	Informes especialistas			X	23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	23

5.5	Información otros programas y aplicativos			X	23
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	23
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		82
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		84
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		86
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		88
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		90
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		93
6.7	Otros documentos seguimiento mensual			N/A	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**			X	26
8	**Anexos**		X		27
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		27
8.2	Registro fotográfico		X		28
8.3	Bitácora de obra		X		32
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1 Localización 7

2.2 Estado inicial de la Vía 9

2.3 Características Técnicas del Proyecto 10

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

3.1 Información general del contrato de obra 12

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 13

3.3 Seguimiento ítems no previstos 15

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 17

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto 17

4.2 Maquinaria y equipo del contrato 17

4.3 Personal del contrato de obra 17

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra 17

4.5 Estado general del tiempo 17

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 17

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 18

4.8 Informe avance físico financiero 18

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 18

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 18

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra 18

4.12 Seguimiento a la programación de obra 18

4.13 Seguimiento programa de inversiones 19

4.14 Actas comité de obra 19

4.15 Acta reunión 19

4.16 Informe semanal 19

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

5.1 Información general del contrato de interventoría 20

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 21

5.3 Informes especialistas 22

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 22

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.1 Equipo contrato de interventoría 23

6.2 Personal contrato de interventoría 23

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 23

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 23

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría 23

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 23

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo 24

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 25

8. ANEXOS 26

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. 26

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras. 27

8.3 Bitácora de obra. 31

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de $685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de $1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE",** con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°11 correspondiente al periodo del mes de JULIO del 2021, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.

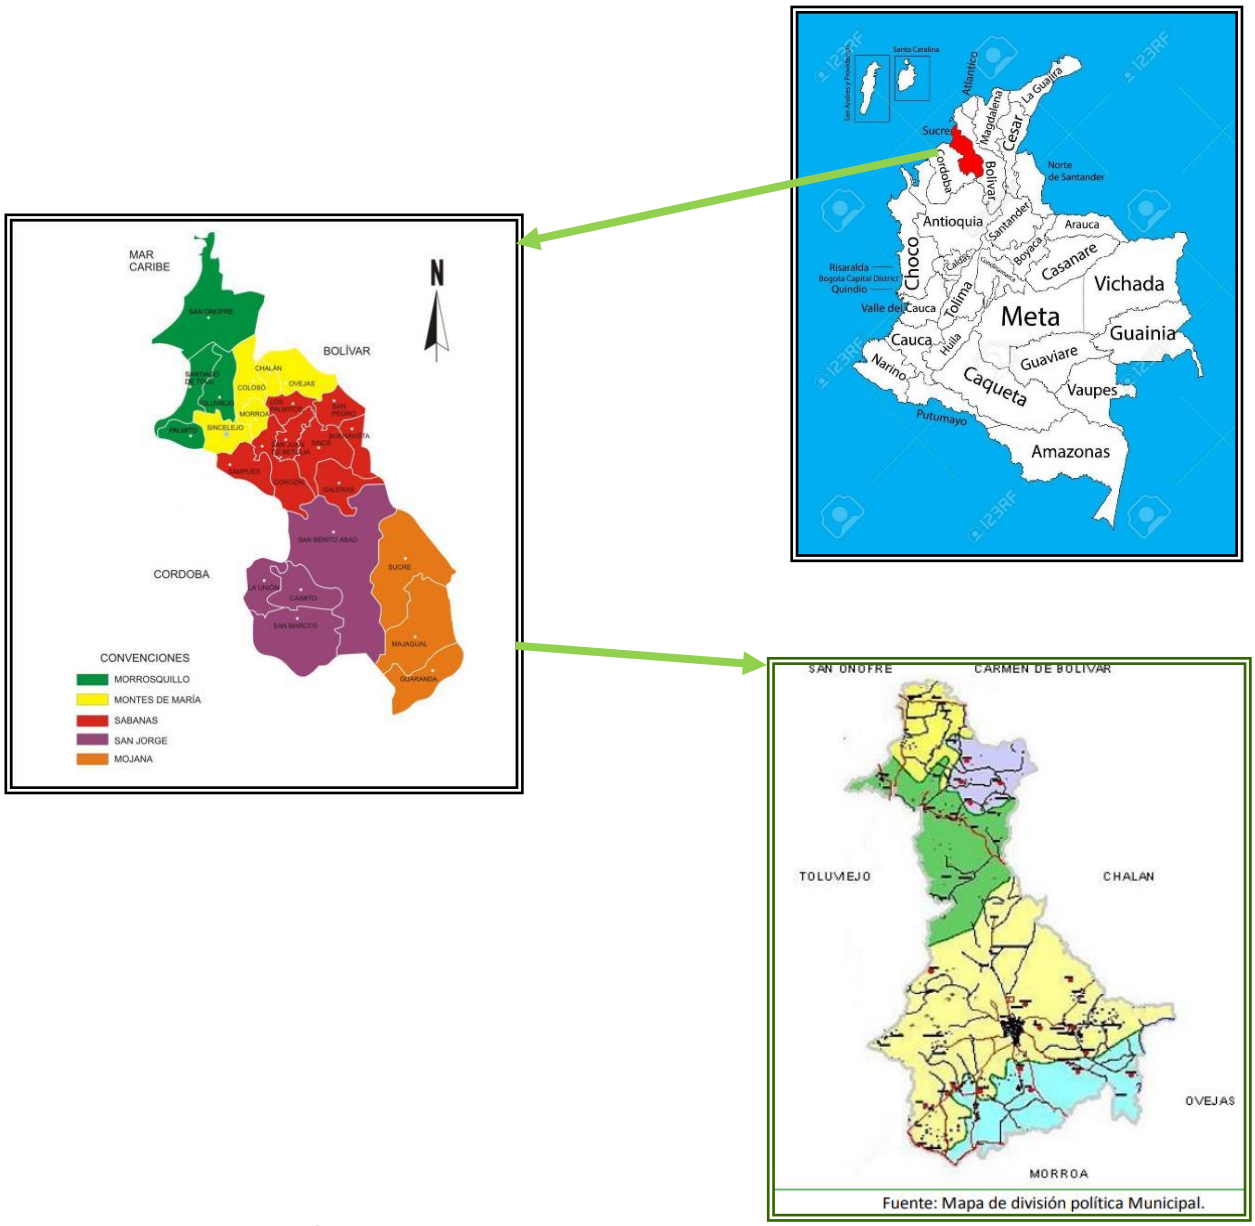


Figura. 1 Localización general del proyecto
Fuente: (INFOGRAFÍA DE INTERNET)

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9º 35' de latitud Norte, 9º 26' de latitud sur; 75º 22' longitud este y 75º 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km2, -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

.

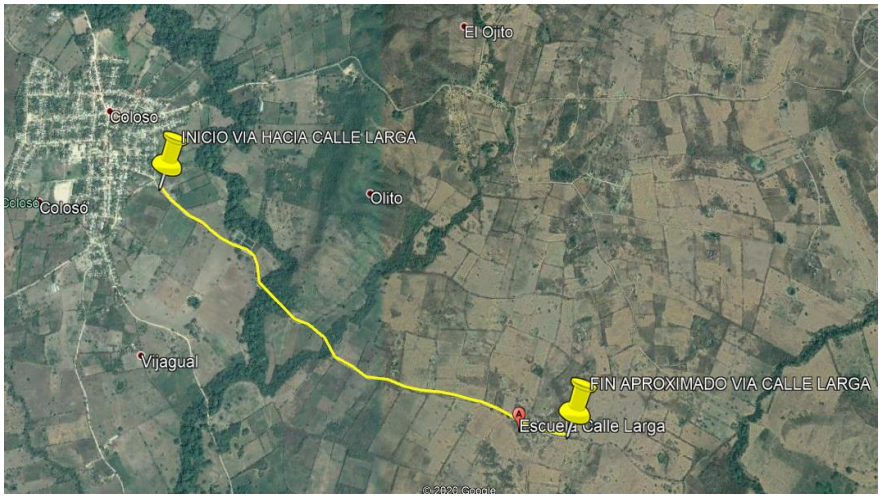


Figura. 2 Localización Vía Vereda Calle Larga
Fuente: Google Earth

2.2 Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598
		TOTAL	1280

TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.

- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.

- El manejo de drenaje para este este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.

- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

La vía a pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- Socialización de los trabajos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento inicial	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
Prórroga No. 2	Treinta (30) días
Prórroga No .3	Cuarenta y cinco (45) días
Fecha de terminación actualizada	8 de agosto de 2021
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	$ 1.055.799.942,50
Residente de Obra	JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Director de Obra	MAGIER ALDAI DUPPERLEY

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

OBRA

En el mes de julio, el consorcio contratista ejecutó las siguientes actividades de obra:

- Excavaciones varias sin clasificar para el tramo 1 de la vía.
- Fundición de losas en concreto de 3000 psi en el tramo 1.
- Fundición de concreto clase D, para vigas riostras en el tramo 1.
- Fundición de huellas de concreto ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pegada en el tramo 1 de la vía.
- Instalación de acero de refuerzo para cunetas, vigas, losas y bordillos en el tramo 1 de la vía.

A la fecha de este informe, el contrato de pavimentación del municipio de Colosó – Sucre, lleva ejecutado 1172 metros lineales de placa huella de los 1280 metros lineales contratados; se encuentran construidos totalmente los tramos 2: con 72 metros lineales, tramo 3:340 metros lineales, tramo 3": 70 metros lineales y finalmente tramo 4: 500 metros lineales, en estos falta por instalar sello asfáltico. El Box-culvert que inicialmente se había programado de 1m x1m, se construyó en su totalidad con una sección de 2 m x 1 metros, ya que, el análisis hidrológico realizado arrojó este tamaño en la estructura.

En la tabla 2, se puede observar el porcentaje de avance de cada uno de los tramos que conforman la placa huella.

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	30%
TRAMO N°2	72 ml	99%
TRAMO N°3	340 ml	99%
TRAMO N°3"	70 ml	100%
TRAMO N°4	500 ml	99%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	100%

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de julio.

CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS						CANTIDADES ACTUALIZADAS PREBALANCE N° 1		CANTIDADES EJECUTADAS HASTA JULIO		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT										
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,60	$ 26.127,00	$ 668.851,20	89,34	$ 2.334.186,18	25,60	$ 668.851,20	25,60	29%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8,40	$ 46.897,00	$ 393.934,80	44,24	$ 2.074.723,28	0,00	$ -	0,00	0%
1.3	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	m3	17,50	$ 491.409,00	$ 8.599.657,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0%
1.4	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	m3	1,40	$ 402.347,00	$ 563.285,80	1,15	$ 462.699,05	1,40	$ 563.285,80	1,40	122%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1.565,00	$ 4.879,00	$ 7.635.635,00	3.155,00	$ 15.393.245,00	1565,00	$ 7.635.635,00	1565,00	50%
	ITEMS NO PREVISTOS										
	Baranda metálica	m	0,00	$ 1.397.656,00	$ -	5,20	$ 7.267.811,20	0,00	$ -	0,00	0%
	Sello de juntas para puentes	m	0,00	$ 38.587,00	$ -	18,00	$ 694.566,00	0,00	$ -	0,00	0%
	Concreto Resistencia 28 Mpa (C)	m3	0,00	$ 771.815,00	$ -	24,06	$ 18.569.868,90	17,50	$ 13.506.762,50	17,50	73%
					SUBTOTAL $ 17.861.364,30	**SUBTOTAL**	**$ 46.797.099,61**	**SUBTOTAL**	**$**		**22.374.534,500**
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO										
2,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,40	$ 26.127,00	$ 6.019.660,80	365,20	$ 9.541.580,40	337,50	$ 8.817.862,50	337,50	92%
2,2	Subbase Granular Clase C	m3	960,00	$ 114.944,00	$ 110.346.240,00	960,00	$ 110.346.240,00	960,00	$ 110.346.240,00	960,00	100%
2,3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21Mpa)	m3	652,80	$ 570.922,00	$ 372.697.881,60	466,47	$ 266.317.985,34	452,7	$ 258.456.389,40	452,70	97%
2,4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320,00	$ 330.557,00	$ 105.778.240,00	324,33	$ 107.209.551,81	323,1	$ 106.802.966,70	323,10	100%
2,5	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281,60	$ 487.978,00	$ 137.414.604,80	463,27	$ 226.065.568,06	427,8	$ 208.756.988,40	427,80	92%
2,6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	51.072,00	$ 4.879,00	$ 249.180.288,00	52.844,86	$ 257.830.071,94	50285,8	$ 245.344.385,51	50.285,79	95%
2,7	Sello Asfaltico para Juntas	m	13.658,00	$ 2.301,00	$ 31.427.058,00	11.105,60	$ 25.553.985,60	6.230,00	$ 14.335.230,00	6.230,00	56%
	ITEMS NO PREVISTOS										
	Relleno para estructuras con suelo	m3	0,00	$ 46.897,00	$ -	360,26	$ 16.895.113,22	0,00	$ -	0,00	0%
					SUBTOTAL $ 1.012.863.973,20	**SUBTOTAL**	**$ 1.019.760.096,37**	**SUBTOTAL**	**$**		**952.860.062,51**
					TOTAL OBRA CIVIL 1.030.725.337,50	**TOTAL**	**$ 1.066.557.195,98**	**TOTAL**	**$**		**975.234.597,01**

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

En la tabla 4, se presenta las cantidades actualizadas de acuerdo con un pre-balance presentado por el contratista a la interventoría en base a lo que se ha ejecutado a la fecha en las obras de pavimentación de placa huella de la vía Vereda Calle Larga en el municipio de Colosó - Sucre, que se encuentra en elaboración, por lo que sus valores definitivos pueden varias

INTERVENTORIA

En el mes julio, la interventoría a través de su personal profesional, ejecutó las siguientes actividades:

- Solicitud al contratista actualización de programación de los trabajos, plan de contingencia, y flujo de caja semanal en Excel, considerando el plazo final de entrega total de las obras establecido por la alcaldía de Colosó para el día 08 de agosto de 2021.
- Visitas constantes al lugar de las obras, con el objetivo de corroborar que los trabajos en ejecución cumplan con los diseños entregados por el contratista y aprobados por la interventoría y se ajusten a los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Vías para este tipo de vías terciarias.
- Inspección del personal profesional de interventoría, del cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, social y ambiental por parte de la firma constructora en el desarrollo de ejecución del contrato de obra No. MM-LP-OP-085-2020.
- Solicitud al contratista de entrega resultados de laboratorios de los elementos de placa huella fundidos a la fecha y box-culvert construido.
- Reuniones semanales con personal profesional de INVIAS, con el objetivo de informar el estado de avance de las obras de pavimentación con este contrato.
- Comunicación constante con la entidad contratante en pro del contrato de obra del municipio de Colosó – Sucre.

3.3 Seguimiento ítems no previstos.

De acuerdo con el pre-balance entregado por el contratista, el cual se encuentra en revisión por la interventoría, como ítems no previstos en el contrato de obra del municipio de Colosó se tienen los siguientes:

ITEMS NO PREVISTOS BOX-CULVERT:

- Baranda metálica
- Sello de juntas para puentes
- Concreto de Resistencia 28 MPA.

ITEM NO PREVISTO PLACA HUELLA:

- Relleno para estructuras con suelo.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha de este informe, el Consorcio Placa Huella Colosó, lleva una inversión ejecutada acumulada de $975.234.597, lo que representa el 92,37% del valor total del contrato.
El contratista no ha hecho entrega de programación de obra y flujo de caja semanal de las obras actualizadas de acuerdo con la prórroga N°3 aprobada por la alcaldía de Colosó.

En comité de obra realizado el día 27 de julio de 2021, con la participación de los ingenieros Jorge Velázquez – Director de interventoría, Álvaro García – Residente de interventoría, Luis Miguel González – Supervisor del contrato de interventoría – INVIAS, William Felipe Gutiérrez – Gestor Técnico INVIAS y Mario José Caballero – Director Territorial Sucre INVIAS , con el objeto de hacer seguimiento semanal al contrato d eobra del municipio de Colosó ;la interventoría informó al personal del Instituto Nacional de Vías, que, de acuerdo con el seguimiento realizado a este contrato, a la fecha de la reunión la firma constructora presenta ejecutado acumulado un aproximado del 90%, además de informar que el personal profesional de interventoría realiza revisión del balance de obra presentado por el contratista para dar el aval y sea la entidad contratante quien de su aprobación. De esta reunión se da la recomendación para el contratista de utilizar los recursos que sobren en la señalización vial para garantizar la seguridad en las obras.

En comité de obra llevado a cabo el día 29 de julio de 2021, el personal profesional de INVIAS dio indicaciones a la interventoría: Consorcio CIU Terciaria para la recopilación de información como documentación del Departamento Nacional de Planeación para la visita programada en la primera semana de agosto. Como información solicitada se requirió: Video de las obras ejecutada y en ejecución, actualización de documentos correspondientes a prórrogas, acta de modificación, informes de interventoría a corte 30 de junio de 2021, actas de socialización e inicio de obra, aprobación de estudios y fotografías recientes.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 2**

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 4**

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 5.**

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021**. Ver anexo 6**

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 9**

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 10**

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, a la fecha de este informe se desembolsado el 30% del valor total, que corresponde a $117,412,221.

4.12 Seguimiento a la programación de obra

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría al contrato de obra de referencia, a la fecha de este informe, al contratista el falta por ejecutar un 7.63% del valor total del contrato.

La interventoría ha reiterado en varias oportunidades al contratista la remisión de la programación de las actividades y flujo semanal de las obras actualizadas para continuar con el seguimiento, pero a la fecha, el consorcio contratista no ha hecho entrega de lo solicitado.

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

4.14 Actas comité de obra

Se llevó a cabo, comité de obra el día 27 de julio de 2021 y 29 de julio de 2021; de cada una de las reuniones se levantó acta con detalles y observaciones. **Ver anexo 11**

4.15 Acta reunión

N. A. En este mes no se realizaron actas de reunión.

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 12**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Prorroga No. 2	Tres (3) meses
Prorroga No. 3	Cuatro meses y medio (4,5)
Fecha terminación actualizada	08 de noviembre de 2021.
Valor Total Contrato	$ 873.235.119,28
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

La interventoría mediante OFICIO N° 330 2021 CIU/COLOSÓ de 11 de julio de 2021, solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS MIRANDA VERGARA, actualización de plan de contingencia donde se detallen los recursos económicos, logísticos, equipos y de personal para la terminación de las obras, así como la nueva reprogramación de los trabajos y flujo de caja semanal en Excel de acuerdo con los tiempos de la prórroga N° 03 por término de 45 días aprobada por la Alcaldía de Colosó.

A través de OFICIO N° 336 2021 CIU/COLOSO con fecha 12 de julio de 2021, la interventoría solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ, remitir firmas digitales de director e ingeniero residente de obras, con carácter urgente, al ser un requisito intrínseco en la validación de los informes técnicos de las obras ante el Instituto nacional de Vías.

Mediante OFICIO N° 339 2021 CIU/COLOSÓ con fecha 14 de julio de 2021, la interventoría reiteró solicitud al consorcio contratista de remisión de firmas del ingeniero director e ingeniero residente de las obras del contrato del municipio de Colosó – Sucre.

A través de OFICIO N° 344 2021 CIU/COLOSÓ, de 22 de julio de 2021, la interventoría solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS MIRANDA VERGARA información concerniente al manejo de la fiducia aperturada para la construcción de las obras de pavimentación de referencia, lo cual incluye extractos bancarios emitidos por el banco, certificación final de los rendimientos financieros generados, certificación de pago ante la tesorería del ente contratante y toda aquella información pertinente al encargo fiduciario del contrato.

La interventoría mediante comunicación escrita: OFICIO N° 348 2021 CIU/COLOSÓ de 23 de julio de 2021, solicitó al consorcio contratista remitir balance general del contrato realizado con el objetivo de que la interventoría pueda revisarlo y avalar los APUS de ítems no previstos y proceder al envío a la entidad contratante, para proceso de aprobación por parte de la Alcaldía de Colosó.

La interventoría por medio de OFICIO N°356 2021 CIU/COLOSÓ con fecha 29 de julio de 2021, solicitó al señor Isaías Javier Díaz Barrios, alcalde municipal de Colosó- Sucre, remitir a la interventoría informes bimensuales generados desde el inicio de las obras a

corte 30 de junio de 2021, para documentar al Departamento Nacional de Planeación previo visita programada para la primera semana de agosto de 2021.

A través de OFICIO N° 364 2021 CIU/COLOSÓ de 30 de julio de 2021, la interventoría reiteró solicitud al alcalde Municipal de Colosó -Sucre, de entrega de informes bimensuales generados desde el inicio de las obras hasta 30 de junio de 2021.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente informe, no se requirió concepto de los especialistas para este contrato.

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021.**Ver anexo 15**

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 17**

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de julio al 31 de julio de 2021. **Ver anexo 18**

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticipo).

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. La interventoría solicita al contratista la entrega con carácter urgente de plan de contingencia actualizado, reprogramación de las obras y flujo de caja semanal de las obras, considerando el plazo establecido por la alcaldía de Colosó para la entrega total de las obras: 08 de agosto de 2021.

2. La interventoría solicita al contratista la entrega de resultados de laboratorio de los elementos de la placa huella fundidos, con el fin de corroborar la resistencia del concreto instalado, de acuerdo con el diseño de mezcla presentado por el contratista a la interventoría.

3. La interventoría continuará con el seguimiento y control de las obras en ejecución para la pavimentación de la vía Calle Larga en el municipio de Colosó, de acuerdo con los diseños entregados por el contratista y aprobado por la interventoría y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

4. La interventoría solicita al contratista la implementación de protocolo de bioseguridad contra la propagación del virus COVID-19 en el lugar de las obras, así como el uso de EPP.

5. La interventoría solicita al contratista copia del pago de planilla de seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado a las obras.

6. La interventoría continuará comunicando a la entidad contratante e Instituto Nacional de Vías del estado de avance del contrato de obra de referencia.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido.
Se presentan como archivos adjuntos la relación de correspondencia durante el mes de julio entre interventoría – entidad contratante e interventoría – contratista. **Ver anexo 19.**

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA				
FECHA	REFERENCIA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
11/07/2021	OFICIO N°330 2021 CIU/ COLOSÓ	SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
12/07/2021	OFICIO N°336 2021 CIU/COLOSÓ	REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
14/07/2021	OFICIO N°339 2021 CIU/COLOSÓ	REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
22/07/2021	OFICIO N°344 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD INFORMACIÓN MANEJO FIDUCIA	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
23/07/2021	OFICIO N°348 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD REMISION BALANCE FINAL INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
29/07/2021	OFICIO N°356 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD INFORMACION INFORMES BIMENSUALES	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE
30/07/2021	OFICIO N°364 2021 CIU/COLOSÓ	SOLICITUD REMISION INFORMES BIMENSUALES	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE

8.2 Registro fotográfico del avance de obras.



1. Foto: Fundición placas concreto hidráulico 3000 psi – Tramo 1



2. Foto: Instalación acero de refuerzo para cunetas y placas.



3. Foto: Trabajos de pavimentación placa huella – Tramo 1.



4. Foto: Trabajos de pavimentación placa huella – Tramo 1.



5. Foto: Fundición de vigas riostras en concreto hidráulico de 3000 psi – tramo 1.



6. Foto: Obras de pavimentación ejecutadas a la fecha.




7. Foto: Trabajos ejecutados en la vía vereda Calle Larga en Colosó – Sucre.





1. Foto: Trabajos ejecutados en la vía vereda Calle Larga en Colosó – Sucre.

8.3 Bitácora de obra.

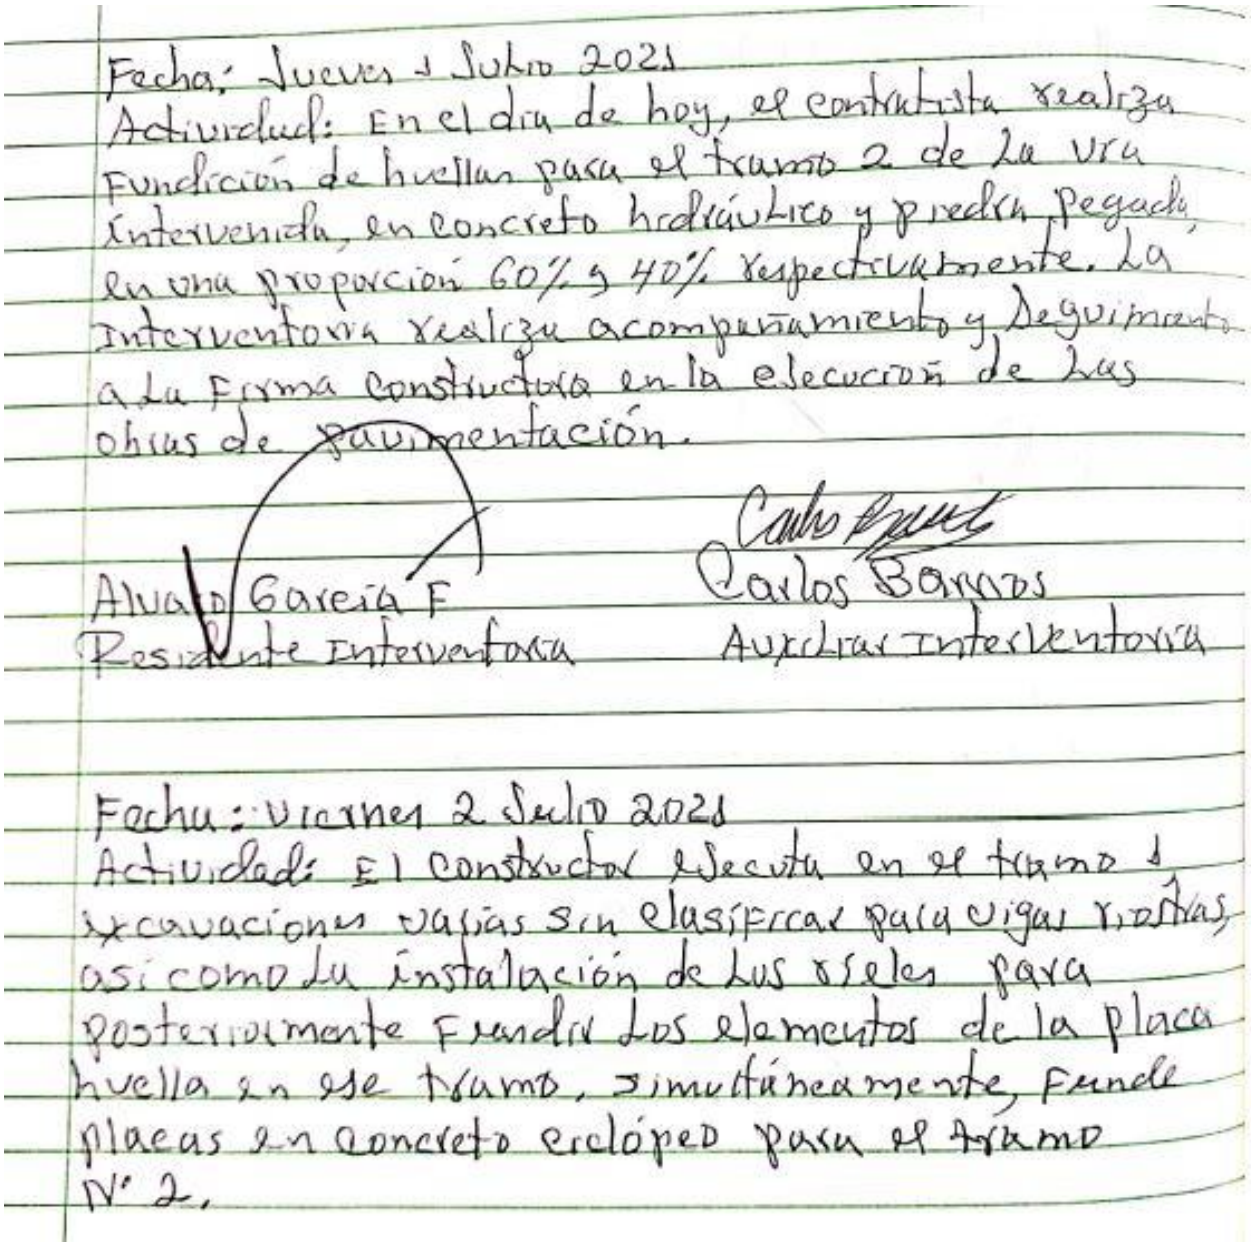

Fecha: Jueves 1 Julio 2021
Actividad: En el día de hoy, el contratista realiza Fundición de huellas para el tramo 2 de la vía intervenida, en concreto hidráulico y piedra pegada, en una proporción 60% y 40% respectivamente. La interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a la firma constructora en la ejecución de las obras de pavimentación.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barros
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 2 Julio 2021
Actividad: El constructor ejecuta en el tramo 1 excavaciones varias sin clasificar para vigas riostras, así como la instalación de los rieles para posteriormente fundir los elementos de la placa huella en ese tramo, simultáneamente, funde placas en concreto ciclópeo para el tramo N° 2.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 3 Julio 2021
Actividad: En el tramo 1, el contratista se encuentra realizando excavaciones varias sin clasificar e instalación de acero de refuerzo para placas, cunetas y bordillos, en este mismo tramo. La Interventoría realiza Seguimiento técnico, administrativo y ambiental de manera constante en aras de cumplir con todos los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: domingo 4 Julio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el día de hoy, al ser un día no laboral de acuerdo con la programación de obra por el contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 5 Julio 2021
Actividad: En el lugar de los trabajos tramo 1 de La Vía, el contratista ejecuta Fundición de placas en concreto hidráulico con resistencia de 3000 PSI; de manera simultanea continua con la instalación de acero de refuerzo para placas en este mismo tramo.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 6 Julio 2021
Actividad: En el dia de hoy, el contratista Funde placas en concreto reforzado de 21 MPA para el tramo 1; también instala acero de refuerzo para placas y ejecuta excavaciones varias para vigas riostras.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 7 Julio 2021
Actividad: Continúa las actividades de Fundición de Placas de concreto reforzado de 3000 psi en el tramo 1 de la vía Colosó - Vereda Calle Larga en el municipio de Colosó, así como la instalación de acero de refuerzo para los elementos de la placa huella, tales como: placas, cunetas y vigas riostras. La interventoría recuerda al contratista la realización de ensayo de resistencia a compresión de los elementos de la placa huella fundidos, así como la entrega de los resultados a la interventoría con el fin de corroborar la resistencia del concreto fundido.

Alvaro García F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar interventoría.

Escaneado con CamScanner

Fecha: Jueves 8 Julio 2021
Actividad: La Firma Constructora, en el día de hoy continúa con la Fundición de Placas en concreto ciclópeo en concreto hidráulico y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente. La interventoría realiza visita al lugar de las obras y realiza control técnico y ambiental de las actividades desarrolladas.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar interventoría

Fecha: Viernes 9 Julio 2021
Actividad: Continúa en el tramo 1 de la vía Colasó - Vereda Calle Larga, la Fundición de Placas en concreto hidráulico de 3000 psi, así como la Fundición de huellas en concreto ciclópeo. De manera simultánea, el contratista adelanta actividades de instalación de acero de refuerzo para Placas, Cunetas y vigas en este mismo tramo.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar interventoría

Fecha: Sabado 10 Julio 2021
Actividad: En el tramo 1, en el día de hoy, el contratista Frende huellas de Concreto Ciclópeo en concreto hidráulico y piedra razón en una proporción 60% y 40% respectivamente. La Interventoría corrobora que el concreto instalado en obra cumpla con las dosificaciones del diseño de mezcla Entregado por el contratista a la interventoría.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: domingo 11 Julio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, ya Ser un dia no laboral de acuerdo con la programación de obra por el contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 12 Julio 2021
Actividad: En el dia de hoy, el constructor realizo excavaciones varias sin clasificar para vigas riostras. Fundición de placas en concreto de 21 MPA y Fundición de huellas en concreto ciclópeo en el tramo 1 de la via. La Interventoría mediante oficio N°336 2021 el cual fue radicado con Fecha 12 de Julio de 2021 y asunto remisión Firmas digitales director e ingeniero residente en el cual se le solicita copia de la firma digital a los ingenieros que figuran como director y residente de obra:

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: martes 13 Julio 2021
Actividad: En el tramo 1 de la via, el contratista prosigue con Fundición de placas en concreto reforzado

Escaneado con CamScanner

de 3000 PSI y Fundición de huellas de ciclopeo en concreto hidraulico y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente. Paralelamente en este mismo tramo, instala acero de refuerzo para cunetas, vigas riostras y bordillos.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 14 Julio 2021
Actividad: El contratista en el dia de hoy realiza Fundición de vigas riostras en concreto de 3000 psi para el tramo 1 de la via Coloso - Vereda Calle Larga en el municipio de coloso Sucre; de manera simultánea, continua con la instalación de acero para cunetas, vigas riostras y bordillos en este mismo tramo. Esta interventoria al notar el caso omiso de la solicitud del OFICIO N° 336 2021 CIV/COLOSO con Fecha, 12 de Julio de 2021, oficia nuevamente al contratista como lo hace notar el OFICIO N° 339 2021 CIV/COLOSO con Fecha 14 de Julio de 2021 y asunto remisión Formas digitales director e ingeniero residente.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 15 Julio 2021
Actividad: En el tramo 1 de la via Vereda Calle Larga el contratista ejecuta actividades tales como: Fundición de vigas riostras y cunetas en concreto reforzado de 3000 PSI e Instalación de acero de refuerzo para cunetas, placas y vigas riostras. La Interventoria Solicita al contratista resultados de ensayos de resistencia a la compresión

Escaneado con CamScanner

de Las elementos de placa huella Fundidos a La Fecha.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 16 Julio 2021
Actividad: Continúa La ejecución de las actividades de obra para la pavimentación de la vía Coloso - Vereda Calle Larga en el municipio de Coloso-Sucre en el tramo 3 de la vía, La Fundición de vigas riostras en Concreto de reforzado de 3000 psi de manera paralela, en el mismo tramo, Fundición de Cunetas en Concreto de 21 MPA.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sabado 17 Julio 2021
Actividad: El Contratista, Funde vigas riostras en el Tramo 3 de La Vía en Concreto de 3000 psi de manera simultánea. Fundición de Cunetas en Concreto de 21 MPA. También ejecuta instalación de acero de refuerzo para Placas, Cuneta, vigas y bordillos en el mismo tramo.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Escaneado con CamScanner

Fecha: domingo 18 Julio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el día de hoy, al ser un día no laborar de acuerdo con la programación de obra por el contratista.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Lunes 19 Julio 2021
Actividad: En el día de hoy, el contratista, se encuentra Fundiendo huellas de Ciclópeo en concreto hidráulico de 21 MPA y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente. La Interventoría realiza visita al lugar de las obras y verifica que las actividades de obras que se encuentran en desarrollo cumplan con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías para este Tipo de pavimentación, así como realiza Inspección Social, ambiental y en materia de SST en el área de los trabajos.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: martes 20 Julio 2021
Actividad: El contratista continúa con Fundición de placas en Concreto ciclópeo para el tramo 1 de la vía. De manera simultánea, en este mismo tramo, Funde vigas riostras en concreto reforzado de 3000 PSI cumpliendo con las dosificaciones de diseño de mezcla presentado por la Firma constructora a la Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 21 Julio 2021
Actividad: En el área de los trabajos, el contratista prosigue Fundiendo para el tramo 2 los elementos de la placa huella, tales como: Vigas riostras en concreto de 21 MPA y placas de concreto ciclópeo en concreto hidráulico de 21 MPA y piedra pegada en una proporción 60% y 40% respectivamente.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 22 Julio 2021
Actividad: En el día de hoy, prosigue Fundición de vigas riostras en concreto reforzado para el tramo 1. La Interventoria mediante OFICIO N° 344 2021 CIU/Coloso con fecha 22 de Julio de 2021 y Asunto Solicitud información manejo Fiducia en aras de Solicitar la información concerniente al manejo de la Fiducia, aperturada para la construcción de las obras referenciadas, la cual incluye los extractos bancarios emitidos por el banco, certificación Final de los rendimientos financieros generados y certificación de pago ante la tesorería del ente contratante, Alcaldía Coloso Sucre.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: Viernes 23 Julio 2021
Actividad: En el área de los trabajos, el contratista Funde Vigas riostras en concreto de 3000 psi, de manera paralela Funde huellas en concreto ciclopeo para el tramo 1 de la vía. La Interventoría solicita al contratista resultado de los ensayos de resistencia a la compresión de los elementos Fundidos en este tramo con el objetivo de corroborar la calidad de las obras ejecutadas, de manera, que cumplan con los lineamientos estipulados por INVIAS.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sabado 24 Julio 2021
Actividad: prosigue Fundición de vigas riostras en concreto de 3000 psi para el tramo 1 de la vía, de acuerdo con las dosificaciones del diseño de mezcla entregado por el contratista a la Interventoría. La Interventoría se encuentra en acompañamiento y seguimiento constante al contrato de obra de referencia.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: domingo 25 Julio 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el día de hoy, al ser un día no laboral de acuerdo con la programación de obra por el Contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Escaneado con CamScanner

Fecha: Lunes 26 Julio 2021
Actividad: El contratista realiza instalacion de acero de refuerzo para placas, cunetas y vigas riostras en el tramo 1 de la via. La interventoria realiza Seguimiento Técnico, administrativo y ambiental de manera constante en aras de Cumplir con todo los Lineamiento estipulados por el Instituto Nacional de Vias INVIAS.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 27 Julio 2021
Actividad: En el dia de hoy, el contratista Funde Vigas riostras en concreto de 21 MPA para el tramo 1 de la Via; de manera simultanea Funde Placas en Concreto de 3000 psi en este mismo tramo.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 28 Julio 2021
Actividad: Prosiguen las actividades de pavimentacion en la via Colasó - Vereda Calle Larga. El contratista continúa con Fundicion de vigas riostras en concreto de 3000 psi para el tramo 1 de la via. de manera Simultanea en este mismo tramo, Funde placas en concreto reforzado de 21 MPA y Huellas de ciclopeo en concreto hidraulico y piedra pegada en una proporcion 60% y 40% respectivamente.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: Jueves 29 Julio 2021
Actividad: En el dia de hoy, en el área de los trabajos, tramo 1 de la via, el constructor realiza Fundición de placas de ciclópeo en concreto hidraulico de 3000 psi y piedra razón en una proporción 60% y 40% respectivamente. Paralelamente, en este mismo tramo, Funde Vigas riostras en concreto reforzado de 21 MPA.

Alvaro García F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria


Fecha: Viernes 30 Julio 2021
Actividad: El contratista prosigue con la Fundición de vigas riostras en concreto de 3000 psi. cumpliendo con la dosificación del diseño de mezcla entregado por la Firma constructora a la Interventoria. A través de su personal profesional, la Interventoria realiza seguimiento y control técnico, Social, ambiental, administrativo y en materia de SST al contrato de obra N° LP-085-2020 del municipio de Coloso - Sucre.

Alvaro García F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sabado 31 Julio 2021
Actividad: En el tramo 1 de la via, el constructor realiza Fundición de placas en concreto ciclópeo y Fundición de vigas riostras en concreto hidraulico reforzado de 3000 psi. La interventoria solicita al contratista los resultados de Laboratorios de las obras de pavimentación realizadas a la fecha de hoy.

Escaneado con CamScanner

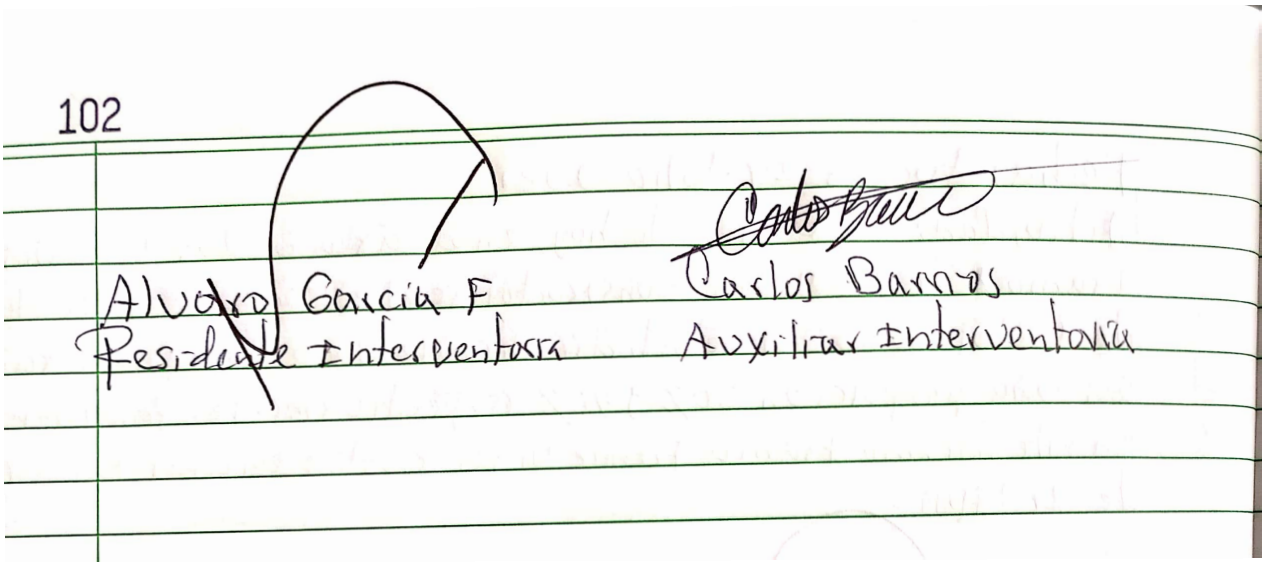

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: LP – 085 – 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 10/09/2020
FECHA DE REANUDACION N°2: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.055.799.942,50
VALOR ACUMULADO: $ 1.055.799.942,50
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 117.412.221,00

PLAZO ACUMULADO: 11 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: N/A
VALOR ADICIÓNALES: N/A
AMORTIZACION ANTICIPO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Ml	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Ml	1000
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 216.167.552	$ -	$ 216.167.552	-	$ 69.096.129	1,000	0,32
Acumulado:	$ 1.055.799.942,50	$ 975.234.597	$ -	$ 975.234.597	0,92	$ 667.359.997	1,000	0,68

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	**$ 1.055.799.942,50**

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,92	10,73	0,98	0,27	$ 80.565.345,50	0	$ 1.055.799.942,50	-
Interventor:	0,76	11,00	0,76	3,50	$ 205.875.122,28	0	$ 205.875.122,28	$ 205.875.122,28

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	10/12/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	10/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	10/08/2024
Calidad de Estudios y Diseños	12/04/2021	12/04/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	12/04/2021	12/04/206

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	10/08/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 28/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

EL ENTE CONTRATANTE A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HA CITADO A AUDIENCIA AL CONSORCIO CONTRATISTA POR LA SOLICITUD DE APREMIO REALIZA POR LA INTERVENTORÍA, MOTIVADA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO CONTRATISTA PARA CON EL MUNICIPIO DE COLOSÓ SUCRE

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

LA INTERVENTORÍA A TRAVÉS DE OFICIO N° 330 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 11 DE JULIO DE 2021. LE SOLICITA AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ ACTUALIZAR DOCUMENTOS COMO PLAN DE CONTINGENCIA, PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE CAJA SEMANAL EN EXCEL DE ACUERDO A LA PRÓRROGA N° 3 SOLICITA POR LA FIRMA CONSTRUCTORA POR TÉRMINO DE 45 DIAS CALENDARIO

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°336 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 12 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE EN EL CUAL SE LE SOLICITA COPIA DE LA FIRMA DIGITAL A LOS INGENIERO QUE FIGURAN COMO DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.

ESTA INTERVENTORÍA AL NOTAR EL CASO OMISO DE LA SOLICITUD DEL OFICIO N°339 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 14 DE JULIO DE 2021 ,OFICIIA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA COMO LO HACE NOTAR EL OFICIO N°339 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 14 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO REMISION FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE.

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°344 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 22 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO SOLICITUD INFORMACION MANEJO FIDUCIA EN ARAS DE SOLICITAR LA INFORMACION CONCERNIENTE AL MANEJO DE LA FIDUCIA, APERTURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REFERENCIADAS, LO CUAL INCLUYE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EMITIDOS POR EL BANCO, CERTIFICACION FINAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y CERTIFICACION DE PAGO ANTE LA TESORERIA DEL ENTE CONTRATANTE, ALCALDIA DE COLOSO SUCRE.

A TRAVÉS DE OFICIO N° 348 2021 CIU / COLOSÓ DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021; LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONSORCIO CONTRATISTA REMITA BALANCE FINAL INTEGRAL DEL CONTRATO , PARA EFECTOS DE AVALAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LOS APUS DE ITEMS NO PREVISTOS Y PROCEDER A ENVIARLOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA APROBACION FINAL POR PARTE DE ELLOS

MEDIANTE OFICIO N° 356 2021 CIU/COLSÓ DEL DIA 29 DE JULIO DE 3031, LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL ALCALDE MUNICIAL. ISAIAS JAVIER DIAZ BARRIOS, REMITIR A LA INTERVENTORÍA INFORMES BIMENSUALES DEL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 364 2021 CON FECHA 30 DE JULIO DE 2021, REITERA SOLICITUD AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ DE REMITIR INFORMES BIMENSUALES DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARÁ CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE REFERENCIA

LA INTERVENTORÍA SOLICITA CON CARÁCTER URGENTE AL CONTRATISTA INFORMACION ACTUALIZADA DE PLAN DE CONTINGENCIA, REPROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y FLUJO DE CAJA SEMANAL EN EXCEL, DE ACUERDO A LA PRÓRROGA N° 03 POR TÉRMINO DE 45 DIAS SOLICITADA POR EL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA SEGUIRÁ INFORMANDO A LA ENTIDAD CONTRATANTE E INVIAS DEL ESTADO DE AVANCE DE ESTE CONTRATO

Firma

Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoria
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JULIO **CONTRATO No.** LP – 085 – 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aspersor manual	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	A	I	A
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoj	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua(1000 Galones)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm.	I	I	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta 6 m3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	10

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JULIO **CONTRATO DE OBRA No.** **LP – 085 – 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO A LA INTERVENTORÍA COPIA DE PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL , COMO SOPORTE DE CONTROL DIARIO DEL PERSONAL VINCULADO A LAS OBRAS, PESE A LOS REQUERIMIENTOS

REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA EN VARIAS OPORTUNIDADES

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	10

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES INFORME MENSUAL: JULIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	201067-01 de 26/06/2020	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-085-2020	201067	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.055.799.942,50
TOTAL						**$ 1.055.799.942,50**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.055.799.942,50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 834.887.523,38	$ 195.837.814,13	$ 1.030.725.337,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22	$ 2.722.312,78	$ 14.327.962,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 8.704.780,83	$ 2.041.862,17	$ 10.746.643,00
VALOR TOTAL	$ 855.197.953,43	$ 200.601.989,08	$ 1.055.799.942,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	5 DE 10	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021

UNIDAD EJECUTORA: FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: JULIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	22	23	24	23	736
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	8
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO CONTRATISTA NO PRESENTÓ RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE ESTE MES. LA INTERVENTORÍA HA SOLICITA REITERADAS VECES HACER LLEGAR TAL INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	7	DE 10

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. dias cotizados		Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma

Nombre : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 11 **PERIODO MES:** JULIO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP – 085 – 2020 PLAZO INICIAL: 7 MESES PLAZO ACUMULADO: 11 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

SECTOR: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.055.799.942,50 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8 DE AGOSTO DEL 2021

RUTA: N/A VALOR ACUMULADO: $ 1.055.799.942,50 VALOR ADICIONALES: N/A

TRAMO: N/A ANTICIPO CONCEDIDO: $ 117.412.221,00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	11 MESES	8/08/2021	1.055.799.942,50	1.055.799.942,50

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	**$ 1.055.799.942,50**

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 117.412.221
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	14,5 MESES	8/11/2021	$ 685.270.884,00	$ 873.235.119,20

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 216.167.552,00	$ -	$ 216.167.552	-	$ 69.096.129,00	1,000	0,32
Acumulado:	$ 1.055.799.942,50	$ 975.234.597	$ -	$ 975.234.597	0,92	$ 667.359.997,00	1,000	0,68

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,92	10,73	0,98	0,27	$ 80.565.345,50	0	$ 1.055.799.942,50	-
Interventor:	0,97	11,00	0,76	3,50	$ 205.875.122,28	0	$ 205.875.122,28	$ 205.875.122,28

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	3,6
Calzada:	3,6
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	N/A
Carpeta:	N/A

Observaciones: LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA; ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS; NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	$ 13.372.764,0	$ 16.010.879,0	$ 17.823.251,0	$ 19.635.623,0	$ 168.096.335,0	$ 493.266.263,0	$ 876.047.752,0	$ 1.055.799.942,0	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT	$ 17.861.364,3								N/A	N/A	N/A	N/A	-
	$22.374.534,500												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$ 1.012.863.973,2								0	0,246	12,8	1	0,000
	$ 952.860.062,5												
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.327.962,0								N/A	N/A	N/A	NA	-
	$ 11.605.649,2												
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$ 10.746.643,0								N/A	N/A	N/A	N/A	-

INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)				
	En el mes		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT	$ 0,0	$ 4.907.105,0	$ 17.861.364,3	$ 22.374.534,5
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$ 0,0	$ 211.260.447,4	$ 1.012.863.973,2	$ 952.860.062,5
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,0	$ 0,0	$ 14.327.962,0	$ 11.605.649,2
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$ 0,0	$ 0,0	$ 10.746.643,0	$ 0,0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8-ago-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO: $ 1.055.799.942,50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.** **-**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	12	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	10	8	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	12	4	2021	12	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	10	8	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 28/06/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8-ago-21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma N.A.	Firma	Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	Nombre:	Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	Nombre:
Director de Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:22202-246559 COR	Matrícula No.:	Matrícula No.: 25202-60909 CND	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 27 (Día) 07 (Mes) 21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Ferrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. LP-085 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio placa Huella Coloso

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso - Vereda Calle Larga en el municipio de Coloso - Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio Civ Terciaria

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jorge velasquez	Director Interventoria	Consorcio Civ Terciaria
Alvaro Garcia Florez	Residente Interventoria	Consorcio Civ Terciaria.
Luis Miguel Gonzales O.	Coordinador	INVIAS
William Felipe Gutierrez	Gestor	INVIAS
Mario Jose Caballero	Director territorial Sucre	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento Semanal del contrato de obra del municipio de Coloso - Sucre (Reunión Virtual)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

* Resolver dudas, inquietudes e inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de obra en el municipio de Coloso - Sucre.
* Verificar el desarrollo y porcentaje de ejecución de la obra.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	27 (Día)	07 (Mes)	21 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- El Contratista lleva ejecutado el 90%, Con Fecha de terminación el 8 de Agosto del 2021
- La interventoria está revisando el Balance de obra para su aprobación
- Como recomendación utilizar los recursos que sobren en la Señalización vial para garantizar la Seguridad en las obras.
- Se lleva Construido en placa huella 1172 metros lineales
- Ya se encuentra Construido el box Culvert, donde se había programado que Fuera 1x1 Pero el analisis hidrologico arrojo 2x1 y se realizo de esa manera.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jorge Velasquez	
Alvaro García Florez	
Luis Miguel Gonzales Ozuna	
William Felipe Gutierrez Barragan.	
Mario Jose Caballero. Guerra	

Original: Informe mensual de Interventoria

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	29 (Día)	07 (Mes)	21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. Lp-085 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio Placa Huella Colosó

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de las vías de los municipios PDET del Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: Consorcio CIU Terciaria

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jorge Velasquez	Director Interventoria	C. CIU Terciaria.
Luis Miguel Gonzales	Supervisor	INVIAS
Alvaro Garcia Florez	Residente Interventoria	C. CIU Terciaria
William Felipe Gutierrez	Gestor	INVIAS
Monica Orduz Manrique	Profesional de Apoyo	INVIAS.
Mario Jose Caballero	Director Territorial Sucre.	INVIAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Directrices para la recopilacion de Informacion de la visita que realizara el Departamento Nacional de planeacion.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Aclarar los tramites que se deben llevar a cabo, para recibir la visita del Departamento Nacional de planeacion

Directrices de la Informacion que se debe tener de manera clara, organizada para la visita del (DNP) - Departamento Nacional de planeacion

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Hacer un video corto de 2minutos para cada mucipio de las actividades totales y cuales se estan ejecutando de manera clara.
- Actualizar la información de las polizas de la adición 1 Prorroga 3.
- Enviar el acta de modificación 2 y la acta de modificación 3 esta en tramites de acuerdo a la adición 1 Prorroga 3.
- Se estan Solicitando los informes de interventoria al corte de 30 de junio
- Los informes de supervisión actualizada a corte de 30 de junio.
- Todas las actas de cesta que han tramitado los municipios para dar la información de los traslados de los recursos.
- Actas de socialización de inicio de obra de todos los municipios
- Los documentos finales de Estudios y Diseños, acta de aprovación de estudios
- Fotografias recientes, 8 por cada municipio, legibles y de forma horizontal.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jorge Velasquez	
Luis Miguel Gonzales	
Alvaro Garcia Florez	
Monica Orduz Manrique	
William Felipe Gutierrez	
Mario Jose Caballero.	

Escaneado con CamScanner

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 40**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	8 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y CUATRO (44) **del** 2/07/2021 **al** 8/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 788.728.333
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	74,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 788.728.332,96

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	16,875	19,95	85,50	19,5	137,70	**279,525**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	56,25	54	255	52,5	375	**792,75**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

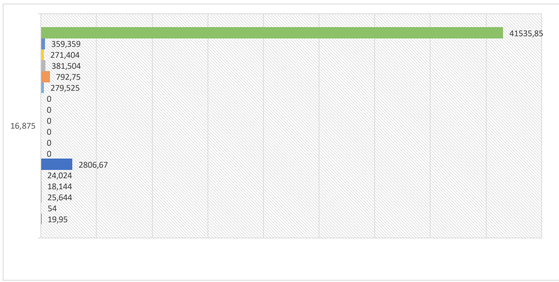

MAOUINARIA Y EOUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: ____ — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

ESTADO:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA DE FECHA 21 DE JULIO , REITERANDO SOLICITUD DE
ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 40**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	8 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y CUATRO (44) **del** 2/07/2021 **al** 8/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

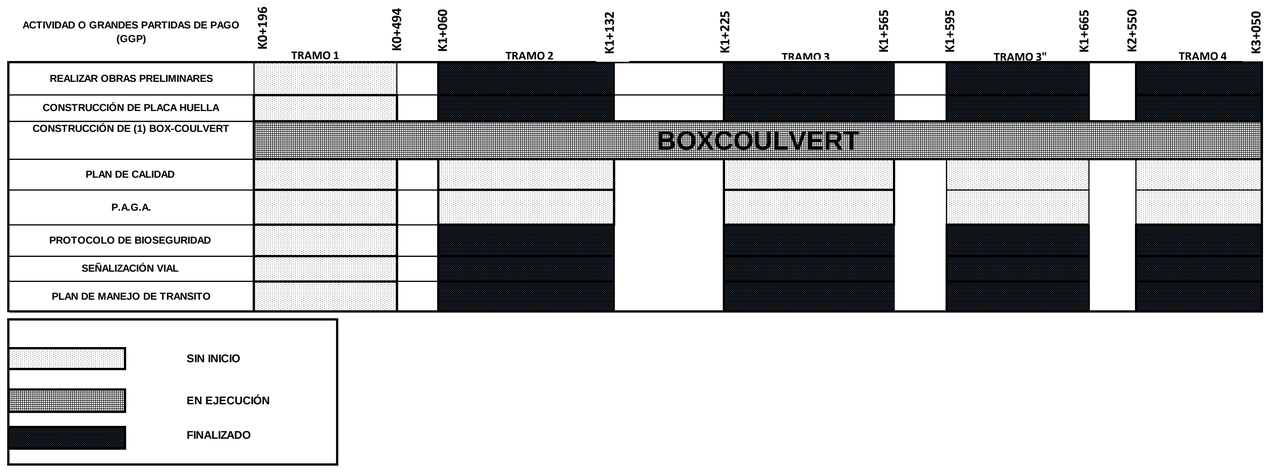

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA HUELLA



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 4. FUNIDION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 41**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	15 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y CINCO(45) **del** 9/07/2021 **al** 15/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 952.250.233
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	90,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 952.250.233,23

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

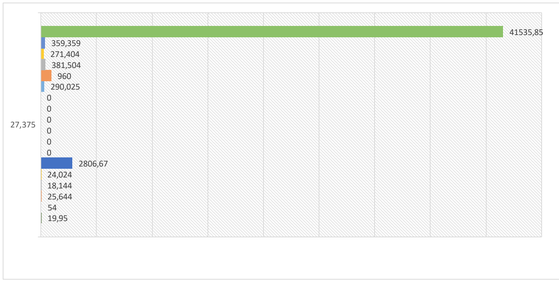

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
PERMISO MINERO: SI NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

ESTADO:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE
ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: HASTA LA PRESENTE EL CONTRATO DE OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: La interventoría se apoya conjuntamente con la social del contratista para la gestión social correspondiente a las obras.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 41**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	15	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y CINCO(45) **del** 9/07/2021 **al** 15/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

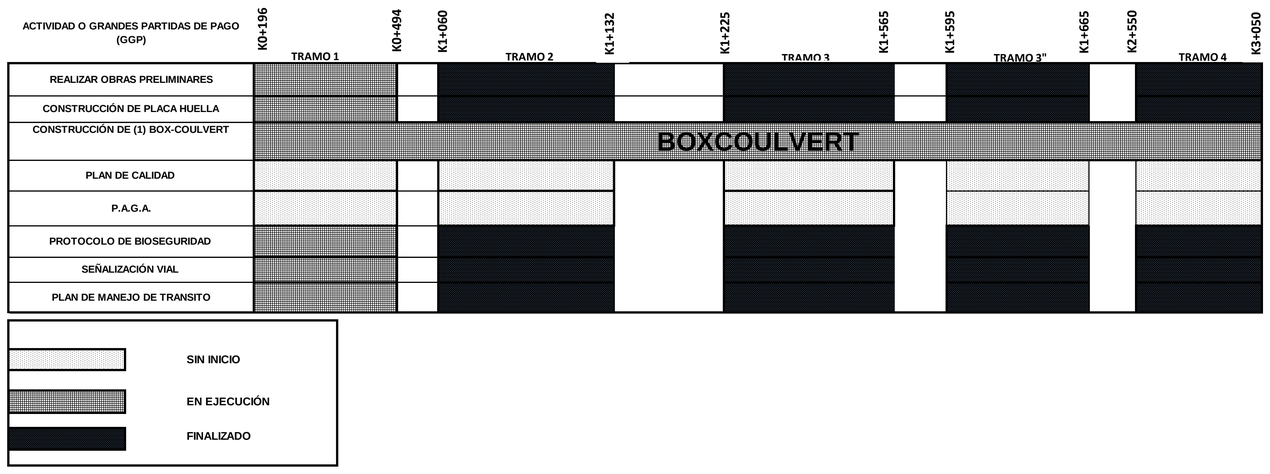

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA HUELLA



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.



FOTO 4. FUNIDION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°336 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 12 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE EN EL CUAL SE LE SOLICITA COPIA DE LA FIRMA DIGITAL A LOS INGENIERO QUE FIGURAN COMO DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
ESTA INTERVENTORÍA AL NOTAR EL CASO OMISO DE LA SOLICITUD DEL OFICIO N°336 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA 12 DE JULIO DE 2021 ,OFICIIA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA COMO LO HACE NOTAR EL OFICIO N°339 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 14 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO REMISION FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE.	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 42**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	22 (Día)	7 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y SEIS (46) **del** 16/07/2021 **al** 22/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 970.235.185
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	91,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 970.235.185,15

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

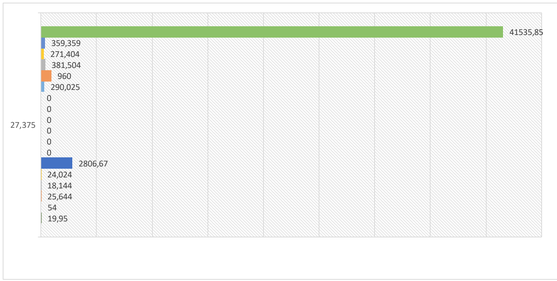

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
PERMISO MINERO: SI NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

ESTADO:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA OFICIO DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
PENDIENTE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA HASTA LA PRESENTE NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORIA SIGUE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA LLEVA UN ATRASO DEL 8.1%, SE ESPERA DISMINUIR ESTE PORCENTAJE EN LA PROXIMA SEMANA, DEBIDO A LA PETICION DE LA INTERVENTORÍA REALIZANDO AUMENTO DE RENDIMIENTO, AUMENTO LA MANO DE OBRA Y LA INTENSIDAD EN EL USO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 42**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	22	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y SEIS (46) **del** 16/07/2021 **al** 22/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

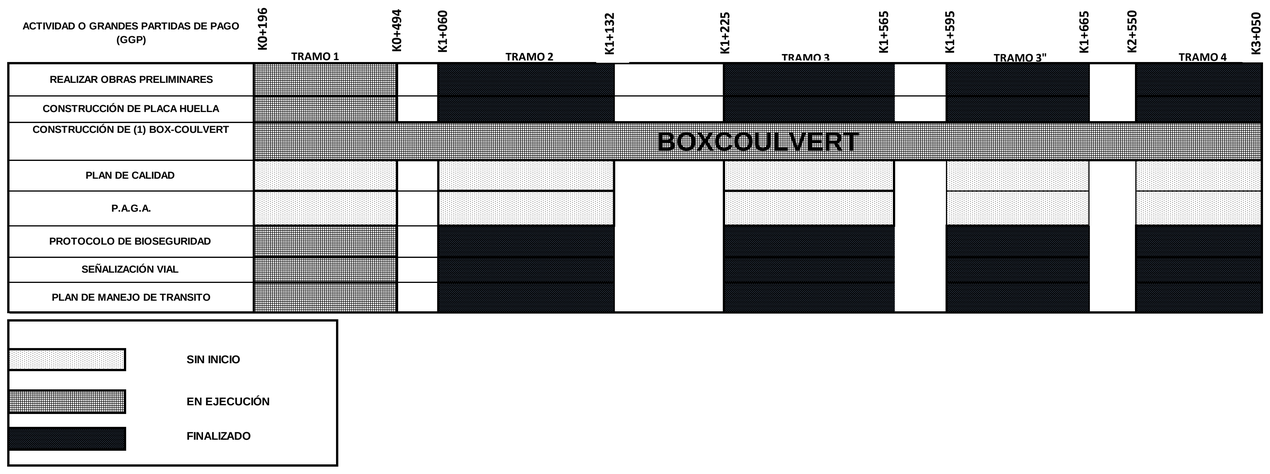

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIGAS RIOSTRAS.



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°344 2021 CIU/COLOSÓ CON FECHA DE 22 DE JULIO DE 2021 Y ASUNTO SOLICITUD INFORMACION MANEJO FIDUCIA EN ARAS DE SOLICITAR LA INFORMACION CONCERNIENTE AL MANEJO DE LA FIDUCIA, APERTURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REFERENCIADAS, LO CUAL INCLUYE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EMITIDOS POR EL BANCO, CERTIFICACION FINAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y CERTIFICACION DE PAGO ANTE LA TESORERIA DEL ENTE CONTRATANTE, ALCALDIA DE COLOSO SUCRE.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 43**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	29 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y SIETE (47) **del** 23/07/2021 **al** 29/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 975.234.597
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	92,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 975.234.596,56

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar	0					**0**
Relleno para estructuras con suelo	0					**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	0					**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	0					**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	0					**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

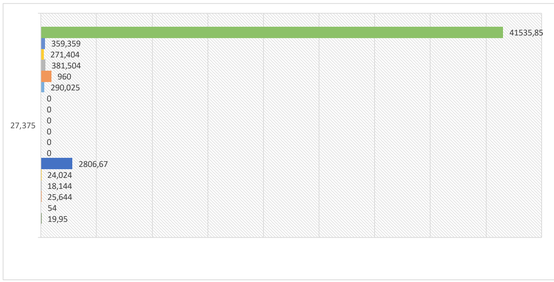

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El proyecto requiere permiso ocupacion de cauce

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista presenta documento PAGA VERSION 1 de fecha 17 de diciembre de 2020, se solicitan ajustes e informes ambientales hasta la fecha, sin respuesta a las reiteraciones realizadas con copia al INVIAS
La interventoría solicito el documento e informes ambientales, mediante oficio, pero a la fecha del presente informe el contratista aún no ha hecho entrega

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA NO TIENE GESTIÓN PREDIAL, NO HAY AMPLIACIONES DE LA VÍA NI MODIFICACIONES DEL TRAZADO QUE OBLIGUEN A LA ADQUISICIÓN DE PREDIO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO - SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORÍA ESTA ATENTA A CUALQUIER PQR EMITIDA POR LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LA OBRA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA LLEVA UN ATRASO DEL 8.1%, SE ESPERA DISMINUIR ESTE PORCENTAJE EN LA PROXIMA SEMANA, DEBIDO A LA PETICION DE LA INTERVENTORÍA REALIZANDO AUMENTO DE RENDIMIENTO, AUMENTO LA MANO DE OBRA Y LA INTENSIDAD EN EL USO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 43**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	29	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y SIETE (47) **del** 23/07/2021 **al** 29/07/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

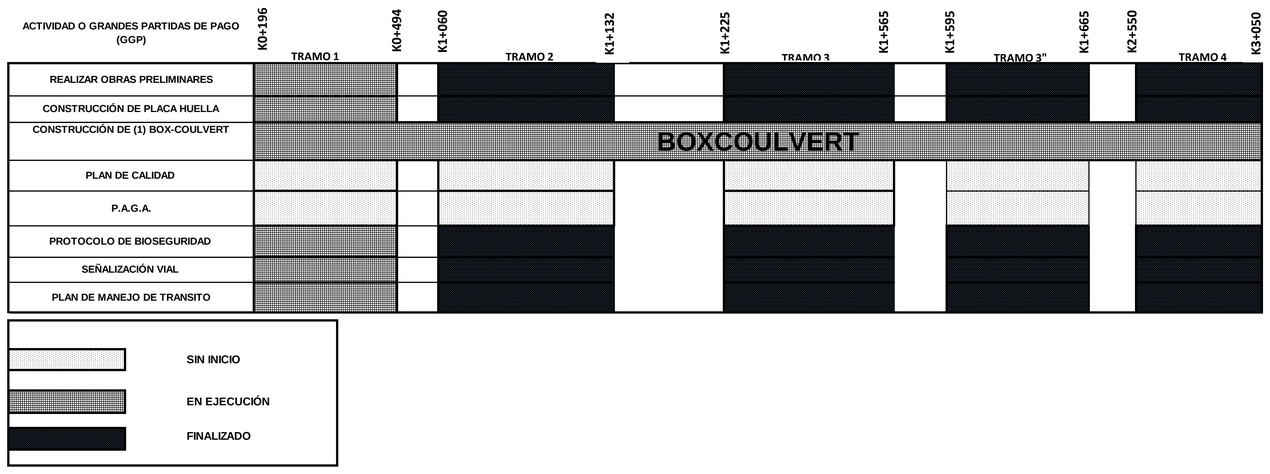

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIGAS RIOSTRAS.



FOTO 3. FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 6	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: **JULIO** **CONTRATO No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO CIU TERCIARIA** **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 14

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: JULIO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	INSPECTORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YINA JUDITH CARO COHEN	INSPECTORA SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MES ES LA SIGUIENTE: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 0.40/1 , ESPECIALISTA AMBIENTAL 0. 33/1 ;DEMÁS RECURSO PERSONAL: 1/1

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL: JULIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70204	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,20
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70508	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70418	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70523	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70713	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70823	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70230	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70473	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
				TOTAL		**$ 873.235.119,28**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 873.235.119,28**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	$ 16.447.491	$ 3.858.053	$ 20.305.544	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 20.305.544	$ 664.965.340,00	-	ACTA CONCILIADA
2	octubre	$ 35.518.064	$ 8.331.398	$ 43.849.462	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 64.155.006	$ 621.115.878,00	-	ACTA CONCILIADA
3	noviembre	$ 51.817.723	$ 12.154.775	$ 63.972.498	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 128.127.504	$ 557.143.380,00	-	ACTA CONCILIADA
4	diciembre	$ 49.968.892	$ 11.721.098	$ 61.689.990	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 189.817.494	$ 495.453.390,00	-	ACTA CONCILIADA
5	enero	$ 52.130.834	$ 12.228.220	$ 64.359.054	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 254.176.548	$ 431.094.336,00	-	ACTA CONCILIADA
6	febrero	$ 51.067.961	$ 11.978.905	$ 63.046.866	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 317.223.414	$ 368.047.470,00	-	ACTA EN ELABORACION
7	marzo	$ 59.739.174	$ 14.012.893	$ 73.752.067	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 390.975.481	$ 294.295.403,00	-	ACTA EN ELABORACION
8	abril	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 460.071.610	$ 225.199.274,00	-	ACTA EN ELABORACION
9	mayo	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 529.167.739	$ 156.103.145,00	-	ACTA EN ELABORACION
10	junio	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 598.263.868	$ 87.007.016,00	-	ACTA EN ELABORACION
11	julio	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 667.359.997	$ 205.875.122	-	ACTA EN ELABORACION
TOTALES		**$ 540.561.598**	**$ 126.798.399**	**$ 667.359.997**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ 156.600,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ -
2	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.200,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00	$ -	$ -
3	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.300,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
4	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.485.000,00	$ 1.485.000	$ 103.356,00	$ 59.400,00	$ 237.600,00	$ 59.400,00	$ -	$ -
5	CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	32670053	INSPECTOR SOCIAL	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00		$ 64.000,00	$ -	$ -
6	YINA JUDITH CARO COHEN	1102847188	INSPECTOR SST	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00	$ 256.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ -
7	MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	1099965566	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.256,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$							15.105.000,00

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	6

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **732-2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 1/09/2019

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIMEBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/11/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 685.270.884,00

VALOR ACUMULADO: $ 873.235.119,28
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	24	3	2021	30	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	24	3	2021	30	6	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	30	6	2021	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18

FECHA 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

FECHA DE INICIO: 1/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/11/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 11 de julio de 2021 OFICIO N°330 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD ACTUALIZACION DOCUMENTOS**

Cordial saludo,

La interventoría, teniendo en cuenta el OFI 49 PH COLOSÓ de 17 de junio 2021, -donde ustedes solicitaron prorroga contractual por término de cuarenta y cinco (45) días calendario -, esta interventoría ya requirió al municipio de Colosó, Sucre, con la finalidad que se oficialice la prorroga requerida, para finiquitar los trabajos remanentes del contrato de obra referenciado.

Posteriormente, mediante OFICIO N°311 2021 CIU/ COLOSÓ, de 23 junio de 2021, esta interventoría los requirió hacer entregar de actualización de documentos, requerimiento que a la fecha han omitido ante la interventoría.

Por ende, y debido que la prorroga N° 3 por término de 45 días, reiteramos que ustedes como consorcio constructor, -deben en el término de la instancia-, actualizar nuevamente el plan de contingencia, donde se detallen los recursos económicos, logísticos, equipos, personal profesional, técnicos, ayudantes y obreros requeridos, para la terminación y entrega de los trabajos de acuerdo a los tiempos de la prorroga N° 03; así mismo, solicitamos con el mismo rigor, actualicen y presenten la nueva reprogramación de los trabajos, y, el flujo de caja semanal en la aplicación Excel, incluyendo el avance semanal y acumulado en porcentaje de avance de los trabajos.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

En síntesis, esta interventoría reitera en nueva oportunidad, hacer entrega de los documentos relacionados, con la finalidad de revisión y aprobación por parte de interventoría y ente contratante.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 12 de julio de 2021 OFICIO N°336 2021 CIU/ COLOSO

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE**

Cordial saludo,

Mediante oficio INV-732-2020-117, de 29 de octubre de 2020, interventoría comunicó a ustedes, la lista de profesionales aprobados para participar en el desarrollo de las obras de pavimentación del contrato en referencia, específicamente los cargos de director y residente de las obras.

Por tal motivo, esta interventoría solicita copia de la firma digital del ingeniero Carlos Alfonso Garrido Hernández, -quien se admitió como director de las obras-, y del ingeniero Jesús Manuel Romero García, - quien se aprobó para del cargo de residente de las obras-, que además debe enviarnos el correspondiente diploma como especialista en vías terrestres.

Esta solicitud, esperamos la atiendan en el término de la instancia, ya que es requisito intrínseco, primero, para validar nuestros informes técnicos de las obras del municipio de Colosó Sucre, ante el Instituto Nacional de Vías, y, segundo, dar trámite correspondiente, a las actas de cobro parcial y final que presenten a la interventoría.

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 14 de julio de 2021 OFICIO N°339 2021 CIU/ COLOSO

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REMISIÓN FIRMAS DIGITALES DIRECTOR E INGENIERO RESIDENTE**

Cordial saludo,

Motiva el presente, reiterar el cumplimiento de la comunicación OFICIO N°336 2021 CIU/ COLOSÓ, de 12 julio de 2021, donde esta interventoría precisó y exige el cumplimiento de lo siguiente:

.

Copia de la firma digital del ingeniero Carlos Alfonso Garrido Hernández, -quien se admitió como director de las obras-, y del ingeniero Jesús Manuel Romero García, - quien se aprobó para del cargo de residente de las obras-, que además debe enviarnos el correspondiente diploma como especialista en vías terrestres, información que debe contener números de las matriculas profesionales.

Esta solicitud, esperamos la atiendan en el término de la instancia, ya que es requisito intrínseco, primero, para validar nuestros informes técnicos de las obras del municipio de Colosó Sucre, ante el Instituto Nacional de Vías, y, segundo, dar trámite correspondiente, a las actas de cobro parcial y final que presenten a la interventoría.

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 22 de julio de 2021 OFICIO N°344 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACIÓN MANEJO FIDUCIA**

Cordial saludo,

De manera respetuosa, solicitamos enviarnos toda la información concerniente al manejo de la fiducia, aperturada para la construcción de las obras referenciadas, lo cual incluye, los extractos bancarios emitidos por el banco, certificación final de los rendimientos financieros generados, y, certificación de pago ante la tesorería del ente contratante, alcaldía de Colosó Sucre; y, toda aquella información que usted estime pertinente adjuntar, concerniente al encargo fiduciario del contrato

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 23 de julio de 2021 OFICIO N°348 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
R/L Greys Miranda Vergara

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD REMISION BALANCE FINAL INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020**

Cordial saludo,

A la fecha, se encuentra realizado el balance general del contrato referenciado, motivo que nos obliga a solicitarles nos remitan el balance general, realizado en conjunto con sus ingenieros, para efectos de ***avalar*** por parte de esta interventoría, los APUS de ítems no previstos, y, proceder a enviarlos a la alcaldía de Colosó Sucre, para que procedan a su aprobación final por parte de ellos, debido que son los contratantes.

Introducir ítems no previstos al desarrollo de las obras, requiere de un cambio en el componente presupuestal del contrato de obra No.MM-LP-OP-085-2020, siendo el contratista y contratante, -solo ellos, de acuerdo a la normatividad contractual-, los que pueden llegar a un nuevo acuerdo de voluntades, -ya que un contrato es un acuerdo de voluntades-, para el reconocimiento de nuevas partidas constructivas, siendo la función de la interventoría, ***avalar*** que los nuevos precios de ítems no previstos, se ajusten a los valores estipulados por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS.

En síntesis, esta interventoría no dará el aval de los ítems no previstos, -para remitir su aprobación por parte de la alcaldía de Colosó Sucre-, hasta que ustedes, remitan el balance general que está elaborado a la fecha, con la finalidad de remitir toda la documentación completa, para que el ente contratante, observe y palpe el alcance general de las obras del contrato referenciado, mediante la introducción de estos nuevos ítems necesarios para el desarrollo de las obras.

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 29 de julio de 2021 OFICIO N°356 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD REMISION INFORMES BIMENSUALES**

Cordial saludo,

En la primera semana de agosto del año en curso, el Departamento Nacional de Planeación coordinamente con el Instituto Nacional de Vías INVIAS, realizará visita técnica al área de ejecución de los trabajos, con la finalidad de verificar el cumplimiento del convenio 645 de 2020 y del contrato de obra publica referenciado.

Dentro de las obligaciones del municipio de Colosó Sucre, está el elaborar los informes bimensuales del desarrollo de esta obra publica, por consiguiente, de manera respetuosa, esta interventoría solicita la remisión, - en el término de la instancia-, los informes bimensuales que se hayan generado a la fecha, y, con corte a 31 de julio de 2021, información a entregar a las respectivas entidades involucradas en el financiamiento y desarrollo de esta obra publica.

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 30 de julio de 2021 OFICIO N°364 2021 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD REMISION INFORMES BIMENSUALES**

Cordial saludo,

En reunión virtual, sostenida el día de ayer de 3:00 P.M a 4:00 P.M – entre el Departamento Nacional de Planeación coordinamente con el Instituto Nacional de Vías INVIAS e interventoría-, se acordó como fecha final el próximo 3 de agosto de 2021, para que el municipio de Colosó Sucre, entregue los informes bimensuales generados desde el inicio de las obras hasta el 30 de junio de 2021, con la finalidad de dejarlos a consideración al Departamento Nacional de Planeación, para que se documente previamente, ex ante de la visita técnica a realizarse la primera semana de agosto de 2021.

No siendo otro el motivo,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C
