CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 732 DE 2020

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATO DE OBRA LP – 085 -2020





NFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12

PERIODO DEL 01 al 31 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO CIU TERCIARIA

NIT. 901.381.077-9

ELABORÓ	REVISÓ
ING ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ	JORGE ISSAC VELASQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3202733572

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciosantander2019@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORME MENSUAL NO. 12 **MES O PERIODO:** AGOSTO 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**			X	6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**			X	7
2.1	Localización			X	9
2.2	Inventario y estado inicial de la vía			X	10
2.3	Características técnicas del proyecto			X	10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**			X	12
3.1	Información general del contrato			X	12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes			X	13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**			X	18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		43
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		45
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		47
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		49
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		51
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		53
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		55
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		57
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		59
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		62
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		N/A	
	• Seguimiento Programa de Obra			X	20
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		N/A	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		67
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		65
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		76
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	21
5.1	Información general del contrato			X	21
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			X	22
5.3	Informes especialistas			X	23
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	23

5.5	Información otros programas y aplicativos			X	23
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			X	23
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		85
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		87
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		89
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		91
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		93
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		96
6.7	Otros documentos seguimiento mensual			N/A	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		N/A	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		N/A	
7	**Conclusiones y recomendaciones**			X	26
8	**Anexos**		X		27
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		27
8.2	Registro fotográfico		X		28
8.3	Bitácora de obra		X		34
8.4	Video del avance de las obras			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1 Localización 7

2.2 Estado inicial de la Vía 9

2.3 Características Técnicas del Proyecto 10

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

3.1 Información general del contrato de obra 12

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 13

3.3 Seguimiento ítems no previstos 15

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 18

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto 18

4.2 Maquinaria y equipo del contrato 18

4.3 Personal del contrato de obra 18

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra 18

4.5 Estado general del tiempo 18

4.6 Resumen ensayos de laboratorio 18

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 19

4.8 Informe avance físico financiero 19

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 19

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 19

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra 19

4.12 Seguimiento a la programación de obra 19

4.13 Seguimiento programa de inversiones 20

4.14 Actas comité de obra 20

4.15 Acta reunión 20

4.16 Informe semanal 20

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21

5.1 Información general del contrato de interventoría 21

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 22

5.3 Informes especialistas 22

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 22

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23

6.1 Equipo contrato de interventoría 23

6.2 Personal contrato de interventoría 23

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 23

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 23

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría 23

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 24

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo 24

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 25

8. ANEXOS 26

8.1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido. 26

8.2 Registro fotográfico y video del avance de obras. 27

8.3 Bitácora de obra. 32

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y tránsito de la población rural del municipio de Colosó Sucre, realizando el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria sector vereda Calle Larga, a fin de proporcionar entornos más apropiados para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de este sector. El municipio de Colosó ha adelantado otros proyectos de este tipo, lo que le permite formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión a fin de ser financiado con recursos del sistema general de regalías-OCAD Paz.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Subdirección de red terciaria férrea, mediante el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.CMA-DO-SRT-010-2020, adjudicó por la Resolución Número 988 del 21 de abril de 2020 al CONSORCIO CIU TERCIARIA, el Contrato No. 732 de 2020 por valor de $685.270.884 IVA incluido, con Acta de Iniciación a partir del 1° de octubre de 2020. El Objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Por Licitación Pública No. LP – 003 - 2020 el Municipio de Colosó Sucre, adjudicó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO el contrato de Obra No. LP –085 - 2020, por valor de $1.055.799.942,50 IVA incluido. El Objeto del Contrato es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE",** con acta de Iniciación a partir del 10 de septiembre de 2020. La terminación del contrato de obra está prevista inicialmente para el día 8 de abril del 2021.

El presente documento hace referencia al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°12 correspondiente al periodo del mes de AGOSTO del 2021, ha sido elaborado por el CONSORCIO CIU TERCIARIA, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías haciendo una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de **Colosó, Sucre**, siendo el municipio en extensión territorial del Departamento el puesto número 23.

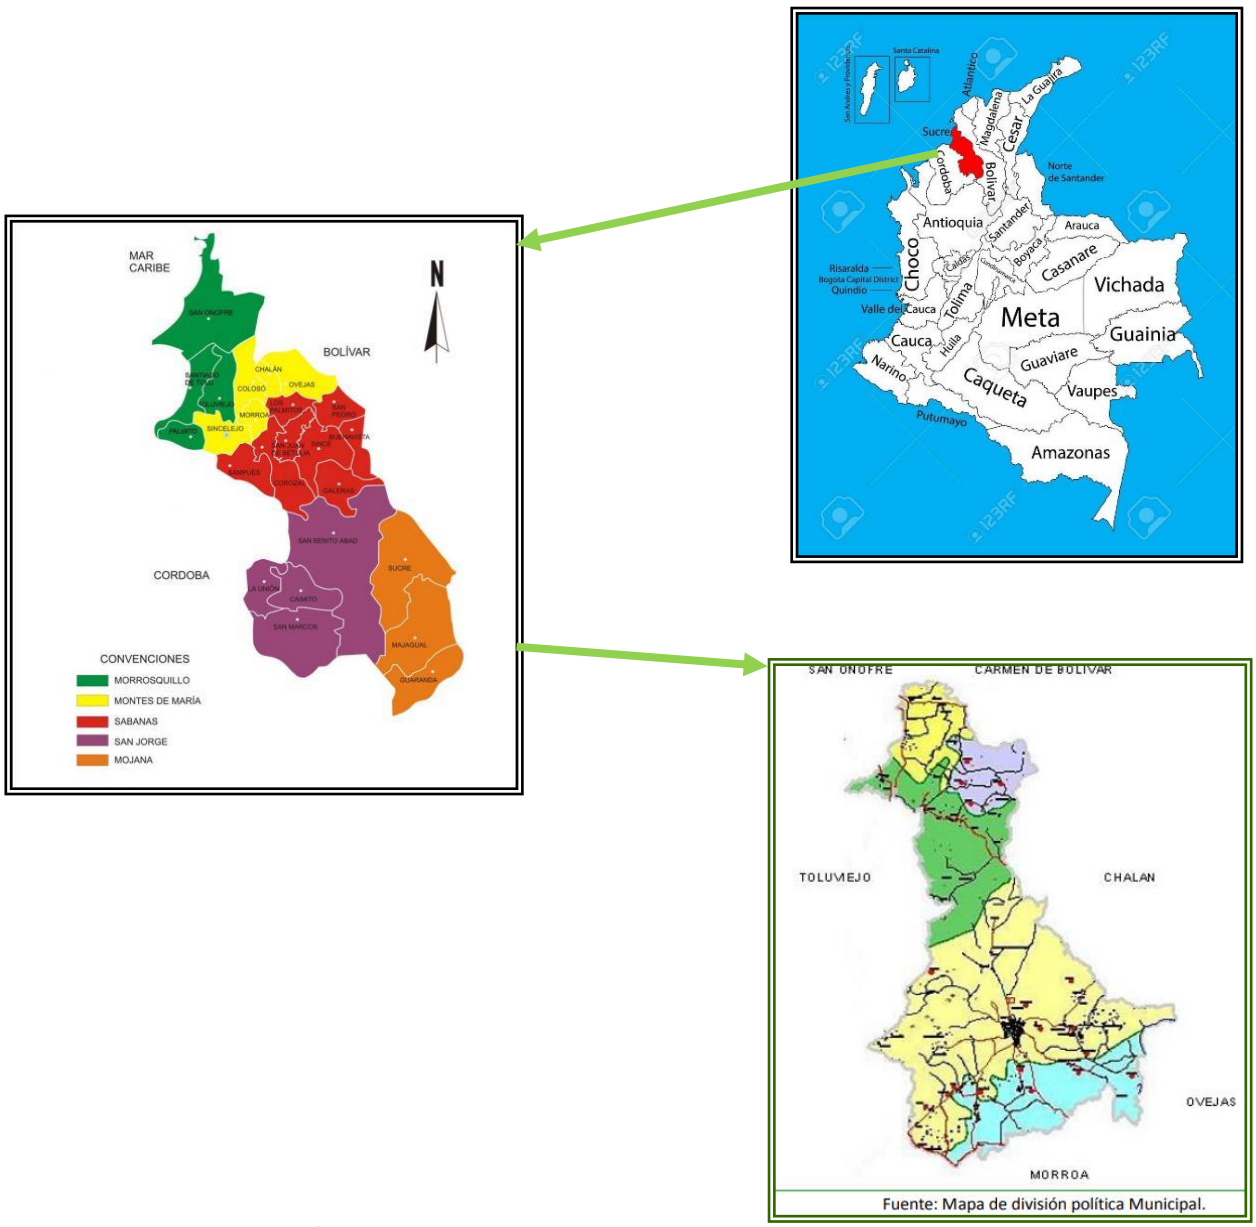


Figura. 1 Localización general del proyecto
Fuente: (INFOGRAFÍA DE INTERNET)

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó está comprendida entre 9º 35' de latitud Norte, 9º 26' de latitud sur; 75º 22' longitud este y 75º 25' longitud oeste, su posición geográfica le sitúa al Noreste del departamento de Sucre, altitud 133 m.s.n.m, superficie aproximada de 127 km2, -el 1,20% del área total del departamento de Sucre,- y población promedio de 6.031 habitantes (censo de 2.018).

El municipio de Colosó fue poblado y fundado inicialmente por el Cacique Onné Colosó, de la tribu descendía de los finzenúes, que era el amo y señor de las tierras que hoy comprenden los municipios de Colosó y Chalán, y, mantuvo sus dominios en continuas guerras con sus vecinos los caciques Yumal y Yoney, a quienes venció.

Con el hoy vecino municipio de Chalán, Colosó hizo parte del municipio de Ricaurte, antiguo San Miguel de Colosó. La cabecera municipal no era estable, ya que se disputaba entre ambas localidades la administración de la municipalidad.

A pocos años de crearse el Departamento de Sucre, Colosó se agregó de Ricaurte, formando un municipio aparte por medio de una ordenanza del recién creado departamento, lo cual ocasionó que el nombre del municipio volviera a ser formalmente Colosó, aunque en algunos documentos oficiales aparece en entre paréntesis el nombre anterior de la municipalidad, Ricaurte, y en otros aparece el nombre dado por los españoles, San Miguel de Colosó.

.

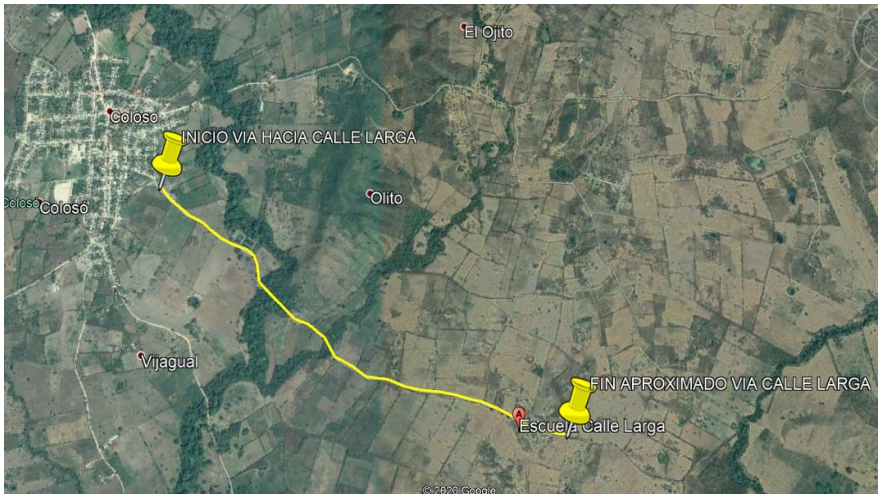


Figura. 2 localización Vía Vereda Calle Larga
Fuente: Google Earth

2.2 Estado inicial de la Vía

El estado actual de la vía que conduce hacia la vereda Calle Larga, -sitio donde se ejecutará el contrato de obra N° 085 de 2020 con objeto a MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE-, se puede catalogar regular, en términos generales, los tramos a trabajar forman parte de un corredor vial comprendido de un total de 2.850 metros, que desde la salida del municipio conduce hacia la vereda Calle Larga, a continuación, el cuadro ilustra la reubicación de los tramos, -teniendo la distribución proyectada por el municipio versus ubicación real, una vez se precisó la ubicación definitiva de los tramos según las necesidades reales de construcción-.

TRAMOS INICIALES			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+000	K0+296	296
TRAMO 2	K0+531	K0+817	286
TRAMO 3	K1+480	K1+580	100
TRAMO 4	K2+102	K2+700	598
		TOTAL	1280

TRAMOS REUBICADOS			
	INICIO	FIN	DISTANCIA
TRAMO 1	K0+196	K0+494	298
TRAMO 2	K1+060	K1+132	72
TRAMO 3	K1+225	K1+565	340
TRAMO 3"	K1+595	K1+665	70
TRAMO 4	K2+550	K3+050	500
		TOTAL	1280

Los tramos reubicados,-según se muestra en el cuadro anterior-, presentan dificultades de movilidad debido a cárcavas y/o perdida de finos, su topografía es plana, esta vía está en subrasante natural, su nivel es aproximadamente el de las fincas colindantes, esto genera al corredor vial permanecer encharcado en época de invierno, dificultando el tránsito vehicular de todo tipo; la vía cuenta con su sistema natural de escorrentía de aguas, no tiene obras de drenaje, además su mantenimiento es bajo, conllevando que los ciudadanos no cuenten con una vía que les permita movilizarse con tiempos razonables de viaje y con la seguridad adecuada, lo incrementa los fletes ocasionando pérdidas para los transportadores y usuarios.

La obra que se pretende adelantar se ha definido con base a una inspección preliminar y un estudio adelantado por la Alcaldía de Colosó Sucre, tendiente a mejorar los tramos considerados como críticos.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

Se realizará la construcción de placa huella la cual permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural del municipio, al disponer de infraestructura mejorada para tal fin. Se considera la realización de una serie de estudios y diseños relacionados con la ingeniería, específicamente, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, que servirán para determinar las obras necesarias para la atención de puntos críticos, la sostenibilidad integral de las obras y su duración en el tiempo. En cuanto al diseño de las obras de la superficie de rodadura, el INVIAS cuenta con un documento que incluye parámetros sobre dimensiones, materiales, procedimiento constructivo, calidad y medición

- El levantamiento topográfico esta georreferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS), referenciado al sistema MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional – Sistema de Referenciación para las Américas), que es el datum oficial de Colombia, pudiéndose marcar un inicio y el fin del tramo a intervenir.

- Estudio de suelos, se identificó la calidad del suelo mediante sondeos y extracciones inalteradas, determinando mediante ensayos de CBR la capacidad de soporte de la rasante.

- El manejo de drenaje para este este tipo de placa huella, se llevará a cabo mediante dos cunetas, ubicadas cada una de estas en sus extremos. Así mismo, estará compuesta por 2 losas de concreto reforzado, de 0,90 m de ancho y dos franjas de concreto ciclópeo de 0,45 m. contiguos a las cunetas y una franja central de 0.90 también de ciclópeo. Esta conformación permitirá la circulación de vehículos en un sentido.

- Los espesores y refuerzo de la placa se regirán a los parámetros descritos en el anterior prototipo, 15 cm., el diseño de la mezcla será el aprobado por esta interventoría.

La vía para pavimentar comunica con el sector llamado Calle Larga, además de las obras de pavimentación se construirá un box –coulvert sección 1.0 m * 1.0 m en la abscisa K 1 + 950, obras requeridas para avanzar en obras de pavimentación tipo placa huella, para de esta manera la Alcaldía de Colosó Sucre, garantice la intercomunicación vial con este sector rural del municipio.

Para la protección total de la obra se requiere realizar entre otras las siguientes actividades:

- Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obra de acuerdo con la normatividad vigente.
- Elaboración, actualización y ajuste del documento PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).
- Vías de acceso, campamento, puesto de control, zonas de depósito, almacén, infraestructura y equipo necesarios para y durante la realización de las obras.
- Socialización de los trabajos.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato de obra

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Contratista	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ
Contrato No.	LP - 085 -2020
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Fecha de inicio	10 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reinicio N°1	N/A
Fecha de Suspensión N°2	N/A
Fecha de Reinicio N°2	N/A
Adicional No. 1	N/A
Fecha de Vencimiento inicial	8 de abril de 2021
Plazo inicial	Siete (7) meses
Prórroga No. 1	Cuarenta y cinco (45) días
Prórroga No. 2	Treinta (30) días
Prórroga No .3	Cuarenta y cinco (45) días
Suspensión No. 1	Quince (15) días
Fecha de terminación actualizada	23 de agosto de 2021
Valor Total Contrato (Incluido IVA)	$ 1.077.263.512,3
Residente de Obra	JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Director de Obra	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY

Tabla 1. Datos Generales Contratista obra

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

OBRA

El contratista ejecutó las siguientes actividades de obra en el mes de agosto:

- Excavaciones varias sin clasificar para el tramo 1 de la vía.
- Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos en el tramo 1 de la vía.
- Fundición de cunetas y bordillos en concreto de 3000 psi para el tramo 1 de la vía.
- El consorcio contratista suspendió actividades de obra el día 06 de agosto de 2021, por término de 15 días calendarios aprobado por la entidad contratante: Alcaldía de Colosó – Sucre, debido a las constantes y fuertes precipitaciones en la zona de trabajo que impidieron la extracción de materiales pétreos en la cantera, así como su suministro para las obras de pavimentación.
- El contratista retomó los trabajos el 21 de agosto de 2021 de acuerdo con lo establecido por el ente contratante y finalizó con actividad de sello de juntas, relleno de espaldar de bordillos y finiquitó todas las actividades de sello para placa huella.

A la fecha de este informe, el contrato de pavimentación del municipio de Colosó – Sucre, ejecutó en su totalidad las obras de pavimentación contratadas para esta vía, detallada de la siguiente manera:

- 1280 metros lineales de placa huella; construidos totalmente repartidos en tramo 1: 298 metros lineales, tramo 2: con 72 metros lineales, tramo 3: con 340 metros lineales, tramo 3": 70 metros lineales y finalmente tramo 4: 500 metros lineales.
- Box-culvert con una sección de 2 m x 1 metros, ya que, el análisis hidrológico realizado arrojó este tamaño en la estructura.

En la tabla 2, se puede observar el porcentaje de avance de cada uno de los tramos que conforman la placa huella.

TRAMOS	LONGITUD (m)	% EJECUCIÓN
TRAMO N°1	298 ml	100%
TRAMO N°2	72 ml	100%
TRAMO N°3	340 ml	100%
TRAMO N°3"	70 ml	100%
TRAMO N°4	500 ml	100%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por tramos

En la tabla 3 se puede observar a detalle la ubicación de los boxcoulvet y el porcentaje de ejecución.

ESTRUCTURA DE DRENAJE	UBICACIÓN	% EJECUCION
Boxcoulvert N°1	K1+950	100%

Tabla 3. Porcentaje de ejecución por alcantarillas

A continuación, en la tabla 4 se observan con cada una de las actividades contratadas y a su vez el porcentaje de avance hasta el mes de agosto.

CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS						CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA N°1		CANTIDADES EJECUTADAS HASTA AGOSTO		AVANCE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE
1	CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT										
1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,60	$ 26.127,00	$ 668.851,20	89,33	$ 2.333.924,91	89,33	$ 2.333.924,91	89,33	100%
1.2	Relleno para estructuras con suelo	m3	8,40	$ 46.897,00	$ 393.934,80	44,24	$ 2.074.723,28	44,24	$ 2.074.723,28	44,24	100%
1.3	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)	m3	17,50	$ 491.409,00	$ 8.599.657,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0%
1.4	Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)	m3	1,40	$ 402.347,00	$ 563.285,80	1,14	$ 458.675,58	1,14	$ 458.675,58	1,14	100%
1.5	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1.565,00	$ 4.879,00	$ 7.635.635,00	3.155,00	$ 15.393.245,00	3155,00	$ 15.393.245,00	3155,00	100%
	ITEMS NO PREVISTOS										
	Baranda metálica	m	0,00	$ 731.973,00	$ -	5,20	$ 3.806.259,6	5,20	$ 3.806.259,6	5,20	100%
	Sello de juntas para puentes	m	0,00	$ 38.587,00	$ -	18,00	$ 694.566,00	18,00	$ 694.566,00	18,00	100%
	Concreto Resistencia 28 Mpa (C)	m3	0,00	$ 771.815,00	$ -	24,05	$ 18.562.150,75	24,05	$ 18.562.150,75	24,05	100%
					SUBTOTAL	**$ 17.861.364,30**	**SUBTOTAL**	**$ 43.323.545,12**	**SUBTOTAL**	**$**	**43.323.545,12**
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO										
2,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,40	$ 26.127,00	$ 6.019.660,80	365,19	$ 9.541.319,13	365,19	$ 9.541.319,13	365,19	100%
2,2	Subbase Granular Clase C	m3	960,00	$ 114.944,00	$ 110.346.240,00	960,00	$ 110.346.240,00	960,00	$ 110.346.240,00	960,00	100%
2,3	Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21Mpa)	m3	652,80	$ 570.922,00	$ 372.697.881,60	466,46	$ 266.312.276,12	466,46	$ 266.312.276,12	466,46	100%
2,4	Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella	m3	320,00	$ 330.557,00	$ 105.778.240,00	324,32	$ 107.206.246,24	324,32	$ 107.206.246,24	324,32	100%
2,5	Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	281,60	$ 487.978,00	$ 137.414.604,80	463,27	$ 226.065.568,06	463,27	$ 226.065.568,06	463,27	100%
2,6	Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	51.072,00	$ 4.879,00	$ 249.180.288,00	52.844,86	$ 257.830.071,94	52844,9	$ 257.830.071,94	52.844,86	100%
2,7	Sello Asfaltico para Juntas	m	13.658,00	$ 2.301,00	$ 31.427.058,00	11.105,60	$ 25.553.985,60	11.105,60	$ 25.553.985,60	11.105,60	100%
	ITEMS NO PREVISTOS										
	Relleno para estructuras con suelo	m3	0,00	$ 46.897,00	$ -	357,30	$ 16.756.298,10	357,30	$ 16.756.298,10	357,30	100%
					SUBTOTAL	**$ 1.012.863.973,20**	**SUBTOTAL**	**$ 1.019.612.005,19**	**SUBTOTAL**	**$**	**1.019.612.005,19**
					TOTAL OBRA CIVIL	**1.030.725.337,50**	**TOTAL**	**$ 1.062.935.550,3**	**TOTAL**	**$**	**1.062.935.550,3**

Tabla 4. Avance de obra por ítem contratado.

En la tabla 4, se presenta las cantidades actualizadas de acuerdo con acta modificatoria N°1 presentado por el contratista a la interventoría de acuerdo con lo ejecutado en las obras de pavimentación para la vía Calle Larga en el municipio de Colosó – Sucre.

INTERVENTORIA

La interventoría llevó a cabo las siguientes actividades en el mes de agosto:

- Acompañamiento al contratista en la ejecución de las obras de pavimentación para la finalización y entrega total de las obras.
- Solicitud al ente contratante de dar trámite a suspensión por 15 días calendario al contrato de obra, debido a los retrasos e impedimentos que ha causado las precipitaciones frecuentes en el área de trabajo.
- Control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social y en materia de SST del contrato de obra de referencia.
- Revisión de documentos y soportes físicos y digitales entregados por el contratista relacionado a las trabajos de pavimentación de la obra de referencia.
- Supervisión e inspección de las obras finalizadas.
- Informar al Instituto Nacional de Vías y entidad contratante del estado de avance del contrato del municipio de San Onofre.
- Solicitud al contratista de resultados finales de laboratorio.
- Solicitud al contratista ponerse al día con el pago de seguridad social del personal vinculado con la ejecución del contrato.

3.3 Seguimiento ítems no previstos.

De acuerdo con el acta modificatoria N°1, el cual se encuentra en trámite de aprobación por la alcaldía de Colosó - Sucre, como ítems no previstos en el contrato de obra del municipio de Colosó se tienen los siguientes:

ITEMS NO PREVISTOS BOX-CULVERT:

- Baranda metálica
- Sello de juntas para puentes
- Concreto de Resistencia 28 MPA.

ITEM NO PREVISTO PLACA HUELLA:

- Relleno para estructuras con suelo.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha de este informe el consorcio contratista terminó al 100% las obras de pavimentación contratadas para la vía Colosó – Vereda Calle Larga en el municipio de Colosó – Sucre. La inversión total ejecutada fue de $1.077.263.513,13, teniendo en cuenta los ítems no previstos que se detallaron anteriormente.

En reunión realizada el día 02 de agosto de 2021, con la participación del ingeniero Luis Miguel González Ozuna de INVIAS y personal profesional de Consorcio CIU Terciaria, ingeniero residente: Álvaro García y auxiliar de interventoría: ingeniera Maria Vannina Cerro. El ingeniero González dio al personal de interventoría indicaciones a seguir para ajustes de los informes mensuales de interventoría de cada municipio PDET. De esta reunión queda como pendiente la realización de carta a cada representante legal de cada contratista donde se hacen responsable de la bitácora generada desde el inicio de las obras hasta la fecha de los trabajos ejecutados.

Se realizó comité de obra el día 10 de agosto de 2021, con el objetivo de realizar seguimiento semanal del avance del contrato de obra del municipio de Colosó – Sucre; en esta reunión virtual, los ingenieros Álvaro García y Jorge Velázquez informan al personal profesional del Instituto Nacional de Vías, que este contrato lleva un rendimiento del 92% a la fecha de la reunión; y que presentaron un retraso debido a las lluvias frecuentes en la zona; el contratista solicitó una prórroga de 15 días a partir del 6 de agosto de 2021. De esta contrato de obra, la interventoría se encuentra en revisión del balance general.

Se realizó comité de obra el día 10 de agosto de 2021, con la participación de la profesional Mónica Orduz Manrique, profesional de apoyo de INVIAS y el ingeniero Álvaro García, residente de interventoría Consorcio CIU Terciaria , con el fin de hacer seguimiento al avance de ejecución del contrato de obra del municipio de Colosó; en este encuentro, el ingeniero García le informa a la señora Orduz, que el contrato a la fecha de la reunión lleva ejecutado 1 box -culvert de 2 metros x 1 metros en su totalidad, y la placa huella ya está casi terminada.

En comité de obra con fecha 17 de agosto de 2021, se reunieron virtualmente, la profesional de apoyo de INVIAS: señora Mónica Orduz Manrique, Residente de

interventoría: ingeniero Álvaro García y auxiliar de interventoría: ingeniero Carlos Barrios; de este encuentro, la profesional de apoyo del Instituto Nacional de Vías hizo un control de la información general del contrato de obra recopilada recibida y faltante para documentación previa visita del departamento Nacional de Planeación -DNP. De esta recopilación de información para el contrato del municipio de Colosó queda pendiente estudios y diseños e informes bimensuales del contratista.

Se llevó a cabo comité de obra el día 24 de agosto de 2021, con el objetivo de hacer seguimiento semanal del avance del contrato de obra N° LP-085-2020 del municipio de Colosó – Sucre; la interventoría informa al personal profesional de INVIAS de la información general del contrato, que inicialmente tenia una fecha de finalización el día 08 de agosto de 2021, pero debido a las lluvias en la zona que retrasaban los trabajos, la entidad contratante tramitó una suspensión por término de 15 días calendario, por lo que su fecha de terminación se actualizó al 23 de agosto de 2021.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se presenta el resumen mensual del estado general del proyecto durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 1**

4.2 Maquinaria y equipo del contrato

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 2**

4.3 Personal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 3**

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 4**

4.5 Estado general del tiempo

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 5.**

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 se presenta el resumen ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021**. Ver anexo 6**

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se presenta el control de aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 7**

4.8 Informe avance físico financiero

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se presenta el informe avance físico-financiero del contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 8**

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se presenta el seguimiento garantías y seguros contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 9**

4.10 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 se presenta el seguimiento plan de calidad contrato de obra durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 10**

4.11 Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra

El contratista y contratante pactaron en las cláusulas contractuales, un primer desembolso en calidad de anticipo, a la fecha de este informe se desembolsado el 30% del valor total, que corresponde a $117,412,221.

4.12 Seguimiento a la programación de obra

El contratista finalizó la totalidad de las obras contratadas: 1280 metros lineales de placa huella y 1 box -culvert de sección 2 metros x 1 metros, que inicialmente estaba contratado para sección 1x1 m; pero de acuerdo con los resultados del estudio hidrológico realizado, se modificó para su óptima funcionabilidad. El contrato de obra N° LP-085-2020 del municipio de Colosó – Sucre, ejecutó una inversión de $1.077.263.512,31 en la totalidad

de los trabajos de pavimentación de la vía Colosó – Vereda Calle Larga en el municipio de Colosó.

4.13 Seguimiento programa de inversiones

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

4.14 Actas comité de obra

Se llevó a cabo, comité de obra los días 10 de agosto de 2021, 17 de agosto de 2021 y 24 de agosto de 2021; de cada una de las reuniones se levantó acta con detalles y observaciones. **Ver anexo 11**

4.15 Acta reunión

Se realizó reunión virtual el día 02 de agosto de 2021. De esta reunión se levantó acta. **Ver anexo 11**

4.16 Informe semanal

En el formato MSE-FR-21 se presentan los informes semanales durante el periodo de 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 12**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

VIA TERCIARIA	COLOSÓ – CALLE LARGA
Interventoría	CONSORCIO CIU TERCIARIA
Contrato	732 de 2020
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2020
Fecha de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°1 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°2 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Ampliación N°3 de Suspensión N°1	N/A
Fecha de Reanudación	N/A
Plazo inicial	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actualizada	31 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1	Tres (3) meses
Prorroga No. 2	Tres (3) meses
Prorroga No. 3	Cuatro meses y medio (4,5)
Fecha terminación actualizada	08 de noviembre de 2021.
Valor Total Contrato	$ 873.235.119,28
Residente de Interventoría	ÁLVARO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ
Director de Interventoría	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Tabla 3. Datos Generales Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

Mediante OFICIO N° 375 2021 CIU/COLOSÓ con fecha 11 de agosto de 2021; la interventoría solicitó al señor Isaías Javier Díaz Barrios, alcalde municipal de Colosó-Sucre, tramitar al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS MIRANDA VERGARA, suspensión de las obras por término de 15 días calendario, debido a que el contratista ha presentado retraso en sus actividades por lluvias intempestivas en el área de trabajo; razón que la interventoría considera justificación para suspender las actividades por 15 días a partir del 6 de agosto de 2021, tiempo prudente para que se estabilicen los suelos y se ejecuten los trabajos remanentes del contrato de referencia.

La interventoría a través de OFICIO N° 385 2021 CIU/ COLOSÓ, de 19 de agosto de 2021, reiteró solicitud a la entidad contratante de tramitar y oficializar suspensión de las obras por término de 15 días calendario al contrato de obra del municipio de Colosó, debido a las lluvias frecuentes e intensas que han retrasado los trabajos de pavimentación; así mismo, solicitó, copia del acta de suspensión con copia de pólizas actualizadas y su correspondiente aprobación por parte de la oficina jurídica de la alcaldía.

Por medio de OFICIO N° 398 2021 CIU/COLOSÓ, con fecha 24 de agosto de 2021; la interventoría solicitó al CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÍ R/L GREYS MIRANDA VERGARA, copia del pago de la planilla de la seguridad social como soporte de las actividades en lo correspondiente al mes de julio de 2021.

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo del presente informe, no se requirió concepto de los especialistas para este contrato.

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato es un convenio, por ende, se están usando los formatos del Municipio de Colosó Sucre)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se registra los informes semanales durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 13**

6.2 Personal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 14**

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 15**

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se registra el control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 16**

6.5 Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se registra el seguimiento garantías contrato Interventoría del contrato de Interventoría durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 17**

6.6 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se registra el seguimiento al plan de calidad contrato de Interventoría durante el periodo 01 de agosto al 31 de agosto de 2021. **Ver anexo 18**

6.7 Seguimiento a la inversión del anticipo

N.A. (Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría no tiene anticipo).

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría, se recomienda:

1. Solicitud al consorcio contratista la entrega de todos los documentos, técnicos, administrativos, legales, financieros, ambientales, sociales, en materia de seguridad y salud en el trabajo para poder realizar el proceso de liquidación del contrato.

2. A la comunidad beneficiaria de las obras y entidad contratante, velar por el cuidado y buen uso de los trabajos de pavimentación ejecutados en la vía Colosó – Vereda Calle Larga.

3. La interventoría continuará con el control y seguimiento al contrato de obra del municipio de Colosó – sucre, en cuanto a materia administrativa para proceder a la etapa de liquidación bilateral del contrato.

4. La interventoría mantendrá informado al Instituto Nacional de Vías de las acciones a seguir con el contrato de obra de referencia.

5. La interventoría le solicita al consorcio contratista entrega de copia de pago de planilla de seguridad social del personal vinculado a las obras, correspondiente al mes de julio de 2021.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibido.

Se presentan como archivos adjuntos la relación de correspondencia durante el mes de agosto entre interventoría – entidad contratante e interventoría – contratista. **Ver anexo 19.**

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA				
FECHA	REFERENCIA	ASUNTO	REMITE	DESTINO
11/08/2021	OFICIO N°375 2021 CIU/ COLOSÓ	SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE
19/08/2021	OFICIO N°385 2021 CIU/COLOSÓ	REITERACION SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION	CONSORCIO CIU TERCIARIA	ALCALDE MUNICIPAL COLOSÓ SUCRE
24/08/2021	OFICIO N°398 2021 CIU/COLOSÓ	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	CONSORCIO CIU TERCIARIA	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ

8.2. Registro fotográfico del avance de obras.





1. Foto: Fundición de cunetas y bordillo en concreto hidráulico 3000 psi – Tramo 1





2. Foto: Estado de la vía debido a las precipitaciones en la zona.



3. Foto: Fundición losa de aproximación Box – culvert.



4. Foto: Fundición de huellas en concreto ciclópeo, placa huella – Tramo 1.



5. Foto: Instalación baranda metálica para box-culvert.



6. Foto: Estado final obras – Placa huella.



7. Foto: Estado final obras – Placa huella.



8. Foto: Estado final obras – Placa huella.



9. Foto: Estado final obras – Box-culvert



10. Foto: Estado final obras – Box-culvert

7.1 Bitácora de obra.

Fecha: domingo 1 de agosto 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, al ser un dia no laboral de acuerdo con la Programación de obra entregada por el Contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barros
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 2 agosto 2021
Actividad: En el dia de hoy, el Contratista realiza actividades de excavaciones varias Sin clasificar en el tramo 1; de manera paralela instala en este mismo tramo acero de refuerzo y bordillos cumplriendo con las especificaciones técnicas de los diseños entregados por el Contratista y aprobados por la Interventoría.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barros
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 3 agosto 2021
Actividad: En la Via Calle larga municipio de Colosó, la Firma Constructora ejecuta en el dia de hoy instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos, así como Colocación de encofrado de las estructuras armadas para proceder con la Fundación en concreto. La Interventoria realiza control y seguimiento en la ejecución de las

Escaneado con CamScanner

trabajos, verificando que estos cumplan los diseños entregados y aprobados, así como los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de VIAS para la construcción de pavimento placa huella en estas vías terciarias.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 4 agosto 2021
Actividad: En la zona de trabajo, el constructor continúa instalando acero de refuerzo para cunetas y bordillos en el Tramo 1 de la Via. De manera simultánea realiza excavaciones varias sin clasificar en el mismo tramo. El contratista ha disminuido su rendimiento en estos dias debido a las precipitaciones que se han presentado en el eje vial de los trabajos.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Jueves 5 agosto 2021
Actividad: En el dia de hoy, el contratista no ejecuta actividades de obra, ya que la vía en cuestión se encuentra en mal estado por las precipitaciones presentada en los ultimos dias.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 6 agosto 2021
Actividad: El contrato de obra N° LP-085-2020 del municipio

Escaneado con CamScanner

de Coloso Se encuentra Suspendido por 15 días Calendario, debido a Solicitud realizada por consorcio PLACA HUELLA COLOSO motivada por las Constantes y Fuertes precipitaciones en la zona del desarrollo de los trabajos y consecuencias de estas, el impedimento de extracción de materiales pétreos en la cantera que los Suministra así como el mal estado de las Vías dificulta el acceso y distribución de los materiales.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sabado 7 agosto 2021
Actividad: El Contrato de obra del municipio de coloso Se encuentra Suspendido por 15 días Calendario desde el 6 de agosto de 2021. La interventoría le solicita al contratista entrega de resultados de laboratorios de los elementos en concreto de Placa huella construidos a la Fecha.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: domingo 8 agosto 2021
Actividad: No Se realizaron actividades en el día de hoy, al Ser un día no Laboral de acuerdo con la programación de obra entregada por el Contratista.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Escaneado con CamScanner

Fecha: Lunes 9 agosto 2021
Actividad: El Contratista no ejecuta actividades de obra en el dia de hoy; el contrato se encuentra suspendido por termino de 15 dias calendario desde el 06 de agosto 2021.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 10 agosto 2021
Actividad: En la Vereda Calle Larga del municipio de Coloso Sucre, las obras de pavimentacion continuan suspendidas. La Interventoria se encuentra atenta a cualquier Novedad durante este tiempo y continuara con el control tecnico una vez reinicien las trabajos.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 11 agosto 2021
Actividad: En el dia de hoy, el Contratista no realiza actividades de obra, el Contrato se encuentra suspendido. La Interventoria mediante OFICIO N°375 2020 CSU/Coloso con Fecha 11 de agosto y asunto "Solicitud tramite suspension" en el cual se da respuesta la Solicitud del Contratista de 6 de agosto en la oficio OFI059 PH Coloso en el cual se solicita la Suspension de las obras por termino de 15 dias Calendario motivado por la instancia climaticas que le han retrasando las actividades.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: Jueves 12 agosto 2021
Actividad: El Contrato de obra se encuentra suspendido desde el 06 de agosto de 2021, por término de 15 días Calendario, debido a las Fuertes y Frecuentes precipitaciones presentadas en el área de trabajo lo que ha impedido el acceso a la vía, la extracción de materiales pétreos en la cantera, así como su suministro al eje Vial.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Viernes 13 agosto 2021
Actividad: En el día de hoy, no se llevaron a cabo actividades de obra. El Contrato del municipio de Colosó se encuentra Suspendido por término de 15 días Calendario desde el 06 de agosto de 2021, debido a Impedimento de Construcción que han generado las Lluvias presentadas de los últimos días en la zona de los trabajos.

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Fecha: Sábado 14 agosto 2021
Actividad: En el día de hoy, los trabajos continúan suspendidos. La interventoría se encuentra atenta a cualquier novedad en el periodo de suspensión y continua comunicación escrita y vía telefónica con el Consacd contratista

Alvaro García F
Residente Interventoría

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoría

Escaneado con CamScanner

Fecha: domingo 15 agosto 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, al ser un dia no laboral de acuerdo con la programación de obra entregada por el contratista.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 16 agosto 2021
Actividad: No se realizan actividades en el dia de hoy, ya que, el contrato continúa suspendido, de acuerdo con las fechas establecidas por la entidad contratante: Alcaldia de Roloso, Los trabajos deberán reiniciarse el dia 21 de agosto 2021

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: martes 17 agosto 2021
Actividad: El contrato de obra se encuentra suspendido desde el 06 de agosto de 2021 por término de 15 dias calendarios.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: miercoles 18 agosto 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el lugar de los trabajos; el contrato de obra N° LP-085-2020 se encuentra suspendido

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

Fecha: Jueves 19 agosto 2021
Actividad: El Contrato de obra de referencia se encuentra Suspendido. La Interventoria mediante OFICIO N° 385-2020 CIV/COLOSO con Fecha 19 de agosto 2021 asunto — "referencia Solicitud tramite Suspension" en el cual Se solicita respetuosamente al Señor alcalde municipal nos remita copia del acta de Suspensión, con las copias de polizas actualizadas y su correspondiente aprobación por parte de la OFICINA Juridica de la alcaldia.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Viernes 20 agosto 2021
Actividad: El Contrato de obra N° LP-085-2020 del municipio de Coloso Se encuentra Suspendido por 15 dias calendario, debido a Solicitud realizada por Consorcio Placa Huella coloso motivada por las constantes y fuertes precipitaciones en la zona del desarrollo de los trabajos y consecuencia de estas, el impedimento de extracción de materiales petreos en la cantera que los Suministra, así como el mal estado de las vias que dificulta el acceso y distribución de los materiales.

Alvaro Garcia F
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Sábado 21 agosto 2021
Actividad: El contratista realiza las actividades de sello de juntas, relleno de espaldar de bordillos y Empaquetadura Todas las actividades de Fundición de concreto hidraulico para placa huella, concreto ciclopeo, concreto hidraulico

Escaneado con CamScanner

para cunetas y bordillos, a su vez el contratista finaliza con las actividades de sello.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: domingo 22 agosto 2021
Actividad: No se realizaron actividades en el dia de hoy, al ser un dia no laboral de acuerdo con la programacion de obra entregada por el contratista.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Fecha: Lunes 23 agosto 2021
Actividad: El contratista finaliza las actividades de sello de juntas, relleno de espaldar de bordillos y termina con toda las actividades contratadas del contrato de referencia.

Alvaro Garcia F.
Residente Interventoria

Carlos Barrios
Auxiliar Interventoria

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: LP – 085 – 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE INICIACION:	10/09/2020
FECHA DE REANUDACION N°2:	N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.055.799.942,50
VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.263.512,31
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 117.412.221,00

PLAZO ACUMULADO:	11 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	6/08/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	N/A
VALOR ADICIÓNALES:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	MI	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	MI	1280
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	UND.	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 87.700.953	$ -	$ 87.700.953	-	$ 69.096.129	1,000	0,79
Acumulado:	$ 1.077.263.512,31	$ 1.077.263.512	$ -	$ 1.077.263.512	1,00	$ 736.456.126	1,000	0,68

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	**$ 1.077.263.512,31**

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	11,00	1,00	0,00	$ -	0	$ -	-
Interventor:	0,84	12,00	0,83	2,50	$ 136.778.993,28	0	$ 136.778.993,28	$ 136.778.993,28

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.605.649,22

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	10/09/2020	10/12/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/09/2020	10/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/09/2020	10/08/2024
Calidad de Estudios y Diseños	12/04/2021	12/04/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	12/04/2021	12/04/206

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/09/2020	10/08/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 28/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica):

AUN A LA FECHA, A PESAR DE LA INTEVRENTORÍA SER INSISTENTE, LA ALCALDÍA DE OLOSÓ SUCRE NO HA DEFINIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DE APREMIO CONTRA EL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ SOLICITADO POR LA INTERVENTORÍA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N° 375 2021 CIU/COLOSÓ DE 11 DE AGOSTO 2021, SOLICITÓ AL SEÑOR ALCALDE ISAIAS JAVIER DIAS BARRIO, TRAMITAR SUSPENSI+ÓN POR 15 DÍAS CALENDARIO AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L GREYS MIRANDA VERGADA DEBIDO A LAS INSTANCIAS CLIMÁTICAS A LAS QUE HA ESTADO SOMETIDO EL CONTRATISTA, LO QUE HA RETRASADO SUS ACTIVIDADES DE OBRA

A TRAVÉS DE OFICIO N° 385 2021 CIU/COLOSÓ DE 19 DE AGOSTO DE 2021, LA INTERVENTORÍA REITEREAAL ALCALDE MUNICIPAL DE COLOSÓ SUCRE SOLICITUD DE TRAMITE DE SUSPENSION POR 15 DÍAS CALENDARIO AL CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ

MEDIANTE OFICIO N° 398 2021 CIU/COLOSÓ DE 24 DE AGOSTO DE 2021, LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONSORCIO CONTRATUSTA COPIA DEL PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION , CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARÁ CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE REFERENCIA

LA INTERVENTORÍA SOLICITA CON CARÁCTER URGENTE AL CONTRATISTA INFORMACION ACTUALIZADA DE PLAN DE CONTINGENCIA, REPROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y FLUJO DE CAJA SEMANAL EN EXCEL, DE ACUERDO A LA PRÓRROGA N° 03 POR TÉRMINO DE 45 DIAS SOLICITADA POR EL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA SEGUIRÁ INFORMANDO A LA ENTIDAD CONTRATANTE E INVIAS DEL ESTADO DE AVANCE DE ESTE CONTRATO

Firma

Nombre JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 10	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **CONTRATO No.** LP – 085 – 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aspersor manual	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoj	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua(1000 Galones)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm.	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP, con martillo.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de soldadura 250 AMP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora A25C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta 6 m3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE OBRA No.** **LP – 085 – 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO A LA INTERVENTORÍA COPIA DE PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL , COMO SOPORTE DE CONTROL DIARIO DEL PERSONAL VINCULADO A LAS OBRAS, PESE A LOS REQUERIMIENTOS

REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA EN VARIAS OPORTUNIDADES

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: **ALVARO GARCIA FLOREZ**
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	201067-01 de 26/06/2020	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-085-2020	201067	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.055.799.942,50
TOTAL						**$ 1.055.799.942,50**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.077.263.512,31**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 860.977.795,75	$ 201.957.754,56	$ 1.062.935.550,31
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.605.649,22	$ 2.722.312,78	$ 14.327.962,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 872.583.444,97	$ 204.680.067,34	$ 1.077.263.512,31

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	5	DE 10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021

UNIDAD EJECUTORA: **FERREA Y TERCIARIA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: **LP – 085 – 2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	24	24	23	24	23	24	24	24	23	22	22	23	24	24	24	23	24	24	24	23	22	24	23	24	24	23	22	24	725
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0	17
Lluvias intensas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITEZ
Residente de Obra
Matrícula No. :22202-242017 COR

Firma
Nombre: ALVARO GARCIA FLOREZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-39368 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6

Teléfono: 3481502 – 2111738 Celular: 3202733572
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 OFC 201
Bogotá D. C.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
	VERSIÓN	1		
	PAGINA	6	DE	10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO CONTRATISTA NO PRESENTÓ RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE ESTE MES. LA INTERVENTORÍA HA SOLICITA REITERADAS VECES HACER LLEGAR TAL INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 DE 10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. dias cotizados		Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. días cotizados		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	8 DE 10	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 12 **PERIODO MES:** AGOSTO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LP – 085 – 2020	PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	11 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	6/08/2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A		
SECTOR:	VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.055.799.942,50	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	23 DE AGOSTO DE 2021
RUTA	N/A	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.263.512,31	VALOR ADICIONALES:	$ 21.463.569,81
TRAMO:	N/A	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 117.412.221,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 732 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP – 085 – 2020	11 MESES	23/08/2021	1.055.799.942,50	1.077.263.512,31

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.055.799.942,50
Total	**$ 1.077.263.512,31**

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 117.412.221
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
732 DE 2020	14,5 MESES	8/11/2021	$ 685.270.884,00	$ 873.235.119,20

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	$ 87.700.953,30	$ -	$ 87.700.953	-	$ 69.096.129,00	1,000	0,79
Acumulado:	$ 1.077.263.512,31	$ 1.077.263.512	$ -	$ 1.077.263.512	1,00	$ 736.456.126,00	1,000	0,68

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	11,00	1,00	0,00	$ -	0	$ 1.077.263.512,31	$ -
Interventor:	0,84	12,00	0,83	2,50	$ 136.778.993,28	0	$ 136.778.993,28	$ 136.778.993,28

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	3,6
Calzada:	3,6
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	N/A
Carpeta:	N/A

Observaciones: LA VIA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA ES VIA TERCIARIA, NO TIENE BERMAS NO REQUIERE MATERIAL DE BASE, Y EN VEZ DE CARPETA ESTA VIA SE CONSTRUIRA EN PLACA HUELLA DE 0,15 m CON BORDILLOS Y CUNETAS DE 0,7 m PARA UN TOTAL DE ANCHO VIAL DE 5,0 m.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.327.962,00
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 14.327.962,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	$ 13.372.764,0	$ 16.010.879,0	$ 17.823.251,0	$ 19.635.623,0	$ 148.096.335,0	$ 493.266.263,0	$ 876.047.752,0	$ 1.077.263.512,3	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN BOX - CULVERT	$ 43.323.545,1								N/A	N/A	N/A	N/A	1,000	$ 0,0	$ 20.949.010,6	$ 43.323.545,1	$ 43.323.545,1
	$ 43.323.545,1																
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO								$ 1.019.612.005,2	0	0,28	1,28	1,28	1,000	$ 0,0	$ 66.751.942,7	$ 1.019.612.005,2	$ 1.019.612.005,2
								$ 1.019.612.005,2									
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.327.962,0								N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 14.327.962,0	$ 14.327.962,0
	$ 14.327.962,0																
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL									N/A	N/A	N/A	N/A	-	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.:22202-246559 COR

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-60909 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23-ago-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.055.799.942,50

VALOR ACUMULADO: $ 1.077.263.512,31
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.327.962,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	8	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	11	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	9	4	2021	8	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	12	4	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.** **-**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 105.579.994,25	10	9	2020	10	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 316.739.982,75	10	9	2020	10	12	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 211.159.988,50	10	9	2020	10	8	2024
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 316.739.982,75	12	4	2021	12	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **65-44-101185482**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16,63%	$ 175.560.600,00	10	9	2020	10	8	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **65-40-101053200** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 28/06/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LAS POLIZAS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP – 085 – 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

FECHA DE INICIO: 10/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 07 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/082021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma N.A.	Firma	Firma
Nombre: MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	Nombre:	Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	Nombre:
Director de Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:22202-246559 COR	Matrícula No.:	Matrícula No.: 25202-60909 CND	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 02 (Día) 08 (Mes) 21 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 04
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red terciaria y Ferrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. Lp-085 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso Vereda Calle larga en el municipio de coloso departamento de sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 7320 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Alvaro García F	Residente Interventoría	Consorcio CIU terciaria
Luis Miguel Gontalez	Coordinador	INVIAS
María Vannina Cerro.	Auxiliar interventoría	Consorcio CIU terciaria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Correcciones de los Informes mensuales teniendo en cuenta punto por punto, según la citación enviada del ultimo comunicado a interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Informes mensuales de Cada municipio de Sucre PDET
- Revisión de los formatos implementados
- Actas de Comite de obra y de reunión
- Los Ensayos enviados por el contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Dentro del informe el punto 5.3: Informes especialistas, dentro del anexo se tiene que presentar las actividades que realizo el especialista (los oficios que se relacionaron, Comite de los especialista Contratista)
- En relación con las Bitacoras se va realizar una carta donde se le enviara a los representantes legales de cada contratista donde ellos se hacen responsables de las notas en bitacora.
- Incluir copias de los ensayos en los Informes
- tener consecutivo de las actas de comite de obra y reunión enumerarlo de acuerdo a la fecha.
- Dentro del formato control de asistencia del personal de interventoría hacer la observación del tiempo de dedicación del personal y en el formato de los salarios hacer la corrección segun el acta de costo
- Anexar los oficios tramitados por interventoría para que quede como evidencia dentro del informe
- Realizar las observaciones en el formato de plan de calidad.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	02 (Día)	08 (Mes)	21 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Luis Miguel Gonzalez	
Maria Vannina Cerro	
Alvaro García F.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 10 (Día) 08 (Mes) 21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. LP-085 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso - Vereda Calle larga en el municipio de Coloso - Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIV TERCIARIA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Luis Miguel Gonzalez	Supervisor	INVIAS
Mauricio Casas	Representante legal	INVIAS
Liliana Marín L.	Inspector	Consorcio CIV Terciana
William Felipe Gutierrez	Gestor	INVIAS
Alvaro García F.	Residente Interventoria	CONSORCIO CIV TERCIARIA
Jorge Velasquez.	Director Interventoria.	Consorcio CIV Terciaria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Seguimiento Semanal del avance del contrato de obra del municipio de Coloso - Sucre, reunión llevada a cabo de manera virtual.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Resolver inquietudes, dudas e inconvenientes presentadas durante la ejecución del contrato de obra en el municipio de Coloso - Sucre.
- Reporte actual del desarrollo de las actividades y el porcentaje de ejecución de la obra.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Este Contratista lleva un rendimiento del 92%.
- Este Contrato se vencio el 8 de agosto de 2021
- El atraso se debe porque en estos días ha llovido mucho en la zona, el contratista envio una solicitud de prorroga de 15 días. estan en un sector bastante facil, que con días soleados les rinde mucho.
- Se les realizara una suspencion a partir del 6 de agosto de 2021
- El contratista lleva 1210 metros lineales construidos, el box colvert de 1x1 esta ya construido.
- le falta la loza de aproximacion del box, para que quede mas protegido y 30 metros de placa huella por construir.
- Se esta revisando el balance general.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Luis Miguel Gonzalez	
William Felipe Gutierrez	
Alvaro García F.	
Jorge Velasquez	
Mauricio Casas	
Liliana Marín L.	

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	10 (Día)	08 (Mes)	21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. LP- 085 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso - vereda Calle larga en el municipio de Coloso - Departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Ordoz Manrique	Profesional de apoyo	INVIAS
Alvaro García F.	Residente interventoría	Consorcio Cio terciaria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento del avance de ejecución del contrato de obra, del municipio de Coloso departamento de Sucre. (Reunión Virtual)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Actividades que se ejecutaron hasta la fecha.
- Reporte actual del porcentaje de ejecución de la Obra.
- Costo de Construcción de la ejecución de la obra.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	
		FECHA	10 (Día) 08 (Mes) 21 (Año)	

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- El contratista lleva ejecutado un boxculvert de 2X1, que costo $ 32.154.517 y en placa huella tiene $ 962.937.804 ya el boxculvert esta listo.
- las actividades que se han llevado a cabo es la construcción de placa huella y el boxculvert

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Ordoz Manrique	
Alvaro García F.	

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	17 (Día)	08 (Mes)	21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÈ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red terciaria y Ferrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre.

CONTRATO DE OBRA No. Lp-085 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso - Vereda Calle Larga en el municipio de Coloso - departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIV TERCIARIA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Ordoz Manrique	Profesional de apoyo	INVIAS
Alvaro García F.	Residente interventoría	Consorcio Civ terciaria
Carlos Barrios T.	Auxiliar interventoría	Consorcio Civ terciaria

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer un chequeo, verificar y actualizar la información del departamento nacional de planeación del contrato de obra del municipio de Coloso - Sucre (Reunión virtual).

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Información general del contrato de obra para visita del departamento nacional de planeación.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	17	08	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

→ Actas de Socialización - OK
→ Videos - OK
→ Registro Fotografico - OK
→ Actas de Cobro - No tienen
→ Queda Pendiente de los estudios y diseños
→ Acta de veeduria - OK
→ No han mandado ningún Informe Bimensual - Queda pendiente Cargar.
→ Informe mensual Interventoria - OK

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
/	/	/

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

/ N/A /

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Monica Ordoz Manrique	
Alvaro Garcia F.	
Carlos Barrios T.	

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	24 (Día)	08 (Mes)	21 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sucre

CONTRATO DE OBRA No. Lp-085 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de la vía Coloso - vereda Calle larga en el municipio de coloso departamento de Sucre.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
William Felipe Gutierrez	Gestor	INVIAS
Alvaro Garcia	Residente Intervent.	Consorcio ciu terciaria
Luis Miguel Gonzalez	Coordinador	INVIAS
Jorge Velasquez	Director Intervent.	Consorcio ciu terciaria
Liliana Marin	Inspector	Consorcio ciu terciaria.
Monica Orduz	Profesional apoyo	INVIAS
Mario Jose Caballero.	Director territorial.	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento semanal del avance del contrato de obra del municipio de Coloso en el departamento de Sucre (Reunión virtual).

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Resolver dudas, inquietudes e inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de obra en el municipio de Coloso departamento de Sucre.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	24 (Día)	08 (Mes)	21 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Fecha actual Final es el 8 de agosto de 2021, se paso una prorroga de 15 días.
- lleva construido 1262 metros lineales contra un total de 1280 metros lineales, Faltan 18 metros.
- lleva un porcentaje de 97%.
- Ya esta construido el box culvert de 2x1 con su baranda, su acceso y su losa de aproximación.
- falta el sello asfaltico del tramo 1 y 18 metros lineales de placa huella.
- El balance de obra esta en $1.080.000.000

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
William Felipe Gutierrez	
Alvaro García F.	
Jorge velasquez	
Luis Miguel Gonzalez	
Monica Ordoz.	

Escaneado con CamScanner

ANEXO 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 44**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	5 (Día)	8 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y OCHO (48) **del** 30/07/2021 **al** 5/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 978.362.102
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	92,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 978.362.101,56

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	**SI**	**NO**
	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

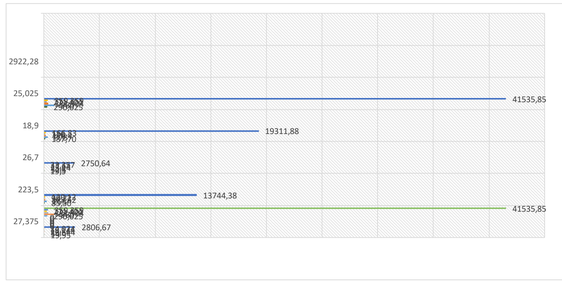

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: ____ — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

ESTADO:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA OFICIO DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
PENDIENTE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA HASTA LA PRESENTE NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORIA SIGUE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA LOSAS EN EL TRAMO 1.

EL CONTRATISTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOTRAS Y CONCRETO CICLOPEO.

EL CONTRATISTA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOTRAS ,LOSAS,BORDILLOS Y CUNETAS.

EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA LLEVA UN ATRASO DEL 7,33%, SE ESPERA DISMINUIR ESTE PORCENTAJE EN LA PROXIMA SEMANA, DEBIDO A LA PETICION DE LA INTERVENTORÍA REALIZANDO AUMENTO DE RENDIMIENTO, AUMENTO LA MANO DE OBRA Y LA INTENSIDAD EN EL USO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

EL CONTRATISTA HA DISMINUIDO SU RENDIMIENTO EN ESTA SEMANA DEBIDO A LAS PRECIIPITACIONES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL EJE VIAL DE LOS TRABAJOS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 44**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	5	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y OCHO (48) **del** 30/07/2021 **al** 5/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

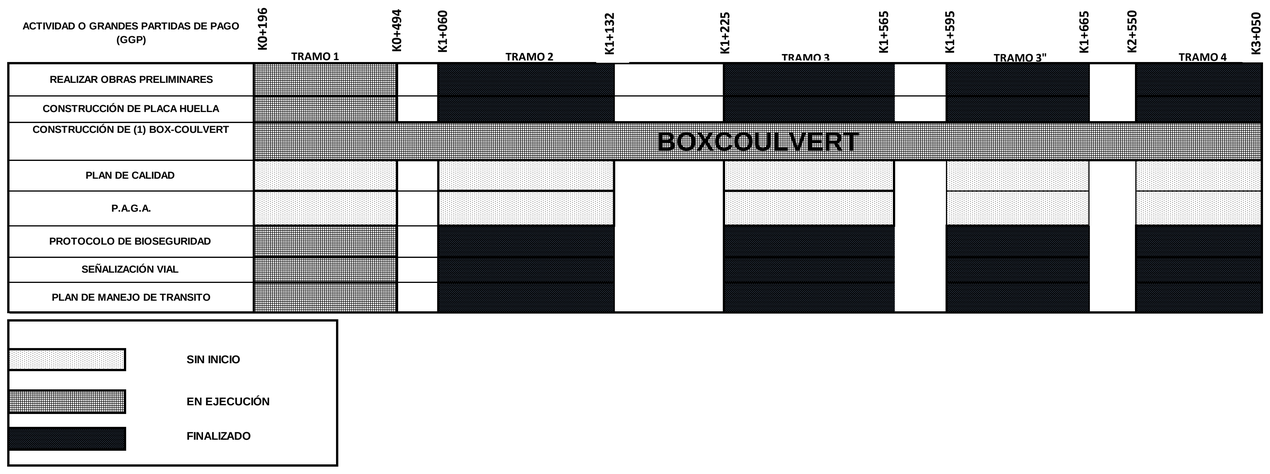

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CUNETAS Y BORDILLOS .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIGAS RIOSTRAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 45**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	12 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y NUEVE (49) **del** 6/08/2021 **al** 12/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 981.362.102
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	92,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 981.362.101,56

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:


Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA OFICIO DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
PENDIENTE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA HASTA LA PRESENTE NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORIA SIGUE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA NO EJECUTÓ ACTIVIDADES EN OBRA,

DEBIDO A QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR 15 DIAS DESDE EL 6 DE AGOSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 45**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	12	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CUARENTA Y NUEVE (49) **del** 6/08/2021 **al** 12/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

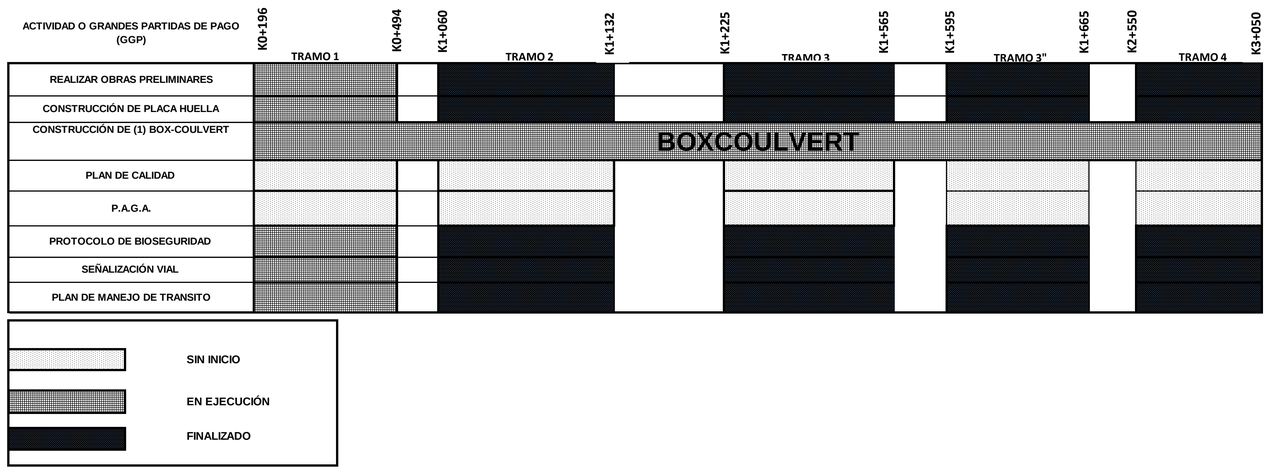

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS



FOTO 3. SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO



FOTO 4. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSAS DE APROXIMACION EN BOX.



FOTO 5. FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSAS DE APROXIMACION EN BOX.



CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 11 de agosto de 2021 OFICIO N° 375 2020 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÁS JAVIER DÍAZ BARROS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION**

Cordial saludo,

Motivado por medio del oficio OFI 059 PH COLOSÓ de 6 agosto de 2021, enviado por el consorcio constructor,- del contrato de la referencia-, CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ RL Greys Miranda Vergara, donde solicitan suspensión de las obras por término de quince (15) días calendario, motivado que el contratista ha estado sometido a instancias climáticas que le han retrasado sus actividades en obra, adicionalmente, se le han deteriorado actividades realizadas, debido a lluvias intempestivas , por consiguiente, esta interventoría considera, - en favorabilidad de la calidad de las obras por construir-, solicita a su despacho, suspender los trabajos por término de los quince (15) días solicitados por el contratista, tiempo prudencial para que se estabilicen los suelos y se ejecuten los trabajos remanentes del contrato en comento.

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

FOTO 5. SOLICITUD DE SUSPENSION.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO N°375 2020 CIU/COLOSÓ CON FECHA 11 DE AGOSTO Y ASUNTO"SOLICITUD TRAMITE SUSPENSIÓN " EN ELCUAL SE DA RESPESTA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE 6 DE AGOSTO EN SU OFICIO OFI059 PH COLOSO , EN EL CUALSE SOLICITA LA SUSPENSION DE LAS OBRAS POR TERMINO DE 15 DIAS CALENDARIO MOTIVADO POR LAS INSTANCIAS CLIMATICAS QUE LE HAN RETRASADO SUS ACTIVIDADES.	**No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 46**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	19 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CINCUENTA (50) **del** 13/08/2021 **al** 19/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ -	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.055.799.942,50	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.055.799.942,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 992.312.100
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	93,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 992.312.100,11

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			0			**0**
Relleno para estructuras con suelo			0			**0**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			0			**0**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			0			**0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	27,375	19,95	85,50	19,5	137,70	**290,025**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	26,7	25,644	127,62	25,14	176,4	**381,504**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	18,9	18,144	90,72	17,64	126	**271,404**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	25,025	24,024	120,12	23,357	166,83	**359,359**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	2922,28	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**41535,85**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	0	0	0	0	0	**0**

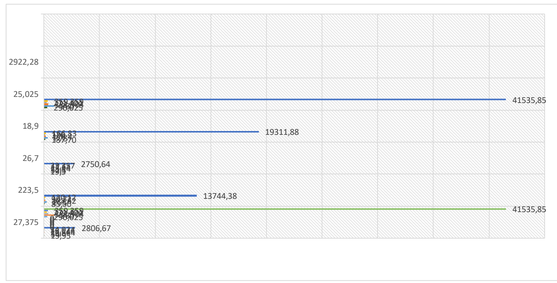

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA OFICIO DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
PENDIENTE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA HASTA LA PRESENTE NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORIA SIGUE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

DEBIDO A QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR 15 DIAS DESDE EL 6 DE AGOSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 46**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	19	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CINCUENTA (50) **del** 13/08/2021 **al** 19/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRAMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

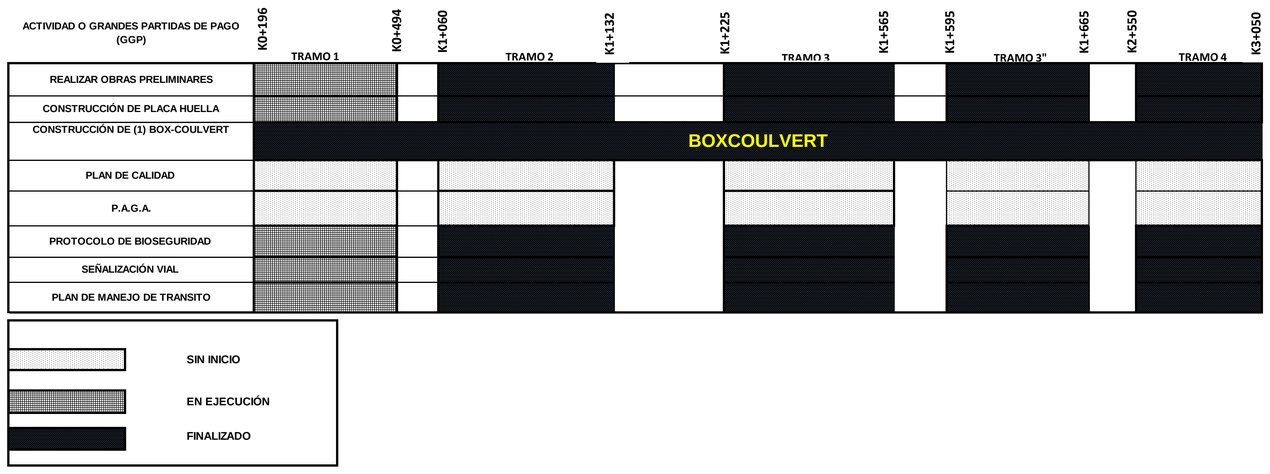

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO .



FOTO 2. FUNDICION DE CONCRETO CICLOEPO EN TRAMO 1



FOTO 3. SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO N°385 2020 CIU/COLOSO CON FECHA 19 DE AGOSTO 2021 Y ASUNTO "REITERACION SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION" EN EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL NOS REMITA COPIA DEL ACTA DE SUSPENSION, CON LAS COPIAS DE POLIZAS ACTUALIZADAS Y SU CORRESPONDIENTE APROBACION POR PARTE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA ALCALDIA.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 47**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	23 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CINCUENTA Y UNO(51) **del** 20/08/2021 **al** 23/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020

KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO CIU TERCIARIA NIT. 901.381.077-9		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA			**INTEGRANTES:**	(Integrado por CAYCO S.A.S con NIT. 900.334.140-1 con una participación del 35%, INARGOS LTDA con NIT. 860.046.102-1 con una participación del 60% y URBACOLING S.A.S. con NIT. 901.260.852-1 con una participación del 5%)		
CONTRATO No.	LP – 085 – 2020	**VALOR INICIAL:**	$ 1.055.799.942,50	**CONTRATO No.**	732-2020	**VALOR INICIAL:**	$ 685.270.884,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**ADICIONES:**	$ 21.463.569,81	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES	**ADICIONES:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.077.263.512,31	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021	**VALOR ACUMULADO:**	$ 685.270.884,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2021**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.055.799.943	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.077.263.512,31
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.077.263.512,31
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.077.263.512
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.077.263.512,31

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 685.270.884,00 Básico

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 69.096.129,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

Nota:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**3"**	**4**	**TOTAL**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX-COULVERT						
Excavaciones varias sin clasificar			89,33			**89,33**
Relleno para estructuras con suelo			44,24			**44,24**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa)			0			**0**
Concreto clase F (f`c = 14 Mpa)			1,14			**1,14**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)			3155			**3155**
Baranda Metalica			5,2			**5,2**
Sello de Juntas para Puentes			18			**18**
Concreto Resistencia 28MPa©			24,05			**24,05**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Excavaciones varias sin clasificar **(M3)**	102,54	19,95	85,50	19,5	137,70	**365,19**
Subbase Granular Clase C **(M3)**	223,5	54	255	52,5	375	**960**
Concreto Hidráulico para Placa Huella (f`c = 21 Mpa) **(M3)**	111,656	25,644	127,62	25,14	176,4	**466,46**
Concreto Resistencia 14MPa (G) - Para Placa Huella **(M3)**	71,816	18,144	90,72	17,64	126	**324,32**
Concreto clase D (f`c = 21 Mpa) - Para Cunetas **(M3)**	128,936	24,024	120,12	23,357	166,83	**463,27**
Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2) **(KG)**	14231,29	2806,67	13744,38	2750,64	19311,88	**52844,86**
Sello Asfaltico para Juntas**(M)**	493,6	672	3173,33	2100	4666,67	**11105,6**

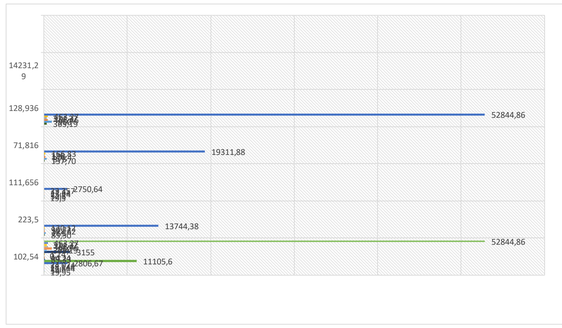

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	**1**	**2**	**3**	**4**	**TOTAL**
Aspersor manual	0	0	0	1	1
Bulldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m.	0	0	0	0	0
Carrotanque de agua(1000 Galones)	0	0	0	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	0	0	0	0	0
Vibro compactador Manual Vibratorio (RANA) con motor de 6 HP	0	0	0	0	0
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	0	0	0	1	1
Compresor (barrido y soplado)	0	0	0	0	0
Compresor 120 HP, con martillo.	0	0	0	0	0
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm)	0	0	0	0	0
Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia 40 HP, 2100 golpes / minuto	0	0	0	0	0
Equipo de soldadura 250 AMP	0	0	0	0	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	0	0	0	0	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	0	0	0	0	0
Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP	0	0	0	0	0
Retroexcavadora A25C	0	0	0	0	0
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	0	0	0	1	1
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt	0	0	0	0	0
Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	0	0	0	1	1
Volqueta 6 m3	0	0	0	1	1

TRAMO Y/O SECTOR(S):

TRAMO 1 - EJE 1	K0+196	-	K0+494
TRAMO 2 - EJE 1	K1+060	-	K1+132
TRAMO 3 - EJE 1	K1+225	-	K1+565
TRAMO 3" - EJE 1	K1+595	-	K1+665
TRAMO 4 - EJE 1	K2+550	-	K3+050

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA INFORMACION DE LA FUENTE DEL SUMINISTRO DE MATERIALES	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES: El contratista aún no ha entregado a esta interventoría los documentos de las fuentes de materiales, presento PAGA V2 el 17 de diciembre de 2020 sin anexos, se solicitaron ajustes, los cuales no han sido entregados a Interventoría a la fecha, se reitera solicitud de fecha 21 de julio de 2021, sin respuesta a la fecha

OBSERVACIONES: El presente contrato requiere permiso de ocupación de cauce - en tramite

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

SE REMITE OFICIO AL CONTRATISTA OFICIO DE FECHA 21 DE JULIO, REITERANDO SOLICITUD DE ENTREGA PAGA V3 Y SUS ANEXOS
INFORME 1 .10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE OCTUBRE DE 2020
INFORME 2. 10 OCTUBRE DE 2020 HASTA 9 NOVIEMBBRE DE 2020
INFORME 3. 10 DE NOVIEMBRE HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME 4. 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 19 DE ENERO DE 2021
INFORME 5. 10 DE ENERO DE 2021 HASTA 9 DE FEBRERO DE 2021
INFORME 6. 10 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 9 MARZO DE 2021
INFORME 7. 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE ABRIL DE 2021
INFORME 8. 10 DE ABRIL DE 2021 HASTA 9 DE MAYO DE 2021
INFORME 9. 10 DE MAYO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
INFORME 10. 10 DE JUNIO DE 2021 HASTA 9 DE JULIO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL I. PERIODO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
INFORME TRIMESTRAL II. PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 9 DE MARZO DE 2021
INFORME TRIMESTRAL III. PERIODO 10 DE MARZO DE 2021 HASTA 9 DE JUNIO DE 2021
PENDIENTE RESPUESTA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: El contratista debe entregar a esta Interventoría la resolución del permiso de ocupación de cauce emitida por la corporación ambiental CARSUCRE, de igual forma se debe ejecutar lo que en la misma se solicite por parte de la Corporación Ambiental

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA HASTA LA PRESENTE NO TIENE GESTIÓN PREDIAL

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	SINCELEJO SUCRE
OTROS:	0		

OBSERVACIONES: INTERVENTORIA SIGUE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA EJECUTÓ ESTAS ACTIVIDADES EN OBRA,

EL PRESENTE CONTRATO SE REAUNADA EL DIA 21 DE AGOSTO, Y EL CONTRATISTA FINIQUIDA TODAS LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PLACA HUELLA,CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO HIDRAULICO PARA CUNETAS Y BORDILLOS , A SU VEZ EL CONTRATISTA FINALIZA CON LAS ACTIVIDADES DE SELLO

DE JUNTAS, RELLENO DE ESPALDAR DE BORDILLOS Y TERMINA CON TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL CONTRATO EN REFERENCIA EL DIA 23 DE AGOSTO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL No. 47**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA	23 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO COLOSO – VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA **TRAMO Y/O SECTOR(S):** **CALLE LARGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **SEMANA No.:** CINCUENTA Y UNO(51) **del** 20/08/2021 **al** 23/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ – VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE **FECHA DE INICIO:** 10/09/2020


KM A MEJORAR: N/A **KM A REHABILITAR:** N/A **KM A CONSTRUIR:** 1.280 **No. PUENTES:** 0 **No. BOX COULVERT:** 1 **OTROS:**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la programación de obra la siguientes actividades se realizarán :

1	A PESAR DE LAS CONSTANTES SOLICITUDES Y PETICIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA , ESTE NO HA ENVIADO LA REPROGRAMACION DE OBRAS QUE PERMITA CHEQUEAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA.
2	
3	
4	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

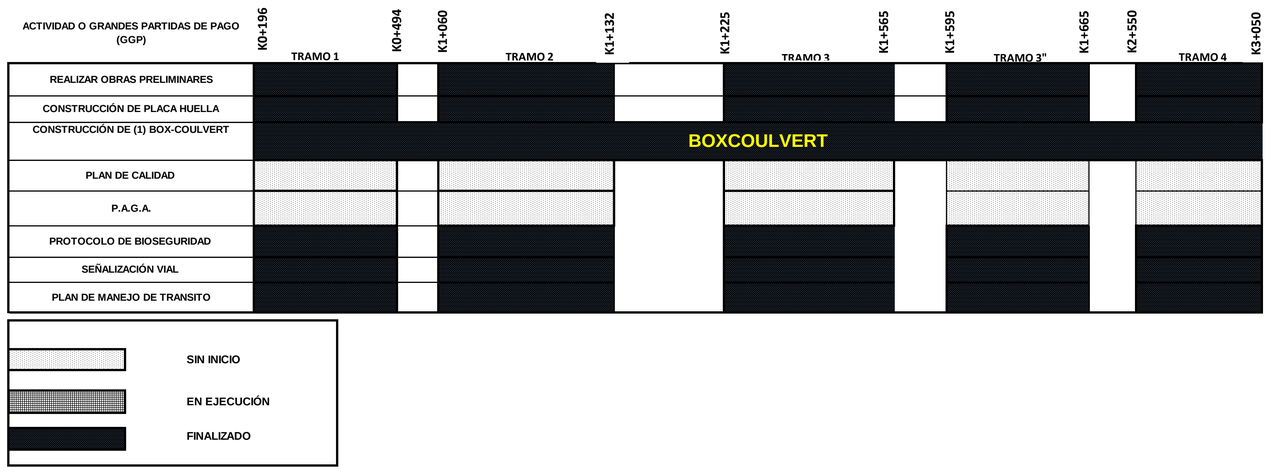

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



FOTO 1 .FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO E HIDRAULICO.



FOTO 2. ESTADO FINAL PLACA HUELLA



FOTO 3. ESTADO FINAL PLACA HUELLA



FOTO 4. ESTADO FINAL PLACA HUELLA



FOTO 5. ESTADO FINAL PLACA HUELLA



FOTO 6. ESTADO FINAL BOX

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO,ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL DE MANERA CONSTANTE EN ARAS DE CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.	**NOMBRE:** JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS **No. MAT:** 25202-60909 CND
	Invias - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 6	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: AGOSTO **CONTRATO No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OFICINA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO 1		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 14

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 732-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA **SECTOR:** VEREDA CALLE LARGA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	DIRECTOR INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	INSPECTORA SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YINA JUDITH CARO COHEN	INSPECTORA SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOSE CARLOS URZOLA OYOLA	ESPECIALISTA AMBIENTAL																												X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA DEDICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL MES ES LA SIGUIENTE: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 0.40/1 , ESPECIALISTA AMBIENTAL 0. 33/1 ;DEMÁS RECURSO PERSONAL: 1/1

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70204	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,50
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70508	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,51
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70230	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,52
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70418	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,53
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70473	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,54
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70523	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,55
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70713	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,56
2020	19419 de 09/12/2019	Subdirección Financiera INVIAS	P70823	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	85.658.860,57
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70204	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,20
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70508	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70418	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70523	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70713	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70823	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70230	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
2021	23221 de 02/07/2021	Subdirección Terciaria y Ferrea - SGR	PZ70473	NACIÓN	ADICIONAL No. 1	23.495.529,40
				TOTAL		**$ 873.235.119,28**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 873.235.119,28**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	septiembre	$ 16.447.491	$ 3.858.053	$ 20.305.544	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 20.305.544	$ 664.965.340,00	-	ACTA CONCILIADA
2	octubre	$ 35.518.064	$ 8.331.398	$ 43.849.462	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 64.155.006	$ 621.115.878,00	-	ACTA CONCILIADA
3	noviembre	$ 51.817.723	$ 12.154.775	$ 63.972.498	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 128.127.504	$ 557.143.380,00	-	ACTA CONCILIADA
4	diciembre	$ 49.968.892	$ 11.721.098	$ 61.689.990	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 189.817.494	$ 495.453.390,00	-	ACTA CONCILIADA
5	enero	$ 52.130.834	$ 12.228.220	$ 64.359.054	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 254.176.548	$ 431.094.336,00	-	ACTA CONCILIADA
6	febrero	$ 51.067.961	$ 11.978.905	$ 63.046.866	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 317.223.414	$ 368.047.470,00	-	ACTA EN ELABORACION
7	marzo	$ 59.739.174	$ 14.012.893	$ 73.752.067	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 390.975.481	$ 294.295.403,00	-	ACTA EN ELABORACION
8	abril	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 460.071.610	$ 225.199.274,00	-	ACTA EN ELABORACION
9	mayo	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 529.167.739	$ 156.103.145,00	-	ACTA EN ELABORACION
10	junio	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 598.263.868	$ 87.007.016,00	-	ACTA EN ELABORACION
11	julio	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$685270884 DE 19419 de 09/12/2019	$ 667.359.997	$ 205.875.122,28	-	ACTA EN ELABORACION
12	agosto	$ 55.967.864	$ 13.128.265	$ 69.096.129	0	0	$187964235 DE 23221 de 02/07/2021	$ 736.456.126	$ 136.778.993,28	-	ACTA EN ELABORACION
TOTALES		**$ 596.529.462**	**$ 139.926.664**	**$ 736.456.126**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 6

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 732 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA COLOSÓ - VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ

SECTOR: VEREDA CALLE LARGA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ 156.600,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ -
2	ALVARO ENRIQUE GARCIA FLOREZ	92186230	RESIDENTE INTERVENTORÍA	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.200,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00	$ -	$ -
3	CARLOS DAVID BARRIOS TORDECILLA	1067950990	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.300,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
4	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3880125	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.485.000,00	$ 594.000,00	$ 41.342,40	$ 23.760,00	$ 95.040,00	$ 23.760,00	$ -	$ -
5	CARMEN MARIA MONTAÑO SALCEDO	32670053	INSPECTOR SOCIAL	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00		$ 64.000,00	$ -	$ -
6	YINA JUDITH CARO COHEN	1102847188	INSPECTOR SST	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 111.360,00	$ 64.000,00	$ 256.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ -
7	MARIA VANNINA CERRO NAVARRO	1099965566	INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00	$ 164.256,00	$ 94.400,00	$ 377.600,00	$ 94.400,00	$ -	$ -
8	JOSE CARLOS URZOLA OYOLA	92549715	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.485.000,00	$ 198.000,00	$ 13.780,80	$ 7.920,00	$ 31.680,00	$ 7.920,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$							14.412.000,00

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	6

FECHA	31	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **732-2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO CIU TERCIARIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 1/09/2019

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIMEBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/11/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 685.270.884,00

VALOR ACUMULADO: $ 873.235.119,28
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	1	9	2020	1	11	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	1	9	2020	3	5	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	4	5	2021	4	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 68.527.088,40	24	3	2021	30	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 137.054.176,80	24	3	2021	30	6	2024
Calidad del servicio	30%	$ 205.581.265	30	6	2021	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB- 100128840**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-60909 CND

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202 - 204005

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED FERREA Y TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 732 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA

FECHA DE INICIO: 1/09/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/11/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 732 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-60909 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 204005

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 11 de agosto de 2021 OFICIO N° 375 2020 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION**

Cordial saludo,

Motivado por medio del oficio OFI 059 PH COLOSÓ de 6 agosto de 2021, enviado por el consorcio constructor,- del contrato de la referencia-, CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSÓ R/L Greys Miranda Vergara, donde solicitan suspensión de las obras por término de quince (15) días calendario, motivado que el contratista ha estado sometido a instancias climáticas que le han retrasado sus actividades en obra, adicionalmente, se le han deteriorado actividades realizadas, debido a lluvias intempestivas , por consiguiente, esta interventoría considera, - en favorabilidad de la calidad de las obras por construir-, solicita a su despacho, suspender los trabajos por término de los quince (15) días solicitados por el contratista, tiempo prudencial para que se estabilicen los suelos y se ejecuten los trabajos remanentes del contrato en comento.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 19 de agosto de 2021 OFICIO N° 385 2020 CIU/ COLOSÓ

Señor
ISAÍAS JAVIER DÍAZ BARRIOS
Alcalde Municipal
Colosó Sucre

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.MM-LP-OP-085-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA COLOSÓ CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ – DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **REITERACION SOLICITUD TRAMITE SUSPENSION**

Cordial saludo,

Mediante comunicación OFICIO N° 375 2020 CIU/ COLOSÓ de 11 de agosto de 2021, esta interventoría informó y solicitó a su despacho, tramitar y oficializar suspensión de las obras por término de quince (15) días calendario, motivado que el contratista ha estado sometido a instancias climáticas que le han retrasado sus actividades en obra, adicionalmente, se le han deteriorado actividades realizadas, debido a lluvias intempestivas, por consiguiente, esta interventoría consideró, - en favorabilidad de la calidad de las obras por construir-, solicita a su despacho, suspender los trabajos por término de los quince (15) días solicitados por el contratista, tiempo prudencial para que se estabilicen los suelos y se ejecuten los trabajos remanentes del contrato en comento.

Como a la fecha, no han informado a interventoría del estado de este requerimiento, - para control de los tiempos del contrato de obra en referencia-, respetuosamente solicitamos nos remitan copia del acta de suspensión, con las copias de pólizas actualizadas y su correspondiente aprobación por pare de la oficina jurídica de la alcaldía.

Cordialmente,

Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

c.c. GREYS MIRANDA VERGARA
R/L CONSORCIO PLACA HUELLA CHALAN

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C

CONSORCIO CIU TERCIARIA
NIT. 901.381.077-9

Sincelejo, Sucre, 24 de agosto de 2021 OFICIO N° 398- 2021 CIU/ COLOSÓ

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA COLOSO
Atn. GREYS PAOLA MIRANDA VERGARA
Representante Legal Consorcio

Referencia: **CONTRATO DE OBRA N° LP-085-2020, MEJORAMIENTO DE LA VIA COLOSO-VEREDA CALLE LARGA EN EL MUNICIPIO DE COLOSO- DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Asunto: **INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Cordial saludo,

Mediante la presente, se le solicita remitir a esta interventoría, copia del pago de la planilla de la seguridad social como soporte de las actividades realizadas en lo correspondiente al informe del mes de julio de 2021. Debido a que este es un soporte para que la interventoría pueda presentar su informe de seguimiento. Se ha hecho llamado por vía telefónica y otros medios, pero no han dado respuesta del asunto.

Cordialmente,



Ingeniero Jorge Isaac Velásquez
Director de Interventoría

Teléfono: 3481502 - 2111738 Celular: 3142790951
Email: consorciociuterciaria@gmail.com
Carrera 20 B No. 75-20 Ofc. 201
Bogotá D.C
