LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Supervisor	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
Número de contrato/vigencia	No. CO1.PCCNTR.8169110 - INTERVENTORIA - LOTE 6				
Informe N°	10	Periodo del informe	6/07/2026	Hasta el	5/08/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	119 - 129
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	130 - 143
Informes semanales	SI		CUMPLE	210 - 337
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	150
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		N.A.	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	145 - 146
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	150
Directiva distrital N° 1 de 2011	N.A.		N.A.	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	N.A.		N.A.	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	152 - 154
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	33 - 36
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	355 - 400
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	446 - 462
Bitácora	SI		CUMPLE	188 - 209
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	441 - 445
Actividades no previstas del proyecto	N.A.		N.A.	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	152 - 154
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	N.A.		N.A.	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	37 - 107
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	152 - 154
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	411 - 419
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato	SI		CUMPLE	151 - 152
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	161 - 166
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	155 - 160
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	161 - 166
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	150
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de	SI		CUMPLE	150
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	401 - 410
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	420 - 440
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	161 - 166
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	184
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	N.A.		N.A.	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	N.A.		N.A.	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	SI		CUMPLE	
Modificaciones	SI		CUMPLE	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110	**Aprobó**	**Revisó.**
JOHN CASTAÑEDA		
Elaboró: Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR.8169110

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2"

INTERVENTOR:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO PAIS
LOTE: 6

INFORME MENSUAL No. 10
PERIODO REPORTADO 06/07/2026- 05/08/2026

BOGOTA D.C.

ÍNDICE DE REVISIONES INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10			
NÚMERO DE REVISIÓN	**CAPÍTULO MODIFICADO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
0	Documento Original	7/08/2026	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL 10 DE INTERVENTORÍA**
REVISIÓN		
Responsable Elaboración Componente Técnico	Nombre	Ing. John Castañeda
	Firma	JOHN CASTAÑEDA
	Fecha	21-08-2026
Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	21-08-2026
Responsable de la Revisión del Informe	Nombre	Arq. Héctor Villazón
	Firma	
	Fecha	21-08-2026
Responsable de la Aprobación del Informe	Nombre	Arq. Santiago Ángel
	Firma	
	Fecha	24-08-2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1 LOCALIZACIÓN 10

2.2 ESTADO INICIAL 13

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 14

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja 14
..... 14
2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A. 16
2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B 17
2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C 18
2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B 19
2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A 20
2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda 21
2.3.9 Colegio Santa Librada 22
2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A 23
2.3.11 Colégio Tenerife Granda Sur Sede A 24
2.3.12 Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede b – Puerta al Llano 25

2.4 EMERGENCIAS 26

3. CONTRATO DE OBRA 26

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 26

3.1.1 GARANTÍAS 28

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 33

3.3 INFORME DE AVANCE 35

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 37
3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS 39
3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO 39
3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA 107

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA 108

3.4.1 EQUIPO 108
3.4.2 PERSONAL 108

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 109

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL 109
3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES 110
3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS 110
3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 111
3.5.5 ESTADO FINANCIERO 118

3.6 ESTADO DEL TIEMPO 119
3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO 119
3.8 OBLIGACIONES GENERALES 119
3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 130
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 143
4.1. INFORMACIÓN GENERAL 143
4.1.1. GARANTÍAS 144
4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 146
4.2.1 ADMINISTRATIVAS 146
4.2.2 TÉCNICAS 147
4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 148
4.2.4 LEGAL 148
4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR 149
4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA 149
4.3.2 EQUIPO 151
4.4 INFORMACION FINANCIERA 151
4.4.1 PRESUPUESTO 151
4.4.2 ESTADO FINANCIERO 151
A. PAGOS EFECTUADOS 151
5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 152
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 155
7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 161
8. OBLIGACIONES GENERALES 166
9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 174
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 184
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 185

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Educativas 13
Tabla 2. Información general contrato de obra 27
Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista 33
Tabla 4- Avance Financiero 36
Tabla 5. Porcentajes Acumulados 37

Tabla 6 - Certificado disponibilidad presupuestal 111
Tabla 7 - Listado APU´S 117
Tabla 8 - Pagos Realizados 119
Tabla 9 - Obligaciones Generales Contratista 129
Tabla 10 - Obligaciones Especificas Contratista 143
Tabla 11 - Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110 144
Tabla 12 - Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 146
Tabla 13 - Personal de Interventoría 150
Tabla 14 - Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría 151
Tabla 15. Pagos realizados a la interventoría 152
Tabla 16 - Obligaciones Generales - Interventoría 174
Tabla 17 - Obligaciones Especificas - Interventoría 184
Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada 196
Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza 197
Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza - Emergencia 198
Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Calasanz- Emergencia 199

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme 11
Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades 12
Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja 14
Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A 16
Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B 17
Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C 18
Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B 19
Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A 20
Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda 21
Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada 22
Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa 23
Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 24
Ilustración 14 - Esquema de Distribución Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede b – Puerta al Llano 25
Ilustración 15 Flujo de Caja Semanal 37
Ilustración 16 Curva s – Programado vs ejecutado 38
Ilustración 17 - Actividades Orlando Fals 41
Ilustración 18- Actividades Sierra Morena 46

Ilustración 19 *- Actividades Unión Europea Sede B* 53
Ilustración 20 - Actividades Arborizadora Baja 63
Ilustración 21 - Actividades Fabio Lozano Simonelli 75
Ilustración 22 - Actividades Estrellas del Sur Sede B 79
Ilustración 23 - Actividades Calasanz (Buenavista) 83
Ilustración 24 - Actividades Santa Librada 88
Ilustración 25 *Actividades Estrella del Sur Sede A* 93
Ilustración 26 Actividades Guillermo Cano Isaza 101
Ilustración 27 Actividades Tenerife – Granda Sur 104
Ilustración 28 Actividades Ciudad de Villavicencio 107
Ilustración 29 - *Presupuestos actualizados emergencias* 108

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Bitácora de obra 39
Anexo 2. Informe Semanal 39
Anexo 3. Acta Parcial de Obra 119
Anexo 4. Actas de comité 146
Anexo 5. Planillas de pago 150
Anexo 6. Certificado pago Parafiscales 150
Anexo 7. Registro Capacitaciones 165
Anexo 8. Registro fotográfico 184
Anexo 9. Relación de Correspondencia 187

1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

Es por esto que la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** a través de la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (DCCEE)**, es la encargada de liderar, planificar y ejecutar proyectos de construcción, adecuación, ampliación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles educativos y administrativos del Distrito. En desarrollo de estas funciones y con base en los diagnósticos realizados por los gestores territoriales y especialistas de la DCCEE, se ha determinado la conveniencia de adelantar un programa de **ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS** que permitan garantizar la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las sedes, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El presente proyecto corresponde al proceso contractual **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, mediante el cual se seleccionará a los contratistas encargados de ejecutar las obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS MENORES PRIORITARIAS**, necesarias para asegurar la prestación continua y eficiente del servicio educativo en Bogotá D.C.

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, mediante la **LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025,** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**" - **LOTE NO. 6** se adjudicó al **CONSORCIO PAIS,** representado legalmente por **Juan Carlos Velásquez Forero** identificado con No. CC 80.217.561 de Bogotá, consorcio integrado por (CONSTRUCTORA PAIS identificada con NIT. 901.063.647-3 con una participación del 30%, CONSTRUCOL S.A.S identificada con

NIT.1.053.341.203 con una participación del 30%, CONSTRUCCIONES VYP S.A.S identificada con NIT. 901.368.837-6, con una participación del 10%, FAPAIS S.A.S identificada con NIT. 901.762.077-4) por un valor total de la propuesta económica de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.232.049.023,00) y un valor de emergencias de CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS ($100.000.000,00), valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de siete (7) meses para la intervención de Nueve (9) instituciones educativas y que para su efectiva supervisión integral se debe de contar con una interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera. Mediante la Modificación No. 1 al contrato, se aprobó una adición presupuestal por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785.001.422,00), así como una ampliación del plazo de ejecución por un término de un (1) mes y quince (15) días. Como resultado de esta modificación, el valor total del contrato ascendió a la suma de TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.117.050.445,00). Posteriormente, las partes suscribieron la Modificación No. 2, mediante la cual se otorgó una nueva prórroga al plazo contractual por un término de tres (3) meses y diez (10) días, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades pendientes y el cumplimiento del objeto contractual.

Del mismo modo, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** luego de adjudicado el contrato de interventoría **CO1.PCCNTR.8169110** al CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, adelanto el proceso de contratación a través de convocatoria concurso de méritos abierto No. **SED-CM-A-DCCEE-018-2025** y que mediante **RESOLUCIÓN 0073 DE 05 DE AGOSTO DE 2025** por medio de la cual se adjudica el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE No. 2** al proponente **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO,** representado legalmente por el señor ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con CC. 79.602.923 de Bogotá D.C., (Consorcio integrado por **SEIING SAS BIC** identificado con Nit. 900.208.425-6, con participación del 50% y **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con Nit. 901.094.289-2, con un porcentaje de participación del 50%) por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE **($796.278.928,00),** incluido IVA y demás

tributos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato por un plazo de SIETE (7) meses.

Mediante el comunicado No. SERINCO-SED-INT-2025-121 del 4 de diciembre de 2025, el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-INT-2025-400** del 9 de abril de 2026, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 02 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110** de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de tres punto cinco (3.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 05 de octubre de 2026, así como adicionar la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE **($162.875.214,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($ 1.087.485.065,00).**

Con este informe, ***CONSORCIO PAIS*** *y* ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto del año 2026.

La interventoría ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** será la encargada de realizar la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar. Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollarán en la ciudad de **BOGOTÁ D.C**., el proyecto abarca dos (2) de las veinte (20) localidades que conforman el territorio distrital, las cuales se encuentran ubicadas en el sector sur de la ciudad: **CIUDAD BOLÍVAR** y **USME**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán **siete (7)** instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de **Cinco (5)** instituciones educativas, solo en el área urbana.

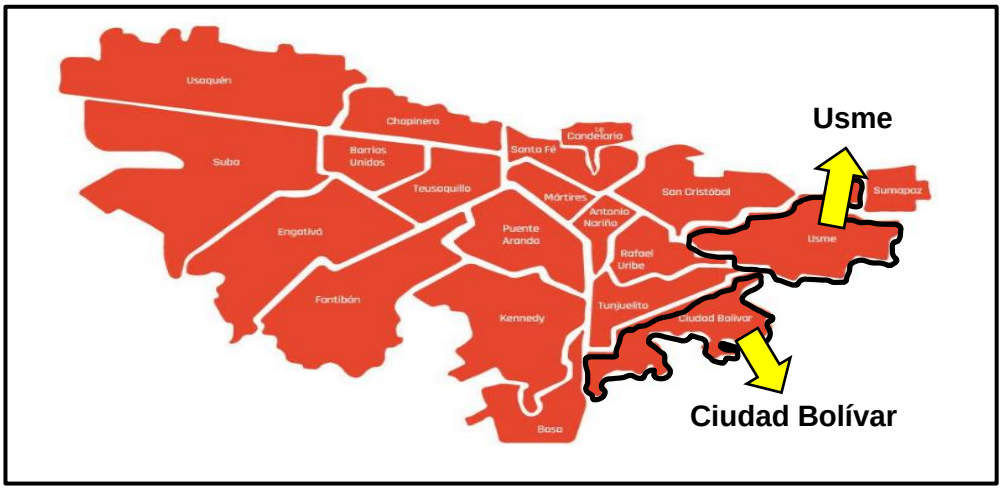


Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
Fuente: Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.

Se deja claridad que de acuerdo con la adición firmada el día 12 de diciembre de 2025 se añaden dos nuevos colegios uno en la localidad de Ciudad Bolívar y un colegio en la Localidad de Usme.

Para la prórroga firmada en el mes de mayo del año 2026 se incluye un nuevo colegio en la localidad de Usme – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede b.



Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Arborizadora Baja	A	Calle 59 a Bis Sur # 45 -16	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Buena Vista I.E.D Calasanz	A	Cra. 17f # 77A - 13 Sur	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda A	A	Cra.7 P No. 72-25 Sur	Ciudad Bolívar	5 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda b	B	Calle 75 sur # 18 B - 45	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Sierra Morena Sede C	C	Carrera 46A No. 79D- 15 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Unión europea Sede B	B	Calle 69B sur # 17 N 92	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Fabio Lozano Simónelli Sede A	A	Calle 65 Sur # 5-65	Usme	19 Semanas
Colegio Orlando Fals Borda	A	Cra 12 # 72-60 Sur	Usme	15 Semanas
Colegio Santa Librada	A	Calle 75A Sur # 9A-45	Usme	18 Semanas
Colegio Guillermo Cano Izasa	A	Cra. 16ª # 62-35 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas
Tenerife Granada Sur	A	Cra. 14b Bis # 91 sur 14	Usme	12 Semanas
Ciudad de Villavicencio	B	Calle 114 A Sur No. 7F Este 60	Usme	15 Semanas

Tabla 1. Sedes Educativas
Fuente: Propia

2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera, se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja



Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la cubierta en el Área de preescolar y sus baños adjuntos.

- Reparación de la cancha en la zona de bachillerato, este ítem incluye: Adecuación de la gradería
- Demolición y reconstrucción de una placa
- Remplazo de los marcos de futbol, baloncesto y suministro de los parales y malla para la cancha de voleibol.

2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz

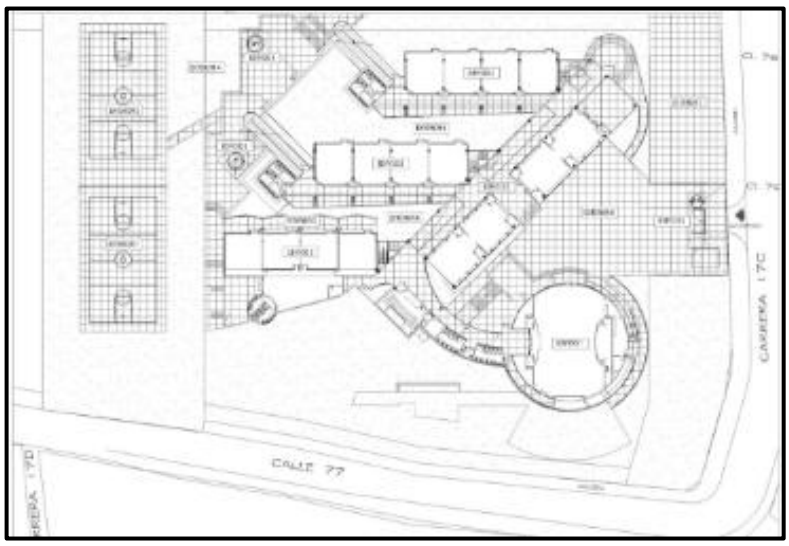


Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz
Fuente: *Propia*

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar en la sede educativa es el cambio de la cubierta de la zona del comedor
- El contratista deberá contemplar un cerramiento perimetral para mitigar el ingreso de palomas al área.

2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A.

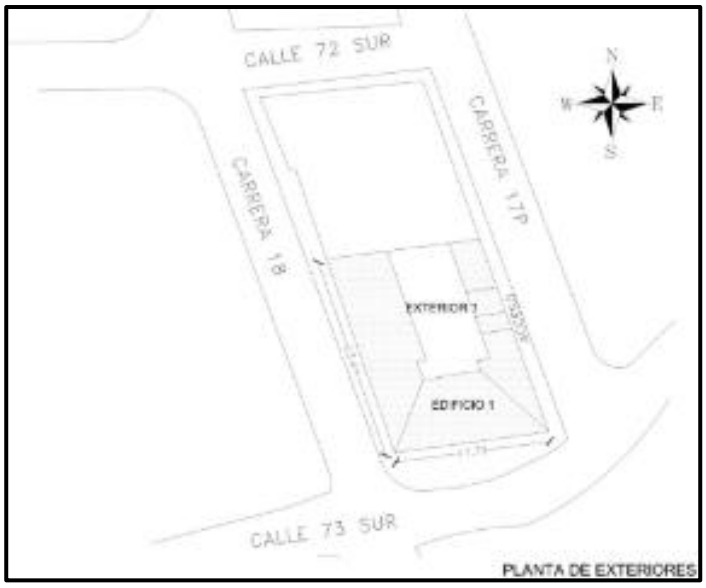


Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la puerta principal de la entrada
- Cambio total de las dos baterías sanitarias

2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B

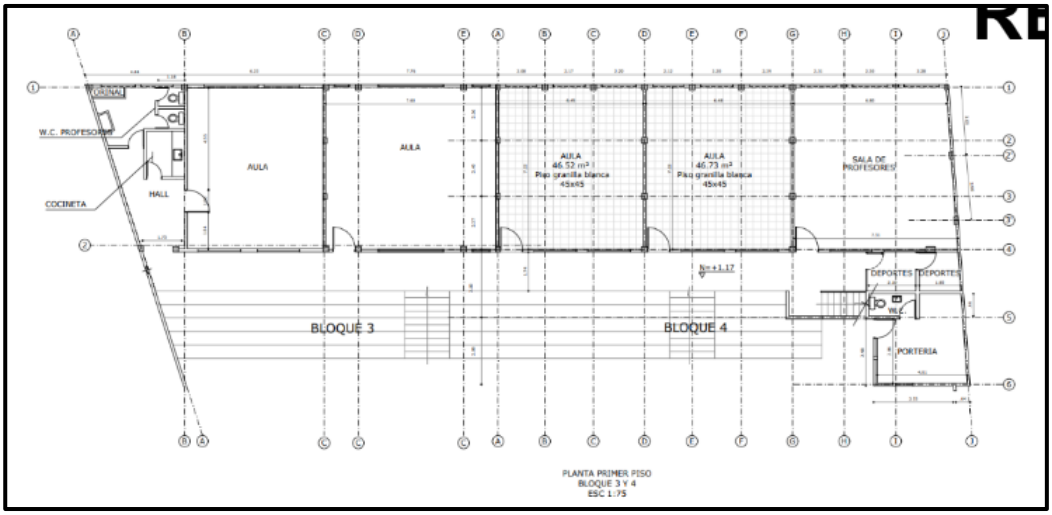


Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de puertas y ventanas en todas las aulas que allí se encuentran y de igual forma en el área administrativa.
- Cambio de la puerta principal de entrada del colegio.

2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C

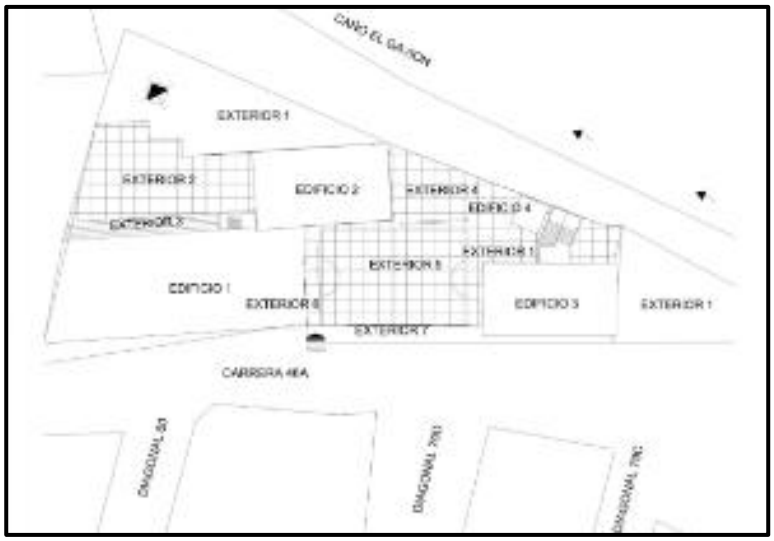


Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación del cuarto de basuras
- Adecuación de la rampa de acceso, incluyendo de igual forma la instalación de barandas metálicas
- Revisión de la aplicación de pintura para los salones, el contratista tendrá la misión de analizar el estado de esta, ya que de acuerdo con la visita los salones se encuentran en buen estado.

2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B

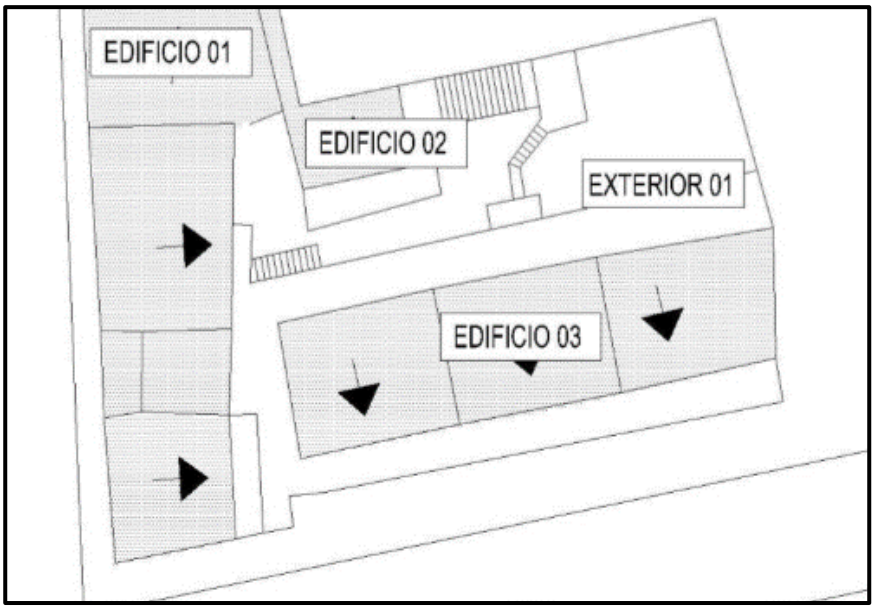


Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo para realizar en la sede educativa es el cambio de cubierta ubicado en tres aulas, para una mejor ubicación es donde se encuentra el aula de informática

2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A

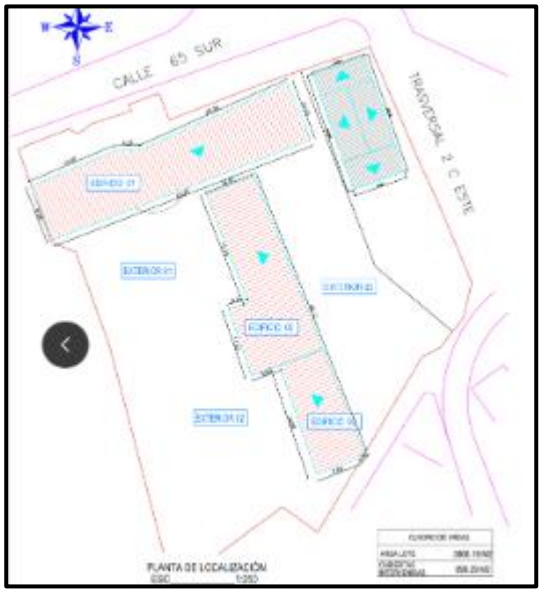


Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Manejo de aguas lluvias en la cancha colindante con el salón de los laboratorios
- Cambio total de las dos baterías sanitarias del tercer piso
- Sustitución de los pisos en todos los salones del tercer piso.

2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda

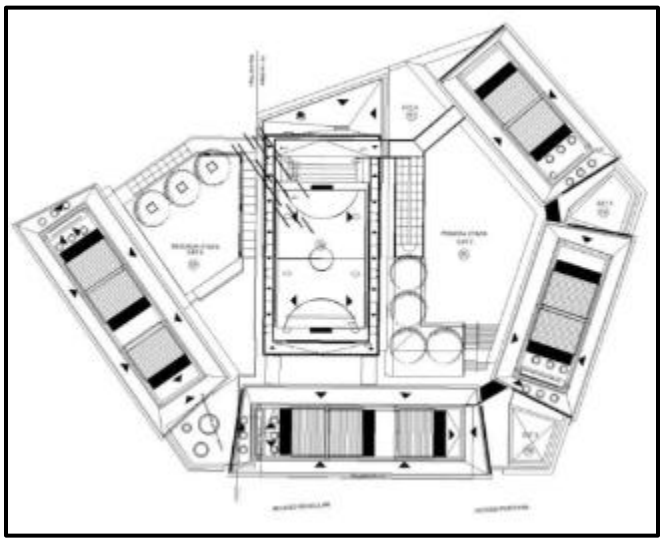


Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar consiste en la impermeabilización de la placa ubicada en la terraza debido a que se presenta empozamientos en la misma y esta filtra hacia el área de recreación del colegio, además de ello se encuentra afectando los techos de los salones.

2.3.9 Colegio Santa Librada



Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización de la terraza del comedor, previa verificación técnica que evidencia filtraciones por la junta de dilatación entre dos estructuras.
- Impermeabilización de la terraza en la zona de las materas.

2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A



Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento de Baterías Sanitarias en bloque bachillerato
- Mejoramiento de instalaciones Hidrosanitarias
- Adecuación de la red eléctrica – Baterías Sanitarias.

2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A

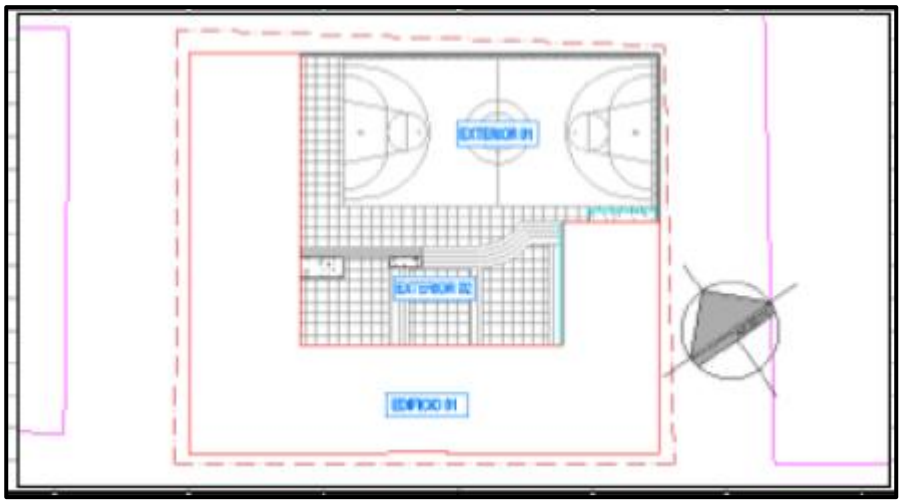


Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización Tanque aguas potable
- Mantenimiento correctivo motobombas
- Mejoramiento de barandas

2.3.12 Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede B – Puerta al Llano

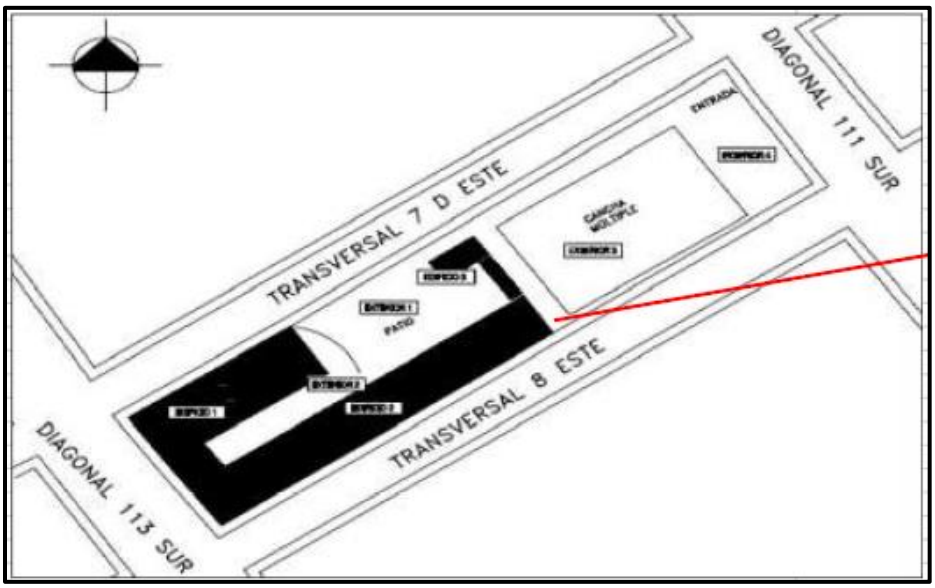


Ilustración 14 - Esquema de Distribución Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede b – Puerta al Llano
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal
- Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico
- Mejoramiento de las redes de aguas lluvias

2.4 EMERGENCIAS

En el marco de la ejecución del contrato, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), contempla la atención de emergencias en la infraestructura educativa distrital, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio educativo.

Estas emergencias corresponden a situaciones imprevistas o de fuerza mayor que afectan las condiciones físicas de las edificaciones como daños estructurales, filtraciones, desprendimientos, fallas en cubiertas o deterioro de redes eléctricas e hidrosanitarias las cuales requieren una intervención inmediata y coordinada.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 416.900.290,00)*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Teniendo en cuenta los informes preliminares y reportes institucionales, durante el presente periodo no se han presentado ni ejecutado atenciones por concepto de emergencias en las instituciones educativas a cargo del contrato.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA	
	DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.6
CONTRATISTA	CONSORCIO PAIS - NIT 901.974.049-8
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8154780
VALOR INICIAL	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023).
VALOR ADICIÓN No.1	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422)
VALOR FINAL	TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.117.050.445)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIÓN No.1	UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO PRORROGA No.2	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	20 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 2. Información general contrato de obra
Fuente: Propia

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	05/12/2026	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	05/04/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/04/2026	05/04/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	12/01/2027	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	13/05/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 466.409.804,60
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**	
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 8	
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA	
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2025	
AMPAROS	**VIGENCIA**	

	INICIAL	FINAL	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	27/02/2027	$ 623.410.089,00
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	28/06/2029	$ 311.705.044,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 11		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 5		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT – HMACC	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
MANTENIMIENTO	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06

REMOCIÓN DE ESCOMBROS	13/07/2026	20/08/2026	$ 349.807.353,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	39-44-101175397 - Anexo 1		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/06/2027	$ 623.410.089,00
PRESTACIONES SOCIALES	13/07/2026	08/10/2029	$ 311.705.044,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/07/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	39-40-101045911		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	27/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	05/10/2026	$ 511.771.500,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	BY - 100000027		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**INICIAL**	
DAÑOS MATERIALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIO VOLC	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT - HMACC	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00

MANTENIMIENTO	20/08/2026	30/11/2026	$ 3.117.050.445,00
RCE POR DAÑOS MATERIALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 466.409.804,06
RCE POR DAÑOS PERSONALES	20/08/2026	30/11/2026	$ 466.409.804,06
REMOCION DE ESCOMBROS	20/08/2026	30/11/2026	$ 349.807.353,45

Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista
Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de julio y el 05 de agosto de 2026, se realizaron actividades de visita en las sedes subrayadas, resaltadas en negrilla y cursiva, además de ello el contratista de obra realizó las siguientes tareas en cada una de las instituciones educativas.

- CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja
- CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C
- CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B
- CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda
- CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli
- CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B
- CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)
- CPF 546 – Colegio Santa Librada
- CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A
- CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza
- CPF 548 – Colegio Tenerife Granada Sur Sede A
- CPF 545 – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B

Además de ello el contratista de obra CONSORCIO PAIS realizo las siguientes actividades referentes a cada una de las instituciones educativas mencionadas a continuación:

❑ CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda

A la fecha del presente informe, el frente de obra cuenta con las actividades al 100%.

- **CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C**

A la fecha del presente informe, el frente de obra cuenta con las actividades al 100%.

- **CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja**

A la fecha del presente informe, se ha culminado con el 100% de las actividades programadas en el frente de obra. Se realizó la entrega total de los trabajos ejecutados, tanto en la zona de la cancha deportiva como en el bloque de primera infancia.

En la zona de la cancha deportiva, los trabajos entregados comprenden la adecuación integral de la cancha, así como la instalación de dos cerramientos contra impacto: uno de 2.5 metros de altura y otro de 5.0 metros de altura, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para la seguridad de la infraestructura.

En cuanto al bloque de primera infancia, se entregaron los siguientes trabajos: instalación del piso vinílico, instalación y reemplazo de la cubierta, y adecuación del sistema eléctrico, que incluyó la instalación de luminarias, interruptores y tomacorrientes. Todas estas intervenciones fueron ejecutadas conforme a los estándares establecidos, garantizando el correcto funcionamiento y la seguridad de las instalaciones.
Se continúa a la espera de la recepción formal por parte de la entidad educativa para dar por concluido el proceso en su totalidad.

- **CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)**

A la fecha del presente informe el frente de obra cuenta con el 100% de las actividades.

- **CPF 546 – Colegio Santa Librada**

A la fecha del presente informe para culminar con las actividades falta la actividad de pintura del corredor y después de ello realizar la entrega pertinente a la institución educativa.

- **CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades.

- **CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza**

Durante el presente periodo, el contratista dio inicio a las actividades de enchape para piso y pared en las baterías sanitarias del bloque B, ubicado en el segundo piso, y de manera simultánea en el bloque C, con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y garantizar un avance equilibrado en ambos frentes de trabajo.

A la fecha del presente informe, se ha alcanzado un **90% de ejecución** en cada una de las zonas intervenidas. En el bloque C, colindante con la cancha deportiva, se ha avanzado significativamente con la instalación de los aparatos sanitarios, la colocación del mesón en policuarzo y la instalación de las divisiones en acero inoxidable, lo que permite visualizar el acabado final de estas baterías sanitarias.

Sin embargo, para dar por culminadas las actividades en su totalidad, resta por ejecutar la terminación de los enchapes en un baño destinado para uso de los docentes, así como la instalación de las divisiones sanitarias en las baterías del segundo piso del bloque B. Se espera que estas actividades sean finalizadas en el próximo periodo, permitiendo así la entrega formal de los espacios intervenidos.

- **CPF 548 – Colegio Tenerife Granda Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 545 – Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B**

Durante el presente periodo, el frente de obra ha desarrollado un conjunto de actividades orientadas a la adecuación integral de los espacios exteriores y de circulación de la institución educativa, logrando avances significativos en los frentes de trabajo establecidos.

En primer lugar, se culminó con la instalación del cerramiento perimetral, garantizando con ello las condiciones de seguridad y delimitación del área intervenida, así como la protección de la comunidad educativa frente a posibles riesgos externos.

Posteriormente, se ejecutó el trasiego del material proveniente de las demoliciones realizadas en las placas, asegurando el adecuado manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD), de acuerdo con los protocolos ambientales establecidos. Una vez despejadas las áreas, se procedió con la instalación de las bajantes y su respectiva conexión a las cajas de inspección, garantizando así la correcta evacuación de aguas lluvias y el funcionamiento óptimo del sistema hidrosanitario.

De manera paralela, se llevó a cabo la instalación de la subbase granular en el corredor de la entrada principal, específicamente en el tramo colindante con la cancha deportiva, con el fin de preparar una base firme y estable para los acabados finales del piso.

Finalmente, se realizó la construcción de un cárcamo en el corredor de las aulas, elemento clave para la captación y manejo adecuado de aguas superficiales, contribuyendo a la prevención de encharcamientos y al mantenimiento de condiciones óptimas de tránsito peatonal en esta zona del colegio.

INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, con corte al Informe Semanal No. 38. se cuenta con los siguientes porcentajes de la Tabla No. 4

% Programado	% Ejecutado
$ 2,413,326,181.50 (90,06%)	$ 2,379,544,897.74 (88.80%)
Atraso de $ 33.781.283,76 (1,26%)	

Tabla 4- *Avance Financiero*
Fuente: Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Agosto 02 2026						
SEDE EDUCATIVA	**PROGRAMADO ACUMULADO**		**EJECUTADO ACUMULADO**		**TOTAL POR SEDE**	**% DE ADELANTO O ATRASO**
ORLANDO FALS BORDA	$ 156.929.148,00	100,00 %	$ 156.929.147,99	100,00 %	$ 156.929.148,00	**ENTREGADO**
UNION EUROPEA	$ 169.766.274,00	100,00 %	$ 169.766.274,00	100,00 %	$ 169.766.274,00	**ENTREGADO**
SIERRA MORENA	$ 118.699.548,00	100,00 %	$ 118.699.548,00	100,00 %	$ 118.699.548,00	**ENTREGADO**
FABIO LOZANO	$ 245.187.661,00	100,00 %	$ 245.187.661,00	100,00 %	$ 245.187.661,00	**0,00%**
ARBORIZADORA BAJA	$ 630.139.470,00	100,00 %	$ 630.139.470,00	100,00 %	$ 630.139.470,00	**ENTREGADO**
BUENAVISTA	$ 186.826.436,00	100,00 %	$ 186.826.436,00	100,00 %	$ 186.826.436,00	**ENTREGADO**
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78.637.768,00	100,00 %	$ 78.637.768,00	100,00 %	$ 78.637.768,00	**ENTREGADO**
SANTA LIBRADA	$ 223.822.666,00	100,00 %	$ 213.404.464,93	95,35%	$ 223.822.666,00	**-4,65%**
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76.163.937,00	100,00 %	$ 76.163.937,00	100,00 %	$ 76.163.937,00	**ENTREGADO**
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88.940.710,00	100,00 %	$ 88.940.710,00	100,00 %	$ 88.940.710,00	**ENTREGADO**
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 263.212.563,50	74,25%	$ 275.765.711,51	77,79%	$ 354.505.537,00	**3,54%**
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 175.000.000,00	50,00%	$ 139.083.769,30	39,74%	$ 350.000.000,00	**-10,26%**
TOTALES	**$ 2.413.326.181,50**	**90,06%**	**$ 2.379.544.897,74**	**88,80%**	**$ 2.679.619.155,00**	**-1,26%**

Tabla 5. *Porcentajes Acumulados*
Fuente: Propia

3.2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo con el flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.14 e Ilustración No.15

FLUJO DE CAJA SEMANAL	**SEMANA 35**	**SEMANA 36**	**SEMANA 37**	**SEMANA 38**
	6-jul-26	13-jul-26	20-jul-26	27-jul-26
	12-jul-26	19-jul-26	26-jul-26	2-ago-26
FLUJO SEMANAL	**$ 32.683.764,70**	**$ 38.344.907,55**	**$ 46.675.234,55**	**$ 43.826.503,19**
	1,22%	**1,43%**	**1,74%**	**1,64%**
FLUJO ACUMULADO	**$ 2.284.479.536,21**	**$ 2.322.824.443,76**	**$ 2.369.499.678,31**	**$ 2.413.326.181,50**
	85,25%	**86,68%**	**88,43%**	**90,06%**

Ilustración 15 *Flujo de Caja Semanal*
Fuente: Propia

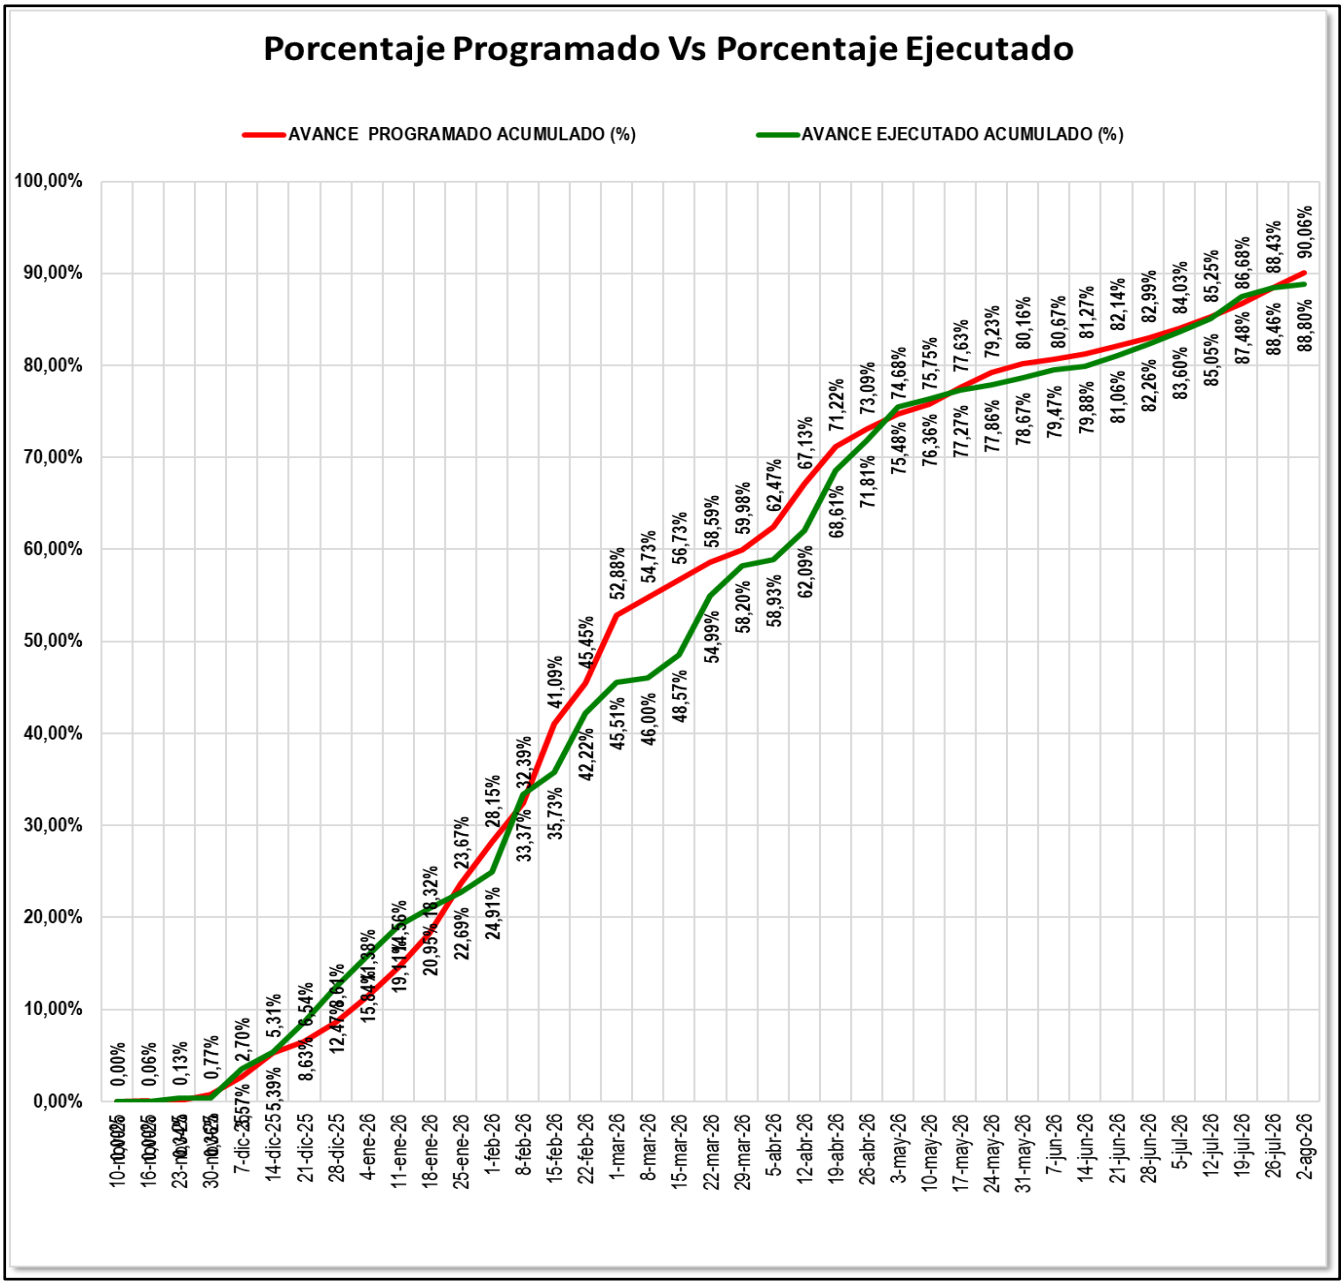


Ilustración 16 Curva s – Programado vs ejecutado
Fuente: Propia

3.2.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance de igual forma en el anexo No.02 se presentarán los informes semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio País semana por semana.

Anexo 1. Bitácora de obra
Anexo 2. Informe Semanal

3.2.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO

Para la fecha del presente periodo, y dando alcance al cronograma de obra vigente, el contratista debería llevar en ejecución las siguientes actividades de acuerdo con cada institución educativa, pero como se evidencia en los puntos anteriores se cuenta con un atraso debido a que no ha realizado en su totalidad las actividades programadas.

Se presentarán las Ilustraciones No.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36,50	225,50	262,00	262,00		$ 4.233,48	$ 1.109.170,66	$ (954.648,79)	717,81 %	717,81%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91,00	(62,60)	28,40	28,40		$ 31.110,25	$ 883.530,99	$ 1.947.501,40	100,00 %	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,50	211,26	247,76	247,76		$ 18.044,21	$ 4.470.634,09	$ (3.812.020,33)	678,79 %	678,79%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	301,34	(266,74)	34,60	34,60		$ 33.201,35	$ 1.148.766,74	$ 8.856.128,37	11,48%	11,48%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 38			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,20	40,80	120,00	120,00		$ 69.099,55	$ 8.291.946,35	$ (2.819.261,76)	151,52 %	151,52%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,00	199,20	233,20	216,59		$ 107.273,69	$ 23.234.421,60	$ (19.587.116,26)	637,03 %	637,03%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16,00	(13,00)	3,00	3,00		$ 166.952,47	$ 500.857,42	$ 2.170.382,16	18,75%	18,75%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1,50			1,50		$ 62.023,52	$ 93.035,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,00			34,00		$ 91.590,40	$ 3.114.073,57	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,30			0,30		$ 135.394,33	$ 40.618,30	$ -	100,00 %	100,00%
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,24			0,24		$ 181.045,17	$ 43.450,84	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 38			
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,00			15,00		$ 22.829,47	$ 342.442,05	$ -	100,00 %	100,00%
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19,00			19,00		$ 19.858,75	$ 377.316,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15,36			15,36		$ 177.336,50	$ 2.723.888,59	$ -	100,00 %	100,00%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58,50	136,16	194,66	194,66		$ 27.185,71	$ 5.291.971,11	$ (3.701.606,83)	100,00 %	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73,00	189,00	249,56	239,56		$ 45.289,29	$ 10.849.501,59	$ (7.543.383,64)	328,16 %	328,16%
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127,20	127,20		$ 4.291,49	$ 545.877,16	$ (545.877,16)	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344,96			340,58		$ 4.663,84	$ 1.588.397,08	$ 20.440,72	98,73%	98,73%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262,00	20,37	252,37	255,37		$ 361.355,09	$ 92.279.248,29	$ 2.395.784,22	97,47%	97,47%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							**$ 156.929.147,99**			

Ilustración 17 - *Actividades Orlando Fals*
Fuente: Propia

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47,37	223,92	271,29	271,29		$ 7.045,00	$ 1.911.238,10	$ (1.577.516,00)	572,70%	572,70%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60,00	13,00	73,00	73,00		$ 31.110,25	$ 2.271.047,96	$ (404.433,20)	121,67%	121,67%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1,76	(1,76)	-	-		$ 274.656,52	$ -	$ 483.395,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20,80	7,20	28,00	28,00		$ 21.488,46	$ 601.677,01	$ (154.716,95)	134,62%	134,62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,60			12,60		$ 11.376,96	$ 143.349,70	$ -	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,84			36,84		$ 107.273,69	$ 3.951.962,61	$ -	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32,64	0,72	31,92	-		$ 93.547,94	$ -	$ 3.053.405,00	0,00%	0,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,20			3,40		$ 15.633,37	$ 53.153,46	$ 59.407,00	47,22%	47,22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,29			4,00		$ 11.761,45	$ 47.045,82	$ 15.172,00	75,61%	75,61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS	m3	1,76	6,86	8,62	4,57		$ 91.988,38	$ 420.527,47	$ (258.627,91)	259,75%	259,75%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38			
DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24,87	-9,60	15,27	15,27		$ 21.702,97	$ 331.382,67	$ 208.370,00	61,40 %	61,40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7,00	7,00	14,00	14,00		$ 176.060,25	$ 2.464.579,38	$ (1.232.158,00)	199,98%	199,98 %
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12,60	3,76	16,36	16,36		$ 146.133,16	$ 2.390.738,55	$ (549.461,00)	129,84%	129,84 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00			-		$ 78.726,73	$ -	$ 472.360,38	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8,00			-		$ 28.310,86	$ -	$ 226.487,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00			-		$ 129.729,46	$ -	$ 259.458,91	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29,00			-		$ 14.988,50	$ -	$ 434.667,00	0,00%	0,00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42,05	8,55	50,60	50,60		$ 193.996,53	$ 9.816.224,55	$ (1.658.670,00)	120,33%	120,33 %
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00%	100,00 %
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2,96			2,96		$ 592.067,38	$ 1.752.519,43	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420,50	(366,54)	53,96	53,96		$ 7.255,46	$ 391.504,61	$ 2.659.416,00	12,83 %	12,83%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91,39			91,39		$ 7.103,01	$ 649.144,22	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	10,00	16,00	16,00		$ 143.600,90	$ 2.297.614,44	$ (1.436.009,00)	266,67%	266,67 %
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4,00	-4,00	0,00	-		$ 1.618.437,02	$ -	$ 6.473.748,09	0,00%	0,00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3,00			2,00		$ 875.947,70	$ 1.751.895,39	$ 875.948,00	66,67 %	66,67%
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3,60			3,60		$ 68.114,71	$ 245.212,96	$ -	100,00%	100,00 %
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15,77	1,25	17,02	17,02		$ 159.158,72	$ 2.708.881,47	$ (198.948,00)	107,93%	107,93 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33,78			36,35		$ 1.120.163,13	$ 40.719.658,08	$ (2.880.548,00)	107,61%	107,61 %
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172,00	(172,00)	-	-		$ 65.757,83	$ -	$ 11.310.347,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146,06	156,06		$ 77.589,44	$ 12.108.607,88	$ (12.108.608,00)	106,85%	106,85 %

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14,08	2,72	16,80	16,80		$ 98.222,57	$ 1.650.139,25	$ (267.165,00)	119,32%	119,32 %
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4,08			4,08		$ 45.289,29	$ 184.780,29	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4,84			4,84		$ 126.224,49	$ 610.926,55	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	24,00			24,00		$ 23.315,15	$ 559.563,51	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24,00			24,00		$ 20.790,98	$ 498.983,52	$ -	100,00%	100,00 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,08	0,05	5,13	5,13		$ 798.362,30	$ 4.095.598,62	$ (39.918,00)	100,98%	100,98 %
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193,76	-98,31	95,45	105,45		$ 29.785,43	$ 3.140.873,57	$ 2.630.351,00	54,42 %	54,42%
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61,76	14,44	76,20	86,20		$ 29.785,43	$ 2.567.504,05	$ (727.956,00)	139,57%	139,57 %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226,80	92,51	319,31	319,31		$ 23.042,63	$ 7.357.741,55	$ (2.131.674,00)	140,79%	140,79 %

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36,84	-23,74	13,10	15,10		$ 264.771,67	$ 3.998.052,18	$ 5.756.136,00	40,99 %	40,99%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537,24			537,24		$ 4.663,84	$ 2.505.600,70	$ -	100,00%	100,00 %
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 118.699.548,00**			

Ilustración 18- Actividades Sierra Morena
Fuente: Propia

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168,00	10,14	178,14	178,14		$ 4.233,48	$ 754.151,38	$ (42.927,00)	106,04 %	106,04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45,00	7,80	52,80	23,83		$ 31.110,25	$ 741.422,37	$ 658.538,70	52,96%	52,96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136,13	(104,13)	32,00	32,00		$ 3.248,63	$ 103.956,25	$ 338.280,13	23,51%	23,51%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,83	-	5,83	-		$ 144.722,00	$ -	$ 843.729,29	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36,30			36,30		$ 26.782,33	$ 972.198,70	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5,15	7,35	12,50	12,50		$ 27.938,51	$ 349.231,40	$ (205.348,06)	242,72 %	242,72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168,00	5,63	173,63	183,63		$ 36.752,18	$ 6.748.803,22	$ (574.436,61)	109,30 %	109,30%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 11.967,87	$ 287.228,79	$ (71.807,20)	133,33 %	133,33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 7.469,97	$ 179.279,20	$ (44.819,80)	133,33 %	133,33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1,00			-		$ 55.922,89	$ -	$ 55.922,89	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7,00	0,00	7,00	-		$ 32.498,47	$ -	$ 227.489,29	0,00%	0,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	m	3,90	-3,90	0,00	-		$ 18.687,73	$ -	$ 72.882,16	0,00%	0,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
A SITIOS AUTORIZADOS											
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19,43			19,43		$ 21.844,63	$ 424.441,11	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,90			3,90		$ 89.839,27	$ 350.373,14	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515,11	-1076,19	2438,92	2.608,92		$ 23.042,63	$ 60.116.373,04	$ (84.914.618,87)	-242,42 %	-242,42%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ (825.185,65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0,50			0,50		$ 341.855,19	$ 170.927,60	$ (170.927,60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26,40	18,13	44,53	44,53		$ 91.590,40	$ 4.078.520,47	$ (1.660.533,93)	245,62 %	245,62%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1,00	-1,00	0,00			$ 875.947,70	$ -	$ 875.947,70	0,00%	0,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213,75	0,29	214,04	214,04		$ 264.771,67	$ 56.671.727,78	$ (76.783,78)	100,14 %	100,14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,15			18,15		$ 106.267,26	$ 1.928.750,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,90			34,9		$ 91.590,40	$ 3.196.504,93	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	M	42,00			42		$ 23.315,15	$ 979.236,14	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42,00			42		$ 20.790,98	$ 873.221,16	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 180.330,15	$ 4.327.923,59	$ (540.990,45)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 238.055,44	$ 5.713.330,57	$ (714.166,32)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA	M	22,50	8,50	31,00	30		$ 304.166,74	$ 9.125.002,11	$ (2.281.250,53)	133,33 %	133,33%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 38			
FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.											
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32,35	0,75	33,10	33,1		$ 222.048,37	$ 7.349.801,01	$ (166.536,28)	102,32 %	102,32%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61,70			65,10		$ 17.207,77	$ 1.120.195,60	$ (58.476,16)	105,51 %	105,51%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224,21			224,21		$ 4.663,84	$ 1.045.679,27	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA							**$ 169.766.274,00**			

Ilustración 19 - Actividades Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786,72	463,91	1250,63	1.250,63		$ 7.045,00	$ 8.810.688,60	$ (3.268.246,00)	158,97 %	158,97%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96,25	73,00	169,25	169,25		$ 31.110,25	$ 5.265.409,14	$ (2.271.047,96)	175,84 %	175,84%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466,58	9,42	476,00	476,00		$ 107.273,69	$ 51.062.274,77	$ (1.010.518,00)	102,02 %	102,02%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5,25			-		$ 22.300,62	$ -	$ 117.078,27	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,00	6,23	151,23	151,23		$ 32.594,26	$ 4.929.229,33	$ (203.062,21)	104,30 %	104,30%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145,00	123,77	21,23	21,23		$ 42.650,45	$ 905.469,00	$ 5.278.845,87	14,64%	14,64%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130,00			130,00		$ 69.868,54	$ 9.082.910,19	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA,	m2	323,02			323,02		$ 36.752,18	$ 11.871.653,14	$ 37,00	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN											
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35,50			35,50		$ 8.680,11	$ 308.143,88	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25,00			25,00		$ 7.469,97	$ 186.749,17	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2,00			2,00		$ 398.950,46	$ 797.900,91	$ -	100,00 %	100,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21,00			-		$ 11.761,45	$ -	$ 246.991,00	0,00%	0,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16,80	5,76	22,56	22,56		$ 91.988,38	$ 2.075.257,93	$ (529.853,00)	134,29 %	134,29%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258,10	(36,51)	221,59	221,59		$ 79.962,51	$ 17.718.891,73	$ 2.919.431,00	85,85%	85,85%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22,83			22,83		$ 135.394,33	$ 3.091.052,48	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15,52			2,22		$ 66.591,58	$ 147.833,30	$ 885.668,00	14,30%	14,30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103,10	68,26	171,36	171,36		$ 176.060,25	$ 30.169.684,13	$ (12.017.873,00)	166,21 %	166,21%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129,05	25,90	154,95	154,95		$ 176.060,25	$ 27.280.535,46	$ (4.559.960,00)	120,07 %	120,07%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87,00			87,00		$ 76.033,93	$ 6.614.951,64	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90,00			90,00		$ 97.085,28	$ 8.737.675,50	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18,70	5,00	23,70	23,70		$ 165.931,21	$ 3.932.569,57	$ (829.656,00)	126,74 %	126,74%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90,00			90,00		$ 164.788,52	$ 14.830.966,59	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1,52			1,52		$ 358.768,86	$ 545.328,67	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0,90			0,90		$ 156.990,72	$ 141.291,65	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809,76	-142,50	1667,26	1.667,26		$ 23.042,63	$ 38.418.051,96	$ 3.283.574,00	92,13%	92,13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2,00					$ 1.088.548,32	$ -	$ 2.177.097,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684,78	-162,78	522,00	522,00		$ 11.730,42	$ 6.123.281,59	$ 1.909.479,00	76,23%	76,23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3,00			2,00		$ 5.565,04	$ 11.130,08	$ 5.565,00	66,67%	66,67%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323,02			323,02		$ 264.771,67	$ 85.526.544,13	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35,50			35,50		$ 305.515,84	$ 10.845.812,21	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE:	m2	484,50	-43,86	440,64	440,64		$ 225.361,76	$ 99.303.405,31	$ 9.884.367,00	90,95%	90,95%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484,50	-484,50	0,00	-		$ 77.589,44	$ -	$ 37.592.083,00	0,00%	0,00%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714,00			680,68		$ 65.757,83	$ 44.760.026,89	$ 2.191.065,00	95,33%	95,33%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66,67			66,67		$ 62.023,52	$ 4.135.108,31	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620,45			620,45		$ 7.255,46	$ 4.501.650,03	$ -	100,00 %	100,00%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353,72			353,72		$ 18.365,30	$ 6.496.173,31	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2,00	-1,00	1,00	1,00		$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,00	50,00%	50,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ 126.906,00	80,00%	80,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118,00			118,00		$ 15.217,85	$ 1.795.706,06	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118,00			118,00		$ 16.070,48	$ 1.896.316,55	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00			25,00		$ 180.330,15	$ 4.508.253,74	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22,00			22,00		$ 238.055,44	$ 5.237.219,69	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00			3,00		$ 193.810,36	$ 581.431,07	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194,18			194,18		$ 9.167,13	$ 1.780.074,18	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			16,95		$ 2.042.059,82	$ 34.612.913,93	$ 1.123.133,00	96,86%	96,86%
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			16,95		$ 1.257.854,97	$ 21.320.641,75	$ 691.820,00	96,86%	96,86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130,00			125,78		$ 237.210,90	$ 29.836.007,59	$ 1.001.410,00	96,75%	96,75%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 38			
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197,54			194,54		$ 5.046,98	$ 981.840,09	$ 15.141,00	98,48%	98,48%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.078,76			1.078,76		$ 4.663,84	$ 5.031.162,64	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							$ 630.139.470,00			

Ilustración 20 - Actividades Arborizadora Baja
Fuente: *Propia*

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201,02	10,05	1211,07	1.211,07		$ 4.233,48	$ 5.127.035,54	$ (42.546,00)	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51,83	81,17	133,00	133,00		$ 31.110,25	$ 4.137.662,72	$ (2.525.218,67)	256,61 %	256,61%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y	M2	235,29	11,28	246,57	246,57		$ 32.594,26	$ 8.036.765,70	$ (367.663,21)	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68,70	68,70		$ 107.273,69	$ 7.369.702,26	$ (7.369.702,26)	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,64	1,35	29,99	29,99		$ 22.300,62	$ 668.795,68	$ (30.105,84)	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55,48	30,02	85,50	85,50		$ 12.649,16	$ 1.081.503,32	$ (379.727,83)	154,11 %	154,11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00			28,00		$ 20.708,69	$ 579.843,18	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3	15,05	0,08	15,13	15,13		$ 66.591,58	$ 1.007.530,54	$ (5.327,33)	100,53 %	100,53%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}											
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,32			17,32		$ 33.174,37	$ 574.580,07	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28,00			28,00		$ 27.281,50	$ 763.882,01	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3,00	3,00		$ 25.731,38	$ 77.194,15	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M	66,00			66,00		$ 27.938,51	$ 1.843.941,79	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
SITIOS AUTORIZADOS)											
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63,85	63,85		$ 34.724,48	$ 2.217.158,36	$ -	100,00 %	100,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120,60	120,60		$ 15.633,37	$ 1.885.384,52	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00			8,00		$ 7.469,97	$ 59.759,73	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55,30	-5,16	50,14	50,14		$ 32.569,97	$ 1.633.058,41	$ 168.061,06	90,67%	90,67%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,90			22,90		$ 18.687,73	$ 427.949,09	$ -	100,00 %	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2,80	2,80		$ 18.044,21	$ 50.523,80	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,80	2,49	15,29	15,29		$ 135.394,33	$ 2.070.179,26	$ (337.131,87)	119,45 %	119,45%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194,67			194,67		$ 42.650,45	$ 8.302.762,60	$ -	100,00 %	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49,31			49,31		$ 45.289,29	$ 2.233.214,74	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548,06	(548,06)	-			$ 69.868,54	$ -	$ 38.292.151,98	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158,76	(56,05)	102,71	102,71		$ 7.103,01	$ 729.550,31	$ 398.123,79	64,70%	64,70%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171,60	(44,68)	126,92	122,00		$ 164.788,52	$ 20.104.199,16	$ 8.173.510,48	71,10%	71,10%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0,64	0,64		$ 115.264,41	$ 73.769,22	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13,00	13,00		$ 156.990,72	$ 2.040.879,36	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20,50	20,57		$ 24.290,55	$ 499.656,52	$ (1.700,34)	100,34 %	100,34%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00			2,00		$ 126.905,79	$ 253.811,58	$ (253.811,58)	100,00 %	100,00%
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES,	UN	1,00			1,00		$ 253.721,19	$ 253.721,19	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8,00			8,00		$ 180.330,15	$ 1.442.641,20	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32,00	-27,00	5,00	5,00		$ 23.315,15	$ 116.575,73	$ 629.508,95	15,63%	15,63%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55,00	55,00		$ 33.700,52	$ 1.853.528,49	$ (1.853.528,49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32,00	(12,00)	20,00	20,00		$ 20.790,98	$ 415.819,60	$ 249.491,76	62,50%	62,50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8,00	8,00		$ 198.607,76	$ 1.588.862,05	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00	-5,00	3,00	3,00		$ 238.055,44	$ 714.166,32	$ 1.190.277,20	37,50%	37,50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1,00	1,00		$ 781.835,83	$ 781.835,83	$ (781.835,83)	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60,00	60,00		$ 57.049,39	$ 3.422.963,50	$ (3.422.963,50)	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15,00	(2,42)	12,58	12,58		$ 361.355,09	$ 4.545.846,98	$ 874.479,31	83,87%	83,87%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00			1,00		$ 875.947,70	$ 875.947,70	$ -	100,00 %	100,00%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55,30	-5,16	50,14	50,14		$ 130.345,99	$ 6.535.548,17	$ 672.585,33	90,67%	90,67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226,69	12,39	239,08	239,08		$ 126.224,49	$ 30.177.196,69	$ (1.563.366,10)	105,46 %	105,46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,44	76,23	93,67	93,67		$ 33.727,50	$ 3.159.254,93	$ (2.571.047,33)	537,10 %	537,10%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE	M			39,00	39,00		$ 22.829,47	$ 890.349,34	$ (890.349,34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
ANDAMIO CERTIFICADO)											
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0,00	5,29	5,29	5,29		$ 62.023,52	$ 328.104,44	$ (328.104,44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
WIN DE ALUMINIO	M	18,00	2,90	20,90	20,90		$ 15.372,99	$ 321.295,59	$ (44.581,68)	116,11%	116,11%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131,00	(37,64)	93,36	93,36		$ 98.222,57	$ 9.170.059,56	$ 3.697.097,71	71,27%	71,27%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11,73	-5,49	6,24	6,24		$ 1.127.900,21	$ 7.038.097,34	$ 6.192.172,18	53,20%	53,20%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47,82	-8,24	39,58	40,99		$ 989.338,00	$ 40.552.909,59	$ 6.757.233,57	85,72%	85,72%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	0,30	1,50	1,50		$ 989.338,00	$ 1.484.007,00	$ 296.801,40	83,33%	83,33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00			3,00		$ 772.427,21	$ 2.317.281,62	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11,00			11,00		$ 1.117.185,66	$ 12.289.042,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS	M2			3,84	3,84		$ 798.362,30	$ 3.065.711,25	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14,00			14,00		$ 404.611,28	$ 5.664.557,91	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102,46	102,46		$ 91.590,40	$ 9.384.352,28	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1,65	1,65		$ 78.726,73	$ 129.899,11	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24,00	24,00		$ 51.125,49	$ 1.227.011,85	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11,00			11,00		$ 18.869,86	$ 207.568,48	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28,00			28,00		$ 4.998,42	$ 139.955,63	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14,00			14,00		$ 63.533,17	$ 889.464,33	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14,00			14,00		$ 63.533,17	$ 889.464,33	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7,20	0,56	7,76	7,76		$ 123.260,52	$ 956.501,65	$ (69.025,89)	107,78 %	107,78%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 38			
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66,72	216,43	283,15	283,15		$ 20.236,50	$ 5.729.964,98	$ (4.379.785,70)	424,39 %	424,39%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24,00	24,00		$ 33.569,66	$ 805.671,73	$ -	100,00 %	100,00%
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22,64	22,64		$ 32.026,28	$ 725.075,09	$ (725.075,09)	100,00 %	100,00%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122,00	122,00		$ 32.026,28	$ 3.907.206,76	$ -	100,00 %	100,00%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176,38			176,38		$ 6.610,59	$ 1.165.975,86	$ -	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.201,02			1.201,02		$ 4.663,84	$ 5.601.363,56	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							$ 245.187.661,00			

Ilustración 21 - Actividades Fabio Lozano Simonelli
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED	m2	557,28	20,48	577,76	577,76		$ 4.233,48	$ 2.445.932,98	$ (86.702,00)	103,67 %	103,67%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 38			
no lo puede aportar)											
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88,20	-88,20	0,00	-		$ 154.730,98	$ -	$ (13.647.272,19)	0,00%	0,00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54,17			33,24		$ 33.174,37	$ 1.102.716,03	$ 694.339,54	61,36%	61,36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95,99	-32,70	63,29	63,29		$ 29.391,49	$ 1.860.302,19	$ 960.987,18	65,94%	65,94%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28,37					$ 707.267,02	$ -	$ 20.065.165,47	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM	M2	25,81	6,00	31,81	35,81		$ 829.259,39	$ 29.695.861,74	$ (8.292.676,84)	138,75 %	138,75%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 38			
Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,43			1,43		$ 798.362,30	$ 1.145.011,22	$ (3.353,12)	100,29 %	100,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87,25			69,15		$ 467.649,33	$ 32.338.268,71	$ 8.464.135,19	79,26%	79,26%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 38			
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141,20			141,20		$ 9.408,62	$ 1.328.459,99	$ 37,63	100,00 %	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141,20			148,20		$ 22.829,47	$ 3.383.236,17	$ (159.714,97)	104,95 %	104,95%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141,20			148,20		$ 17.207,77	$ 2.550.122,76	$ (120.385,56)	104,95 %	104,95%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577,76			597,76		$ 4.663,84	$ 2.787.856,22	$ (93.276,77)	103,46 %	103,46%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							$ 78.637.768,00			

Ilustración 22 - Actividades Estrellas del Sur Sede B
Fuente: *Propia*

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538,32	-88,32	450,00	450,00		$ 4.233,48	$ 1.905.064,11	$ 373.901,00	83,59%	83,59%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 38			
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78,28	11,72	90,00	95,00		$ 31.137,23	$ 2.958.036,66	$ (520.614,00)	121,36 %	121,36%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538,32					$ 3.248,63	$ -	$ 1.748.804,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12,00	(1,00)	11,00	11,00		$ 7.469,97	$ 82.169,63	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5,00	5,00		$ 23.315,15	$ 116.575,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20,00	20,00		$ 20.790,98	$ 415.819,60	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1,00			1,00		$ 101.214,88	$ 101.214,88	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 38			
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538,82	-134,52	404,30	408,30		$ 36.752,18	$ 15.005.915,99	$ 4.796.895,00	75,78%	75,78%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841,40	-941,87	899,53	902,53		$ 23.042,63	$ 20.796.663,05	$ 21.634.032,15	49,01%	49,01%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44,00			46,69		$ 130.345,99	$ 6.086.241,01	$ (351.017,24)	106,12 %	106,12%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633,15			632,63		$ 4.663,84	$ 2.950.473,25	$ 2.436,22	99,92%	99,92%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30,00			30,00		$ 37.696,55	$ 1.130.896,57	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 38			
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87,00	87,00		$ 106.267,26	$ 9.245.251,44	$ (9.245.251,44)	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538,31	-538,31	0,00	-		$ 264.771,67	$ -	$ 142.529.236,49	0,00%	0,00%

CPF	1974	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DDE AACEITES (NNCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0,00	0,00	410,94	410,94		$ 306.692,25	$ 126.032.114,08	$ (126.032.114,08)	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186.826.436,00**			

Ilustración 23 - Actividades Calasanz (Buenavista)
Fuente: *Propia*

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28			557,28		$ 4.233,48	$ 2.359.231,39	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128,18	-78,18	50,00	50,00		$ 31.110,25	$ 1.555.512,30	$ 2.432.199,03	39,01 %	39,01%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65,03	-39,70	25,33	25,33		$ 15.633,37	$ 395.993,28	$ 620.644,82	38,95 %	38,95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,90		0,80	0,80		$ 32.594,26	$ 26.075,40	$ 2.187.074,58	1,18%	1,18%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27,20			13,34		$ 21.844,63	$ 291.407,33	$ 302.766,53	49,04 %	49,04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372,13			334,28		$ 13.385,77	$ 4.474.588,57	$ 506.658,09	89,83 %	89,83%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 38			
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18,00	18,00		$ 22.829,47	$ 410.930,46	$ (410.930,46)	100,00 %	100,00%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63,87	28,85	92,72	92,72		$ 34.724,48	$ 3.219.654,24	$ (1.001.801,39)	145,17 %	145,17%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73,27	73,27		$ 36.752,18	$ 2.692.832,39	$ -	100,00 %	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,47	(16,47)	-			$ 18.044,21	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194,87			194,87		$ 9.443,70	$ 1.840.293,82	$ 1.840.293,82	100,00 %	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59,96			59,96		$ 91.988,38	$ 5.515.765,80	$ 5.515.765,80	100,00 %	100,00%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100,00	(20,61)	79,39	79,39		$ 53.568,71	$ 4.252.820,18	$ 4.252.820,18	79,39 %	79,39%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63,33			13,44		$ 91.988,38	$ 1.236.323,87	$ 1.236.323,87	21,22 %	21,22%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 38			
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281,83	(180,01)	96,22	96,22		$ 45.289,29	$ 4.357.735,20	$ 4.357.735,20	34,14 %	34,14%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12,54	12,54		$ 193.996,53	$ 2.432.716,52	$ 2.432.716,52	100,00 %	100,00%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333,93	-143,06	190,87	190,87		$ 69.679,67	$ 13.299.757,83	$ 13.299.757,83	57,16 %	57,16%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208,04			118,00		$ 25.122,94	$ 2.964.506,94	$ 2.964.506,94	56,72 %	56,72%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19,35	19,35		$ 91.590,40	$ 1.772.274,22	$ 1.772.274,22	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8,10	8,10		$ 78.726,73	$ 637.686,52	$ 637.686,52	100,00 %	100,00%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19,60			13,44		$ 62.023,52	$ 833.596,15	$ 833.596,15	68,57 %	68,57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48,00			37,00		$ 16.863,75	$ 623.958,75	$ 623.958,75	77,08 %	77,08%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110,00	69,08	179,08	179,08		$ 16.863,75	$ 3.019.960,35	$ 3.019.960,35	162,80 %	162,80%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 38			
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356,60	-300,35	56,25	59,92		$ 34.369,67	$ 2.059.599,55	$ 2.059.599,55	16,80 %	16,80%
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	(6,00)	-	-		$ 68.114,71	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7,20	-1,32	5,88	5,88		$ 157.817,72	$ 927.968,18	$ 927.968,18	81,67 %	81,67%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67,71			67,71		$ 5.565,04	$ 376.808,69	$ 376.808,69	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6,00	-0,12	5,88	5,88		$ 101.978,47	$ 599.633,40	$ 599.633,40	98,00 %	98,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17,20	20,20		$ 305.515,84	$ 6.171.419,91	$ 6.171.419,91	117,44 %	117,44%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335,60	(23,61)	311,99	311,99		$ 361.355,09	$ 112.739.173,09	$ 112.739.173,09	92,96 %	92,96%

CPF	546	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190,00	190,00		$ 11.730,42	$ 2.228.757,19	$ 2.228.757,19	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8,00	8,00		$ 33.502,20	$ 268.017,60	$ 268.017,60	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37,42	37,42		$ 258.201,55	$ 9.661.902,03	$ 9.661.902,03	100,00 %	100,00%
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190,84	200,84		$ 29.001,60	$ 5.824.681,89	$ 5.824.681,89	105,24 %	105,24%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130,00			130,00		$ 89.213,28	$ 11.597.727,02	$ 11.597.727,02	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617,33			586,46		$ 4.663,84	$ 2.735.154,84	$ 2.735.154,84	95,00 %	95,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 213.404.464,93**			

Ilustración 24 - *Actividades Santa Librada*
Fuente: Propia

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en	M2	20,56			20,56		$ 4.233,48	$ 87.040,26	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
su defecto la SED no lo puede aportar)											
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40,30	-31,81	8,49	8,49		$ 31.110,25	$ 264.138,88	$ 989.604,00	21,07%	21,07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-2,22	17,30	17,30		$ 32.594,26	$ 563.880,63	$ 72.359,00	88,63%	88,63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-5,96	13,56	13,56		$ 22.300,62	$ 302.396,45	$ 132.912,00	69,47%	69,47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,65	-2,49	38,16	38,16		$ 12.649,16	$ 482.692,01	$ 31.496,00	93,87%	93,87%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-4,52	15,00	15,00		$ 20.708,69	$ 310.630,28	$ 93.603,00	76,84%	76,84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,36	-5,02	6,34	6,34		$ 33.174,37	$ 210.325,50	$ 166.535,00	55,81%	55,81%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00			15,00		$ 27.281,50	$ 409.222,50	$ -	100,00 %	100,00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00			15,00		$ 182.479,27	$ 2.737.188,99	$ -	100,00 %	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19,52			19,52		$ 42.650,45	$ 832.536,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE	M2	19,52	(1,99)	17,53	17,53		$ 126.224,49	$ 2.212.715,38	$ 251.187,00	89,81%	89,81%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
GUARDAESCOBA											
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,80			0,80		$ 67.218,91	$ 53.775,13	$ -	100,00 %	100,00%
WIN DE ALUMINIO	M	3,00			3,00		$ 15.372,99	$ 46.118,98	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44,84			40,81		$ 116.158,86	$ 4.740.210,72	$ 468.353,00	91,01%	91,01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,20			5,20		$ 707.267,02	$ 3.677.788,50	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,16	0,12	2,28	2,38		$ 1.127.967,67	$ 2.680.941,73	$ (244.532,00)	110,04 %	110,04%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7,00	1,00	8,00	8,00		$ 873.470,75	$ 6.987.765,98	$ (873.471,00)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			2,00		$ 616.820,66	$ 1.233.641,32	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			5,00		$ 404.611,28	$ 2.023.056,40	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38			
20 X 20 PLÁSTICA											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28,82	12,82	41,64	42,64		$ 989.338,20	$ 42.185.380,90	$ (13.672.654,00)	147,95 %	147,95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	(0,80)	1,00	1,00		$ 989.338,20	$ 989.338,20	$ 791.471,00	55,56%	55,56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44,84			40,81		$ 36.193,65	$ 1.476.990,67	$ 145.933,00	91,01%	91,01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,50			35,10		$ 21.599,09	$ 758.128,09	$ 8.640,00	98,87%	98,87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,16			2,16		$ 123.260,52	$ 266.242,73	$ -	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111,32			100,19		$ 4.663,84	$ 467.270,00	$ 51.909,00	90,00%	90,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 76.163.937,00**			

Ilustración 25 Actividades Estrella del Sur Sede A
Fuente: *Propia*

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125,48			125,48		$ 4.233,48	$ 531.216,54	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68,00			32,20		$ 31.110,25	$ 1.001.749,92	$ 1.113.747,00	47,35%	47,35%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129,54	18,57	148,11	148,11		$ 32.594,26	$ 4.827.535,26	$ (605.275,00)	114,34 %	114,34%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150,00			150,00		$ 11.376,96	$ 1.706.544,05	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40,00			40,00		$ 7.469,97	$ 298.798,67	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100,00			100,00		$ 18.687,73	$ 1.868.773,32	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95,87	17,32	113,19	113,19		$ 22.300,62	$ 2.524.207,52	$ (386.247,00)	118,07 %	118,07%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364,26	(31,38)	332,88	364,26		$ 12.649,16	$ 4.607.583,60	$ -	100,00 %	100,00%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7,20	3,16	10,36	10,20		$ 65.869,81	$ 671.872,04	$ (197.609,00)	141,67 %	141,67%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22,00	37,00	59,00	37,00		$ 20.708,69	$ 766.221,35	$ (310.630,00)	168,18 %	168,18%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS	M2	26,61			26,11		$ 33.174,37	$ 866.182,77	$ 16.587,00	98,12%	98,12%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78,00			53,00		$ 27.281,50	$ 1.445.919,51	$ 682.038,00	67,95%	67,95%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15,00	15,00		$ 20.708,69	$ 310.630,28	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19,00	19,00		$ 11.967,87	$ 227.389,46	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16,00	16,00		$ 7.469,97	$ 119.519,47	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M			58,00	58,00		$ 4.391,32	$ 254.696,59	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)											
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35,00	118,18	153,18	153,18		$ 61.099,39	$ 9.359.204,54	$ (7.220.726,00)	437,66 %	437,66%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129,54	30,05	159,59	145,24	5,71	$ 126.224,49	$ 18.332.845,54	$ (1.981.725,00)	112,12 %	112,12%
WIN DE ALUMINIO	M	30,00	52,83	82,83	34,20	12,00	$ 15.372,99	$ 525.756,41	$ (64.567,00)	114,00 %	114,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7,20	16,32	23,52	16,71		$ 1.128.300,90	$ 18.853.908,00	$ (10.730.142,00)	232,08 %	232,08%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364,26			364,26		$ 36.193,65	$ 13.183.900,70	$ -	100,00 %	100,00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119,96	(45,93)	74,03	26,10		$ 21.599,09	$ 563.736,28	$ 2.027.291,00	21,76%	21,76%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO	M2	135,38			96,79		$ 989.338,20	$ 95.760.548,36	$ 38.176.057,00	71,50%	71,50%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37,00			37,00		$ 18.869,86	$ 698.184,88	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37,00			37,00		$ 63.533,17	$ 2.350.727,15	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22,00	7,00	29,00	29,00		$ 63.533,17	$ 1.842.461,82	$ (444.732,00)	131,82 %	131,82%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37,00			37,00		$ 181.838,44	$ 6.728.022,41	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38,00			38,00		$ 97.295,74	$ 3.697.238,23	$ -	100,00 %	100,00%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22,00			22,00		$ 5.565,04	$ 122.430,83	$ -	100,00 %	100,00%
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74,03	-30,18	43,85	21,06		$ 13.044,45	$ 274.716,07	$ 690.964,00	28,45%	28,45%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20,88			9,36		$ 123.260,52	$ 1.153.718,48	$ 1.419.961,00	44,83%	44,83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12	UN			13,00	6,00		$ 192.677,11	$ 1.156.062,68	$ (1.156.063,00)	#¡DIV/0 !	#¡DIV/0!

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3,00			3,00		$ 572.567,48	$ 1.717.702,45	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	56,00	106,00	65,00	15,00	$ 23.315,15	$ 1.515.484,50	$ (349.727,00)	130,00 %	130,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50,00	(4,00)	46,00	30,00		$ 20.790,98	$ 623.729,40	$ 415.820,00	60,00%	60,00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	M	36,90			36,90		$ 21.844,63	$ 806.066,74	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO , CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00			10,00		$ 180.330,15	$ 1.803.301,50	$ 3.967.263,00	31,25%	31,25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18,00			18,00		$ 198.607,76	$ 3.574.939,62	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20,00			8,00		$ 180.330,15	$ 1.442.641,20	$ 2.163.962,00	40,00%	40,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5,40	0,60	6,00	3,00		$ 989.338,20	$ 2.968.014,60	$ 2.374.412,00	55,56%	55,56%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12,00			6,00		$ 772.427,21	$ 4.634.563,23	$ 4.634.563,00	50,00%	50,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12,00			5,00		$ 41.130,01	$ 205.650,06	$ 287.910,00	41,67%	41,67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45,00	-8,00	37,00	24,00	3,00	$ 1.117.185,66	$ 26.812.455,90	$ 23.460.899,00	53,33%	53,33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364,26	(24,03)	340,23	330,72	7,50	$ 98.222,57	$ 32.484.169,87	$ 3.294.385,00	97,20%	97,20%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205,61			116,79		$ 4.663,84	$ 544.689,72	$ 414.242,00	56,80%	56,80%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 275.765.711,51**			

Ilustración 26 Actividades Guillermo Cano Isaza
Fuente: *Propia*

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193,00	41,34	234,34	234,34		$ 4.233,48	$ 992.072,72	$ (175.012,00)	121,42 %	121,42%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39,00			26,00		$ 31.110,25	$ 808.866,40	$ 404.433,00	66,67%	66,67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24,83	65,79	90,62	90,62		$ 38.696,24	$ 3.506.652,84	$ (2.545.825,00)	364,96 %	364,96%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44,28	25,88	70,16	55,16		$ 361.355,09	$ 19.932.346,54	$ (3.931.543,00)	124,57 %	124,57%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O	M2	44,28	25,88	70,16	70,16		$ 65.757,83	$ 4.613.569,51	$ (1.701.813,00)	158,45 %	158,45%

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 38			
CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412,00	(366,94)	45,06	45,06		$ 32.026,28	$ 1.443.104,40	$ 11.751.725,00	10,94%	10,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43,00	-7,64	35,36	30,36		$ 190.851,78	$ 5.794.260,06	$ 2.412.367,00	70,60%	70,60%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5,50	-0,80	4,70	4,70		$ 1.120.163,13	$ 5.264.766,69	$ 896.131,00	85,45%	85,45%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964,27	(570,86)	393,41	393,41		$ 4.663,84	$ 1.834.783,56	$ 2.662.416,00	40,80%	40,80%
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150,00	(15,20)	134,80	116,77		$ 383.249,63	$ 44.750.287,29	$ 12.737.157,00	77,84%	77,84%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 88.940.710,00**			

Ilustración 27 Actividades Tenerife – Granda Sur
Fuente: *Propia*

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 38			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540,76			540,76		$ 4.233,48	$ 2.289.294,37	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	35,00			35,00		$ 31.110,25	$ 1.088.858,61	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107,30		-	107,30		$ 69.099,55	$ 7.414.382,03	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361,42			361,42		$ 69.099,55	$ 24.973.960,41	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 38			
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00			120,00		$ 108.358,36	$ 13.003.003,55	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37,24			31,65		$ 91.988,38	$ 2.911.432,34	$ 514.215,00	84,99%	84,99%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22,04			14,33	3,83	$ 176.060,25	$ 2.522.943,36	$ 1.357.425,00	65,02%	65,02%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9,00	(2,00)	7,00	7,00		$ 875.947,70	$ 6.131.633,87	$ 1.751.895,00	77,78%	77,78%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 38			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120,00			114,84		$ 503.048,36	$ 57.770.073,74	$ 2.595.730,00	95,70%	95,70%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9,00			8,00	3,50	$ 320.598,77	$ 2.564.790,20	$ 320.599,00	88,89%	88,89%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94,84			53,39		$ 34.724,48	$ 1.853.940,25	$ 1.439.330,00	56,29%	56,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M	M	54,00			45,50	3,50	$ 89.213,28	$ 4.059.204,46	$ 758.313,00	84,26%	84,26%

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 38			
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25,00			25,00		$ 11.730,42	$ 293.260,61	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45,00			35,79	18,59	$ 91.590,40	$ 3.278.020,38	$ 843.548,00	79,53%	79,53%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68,00			63,00		$ 141.729,70	$ 8.928.971,13	$ 708.649,00	92,65%	92,65%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 139.083.769,30**			

Ilustración 28 Actividades Ciudad de Villavicencio
Fuente: *Propia*

3.2.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo encontramos que al contratista CONSORCIO PAIS, le fueron asignadas las siguientes emergencias, adicionales a las relacionadas en la siguiente tabla y que ya fueron finalizadas:

CPF 546 IED Santa Librada, Sede A
CPF 567 IED San José de Usme -Sede A, San José Monteblanco (Don Bosco II)
CPF 575 IED Eduardo Umaña Mendoza, Sede A Villa Alemania

IED EMERGENCIAS	Presupuesto Actualizado	Porcentaje Ejecutado (%)
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 27.970.936,00	100%
ARBORIZADORA BAJA (IED)	$ 54.989.304,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 62.743.230,00	100%

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 2.036.406,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 7.916.830,00	100%
GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	$ 12.144.175,00	100%
CUNDINAMARCA (IED)	$ 18.773.665,00	100%
LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	$ 50.000.000,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 13.517.897,01	100%

Ilustración 29 - *Presupuestos actualizados emergencias*
Fuente: *Propia*

3.3 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

3.3.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

3.3.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección

El personal clave para el Grupo 2, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.

- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-043-L6- REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6**, enviado a la Secretaría de Educación Distrital SED se dio aprobación a los profesionales del contratista, sin embargo posteriormente, mediante oficio **SERINCO-SDE-2025-330-L6 CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6**, se realizó el cambio de los profesionales correspondientes a residente e inspector; por lo tanto, esta interventoría dio aprobación a las siguientes hojas de vida:

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR	WILSON LEONARDO PARRA ROBLES	100%
RESIDENTE	FABIO ALBEIRO AGREDO FAJARDO	100%
ESTRUCTURAL	JIMMY VERGARA SILVA	10%
AMBIENTAL	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	20%
PROF. SST	YONH JAIRO GUARIN PATERNINA	10%
ESP. ELÉCTRICO	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	10%
ESP. HIDROSANITARIO	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	10%
PROF. DE COSTOS	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	10%
TÉCNICO SST 1	CINDY LORENA RIVERA	100%
TÉCNICO SST 2	EDINSON FABER FORERO BARRANTE	100%
INSPECTOR DE OBRA 1	ALVARO ZAMIR BENITEZ MENDOZA	100%
INSPECTOR DE OBRA 2	IVAN BAUTISTA MACIAS	100%

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.4.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO PAIS es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINETO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENITA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.215.148.733)

Y se cuenta con una adición por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422) INC.IVA

3.4.2 PRESUPUESTO POR SEDES

Los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L5-2025-074

3.4.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para este mismo periodo se cuenta con un presupuesto aproximado, el cual se va a incluir en el Modificatorio No. 3 por un valor de $ 160.000.000). De las emergencias relacionadas anteriormente que corresponden a la vigencia actual, Santa Librada, Sede A, San José de Usme, Sede A y Eduardo Umaña Mendoza, Sede A, Consorcio País no ha remitido la documentación sobre los alcances, presupuestos y programaciones de estas sedes.

IED EMERGENCIAS	Presupuesto Actualizado	Porcentaje Ejecutado (%)
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 27.970.936,00	100%
ARBORIZADORA BAJA (IED)	$ 54.989.304,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 62.743.230,00	100%
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	$ 2.036.406,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 7.916.830,00	100%
GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	$ 12.144.175,00	100%
CUNDINAMARCA (IED)	$ 18.773.665,00	100%
LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	$ 50.000.000,00	100%
CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	$ 13.517.897,01	100%

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto total asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($416.900.290,00),*** destinado exclusivamente a

la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.6 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780.

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1642	20/02/2025	4924	03/09/2025	$2.332.049.023
3697	05/12/2025	7577	22/12/25	$785.001.422
TOTAL				$3.117.050.445

Tabla 6 - *Certificado disponibilidad presupuestal*
Fuente: *Propia*

3.4.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.1.3	Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.
1.1.6	Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)
1.2.4	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.6	Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.8	Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.9	Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	(incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.10	Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.13	Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.17	Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados)
1.2.18	Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.20	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.21	Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.24	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados)
1.2.36	Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.40	Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)
1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)
1.4.2	Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad. incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados
1.4.4	Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.4.7	Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados)
2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.2	Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.6	Relleno con material seleccionado
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)
2.2.1	Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero)
2.2.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)
2.2.7	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo.
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación.
2.3.5	Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).
2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m
2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)
3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo
3.1.7	Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones.
4.2.3	Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios
4.2.4	Suministro e instalación accesorios PVC-S 4"
4.2.11	Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
4.5.1	Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2"
4.5.2	Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2"
4.5.5	Suministro e instalación punto sanitario 4"
4.5.6	Suministro e instalación punto sanitario 2"
4.6.1	Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2"
4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada
4.7.3	Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados)
4.8.1	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
4.8.2	Suministro e instalación geotextil nt 1600
4..9.12	Sondeo y revisión de desagües
5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.3	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.10	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
5.1.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka
5.1.25	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.38	Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.46	Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050.
7.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04
7.2.1	Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado
7.2.10	Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm
7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba
7.2.17	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores
7.2.37	Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45
9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.2.2	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco)
9.3.7	Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte)
9.3.10	Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
10.1.5	Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
10.1.7	Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push)
10.1.11	Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de 3 c
10.1.12	Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón)
10.1.15	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica
10.1.16	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3"
11.1.4	Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1"
11.1.10	Desinstalación de parque infantil en zona verde.
11.1.10	Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde.
12.1.2	Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)
12.1.7	Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (incluye andamio certificado)
12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm)
12.2.3	Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)
12.2.5	Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados)
12.3.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras
12.3.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica
14.1.2	Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm
16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.3	Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados)
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
16.1.13	Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente)
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación
16.1.18	Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente instalados).
16.1.19	Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sándwich
16.1.20	Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica
16.1.21	Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte.
16.1.25	Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina)
18.1.1	Aseo general final y limpieza
18.1.4	Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón corrugado, plástico o similar (incluye retiro y disposición).

Tabla 7 - Listado APU´S
Fuente: *Elaboración Propia*

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO PAIS presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L6-2025-040.

3.4.5 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista Consorcio País a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.2 Informes Semanales.

B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

ACTA	%	VALOR	ESTADO
1	11,60%	$ 361.723.907,00	PAGADO
2	13,97%	$ 435.348.486,00	PAGADO
3	25,07%	$ 781.384.254,00	PAGADO
4	15,80 %	$ 492.623.060,00	PAGADO
5	6,72%	$ 209.434.074,00	PAGADO

6	4.85%	$ 151.233.507,00	EN TRAMITE
TOTAL	**78,01%**	**$ 2.431.747.288,00**	

Tabla 8 - *Pagos Realizados*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 3. Acta Parcial de Obra

Para el periodo del presente informe el contratista Consorcio País presentó ante la interventoría el acta parcial No. 6, la cual ya fue enviada a la SED para el trámite de pago respectivo.

3.5 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias aisladas en el presente periodo las cuales no han impactado la normal ejecución de las actividades. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

3.6 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO PAÍS**, en el informe técnico, presenta las fichas técnicas de los materiales utilizados en las actividades de obra, los ensayos de laboratorio realizados se evidencian en los informes mensuales anteriores.

3.7 OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El	Si cumple, el contratista consorcio País subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.		
2	Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	
3	Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Cumple aplica para el presente periodo	Al momento del presente periodo se ha realizado el pago del acta parcial No.1, y el pago del acta parcial No.2, el pago del acta parcial No.3, pago de acta No. 4 y pago de acta No.5
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.		
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	El contratista a la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones	Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo al contrato y acta de inicio.	
8	Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	No aplica para el presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	a la fecha del presente informe cumple con los requerimientos	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento	Cumple Parcialmente	De acuerdo a los avances presentados debe presentar un plan de contingencia para cumplir con la obligación
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Cumple	
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple, a la fecha no se han presentado reportes negativos de acuerdo a la obligación.	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_	A la fecha el contratista cumple con lo estipulado en la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales		
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.	A la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.	Cumple a la fecha con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple a la fecha con la obligación	
17	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás	Cumple	Se presentan en el informe mensual del contratista

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.		
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	Cumple para el presente periodo del informe	
19	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	No aplica para el presente periodo.	
20	El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
22	El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Cumple	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Cumple	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Cumple a la fecha con la obligación	
25	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	Cumple a la fecha con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Cumple	
27	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
28	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
29	Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Cumple	
30	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Cumple a la fecha la obligación	
31	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se	No aplica.	A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan.

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
32	Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Cumple	
33	Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No aplica	No se ha presentado aun la información que la obligación requiere.
34	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No aplica para el presente periodo.	
35	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo.	
36	Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
37	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.	No aplica para el presente periodo.	
38	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Cumple	
39	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra.	
40	Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Cumple, de haber afectaciones el contratista deberá reparar o restituir lo que llegase a dañar.	
41	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015.	No aplica para el presente periodo.	
42	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.		
43	Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas.	Cumple, se presenta cada mes y cada vez que un nuevo personal ingresa a los frentes de obra.	
44	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión.	Cumple para el periodo del presente informe	
45	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Cumple para el periodo del presente informe	
46	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de	No aplica para el presente periodo.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.		
47	Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	Cumple	
48	El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.	A la fecha el contratista no ha requerido de dar respuesta en los días que estipula la obligación	
49	Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría.	Se cuenta con el avance semanal que realiza la interventoría	
50	El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025.	Cumple	

Tabla 9 - *Obligaciones Generales Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

3.8 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).	Cumple, el contratista realizo la entrega de los documentos estipulados en la obligación	
2	Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación y subió las pólizas a la plataforma SECOP	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	solicitadas en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior.	II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
3	Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio.	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación a la entidad y subió el acta de inicio a la plataforma SECOP II, el día 09/10/2025	
4	Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser	La interventoría remitió mediante oficio SERINCO-SDE-L6-2025-012 en el cual se le requería al contratista la documentación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido.	mencionada en la obligación mencionada.	
5	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos.	Cumple	
6	Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave.	Cumple	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.	Cumple con la obligación	
8	Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital".	Cumple con la obligación	
10	Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales).	Cumple con la obligación	
11	Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin.		
12	Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras.		
13	Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del	Cumple	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.		
14	Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas.		
15	Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	Cumple con la obligación	
16	Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación.	Cumple con la obligación	
17	Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso.		
18	Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos.		
19	Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.	No aplica para el presente periodo	
20	Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	ejecución de actividades." del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.		
21	Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes.	No aplica para el presente periodo	
22	Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato	No aplica para el presente periodo	
23	Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
24	Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos.	No aplica para el presente periodo	
25	Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio.	Cumple con la obligación	
26	Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente	Cumple con la obligación	
27	Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED.	No aplica para el presente periodo	
28	Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.		
29	Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.	Cumple con la obligación	

Tabla 10 - *Obligaciones Especificas Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
VALOR ADICIÓN	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA
VALOR FINAL No. 1	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($924.609.851,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PRORROGA	UN MES (01) Y QUINCE DIAS (15)
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
ADICIÓN No. 2	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 162.875.214,00) INC. IVA
VALOR FINAL No. 2	UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1,087,485,065.00)
PRORROGA No. 2	107 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 11 - *Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia.*

4.1.1. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ACTA DE INICIO suscrita el 6 de octubre de 2025.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACION	POR SUSCRIPCION DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICION	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2		
TIPO DE MODIFICACION	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICION	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00
MODIFICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	31/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	20/12/2026	$ 184.921.970,20
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	20/06/2029	$ 92.460.985,10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	20/06/2031	$ 184.921.970,20
MODIFICACION No.2 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.2 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	11/06/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	05/04/2027	$ 217.497.013,00

PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	05/10/2029	$ 108.748.506,50
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	05/10/2031	$ 217.497.013,00

Tabla 12 - *Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia*

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.2.1 ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados por parte del contratista consorcio País, los cuales se encuentran en revisión.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra y de las emergencias asignadas.
- Elaboración de informes semanales de interventoría No.35, No.36, No.37, No.38.
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.
- Elaboración de comunicaciones referentes a estados de cada frente de obra, solicitudes de planes de contingencia teniendo en cuenta los atrasos en cada frente
- Elaboración de comités de obra.
- Elaboración de informes Mensuales de acuerdo con el periodo de corte.

Anexo 4. Actas de comité

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:

- Se valida y se da aprobación del Plan de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra Consorcio País.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio País.

- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.
- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio País.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio País.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas.
- Organización documental.
- Se realiza seguimiento al plan ambiental con enfoque PIGA.
- Se identifica la adecuación de puntos de acopio para la acumulación de los materiales RCD generados a partir de las demoliciones realizadas.
- Se realiza retiro de material RCD.
- Se identifica ingreso de material pétreo a la obra.
- No se realiza aprovechamiento ni circularidad de RCD por el contratista de obra en el presente periodo.
- El contratista da cumplimiento al cronograma de capacitaciones ambientales y el plan de trabajo de este.

4.2.2 TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Visitas técnicas de verificación de cantidades y avances en cada una de las instituciones educativas, en cuanto a mantenimientos y emergencias.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.
- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos, de igual forma revisión y validación de ítems No previstos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.

- Revisión de acta de corte de obra y de igual forma revisión de informes mensuales de cada uno de los componentes
- Revisión de presupuestos y balances finales para cada una de las sedes
- Revisión de los ítems no previstos.

4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.
- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.
- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales, y de igual forma se realizó la revisión de los ítems no previstos para ser aprobados por parte de la supervisión
- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, de igual forma cada uno de los balances de acuerdo con las actividades que se encuentran en ejecución con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.
- Revisión semana por semana para verificación de actividades realizadas y de avances de obra.
- Revisión de acta parcial de obra, para el respectivo trámite ante la entidad contratante.

4.2.4 LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se realiza la revisión de los informes mensuales de acuerdo al periodo.
- Se realiza la elaboración de los informes mensuales de acuerdo a cada uno de los periodos incluyendo el de mención del 06 de mayo de 2026 al 05 de junio de 2026. En el cual se consolida la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental.

4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Un (1) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA*** se

radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S-2025-320192_RTA da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido".* Posteriormente, mediante el oficio SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA, la interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Héctor Villazón Gutiérrez	100%
Profesional de apoyo	Viviana Miranda Cañón	100%
Residentes de Interventoría (3)	Ana Pardo Duarte	100%
	César Carvajal González	
	Jhon Quintero Acevedo	
Especialista Ambiental	Luis González Camargo	15%
Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo (1)	Fabian Adolfo Paredes Serrano	100%
Inspectores de Interventoría	Camilo Andrés Cardenas	100%

Tabla 13 - *Personal de Interventoría*
Fuente: *Propia*

Anexo 5. Planillas de pago
Anexo 6. Certificado pago Parafiscales

4.3.2 EQUIPO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.4 INFORMACION FINANCIERA

4.4.1 PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).

Y se cuenta con una adición por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1984	05/03/2025	5012	05/09/2025	796.184.131
3698	5/12/2025	7587	23/12/2025	128.425.720
514	12/03/2026			162.875.214
TOTAL				1.087.485.065

Tabla 14 - *Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*
Fuente: *Propia.*

4.4.2 ESTADO FINANCIERO

A. PAGOS EFECTUADOS

ACTA	%	VALOR	VALOR VARIABLE – LOTE6	PAGO
Costo fijo No. 1	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236

Costo fijo No. 2	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 3	4,18%	$45.496.236,06	N/A	$45.496.236,06
Costo Variable No. 3	8,84%	$96.091.514,94	$18.180.024,14	$96.091.514,94
Costo fijo No. 4	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo Variable No. 4	3,10%	$33.730.926	$8.792.235,88	$33.730.926
Costo Fijo No.5	4,18%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo Variable No.5	2,10%	$22.792.645	N/A	$22.792.645
Costo Fijo No.6	8,37%	$90.992.472	N/A	$90.992.472
Costo Variable No.6	16,05%	$174.562.766	$112.122.614	$174.562.766
Costo Fijo No.7	3,15%	$34.246.858,95	N/A	$34.246.858,95
Costo Variable No.7	12,93%	$140.657.293,05	N/A	$140.657.293,05
Costo Fijo No.8	6,08%	$22.210.575	N/A	$22.210.575
Costo Variable No.8	18,16%	$99.580.187	$10.531.876,13	$99.580.187
TOTAL		**$942.346.418**	**$139.094.874,02**	**$942.346.418**

Tabla 15. *Pagos realizados a la interventoría*
Fuente: *Elaboración Propia*

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO PAIS, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.
- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.

- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo a las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.


A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

Tabla 14*. Plan calidad*
Fuente: *Propia*

TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 6

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.



El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Alcance
2. Descripción del proyecto
3. Necesidad
4. Conveniencia
5. Impacto del proyecto
6. Directrices organizacionales
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos
8. Liderazgo y compromiso
9. Entradas del Plan de Calidad
10. Roles y autoridades
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
12. Planificación de cambios
13. Apoyo
14. Operación
15. Auditorias
16. Ponderación
17. Registros

El contratista entrega un Plan integral con el desarrollo de la mayoría de los contenidos requeridos para el aseguramiento de la calidad. Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación. Adicionalmente se solicita la revisión del alcance de los controles de los

ensayos e inspecciones de las actividades según la normativa. El contratista hace la subsanación y complementación y se aprueba.

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para este periodo el contratista realizó actividades de demolición, en los siguientes colegios, así mismo, se realizaron actividades de orden y aseo.

- Guillermo Cano Isaza, demolición de baños y salones.

Sin embargo, el material producto de las actividades propias del contrato fue acopiado temporalmente en sitio y retirado en menos de 24 horas.

El contratista remitió certificados pendientes del periodo correspondiente a junio de 2026, CEMEX por 21,68 Toneladas y GRECO por 8,96 Toneladas, así mismo, cabe mencionar que el contratista remite los anexos del Decreto 507 de 2023 debidamente diligenciados, ya que para el periodo de julio relaciona el retiro y disposición final de 14m3 – 62,85 Toneladas (Máquinas amarillas y SECAM).

Es importante señalar que, el contratista se encuentra al día con los reportes mensuales de RCD, en la plataforma web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

MANEJO DE ESCOMBRO.

Este proyecto contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de aproximadamente 1521 Toneladas, según los estudios técnicos preliminares realizados.

Los escombros generados durante este período fueron retirados en un plazo máximo de 24 horas tras su producción, dado que el proyecto se desarrolla en una zona de alto tránsito peatonal.

Para el mes de julio, el Consorcio País realizó la disposición final de RCD correspondientes en las escombreras Máquinas Amarillas y SECAM, en cada una 53,87 Ton y 8,98 Ton, respectivamente.

El contratista CONSORCIO PAÍS, no dispuso residuos de construcción en zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto.





TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

Durante este periodo, se llevó a cabo la disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, asegurando su traslado hasta los sitios de disposición (CEMEX - GRECO). Esta labor se ejecutó utilizando volqueta sencilla, las cuales se encontraban debidamente carpadas, sin exceder su capacidad.

- Máquinas amarillas – 7m3 – 53,87Ton.
- SECAM – 7m3 – 8,98Ton.

El transporte de los escombros se efectuó en horarios planificados para evitar interferencias con las horas pico del tráfico vehicular y respetando los horarios de descanso de los residentes del sector. Además, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por las autoridades de tránsito competentes.

- **PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.**

FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio País, manifiesta que hubo ingreso de 22m3 – 33Ton de subbase granular Tipo PEA-Reciclada del proveedor SECAM, se presenta su respectivo certificado.

- **PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES**

El contratista Consorcio País, cuenta con varios sitios de almacenamiento temporal para el proyecto, dado que el contrato se desarrolla en varias instituciones educativas, los cuales de igual forma garantizan orden y aseo, y de igual forma están establecidos en espacios que no interrumpa el tráfico peatonal.

MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES.

CONSORCIO PAÍS, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligrosos entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas. Los residuos ordinarios se separaron según el PGIRS y se entregaron a cada una de las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá.



DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio País, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que las actividades se realizan al interior de las instituciones educativas, no se han realizado actividades que requieran de retroexcavadoras, ni vibrocompactadores, por tanto, no se tienen establecidos Planes Estratégicos Viales.

Sin embargo, para el retiro de residuos de construcción y demolición, si se hace uso de volquetas sencillas, las cuales realizan el transporte de dichos residuos a los sitios autorizados, los cuales, tal y como se mencionó con anterioridad al retirarse de los sitios de obra, van debidamente carpados y sin exceso de carga, las cuales dan cumplimiento a las normativas de tránsito.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para este periodo se trabajó con la siguiente maquinaria amarilla y volquetas:

- Volquetas sencillas.

PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, el contratista realizó capacitaciones en los siguientes temas ambientales:

- MANEJO de emisiones atmosféricas, mantenimiento de cerramientos.
- MANEJO de sustancias químicas y residuos peligrosos.

MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el periodo evaluado, se identificaron actividades de manejo y disposición de los residuos generados en obra, así como medidas de orden, aseo y limpieza en cada uno de los frentes de trabajo.

PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES.

En el presente periodo reportado, se realizaron excavaciones en el Colegio Ciudad de Villavicencio.

Tal como se ha mencionado en el desarrollo del informe, dicho material de excavación, se ha dispuesto debidamente en los sitios autorizados.

RELLENOS.

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades de relleno, de acuerdo con lo reportado por el contratista.

PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

De manera semanal, el contratista ejecutó labores de limpieza, organización y mantenimiento en las vías de acceso de entrada y salida, garantizando que permanecieran libres de escombros y materiales en las zonas donde se realizaron retiros de RCD.

PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

PRELIMINARES.

No aplico en el periodo.

DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes

EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES

No aplico en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien avisará a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.
- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.
2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

    - Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
    - Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
    - Control de actividades de alto riesgo mediante:
    - Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
    - Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
    - Validación de documentación del personal idóneo.
    - Permisos de trabajo seguro en alturas.
    - Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
    - Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

6	546	USME	SANTA LIBRADA	A – SANTA LIBRADA	CL 75 A SUR No 1 B 45 ESTE

COLEGIO SANTA LIBRADA
ACTIVIDAD DE ORDEN Y ASEO









Observación del hallazgo:
Durante la revisión de interventoría se evidencia que el personal estaba recogiendo materiales y realizando orden y aseo, ya que habían finalizado la obra.

6	1959	CUIDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	KR 16ª # 62-35 SUR

COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA
ACTIVIDAD EMBOQUILLADO Y REVESTIMIENTO DE BALDOSAS.



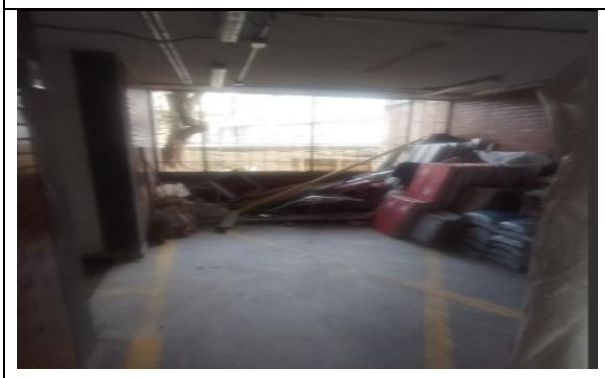















Observación del hallazgo:
Durante la revisión de interventoría se observan cables eléctricos en mal estado y adicional a esto se evidencia que estaban realizando actividades con una pulidora sin guarda, por tal razón se suspendió actividades temporalmente hasta que esta se instaló la guarda de la pulidora y de esta manera se redujo el riesgo de cortadura.

Anexo 7. Registro Capacitaciones

REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el presente periodo el Contratista gestiono varios procesos de gestión documental para la aprobación del personal en las obras, y así poder permitir el acceso e inicio de los trabajadores en obra. Los cuales quedan registrados los siguientes registros de aprobaci6n de personal en obra.

11/06/2026	CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela)	Fortaleza	5	3:30 p. m.	4:00 p. m.	Recolección de escombros	Ats,	Se evidencia reparacion del cerramiento.	sacando los escombros del punto de acopio para que no se acumulen	Adriana Forero	
12/06/2026	Jose jaime Rojas	Fortaleza	5	1:00 p. m.	2:00 p. m.	Actividad orden y aseo	Ats	Se evidencia desarrollo de orden y aseo para realizar entrega de la	N/A	Adriana Forero	
16/06/2026	Colegio ciudad de Villavicencio	Consorcio pais	6	11:00am	12:00 p. m.	Actividad retiro de baldozas	Ats	Se suspenden actividades por que se evidencio personal	Se recomienda realizar jornada de orden y aseo.	Faber Forero	
17/06/2026	Colegio Guillermo icano izasa	Consorcio pais	6	1:00 p. m.	2:00 p. m.	Actividad de restauración	Ats	Se evidencia área de trabajo en desorden y cerramiento	Se recomienda realizar jornada de orden y aseo.	Faber Forero	
18/06/2026	Brasilia	Fortaleza	5	2:30 p. m.	3:00 p. m.	No se evidencia actividades	N/A	Se evidencia punto de acopio en mal en desorden.	Se recomienda realizar actividades de orden y aseo al finalizar actividades	Adriana Forero	
18/06/2026	MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA	Fortaleza	5	1:00 p. m.	2:00 p. m.	Entrega de actividades	Ats	Se evidencia uso adecuado de Epp	Se recomienda realizar orden y aseo al finalizar actividades y se debe	Adriana Forero	

18/06/2026	CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela)	Fortaleza	5	10:00am	11:00 p. m.	Revestimiento de muros	Ats	revisión de interventoría se evidencia cerramiento	personal de la obra que desalojen el escombro acumulado y que realicen	Adriana Forero	
22/06/2026	MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA	Fortaleza	5	1:00pm	2:00 p. m.	Movimiento de tierra y nivelación de terreno	Ats permiso de alturas y en caliente.	Se evidencia al pesonal sin el uso adecuado de epp.	Se debe portar adecuadamente los guantes y gafas de seguridad al momento de realizar actividades	Adriana Forero	
25/06/2026	Colegio guillermo ícano izasa 25	Consorcio pais	6	1:00pm	2:00 p. m.	Preparacion y revestimiento de murcs	Ats	Se evidencia implementación de la señalización del	Se recomienda al personal de la obra que realicen jornada de orden y aseo del punto.	Adriana Forero	
26/06/2026	Brasilia	Fortaleza	5	1:00pm	2:00 p. m.	Preparacion y revestimiento de murcs	Ats	Se evidencia desorden del punto de acopio	Se recomienda al personal de la obra que desalojen el escombro acumulado y que realicen jornada	Adriana Forero	
26/06/2026	Colegio santa librada	Consorcio pais	6	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Izado de materiales	Ats,permiso de trabajo en alturas	Se evidencia que no cuentan con algunos epp.	Se debe implementar el arnes para el ayudante ya que el riesgo de alturas aumenta por la zona	Faber Forero	
26/06/2026	MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA	Fortaleza	5	3:00 p. m.	4:00 p. m.	Preparación de superficies	Ats,permiso de trabajo en alturas	Se evidencia andamios con doble bandeja en	Se recomienda el uso de tapabocas y gafas de seguridad.	Adriana Forero	
26/06/2026	MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA	Fortaleza	5	3:00 p. m.	4:00 p. m.	Preparación de superficies	Ats,permiso de trabajo en alturas	Se evidencia andamios con doble bandeja en forma de	Se recomienda el uso de tapabocas y gafas de seguridad.	Adriana Forero	
26/06/2026	MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela)	Fortaleza	5	10:00:00 am.	11:00 a. m.	Actividades instalación de baldosas.	Ats	Se evidencia reparacion del cerramiento.	Se recomienda no dejar escombros por los corredores o pasillos y colocar	Adriana Forero	
30/05/2026	Colegio ciudad de Villavicencio	Consorcio pais	6	10:00am	11:00 p. m.	Excavación	Ats	Se evidencia pulidora sin guarda de seguridad	Se recomienda instalar guarda de la pulidora para continuar la actividad	Faber Forero	

FREIDER CHAMORRO MANGA	1.143.442.963	CONSORCIO PAIS
DIEGO A TRASLAVIÑA	91.363.817	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONSULTORIAS JRS SAS
LUIS CARLOS CANO VARELA	9.297.920	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONSULTORIAS JRS SAS

8. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la	El Consorcio Serinco Educativo remitió las pólizas a la entidad y subió las mismas a la plataforma SECOP II, el día 27/10/2025	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.		
2	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con la obligación	
3	Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Para el presente periodo se cuenta con el pago de cuatro actas dentro de las cuales se encuentra el pago fijo y el pago variables según el avance de obra. y se encuentra pendiente el pago de una quinta acta.	
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.		
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	Se cumple con la obligación de acuerdo con el presente periodo	
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto.	Se cumple con la obligación	
8	Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	Se cumple con la obligación de acuerdo al presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.		
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	Se cumple con la obligación	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Se cumple con la obligación	
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales		
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	Se cumple con la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3	Se cumple con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
17	Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.		
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión.	Se cumple con la obligación	
19	Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Se cumple con la obligación	
20	La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Se cumple con la obligación	
22	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Se cumple con la obligación	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Se cumple con la obligación	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se cumple con la obligación	
25	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se cumple con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se cumple con la obligación	
27	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	
28	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad.	Se cumple con la obligación	
29	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6	Se cumple con la obligación	
30	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		
31	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Se cumple con la obligación	
32	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas.	No aplica para el presente periodo	
33	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Se cumple con la obligación	
34	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista.	No aplica para el presente periodo	
35	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.		
36	Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo	
37	Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra.	Se cumple con la obligación	
38	La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 16 - *Obligaciones Generales - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.	No aplica para el presente periodo	
2	Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF		
3	Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
4	Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.	Se cumple con la obligación	
5	Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.	Se cumple con la obligación	
6	Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.	Se cumple con la obligación	
7	Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.		
8	Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
9	Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.	Se cumple con la obligación	
10	Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.		
11	Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.	Se cumple con la obligación	
12	Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.	Se cumple con la obligación	
13	Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.	Se cumple con la obligación	
14	Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.	Se cumple con la obligación	
15	El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.	Se cumple con la obligación	
16	Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.	Se cumple con la obligación	
17	En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.		
18	Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.	No aplica para el presente periodo	
19	Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.	Se cumple con la obligación	
20	Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.	Se cumple con la obligación	
21	Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.	Se cumple con la obligación	
22	Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.		
23	Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.	Se cumple con la obligación	
24	Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.	Se cumple con la obligación	
25	Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.	Se cumple parcialmente, debido a que se encuentra en verificación el acta parcial de obra.	
26	Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
27	Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes mes a mes serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.	Se cumple con la obligación	
28	Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.	No aplica para el presente periodo	
29	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
30	Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
31	Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.	No aplica para el presente periodo	
32	Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.	No aplica para el presente periodo	
33	Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	Se cumple con la obligación	
34	Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.	Se cumple con la obligación	
35	Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.	Se cumple con la obligación	
36	Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.		
37	Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.	Se cumple con la obligación	
38	Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.	Se cumple con la obligación	
39	Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.	Se cumple con la obligación	
40	En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.		
41	Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.	No aplica para el presente periodo	
42	Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.	No aplica para el presente periodo	
43	Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.	No aplica para el presente periodo	
44	En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.	No aplica para el presente periodo	
45	En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.		
46	El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 17 - *Obligaciones Especificas - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico se realizó durante las visitas de seguimiento en la etapa de ejecución de las obras en las diferentes sedes educativas, con el fin de documentar el avance y el estado de las intervenciones. Este material permite respaldar las observaciones técnicas, evidenciar las actividades ejecutadas, identificar situaciones relevantes en campo y servir como soporte visual.

Anexo 8. Registro fotográfico

Se adjunta video mediante el cual se evidencian los avances de obra correspondientes a cada sede intervenida, el cual podrá ser consultado a través del siguiente enlace:

- Link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1O8ymYlZ8DJn1qP-MnNG-2G0ZUjQbjl7t?usp=drive_link

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el registro audiovisual del progreso de ejecución.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se solicitó y recalcó al contratista que no se admite el ingreso a personal que no cuente con su Seguridad Social al día así mismo su ARP y respectivas dotaciones en especial en temáticas de trabajó en alturas. No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cumpla con este ítem y se recalcó en cuanto al tema de trabajos en alturas que se deben implementar todas las medidas y protocolos de seguridad al respecto.

2. Se sugiere al contratista dar un buen manejo y disposición de los materiales ya que no se recibirán trabajos que no estén en óptimas condiciones en cuanto a su ejecución, terminado y calidad de los materiales y ante todo garantizando el cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas y metodologías de ejecución de cada tarea.

3. Desfase General en la Programación: Al cierre del periodo, el proyecto presenta un avance financiero ejecutado del 88.80%, frente a un programado del 90.06%, lo que se traduce en un atraso global del 1.26%, equivalente a $33.781.283,76. Este desfase, aunque moderado, evidencia la necesidad de un seguimiento más riguroso para cumplir con el plazo contractual, especialmente considerando las prórrogas ya otorgadas.

4. Finalización Exitosa de la Mayoría de los Frentes de Obra: Se destaca la culminación de las actividades en nueve (9) de los doce (12) frentes de obra. Las siguientes instituciones educativas han alcanzado o superado el 100% de su ejecución programada y se encuentran en proceso de entrega o ya han sido entregadas, lo que representa un logro significativo en la ejecución del contrato:

   - Orlando Fals Borda
   - Sierra Morena Sede C
   - Unión Europea Sede B
   - Arborizadora Baja
   - Fabio Lozano Simonelli
   - Estrella del Sur Sede B
   - Calasanz (Buena Vista)
   - Estrella del Sur Sede A
   - Tenerife Granda Sur Sede A

5. ***Frentes de Obra con Atrasos Críticos***: Dos frentes de obra presentan desviaciones significativas que concentran el retraso del proyecto y requieren atención inmediata:

   Colegio Santa Librada (CPF 546): Con un avance del 95.35% y un ***atraso del -4.65%,*** las actividades pendientes se limitan a la terminación de la pintura en el corredor, lo que permitirá su pronta entrega.

   Colegio Guillermo Cano Isaza (CPF 1959): Este es el frente más crítico, con un avance del 77.79% frente a un programado del 74.25%, presentando un ***atraso del -10.26%.*** Aunque se han iniciado actividades en los bloques B y C, el avance es insuficiente y se hace imprescindible la aplicación de un plan de contingencia efectivo para acelerar los trabajos y evitar mayores contratiempos.

6. Se iniciaron las actividades en el Colegio Ciudad de Villavicencio, Sede B (CPF 545), el cual fue incluido mediante la última prórroga. Durante el periodo se ejecutaron trabajos de demolición, excavación, instalación de cerramiento y cajas de inspección, alcanzando un avance del 39.74% frente a un 50.00% programado. Este frente presenta un atraso inicial del -10.26% que debe ser controlado para no comprometer su entrega dentro del plazo establecido.

7. Se evidencia una ejecución exitosa en la mayoría de las emergencias asignadas, con varias de ellas alcanzando el 100% de ejecución. Sin embargo, se mantienen recursos disponibles para la atención de nuevas necesidades que puedan surgir, lo que demuestra la capacidad del contratista para gestionar este tipo de imprevistos.

8. Control Financiero: El contrato de obra ha ejecutado a la fecha un valor de $2.379.544.897,74, lo que representa un 88.80% del valor total final del contrato ($2.679.619.155,00). Se han tramitado seis (6) actas parciales de pago, de las cuales cinco (5) han sido pagadas y una se encuentra en trámite. El flujo de caja semanal muestra una ejecución continua, aunque inferior a lo programado en las últimas semanas.

9. garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos, se recomienda:

    a. Acelerar los trabajos en el Colegio Guillermo Cano Isaza y el Colegio Ciudad de Villavicencio, implementando los planes de contingencia solicitados para subsanar los atrasos.
    b. Finalizar la entrega formal de los frentes de obra completados, gestionando las actas de recibo con la comunidad educativa para dar por concluido el proceso.
    c. Actualizar y presentar de manera inmediata los balances y reprogramaciones de los frentes con atraso, asegurando que las cantidades de obra y recursos estén alineadas con la realidad de la ejecución.
    d. Mantener una comunicación fluida y oportuna con la interventoría para la subsanación de observaciones a los documentos técnicos (APUs, manuales de mantenimiento), lo cual agilizará los trámites administrativos y financieros.

10. En términos generales, tanto el contratista de obra como la interventoría cumplen con la mayoría de las obligaciones generales y específicas derivadas del contrato. Se destaca que las garantías del contrato se encuentran vigentes y actualizadas conforme a las modificaciones y prórrogas realizadas. El personal clave mínimo requerido ha sido aprobado y se encuentra vinculado a la ejecución del proyecto.

11. El contratista de obra ha dispuesto del personal mínimo requerido, previamente aprobado por la interventoría y la SED.

12. Se sugiere actualizar los balances, reprogramaciones y presupuestos de los frentes con atraso y de las nuevas emergencias.

13. Se reitera la necesidad de subsanar oportunamente las observaciones a los Manuales de Mantenimiento y a los APU´s de Ítems No Previstos.

14. Hemos reiterado al contratista de obra la necesidad de actualizar el balance la reprogramación de acuerdo con las cantidades reales a ejecutar para que no se sigan presentando atrasos en el comparativo programado vs ejecutado.

Anexo 9. Relación de Correspondencia

ANEXO No. 01. BITACORA DE OBRA

2 oficiales, 2 ayudantes
actividades: asao baños nivel 2, llegada registros de 2 1/2" paso instalacion baños nivel 3 retiro concreto para tramo placa baño mujeres

Jhon Castrillon
Interventoria

R. Obra

06/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes.
actividades: Vaciado tramo placa baño mujeres nivel 1 concheo, alzado muros pocata y division baño hombres nivel 2,

Jhon Castrillon
Interventoria

R. Obra

07/07/2026
personal administrativo
1 Residente 1 inspector 1 SST
personal operativo
2 oficiales 3 ayudantes.
actividades: alistado piso baño mujeres, pañete muros baños nivel 2

Jhon C
Interventoria

Obra

09/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
Personal Operativo
2 Oficiales 3 ayudantes
actividades: pañete muros baños mujeres y hombres nivel 2, demolicion enchape y pañete baños profesores, regreta y colocacion tuberia sanitaria y pañete baños concheo

Jhon C
Interventoria

Obra

14/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo.
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: enchape paredes baños, nivel 1 y 2
pañetes, maestros por punto baño por persona nivel
2. instalado el 12 de julio ciclo pasado

Jhon C
inspector

f
R. obra

15/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pared baño nivel
2 y baño canchas.

Jhon C
inspector

f
R obra

16/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pared baño nivel
2 y baños canchas

Jhon C
inspector

f
R obra.

17/07/2026
personal administrativo
1 Residente. 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales. 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pared y piso
nivel 2 y baños canchas

Jhon C
inspector

f R obra

18/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
personal operativo
2 Oficiales, 1 ayudante
actividades: instalacion enchape pared y baños nivel 2 y concha, instalacion enchape piso

Jhon C
INSPECTOR

R.obra

21/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 Oficiales, 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pared y piso baño conchas, emboquillado enchape piso baño mujeres instalacion enchape pared y piso baños nivel 2.

Jhon C
residente

Robra

22/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 Oficiales, 3 ayudantes
actividades: se inicio instalacion electrica baño mujeres conchas, se esta instalando el graseo de escoba enchapando paredes baño conchas, instalacion enchape piso y pared baños nivel 2,

Jhon C
INSPECTOR

R.obra

23/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo

2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: personal electrico instalando tuberia
3/4 EMT, instalacion enchape pared baño hombres
canchas, instalacion enchape pared baño profesores
nivel 2, demolicion enchape pared y piso baño profesores
nivel 2

JOHN C
INGENIERO

R. obra

24/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
3 ayudantes 2 oficiales
actividades: instalacion tuberia hidraulica pvc piso
y verticales sanitaria nivel 2 baños profesores, enchape
pared baños hombres canchas,

JOHN C
INGENIERO

R. obra

25/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales 3 ayudante personal electrico
actividades: instalacion tuberia electrica EMT, lamparas
baños canchas, instalacion enchape pared baño hombres
llegada de sanitarios y orinales

JOHN C
INGENIERO

R. obra

27/07/2026.
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape piso y pared baños
hombres nivel 1 o canchas, instalacion enchape pared

baño nivel 2, profesores

Jhon C
Maestro

f
R. obra

28/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pared y pisos baños hombres canchas, instalacion enchape baño profesores nivel 2.

Jhon C
Maestro

f
R. obra

29/07/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape piso pasillo o corredor acceso baños nivel 2, instalacion enchape pared, piso baños hombres canchas

Jhon C
Maestro

f
R. obra

30/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes.
actividades: prolongacion verticales hidraulicas y sanitarios baño profesores nivel 2, instalacion enchape pasillo acceso baños nivel 2, instalacion enchape columnetas baño hombres baños canchas, instalacion enchape de piso

Jhon C
Maestro

f
R. obra

31/07/2026

personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: aplicacion pintura vinilo pared baño hombres canchas; instalacion sanitarios baño mujeres, baño de las canchas, instalacion enchape aluminetas, baño profesores nivel 2.

Jaime C. — Ing. residente
f. obra

01/09/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspectora, 1 SST
personal operativo
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: instalacion enchape pisa pasillo baños nivel 2. instalacion tuses, sanitarios baño canchas, aplicacion pintura baños canchas

Jaime C. — Ingeniero
f. obra.

03/08/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspectora, 1 SST.
personal operativos.
2 oficiales, 3 ayudantes
actividades: instalacion baños hombres, sector canchas (tuses). enchape pared baño profesores nivel 2.

Jaime C. — Ingeniero
f. obra

04/08/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
2 oficiales, 3. ayudantes
actividades: Embaquillado enchape pared y piso baño hombre

aplicacion pintura pared baño mujeres baño d de las conch
instalacion enchape piso acceso o pasillo nivel 2, se evidencia
humedad lateral baños nivel 3, se solicita corregir por parte
de la SED

Inspector

Obra

05/08/2026

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 sst

personal operativo

2 oficiales, 3 ayudantes

actividades: instalacion enchape piso y pared pasillo y baño
por fuera nivel 2, granito baños puertas acceso baños
conchas, enbaquillado enchape piso y pared,

Inspector

Obra

06/08/2026

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 sst

personal operativo

2 oficiales, 3 ayudantes, 2 tecnicos

actividades; inspeccion tuberia sanitaria baños nivel 3
con CCTV, tuberia hidraulica con boroscopio, se evidencia que
la tuberia sanitaria esta bien, en la tuberia hidraulica
se detectan 2 fugas en los baño de los hombres las
cuales se corrigen y llega de divisiones a baños conchas
instalacion de divisiones baño mujeres.

Inspector

Obra

08/08/2026

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 sst

personal operativo

2 oficiales, 3 ayudantes

Actividades: Sumtech sanitarios retirados en nivel 3 baños instalación enchape piso 3 baldosas retiradas, instalación divisiones baños hombres enchape

Jhon C
Inspector

Arbre

10/08/2026.

Scanned with CamScanner

03/04/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, ~~soldador~~, 1 ay
actividades: se realizó la instalación tubería Ø 6"
instalación nuevos modulos de cerramiento, Alzado
muro mampostería cajas inspección

[signature]
2 INTERNOS
R. obra

04/04/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector 1 sst
personal operativo
1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 ayudante
actividades: se llevo cabo: instalación modulos de
cerramiento, alzado cajas de inspección, retiro de material
suelto de alistado antiguo adoquin en concreto

[signature]
2 INTERNOS
R. obra

06/04/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
actividades: retiro material antiguo alistado
zona del parque infantil, encamado tubería Ø 6"

[signature]
2 INTERNOS
R. obra

07/04/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo

1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes
actividades
retiro elistech zona parque infantil, llenado tapado
zanja tubería 6" instalada, armado modulos cerramiento.

JOHN C
INSPECTOR

R. obra

08/01/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 soldador, 1 ayudante
actividades: instalación modulos de cerramiento
retiro elistech zona parque infantil.

JOHN C
INSPECTOR

R. obra

09/01/2026.
ESTADO DEL TIEMPO Medición precipitación bajo
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 1 Oficial
actividades: instalación tubería vertical, bajante al
pie del busto, instalación modulos de cerramiento

JOHN C
INSPECTOR

R. obra

10/01/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes
actividades: excavación en el area infantil
construcción ejes de inspección

R. obra

13/07/2026
ESTADO DEL TIEMPO : precipitaciones bajas
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1SST.
personal Operativo
1 maestro, 4 ayudantes
Actividades : excavacion 2L pie del parque infantil, retiro 2 listado

JOHN C
INGENIERO

R. OBRA

14/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro 4 ayudantes
Actividades : excavaciones para construccion filtro y excavacion para construccion cercamos.

JOHN C
INGENIERO

R. OBRA

15/07/2026
Estado del tiempo : Nublado
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro. 4 ayudantes
Actividades : excavaciones para construccion cercamos, excavacion para construccion filtro, retiro de R.C.D

JOHN C.
INGENIERO

R. OBRA

16/07/2026
ESTADO DEL TIEMPO : precipitaciones
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro. 4 ayudantes.

actividades: excavacion para construccion cocheras, retiro de R.C.D, llegada de subbase pca, excavacion para filtro al pie de la concha, vaciado dados de concreto

Jose C
interior

R. obra

17/07/2026

estado del tiempo: precipitaciones bajas

personal administrativo,

1 Residente. 1 inspector, 1 sst

personal operativo

1 maestro, 4 ayudantes

actividades: excavacion para construccion filtro sector concha, instalacion de geotextil, instalacion grava

Jose C
interior

R. Obra

18/07/2026

ESTADO DEL TIEMPO: precipitaciones

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 sst

personal operativo

1 maestro, 4 ayudantes

actividades: construccion filtro, al pie de la concha

inicio extendido subbase pca.

Jose C
interior

R. Obra

21/07/2026

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 sst

personal operativo

1 maestro, 4 ayudantes

construccion filtro al pie de la concha, extendido subbase pca al pie de la concha.

Jose C
Operario

R. obra

22/07/2026

personal administrativo

1 residente, 1 inspector, 1 SST

personal operativo

1 maestro, 4 ayudantes

actividades: extendido subbase pea sector cancha instalacion loseta conectada al cercano fachada posterior cancha

Juan C
INSPECTOR

R. obra

23/07/2026

ESTADO DEL TIEMPO: precipitaciones

personal administrativo

1 residente, 1 inspector, 1 SST

personal operativo

1 maestro, 4 ayudantes.

actividades: correccion hidraulica tubo pozo 64 afectado sobre pasillo 0 corredor; vaciado o fundido de fondo o solado cercano; Arreglo caja inspeccion 01 pie puesta del salon queda salida a la calle fachada posterior

Juan C
INSPECTOR

R. obra

29/07/2026.

personal administrativo

1 residente 1 inspector 1 SST

personal operativo

1 maestro 4 ayudantes

actividades: llegan las tapas para las cajas de inspeccion Comparten subbase pea sector donde esta extendido excavacion para construccion de filtro entre cesped de vigilancia y parque infantil, vaciado de fondo o solado cercano

Juan C
INSPECTOR

R. obra.

25/07/2026.

personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: construccion filtro electrodialisis parque infantil
y

JOHN C
INGENIERO
R. obra

27/01/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro 4 ayudantes
actividades: compactacion subbase para sector lateral
cancha microfutbol; encamisado tuberia afectada en labores

JOHN C
INGENIERO
R. obra

28/01/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: construccion filtro fachada posterior cesacle
de vigilancia, baños, cambio bajante aguas lluvias
sector de salones después de baños, provenientes desde
el segundo piso.

JOHN C
INGENIERO
R. obra

29/01/2026.
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro 4 ayudantes
actividades: construccion filtro parte posterior
cesacle vigilancia, vaciado concreto muro lateral

R. obra

30|07|2026.
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: llegada a obra de agregados arena y grava, cosido filtro al pie del parque infantil, protección moros de las cajas

John C
Interventor

R. obra

31|07|2026:
personal administrativo
1 Residente 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: retiro boulders del parque que de sobre area de intervención, corrección terminación de escalera o brazo en box caja de inspección y parque infantil, excavación para cárcamo frente a baños y selva

John C
Interv.

R. obra

01|08|2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: encofrado, vaciado y fundido tramo de escalera entre pasillo y parque infantil.

John C
Interventor

R. obra

03|08|2026

personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo:
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: demolición mampostería existente como terminado, algunas columnas o trabes del kinder infantil, corte o adecuación piso existente, acceso a salones pesillo o concreto, retiro cercamo corte acceso a salon.

Juan C
INGENIERO

R. obra

04/08/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: fundido solado o fundo cajo de inspección demolido, forma o modulación caja entre concha y y cerete de vigilancia descarga de concreto existente, acero de zapatas en pesillo y zapata aledaña al pasaje infantil, inspección y sondeo tubería descarga a cajo, relleno a vio ultimo salon

Juan C
INGENIERO

R. obra

05/08/2026.
ESTADO DEL TIEMPO: precipitaciones
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro, 4 ayudantes
actividades: aplicación pintura bayetas, adecuación finales para fundido piso, compactación suelo fundación y subbase pza

Juan C
INGENIERO

R. obra

06/08/2026.

personal administrativo
↓ Residente, ↓ inspector, ↓ SST
personal operativo
↓ maestro, ↓ ayudantes
actividades: compactación suelo fundación, toma de medidas para construcción zapatas cercanas

Juan C
INGENIERO

f
R. obra

08/08/2026
ESTADO DEL TIEMPO: precipitaciones
personal administrativo
↓ Residente, ↓ inspector, ↓ SST
personal operativo
↓ maestros, ↓ ayudantes
actividades: encamisado tubería hidráulica sitio pesillo, excavación para fundición placa zona de pesillo y demás zonas.

Juan C
INGENIERO

f
R-obra

Emergencia Cena Isaza 06/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
actividades: alistado de pisos salon

Jhon C
Inspector

Rubro

Emergencia colegio cena Isaza 09/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 oficial 1 ayudante.
actividades: instalacion enchape salon

Jhon C
Inspector

R. obra

Emergencia colegio Nima Isaza 09/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro
actividades: respaldo pintura existente: pluche electrico
bateo nivelacion, aplicacion estucos

Jhon C
Inspector

Robra

Colegio cena Isaza, Emergencia 16/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
actividades: instalacion granito, acceso salon terminacion
embaguillado enchape pisos

Jhon C
Inspector

Robra

Emergencia colegio Nima Isaza 16/07/2026
personal administrativo

Norma

1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 maestro
actividades: aplicacion pintura placa y cintas azul y amarillo baño nivel 2, luego de haber resanado y lijado

Jhon C
INTERVENTOR

obra

Colegio cano isaza Emergencia 23/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspecta, 1 sst
personal operativo
1 oficial 1 ayudante
actividades: cambio 6 piezas hierro oxidados en escalera del piso, aseo general

Jhon C
INTERVENTOR

1 obra

Emergencia Hora Colegio colegio 27/07/2026
personal administrativo
1 Residente 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro
actividades: instalacion lamparas biblioteca, intervencion baños nivel 1, resanado placa baño niñas y niños

Jhon C
INTERVENTOR

1 obra

Emergencia Hora Colegio colegio 25/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 sst
personal operativo
1 maestro
actividades: aplicacion estuco placa baño y cintas baño niños y niñas nivel 1, se evidencia humedad en el baño de los niños, en la placa bajo los orinales del nivel 2, se realizo seguimiento pero menor si sea o tiene fuga la tubería sanitaria o hidraulica se aplica pintura en los baños de los niños en placa

Norma

y cintas

Emergencia colegio Nuevo Oasis 05/08/2020

personal administrativo

1 Residente, 1 inspector SST

personal operativo

1 maestro

actividades: después del seguimiento se evidencia humedad se interviene levantando el enchape en el punto focalizado y se realiza demolición de un sector de placa, encontrando la arena y la tubería sanitaria, se esta ubicando la posible fuga

John C
INGENIERO

Obra

personal operativo
1 Oficial 1 ayudante.
actividades realizadas
Instalacion sellos Sikaflex pasillo 0 corredor, sellado e impermeabilizacion contorno, retiro de embaquillado existente sobre adoquin, preparacion con impermeabilizacion del mortero, reembaquillado

Juan Antonio Diaz
Interventor

R. obra

Colegio Santa Librada 15/07/2026
personal administrativo
1 Residente 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades: embaquillado adoquin islas, lavado con rinso y aplicacion hidrofugo

John C
Interventor

R obra

Colegio Santa Librada 18/07/2026
personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SST
personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
actividades: aseo general piso, retiro o acopio de material sobrante

John C
Interventor

R obra

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 02. INFORMES SEMANALES

FECHA: 13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 80 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
12 de julio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA



MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

| POLIZAS CONTRATO DE OBRA | | | |

FECHA: 13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	FRENTE AL 100%
8A 95.35%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  


FECHA:	13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 2


CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 63.97%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	    
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	


TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	 
16A 26.05%	PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	   

FECHA:	13/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	13/07/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166	Días					
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 35				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 156,929,147.99**				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 35				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	

DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	24.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	-98.31	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	

CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**				**Fabio Lozano Simonelli**		**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**					**Estrella del Sur Sede B**	**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	

PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			37.00		$ 16,863.75	$ 623,958.75	$ 623,958.75	77.08%	77.08%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	117.44%	117.44%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	311.99	311.99		$ 361,355.09	$ 112,739,173.09	$ 112,739,173.09	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00	8.00	$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84	10.00	$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			586.46	118.46	$ 4,663.84	$ 2,735,154.84	$ 2,735,154.84	95.00%	95.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 213,404,464.93**				
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 35**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 76,163,937.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 35				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11	18.57	$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87			95.87		$ 22,300.62	$ 2,137,960.73	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	-31.38	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18	118.18	$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	12.01		$ 1,128,300.90	$ 13,550,893.78	$ (5,427,127.00)	166.81%	166.81%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10		$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			86.39	6.77	$ 989,338.20	$ 85,471,431.07	$ 48,465,175.00	63.81%	63.81%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00	13.00	$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00	10.00	$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00			16.00		$ 63,533.17	$ 1,016,530.66	$ 381,199.00	72.73%	72.73%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00	18.00	$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00	12.00	$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	21.06		$ 13,044.45	$ 274,716.07	$ 690,964.00	28.45%	28.45%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			9.36		$ 123,260.52	$ 1,153,718.48	$ 1,419,961.00	44.83%	44.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00			30.00		$ 23,315.15	$ 699,454.39	$ 466,303.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00			30.00		$ 20,790.98	$ 623,729.40	$ 415,820.00	60.00%	60.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES	UN	32.00			10.00	6.00	$ 180,330.15	$ 1,803,301.50	$ 3,967,263.00	31.25%	31.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	3.00		$ 989,338.20	$ 2,968,014.60	$ 2,374,412.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			6.00		$ 772,427.21	$ 4,634,563.23	$ 4,634,563.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA	UN	45.00	-8.00	37.00	19.00		$ 1,117,185.66	$ 21,226,527.59	$ 29,046,827.00	42.22%	42.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	205.65	60.30	$ 98,222.57	$ 20,199,472.47	$ 15,579,083.00	60.44%	60.44%	

ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			93.85		$ 4,663.84	$ 437,701.26	$ 521,231.00	45.64%	45.64%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 223,059,079.86**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 35**				**Observa**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**			**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**			**SEMANA 35**				**Observa**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	107.30	21.46	$ 69,099.55	$ 7,414,382.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)+	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			31.65	17.82	$ 91,988.38	$ 2,911,432.34	$ 514,215.00	84.99%	84.99%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00			7.00	3.00	$ 875,947.70	$ 6,131,633.87	$ 1,751,895.00	77.78%	77.78%	

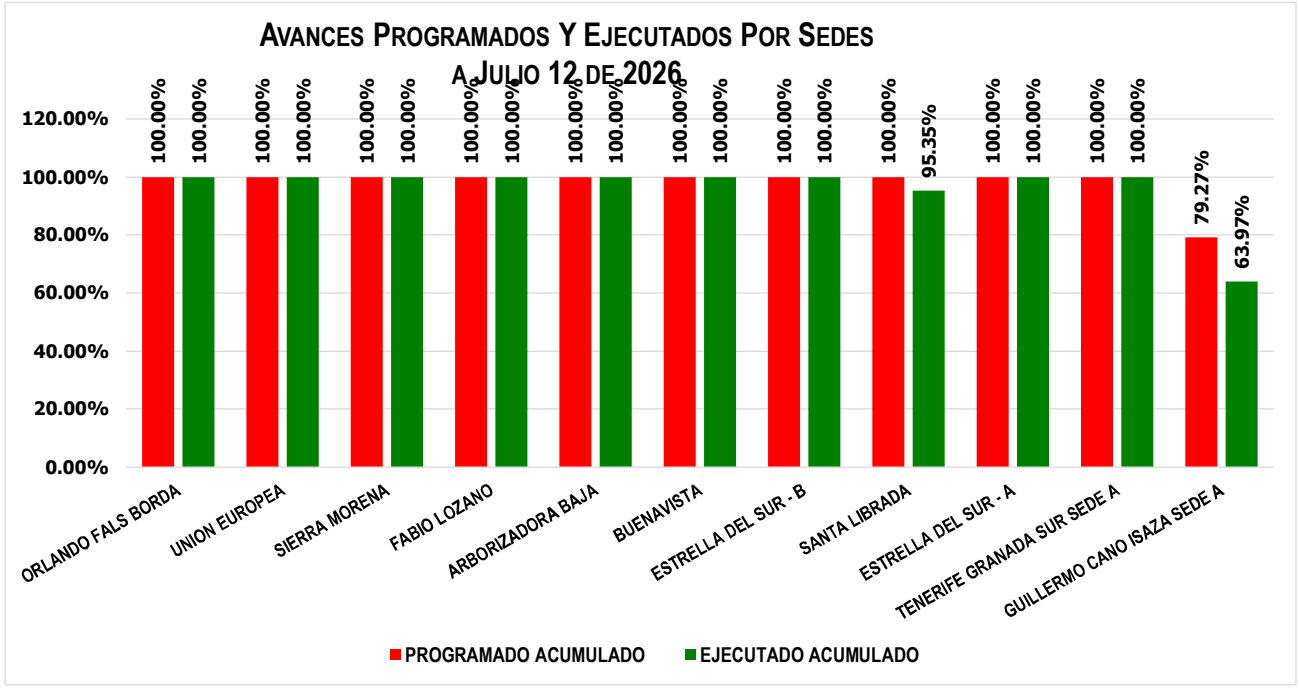
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			78.00	6.40	$ 503,048.36	$ 39,237,772.13	$ 21,128,031.00	65.00%	65.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			21.15	21.15	$ 34,724.48	$ 734,422.86	$ 2,558,847.00	22.30%	22.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			45.00	15.00	$ 141,729.70	$ 6,377,836.52	$ 3,259,783.00	66.18%	66.18%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 91,159,593.14**				

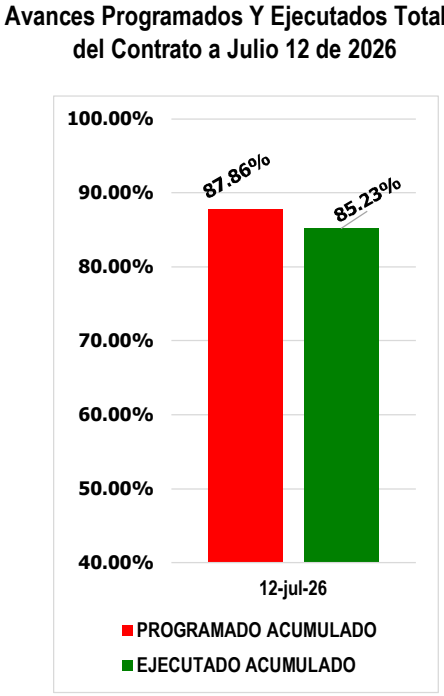
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**85.23%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,278,914,089.93**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,673,811,143.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Julio 12 2026

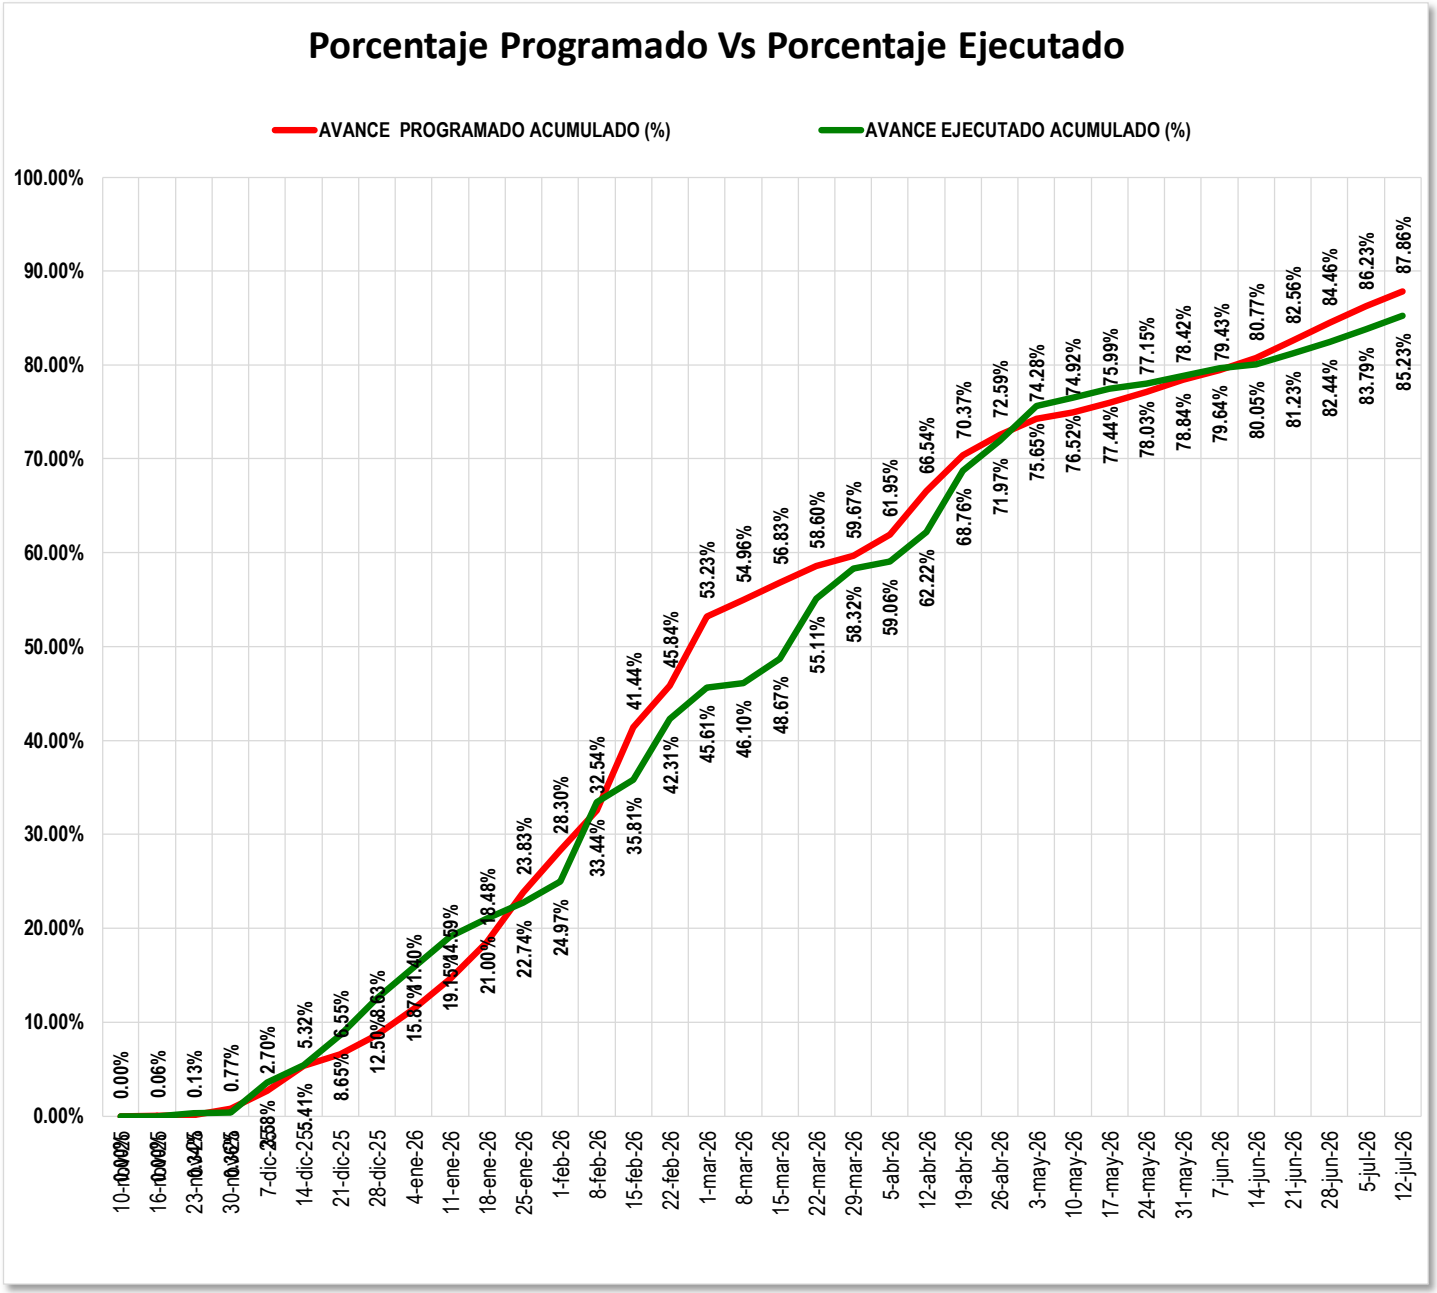
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	0.00%
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 213,404,464.93	95.35%	$ 223,822,666.00	-4.65%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 276,414,243.05	79.27%	$ 223,059,079.86	63.97%	$ 348,697,525.00	-15.30%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 97,638,270.18	27.90%	$ 91,159,593.14	26.05%	$ 350,000,000.00	-1.85%
TOTALES	**$ 2,349,166,131.23**	**87.86%**	**$ 2,278,914,089.93**	**85.23%**	**$ 2,673,811,143.00**	-2.63%

OBSERVACIONES: De acuerdo a la información contenida en la tabla anterior, encontramos que de los tres (3) frentes de mejoramientos en ejecución, la ***IED Santa Librada*** registra un atraso cercano al 5%, ***Ciudad de Villavicencio*** con un porcentaje de atraso cercano al 2%, y por último ***Guillermo Cano Isaza,*** luego de la reprogramación presentada por el contratista donde solicita una ampliación del plazo de entrega, registra un atraso superior al 15%. El contrato en general mantiene un atraso superior al 2%.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Julio 12 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.58%
14-dic-25	5.32%	5.41%
21-dic-25	6.55%	8.65%
28-dic-25	8.63%	12.50%
4-ene-26	11.40%	15.87%
11-ene-26	14.59%	19.15%
18-ene-26	18.48%	21.00%
25-ene-26	23.83%	22.74%
1-feb-26	28.30%	24.97%
8-feb-26	32.54%	33.44%
15-feb-26	41.44%	35.81%
22-feb-26	45.84%	42.31%
1-mar-26	53.23%	45.61%
8-mar-26	54.96%	46.10%
15-mar-26	56.83%	48.67%
22-mar-26	58.60%	55.11%
29-mar-26	59.67%	58.32%
5-abr-26	61.95%	59.06%
12-abr-26	66.54%	62.22%
19-abr-26	70.37%	68.76%
26-abr-26	72.59%	71.97%
3-may-26	74.28%	75.65%
10-may-26	74.92%	76.52%
17-may-26	75.99%	77.44%
24-may-26	77.15%	78.03%
31-may-26	78.42%	78.84%
7-jun-26	79.43%	79.64%
14-jun-26	80.77%	80.05%
21-jun-26	82.56%	81.23%
28-jun-26	84.46%	82.44%
5-jul-26	86.23%	83.79%
12-jul-26	**87.86%**	**85.23%**
19-jul-26	89.92%	0.00%
26-jul-26	91.98%	0.00%
2-ago-26	93.46%	0.00%
9-ago-26	94.18%	0.00%

FECHA:	20/07/2026
DIAS RESTANTES	73 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	
CORTE DEL INFORME:	19 de julio de 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO 2

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PAIS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026

PLAZOS EN DIAS ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRORROGAS	153	148
TOTAL	364	359

VALOR CONTRATO ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %		EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%	→	100.00%	↓		$ 156,929,148.00	$ 156,929,147.99	10/11/2025	28/02/2026
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%	→	100.00%	↑		$ 169,766,274.00	$ 169,766,274.00	18/11/2025	21/02/2026
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	100.00%	100.01%	↑	100.00%	↑		$ 118,699,548.00	$ 118,712,551.97	10/11/2025	18/04/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	100.00%	100.00%	→	100.00%	↓		$ 245,187,661.00	$ 245,187,661.00	1/12/2025	11/04/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%	→	100.00%	↑		$ 630,139,470.00	$ 630,139,470.00	24/11/2025	28/02/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%	→	100.00%	↓		$ 186,826,436.00	$ 186,826,436.00	10/12/2025	21/03/2026
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%	→	100.00%	↓		$ 78,637,768.00	$ 78,637,768.00	1/12/2025	14/03/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	95.35%	95.35%	→	100.00%	↓		$ 223,822,666.00	$ 213,404,464.93	15/01/2026	2/05/2026
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%	→	100.00%	↑		$ 76,163,937.00	$ 76,163,937.00	15/01/2026	28/02/2026
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	100.00%	100.00%	→	100.00%	↑		$ 88,940,710.00	$ 88,940,710.00	9/03/2026	7/06/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	63.97%	72.41%	↑	85.15%	↓		$ 348,697,525.00	$ 252,488,650.46	13/01/2026	19/06/2026
545	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	C	Puerta al Llano	26.05%	36.28%	↑	35.49%	↓		$ 350,000,000.00	$ 126,981,761.16	3/06/2026	30/09/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						87.67%	↑	89.62%	↓		$ 2,673,811,143.00	$ 2,344,178,832.53		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 28,072,878.00	$ 28,072,878.00	26/01/2026	1/03/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 52,071,222.00	$ 52,071,222.00	6/04/2026	14/05/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 63,396,903.00	$ 63,396,903.00	7/04/2026	22/05/2026
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	CIUDAD BOLIVAR	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 2,038,265.00	$ 2,038,265.00	27/07/2026	1/08/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 5,260,774.00	$ 5,260,774.00	22/05/2026	6/06/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 11,337,220.00	$ 11,337,220.00	27/05/2026	20/06/2026
1980	CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Riviera del Sur	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 18,125,874.00	$ 18,125,874.00	16/06/2026	27/06/2026
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 70,007,566.00	$ 70,007,566.00	23/06/2026	7/07/2026
567	SAN JOSE DE USME - DON BOSCO 2 (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	San José Monteblanco (Don Bosco II)			→		✓		$ 24,867,651.00			
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%	→	100.00%	✓		$ 12,664,106.00	$ 12,664,106.00	22/06/2026	27/06/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Santa Librada			→		✓		$ 76,878,564.00			
TOTAL FRENTES DE OBRA						72.10%	↑	100.00%	↓		$ 364,721,023.00	$ 262,974,808.00		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	8	0	9	$ 2,344,178,833
ACUMULADO EMERGENCIAS				
9	0	0	9	$ 262,974,808
TOTAL				
10	8	0	18	$ 2,607,153,641
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
				2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
				3		14		25		36	
				4		15		26		37	
				5		16		27		38	
				6		17		28		39	
				7		18		29		40	
				8		19		30			
				9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
		TOTAL OBRA		10		21		32			
	$ 361,963,041.00			11		22		33		$ 90,992,472	


AVANCE GENERAL


	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	87.67%	11.61%	79.67%
PROGRAMADO	89.62%		
ATRASO	-1.95%	EN EJECUCION	

FECHA APROBACION CRONOGRAMA











OBSERVACIONES:

FECHA:	20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 2

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.01%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072878
52071222
63396903
2036265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00

FECHA:	20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	20/07/2026
DIAS RESTANTES	166 Dias
REGISTRO FOTOGRAFICO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	**FRENTE AL 100%**
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		


TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	FRENTE AL 100%
8A **95.35%**	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA: 20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA:	20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	



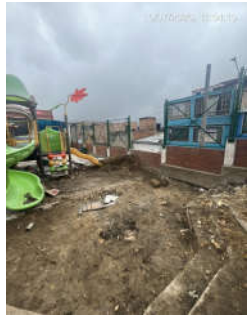
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 72.41%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	   
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	


TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 36.28%	PUERTA AL LLANO	Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	  

FECHA:	20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 20/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 36				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 156,929,147.99**				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 36				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
546	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 118,712,551.97**				
CPF	**1930**	**IED**				**UNIÓN EUROPEA**		**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	

DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	

EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	

CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				

CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	

CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	

PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							**$ 245,187,661.00**				

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 36				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÀMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
						SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA		**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			37.00		$ 16,863.75	$ 623,958.75	$ 623,958.75	77.08%	77.08%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	

DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	117.44%	117.44%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	311.99	311.99		$ 361,355.09	$ 112,739,173.09	$ 112,739,173.09	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			586.46		$ 4,663.84	$ 2,735,154.84	$ 2,735,154.84	95.00%	95.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			**$ 213,404,464.93**				
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 36**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 76,163,937.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 36				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87			95.87		$ 22,300.62	$ 2,137,960.73	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			116.21	14.27	$ 126,224.49	$ 14,668,548.47	$ 1,682,573.00	89.71%	89.71%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	16.71	4.70	$ 1,128,300.90	$ 18,853,908.00	$ (10,730,142.00)	232.08%	232.08%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10		$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			96.79	10.40	$ 989,338.20	$ 95,760,548.36	$ 38,176,057.00	71.50%	71.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00			22.00	6.00	$ 63,533.17	$ 1,397,729.66	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	21.06		$ 13,044.45	$ 274,716.07	$ 690,964.00	28.45%	28.45%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			9.36		$ 123,260.52	$ 1,153,718.48	$ 1,419,961.00	44.83%	44.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00			30.00		$ 23,315.15	$ 699,454.39	$ 466,303.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00			30.00		$ 20,790.98	$ 623,729.40	$ 415,820.00	60.00%	60.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES	UN	32.00			10.00		$ 180,330.15	$ 1,803,301.50	$ 3,967,263.00	31.25%	31.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	3.00		$ 989,338.20	$ 2,968,014.60	$ 2,374,412.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			6.00		$ 772,427.21	$ 4,634,563.23	$ 4,634,563.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA	UN	45.00	-8.00	37.00	19.00		$ 1,117,185.66	$ 21,226,527.59	$ 29,046,827.00	42.22%	42.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	323.22	117.57	$ 98,222.57	$ 31,747,500.56	$ 4,031,054.00	95.00%	95.00%	

ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			116.79	22.94	$ 4,663.84	$ 544,689.72	$ 414,242.00	56.80%	56.80%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 252,488,650.46**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 36**				**Observa**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				
CPF	**545**	**IED**			**CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)**			**SEMANA 36**				**Observa**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5 x5 anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	107.30		$ 69,099.55	$ 7,414,382.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			31.65		$ 91,988.38	$ 2,911,432.34	$ 514,215.00	84.99%	84.99%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			3.50	3.50	$ 176,060.25	$ 616,210.87	$ 3,264,157.00	15.88%	15.88%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00			7.00		$ 875,947.70	$ 6,131,633.87	$ 1,751,895.00	77.78%	77.78%	

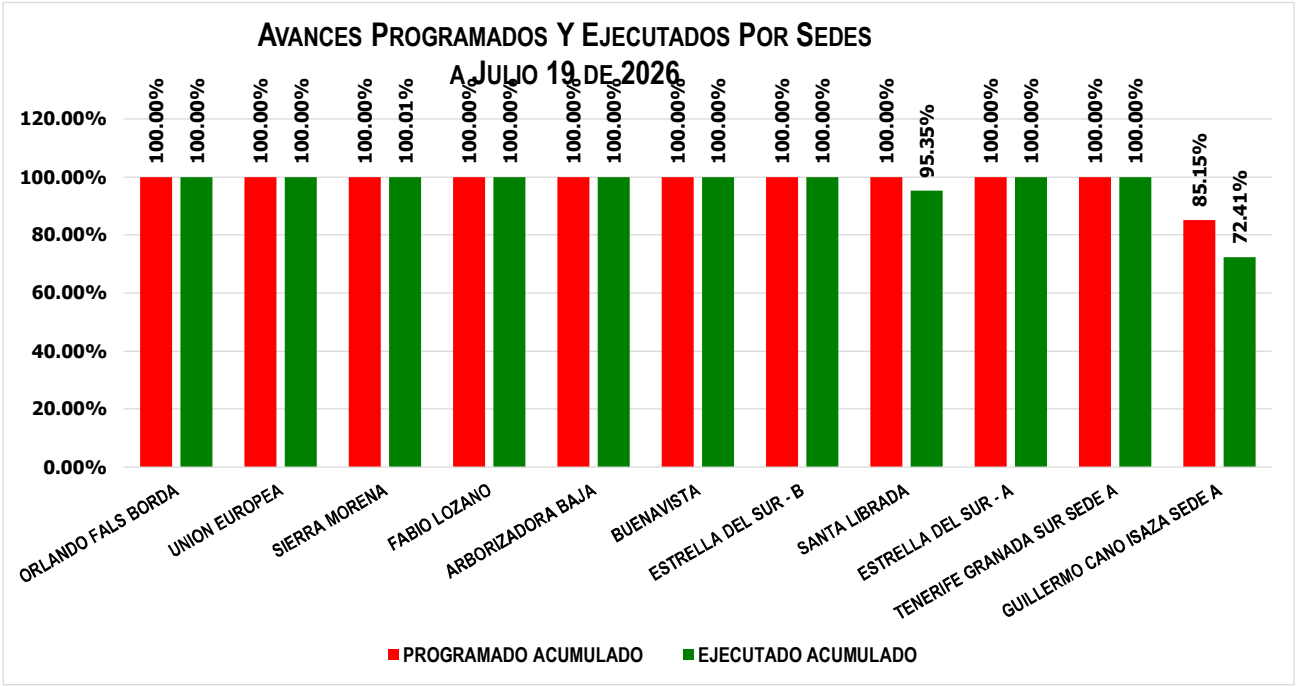
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			114.84	36.84	$ 503,048.36	$ 57,770,073.74	$ 2,595,730.00	95.70%	95.70%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			53.39	32.24	$ 34,724.48	$ 1,853,940.25	$ 1,439,330.00	56.29%	56.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			63.00	18.00	$ 141,729.70	$ 8,928,971.13	$ 708,649.00	92.65%	92.65%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 126,981,761.16**				

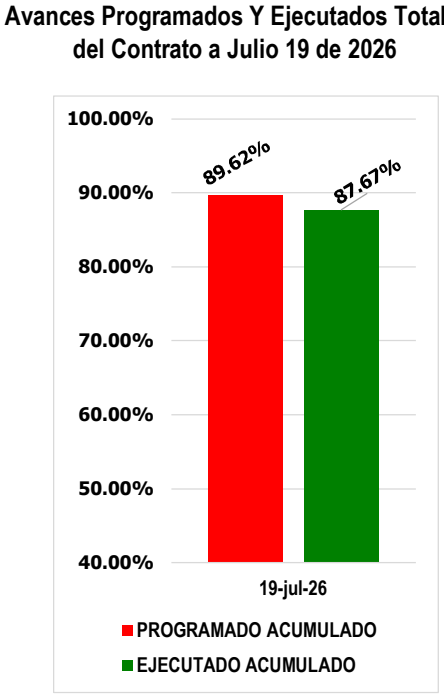
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**87.67%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,344,178,832.53**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,673,811,143.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Julio 19 2026

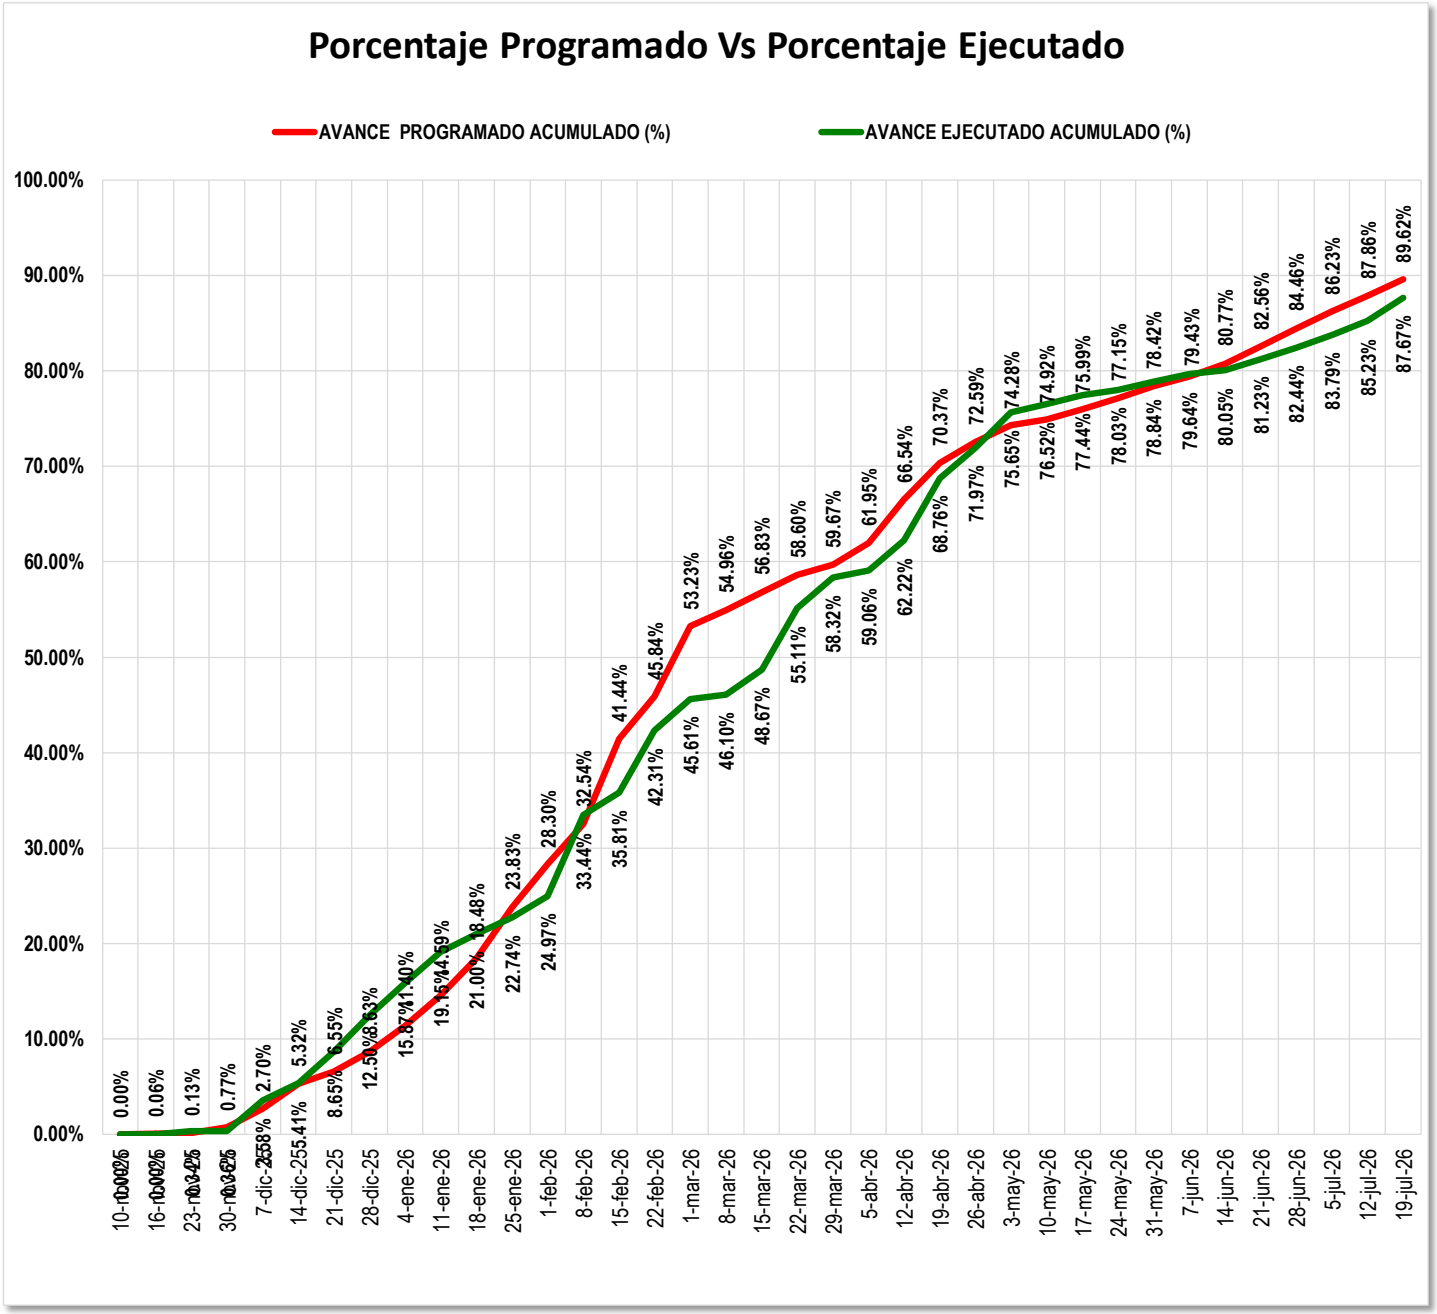
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,712,551.97	100.01%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	0.00%
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 213,404,464.93	95.35%	$ 223,822,666.00	-4.65%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 296,902,110.40	85.15%	$ 252,488,650.46	72.41%	$ 348,697,525.00	-12.74%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 124,218,363.31	35.49%	$ 126,981,761.16	36.28%	$ 350,000,000.00	0.79%
TOTALES	**$ 2,396,234,091.71**	**89.62%**	**$ 2,344,178,832.53**	**87.67%**	**$ 2,673,811,143.00**	-1.95%

OBSERVACIONES: De acuerdo a la información contenida en la tabla anterior, encontramos que de los tres (3) frentes de mejoramientos en ejecución, la ***IED Santa Librada*** registra un atraso por encima del 4%, ***IED Ciudad de Villavicencio*** con un porcentaje de adelanto cercano al 1%, y por último ***IED Guillermo Cano Isaza, sede que solicitó un*** a reprogramación con adición de 2 semanas, registra un atraso superior al 12%. El contrato en general mantiene un atraso cercano al 2%.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Julio 19 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.58%
14-dic-25	5.32%	5.41%
21-dic-25	6.55%	8.65%
28-dic-25	8.63%	12.50%
4-ene-26	11.40%	15.87%
11-ene-26	14.59%	19.15%
18-ene-26	18.48%	21.00%
25-ene-26	23.83%	22.74%
1-feb-26	28.30%	24.97%
8-feb-26	32.54%	33.44%
15-feb-26	41.44%	35.81%
22-feb-26	45.84%	42.31%
1-mar-26	53.23%	45.61%
8-mar-26	54.96%	46.10%
15-mar-26	56.83%	48.67%
22-mar-26	58.60%	55.11%
29-mar-26	59.67%	58.32%
5-abr-26	61.95%	59.06%
12-abr-26	66.54%	62.22%
19-abr-26	70.37%	68.76%
26-abr-26	72.59%	71.97%
3-may-26	74.28%	75.65%
10-may-26	74.92%	76.52%
17-may-26	75.99%	77.44%
24-may-26	77.15%	78.03%
31-may-26	78.42%	78.84%
7-jun-26	79.43%	79.64%
14-jun-26	80.77%	80.05%
21-jun-26	82.56%	81.23%
28-jun-26	84.46%	82.44%
5-jul-26	86.23%	83.79%
12-jul-26	87.86%	85.23%
19-jul-26	**89.62%**	**87.67%**
26-jul-26	91.68%	0.00%
2-ago-26	93.46%	0.00%
9-ago-26	94.18%	0.00%
16-ago-26	94.91%	0.00%
23-ago-26	95.64%	0.00%
30-ago-26	96.36%	0.00%
6-sep-26	97.09%	0.00%
13-sep-26	97.82%	0.00%
20-sep-26	98.55%	0.00%
27-sep-26	99.27%	0.00%
30-sep-26	100.00%	0.00%

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 66 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
26 de julio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA


MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-100046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

| POLIZAS CONTRATO DE OBRA | | | |

FECHA:	26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00


FECHA:	26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%


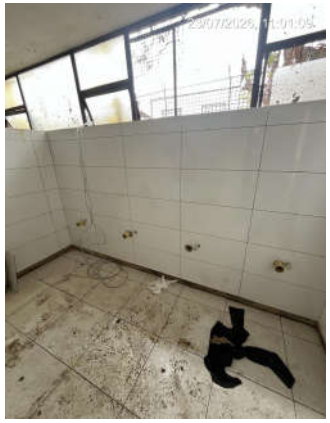
FECHA:	26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **95.35%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA - SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE UNA ACTIVIDAD ADICIOANLA PARA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INICE NUEVAMENTE LAS LABORES EN EL FRENTE DE OBRA**



FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**


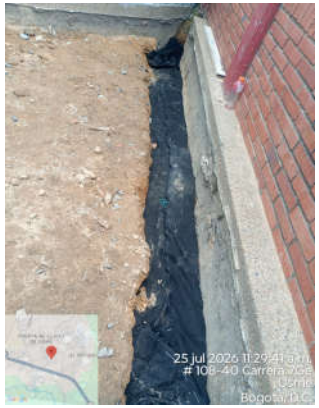
FECHA:	26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 76.28%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	   
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%


FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 38.65%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	  

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 37				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 37				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI			**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	

PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			37.00		$ 16,863.75	$ 623,958.75	$ 623,958.75	77.08%	77.08%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	117.44%	117.44%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	311.99	311.99		$ 361,355.09	$ 112,739,173.09	$ 112,739,173.09	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			586.46		$ 4,663.84	$ 2,735,154.84	$ 2,735,154.84	95.00%	95.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			**$ 213,404,464.93**				

CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 37**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 76,163,937.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 37				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20	5.10	$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	139.53	23.32	$ 126,224.49	$ 17,612,103.68	$ (1,260,983.00)	107.71%	107.71%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	22.20	4.20	$ 15,372.99	$ 341,280.48	$ 119,909.00	74.00%	74.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	16.71	4.70	$ 1,128,300.90	$ 18,853,908.00	$ (10,730,142.00)	232.08%	232.08%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10		$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			96.79	10.40	$ 989,338.20	$ 95,760,548.36	$ 38,176,057.00	71.50%	71.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00	7.00	$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	21.06		$ 13,044.45	$ 274,716.07	$ 690,964.00	28.45%	28.45%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			9.36		$ 123,260.52	$ 1,153,718.48	$ 1,419,961.00	44.83%	44.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00	3.00	$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	50.00	20.00	$ 23,315.15	$ 1,165,757.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	(4.00)	46.00	30.00		$ 20,790.98	$ 623,729.40	$ 415,820.00	60.00%	60.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			10.00		$ 180,330.15	$ 1,803,301.50	$ 3,967,263.00	31.25%	31.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18.00			18.00	14.00	$ 198,607.76	$ 3,574,939.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	3.00		$ 989,338.20	$ 2,968,014.60	$ 2,374,412.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			6.00		$ 772,427.21	$ 4,634,563.23	$ 4,634,563.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA	UN	45.00	-8.00	37.00	21.00	2.00	$ 1,117,185.66	$ 23,460,898.92	$ 26,812,456.00	46.67%	46.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	323.22		$ 98,222.57	$ 31,747,500.56	$ 4,031,054.00	95.00%	95.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			116.79		$ 4,663.84	$ 544,689.72	$ 414,242.00	56.80%	56.80%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA			**$ 270,422,540.23**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 37**				**Observ**
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	

REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 88,940,710.00**				

CPF	545	IED	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)					SEMANA 37				Observ
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5 x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	107.30		$ 69,099.55	$ 7,414,382.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			31.65		$ 91,988.38	$ 2,911,432.34	$ 514,215.00	84.99%	84.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			10.50	7.00	$ 176,060.25	$ 1,848,632.61	$ 2,031,735.00	47.64%	47.64%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(2.00)	7.00	7.00		$ 875,947.70	$ 6,131,633.87	$ 1,751,895.00	77.78%	77.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			114.84		$ 503,048.36	$ 57,770,073.74	$ 2,595,730.00	95.70%	95.70%	

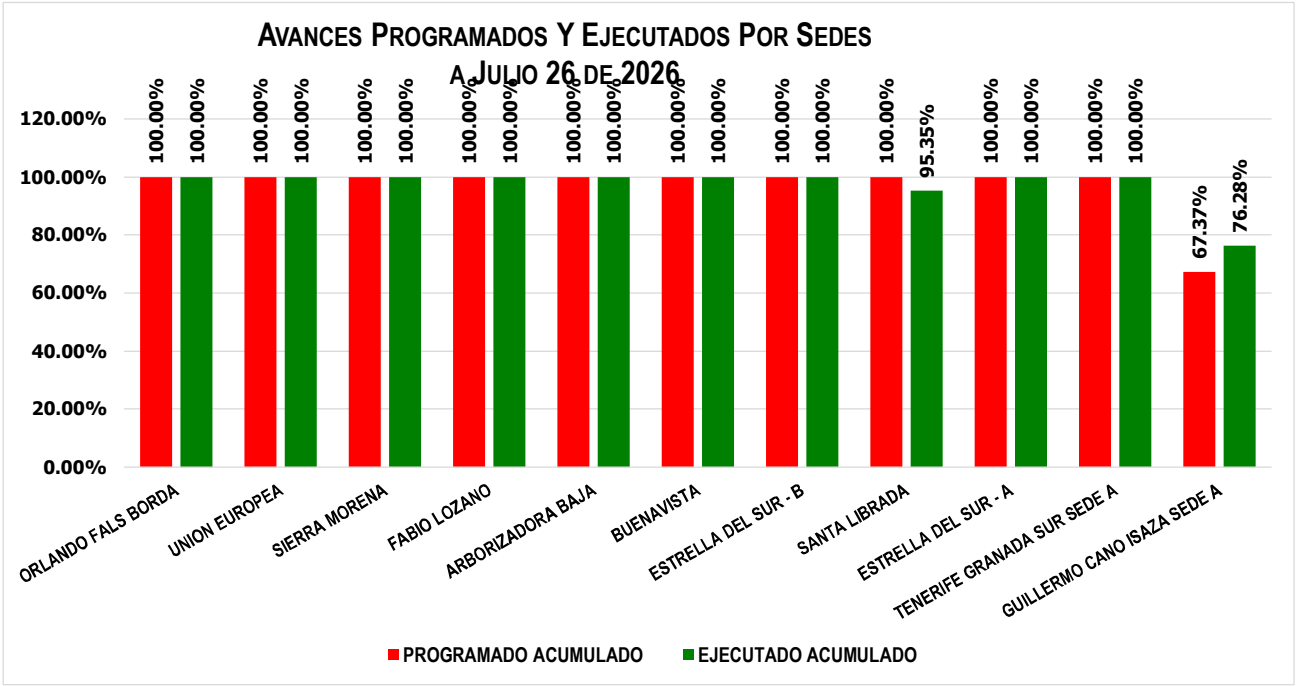
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00			4.50	4.50	$ 320,598.77	$ 1,442,694.49	$ 1,442,694.00	50.00%	50.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			53.39		$ 34,724.48	$ 1,853,940.25	$ 1,439,330.00	56.29%	56.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			42.00	42.00	$ 89,213.28	$ 3,746,957.96	$ 1,070,559.00	77.78%	77.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00	25.00	$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00			17.20	17.20	$ 91,590.40	$ 1,575,354.86	$ 2,546,213.00	38.22%	38.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			63.00		$ 141,729.70	$ 8,928,971.13	$ 708,649.00	92.65%	92.65%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 135,272,450.82**				

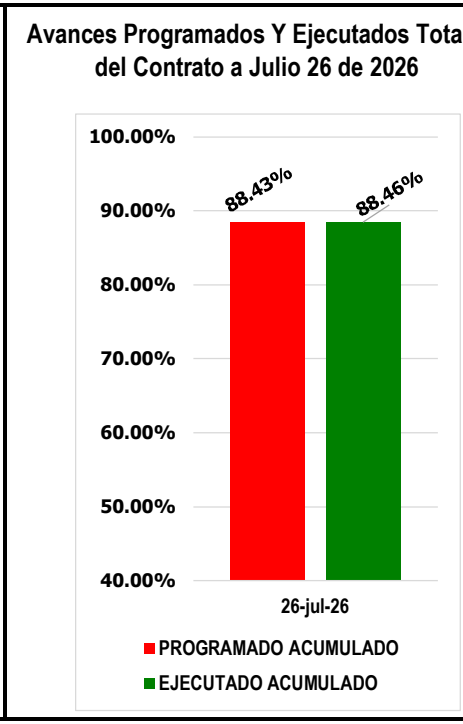
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**88.46%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,370,390,407.98**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,679,619,155.00**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Julio 26 2026

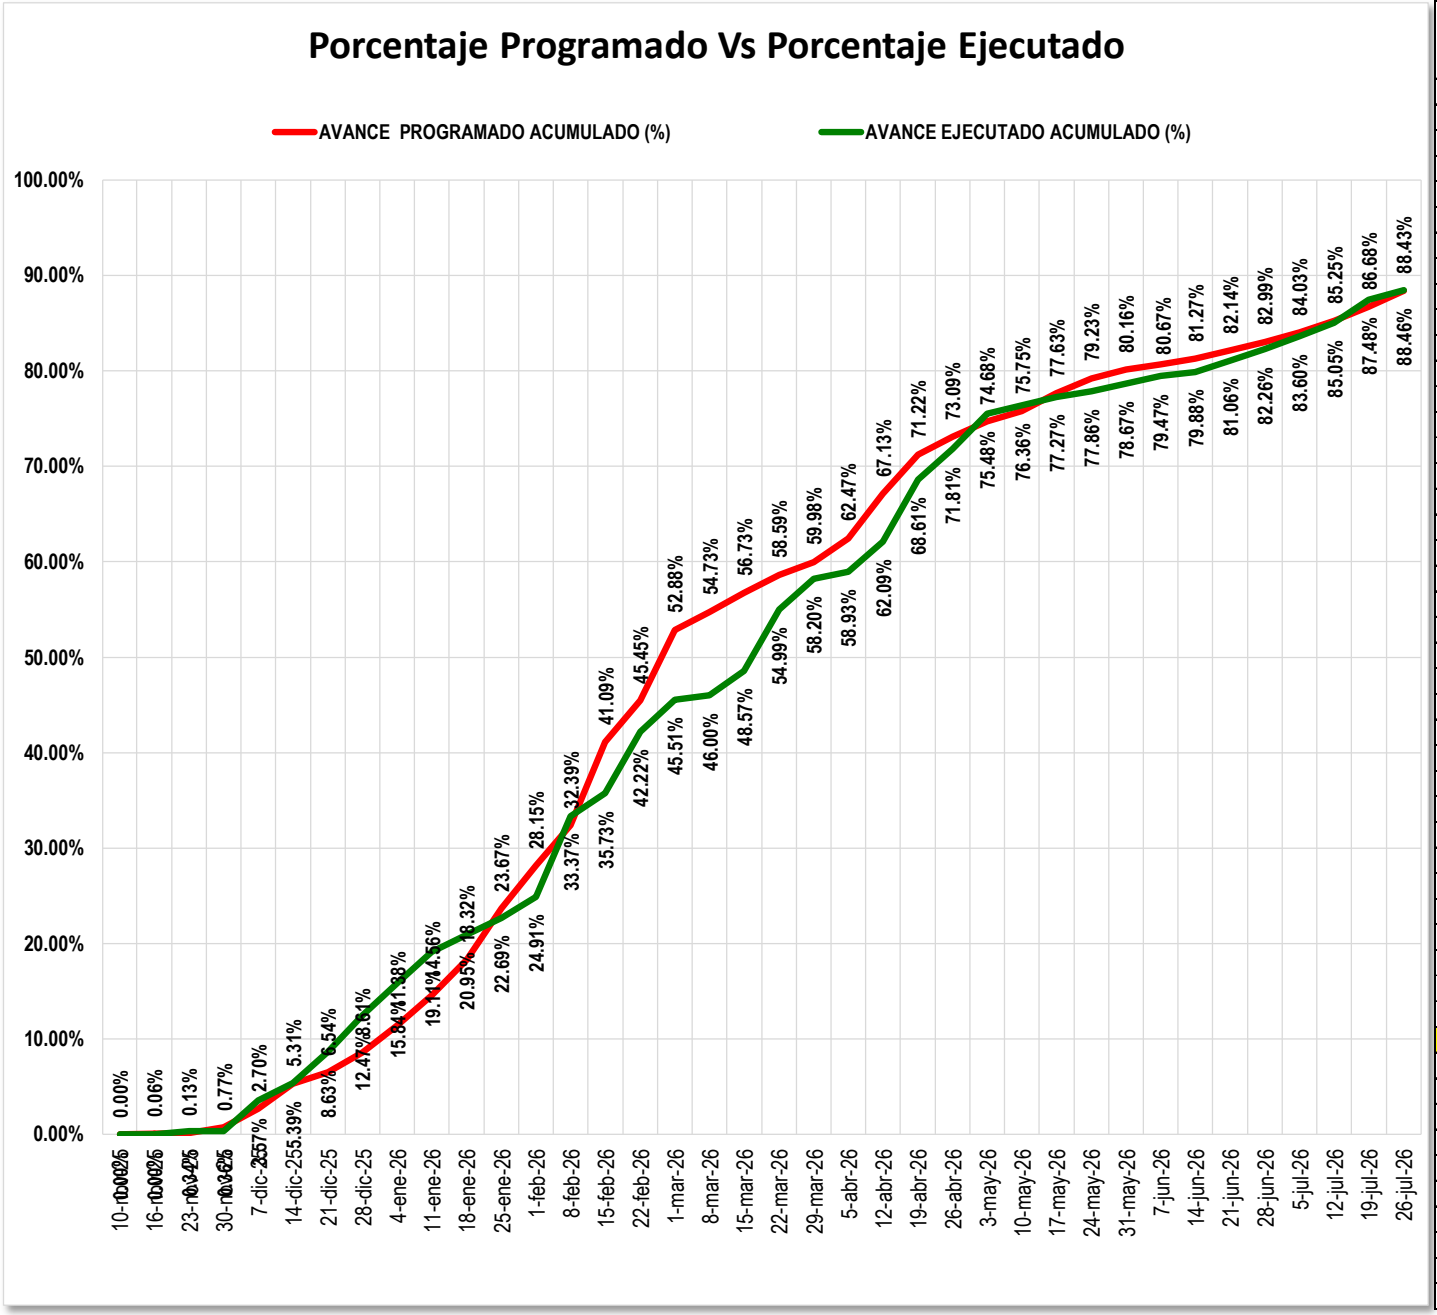
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	0.00%
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 213,404,464.93	95.35%	$ 223,822,666.00	-4.65%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 238,830,504.76	67.37%	$ 270,422,540.23	76.28%	$ 354,505,537.00	8.91%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 155,555,555.56	44.44%	$ 135,272,450.82	38.65%	$ 350,000,000.00	-5.80%
TOTALES	**$ 2,369,499,678.31**	**88.43%**	**$ 2,370,390,407.98**	**88.46%**	**$ 2,679,619,155.00**	0.03%

OBSERVACIONES: De acuerdo a la información contenida en la tabla anterior, encontramos que de los tres (3) frentes de mejoramientos en ejecución, la ***IED Santa Librada*** continúa registrando un atraso por encima del 4%, ***IED Ciudad de Villavicencio*** con un atraso cercano al 6%, y por último ***IED Guillermo Cano Isaza,*** sede que solicitó una reprogramación con adición de 2 semanas, registra un adelanto que roza el 9%. El contrato en general se encuentra practicamente nivelado entre los avances ejecutados y programados.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Julio 26 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.06%	0.00%
23-nov-25	0.13%	0.34%
30-nov-25	0.77%	0.36%
7-dic-25	2.70%	3.57%
14-dic-25	5.31%	5.39%
21-dic-25	6.54%	8.63%
28-dic-25	8.61%	12.47%
4-ene-26	11.38%	15.84%
11-ene-26	14.56%	19.11%
18-ene-26	18.32%	20.95%
25-ene-26	23.67%	22.69%
1-feb-26	28.15%	24.91%
8-feb-26	32.39%	33.37%
15-feb-26	41.09%	35.73%
22-feb-26	45.45%	42.22%
1-mar-26	52.88%	45.51%
8-mar-26	54.73%	46.00%
15-mar-26	56.73%	48.57%
22-mar-26	58.59%	54.99%
29-mar-26	59.98%	58.20%
5-abr-26	62.47%	58.93%
12-abr-26	67.13%	62.09%
19-abr-26	71.22%	68.61%
26-abr-26	73.09%	71.81%
3-may-26	74.68%	75.48%
10-may-26	75.75%	76.36%
17-may-26	77.63%	77.27%
24-may-26	79.23%	77.86%
31-may-26	80.16%	78.67%
7-jun-26	80.67%	79.47%
14-jun-26	81.27%	79.88%
21-jun-26	82.14%	81.06%
28-jun-26	82.99%	82.26%
5-jul-26	84.03%	83.60%
12-jul-26	85.25%	85.05%
19-jul-26	86.68%	87.48%
26-jul-26	**88.43%**	**88.46%**
2-ago-26	90.06%	0.00%
9-ago-26	92.71%	0.00%
16-ago-26	94.92%	0.00%
23-ago-26	95.65%	0.00%
30-ago-26	96.37%	0.00%
6-sep-26	97.10%	0.00%
13-sep-26	97.82%	0.00%
20-sep-26	98.55%	0.00%
27-sep-26	99.27%	0.00%
30-sep-26	100.00%	0.00%

FECHA: 2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME
DIAS RESTANTES 59 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA		GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS
2 de agosto de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,332,049,023.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 291,300,934.00	$ 785,001,422.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	153	148	TOTAL	$ 1,087,485,065.00	$ 3,117,050,445.00
TERMINACION FINAL	5 de octubre de 2026	30 de septiembre de 2026	TOTAL	364	359			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2	5-jun-26	$ 162,875,214.00	107	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2	27-may-26		102	
3				
4				

| POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |

FECHA:	2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 100.00%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	FRENTE AL 100%

28072879
52071222
63396903
2038265
5260774
11337220
18125874
70007566
24,867,651.00
12664106
76,878,564.00


FECHA: 2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 364721023 	 	FRENTE AL 100%
4A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 196 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 100.00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	FRENTE AL 100%
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%


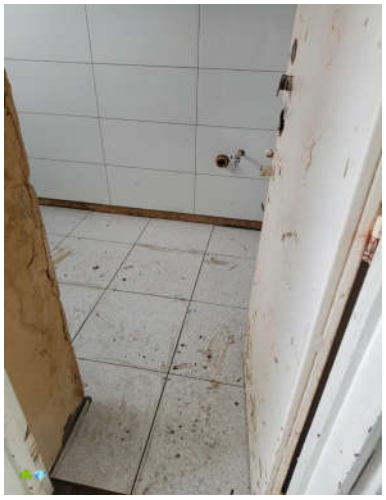
FECHA: 2/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **95.35%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	**NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA - SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE UNA ACTIVIDAD ADICIONAL PARA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA INICIE NUEVAMENTE LAS LABORES EN EL FRENTE DE OBRA**



FECHA: 2/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 100.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**



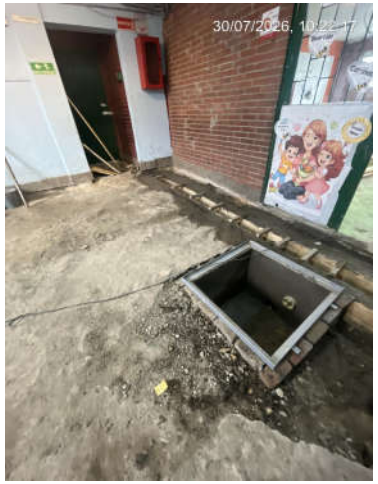
FECHA:	2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 77.79%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%


FECHA: 2/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	EMERGENCIA AL 100%
14A 100.00%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* ADECUACIÓN GRADERIAS, REEMPLAZO ESCALERA TARIMA, ADECUACIÓN TARIMA *MEJORAMIENTO DEL TERRENO AL REDEDRO DE LA TARIMA EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA:	2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166 Dias					
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
15A 100.00%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	*CAMBIO DE PISO AULA BLOQUE DE PRIMARIA SEGUNDO PISO EMERGENCIA	 	 	EMERGENCIA AL 100%
16A 39.74%	CIUDAD DE VILAVICENCIO - PUERTA AL LLANO	☐Mejoramiento correctivo de los pisos en acceso y corredor principal ☐Mejoramiento correctivo del cerramiento metálico ☐Mejoramiento de las redes de aguas lluvias	 	 	    

FECHA: 2/08/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
17A 100.00%	CUNDINAMARCA (IED)	□Adecuación de una estructura en cielo raso PVC, para mitigar el ingreo de palomas al comedor de la institución	 	 	EMERGENCIA AL 100%
17A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	* Cambio de tablero Principal electrico * Adecuación acometidas electricas según alcance de la ficha electrica	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA: 2/09/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
18A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) - EMERGENCIA	* cambio y suministro e instalación de motobombas para tanque de agua potable	 	 	EMERGENCIA AL 100%

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 38				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(266.74)	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	216.59		$ 107,273.69	$ 23,234,421.60	$ (19,587,116.26)	637.03%	637.03%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00		$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	239.56		$ 45,289.29	$ 10,849,501.59	$ (7,543,383.64)	328.16%	328.16%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58		$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	252.37	255.37		$ 361,355.09	$ 92,279,248.29	$ 2,395,784.22	97.47%	97.47%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$ 156,929,147.99				
CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 38				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	(1.76)	-	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.57		$ 91,988.38	$ 420,527.47	$ (258,627.91)	259.75%	259.75%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			2.00		$ 875,947.70	$ 1,751,895.39	$ 875,948.00	66.67%	66.67%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.60			3.60		$ 68,114.71	$ 245,212.96	$ -	100.00%	100.00%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			36.35		$ 1,120,163.13	$ 40,719,658.08	$ (2,880,548.00)	107.61%	107.61%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	(172.00)	-	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	156.06		$ 77,589.44	$ 12,108,607.88	$ (12,108,608.00)	106.85%	106.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84		$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1.00			24.00		$ 23,315.15	$ 559,563.51	$ (536,248.00)	2400.00%	2400.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	24.00			24.00		$ 20,790.98	$ 498,983.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	(98.31)	95.45	105.45		$ 29,785.43	$ 3,140,873.57	$ 2,630,351.00	54.42%	54.42%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	86.20		$ 29,785.43	$ 2,567,504.05	$ (727,956.00)	139.57%	139.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	15.10		$ 264,771.67	$ 3,998,052.18	$ 5,756,136.00	40.99%	40.99%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	537.24			537.24		$ 4,663.84	$ 2,505,600.70	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA			**$ 118,699,548.00**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	(104.13)	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	-	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	183.63		$ 36,752.18	$ 6,748,803.22	$ (574,436.61)	109.30%	109.30%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,608.92		$ 23,042.63	$ 60,116,373.04	$ (84,914,618.87)	-242.42%	-242.42%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	30		$ 304,166.74	$ 9,125,002.11	$ (2,281,250.53)	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			65.10		$ 17,207.77	$ 1,120,195.60	$ (58,476.16)	105.51%	105.51%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA			**$ 169,766,274.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56		$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	(36.51)	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70		$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			680.68		$ 65,757.83	$ 44,760,026.89	$ 2,191,065.00	95.33%	95.33%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 2,042,059.82	$ 34,612,913.93	$ 1,123,133.00	96.86%	96.86%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			16.95		$ 1,257,854.97	$ 21,320,641.75	$ 691,820.00	96.86%	96.86%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			125.78		$ 237,210.90	$ 29,836,007.59	$ 1,001,410.00	96.75%	96.75%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			194.54		$ 5,046.98	$ 981,840.09	$ 15,141.00	98.48%	98.48%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,078.76			1,078.76		$ 4,663.84	$ 5,031,162.64	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 630,139,470.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	81.17	133.00	133.00		$ 31,110.25	$ 4,137,662.72	$ (2,525,218.67)	256.61%	256.61%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	11.28	246.57	246.57		$ 32,594.26	$ 8,036,765.70	$ (367,663.21)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05	0.08	15.13	15.13		$ 66,591.58	$ 1,007,530.54	$ (5,327.33)	100.53%	100.53%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			3.00	3.00		$ 25,731.38	$ 77,194.15	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3			63.85	63.85		$ 34,724.48	$ 2,217,158.36	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			120.60	120.60		$ 15,633.37	$ 1,885,384.52	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 32,569.97	$ 1,633,058.41	$ 168,061.06	90.67%	90.67%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			2.80	2.80		$ 18,044.21	$ 50,523.80	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	2.49	15.29	15.29		$ 135,394.33	$ 2,070,179.26	$ (337,131.87)	119.45%	119.45%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 42,650.45	$ 8,302,762.60	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 45,289.29	$ 2,233,214.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	(56.05)	102.71	102.71		$ 7,103.01	$ 729,550.31	$ 398,123.79	64.70%	64.70%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 164,788.52	$ 20,104,199.16	$ 8,173,510.48	71.10%	71.10%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2			0.64	0.64		$ 115,264.41	$ 73,769.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M			13.00	13.00		$ 156,990.72	$ 2,040,879.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M			20.50	20.57		$ 24,290.55	$ 499,656.52	$ (1,700.34)	100.34%	100.34%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			2.00		$ 126,905.79	$ 253,811.58	$ (253,811.58)	100.00%	100.00%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			1.00		$ 253,721.19	$ 253,721.19	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00	-27.00	5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ 629,508.95	15.63%	15.63%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			55.00	55.00		$ 33,700.52	$ 1,853,528.49	$ (1,853,528.49)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	(12.00)	20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ 249,491.76	62.50%	62.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN			8.00	8.00		$ 198,607.76	$ 1,588,862.05	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	-5.00	3.00	3.00		$ 238,055.44	$ 714,166.32	$ 1,190,277.20	37.50%	37.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN			1.00	1.00		$ 781,835.83	$ 781,835.83	$ (781,835.83)	100.00%	100.00%	
ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M			60.00	60.00		$ 57,049.39	$ 3,422,963.50	$ (3,422,963.50)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	(2.42)	12.58	12.58		$ 361,355.09	$ 4,545,846.98	$ 874,479.31	83.87%	83.87%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30	-5.16	50.14	50.14		$ 130,345.99	$ 6,535,548.17	$ 672,585.33	90.67%	90.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			39.00	39.00		$ 22,829.47	$ 890,349.34	$ (890,349.34)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	-	5.29	5.29	5.29		$ 62,023.52	$ 328,104.44	$ (328,104.44)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00	2.90	20.90	20.90		$ 15,372.99	$ 321,295.59	$ (44,581.68)	116.11%	116.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	(37.64)	93.36	93.36		$ 98,222.57	$ 9,170,059.56	$ 3,697,097.71	71.27%	71.27%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-5.49	6.24	6.24		$ 1,127,900.21	$ 7,038,097.34	$ 6,192,172.18	53.20%	53.20%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-8.24	39.58	40.99		$ 989,338.00	$ 40,552,909.59	$ 6,757,233.57	85.72%	85.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00		$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2			3.84	3.84		$ 798,362.30	$ 3,065,711.25	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			102.46	102.46		$ 91,590.40	$ 9,384,352.28	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			1.65	1.65		$ 78,726.73	$ 129,899.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M			24.00	24.00		$ 51,125.49	$ 1,227,011.85	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11.00			11.00		$ 18,869.86	$ 207,568.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	28.00			28.00		$ 4,998.42	$ 139,955.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	14.00			14.00		$ 63,533.17	$ 889,464.33	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7.20	0.56	7.76	7.76		$ 123,260.52	$ 956,501.65	$ (69,025.89)	107.78%	107.78%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			24.00	24.00		$ 33,569.66	$ 805,671.73	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		22.64	22.64		$ 32,026.28	$ 725,075.09	$ (725,075.09)	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M			122.00	122.00		$ 32,026.28	$ 3,907,206.76	$ -	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,201.02			1,201.02		$ 4,663.84	$ 5,601,363.56	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 245,187,661.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	35.81		$ 829,259.39	$ 29,695,861.74	$ (8,292,676.84)	138.75%	138.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			69.15		$ 467,649.33	$ 32,338,268.71	$ 8,464,135.19	79.26%	79.26%	

ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			148.20		$ 22,829.47	$ 3,383,236.17	$ (159,714.97)	104.95%	104.95%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			148.20		$ 17,207.77	$ 2,550,122.76	$ (120,385.56)	104.95%	104.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			597.76		$ 4,663.84	$ 2,787,856.22	$ (93,276.77)	103.46%	103.46%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 78,637,768.00**				
CPF	**1974**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	95.00		$ 31,137.23	$ 2,958,036.66	$ (520,614.00)	121.36%	121.36%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	408.30		$ 36,752.18	$ 15,005,915.99	$ 4,796,895.00	75.78%	75.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	902.53		$ 23,042.63	$ 20,796,663.05	$ 21,634,032.15	49.01%	49.01%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			46.69		$ 130,345.99	$ 6,086,241.01	$ (351,017.24)	106.12%	106.12%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186,826,436.00**				
CPF	**546**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 38**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18	-78.18	50.00	50.00		$ 31,110.25	$ 1,555,512.30	$ 2,432,199.03	39.01%	39.01%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90		0.80	0.80		$ 32,594.26	$ 26,075.40	$ 2,187,074.58	1.18%	1.18%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			18.00	18.00		$ 22,829.47	$ 410,930.46	$ (410,930.46)	100.00%	100.00%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87	28.85	92.72	92.72		$ 34,724.48	$ 3,219,654.24	$ (1,001,801.39)	145.17%	145.17%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			73.27	73.27		$ 36,752.18	$ 2,692,832.39	$ -	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	(16.47)	-			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	100.00	(20.61)	79.39	79.39		$ 53,568.71	$ 4,252,820.18	$ 4,252,820.18	79.39%	79.39%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83	(180.01)	96.22	96.22		$ 45,289.29	$ 4,357,735.20	$ 4,357,735.20	34.14%	34.14%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			12.54	12.54		$ 193,996.53	$ 2,432,716.52	$ 2,432,716.52	100.00%	100.00%	

PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	-143.06	190.87	190.87		$ 69,679.67	$ 13,299,757.83	$ 13,299,757.83	57.16%	57.16%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M			19.35	19.35		$ 91,590.40	$ 1,772,274.22	$ 1,772,274.22	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M			8.10	8.10		$ 78,726.73	$ 637,686.52	$ 637,686.52	100.00%	100.00%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			37.00		$ 16,863.75	$ 623,958.75	$ 623,958.75	77.08%	77.08%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	179.08		$ 16,863.75	$ 3,019,960.35	$ 3,019,960.35	162.80%	162.80%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	59.92		$ 34,369.67	$ 2,059,599.55	$ 2,059,599.55	16.80%	16.80%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20	-1.32	5.88	5.88		$ 157,817.72	$ 927,968.18	$ 927,968.18	81.67%	81.67%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	-0.12	5.88	5.88		$ 101,978.47	$ 599,633.40	$ 599,633.40	98.00%	98.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M			17.20	20.20		$ 305,515.84	$ 6,171,419.91	$ 6,171,419.91	117.44%	117.44%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	(23.61)	311.99	311.99		$ 361,355.09	$ 112,739,173.09	$ 112,739,173.09	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2			190.00	190.00		$ 11,730.42	$ 2,228,757.19	$ 2,228,757.19	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN			8.00	8.00		$ 33,502.20	$ 268,017.60	$ 268,017.60	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3			37.42	37.42		$ 258,201.55	$ 9,661,902.03	$ 9,661,902.03	100.00%	100.00%	
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2			190.84	200.84		$ 29,001.60	$ 5,824,681.89	$ 5,824,681.89	105.24%	105.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	130.00			130.00		$ 89,213.28	$ 11,597,727.02	$ 11,597,727.02	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	617.33			586.46		$ 4,663.84	$ 2,735,154.84	$ 2,735,154.84	95.00%	95.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			**$ 213,404,464.93**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 38				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	(2.49)	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.38		$ 1,127,967.67	$ 2,680,941.73	$ (244,532.00)	110.04%	110.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	42.64		$ 989,338.20	$ 42,185,380.90	$ (13,672,654.00)	147.95%	147.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.10		$ 21,599.09	$ 758,128.09	$ 8,640.00	98.87%	98.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 76,163,937.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 38				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			125.48		$ 4,233.48	$ 531,216.54	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			32.20		$ 31,110.25	$ 1,001,749.92	$ 1,113,747.00	47.35%	47.35%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54	18.57	148.11	148.11		$ 32,594.26	$ 4,827,535.26	$ (605,275.00)	114.34%	114.34%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			150.00		$ 11,376.96	$ 1,706,544.05	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			40.00		$ 7,469.97	$ 298,798.67	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			100.00		$ 18,687.73	$ 1,868,773.32	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	95.87	17.32	113.19	113.19		$ 22,300.62	$ 2,524,207.52	$ (386,247.00)	118.07%	118.07%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	(31.38)	332.88	364.26		$ 12,649.16	$ 4,607,583.60	$ -	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	3.16	10.36	10.20		$ 65,869.81	$ 671,872.04	$ (197,609.00)	141.67%	141.67%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	22.00	37.00	59.00	37.00		$ 20,708.69	$ 766,221.35	$ (310,630.00)	168.18%	168.18%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			26.11		$ 33,174.37	$ 866,182.77	$ 16,587.00	98.12%	98.12%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			53.00		$ 27,281.50	$ 1,445,919.51	$ 682,038.00	67.95%	67.95%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M			19.00	19.00		$ 11,967.87	$ 227,389.46	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			16.00	16.00		$ 7,469.97	$ 119,519.47	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M			58.00	58.00		$ 4,391.32	$ 254,696.59	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	118.18	153.18	153.18		$ 61,099.39	$ 9,359,204.54	$ (7,220,726.00)	437.66%	437.66%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	30.05	159.59	145.24	5.71	$ 126,224.49	$ 18,332,845.54	$ (1,981,725.00)	112.12%	112.12%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00	52.83	82.83	34.20	12.00	$ 15,372.99	$ 525,756.41	$ (64,567.00)	114.00%	114.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	7.20	16.32	23.52	16.71		$ 1,128,300.90	$ 18,853,908.00	$ (10,730,142.00)	232.08%	232.08%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			364.26		$ 36,193.65	$ 13,183,900.70	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10		$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			96.79		$ 989,338.20	$ 95,760,548.36	$ 38,176,057.00	71.50%	71.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	37.00			37.00		$ 18,869.86	$ 698,184.88	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	37.00			37.00		$ 63,533.17	$ 2,350,727.15	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	7.00	29.00	29.00		$ 63,533.17	$ 1,842,461.82	$ (444,732.00)	131.82%	131.82%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	37.00			37.00		$ 181,838.44	$ 6,728,022.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	38.00			38.00		$ 97,295.74	$ 3,697,238.23	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	22.00			22.00		$ 5,565.04	$ 122,430.83	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	74.03	-30.18	43.85	21.06		$ 13,044.45	$ 274,716.07	$ 690,964.00	28.45%	28.45%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	20.88			9.36		$ 123,260.52	$ 1,153,718.48	$ 1,419,961.00	44.83%	44.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			13.00	6.00		$ 192,677.11	$ 1,156,062.68	$ (1,156,063.00)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	3.00			3.00		$ 572,567.48	$ 1,717,702.45	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	56.00	106.00	65.00	15.00	$ 23,315.15	$ 1,515,484.50	$ (349,727.00)	130.00%	130.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	50.00	(4.00)	46.00	30.00		$ 20,790.98	$ 623,729.40	$ 415,820.00	60.00%	60.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	36.90			36.90		$ 21,844.63	$ 806,066.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00			10.00		$ 180,330.15	$ 1,803,301.50	$ 3,967,263.00	31.25%	31.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18.00			18.00		$ 198,607.76	$ 3,574,939.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ 2,163,962.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	0.60	6.00	3.00		$ 989,338.20	$ 2,968,014.60	$ 2,374,412.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00			6.00		$ 772,427.21	$ 4,634,563.23	$ 4,634,563.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00			5.00		$ 41,130.01	$ 205,650.06	$ 287,910.00	41.67%	41.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00	-8.00	37.00	24.00	3.00	$ 1,117,185.66	$ 26,812,455.90	$ 23,460,899.00	53.33%	53.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	(24.03)	340.23	330.72	7.50	$ 98,222.57	$ 32,484,169.87	$ 3,294,385.00	97.20%	97.20%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	m2	205.61			116.79		$ 4,663.84	$ 544,689.72	$ 414,242.00	56.80%	56.80%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 275,765,711.51**				

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 38				Observ
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	55.16		$ 361,355.09	$ 19,932,346.54	$ (3,931,543.00)	124.57%	124.57%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	30.36		$ 190,851.78	$ 5,794,260.06	$ 2,412,367.00	70.60%	70.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50	(0.80)	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	116.77		$ 383,249.63	$ 44,750,287.29	$ 12,737,157.00	77.84%	77.84%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							$ 88,940,710.00				

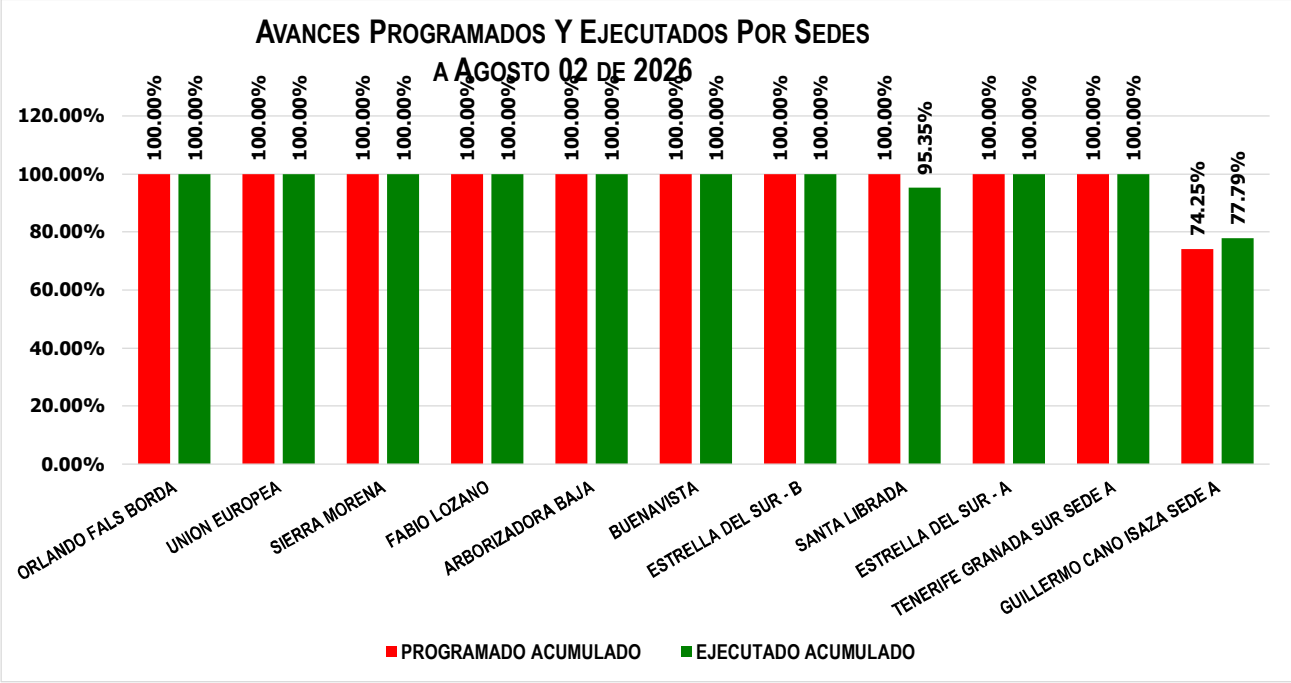
CPF	545	IED			CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)			SEMANA 38				Observ
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	540.76			540.76		$ 4,233.48	$ 2,289,294.37	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M)	M	35.00			35.00		$ 31,110.25	$ 1,088,858.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.30		-	107.30		$ 69,099.55	$ 7,414,382.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.06 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	361.42			361.42		$ 69,099.55	$ 24,973,960.41	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M2	120.00			120.00		$ 108,358.36	$ 13,003,003.55	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	37.24			31.65		$ 91,988.38	$ 2,911,432.34	$ 514,215.00	84.99%	84.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.04			14.33	3.83	$ 176,060.25	$ 2,522,943.36	$ 1,357,425.00	65.02%	65.02%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	9.00	(2.00)	7.00	7.00		$ 875,947.70	$ 6,131,633.87	$ 1,751,895.00	77.78%	77.78%	

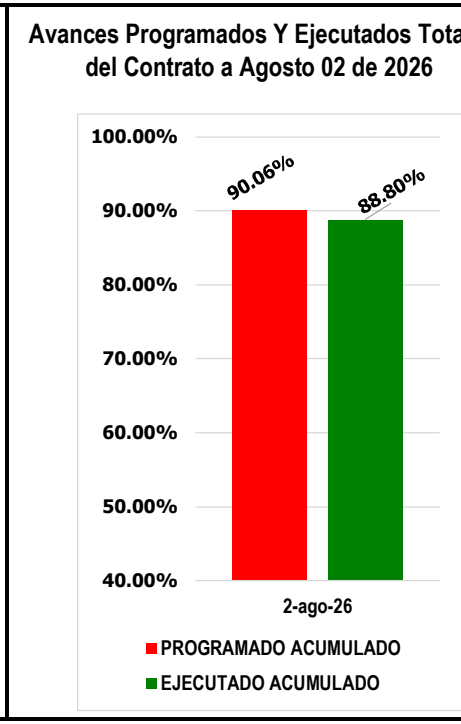
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	120.00			114.84		$ 503,048.36	$ 57,770,073.74	$ 2,595,730.00	95.70%	95.70%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	9.00			8.00	3.50	$ 320,598.77	$ 2,564,790.20	$ 320,599.00	88.89%	88.89%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	m3	94.84			53.39		$ 34,724.48	$ 1,853,940.25	$ 1,439,330.00	56.29%	56.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	54.00			45.50	3.50	$ 89,213.28	$ 4,059,204.46	$ 758,313.00	84.26%	84.26%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	25.00			25.00		$ 11,730.42	$ 293,260.61	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	45.00			35.79	18.59	$ 91,590.40	$ 3,278,020.38	$ 843,548.00	79.53%	79.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	68.00			63.00		$ 141,729.70	$ 8,928,971.13	$ 708,649.00	92.65%	92.65%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 139,083,769.30**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**88.80%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**2,379,544,897.74**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,679,619,155.00**

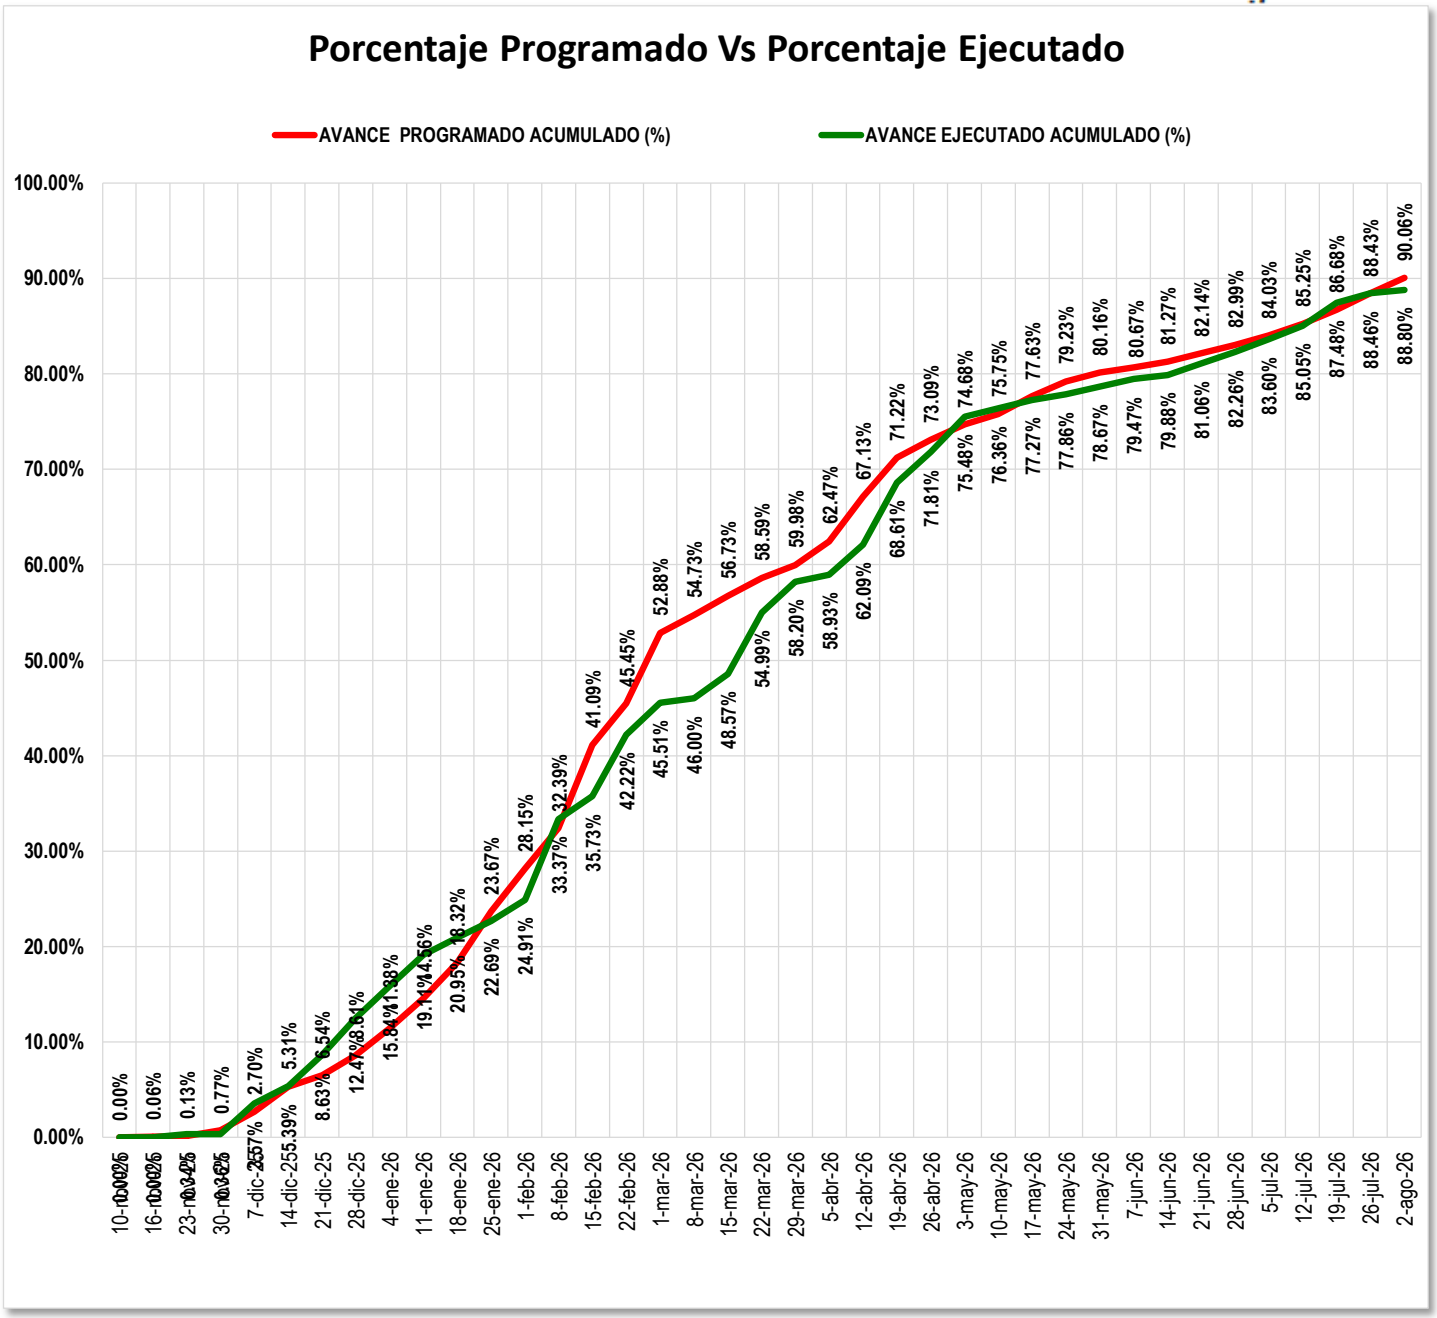
AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Agosto 02 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 156,929,148.00	100.00%	$ 156,929,147.99	100.00%	$ 156,929,148.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	100.00%	$ 169,766,274.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	100.00%	$ 118,699,548.00	ENTREGADO
FABIO LOZANO	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	100.00%	$ 245,187,661.00	0.00%
ARBORIZADORA BAJA	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	100.00%	$ 630,139,470.00	ENTREGADO
BUENAVISTA	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	100.00%	$ 186,826,436.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	100.00%	$ 78,637,768.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 223,822,666.00	100.00%	$ 213,404,464.93	95.35%	$ 223,822,666.00	-4.65%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	100.00%	$ 76,163,937.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	100.00%	$ 88,940,710.00	ENTREGADO
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 263,212,563.50	74.25%	$ 275,765,711.51	77.79%	$ 354,505,537.00	3.54%
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 175,000,000.00	50.00%	$ 139,083,769.30	39.74%	$ 350,000,000.00	-10.26%
TOTALES	$ 2,413,326,181.50	90.06%	$ 2,379,544,897.74	88.80%	$ 2,679,619,155.00	-1.26%

OBSERVACIONES: De acuerdo a la información contenida en la tabla anterior, al final del periodo encontramos que de los frentes de mejoramientos de la ***IED Santa Librada*** continúa registrando un atraso por encima del 4% y la ***IED Ciudad de Villavicencio*** con un atraso por encima del 10%. Por último la ***IED Guillermo Cano Isaza,*** luego de la reprogramación y prórroga de dos (2) semanas, registra un adelanto que que supera el 3%. El contrato en general presenta un atraso del 1.26%.





AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Agosto 02 2026



FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,06%	0,00%
23-nov-25	0,13%	0,34%
30-nov-25	0,77%	0,36%
7-dic-25	2,70%	3,57%
14-dic-25	5,31%	5,39%
21-dic-25	6,54%	8,63%
28-dic-25	8,61%	12,47%
4-ene-26	11,38%	15,84%
11-ene-26	14,56%	19,11%
18-ene-26	18,32%	20,95%
25-ene-26	23,67%	22,69%
1-feb-26	28,15%	24,91%
8-feb-26	32,39%	33,37%
15-feb-26	41,09%	35,73%
22-feb-26	45,45%	42,22%
1-mar-26	52,88%	45,51%
8-mar-26	54,73%	46,00%
15-mar-26	56,73%	48,57%
22-mar-26	58,59%	54,99%
29-mar-26	59,98%	58,20%
5-abr-26	62,47%	58,93%
12-abr-26	67,13%	62,09%
19-abr-26	71,22%	68,61%
26-abr-26	73,09%	71,81%
3-may-26	74,68%	75,48%
10-may-26	75,75%	76,36%
17-may-26	77,63%	77,27%
24-may-26	79,23%	77,86%
31-may-26	80,16%	78,67%
7-jun-26	80,67%	79,47%
14-jun-26	81,27%	79,88%
21-jun-26	82,14%	81,06%
28-jun-26	82,99%	82,26%
5-jul-26	84,03%	83,60%
12-jul-26	85,25%	85,05%
19-jul-26	86,68%	87,48%
26-jul-26	88,43%	88,46%
2-ago-26	**90,06%**	**88,80%**
9-ago-26	92,71%	0,00%
16-ago-26	94,92%	0,00%
23-ago-26	95,65%	0,00%
30-ago-26	96,37%	0,00%
6-sep-26	97,10%	0,00%
13-sep-26	97,82%	0,00%
20-sep-26	98,55%	0,00%
27-sep-26	99,27%	0,00%
30-sep-26	100,00%	0,00%

ANEXO No. 03. ACTA PARCIAL DE OBRA

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 006

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 DE JULIO DEL 2026 AL 05 DE AGOSTO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA No.8154780 de 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO PAIS

DIRECCION : CR 82 A # 82 A - 04 CA 2 PISO Bogotá D.C.

C.C. ó NIT : 901974049-8

TELEFONO : 310-259-55-02

INTERVENTOR : CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

DIRECCION : Calle 98 No. 70-91 Bogotá D.C.

C.C. ó NIT : 901977271-0

TELEFONO : 313-735-67-09

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 6

ESTABLECIMIENTOS : LOTE No. 6

LOCALIZACION : ZONA 6 SUR

VR. INICIAL : $ 2,332,049,023.00

ANTICIPO 0% $ 0.00

VR. ADICIONAL : $ 785,001,422.00

VR. FINAL : $ 3,117,050,445.00

PLAZO INICIAL : 7 meses

FECHA INICIACION : octubre 06 del 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : mayo 05 del 2026

PLAZO ADICIONAL MOD 01 : un mes y 15 días

PLAZO ADICIONAL MOD 02 : tres meses y 10 días

TIEMPO SUSPENDIDO : N.A.

PLAZO TOTAL : 11 meses y 25 días

FECHA FINAL : 30 de septiembre del 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	4924	3-sep-25	$ 2,332,049,023.00	$ 51,535,242.00	$ 51,535,242.00	$ 0.00
3697	5-dic-25	7577	22-dic-25	$ 785,001,422.00	$ 785,001,422.00	$ 99,698,265.00	$ 685,303,157.00
TOTAL				$ 3,117,050,445.00	$ 836,536,664.00	$ 151,233,507.00	$ 685,303,157.00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 151,233,507.00

CIENTO CINCUENTA YUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%EJEC.
	1917. ESTRELLA DEL SUR SEDE A		1.00					1		1.00		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	27.19	$ 115,122.46	27.19	$ 115,122.46	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,594.00	-		$ 0.00	17.53	$ 571,372.82	17.53	$ 571,372.82	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,301.00	-		$ 0.00	13.56	$ 302,401.56	13.56	$ 302,401.56	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12,649.00	-		$ 0.00	38.16	$ 482,685.84	38.16	$ 482,685.84	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20,709.00	-		$ 0.00	3.80	$ 78,694.20	3.80	$ 78,694.20	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,175.00	-		$ 0.00	6.34	$ 210,329.50	6.34	$ 210,329.50	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27,282.00	-		$ 0.00	15.00	$ 409,230.00	15.00	$ 409,230.00	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 97,085.00	-		$ 0.00	7.46	$ 724,254.10	7.46	$ 724,254.10	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7,255.00			$ 0.00	14.67	$ 106,430.85	14.67	$ 106,430.85	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2		$ 67,219.00	-		$ 0.00	0.48	$ 32,265.12	0.48	$ 32,265.12	
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1,604.00			$ 0.00	280.00	$ 449,120.00	280.00	$ 449,120.00	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 182,479.00	-		$ 0.00	15.00	$ 2,737,185.00	15.00	$ 2,737,185.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42,650.00	-		$ 0.00	17.36	$ 740,404.00	17.36	$ 740,404.00	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	ML		$ 62,024.00			$ 0.00	7.46	$ 462,699.04	7.46	$ 462,699.04	

7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 126,225.00	-		$ 0.00	17.53	$ 2,212,724.25	17.53	$ 2,212,724.25	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 15,373.00			$ 0.00	4.06	$ 62,414.38	4.06	$ 62,414.38	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 116,159.00	-		$ 0.00	39.41	$ 4,577,826.19	39.41	$ 4,577,826.19	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 707,267.00			$ 0.00	5.20	$ 3,677,788.40	5.20	$ 3,677,788.40	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 1,127,967.00	-		$ 0.00	2.28	$ 2,571,764.76	2.28	$ 2,571,764.76	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 873,471.00	-		$ 0.00	8.00	$ 6,987,768.00	8.00	$ 6,987,768.00	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 616,820.00	-		$ 0.00	2.00	$ 1,233,640.00	2.00	$ 1,233,640.00	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 404,611.00	-		$ 0.00	5.00	$ 2,023,055.00	5.00	$ 2,023,055.00	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 41,130.00	-		$ 0.00	2.00	$ 82,260.00	2.00	$ 82,260.00	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 989,338.00	-		$ 0.00	41.64	$ 41,196,034.32	41.64	$ 41,196,034.32	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36,194.00	-		$ 0.00	40.80	$ 1,476,715.20	40.80	$ 1,476,715.20	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,599.00	-		$ 0.00	41.95	$ 906,078.05	41.95	$ 906,078.05	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 123,260.00	-		$ 0.00	2.04	$ 251,450.40	2.04	$ 251,450.40	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ 0.00	140.85	$ 656,924.40	140.85	$ 656,924.40	
	1904. ARBORIZADORA BAJA SEDE A											
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 7,045.00	-		$ 0.00	1,262.70	$ 8,895,721.50	1,262.70	$ 8,895,721.50	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	181.18	$ 5,636,509.80	181.18	$ 5,636,509.80	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107,273.00	-		$ 0.00	480.55	$ 51,550,040.15	480.55	$ 51,550,040.15	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,594.00	-		$ -	150.24	$ 4,896,922.56	150.24	$ 4,896,922.56	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36,752.00	-		$ 0.00	323.02	$ 11,871,631.04	323.02	$ 11,871,631.04	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML		$ 21,489.00			$ 0.00	15.00	$ 322,335.00	15.00	$ 322,335.00	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8,680.00	-		$ 0.00	35.50	$ 308,140.00	35.50	$ 308,140.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,470.00	-		$ 0.00	25.00	$ 186,750.00	25.00	$ 186,750.00	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 398,950.00	-		$ 0.00	2.00	$ 797,900.00	2.00	$ 797,900.00	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,762.00			$ 0.00	70.79	$ 832,631.98	70.79	$ 832,631.98	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	18.67	$ 2,527,824.65	18.67	$ 2,527,824.65	
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 79,963.00	-		$ 0.00	221.59	$ 17,719,001.17	221.59	$ 17,719,001.17	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21,703.00	-		$ 0.00	21.00	$ 455,763.00	21.00	$ 455,763.00	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 176,060.00	-		$ 0.00	171.36	$ 30,169,641.60	171.36	$ 30,169,641.60	
2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3		$ 166,458.00	-		$ 0.00	154.95	$ 25,792,667.10	154.95	$ 25,792,667.10	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 97,085.00			$ 0.00	73.00	$ 7,087,205.00	73.00	$ 7,087,205.00	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 115,265.00			$ 0.00	31.95	$ 3,682,716.75	31.95	$ 3,682,716.75	
2.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2		$ 69,869.00	-		$ -	131.51	$ 9,188,472.19	131.51	$ 9,188,472.19	
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 164,788.00	-		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	

2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M		$ 156,991.00	-		$ -	0.90	$ 141,291.90	0.90	$ 141,291.90	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7,255.00	-		$ -	466.17	$ 3,382,063.35	466.17	$ 3,382,063.35	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 23,042.00	-		$ 0.00	1,667.26	$ 38,417,004.92	1,667.26	$ 38,417,004.92	
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 11,730.00	-		$ 0.00	608.00	$ 7,131,840.00	608.00	$ 7,131,840.00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 572,567.00	-		$ -	1.00	$ 572,567.00	1.00	$ 572,567.00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 238,055.00	-		$ -	28.00	$ 6,665,540.00	28.00	$ 6,665,540.00	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 193,810.00	-		$ -	3.00	$ 581,430.00	3.00	$ 581,430.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42,650.00	-		$ 0.00	19.86	$ 847,029.00	19.86	$ 847,029.00	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M		$ 34,369.00	-		$ -	32.69	$ 1,123,522.61	32.69	$ 1,123,522.61	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 126,134.00	-		$ -	2.79	$ 351,913.86	2.79	$ 351,913.86	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 62,024.00	-		$ -	64.05	$ 3,972,637.20	64.05	$ 3,972,637.20	
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2		$ 237,210.00	-		$ -	131.51	$ 31,195,487.10	131.51	$ 31,195,487.10	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 65,757.00	-		$ 0.00	660.96	$ 43,462,746.72	660.96	$ 43,462,746.72	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M		$ 18,365.00	-		$ -	353.72	$ 6,496,067.80	353.72	$ 6,496,067.80	
9.3.2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M		$ 2,042,060.00			$ -	17.50	$ 35,736,050.00	17.50	$ 35,736,050.00	
9.3.3	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M		$ 1,257,855.00			$ -	17.50	$ 22,012,462.50	17.50	$ 22,012,462.50	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A	M		$ 9,167.00	-		$ -	194.18	$ 1,780,048.06	194.18	$ 1,780,048.06	
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN		$ 12,850,062.00	-		$ 0.00	1.00	$ 12,850,062.00	1.00	$ 12,850,062.00	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO	M		$ 106,267.00	-		$ -	36.05	$ 3,830,925.35	36.05	$ 3,830,925.35	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 264,771.00	-		$ 0.00	323.02	$ 85,526,328.42	323.02	$ 85,526,328.42	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100	M		$ 305,516.00	-		$ -	35.50	$ 10,845,818.00	35.50	$ 10,845,818.00	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ 0.00	546.00	$ 2,546,544.00	546.00	$ 2,546,544.00	
	1913. SIERRA MORENA IED SEDE C							1		1		
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 7,045.00	-		$ 0.00	99.61	$ 701,752.45	99.61	$ 701,752.45	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	53.00	$ 1,648,830.00	53.00	$ 1,648,830.00	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107,273.00	-		$ 0.00	35.01	$ 3,755,627.73	35.01	$ 3,755,627.73	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 27,509.00	-		$ 0.00	26.00	$ 715,234.00	26.00	$ 715,234.00	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 21,489.00	-		$ 0.00	28.00	$ 601,692.00	28.00	$ 601,692.00	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,762.00	-		$ 0.00	14.00	$ 164,668.00	14.00	$ 164,668.00	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	9.13	$ 1,236,156.35	9.13	$ 1,236,156.35	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21,703.00	-		$ 0.00	12.29	$ 266,729.87	12.29	$ 266,729.87	

2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 176,060.00	-		$ 0.00	19.98	$ 3,517,678.80	19.98	$ 3,517,678.80	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 193,997.00	-		$ 0.00	60.66	$ 11,767,858.02	60.66	$ 11,767,858.02	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 165,931.00	-		$ 0.00	11.84	$ 1,964,623.04	11.84	$ 1,964,623.04	
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 164,788.00	-		$ 0.00	12.20	$ 2,010,413.60	12.20	$ 2,010,413.60	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 358,769.00	-		$ 0.00	2.69	$ 965,088.61	2.69	$ 965,088.61	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7,255.00	-		$ 0.00	53.96	$ 391,479.80	53.96	$ 391,479.80	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7,103.00	-		$ 0.00	91.12	$ 647,225.36	91.12	$ 647,225.36	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA,	KG		$ 23,042.00	-		$ 0.00	319.31	$ 7,357,541.02	319.31	$ 7,357,541.02	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 146,133.00	-		$ 0.00	16.36	$ 2,390,735.88	16.36	$ 2,390,735.88	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 143,601.00	-		$ 0.00	16.00	$ 2,297,616.00	16.00	$ 2,297,616.00	
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 652,386.00	-		$ 0.00	1.00	$ 652,386.00	1.00	$ 652,386.00	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 875,948.00	-		$ 0.00	1.00	$ 875,948.00	1.00	$ 875,948.00	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 126,906.00	-		$ 0.00	1.00	$ 126,906.00	1.00	$ 126,906.00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 211,700.00	-		$ 0.00	1.00	$ 211,700.00	1.00	$ 211,700.00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 572,567.00	-		$ 0.00	1.00	$ 572,567.00	1.00	$ 572,567.00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 29,325.00	-		$ 0.00	1.00	$ 29,325.00	1.00	$ 29,325.00	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		$ 31,085.00	-		$ 0.00	1.00	$ 31,085.00	1.00	$ 31,085.00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 23,315.00	-		$ 0.00	9.00	$ 209,835.00	9.00	$ 209,835.00	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 33,701.00	-		$ 0.00	56.41	$ 1,901,073.41	56.41	$ 1,901,073.41	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 180,330.00	-		$ 0.00	1.00	$ 180,330.00	1.00	$ 180,330.00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 198,607.00	-		$ 0.00	1.00	$ 198,607.00	1.00	$ 198,607.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 781,970.00	-		$ 0.00	1.00	$ 781,970.00	1.00	$ 781,970.00	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M		$ 57,777.00	-		$ 0.00	65.41	$ 3,779,193.57	65.41	$ 3,779,193.57	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 45,289.00	-		$ 0.00	4.04	$ 182,967.56	4.04	$ 182,967.56	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 126,225.00	-		$ 0.00	4.08	$ 514,998.00	4.08	$ 514,998.00	
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		$ 77,589.00	-		$ 0.00	146.06	$ 11,332,649.34	146.06	$ 11,332,649.34	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 98,222.00	-		$ 0.00	15.53	$ 1,525,387.66	15.53	$ 1,525,387.66	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 159,159.00	-		$ 0.00	17.00	$ 2,705,703.00	17.00	$ 2,705,703.00	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 798,362.00			$ 0.00	5.40	$ 4,311,154.80	5.40	$ 4,311,154.80	
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M		$ 190,852.00			$ 0.00	33.81	$ 6,452,706.12	33.81	$ 6,452,706.12	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR	M		$ 1,120,163.00	-		$ 0.00	33.21	$ 37,200,613.23	33.21	$ 37,200,613.23	

12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36,194.00	-		$ 0.00	45.40	$ 1,643,207.60	45.40	$ 1,643,207.60	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 29,785.00	-		$ 0.00	73.00	$ 2,174,305.00	73.00	$ 2,174,305.00	
12.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19,868.00	-		$ 0.00	76.40	$ 1,517,915.20	76.40	$ 1,517,915.20	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 264,771.00	-		$ 0.00	13.10	$ 3,468,500.10	13.10	$ 3,468,500.10	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ 0.00	433.80	$ 2,023,243.20	433.80	$ 2,023,243.20	
	523. FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A							1		1.00		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	1,211.07	$ 5,127,670.38	1,211.07	$ 5,127,670.38	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	130.00	$ 4,044,300.00	130.00	$ 4,044,300.00	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107,273.00	-		$ -	68.70	$ 7,369,655.10	68.70	$ 7,369,655.10	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,594.00	-		$ 0.00	246.57	$ 8,036,702.58	246.57	$ 8,036,702.58	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,301.00	-		$ 0.00	29.99	$ 668,806.99	29.99	$ 668,806.99	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12,649.00	-		$ 0.00	85.50	$ 1,081,489.50	85.50	$ 1,081,489.50	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20,709.00	-		$ 0.00	28.00	$ 579,852.00	28.00	$ 579,852.00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,175.00	-		$ 0.00	17.32	$ 574,591.00	17.32	$ 574,591.00	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27,282.00	-		$ 0.00	28.00	$ 763,896.00	28.00	$ 763,896.00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20,709.00	-		$ 0.00	66.00	$ 1,366,794.00	66.00	$ 1,366,794.00	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,570.00	-		$ 0.00	50.14	$ 1,633,059.80	50.14	$ 1,633,059.80	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25,731.00	-		$ 0.00	3.00	$ 77,193.00	3.00	$ 77,193.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,470.00	-		$ 0.00	8.00	$ 59,760.00	8.00	$ 59,760.00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,044.00	-		$ 0.00	2.80	$ 50,523.20	2.80	$ 50,523.20	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 18,688.00	-		$ 0.00	22.90	$ 427,955.20	22.90	$ 427,955.20	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 34,725.00			$ 0.00	73.61	$ 2,556,107.25	73.61	$ 2,556,107.25	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15,633.00	-		$ 0.00	120.60	$ 1,885,339.80	120.60	$ 1,885,339.80	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	15.29	$ 2,070,189.55	15.29	$ 2,070,189.55	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 66,592.00	-		$ 0.00	15.13	$ 1,007,536.96	15.13	$ 1,007,536.96	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 115,265.00			$ 0.00	0.64	$ 73,769.60	0.64	$ 73,769.60	
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 164,788.00	-		$ 0.00	121.97	$ 20,099,192.36	121.97	$ 20,099,192.36	
2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M		$ 27,185.00	-		$ 0.00	7.40	$ 201,169.00	7.40	$ 201,169.00	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M		$ 156,991.00	-		$ -	8.37	$ 1,314,014.67	8.37	$ 1,314,014.67	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7,103.00	-		$ 0.00	102.71	$ 729,549.13	102.71	$ 729,549.13	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91,590.00	-		$ 0.00	102.46	$ 9,384,311.40	102.46	$ 9,384,311.40	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 78,727.00	-		$ 0.00	1.65	$ 129,899.55	1.65	$ 129,899.55	

4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 51,126.00	-		$ 0.00	24.00	$ 1,227,024.00	24.00	$ 1,227,024.00	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN		$ 18,870.00	-		$ 0.00	11.00	$ 207,570.00	11.00	$ 207,570.00	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4,998.00	-		$ 0.00	28.00	$ 139,944.00	28.00	$ 139,944.00	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 63,533.00	-		$ 0.00	14.00	$ 889,462.00	14.00	$ 889,462.00	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 63,533.00	-		$ 0.00	14.00	$ 889,462.00	14.00	$ 889,462.00	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 875,948.00	-		$ 0.00	1.00	$ 875,948.00	1.00	$ 875,948.00	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	UN		$ 5,565.00	-		$ 0.00	122.00	$ 678,930.00	122.00	$ 678,930.00	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 126,906.00			$ 0.00	2.00	$ 253,812.00	2.00	$ 253,812.00	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 253,721.00			$ 0.00	1.00	$ 253,721.00	1.00	$ 253,721.00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 572,567.00	-		$ -	1.00	$ 572,567.00	1.00	$ 572,567.00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 29,325.00			$ 0.00	3.00	$ 87,975.00	3.00	$ 87,975.00	
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 184,520.00			$ 0.00	1.00	$ 184,520.00	1.00	$ 184,520.00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 23,315.00			$ 0.00	5.00	$ 116,575.00	5.00	$ 116,575.00	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 33,701.00			$ 0.00	55.00	$ 1,853,555.00	55.00	$ 1,853,555.00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16,070.00			$ 0.00	20.00	$ 321,400.00	20.00	$ 321,400.00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 180,330.00			$ 0.00	8.00	$ 1,442,640.00	8.00	$ 1,442,640.00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 238,055.00			$ -	3.00	$ 714,165.00	3.00	$ 714,165.00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 198,607.00			$ 0.00	8.00	$ 1,588,856.00	8.00	$ 1,588,856.00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 781,970.00			$ 0.00	1.00	$ 781,970.00	1.00	$ 781,970.00	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M		$ 57,777.00			$ 0.00	60.00	$ 3,466,620.00	60.00	$ 3,466,620.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42,650.00	-		$ 0.00	194.64	$ 8,301,396.00	194.64	$ 8,301,396.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 45,289.00	-		$ 0.00	49.31	$ 2,233,200.59	49.31	$ 2,233,200.59	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 62,024.00	-		$ -	5.29	$ 328,106.96	5.29	$ 328,106.96	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 126,225.00	-		$ 0.00	239.08	$ 30,177,873.00	239.08	$ 30,177,873.00	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 15,373.00	-		$ 0.00	20.90	$ 321,295.70	20.90	$ 321,295.70	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 24,291.00			$ 0.00	20.50	$ 497,965.50	20.50	$ 497,965.50	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 98,222.00	-		$ -	93.36	$ 9,170,005.92	93.36	$ 9,170,005.92	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 798,362.00	-		$ 0.00	2.84	$ 2,267,348.08	2.84	$ 2,267,348.08	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 1,127,967.00	-		$ -	6.24	$ 7,038,514.08	6.24	$ 7,038,514.08	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 772,427.00			$ -	3.00	$ 2,317,281.00	3.00	$ 2,317,281.00	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 404,611.00			$ -	14.00	$ 5,664,554.00	14.00	$ 5,664,554.00	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33,570.00			$ -	24.00	$ 805,680.00	24.00	$ 805,680.00	

11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 989,338.00	-		$ -	39.58	$ 39,157,998.04	39.58	$ 39,157,998.04	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 989,338.00			$ -	1.50	$ 1,484,007.00	1.50	$ 1,484,007.00	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36,194.00	-		$ -	93.67	$ 3,390,291.98	93.67	$ 3,390,291.98	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 22,829.00	-		$ -	39.00	$ 890,331.00	39.00	$ 890,331.00	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,599.00	-		$ -	265.74	$ 5,739,718.26	265.74	$ 5,739,718.26	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 32,026.00	-		$ 0.00	22.64	$ 725,068.64	22.64	$ 725,068.64	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 130,346.00	-		$ -	50.14	$ 6,535,548.44	50.14	$ 6,535,548.44	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 123,260.00	-		$ 0.00	7.76	$ 956,497.60	7.76	$ 956,497.60	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 361,355.00			$ -	12.58	$ 4,545,845.90	12.58	$ 4,545,845.90	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	1,166.32	$ 5,439,716.48	1,166.32	$ 5,439,716.48	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 7,170.00	-		$ -	176.38	$ 1,264,644.60	176.38	$ 1,264,644.60	
	1974. CALAZANS BUENA VISTA SEDE A		1							1.00		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ -	478.36	$ 2,025,376.24	478.36	$ 2,025,376.24	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	90.00	$ 2,799,900.00	90.00	$ 2,799,900.00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36,752.00	-		$ -	405.10	$ 14,888,235.20	405.10	$ 14,888,235.20	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,470.00	-		$ -	11.00	$ 82,170.00	11.00	$ 82,170.00	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 23,042.00	-		$ -	596.76	$ 13,750,543.92	596.76	$ 13,750,543.92	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 23,315.00	-		$ -	5.00	$ 116,575.00	5.00	$ 116,575.00	
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 20,790.00	-		$ -	20.00	$ 415,800.00	20.00	$ 415,800.00	
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 101,214.00	-		$ -	1.00	$ 101,214.00	1.00	$ 101,214.00	
5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN		$ 33,643.00	-		$ -	10.00	$ 336,430.00	10.00	$ 336,430.00	
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2		$ 41,495.00			$ -	349.97	$ 14,522,005.15	349.97	$ 14,522,005.15	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 130,346.00	-		$ -	35.09	$ 4,573,841.14	35.09	$ 4,573,841.14	
15.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M		$ 37,697.00	-		$ -	30.00	$ 1,130,910.00	30.00	$ 1,130,910.00	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 106,267.00	-		$ -	83.26	$ 8,847,790.42	83.26	$ 8,847,790.42	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	726.82	$ 3,389,888.48	726.82	$ 3,389,888.48	
18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG		$ 2,311.00	-		$ -	1,983.00	$ 4,582,713.00	1,983.00	$ 4,582,713.00	
	1930. UNION EUROPEA SEDE B									1.00		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	204.52	$ 865,937.68	204.52	$ 865,937.68	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	22.00	$ 684,420.00	22.00	$ 684,420.00	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3,249.00	-		$ 0.00	77.00	$ 250,173.00	77.00	$ 250,173.00	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 26,782.00	-		$ 0.00	65.25	$ 1,747,525.50	65.25	$ 1,747,525.50	

1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36,752.00	-		$ 0.00	173.63	$ 6,381,249.76	173.63	$ 6,381,249.76	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11,968.00	-		$ 0.00	22.00	$ 263,296.00	22.00	$ 263,296.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,470.00	-		$ 0.00	22.00	$ 164,340.00	22.00	$ 164,340.00	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 23,042.00	-		$ 0.00	2,512.54	$ 57,893,946.68	2,512.54	$ 57,893,946.68	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91,590.00	-		$ -	44.53	$ 4,078,502.70	44.53	$ 4,078,502.70	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 572,567.00	-		$ -	1.00	$ 572,567.00	1.00	$ 572,567.00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 238,055.00	-		$ -	18.00	$ 4,284,990.00	18.00	$ 4,284,990.00	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 193,810.00	-		$ -	6.00	$ 1,162,860.00	6.00	$ 1,162,860.00	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 106,267.00	-		$ -	22.40	$ 2,380,380.80	22.40	$ 2,380,380.80	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 264,771.00	-		$ 0.00	213.76	$ 56,597,448.96	213.76	$ 56,597,448.96	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 305,516.00	-		$ -	31.70	$ 9,684,857.20	31.70	$ 9,684,857.20	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	249.75	$ 1,164,834.00	249.75	$ 1,164,834.00	
	1918. ESTRELLA DEL SUR SEDE B		1							1		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	577.76	$ 2,446,235.84	577.76	$ 2,446,235.84	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,175.00	-		$ 0.00	24.36	$ 808,143.00	24.36	$ 808,143.00	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29,392.00	-		$ 0.00	63.29	$ 1,860,219.68	63.29	$ 1,860,219.68	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 707,267.00			$ 0.00	7.20	$ 5,092,322.40	7.20	$ 5,092,322.40	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 829,259.00	-		$ 0.00	31.81	$ 26,378,728.79	31.81	$ 26,378,728.79	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 798,362.00	-		$ 0.00	1.43	$ 1,141,657.66	1.43	$ 1,141,657.66	
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 467,649.00	-		$ 0.00	63.29	$ 29,597,505.21	63.29	$ 29,597,505.21	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 22,829.00	-		$ 0.00	238.91	$ 5,454,076.39	238.91	$ 5,454,076.39	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17,208.00	-		$ 0.00	238.91	$ 4,111,163.28	238.91	$ 4,111,163.28	
	581. ORLANDO FALS BORDA SEDE A									1		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	262.00	$ 1,109,308.00	262.00	$ 1,109,308.00	

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	28.40	$ 883,524.00	28.40	$ 883,524.00	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107,273.00	-		$ -	115.98	$ 12,441,522.54	115.98	$ 12,441,522.54	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,044.00	-		$ 0.00	248.96	$ 4,492,234.24	248.96	$ 4,492,234.24	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 34,725.00			$ 0.00	41.43	$ 1,438,656.75	41.43	$ 1,438,656.75	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15,633.00	-		$ 0.00	238.04	$ 3,721,279.32	238.04	$ 3,721,279.32	
2.3.8	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN		$ 166,952.00	-		$ 0.00	3.00	$ 500,856.00	3.00	$ 500,856.00	
2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M		$ 27,185.00	-		$ 0.00	194.67	$ 5,292,103.95	194.67	$ 5,292,103.95	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 28,183.00	-		$ 0.00	37.31	$ 1,051,507.73	37.31	$ 1,051,507.73	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91,590.00	-		$ 0.00	31.30	$ 2,866,767.00	31.30	$ 2,866,767.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42,650.00	-		$ 0.00	0.98	$ 41,797.00	0.98	$ 41,797.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 45,289.00	-		$ 0.00	248.96	$ 11,275,149.44	248.96	$ 11,275,149.44	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 62,024.00	-		$ -	1.92	$ 119,086.08	1.92	$ 119,086.08	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33,570.00			$ -	1.00	$ 33,570.00	1.00	$ 33,570.00	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 19,859.00			$ -	29.05	$ 576,903.95	29.05	$ 576,903.95	
14.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2		$ 177,390.00			$ -	15.20	$ 2,696,328.00	15.20	$ 2,696,328.00	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 361,355.00	-		$ -	282.37	$ 102,035,811.35	282.37	$ 102,035,811.35	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	280.00	$ 1,305,920.00	280.00	$ 1,305,920.00	
	548. SANTA LIBRADA SEDE A									1		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ 0.00	557.28	$ 2,359,523.52	557.28	$ 2,359,523.52	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ 0.00	50.00	$ 1,555,500.00	50.00	$ 1,555,500.00	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 69,099.00	-		$ 0.00	0.80	$ 55,279.20	0.80	$ 55,279.20	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 36,752.00	-		$ -	73.27	$ 2,692,819.04	73.27	$ 2,692,819.04	
1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 7,193.00	-		$ 0.00	3.54	$ 25,463.22	3.54	$ 25,463.22	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15,750.00	-		$ 0.00	284.22	$ 4,476,465.00	284.22	$ 4,476,465.00	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 34,725.00			$ 0.00	87.31	$ 3,031,839.75	87.31	$ 3,031,839.75	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15,633.00	-		$ 0.00	150.83	$ 2,357,925.39	150.83	$ 2,357,925.39	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,762.00	-		$ 0.00	190.84	$ 2,244,660.08	190.84	$ 2,244,660.08	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 91,988.00	-		$ 0.00	38.57	$ 3,547,977.16	38.57	$ 3,547,977.16	
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M2		$ 53,569.00	-		$ 0.00	75.82	$ 4,061,601.58	75.82	$ 4,061,601.58	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 193,997.00	-		$ 0.00	12.54	$ 2,432,722.38	12.54	$ 2,432,722.38	
2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M		$ 27,185.00	-		$ -	115.44	$ 3,138,236.40	115.44	$ 3,138,236.40	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7,103.00	-		$ 0.00	24.47	$ 173,810.41	24.47	$ 173,810.41	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91,590.00	-		$ 0.00	19.35	$ 1,772,266.50	19.35	$ 1,772,266.50	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 78,727.00	-		$ 0.00	81.70	$ 6,431,995.90	81.70	$ 6,431,995.90	

4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 89,213.00			$ 0.00	110.64	$ 9,870,526.32	110.64	$ 9,870,526.32	
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 11,730.00	-		$ 0.00	173.88	$ 2,039,612.40	173.88	$ 2,039,612.40	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 45,289.00	-		$ 0.00	96.22	$ 4,357,707.58	96.22	$ 4,357,707.58	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 69,679.00	-		$ 0.00	190.84	$ 13,297,540.36	190.84	$ 13,297,540.36	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 62,024.00	-		$ -	13.60	$ 843,526.40	13.60	$ 843,526.40	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 22,829.00	-		$ -	18.00	$ 410,922.00	18.00	$ 410,922.00	
15.1.6	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2		$ 29,609.00	-		$ -	88.38	$ 2,616,843.42	88.38	$ 2,616,843.42	
16.1.5	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 157,818.00			$ -	5.88	$ 927,969.84	5.88	$ 927,969.84	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 361,355.00	-		$ -	307.91	$ 111,264,818.05	307.91	$ 111,264,818.05	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 305,516.00	-		$ -	17.20	$ 5,254,875.20	17.20	$ 5,254,875.20	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	190.84	$ 890,077.76	190.84	$ 890,077.76	
19.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3		$ 258,201.00			$ -	35.34	$ 9,124,823.34	35.34	$ 9,124,823.34	
	0548. TENERIFE GRANADA SUR SEDE A									1.00		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ -	234.34	$ 992,195.56	234.34	$ 992,195.56	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	26.00	$ 808,860.00	26.00	$ 808,860.00	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 65,757.00	-		$ 0.00	70.16	$ 4,613,511.12	70.16	$ 4,613,511.12	
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M		$ 190,852.00			$ 0.00	35.36	$ 6,748,526.72	35.36	$ 6,748,526.72	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR	M		$ 1,120,163.00	-		$ 0.00	4.70	$ 5,264,766.10	4.70	$ 5,264,766.10	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 32,026.00	-		$ 0.00	45.06	$ 1,443,091.56	45.06	$ 1,443,091.56	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 38,696.00	-		$ -	90.62	$ 3,506,631.52	90.62	$ 3,506,631.52	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 361,355.00	-		$ -	70.16	$ 25,352,666.80	70.16	$ 25,352,666.80	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	331.15	$ 1,544,483.60	331.15	$ 1,544,483.60	
	1959. GUILLERMO CANO IZASA SEDE A									1		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	26.00	$ 808,860.00	26.00	$ 808,860.00	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28,699.00	-		$ -	70.73	$ 2,029,880.27	70.73	$ 2,029,880.27	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,594.00	-		$ 0.00	87.02	$ 2,836,329.88	87.02	$ 2,836,329.88	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,301.00	-		$ -	90.28	$ 2,013,334.28	90.28	$ 2,013,334.28	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,377.00		41.12	$ 467,822.24	96.69	$ 1,100,042.13	137.81	$ 1,567,864.37	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 27,509.00	-		$ 0.00	71.34	$ 1,962,492.06	71.34	$ 1,962,492.06	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12,649.00	-	41.12	$ 520,126.88	283.30	$ 3,583,461.70	324.42	$ 4,103,588.58	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20,709.00	-		$ -	31.00	$ 641,979.00	31.00	$ 641,979.00	

1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33,175.00	-		$ -	47.79	$ 1,585,433.25	47.79	$ 1,585,433.25	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27,282.00	-		$ -	77.00	$ 2,100,714.00	77.00	$ 2,100,714.00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21,844.00			$ 0.00	36.90	$ 806,043.60	36.90	$ 806,043.60	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2		$ 67,219.00		2.32	$ 155,948.08	10.36	$ 696,388.84	12.68	$ 852,336.92	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN		$ 18,870.00	-		$ 0.00	12.00	$ 226,440.00	12.00	$ 226,440.00	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 63,533.00	-	6.00	$ 381,198.00	8.00	$ 508,264.00	14.00	$ 889,462.00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 97,295.00	-	6.00	$ 583,770.00	10.00	$ 972,950.00	16.00	$ 1,556,720.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 45,289.00	-		$ 0.00	157.75	$ 7,144,339.75	157.75	$ 7,144,339.75	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 126,225.00	-	76.63	$ 9,672,621.75	81.69	$ 10,311,320.25	158.32	$ 19,983,942.00	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 15,373.00	-		$ 0.00	46.83	$ 719,917.59	46.83	$ 719,917.59	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 98,222.00	-	136.15	$ 13,372,925.30	155.65	$ 15,288,254.30	291.80	$ 28,661,179.60	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN		$ 730,228.00	-		$ -	2.00	$ 1,460,456.00	2.00	$ 1,460,456.00	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 772,427.00			$ -	5.00	$ 3,862,135.00	5.00	$ 3,862,135.00	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1,128,301.00	-		$ -	12.30	$ 13,878,102.30	12.30	$ 13,878,102.30	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 989,338.00	-	20.73	$ 20,508,976.74	60.19	$ 59,548,254.22	80.92	$ 80,057,230.96	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 989,338.00	-	0.50	$ 494,669.00	0.00	$ 0.00	0.50	$ 494,669.00	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36,194.00	-	19.37	$ 701,077.78	274.39	$ 9,931,271.66	293.76	$ 10,632,349.44	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,599.00	-		$ -	70.73	$ 1,527,697.27	70.73	$ 1,527,697.27	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 32,026.00	-		$ 0.00	98.82	$ 3,164,809.32	98.82	$ 3,164,809.32	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	83.73	$ 390,516.72	83.73	$ 390,516.72	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 7,170.00	-		$ -	25.52	$ 182,978.40	25.52	$ 182,978.40	
	0545. CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B									1		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-	385.79	$ 1,633,434.86		$ 0.00	385.79	$ 1,633,434.86	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	25.00	$ 777,750.00	25.00	$ 777,750.00	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3,249.00	-	49.60	$ 161,150.40		$ 0.00	49.60	$ 161,150.40	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32,594.00	-	4.96	$ 161,666.24	385.79	$ 12,574,439.26	390.75	$ 12,736,105.50	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20,709.00	-		$ -	5.73	$ 118,662.57	5.73	$ 118,662.57	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-	20.01	$ 2,709,253.95	7.65	$ 1,035,771.75	27.66	$ 3,745,025.70	
2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 320,599.00		7.35	$ 2,356,402.65		$ 0.00	7.35	$ 2,356,402.65	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 143,601.00	-		$ 0.00	21.20	$ 3,044,341.20	21.20	$ 3,044,341.20	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 91,590.00	-	65.35	$ 5,985,406.50		$ 0.00	65.35	$ 5,985,406.50	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 78,727.00	-	7.60	$ 598,325.20		$ 0.00	7.60	$ 598,325.20	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 875,948.00	-	7.00	$ 6,131,636.00		$ 0.00	7.00	$ 6,131,636.00	

4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 89,213.00		50.40	$ 4,496,335.20		$ 0.00	50.40	$ 4,496,335.20	
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 503,048.00	-	91.61	$ 46,084,227.28	23.42	$ 11,781,384.16	115.03	$ 57,865,611.44	
	EMERGENCIAS									1		
	DILE USME - EMERGENCIA 1									1		
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 7,045.00	-		$ 0.00	33.26	$ 234,316.70	33.26	$ 234,316.70	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3,249.00	-		$ 0.00	18.00	$ 58,482.00	18.00	$ 58,482.00	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 154,775.00	-		$ 0.00	6.00	$ 928,650.00	6.00	$ 928,650.00	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8,959.00	-		$ 0.00	16.00	$ 143,344.00	16.00	$ 143,344.00	
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15,750.00	-		$ 0.00	33.26	$ 523,845.00	33.26	$ 523,845.00	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$ 122,314.00	-		$ 0.00	34.82	$ 4,258,973.48	34.82	$ 4,258,973.48	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 28,183.00	-		$ 0.00	7.50	$ 211,372.50	7.50	$ 211,372.50	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 26,367.00	-		$ 0.00	7.50	$ 197,752.50	7.50	$ 197,752.50	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 20,146.00	-		$ 0.00	5.50	$ 110,803.00	5.50	$ 110,803.00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14,989.00	-		$ 0.00	12.00	$ 179,868.00	12.00	$ 179,868.00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1-1/4"	UN		$ 155,896.00	-		$ 0.00	1.00	$ 155,896.00	1.00	$ 155,896.00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 115,584.00	-		$ 0.00	1.00	$ 115,584.00	1.00	$ 115,584.00	
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 81,362.00	-		$ 0.00	1.00	$ 81,362.00	1.00	$ 81,362.00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 69,001.00	-		$ 0.00	1.00	$ 69,001.00	1.00	$ 69,001.00	
4.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UN		$ 313,985.00	-		$ 0.00	1.00	$ 313,985.00	1.00	$ 313,985.00	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 69,679.00	-		$ 0.00	33.26	$ 2,317,523.54	33.26	$ 2,317,523.54	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 25,123.00	-		$ 0.00	26.80	$ 673,296.40	26.80	$ 673,296.40	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 65,757.00	-		$ 0.00	38.00	$ 2,498,766.00	38.00	$ 2,498,766.00	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 13,044.00	-		$ 0.00	1.50	$ 19,566.00	1.50	$ 19,566.00	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,599.00	-		$ 0.00	12.90	$ 278,627.10	12.90	$ 278,627.10	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 32,026.00	-		$ 0.00	15.41	$ 493,520.66	15.41	$ 493,520.66	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 38,696.00	-		$ -	6.30	$ 243,784.80	6.30	$ 243,784.80	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 361,355.00	-		$ 0.00	37.54	$ 13,565,266.70	37.54	$ 13,565,266.70	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	85.61	$ 399,285.04	85.61	$ 399,285.04	
	DILE USME - EMERGENCIA 2											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	2.25	$ 304,638.75	2.25	$ 304,638.75	
2.3.5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 42,469.00	-		$ 0.00	2.40	$ 101,925.60	2.40	$ 101,925.60	

4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14,830.00	-		$ 0.00	30.00	$ 444,900.00	30.00	$ 444,900.00				
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 19,859.00	-		$ 0.00	3.60	$ 71,492.40	3.60	$ 71,492.40				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	99.00	$ 461,736.00	99.00	$ 461,736.00				
	1974. CALAZANS BUENA VISTA SEDE A Emergencia 1														
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ -	36.90	$ 156,234.60	36.90	$ 156,234.60				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	25.00	$ 777,750.00	25.00	$ 777,750.00				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 34,725.00			$ 0.00	19.58	$ 679,915.50	19.58	$ 679,915.50				
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11,762.00			$ 0.00	13.69	$ 161,021.78	13.69	$ 161,021.78				
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	17.76	$ 2,404,615.20	17.76	$ 2,404,615.20				
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21,703.00	-		$ 0.00	7.27	$ 157,780.81	7.27	$ 157,780.81				
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA,	M		$ 57,521.00	-		$ 0.00	12.43	$ 714,986.03	12.43	$ 714,986.03				
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 97,085.00			$ 0.00	7.74	$ 751,437.90	7.74	$ 751,437.90				
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 193,997.00	-		$ 0.00	5.48	$ 1,063,103.56	5.48	$ 1,063,103.56				
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,364,840.00	-		$ 0.00	1.79	$ 2,443,063.60	1.79	$ 2,443,063.60				
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 165,931.00	-		$ 0.00	18.40	$ 3,053,130.40	18.40	$ 3,053,130.40				
2.3.10	CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 CMS X 20 CMS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 86,754.00	-		$ 0.00	12.43	$ 1,078,352.22	12.43	$ 1,078,352.22				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7,255.00	-		$ 0.00	398.12	$ 2,888,360.60	398.12	$ 2,888,360.60				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7,103.00	-		$ 0.00	22.81	$ 162,019.43	22.81	$ 162,019.43				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 23,042.00	-		$ -	267.09	$ 6,154,287.78	267.09	$ 6,154,287.78				
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M		$ 190,852.00	-		$ -	10.80	$ 2,061,201.60	10.80	$ 2,061,201.60				
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M		$ 1,120,163.00	-		$ 0.00	10.80	$ 12,097,760.40	10.80	$ 12,097,760.40				
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y	M2		$ 503,048.00	-		$ -	30.16	$ 15,171,927.68	30.16	$ 15,171,927.68				
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 989,338.00	-		$ -	4.83	$ 4,778,502.54	4.83	$ 4,778,502.54				
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 161,041.00	-		$ -	11.73	$ 1,889,010.93	11.73	$ 1,889,010.93				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	283.09	$ 1,320,331.76	283.09	$ 1,320,331.76				
19.1.16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2		$ 86,511.00	-		$ -	5.71	$ 493,977.81	5.71	$ 493,977.81				
	1974. CALAZANS BUENA VISTA SEDE A Emergencia 3														
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ -	9.00	$ 38,106.00	9.00	$ 38,106.00				
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN		$ 6,292,015.00	-		$ -	2.00	$ 12,584,030.00	2.00	$ 12,584,030.00				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	9.00	$ 41,976.00	9.00	$ 41,976.00				

	1904. ARBORIZADORA BAJA SEDE A Emergencia 1														
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00	-		$ -	37.00	$ 1,151,070.00	37.00	$ 1,151,070.00	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 69,099.00	-		$ 0.00	1.50	$ 103,648.50	1.50	$ 103,648.50	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107,273.00	-		$ 0.00	2.08	$ 223,127.84	2.08	$ 223,127.84	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,301.00	-		$ -	3.15	$ 70,248.15	3.15	$ 70,248.15	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 135,395.00	-		$ 0.00	0.97	$ 131,333.15	0.97	$ 131,333.15	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21,703.00	-		$ 0.00	6.30	$ 136,728.90	6.30	$ 136,728.90	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,023,205.00	-		$ 0.00	0.95	$ 972,044.75	0.95	$ 972,044.75	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 57,521.00	-		$ 0.00	4.29	$ 246,765.09	4.29	$ 246,765.09	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 97,085.00			$ 0.00	4.45	$ 432,028.25	4.45	$ 432,028.25	
2.2.9	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1,596,806.00			$ 0.00	0.67	$ 1,069,860.02	0.67	$ 1,069,860.02	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 115,265.00			$ 0.00	16.11	$ 1,856,919.15	16.11	$ 1,856,919.15	
2.3.13	COLUMNAS EN CONCRETO ACABADO A LA VISTA 3000 PSI INCLUYE FORMALETA METÁLICA	M3		$ 1,372,888.00	-		$ 0.00	0.24	$ 329,493.12	0.24	$ 329,493.12	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7,255.00	-		$ 0.00	226.28	$ 1,641,661.40	226.28	$ 1,641,661.40	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 23,042.00	-		$ -	194.48	$ 4,481,208.16	194.48	$ 4,481,208.16	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 146,133.00	-		$ 0.00	2.43	$ 355,103.19	2.43	$ 355,103.19	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 42,650.00	-		$ 0.00	29.57	$ 1,261,160.50	29.57	$ 1,261,160.50	
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M		$ 14,271.00	-		$ 0.00	8.55	$ 122,017.05	8.55	$ 122,017.05	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2		$ 124,509.00	-		$ 0.00	19.59	$ 2,439,131.31	19.59	$ 2,439,131.31	
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 62,024.00	-		$ -	91.63	$ 5,683,259.12	91.63	$ 5,683,259.12	
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M		$ 83,862.00	-		$ -	8.55	$ 717,020.10	8.55	$ 717,020.10	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR	M		$ 1,120,163.00	-		$ 0.00	15.73	$ 17,620,163.99	15.73	$ 17,620,163.99	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 22,829.00	-		$ -	14.08	$ 321,432.32	14.08	$ 321,432.32	
15.1.6	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2		$ 29,609.00	-		$ -	118.18	$ 3,499,191.62	118.18	$ 3,499,191.62	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	474.90	$ 2,214,933.60	474.90	$ 2,214,933.60	
	1980. COLEGIO CUNDINAMARCA SEDE A Emergencia 1														
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-		$ -	112.52	$ 476,409.68	112.52	$ 476,409.68	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 130,346.00	-		$ 0.00	112.52	$ 14,666,531.92	112.52	$ 14,666,531.92	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00	-		$ -	639.60	$ 2,983,094.40	639.60	$ 2,983,094.40	
	0566. IED LUIS EDUARDO MORA OSEJO Emergencia 1														
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4,234.00	-	161.38	$ 683,282.92		$ 0.00	161.38	$ 683,282.92	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 31,110.00		11.00	$ 342,210.00		$ 0.00	11.00	$ 342,210.00	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 63,583.00		2.00	$ 127,166.00		$ 0.00	2.00	$ 127,166.00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,470.00		11.00	$ 82,170.00		$ 0.00	11.00	$ 82,170.00	
5.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 850,565.00		1.00	$ 850,565.00		$ 0.00	1.00	$ 850,565.00	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	m		$ 79,761.00		20.00	$ 1,595,220.00		$ 0.00	20.00	$ 1,595,220.00	

5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 238,055.00		5.00	$ 1,190,275.00		$ 0.00	5.00	$ 1,190,275.00	
5.1.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 1/0 + T (# 6 AWG) LIBRE HALOGENO.	M		$ 283,213.00		34.00	$ 9,629,242.00		$ 0.00	34.00	$ 9,629,242.00	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4,664.00		60.00	$ 279,840.00		$ 0.00	60.00	$ 279,840.00	
	COSTO TOTAL CONDICIONES ORIGINALES				**$ 2,332,049,023.00**		**$ 131,956,944.97**		**$ 1,977,294,260.15**		**$ 2,109,251,205.12**	

ITEMS NO PREVISTOS						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%EJEC.
	1904. ARBORIZADORA BAJA SEDE A											
NP-05	LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML		$ 5,047.00			$ 0.00	197.54	$ 996,984.38	197.54	$ 996,984.38	
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY)	M2		$ 225,362.00			$ 0.00	440.64	$ 99,303,511.68	440.64	$ 99,303,511.68	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A120 80CMX30CM*22CM (INCLUYE, TRANSPORTE, DESCARGA, TRASIEGO, INSTALACION, EMBOQUILLADO), PARA EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA, SEDE A.	M		$ 99,518.00			$ 0.00	90.00	$ 8,956,620.00	90.00	$ 8,956,620.00	
	1904. ARBORIZADORA BAJA SEDE A - EMERGENCIA 1											
NP-04	TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUÍN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS Y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN)	M2		$ 25,961.00			$ 0.00	122.34	$ 3,176,068.74	122.34	$ 3,176,068.74	
	523. FABIO LOZANO SIMONELLI											
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN		$ 1,082,495.00			$ 0.00	11.00	$ 11,907,445.00	11.00	$ 11,907,445.00	
	581. ORLANDO FALS BORDA SEDE A											
NP-07	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.18 M PROMEDIO EN TERRAZA DEL COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 37,818.00			$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	
NP-07	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.18 M PROMEDIO EN TERRAZA DEL COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 50,736.00			$ 0.00	118.20	$ 5,996,995.20	118.20	$ 5,996,995.20	
	548. SANTA LIBRADA SEDE A											
NP-02	DEMOLICIÓN DE MATERAS EN CONCRETO O FIBROCEMENTO 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7m	UN		$ 37,818.00			$ 0.00	30.00	$ 1,134,540.00	30.00	$ 1,134,540.00	
	1974. CALAZANS BUENA VISTA SEDE A											
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	M2		$ 306,692.00			$ 0.00	405.10	$ 124,240,929.20	405.10	$ 124,240,929.20	
	1974. CALAZANS BUENA VISTA SEDE A EMERGENCIA 1											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 2.000 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE FLOTADOR	UN		$ 2,116,247.00			$ 0.00	1.00	$ 2,116,247.00	1.00	$ 2,116,247.00	
	1959. GUILLERMO CANO IZASA SEDE A											
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN		$ 1,082,495.00		10.00	$ 10,824,950.00	19.00	$ 20,567,405.00	29.00	$ 31,392,355.00	

	0548. TENERIFE GRANADA SUR SEDE A													
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PVC PLASTIFICADA TIPO SIKAPLAN® 15 PR O SIMILAR PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN, PERFILERÍA DE ANCLAJE, TERMOFUSIÓN DE JUNTAS, SELLADO PERIMETRAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		$ 225,189.00			$ 0.00	100.89	$ 22,719,318.21	100.89	$ 22,719,318.21	
	1930. UNION EUROPEA SEDE B													
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CM PARA PROTECCIÓN DE REDES EN EL COLEGIO UNIÓN EUROPEA.	M		$ 93,487.00			$ 0.00	22.50	$ 2,103,457.50	22.50	$ 2,103,457.50	
	0566. IED LUIS EDUARDO MORA OSEJO Emergencia 1													
NP-17	DESMONTE TABLERO COMPUESTO DE TOTALIZADOR GENERAL, TOTALIZADORES PARCIALES (5) Y DISTRIBUCIÓN N°3 CON 20 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, 2 CIRCUITOS TRIFÁSICOS, NEUTROS Y TIERRAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 1,112,264.00		1.00	$ 1,112,264.00		$ 0.00	1.00	$ 1,112,264.00	
	0545. CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE B													
NP-19	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA Y PARAL EN PERFIL DE ACERO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 62,810.00		116.85	$ 7,339,348.50		$ 0.00	116.85	$ 7,339,348.50	
	COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS						**$ 19,276,562.50**		**$ 303,219,521.91**		**$ 322,496,084.41**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU=34,91%)		**$ 3,117,050,445.00**	**$ 151,233,507.47**	**$ 2,280,513,782.06**	**$ 2,431,747,289.53**	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**(0%)**	**$ 0.00**			**$ 0.00**	
VALOR A PAGAR			**$ 151,233,507.47**	**$ 2,280,513,782.06**	**$ 2,431,747,289.53**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA			**-$ 0.47**	**-$ 1.06**	**-$ 1.53**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 151,233,507.00**	**$ 2,280,513,781.00**	**$ 2,431,747,288.00**	**78.01%**
DESCUENTO ANS	DESCUENTO POR EVALUACIÓN A LOS ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO "ANS" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 6-OCT-25 AL 05-ABR-26, CONFORME AL NUMERAL 11 DEL DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA MINUTA DEL CONTRATO EN LAS CLÁUSULA 18			$ 2,718,885.00	$ 2,718,885.00	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 685,303,157.00**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0.00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO PAIS**
C.C. O NIT : 901.974.049-8
DIRECTOR DE OBRA : WILSON LEONARDO PARRA ROBLES
C.C. : 7.278.308

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
C.C. O NIT : 901977271-0
DIRECTOR DE INTERVENTORIA : HECTOR VILLAZON GUTIERREZ
C.C. : 8.767.031

ANEXO No. 04. ACTAS DE COMITE

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	07	07	2026	**HORA INICIO:**	8:00 AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 6	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Temas Generales
2	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Lote 6 – Seguimiento sedes Educativas Activas

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33

DESARROLLO

Se realiza reunión de comité técnico conjunto para los Lotes 4, 5 y 6.

1. Temas Generales

1.1 Radicación de Actas Parciales

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel, solicitó que durante la semana comprendida entre el 6 y el 10 de julio de 2026 sean radicadas las actas parciales de obra correspondientes para dar continuidad al trámite administrativo.

Se reiteró a todos los contratistas e interventorías la necesidad de culminar oportunamente la revisión de los documentos, realizar los ajustes pendientes y efectuar la radicación dentro del plazo solicitado por la entidad, viernes 10-jul-2026.

1.2 Incumplimiento de Actividades Programadas Durante el Receso Escolar

El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, manifestó su preocupación debido a que varias de las actividades que debían ejecutarse durante el periodo de vacaciones de mitad de año no fueron atendidas dentro de los tiempos previstos por algunos contratistas.

Indicó que esta situación puede generar inconformidades por parte de los rectores, gestores territoriales y comunidad educativa, especialmente en aquellos colegios donde se habían adquirido compromisos específicos para entregar espacios antes del reinicio de clases.

En consecuencia, solicitó priorizar durante la presente semana la atención de dichos pendientes y mantener una comunicación permanente con las instituciones educativas.

1.3 Registro Fotográfico

La Supervisión reiteró la importancia de mantener actualizado el registro fotográfico diario de todos los frentes de obra, actividades de emergencia y atenciones de garantía.

Se recordó que dicho registro constituye el principal soporte para la elaboración de informes técnicos, atención de requerimientos de la entidad y elaboración de actas de entrega.

1.4 Entrega Formal de Intervenciones Ejecutadas

Se recordó que entre los días lunes y miércoles deberá coordinarse entre los contratistas de obra y la interventoría la entrega formal de los espacios intervenidos a las respectivas Instituciones Educativas.

Cada entrega deberá encontrarse soportada con:

- Acta de Entrega de Espacios.
- Matriz de Mantenimiento.
- Manual de Mantenimiento.

1.5 Manuales de Mantenimiento

La Supervisión recordó la necesidad de culminar la remisión de los Manuales de Mantenimiento y de los oficios de entrega dirigidos a las Instituciones Educativas, conforme al cuadro de seguimiento existente.

Se indicó que la interventoría deberá verificar con cada contratista el estado de los documentos pendientes, especialmente en los lotes 5 y 6, donde aún existen sedes sin evidencia de entrega formal.

1.6 Posible Modificatorio Contractual

El Apoyo a la Supervisión informó que existe viabilidad para gestionar un nuevo modificatorio a los contratos de obra.

Por tal motivo solicitó a contratistas e interventoría revisar el estado de ejecución de los contratos, adoptar medidas correctivas cuando sea necesario y evitar atrasos que puedan afectar la aprobación del modificatorio.

1.7 Actividades No Previstas (NP)

Finalmente, el Apoyo a la Supervisión reiteró la importancia de radicar oportunamente los APU´s de los Ítems No Previstos (NP) pendientes, indicando que su trámite oportuno permitirá evitar atrasos administrativos y facilitar la gestión del futuro modificatorio contractual.

Concluidos los temas generales, se dio inicio al seguimiento individual de cada lote, revisando el estado de los frentes de obra, emergencias, garantías y compromisos específicos adquiridos por los contratistas e interventorías.

2. Lote 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

El colegio Ofelia Uribe registra un atraso de 4,19%
El colegio Compartir El Recuerdo - A presenta un avance de 9,11%
El colegio Arborizadora Alta presenta un avance del 11,58%

Finalmente, se informó que el estado general del contrato presenta un avance consolidado del 2,29%.

Los frentes priorizados para formalización corresponden a:

- IED Estrella del Sur (Emergencia).
- IED Ofelia Uribe (Biblioteca y canales)

Programación de visitas. Se mencionó que la visita a la IED Brisas del Diamante, Lote 4 se realizó el lunes 6 de julio.

- **Estado de Cumplimiento de Compromisos en IED Compartir Recuerdo**

El Apoyo a la Supervisión solicitó al contratista informar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Institución Educativa Compartir Recuerdo durante el periodo de receso escolar, particularmente respecto a las solicitudes presentadas por la institución relacionadas con la batería sanitaria de preescolar.

El contratista informó que durante el periodo de vacaciones fueron ejecutadas las actividades solicitadas por la institución educativa, consistentes en el retiro de uno de los orinales instalados y el ajuste de altura del orinal restante, atendiendo la solicitud presentada por la IED.

Se indicó que el orinal fue reinstalado a una altura aproximada de 45 cm desde el nivel del piso, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos para este tipo de dotaciones sanitarias.

igualmente, el contratista manifestó que existe registro fotográfico de las actividades ejecutadas y que el elemento retirado permanece bajo custodia de la institución.

La Interventoría indicó que dicha actuación debe quedar soportada mediante un Acta de Entrega específica, dejando constancia de que el retiro del orinal obedeció a una solicitud expresa de la Institución Educativa y que el elemento retirado fue entregado al colegio.

Se recomendó citar dentro del acta el correo electrónico mediante el cual la institución realizó la solicitud, con el fin de garantizar la trazabilidad administrativa de la modificación ejecutada.

Se acordó elaborar el Acta de Entrega correspondiente y programar su firma durante la visita prevista para la presente semana.

- **Garantía – IED Los Tejares**

El Apoyo a la Supervisión reiteró la necesidad de contar con el informe técnico correspondiente a la solicitud de garantía presentada por la Institución Educativa Los Tejares.

Indicó que dicho documento resulta prioritario debido a que la información debe ser socializada con los gestores territoriales desde el inicio de la semana.

Se informó que el informe se encontraba en elaboración y que sería remitido durante el fin de semana al Arquitecto Héctor para su revisión y posterior trámite.

Se indicó que el concepto técnico establecerá que la situación reportada no corresponde a una garantía del contrato, dado que el área afectada no hacía parte del alcance inicialmente contratado.

En consecuencia, se recomendará a la institución realizar la impermeabilización correspondiente; sin embargo, si posteriormente la Secretaría determina atender la situación como emergencia, esta podrá ser evaluada dentro del contrato.

- **Garantía – IED Fanny Mickey**

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel, manifestó que, aunque ya se iniciaron algunas actividades correspondientes a la garantía del colegio Fanny Mickey, aún permanecen actividades pendientes que deben concluirse dentro del plazo contractual.

Adicionalmente expresó su preocupación por la humedad existente en uno de los muros intervenidos, indicando que resulta indispensable verificar el origen de dicha afectación antes de dar por terminada la atención.

También recomendó que el área donde actualmente se atiende la emergencia permanezca completamente señalizada y delimitada para evitar riesgos durante el desarrollo de las actividades.

El contratista informó que varias de las actividades programadas no pudieron verificarse completamente debido a la ausencia temporal del servicio de agua en la institución.

Respecto al muro con humedad, indicó que aún no se había iniciado la exploración correspondiente debido a que el personal se encontraba terminando las actividades programadas en la Institución Educativa Brisas del Diamante.

Se manifestó igualmente que, una vez concluya dicho frente, el personal será trasladado inmediatamente al colegio Fanny Mickey para realizar la inspección, identificar el origen de la humedad y ejecutar las actividades que correspondan.

La Interventoría recomendó realizar una exploración desde el exterior del muro con el propósito de determinar si la humedad corresponde a una filtración originada por la intervención ejecutada o si se trata de una condición preexistente de la edificación.

Se precisó que, en caso de comprobarse que la afectación corresponde a causas externas al contrato, la actividad podrá reconocerse económicamente; sin embargo, si la humedad proviene de la intervención realizada, deberá atenderse como garantía sin generar costos adicionales.

Se reiteró que el plazo máximo para culminar la atención de la garantía y presentar el informe técnico correspondiente vence el día 7 de julio de 2026.

- **Emergencia – IED Rural La Unión**

Se solicitó informar las condiciones de seguridad implementadas en el frente de obra teniendo en cuenta el reinicio de actividades académicas.

El contratista informó que el cerramiento principal del área demolida permanece instalado; sin embargo, reconoció que existe un acceso secundario que requiere aislamiento adicional mediante polisombra.

La Interventoría manifestó que la primera actividad a ejecutar el lunes deberá ser el cierre completo del área intervenida para impedir el ingreso de estudiantes, docentes y demás personal.

Se recomendó extender el cerramiento alrededor de toda la biblioteca con el fin de eliminar cualquier riesgo durante el reinicio de clases.

El contratista ejecutará el ajuste del cerramiento durante la primera jornada laboral del lunes y la Supervisión informará previamente a la institución educativa sobre las medidas de seguridad adoptadas.

- **Emergencia – IED Estrella Del Sur, Sede D**

El Apoyo a la Supervisión consultó el estado de la atención correspondiente a la emergencia ejecutada en la Institución Educativa Estrella del Sur.

Adicionalmente explicó que el contratista solicitó ampliar el plazo inicialmente previsto para ejecutar el cambio del material especificado.

Se indicó que la Interventoría no debe limitarse únicamente a trasladar la solicitud del contratista, sino emitir un concepto técnico que justifique la viabilidad del cambio solicitado y el plazo requerido.

Se recomendó conceder un término de ocho (8) días hábiles para culminar las actividades, permitiendo informar oportunamente a la Rectoría las razones técnicas que impidieron finalizar la emergencia antes del reinicio escolar.

La Interventoría elaborará el concepto técnico correspondiente y el contratista adelantará la instalación del nuevo material una vez sea autorizado.

- **Biblioteca IED Ofelia Uribe de Acosta**

Se solicitó actualizar el estado del suministro e instalación de las rejillas pendientes que actualmente impiden la entrega definitiva de la biblioteca.

La Interventoría informó que el No Previsto correspondiente fue finalmente aprobado, razón por la cual ya es posible iniciar la fabricación de las rejillas.

El Apoyo a la Supervisión manifestó que, aunque la aprobación del NP constituye un avance importante, la fabricación de las rejillas debió gestionarse oportunamente debido a que este tema ha sido tratado en varios comités anteriores.

Se indicó que la demora en esta actividad continúa retrasando la entrega definitiva de la biblioteca.

El contratista iniciará inmediatamente la fabricación de las rejillas con el propósito de realizar la entrega formal de la biblioteca durante las próximas semanas.

- **Cierre**

Se recordó que el colegio Fanny Mickey fue definido para la instalación del ciclo parqueadero correspondiente al componente de sostenibilidad.

El contratista manifestó que iniciará el proceso de fabricación y suministro del elemento.

La Supervisión informó adicionalmente que el Lote 6 ya cuenta con un proveedor definido, por lo que recomendó tomar dicha referencia en caso de requerirse apoyo para agilizar el proceso.

Como conclusión del seguimiento efectuado al Lote 4, el Apoyo a la Supervisión reiteró la necesidad de priorizar el cierre de garantías, culminar las entregas pendientes y mantener actualizados los registros fotográficos e informes técnicos, con el fin de evitar observaciones por parte de la Secretaría de Educación y garantizar el adecuado desarrollo del futuro modificatorio contractual.

3. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

El colegio José Jaime Rojas registra un atraso de 0,50%
El colegio Miguel de Cervantes presenta un atraso de 13,54%
El colegio Brasilia presenta un atraso del 00,01%
El colegio Paraíso Mirador presenta un avance del 28,89

Finalmente, se informó que el estado general del contrato presenta un atraso consolidado del 1,54%.

Los frentes priorizados para formalización corresponden a:
- IED La Joya Don Bosco (Motobombas).
- IED Bicentenario (Emergencia).
- IED José María Vargas Vila (Emergencia y Garantía).

Programación de Visitas

Rodrigo Lara Bonilla – Lote 5: lunes 6 de julio.
Bicentenario – Lote 5: martes 7 de julio.

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel, recordó que las intervenciones que ya se encuentran finalizadas deberán formalizar su entrega a las Instituciones Educativas mediante la respectiva Acta de Entrega de Espacios, Matriz de Mantenimiento y Manual de Mantenimiento.

- **IED Miguel de Cervantes Saavedra - Programación de Entregas**

El Arq. Santiago Ángel solicitó confirmar el cronograma definitivo de entrega de los diferentes espacios intervenidos en la Institución Educativa Miguel de Cervantes, indicando que dichas fechas deberán cumplirse estrictamente para evitar afectar la programación académica de la institución.

El contratista informó que el cronograma de entrega previsto corresponde al siguiente:

- Aulas del primer piso, corredores de circulación y oficina en Superboard: 09 de julio de 2026.
- Baños de la Biblioteca: 21 de julio de 2026.
- Plazoleta de primaria: 31 de julio de 2026.
- Parqueadero: 14 de agosto de 2026.

Manifestó que el personal de obra se encuentra concentrando esfuerzos para garantizar el cumplimiento de dichas fechas y evitar nuevas modificaciones en la programación.

Se indicó que las fechas informadas ya fueron comunicadas a la Institución Educativa y a la Secretaría de Educación, razón por la cual deberán cumplirse de manera estricta.

Así mismo, se recordó que cualquier modificación deberá justificarse técnicamente y comunicarse oportunamente a la entidad.

El contratista mantendrá el cronograma informado y reportará semanalmente el porcentaje de avance de cada uno de los frentes.

- **IED Miguel de Cervantes – Embebida en Muro de Tubería de Agua Potable**

El Apoyo a la Supervisión recordó la observación realizada por el director de Construcciones durante la visita efectuada el pasado 2 de julio de 2026, relacionada con la tubería de abastecimiento de agua que conduce hacia el bloque de preescolar.

Se solicitó que dicha actividad sea incorporada dentro del alcance de la intervención.

El contratista manifestó que revisará técnicamente la condición actual de la tubería y realizará los ajustes necesarios para que no quede a la vista sin afectar el funcionamiento del sistema hidráulico existente.

La Interventoría indicó que realizará el seguimiento correspondiente para verificar que la actividad sea incluida antes de la entrega definitiva del frente.

La actividad quedará incorporada dentro del alcance pendiente del frente Miguel de Cervantes y deberá ejecutarse antes de la entrega definitiva del proyecto.

- **Garantía – IED Brasilia**

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel, solicitó informar el estado actual de la atención de las garantías pendientes en la Institución Educativa Brasilia.

Recordó que dichas actividades deben concluirse antes del 13 de julio de 2026, junto con la entrega del respectivo informe técnico.

El contratista informó que actualmente se encuentran ejecutándo las actividades programadas para la atención de las observaciones presentadas por la institución y que el personal continuará trabajando durante la presente semana para culminarlas dentro del plazo establecido.

La Interventoría manifestó que realizará seguimiento permanente a las actividades y verificará el cumplimiento de los trabajos antes de emitir el concepto de cierre de garantía.

Se estableció como fecha máxima para finalizar la atención y remitir el informe técnico el día 13 de julio de 2026.

- **Emergencia – IED Paraíso Mirador Sede B**

El Arq. Santiago Ángel, poyo a la Supervisión solicitó al contratista informar el estado de la planeación correspondiente a la atención de la emergencia en la Sede B de la Institución Educativa Paraíso Mirador.

Se recordó que la entidad requiere conocer oportunamente el presupuesto y el cronograma de ejecución con el fin de realizar el seguimiento correspondiente.

El contratista manifestó que actualmente se encuentra consolidando la información técnica y presupuestal necesaria para estructurar el cronograma definitivo de ejecución.

Así mismo, indicó que se revisará la disponibilidad del personal y de los recursos requeridos para iniciar las actividades dentro del plazo previsto.

Se reiteró que el presupuesto y el cronograma deberán remitirse a más tardar el 8 de julio de 2026.

Igualmente, se indicó que el inicio de la emergencia deberá efectuarse sin excepción el día 14 de julio de 2026, con el fin de contar con el tiempo suficiente para ejecutar las actividades programadas.

En caso de modificarse el personal asignado al proyecto, el contratista deberá actualizar oportunamente el listado del equipo de trabajo.

El contratista remitirá el presupuesto y cronograma dentro del plazo establecido y mantendrá informada a la interventoría sobre cualquier modificación en la programación.

- **Biblioteca La Marichuela**

  El Apoyo a la Supervisión consultó el estado de las actividades pendientes correspondientes a la batería de baños de mujeres de la Biblioteca La Marichuela.

  El contratista informó que únicamente permanecen pendientes la instalación de los espejos y la puerta del depósito, actividades que serán ejecutadas durante la presente semana.

  La Interventoría recordó que dichos elementos hacen parte del alcance contractual y resultan indispensables para efectuar la entrega definitiva del frente.

  El contratista finalizará las actividades pendientes antes de programar la entrega oficial de la biblioteca.

- **Entrega de Frentes Finalizados**

  Se recordó que durante los primeros días de la semana deberán formalizarse las entregas correspondientes a:

  - La Joya Don Bosco (Motobombas).
  - Bicentenario (Emergencia).
  - José María Vargas Vila (Emergencia y Garantía).

  La Interventoría manifestó que coordinará con el contratista las visitas de entrega y verificará que cada institución reciba la documentación correspondiente.

Se reiteró que ninguna entrega podrá considerarse finalizada sin la correspondiente Acta de Entrega, Matriz de Mantenimiento y Manual de Mantenimiento.

- **Manuales de Mantenimiento**

Se revisó el cuadro de seguimiento de manuales de mantenimiento correspondiente al Lote 5, evidenciando que aún permanecen pendientes los oficios de entrega para las siguientes instituciones:

- Luis Eduardo Mora Osejo.
- Biblioteca La Marichuela.
- José María Vargas Vila.
- Atabanzha.
- Brasilia.
- El Minuto de Buenos Aires (Emergencia).
- Santa Librada (Emergencia).

Se solicitó verificar esta información con la Arquitecta Ana Pardo y definir el estado real de cada una de las entregas.

La Interventoría manifestó que realizará la revisión documental con el contratista y confirmará durante la presente semana cuáles manuales ya fueron entregados físicamente y cuáles requieren su formalización.

Finalmente, el Apoyo a la Supervisión solicitó que, antes del próximo comité, el contratista defina y comunique formalmente:

- La fecha de entrega de la emergencia correspondiente al colegio José Celestino Mutis.
- La fecha definitiva de entrega del frente José Jaime Rojas.
- El estado de la reparación del cable telefónico intervenido en dicho frente.

Adicionalmente, recordó que el colegio Miguel de Cervantes fue seleccionado para la instalación del ciclo parqueadero correspondiente a los factores de sostenibilidad, razón por la cual deberá iniciarse oportunamente el proceso de fabricación y suministro del elemento.

Se informó igualmente que el contratista del Lote 6 ya cuenta con un proveedor definido para este tipo de mobiliario, recomendando tomar dicha referencia si resulta necesario agilizar el proceso.

4. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

El colegio Santa Librada registra un atraso de 4,77%
El colegio Guillermo Cano Isaza presenta un atraso de 15,97%
El colegio Ciudad De Villavicencio presenta un avance del 0,32%

Finalmente, se informó que el estado general del contrato presenta un atraso consolidado del 2,44%.

Los frentes priorizados para formalización corresponden a:

- IED Luis Eduardo Mora Osejo (Emergencia).
- IED Cundinamarca (Emergencia).
- IED Arborizadora Baja (Emergencia).
- IED Calasanz Buenavista (Emergencia).

- **Actualización de Pólizas Contractuales**

  El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel, solicitó informar el estado de actualización de las pólizas contractuales, indicando que este requisito resulta indispensable para garantizar la continuidad administrativa del contrato y la gestión de futuros modificatorios.

  La Interventoría informó que actualmente se adelantan las gestiones correspondientes con el contratista para la actualización de las garantías contractuales, verificando que los documentos cumplan con los requisitos exigidos por la entidad.

  Se acordó dar prioridad a la actualización de las pólizas y remitir los soportes correspondientes tan pronto finalice el trámite.

- **Garantía – IED Santa Librada**

  El Apoyo a la Supervisión manifestó la necesidad de atender con carácter prioritario la garantía correspondiente a la filtración de agua reportada en el comedor de la Institución Educativa Santa Librada.

  Indicó que esta situación ha sido reportada por la institución y requiere atención inmediata debido a las afectaciones que puede generar sobre las actividades académicas y el funcionamiento del servicio de alimentación escolar.

  El contratista informó que la garantía será incluida dentro de la programación inmediata del personal de obra y que se realizará una inspección técnica para identificar el origen de la filtración antes de iniciar las actividades correctivas.

  La Interventoría manifestó que realizará seguimiento permanente a la atención de la garantía y verificará que las actividades ejecutadas solucionen definitivamente la causa de la filtración.

  El contratista priorizará la atención de esta garantía y presentará el correspondiente informe técnico una vez concluyan las actividades.

- **Entrega de Frentes Finalizados**

  El Apoyo a la Supervisión recordó que durante los primeros días de la semana deberán formalizarse las entregas correspondientes a las siguientes instituciones:

  - IED Luis Eduardo Mora Osejo (Emergencia).
  - IED Cundinamarca (Emergencia).
  - IED Arborizadora Baja (Emergencia).
  - IED Calasanz Buenavista (Emergencia).

  Se reiteró que estas entregas deberán realizarse conjuntamente entre contratista e interventoría.

La Interventoría manifestó que coordinará las visitas con cada Institución Educativa y verificará que las actividades ejecutadas correspondan al alcance aprobado antes de suscribir las respectivas actas

Se recordó que las entregas únicamente podrán formalizarse cuando se encuentren disponibles la totalidad de los documentos requeridos, incluyendo el Manual de Mantenimiento y la Matriz de Mantenimiento.

- **Manuales de Mantenimiento**

Se revisó el cuadro de seguimiento correspondiente al Lote 6, evidenciando que aún permanecen pendientes los oficios de entrega o los manuales de mantenimiento de las siguientes instituciones:

- Sierra Morena.
- Fabio Lozano Simonelli.
- Calasanz Buenavista (Emergencia).
- Luis Eduardo Mora Osejo (Emergencia).

Se indicó que resulta indispensable verificar durante la presente semana si los manuales ya fueron entregados físicamente a las instituciones o si aún permanece pendiente su formalización.

La Interventoría manifestó que realizará la revisión documental con el contratista y remitirá el estado actualizado de cada institución, indicando aquellas que requieren completar la documentación antes del cierre definitivo de los frentes.

- **Emergencia – IED San José de Usme**

El Apoyo a la Supervisión solicitó al contratista informar el estado de preparación de la atención de la emergencia correspondiente a la Institución Educativa San José de Usme.

Se recordó que la entidad requiere contar oportunamente con la planeación de esta intervención para efectuar el seguimiento correspondiente.

El contratista informó que actualmente se encuentra consolidando el presupuesto y el cronograma de ejecución de la emergencia, revisando los recursos necesarios para su atención.

La Interventoría manifestó que verificará la consistencia técnica de la información antes de su remisión a la Supervisión.

El contratista remitirá el presupuesto y el cronograma de ejecución a más tardar el día 8 de julio de 2026, para su correspondiente revisión.

Durante el seguimiento se informó que el contratista del Lote 6 ya cuenta con un proveedor definido para la fabricación e instalación del ciclo parqueadero correspondiente a los factores de sostenibilidad.

La Interventoría manifestó que esta información será compartida con los demás lotes con el fin de facilitar la gestión de los elementos pendientes y evitar retrasos en el cumplimiento de esta obligación contractual.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33

Se recomendó a los demás contratistas evaluar la posibilidad de utilizar el mismo proveedor para agilizar los tiempos de fabricación y suministro.

El Apoyo a la Supervisión reiteró la importancia de mantener actualizado el avance físico del contrato, fortalecer el seguimiento a los frentes activos y adoptar oportunamente las medidas correctivas necesarias para evitar retrasos que puedan afectar la gestión del modificatorio contractual actualmente previsto por la entidad.

Igualmente, recordó la obligación de continuar remitiendo diariamente el registro fotográfico de los frentes de obra, las emergencias y las garantías atendidas, debido a que estos soportes hacen parte de la información utilizada para los informes de seguimiento y control.

La Interventoría manifestó que continuará realizando seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista y verificará semanalmente el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los comités técnicos.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Radicar las Actas Parciales de Obra	Alta	Contratista de Obra - Lote 4,5 y 6	Entre el 6 y el 10 de julio 2026	
2	Entrega de los frentes finalizados, acompañando la entrega con Acta de Entrega de Espacios, Matriz de Mantenimiento y Manual de Mantenimiento.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4,5 y 6	Entre el 6 y el 8 de julio 2026	
3	Remitir el registro fotográfico diario de los frentes de obra, emergencias y garantías ejecutadas.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4,5 y 6	Diario	
4	Radicar los No Previstos (NP) pendientes	Alta	Contratista de Obra - Lote 4,5 y 6	A la mayor brevedad	
5	Remitir el presupuesto y cronograma para la atención de la emergencia de la sede B de Compartir el Recuerdo.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4.	8 de julio 2026	
6	Remitir el informe técnico correspondiente a la garantía solicitada por la IED Los Tejares.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4.	La mayor brevedad	
7.	Remitir presupuesto y cronograma para la atención de la emergencia de Paraíso Mirador Sede B.	Alta	Contratista de Obra - Lote 5.	8 de julio 2026	
8.	Iniciar la atención de la emergencia de Paraíso Mirador Sede B	Alta	Contratista de Obra - Lote 5.	14 de julio 2026	
9.	Actualizar las pólizas contractuales y remitir los soportes correspondientes.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	A la mayor brevedad posible	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
10.	Remitir el presupuesto y cronograma para la atención de la emergencia de la IED San José de Usme.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	8 de julio 2026	

Convocatoria próximo comité:	Martes 14-jul-2026 a partir de la 1:30 p.m.
Hora de finalización:	9:00 am

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 34

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet		**FECHA:**	14	07	2026	**HORA INICIO:**	1:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.							
PRESIDE:	INTERVENTORIA		**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS							

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría - Lote 5 y 6	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría - Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador - Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador - Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador - Lote 6	
Stefanía Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Planos Récord – Definición de fecha límite para Entrega Documental

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 34

DESARROLLO

1. **Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas**

   La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:
   - La IED Miguel de Cervantes Saavedra presenta un atraso del 11.55%
   - Paraiso Mirador registra un adelanto del 55.42%
   - Estado del contrato 1.41% de adelanto

- **IED Biblioteca Marichuela y Brasilia**

  Durante el desarrollo del comité, el residente de obra, Arq. Jonathan Grajales, informó que las actividades de obra blanca correspondientes a la Biblioteca Marichuela ya fueron finalizadas y que la instalación de divisiones se encuentra programada para ejecutarse durante los días jueves y viernes de la presente semana. Así mismo, indicó que el equipo encargado de esta actividad realizará posteriormente la instalación de las divisiones correspondientes en el área de emergencia del colegio Brasilia.

  Frente a lo anterior, el Apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel, solicitó presentar un reporte del avance de instalación durante el fin de semana, con el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes y programar la visita de inspección para definir la fecha de entrega definitiva del colegio Brasilia.

  Adicionalmente, el residente de obra, Arq. Jonathan Grajales, manifestó que la entrega de las puertas presentó retrasos; sin embargo, se espera su recepción para proceder con la instalación en ambos espacios intervenidos.

- **IED José Jaime Rojas**

  En relación con el colegio José Jaime Rojas, el equipo técnico informó que fueron culminadas las actividades correspondientes a reparación de sanitarios, resane de muros, aplicación de pintura, limpieza del pasillo y retiro de escombros.

  Sobre este punto, el Arq. Santiago Ángel indicó que realizará contacto con la encargada del almacén con el fin de verificar la disponibilidad de los espacios intervenidos y confirmar las condiciones para efectuar la entrega formal, definiendo si esta procede de manera total o parcial dependiendo de la revisión realizada por la institución educativa.

  El apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel informó que se deberá realizar una verificación conjunta con la almacenista para revisar el estado de las observaciones pendientes y confirmar si las condiciones actuales permiten avanzar con la entrega formal de los espacios intervenidos.

  Así mismo, indicó que durante dicha revisión se deberá validar la necesidad de contar con la firma del rector en el acta correspondiente, de acuerdo con los procedimientos definidos para la entrega y recibo de las áreas intervenidas.

  Como resultado del seguimiento, se programó realizar la visita de verificación y establecer las acciones finales requeridas para formalizar la entrega.

- **IED Paraíso Mirador – Reprogramación de actividades**

  En relación con el colegio Paraíso Mirador, se informó que durante la ejecución de las actividades se presentó un inconveniente técnico que impidió continuar con la programación prevista.

  No obstante, se indicó que los trabajos serán retomados al día siguiente, con el propósito de culminar las actividades pendientes y continuar con el cronograma establecido para la entrega del frente de obra.

  Como resultado del comité, se acordó realizar seguimiento a la reanudación de las actividades y verificar su avance en la próxima reunión de seguimiento.

- **IED Rodrigo Lara Bonilla**

  En relación con las actividades programadas para el colegio Rodrigo Lara, el residente de obra, Arq. Jonathan Grajales informó que, una vez realizado el desembolso del anticipo correspondiente, se inició la fabricación de los flanches requeridos para la intervención.

  Así mismo, solicitó que se remitan registros fotográficos del avance de fabricación en el taller, con el fin de realizar seguimiento al proceso y coordinar oportunamente las actividades de desmontaje e instalación en obra.

  Como resultado del comité, se estableció que el equipo responsable deberá enviar las evidencias fotográficas del proceso constructivo y mantener informada a la interventoría sobre el avance de fabricación, con el propósito de programar las actividades de montaje conforme al cronograma del proyecto.

2. Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

- IED Santa Librada presenta un atraso del 4.65%
- IED Guillermo Cano Isaza registra un atraso considerable que supera el 15%
- IED Ciudad de Villavicencio con un atraso del 1.85%
- Estado del contrato, 2.63% de atraso

- **IED San José de Usme**

  Durante el comité, el Ing. John Castañeda, residente de interventoría, informó que fue recibido el presupuesto correspondiente al colegio San José de Usme, en el cual se incluyen nuevos precios no previstos (NP) requeridos para atender actividades adicionales identificadas en el desarrollo de la intervención.

  Frente a esta información, el director de obra, Ing. Wilson Parra Robles, indicó que las actividades requeridas corresponden principalmente a la atención de la emergencia presentada en la cocina, contemplando la ejecución de cuatro nuevos precios asociados a la instalación de lava ollas, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de cárcamo y suministro de malla.

  Asimismo, el director de obra manifestó que adelantará la gestión de las respectivas cotizaciones y soportes técnicos necesarios para consolidar la documentación requerida,

con el fin de que la interventoría pueda realizar la revisión y posterior radicación ante la Secretaría.

Por su parte, la interventoría recordó la importancia de contar adicionalmente con el cronograma actualizado de ejecución de dichas actividades, con el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos previstos y garantizar la atención oportuna de la necesidad identificada.

- **IED Fabio Lozano Simonelli**

  Durante el comité, el Arq. Santiago Ángel informó sobre el reporte recibido relacionado con posibles daños en los tubos para las mallas de voleibol del colegio Fabio Lozano Simonelli, indicando la necesidad de realizar una inspección técnica antes de definir la solución correspondiente.

  En respuesta, el inspector de interventoría, Camilo Andrés Cárdenas manifestó que realizará la revisión física de los elementos con el fin de determinar si los daños identificados pueden ser reparados o si se requiere el suministro de nuevos elementos.

  Adicionalmente, Camilo Andrés Cárdenas indicó que realizará la verificación del tubo taponado ubicado en el primer piso de los baños, revisando las condiciones existentes y determinando la viabilidad técnica de la reparación requerida.

  Como resultado del seguimiento, se estableció realizar la inspección correspondiente y presentar la definición técnica de las acciones a ejecutar.

- **Informes SST y Ambiental – Subsanación de observaciones documentales**

  Durante la revisión de los pendientes administrativos del proyecto, María Alejandra Otálora Delgado recordó la necesidad de realizar la subsanación de las observaciones pendientes correspondientes a los informes SST y ambiental, considerando que estos documentos cuentan con una fecha límite establecida para su entrega.

  Sobre este aspecto, María Alejandra Otálora Delgado indicó que los ajustes requeridos deberán ser atendidos antes del día 17 de julio de 2026, con el propósito de evitar retrasos en el proceso de seguimiento documental y administrativo del proyecto.

  En consecuencia, se estableció como compromiso la revisión integral de los informes, incorporación de los ajustes solicitados y posterior remisión de las versiones corregidas dentro del plazo definido.

- **Cicloparqueadero**

  En relación con la ejecución del cicloparqueadero correspondiente al Lote 6, el Arq. Santiago Ángel informó que una vez finalizada la instalación del elemento, el contratista deberá realizar la entrega formal al almacenista correspondiente, mientras que la interventoría deberá emitir comunicación oficial dirigida a la Secretaría certificando el cumplimiento de la actividad ejecutada.

- **IED Guillermo Cano Isaza**

  En relación con las actividades ejecutadas en el colegio Guillermo Cano, el director de obra, Ing. Wilson Parra Robles informó que los trabajos correspondientes al piso del área

de emergencia presentan un avance significativo, encontrándose pendiente únicamente la terminación de detalles en el acceso.

Frente a lo anterior, señaló que las actividades faltantes serán ejecutadas durante el fin de semana, con el propósito de culminar completamente el frente intervenido y permitir la posterior verificación por parte de la interventoría.

- **IED Luis Eduardo Mora Osejo**

Durante el seguimiento de actividades, el Ing. Wilson Parra Robles informó que continúan en ejecución los trabajos de aplicación de pintura epóxica y pintura tipo vinilo en las baterías sanitarias.

Asimismo, notificó que las actividades se están desarrollando progresivamente por cada batería sanitaria y que se tiene prevista la culminación de los trabajos para el día siguiente en horas de la tarde.

La interventoría realizará seguimiento a la terminación de las actividades y validará las condiciones finales de entrega.

- **IED Santa Librada**

Respecto a las actividades pendientes en Santa Librada, el Arq. Santiago Ángel informó la necesidad de cuantificar las áreas adicionales requeridas para ejecutar actividades complementarias de impermeabilización.

Sobre este aspecto, el Ing. Wilson Parra Robles, director de obra, indicó que realizará la estimación de cantidades y costos asociados, con el propósito de presentar la información requerida para gestionar la aprobación como obra prioritaria.

Adicionalmente, se planteó la posibilidad de reutilizar la grava existente en el sitio, buscando optimizar los recursos disponibles y disminuir costos asociados a la ejecución de la actividad.

3. Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas

La interventoría relacionó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

- IED Ofelia Uribe de Acosta registra un atraso superior al 4%
- IED Compartir Recuerdo presenta un adelanto del 7.26%
- IED Arborizadora Alta, también presenta un adelanto 20.16%
- Estado general del contrato registra un adelanto del 3.14% sobre lo programado

- **IED Tejares**

Durante el comité, el residente de obra, Ing. Diego Pinzón informó que las actividades correspondientes al componente eléctrico ya fueron finalizadas.

En relación con la cubierta, señaló que se identificó un tramo de teja pendiente de ajuste en la zona eléctrica, actividad que será atendida con el propósito de culminar completamente las reparaciones requeridas.

Se estableció realizar la intervención y posterior verificación del estado final de la cubierta.

- **IED Arborizadora Alta**

Respecto a las actividades ejecutadas en Arborizadora Alta, el equipo técnico informó que actualmente se adelantan labores de excavación y compactación correspondientes a la placa proyectada.

En relación con la solución eléctrica de la cancha, los participantes del comité indicaron la necesidad de contar con un informe técnico que permita definir la ruta definitiva de instalación de la tubería eléctrica.

Sobre este punto, el Ing. César Carvajal intervino resaltando la importancia de definir previamente la alternativa técnica con el fin de evitar reprocesos durante la ejecución.

Se estableció que, en caso de no contar con la definición técnica dentro del plazo establecido, se procederá con la alternativa de instalación de tubería MT externa, estimando aproximadamente 70 metros de tubería y cableado requeridos.

- **IED Rural La Unión y IED Ofelia Uribe de Acosta**

Respecto al colegio Rural La Unión, el equipo técnico informó que fue confirmado el daño existente en la tubería identificada durante la revisión del frente de obra.

Frente a esta situación, se indicó que se realizará la gestión de adquisición de materiales requeridos para iniciar las actividades de reparación programadas.

En cuanto al colegio Ofelia, el Ing. Diego Pinzón, residente de obra, informó que la instalación de las rejillas metálicas será ejecutada durante el fin de semana, aprovechando la ausencia de estudiantes para facilitar las actividades.

Así mismo, afirmó que se coordinará con el almacenista la identificación de los elementos retirados que puedan ser clasificados como material de desecho o chatarra.

- **IED Brisas del Diamante**

Durante el comité, el Arq. Santiago Ángel, apoyo a la supervisión, informó que fueron entregados tres salones al almacenista, encontrándose pendiente la entrega de los espacios restantes.

Respecto al auditorio, señaló que la entrega será reprogramada debido a la presencia de materiales almacenados por parte del colegio, situación que requiere ser solucionada previamente para garantizar condiciones adecuadas de recepción.

Asimismo, informó que el salón restante continúa en proceso de resane y pintura, por lo cual se realizará seguimiento durante la visita programada para coordinar la entrega formal prevista para el día 21 de julio de 2026.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 34

4. Planos Récord – Definición de fecha límite para Entrega Documental

Durante la revisión del estado documental del proyecto, la Ing. Stefania Ceballos, coordinadora de interventoría, manifestó que persiste la falta de entrega de planos récord correspondientes a varios lotes intervenidos, situación que limita el proceso de cierre documental requerido para la finalización de los contratos.

Frente a esta situación, el Arq. Santiago Ángel indicó que se otorga autonomía a la interventoría para establecer y comunicar al contratista una fecha límite obligatoria para la entrega de los planos récord pendientes, con el propósito de garantizar la consolidación documental del proyecto.

No obstante, aclaró que dichos requerimientos deberán aplicarse únicamente sobre frentes de obra completamente terminados, teniendo en cuenta que no es procedente solicitar documentación definitiva de actividades que aún se encuentren en ejecución.

En consecuencia, la interventoría realizará la comunicación formal correspondiente, estableciendo los plazos necesarios para la entrega de la documentación pendiente.










COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Presentar reporte de avance de instalación de divisiones en Biblioteca y Brasilia.	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	Fin de semana	
2	Entregar informes pendientes de garantías José María Vargas Vila y Brasilia.	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	A la mayor brevedad	
3	Presentar presupuesto, NP´s y cronograma Colegio San José.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	A la mayor brevedad	
4	Subsanar informes SST y ambiental.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	17 de julio de 2026	
5	Presentar presupuesto impermeabilización Santa Librada.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	A la mayor brevedad	
6	Coordinar entrega definitiva Colegio Brisas del Diamante	Alta	Contratista de Obra - Lote 4.	8 de julio 2026	
7	Instalar rejillas Colegio Ofelia.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4.	Durante el fin de semana	

Convocatoria próximo comité:	Por definir
Hora de finalización:	2:45 p.m.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 35

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	22	07	2026	**HORA INICIO:**	2:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 6	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Planos Record

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 35

DESARROLLO

1. **Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas**

- **IED Estrella - Sedes C y D (garantías)**

Durante el desarrollo del comité se informó que, de acuerdo con lo manifestado por la rectora, persisten observaciones pendientes por subsanar relacionadas con filtraciones de agua en las Sede D, específicamente en el área donde se ubican los hornos microondas del corredor de circulación y un daño en la bisagra del portón instalado en la Sede C

Se indicó que las actividades de subsanación deberán ejecutarse en los plazos establecidos por la entidad. Si por algún motivo el tiempo dado no es suficiente, el contratista deberá informar de manera oportuna el plazo adicional requerido

Para la garantía de la sede C, queda pendiente confirmar si el contratista implementará el nuevo sistema de sujeción de puerta (chumaceras) propuesto por la interventoría; en caso de no alcanzar a ejecutarlo dentro del plazo otorgado, deberá responderse el correo de la garantía indicando la fecha en que se implementará la solución.

- **IED Brisas del Diamante**

Se informó que fueron entregados tres salones al almacenista, encontrándose pendiente la entrega del salón A1, actualmente en proceso de resane y pintura. Por parte de la IED la entrega del auditorio será reprogramada debido a que por materiales almacenados por parte del colegio en los espacios a intervenir estos aún no están habilitados para la obra

La interventoría y el contratista de obra manifestó preocupación por la instalación, por parte de un tercero, de tubería de circuito cerrado de televisión sobre las cubiertas impermeabilizadas del colegio, situación que podría afectar la calidad de la obra entregada; el apoyo a la supervisión solicitó remitir registro fotográfico de lo evidenciado para elaborar un informe dirigido al gestor territorial, dejando la respectiva salvedad.

Asimismo, se solicitó remitir fotografías marcadas de la zona donde la IED adelanta trabajos en cubierta, señalando el área donde fue retirado un manto de impermeabilización que no correspondía al alcance del contratista, con el fin de dejar constancia de dicha situación en el informe correspondiente.

Respecto a la entrega de las aulas, el contratista menciona que se programó la entrega del material restante y la finalización del aseo y guardaescoba del salón para el viernes, así mismo el inicio de la intervención del auditorio.

- **IED Ofelia Uribe de Acosta**

Se informó que aún no se ha coordinado la entrega de las rejillas metálicas, por lo que se solicitó por parte de la SED realizar dicha entrega entre el jueves y el viernes sin falta.

Se indicó que, dado que no se ha recibido ningún espacio en el colegio, la entrega deberá realizarse de manera completa, dejando constancia mediante acta de que las

actividades de la biblioteca fueron finalizadas varios días atrás, con el fin de que no se interprete que la obra se está culminando hasta este momento.

- **IED Arborizadora Alta**

Respecto a la intervención eléctrica de la cancha, se informó que se encuentra pendiente la definición de la ruta definitiva de la tubería eléctrica, señalándose la importancia de contar con dicha definición técnica antes de continuar con la ejecución, con el fin de evitar reprocesos, ruta que deberá ser determinada por el contratista de obra.

Se informó que actualmente se adelantan labores de excavación y compactación correspondientes a la placa proyectada.

Adicionalmente, se confirmó que el reflector ubicado en la cancha sí es funcional, por lo que deberá contemplarse e instalarse un nuevo reflector al momento de ejecutar el levantamiento del muro; se indicó además que la ubicación definitiva del interruptor será al ingreso del colegio, conforme a lo indicado por el rector.

- **IED Los Tejares**

Sobre la problemática de las lámparas de la cafetería, se analizaron alternativas para independizar el circuito de las luminarias del circuito del tomacorriente de la nevera, acordándose ejecutar dicha independización, cableado y breaker adicional, sin que ello garantice la solución definitiva del inconveniente reportado por el colegio.

Se estableció remitir un informe técnico documentando lo actuado, el cual será trasladado al especialista eléctrico de la Secretaría de Educación para su concepto; la intervención eléctrica se programó para el sábado 1 de agosto de 2026.

- **IED Fanny Mickey**

Se informó que las actividades de pintura de acabado final de las graderías ya iniciaron y que la prueba de estanqueidad realizada resultó satisfactoria hasta el momento, sin nuevas filtraciones reportadas por la profesora encargada.

Se programó la entrega para el viernes 24 de julio, previa confirmación con la rectora y la almacenista; ya que el contratista de obra realizará visita al colegio La Unión

- **IED Rural La Unión**

Se informó que ya fue adquirido el material para las placas y que se encuentra en gestión el cielo raso, el cual será de color blanco en la zona interior de la biblioteca, mientras que en la zona exterior afectada por la demolición del muro se buscará un material similar al existente para no reemplazar todo el perimetral; se indicó que ya se encuentra en proceso el pañetado.

- **Compartir Sede B**

El apoyo a la supervisión recordó que el lunes 27 de julio está programado el inicio de la intervención del frente Compartir Sede B. El contratista de obra informó que el cerramiento y la baranda ya se encuentran en proceso de fabricación (ornamentación).

2. Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas

- **IED Paraiso Sede B**

Durante el desarrollo del comité, el contratista de Lote 5 informó que fueron destapadas las cajas de inspección reportadas y que, según confirmación de la almacenista, el sistema se encuentra funcionando correctamente y sin contratiempos.

Se informó adicionalmente que las baterías sanitarias portátiles solicitadas como contingencia llegarán mañana y permanecerán instaladas por diez días, como plan alterno mientras se garantiza el uso continuo de los baños existentes.

Frente a los sanitarios en buen estado retirados de las baterías intervenidas, el Arq Santiago Ángel solicitó coordinar de inmediato con la almacenista su entrega al colegio, dado que la institución manifestó preocupación por el paradero de dichos elementos.

- **Biblioteca Marichuela**

En cuanto a los baños de la biblioteca Marichuela, el Ing Jonathan Grajales informó que el baño de mujeres ya se encuentra terminado, incluyendo la instalación de la puerta pendiente, y que en el baño de hombres únicamente restan los tres espejos y la limpieza y aplicación de sellador finales.

Se estableció que, de llegar los espejos el viernes, la entrega se realizará el lunes; en caso contrario, se efectuará el martes, sin perjuicio de poder entregar el espacio sin espejos si así lo determina la interventoría.

- **Brasilia**

Respecto a las garantías atendidas en Brasilia por daños ocasionados por estudiantes, el Ing Jonathan Grajales indicó que se dejará constancia en el informe de que dichas atenciones no corresponden a garantías del contratista sino a mal uso, aclarando que se atienden por única vez y que a futuro no aplicarán bajo la misma condición.

- **IED Miguel de Cervantes**

En relación con el acabado de la cancha, se informó que ya fue adquirido el material tipo slurry, el cual será aplicado este fin de semana previo a la instalación de la pintura.

El Arq Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión, solicitó al Ing John Castañeda y al inspector Camilo Cárdenas, residente e inspector de interventoría, verificar el mejoramiento visible del acabado antes de autorizar la aplicación de la pintura.

Así mismo, se solicitó tener listo el balance ajustado del frente Cervantes antes del lunes, con el fin de definir si se requiere o no una ficha de emergencia adicional para atender la viga canal y el cielo raso de la cocina.

Se recordó adicionalmente que el manual de mantenimiento del área primaria de los pasillos de Miguel de Cervantes se encuentra pendiente de remitir por parte del contratista, quedando como compromiso su entrega

- **IED Gabriel García Márquez**

Se programó visita de diagnóstico conjunta del inspector de interventoría, Camilo Cárdenas y el Ing Jonathan Grajales residente de obra al colegio para el 23-07-2026 a las 8:00 am

- **IED José Jaime Rojas**

Sobre el tema del cable telefónico se solicitó por parte de la entidad definir con la almacenista las acciones a realizar aprovechando la visita programada para el viernes

- **IED San José de Usme - Motobombas**

Se informó que las motobombas presentan una válvula de pie que requiere reparación, para lo cual es necesario que el colegio desocupe previamente el tanque.

Se acordó verificar con la almacenista el estado del tanque y ejecutar la reparación correspondiente antes de proceder con la entrega formal del frente.

Adicionalmente, se indicó que el informe de motobombas ya fue remitido y que, de no existir objeción por parte de la interventoría, será legalizado mediante correo electrónico.

- **IED Santa Librada (garantía - Lote 5)**

Se solicitó al Ing Jonathan Grajales, residente de obra, confirmar la fecha definitiva de atención de la garantía pendiente en Santa Librada, con el fin de poder informar oportunamente a la rectora.

- **Generalidades Lote 5 - Informes de garantías**

Se confirmó que los informes de garantías de Brasilia y de José María Vargas Vila ya fueron entregados a la interventoría, quedando pendiente su revisión por parte del Arq Héctor Villazón y el Ing John Castañeda, director y residente de interventoría.

3. Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas

- **IED Luis Eduardo Mora Osejo**

En el componente eléctrico se informó que resta instalar una luminaria en la biblioteca, dado que de las seis previstas solo se han instalado cinco, y que el circuito 22, correspondiente a la cámara, se encuentra mal marcado, por lo que la marquilla de los baños será corregida al día siguiente.

El apoyo a la supervisión aclara que, dentro del alcance y compromisos, se estableció el suministro de 5 lámparas, las cuales una vez visto el espacio de la biblioteca y su deficiente iluminación se acordó instalarlas allí, sin embargo, se aclara que nunca fueron 6 lámparas como lo sugirió la almacenista, por lo tanto, no hay autorización de incluir una más. Esto será aclarado por el Apoyo a la supervisión con la rectora.

En cuanto a los baños, se informó que el nivel dos ya fue entregado y que en el nivel uno se iniciaron actividades de resane y raspado; se identificó humedad en el baño de niños, la cual será objeto de seguimiento hasta el sábado para determinar su origen en caso de no secarse.

Se solicitó finalizar el manual de mantenimiento del colegio, indicándose que se completará en el día de hoy; se aclaró que el manual de la parte eléctrica de los baños no aplica.

- **IED San José de Usme**

Se informó que fue recibido el presupuesto correspondiente al colegio, el cual incluye nuevos precios no previstos (NP) asociados a la atención de la emergencia presentada en la cocina, entre ellos instalación de lavaplatos, suministro e instalación de tubería en CPVC, construcción de cárcamo y suministro de malla.

El Ing Wilson Parra Robles, director de obra, se comprometió a remitir el presupuesto y el cronograma actualizado a la interventoría en el transcurso de la tarde o noche del día del comité, para su correspondiente revisión.

- **Sierra Morena - Cuarto de basuras**

Se realizó seguimiento al suministro de agua pendiente para el cuarto de basuras, indicándose que se evaluará su ejecución el día sábado, dado que la actividad requiere realizarse sin la presencia de estudiantes.

- **Colegio Cundinamarca**

Se retomará en la tarde el seguimiento a la instalación del falso techo tipo PVC, cuyo contratista se comprometió a finalizar la actividad a las cuatro de la tarde; se solicitó registro fotográfico de lo ejecutado.

- **IED Fabio Lozano Simonelli**

Se realizó seguimiento a la solicitud de prolongación del tubo de reventilación en la cubierta, atendiendo la insistencia reiterada por parte del personal de mantenimiento del colegio.

Se propuso que el contratista suministrará los materiales requeridos, estimados en aproximadamente tres metros de tubería y dos codos, mientras que la instalación estuviera a cargo del personal de mantenimiento del colegio.

4. Planos Récord – Cierre Documental

- **Cierre documental y entrega de planos récord**

Durante el comité se revisó el estado de la entrega de la documentación final de cierre de los contratos, confirmándose que la interventoría remitirá en el día de hoy un oficio con el listado completo de los documentos requeridos por colegio, otorgando un plazo de 15 días para la primera entrega.

Se aclaró que la solicitud aplica de manera general a los Lotes 4, 5 y 6, precisando que, si bien el Lote 6 ya remitió planos, estos cuentan con observaciones pendientes por atender.

El listado de documentos requeridos incluye, entre otros: planos récord, manuales de mantenimiento, inventario de máquinas y equipos instalados, catálogos de equipos cuando aplique, inventario de gabinetes de llaves, actas de entrega de espacios, actas de entrega física de la obra, paz y salvo de servicios públicos, acta final, memorias de cantidades de obra, cuadro de mayores y menores cantidades (en formato Excel editable

y versión final firmada en PDF), balances de los frentes contractuales y de emergencias, informes mensuales de obra e interventoría, informes de supervisión, listado de NP's y APUs aprobados, y memorias de cálculo.

Se estableció como fecha límite el 31 de julio de 2026 para que cada contratista realice la primera entrega de documentación completa por colegio, priorizando los frentes que ya se encuentran cerrados, sin fraccionar la entrega por documentos individuales.

El Arq Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión, se ofreció a apoyar la revisión técnica preliminar de los planos en formato PDF antes de su radicación formal ante la interventoría, aclarando que dicha revisión no reemplaza las observaciones del área de planoteca de la entidad ya realizadas

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Ejecutar subsanación de garantías por filtraciones en IED Estrella Sedes C y D	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Este fin de semana o, a más tardar, fin de semana del 6 de agosto de 2026	
2	Responder correo de garantía confirmando implementación del nuevo sistema de sujeción de puerta y fecha prevista	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
3	Remitir registro fotográfico de tuberías CCTV instaladas sobre cubiertas de Brisas del Diamante	Media	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
4	Remitir fotografías marcadas de la zona donde se retiró el manto de impermeabilización en Brisas del Diamante	Media	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
5	Coordinar y ejecutar entrega definitiva de espacios en Brisas del Diamante (salón A1 y auditorio)	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Viernes 24 de julio de 2026	
6	Entregar rejillas metálicas y definir actas de entrega pendientes en IED Ofelia Uribe de Acosta	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Entre el 23 y 24 de julio de 2026	
7	Instalar reflector adicional en cancha de Arborizadora Alta al ejecutar el muro	Media	Contratista de Obra - Lote 4	Por definir según avance de obra	
8	Remitir informe técnico de ruta de tubería eléctrica cancha Arborizadora Alta	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Por definir por interventoría	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 35

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
9	Ejecutar independización de circuito eléctrico de luminarias en cafetería y remitir informe técnico - IED Tejares	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Sábado 1 de agosto de 2026	
10	Coordinar entrega de graderías, placas y visita conjunta IED Rural La Unión	Media	Contratista de Obra - Lote 4	Viernes 24 de julio de 2026	
11	Iniciar actividades de pañete en frente Compartir CDB mientras se fabrica cerramiento y baranda	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Lunes 27 de julio de 2026	
12	Coordinar con almacenista recolección de sanitarios en buen estado en punto de acopio - IED Brasilia	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	23 y 24 de julio de 2026	
13	Definir con almacenista solución de cable telefónico - IED José Jaime Rojas	Media	Contratista de Obra - Lote 5 / Interventoría	Viernes 24 de julio de 2026	
14	Aplicar slurry y verificar mejora de acabado antes de pintura - cancha Miguel de Cervantes	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	Este fin de semana	
15	Entregar balance ajustado de Miguel de Cervantes	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	Lunes 27 de julio de 2026	
16	Instalar espejos y realizar entrega de baños de biblioteca - IED Brasilia	Media	Contratista de Obra - Lote 5	Lunes 27 o martes 28 de julio de 2026	
17	Revisar informes de garantías de Brasilia y Vargas Vila entregados	Media	Interventoría - Lote 5	A la mayor brevedad	
18	Legalizar por correo informe de motobombas y coordinar entrega - IED Don Bosco	Media	Contratista de Obra - Lote 5 / Interventoría	Por definir	
19	Remitir registro fotográfico de avance de fabricación de flanches en taller - Rodrigo Lara Bonilla	Media	Contratista de Obra - Lote 5	A la mayor brevedad	
20	Confirmar fecha de atención de garantía pendiente - IED Santa Librada	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	Por confirmar	
21	Instalar luminaria faltante y corregir marquilla circuito 22 (baños) - Luis Eduardo Mora Osejo	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	Miércoles 23 de julio de 2026	
22	Confirmar con rectora cantidad definitiva de luminarias a instalar en biblioteca	Media	Interventoría - Lote 6	A la mayor brevedad	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 35

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
23	Hacer seguimiento a humedad en baño de niños (nivel 1) - Luis Eduardo Mora Osejo	Media	Contratista de Obra - Lote 6	Hasta el sábado 25 de julio de 2026	
24	Finalizar manual de mantenimiento - Luis Eduardo Mora Osejo	Media	Contratista de Obra - Lote 6	22 de julio de 2026	
25	Enviar presupuesto y cronograma actualizado - IED San José de Usme	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	22 de julio de 2026 (tarde/noche)	
26	Ajustar diseño del cicloparqueadero Lote 6 conforme a propuesta remitida por correo	Media	Contratista de Obra - Lote 6	Por definir	
27	Finalizar detalles de piso en acceso - IED Guillermo Cano Isaza	Media	Contratista de Obra - Lote 6	Este fin de semana	
28	Estimar cantidades y costos de impermeabilización adicional - IED Santa Librada	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	Viernes 24 de julio de 2026	
29	Ejecutar suministro de agua al cuarto de basuras - Sierra Morena	Media	Contratista de Obra - Lote 6	Sábado 25 de julio de 2026 (por confirmar)	
30	Remitir documentación completa por colegio (planos récord, manuales, actas, balances, cuadro de mayores y menores cantidades, entre otros) de los frentes ya cerrados	Alta	Contratistas de Obra - Lotes 4, 5 y 6	Viernes 31 de julio de 2026 (primera entrega)	

Convocatoria próximo comité:	28-07-2026 2:30 pm
Hora de finalización:	3:15 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 36

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet		**FECHA:**	28	07	2026	**HORA INICIO:**	2:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.							
PRESIDE:	INTERVENTORIA		**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS							

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	JOHN CASTAÑEDA
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 6	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Agredo F.	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Temas Generales

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 36

DESARROLLO

1. Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas

Para dar inicio al seguimiento del Lote 6, el Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría consulta al Contratista de Obra sobre el estado de la subsanación de las observaciones relacionadas con los ensayos de laboratorio.

El Ing. Wilson Parra – Director de Obra informa que establecerá comunicación con el laboratorio con el fin de realizar el respectivo seguimiento y gestionar la atención de los requerimientos pendientes.

- **IED Sierra Morena**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión, solicita informar el estado de seguimiento de las actividades correspondientes al sistema hidráulico de la sede.

  El Ing. Wilson Parra – Director de Obra manifiesta que los materiales requeridos ya fueron adquiridos y que actualmente se encuentra a la espera de la disponibilidad de personal para iniciar la ejecución de las actividades.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta si existe una fecha definida para el inicio de dichas labores.

  El Ing. Wilson Parra – Director de Obra indica que, en caso de no contar con la confirmación del personal para el 1 de agosto, se asignará otro equipo de trabajo para iniciar la ejecución.

- **IED Guillermo Cano Isaza**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta si fue identificada la causa de la filtración presentada sobre la batería de baños.

  El Ing. Wilson Parra – Director de Obra informa que, tras las revisiones realizadas, no fue posible determinar el origen de la filtración presentada en el segundo nivel. Adicionalmente se menciona que las baterías de baños del primer nivel no presentan afectaciones, por lo cual se realizará la respectiva entrega. Para el segundo nivel, se continuará con la ejecución de los acabados, exceptuando las actividades relacionadas con la cubierta. Finalmente, se programará la intervención de los baños ubicados en el tercer nivel.

- **IED Cundinamarca**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita informar la situación presentada en la sede, teniendo en cuenta las inconformidades manifestadas por el Rector.

El Ing. Fabián Fajardo – Residente de Obra informa que se identificó la ausencia de una cruceta en la tarima y que adicionalmente se encuentra pendiente el remate de la cornisa ubicada en la parte superior de uno de los arcos.

Posteriormente, el Ing. Wilson Parra – Director de Obra aclara que no existe certeza sobre si dichos elementos fueron retirados por el personal de obra o si ya no se encontraban instalados al momento del ingreso del equipo al sitio.

Como resultado de la discusión, se acuerda evitar prolongar la situación con la institución educativa; por tal motivo, el Contratista elaborará una respuesta formal explicando lo sucedido y procederá con la reposición de los elementos faltantes para garantizar el cierre de las observaciones.

- **Manuales de Mantenimiento**

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta si los manuales de mantenimiento aprobados correspondientes a las sedes Luis Eduardo Mora Osejo y Guillermo Cano Isaza ya fueron entregados a las respectivas instituciones educativas.

El Ing. Wilson Parra – director de Obra confirma que los manuales fueron entregados en medio físico en ambas sedes.

El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría señala que, para la sede Luis Eduardo Mora Osejo, se encuentra pendiente la formalización del acta de entrega, indicando que únicamente resta la firma del Supervisor para posteriormente gestionar la suscripción por parte del Rector y culminar el proceso de entrega.

2. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

- **IED Brasilia y Biblioteca Marichuela**

Para dar inicio al seguimiento del Lote 5, el Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría recuerda al Contratista la necesidad de llevar los manuales de mantenimiento durante las entregas y remitirlos igualmente por correo electrónico para su respectiva revisión y emisión del aval.

El Ing. Jonathan Grajales – Residente de Obra consulta si corresponden a los mismos manuales que habían sido entregados anteriormente.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión aclara que no es necesario elaborar nuevos manuales; únicamente deberá dejarse consignado en las actas de entrega que se deberán atender las recomendaciones contenidas en los manuales de mantenimiento previamente entregados.

- **IED Don Bosco - La Joya**

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión manifiesta que debe darse prioridad a la revisión del sistema de motobombas antes de la entrega de la sede.

El Ing. Cristian Neira – Director de Obra informa que la visita técnica con el proveedor quedó programada para el día siguiente a las 9:00 a.m., con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de las motobombas previo a la entrega definitiva.

- **IED Fernando González Ochoa**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta la fecha prevista para la entrega definitiva de la institución.

  El Ing. Jonathan Grajales – Residente de Obra manifiesta que las observaciones previamente formuladas ya fueron atendidas y propone realizar una visita técnica entre el jueves y el viernes junto con la Interventoría, con el fin de definir la fecha oficial de entrega.

- **IED José Jaime Rojas**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta el estado del acta y de la visita correspondiente a OTIC.

  El Ing. Jonathan Grajales – Residente de Obra informa que continúa adelantando la gestión de la cotización correspondiente al suministro e instalación de cable UTP categoría 6, la tubería requerida y las adecuaciones de la red telefónica, con el propósito de definir el presupuesto y programar la fecha de ejecución de la intervención.

- **IED Santa Librada**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión informa que para el fin de semana del 6 de agosto se podrá ejecutar la atención de la garantía, con el objetivo de ejecutar las actividades correctivas y dar solución durante el fin de semana.

3. Lote 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión informa que la entrega de la emergencia de la sede Fanny Mickey quedó programada para el 3 de agosto. De igual forma, señala que para la sede Compartir El Recuerdo se mantiene la misma programación, por ultimo se coordinara con la rectora de IED Ofelia Uribe la programación de la visita de entrega, prevista para realizarse al día siguiente o lo antes posible.

- **IED Los Tejares**

  El Ing. Diego Pinzón – Residente de Obra informa que, conforme a lo acordado en el comité anterior, el personal encargado de las actividades eléctricas realizará durante el fin de semana la revisión correspondiente para definir la viabilidad de efectuar la independización de los circuitos.

- **IED Compartir Recuerdo Sede B**

  El Ing. Diego Pinzón – Residente de Obra informa que actualmente se encuentra coordinando el personal para iniciar las actividades de pañetes y demás labores pendientes.

  Adicionalmente, indica que el sábado se realizaron las medidas para la fabricación de la baranda y que existe un acceso a través del muro que será demolido, razón por la cual se propone instalar la baranda de forma continua con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y reducir el riesgo de accidentes en las escaleras.

- **IED Ciudad de Villavicencio Sede A**

  El Ing. Diego Pinzón – Residente de Obra informa que, debido a la falta de personal operativo, no ha sido posible ejecutar las actividades programadas.

  Asimismo, se compromete a remitir un correo electrónico informando oficialmente la situación y la programación de atención mediante personal por administración durante la siguiente semana.

- **IED Brisas del Diamante**

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión consulta sobre las filtraciones que se presentan en las dos aulas de la sede.

  El Ing. Diego Pinzón – Residente de Obra informa que durante el fin de semana se tiene programada la ejecución de las actividades de impermeabilización.

  El Ing. César Carvajal – Residente de Interventoría comunica que la institución educativa manifestó su inconformidad con el paso de las bajantes por la fachada, teniendo en cuenta que la edificación cuenta con declaratoria patrimonial.

  Adicionalmente, presenta el registro fotográfico de las cubiertas con el fin de documentar las afectaciones identificadas.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita suspender cualquier intervención relacionada con las bajantes hasta llevar a cabo una reunión de concertación con la institución educativa, programada para el lunes 3 de agosto, en la cual se definirá la alternativa técnica más adecuada, respetando las restricciones derivadas de la condición patrimonial del inmueble.

4. Temas Generales

Se recuerda que los trámites administrativos ante la Secretaría de Educación para la primera semana de agosto únicamente pueden gestionarse entre lunes y miércoles; por tal motivo, se solicita programar oportunamente las entregas, visitas y demás actividades que requieran gestión administrativa.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 36

De igual manera, se reitera la necesidad de consolidar los balances financieros de todos los frentes de obra y de las actividades ejecutadas por concepto de emergencias, con el propósito de definir el alcance de las adiciones presupuestales requeridas.

Finalmente, se enfatiza que todas las solicitudes de adición deberán tramitarse durante el mes de agosto, con el fin iniciar las ejecuciones de las obras en el mes de septiembre.

Así mismo, se recuerda agilizar la gestión de firma de las actas pendientes, con el propósito de evitar retrasos administrativos en el cierre de los procesos.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Revisión técnica de las motobombas de la joya.	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	29 de julio de 2026	
2	Definir la permanencia o retiro de sanitario portátil en el Paraíso	Alta	Contratista de Obra - Lote 5	01 de agosto de 2026	
3	Respuesta de laboratorio frente a los ensayos.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	A la mayor brevedad	
4	Repara filtraciones en baños de Guillermo cano Isaza	Alta	Contratista de Obra - Lote 6	Antes de la entrega de la sede	
5	Informar oficialmente la situación de Villavicencio.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Próxima semana	
6	Realizar impermeabilización en Brisas del Diamante	Alta	Contratista de Obra - Lote 4.	Fin de semana	
7.	Remitir manuales de mantenimiento faltantes	Alta	Todos los contratistas	Antes de cada entrega	
8.	Presentar balances financieros consolidados de emergencias y frentes de obra	Alta	Todos los contratistas	Antes del 3 de agosto de 2026	

Convocatoria próximo comité:	04/08/2026 – 2:30 pm
Hora de finalización:	3:45 p.m.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 37

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet		**FECHA:**	04	08	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6.							
PRESIDE:	INTERVENTORIA		**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS							

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 5 y 6	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría – Lote 4	
Camilo Cárdenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador – Lote 4	
Natalia Cañon	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 5	
Alejandra Otalora	Consorcio Serinco Educativo	Coordinador– Lote 6	
Stefanía Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Agredo Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	
Diego Pinzon	Consorcio ARSAF	Residente de obra	
Deiby Yecid Arias	Consorcio ARSAF	Director de obra	
Cristian Neira	Consorcio Fortaleza	Director de obra	
Jonathan Grajales	Consorcio Fortaleza	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
2	Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
3	Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas
4	Temas Generales

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 37

DESARROLLO

1. **Lote 4 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

- **Revisión de planimetría para liquidación**

  El arquitecto Nicolás Hernández, coordinador de interventoría Lote 4, consultó el estado de entrega de los planos preliminares correspondientes a ARSAF, manifestando su preocupación debido a que la interventoría aún no los ha recibido, situación que dificulta el avance de la revisión técnica y administrativa.

  En respuesta, el residente de obra, Ing. Diego Pinzón informó que los planos se encuentran en proceso de organización y montaje en el formato definitivo, razón por la cual propuso realizar una mesa de trabajo durante la siguiente semana para efectuar la revisión conjunta.

  Posteriormente, la coordinadora de interventoría, Ing. Stefania Ceballos recordó que el compromiso inicialmente adquirido contemplaba la entrega de dicha documentación el viernes anterior.

  Frente a esta observación, el residente de obra explicó que la atención de las actividades relacionadas con las adiciones contractuales, la elaboración de los presupuestos correspondientes y las múltiples visitas técnicas ejecutadas durante la semana impidieron cumplir con el plazo inicialmente establecido

- **Presentación anticipada de documentación para liquidación contractual**

  El Arq. Santiago Ángel, Apoyo de la supervisión solicitó a los contratistas de los tres lotes de trabajo acelerar la consolidación y entrega de toda la documentación necesaria para el proceso de liquidación contractual. Explicó que, aunque las obras aún cuentan con aproximadamente cuatro meses de ejecución, la intención es iniciar la recopilación documental con suficiente anticipación para evitar retrasos durante el proceso de cierre contractual previsto para el siguiente año. Reiteró que esta estrategia representa un beneficio tanto para la interventoría como para los contratistas, al facilitar la revisión progresiva de los soportes y disminuir reprocesos.

  Asimismo, precisó que actualmente no es procedente iniciar procesos formales por incumplimiento debido a la falta de algunos documentos; sin embargo, advirtió que la entrega tardía podría afectar significativamente los tiempos de liquidación.

- **Revisión del presupuesto de emergencias**

  El Ing. César Carvajal, residente de interventoría presentó el balance actualizado del presupuesto destinado a las intervenciones de emergencia, informando que los recursos asignados prácticamente se encuentran comprometidos, especialmente por las actuaciones desarrolladas en el frente de La Unión. Durante la revisión presupuestal se evidenció la necesidad de ajustar el valor correspondiente a la emergencia eléctrica de la sede Arborizadora Alta, al identificarse mayores cantidades de tubería y acometidas que no habían sido consideradas inicialmente.

  El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión confirmó el resultado del análisis presupuestal realizado durante el fin de semana, indicando que, una vez efectuados los ajustes en los diferentes frentes, el saldo disponible asciende aproximadamente

a diez millones de pesos. De dicho valor se autorizó destinar dos millones para la impermeabilización de la placa del tanque en Tejares, quedando un saldo cercano a ocho millones para atender únicamente necesidades críticas previamente identificadas. Se concluyó que no será posible incorporar nuevas emergencias mientras no existan recursos adicionales.

- **Seguimiento a los frentes Brisas del Diamante, Compartir Recuerdo y Ciudad de Villavicencio**
  Durante la revisión de los diferentes frentes de obra, el Arq. Santiago Ángel solicitó nuevamente al equipo responsable remitir el registro fotográfico correspondiente a las actividades ejecutadas en la sede ***Brisas del Diamante***, con el propósito de fortalecer el soporte documental del proyecto. Respecto a la sede ***Compartir Recuerdo sede B***, se confirmó que el inicio de las actividades constructivas se mantiene programada para el día 15 de agosto, mientras que el cerramiento del área será implementado el 20 de agosto con el acompañamiento del personal de vigilancia.

  En cuanto a la emergencia de ***Ciudad de Villavicencio sede A***, se ratificó igualmente el inicio de actividades para el 15 de agosto, indicando que, pese a las dificultades presentadas para la consecución de personal, el cronograma no será modificado. Como compromiso adicional, el contratista actualizará el listado del personal que será vinculado a este nuevo frente de trabajo.

- **Atención de garantías en Estrella C y Estrella D**
  El Ing. Diego Pinzón, residente de obra informó que en la sede ***Estrella C*** fue intervenida la bisagra correspondiente a uno de los accesos, explicando que el deterioro se produjo como consecuencia de la acción permanente del viento. Señaló igualmente que al día siguiente realizará la aplicación de pintura y elaborará un registro audiovisual que servirá como evidencia de la atención de la garantía.

  Respecto a la sede ***Estrella D***, explicó que la filtración presentada tuvo origen en el desprendimiento de un flanche durante la instalación de la cubierta en PVC, situación que ya fue corregida. Finalmente, se comprometió a remitir el informe técnico correspondiente antes del viernes.

- **Coordinación técnica para la sede La Unión**
  Se acordó efectuar una visita técnica conjunta con la participación del Arq. Santiago Ángel y los Ing. Diego Pinzón y César Carvajal, con el propósito de revisar las condiciones actuales del proyecto y definir las actividades pendientes.

- **Cicloparquedero**
  Durante el presente comité se abordó el tema de la fabricación del ciclo parqueadero, recomendándose avanzar en su elaboración pese a las modificaciones efectuadas sobre la ubicación, que inicialmente estaba prevista para la IED Fanny Mickey. Quedamos a la espera de que se defina el colegio donde va a ser instalado.

- **Bajantes en Brisas del Diamante**
  Se planteó la alternativa de construir un buitrón en ladrillo a la vista para la sede ***Brisas del Diamante***; sin embargo, esta opción es descartada debido a las restricciones presupuestales, determinándose que la solución definitiva consistirá en la instalación de bajantes a la vista. Finalmente, se programó una reunión virtual para

revisar el registro fotográfico de dichas bajantes antes del encuentro previsto con el rector de la institución.

- **Presentación de APU´s de Nuevos Ítems No Previstos (NP´s)**
  El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión recordó a los responsables de los lotes 4, 5 y 6 la obligación de presentar los NP´s pendientes, señalando que este trámite es demorado por parte de la entidad. En consecuencia, solicitó priorizar la radicación de los NP´s para evitar retrasos posteriores durante la ejecución y cierre administrativo de los contratos.

- **Revisión de la propuesta de adición para José Celestino Mutis**
  Durante el análisis técnico de la sede José Celestino Mutis se revisó la propuesta de impermeabilización estimada en aproximadamente 209 millones de pesos. El Arq. Santiago Ángel instruyó al equipo técnico para que el presupuesto sea elaborado considerando el escenario más crítico, incluyendo las actividades de alistado necesarias para garantizar una intervención integral.

  Asimismo, indicó que la prioridad será intervenir completamente el bloque uno y, únicamente en caso de disponibilidad presupuestal, extender las actividades hacia los demás bloques. Finalmente, descartó el uso de poliurea debido a su elevado costo, orientando la solución hacia sistemas convencionales de impermeabilización.

2. **Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

- **Seguimiento a la sede Paraíso Mirador D**
  El Arq. Santiago Ángel destacó el buen avance presentado en las actividades de cerramiento de la sede Paraíso Mirador D, reconociendo el cumplimiento de la programación establecida. No obstante, solicitó al Ing. Cristian Neira, director de obra reforzar el control de calidad durante la ejecución de los trabajos de pintura, haciendo énfasis en las uniones metálicas y soldaduras que permanecen expuestas, con el fin de garantizar la adecuada protección de las superficies y evitar deterioros prematuros una vez la obra sea entregada.

- **Instalación de servicios en la sede José Jaime Rojas**
  El Ing. Cristian Neira informó que ya se realizó la contratación del personal para ejecutar las instalaciones telefónicas y el cableado de red OTIC, indicando que los trabajos fueron programados para desarrollarse durante la siguiente semana. El Arq. Santiago Ángel manifestó su conformidad con la programación propuesta y solicitó realizar seguimiento permanente a la ejecución para garantizar que las instalaciones cumplan con los requerimientos técnicos establecidos.

- **Retiro de escombros en Nueva Esperanza y Fernando González Ochoa**
  El Arq. Jonathan Grajales e Ing. Cristian Neira, representantes del contratista de obra, informaron que se programó un recorrido con vehículo para efectuar el retiro de los escombros acumulados en las sedes Nueva Esperanza y Fernando González Ochoa.

  Se indicó que esta actividad permitirá mejorar las condiciones de orden y aseo en ambos frentes de trabajo, facilitando la continuidad de las actividades constructivas y reduciendo riesgos para la comunidad educativa.

- **Presupuesto de emergencia para Gabriel García Márquez**
  Durante la revisión presupuestal se aprobó la intervención correspondiente al bloque dos de la sede Gabriel García Márquez mediante actividades de impermeabilización, destinando un presupuesto aproximado de 84 millones de pesos. El Arq. Santiago Ángel solicitó que se incluya la pintura de las pérgolas.

- **Atención de garantía en Santa Librada**
  Se confirmó que la atención correspondiente a la garantía de la sede Santa Librada se encuentra programada para el 6 de agosto, de conformidad con los compromisos previamente adquiridos. Durante la reunión se reiteró la necesidad de cumplir estrictamente con esta programación para evitar nuevos requerimientos por parte de la institución educativa y asegurar el cierre oportuno de las observaciones pendientes.

- **Recepción de materiales en la sede Paraíso Mirador**
  El Arq. Jonathan Grajales aclaró que los materiales entregados en la sede Paraíso fueron recibidos correctamente por el inspector de obra, desvirtuando las inquietudes previamente planteadas por el almacenista respecto al procedimiento de recepción. Con esta aclaración se dio por resuelto el asunto y se confirmó la continuidad de las actividades programadas.

3. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas

- **Investigación de filtraciones en el colegio Guillermo Cano**
  El inspector de interventoría, Camilo Cárdenas informó que durante las inspecciones realizadas fueron identificadas dos filtraciones en los baños del segundo piso: una asociada a aguas servidas y otra correspondiente a una humedad antigua localizada sobre la fachada.

  Frente a esta situación, el Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión ordenó suspender temporalmente las actividades de acabado en los baños hasta identificar plenamente el origen de ambas filtraciones y ejecutar las reparaciones correspondientes, evitando que posteriormente se generen reclamaciones por parte de la institución educativa.

  Por su parte, el Ing. Wilson Parra, director de obra manifestó que los trabajos correctivos iniciarán al día siguiente, una vez el oficial encargado retorne a sus labores luego de una incapacidad médica.

- **Seguimiento a las filtraciones en Luis Eduardo Mora Osejo**
  Los Ing. John Castañeda y Fabio Fajardo, residentes de interventoría y obra respectivamente, informaron que continúan presentándose filtraciones en el baño de hombres de la institución, pese a las verificaciones previamente realizadas.

  Explicaron que las pruebas con tintas no permitieron identificar con precisión el origen de la fuga, razón por la cual propusieron efectuar el desmonte de los orinales existentes para inspeccionar completamente las redes hidráulicas y sanitarias, con el propósito de localizar definitivamente la causa del problema y ejecutar una solución permanente.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 37

- **Situación presentada en el Colegio Cundinamarca**
  Durante la reunión se analizó el conflicto generado con el rector del Colegio Cundinamarca respecto a una tarima que presuntamente habría sido afectada durante la ejecución de las obras.

  Con el fin de sustentar técnicamente la posición del contratista, el Arq. Santiago Ángel solicitó a los Ing. Wilson Parra, Fabio Fajardo y Camilo Andrés Cárdenas recopilar toda la evidencia fotográfica disponible que permita demostrar la trazabilidad del elemento antes, durante y después de la intervención.

- **Avances en Santa Librada y Eduardo Umaña**
  Respecto a la sede Santa Librada, se aprobó por el componente de obras prioritarias, el ejecutar la impermeabilización de la placa correspondiente a los baños, actividad que incluirá previamente el retiro y reubicación de las materas existentes para habilitar completamente el área de trabajo. Adicionalmente, se realizará la pintura de los corredores con el objetivo de entregar el frente de obra completamente finalizado.

  En relación con la sede Eduardo Umaña, el Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión informó que existe una disponibilidad presupuestal cercana a 85 millones de pesos destinada a actividades de impermeabilización, razón por la cual solicitó presentar a la mayor brevedad la programación de inicio de dichas actividades.

- **Propuestas de adición para Rafael Uribe y Guayasamín**
  Durante la reunión se revisaron las propuestas de modificación presupuestal correspondientes a las sedes Rafael Uribe y Oswaldo Guayasamín. Se informó que la propuesta para Rafael Uribe asciende aproximadamente a 170 millones de pesos, mientras que para Oswaldo Guayasamín se contempla una adición cercana a 130 millones de pesos, recursos que estarán orientados principalmente a la intervención de las baterías sanitarias. Se acordó continuar con el trámite administrativo necesario para su radicación y evaluación.

- **Emergencia en Puerta del Llano**
  El Arq. Santiago Ángel informó que no se realizará ninguna intervención sobre el volumen estructural de la sede Puerta del Llano hasta contar con el concepto técnico emitido por la Secretaría. En consecuencia, se descartó la ejecución del cambio de cubierta que inicialmente hacía parte del presupuesto de emergencia, toda vez que la intervención estructural asociada no será ejecutada en esta etapa del proyecto.

- **Estado del NP-18**
  El Ing. Wilson Parra, director de obra consultó el estado del trámite correspondiente al NP-18, debido a que no se tenía claridad sobre su avance administrativo. En respuesta, el Arq. Santiago Ángel informó que el documento actualmente se encuentra en proceso de recolección de firmas y precisó que fue remitido con posterioridad al envío del oficio anterior, razón por la cual aún no se evidencia dentro de la documentación previamente socializada. Se indicó que, una vez finalice el ciclo de firmas, el NP continuará con el procedimiento administrativo correspondiente.

4. **Temas Generales**

- **Análisis de la capacidad operativa y número de frentes de obra**

  La Ing. Stefania Ceballos, coordinadora de interventoría manifestó su preocupación frente al incremento progresivo de los frentes de trabajo, señalando que con la incorporación de las adiciones y de las diferentes emergencias, la interventoría estaría atendiendo cerca de trece frentes simultáneamente, situación que podría afectar la capacidad operativa del equipo de trabajo.

  Frente a esta inquietud, el Arq. Santiago Ángel explicó que se realizó un análisis detallado de la programación contractual hasta el 5 de octubre, concluyendo que el volumen de actividades resulta administrativamente manejable, considerando que varios frentes se encuentran próximos a finalizar y que las intervenciones por emergencia están limitadas por la disponibilidad presupuestal existente.

  Adicionalmente, precisó que no se presentaran nuevas emergencias fuera de la localidad y que el cronograma previsto continúa siendo viable, por lo cual no considera necesario establecer un número máximo de frentes diferente al contemplado dentro de las adiciones aprobadas.

- **Estrategia para la radicación de la documentación de obra e interventoría para el modificatorio**

  El Arq. Santiago Ángel presentó la estrategia definida para la radicación de la documentación técnica y administrativa ante la profesional jurídica encargada del proceso durante la siguiente semana. En este sentido, solicitó que tanto el equipo de obra como el equipo de interventoría entreguen durante el fin de semana la totalidad de los documentos pendientes, con el propósito de efectuar una revisión integral antes de su radicación y evitar reprocesos derivados de inconsistencias documentales.

  Señaló que el objetivo principal consiste en obtener la aprobación de todas las obras durante el mes de agosto, evitando el vencimiento de los documentos correspondientes a las Instancias de Acompañamiento Social (IAS). Igualmente, indicó que no deberá adelantarse la radicación por parte de la interventoría de manera independiente, ya que esto podría generar inconsistencias entre la documentación presentada por ambas partes. Finalmente, manifestó que mientras se consolida el expediente administrativo, el equipo podrá continuar adelantando las revisiones técnicas necesarias.

- **Definición de frentes de emergencia y programación de adiciones**

  La Ing. Stefania Ceballos consultó la posibilidad de definir antes de finalizar el mes de agosto el número de frentes de emergencia que serán ejecutados y el valor asociado a cada uno de ellos, con el fin de facilitar la planeación de recursos y personal.

  El Arq. Santiago Ángel respondió que dicha definición será posible siempre que exista coordinación con la líder de la gestión territorial, encargada del proceso. Explicó que contar con las adiciones aprobadas durante agosto permitirá iniciar las nuevas actividades en el mes de septiembre, evitando que su ejecución se traslade hasta octubre y generando beneficios tanto para el contratista como para la interventoría.

Adicionalmente, recordó que, aunque el contrato de obra finaliza el 30 de diciembre, la meta institucional consiste en culminar físicamente las actividades durante el mes de noviembre, disponiendo así de un mes adicional para desarrollar adecuadamente el proceso de liquidación contractual.

- **Gestión de recursos y coordinación entre los frentes de obra**
  Stefania Ceballos, coordinadora de interventoría expresó nuevamente su preocupación respecto a la capacidad del equipo para atender simultáneamente los diferentes frentes de emergencia, señalando que la disponibilidad actual de personal resulta limitada frente al volumen de actividades programadas.

  El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la supervisión manifestó que esta situación puede controlarse mediante una mejor coordinación operativa entre los residentes, inspectores y profesionales de apoyo, indicando que está dispuesto a incrementar la frecuencia de las visitas técnicas o realizar seguimiento permanente mediante herramientas como WhatsApp cuando el personal de obra deba atender actividades administrativas. Reiteró que la presión ejercida sobre el contratista busca garantizar que la totalidad de los frentes se encuentren concluidos a comienzos de octubre, facilitando así el cierre técnico y administrativo de los contratos dentro de los tiempos previstos.

- **Revisión de evidencias fotográficas relacionadas con las tarimas del Colegio Cundinamarca**
  Los Ing. Wilson Parra, John Castañeda y Fabio Fajardo realizaron un análisis cronológico del registro fotográfico correspondiente a la tarima ubicada en el Colegio Cundinamarca, revisando imágenes tomadas antes y después de la intervención. Durante la discusión se evidenció que las crucetas de la estructura no se encontraban instaladas al momento de la inspección posterior, situación que inicialmente originó las reclamaciones formuladas por la institución educativa. No obstante, tras revisar las evidencias disponibles, se concluyó que la estructura habría sido desmontada y movilizada por terceros con ocasión de un evento desarrollado el 23 de junio, y no como consecuencia de las actividades ejecutadas por el contratista.

  El Ing. Camilo Cárdenas, inspector de interventoría aportó adicionalmente un registro fotográfico fechado el 22 de junio, en el cual se observa la estructura completamente instalada antes del evento mencionado, evidencia que será incorporada como soporte para la defensa técnica y administrativa del contratista.

- **Estado administrativo del Consorcio País**
  Como último punto del comité, el Arq. Santiago Ángel informó que la Secretaría emitió respuesta respecto a la actualización de terceros correspondiente a Consorcio País, indicando que no resulta necesario efectuar modificaciones en el registro existente, toda vez que los cambios presentados no alteran la composición ni las condiciones jurídicas del consorcio. Explicó igualmente que el tercero deberá mantenerse registrado bajo el régimen simple, de acuerdo con la información contenida en el último RUT presentado. Finalmente, solicitó al Ing. Wilson Parra revisar internamente la respuesta remitida por correo electrónico y adelantar las gestiones necesarias para dar cierre definitivo a este asunto administrativo.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 37

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Entregar los planos récord (As Built) correspondientes a las obras finalizadas.	Alta	Todos los contratistas	Próxima semana	
2	Ajustar el presupuesto de la emergencia en Arborizadora Alta de acuerdo con el trazado definitivo de la tubería.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	A la mayor brevedad	
3	Fabricar el cicloparqueadero para su instalación.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Pendiente	
4	Contratistas de los Lotes 4, 5 y 6	Alta	Todos los contratistas	A la mayor brevedad	
5	Presentar la propuesta presupuestal para la impermeabilización de la sede José Celestino Mutis.	Alta	Contratista de Obra - Lote 4	Pendiente	
6	Retirar los escombros de las sedes Nueva Esperanza y Fernando González Ochoa.	Alta	Contratista de Obra - Lote 5.	05/07/2026	
7.	Identificar y reparar las filtraciones en los baños del colegio Guillermo Cano.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	A la mayor brevedad	
8.	Consolidar el registro fotográfico que soporte la trazabilidad de la tarima del Colegio Cundinamarca.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	Pendiente	
9.	Gestionar el retiro y reubicación de las materas de Santa Librada para habilitar la ejecución de la placa.	Alta	Contratista de Obra - Lote 6.	A la mayor brevedad	

Convocatoria próximo comité:	10/08/2026 – 2:30 pm
Hora de finalización:	5:10 p.m.

ANEXO No. 05. PLANILLAS DE PAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93907321		2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	Y	$0	$1.242.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	437.800	0		0		0	0	0	0	437.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.800				243.800	0	0	243.800			2.438	243.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.800	437.800
Pensión	2	560.400	560.400
Riesgos Laborales	1	243.800	243.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.242.000	1.242.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93907321		2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	Y	$0	$1.242.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93877417	18/08/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$10,505,430	$2.256.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	8	900	0	141.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	8	1.700	0	282.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	8	1.700	0	281.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	8	1.700	0	281.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	8	3.400	0	563.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	8	1.700	282.300			2.806	282.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	8	2.600	423.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	423.200
Pensión	3	1.120.800	1.127.600
Riesgos Laborales	1	280.600	282.300
CCF	1	420.600	423.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.256.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93877417	18/08/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$10,505,430	$2.256.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SEGA INGENIERIA SAS BIC**, identificada con **NI** número **901219974**, aportó por **VIVIANA ALEJANDRA MIRANDA CAÑON** identificado(a) con **CC** número **1016053198** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Junio - 2026	93209818	09/07/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,750,905	0.00522	$9,200	$0	$0	Junio - 2026	93209818	09/07/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$1,750,905	0.16000	$280,200	$0	$0	Junio - 2026	93209818	09/07/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Julio - 2026	93209818	09/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94196941	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$535.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	0	0	0	235.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	0	0		300.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.000
Pensión	1	300.800	300.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	535.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94196941	10/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$535.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	14/07/2026	67554595	$851.040	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	167.040							167.040			76	167.040	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	167.040	167.040
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	851.040	851.040

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	14/07/2026	67554595	$851.040	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	300.000	14-4	2.450.000	5	167.040		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 06. CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensación Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto.
En mi condición de representante legal del **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** identificado con NIT. **901.977.271-0**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros del consorcio, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas Compensacion Familiar, el consorcio se encuentra paz y salvo en los últimos 6 meses, con el personal vinculado bajo nómina y ha realizado los respectivos pagos.

Respecto a los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del contrato.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de agosto de 2026.

JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA.
CC. 79.768.840 DE BOGOTÁ
TP. 151.202-T
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

CURIEUX MIRANDA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

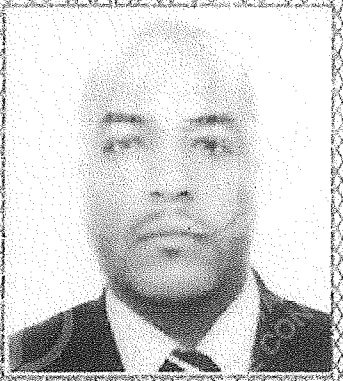
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42117876-M-0079768840-20031002 03871 03274B 01 150171711

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151202-T



JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768840
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161615

FIRMA DEL TITULAR

76162

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A386E08D0EF8ABB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

NIT 901.094.289-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 -
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, identificada con NIT. 901.094.289-2, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos.

Se certifica que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el pago de obligaciones de todo el personal vinculado directamente, incluido el personal independiente que prestó sus servicios para la ejecución del proyecto “Respecto a los pagos correspondientes al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, acorde con el literal 3 del artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013, y para los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la empresa se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el artículo 8. “Exoneración de aportes parafiscales” del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional y salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de agosto de 2026.

MARIA GLADYS RINCON HURTADO.
CC. 46.674.785 DE DUITAMA.
TP. 126815-T
Revisora Fiscal
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 DE BOGOTA
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

RINCON HURTADO

APELLIDOS

MARIA GLADYS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAR-1997 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **0006**260471A 1 7300010240

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126815-T

MARIA GLADYS
RINCON HURTADO
C.C. 46674785
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS 5.2 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B464C57000C8960

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 07. REGISTRO CAPACITACIONES

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO Nº:		FT-SST-053
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 26/11 MES Julio AÑO 2025 HORA ___ Nº PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS: ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Santa Librada Nº DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS: ___ Una persona es necesario

TRABAJO A REALIZAR: Cambio de Malla y Retiro de Gradas

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	generación al ingreso supervisor de sst, y postura de dotación areas y superficies irregulares orden y aseo.
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel irregularidades	verificación de las areas antes inicio de labores
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanicos manipulacion manual de cargas condiciones de seguridad locativo, orden y aseo	manipulacion manual de cargas levantar movimientos repetitivos, caidas a mismo nivel golpes, cortaduras quedar con un mismo objeto	emplear buenas posturas metodos manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiales y herramientas
4	Retiro de malla y retiro de tablones	físicos: ruido, temperatura extrema biomecánicos, posturas prolongadas químicos: gases y vapores	perdida auditiva enfermedad respiratoria general osteomuscular otros	capacitación causa activa uso de equipo de protección adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	químicos: material particulado condiciones de seguridad biomecanicos	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla locativas inspección de area rotación de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpes, y cotusion	verificacion de areas inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

RRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Espátula Cuchara

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Cero guantes tapabocas ha sido todos gafas casi

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jhon Bolivar	7590705	Tecnico	Jhon B	Jhon B	—	+	✓	
Kevin Torres	1073674206	Tecnico	Kevin	Kevin	Kevin		Kevin	
SEBASTIAN MORA	1012316783	Tecnico	Sebs	Sebs	Sebs		Sebs	
Kevin Guillen	1007411217	Practicante	—	—	—	—		

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Jhon Bolivar M.	Reviso	Edwin Leon	Otro	
Nombre, CC	7590705.	Nombre, CC	1077946408	Nombre, CC	
Trabajador		SST	Edwin Leon	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha: Nov. 18 de 2025
		Versión: 1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea

I. IDENTIFICACION

FECHA DIA 04 MES Nov AÑO 2026 HORA N° PERSONAS DE TRABAJO RELACIONADOS

LUGAR DE TRABAJO Colegio Gerardo Paz IED N° DE TRABAJADORES EN EL PUESTO DE TRABAJO (Por genero y en total)

TRABAJO A REALIZAR Instalación de equipos y cableado Institucional de datos y Video Electrico

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCION PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	prevención al ingreso supervisión de epp y prueba de dotación areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel irregularidades	verificación de las areas antes antes de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico manipulación manual de cargas condiciones de seguridad locativo orden y aseo	manipulación manual de cargas descarga (movimiento especifico, caidas a mismo nivel golpes cortaduras punzadas en miembros superiores	emplear buenas posturas mecanica manipulación de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiales y herramientas
4	Instalación de tubos electrico y telefonia Ambiente de tubos	fisico ruido temperatura extrema biomecanico posturas prolongadas químico gases y vapores	perdida auditiva enfermedad respiratoria general osteomuscular	capacitación para activa uso de equipo de soldadura almacenado uso adecuado en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	químico material particulado condiciones de seguridad biomecanico	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas inspección de area rotación de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y colusion	verificación de areas inspección de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

alicate destornillador cuchillo pala bota pantalon overol boquillera

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

casco guantes lentes tapabocas botas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Deyvid Vilca	1022478932	oficial						
Heiber Jaramillo	1000782681	Ayudante						
victor lopez	1020346935	aux						
Manuel Galindo	6871955	OFICIAL						
Andres Pinto	1062187102	Ayudante						
Anderson Diaz	1031823311	Aux elc.						
Jhon Pirapaz	1083826413	Aux elc.						
Gilmer Diaz	1011553649	Tecnico						
STEVEN [illegible]	1010556316	MAESTR						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	MAESTRO	Reviso	Edwin Ferro	Otro	
Nombre, CC	1079556316	Nombre, CC	1072469106	Nombre, CC	
Trabajador		SST	Edwin Ferro	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 06/11 MES Julio AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Glorieta ciudad de villavicencio. N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Dotacion y arreglo de Epp. Instalacion de Rejo

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	Dotacion y arreglo de Epps. Instalacion de rejo	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecalco; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomus culares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	químico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pesa pala pala barra Una cinta

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes botas tapa oidos Gafas Chaleco

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Andres Izquierdo	1053938662	Oficial	—	—	descanso	descanso	descanso	descanso
Mario Diaz	7.306.675	Contratista	—	—	—	—	—	—
Cristian Posada	1017.314.645	Ayudante	—	—	—	—	—	—
Jaiyer calderon	1007973331	Ayudante	—	—	—	—	—	—
Arlinton Zapata	80.121.587	Maestro O	—	—	—	—	—	—
Paula Jse Ruiz	80767389	Instalador	BRUCE	BRUCE	BRUCE	BRUCE	—	—
wilson Posada	1022933256	Ayudante	—	—	—	—	—	—

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Patrono Mauricio	Revisó Edwin Cortes	Otro
Nombre, CC 1.036.945.675	Nombre, CC 1017249108	Nombre, CC
Trabajador	SST Edwin Cortes	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 3 4/18 MES Nov AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Guillermo Cano IPSE N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR demolicion y Enchapado de baños y Salas

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	demolicion y Enchapado de baños y Salas	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomusculares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

guante pantalon gafas botas tapabocas casco

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco Lentes tapabocas guantes botas overol

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
victor lopez	1022454955	aux						
Heiber Jaramillo	1000780681	AUX	Heiber	Heiber	Heiber	Heiber	Heiber	Heiber
Deyver urrea	1022473833	oficial	Deyver	Deyver	Deyver	Deyver	Deyver	Deyver
Andres A	1010 248 702	Auxiliar	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres
Andrés Izquierdo	1037938061	OFICIAL						
Manuel Cardona	1821955	OFICIAL	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
[illegible]	1076055316	MAESTRO						

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	[illegible]	Revisó	Edwin Lenis	Otro	
Nombre, CC	1076055316	Nombre, CC	1077984108	Nombre, CC	
Trabajador		SST		Otra firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-080
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 13 AL 18 MES Julio AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Gloria Cabrera Mar rosado N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (No. incluido el responsable)

TRABAJO A REALIZAR descapote y partida de pared y piso baño

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	I. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	II. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico,manipulacion manual de cargas condicione de seguridad,locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesquelético, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punzadas en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipule peso mayor a su capacidad organización de materiales y herramientas
4	descapote y partida de pared y piso baño	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecanico, posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomusculares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla hidratacion inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y colusion	verificacion de areas inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

TRABAJO REQUERIDAS

Uso [illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco [illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Cargo	Edinson Cerro	Revisó	Edinson Cerro	Otro	
Nombre CC	1072657108	Nombre CC	1072657108	Nombre CC	
Trabajador	Edinson Cerro	SST	Edinson Cerro	Otro ítem que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-263
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Mes 10 de 2023
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS debera ser elaborado, revisado y publicado antes de iniciar la labor por los personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA 04/10/2023 HORA ___ N° TRABAJOS DE TRABAJO SEGURO ACTIVIDADES ___

LUGAR DE TRABAJO ___ N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ No. Aprox. de trabajadores

TRABAJO A REALIZAR ___

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCION PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad/superficies irregulares	superficies irregulares	Inducción al Inicio supervisión de uso y postura de dotación, areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad/superficies irregulares	desorden, irregularidades	verificación de las areas antes inicio de charlas
3	aislamiento de material y herramientas	Inconsistencia manipulación manual de cargas condiciones de seguridad/orden aseo	Inadecuada manipulación manual de cargas, atención prolongada/desplazamiento, caídas a mismo nivel, golpes, cortaduras, punzadas, uso de herramientas, lesiones	cumplir buenas practicas manejo, manipulación de cargas no manipule peso mayor a su capacidad, organización de materiales y herramientas
4	[illegible]	fisico, ruido temperatura extrema biomecanico posturas inadecuadas químico: gases y vapores	perdida auditiva, enfermedad respiratoria, general, dolorosas, cefalea	capacitación, pausas activa uso de equipo de soldadura adecuado uso adecuado en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalización	químico, materia particulado condiciones de seguridad biomecanico	material particulado desorden de piso posturas inadecuadas	mantenimiento señalización, inspección de areas, ubicación de señalados
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpes y colisión	verificación de areas, inspección de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pala pica talla metro plomo pita La Cuadrilla

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

casco gafas tapabocas guantes botas overol arnes

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Carlos Zuluaga	80.181.081	N. de Obra	Nocturno	Nocturno	Nocturno	Nocturno	Nocturno	Nocturno
Jeison Bolaño	1007973351	Ayudante						
[illegible]	1022983256	AUXILIAR						
Jaider Acosta	1023914012	AUX						
Rodrigo [illegible]	80.771.232	AUX	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo	Rodrigo

IV RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Nombre. Rodrigo	Revisó	Edwar Ruiz	Otro	
Nombre CC	CC 1.49.027	Nombre CC	1077860	Nombre CC	
Trabajador	Nombre	SST	Edwar Ruiz	Otro firma que participa en la elaboración de mapa	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 20 AL 25 MES 10/62 AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Ciudad de villavicencio N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado)

TRABAJO A REALIZAR Excavacion

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp, y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad:superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico:manipulacion manual de cargas condicione de seguridad:locativo ordeny aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismó nivel,golpes,cotusiones,punciones en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organización de materiazles y herramientas
4	Extintores de tecnologia de colgún.	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecaico; posturas prolongadas qumico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria,general,osteomus culares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pala pica barra cuchilla nivel plomada.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes botas respirador botas overol guantes gafas

III OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Rodrigo Izquierdo	80879232	Ayudante	—	Rodazol	Rodazol	Rodazol	Rodazol	Rodazol
Dilmer A	1010218904	Ayudante	—	Medicina	Medicina	Medicina	Medicina	Medicina
Hallon R.	901181089	Dcente	—	N.R.V	N.R.V	N.R.V	N.R.V	N.R.V
Joseph Baron	1007973331	Ayudante	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			—					

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	(HALLON) ROMERO	Reviso	Edinson Baron	Otro	
Nombre, CC	901181089	Nombre, CC	1072980808	Nombre, CC	
Trabajador	HALLON ROMERO	SST	Edinson Baron	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea.

I. IDENTIFICACION.

FECHA DIA 20 MES Julio AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio gerardo arango mora N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (Ver permiso (s) relacionado(s))

TRABAJO A REALIZAR Enchapado de baños

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico,manipulacion manual de cargas condicione de seguridad locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas,desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punzo nes en miembros inferiores	emplear buenas posturas metodos manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organizacion de materiales y herramientas
4	Enchapados de baños	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecanico: posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria general,osteomus culares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	marterial particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

ERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

Pulsómetro Llaves pelas Machete guadaña

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco guantes tapabocas tapa oídos botas dotación botas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
[illegible]	76245563/6	maestro	H	H	H	H	H	
Heiber Jurado	1006782687	Ayudante	Hejer	Hejer	Hejer	Hejer	Hejer	
Reyner urrea	1042928935	Oficial	Ahí hay	Ahí hay	Ahí hay	Ahí hay	Ahí hay	
Hector Lopez	1024546955	aux	Hector	Hector	Hector	Hector	Hector	
Manuel Galvis	6/8021955	Oficial	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
Andrés Laguna	1022932062	oficial	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	Andrés	

IV. RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Elaboro	Efrain Jurado	Reviso	Edinson Lopez	Otro	
Nombre CC	1024550316	Nombre CC	1077982508	Nombre CC	
Trabajador		SST	Edinson Lopez	Otro firma que requiera por la complejidad del trabajo	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT-SST-093
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov. 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea

I. IDENTIFICACION

FECHA DIA 28 MES Julio AÑO 2026 HORA ____ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ____

LUGAR DE TRABAJO Colegio Ciudad de Villavicencio N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ____ (Un permiso por trabajador)

TRABAJO A REALIZAR Excavacion manual y hechura de cajas

II. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	**Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	**Charla diaria y firma de permisos**	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel,irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	**alistamiento de material y herramientas**	biomecanico manipulacion manual de cargas condicione de seguridad locativo orden y aseo	manipulacion manual de cargas desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel,golpes,cotusiones,punzo nes en miembros superiores	emplear buenas posturas metodos, manipulacion de carga no manipular peso mayor a su capacidad organizacion de materiales y herramientas
4	Excavacion manual y hechura de cajas	fisico: ruido ,temperatura extrema biomecanico: posturas prolongadas quimico: gases y vapores	perdida auditiva,enfermedad respiratoria general,osteomus culares	capacitacion,pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso extintor en puntos de trabajo
5	**cerramiento y señalizacion**	quimico: material particulado condiciones de seguridad biomecanico	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas ,inspeccion de area,rotacion de actividades
6	**finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo**	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe,y cotusion	verificacion de areas ,inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

VII HERRAMIENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

pica pala barretón cuña palustre carretilla manta guantes

VIII ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y COLECTIVOS

Casco gafas botas overol tapa oídos botas guantes visual

IX OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
[illegible]	[illegible]	Ayudante	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
[illegible]	[illegible]	Oficial	Fr[illegible]	Fr[illegible]	Fr[illegible]	Fr[illegible]	Fr[illegible]	Fr[illegible]
[illegible]	[illegible]	Oficial	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

X RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO

Cargo:	Revisó:	Cargo:	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Trabajador	Vo.Bo.	Otro:	Otro (cual) que requiera por la complejidad del trabajo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:		FT SST 061
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha	Nov 18 de 2025
		Versión	1

INSTRUCCIONES

Este ATS deberá ser elaborado, revisado, y publicado antes de iniciar la labor por las personas responsables de la tarea

I. IDENTIFICACION

FECHA DIA 27 del MES Nov AÑO 2026 HORA ___ N° PERMISOS DE TRABAJO RELACIONADOS ___

LUGAR DE TRABAJO Colegio Gustavo Arango Zapata N° DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS ___ (no incluir en observaciones)

TRABAJO A REALIZAR pintura y enchapado baños

II. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

	1. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRABAJO	PELIGROS	RIESGOS	3. ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
1	Ingreso al proyecto y postura de dotación y elementos de protección personal	Condiciones de seguridad superficies irregulares	superficies irregulares	precaucion al ingreso supervision de epp y postura de dotacion areas y superficies irregulares orden y aseo
2	Charla diaria y firma de permisos	Condiciones de seguridad superficies irregulares	desnivel irregularidades	verificacion de las areas antes inicio de charlas
3	alistamiento de material y herramientas	biomecanico manipulacion manual de cargas condicione de seguridad locativo orden y aseo	manipulacion materiales cargas desorden musculoesqueletico, caidas a mismo nivel golpes colusiones pinzamiento en miembros superiores	emplear buenas posturas metodos manipulacion de carga no manejar peso mayor a su capacidad organizacion de materiales y herramientas
4	demolicion y enchapado de baños	fisico ruido temperatura extrema biomecanico posturas prolongadas quimico gases y vapores	perdida auditiva enfermedad respiratoria general osteomuscular	capacitacion pausa activa uso de equipo de soldadura adecuado uso calzado en puntos de trabajo
5	cerramiento y señalizacion	químico material particulado condiciones de seguridad biomecanico	material particulado desnivel de piso posturas inadecuadas	mascarilla tapabocas inspeccion de area rotacion de actividades
6	finalizacion de actividades orden y aseo en areas de trabajo	condiciones de seguridad superficies irregulares con presencia de material	caida golpe y colusion	verificacion de areas inspeccion de actividades
7				
8				

Powered by CamScanner

RAMENTAS DE TRABAJO REQUERIDAS

palas, barra, pica, pisón, machete, azadón, rastrillo, machete, pisón, pica, carretilla, machete, pisón, pica, carretilla, machete, pisón, pica, carretilla

ANEXO No. 08. REGISTRO FOTOGRAFICO

 	 
Fotografía No.1: Instalación rejillas – Zona corredor jardineras	**Fotografía No.2:** Instalación de césped jardineras
 	 
Fotografía No.3: Instalación de césped jardineras	**Fotografía No.4:** Instalación de césped jardineras

Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada
Fuente: Propia





Fotografía No.5: Pañete para muros y alistado para pisos





Fotografía No.6: instalación de enchape para pared y piso, suministro divisiones en acero inoxidable





Fotografía No.7: Instalación tablero de circuitos, instalación de luminarias

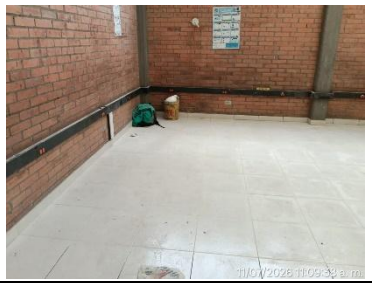




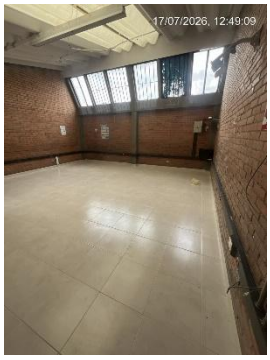
Fotografía No.8: Instalación de enchape para piso y parded.

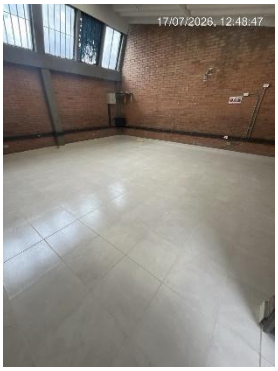
Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza
Fuente: Propia



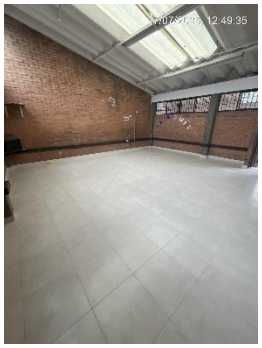


Fotografía No.9: Emboquillado de piso.





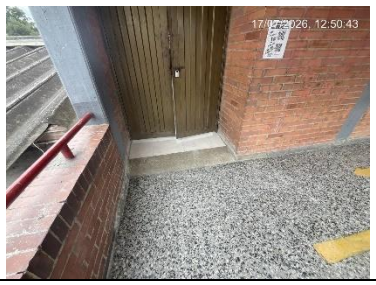
Fotografía No.10: Terminación instalación piso para aula.





Fotografía No.11: Terminación instalación piso para aula.





Fotografía No.12: Terminación instalación piso para aula.

Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza - Emergencia
Fuente: Propia

 	 
Fotografía No.13: Instalación cerramiento perimetral	**Fotografía No.14:** instalación subbase granular, instalación filtro francés en el perímetro.
 	 
Fotografía No.15: Instalación de bajantes y conexión a cajas.	**Fotografía No.16:** Adecuación de cárcamos en la zona del corredor de aulas.

Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Calasanz- Emergencia
Fuente: Propia

ANEXO No.09. RELACION DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.	
PERIODO: JULIO 2026		
FECHA: 05 DE AGOSTO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
VERSION: 1		

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
SERINCO-SDE-L5-2025-001	COMUNICACIÓN	8 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-002	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-003	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-004	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-005	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-006	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-007	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-008	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-009	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE POLIZA EN FISICO				
SERINCO-SDE-L6-2025-010	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-011	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-012	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-013	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-014	COMUNICACIÓN	3 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-015	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-016	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-017	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-018	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-019	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L5-2025-001 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-020	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-002 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L4-2025-021	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-004 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-022	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-023	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-024	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-025	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A PRESUPUESTO POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-026	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SERINCO-SDE-2025-026-L5-REMISION DE OBSERVACIONES A LOS PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON	
SERINCO-SDE-L5-2025-027	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-028	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-029	COMUNICACIÓN	10 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-030	COMUNICACIÓN	14 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE RESIDENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-031	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-004	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-032	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-033	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-034	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-035	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-036	COMUNICACIÓN	20 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	NO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-037	COMUNICACIÓN	21 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-038	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-039	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-005 - PMT	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	

SERINCO-SDE-L5-2025-040	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-041	COMUNICACIÓN	23 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-042	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-043	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-044	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-045	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-046	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-047	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-048	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-049	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-050	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-051	COMUNICACIÓN	29 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-052	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-053	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-054	COMUNICACIÓN	4 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD AJUSTE DE APU E INFORMACION PENDIENTE POR ENTREGA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-057	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-058	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-059	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-060	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIAL APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-061	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-062	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIALAPROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-063	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	LISTADO DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-064	COMUNICACIÓN	11 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO 046-ARSAF-2025 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA PARA LA SELECCIÓN DE FIBROCEMENTO EN LA REPOSICIÓN DE CORNISAS (IED DIEGO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-065	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-066	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-067	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-068	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	AJUSTE DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-069	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-070	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RECOMENDACIONES PARA APROBACIÓN DE LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-071	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-072	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-073	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-074	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-075	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-076		13 nov 2025		CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-077	COMUNICACIÓN	14 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES E INGRESO DEL PERSONAL - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-078	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-079	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-080	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-081	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-082	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-083	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-084	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 1 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-085	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REITERACION DE REMISION DE INFORMACION SOLICITADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	

SERINCO-SDE-L5-2025-086	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-087	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-088	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-089	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-090	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-091	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	TRASLADO DE REMISION DE BALANCE Y ALCANCE – Colegio Guillermo Cano Isaza Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-092	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-093	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-094	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	TRASLADO DE COMUNICADO - OFI-SED-L6-041, APANTALLAMIENTO CUBIERTA BLOQUE PRE ESCOLAR COLEGIO APROPIZADORA BAJA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-095	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 2 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-096	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-097	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-098	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-099	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	CONTRATISTAS	LOTE 4,5 Y 6	REMISIÓN FORMATO DE INFORME MENSUAL SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-100	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-101	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-102	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-103	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	LLAMADO DE ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN EPP, INGRESO PERSONAL Y BITACORAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-104	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO DE PROPUESTA DE BAJANTES Y GÁRGOLAS - IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-105	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - IED LOS TEJARES SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-106	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud de Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-107	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-045. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-108	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Comunicado N° 067-ARSAF-2025. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-109	COMUNICACIÓN	27 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES SG-SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-110	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-050. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prorroga CTO 8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-111	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance al Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-112	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES NP - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-113	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-114	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-047 - Alcance - Solicitud de Modificación Plazo de Ejecución Colegio Santa Librada Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-115	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-116	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-117	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-118	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-119	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO DE PROPUESTA ESQUEMA CERRAMIENTO COLEGIO LA ARABIA - Col La Arabia	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-120	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-121	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORÍA	Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-122	COMUNICACIÓN	2 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Reiteración por Incumplimiento Parcial de las Obligaciones Contractuales - Grupo 2 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-123	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-124	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto de Emergencia CEIF 1931 - IED El Minuto de Buenos Aires - Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-125	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado con Asunto Solicitud Autorización Ingreso de Equipo - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-126	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de ensayos según especificaciones tecnicas - Col Jose Jaime Rojas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-127	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - DIRECCION LOCAL DE USME - CPE 591	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-128	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-129	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-130	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-131	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-046 Solicitud de Modificación fecha de inicio intervención Colegios Santa Librada Sede A y Estrella del Sur Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-132	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-133	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Asistencia del Director de Obra a los Comités Presenciales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-134	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-135	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-136	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-137	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Observaciones Informe Mensual No. 1 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-138	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicados No. 073 ARSAF - 2025 y No. 080 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A _ V1 Y	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-139	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-140	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-141	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-142	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-071. Hallazgo de Dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-143	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Alcance al Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-132 - Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-144	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-145	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-146	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-013 y Aprobación Concepto Estructural Losa de Piso Don Bosco La Joya - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-147	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-148	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-149	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-150	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-151	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-152	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-153	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-154	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		Remisión Acta Costos fijos y costos variables - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) - Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-155	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-156	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-157	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-158	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividades en Ejecución I.E.D. Estrella del Sur Sede B – Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-159	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-160	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-161	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L5-2025-162	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L6-2025-163	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-164	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 091 ARSAF – 2025. Solicitud de información – Actividades no previstas (APUS)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-165	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado comunicado Radicado N.° 092-ARSAF-2025 y solicitud de disposición de p	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-166	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-167	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado Comunicado RADICADO N° 080-ARSAF-2025 y Aprobación Concepto Estructural CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A. - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-168	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-169	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-170	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-171	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Biblioteca y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-172	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Orientación y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-173	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-079. Radicación presupuesto y esquema manejo Aguas Luvias Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-174	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-080. Radicación presupuesto y diagnóstico Dirección Local de Educación de Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-175	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Arborizadora Baja, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-176	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-073 - Mejoramiento Cancha Multideportiva Norte Colegio Arborizadora Baja Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-177	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-178	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 – Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-179	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-082 - Alcance OFI-SED-L6-071 Hallazgo dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-180	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-181	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 097 Arsaf - 2025 - Hallazgos en Red Eléctrica I.E.D Compartir Recuerdo Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-182	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-183	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-184	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-185	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 096 Arsaf - 2025 - Remisión de Dosificación de Concreto Utilizado Para Placas de Baños, Pasillos y Andenes	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-186	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Situación Presentada en el Piso del Bloque de Primera Infancia del Colegio Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-187	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-188	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 – Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-189	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-190	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-191	COMUNICACIÓN	7 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Acabados en la Instalación de Cubierta Colegio Arborizadora Baja - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-192	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L5-2025-193	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-194	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-INT-2025-195	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 3	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-196	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega de Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-197	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-198	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-199	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-200	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-201	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Los Tejares, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L4-2025-202	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Diego Montaña Cuellar, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-203	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-204	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	PROPUESTAS COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-205	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en cuatro (4) Instituciones Educativas Distritales, Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-206	COMUNICACIÓN	14 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones en el Acabado Final de la Estructura de la Cubierta Colegio José Jaime Rojas.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-207	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RETIRO DE ACOPIO MATERIAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA BERMUDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-208	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	ALCANCE SERINCO-SED-L5-2025-193-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-209	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	ALCANCE SERINCO-SED-L6-2025-194-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-210	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra – Colegio Unión Europea Sede B, Colegio Estrella del Sur Sede A, Colegio Estrella del Sur Sede B, y Respuesta Sobre los	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-211	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 – Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-212	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-213	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-214	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-215	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SERINCO-SED-2025-215-L4-Traslado de RADICADO No. 106 ARSAF - 2025 - NOVEDAD	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-216	COMUNICACIÓN	17 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ALCANCE SERINCO-SED-L4-2025-192-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-L4-2025-217	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-218	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-219	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación Inmediata de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-220	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-221	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-222	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-223	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-224	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 116 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INCIO FRENTE DE OBRA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-225	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-226	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-227	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-228	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-229	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-230	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de entregables pendientes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-231	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicados OFI-SED-L6-109 y OFI-SED-L6-110	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-232	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de documentación requerida por la SED – Atenciones de emergencia - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-233	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-234	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-235	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicado Radicado No. 104 ARSAF-2025-Remisión de Informes Avifauna y Silvicultural Atención de Emergencias de Tala y Poda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-236	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-237	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-238	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-239	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segundo llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-240	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-241	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-242	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-243	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Orden y Aseo en las Diferentes Sedes Intervenidas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-244	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	SED - CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Compromisos Adquiridos en Mesa de Trabajo IED Los Tejares – Enero-23-2026	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-245	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en Buen Estado de Cerramiento Provisional IED Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-246	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Información Sobre el inicio de Actividades de Obra en la IED Guillermo Cano Isaza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-247	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-248	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-249	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-250	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-251	COMUNICACIÓN	28 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Estado de las Obras en IED Confederación Brisas del Diamante	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-252	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-253	COMUNICACIÓN	29 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frente de Obra y Cerramiento Provisional en I.E.D. Unión Europea Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-254	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Miguel De Cervantes Saavedra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-255	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones al Acabado Final de la Reja Metálica y Fecha de Entrega del Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-256	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-257	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L4-2025-258	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-259	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-260	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-261	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-262	COMUNICACIÓN	4 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividad de Desmonte de Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) Sede A.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-263	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Programa de Trabajo en Alturas para Actividad Desmonte Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista), Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L5-2025-264	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD DE PERSONAL CONTRACTUAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-265	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-266	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-267	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-268	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Información sobre el Número de Tanques Elevados a Reinstalar en la Dirección Local de Educación de Usme - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-269	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-270	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-271	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-272	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-273	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reubicación Zona de Acopio de Materiales de Desecho - IED. Colegio Orlando Fals Borda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-274	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra y Solicitud de Información de las Fecha de Terminación de cada Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-275	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Orden de Suspensión Inmediata de Actividades y Requerimiento de Cumplimiento Normativo – Resolución 4272/2021 – IED Buenavista (Calazans)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L6-2025-276	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SERINCO-SED-2025-276-L6-Entrega de EPP y Garantizar su uso por el Personal de Obra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-277	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 135 ARSAF - 2025 - RESPUESTA OBSERVACIONES INFORMES SILVICULTURALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-278	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - IED ARBORIZADORA BAJA - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-279	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL. FANNY MICKEY - CPF 1981	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-280	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO SST - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-281	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-282	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-283	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-284	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L-2025-285	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-286	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-287	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-288	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Suspensión de Actividades y Rechazo de Documentación - Oficio OFI-SED-L6-124.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-289	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Citación al Representante Legal de Consorcio País a Recorrido de Obra – Santa Librada	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-290	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia Periódica del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-291	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento Reiterado en la Asistencia del Director de Obra a los Comités y Reuniones de Seguimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-292	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-293	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-294	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-295	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-LX-2025-296	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 143 ARSAF - 2025 - NOVEDAD EN PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS DE INFORMATICA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-297	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L6-2025-298	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-129	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-299	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-300	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-301	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-302	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-303	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RESPUESTA A RADICADO No. 141 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE DISEÑO PLACAS DE RECREACIÓN IED FANNY MICKEY SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-304	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a Correo con Asunto Contrato Mejoramientos. Verificación Ítems Contractuales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-305	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-306	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-307	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-308	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-309	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-310	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-311	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercer Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-312	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-313	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-314	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-315	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-316	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Información Sobre Atención de Emergencia en IED Rafael Uribe Uribe - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-317	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-318	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-319	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Listado de Actividades Críticas para Entregas de Colegios y Tareas no Incluidas en el Balance Inicial	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-320	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Poca Presencia de Personal Operativo Durante el mes de Febrero en las Diferentes Sedes Educativas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-321	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORME ELÉCTRICO – IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-322	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Demoras en la Entrega de Espacios a la Interventoría y Falta de Control `por de Consorcio Fortaleza en la Toma de Detalles	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-323	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-324	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-325	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-326	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-327	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	EVALUACION ANS PERIODOS 4-SEP-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-328	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Cuarto Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-329	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL SANTA LIBRADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-330	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-331	COMUNICACIÓN	3 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-332	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Citación para Levantamiento de Actas de Vecindad a Baterías Sanitarias Biblioteca Chandui, Usme - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-333	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-334	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Seguimiento de Obras de Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-335	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU de NP-03 Suministro e Instalación de Cubierta Modular Tipo Sandwich (ancho=50 mm) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-LX-2025-336	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-337	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-340	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento – Entrega semanal de formatos SST (Lote 4)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-345	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-349	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-354	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-357	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-360	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-361	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-362	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-363	COMUNICACIÓN	19 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-366	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-370	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-373	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-382	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-391	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-393	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-395	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-396	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-397	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-398	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-399	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta de RADICADO No. 188 - ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN A VIDRIOS EN INTERVENCIÓN DE FACHADA – COLEGIO DIEGO MONTAÑA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-400	COMUNICACIÓN	8 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-401	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-160 Radicación Documentos para Prórroga 02	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-402	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 189 ARSAF -2025 - TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE CARGUE EN PLATAFORMA SDA – PIN 27920 – LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-403	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-404	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 191 ARSAF -2025 - PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE CORNISAS IED DIEGO MONTAÑA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-405	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de OFI-SED-L6-165. Solicitud de revisión de descuentos aplicados por concepto de ANS – Posible doble cobro	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-406	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-407	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-408	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-409	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-410	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-411	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	

SERINCO-SED-LX-2025-412	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 199 ARSAF -2025 - AREAS DE CUBIERTAS PARA ENTREGA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-413	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-414	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-415	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-416	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 556 - IED Nueva Esperanza, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-417	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-418	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-419	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-420	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Solicitud Concepto de Especialista Eléctrico y Actualización Ficha SAE para Atención de Emergencia, IED. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-421	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - CPF 1912	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-422	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-08 al NP-12 Aprobados por Interventoría- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-423	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones errores en bitácoras de obra.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-424	COMUNICACIÓN	17 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a RADICADO No. 201 ARSAF -2025 - RESPUESTA COMUNICADO SERINCO-SED-L4-2025-413 REMISIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, AMBIENTAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-425	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-426	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-427	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-428	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-429	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-430	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-431	COMUNICACIÓN	21 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Falla Prematura en Bisagras de Portón Plegable – Solicitud de Solución Técnica	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-432	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1983 - IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-433	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 564 - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-434	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1912 - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-435	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Brasilia - CPF 508	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-436	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-437	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-438	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-439	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-440	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Portón IED Estrella del Sur Sede C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-441	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-442	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTES 4 y 6	Solicitud para Gestionar Devolución de Dineros de Doble Cobro por Concepto de ANS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-443	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-444	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Sobre Intervención de Baterías Sanitarias en IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-445	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-172-Atención Observaciones APUS de NP-08, NP-09, NP-10, y NP-12 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-446	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-447	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-448	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L4-2025-449	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-450	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-MAR-26 AL 05-ABR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-451	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - CPF 1959	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-452	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-453	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-454	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-174-Atención a Observaciones – Ítems NP-13 al NP-16 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-455	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-033 - Reprogramación y Balances, Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra y Bicentenario - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-456	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-457	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-458	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1911 - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-459	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 212 ARSAF - 2025 - Remisión de Reprogramación Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135, Balance de Presupuestos y	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-460	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-461	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-462	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-463	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-464	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 218 Arsaf - 2025 - Respuesta a solicitud de fechas de entrega de baterías sanitarias de primaria y espacios piso 3 bloque A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-465	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Alcance a Comunicado Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-466	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 222 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-467	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-468	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicados N° 190-ARSAF-2025 y N° 213-ARSAF-2025 Con Anexos y Concepto Estructural de Interventoría IED Rural La Unión - Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-469	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-415-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B -	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-470	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-471	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 569 - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-472	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-473	COMUNICACIÓN	6 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 217 - Arsaf-2025-Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-474	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado no. 225 Arsaf - 2025 - Remisión de Evidencia de Filtración de Agua en Placa de Aula bajo Gradas IED Fanny Mikey Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-475	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 508 - IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-476	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta Solicitud de Observaciones a Actividades No Conformes – Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-477	COMUNICACIÓN	8 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe por Entrega Final IED La Arabia, Sede A – Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-478	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-479	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-480	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-481	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Retiro de Materiales Sobrantes de Construcción IED Unión Europea, Sede B - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-482	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Batería Sanitaria IED Fanny Mickey Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-483	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - CPF 510	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-484	COMUNICACIÓN	14 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-485	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-12 a NP-16 Aprobados por Interventoría- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-486	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1959 - IED Guillermo Cano Isaza - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-487	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-L5-2025-488	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-489	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-490	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-185 - Atención Observaciones Presentadas por el Área de Estudios Previos SED	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-491	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Estrella del Sur, Sede D - CPF 1962	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-492	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-493	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-494	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-495	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-496	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-497	COMUNICACIÓN	20 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 230 Arsaf - 2025 - Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-498	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s de Items No Previstos NP-06 al NP-10 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-499	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-500	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-501	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-502	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-503	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 07 INF TÉCNICO MENSUAL No. 07 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-504	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-505	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-506	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-507	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-508	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-509	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-510	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Toma de Detalles Varios IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-511	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Programación de Obras para Intervención de Baterías Sanitarias IED Miguel de Cervantes, Sede B Biblioteca Marichuela - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-512	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 533 - IED Rural La Unión, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-513	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-514	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-515	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-516	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-517	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1985 - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-518	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-519	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta a Solicitud de Atención de Garantía Divisiones de Baño en Acero Inoxidable CPF 508 IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-520	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-521	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-522	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 234-Arsaf-2025 - Solicitud de Información para Entrega de Espacios, Manual y Matriz de Mantenimiento del IED Confederación Brisas del Diamante Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-523	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 236-Arsaf-2025 - Remisión de Informe de Verificación de Avifauna y Ejecución de Tratamientos Silviculturales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-524	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-525	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-526	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-527	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO N° 244-ARSAF-2025 -REMISIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155135 SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-528	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 243 Arsaf - 2025 - Remisión de Atención de Observaciones Grupo No. 2 de Actividades No Previstas.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-529	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-196 Atención Observaciones NP´s 12 15 y 16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-530	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-195 Atención Observaciones NP´s 10 y 11	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-531	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 242 Arsaf - 2025 - Remisión de Programación Frentes de Obra por Modificatorio No. 2 y Presupuesto IED Arborizadora Alta	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-532	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 1 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-533	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto, Cronograma de Emergencia y Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-534	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Entrega Formal en Fisico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-535	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración de Entrega Formal en Fisico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-536	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Entrega Formal en Fisico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-537	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-538	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-539	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-540	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 3 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-541	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 240 Arsaf - 2025 - Respuesta Derecho de Petición por Filtración de agua IED Ofelia Uribe de Acosta Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-542	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-543	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-544	COMUNICACIÓN	9 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-545	COMUNICACIÓN	10 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Relación de Valores de los Contratos de Obra del Grupo 2, Lotes 4, 5 y 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-546	COMUNICACIÓN	10 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Fanny Mickey, Sede A - CPF 1981	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-547	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-548	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-549	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-550	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 4 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-551	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-552	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-513-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-553	COMUNICACIÓN	16 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Programación de Obras para Intervenciones locativas en la IED Ciudad de Villavicencio, Sede B Puerta del Llano - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-554	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-555	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-223- Radicación ajustes APU´s precio son previstos nO. NP-10, NP-11, NP-12, NP-15 y NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-556	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 3 - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-557	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-558	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-559	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-560	COMUNICACIÓN	17 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A - CPF 577	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-561	COMUNICACIÓN	18 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 247-ARSAF-2025-Remisión de Respuesta al Requerimiento SDA E-2026-93904 y Concepto de Interventoría	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-562	COMUNICACIÓN	18 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 7 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-563	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED San José de Usme -Sede A, San José Monteblanco (Don Bosco II) - CPF 567	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-564	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-565	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-566	COMUNICACIÓN	19 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-567	COMUNICACIÓN	20 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias Emergencia IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-568	COMUNICACIÓN	20 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias IED Atabanzha, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-569	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-570	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L6-2025-571	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-572	COMUNICACIÓN	22 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Reprogramación de Obras para Finalizar Intervención de Baterías Sanitarias IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-573	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Estrella del Sur, Sede D Estrella IV - CPF 1962	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-574	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A La Unión Usme - CPF 573	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-575	COMUNICACIÓN	23 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-576	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-577	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede B El Recuerdo - CPF 1915	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-578	COMUNICACIÓN	24 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-579	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-580	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-581	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-582	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-583	COMUNICACIÓN	30 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 577 - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A Villa Hermosa - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-584	COMUNICACIÓN	1 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-585	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 262 Arsaf-2025- información de Novedad Presentada, Daños en Policarbonato y Solicitud de Cambio de Material Cubierta IED Estrella del Sur Sede D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-586	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Los Tejares, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L4-2025-587	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-588	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-589	COMUNICACIÓN	6 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-590	COMUNICACIÓN	8 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-591	COMUNICACIÓN	9 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Radicado OFI-SED-L6-229 Radicación APU´s NP-17 A 19 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-592	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 6 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Arsaf	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-593	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 6 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Fortaleza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-594	COMUNICACIÓN	10 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.06.26 al 05.07.26)- Consorcio Pais	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-595	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-596	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-597	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 35 - Jul 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-598	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-599	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Respuesta al derecho de petición relacionado con la intervención del muro perimetral del IED Arborizadora Alta Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-600	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-601	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-602	COMUNICACIÓN	14 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-603	COMUNICACIÓN	15 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Compartir Recuerdo, Sede B El Recuerdo - CPF 1915	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-604	COMUNICACIÓN	15 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Certificación Cumplimiento Factor de Sostenibilidad - Suministro e Instalación de Ciclo Parqueadero	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-605	COMUNICACIÓN	16 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED Atabanzha, Sede A Valle de Cafam - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-606	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-INT-2025-607	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA No. 8 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-608	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-609	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Caracterización de Material para Subbase en IED Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B – CPF – 545	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-610	COMUNICACIÓN	17 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 Periodo 6-06-2026 al 5-07-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-611	COMUNICACIÓN	18 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede B, Líbano Segundo Sector - CPF 580	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L5-2025-612	COMUNICACIÓN	18 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-613	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-614	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-615	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 36 - Jul 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-616	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-617	COMUNICACIÓN	21 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-618	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-619	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-620	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-621	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda reiteración de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-622	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantia IED Brasilia, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-623	COMUNICACIÓN	22 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Atención de Garantía IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-624	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Entrega de Resultados de Laboratorio de acuerdo a comunicado SERINCO-SED-2025-609-L6-Solicitud de Caracterización de Material para Subbase.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-625	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Diego Montaña Cuellar, Sede A El Uval Nuevo - CPF 576	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-626	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Eduardo Umaña Mendoza, Sede A Villa Alemania - CPF 575	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-627	COMUNICACIÓN	24 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Reprogramación de Obras para Finalizar Intervención de Baterías Sanitarias IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-628	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-629	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-630	COMUNICACIÓN	27 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 37 - Jul 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-631	COMUNICACIÓN	29 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 272 Arsaf - 2025 - Novedad de Corte de Agua Emergencia IED Rural La Unión Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-632	COMUNICACIÓN	30 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta a Solicitud de Información sobre Protocolos de Retiro de Techos con Asbesto - CAS Bachillerato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA BERMUDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-633	COMUNICACIÓN	31 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 579 - IED Gabriel García Márquez, Sede A Villa Diana- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-634	COMUNICACIÓN	31 jul 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-590-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-635	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-636	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-637	COMUNICACIÓN	3 ago 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 38 - Jul 27 a Ago 02 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
