DESur

Al Contestar cite Radicado. **2026-1300-012457-R** Id: 116454
Fecha: 2026-08-26 07:35
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSORCIO CI 2026
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

CONSORCIO CI
UNIÓN QUE CONSTRUYE

CONSORCIO CI 2026
NIT 902.092.335-8
DG 51 15 A 161 KM 12 VIA BELLO
Tel: 6044000000
Bello - Colombia
info@consorcioci2026.com

Factura electronica de venta
No. FECI 1

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300 - (000) 3206700136
Dirección	CL 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 09:36
Expedición	25/08/2026, 12:10
Vencimiento	25/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 01 - CONTRATO SERVICIOS AU DESUR CONTRATO: Desur- # IP-204-2026	1.00	1,245,035,009.00
2	AU ACTA 01 - CONTRATO SERVICIOS AU	1.00	303,290,529.00

DESur
CONTIGO EN AMBOS

Total items: 2

Total Bruto	1,548,325,538.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,548,325,538.00

Valor en Letras:
Mil quinientos cuarenta y ocho millones trescientos veinticinco mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 1,548,325,538.00

Observaciones:
CONTRATO: IP-204-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la Adecuación y Mejoramiento a la malla vial en diferentes sitios del municipio de Envigado, en cumplimiento al acta de Ejecución N°10 del convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24.

EJECUCIÓN DE AGOSTO DE 2026. AU (24.36%).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113801909 aprobado en 20260809 prefijo FECI desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 788efdcafa403974f298cab46eed1e9edaac7165ecdae0ab155f1e078472b1e66f3ac068c8074ba68621e92c4d999960

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DESur	FECHA:	lunes, 24 de agosto de 2026	VALOR INICIAL:	$ 16.070.034.627	ACTA DE OBRA
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026	PLAZO INICIAL:	150 DÍAS	
	NÚMERO DE CONTRATO:	DESur-IP-204-2026	VALOR ADICIONAL:		
	INTERVENTOR:	CONINTEC S.A.S	PLAZO ADICIONAL:		
	NUMERO DE CONTRATO:	DESur-OC-211-2026	VALOR FINAL:	$ 16.070.034.627	No. 1
	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-	PLAZO FINAL:	150 DÍAS	
	MES DEL ACTA	AGOSTO			

Alcaldía de Envigado

En cumplimiento con el contrato entre DESur y Consorcio CI2026, el día 24 de mes de agosto de 2026 se reunieron los suscritos Doctores, Esteban Salazar Ramírez, gerente de DESur, Laura Quintero, Supervisora de DESur, Lucidia Arboleda Torres, Directora de Interventoría, Angela María Vélez en representación del contratista, con el fin de recibir y entregar los trabajos realizados a la fecha y objeto del Contrato así:

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO							ACTA N°1. (19/08/2026 - 31/08/2026)							MODIFICACIONES					ACUMULADO		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UN.	CONTRATO INICIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA	OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONALY/O EXTRA		ACUMULADO		ACTA MODIFICACIÓN No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS						
			T.CANT.	P.UNITARIO	T.CANT.	V. TOTAL	Cant	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	Cant	+/-	Valor Total ($)	Cant	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)
1	RETIROS Y DEMOLICIONES					$ 688.395.905			$ 83.092.560		$ 0		83.092.560			$ -		$ 688.395.905		$ 83.092.560		$ 605.303.345
1.1.1	Cerramiento Provisional con largueros de madera común y tela de verde, altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, perforaciones, concreto para instalación de largueros y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m		$ 44.960	525,00	$ 23.604.000			0		0,00	0,00	0			$ -	525,00	$ 23.604.000	0,00	$ -	525,00	$ 23.604.000
1,2	COMISIÓN TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN					$ 61.820.640			0		0							$ 61.820.640				
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo con comisión de topografía	dia		$ 961.280	63,00	$ 61.820.640			0		0,00	0,00	0			$ -	63,00	$ 61.820.640	0,00	$ -	63,00	$ 61.820.640
1.3	DEMOLICIONES					$ 602.971.265			$ 83.092.560		$ 0		83.092.560					$ 602.971.265				
1.3.1	Demolición de losa en concreto espesor entre 10 y 15 cm incluye transporte a sitio de acopio.	m²		$ 188.600	419,00	$ 78.981.500			0		0,00	0,00	0			$ -	419,00	$ 78.981.500	0,00	$ -	419,00	$ 78.981.500
1.3.2	Demolición de pavimento espesor entre 5 a 10 cm, incluye transporte a sitio de acopio.	m²		$ 70.900	3.333,75	$ 236.362.875			0		0,00	0,00	0			$ -	3.333,75	$ 236.362.875	0,00	$ -	3333,75	$ 236.362.875
1.3.3	Fresado de pavimento asfaltico. Incluye transporte interno y disposicion final del material	m³		$ 184.000	1.000,13	$ 184.023.000	451,59	451,59	83.092.560		0,00	451,59	83.092.560			$ -	1.000,13	$ 184.023.000	451,59	$ 83.092.560	548,54	$ 100.930.440
1.3.4	Demolición de cordones prefabricados en concreto, Incluye transporte interno y disposición final en botadero oficial.	m		$ 63.100	1.641,90	$ 103.603.890			0		0,00	0,00	0			$ -	1.641,90	$ 103.603.890	0,00	$ -	1641,90	$ 103.603.890
2	EXCAVACIONES Y LLENOS					$ 2.168.816.935			0				0			$ -		$ 2.168.816.935		$ -		$ 2.168.816.935
2.1	EXCAVACIONES					$ 697.726.955												$ 697.726.955				
2.1.1	Excavación Manual de material heterogéneo de 0-2 metros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 1 m³, transporte interno de material a sitio de acopio.	m³		$ 116.300	4.000,50	$ 465.258.150			0		0,00	0,00	0			$ -	4.000,50	$ 465.258.150	0,00	$ -	4000,50	$ 465.258.150
2.1.2	Excavaciones Mecanicas de 0 a 2 metros en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 1 m³, incluye transporte interno a sitio de acopio.	m³		$ 79.300	800,10	$ 63.447.930			0		0,00	0,00	0			$ -	800,10	$ 63.447.930	0,00	$ -	800,10	$ 63.447.930
2.1.3	Transporte interno manual o mecánico de tierra, materiales pétreos, demoliciones, arenilla, base, subbase y otros hasta un sitio de acopio, supone una distancia ≤ 50m.	m³		$ 52.600	1.200,15	$ 63.127.890			0		0,00	0,00	0			$ -	1.200,15	$ 63.127.890	0,00	$ -	1200,15	$ 63.127.890
2.1.4	CARGUE MANUAL O MECÁNICO, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las explanaciones y excavaciones. Incluye cargue con paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m³		$ 79.900	1.200,15	$ 95.891.985			0		0,00	0,00	0			$ -	1.200,15	$ 95.891.985	0,00	$ -	1200,15	$ 95.891.985
2.2	LLENOS					$ 1.471.090.980												$ 1.471.090.980				
2.2.1	Suministro, transporte e instalación de base granular NORMA INVIAS 2013, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado	m³		$ 325.400	4.000,50	$ 1.301.762.700			0		0,00	0,00	0			$ -	4.000,50	$ 1.301.762.700	0,00	$ -	4000,50	$ 1.301.762.700
2.2.2	Llenos en Arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.	m³		$ 273.500	102,00	$ 27.897.000			0		0,00	0,00	0			$ -	102,00	$ 27.897.000	0,00	$ -	102,00	$ 27.897.000
2.2.3	Suministro, Transporte y colocación de material filtrante con triturado de 3/4" hasta 1".	m³		$ 319.600	60,00	$ 19.176.000			0		0,00	0,00	0			$ -	60,00	$ 19.176.000	0,00	$ -	60,00	$ 19.176.000
2.2.4	Suministro, transporte e instalación de Subbase Granular SBG-1, NORMA INVIAS 2013, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado	m³		$ 305.600	400,05	$ 122.255.280			0		0,00	0,00	0			$ -	400,05	$ 122.255.280	0,00	$ -	400,05	$ 122.255.280
3	OTROS ELEMENTOS VIALES					$ 835.718.600			0				0			$ -		$ 835.718.600		$ -		$ 835.718.600

3,1	PREFABRICADOS					$ 191.976.000											$ 191.976.000						
3.1.1	Suministro, Transporte e instalación de cordón prefabricado de 0,15x0,45x0,80 m de concreto de 21 Mpa , tres caras, juntas ranuradas.	m		$ 152.000	1.263,00	$ 191.976.000			0		0,00	0,00	0			$ -	1.263,00	$ 191.976.000	0,00	$ -	1263,00	$	191.976.000
3,2	CONCRETOS					$ 92.901.600											$ 92.901.600						
3.2.1	Construcción de CUNETA EN "V" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.	m		$ 168.300	552,00	$ 92.901.600			0		0,00	0,00	0			$ -	552,00	$ 92.901.600	0,00	$ -	552,00	$	92.901.600
3,3	ELEMENTOS HIDRAULICOS					$ 550.841.000											$ 550.841.000						
3.3.1	Reatce de sumidero tipo B. Incluye demolición, reutilizando rejilla existente y desalojo del material sobrante.	und		$ 991.100	200,00	$ 198.220.000			0		0,00	0,00	0			$ -	200,00	$ 198.220.000	0,00	$ -	200,00	$	198.220.000
3.3.2	Reatce de cámaras de inspección. Incluye demolición, reposición de cuello y tapa en concreto, desalojo del material sobrante y todo lo necesario para su correcta ejecución	und		$ 1.855.900	190,00	$ 352.621.000			0		0,00	0,00	0			$ -	190,00	$ 352.621.000	0,00	$ -	190,00	$	352.621.000
4	ACERO DE REFUERZO					$ 17.880.000			0				0			$ -		$ 17.880.000		$ -		$	17.880.000
4,1	ACERO FIGURADO					$ 17.880.000											$ 17.880.000						
4.1.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, cartificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg		$ 8.940	2.000,00	$ 17.880.000			0		0,00	0,00	0			$ -	2.000,00	$ 17.880.000	0,00	$ -	2000,00	$	17.880.000
5	IMPERMEABILIZACIONES Y FILTROS					$ 33.520.000			0				0			$ -		$ 33.520.000		$ -		$	33.520.000
5,1	FILTROS Y CAÑUELAS					$ 33.520.000											$ 33.520.000						
5.1.1	Construcción de Filtro contra Muro de Contención en tubería perforada de 4", geotextil no tejido de 2.400 y triturado de 1 1/2", incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m		$ 228.900	100,00	$ 22.890.000			0		0,00	0,00	0			$ -	100,00	$ 22.890.000	0,00	$ -	100,00	$	22.890.000
5.1.2	Construcción de Cañuela para Filtro en concreto de 210 kg/cm2, incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m		$ 106.300	100,00	$ 10.630.000			0		0,00	0,00	0			$ -	100,00	$ 10.630.000	0,00	$ -	100,00	$	10.630.000
6	PAVIMENTOS					$ 7.805.108.587			1.161.942.449				1.161.942.449			$ -		$ 7.805.108.587		$ 1.161.942.449		$	6.643.166.138
6,1	MEZCLA ASFÁLTICA					$ 7.805.108.587											$ 7.805.108.587						
6.1.1	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MDC-19 en caliente para parcheo. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 1.900.900	497,00	$ 944.747.300			0		0,00	0,00	0			$ -	497,00	$ 944.747.300	0,00	$ -	497,00	$	944.747.300
6.1.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MSC-25 en caliente para parcheo. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 1.850.700	318,00	$ 588.522.600			0		0,00	0,00	0			$ -	318,00	$ 588.522.600	0,00	$ -	318,00	$	588.522.600
6.1.3	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MDC-19 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 1.751.200	386,00	$ 675.963.200			0		0,00	0,00	0			$ -	386,00	$ 675.963.200	0,00	$ -	386,00	$	675.963.200
6.1.4	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MSC-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 1.746.900	170,00	$ 296.973.000			0		0,00	0,00	0			$ -	170,00	$ 296.973.000	0,00	$ -	170,00	$	296.973.000
6.1.5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MDC-19 + FIBRA en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 2.179.900	627,00	$ 1.366.797.300	420,05	420	915.666.995		0,00	420,05	915.666.995			$ -	627,00	$ 1.366.797.300	420,05	$ 915.666.995	206,95	$	451.130.305
6.1.6	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MAM-25 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 2.231.200	669,00	$ 1.492.672.800			0		0,00	0,00	0			$ -	669,00	$ 1.492.672.800	0,00	$ -	669,00	$	1.492.672.800

6.1.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MSC-19 + FIBRA en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.	m³		$ 2.168.300	476,90	$ 1.029.287.222			0		0,00	0,00	0			$ -	476,90	$ 1.029.287.222	0,00	$ -	476,90	$ 1.029.287.222
6.1.8	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MAM-19 en caliente para pavimento.	m³		$ 2.133.800	523,00	$ 1.115.977.400	89,79	89,79	191.593.902		0,00	89,79	191.593.902			$ -	523,00	$ 1.115.977.400	89,79	$ 191.593.902	433,21	$ 924.383.498
6.1.9	Suministro y aplicación de liga con emulsion asfaltica CRR-1 modificada con 2,5% de polimero	m²		$ 7.174	13.335,00	$ 95.665.290			0		0,00	0,00	0			$ -	13.335,00	$ 95.665.290	0,00	$ -	13335,00	$ 95.665.290
6.1.10	Suministro y aplicación de liga con emulsion asfaltica CRR-2	m²		$ 6.465	13.335,00	$ 86.210.775	8458,09	8458,09	54.681.552		0,00	8458,09	54.681.552			$ -	13.335,00	$ 86.210.775	8.458,09	$ 54.681.552	4876,91	$ 31.529.223
6.1.11	Sello de grietas en pavimento asfaltico con ruteo	m		$ 26.200	1.142,00	$ 29.920.400			0		0,00	0,00	0			$ -	1.142,00	$ 29.920.400	0,00	$ -	1142,00	$ 29.920.400
6.1.12	Sello de fisuras en pavimento sin ruteo	m		$ 21.900	947,00	$ 20.739.300			0		0,00	0,00	0			$ -	947,00	$ 20.739.300	0,00	$ -	947,00	$ 20.739.300
6.1.13	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 para Resaltos, que cumpla con el Artículo 460-22. Incluye colocación y compactación. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio, incluye imprimación y transporte de materiales	m		$ 513.600	120,00	$ 61.632.000			0		0,00	0,00	0			$ -	120,00	$ 61.632.000	0,00	$ -	120,00	$ 61.632.000
COSTO DIRECTO						$ 11.539.440.027			1.245.036.009		0		1.245.036.009			$ -		$ 11.539.440.027		$ 1.245.036.009		$ 10.294.405.018
PORCENTAJE AU (24,36%)				24,36%		24,36%			24,36%		24,36%		24,36%			24,36%		24,36%		24,36%		24,36%
COSTOS INDIRECTOS						$ 2.811.007.691			303.290.629		0		303.290.629			$ -		$ 2.811.007.691		$ 303.290.629		$ 2.507.717.062
TOTAL COSTO DIRECTO + AU				$ -		$ 14.350.447.618			1.548.326.638		0		1.548.326.638			$ -		$ 14.350.447.618		$ 1.548.326.638		$ 12.802.122.080

GASTOS REEMBOLSABLES	$ 710.586.009
Componente SST (Revisar subanálisis AU)	$ 90.086.514
Componente Ambiental (Revisar subanálisis AU)	$ 107.111.061
Componente social (Revisar subanálisis AU)	$ 73.420.000
Plan de Manejo de Tránsito PMT (Revisar pestaña subanálisis AU)	$ 178.842.446
Ensayos de laboratorio (Revisar pestaña Ensayos)	$ 158.330.645
Pólizas (Revisar pestaña)	$ 115.797.243
TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 15.070.034.527

COSTO DIRECTO		$ 1.245.036.009
COSTOS INDIRECTO AU 24,36%	24,36%	$ 303.290.629
COSTO TOTAL CD + CI		$ 1.548.326.638
TOTAL EJECUTADO ACTA DE OBRA N°1		$ 1.548.326.638
PORCENTAJE EJECUTADO		10,79%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 12.802.122.080

AMORTIZACIÓN ANTICIPO X DESCUENTO PAGO ANTICIPADO ____ (Seleccionar el caso que aplique, con base en la forma de pago)		
ANTICIPO		-
PAGO ANTICIPADO		-
VALOR ACTA (Sin amortizar)		1.548.326.638
SALDO RESTANTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		
VALOR RESTANTE POR AMORTIZAR		
VALOR ACTA		1.548.326.638

Ing. Esteban Salazar
GERENTE DESUR

Ing. Silvia Isabel Lopera G.
Representante legal interventoria

Laura Quintero
Supervisor de interventoria DESur

Angela Velez A.
Representante del Contratista

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	21 de agosto de 2026		ACTA DE OBRA N°:	1	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		PERIODO DE CORTE:	19/08/2026 A 31/08/2026	
CONTRATANTE:	DESUR		CONTRATO DE OBRA:	DESur-IP-204-2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026		MUNICIPIO:	ENVIGADO	
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S				
CAPITULO: 1	RETIROS Y DEMOLICIONES		CANTIDAD CORTE:	451,59	
ÍTEM: 1.3.3	Fresado de pavimento asfaltico. Incluye transporte interno y disposicion final del material		UNIDAD: m3	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	451,59

ACTA #1 451,59		ACTA #2		ACTA #3			ACTA #4		ACTA #5

ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+305 CI	305,00	3,60	0,050	1,00	54,90	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CC	293,00	3,45	0,050	1,00	50,54	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	168,00	6,80	0,050	1,00	57,12	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	12,00	3,50	0,050	1,00	2,10	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CD	320,00	3,20	0,050	1,00	51,20	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+320 AL PR0+473 CD	153,00	3,30	0,050	1,00	25,25	
FRESADO ©	CEMENTERIO BAHIA	35,00	1,50	0,040	1,00	2,10	
FRESADO ©	CEMENTERIO PR0+473 AL PR0+555 CC	82,00	6,50	0,050	1,00	26,65	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+090 VIA	90,00	5,30	0,060	1,00	28,62	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+052 BAHIA	52,00	2,50	0,060	1,00	7,80	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO INGRESO ÉXITO	6,60	2,45	0,060	1,00	0,97	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+165 VIA	75,00	5,00	0,060	1,00	22,50	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+145 BAHIA	55,00	2,50	0,060	1,00	8,25	
FRESADO ©	ÉXITO VECINO	3,50	5,00	0,100	1,00	1,75	
FRESADO ©	LA PALOMA PR0+000 AL PR0+057	57,00	6,00	0,075	1,00	25,65	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+000	10,17	2,80	0,120	1,00	3,42	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+020	20,00	9,53	0,120	1,00	22,87	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+030	25,00	9,53	0,120	1,00	28,59	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+040	11,57	9,47	0,120	1,00	13,15	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+050	9,54	3,60	0,120	1,00	4,12	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+060	9,14	1,30	0,120	1,00	1,43	
FRESADO ©	LAZAROS PIZZA PR0+070	12,30	8,55	0,120	1,00	12,62	
	SUB-TOTAL				451,59		







JESUS ARIAS
Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

LUCIDIA ARBOLEDA
Directora Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	21 de agosto de 2026		**ACTA DE OBRA N°:**	1		
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		**PERIODO DE CORTE:**	19/08/2026	A	31/08/2026
CONTRATANTE:	DESUR		**CONTRATO DE OBRA:**	DESur-IP-204-2026		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026		**MUNICIPIO:**	ENVIGADO		
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S					
CAPITULO: 6	PAVIMENTOS			**CANTIDAD CORTE:**		420,05
ÍTEM: 6.1.5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MDC-19 + FIBRA en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.		**UNIDAD:** m3	**CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:**		420,05

ACTA #1 420,05	**ACTA #2**		**ACTA #3**	**ACTA #4**	**ACTA #5**

ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+305 CI	305,00	3,60	0,057	1,00	62,59	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CC	293,00	3,45	0,058	1,00	58,63	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	168,00	6,80	0,057	1,00	65,12	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	12,00	3,50	0,057	1,00	2,39	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CD	320,00	3,20	0,057	1,00	58,37	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+320 AL PR0+473 CD	153,00	3,30	0,056	1,00	28,27	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO BAHIA	VARIABLE	VARIABLE	0,056	188,70	10,57	
MDC-19 + FIBRA ©	CEMENTERIO PR0+473 AL PR0+555 CC	82,00	6,50	0,056	1,00	29,85	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+090 VIA	90,00	5,30	0,067	1,00	31,96	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+052 BAHIA	52,00	2,50	0,067	1,00	8,71	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO INGRESO ÉXITO	6,60	2,45	0,067	1,00	1,08	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+165 VIA	75,00	5,00	0,065	1,00	24,38	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+145 BAHIA	55,00	2,50	0,065	1,00	8,94	
MDC-19 + FIBRA ©	ÉXITO VECINO	3,50	5,00	0,105	1,00	1,84	
MDC-19 + FIBRA ©	LA PALOMA PR0+000 AL PR0+057	57,00	6,00	0,080	1,00	27,36	
SUB-TOTAL						420,05	

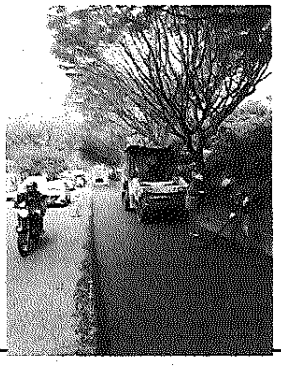

JESUS ARIAS
Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

LUCIDIA ARBOLEDA
Directora Interventoría
CONINTEC S.A.S
Interventoria


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	21 de agosto de 2026		ACTA DE OBRA N°:	1	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		PERIODO DE CORTE:	19/08/2026 - A 31/08/2026	
CONTRATANTE:	DESUR		CONTRATO DE OBRA:	DESur-IP-204-2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026		MUNICIPIO:	ENVIGADO	
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S				
CAPITULO: 6	PAVIMENTOS		UNIDAD: m3	CANTIDAD CORTE:	89,79
ITEM: 6.1.8	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfaltica MAM-19 en caliente para pavimento. Compactada con medios mecanicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento.			CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	89,79

ACTA #1	89,79	ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4		ACTA #5	

ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL	FOTO
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+000	10,17	2,80	0,125	1,00	3,56	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+020	20,00	9,53	0,125	1,00	23,83	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+030	25,00	9,53	0,125	1,00	29,78	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+040	11,57	9,47	0,125	1,00	13,70	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+050	9,54	3,60	0,125	1,00	4,29	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+060	9,14	1,30	0,125	1,00	1,49	
MAM-19 ©	LAZAROS PIZZA PR0+070	12,30	8,55	0,125	1,00	13,15	
SUB-TOTAL						89,79	



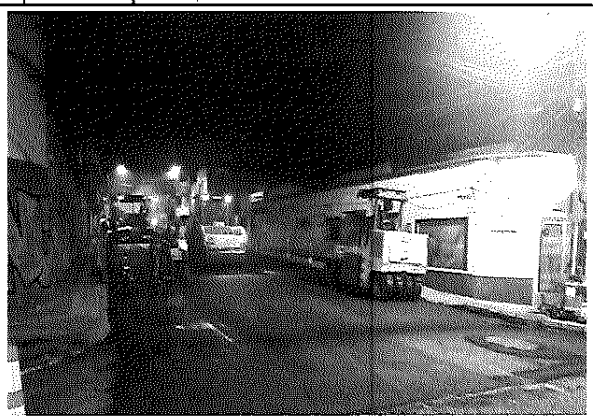

JESUS ARIAS
Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

LUCIDIA ARBOLEDA
Directora Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	21 de agosto de 2026		ACTA DE OBRA N°:	1	
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.		PERIODO DE CORTE:	19/08/2026 A 31/08/2026	
CONTRATANTE:	DESUR		CONTRATO DE OBRA:	DESur-IP-204-2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI 2026		MUNICIPIO:	ENVIGADO	
INTERVENTORIA:	CONINTEC S.A.S				
CAPITULO: 6	PAVIMENTOS		UNIDAD: m2	CANTIDAD CORTE:	8.458,09
ÍTEM: 6.1.10	Suministro y aplicación de liga con emulsion asfaltica CRR-2			CANTIDAD ACUMULADA TOTAL:	8.458,09

ACTA #1	8.458,09	ACTA #2		ACTA #3		ACTA #4		ACTA #5	

ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	BASE / ANCHO (m)	PROF / ALTURA (m)	CANT.	TOTAL
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+305 CI	305,00	3,60	N/A	1,00	1098,00
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CC	293,00	3,45	N/A	1,00	1010,85
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	168,00	6,80	N/A	1,00	1142,40
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+305 AL PR0+473 CI Y CC	12,00	3,50	N/A	1,00	42,00
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+000 AL PR0+320 CD	320,00	3,20	N/A	1,00	1024,00
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+320 AL PR0+473 CD	153,00	3,30	N/A	1,00	504,90
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO BAHIA	VARIABLE	VARIABLE	N/A	188,70	188,70
IMPRIMACION ©	CEMENTERIO PR0+473 AL PR0+555 CC	82,00	6,50	N/A	1,00	533,00
IMPRIMACION ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+090 VIA	90,00	5,30	N/A	1,00	477,00
IMPRIMACION ©	ÉXITO VECINO PR0+000 AL PR0+052 BAHIA	52,00	2,50	N/A	1,00	130,00
IMPRIMACION ©	ÉXITO VECINO INGRESO ÉXITO	6,60	2,45	N/A	1,00	16,17
IMPRIMACION ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+165 VIA	75,00	5,00	N/A	1,00	375,00
IMPRIMACION ©	ÉXITO VECINO PR0+090 AL PR0+145 BAHIA	55,00	2,50	N/A	1,00	137,50
IMPRIMACION ©	LA PALOMA	57,00	6,00	N/A	1,00	342,00
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+000	10,17	2,80	N/A	2,00	56,95
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+020	20,00	9,53	N/A	2,00	381,20
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+030	25,00	9,53	N/A	2,00	476,50
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+040	11,57	9,47	N/A	2,00	219,14
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+050	9,54	3,60	N/A	2,00	68,69
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+060	9,14	1,30	N/A	2,00	23,76
IMPRIMACION ©	LAZAROS PIZZA PR0+070	12,30	8,55	N/A	2,00	210,33
SUB-TOTAL					8458,09	

FOTO

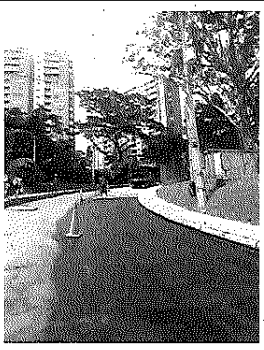

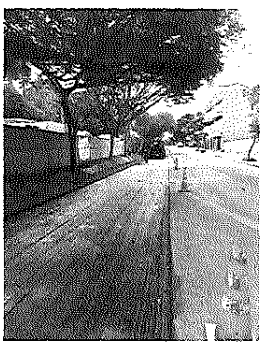



JESUS ARIAS
Residente de Obra
CONSORCIO CI 2026
Contratista

LUCIDIA ARBOLEDA
Directora Interventoria
CONINTEC S.A.S
Interventoria

CONSORCIO CI 2026
Diagonal 51 No. 15 A 161 Km 12 Bello,
Antioquia.
PBX (604) 400 00 00 - 314
Email: info@consorcioci2026.com

CONSORCIO CI
UNIÓN QUE CONSTRUYE

DESur-IP-204-2026

"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24."

Bello, 21 de agosto de 2026

Señores
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL – DESUR
Envigado

Referencia: Contrato DESur-IP-204-2026

Respetados señores:

Los abajo firmantes, en su calidad de representante legal y contador respectivamente del **CONSORCIO CI 2026**, con Nit. **902.092.335-8**, certificamos que la empresa a la fecha no tiene vinculado personal a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales aportes a las caja de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las disposiciones legales vigentes sobre la materia, por tanto, en el momento de su vinculación realizaremos el pago exigido por cada entidad en la fecha indicada para ello.

Dada en Bello, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026.

José Andrés Chica Pérez
C.C. 98.637.898
Representante Legal

Pablo Emilio Gómez Restrepo
C.C. 98.491.635 y TP 221244-T
Contador

Elaboró: JRodriguez – Coordinadora Jurídica – Conasfaltos S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.491.635**

GOMEZ RESTREPO

APELLIDOS

PABLO EMILIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1965**

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1983 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00021901-M-0098491635-20080711 0000930189A 1 2070020743

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

221244-T



PABLO EMILIO
GOMEZ RESTREPO
C.C. 98491635
RESOLUCION INSCRIPCION 1170 **FECHA 21/10/2016**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 235687

Perdida

224767

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9 5 E C 9 9 0 6 B 9 4 4 5 7 1 8

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO EMILIO GOMEZ RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98491635 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 221244-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS identificado(a) con NI 890929951 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEX TORREGLOSA REYES identificado(a) con CC 1045515685

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Tarifa	Periodo	Días
9509291841	569053392	E	2026-08-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-08	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	16%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	6.96%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-07	30

Este certificado se expide el día 2026-08-18 a las 08:18.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS identificado(a) con NI 890929951 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGELA MARIA VELEZ ARANGO identificado(a) con CC 21560763

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Tarifa	Periodo	Días
9509291841	569053392	E	2026-08-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-08	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	16%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	6.96%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-07	30

Este certificado se expide el día 2026-08-18 a las 08:18.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS identificado(a) con NI 890929951 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS EMIRO ARIAS GARCIA identificado(a) con CC 88142493

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Tarifa	Periodo	Días
9509291841	569053392	E	2026-08-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-08	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	16%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	0%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	0%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	0%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	6.96%	2026-07	9
9509291841	569053392	E	2026-08-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-07	9

Este certificado se expide el día 2026-08-18 a las 08:18.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS identificado(a) con NI 890929951 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN ZAMIR SANCHEZ ARRIAGA identificado(a) con CC 71374167

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Tarifa	Periodo	Días
9509291841	569053392	E	2026-08-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-08	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	16%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	0%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	6.96%	2026-07	30
9509291841	569053392	E	2026-08-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	4%	2026-07	30

Este certificado se expide el día 2026-08-18 a las 08:18.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890929951	7	CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. CONASFALTOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 51 16 A 161	BELLO-ANTIOQUIA	4000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	569053392	9509291841	E	2026/08/14	2026/08/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	$245,033,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				226	$125,103,400	$378,700					$0	$125,482,100
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	7	$4,064,900	$12,400	$49,800	$200	$49,800	$200	$0	$4,077,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	111	$62,870,900	$190,300	$234,500	$800	$234,500	$800	$0	$63,061,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	$24,101,900	$72,900	$0	$0	$0	$0	$0	$24,174,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	55	$34,065,700	$103,100	$289,200	$900	$289,200	$900	$0	$34,168,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				227	$51,276,900	$155,100					$0	$51,432,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	227	$51,276,900	$155,100	$0	$0	$0	$0	$0	$51,432,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				227	$29,146,100	$88,200					$0	$29,234,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	227	$29,146,100	$88,200	$0	$0	$0	$0	$0	$29,234,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				227	$36,735,400	$111,500					$0	$36,846,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$316,500	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	$317,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$132,900	$500	$0	$0	$0	$0	$0	$133,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	159	$26,360,500	$79,700	$0	$0	$0	$0	$0	$26,440,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$478,100	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	$479,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$5,810,300	$17,600	$0	$0	$0	$0	$0	$5,827,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$394,200	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	$395,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$73,700	$300	$0	$0	$0	$0	$0	$74,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$2,799,500	$8,500	$0	$0	$0	$0	$0	$2,808,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$9,400	$100	$0	$0	$0	$0	$0	$9,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$360,300	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	$361,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,219,100	$3,700					$0	$1,222,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,219,100	$3,700	$0	$0	$0	$0	$0	$1,222,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$812,700	$2,500					$0	$815,200
SENA	PASENA	899,999,034	5	4	$812,700	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	$815,200
TOTAL				227	$244,293,600	$749,700	$573,500	$1,900	$573,500	$1,900	$0	$245,033,300

2026/08/18 01:34 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que nuestro cliente empresarial **CONSORCIO CI 2026**, identificado(a) con **Nit 9020923358**, es titular de la siguiente cuenta con nuestra Entidad:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
0550039400086292	CUENTA DE AHORROS	VIGENTE	2026/08/25	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el día 25 de agosto de 2026.

Cordial saludo,

BANCO DAVIVIENDA S.A.
