INFORME No. 01

CONTRATO:	**471**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO**	**C.C. No.**	**7.166.766**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JULIO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
267.383.480,00	50.993.880,00	JULIO DE 2026	216.389.600,00	FE -141 NC 29

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 471 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO,** DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2026, SUMINISTRO E INSTALO MUEBLES HOSPITALARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO N RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifican el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución y la Coordinadora de Almacén de la institución, relacionados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3036 en el cual se detallan todos y cada uno de los elementos suministrados por el contratista, el Acta Parcial No. 1 y el Informe con Registro Fotográfico presentado por el contratista, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 50.993.880.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, julio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO

NIT: 7166766-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
Carrera 7 No. 21-59 OF: 402 C, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3105788272

Autorización facturación electrónica No. válida desde hasta rango desde - hasta -

NIT:	**891800231-0**
Nombre o Razón Social:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Dirección:	**CR112727, Tunja, Boyacá, Colombia**
Teléfono:	**7405047**
Email:	**recepciondefacturas@hospitalsanrafaeltunja.gov.co**

No. de Factura	**NC - 29**
Fecha Emisión	**23/07/2026 06:15:17**
Fecha Vencimiento	
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Contado**
Medio de Pago:	**Transferencia Crédito**
Total de Lineas:	**1**

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FE141	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	16/07/2026
CUFE / CUDE:	27c91fda12c0d7da132a9fd79cc74bc8ccf7ac55fb42cbb0ca68bbd7c4e548bdd9e79239d9fe0fa6222184e081005934				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	ELIMINACIÓN DE ITEM POR INCLUSIÓN ERRÓNEA

1	100	PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAVADOS AL 19% Suministro e instalación de locker entrada principal tipo L 30 gavetas con bisagras, manijas, chapas de seguridad y señalización por cada puesto medidas 2,19 m de frente x 2, 07 m de altura y 40 cm de fondo	94	1,00	$3.500.000,00		19%	665000	0,00	$3.500.000,00

Impuestos			
01 IVA	$3.500.000,00	19,00%	$665.000,00


Subtotal:	$3.500.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$665.000,00
Total:	$4.165.000,00

CUDE:	046608bfe8d91403154a5a6f99f8bf25a04aca3f9d861bde84c43515a5772ca51eda29e9d7d1048d5fbf9624ee163fae
Total con letra:	(cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos)

Firma Digital: XY1kCNK1icf7Ru0DE+nP4V4NdGR093zgd+HTrB6Ybu62IclzZUXPd8dj3GzlxJSt
/aa70488iZcCrTy8HGmk4ZC0EKJbYmcD2/7832q+QlsICdEn7
x4daZ+m2V20al4 vQdwdXUyEwCFX5CYgSpRTZ!aRiYJr7EgzFbRAb3j09Zz2ZcCEYb7GcRM6XOJw4Tv Wa6UuVWc4QGzWXfTCfj9aGud9l2U3uGvNmW
GhZ/3kCWaSX0dDmIdG6RtC7bUsiEu DMKSSMvGfCqfEfW3vNJ0hF3bcKGnXSHfCy847wS2Ib/FWUWJ5x9y1W4M+7b0G6+E Ci+Ykn5qtPaf8w9w0H9v
5w==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech


HOSPITAL
San Rafael
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
APROBADA SECOP
POR:
FECHA: 27 julio 2026

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003036

Señores: SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
NIT/C.C.: 7166766 Señor (a): SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-141 Fecha Factura: 2026/07/16
Fecha: 2026/07/22
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM2473	PU1	ARCHIVADOR PARA EMPOTRAR DE MEDIDAS 2.10M DE ALTURA X 1.23 DE ANCHO	UN	1.00	2,100,000	399,000	2,499,000
PM2474	PB1	ARCHIVADOR PARA EMPOTRAR DE MEDIDAS 2.10M DE ALTURA X 1.60M	UN	1.00	2,300,000	437,000	2,737,000
PM2462	PU1	CAJONERA CUADRADA DE 3 CAJONES - BLANCO	UN	1.00	450,000	85,500	535,500
PM2466	PU1	GABINETE AEREO 1.39M DE LARGO X 40CM X 30CM	UN	1.00	900,000	171,000	1,071,000
PM2476	PU1	GABINETE AEREO DE 1.14M DE LARGO X 41CM DE ALTURA	UN	4.00	900,000	684,000	4,284,000
PM2468	PU1	GABINETE AEREO DE 70CM DE FRENTE X 70CM X 35CM	UN	3.00	550,000	313,500	1,963,500
PM2464	PU1	GABINETE AREO DE 1.10M X 41CM X 51CM REANIMACION	UN	1.00	900,000	171,000	1,071,000
PM2477	PU1	GABINETES AEREOS DE 50CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO X 40 DE FONDO	UN	18.00	470,000	1,607,400	10,067,400
PM2478	PB1	LOCKER TIPO L DE 30 GAVETERAS	UN	1.00	5,042,000	957,980	5,999,980
PM2469	PU1	MUEBLE AEREO ESTAND DE ENFERMERIA 99CM DE LARGO X 41CM	UN	1.00	900,000	171,000	1,071,000
PM2471	PB1	MUEBLE DE LAVADO DE MANOS INCLUYE AREA DE LAVADO DE MANOS EN ACERO INOX	UN	1.00	4,500,000	855,000	5,355,000
PM2470	PU1	MUEBLE DE TRABAJO DE 1.35M DE LARGO X 42CM	UN	1.00	350,000	66,500	416,500
PM2467	PU1	MUEBLE LAVAMOS DE 51CM DE FRENTE X 42CM X 75CM	UN	1.00	600,000	114,000	714,000
PM2472	PB1	MUEBLE VISTA AL AUDITORIO DE 3M DE LARGO X 60CM 3 CAJONERAS	UN	1.00	3,500,000	665,000	4,165,000
PM2465	PU1	PUESTO DE TRABAJO DE 3M X 60 REANIMACION	UN	1.00	1,100,000	209,000	1,309,000
PM2475	PU1	PUESTO DE TRABAJO DE 4.68M DE LARGO X 70CM DE FONDO	UN	1.00	1,300,000	247,000	1,547,000
PM2461	PB1	RECEPCION DE ENFERMERIA DE 3.50 DE LARGO X 58CM X 1.15M DE ALTURA	UN	1.00	4,400,000	836,000	5,236,000
PM2463	PU1	RECEPCION DE ENTRADAS DE GUARDAS DE SEGURIDAD - URGENCIAS	UN	1.00	800,000	152,000	952,000
						8,141,880	50,993,880

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500,900	0	0
16350301	Ambas	Internacional	MUEBLES - ENSERES EQ OF	23,492,980	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	49,344,078	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,221,282	8,141,880

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003036

Señores: SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
NIT/C.C.: 7166766 Señor (a): SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-141 Fecha Factura: 2026/07/16
Fecha: 2026/07/22
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	428,520	42,852,000
			TOTAL INTERNACIONAL	50,993,880	50,993,880	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/07/22 Hora: 15:56:04 Usuario:Jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/07 - civmov 8.0.43

VALOR INICIAL: $ 267.383.480.00
FECHA DE INICIO: 10 DE JULIO DE 2026
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026

ACTA PARCIAL # 1

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTRATISTA: ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO

SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 16 de julio 2026

CTO: 471 DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		PRESENTE ACTA	
				V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
	URGENCIAS						
1	Suministro e instalación de recepción enfermería de 3.50 de largo x 58 cm de fondo x 1.15 m de altura con pasacables, con tapa sobreponer exterior, color rower arena, en melamina rh 15 mm color blanco. Con pie de amigos para sostener superficie.	UNIDAD	1	$ 4.400.000,00	$ 4.400.000,00	1,00	$ 4.400.000,00
2	Suministro e instalación de cajonera cuadrada en coordinación de enfermería de medidas 53 cm de fondo x 76 cm de altura 3 cajones con correderas semipesada.	UNIDAD	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00
3	Suministro e instalación de recepción entrada guardas de seguridad medidas de 99 cm de frente x 57 cm de fondo x 1,13 m de altura tapa externa de sobre poner color rower arena, en melamina rh 15 mm co pie de amigos para sostener superficie de trabajo	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00
4	Suministro e instalación de gabinete aéreo reanimación medidas de 1,10m de largo x 41 cm de alto x 51 cm de fondo puerta, bisagras, brazo hidráulico, en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00
5	Suministro e instalación de puesto de trabajo reanimación medidas de 3,00 m de largo x 60 cm de fondo con pasacables y pie de amigos en melamina rh 15 mm	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00
	NEUROFISIOLOGIA						
6	Suministro e instalación de gabinete aéreo 1,39 m de largo 40 cm de altura x 30 cm fondo x con puerta, bisagra y brazo hidráulico en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00
7	Suministro e instalación de mueble lavamanos de 51 cm de frente x 42 cm de fondo x 75 cm de altura 2 puertas con bisagra en melamina de 15 mm rh	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
8	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 70 cm de frente x 70 cm de altura x 35 cm de fondo con 2 puertas y entrepaños, bisagras y brazo hidráulico en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	3	$ 550.000,00	$ 1.650.000,00	3,00	$ 1.650.000,00
9	Suministro e instalación de mueble aéreo estand de enfermería medidas 99 cm de largo x 41 cm alto x 45 cm de fondo brazo hidráulico, bisagras y canto rigido	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00
10	Suministro e instalación de mueble de trabajo medidas de 1,35 m de largo x 42 cm de fondo pasacables en melamina 15 mm rh canto rigido	UNIDAD	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00
	SALA DE INFUSIONES						
11	Suministro e instalación de mueble de lavado de manos incluye área de lavado en acero inoxidable, mueble superior e inferior y torre en melamina de 15 mm rh, enchapado en formica, bisagras, cajones, correderas, niveladores, accesorios para instalación.	UNIDAD	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	1,00	$ 4.500.000,00
	AREA PAJARERA AUDITORIO						
12	Suministro e instalación de mueble vista a auditorio de 3.00 m de largo x 60 cm de fondo con pie de amigos a piso 70 cm de altura y tres cajoneras cierre lento de 45 cm en melamina de 15 mm, manijas rieles tipo pesado tapa de 25 mm área de trabajo	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
13	Suministro e instalación de archivador para empotrar de medidas 2.10 m de altura x 1.23 m de ancho x 55 cm de fondo dos puertas y tres entrepaños correderas, manijas en melamina de 15 mm canto rigido	UNIDAD	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00
14	Suministro e instalación de archivador para empotrar de medidas 2,10 m de altura x 1.60 m de ancho x 50 cm de fondo dos puertas y tres entrepaños correderas, manijas en melamina de 15 mm canto rigido	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00
15	Suministro e instalación de locker entrada principal tipo L 30 gavetas con bisagras, manijas, chapas de seguridad y señalización por cada puesto medidas 2,19 m de frente x 2,07 m de altura y 40 cm de fondo	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00		$ -
	AREA PASILLO FRENTE ASCENSORES						
16	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 4.68 m de largo x 70 cm de fondo reengruesda con pie de amigos, con soportes, pasacables en melamina de rh de 15 mm	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00

17	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.14 m de largo x 41 cm de altura x 31 cm de fondo con tapa, con doble puerta, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh	UNIDAD	4	$ 900.000,00	$ 3.600.000,00	4,00	$ 3.600.000,00
	SEPTIMO SUR						
1e	Suministro e instalación de puertas macizas en melamina cantoneadas en rigido con chapa, bisagras y protectores de camillas	UNIDAD	7	$ 1.300.000,00	$ 9.100.000,00		$ -
19	Suministro e instalación de puertas para baño macizas en melamina cantoneadas en rigido con chapa y bisagras.	UNIDAD	14	$ 1.100.000,00	$ 15.400.000,00		$ -
20	Suministro e instalación de puertas corrediza maciza alto tráfico con manijas en aluminio boceles en aluminio, con ventana en acrílico, en melamina cantoneada con chapa pico de loro	UNIDAD	14	$ 1.300.000,00	$ 18.200.000,00		$ -
21	Suministro e instalación de mesas de noche 82 cm de altura, x 50 cm de ancho y 36 cm de fondo con rodachines y rh canto rigido	UNIDAD	28	$ 440.000,00	$ 12.320.000,00		$ -
22	Suministro e instalación gabinetes aéreos de 50 cm ancho x 40 cm de altura en melamina rh 15 mm	UNIDAD	28	$ 470.000,00	$ 13.160.000,00		$ -
23	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento superior de 2.97 m de largo x 70 cm de altura x 23 cm de fondo bisagras, entrepaños, cajones, en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio	UNIDAD	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ -
24	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento inferior de 4.04 m de largo x 90 cm de altura x 60 cm de fondo con cajones principales x 62 cm de frente, puertas con bisagras, cajones secundarios y terciarios x 62 cm x 30 cm todos los cajones con correderas de 45 tipo semipesado en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio	UNIDAD	1	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00		$ -
25	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 3.54 m de largo x 1.10 m de altura x 85 cm de fondo con cajoneras exteriores de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 2.18 m de largo x 1.10 de altura x 21 cm de fondo	UNIDAD	1	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00		$ -
26	Suministro e instalación de estación de trabajo frente al baño de 3.37 m de largo x 63 cm de altura x 60 cm de fondo bisagras y gabinete, en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00		$ -
27	Suministro e instalación de gabinetes aéreos de 80cm de ancho x 42 cm de altura y 40 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rigido en cuarto ropa limpia	UNIDAD	2	$ 470.000,00	$ 940.000,00		$ -
28	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.20 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto sucio	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
29	Suministro e instalación de módulos inferiores empotrados bajo mesón acero inoxidable en L de 3.40m de frente con puertas, 68 de altura x 53 de fondo con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm cuarto sucio	UNIDAD	2	$ 1.600.000,00	$ 3.200.000,00		$ -
30	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.30 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto insumos	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
31	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.20 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto insumos	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
32	Suministro e instalación de entrepaños de 2.93 m de largo con espaldar en melamina reengruesada de 15 mm en canto rigido en rh en cuarto de equipos	UNIDAD	3	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00		$ -
33	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.30 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto ortopedia	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
	SEXTO PISO ALA NORTE						
34	Suministro e instalación de puertas macizas en melamina cantoneadas en rigido con chapa, bisagras y protectores de camillas	UNIDAD	10	$ 1.300.000,00	$ 13.000.000,00		$ -
35	Suministro e instalación de puertas corrediza maciza alto tráfico con manijas en aluminio boceles en aluminio, con ventana en acrílico, en melamina cantoneada con chapa pico de loro	UNIDAD	11	$ 1.300.000,00	$ 14.300.000,00		$ -
36	Suministro e instalación de mesas de noche 82 cm de altura, x 50 cm de ancho y 36 cm de fondo con rodachines y rh canto rigido	UNIDAD	22	$ 440.000,00	$ 9.680.000,00		$ -
37	Suministro e instalación gabinetes aéreos de 50 cm ancho x 40 cm de altura en melamina rh 15 mm	UNIDAD	22	$ 470.000,00	$ 10.340.000,00		$ -

38	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 4,00 m de largo x 1.10 m de altura x 85 cm de fondo con cajoneras exteriores de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 2.18 m de largo x 1.10 de altura x 21 cm de fondo	UNIDAD	1	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00		$ -
39	Suministro e instalación de estación de trabajo frente a zona de descanso enfermería 3,10 m de largo x 60 cm de fondo con pasacables, pie de amigos, en melamina 15 mm rh, canto rigido	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ -
40	Suministro e instalación de mesa para impresora en puesto de trabajo 60 cm de ancho x 50 de profundidad y altura 65 cm en melamina de 15 mm rh	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ -
41	Suministro e instalación gabinete aéreo de 1,00m cm ancho x 40 cm de altura en melamina rh 15 mm zona de descanso enfermería	UNIDAD	3	$ 900.000,00	$ 2.700.000,00		$ -
42	Suministro e instalación gabinete aéreo de 1,00m cm ancho x 40 cm de altura en melamina rh 15 mm cuarto de aseo	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
43	Suministro e instalación de entrepaños para cuarto ropa limpia de 81 cm de frente x 65 cm de fondo en melamina 15 mm rh	UNIDAD	5	$ 150.000,00	$ 750.000,00		$ -
44	Suministro e instalación de entrepaños de 1,50 m de largo x 30 cm de fondo con espaldar en melamina reengruesada de 15 mm en canto rigido en rh en cuarto de equipos	UNIDAD	6	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00		$ -
45	Suministro e instalación gabinete aéreo de 1,20m cm ancho x 35 cm de fondo en melamina rh 15 mm cuarto de equipos	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
46	Suministro e instalación de armario de insumos para cuarto de equipos médicos 90 cm de ancho x 2,25 m de altura x 47 cm de fondo 5 entrepaños con dos puertas, bisagras cierre lento en melamina de 15 mm	UNIDAD	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00		$ -
47	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento superior de 3,90 m de largo x 50 cm de altura x 32 cm de fondo con gabinetes y doble puerta, bisagras, y mueble inferior tipo L de 88 cm de altura x 5 m de largo x 64 cm de fondo con cajones y puertas, herrajes, correderas bisagras, en canto rigido en rh cuarto trabajo limpio	UNIDAD	1	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00		$ -
48	Suministro e instalación de locker 28 puestos 2,40 m de altura x 1,85 m de frente gavetas con bisagras, manijas, chapas de seguridad cuarto descanso	UNIDAD	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00		$ -
49	Suministro e instalación de escritorio con cajonera de 1,20 m x 60 cm de fondo enchapado en formica con cajonera metálica 2x1 estructura metálica	UNIDAD	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00		$ -
50	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1,0m cm de frente x 40 cm de altura x 35 cm de fondo , bisagras y brazo hidráulico en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00		$ -
	AREA SOTANO						
51	Suministro e instalación gabinetes aéreos de 50 cm de ancho x 40 cm de alto x 40 cm de fondo en melamina rh 15 mm, manija brazo hidráulico en hospitalización	UNIDAD	18	$ 470.000,00	$ 8.460.000,00	18,00	$ 8.460.000,00
	AREA ENTRAOA PRINCIPAL						
52	Suministro e instalacion de locker tipo L 30 gavetas, con bisagras, manijas, chapas de seguridad con llaves y señalización, en canto rigido, medidas aproximadas 2,19 m de frente x 2,07 de altura x 40 cm de fondo	UNIDAD	1	$ 5.042.000,00	$ 5.042.000,00	1,00	$ 5.042.000,00
	SUBTDTAL				$ 224.692.000		$ 42.692.000
	IVA 19%				$ 42.691.480		$ 8.141.880
	TOTAL				**$ 267.383.480**		$ 50.993.880

ARMANOO JAVIER SDLER SALCEOO
Contratista

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Lider de Mantenimiento

EL LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que el señor ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO identificado con C.C. 7.166.766 realizó a satisfacción durante el mes de julio de 2026 el SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 471 de 2026. Soportado con factura número FE-141 de fecha 16 de julio de 2026 y Nota Crédito No NC-29 de fecha 23 de julio de 2026.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 50.993.880.oo).**

Tunja, 23 de julio de 2026.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que el señor ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO identificado con C.C. 7.166.766 realizó a satisfacción durante el mes de julio de 2026, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 471 de 2026. Soportado con factura número FE-141 de fecha 16 de julio de 2026 y Nota Crédito N° NC-29 de fecha 23 de julio de 2026 y Comprobante de Ingreso N° 3036, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de recepción enfermería de 3.50 de largo x 58 cm de fondo x 1.15 m de altura con pasacables, con tapa sobreponer exterior, color rower arena, en melamina rh 15 mm color blanco. Con pie de amigos para sostener superficie.	UNIDAD	1,00
2	Suministro e instalación de cajonera cuadrada en coordinación de enfermería de medidas 53 cm de fondo x 76 cm de altura 3 cajones con correderas semipesada.	UNIDAD	1,00
3	Suministro e instalación de recepción entrada guardas de seguridad medidas de 99 cm de frente x 57 cm de fondo x 1,13 m de altura tapa externa de sobre poner color rower arena, en melamina rh 15 mm co pie de amigos para sostener superficie de trabajo	UNIDAD	1,00
4	Suministro e instalación de gabinete aéreo reanimación medidas de 1,10m de largo x 41 cm de alto x 51 cm de fondo puerta, bisagras, brazo hidráulico, en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	1,00
5	Suministro e instalación de puesto de trabajo reanimación medidas de 3,00 m de largo x 60 cm de fondo con pasacables y pie de amigos en melamina rh 15 mm	UNIDAD	1,00
6	Suministro e instalación de gabinete aéreo 1,39 m de largo 40 cm de altura x 30 cm fondo x con puerta, bisagra y brazo hidráulico en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	1,00
7	Suministro e instalación de mueble lavamanos de 51 cm de frente x 42 cm de fondo x 75 cm de altura 2 puertas con bisagra en melamina de 15 mm rh	UNIDAD	1,00
8	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 70 cm de frente x 70 cm de altura x 35 cm de fondo con 2 puertas y entrepaños, bisagras y brazo hidráulico en melamina canto rigido rh 15 mm	UNIDAD	3,00
9	Suministro e instalación de mueble aéreo estand de enfermería medidas 99 cm de largo x 41 cm alto x 45 cm de fondo brazo hidráulico, bisagras y canto rigido	UNIDAD	1,00
10	Suministro e instalación de mueble de trabajo medidas de 1,35 m de largo x 42 cm de fondo pasacables en melamina 15 mm rh canto rigido	UNIDAD	1,00
11	Suministro e instalación de mueble de lavado de manos incluye área de lavado en acero inoxidable, mueble superior e inferior y torre en melamina de 15 mm rh, enchapado en formica, bisagras, cajones, correderas, niveladores, accesorios para instalación.	UNIDAD	1,00
12	Suministro e instalación de mueble vista a auditorio de 3.00 m de largo x 60 cm de fondo con pie de amigos a piso 70 cm de altura y tres cajoneras cierre lento de 45 cm en melamina de 15 mm, manijas rieles tipo pesado tapa de 25 mm área de trabajo	UNIDAD	1,00
13	Suministro e instalación de archivador para empotrar de medidas 2.10 m de altura x 1.23 m de ancho x 55 cm de fondo dos puertas y tres entrepaños correderas, manijas en melamina de 15 mm canto rigido	UNIDAD	1,00

14	Suministro e instalación de archivador para empotrar de medidas 2,10 m de altura x 1.60 m de ancho x 50 cm de fondo dos puertas y tres entrepaños correderas, manijas en melamina de 15 mm canto rigido	UNIDAD	1,00
15	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 4.68 m de largo x 70 cm de fondo reengruesda con pie de amigos, con soportes, pasacables en melamina de rh de 15 mm	UNIDAD	1,00
16	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.14 m de largo x 41 cm de altura x 31 cm de fondo con tapa, con doble puerta, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh	UNIDAD	4,00
17	Suministro e instalación gabinetes aéreos de 50 cm de ancho x 40 cm de alto x 40 cm de fondo en melamina rh 15 mm, manija brazo hidráulico en hospitalización	UNIDAD	18,00
18	Suministro e instalación de locker tipo L 30 gavetas, con bisagras, manijas, chapas de seguridad con llaves y señalización, en canto rigido, medidas aproximadas 2,19 m de frente x 2,07 de altura x 40 cm de fondo	UNIDAD	1,00

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($50.993.880).**

Tunja, julio de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

ACTA PARCIAL No. 1
INFORME PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 471 DE 2026

Tunja, 17 de julio de 2026

Señores
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
ING. HECTOR JAVIER DIAZ CERÓN
LÍDER DE MANTENIMIENTO
Ciudad

INFORME PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 471 DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
NÚMERO DE DOCUMENTO	C.C. 7.166.766 de Tunja

1. DESCRIPCIÓN DE ENTREGA DE LOS ITEMS REQUERIDOS

En cumplimiento del objeto contractual, se llevó a cabo el suministro e instalación de muebles hospitalarios destinados a los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato. Las actividades comprendieron la entrega, montaje, nivelación, ajuste y puesta en funcionamiento de los diferentes elementos de mobiliario, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, resistencia, funcionalidad, ergonomía y seguridad requeridos para ambientes hospitalarios. La ejecución se desarrolló de manera articulada con las dependencias responsables de la entidad, atendiendo los protocolos técnicos y de seguridad aplicables, con el propósito de asegurar una adecuada distribución y aprovechamiento de los espacios intervenidos. Con ello, se fortalecieron las condiciones físicas y operativas de los servicios asistenciales y administrativos del hospital, contribuyendo a mejorar la prestación de los servicios de salud, el bienestar de los usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja


2. ACTIVIDADES REALIZADAS

AREA URGENCIAS

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247


SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS



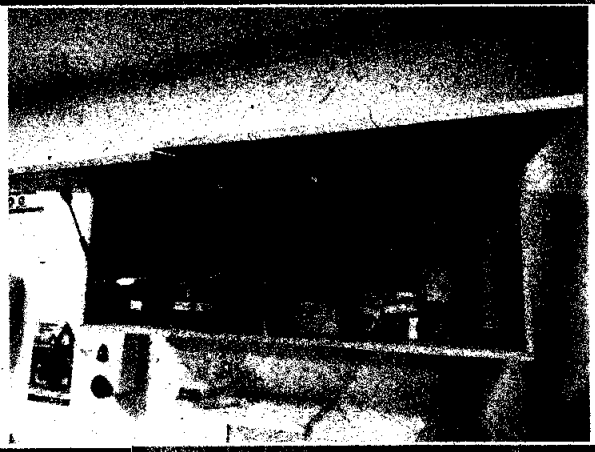




SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

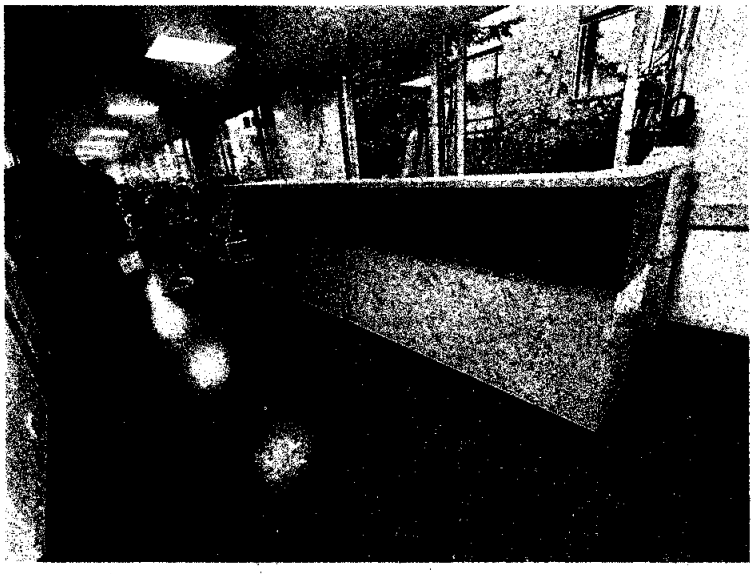

AREA NEUROFISIOLOGIA

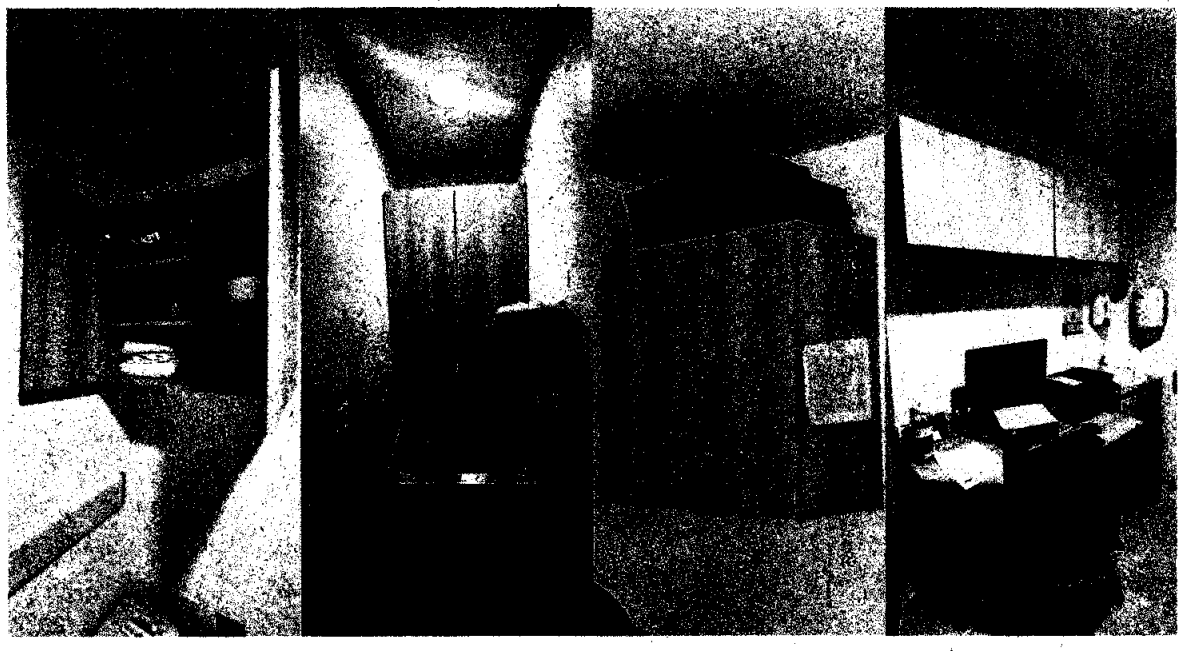

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247




AREA SALA DE INFUSIONES




AREA PAJARERA AUDITORIO

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247




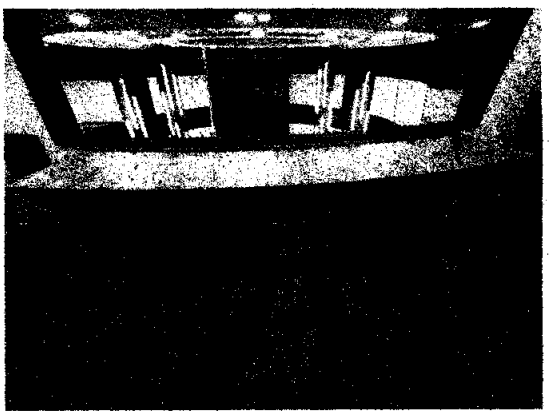

AREA PASILLO FRENTE ASESORES

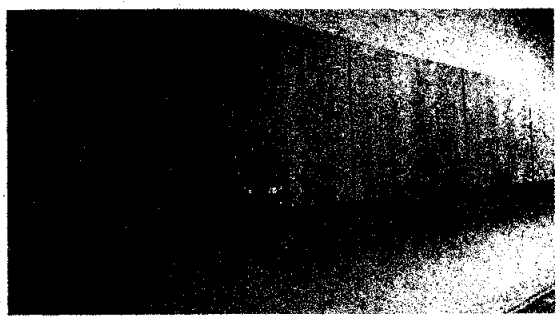

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

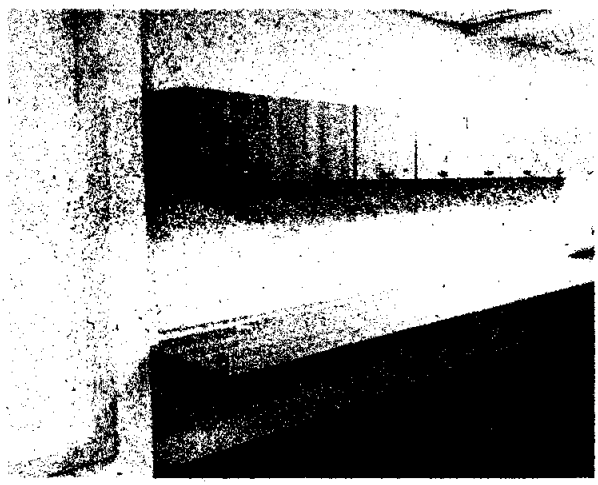


AREA SOTANO





SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

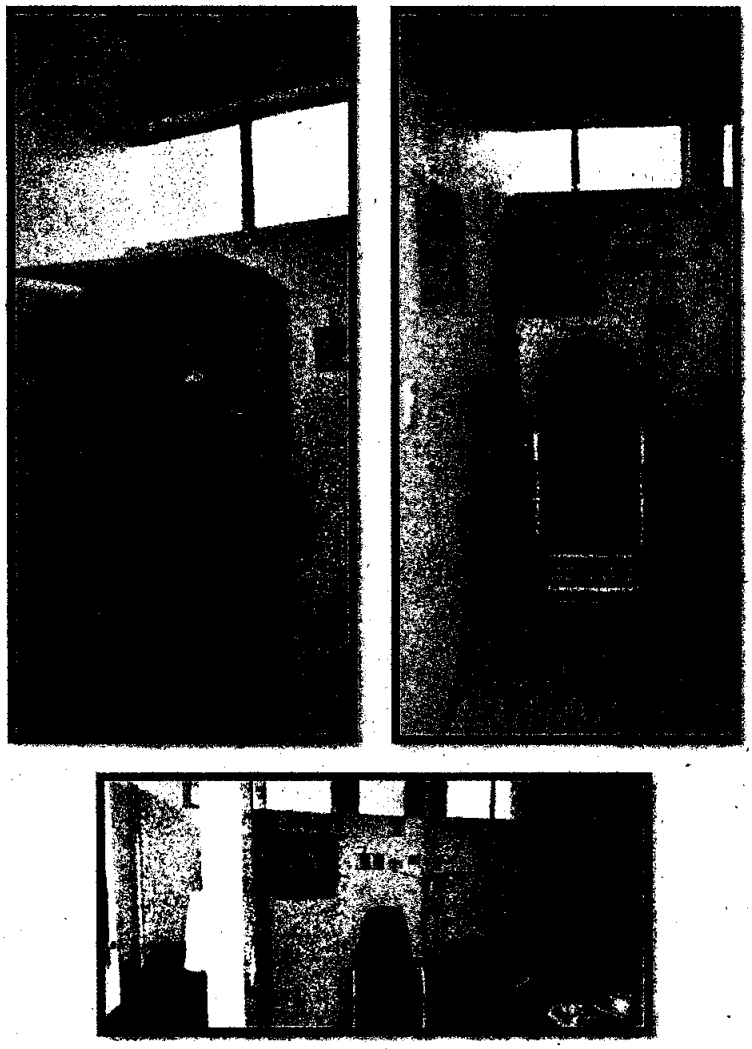

AREA ENTRADA PRINCIPAL

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247



3. RECOMENDACIONES DE USO

1. Implementar rutinas periódicas de limpieza utilizando únicamente productos compatibles con superficies hospitalarias, evitando sustancias abrasivas que deterioren los materiales.
2. Evitar sobrecargar los muebles o utilizar los elementos para fines distintos a los previstos, con el fin de preservar su estructura y vida útil.
3. Realizar inspecciones preventivas trimestrales para verificar fijaciones, herrajes, nivelación y estado general, permitiendo detectar oportunamente posibles desgastes.
4. Socializar con el personal asistencial y administrativo las buenas prácticas de uso y manipulación del mobiliario para prevenir daños por manejo inadecuado.

El suscrito contratista declara que las actividades descritas en el presente informe fueron ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, conforme a los términos, condiciones técnicas y cronograma establecidos, garantizando la calidad del suministro, la correcta instalación de los ítems entregados y la observancia de los lineamientos institucionales aplicables. Asimismo, se deja constancia de que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones requeridas y fueron entregados a satisfacción en las áreas correspondientes, quedando a disposición de la entidad para su verificación, seguimiento y uso dentro de los fines previstos en el contrato.

Cordialmente,

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
CONTRATISTA
C.C. 7.166.766

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

Que el señor **ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO** con **Nit 7.166.766 - 1**, a la fecha ha pagado los aportes para salud, pensión y riesgos laborales, como trabajador independiente, correspondientes a los últimos seis (6) meses de Dos Mil Veintiséis (2026) encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja a los Seis días (06) días del mes de Julio de Dos Mil veintiséis (2026).

LINDON BORDA DUITAMA
Contador **U.P.T.C.**
Nit: **4.221.723 - 1**
Tarjeta Profesional **42.340 - T**
