Tunja, 06 de marzo de 2026

IH-006-2026

Señores,
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: Remisión Informe mes de febrero 2026

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe Mensual de Actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, relacionado con el proyecto de construcción del tercer piso destinado a Hospitalización de Adultos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Lo anterior se remite en cumplimiento de lo establecido contractualmente y con el fin de informar el avance técnico, administrativo y de interventoría del proyecto durante el periodo señalado.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**2**		FECHA:	6	de	MARZO	de	2026			
PERIODO:	DEL	15	de	FEBRERO	de	2026	AL	28	de	FEBRERO	de	2026

CONTRATO No:	**664**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**202500000032831**

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 11 # 27-27 Costado occidental del Hospital

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN.	**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA	$ -	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 6.747.955.961,54	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 6.747.955.961,54

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	**31**	de	AGOSTO	de	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	**31**	de	AGOSTO	de	**2026**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**19,65%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**12,05%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**8,00%**



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	M-100287952	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑÍA SIEMPRE	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd: 21	mm: 1	aa: 2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15	1	2026	30	10	2026	$ 674.795.596,15
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15	1	2026	30	4	2026	$ 1.349.591.192,31
PRESTACIONES SOCIALES	15	1	2026	30	4	2029	$ 674.795.596,15
CALIDAD DE LA OBRA	15	1	2026	30	10	2026	$ 1.349.591.192,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15	1	2026	30	4	2031	$ 1.349.591.192,31
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15	1	2026	30	4	2026	$ 700.362.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Dias soleados.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa
Acta de Inicio de Interventoria	15	1	2026
PRORROGA No. 1 Contrato de Interventoria	27	2	2026
Acta de Inicio de Obra	15	1	2026
PRORROGA No. 1 Contrato de obra	27	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL, PLACA TRANSITABLE Y FUNDIDA DE CONCRETO.	Hospitalización adulto
PERFORACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y PLUVIAL	Hospitalización adulto

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	Hospitalización adulto
MAMPOSTERÍA, COLUMNETAS, VIGUETAS Y PAÑETES	Hospitalización adulto

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
* Seguimiento al cumplimiento de actividades en obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Seguimiento, Control y Verificación de los sistemas de Seguridad, Ambiental y Contenido Social.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Seguimiento, Control y Verificación del uso de elementos de protección al personal.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA DE MANO	REPLANTEO, CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y PANTALLAS	100%	
MEZCLADORA - AUTOHORMIGUERA	CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y PANTALLAS	80%	
TALADRO	PERFORACIONES	60%	
SIERRA DE MANO	CORTE DE MATERIALES	60%	
VOLQUETA	RETIRO DE SOBRANTES	50%	
MINICARGADOR	RETIRO DE SOBRANTES	30%	
VIBRADOR DE CONCRETO	CAMPAMENTO	100%	
PULIDORA	CORTES	70%	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
CEMENTO	Cementos Argos	Cemento Bulto de 50 Kg
ACERO	Andres Martinez	Acero en barra
LONA BLANCA	Distrifer	Cerramiento temporal

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computador	Revision de Estudios y Diseños	100%	
Impresora	Ejecucion del proyecto	100%	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	23	1	2026	$ 1.349.591.192,32
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				0.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
9/02/2026	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Supervisor del Contrato	Remisión informe enero 2026 con anexos	Revisión y entrega de Documentos
17/02/2026	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Supervisor del Contrato	Remisión de informe ajustado de acuerdo a observaciones compartidas por la supervisión.	Revisión y entrega de Documentos

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH										
John Jairo Benavides	1.049.657.535	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Luis Yoel Rodriguez	7.037.276	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Fabriciano Torres Rivera	7.166.053	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Jose Amilkar Diaz Correa	1.115.914.794	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Fabian Edilbrando Rodriguez	7.186.844	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Oswaldo Maldonado Murcia	80.394.482	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Ivan Andres Mahecha Beltran	1.073.327.568	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Angel Ferney Patiño Barahona	1.010.117.212	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Manuel José Polo	1.070.806.365	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Josfran Rafael Rojas Gomez	PPT 5274244	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Jairo Espinosa Rodriguez	18.923.104	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Oscar David Aristizabal Cardenas	1.056.785.406	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Fabian Reinaldo Rodriguez	1.057.545.387	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Fredy Ramon Rodriguez Piamo	PPT 7154851	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Said Fernando Larrotta Madera	88.273.429	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Jose Miguel Palmera	1.049.349.065	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Miguel Viasus	1.049.616.295	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Edwin Vargas	1.049.623.749	x	x	x	1	2	2026	28	2	2028
yair Nunpaque	1.049.622.887	x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
katherine Munevar	1.082.924.352	x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Edison Vargas	1.010.048.639	x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Laura Suarez	1.010.121.910	x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
German Rodriguez	7.184.104	x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Walfran Enrique Alvear	1.067.815.402	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION										
Clara María Rodas Moreno		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Alejandro Saldarriaga Castrillón		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Hugo Aguilar Suarez		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Catalina Yepes Estrada		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Gustavo Alonso Yepes Yepes		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Ricardo Gómez Colorado		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026
Leidy Johana Muñoz Zapata		x	x	x	1	2	2026	28	2	2026

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de obra	Duván Sánchez	98.564.715
Residente de Obra	German Rodríguez	7.184.104
Asesor Estructural	Jorge Arbeláez	98.545.040
Asesor Eléctrico	Jhonny Herrera	73.557.984
Asesor HVAC	Andrés Rojas	1.049.619.156
Asesor Hospitalario	Luis Mauricio Fonseca	7.165.985
SISO de obra	Laura Lorena Suarez	1.010.121.910

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	
* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría				

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**DOC. IDENTIFICACIÓN**
Director de Interventoría	Clara María Rodas Moreno	43.640.564
Asesor Gases Medicinales	Alejandro Saldarriaga Castrillón	71.213.617
Asesor Eléctrico	Hugo Aguilar Suarez	7.186.099
Asesor Estructural	Catalina Yepes Estrada	1.128.266.981
Asesor HVAC	Gustavo Alonso Yepes Yepes	70.078.226
Residente de Interventoría	Ricardo Gómez Colorado	1.037.626.269
SISO de Interventoría	Leidy Johana Muñoz Zapata	1.020.440.559

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
* Se desarrollan charla de inducción y capacitación de seguridad al personal de la obra	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Se realiza cerramientos en Superboard para la seguridad del público del centro de salud.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Se realiza instalación de lona de delimitación de obra y publico.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
* Se realiza seguimiento de entrada de materiales	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Se Cuantifican actividades de obra ejecutada.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Se solicita certificados de calidad y/o diseños de mezcla para la obra	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.
* Se solicita certificados de calidad de los materiales fundidos.	Carrera 11 # 27-27 Costado occidental HUSRT.

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Certificado de calidad cemento de uso general	28	2	2026	Certifica Argos
Certificado de calidad cemento estructural	28	2	2026	Certifica Argos
Certificado de calidad de muestras de resistencia de placa transitable, vigas y viga canal	12	2	2026	Certifica - Colconcretos. Resistencia a 3 y 7 dias. Resultado a 7 dias superando la resistendia de 28 Mpa .

Certificado de calidad de muestras de resistencia de placa transitable, vigas y viga canal	9	2	2026	Resistencia de los concretos de Placa transitable, vigas, viga canal. Muestras tomadas por el contratista donde falla a 3, 7 y 14 días cumpliendo con la resistencia admisible.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Certificado de calidad de Pantalla Piso 3	28	2	2026	Resultado promedio de 103,23% cumple resisitencia
Certificado de calidad de Columnas y Pantalla Piso 3	28	2	2026	Resultado promedio de 94,19% cumple resistencia minimo admisible de acuerdo a la norma

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arena lavada	Dubai	11,3	Para columnas y pantallas
Arena Peña	Dubai	11,3	Para columnas y pantallas
Grava	Agregados Santa Lucia	21,9	Para columnas y pantallas
Acero	Andres Martinez	-	Para columnas, pantallas y vigas

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
En la mesa técnica se definieron ajustes en fachadas, alturas y distribución de espacios del proyecto. Se estableció cielo raso de 2.60 m, antepechos en bloque en fachada occidental y modificaciones en fachadas norte y oriental. También se definieron acabados (pisos en granito Blanco Huila), dotaciones y ajustes en áreas como trabajo limpio, trabajo sucio, procedimientos, estación de enfermería, cuarto de equipos, unidades sanitarias y habitaciones. Adicionalmente, se solicitaron sensores en áreas específicas, sistema de llamados de enfermería con código azul, adecuación del cuarto de residuos, ajustes en lavapatos y verificación de ventilación natural en algunos espacios.	2	2	2026	mesa tecnica
En el comité técnico de obra se socializaron ajustes a los diseños arquitectónicos, los cuales fueron aprobados por el Dr. Pertuz manteniendo la capacidad instalada. También se definió que la red RCI del tercer nivel se ejecutará con sistema tradicional, similar al de urgencias niveles 1 y 2. Además, se informó que las memorias y planos eléctricos están disponibles en Drive y se solicitó una programación de obra ajustada para la prórroga.	11	2	2026	Comité de Obra
En el comité técnico de obra se definió mantener ladrillo Santa Fe en la fachada occidental entre los ejes A–D y estuco pintado entre los ejes D–F'. Además, se solicitó dejar una puerta de acceso a la placa transitable en la circulación sur, cerca de la habitación unipersonal.	28	2	2026	Comité de Obra
En la mesa técnica se resolvieron dudas del contratista sobre planimetría y proceso constructivo para evitar retrasos. Se acordó registrar en planos récord los ajustes de la fachada oriental y dejar una puerta-ventana al final de la circulación norte-sur para acceso directo a la terraza.	16	2	2026	Mesa tecnica

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	15	1	2026	31	1	2026	
Informe de Interventoría No. 2	1	2	2026	1	2	2026	Presente Informe

OBSERVACIONES:

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	**VERIFICACIÓN**	**FOLIOS No.**
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**SI**	**110 - 120**
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	**SI**	**162 - 178**
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**SI**	**192 - 217**
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**NO**	**-**
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	**SI**	**179 - 191**
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**NO**	**-**
Amortización del anticipo	**NO**	**-**
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	**NO**	**-**
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**NO**	**-**
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**NO**	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**NO**	**-**
Memorias y planos de diseño aprobados	**NO**	**-**

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	**192 - 217**
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**NO**	**-**
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**SI**	**42 - 439**
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**418-422**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	**110-161**
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**SI**	**423 - 439**
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**SI**	**423 - 439**
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**SI**	**423 - 439**
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**NO**	**-**
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	**231 - 247**
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**218 - 422**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	RICARDO GOMEZ COLORADO

INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA MENSUAL No 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 664 DE 2025
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN - NIT:902.020.105-2
OBJETO: *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*".

CONTRATISTA DE OBRA N° 665 DE 2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH - NIT: 902.020.164-7
OBJETO: *"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.",*

PERIODO:
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA
2026

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026	**NIT**	902.020.105-2

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado por la firma de Interventoría CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN, dando cumplimiento a la Cláusula Séptima “Obligaciones del Contratista” numeral 8. Presentación de Informes a la supervisión, por consiguiente; se da a conocer el presente INFORME MENSUAL No. 02 “EJECUCIÓN DE OBRA”, describiendo las actividades que se adelantan en el tiempo predeterminado y el estado en la ejecución del Contrato de Obra No. 665 de 2025, cuyo objeto es: ***“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ***

En el marco del proyecto, la construcción del tercer nivel correspondiente a la ampliación del servicio de urgencias y a la infraestructura de alta complejidad se desarrolla en el costado occidental de las instalaciones existentes del hospital. Para la ejecución de esta etapa, el HUSRT contempla la continuidad en la prolongación de las columnas sobre la estructura en acero proyectado, la cual se encuentra en desarrollo desde la cimentación del primer nivel de la ampliación de urgencias y cuya ejecución está a cargo de un consorcio diferente.

En razón de lo anterior, se requiere una coordinación permanente entre los dos consorcios involucrados, con el propósito de evitar interferencias en los procesos constructivos de ambos contratos o, en su defecto, mitigar cualquier impacto negativo. Sin embargo, es pertinente indicar que podrían presentarse variaciones en los plazos de ejecución, derivadas del uso compartido de los accesos para el ingreso de materiales, así como de la dependencia de ciertas actividades del tercer nivel respecto a las intervenciones ejecutadas por el contratista responsable de los niveles inferiores.

Por lo anterior, se registra dentro del presente Informe, la descripción de los trabajos adelantados por el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** en el período comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2026. Donde se hace relación de los aspectos más sobresalientes, las actividades contractuales y demás eventualidades que conlleve la correcta ejecución del contrato de obra, dejando un registro físico para conocimiento de los interesados.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 2
2. GENERALIDADES 5
2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
2.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.3 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
3. DESCRIPCION Y ESTADO INICIAL DEL PROYECTO 9
3.1 AREA GENERAL 9
3.2 INVENTARIO DEL ESPACIO 10
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11
5. AVANCE EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 11
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 15
6.1 GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 16
6.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 17
6.3 SEGUIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS 18
6.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 19
7. AVANCE DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO 24
7.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 24
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 27
7.2. AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO A LA FECHA 29
7.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 29
8. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 31
8.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 31
8.2. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 32
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 33
9.1. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA 33
9.2. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 34
9.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA 35
9.4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 36
9.5. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 36
9.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 40
10. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA... 41
11. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 41
12. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 42
13. AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 42
13.1. SEGUIMIENTO A ENSAYOS DE LABORATORIO 47
18 CONCLUSIONES 49
14. ANEXOS 49

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información del contrato 15
Tabla 2 Pólizas vigentes contratista 16
Tabla 3 Presupuesto general 17
Tabla 4 Actividades programadas a la fecha 24
Tabla 5 Actividades ejecutadas contractuales 27
Tabla 6. Avance de obra ejecutada a la fecha 29
Tabla 7 Avance General en tiempo de obra en porcentaje 29
Tabla 8. Seguimiento al contrato 30
Tabla 9 Pólizas vigentes interventoría 32
Tabla 10 Correspondencia enviada 35
Tabla 11 Correspondencia recibida mes noviembre por parte del contratista de obra. 36
Tabla 12 Avance interventoría en días 41
Tabla 13 Equipo contrato de interventoría 42
Tabla 14 Personal interventoría 42

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1 Ubicación Nacional y Departamental del proyecto 6
Imagen 2 Ubicación general de la obra. 7
Imagen 3 Localización interna Etapa 1 7
Imagen 4 Área General 9
Imagen 5 Corte fachada norte 10
Imagen 6. Amarre de aceros 20
Imagen 7. Tercer nivel – Fundida de placa. 20
Imagen 8. Amarre de Acero 21
Imagen 9. Encofrado y fundida de concreto 21
Imagen 10. Amarre de Acero 22
Imagen 11. Encofrado y fundida de concreto 22
Imagen 12. Amarre de Acero 23
Imagen 13. Encofrado y fundida de concreto 23
Imagen 14. Mampostería 24
Imagen 15. Mampostería y elementos estructurales 24
Imagen 16 Evolución de las precipitaciones en Tunja 40
Imagen 17 Recorrido de obra 44
Imagen 18 Recorrido de obra 44
Imagen 19 Recorrido de obra 45
Imagen 20 Comité de obra 45

2. GENERALIDADES

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ESE Hospital San Rafael de Tunja, es el principal centro de referencia de alta complejidad del departamento, actualmente apoya la prestación de servicios de segundo nivel para la zona centro del departamento, lo cual ha generado demanda en la prestación de los servicios de la ESE. En los últimos 5 años se ha evidenciado un aumento progresivo en la demanda de los servicios prestados por la ESE, reflejado en los egresos hospitalarios, en demanda insatisfecha y principalmente en el índice ocupacional de cada uno de los servicios de la institución.

Ante esta demanda creciendo constantemente, se requiere la ampliación de la capacidad instalada tanto en talento humano como en infraestructura. En vigencia 2022 (después de pasar por una pandemia nacional e internacional) se tiene un promedio de ocupación del 138% y en junio de 2023 el promedio de ocupación fue del 132.30% de manera general. Lo cual demuestra la necesidad de ampliar rápidamente la infraestructura, aprovechando cada espacio con el que cuenta el Hospital.

Ante esta problemática, se proyecta la construcción de la ampliación de urgencias e infraestructura de alta complejidad (etapa 1) complementando con un tercer nivel que prestará el servicio de hospitalización adulto, este se realizará en el costado occidental de las instalaciones del hospital. En donde plantea continuar con la prolongación de las columnas sobre el acero proyectado de la estructura que viene desde la cimentación del primer nivel de la ampliación de urgencias la cual está siendo ejecutada por otro consorcio, como se mencionó anteriormente y debido a las circunstancias en que se ejecutara el proyecto se tendrá un contacto continuo entre los dos consorcios con el fin de no entorpecer los procesos constructivos de los dos contratos o por lo menos minimizar cualquier tipo de afectación, sin embargo es importante anotar que pueden haber variaciones en los tiempos de ejecución ya que se compartirán acceso de materiales y habrán algunas actividades a realizar en la construcción del tercer nivel que dependan de la intervención del otro contratista en los niveles inferiores.

Esta etapa contará con los servicios de hospitalización adulto, ampliando significativamente la cantidad de camas de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, de las cuales son 11 camas sencillas con su respectiva unidad sanitaria, 5 habitaciones bipersonales con unidad sanitaria, dos habitaciones para aislados con su respectiva unidad sanitaria y filtro cada una, estación de enfermería, sala de procedimientos, sala de espera, cuarto de equipos, unidades sanitarias para


funcionarios, cuartos de aseo como: trabajo sucio, trabajo limpio, Ropa sucia, Ropa limpia, cuartos de residuos peligrosos y no peligrosos. Acompañados en este nivel de acceso de ascensor camero, amplios espacios de acceso y circulaciones.

Estos trabajos se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas, y ambientales suministradas por la entidad contratante, así como la normatividad vigente entre las que se destacan RAS 2000, resolución 0330 de 2017, la NSR-10, RETIE, RETILAP y todo lo establecido al respecto en el pliego de condiciones del contrato de obra. La construcción tiene un plazo de ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de agosto de 2026, lo cual indica que el período de las etapas de ejecución de obras abarca un periodo desde 15 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2026.

2.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Tunja, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes, a 115 km al noreste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país. Siendo el sitio del proyecto a ejecutar. En la imagen que se encuentra a continuación hace referencia a la localización nacional y departamental.

Imagen 1 Ubicación Nacional y Departamental del proyecto

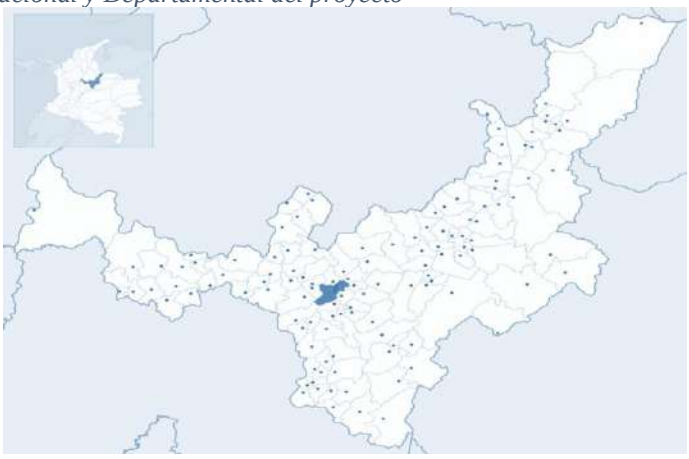

Fuente: Tomada de (wikipedia, 2011)

La obra se localiza más exactamente en la carrera 11 # 27-77, en inmediaciones del barrio 20 de julio y barrio las nieves, allí se ubica el Hospital Universitario San Rafael ubicado en la macro-zona centro occidental (CW) de la ciudad de Tunja. A continuación, se muestra la ubicación general.

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026	**NIT**	902.020.105-2


Imagen 2 Ubicación general de la obra.



Fuente: Tomada de (google maps, 2023)

La obra se efectuará en costado occidental dentro de las instalaciones actuales del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, donde se edificará un tercer piso sobre una obra nueva de dos pisos que actualmente se está construyendo en la actualidad por otro consorcio, en este espacio funcionará el servicio de hospitalización adulto.

Imagen 3 Localización interna Etapa 1

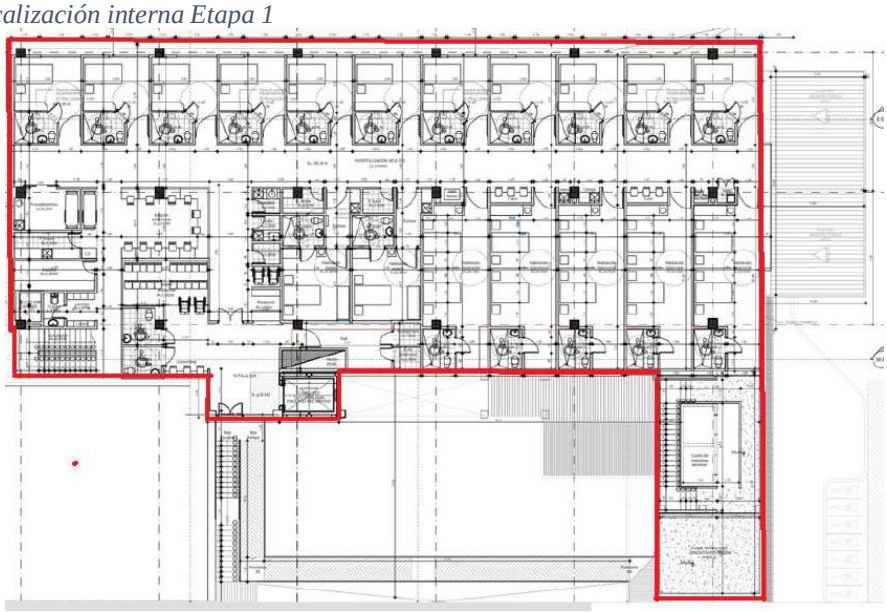

Fuente: Tercer nivel – Diseño arquitectónico.

2.3 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La construcción de un tercer nivel destinado al servicio de hospitalización de adultos, ubicado sobre el área correspondiente a la ampliación del servicio de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, permitirá ampliar la capacidad instalada de la ESE. Esta intervención responde a las necesidades de atención derivadas de la cobertura departamental, la cual comprende 123 municipios organizados en 13 provincias, cuyos establecimientos de salud prestan, en su mayoría, servicios de primer nivel de atención.

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja se constituye como el principal referente de alta complejidad del departamento y, de manera complementaria, apoya actualmente la prestación de servicios de segundo nivel para la zona centro del departamento. Esta condición ha generado un incremento sostenido en la demanda de los servicios asistenciales, situación que sustenta la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria mediante la ejecución del tercer nivel proyectado a la atención de urgencias con servicio de Hospitalización adulto, de esta manera aumentar la capacidad de los servicios.

Los municipios que se encuentran en zona centro y aledaños con la ciudad de Tunja son:

- Motavita
- Cómbita
- Oicatá
- Chivatá
- Soracá
- Boyacá
- Ventaquemada
- Samacá
- Cucaita
- Sora

Se registra la necesidad de ampliar la infraestructura física del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT), con el fin de atender de manera adecuada el incremento en la demanda de los servicios asistenciales. La presente etapa del proyecto corresponde a la continuación de la ampliación del servicio de urgencias, mediante la construcción de un tercer nivel destinado a la prestación de servicios de hospitalización de adultos.

Esta intervención hace parte de la primera de tres etapas contempladas dentro del plan de ampliación de infraestructura del hospital. La segunda etapa considera la construcción de un edificio de cinco pisos, en el cual se albergarán áreas destinadas a cuarto de equipos, central de gases, salas de autopsias, parqueadero para funcionarios, sistema de bomba de vacío, servicios generales, almacén, lavandería, salas de cirugía, áreas de recuperación y observación, central de esterilización, aula

académica, servicios de quimioterapia para población adulta y pediátrica, así como unidades de cuidado intensivo e intermedio para adultos.


En cuanto a la tercera etapa del proyecto contempla la construcción de un búnker especializado para la prestación de servicios de oncología, con lo cual se consolidará la ampliación integral de la capacidad instalada del HUSRT.

Para el presente contrato se contará con la ampliación de la infraestructura correspondiente a la etapa 1, mediante la construcción del tercer nivel destinado a hospitalización de adultos, el cual permitirá fortalecer la capacidad instalada del HUSRT y mejorar la cobertura y oportunidad en la prestación de los servicios de salud para la población del área de influencia y del departamento en general. Esta intervención tiene como objetivo contribuir a la atención oportuna, eficiente y eficaz de las necesidades médicas, así como apoyar la reducción de los indicadores de morbilidad y mortalidad asociados a la demanda asistencial.

3. DESCRIPCION Y ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

3.1 AREA GENERAL

Imagen 4 Área General

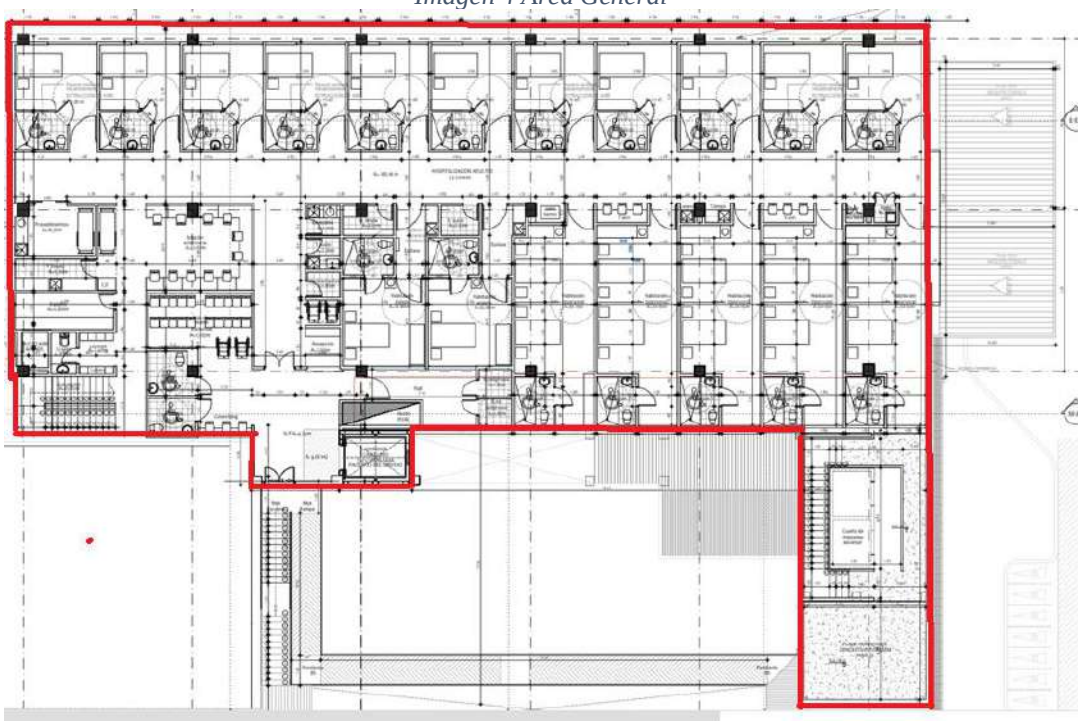


Fuente: Plano Arquitectónico 000 GENERAL_FASE

El proyecto integral se desarrolla en tres (3) etapas. El presente informe corresponde a la etapa 1, la cual contempla la construcción de un tercer nivel destinado a la prestación del servicio de hospitalización de adultos. Esta etapa consiste en la ejecución de un área aproximada de 897.40 m², proyectada con un sistema estructural tradicional basado en columnas y vigas de concreto.

La cubierta del tercer nivel será conformada, en su mayor parte, por una estructura metálica con acabado en teja termoacústica; adicionalmente, se dispondrá de un área de cubierta en losa estructural, sobre la cual se instalarán los equipos correspondientes al sistema de ventilación.

A continuación, podemos ver un corte de fachada, el cual nos permite observar gráficamente la perspectiva de como quedaría la construcción del tercer nivel con vista desde el costado occidental.

Imagen 5 Corte fachada norte

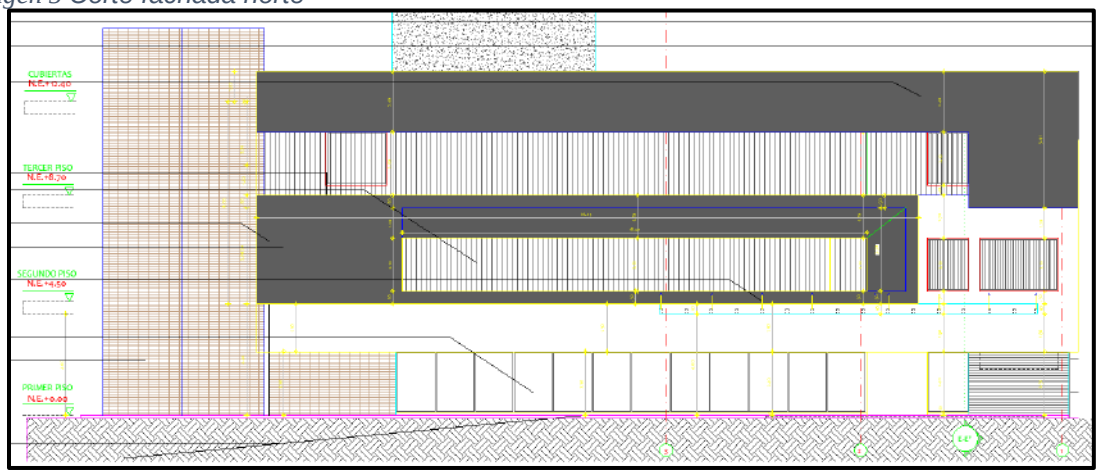

Fuente: Planos Arquitectónicos - FACHADA OCCIDENTE TERCER NIVEL

A continuación, se relaciona información arquitectónica en cuanto al espaciamiento del tercer nivel correspondiente a hospitalización adultos.

3.2 INVENTARIO DEL ESPACIO

En el tercer nivel se tiene la siguiente distribución de espacios cuya destinación corresponde a:

(11) Habitaciones de internación unipersonal con baño.

(5) habitaciones bipersonales con baño.

(2) Habitaciones de paciente aislado con antecámara (filtro) y baño.
(1) Procedimientos.
(1) Estación de enfermería.
(1) Trabajo sucio.
(1) Trabajo Limpio.
(1) Ropa Sucia.
(1) Ropa Limpia.
(1) Deposito de equipos.
(1) Deposito de medicamentos.
(1) Área de aseo.
(1) Lavapatos.
(1) Recepción
(1) Sala de espera
(1) Unidades sanitarias visitantes
(1) Lockers
(1) Unidades sanitarias persona asistencial.
(1) Área de estacionamiento camillas – sillas de ruedas.
(1) Depósito de residuos peligrosos y no peligrosos.
(1) Cuarto técnico.
(1) Circulaciones horizontales.
(1) Rampa.
(1) Escaleras
(1) Escalera de emergencia y ascensores.

Lo anterior hace parte de la construcción del tercer nivel que presta los servicios de hospitalización adulto y que corresponde como parte de una primera etapa a la ampliación e infraestructura de la sala de urgencias de alta complejidad de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." Se basa principalmente en la construcción de un tercer nivel que prestara el servicio de hospitalización adulto, el cual contiene una serie de habitaciones con unidades sanitarias, cuarto técnico, sala de procedimientos, cuartos de aseo y punto de parada en ascensor camero. Seguidamente se construirá una cubierta en estructura metálica y se contará con teja termoacústica, placa transitable para la instalación de equipos de ventilación, accesos y circulaciones en general.

El proyecto contará con red contraincendios RCI, Sistema HVAC, Gases medicinales, entre otros. Los cuales mejoran la calidad del servicio, contando con una amplia infraestructura, con espacios amplios, cómodos y accesibilidad asertiva.

5. AVANCE EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante el presente periodo, se ha venido desarrollando de manera continua la revisión de la información técnica y documental suministrada por el Hospital

Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT), correspondiente a los estudios y diseños del proyecto de construcción del tercer nivel de la Torre de Urgencias – Etapa 1, cuyo alcance contempla la prestación del servicio de hospitalización adulto.

Como resultado de este proceso, se ha realizado un análisis detallado de los diferentes componentes del proyecto con el propósito de verificar la consistencia técnica de los diseños, la compatibilidad entre especialidades, el cumplimiento de la normativa aplicable y la viabilidad constructiva de las soluciones planteadas.

En el desarrollo de esta revisión documental se han identificado diversas observaciones, inquietudes técnicas y requerimientos de información, los cuales han sido expuestos y discutidos en comités técnicos y mesas de trabajo realizadas en obra con el HUSRT, con el fin de aclarar inconsistencias, definir criterios técnicos y dar solución oportuna a los aspectos identificados, evitando posibles afectaciones en la ejecución del proyecto.

Todas estas observaciones han sido debidamente registradas en las respectivas actas, garantizando la trazabilidad de las solicitudes realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De manera general, durante el proceso de revisión se ha evidenciado la ausencia de algunos detalles constructivos en varios componentes del diseño, así como la necesidad de realizar ajustes en los diseños arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas, lo cual requiere su respectiva aclaración y complementación por parte del HUSRT.

Adicionalmente, en el componente arquitectónico se identificaron variaciones en la conformación de algunos espacios, derivadas de la falta de coincidencia entre el sistema estructural proyectado y el diseño arquitectónico original en determinadas áreas. Estas diferencias generan la necesidad de efectuar ajustes específicos en los planos arquitectónicos, los cuales deberán ser debidamente definidos, coordinados y aprobados para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Como resultado de la revisión técnica realizada, se relacionan a continuación las principales observaciones y requerimientos identificados:

1. Planos en formato editable (DWG)

Se evidencia que algunos planos, particularmente los correspondientes a redes eléctricas, fueron suministrados únicamente en formato PDF y sin acotación, lo cual limita el proceso de revisión técnica y la adecuada verificación de los diseños.

No obstante, se informa que los diseños fueron remitidos posteriormente por el HUSRT en los formatos correspondientes para su revisión.

2. Planos arquitectónicos de fachadas

A la fecha del presente informe, el HUSRT ha venido definiendo en mesas técnicas los lineamientos del diseño arquitectónico de fachadas. Sin embargo, se encuentra pendiente la definición de los acabados finales relacionados con elementos tipo Hunter Douglas y la especificación de la paleta de colores.

3. Planos arquitectónicos – replanteamiento y coordinación de espacios

Se recibió un ajuste arquitectónico considerando el área y la ubicación de los fosos destinados al paso de redes verticales correspondientes a HVAC, redes sanitarias, pluviales y red de gases medicinales provenientes del primer y segundo nivel.

Estos ajustes buscan garantizar la correcta coordinación espacial y técnica entre las diferentes redes del proyecto.

4. Planos estructurales del tercer nivel

El HUSRT realizó un comité extraordinario en el cual se determinó no ejecutar la rampa inicialmente contemplada, de acuerdo con la revisión interna del servicio. Así mismo, se decidió no implementar medidas de contingencia asociadas al cierre de espacios.

Esta decisión se fundamenta en la evaluación conjunta de las condiciones del área, la operatividad de los espacios existentes y las posibles contingencias que podrían generarse durante su construcción, concluyéndose que la no ejecución de esta actividad no afecta la funcionalidad ni la operación prevista del servicio proyectado.

En consecuencia, se deja constancia de que la actividad inicialmente contemplada queda sin ejecución por solicitud del HUSRT, con el fin de optimizar el desarrollo del proyecto y evitar intervenciones que, conforme al análisis realizado, no resultan necesarias bajo las condiciones actuales.

Por otra parte, durante la ejecución de obra se realizaron ajustes en elementos estructurales, particularmente en vigas, conforme a las condiciones encontradas en sitio. Dichos ajustes serán incorporados y remitidos en los respectivos planos récord.

5. Red Contra Incendios (RCI) y sistema HVAC

Se realizó la revisión y actualización de los planos definitivos correspondientes al sistema de HVAC (ventilación y extracción) y a la Red Contra Incendios (RCI) del proyecto.

Estos documentos incorporan los ajustes, revisiones y precisiones técnicas efectuadas durante la etapa de coordinación y verificación de diseño, conforme a las especificaciones contractuales, la normatividad vigente aplicable y los requerimientos técnicos del proyecto.

La documentación se remite para su conocimiento y para los fines pertinentes dentro del marco de las competencias de control, seguimiento y supervisión contractual por parte de la interventoría.

6. Diseño de red de gas

Dentro de la documentación suministrada no se evidenció información correspondiente al diseño de la red de gas, pese a que este componente se encuentra contemplado dentro del presupuesto del proyecto.

Por lo anterior, se solicita la remisión de los planos de diseño, memorias de cálculo y especificaciones técnicas correspondientes a este sistema, con el fin de adelantar la respectiva revisión técnica y verificación de cumplimiento normativo.

Se precisa igualmente que la obra objeto del contrato corresponde exclusivamente a la construcción del tercer nivel, cuya ejecución inicia con actividades estructurales, incluyendo la prolongación del acero de refuerzo de columnas previamente dispuesto durante el vaciado de la losa del segundo nivel, actividad ejecutada por el consorcio responsable de las obras correspondientes a los niveles primero y segundo.

En razón a que la intervención se desarrolla sobre una estructura existente, la Interventoría deja expresa constancia de que dentro del alcance contractual no fueron suministrados por parte del HUSRT estudios de suelos ni levantamientos topográficos. En consecuencia, cualquier ajuste, verificación adicional o condición técnica derivada de la ausencia de dicha información no hace parte de las obligaciones contractuales inicialmente establecidas para el Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades técnicas exigibles conforme a la normativa vigente.

Así las cosas, surge la necesidad de realizar un balance de cantidades próximas a ejecutar y la eventual inclusión de ítems no previstos en la concepción inicial del proyecto, conforme a las definiciones técnicas que adopte el HUSRT.

En virtud de lo anterior, esta Interventoría solicita respetuosamente la entrega oportuna de las aclaraciones, ajustes y complementaciones requeridas, con el fin de continuar con la revisión técnica, garantizar la adecuada coordinación entre especialidades y dar continuidad a la ejecución contractual en condiciones técnicas, administrativas y normativas adecuadas, evitando retrasos que no sean atribuibles al Contratista.

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Dentro del alcance del contrato se determinó con el objeto*: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."* Dentro del contrato se incluye, además, la gestión social y ambiental, de conformidad con los estudios y diseños de la normatividad vigente.

A continuación, se describen los aspectos básicos contractuales para la ejecución de este proyecto de construcción:

Tabla 1 Información del contrato

Contrato Obra No.	665 DE 2025
Objeto del Contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
Localización de la Obra:	TUNJA
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Plazo de ejecución:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de iniciación:	15 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación inicial	29 DE ABRIL DE 2026
Prorroga No. 1	27 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación Final	31 DE AGOSTO DE 2026
Valor del Contrato original:	SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 6.747.955.961.54 M/CTE).

Contrato Obra No.	665 DE 2025
Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No.	M-100287952 ANEXO 2
Riesgos Amparados	
* Cumplimiento del contrato	$ 674.795.596.15 M/CTE
* Buen manejo de Anticipo	$ 1.349.591.192.31 M/CTE
* Prestaciones sociales	$ 674.795.596.15 M/CTE
* Calidad de los elementos	$ 1.349.591.192.31 M/CTE
* Estabilidad de la obra	$ 1.349.591.192.31 M/CTE
Póliza Responsabilidad Civil No.	M-100287952 - $ 700.362.000.00 M/CTE
Amparos 1. Predios, labores y operaciones 2. Patronal 3. Contratistas y subcontratistas. 4. Vehículos propios y no propios.	

Fuente: Información del contrato de obra.

6.1 GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Dentro de las garantías contempladas en el contrato *"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."* Se dan a conocer las pólizas expedidas por la aseguradora "COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS", donde se emiten dos (2) pólizas, la primera es una póliza de cumplimiento y la segunda, una póliza de responsabilidad civil extracontractual, las cuales se dan a conocer a continuación:

Tabla 2 Pólizas vigentes contratista

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA													
No. PÓLIZA	M-100287952	ANEXO No.	2	ASEGURADORA			SEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑÍA SIEMPRE			FECHA APROB.DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
											21	01	2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				d	m	aaaa	d	m	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				15	01	2026	30	10	2026	$ 674.795.596.15			

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA													
No. PÓLIZA	M-100287952	ANEXO No.	2	ASEGURADORA			SEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑÍA SIEMPRE			FECHA APROB.DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
											21	01	2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				d	m	aaaa	d	m	aaaa				
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				15	01	2026	30	04	2026	$ 1.349.591.192.31			
PRESTACIONES SOCIALES				15	01	2026	30	04	2029	$ 674.795.596.15			
CALIDAD DE LA OBRA				15	01	2026	30	10	2026	$ 1.349.591.192.31			
ESTABILIDAD DE LA OBRA				30	04	2026	30	04	2031	$ 1.349.591.192.31			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				15	01	2026	30	04	2026	$ 700.362.000.00			

Fuente: Información contractual contratista de obra

El presente documento hace parte del proceso contractual de la obra de orden administrativo, el cual es importante puesto que es el seguro donde permite cubrir los perjuicios ocasionados a la entidad contratante y se protege al contratista de obra. El soporte respectivo se encuentra en el anexo No. 2 Pólizas contractuales.

6.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL

El número del contrato asignado es el 665 de 2025, con un valor de contrato de Seis mil setecientos cuarenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y un pesos con cincuenta y cuatro centavos

Tabla 3 Presupuesto general

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1,00	PRELIMINARES	$68.421.675,17
2,00	CIMENTACION Y DESAGUES	$2.347.054,58
3,00	ESTRUCTURA	$ 857.769.422,01
4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$150.033.190,36
5,00	RED CONTRAINCENDIOS	$ 384.042.809,31
6,00	RED DE GAS	$3.778.952,46
7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 880.352.349,11
8,00	AUTOMATIZACION	$239.083.445,64
9,00	MAMPOSTERIA	$247.214.198,51
10,00	PAÑETES	$201.615.993,17
11,00	PISOS	$328.699.207,63
12,00	URBANISMO	$542.070,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
13,00	ENCHAPES	$59.805.225,75
14,00	CUBIERTA	$484.226.028,41
15,00	CARPINTERIA DE MADERA	$239.486.516,07
16,00	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	$ 249.038.601,29
17,00	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y PVC	$174.621.247,52
18,00	CARPINTERIA METALICA	$682.596.767,56
19,00	ESTUCO Y PINTURA	$226.863.084,69
20,00	CERRADURAS VIDRIOS Y ESPEJOS	$45.240.539,74
21,00	APARATOS SANITARIOS	$226.290.255,41
22,00	VARIOS	$173.463.451,70
23,00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA Y VENTILACION MECANICA	$ 263.090.933,06
24,00	RED DE GASES MEDICINALES	$ 371.033.004,19
25.00	INSTALACION DE EQUIPOS	$177.792.238,00
	SUBTOTAL	$ 5.182.652.508.85
	AIU	$ 1.554.795.752.69
	RETIE + RETILAP	$10.507.700.00
	TOTAL	**$ 6.747.955.961.54**

Fuente: Información contractual contratista de obra

6.3 SEGUIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS

En el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo evaluado, la Interventoría realizó el seguimiento técnico a la ejecución del contrato, evidenciando la necesidad de incluir y consolidar algunos ítems no previstos que surgieron durante la ejecución de las obras.

Estos ítems corresponden a actividades que, si bien no se encontraban contempladas inicialmente dentro del alcance contractual ni en el presupuesto original, resultaron necesarias para garantizar la correcta ejecución técnica del proyecto, la funcionalidad de las obras y el cumplimiento de las especificaciones constructivas.

Durante el presente mes, la Interventoría efectuó la revisión, verificación técnica y consolidación de dichos ítems no previstos, evaluando sus cantidades, justificación técnica y pertinencia dentro del desarrollo del proyecto. Como resultado de este

proceso, se procedió a integrar la información correspondiente en los soportes técnicos y administrativos del contrato.

La consolidación realizada en el presente periodo permite contar con un registro organizado y sustentado de los ítems no previstos, con el fin de facilitar su análisis, control y eventual trámite administrativo previo a su ejecución en obra, conforme a los procedimientos establecidos en el contrato y la normatividad aplicable.

6.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo transcurrido entre 01 al 28 de febrero de 2026, se evidencia registro de actividades relacionadas dentro del presupuesto de obra, las cuales, se ejecutan en tercer nivel donde se adelantó las siguientes actividades:

- **AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL, PLACA TRANSITABLE Y FUNDIDA DE CONCRETO.**

Se ejecutaron las actividades correspondientes al corte, figurado, armado y amarre del acero de refuerzo para los elementos estructurales del proyecto, tales como columnas, vigas, viga canal y placa transitable, conforme a lo indicado en los planos estructurales, memorias y especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad comprende el replanteo y verificación de niveles, suministro, fabricación, montaje y retiro de formaleta; corte, figurado, instalación y amarre del acero de refuerzo según diseño estructural; así como el suministro, transporte, colocación y fundida de concreto estructural de la resistencia especificada para vigas, losa maciza y viga canal.

Incluye vibrado mecánico para adecuada compactación, control de alineación, nivelación y pendientes (en el caso de la viga canal), acabado superficial según requerimientos de uso, curado del concreto conforme a la norma aplicable y desencofrado en los tiempos técnicamente establecidos.

Asimismo, contempla la reparación de posibles imperfecciones, limpieza del área intervenida, disposición de residuos y cumplimiento de las normas técnicas, estructurales y de seguridad industrial vigentes.

Imagen 6. Amarre de aceros



Imagen 7. Tercer nivel – Fundida de placa.



Fuente: Elaboración Propia


- **AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL, ENTRE OTROS.**

Esta actividad comprende la ejecución integral de los elementos estructurales verticales, específicamente columnas, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto. Inicia con el corte, doblado, armado y amarre del acero de refuerzo, conforme a los diámetros, separaciones, traslapos y longitudes de anclaje definidos en diseño, garantizando la correcta ubicación de barras longitudinales, estribos y refuerzos especiales.

Imagen 8. Amarre de Acero



Imagen 9. Encofrado y fundida de concreto

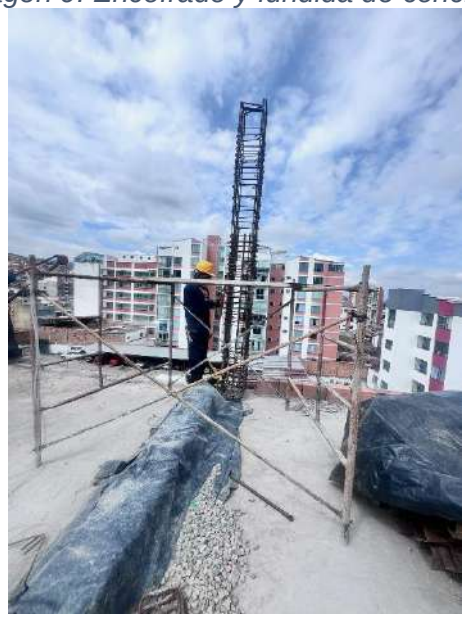

Fuente: Elaboración Propia

- **PERFORACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y PLUVIAL**

Ejecución de perforaciones en elementos constructivos existentes (placa), necesarias para el paso de tubería correspondiente a los sistemas sanitario y pluvial, de acuerdo con los planos hidrosanitarios y especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad comprende el replanteo y localización de puntos de perforación, perforación mecánica con equipo adecuado según diámetro requerido, suministro e instalación de tubería sanitaria y pluvial del material y diámetro especificado, incluyendo accesorios, uniones, sellos, anclajes y soportes.

Incluye alineación, nivelación y fijación de la tubería, realización de pruebas de hermeticidad y funcionamiento, resane y sellado de los puntos intervenidos, limpieza del área de trabajo y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad industrial vigentes.

Imagen 10. Amarre de Acero



Imagen 11. Encofrado y fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA**

Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica destinada a soportar el sistema de cubierta, ejecutada conforme a los planos estructurales, memorias de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad comprende el suministro de perfiles estructurales (cerchas, vigas, correas, columnas y elementos de arriostramiento), platinas, pernos de anclaje y elementos de fijación; corte, armado y soldadura en taller; aplicación de protección anticorrosiva (imprimante y/o pintura según especificación); transporte al sitio de obra; izaje, montaje, alineación, nivelación y fijación definitiva.

Incluye la verificación de aplome y escuadría, ejecución de uniones soldadas y/o empernadas según diseño, instalación de anclajes a la estructura existente, retoques de pintura en puntos intervenidos, limpieza del área de trabajo y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad industrial vigentes.

Imagen 12. Instalación de perfilería metálica


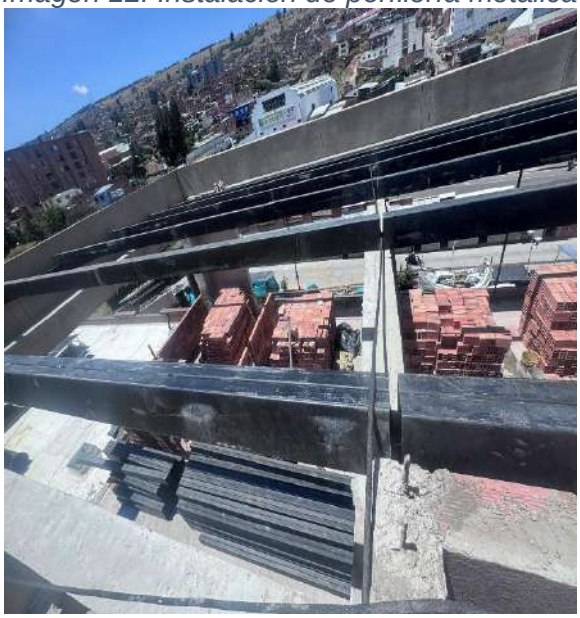


Imagen 13. Instalación de perfilería metálica

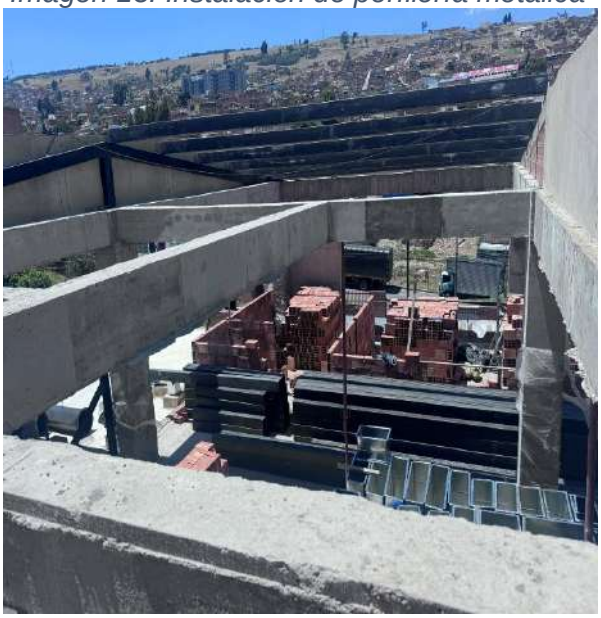

Fuente: Elaboración Propia

- **MAMPOSTERÍA, COLUMNETAS, VIGUETAS Y PAÑETES**

Ejecución de muros en mampostería estructural y/o no estructural, construcción de elementos de confinamiento (columnetas y viguetas de amarre) y aplicación de pañetes, de conformidad con los planos arquitectónicos y estructurales, así como con las especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad comprende el suministro y colocación de unidades de mampostería (bloque o ladrillo según especificación), preparación y aplicación de mortero de pega en proporción definida, replanteo, alineación, nivelación y plomeo de muros. Incluye la construcción de columnetas y viguetas en concreto reforzado, con instalación de acero de refuerzo, formaleta, fundida, vibrado y curado del concreto.


Asimismo, contempla la preparación de superficies, ejecución de pañetes interiores y/o exteriores con mortero cemento-arena en espesores especificados, afinado, nivelado y acabado final conforme a los requerimientos del proyecto.

Incluye limpieza del área de trabajo, retiro de escombros y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad industrial vigentes.

Imagen 14. Mampostería



Imagen 15. Mampostería y elementos estructurales

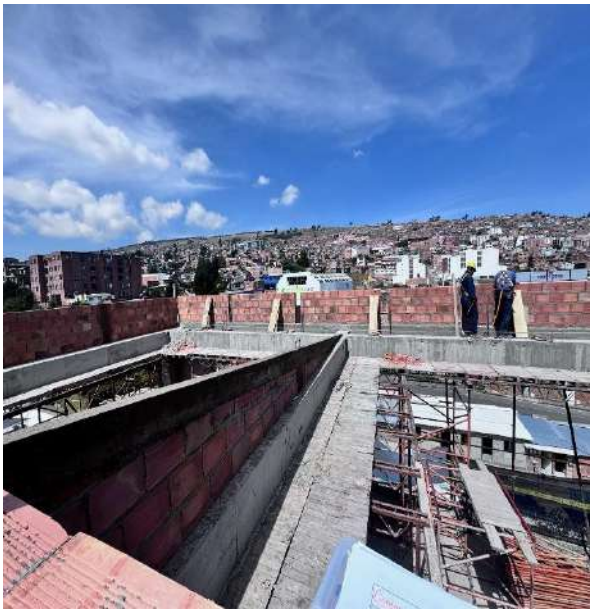

Fuente: Elaboración Propia

El registro fotográfico general de las actividades realizadas el presente mes, se encuentran en el anexo 6.

7. AVANCE DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

7.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

En el presente mes de febrero 2026, el contratista de obra presenta programación de obra ajustada, siguiendo con las indicaciones emitidas por el HUSRT y fecha de terminación real del contrato; a partir del presente informe se registrará los diferentes datos de programación, ejecución y flujo de caja de acuerdo con la versión final.

A continuación, se consolida las siguientes actividades programadas acumuladas con respecto al flujo de inversión de la siguiente manera:

Tabla 4 Actividades programadas a la fecha

Nombre de tarea	Costo	% completado
Proyecto1	**$ 6.737.448.261,56**	**8%**

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

Nombre de tarea	Costo	% completado
EJECUTAR PRELIMINARES	**$ 68.421.675,19**	**100%**
RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M	$ 4.272.526,70	100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	$ 10.572.431,09	100%
DEMOLICION MUROS LADRILLO E= 0.15 MTS	$ 1.085.067,76	100%
DESMONTE VIDRIO	$ 23.532,11	100%
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	$ 424.787,34	100%
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	$ 472.580,15	100%
ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	$ 127.263,27	100%
DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	$ 1.088.201,82	100%
SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES LATERALES DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPAS DE SUPERBOARD	$ 15.735.403,84	100%
CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA	$ 17.961.652,18	100%
MURO DE AISLAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA, INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO CON FRESCASA	$ 16.658.228,93	100%
CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y DESAGUES	**$ 2.347.054,58**	**100%**
CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	$ 2.347.054,58	100%
CONSTRUIR ESTRUCTURA	**$ 857.769.422,00**	**68%**
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPA (3500 PSI) E= 0.10 MTS	$ 24.499.826,43	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA 3000 PSI	$ 108.411.235,50	25%
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	$ 249.496.096,90	69%
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPA	$ 8.878.692,03	69%
SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	$ 2.595.362,33	100%
SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM	$ 9.448.585,24	71%
COLUMNAS EN CONCRETO 31 MPA (4500 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA MADERA	$ 181.130.539,82	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON EN LONA	$ 17.324.848,32	100%
ESCALERA EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI)	$ 6.677.073,74	30%
CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	$ 185.988.592,87	100%
CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) PLACA DE ENTREPISO	$ 19.887.706,44	100%
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 28MPa - (4000 PSI)	$ 43.430.862,38	100%
EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**$ 150.033.190,39**	**51%**
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMETARIOS PARA SU CONEXIÓN	$ 668.578,48	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	$ 1.713.212,18	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	$ 270.821,62	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	$ 1.031.935,01	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	$ 312.172,95	94%

Nombre de tarea	Costo	% completado
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE	$ 261.343,41	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO	$ 515.162,52	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"	$ 180.136,14	100%
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	$ 14.174.897,22	81%
PUNTO HIDRAULICO 3/4"	$ 933.291,29	43%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC - P ½" RDE 9	$ 3.549.058,19	22%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11	$ 2.981.080,32	20%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	$ 2.233.214,24	20%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	$ 4.160.537,75	33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	$ 4.299.434,79	25%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	$ 8.281.969,25	20%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3".	$ 3.088.555,47	21%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	$ 1.236.461,85	19%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	$ 2.979.407,73	42%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	$ 9.152.052,00	50%
INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	$ 106.744,30	100%
TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	$ 7.177.334,35	100%
TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	$ 17.277.986,38	100%
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	$ 1.390.873,89	100%
SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	$ 2.421.102,06	100%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	$ 9.559.596,80	100%
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	$ 5.259.829,58	100%
REVENTILACION PVC 3"	$ 6.466.356,61	100%
SALIDA SANITARIA PVC 3"	$ 3.728.865,19	100%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	$ 7.579.940,93	98%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	$ 9.968.804,59	88%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 6``	$ 2.421.102,06	92%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4``	$ 777.410,40	82%
CONSTRUIR MAMPOSTERIA	**$ 247.214.198,53**	**1%**
MURO EN BLOQUE Nº5 E=0.12 MTS	$ 134.700.302,07	4%
INSTALAR CUBIERTA	**$ 484.226.028,41**	**22%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	$ 76.876.477,30	22%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8MM	$ 4.374.588,66	43%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	$ 7.277.841,17	53%
ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	$ 37.543.106,33	33%

Fuente: Programación de obra Project.

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Por otra parte, a continuación, se hace relación de las actividades ejecutadas en el mes de febrero 2026:

Tabla 5 Actividades ejecutadas contractuales

No.	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR
1,03	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	$ 16.462,87	8,10	$ 133.349
3,02	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI).	Metro Cúbico	$ 1.143.940,44	1,19	$ 1.361.289
3,03	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	$ 7.675,05	1.350,95	$ 10.368.609
3,1	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	Metro Cúbico	$ 1.455.868,00	25,47	$ 37.080.958
3,12	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 28 MPa - (4000 PSI)	Metro Cúbico	$ 1.470.438,19	2,63	$ 3.867.252
4,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Metro lineal	$ 142.207,99	49,00	$ 6.968.192
4,26	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	$ 82.624,00	33,00	$ 2.726.592
4,27	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Unidad	$ 161.840,91	11,00	$ 1.780.250
9,01	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	$ 71.370,94	99,18	$ 7.078.570
10,07	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	Metro Cuadrado	$ 38.457,87	147,59	$ 5.675.997
18,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	$ 24.067,10	7.171,53	$ 172.597.930
			COSTOS DIRECTOS		**$ 249.638.987,61**
			Administración 24,9%		**$ 62.160.107,92**

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

No.	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR
				imprevistos 0,1%	**$ 249.638,99**
				Utilidad 5%	**$ 12.481.949,38**
				A.I.U. 30 %	**$ 74.891.696,29**
				COSTO TOTAL	**$ 324.530.683,90**

Fuente: Ejecutado mes de febrero 2026

Para el presente informe de interventoría, se registran los siguientes porcentajes de avance, los cuales corresponden a la ejecución de obra realizada por el contratista de obra, de acuerdo con las actividades desarrolladas y verificadas durante el periodo reportado.

% Avance Financiero Programado	8,00%
% Avance Físico Programado	8,10%
% Avance Físico Ejecutado	12,05%
% Avance Financiera	10,00%
% Tiempo	19,65%

Durante el periodo objeto del presente informe se evidencian porcentajes favorables en la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra. No obstante, es preciso señalar que mediante Prórroga No. 1 de fecha 27/01/2026 se realizó la ampliación del plazo contractual, situación que conllevó a la actualización y ajuste de la programación de obra por parte del contratista, con el fin de articular la ejecución de las actividades con el nuevo horizonte temporal del contrato.

Por otra parte, se han presentado algunas observaciones e inquietudes relacionadas con los diseños del proyecto; sin embargo, estas han sido objeto de revisión y aclaración en el marco de los comités técnicos de obra y mesas de trabajo adelantadas durante el periodo de seguimiento.

Así mismo, la interventoría ha realizado el acompañamiento a las gestiones de coordinación técnica entre el contratista de obra y el contratista responsable de la ejecución de la Torre de Urgencias, con el propósito de programar y garantizar la correcta ejecución de las conexiones sanitarias bajo placa correspondientes al área de hospitalización de adultos, asegurando la adecuada articulación constructiva entre los frentes de obra.

Por otra parte, el contratista de obra remitió oficio mediante el cual solicita el ajuste a los porcentajes de dedicación del personal asignado al proyecto, en consideración a la ampliación del plazo contractual. Dicha solicitud fue revisada por la interventoría, verificando su concordancia con las condiciones actuales del contrato, por lo cual se emite concepto de aprobación, esto en concordancia con el tramite que adelanto esta

interventoría con la supervisión del HUSRT con el fin de actualizar el porcentaje de dedicación del personal de interventoría.

7.2. AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO A LA FECHA

Las cantidades ejecutadas contractuales, se observó una programación de actividades para el mes de febrero de 8% con respecto a uno ejecutado del 9.53% esto a nivel financiero., a la fecha del presente informe se encuentra Conrado el 3.71%.

Tabla 6. Avance de obra ejecutada a la fecha

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR CONTRATO	$ 6.747.955.961,54	100%
TOTAL EJECUTADO	$ 250.060.231,66	3.71%
Pago Autorizado No. 1	-	-
SALDO	**$ 6.497.895.729,88**	**96.29%**

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que el plazo contractual de obra fue ampliado hasta el 31 de agosto del presente año, se espera que el contratista mantenga el número de cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar la continuidad en los porcentajes de avance de obra y el cumplimiento de la entrega final dentro del plazo establecido.

Tabla 7 Avance General en tiempo de obra en porcentaje

CONCEPTO	DÍAS	PORCENTAJE
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	229	100%
TIEMPO EJECUTADO	45	19,65%
TIEMPO POR EJECUTAR	184	80,35%

Fuente: Elaboración Propia

7.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Para el presente periodo de reporte, el seguimiento al programa de inversiones presenta un resultado favorable. Lo anterior, considerando la ampliación del plazo contractual contemplada en la Prórroga No. 1, la cual conllevó a la actualización de

la programación por parte del contratista, ajustando la planificación de las actividades conforme al nuevo horizonte de ejecución del contrato.

En este sentido, el contratista realizó la reprogramación de los recursos asociados a la obra, incluyendo la organización de cuadrillas, suministro de materiales y asignación de personal, de manera coherente con los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades contractuales.

Tabla 8. Seguimiento al contrato

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
FEBRERO	$ 539.836.476,92	$ 643.027.851,89	CUMPLE

**Programado, el valor asignado se hace referencia a las actividades programadas acumuladas y ejecutado acumulado a nivel presupuestal la misma manera. Se debe tener en cuenta posibles ajustes y/o variaciones debido a la inclusión de actividades no previstas.*

Fuente: Elaboración propia

El avance físico de obra correspondiente al mes de febrero alcanza un 12,05 %, resultado de la ejecución de actividades asociadas principalmente a trabajos preliminares, adecuaciones del área de intervención y desarrollo de actividades constructivas iniciales conforme a la programación establecida. Este porcentaje refleja el progreso real de las labores ejecutadas en obra durante el periodo evaluado, de acuerdo con las mediciones y verificaciones realizadas en campo.

El equipo de trabajo ha orientado sus esfuerzos a garantizar la entrega del proyecto en condiciones funcionales y operativas, priorizando la continuidad de la ejecución y la mitigación de posibles atrasos en obra. En este sentido, se ha realizado una revisión detallada de las estrategias constructivas y de coordinación necesarias para el adecuado manejo de las actividades.

Durante el avance de la obra y la revisión de las actividades programadas para su ejecución, se han identificado inquietudes técnicas relacionadas con los estudios y diseños preliminares suministrados. En particular, se ha evidenciado la insuficiencia de detalles técnicos y la existencia de incongruencias entre la información representada en planta y aquella contenida en los detalles constructivos, lo cual ha generado incertidumbre en la correcta interpretación y ejecución de los espacios proyectados.

Ante esta situación, ha sido necesario solicitar y desarrollar mesas técnicas, con el acompañamiento de la Supervisión, con el propósito de definir criterios claros de ejecución, especialmente en lo referente a la prevalencia entre la guía arquitectónica

general y los detalles específicos. Estas circunstancias han requerido, en algunos casos, la formalización de las observaciones en comités de obra, mesas técnicas y en el presente informe mensual de interventoría, con el fin de dejar constancia del avance real del proyecto, las decisiones adoptadas y las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de la obra.

8. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Dentro del alcance del contrato cuyo objeto es la: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA* El número del contrato asignado es el 664 de 2025, con un valor de contrato de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLOSNES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($ 362.790.737.94 M/CTE).

8.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen los aspectos básicos contractuales para la ejecución del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Contrato No.	664 DE 2025
Objeto del Contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
Localización:	MUNICIPIO DE TUNJA
Contratista:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN.
Plazo de ejecución:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de iniciación:	15 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación original (Etapa de Construcción):	29 DE ABRIL DE 2026
Prorroga No. 1	27 DE FEBRERO 2026
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2026

Valor del Contrato original:	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLOSNES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($ 362.790.737.94 M/CTE).
Compañía Aseguradora:	Seguros Mundial
Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No.	M-100287237
Riesgos Amparados	* CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO * PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES * CALIDAD DEL SERVICIO
* Anticipo	$ 0.00 M/CTE
*Cumplimiento del contrato	$ 36.279.073,79 M/CTE
* Pagos salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 36.279.073,79 M/CTE
* Calidad del servicio	$ 72.558.147.59 M/CTE
Póliza Responsabilidad Civil No.	M-100075084 ANEXO 2
* Calidad del servicio	$ 350.181.000,00 M/CTE
Se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes de terceros y o lesiones a personas que se puedan causar en la ejecución del contrato No. 664 de 2025 cuyo objeto es: "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*	

Fuente: Información contractual interventoría

8.2. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Dentro de las garantías contempladas en el contrato de interventoría "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Se dan a conocer las pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, donde se emiten dos (2) pólizas, la primera es una póliza de cumplimiento y la segunda, una póliza de responsabilidad civil, las cuales se dan a conocer a continuación:

Tabla 9 Pólizas vigentes interventoría

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORIA											
N° PÓLIZA	**M-100287237**	**ANEXO N°**	**2**	**ASEGURADORA**		**SEGUROS MUNDIAL**		**FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN**	**DD**	**MM**	**AA**
									28	**01**	**2026**
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				**VIG. DESDE**			**VIG. HASTA**			**SUMA ASEGURADA**	
				DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				15	01	2026	30	10	2026	$ 36.279.073.79	
PAGO DE SALARIOS				15	01	2026	30	04	2029	$ 36.279.073.79	
CALIDAD DEL SERVICIO				15	01	2026	30	04	2031	$ 72.558.147,59	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL				15	01	2026	29	04	2026	$ 250.181.000,00	

Fuente: Información contractual interventoría

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

9.1. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA

El contratista una vez suscribe acta de inicio, realiza la planeación y gestión administrativa para la solicitud del anticipo con el objetivo de tener flujo de caja para dar apertura a la ejecución de obras.

Mediante oficio del 23/01/2026 el contratista, envía la documentación requerida para el desembolso del anticipo del contrato, la cual consta de: Cuenta de cobro, Acta de inicio firmada, Certificación Bancaria Fiducia, Plan de inversión de anticipo, certificación pago seguridad social y aportes legales, Contrato Fiduciaria para el manejo del anticipo.

Por parte de interventoría se evalúa información y en esta misma fecha se remite información con visto bueno a la supervisión a fin de continuar con el trámite. Este se encuentra por un valor de $ 1.349.591.192.32.

Para el presente mes el control financiero de obra se encuentra de la siguiente manera:

CONTROL FINANCIERO DE OBRA					
VALOR DEL CONTRATO				$ 6.747.955.961,54	
ANTICIPO 20%				$ 1.349.591.192,31	
No. De acta	**FECHA**	**VALOR EJECUTADO**	**AMORTIZACIÓN 20%**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
1	12/02/2026	$ 318.497.167,99	$ 63.699.433,60	$ 1.285.891.758,71	$ 6.429.458.793,55

CONTROL FINANCIERO DE OBRA					
VALOR DEL CONTRATO				$ 6.747.955.961,54	
ANTICIPO 20%				$ 1.349.591.192,31	
No. De acta	**FECHA**	**VALOR EJECUTADO**	**AMORTIZACIÓN 20%**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
SUBTOTAL		**$ 318.497.167,99**	**$ 63.699.433,60**	**$ 1.285.891.758,71**	**$ 6.429.458.793,55**

9.2. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante el presente periodo, el equipo técnico de Interventoría ha venido desarrollando de manera continua la revisión de la información técnica y documental suministrada por el HUSRT. En el marco de este proceso, se realiza el análisis permanente de los diferentes componentes del proyecto con el propósito de verificar su consistencia técnica, la compatibilidad entre las diferentes especialidades y la viabilidad constructiva de las soluciones planteadas.

Como resultado de esta revisión, se han identificado diversas observaciones, inquietudes técnicas y requerimientos de información, los cuales han sido expuestos y analizados en comités técnicos y mesas de trabajo realizadas en obra, con el fin de aclarar inconsistencias, definir criterios técnicos y dar respuesta oportuna a los requerimientos surgidos durante el proceso de revisión de la documentación. Todas estas observaciones han sido debidamente registradas en las respectivas actas de reunión, garantizando la trazabilidad de las solicitudes realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De manera general, durante la revisión de la documentación se ha evidenciado la ausencia de algunos detalles constructivos en los planos, así como la necesidad de realizar ajustes en los diseños arquitectónicos y estructurales. Estos aspectos han sido consignados tanto en las actas correspondientes como en el presente informe.

En ese sentido, el equipo técnico mantiene la revisión permanente de los diferentes componentes del proyecto, generando inquietudes que son comunicadas oportunamente a la supervisión con el fin de obtener definiciones técnicas de manera ágil y evitar posibles afectaciones en la ejecución de la obra.

De esta manera, el equipo técnico continúa avanzando conjuntamente con los asesores especialistas en la revisión y análisis de la información disponible, con el propósito de realizar los ajustes pertinentes y permitir la continuidad del proceso constructivo. En consecuencia, se solicita respetuosamente la aclaración,

complementación y entrega de la información técnica requerida, con el fin de continuar con el proceso de ajuste, coordinación y validación de los diseños.

Durante el proceso de revisión técnica también se evidenciaron las siguientes situaciones a nivel general como:

- Falta de información en formato editable y debidamente acotado, particularmente en planos de redes eléctricas.

- Ausencia o insuficiencia de planos arquitectónicos actualizados, especialmente en lo relacionado con fachadas y la integración del nuevo nivel con la estructura existente.

- Inconsistencias en la coordinación entre los componentes arquitectónico y estructural, derivadas de la indefinición de algunos elementos proyectados desde los niveles inferiores.

- Posibles incompatibilidades técnicas entre sistemas diseñados y sistemas que ya se encuentran ejecutados en la infraestructura existente.

Finalmente, se precisa que el alcance de la obra objeto del contrato corresponde exclusivamente a la construcción del tercer nivel, cuya ejecución inicia con actividades estructurales, incluyendo la prolongación del acero de refuerzo de las columnas previamente dispuesto durante el vaciado de la losa del segundo nivel, actividad que fue ejecutada por el consorcio responsable de la construcción de los niveles primero y segundo.

9.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA

En el presente periodo se solicitó información al contratista y a la entidad contratante mediante oficios relacionados a continuación:

Tabla 10 Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
IH-004	9/02/2026	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Supervisor del Contrato	Remisión informe enero 2026 con anexos	Revisión y entrega de Documentos
IH-004	17/02/2026	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	Remisión de informe ajustado de acuerdo a observaciones	Revisión y entrega de Documentos

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
		DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Supervisor del Contrato	compartidas por la supervisión.	

Fuente: Elaboración Propia

Soportes que están relacionados en el anexo No. 5 Correspondencia enviada.

9.4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

En el presente período se recibió la siguiente información por parte del contratista de obra:

Tabla 11 Correspondencia recibida mes noviembre por parte del contratista de obra.

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
Correo Electrónico	6/02/2026	Consorcio Infraestructura ACH	Remision informe mensual de obra 01	Revisión y entrega de Documentos

Fuente: Elaboración Propia

En el presente periodo se recibió la siguiente correspondencia por parte de la supervisión:

CONSECUTIVO	FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
Correo Electrónico	9/02/2026	Consorcio Interhospitalizacion	Entrega ajuste componente técnico diseños proyecto	Revisión y entrega de Documentos

Soportes que están relacionados en el anexo No. 5 Correspondencia.

9.5. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

En el mes de febrero de 2026 se realizaron dos (2) comités técnicos y dos (2) mesas técnicas, en los cuales se atendieron y resolvieron inquietudes de carácter técnico y administrativo relacionadas con el desarrollo del proyecto.

Durante las sesiones se presentó el avance físico de obra y el estado de revisión y ajuste de los diseños, detallando actividades ejecutadas, porcentajes de

cumplimiento y aspectos pendientes por definir. Asimismo, se analizaron temas críticos, requerimientos de información faltante y consideraciones técnicas necesarias para la correcta continuidad de los trabajos.

Por su parte, el HUSRT, a través de la Gerencia, la Supervisión y el equipo de apoyo, emitió lineamientos y definiciones frente a las observaciones e inquietudes planteadas, dejando claridad sobre los criterios técnicos y las acciones a seguir.

A continuación, se hace la descripción de los temas tratados es el presente mes de la siguiente manera:

COMITÉ, MESAS TÉCNICAS Y RECORRIDOS DE OBRA

2. MESA TÉCNICA

FECHA: 02/02/2026

Se realiza mesa técnica donde se tratan los siguientes temas:

- El Ing. Germán Rodríguez menciona que en fachada occidental muestra el 2do nivel los muros en superboard.
- El Arq. Cristian Gómez solicita que antepechos costado occidental sean de H=1.00 mts, material en bloque. En este espacio realizar drenaje para la evacuación de aguas.
- El arq. Solicita que la altura de cielo raso sea de 2.60 mts.
- Fachada norte: El ing German Rodríguez solicita ajuste a la fachada de acuerdo a lo comentado en comité técnico donde se el costado Nor-oriental el espacio proyectado como aula o descanso médico. Por otra parte, el Arq. Cristian Gómez Consultara la posible ampliación de terraza.
- Fachada oriental: Se solicita ajuste de acuerdo a los cambios efectuados en cuanto a que ya no se construirá rampa.
- Se define en el presente comité: Pisos en granito Blanco Huila. Cuartos de aseo – enchapes. Trabajo limpio: mesa de trabajo con poceta. Trabajo Sucio: Mesa de trabajo con 2 pocetas + vertedero. Procedimientos: Lavamanos + mesón con poceta en acero inoxidable. La puerta en este ultimo espacio debe quedar enfrentada al cuarto de la habitación. El arq. Cristian Gómez menciona que este espacio se amplió y cubre el espacio de camillas.
- Estación de enfermería: El arq. Cristian Gómez solicita que se realice antepecho en mampostería y en este instalar las diferentes redes que se requiere.
- Cuarto de equipos: La jefe Laura R. solicita 10 tomas dobles para repisa y 5 und a nivel bajo para la conexión de equipos.
- Unidades sanitarias: Ducha multifuncional que incluya plato y teléfono en 1 solo punto. Solicita el arq, Cristian Gómez.
    - Sanitario: con fluxómetro de acuerdo a lo indicado por el arq. Cristian Gómez.

- Lavamanos: Para personal con movilidad reducida. En habitaciones solicita que sea con semipedestal y con grifería tradicional.

La jefe Laura Rodríguez solicita que sensor se utilice en trabajo limpio, trabajo sucio, procedimientos y lavapatos.

Lavapatos: Lavamanos normal en acero inoxidable con grifería en cuello de ganzo + vertedero.

El arq. Cristian Gómez y jefe Laura Rodríguez solicitan ajuste en trabajo sucio y lavapatos en el cual unifican el espacio donde quedarían 2 mesones donde: el primero – cuenta con vertedero + Lavamanos circular pequeño + poceta. En el segundo: En el segundo pocetas profundas. Este espacio se requiere asepsia por tal razón solicitan que sea enchapado.

- Filtro: Hacia cuarto de aislados la jefe Laura Rodríguez solicita que en este espacio se instale Lavamanos Enzo.

- Habitaciones bipersonales: La jefe Laura y el arq. Cristian Gómez solicitan que donde va el closet + lavamanos se realiza ajuste donde solicitan dejar solo espacio para closet para instalar 2 muebles de 1.20mts de ancho por H=1.00 mts.

- Llamados de enfermería: La jefe Laura Rodríguez solicita que se instale llamados de enfermería en unidad sanitaria, habitaciones, con punto de control en estación de enfermería. Estos van con código azul.

- Cuarto de residuos peligrosos y no peligrosos: la jefe Laura solicita que en este espacio sea enchapado y se instale punto hidráulico a fin de realizar lavado y sifon para evacuar el agua.

- Red de ventilación: El ing. German menciona que hay puntos de retorno que no fueron tenidos en cuenta. A lo cual el Arq. Cristian Gómez menciona que son puntos donde cuentan con ventilación natural – Ventanas.

- **COMITÉ TÉCNICO DE OBRA**
  FECHA: 11/02/2026

Se realiza comité técnico de obra donde se tratan los siguientes temas:

1. Ajuste arquitectónico: El arq. Cristian Gómez menciona que realizo ajustes a los diseños arquitectónicos y que fueron actualizados el día de ayer. Desde obra e interventoría manifiestan que no se ha revisado debido a que no se había informado de estos ajustes.

El ing. German solicita actualización de cortes de fachada tanto en la oriental teniendo en cuenta que ya no va rampa, ascensor, escalera. El arq. Cristian G. Menciona que dentro de los mismos ajustes se encuentra actualizado.

En el presente comité, El arq. Cristian Gómez Socializa los ajustes realizados, donde el Dr.Pertuz autoriza este ajuste, el cual se mantiene la capacidad instalada.

2. RCI: El ing. German Rodríguez pregunta por este tipo de red como se manejara teniendo en cuenta que el diseño se encuentra nebulizado. El arq. Cristian Gomez menciona que dada las condiciones de obra y teniendo en cuenta la red que se esta construyendo en urgencias nivel 1 y 2 de manera tradicional, solicitan que para el tercer nivel se realice adherencia a este sistema. Por parte del HUSRT autorizan y/o solicitan que se realice el cambio a este sistema.

3. Memorias Eléctricas: El ing. German Rodríguez solicita información de planos en dwg y memorias. A lo cual el Arq. Cristian Gómez menciona que esta información se encuentra en el Drive.

4. Prorroga: El Arq. Cristian Gómez solicita programación de obra ajustada a los tiempos solicitados.

- **COMITÉ TÉCNICO DE OBRA NO. 5**
  FECHA: 18/02/2026

Se realiza comité técnico de obra donde se tratan temas de:

1. El arq. Cristian Gómez solicita que en fachada occidental entre eje A al D dejar ladrillo santa fe y el eje d al F´ estucado y pintado.

2. El arq. Cristian Gómez solicita que en circulación sur dejar una puerta de acceso a placa transitable cerca a habitación unipersonal.

- **MESA TÉCNICA**
  FECHA: 16/02/2026

Se realiza mesa técnica donde el arq. Cristian Gómez solicita información acerca de dudas por parte del contratista con respecto a la planimetría y/o proceso constructivo. La idea es realizar estas mesas técnicas en la medida que se requiera para que no se generen ningún retraso.

En esta mesa técnica se trata acerca de los ajustes en fachada oriental, los cuales el arq. Cristian Gomez indica que se realizaran en los planos record por parte del contratista.

El arq. Cristian Gómez solicita que en circulación que conduce de norte a sur dejar una puerta ventana en el remate del costado sur para poder tener acceso directo a la terraza.

Soportes se encuentran en el anexo 4. Actas generadas


9.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En febrero de 2026, Tunja registró un clima característico de temporada seca, con:

- Las temperaturas suelen oscilar entre mínimas alrededor de 7–9 °C y máximas cerca de 16–18 °C, con una temperatura media mensual aproximada de 12 °C.
- El promedio de humedad relativa está alrededor del 75 %–87 %, lo que contribuye a un ambiente fresco y en ocasiones húmedo.
- Las lluvias: se presentaron días con lluvias ligeras a moderadas y cielos parcialmente nublados, con probabilidad alta de precipitación en varios días de febrero.

A continuación, se presenta un esquema con las temperaturas y precipitaciones a corte del presente informe:

Imagen 16 Evolución de las precipitaciones en Tunja

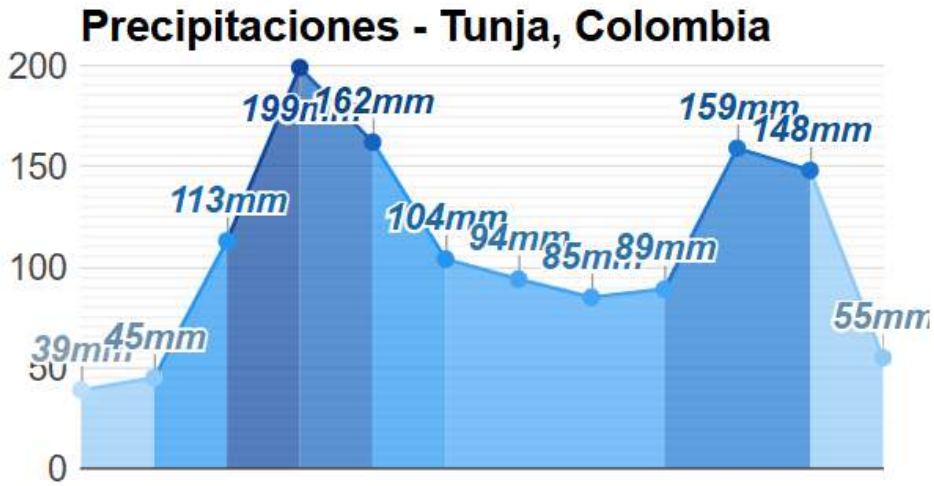

Fuente: Tomada de weather-atlas.com clima en Tunja – Boyacá

Datos climáticos históricos mensuales de Tunja – Climate-Data.org: temperatura media mensual y precipitación por mes.

Estas condiciones son relevantes para la planificación de obra, logística de materiales y seguridad de los trabajadores, especialmente en actividades que pueden verse afectadas por condiciones de humedad o temperatura nocturna.

El clima en la ciudad de Tunja se caracterizó por temperaturas frescas y condiciones parcialmente nubladas, propias de la temporada. Se presentaron precipitaciones intermitentes de baja a moderada intensidad, principalmente en horas de la tarde y la noche; sin embargo, estas no generaron suspensiones prolongadas ni afectaciones significativas en el desarrollo de las actividades programadas en obra. Las labores ejecutadas se realizaron con exposición a variaciones climáticas normales de la región, sin que se registraran interrupciones relevantes durante el periodo evaluado.

10. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con la cláusula tercera en el numeral 1, podemos expresar que el avance de la interventoría es medido de acuerdo con el avance reportado en las actas de recibo parcial de obra, en este caso corresponde al avance que se tiene a la fecha de ejecución del contrato, el cual corresponde al 3.71% sabiéndose que el plazo de ejecución del proyecto cuenta con 3.5 meses de ejecución.

En cuanto al tiempo de ejecución, para el mes de enero cuenta con un tiempo transcurrido de 16.19%.

Tabla 12 Avance interventoría en días

CONCEPTO	DÍAS	PORCENTAJE
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	229	100%
TIEMPO EJECUTADO	45	19,65%
TIEMPO POR EJECUTAR	184	80,35%

Fuente: Elaboración propia

11. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A fecha de corte, para el presente informe se tiene la relación de los siguientes equipos:

Tabla 13 Equipo contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo de computo	2
Impresora	1

Fuente. Elaboración Propia

12. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El personal que se encuentra al frente de las actividades contractuales en el CONSORCIO INTER HOSPITAL 2023, se relacionan a continuación:

Tabla 14 Personal interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Director Interventoría	Clara María Rodas Moreno
Asesor Gases Medicinales	Alejandro Saldarriaga Castrillón
Asesor Eléctrico	Hugo Aguilar Suarez
Asesor Estructural	Catalina Yepes Estrada
Asesor HVAC	Gustavo Alonso Yepes Yepes
Residente de Interventoria	Ricardo Gómez Colorado
SISO	Leidy Johana Muñoz Zapata

Fuente: Información contractual interventoría

13. AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo evaluado, la Interventoría continua con la revisión técnica y documental de la información suministrada por el Hospital Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT), disponible en la plataforma Drive en formatos PDF y DWG de carácter preliminar. Así mismo, se avanzó en la identificación de actividades sobre planos y en la revisión de las cantidades contractuales; no obstante, debido a la magnitud del proyecto y a las inquietudes técnicas que se han generado durante el análisis, dichas actividades no fueron concluidas en el presente mes, encontrándose actualmente en proceso.

De manera paralela, se llevó a cabo el seguimiento a los ajustes y modificaciones solicitadas por Obra e interventoría al personal del HUSRT, derivadas de requerimientos funcionales para la adecuada prestación del servicio de salud. Estas definiciones han incidido en la consolidación del registro de cantidades reales y en la programación de actividades, conforme a lo acordado en las mesas técnicas y comités de obra realizados durante el periodo.

En el componente técnico, la Interventoría realizó la verificación del proceso constructivo, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la cuantificación de las actividades ejecutadas, el seguimiento a la programación de obra y la revisión de la documentación presentada por el Contratista. Adicionalmente, se efectuó control de calidad mediante la toma de muestras para ensayos de laboratorio y la verificación de los materiales empleados, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y ambientales del proyecto.

En el ámbito administrativo, se mantuvo el seguimiento permanente a la documentación contractual, el registro de mesas técnicas y comités de obra, la bitácora de actividades, el control de ingreso de materiales y la revisión de las solicitudes de prórroga de plazo con sus respectivos soportes, informando oportunamente al HUSRT sobre la ausencia o insuficiencia de detalles técnicos en los diseños y planos, con el fin de garantizar la trazabilidad y el adecuado control del proyecto.

El día 27/02/2026, el HUSRT aprobó la adición de tiempo a los contratos de obra e interventoría con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las intervenciones en el área de hospitalización de adultos. Esta extensión responde a la necesidad de ajustar la programación de obra y supervisión, asegurando que las actividades planificadas se desarrollen de manera completa, coordinada y cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad aplicable.

En el marco de seguimiento y control realizado por la interventoría al desarrollo técnico del proyecto, y después de visita técnica efectuada por el especialista

estructural a obra, se evaluaron las condiciones actuales de la estructura proyectada para la cubierta, identificándose la necesidad de implementar algunos ajustes constructivos con el fin de garantizar el adecuado comportamiento estructural del sistema. En este sentido, se aprobó el requerimiento de adicionar vigas aéreas dentro de la configuración de la cubierta, las cuales permitirán mejorar la distribución de cargas y optimizar los apoyos estructurales. De igual manera, se determinó la necesidad de incorporar culatas en estructura metálica sobre los ejes transversales, con el propósito de reforzar la estabilidad del conjunto estructural y asegurar la rigidez al sistema. Así mismo, se indicó considerar el aumento de la altura de la viga canal sobre el eje 1, con el fin de prevenir el desborde de las aguas provenientes de la cubierta hacia la canal. Adicionalmente, se planteó el incremento de la sección de la base de dicha viga canal, debido al traslapo de los aceros de los elementos estructurales que la interceptan.

Durante el presente periodo se realizaron dos (2) comités técnicos y dos (2) mesas técnicas de obra para la presentación y seguimiento del proyecto. Estas reuniones incluyeron recorridos de obra, con el fin de verificar en sitio el estado de las actividades ejecutadas, así como revisar y coordinar las actividades programadas para su próxima ejecución.

Imagen 17 Recorrido de obra



Imagen 18 Recorrido de obra



Fuente: Archivo de Interventoría

Durante la ejecución del proyecto, y aun cuando se han registrado ajustes y requerimientos por parte del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT), se considera fundamental continuar con la realización periódica de mesas técnicas y comités de obra, acompañados de recorridos en sitio. Estas instancias permiten exponer y analizar las inquietudes identificadas durante la ejecución, revisar la información contractual disponible y verificar directamente la conformación física y funcional de los espacios proyectados.

Imagen 19 Recorrido de obra



Imagen 20 Comité de obra



Fuente: Archivo de Interventoría

La importancia de estos espacios de coordinación se incrementa teniendo en cuenta que la intervención se desarrolla en el tercer piso de una infraestructura hospitalaria existente, lo cual implica condiciones particulares asociadas a la integración con áreas en funcionamiento, la compatibilidad con redes e instalaciones existentes y la necesidad de mantener la continuidad de la prestación de los servicios de salud. En este contexto, la revisión técnica en sitio facilita la identificación temprana de posibles interferencias constructivas, operativas o funcionales.

De esta manera, las mesas técnicas y comités de obra permiten la toma oportuna de decisiones, orientadas a garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y funcionales del proyecto, así como la definición anticipada de las situaciones que se presentan durante la ejecución. Lo anterior contribuye a minimizar impactos sobre el presupuesto contractual, el cronograma de obra y la operación hospitalaria.

Para el adecuado desarrollo de estas instancias, se recomienda la participación de personal idóneo y conocedor de la operación hospitalaria, de modo que las decisiones adoptadas consideren de manera integral los requerimientos técnicos, normativos y funcionales propios de la infraestructura hospitalaria.

De manera complementaria, la Interventoría adelantó la revisión documental respectiva, las cuales han sido concertadas y escaladas al hospital. Así mismo, se realizó seguimiento en obra a las actividades ejecutadas y se comunicó a la Entidad solicitando información adicional, dejando registro de las definiciones adoptadas en comités de obra, mesas técnicas y recorridos de verificación.

En el presente periodo, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja informó oficialmente la aprobación de la prórroga en tiempo para los contratos asociados al proyecto, tanto para el Contrato de Obra como para el Contrato de Interventoría.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, dicha prórroga extiende el plazo de ejecución de ambos contratos hasta el 31 de agosto de 2026, con el propósito de garantizar la adecuada culminación de las actividades pendientes, la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de los alcances técnicos, administrativos y contractuales establecidos para el proyecto.

La ampliación del plazo permitirá continuar con el desarrollo de las actividades constructivas, de supervisión y seguimiento técnico, asegurando que los procesos se realicen conforme a las especificaciones definidas, así como atender los requerimientos técnicos y operativos que se han identificado durante la ejecución del proyecto. Asimismo, esta medida busca asegurar la adecuada finalización de las intervenciones y la puesta en funcionamiento de los espacios proyectados, en concordancia con las necesidades institucionales.

Por otra parte, el contratista remite un oficio mediante el cual solicita realizar un ajuste en los porcentajes de dedicación del personal del proyecto. Esta solicitud se fundamenta en la ampliación del plazo contractual previamente aprobada, la cual genera la necesidad de reorganizar y optimizar la distribución del tiempo y las responsabilidades del equipo técnico, con el fin de garantizar la adecuada continuidad de las actividades y el cumplimiento de los compromisos contractuales durante el nuevo periodo de ejecución.

En este sentido, la interventoría procede a revisar la solicitud presentada por el contratista, verificando su coherencia con las condiciones del contrato, el alcance de las actividades pendientes y la ampliación en tiempo otorgada. Como resultado de dicho análisis, la interventoría emite concepto favorable y aprueba el ajuste propuesto en los porcentajes de dedicación del personal.

Posteriormente, y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control, la interventoría remite al HUSRT la solicitud de ajuste en la dedicación del personal, considerando lo establecido en el contrato de interventoría y la adición en tiempo aprobada, con el fin de que la entidad tenga conocimiento y se surta el trámite correspondiente dentro del proceso contractual.

Durante el mes de febrero se registraron avances en la ejecución de diferentes actividades constructivas correspondientes a la estructura y redes del proyecto. Entre las labores desarrolladas se destacan la construcción de columnas, vigas de

amarre y viga canal, así como la ejecución de mampostería en los sectores programados. De igual manera, se adelantó la instalación de la estructura metálica, incluyendo la disposición de sus respectivos apoyos conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Adicionalmente, se realizaron actividades relacionadas con la perforación de placa para la instalación de tubería sanitaria, así como la instalación de redes sanitarias bajo placa, incluyendo sus correspondientes ramales y elementos de conexión tipo araña, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Finalmente, desde la Interventoría se espera que el Contratista mantenga el rendimiento y la dinámica de ejecución evidenciada a la fecha, con el fin de dar cumplimiento al cronograma de obra y lograr la entrega del proyecto dentro de los plazos contractuales establecidos.

13.1. SEGUIMIENTO A ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente informe no se registra la calidad de materiales.

- Certificado de calidad cemento de uso general Argos. Fecha 28/02/2026
- Certificado de calidad cemento estructural Argos. Fecha 28/02/2026
- Colconcretos SA. Resistencia de placa transitable, vigas, viga canal. 12/02/2026.

No.	FECHA	f'c	EDAD	FECHA	PESO	DENSIDAD	RESISTENCIA		TIPO	RESISTENCIA	% EDAD DADA
MUESTRA	FUNDIDA	Kg./cm^2	DÍAS	FALLA	g	Kg./m^3	MPa	Kgf/cm^2	Fallas	PROM (Kgf/cm^2)	
121	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	3	2026-02-07	3866	2461	23.9	244	2	239	85
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	3	2026-02-07	3809	2425	23.0	234	2		
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3803	2421	30.0	306	2	302	108
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3789	2412	29.4	299	2		
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3803	2421	29.5	301	6		

Resistencia de los concretos de Placa transitable, vigas, viga canal. Muestras tomadas por el contratista donde falla a 3, 7 y 14 días cumpliendo con la resistencia admisible. Fecha 09/02/2026.

Resultados a 3 días

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			
						kN	lbf	MPa	psi				Tipo de refrendado
1-145205 (1)	3,7	2,0	99,5	1,000	7776	122,156	27462	15,7	2280	56%	T2	2355	Neopreno
2-145205 (1)	3,93	2,0	102,5	1,000	8252	135,459	30452	16,4	2380	59%	T2	2362	Neopreno
3-145205 (1)	3,72	2,1	99,5	1,000	7776	106,205	23876	13,7	1990	49%	T2	2348	Neopreno

Resultados a 7 días

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			
						kN	lbf	MPa	psi				Tipo de refrendado
1-145206 (2)	3,794	2,0	101,5	1,000	8091	173,258	38950	21,4	3100	76%	T4	2313	Neopreno
2-145206 (2)	3,786	2,0	101,0	1,000	8012	169,623	38133	21,2	3070	76%	T4	2309	Neopreno
3-145206 (2)	3,746	2,0	101,0	1,000	8012	167,101	37566	20,9	3030	75%	T4	2295	Neopreno

Resultados a 14 días

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			
						kN	lbf	MPa	psi				Tipo de refrendado
1-145484 (1)	3,806	2,0	101,0	1,000	8012	229,533	51601	28,6	4150	102%	T4	2318	Neopreno
2-145484 (1)	3,788	2,0	100,0	1,000	7854	204,293	45927	26	3770	93%	T5	2368	Neopreno
3-145484 (1)	3,792	2,0	100,0	1,000	7854	224,523	50475	28,6	4150	102%	T2	2363	Neopreno

Por parte de interventoría se presenta:

Número de Muestra	Localización	Porcentaje alcanzado	RESISTENCIA ADMISIBLE	PORCENTAJE ADMISIBLE	RESULTADO 1	RESULTADO 2	PROMEDIO RESULTADO	CONCLUSION 1 MINIMO ADMISIBLE
4	PANTALLA PISO 3	103,1	27,5	88,71%	96,45%	103,23%	103,23%	CUMPLE
3	COLUMNAS Y PANTALLA PISO 3	82,4	27,5	88,71%	94,19%	82,26%	94,19%	CUMPLE

En el anexo No. 9 se encuentra calidad de los materiales.

En el Anexo 1 se presenta el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoría, elaborado en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría. Este informe consolida las actividades de seguimiento, verificación y control realizadas por la interventoría frente a la implementación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del proyecto.

La elaboración de este informe es de especial importancia, ya que permite evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo, así como las acciones implementadas para la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad física del personal que participa en la ejecución de las actividades del contrato. De igual manera, el informe constituye un instrumento de control y trazabilidad que permite identificar condiciones de riesgo, verificar la adopción de medidas preventivas y correctivas, y garantizar que las actividades se desarrollen bajo condiciones seguras, contribuyendo así al adecuado desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los estándares establecidos en la normativa aplicable.

18 CONCLUSIONES

- El presente informe documenta los hallazgos preliminares, observaciones técnicas y requerimientos de información complementaria necesarios para garantizar la correcta ejecución del Tercer nivel correspondiente a Hospitalización Adulto. Se establece que el HUSRT deberá atender las observaciones formuladas en el presente informe para garantizar la coordinación de especialidades, el cumplimiento de la normativa vigente y la calidad en la ejecución de la obra

RECOMENDACIONES

- Se recomienda ir entregando la documentación a medida que se va generando, seguido a esto lo prioritario es la revisión y generación de informes de los estudios y diseños donde se dé por entendido lo allí plasmado o por lo contrario la exposición de dudas e inquietudes, de esta manera notificar al consultor, subsanar si es necesario y dar apertura a la ejecución de obra.

- Se recomienda contar oportunamente con los permisos que se requieran (tener en cuenta especialmente con entidades públicas como Ebsa, Veolia, Vanti, Urbaser, entre otras).

- Contar con la organización de las diferentes áreas de funcionamiento del hospital a fin de minimizar el riesgo con terceros.

- Contar con las áreas señalizadas.

14. ANEXOS

- Anexo 1 Informe de Seguridad y Salud en el trabajo de interventoría
- Anexo 2 Pólizas del contrato de obra e interventoría
- Anexo 3 Bitácora de obra
- Anexo 4 Actas de inicio y comités de obra
- Anexo 5 Correspondencia
- Anexo 6 Registro fotográfico
- Anexo 7 Informe de obra
- Anexo 8 Certificados de Cumplimiento
- Anexo 9 Calidad de Materiales
- Anexo 10 Programación de obra

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

INFORME DE INTERVENTORIA DE SST MENSUAL No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 664 DE 2025
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN - NIT:902.020.105-2

OBJETO: *“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*”.

CONTRATISTA DE OBRA N° 665 DE 2025
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH - NIT: 902.020.164-7

OBJETO: *“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”,*

PERIODO:
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA
2026

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

Contenido

1. INTRODUCCION 4
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASPECTOS AMBIENTALES 5
3. PERSONAL CONTRATISTA - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH 5
4. PERSONAL INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION 6
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
4.2. AVANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
4.3. CRITERIOS Y AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE PLAN ACCION 9
4.4. AFILIACION AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 10
4.5. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST 13
4.6. CAPACITACION AL VIGIA DEL COSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH 14
4.7. CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA) 15
4.7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIONES ANUAL 15
4.7.2. INDUCCIONES Y REINDUCCIONES EN SST. 16
4.7.3. PLAN ANUAL DE TRABAJO 16
4.7.4. MATRIZ LEGAL 17
4.7.5. DESCRIPCION SOCIO DEMOGRAFICO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 18
4.7.6. ACTIVIDAES DE MEDICINA DEL TRABAJO PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD. 18
4.7.7. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 19
4.7..8 CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLINICAS 19
4.7.9. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES 19
1.1. ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES 19
1.1. SERVICIO DE HIGIENE 20
1.1. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES 21
1.2. DENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DEL RIESGO 22
1.3. IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS CATALOGADAS O CON TOXICIDAD AGUDA 23
1.4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 23
1.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 24

1.6. INSPECCIONES A INSTALACIONES O MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25

1.7. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 26

2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACIÓN DE USO ADECUADO 26

2.1. BRIGADAS DE PREVENCION PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA..... 27

2.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 28

2.2.1. OTRAS ACCIONES PARTE DE INTERVENTORÍA 29

2.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD POR PARTE DE INTERVEMTORIA..... 30

2.4. INSPECCIONES A EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA 30

3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA 31

7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL..... 32

4. FICHA No 4 USO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 33

5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS..... 33

5.1. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 34

5.2. USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA 35

6. MANEJO INTEGRAL DE AREAS DE OBRA..... 37

7. PROGRAMA No 5 FOMENTO DE EMPLEO 38

8. INSPECCIONES AMBIENTALES POR INTERVENTORIA 39

9. HALLAZGOS DURANTE EL PERIODO 40

10. CONTROL DE VISITANTES. 41

11. AUSENTISMO..... 41

12. CONCLUCIONES..... 42

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

1. INTRODUCCION

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, comprende el conjunto de políticas, procesos, procedimientos y actividades orientadas a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos laborales, con el propósito de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de proteger y promover la salud de los trabajadores. Su objetivo principal es mejorar de manera continua las condiciones y el ambiente de trabajo, contribuyendo al mantenimiento del bienestar físico, mental y social del personal vinculado al proyecto.

En el marco de las funciones propias de la Interventoría, el presente informe consolida la verificación y seguimiento a las actividades implementadas para garantizar la seguridad y salud del personal durante la ejecución de la obra, mediante la aplicación de medidas preventivas, correctivas y de control, en concordancia con la normatividad legal vigente y los lineamientos contractuales establecidos.

Así mismo, el presente Informe Mensual de Interventoría registra la descripción de los trabajos adelantados por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, relacionando los aspectos más relevantes, las actividades contractuales ejecutadas, el estado de avance y las eventualidades que inciden en la correcta ejecución del contrato de obra, dejando constancia documental para conocimiento, control y seguimiento por parte del hospital y demás interesados.

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASPECTOS AMBIENTALES

Las actividades ejecutadas en el presente periodo 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, corresponden a ensamble de andamio, camillas, para amarre de acero para vigas de placa transitable, instalación de poron y encofrado fundido de columnas localización y replanteo de espacios, suministro y figurado de acero para columnas perforación para la instalación de puntos de desagüe.

3. PERSONAL CONTRATISTA - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

En este punto se registra la labor de supervisión efectuada por la interventoría respecto al equipo administrativo y operativo vinculado al proyecto por el contratista, comprobando que cada trabajador cuente con afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social, que los pagos correspondientes se realicen oportunamente y que los aportes parafiscales se encuentren al día, en estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable en Colombia.

Para adelantar las actividades propias del desarrollo de la obra, se cuenta con el personal operativo referenciado a continuación:

Tabla 1 personal mínimo exigido contrato de obra.

No.	CARGO	PROFESIONALES
1	Director de obra	Duván Sánchez
2	Residente de Obra	German Rodríguez
3	Asesor Estructural	Jorge Arbeláez
4	Asesor Eléctrico	Jhonny Herrera
5	Asesor HVAC	Andrés Rojas
6	Asesor Hospitalario	Luis Mauricio Fonseca

Fuente: *Personal mínimo contractual*

Nota: Con relación al personal vinculado a la ejecución de la obra, se constató que el contratista mantiene a sus trabajadores inscritos en el Sistema de Seguridad Social, encontrándose dichas afiliaciones vigentes y en pleno estado de activación al momento de la verificación.

En el Anexo 1.1 se encuentran en planillas de seguridad social.

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

4. PERSONAL INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION

Para adelantar las actividades propias del desarrollo de la obra, se cuenta con el personal operativo referenciado a continuación.

Tabla 2 personal mínimo exigido en el contrato de interventoría

No.	CARGO	PROFESIONALES
1	Director de Interventoría	Clara María Rodas Moreno
2	Asesor Hospitalario	Paola Alejandra Villadiego García
3	Asesor estructural	Catalina Yepes Estrada
4	Asesor eléctrico	Hugo Aguilar Suarez
5	Residente de Interventoría	Ricardo Gómez Colorado
6	SISO	Leidy Johana Muñoz Zapata

Fuente: Archivo de Interventoría.

Nota: El equipo vinculado al CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN que integra la interventoría dispone de las afiliaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social, evidenciándose que, para el mes en curso, estas se encuentran vigentes y en estado activo conforme a la normativa aplicable.

En el Anexo 1.1 se encuentran en planillas de seguridad social.

PERSONAL DE OBRA ACTIVO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH.

Tabla 3 personal de obra operativo:

CARGO	CUENTA DE NOMBRE
ADMINISTRATIVO	3
AYUDANTE DE OBRA	2

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Para el mes de febrero se registró un total de cinco (5) personas vinculadas al proceso constructivo, correspondientes al personal ingresado por el consorcio CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH, quienes participaron en la ejecución de las actividades del proyecto.

En el Anexo 1 se encuentran los soportes de seguridad y salud en el trabajo

De igual manera, se dispone de un subcontratista especializado en infraestructura, responsable de la ejecución técnica y operativa de estas actividades, garantizando su desarrollo conforme a los lineamientos establecidos.

Tabla 4 personal de obra subcontratista

EMPRESA	N. TRABAJADORES
CONTRATISTA EXTERNO	19
Total	**19**

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Para el presente mes, se tiene un total de 24 personas de contratista y subcontratistas que hacen parte del proceso de construcción del tercer piso en obra.

En el Anexo 1.1 se encuentran en planillas de seguridad social

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y CALIFICADA.

La vinculación de personal calificado y no calificado se llevó a cabo conforme a las necesidades específicas del proyecto, asegurando la participación de trabajadores con la experiencia y capacidades requeridas para las actividades técnicas, así como de apoyo para las labores operativas. Esta estrategia permitió optimizar el desarrollo de las actividades en obra, promover oportunidades de empleo en la zona de influencia y consolidar un equipo de trabajo eficiente, en cumplimiento de los parámetros de calidad y seguridad definidos para el proyecto.

En consecuencia, se definen e implementan criterios específicos para la incorporación del personal, orientados a asegurar que el proceso de selección y contratación se ajuste a los lineamientos establecidos y atienda de manera oportuna y efectiva los requerimientos propios del proyecto.

- ✓ Examen médico ocupacional.
- ✓ Afiliación al Sistema General de Seguridad Social integral
- ✓ Inducción para socialización de temas generales **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** (políticas, objetivos, normas internas),
- ✓ Conocimiento de funciones y actividades a desarrollar.

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

Tabla 5 ingreso de personal de obra

CARGO	N. TRABAJADORES
ADMINISTRATIVO	1
AYUDANTE DE OBRA	0
OFICIAL DE OBRA	0
Total	**1**

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: se registra ingresos UN INGRESO durante el periodo de FEBRERO de 2026 pertenecientes al contratista de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**.

Retiros de personal:

El **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** lleva a cabo los siguientes procedimientos para la desvinculación del personal.

1. Examen de egreso
2. Firmas de paz y salvo
3. Elaboración de liquidación
4. Entrega de certificados

Tabla 6 retiro de personal de obra

CARGO	N. TRABAJADORES
ADMINISTRATIVO	0
AYUDANTE DE OBRA	0
DIRECTOR DE OBRA	0
OFICIAL DE OBRA	0
ALMACENISTA	0
Total	**0**

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: no se reporta la salida de personas por parte del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** durante el periodo de FEBRERO de 2026.

4.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta a Supervisión del HUSRT**,** los avances relacionados a la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**, teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo y la normatividad vigente, de acuerdo a los establecido ***"CONTRATO No. 664 DE 2025 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE***

4.2. AVANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Interventoría verificó el progreso en la implementación de los estándares mínimos bajo el ciclo PHVA en la obra, constatando que el contratista ha ejecutado las acciones correctivas correspondientes y efectuado los respectivos cierres frente a los hallazgos identificados. A continuación, se describen de manera detallada las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de FEBRERO y el 28 de FEBRERO de 2026.

4.3. CRITERIOS Y AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE PLAN ACCION

Cuadro consolidado de puntajes correspondientes a los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019, mediante la cual se determinan los lineamientos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a empleadores y contratantes.

Tabla 7 Cumplimiento de estándares en seguridad y salud en el trabajo.

N°	CRITERIO ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
1	Afiliación al sistema de seguridad social integral
2	Identificación de trabajadores que se dedican en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial
3	Conformación y funcionamiento del COPASST
4	Capacitación de los integrantes del COPASST
5	Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
6	Programa de capacitación anual
7	Inducción y reinducción en SST
8	Plan Anual de Trabajo.
9	Matriz legal
10	Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores
11	Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud
12	Evaluaciones médicas ocupacionales
13	Custodia de las historias clínicas
14	Restricciones y recomendaciones médico laborales
15	Estilos de vida y entornos saludables
16	Servicios de higiene
17	Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales e investigaciones de accidentes.
18	* Registro y análisis estadístico de accidente de trabajo y enfermedades laborales.

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

N°	CRITERIO ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
	* Frecuencia de accidentalidad Severidad de accidentalidad * Proporción de accidentes de trabajo mortales * Prevalencia de enfermedades laborales * Incidencia de enfermedades laborales * Ausentismo por causa médica.
19	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
20	Identificación de sustancias catalogadas o con toxicidad aguda
21	Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
22	Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
23	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos
24	Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas
25	Entrega de los elementos de protección personal (EPP), y capacitación en uso adecuado
26	Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
27	Acciones preventivas/correctivas

Fuente: Archivo de Interventoría.

NOTA: Seguidamente, se expone la descripción detallada de los criterios definidos en los estándares mínimos del Sistema de Gestión, en concordancia con los avances informados y evidenciados por el contratista durante el período evaluado.

4.4. AFILIACION AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** presentó la planilla correspondiente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado a la obra, correspondiente al periodo comprendido entre el mes de febrero, como soporte del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

Imagen1 Soporte de pago



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-16, 03:13:06 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 82887849

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: enero de 2026

PAGADO 16/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URG SAN RAFAEL		
Documento	NI901752359	**Dirección**	DG 74D #32 BB - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4883991
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAÑOLA AGUIRRE DIANA DARLENE	**Identificación**	CC 43341527
Total Afiliados	46	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	VAC	TDP	TAP	COR	VCT	AVP	VST	ING	RET	TDE	TAE	TDA	TAA	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte CCF/A	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
1042841318	LEIDY SARIANA ARBELAEZ CARDOZO	01	00													X						23 SURA PROTECCION	$ 1.333.000	$ 266.600	37 EPS SURA	$ 1.333.000	$ 63.984	0,000	$ 1.333.000	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.333.000	$ 53.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1040706823	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00										X									23 SURA PORVENIR	$ 473.334	$ 85.200	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 473.334	$ 75.733	0,000	$ 473.334	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 473.334	$ 18.933	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.666
1040706823	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00																			23 SURA PORVENIR	$ 1.264.667	$ 216.800	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 1.264.667	$ 101.035	0,000	$ 1.264.667	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.264.667	$ 50.587	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.933
1088473555	STEVEN ANDRES DIAZ CORREA	01	00										X									23 SURA PORVENIR	$ 333.134	$ 63.200	37 EPS SURA EXPRESSCOPIA EPS	$ 333.134	$ 53.293	0,000	$ 333.134	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 333.134	$ 13.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.600
1040473555	STEVEN ANDRES DIAZ CORREA	01	00																			23 SURA PORVENIR	$ 1.081.200	$ 174.700	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 1.081.200	$ 43.700	0,000	$ 1.081.200	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.081.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.240
1010471318	ANGELY GISNEY PATIÑO MANDIVELSO	01	00										X									23 SURA PORVENIR	$ 1.081.200	$ 174.700	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 1.081.200	$ 43.700	0,000	$ 1.081.200	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.081.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.240
1010471318	ANGELY GISNEY PATIÑO MANDIVELSO	01	00																			23 SURA PORVENIR	$ 1.081.200	$ 174.700	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 1.081.200	$ 43.700	0,000	$ 1.081.200	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.081.200	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.240
1010521728	ANDERSON ANDRES TOCARRUNCHO PEÑA	01	00																			23 SURA PROTECCION	$ 1.403.000	$ 337.800	37 EPS FAMISANAR EPS	$ 1.403.000	$ 57.500	0,000	$ 1.403.000	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 1.403.000	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.800
1011194747	JUAN PABLO SEPULVEDA VEGA	01	00																			23 SURA PROTECCION	$ 1.600.000	$ 416.000	37 EPS SURA	$ 1.600.000	$ 184.000	0,960	$ 1.600.000	$ 181.000	23 CCF 100 COMFAORI	$ 2.000.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000
1040680714	WILLIAM DANILO SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00													X						23 SURA PORVENIR	$ 448.000	$ 71.700	37 EPS SURA NUEVA EPS	$ 448.000	$ 58.240	0,000	$ 448.000	$ 0	23 CCF 100 COMFAORI	$ 448.000	$ 17.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.600

Fuente: Archivo de Interventoría

nota: La interventoría realizó la revisión de los comprobantes de pago correspondientes al periodo objeto de evaluación, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social. Como resultado de esta verificación, se evidenció que todo el personal vinculado se encuentra afiliado y con aportes al día en el Sistema de Seguridad Social Integral EPS, ARL y fondo de pensiones asegurando la cobertura frente a riesgos laborales y contingencias comunes, conforme a la normatividad vigente aplicable.

En el Anexo 1.1 se encuentra las Planillas de seguridad social.

Determinación del personal que realiza de manera continua labores consideradas de alto riesgo y registro correspondiente para la cotización en el régimen de pensión especial.

Con respecto a este aspecto, se consideran como actividades de alto riesgo aquellas que se detallan a continuación:

- Trabajo en alturas
- Espacios confinados
- Trabajo en caliente.

A continuación, se describe las siguientes actividades

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

- **IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES QUE SE DEDICAN EN FORMA PERMANENTE A ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y COTIZACIÓN DE PENSIÓN ESPECIAL**

Durante este mes, se identifica al personal que desarrolla labores de alto riesgo, específicamente en trabajos en alturas. El contratista ha presentado el informe correspondiente, detallando los trabajadores autorizados para llevar a cabo estas actividades bajo las normas de seguridad establecidas.

Tabla 8 personal en permiso de trabajo en alturas subcontratistas.

PERSONAL	FECHA DE AUTORIZACIÓN	TRABAJADOR AUTORIZADO
Fabriciano torres	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Jhon Benavides	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
José Amilkar correa	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Fabian Hildebrando Rodríguez	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Luis Yoel Rodríguez	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Angel Ferney Patiño	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Fabian Idelbrando Rodríguez	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Jairo Espinosa Rodríguez	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Wlfran Enrique Alvear	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Oscar David Aristizábal	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Manuel Jose Polo	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Esteban Vargas	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo
Andrea Marroquín	Del 01 al 28 de febrero de 2026	activo

Fuente: Archivo de Interventoría.

NOTA: La interventoría verificó los permisos de trabajo en alturas correspondientes al mes en curso, comprobando en la plataforma del Ministerio de Protección Social que los cursos de formación y certificación del personal se encuentran vigentes y válidos, conforme a lo estipulado en la Resolución 4272 de 2021. Durante este periodo, las actividades se desarrollaron en TERCER PISO, incluyendo el traslado de materiales hacia y desde la placa transitable.

En el Anexo 1.1 se encuentra las Planillas de seguridad social.

Imagen 2 firma de permisos trabajos en alturas



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota. El trabajador completa y registra los permisos de trabajo en alturas antes de iniciar la actividad, específicamente para la operación de armado de formaleta fundida de columnas y subida de material con pluma, garantizando así el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos.

- Espacios confinados en el presente mes el contratista no realiza actividades en estas condiciones.
- Trabajo en caliente el presente mes el contratista no realiza este tipo de actividades.

En el Anexo 1.2 se encuentra permisos de trabajo en alturas.

4.5. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST

No se requiere la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que la empresa cuenta con menos de diez (10) trabajadores. En su lugar, se designa formalmente un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien será el responsable de promover, apoyar y supervisar el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, velando por la prevención de riesgos y el bienestar del personal.

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

Imagen 3 conformación vigía consorcio infraestructura ACH



Fuente: Archivo de Interventoría

NOTA: Los subcontratistas cuentan con su respectivo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), implementado a través del **CONSORCIO URG SAN RAFAEL**, dando cumplimiento a los lineamientos y requisitos establecidos para el desarrollo de las actividades en obra, lo cual contribuye a garantizar condiciones seguras para el personal vinculado al proyecto.

Por otro lado:

Para el presente semestre, se efectúa la designación del señor SAID FERNANDO LARROTA MADERO, quien se desempeña como ayudante de obra, como Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH,** asumiendo la responsabilidad de apoyar y supervisar el cumplimiento de las actividades del sistema en materia de prevención de riesgos laborales.

En el Anexo 1.3 se encuentra acta de conformación vigía.

4.6. CAPACITACION AL VIGIA DEL COSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Se llevó a cabo la capacitación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y competencias en la identificación de peligros, reporte de actos y condiciones inseguras, seguimiento a medidas preventivas y promoción de la cultura de autocuidado. Esta formación le permite desempeñar adecuadamente sus funciones dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo al mejoramiento continuo de las condiciones laborales y a la prevención de incidentes en la empresa.

Imagen 4 capacitación personal en obra y vigía sst



Fuente: Archivo de Interventoría

En el Anexo 1.4 se encuentra capacitaciones sst

4.7. CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)

En el período evaluado se realizó la Reunión No. 01 del Comité de Convivencia Laboral**,** llevada a cabo el 3 de febrero de 2026 en las instalaciones del **Hospital Universitario San Rafael de Tunja**. Durante esta sesión se efectuó la conformación del comité y se designó al señor **José Palmera** como representante del comité.

Adicionalmente, durante la reunión se abordaron temas relacionados con la promoción de un ambiente laboral positivo, estableciendo lineamientos para fomentar la comunicación asertiva, el respeto y la sana convivencia entre los trabajadores. Igualmente, se plantearon iniciativas de sensibilización y formación orientadas a prevenir situaciones de conflicto y fortalecer las relaciones interpersonales dentro de la institución.

4.7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIONES ANUAL

Durante el presente período, el contratista llevó a cabo dos capacitaciones dirigidas al personal operativo, enfocadas en la inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas actividades tuvieron como objetivo fortalecer los riesgos

psicosociales y funciones del CCL dando prioridad al primero como forma de mantener un ambiente adecuado para los trabajadores.

Tabla 9 CAPACITACIONES sst en el año 2026

CAPACITACIONES	ASISTENTES
RIESGO PSICOSOCIAL	4
PRACTICAS DE MANEJO SEGURO Y MANEJO DE EXTINTORES	4
TOTAL, DE CHARLAS	2

Fuente: Archivo de Interventoría.

NOTA: las capacitaciones desarrolladas durante el periodo contribuyeron al fortalecimiento de los conocimientos y competencias del personal en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el Anexo 1.4 se encuentra capacitaciones sst

4.7.2. INDUCCIONES Y REINDUCCIONES EN SST.

Durante el mes de febrero se realizó proceso de inducción, debido a un ingreso de una nueva persona a la obra por parte del contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**. En este período, las actividades se desarrollaron con el personal previamente vinculado, garantizando la continuidad de las labores y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto.


En el Anexo 1.5 se encuentra inducciones sst

4.7.3. PLAN ANUAL DE TRABAJO

Durante el mes de FEBRERO se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del contratista. Este proceso permitió supervisar el desarrollo de las acciones programadas en obra, orientadas al fortalecimiento del desempeño del personal, la correcta ejecución de sus funciones y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el adecuado desarrollo del proyecto.

imagen 5 plan anual de trabajo sst en el año 2026

OBJETO	“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA”. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

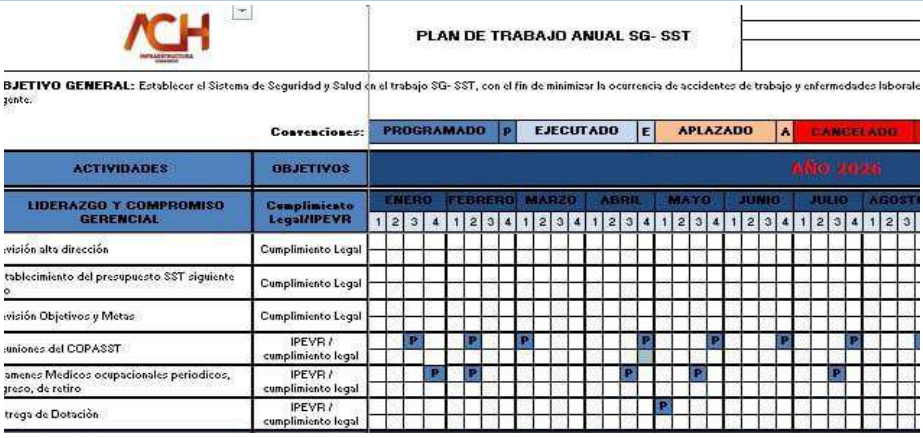

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG- SST

BJETIVO GENERAL: Establecer el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborale gente.

Convenciones: PROGRAMADO P | EJECUTADO E | APLAZADO A | CANCELADO


ACTIVIDADES	OBJETIVOS	AÑO 2026																																	
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	Cumplimiento Legal/IPEVR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
...visión alta dirección	Cumplimiento Legal																																		
...tablecimiento del presupuesto SST siguiente ...o	Cumplimiento Legal																																		
...visión Objetivos y Metas	Cumplimiento Legal																																		
...uniones del COPASST	IPEVR / cumplimiento legal			P			P			P						P				P				P				P						
...ámenes Medicos ocupacionales periodicos, ...greso, de retiro	IPEVR / cumplimiento legal				P		P								P				P				P										
...trega de Dotación	IPEVR / cumplimiento legal																P																		

Fuente: Archivo de Interventoría.

4.7.4. MATRIZ LEGAL

Durante el mes de FEBRERO, la matriz legal del contratista se mantuvo sin modificaciones, evidenciando que no se reportaron actualizaciones en este período. No obstante, se continúa con su seguimiento conforme a los requisitos establecidos en la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

imagen 6 matriz legal sst en el año 2026

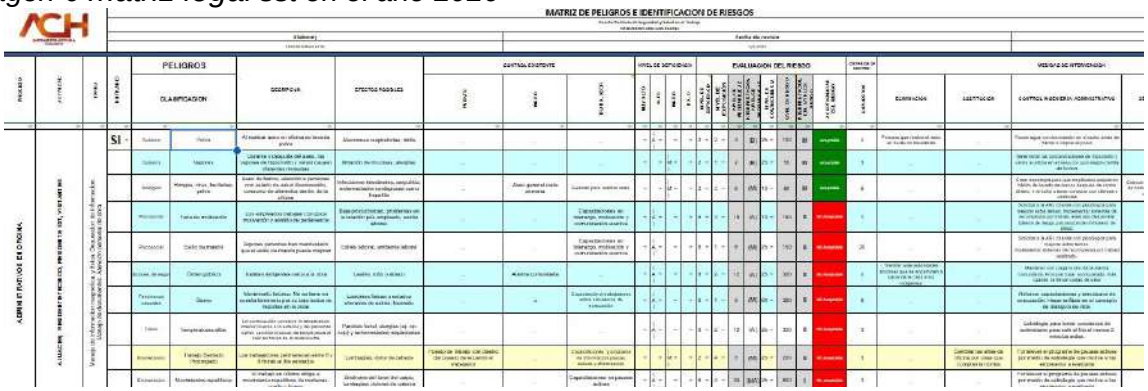

MATRIZ DE PELIGROS E IDENTIFICACION DE RIESGOS

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Se continúa con la verificación de la matriz legal del proyecto, evidenciando que durante el periodo no se presentaron modificaciones en la normatividad aplicable ni en las condiciones de la obra que requirieran su actualización. Esta herramienta se mantiene vigente y permite identificar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento

de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la adecuada gestión normativa dentro del desarrollo de las actividades del proyecto.

4.7.5. DESCRIPCION SOCIO DEMOGRAFICO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Durante el período evaluado NO se realizó la revisión de la información sociodemográfica de los trabajadores vinculados al proyecto, con el fin de identificar características relevantes como edad, género, cargo, nivel educativo y tiempo de vinculación laboral. Asimismo, NO se efectuó el análisis del diagnóstico de las condiciones de salud del personal, donde se permite reconocer factores de riesgo y establecer acciones preventivas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades laborales, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas actividades contribuyen a la toma de decisiones para el fortalecimiento del bienestar y la protección de los trabajadores en el desarrollo de sus labores.

Nota: El contratista manifiesta que se ha realizado la gestión correspondiente ante la empresa encargada de la custodia de las historias médicas ocupacionales, con el fin de que para el próximo informe se efectúe la entrega de la información requerida.

4.7.6. ACTIVIDAES DE MEDICINA DEL TRABAJO PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD.

Durante este período se desarrollaron actividades de medicina del trabajo, orientadas a la prevención de riesgos y a la promoción de la salud, con el objetivo de garantizar el bienestar físico y mental del personal en obra, de la siguiente manera:

- Pausas activas
- Se promueve higiene personal
- Mejora de condiciones de puesto de trabajo (aseo)

Imagen 7 mejoramiento de condiciones de trabajo (aseo)



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Durante el periodo evaluado, se evidenció que en la obra civil se mantienen condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas de trabajo, lo cual contribuye a generar espacios seguros y organizados para el desarrollo de las actividades constructivas. El personal realiza de manera constante la disposición correcta de materiales, herramientas y residuos generados durante la jornada laboral, evitando la acumulación innecesaria de elementos en las zonas de tránsito. Estas acciones favorecen la prevención de incidentes, mejoran la movilidad dentro del área de obra y promueven el cumplimiento de las buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo.

4.7.7. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

Durante el presente mes, el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** realizó evaluaciones médicas ocupacionales correspondientes al ingreso de nuevo personal. Asimismo, cuenta con los servicios de salud ocupacional de la IPS **Asociación de Servicios en Salud Ocupacional S.A.S. (ASSOC S.A.S.)**, entidad encargada de la gestión y custodia de los historiales clínicos del personal vinculado al proyecto, garantizando el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.7.8 CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLINICAS

Para el presente periodo no se dispone de las historias clínicas ocupacionales del personal vinculado al Consorcio Infraestructura ACH, dado que estos documentos se encuentran bajo la responsabilidad y custodia de la IPS ASSOC, entidad encargada de su administración, manejo y conservación conforme a la normatividad vigente.

Nota: El contratista informa que actualmente se encuentra en proceso de gestión y solicitud ante la entidad correspondiente para la obtención de la certificación requerida.

4.7.9. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES

Durante el período correspondiente al mes de **febrero**, se emitieron recomendaciones médico-laborales, debido a un ingreso de nuevo personal por parte del **Consorcio Infraestructura ACH**, por lo que fue necesario realizar evaluaciones médicas ocupacionales que generaran este tipo de conceptos o indicaciones.

- Uso de epp
- Higiene postural
- Pausas activas
- Manejo adecuado de cargas
- Uso correctivo visual permanente

1.1. ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES

La interventoría mantiene el seguimiento a las acciones orientadas al bienestar integral de los trabajadores en la obra, promoviendo prácticas que favorezcan el cuidado de la salud y la prevención de riesgos. En este sentido, se impulsan iniciativas de orientación y sensibilización dirigidas al personal, enfocadas en fortalecer el autocuidado, mejorar las condiciones de salud y propiciar un entorno laboral seguro, saludable y favorable para el desarrollo de las actividades y sus condiciones físicas.

Imagen 8 punto de hidratación



Fuente: Archivo de Interventoría

NOTA: El contratista cuenta con puntos de hidratación en obra que es compartido con el contratista consorcio urg san Rafael, como medios para garantizar el acceso permanente a agua potable por parte de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. Esta medida contribuye a la prevención de la deshidratación, especialmente durante jornadas laborales prolongadas, y promueve condiciones adecuadas de bienestar y cuidado de la salud del personal en el lugar de trabajo.

1.1. SERVICIO DE HIGIENE

se observó que se mantiene un proceso organizado para el manejo de residuos y la conservación de las áreas sanitarias. El contratista dispone de personal encargado de realizar labores periódicas de aseo y mantenimiento, lo que contribuye a preservar condiciones adecuadas de salubridad, prevenir afectaciones a la salud y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el período correspondiente al mes de FEBRERO se realizó la verificación de las condiciones de higiene y saneamiento en las instalaciones de la obra, con el fin de garantizar espacios adecuados para el bienestar de los trabajadores.

En este proceso se evidenció que las unidades sanitarias disponibles cumplen con las condiciones necesarias de funcionamiento, limpieza y dotación de insumos básicos para su uso adecuad.

Imagen 9 limpieza de baños.



Fuente: Archivo de Interventoría


Nota: Se verificó que los servicios sanitarios se encontraban en buen estado. Estos son compartidos con el contratista **Consorcio URG San Rafael**, estableciéndose una distribución de las labores de aseo entre los subcontratistas para garantizar su adecuada limpieza. Asimismo, se constató la disponibilidad de insumos básicos como desinfectante, jabón y elementos de protección personal (guantes, gafas y tapabocas), necesarios para la correcta ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de los baños.

1.1. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES

La interventoría lleva a cabo inspecciones y seguimientos constantes en la obra, con el objetivo de identificar riesgos y aplicar medidas preventivas que reduzcan la ocurrencia de accidentes e incidentes. Estas acciones permiten garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, promover buenas prácticas laborales y mantener un entorno de trabajo seguro, protegiendo la integridad física y el bienestar de todo el personal involucrado en el proyecto.

Imagen 10 grafica de accidentabilidad

Imagen 10 grafica de accidentabilidad.

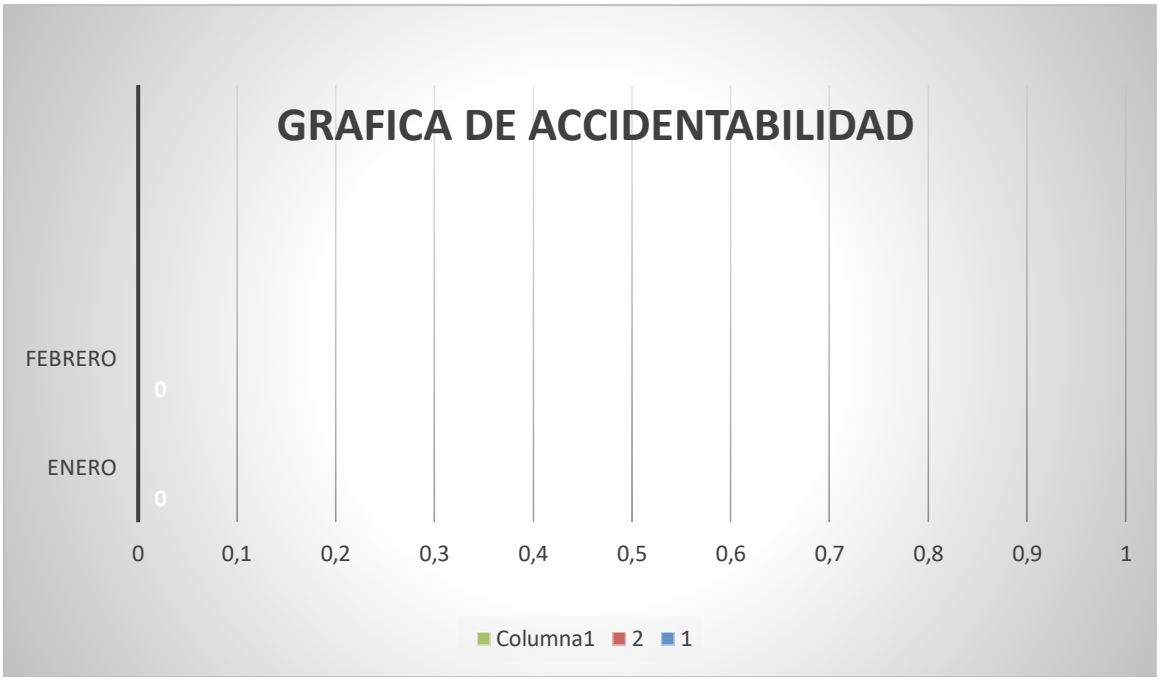

Fuente: Archivo de Interventoría

NOTA: Durante este periodo, **no se registraron accidentes** en la obra, lo que refleja el compromiso del personal y del contratista con las prácticas de seguridad y prevención establecidas**.**

1.1. DENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DEL RIESGO

Esta herramienta, se elabora conforme a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, tiene como objetivo principal identificar, evaluar y priorizar los riesgos presentes en el entorno laboral, con el fin de implementar medidas preventivas y de control que garanticen la seguridad y salud de los colaboradores.

Durante el mes de FEBRERO se realizó la verificación de la matriz de riesgos, con base en el avance de las actividades ejecutadas en obra y No se identificaron cambios que implicaran la actualización de riesgos o procedimientos, por lo que la matriz se mantiene sin modificaciones.

1.2. IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS CATALOGADAS O CON TOXICIDAD AGUDA

Durante este período, no se registró la utilización de sustancias clasificadas como de toxicidad aguda en las actividades de construcción, evidenciando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la correcta gestión de los materiales en obra.

La interventoría mantiene la supervisión continua, enfatizando la identificación y control de cualquier sustancia con potencial riesgo tóxico, con el fin de proteger la salud de los trabajadores. Se recomienda asegurar la disponibilidad y actualización permanente de las fichas de datos de seguridad y fichas técnicas, garantizando que todo el personal conozca las propiedades, medidas preventivas y procedimientos correctos para la manipulación segura de estos materiales.

1.3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

La interventoría realiza seguimiento constante al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro y a la adopción de buenas prácticas de prevención, mediante diversas acciones:

Se verifica que el personal complete los **preoperacionales** antes de iniciar sus actividades, identificando posibles riesgos y aplicando medidas de mitigación oportunas.

Se supervisa la **participación en capacitaciones y charlas de prevención** ofrecidas por el contratista, fomentando una cultura de responsabilidad y autocuidado que fortalece la seguridad dentro de la obra.

Se controla el **uso correcto de los elementos de protección personal (EPP)**, especialmente en actividades de pintura y estuco, asegurando que los trabajadores cuenten con la protección necesaria durante la ejecución de sus tareas.

Estas prácticas permiten mantener un **entorno laboral seguro**, promoviendo el bienestar del personal y asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Imagen 11 verificación de equipos en obra



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Como parte de las medidas preventivas, se supervisa el uso apropiado de los equipos proporcionados por el contratista, asegurando que sean empleados de manera segura durante la ejecución de las actividades. Esta práctica contribuye a minimizar riesgos, prevenir accidentes y proteger la integridad de todo el personal en la obra.

1.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante este período se llevó a cabo la revisión de los procedimientos y lineamientos internos del contratista asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de asegurar que las labores en obra se realicen siguiendo prácticas seguras y criterios técnicos adecuados. Esta evaluación permite verificar la vigencia, pertinencia y correcta implementación de los documentos que sustentan la gestión preventiva, los cuales se presentan a continuación:

- INSPECCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO
- INSPECCIÓN ATS
- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS
- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BUEN ESTADO DE EPP

imagen 12 verificación de equipos en obra

NOTA: Se brinda orientación al personal respecto a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Estas acciones fomentan una cultura preventiva basada en la responsabilidad y el autocuidado, promoviendo prácticas seguras en todas las actividades realizadas en obra.

En el Anexo 1.6 inspecciones de permisos de trabajo.

1.5. INSPECCIONES A INSTALACIONES O MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Durante el período se efectuó la inspección periódica de la maquinaria y los equipos empleados en la obra, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Estas revisiones permiten detectar a tiempo posibles fallas o necesidades de mantenimiento, asegurando la operación segura y continua de las actividades. A continuación, se presenta el inventario de la maquinaria de mayor utilización durante el mes.

- CARMIX-AUTOHORMIGUERA
- VOLQUETA
- MINICARGADOR

imagen 13 verificación de equipos en obra



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: En el marco del Programa de Mantenimiento Preventivo se realizan actividades como el cambio de aceite y filtros de la volqueta, así como el reemplazo de las pastillas de freno de la volqueta. con el objetivo de asegurar que los equipos funcionen en condiciones óptimas. Estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de accidentes, optimizar el rendimiento de la maquinaria y garantizar la seguridad

durante la ejecución de las labores en obra.

En el Anexo 1.7 se encuentra en inspecciones de equipos

1.6. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

Durante el período evaluado, no se llevaron a cabo las labores de mantenimiento periódico de los equipos, maquinarias y herramientas por parte del contratista, asegurando su funcionamiento adecuado y reduciendo el riesgo de fallas durante la ejecución del proyecto. Se recomienda continuar con la programación y ejecución de los mantenimientos previstos para mantener la operatividad y prevenir posibles contingencias.

Nota: En este período no se reportaron mantenimientos específicos para herramientas como pulidora, taladro y la tronzadora, utilizadas en las actividades constructivas.

2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACIÓN DE USO ADECUADO

La interventoría realiza la verificación de la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP), asegurando que los equipos proporcionados sean los adecuados frente a los riesgos presentes en las actividades de la obra. Durante febrero de 2026, se llevó a cabo la distribución de los EPP, cumpliendo con la normatividad vigente y los estándares de seguridad establecidos, garantizando así la protección efectiva de los trabajadores en el desarrollo de sus labores.

imagen 14 entrega de elementos de protección personal.



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: El **contratista** presenta los soportes correspondientes a la entrega de elementos de protección individual (EPI) al personal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** que ingresa al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección señalados para el desarrollo de las actividades en obra se entregan los siguientes elementos mencionados a continuación:

- Gafas con filtro solar
- Guantes de nitrilo
- Tapa bocas
- Cascos

En el Anexo 1.8 se encuentra entrega de epp

2.1. BRIGADAS DE PREVENCION PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

La interventoría sigue verificando la organización y operatividad de la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias del contratista **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**, integrada por cuatro personas capacitadas para atender oportunamente cualquier eventualidad en la obra. La brigada cuenta con la dotación y los equipos requeridos, incluyendo alarmas de emergencia, camillas, botiquines y extintores, lo que garantiza una respuesta rápida y eficaz frente a situaciones de riesgo, asegurando la protección del personal y la continuidad de las actividades.

Imagen 15 botiquín.



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Se efectúa la inspección periódica de los equipos destinados a la atención de emergencias en la obra, con el objetivo de garantizar su funcionamiento adecuado y disponibilidad inmediata. Esta revisión abarca extintores, botiquines de primeros auxilios, camillas, alarmas de alerta, señalización de rutas de evacuación y equipos de protección personal. Mantener estos elementos en óptimas condiciones asegura una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad, fortaleciendo la seguridad del personal y cumpliendo con los estándares de prevención establecidos.

2.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Dentro del marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el contratista mantiene de forma permanente la ejecución de medidas preventivas y correctivas orientadas a resguardar la integridad del personal en obra. Estas medidas incluyen la identificación y evaluación de riesgos, la capacitación constante de los trabajadores, la correcta utilización de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de protocolos de trabajo seguro. Asimismo, se aplican acciones correctivas frente a cualquier situación de riesgo, buscando eliminar, controlar o reducir su impacto, fomentando un ambiente laboral seguro y fortaleciendo la cultura de prevención y responsabilidad entre todos los colaboradores.

Imagen 16 señalización de espacios en la circulación de obra



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: El contratista implementa de manera continua acciones preventivas y correctivas para gestionar los riesgos en la obra. Entre las medidas preventivas se incluyen señalización de áreas peligrosas, capacitaciones, listas de verificación, pausas activas, simulacros y aplicación de procedimientos de emergencia. Las acciones correctivas abarcan mantenimiento de maquinaria, adecuación de

andamios y reentrenamiento del personal. Estas intervenciones son supervisadas y validadas por la interventoría, asegurando una gestión efectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2.1. OTRAS ACCIONES PARTE DE INTERVENTORÍA

El contratista entrega los soportes de las actividades de formación realizadas, conforme al plan de charlas y capacitaciones previamente establecido.

Adicionalmente, se desarrollaron otras acciones formativas tales como se presenta en el cuadro a continuación:

FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Tabla 10 charlas personal en obra

CHARLAS	ASISTENTES
PAUSA ACTIVA	4
EXCESO DE CONFIANZA	4
TOTAL, DE CHARLAS	2

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Una parte del personal no pudo asistir a la capacitación debido a que se encontraba asignada a otras obras del contratista, lo que impidió contar con la participación total durante el período programado. No obstante, las jornadas de formación realizadas aportaron significativamente al fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la cultura de autocuidado y contribuyendo a la consolidación de un entorno laboral más seguro y enfocado en la prevención de riesgos.

En el Anexo 1.4 se encuentra capacitaciones sst

COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA INTERVENTORIA Y SUPERVISION

Durante el presente período NO se llevaron a cabo reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) entre el contratista, la interventoría y la supervisión del **Hospital Universitario San Rafael de Tunja (HUSRT)**. A pesar de ello, se mantiene la implementación de los protocolos y acciones preventivas establecidas, asegurando

que las actividades en obra continúen bajo criterios de seguridad y cumplimiento de la normatividad vigente.

2.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD POR PARTE DE INTERVEMTORIA

Durante el período evaluado, la interventoría realizó visitas de inspección a la obra con el objetivo de verificar la implementación de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas revisiones facilitaron la identificación de áreas de mejora, el refuerzo de prácticas seguras y la emisión de recomendaciones preventivas, contribuyendo a garantizar un entorno laboral seguro y a proteger la salud e integridad del personal en el desarrollo de sus labores.

Tabla 11 inspecciones de seguridad

FECHA	INSPECCIÓN
13/02/2026	Taladro
17/02/2026	Pulidora
12/02/2026	Herramienta menor
13/02/2026	Inspección de escaleras
07/02/2026	Señalización a obra

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: En la inspección realizada por la interventoría sobre herramientas y equipos, incluyendo taladros, pulidoras, herramientas menores, escaleras y señalización de obra, se identificaron elementos que requerían atención para prevenir posibles actos inseguros. Durante la revisión se constató que las herramientas y equipos se mantienen en buen estado, con un adecuado mantenimiento y una gestión responsable de las condiciones de seguridad, garantizando su uso seguro durante las actividades en obra.

En el anexo 1.7 se encentra en inspecciones de equipos.

2.4. INSPECCIONES A EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA

La interventoría realiza revisiones periódicas de los equipos empleados en la obra, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento, condiciones de seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos establecidos. Estas inspecciones permiten identificar de manera temprana posibles fallas o desgastes, planificar mantenimientos preventivos y garantizar que los equipos operen de forma segura, fortaleciendo la prevención de accidentes y cumpliendo con la normativa vigente en seguridad laboral.

Equipos utilizados durante el periodo como son:

- Pulidora
- Taladro
- Tronzadora

Tabla 17 inspecciones de equipos.



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Durante el mes reportado, no se registraron equipos en mal estado**.** Se cuenta **con un** total de 3 equipos en inventario**,** los cuales son utilizados de manera adecuada para las diferentes actividades de construcción en la obra.

En el Anexo 1.7 se encuentra en inspecciones de equipos.

3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA

La interventoría entrega el registro de las inspecciones efectuadas durante el mes de febrero, documentando las acciones realizadas por el contratista en la obra para asegurar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Listado de verificación de inspecciones:

Tabla 12 inspecciones de equipos por el contratista.

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**N° DE CONTRATO**	665 DE 2025
NIT	902.020.164-7	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**NIT**	902.020.105-2

INSPECCIÓN	**FECHA**	¿Se realizo? Si / NO
Inspección de elementos de protección personal	Mensual	SI
inspección locativa	bimensual	NO
inspección pre operacional roto martillo	Cuando se opere	NO
inspección pre operacional pulidora	diario	SI
inspección pre operacional taladro	diario	SI
inspección pre operacional sierra eléctrica	Cuando se opere	SI
inspección de arnés, eslingas y línea de vida	Diario	SI
inspección pre operacional de escaleras	diario	SI
inspección pre operacional CARMIX	Cuando se requiera su manejo	SI

Fuente: Archivo de Interventoría.

Nota: Durante el período evaluado se realizaron un total de 7 inspecciones, evidenciando la continuidad en el seguimiento de las condiciones de seguridad y la aplicación de los protocolos establecidos en la obra, lo que contribuye a mantener un entorno laboral seguro y controlado.

7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el período evaluado, se dio cumplimiento al **Plan de Manejo Ambiental (PMA)** implementado en la obra, asegurando que todas las actividades se desarrollen bajo criterios de protección del entorno. Este plan contempla medidas para la gestión adecuada de residuos, control de emisiones, conservación de áreas verdes y manejo responsable de materiales peligrosos. La supervisión constante de su ejecución permite minimizar impactos ambientales, promover prácticas sostenibles y garantizar que las operaciones cumplan con la normatividad ambiental vigente.

Tabla 13 compra de bienes y servicio

ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS AMBIENTALES	**CUMPLIMIENTO**		
	SI	**NO**	**N/A**
Adquisición de materiales a proveedores legalmente constituidos, junto con la verificación de permisos, registros e instrumentos legales o ambientales que apliquen en la extracción, comercialización y suministro de materiales.	X		
Controles operativos del correcto acopio, cargue y descargue de materiales, en cumplimiento de las normas ambientales.	X		

Fuente: Archivo de Interventoría.

4. FICHA No 4 USO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el mes de **febrero** se realizó el control y seguimiento al almacenamiento y manejo de los materiales de construcción, verificando que estos se encontraran ubicados en áreas delimitadas, cubiertas y debidamente señalizadas, conforme a lo establecido en el **Plan de Manejo Ambiental**. Asimismo, se constató que la manipulación de los insumos se efectuara de manera segura y organizada, contribuyendo a la prevención de riesgos de contaminación y al cumplimiento de las buenas prácticas ambientales del proyecto.

Imagen 18 Materiales en obra señalizados y acopiados.



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: los materiales son acopiados en obra y cubiertos en zonas estratégicas de la obra para su utilización.

5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

Durante el mes de febrero, la interventoría realizó el seguimiento al manejo y almacenamiento de sustancias químicas utilizadas en la obra, verificando que se cumplieran las condiciones adecuadas de seguridad, señalización y ventilación, así como la disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) para su correcta consulta. Asimismo, se promovieron prácticas de manejo seguro entre el personal, conforme a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y la normativa vigente. Dentro de esta verificación se incluyó el control del almacenamiento de insumos como ACPM, gasolina, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la salud de los

trabajadores y minimizar impactos al medio ambiente.

Imagen 19 kit de derrames de sustancias químicas



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: Durante el presente mes FEBRERO no se registraron derrames de sustancias químicas en el proyecto. Sin embargo, el contratista cuenta con kits antiderrames disponibles en sitio, como medida preventiva para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda presentarse

5.1. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

La gestión de los residuos sólidos en la obra se desarrolla conforme a la normativa ambiental vigente y a los lineamientos establecidos en el **Plan de Manejo Ambiental**. Para ello, se cuenta con puntos ecológicos debidamente identificados y zonas destinadas al almacenamiento temporal de los residuos, además de registros que evidencian su entrega a gestores autorizados para su disposición final. Asimismo, se realizan verificaciones periódicas junto con el personal del **HUSRT**, con el fin de fortalecer la adecuada separación de residuos aprovechables como cartón, vidrio y plástico, residuos ordinarios como restos de alimentos y empaques, y residuos peligrosos, entre los que se incluyen EPP contaminados y sustancias químicas como ACPM, gasolina y pegantes.

Imagen 20 punto ecológico en obra



Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: En el proyecto **HUSRT** se dispone de uno (1) punto ecológico destinados a la adecuada separación en la fuente y clasificación de los residuos generados en la obra, conforme al código de colores establecido en la **Resolución 2184 de 2019** del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cada punto está dotado con **caneca blanca** para residuos reciclables, **caneca negra** para residuos no aprovechables, para residuos peligrosos. Estos residuos son almacenados de manera temporal bajo condiciones controladas, previo a su recolección y disposición final por parte de gestores autorizados.

La implementación de estos puntos ecológicos contribuye al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y fortalece la gestión integral de residuos dentro del proyecto, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente.

5.2. USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA

Para el control del consumo de agua en la obra, se realizó la lectura del medidor con corte al 28 de febrero de 2026, registrando un total acumulado de 975 m³. Al compararlo con la lectura anterior de 943 m³, se evidencia para el presente mes tiene un consumo de 32 m³ durante el periodo evaluado.

El volumen consumido se asocia principalmente al abastecimiento de unidades sanitarias, la preparación de mezclas de mortero (revestimiento), labores de limpieza de herramientas, equipos y áreas de trabajo.

Imagen 21 Mes de ENERO 2026



imagen 22 mes febrero 2026



Fuente: Archivo de Interventoría

✓ CONSUMO DE AGUA APROXIMADO ES DE 1.3 m³ POR PERSONA EN OBRA

Nota: El seguimiento continuo de este indicador permite el uso eficiente del recurso hídrico y reafirma el compromiso del proyecto con la implementación de prácticas sostenibles en la ejecución de la obra.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ENERGÍA

Para el presente mes se registra un consumo de **170.649 kWh**. Al compararlo con el consumo acumulado del mes de **enero**, que fue de **219.006 kWh**, se evidencia que para el mes de **febrero** se alcanza un consumo total de **324.391 kWh**. De este valor, **105.385 kWh** corresponden a un consumo compartido entre el tomógrafo de la sala era (espacios entregados al HUSRT) y el **Contratista Consorcio URG San Rafael**, reflejando así la distribución del uso energético durante el periodo evaluado.

Este valor corresponde al funcionamiento de los equipos eléctricos utilizados para el desarrollo de las actividades de obra civil e instalación de redes.

Los equipos que contribuyeron al consumo se encuentran pulidoras, taladros, sierras eléctricas, herramientas manuales motorizadas, equipos de cómputo y otros dispositivos requeridos en los procesos constructivos diarios.

Imagen 23 Mes de ENERO 2026



imagen 24 mes de febrero 2026



Fuente: Archivo de Interventoría

Lectura anterior: 219.006 kWh – mes enero
Lectura actual: 324.390 kWh – mes febrero

Nota: El consumo registrado corresponde a un mes de operación de la nueva subestación, la cual es compartida con: HUSRT en los servicios de: (tomografía, sala de observación (sala era), batería sanitaria, departamento penal) contratista consorcio urg san Rafael (construcción de la torre urgencias piso 1 y 2).

Este registro permite llevar un control eficiente del uso de los recursos y facilita la evaluación del impacto energético del proyecto.

6. MANEJO INTEGRAL DE AREAS DE OBRA

La organización y mantenimiento de las áreas de obra es fundamental para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades del proyecto. Esto implica mantener espacios de trabajo limpios, ordenados y correctamente delimitados, así como asegurar una adecuada señalización y distribución de las zonas operativas, logísticas y administrativas. Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad del personal, optimizar el desarrollo de las labores y promover prácticas responsables con el entorno.

Imagen 25 Orden y aseo



Fuente: Archivo de Interventoría

NOTA: La interventoría verifica que el contratista mantenga el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza, lo cual permite contar con espacios más seguros y funcionales para la circulación del personal que desarrolla sus actividades en esta zona. Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad, prevenir posibles incidentes y favorecer el desarrollo eficiente y organizado de las labores en obra.

7. PROGRAMA No 5 FOMENTO DE EMPLEO

Como parte del desarrollo del proyecto, se ha promovido la generación de empleo local mediante la vinculación de mano de obra calificada y no calificada proveniente de la comunidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato. Esta estrategia contribuye a la disminución del desempleo y al fortalecimiento del sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo del departamento.

Por su parte, la interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, verificando la cantidad y procedencia del personal vinculado. Como resultado de esta verificación, se presenta la siguiente relación:

Tabla 14 procedencia del personal de obra

Personas del departamento	**11**
Personas de otros departamentos	13
TOTAL	24

Fuente: Archivo de Interventoría

De acuerdo con la tabla anterior, que se registra un total de 24 trabajadores del consorcio vinculados al proceso constructivo. De estos cuales, 11 son colaboradores pertenecen al subcontratista del departamento donde se ejecuta la obra, mientras que los 13 restantes provienen de otros departamentos, evidenciando una participación conjunta en el desarrollo del proyecto.

8. INSPECCIONES AMBIENTALES POR INTERVENTORIA

Durante el mes de febrero se realizaron recorridos de verificación ambiental en el área de obra con el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para el proyecto. Estas actividades permiten revisar aspectos relacionados con la adecuada gestión de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y la implementación de acciones orientadas a prevenir, mitigar o corregir posibles impactos ambientales. En este sentido, la interventoría efectuó las correspondientes inspecciones ambientales durante el periodo, obteniendo los siguientes registros:

Tabla 15 inspecciones en obra ambientales

INSPECCIÓN	OBSERVACIÓN
Materiales de construcción	Están almacenados en áreas definidas, delimitadas y cubiertas. el contratista cuenta con dos lugares de acopio de materiales de construcción en obra.
Materiales pétreos	Se encuentran protegidos contra lluvia y viento (lonas, cubiertas, estivas) si están en lugares apropiados y debidamente protegidos.
Los materiales peligrosos y no peligrosos	Se acopian de forma correcta. Si están debidamente señalizados y separados por puntos de acopio (punto ecológico) que permite realizar su selección más eficiente

Fuente: Archivo de Interventoría.

Durante el mes de FEBRERO, las inspecciones ambientales realizadas por la interventoría evidenciaron un manejo adecuado de la segregación de residuos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental y promoviendo buenas prácticas en la gestión de residuos, el control de emisiones y el uso responsable de los recursos naturales. Estas actividades permiten identificar de manera oportuna posibles riesgos y prevenir impactos negativos sobre el entorno, reforzando el compromiso con la sostenibilidad en la ejecución de la obra. Adicionalmente, el contratista se encuentra implementando acciones de mejora en los procesos actuales para optimizar aún más la gestión ambiental.

En el Anexo 1.9 se encuentra en inspecciones ambientales

Sugerencias de residuos:

- ✓ Los residuos se segregan en la fuente (reciclables, ordinarios, peligroso RCD) Si se cuenta con tres puntos ecológicos en obra para mitigar este punto.
- ✓ Preservar contenedores rotulados con colores normativos si se cuenta con uno, esta una zona de acopio para los residuos ordinario y no ordinarios.
- ✓ Los residuos peligrosos se almacenan en recipientes adecuados y cerrados. Si se cuenta con 8 canecas con tapa que permite tener los residuos fuera de la intemperie.
- ✓ Se dispone de registro de entrega de gestores autorizados. Si esta la empresa URBASER Y MARES para el tema de residuos peligrosos y ordinarios.

Manejo de sustancias químicas

- ✓ Las sustancias químicas se almacenan en áreas específicas y señalizadas, si se cuenta con un cuarto de sustancias donde se está señalizado con su respectivo pictograma de colores de las sustancias catalogadas como peligrosas.
- ✓ Los recipientes están debidamente rotulados con nombre de la sustancia y pictograma de peligro, si están los tarros con su respectivo rotulo correspondiente a la sustancia a utilizar.
- ✓ Se cuenta con hojas de seguridad disponibles y accesible sen obra, si esta se encuentra en el cuarto de almacén a disposición de la persona o entidad que se requiera verificar la información.
- ✓ El personal está capacitado en manejo seguro de sustancias químicas, si se realiza capacitaciones de formación sobre uso correcto de los químicos en obra.
- ✓ Existe kit de emergencias o plan de contingencia en caso derrames o fugas, si se cuenta con un kit de emergencias para enfrentar cualquier derrame que se presente en obra..

HALLAZGOS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) efectuada por la interventoría, no se registraron hallazgos durante el periodo. Tanto la interventoría como la supervisión HUSRT constataron un adecuado desempeño en la obra, destacando aspectos como la correcta señalización, la organización y

almacenamiento de materiales, la gestión ordenada de las áreas de trabajo y el uso apropiado de los elementos de protección y medidas ambientales, evidenciando un cumplimiento adecuado de los protocolos durante la ejecución de las actividades de obra.

9. CONTROL DE VISITANTES.

La interventoría supervisa la presencia de personal en la obra que, aunque no participa directamente en las labores constructivas, cumple un papel complementario esencial para la supervisión y apoyo de las actividades del proyecto HUSRT. Este grupo abarca proveedores de materiales, visitantes y personal del hospital, quienes deben contar obligatoriamente con la afiliación vigente a la seguridad social para poder acceder a las instalaciones. Con el fin de garantizar el control y seguimiento de estas personas, se mantiene un registro detallado que se presenta a continuación.

Tabla 16 control de personal

Visitantes	N. de personal
Proveedores	2
Personal HUSRT	4
Total	**6**

Fuente: Archivo de Interventoría

En el Anexo 1.10 se encuentra en control de visitantes

AUSENTISMO

A continuación, se relaciona al personal del consorcio CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH por ausentismo para este periodo:

Tabla 17 Ausentismo

NOMBRE	CAUSA	DÍAS
Fredy Rodríguez	Licencia por luto	5
	Total	**5 días**

Fuente: Archivo de Interventoría

Nota: El seguimiento de interventoría para el ausentismo en obra, permite identificar las causas recurrentes de inasistencia del personal durante el periodo, facilitando la implementación de medidas preventivas y correctivas que contribuyan a mejorar la continuidad operativa, el bienestar de los trabajadores y la eficiencia en el desarrollo de las

actividades en obra.

A continuación, se discriminan de la siguiente manera:

- Ausentismo por accidente laboral cero (0).
- Ausentismo por enfermedad general 0.
- Ausentismo por permiso personal 0
- Ausentismo por calamidad familiar 1

10. CONCLUCIONES

Como conclusión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se puede afirmar que durante el periodo evaluado se ha evidenciado un cumplimiento adecuado de los protocolos establecidos, destacando la correcta señalización, el uso apropiado de los equipos de protección personal, la organización de las áreas de trabajo y la gestión responsable de riesgos. Estas prácticas contribuyen a prevenir accidentes y enfermedades laborales, promoviendo un entorno seguro y saludable para todo el personal involucrado en la obra, y reflejan el compromiso tanto del contratista como de la interventoría con la cultura de seguridad en el desarrollo del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda ir entregando la documentación a medida que se va generando.

- Contar con la organización de las diferentes áreas de funcionamiento del hospital a fin de minimizar el riesgo con terceros.

- Contar con la organización de las diferentes áreas de funcionamiento del hospital a fin de minimizar el riesgo con terceros.

- Se recomienda contar con una correcta señalización de las áreas de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, trabajadores y terceros, así como facilitar la movilidad y organización dentro del hospital.

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.1 SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-04, 11:52:54 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82906079

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-05 12:38:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SODINSA SA				
Documento	NI 811033318	**Dirección**	DG 65D #42 - 24 CONQUISTADORES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3513121		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	26
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	YEPES YEPES GUSTAVO ALONSO	**Identificación**	CC 70078226		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1128266981		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					YEPES ESTRADA CATALINA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-04, 12:02:23 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82783234

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-10 11:11:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA SAS				
Documento	NI 901566308	**Dirección**	CL 32A #72 - 63		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137262639		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HINCAPIE URIBE LUIS GUILLERMO	**Identificación**	CC 71588845		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43640564		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODAS MORENO CLARA MARIA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.341.692	230201		16 %	$ 6.341.692	$ 1.014.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.341.692	$ 253.700	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 6.341.692	$ 441.400	CCF04	4 %	$ 6.341.692	$ 253.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.014.700	$ 0	$ 0	$ 253.700	$ 441.400	$ 253.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.963.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-04, 11:44:56 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82985098

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI890934041 LOS CASTORES CONSTRUCTORES SAS

PAGADA 2026-02-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LOS CASTORES CONSTRUCTORES SAS				
Documento	NI 890934041	**Dirección**	CL 50 #46 - 36 ED FURATENA 904		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2506092		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	9
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RAMOS BUITRAGO JULIAN DAVID	**Identificación**	CC 1018419793		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71216752		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIRALDO QUINTERO JORGE DAIRO	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	19	19	19	19			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.108.907	$ 77.200	CCF04	4 %	$ 1.108.907	$ 44.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
	X						C								0	19	19	19	19			F	$ 2.100.000	230201		16 %	$ 1.330.000	$ 212.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.330.000	$ 92.600	CCF04	4 %	$ 1.330.000	$ 53.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-04, 11:08:01 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 83048504

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI901155456 SCS INGENIERIA SAS

PAGADA 2026-02-16

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SCS INGENIERIA SAS				
Documento	NI 901155456	**Dirección**	CL 63C #42 - 24 CASA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3002043710		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ESTRADA GARCIA DAVID	**Identificación**	CC 1010138464		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020440559		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MUÑOZ ZAPATA LEIDY JOHANNA	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.035.640	230301		16 %	$ 6.035.640	$ 965.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.035.640	$ 241.500	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 6.035.640	$ 420.100	CCF04	4 %	$ 6.035.640	$ 241.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 965.800	$ 0	$ 0	$ 241.500	$ 420.100	$ 241.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.868.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-19, 11:39:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83108840

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 19/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VISTA INGENIERIA SAS		
Documento	NI901063194	**Dirección**	CL 42 #60 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127316418
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ COLORADO RICARDO	**Identificación**	CC 1037626269
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037626269	RICARDO GOMEZ COLORADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 500.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 80.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 1.778.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 500.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 80.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.778.400	$ 0	$ 1.778.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 12:38:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84130516

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH		
Documento	NI902020164	**Dirección**	CR 11 #27 - 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	261938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CELIS BEDOYA LILIANA DEL SOCORRO	**Identificación**	CC 42679338
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010121910	LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA	01	00	X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.456.667	$ 233.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.456.667	$ 58.300	6,960	$ 1.456.667	$ 101.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.456.667	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.100
CC 1049349065	JOSE MIGUEL PALMERA LARIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00	X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 88273429	SAID FERNANDO LARROTTA MADERA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 7154851	FREDDY RAMON RODRIGUEZ PIAMO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 1.900.400	$ 475.300	$ 826.800	$ 475.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.677.800	$ 0	$ 3.677.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 12:45:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83882282

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URG SAN RAFAEL		
Documento	NI901752359	**Dirección**	DG 74D #32 BB - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4883991
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAÑOLA AGUIRRE DIANA DARLENE	**Identificación**	CC 43341527
Total Afiliados	46	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000637359	LESLY DAHIANA ARBELAEZ ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1006415950	YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1010121720	ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017164101	CONSTANZA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 1049655328	NESTOR ANDRES CHAPARRO GRASS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1049657535	JOHN JAIRO BENAVIDES RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1050602788	MAURICIO SALAMANCA CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 66.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.400
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 133.334	$ 21.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1053282088	ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 120.000	$ 19.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/03/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83882282** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.680.000	$ 67.200	6,960	$ 1.680.000	$ 117.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200
CC 1056075701	YEFER VICENTE BERNAL TORRES	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1056075701	YEFER VICENTE BERNAL TORRES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1067815402	WALFRAN ENRIQUE ALVEAR TORRECILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1070806365	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1093742377	LUCDWIG ANDRES LARROTTA MADERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1115915923	RICARDO ANDRES MONROY ROSAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 18923104	JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 32144038	ANDREA PELAEZ TERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 40051344	EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 71171727	OMAR ALBERTO BEDOYA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.230.000	$ 356.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.230.000	$ 89.200	6,960	$ 2.230.000	$ 155.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.230.000	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.500
CC 7161668	NELSON GEOVANNY WILCHES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7166053	FABRICIANO TORRES RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7172373	LUIS MIGUEL MEDINA PIÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 133.334	$ 21.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 133.334	$ 21.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 7180353	LUIS FERNANDO PULIDO SANTIAGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 7305011	JOSE CRISANTO GARCIA CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 80394482	OSWALDO MALDONADO MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 85444640	ALFREDO MANUEL LUQUE PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 88202999	JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 9675071	PLINIO ALCIDES PIRATOBA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
PT 5274244	JOSFRAN RAFAEL ROJAS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6483717	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/03/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83882282** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 7037276	LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 14.062.900	$ 3.494.900	$ 6.030.100	$ 3.466.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.054.400	$ 0	$ 27.054.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.2 PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** 402-FIT-XP-FM1. **IDENTIFICACION** # 20.

OPERARIO Manuel Avila **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 155	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 97	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26.		27-02-26.		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel					
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** XP-245-TIP **IDENTIFICACION** # 20.

OPERARIO Wolfan Ayear. **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 179 **MARCA** XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							
		FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 17 **MARCA** XP.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-HT-24 EM. **IDENTIFICACION** #20.

OPERARIO Yerney Patiño **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 361	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, raiaduras, corrosión)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		\	\			\	\	\	\	\	\
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 12	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		\	\	NA		\	\	\	\	\	\
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓				✓							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T/A		T/A				T/A							
	* Estado de los seguros de los ganchos	T/A		T/A				T/A							
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]							
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz				Laura Ortiz							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sosega **MODELO** 210+1T- X16H **IDENTIFICACION** # 25

OPERARIO Jafl Rodriguez **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 423	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 18	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 21-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz.		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sofega **MODELO** 2354 4-2421 **IDENTIFICACION** #27.

OPERARIO Jairo espinoza **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 421	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sofega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 25	23-02-26		24-02-26		25-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA X1P	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 10106 MT-X4-6M **IDENTIFICACION** # 15

OPERARIO JOSE CORREA **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 181	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO	23-02-26		24-02-26		25-02-26		FECHA		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	MT		MT		MA		MA		MH					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	/		/		/		/		/					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** Uot xp-6M. **IDENTIFICACION** AH 18.

OPERARIO OSCAR ARISTIZABAL. **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 180	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 412	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T°A		T°A		T°A		T°A		T°A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA	
	* Estado de los seguros de los ganchos	FA		FA		FA		FA		FA		FA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	OSCN		OSCN		OSCN		OSCN		OSCN					
	INSPECCIONÓ	Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA X P. **MODELO** 402 - XIT - XP - TM1 **IDENTIFICACION** #1 17.

OPERARIO Fabian edibrando **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 166 MARCA X P														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 1107 MARCA X P.	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T'M		T'M		T'M		N/A		T'M					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T'A		T'A		T'A		T'A		T'A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	T'A		T'A		T'A		T'A		T'A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Lcdo Ortiz		Lcdo Ortiz		Lcdo Ortiz		Lcdo ortiz		Lcdo ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	XP	**MODELO**	402-MIF-X4-6M,	**IDENTIFICACION**	
OPERARIO	(Andres) Prof	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO	~~FECHA~~		24026		~~23-02-25~~		25-02-26		27-02-26		~~FECHA~~		~~FECHA~~	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (ruptura en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			TA		TA		TA		TA					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA		24-01-26		25-01-26		26-01-26		27-01-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			Andres O		Andres O		Andres O		Andres O					
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega	**MODELO**	XP_402-FIT-01	**IDENTIFICACION**	# 18.
OPERARIO	Fabriciano Torres	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 424	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 16	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T/A		T/A		T/A		T/A		T/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T A		T T		T A		T A		T A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	T A		T A		T A		T A		T A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Insafe	**MODELO**	Insafe.	**IDENTIFICACION**	# 09.
OPERARIO	Jaofren Rojas	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 1504. MARCA In safe.	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO S/	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA xp.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26.		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T'H		T'T		T'A		T'A							
	* Estado de los seguros de los ganchos	T'H		T'T		T'A		T'A							
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	JOSFIAN		JOSFIAN		JOSFIAN		JOSFIAN							
	INSPECCIONÓ	LOUD Ort·7		LOUD Ort·7		LOUD Ort·7.		LOUD Ort·7							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.3 ACTA DE CONFORMACION VIGIA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día **03** de febrero del 2026, en las instalaciones del **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (CAMPAMENTO DE OBRA)**, siendo las 10:00 AM, se reunieron representantes de la dirección y colaboradores para conformar el comité de convivencia laboral, comprendido para los años 2026 a 2028 dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 3461 de 2025. El periodo de los miembros del comité de convivencia laboral es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del comité de convivencia laboral, así como la capacitación requerida.

Orden del Día

1. Nombramiento del miembro del comité de convivencia laboral como representantes por parte el empleador y trabajadores.

Desarrollo del Orden del Día

1. Los representantes de la dirección y de los trabajadores de la empresa nombraron como su representante a: JOSE PALMERA

2. Integrando el comité de convivencia laboral se procedió de acuerdo a la resolución 3461 de 2025 a nombrar una persona, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.

3. Siendo las 10:55 AM, se da lectura al contenido de la presente acta, siendo aprobada en unanimidad en todo su contenido.

Se firma y se da por terminada la reunión.

José Palmera.

JOSE PALMERA
1.049.349.065

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.4
CAPACITACIONES SST

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO		Cap. Riesgo Psicosocial y Funciones CCL		
FECHA 11/02/2026		FEBRERO 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		LAURA SUAREZ		
TIPO DE EVENTO		**Charla ( )** **Inducción ( )** **Curso Taller ( )** **Capacitación (X)** **Otros ( )** **Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	7154851	CONSORCIO ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88273429	CONSORCIO ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1049349065	CONSORCIO ACH	
4	German Rodriguez	7'184.104.	consorcio ACH	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Powered by CamScanner

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO		Charla seguridad manejo de cargas		
FECHA		FEBRERO 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		LAURA SUAREZ		
TIPO DE EVENTO		**Charla (X) Inducción ( ) Curso Taller ( ) Capacitación ( )** **Otros ( ) Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	7154851	CONSORCIO ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88273429	CONSORCIO ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1049349065	CONSORCIO ACH	
4	Gamon Rodriguez	7'189.104	consorcio ACH	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Powered by CamScanner

	CONSORCIO ACH	FECHA: 15/01/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 2

NOMBRE DEL EVENTO		Cap. Practicas de trabajo seguro y manejo de extintores		
FECHA 25/02/2026		Febrero 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		Laura Suarez		
TIPO DE EVENTO		**Charla ( ) Inducción ( ) Curso Taller ( )** **Capacitación (X) Otros ( ) Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	PPT 7154851	Consorcio ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88,273,429	Consorcio ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1,049,349,065	Consorcio ACH	
4	Carmen Rodriguez	9'184.104	Consorcio ACH	

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.5
INDUCCIONES

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FORMATO Código : F-SST-02	
		Versión: 01 Fecha: 24/01/26	Página 1 de 1

INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Fecha: 12/02/2026
Nombre del Trabajador: Laura Lorena Suarez
Cedula: 1010122910
Cargo: Coordinadora HSEQ
Encargado de la Inducción: Laura Ortiz

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a la compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Socialización de Políticas
- Socialización de Objetivos
- Socialización de Responsabilidades
- Socialización de Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral
- Socialización de Peligros y Riesgos
- Socialización Matriz IPEVR
- Socialización de Actos y Condiciones inseguras
- Socialización EPP
- Socialización del COPPAST
- Socialización del Comité de Convivencia
- Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Yo, como trabajador del consorcio Infraestructura ACH estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados y socializados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor y el cuidado de mi salud.

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, Procedimientos Generales de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, Las políticas, y demás información pertinente al SG-SST. Por lo tanto me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere que afecte mi salud y condiciones de trabajo.
Duración de la inducción: 1:00 Hora

Firma: 

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.6 INSPECCIONES DE PERMISOS DE TRABAJO

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CONSORCIO	LISTA DE CHEQUEO DE ARNES DE SEGURIDAD						
NOMBRE TRABAJADOR	Fabriciano tovar	**CARGO**	Ayudante.		**FRENTE DE TRABAJO**	Tenes. pisc.	
Serial:	XP- 224-14 WAY.	**CONVENCIONES: SI -NO- NA**					
Modelo:	2025.	**FECHA**	**DESDE**	02-02-26	**HASTA**	07-02-26	**AÑO** 2026.
1	**CONDICION DEL TEJIDO O CORREA**	***LUNES***	***MARTES***	***MIERCOLES***	***JUEVES***	***VIERNES***	***SABADO***	***DOMINGO***
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas							
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido							
1.3	Grietas							
1.4	Estiramiento excesivo							
1.5	Deterioro general							
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos							
1.7	Quemaduras							
2	**COSTURAS**							
2.1	Cortaduras							
2.2	Deshilachamiento							
2.3	Hilos faltantes							
2.4	Quemaduras							
2.5	Exposición a productos Químicos							
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**							
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)							
3.2	Picaduras, grietas							
3.3	Deterioro general							
3.4	Defecto de funcionamiento							
3.5	Corrosión							
4.	**PARTES PLASTICAS**							
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)							
4.2	Grietas							
4.3	Cortaduras							
4.4	Piezas faltantes							
4.6	Otros							
Inspector		FIRMA						
Nombre:	Leidy Muñoz	Leidy Muñoz						

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.7
INSPECCIONES DE EQUIPOS

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	LISTA DE CHEQUEO OPERACIONAL DE PULIDORA	

PROYECTO Construcción hospitalización adulto.

Localización o Frente : obra.

Fecha de inicio	09-02-2026.			Fecha de finalización	14-02-2026.
B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA

CODIGO EQUIPO

ITEM	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. Se verificó el voltaje de la Pulidora ?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2. Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no este picado, conexiones con puestas a tierra).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3. Estado del disco (que se encuentren en buen estado general).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4. Arandela guía de sujecion (tuerca adecuada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5. Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6. Estado del suiche de encendido automático.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7. Estado de la guía de la pulidora y (ranura) de la guarda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8. Estado y utilización adecuada de la pulidora según su tarea.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9. Estado físico de la pulidora (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10. Horas trabajadas del equipo														
Vo Bo Supervisor HSEQ														

Observaciones:

Acción correctiva:	Responsable:	COORDINADOR HSEQ

Leidy Muñoz Interventoria de obra.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.8
ENTREGA DE EPP

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-061
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha:
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 20 - 02 - 2026.
AREA INSPECCIONADA: Almacen.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidy Muñoz.

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Jose palmera	Aux. Cocil.	X			X			X		X		X				X			X			
2	Freddy Rodriguez	Vigilante.	X			X			X		X		X				X			X			
3	Sord Iarrotta	Vigilante.	X			X			X		X		X				X			X			
4	Cosme Rodriguez		X			X			X		X		X				X			X			
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA										DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H				
1										A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
2										B- CASCO			
3										C- GUANTES			2. MOTIVACION
4										D- BOTAS			
5										E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
6										F- PROTECTORES AUDITIVOS			
7										G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
8										H- OTRO			
9										Cual? _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
10													

OBSERVACIONES: Se entrega de forma adecuada los EPP.

FIRMA: Leidy Muñoz
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: Leidy Muñoz.
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 1.9
INSPECCIONES AMBIENTALES

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

INSPECCION AMBIENTAL

Ítem	Ítem de Verificación	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Acopio de Materiales				
1,1	¿Los materiales de construcción están almacenados en áreas definidas y delimitadas?	X		
1,2	¿Se encuentran protegidos contra lluvia y viento (lonas, cubiertas, estibas)?	X		
1,3	¿Los materiales peligrosos y no peligrosos se acopian de forma separada?	X		
1,4	¿Se evita el contacto directo de materiales con el suelo (uso de estibas)?	X		
2. Segregación de Residuos				
2,1	¿Los residuos se segregan en la fuente (reciclables, ordinarios, peligrosos, RCD)?	X		
2,2	¿Se cuenta con contenedores identificados y rotulados con colores normativos?	X		
2,3	¿Los residuos peligrosos se almacenan en recipientes adecuados y cerrados?	X		
2,4	¿Se dispone de registros de entrega a gestores autorizados?	X		
3. Manejo de Sustancias Químicas				
3,1	¿Las sustancias químicas se almacenan en áreas específicas y señalizadas?	X		
3,2	¿Los recipientes están debidamente rotulados con nombre de la sustancia y pictogramas de peligro?	X		
3,3	¿Se cuenta con Hojas de Seguridad disponibles y accesibles en obra?	X		
3,4	¿El personal está capacitado en manejo seguro de sustancias químicas?	X		
3,5	¿Existe un kit de emergencia o plan de contingencia en caso de derrames o fugas?	X		

OBSERVACIONES: De acuerdo a las recomendaciones dadas por la interventoría.

CORRECCIÓN o ACCIÓN CORRECTIVA (Todo hallazgo debe registrarse junto con la corrección o acción correctiva realizada).	**RESPONSABLE**	**EFICAZ**	
		SI	**NO**
No se reportan acciones correctivas			

Leidy Muñoz: Interventoría.
Fecha: 03-02-2026

Powered by CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 2

POLIZAS
CONTRATISTA DE OBRA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

De conformidad con el Manual de Contratación de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, y de conformidad con la Resolución No. 203 de 2021 "Por medio del cual se hace una delegación de funciones" en la cual el gerente de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja designa para la aprobación de pólizas al **Subgerente Administrativo y Financiero** de la Institución.

Que en la fecha se procede a realizar la aprobación de la garantía única presentada por **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** con (NIT/CC:)**: 902.020.164-7** para amparar el contrato **No. 665** de **2025**, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA".**

Para el efecto, se recibe la Póliza de Garantía Única que ampara, **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA,** Póliza **No M-100287952 Anexo 2** fecha de expedición **del 19 de enero de 2026**, expedida por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,** con vigencia desde el 15/01/2026 hasta 30/04/2031, la cual presenta los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
X CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 674.795.596.15	15/01/2026	30/10/2026
X BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.349.591.192.31	15/01/2026	30/04/2026
X PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 674.795.596.15	15/01/2026	30/04/2029
X CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.349.591.192.31	15/01/2026	30/10/2026
X ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 1.349.591.192.31	15/01/2026	30/04/2031

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Póliza **No M-100075245 Anexo 2** con fecha de expedición **el 19 de enero de 2026**, expedida por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
X RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 700.362.000.00	15/01/2026	30/04/2026

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja a través del contrato **No. 665** y en consecuencia se imparte la aprobación de las Pólizas de Garantía **No M-100287952 Anexo 2 y No M-100075245 Anexo 2.**

En constancia se firma en Tunja, a los veintiún (21) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026)

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reviso: Yanyti Cecilia Pinilla P.
Coordinadora área de Contratación
Elaboro: Yuli Paola Ropero
Tecnólogo Administrativo – Contratación

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100287952** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** Asegurado o Beneficiario: **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA / E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA** , expedida por la Compañía en **19/01/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **19** días del mes **ENERO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: h97S314RvsTvXEuBRFrHng==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100287952	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15042516	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**No. DOC. IDENTIDAD**	902.020.164-7
DIRECCIÓN	DG 74 D 32 B B 25	**TELÉFONO**	3137832867
ASEGURADO	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.800.231-0
DIRECCIÓN	CRA 11 NO. 27-27	**TELÉFONO**	6087405030
BENEFICIARIO	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.800.231-0
DIRECCIÓN	CRA 11 NO. 27-27	**TELÉFONO**	6087405030

OBJETO DE CONTRATO

* MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS A PARTIR DEL 15/01/2026.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 665 DE 2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
-
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ANANDA INGENIERIA S.A.S. NIT: 901097641 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - VILLA SAN JOSE DEL AVE MARIA S.A.S. NIT: 901763600 (PART. 70,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	674.795.596,15	1.331.103,64
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/04/2026	1.349.591.192,31	970.596,41
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/04/2029	674.795.596,15	5.550.887,06
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	1.349.591.192,31	2.662.207,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2026	24:00 Horas Del 30/04/2031	1.349.591.192,31	16.879.133,68
		TOTAL ASEGURADO	$ 5.398.364.769,23	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GYAR SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	27.393.928,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	27.393.928,07
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	5.206.328,33
TOTAL A PAGAR	$	32.608.056,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Juliana Delis Bedoya
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100287952	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15042516	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH)
-
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: AeBUSBNKnykGoTaspC+BlQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100075245	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15042532	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**No. DOC. IDENTIDAD**	902.020.164-7
DIRECCIÓN	DG 74 D 32 B B 25	**TELÉFONO**	3137832867
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**No. DOC. IDENTIDAD**	902.020.164-7
DIRECCIÓN	DG 74 D 32 B B 25	**TELÉFONO**	3137832867
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

* MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS A PARTIR DEL 15/01/2026.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.665 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700.362.000,00	700.362.000,00	700.362.000,00	604.422,00
PATRONAL	700.362.000,00	700.362.000,00	700.362.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	700.362.000,00	700.362.000,00	700.362.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	700.362.000,00	700.362.000,00	700.362.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 700.362.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GYAR SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	604.422,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	604.422,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	115.790,18
TOTAL A PAGAR	$	725.212,18

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Juliana Delis Bedoya
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100075245	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15042532	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - ANANDA INGENIERIA S.A.S. NIT: 901097641 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - VILLA SAN JOSE DEL AVE MARIA S.A.S. NIT: 901763600 (PART. 70,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE INCLUYE COMO ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL AL E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 2

POLIZAS INTERVENTORIA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

De conformidad con el Manual de Contratación de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, y de conformidad con la Resolución No. 203 de 2021 "Por medio del cual se hace una delegación de funciones" en la cual el gerente de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja designa para la aprobación de pólizas al **Subgerente Administrativo y Financiero** de la Institución.

Que en la fecha se procede a realizar la aprobación de la garantía única presentada por **CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN** con (NIT/CC:)**: 902.020.105-2** para amparar el contrato **No. 664** de **2025**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ÁLTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".**

Para el efecto, se recibe la Póliza de Garantía Única de acuerdo con el acta de inicio que ampara, **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** Póliza **No M-100287237 Anexo 2** fecha de expedición **del 23 de enero de 2026**, expedida por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,** con vigencia desde el 15/01/2026 hasta 30/04/2031, la cual presenta los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
X CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 36.279.073.79	15/01/2026	30/10/2026
X PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 36.279.073.79	15/01/2026	30/04/2029
X CALIDAD DEL SERVICIO	$ 72.558.147.59	30/04/2026	30/04/2031

Pólza **No M-100075084 Anexo 2** con fecha de expedición **el 23 de enero de 2026**, expedida por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
X RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000.00	15/01/2026	30/04/2026

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza, la misma se ajusta a lo requerido por la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja a través del contrato **No. 664** y en consecuencia se imparte la aprobación de las Pólizas de Garantía **M-100287237 Anexo 2 y No M-100075084 Anexo 2.**

En constancia se firma en Tunja, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026)

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reviso: Yamyd Cecilia Pinilla P.
Coordinadora área de Contratación

Elaboro: Yuli Paola Ropero
Tecnólogo Administrativo – Contratación

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100287237** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION** Asegurado o Beneficiario: **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA / E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA** , expedida por la Compañía en **23/01/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **23** días del mes **ENERO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jOV/4gmTbnplCfKF9EFfpw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100287237	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15044312	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	902020105-2
DIRECCIÓN	CR 25 A 38 D SUR 111	**TELÉFONO**	3004517774
ASEGURADO	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891800231-0
DIRECCIÓN	CRA 11 NO. 27-27	**TELÉFONO**	6087405030
BENEFICIARIO	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891800231-0
DIRECCIÓN	CRA 11 NO. 27-27	**TELÉFONO**	6087405030

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUROS MUNDIAL DEJA CONSTANCIA QUE CONOCE EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 664 DE 2025 CONTADO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2026 Y CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2026.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 664 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	36.279.073,79	85.877,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 30/04/2029	36.279.073,79	358.119,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/04/2026	24:00 Horas Del 30/04/2031	72.558.147,59	1.088.969,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 145.116.295,17	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GYAR SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.532.965,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.532.965,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	292.213,00
TOTAL A PAGAR	$	1.830.178,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

VISTA
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100287237	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15044312	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - VISTA INGENIERIA SAS NIT: 901063194 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS INGENIERIA SAS NIT: 901155456 (PART. 30,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION)

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +pGBtQRuKddm0c7Qi+hxMA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100075084	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15044317	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	902020105-2
DIRECCIÓN	CR 25 A 38 D SUR 111	**TELÉFONO**	3004517774
ASEGURADO	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	902020105-2
DIRECCIÓN	CR 25 A 38 D SUR 111	**TELÉFONO**	3004517774
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUROS MUNDIAL DEJA CONSTANCIA QUE CONOCE EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 664 DE 2025 CONTADO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2026 Y CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2026.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.664 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	402.948,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GYAR SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	402.948,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	402.948,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	77.510,00
TOTAL A PAGAR	$	485.458,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

VISTA
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100075084	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	15044317	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/01/2026	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - VISTA INGENIERIA SAS NIT: 901063194 (PART. 70,0 %)
INTEGRANTE 2 - SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS INGENIERIA SAS NIT: 901155456 (PART. 30,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 3

BITÁCORA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

30/01/26 Viernes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil, 12 ayudantes, 4 oficiales. ——
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora - trontadora, carmix, volqueta, minicargador
Actividades Ejecutadas: ——
Fundido de concreto pantalla, llegado de materiales, sanitarios tuberia y accesorios. ——
GERMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRA.
RGC.
Residente Interventoria

31/01/26 Sabado estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil. 12 ayudantes, 4 oficiales. ——
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, mincargador. ——
Actividades Ejecutadas: ——
Suministro fraguado y amarre de acero para pantallas. ——
GERMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE OBRA.
RGC
Residente Interventoria.

01/02/26 Domingo estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil 12 ayudantes, 4 oficiales. ——
Interventoria: Residente, profesional SST
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro trontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ——
Suministro de andamios y camillos para amarre de acero vigas y placa transitable.

Powered by CamScanner

GERMAN RODRIGUEZ
R OBRA

RGC
Residente Interventoria.

02/02/26 Lunes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra! Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria! Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: Ensamble de andamio y camillos, para amarre de acero para vigas y placa transitable, perforación para la instalación de puntos, de desaques para unidades sanitarias. ———

GERMAN RODRIGUEZ
R OBRA

RGC
Residente Interventoria.

03/02/26 Martes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria! Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Ensamble de andamio y camillas para amarre de acero para vigas y placa. Transitable instalación de puntos y encofrado, hidratacion y curado del concreto, Suministro e instalación de tuberia sanitaria. (arañas) bajo placa.

GERMAN RODRIGUEZ
R OBRA

RGC
Residente Interventoria.

JUAN
Clara Rodas - Interv.

04/02/26 Miercoles estado del tiempo Soleado.
Personal en obra! Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar, civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———

Powered by CamScanner

Interventoria: Residente, profesional SST
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro
trontadora, comix volqueta minicargador.
Actividades ejecutadas: ———————
Fundido de concreto para vigas (1ra fundida)
viga canal y placa transitable, hidratación y
curado de concreto. ———————

GERMAN RODRIGUEZ R. RGC
R OBRA Residente Interventoria

05/02/26 JUEVES estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST
maestro general, almacenista, auxiliar civil,
14 ayudantes, 4 oficiales. ———————
Interventoria: Residente, profesional SST
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro
trontadora, comix, volqueta, minicargador,
Actividades ejecutadas: ———————
Fundido de concreto para vigas (1ra fundida)
viga canal y placa transitable, hidratación
y curado del concreto. ———————

GERMAN RODRIGUEZ RGC
R OBRA. Residente Interventoria.

06/02/26 Viernes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST
maestro general, almacenista, auxiliar civil,
14 ayudantes, 4 oficiales. ———————
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, ta-
ladro, trontadora, comix, volqueta, minicargad
Actividades ejecutadas: ———————
Desencofrado de viga, mampostería en ce-
bierto, perforación para la instalación de
puntos de olesaque para vivladas Sanita-
rios. ———————

GERMAN RODRIGUEZ
RGC
Residente Interventoria
RODRA

08/02/26 Sabado estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST
maestro general, almacenista, auxiliar civil.
14 ayudantes, 4 oficiales.
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro,
tronzadora, carmix, volqueta, minicargador,
Actividades ejecutadas:
Mamposteria en cubierta, Suministro e
instalación de tuberia Sanitaria (cañas) bajo placa

GERMAN RODRIGUEZ
RGC
RODRA
Residente Interventoria.

09/02/26 Lunes estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST
maestro general, almacenista, auxiliar civil.
14 ayudantes, 4 oficiales.
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro,
tronzadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas:
Mamposteria en cubierta, perforación para la
instalación de puntos, de desagues para pocetas

GERMAN RODRIGUEZ:
RGC
RODRA
Residente Interventoria.

10/02/26 Martes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: profesional SST, Residente.
maestro general, almacenista, auxiliar civil,
14 ayudantes, 4 oficiales.
Interventoria: Residente. profesional SST.
equipos: Herramienta menor, polidora, taladro.
Tronzadora, carmix. volqueta, minicargador.

Powered by CamScanner

Actividades ejecutadas: ———
Hamposteria en cubierta, Suministro e instalación de tuberia Sanitaria (arenal) bajo placa
GERMAN RODRIGUEZ. RGC DUVAN
R OBRA Residente Interventoria Clara Rodas - Interv.

11/02/26 Miercoles estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, frontadora, cormix, minicargador volqueta
Actividades ejecutadas: ———
Hamposteria en cubierta. ———
GERMAN RODRIGUEZ. RGC
R OBRA. Residente Interventoria.

12/02/26 Jueves estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil 14 ayudantes, 4 oficiales, ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, frontadora, cormix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Hamposteria en cubierta y amarre de acero en elementos estructurales (columnetas y vigas).
GERMAN RODRIGUEZ RGC
R OBRA Residente Interventoria.

13/02/26. Viernes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST. maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———

Powered by CamScanner

Interventoria: Residente, profesional SST
Equipos: Herramienta menor- polidora, taladro, frontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Mamposteria en cubierta. ———
GERMAN RODRIGUEZ R C G
ROBAR Residente Interventoria.

14/02/26 Sabado estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST. maestro general, almacenista, auxiliar civil, 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro-frontadora, carmix, minicargador, volqueta.
Actividades ejecutadas: ———
Mamposteria en cubierta, Suministro e instalación de tuberia sanitaria (arenas) bajo placa.
GERMAN RODRIGUEZ R G C
ROBAR Residente Interventoria.

16/02/26 Lunes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, frontadora, carmix, minicargador, volqueta.
Actividades ejecutadas: ———
Encofrado y fundido de elementos estructurales. perforación para la instalación de puntos de desagues para pocetas, ensamble de andamio camillas Suministro y amarre de acero para vigas
GERMAN RODRIGUEZ R G C
R OBAR Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

17/02/26 Martes estado del tiempo Soleado. Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil, 14 ayudantes, 4 oficiales. ——— Interventoria: Residente, profesional SST, Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, tronzadora, carmix, volqueta, minicargador. Actividades ejecutadas: ——— Revestimiento (pañete) sobre muros fachada, oriental, Suministro e instalación de tubería sanitaria (arañas) bajo placa. Ensamble de andamio, camillos, Suministro y amarre de acero para vigas. ——— DUVAN

GERMAN RODRIGUEZ R 06 R6C Clara Rodas - Interv.
R OBRA Residente Interventoria.

18/02/26 Miercoles estado del tiempo Soleado. Personal en obra: Residente, director de obra, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil 14 ayudantes, 4 oficiales. ——— Interventoria: Residente, profesional SST, Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, tronzadora, carmix, volqueta, minicargador. Actividades Ejecutadas: ——— Revestimiento (pañete) sobre muros fachada oriental, perforación para la instalación de puntos de desagues para pocetas, Ensamble de andamio, camillos, Suministro y amarre de acero para viga. ———

GERMAN RODRIGUEZ R 06 R6C
R OBRA Residente Interventoria

19/02/26 Jueves estado del tiempo Soleado Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar civil, 14 ayudantes y oficiales. ———

Powered by CamScanner

Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramiento menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutados. ———
Revestimiento (pañete) sobre muros fachada oriental, suministro e instalación de tubería sanitaria (arañas) bajo placa. Ensamble de andamio, camillos, Suministro y amarre de acero para vigas. ———

GERMAN RODRIGUEZ
R OBRA.

RGC.
Residente Interventoria.

20/02/26 Viernes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxilior civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramiento menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Amarre de acero columnas costado nororiental. revestimiento pañete sobre muros internos. perforación para la instalación de puntos desagues para pocetas. ensamble de andamio, camillos Suministro y amarre de acero para vigas. ———

GERMAN RODRIGUEZ
R OBRA

RGC
Residente Interventorio

21/02/26 Sabado estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxilrar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramiento menor, polidora, taladro, trontadora, carmix, volqueta, minicargador.

Powered by CamScanner

Actividades ejecutadas: ——————
Amarre de acero columnas costado nororiental revestimiento (pañete) sobre muros internos suministro e instalación de tubería sanitaria (aranas) bajo placa, ensamble de andamio camillos, suministro y amarre de acero para vigas. ——————

GERMAN RODRIGUEZ RGC
R OBRA. Residente Interventoria

23/02/26 Lunes estado del tiempo Soleado
Personal en obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar civil, 14 ayudantes, 4 oficiales. ——————
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, trompadora, cermix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ——————
Amarre de acero columnas costado oriental. perforación para la instalación de puntos de desagues para pocetos, ensamble de andamio camillos, suministro y amarre de acero, para vigas. ——————

GERMAN RODRIGUEZ RGC
R OBRA Residente Interventoria.

24/02/26 Martes estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Director, Residente, profesional SST, maestro general, almacenista auxiliar civil, 14 ayudantes, 4 oficiales ——
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, trompadora, cermix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas) ——————
Amarre de acero columnas costado nororiental suministro e instalación de tubería sanitaria

Powered by CamScanner

(arañas) bajo placa, ensamble de andamio camillos suministro, amarre de acero para vigas y encofrado. ——— DUVAN J

GERMAN RODRIGUEZ RGC Clara Rodas - Interv.
R OBRA Residente Interventoria.

25/02/26 Miercoles Estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente. profesional SST. maestro general, almacenista, auxiliar SST. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente profesional SST
Equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, troqtadora, cermix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Amarre de acero columnos costado nororiental. perforación para la instalación de pontos de desagues para pocetas, ensamble de andamios camillas, suministro amarre de acero para vigas y encofrado, mamposteria en muros anclajes y amarre de acero para elementos estructorales (columnas y vigetas). ———
GERMAN RODRIGUEZ RGC
R OBRA Residente Interventoria.

26/02/26. Jueves estado del tiempo Soleado.
Personal en obra: Residente, profesional SST. maestro general, almacenista, auxiliar civil. 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST.
Equipos: Herramiento menor, polidora, taladro, troqtadora, cermix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Amarre de acero, columnos costado nororiental y encofrado. ———
GERMAN RODRIGUEZ RGC.
R OBRA Residente Interventoria

27/02/26. Viernes estado del tiempo soleado.
Personal de obra: Residente, profesional SST maestro general, almacenista, auxiliar de obra 14 ayudantes, 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST
equipos: Herramienta menor, polidora, taladro, tronzadora, carmix, volqueta, minicargador.
Actividades ejecutadas: ———
Amarre de acero, columnas costado nororiental y encofrado, amarre de acero columnas costado nororiental y encofrado. Ensamble de andamio, camillas suministro, amarre de acero para vigas y encofrado, mampostería en muros, anclajes amarre de acero para elementos estructurales (columnetas, vigas y vigas). ———

GERMAN RODRIGUEZ RGC.
RODRIA Residente Interventoria

28/02/26 Sabado estado del tiempo Soleado.
Personal de obra: Residente, profesional SST, maestro general, almacenista, auxiliar de civil, 14 ayudantes 4 oficiales. ———
Interventoria: Residente, profesional SST
equipos: Herramienta menor, polidora, taladro tronzadora, volqueta, carmix, ———
Actividades ejecutadas: ———
Amarre de acero columnas costado nororiental y encofrado, ensamble de andamios camillas, suministro amarre de acero para vigas y encofrado, mamposteria en muros anclajes y amarre de acero para elementos estructurales (columnas y vigas).

GERMAN RODRIGUEZ RGC
RODRIA. Residente Interventoria

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 4

ACTA DE INICIO OBRA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-02	ACTA DE INICIO	Página 1 de 1	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

El quince (15) de enero del dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la ciudad de Tunja, los suscritos, mayores de edad, a saber: **VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.329.379, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de una parte; y por la otra, **LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 42.679.338, como Representante Legal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH,** identificado con Nit: 902.020.164-7, como **CONTRATISTA,** y **RICARDO GOMEZ COLORADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.037.626.269, en su condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION,** identificado con Nit. 902.020.105-2, en su condición de Interventor del Contrato de Obra, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH**	NIT: 902.020.164-7	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**		
VALOR:	**$ 6.747.955.961.54**		
NUMERO DE CONTRATO:	**665 DE 2025**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**31/12/2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**15/01/2026**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**29/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		

1. OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CDP No. 2167 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
CDP No. 2 DEL 1º. DE ENERO DE 2026.
CRP No. 2216 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CRP No. 2 DEL 1º. DE ENERO DE 2026.
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, POR PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, POR CALIDAD DEL SERVICIO, POR ESTABILIDAD DE LA OBRA Y POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE FECHA ENERO 15 DE 2026.

2. OBSERVACIONES:
Dar cumplimiento a las Obligaciones Contractuales establecidas en el Contrato No. 665 de 2025.

En constancia se suscribe la presente acta en Tunja, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 665 de 2025.

LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA
R/L. Consorcio Infraestructura ACH
Contratista.

VISTA

RICARDO GOMEZ COLORADO
R/L. CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Interventor Contrato.

Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 4

ACTA DE INICIO INTERVENTORIA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-02	ACTA DE INICIO	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

El quince (15) de enero del dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la ciudad de Tunja, los suscritos, mayores de edad, a saber: **VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.329.379, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de una parte; y por la otra, **RICARDO GOMEZ COLORADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.037.626.269, en su condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION,** identificada con NIT: 902.020.105-2, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION**		NIT: 902.020.105-2
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**		
VALOR:	**$ 362.790.737.94**		
NUMERO DE CONTRATO:	**664 DE 2025**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**31/12/2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**15/01/2026**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**29/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		

1. OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CDP No. 2168 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.
CDP No. 1 DEL 1º. DE ENERO DE 2026.
CRP No. 2215 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CRP No. 1 DEL 1º. DE ENERO DE 2026.
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS POR PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, POR CALIDAD DEL SERVICIO, Y POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE FECHA ENERO 13 DE 2026.

2. OBSERVACIONES:
Dar cumplimiento a las Obligaciones Contractuales establecidas en el Contrato No. 664 de 2025.

En constancia se suscribe la presente acta en Tunja, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

VISTA

RICARDO GOMEZ COLORADO
R/L. CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Contratista.

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 664 de 2025.

Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PRORROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 664 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA Y CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

Entre los suscritos **GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **7.165.970** expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernación de Boyacá y posesionado mediante Acta el día 01 de abril de 2024, como **GERENTE** de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja con Nit. No. **891.800.231-0**, facultado para celebrar contratos de acuerdo al artículo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos del presente contrato se denomina el **HOSPITAL**, por una parte y por la otra, **CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN**, identificada con Nit. No. 902.020.105-2, representada legalmente por RICARDO GOMEZ COLORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.037.626.269, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Prórroga 01 al contrato de Interventoría No. 664 DE 2025 previas las siguientes consideraciones: **1).** Para la vigencia 2025, se celebró Contrato No. 664 cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**", por un valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DÉ PESOS M/CTE ($ 362.790.737,94)** y con un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 2).** Que se suscribió Acta de Inicio el día 15 de Enero del 2026, con fecha de terminación el día 29 de Abril de 2026, por lo cual el contrato se encuentra vigente y en ejecución **3).** Que la supervisión del contrato de Interventoría que adelanta la Subgerencia Administrativa y Financiera, radica Anexo Modificatorio, en la que solicita y aprueba prorrogar el contrato de Interventoría No. 664 de 2025 hasta el 31 de agosto del 2026, Atendiendo a lo siguiente **a)** *Que dada la relevancia de la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable, y jurídica para la construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto de la E.S.E hospital universitario san Rafael de Tunja departamento de Boyacá al contrato de obra para el seguimiento de la ejecución del contrato de obra No 665 de 2025 cuyo objeto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA" se requiere realizar su prórroga hasta el 31 de agosto de 2026.* **b)** *Que dicho contrato de interventoría hace parte del anexo presupuestal de los recursos provenientes en el marco del convenio interadministrativo suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, con numero de convenio C01.PCCNTR.8315399/3822 de 2025 suscrito el día 07 de noviembre como plazo inicial hasta 31 de diciembre y valor de $ 362.790.737,94* **c)** *Que al referido convenio se realizó solicitud de prórroga por un término de 8 meses adicionales, por tal razón el día 09 de diciembre del 2025 contractualmente se suscribió prorroga al convenio No.3822 de 2025.* **d)** *En desarrollo de las labores de control y seguimiento técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable, y jurídica, propias de la interventoría del Contrato No. 664 de 2025, orientado a la supervisión técnica del contrato de obra No 665 de 2025, cuyo objeto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA" evidenciando el seguimiento a la continuidad en las actividades programadas y cumplimiento general de las obligaciones contractuales.* **e)** *Que, por medio de oficio IH-003-2026 del 28 , de enero de 2026, por*

*parte de la interventoría del contrato en mención, se solicita prorroga al contrato 664 de 2025 donde justifica: "Esta Interventoría considera que la ejecución de las actividades presenta restricciones operativas relevantes, derivadas de la necesidad de coordinar trabajos con terceros, particularmente con el consorcio que ejecuta las obras en los pisos inferiores, así como de la obligación de mantener la operación hospitalaria continua (24/7). Estas condiciones limitan los frentes de trabajo simultáneos, reducen los rendimientos esperados y obligan a ejecutar varias actividades en ventanas de tiempo controladas, lo cual impacta los rendimientos de obra de manera directa dentro el plazo contractual. La ampliación del plazo resulta técnicamente necesaria para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la adecuada integración de los sistemas constructivos y la continuidad segura de la operación hospitalaria.", **f)** Que debido a la complejidad técnica de diseño de cada uno de los componentes asociados a la integración, empalme y conexión de las diferentes redes y sistemas que inciden directamente en la construcción del piso de hospitalización y su articulación con la edificación existente. Dicha complejidad impacta de manera directa los rendimientos de ejecución previstos, prolongando el tiempo de permanencia en obra respecto al plazo contractual inicialmente establecido. **g)** Una vez evaluados los diseños por parte de los asesores y elaborado el respectivo plan de trabajo, se determinó que los rendimientos reales de ejecución demandan un mayor plazo al inicialmente pactado, razón por la cual se hace necesaria la ampliación del término contractual, considerando además la necesidad de coordinar actividades específicas con terceros y ejecutar trabajos de contingencia de manera conjunta con el HUSRT y con el consorcio que actualmente ejecuta obras en los pisos inferiores. **h)** Por lo anterior, y con base en la evaluación técnica y administrativa realizada, la supervisión considera procedente la ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 664 de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. **I)** Una vez revisado el cuadro de dedicación de los profesionales y verificadas las obligaciones contractuales, esta supervisión acepta la solicitud presentada por la Interventoría en cuánto al ajuste del porcentaje de dedicación de los profesionales de conformidad con el oficio IH-003-2026 y anexo presentado por el contratista de interventoría.* **4).** La necesidad de realizar **PRORROGA No. 1** al **CONTRATO No. 664 DE 2025,** fue presentada ante el Comité Directivo por parte de la **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASESOR DE GERENCIA Y PROFESIONALES DE APOYO DE LA SUBGERECIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,** la cual fue analizada, señalando la pertinencia de cubrir esta necesidad con la presente **PRORROGA No. 1. 5).** Que la presente Prorroga, se encuentra ajustada a los presupuestos de ley, de conformidad con el artículo 85 de la ley 1474 del 2011 en el que se establece lo siguiente "*CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia (...)*" **6)** De conformidad con lo estipulado en el Código Civil, el contrato es la manifestación de voluntades expresado por las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. **7).** En virtud de dicha autonomía las partes pueden modificar el documento contractual siempre y cuando sea convenido de mutuo acuerdo teniendo en consideración los fines y los principios de que trata la contratación estatal, la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. **8).** Que la Resolución 376 de 2024 mediante la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Entidad establece en su numeral 2 del artículo 37: "***REFORMAS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES:*** *(...)* ***3. Prórroga.*** *Consiste en la ampliación en el tiempo acordado para la ejecución del contrato. Para ello se requiere de la manifestación por escrito del supervisor o interventor en la cual conste su concepto con referencia a la prórroga con los soportes respectivos. Si la solicitud de la prórroga proviene del contratista deberá mediar petición de su parte elevada por escrito en la que consten las razones que justifican la prórroga y avalada con el visto bueno del supervisor o interventor en cual deberá además dar su concepto por escrito a la prórroga solicitada con los respectivos soportes de la aceptación. (...)".* **9).** Que con el fin de dar continuidad a las labores de seguimiento, verificación y control al proyecto objeto de interventoría, es necesario prorrogar la

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES www.hospitalesporlasaludambiental.net

icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 icontec ISO 45001

ejecución del contrato de interventoría por el mismo plazo prorrogado al contrato de Obra, es decir Hasta el 31 de Agosto del 2026, indispensables para el cumplimiento del contrato en mención. **10)** Así las cosas, la Gerencia aprueba la celebración de la **PRORROGA No. 1** al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 664 DE 2025.** En virtud de lo anterior y en ejercicio de la voluntad de las partes se acuerda: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** al plazo inicialmente pactado en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 664 DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2026. PARÁGRAFO 1:** El plazo total de ejecución será: **A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026. CLÁUSULA SEGUNDA - GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías inicialmente suscritas de acuerdo con la presente **PRORROGA No. 1** dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Hacen parte integral de la presente **PRORROGA No. 1:** Oficio No. ACH-002 emitido por el contratista de obra; Oficio IH-003-2026 y Anexo Ajuste Dedicación Personal emitido por la Interventoría: Cronograma de Ejecución de Actividades; Prorroga 01 al convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8560717/3822; solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato ante el Comité Directivo y el Anexo Modificatorio No. 1. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato permanecen inmodificables.

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes y teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4170 de 2011, El Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), se constituye en una plataforma en línea que permite la publicación y suscripción de contratos electrónicos, por lo que, para efectos de perfeccionar y legalizar este contrato se requiere la aprobación electrónica de las partes a través de la plataforma "SECOP II", la cual surte plenos efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto normativamente.

Aprobó: *German Francisco Pertuz Gonzalez (Gerente).*

Revisó: *Yanyd Cecilia Pinilla (Coordinadora Actividades de Contratación).*

Proyectó: *Cristian Camilo Acosta (Profesional de Contratación).*

PRORROGA 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 665 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Entre los suscritos **GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **7.165.970** expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernación de Boyacá y posesionado mediante Acta el día 01 de abril de 2024, como **GERENTE** de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja con Nit. No. **891.800.231-0,** facultado para celebrar contratos de acuerdo al artículo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para loKs efectos del presente contrato se denomina el **HOSPITAL**, por una parte y por la otra, **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** con Nit. No. **902.020.164-7** representado legalmente por **LILIANA DEL SOCORRO CELIS BEDOYA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. **42.679.338,** quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente Prórroga 01 al contrato de obra No. 665 DE 2025 previas las siguientes consideraciones: **1).** Para la vigencia 2025, se celebró Contrato No. 665 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.",** por un valor de **SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($6.747.955.961,54).** y con un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 2).** Que se suscribió Acta de Inicio el día 15 de Enero del 2026, con fecha de terminación el día 29 de Abril de 2026, por lo cual el contrato se encuentra vigente y en ejecución. **3).** Que con oficio ACH-002 de fecha 28 de Enero del 2026, el contratista ejecutor de la Obra, presenta solicitud de prorroga al contrato de obra No. 665-2025, de acuerdo a lo siguiente: **a)** *Muy comedidamente, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente la adición en tiempo del plazo del contrato en referencia, teniendo en cuenta que, una vez realizado un análisis detallado de la información técnica de diseño de cada uno de los componentes por parte de nuestros asesores especializados, se evidenció la complejidad técnica asociada a la Integración, empalme y conexión de las diferentes red s y sistemas que inciden directamente en la construcción del piso de hospitalización y su articulación con la edificación existente.* **b)** *Dicha complejidad impacta de manera directa los rendimientos de ejecución previstos, prolongando el tiempo en cuanto a la ejecución de actividades de obra, afectando al plazo contractual Inicialmente establecido. En ese sentido, y como resultado del análisis técnico efectuado, se exponen a continuación los aspectos que sustentan y justifican fa. presente solicitud:* **I)** *Una vez evaluados los diseños por parte de los asesores y elaborado el respectivo plan de trabajo, se determinó que los rendimientos reales de ejecución demandan más tiempo del inicialmente pactado, razón por la cual se hace necesaria la ampliación del término contractual, considerando además la necesidad de coordinar actividades específicas con terceros y ejecutar trabajos de contingencia de manera conjunta con el HUSRT y con el consorcio que actualmente ejecuta obras en los pisos inferiores.* **II)** *Dentro de estas actividades se destacan, entre otras, los empalmes a redes ya construidas en la torre, todo ello bajo el condicionante de la operación continua del hospital (24/7).* **III)** *El desarrollo de varias actividades críticas depende directamente de la programación del contratista de obra Consorcio URG San Rafael, para poder adelantar trabajos tales como perforaciones, conexiones de la red de descarga de aguas servidas y aguas lluvias, red de suministro, empalme de redes existentes, entre otros, lo cual limita la ejecución autónoma de dichas actividades y condiciona los tiempos de intervención, el consorcio que de acuerdo con la reunión realiza con presencia del equipo profesional de ambos contratos, estiman culminar la ejecución de sus actividades para el mes de mayo del presente año, es*

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesverdesysaludables.net
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 icontec ISO 45001

decir que solo hasta después de esa fecha, puedan ser programadas y ejecutadas actividades criticas para el desarrollo y culminación de nuestro proyecto. ***c)*** *Con base en lo anterior, se evidencia que las circunstancias expuestas son de carácter técnico y operativo, ajenas a la voluntad como contratista, y tienen incidencia directa sobre el plazo de ejecución, razón por la cual se solicita respetuosamente la ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2026, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, y la debida calidad de las obras, así como la continuidad en la operación hospitalaria.* **4).** Que la Interventoría del contrato de obra que adelanta el contratista denominado CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION a través del contrato de interventoría No. 664 de 2025, mediante Oficio OFC No. IH-003-2026 de fecha 28 de Enero del 2026, emite concepto favorable y aprueba la solicitud de Prórroga hasta el 31 de agosto del 2026, de acuerdo a lo siguiente: **a)** *En ejercicio de las funciones ,de seguimiento y control asignadas a la interventoría, y, en atención a la solicitud de ampliación del plazo contractual presentada por el contratista del consorcio de obra en referencia, esta interventoría procedió a realizar un análisis integral de las condiciones técnicas, constructivas y operativas que actualmente inciden en la ejecución del proyecto, emitiendo el siguiente concepto técnico.* **b)** *Como resultado de, la revisión detallada de los diseños oficialmente entregados. el' 26 de enero, la planeación inicial del proyecto, del cronograma contractual vigente y de las condiciones reales dé ejecución en obra, esta interventoría identifica que el proyecto presenta factores de complejidad técnica no plenamente previsible al momento de la suscripción del contrato, asociados principalmente 1 a la integración del nuevo piso de hospitalización con la infraestructura hospitalaria existente.* **c)** *Desde el punto de vista técnico, la interventoría establece que los diseños entregados requieren revisiones adicionales y coordinaciones interdisciplinarias en las áreas arquitectónica, estructural, eléctrica, ventilación y red contra incendios (RCI), los cuales resultan indispensables para garantizar la compatibilidad entre sistemas nuevos y existentes, así como para evitar reprocesos, interferencias y riesgos durante la etapa constructiva. Dichos ajustes inciden directamente en la definición de la ruta crítica del proyecto, afectando la programación inicialmente prevista.* ***d)*** *Adicionalmente, esta interventoría considera que la ejecución de las actividades presenta restricciones operativas relevantes, derivados de la necesidad de coordinar trabajos con terceros particularmente con el consorcio que ejecuta las obras en los pisos inferiores, así como de la obligación de mantener la operación hospitalaria continua (24/7). Estas condiciones limitan los frentes de trabajo simultáneos, reducen los rendimientos esperados y obligan a ejecutar varias actividades en ventanas de tiempo controladas, lo cual impacta los rendimientos de obra de manera directa, dentro del Plazo contractual.* ***e)*** *Así mismo, se evidencia que varias actividades críticas (tales como perforaciones estructurales, empalmes a redes de suministro, redes de aguas servidas y aguas lluvias) no pueden ejecutarse de manera autónoma por el contratista, al depender d la programación, avance y condiciones de obra de terceros, situación que constituye un factor externo de incidencia directa en los tiempos de ejecución, él cual no puede ser atribuible al contratista.* ***f)*** *A partir del análisis técnico realizado, esta interventoría concluye que: Las circunstancias que afectan el plazo contractual no obedecen a Deficiencias de planeación ni a incumplimientos por parte del contratista. La ampliación del plazo resulta técnicamente necesaria para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la adecuada integración de los sistemas constructivos y la continuidad segura de la operación hospitalaria. Forzar la ejecución dentro del plazo contractual vigente, incrementaría el riesgo de afectaciones funcionales, reprocesos, interferencias técnicas y posibles impactos en la prestación del servicio de salud. En consecuencia, esta interventoría remite concepto técnico favorable frente a la adición en tiempo del contrato de obra, recomendando que la ampliación del plazo se defina con base en el cronograma ajustado y en los rendimientos reales de ejecución, encontrando prudente la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2026.* **5).** Que Subgerencia administrativa y financiera, supervisor de la interventoría, presenta Anexo Modificatorio en la que avala la Prórroga, solicitada por el contratista ejecutor de la obra y aprobada por la interventoría de las obras. **6)** La necesidad de realizar **PRORROGA No. 1** al

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 icontec ISO 45001
ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

CONTRATO No. 665 DE 2025, fue presentada ante el Comité Directivo por parte de la **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASESOR DE GERENCIA Y PROFESIONALES DE APOYO DE LA SUBGERECIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,** la cual fue analizada, señalando la pertinencia de cubrir esta necesidad con la presente **PRORROGA No. 1. 7).** De conformidad con lo estipulado en el Código Civil, el contrato es la manifestación de voluntades expresado por las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. **8).** En virtud de dicha autonomía las partes pueden modificar el documento contractual siempre y cuando sea convenido de mutuo acuerdo teniendo en consideración los fines y los principios de que trata la contratación estatal, la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. **9).** Que la Resolución 376 de 2024 mediante la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Entidad establece en su numeral 2 del artículo 37: *"**REFORMAS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES:** (...) **3. Prórroga.** Consiste en la ampliación en el tiempo acordado para la ejecución del contrato. Para ello se requiere de la manifestación por escrito del supervisor o interventor en la cual conste su concepto con referencia a la prórroga con los soportes respectivos. Si la solicitud de la prórroga proviene del contratista deberá mediar petición de su parte elevada por escrito en la que consten las razones que justifican la prórroga y avalada con el visto bueno del supervisor o interventor en cual deberá además dar su concepto por escrito a la prórroga solicitada con los respectivos soportes de la aceptación. (...)".* **10).** Así las cosas, la Gerencia aprueba la celebración de la **PRORROGA No. 1** al **CONTRATO DE OBRA No. 665 DE 2025.** En virtud de lo anterior y en ejercicio de la voluntad de las partes se acuerda: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** al plazo inicialmente pactado en el **CONTRATO DE OBRA No. 665 DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2026. PARÁGRAFO 1:** El plazo total de ejecución será **A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026. CLÁUSULA SEGUNDA - GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías inicialmente suscritas de acuerdo con la presente **PRORROGA No. 1** dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Hacen parte integral de la presente **PRORROGA No. 1:** Oficio No. ACH-002 emitido por el contratista de obra; Oficio IH-003-2026 emitido por la Interventoría: Cronograma de Ejecución de Actividades; Prorroga 01 al convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8560717/3822; solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato ante el Comité Directivo y el Anexo Modificatorio No. 1. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato permanecen inmodificables.

3

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes y teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4170 de 2011, El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, se constituye en una plataforma en línea que permite la publicación y suscripción de contratos electrónicos, por lo que, para efectos de perfeccionar y legalizar este contrato se requiere la aprobación electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, la cual surte plenos efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto normativamente.

Aprobó: *German Francisco Pertuz Gonzalez (Gerente).*

Revisó: *Yanyd Cecilia Pinilla (Coordinadora Actividades de Contratación).*

Proyectó: *Cristian Camilo Acosta (Profesional de Contratación).*

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 4

ACTA DE COMITÉ Y MESAS TECNICAS

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	**ACTA DE COMITE**	Versión: 01
		FECHA: 01/06/2023

ACTA No.	#4		
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite tecnico de obra.		
LUGAR:	Sala de juntas Subgerencia	**FECHA:**	11/02/2026.
HORA INICIO:	8:30 am.	**HORA FINALIZACIÓN:**	—

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA
Germán Rodríguez W	CTACH.	3122194648	
Ricardo Cano Cabrera	Interventoría	3005177974	
Laura J. Londoño Saccone	Hospitalización	3016178089	
Melissa Bermúdez G.	HUSRT	3167041381	
Fabian Mateo G.	H.U.S.R.T	3118165354	
Victor Manuel Sanchez	HUSRT	3116228103	
Anderson Fabian Reyes	HUSRT	3112414049.	
CRISTIAN GONZALEZ PACHECO	HUSRT	3138284340	
Carmen F. Ortiz	H.U.S.R.T.	3006782886	
Santiago Chaparro	HUSRT	3204899812	

→ Final Firmas Asistentes

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS A TRATAR :

1. Ajustes Arquitectonicos.
2. Cambio Sistema Eci.
3. —
4. —
5. —
6. —

2. DESARROLLO DEL COMITÉ: Se tratan los siguientes temas:

1) Ajuste Arquitectonicos: #1 arq. Cristian Gomez menciona que realizó ajustes a los diseños arquitectonicos y que fueron actualizados el dia de ayer. Desde obra e interventoria manifiestan que no se ha revisado debido a que no se habia informado de estos ajustes.

#1 arq. Germán Rodriguez solicita actualización de cortes fachada tanto la oriental teniendo en cuenta que ya no va rampa, Ascensor, escalera. #1 arq. Cristian G. menciona que dentro de los mismos ajustes se encuentra actualizado.

3. COMPROMISOS:	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Scanned with CamScanner

. Harq. Cristian Gomez socializa ajustes realizados, donde el dr Perez autoriza este ajuste, el cual no se mantiene la capacidad instalada.

---

2. PCI: El Ing. German Rodriguez pregunta por este tipo de red como se manejará teniendo en cuenta que el desero se encuentra Nebulizado. El arq. Cristian Gomez menciona que dada las condiciones de la obra y teniendo en cuenta la red que se esta construyendo Urgencias nivel 1 y 2 de manera tradicional, solicitan que para el tercer nivel se realice adherencia a este sistema.
Por parte del HUSRT autorizan y/o solicitan que se realice el cambio a este sistema.

3. Memorias electricas: El ing. german Rodriguez solicita Información de Planos en dwg y memorias. A lo cual el Arq. Cristian Gomez menciona que esta Información se encuentra en el drive.

4. Prorroga: El arq. solicita Programación de obra ajustada a los tiempos solicitados. Firma Asistentes

* JHONATHAN ANDRÉS ECHEVERRIA AFLL 1.052.353.713
SUPERVISIÓN TECNICA HUSRT

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	ACTA DE COMITE	Versión: 01 FECHA: 01/06/2023

CONTINUA - 2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

Comite de Obra. #5.

Lugar: Subgerencia. Fecha 18/02/2026

Hora inicio: 9:50am

Desarrollo del comite: Se realiza comite de obra donde se tratan los siguientes temas.

1. El arq. Cristian Gomez solicita que en fachada Occidental entre eje A al D. dejar ladrillo santafe. y el eje D al F1 estucado y pintado.

2. El arq. Cristian Gomez solicita que en circulación 5yr del dejar una puerta de acceso a placa transitable cerca a habitación unipersonal.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSET	3138284340	
Andres Fabian Rojas	HUSET	3112414049.	
Santiago Chaparro	HUSET.	3204894812	
JONATHAN E ASCENCIO	H.U.S.E.T	320 2377977	
JHONATAN ANDRÉS ECHEVERRI	H.U.S.E.T	3114782823	
GERMAN RODRIGUEZ M	CUR6	3123194648	
Fabian Moreno	HUSET	3118165354	
Ricardo Conuy C.	Interventoria	3004519494	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	ACTA DE COMITE	Versión: 01 FECHA: 01/06/2023

ACTA No.	#2.		
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica		
LUGAR:	Subgerencia.	**FECHA:**	02/02/2026.
HORA INICIO:	09:10 am.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00 am.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA
Laura Elizeth Rodriguez S	HUSRT.	[illegible]	
Santiago Chaparro G	HUSRT	Artsanty@gmail.com	
Fabian Moreno	H.U.S.R.T	arq.fabianmoreno@gm.com	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	ARKRISG@GMAIL.COM	
Fabian Arijona	HUSRT	fabianarijona@gmail.com	
GERMAN RODRIGUEZ M	CACH	3123194648	
Ricardo Camacho	Interventoria	3004517779	

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS A TRATAR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ: Se realiza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. El Ing German Rodriguez menciona que en fachada occidental muestra en 2do nivel el piso tecnico en superboard.

El arq. Cristian Gomez solicita que antepechos costado occidental sean de H=1.00mts, material: bloque. Realizar drenaje para evacuacion de aguas.

El arq. Cristian Gomez solicita que la altura de cielo raso sea de ~~2.60~~ mts. (2.60mts).

3. COMPROMISOS:	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisar la norma de antepechos para el espacio de Hospitalizacion.		

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ACTA DE COMITE

Versión: 01

FECHA: 01/06/2023

CONTINUA - 2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

- Fachada Norte: #Ing German Rodriguez solicita ajuste a la fachada de acuerdo a lo comentado en comite tecnico donde se usara el costado Nor-oriental. el espacio proyectado como aula o descanso medico. Por otra parte el Arq. Cristian Gomez Consultara la posible ampliacion de terraza.
- Fachada Oriental: se solicita ajuste de acuerdo a los cambios efectuados en cuanto a que ya no se construira rampa.
  Se define en el presente comites
- Pisos ⇒ Blanco Huila. gravato

Cuartos de aseo ⇒ enchapes.

Trabajo limpio ⇒ Mesa de trabajo con poceta.

Trabajo sucio ⇒ mesa de trabajo con 2 pocetas + vertedero.

Procedimientos & lavamanos + meson con poceta
en Acero inoxidable.

Puerta enfrentada al cuarto de habitacion.
#arq. cristian Gomez menciona que este espacio se amplio y cubre el espacio de canillas.

Estacion de enfermeria: #arq. Cristian Gomez solicita que se realice antepecho en mamposteria y en este instalar las diferentes redes que se requiere.

Cuarto de equipos & la jefe laura R. Solicita 10 tomas dobles. Para regisa y Sund. a nivel bajo para conexion de equipos.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA

	ACTA DE COMITE	Versión: 01
		FECHA: 01/06/2023

CONTINUA - 2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

- Unidades Sanitarias: ducha multifuncional que incluya plato y teléfono en 1solo punto. solicita el Arq. Cristian G.

Sanitario 2. con fluxometro. de acuerdo a lo indicado por el Arq. Cristian Gomez

Lavamanos: Para personal con movilidad reducida. - Hab. #Arq. Cristian Gomez solicita que sean con semipedestal. con griferia tradicional

la Jefe Laura Rodriguez solicita que sensor se utilice en trabajo limpio, trabajo sucio, Procedimientos, Lavapatos.

Lavapatos: 2 [Lavamanos Normal en Acero Inoxidable. Vertedero → con griferia cuello de ganzo.

#Arq. Cristian Gomez y Jefe Laura solicitan ajuste en trabajo sucio y lavapatos en el cual unifiquen el espacio. donde quedarian. 2 resones. donde. el 1ro. cuenta con vertedero + lavamanos circular pequeño + poceta. y en 2do poceta. las dos pocetas son profundas. #este espacio solicitan que por ascencia sea enchapado.

#Filtro tracia cuarto de aseados, la jefe Laura Rodriguez solicita que en este espacio se instale lavamanos ENZO.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	ACTA DE COMITE	Versión: 01
		FECHA: 01/06/2023

CONTINUA - 2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

Habitaciones bipersonales: la jefe Laura y el Arq. Cristian Gomez solicitan que donde va el closet + lavamanos se realiza ajuste donde solicitan dejar solo espacio para closet para instalar 2 muebles de 1.20 mts de ancho por H= 1mts

Llamados de enfermería: la jefe laura Rodriguez solicita que se instale llamados de enfermería en unidad sanitaria, habitaciones, punto de control en estacion de enfermería. Estos van con codigo azul.

Cuartos de Residuos peligrosos y no peligrosos: la jefe laura solicita que este espacio sea enchapado y se instale punto hidrosanitario a fin de realizar lavado y sifon para evacuar el agua.

Red de Ventilación: El ing. German menciona que hay puntos de Retorno que no fueron tenidos en cuenta a lo cual el arq. Cristian Gomez menciona que son puntos donde cuentan con ventilacion Natural - Ventanas.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA	

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR: MESA TECNICA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA TERCER PISO (HOSPITALIZACIÓN ADULTO)

FECHA: 16-02-2026 HORA: 09:20AM LUGAR: SALA JUNTAS SUBGERENCIA

PROCESO: _____ RESPONSABLE: _____

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
GERMAN A RODRIGUEZ W	C. URG	3123194648.	
CRISTIAN GOMEZ PACHECO	HUSRT	3138284340	
Fabian Moreno Gonzalez	HUSRT	311 816 53 54	
Santiago Campos R.	HUSRT	3204899[illegible]	
Anderson Febres Reyes Cadiz	HUSRT	3112414049.	
WILMER ROJAS	HUSRT	3166956[illegible]	
Melissa Bermúdez Guarín	HUSRT	3167043361	
Rosalba Gomez Colmenares	Interventoria	3004517774	

ANEXO (4)

Scanned with CamScanner

Código: CA-F-18	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	MESA TÉCNICA				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	COMITÉ DE OBRA TERCER PISO (HOSPITALIZACIÓN ADULTO)				
PROCESO:		RESPONSABLE:			
LUGAR:	SALA JUNTAS SUBGERENCIA	FECHA:	16-02-2026	HORA DE INICIO:	09:00am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a mesa técnica, el arq. Cristian solicita información sobre si para saber si hay alguna duda por parte del contratista con respecto a planimetria y/o proceso constructivo. La idea es realizar estas mesas técnicas en la medida que se requiera para que no se genere ningún retraso.

Ajustes en fachada Oriental → Estos se realizaran en los planos record por parte del contratista.

En la circulación principal que conduce de norte a sur, dejar puerta ventana en el remate del costado sur para poder tener acceso directo a la terraza del volumen donde funciona actualmente salas cx para poder acceder a los equipos de HVAC para su revisión y mantenimiento. (sugiere el Arq. Cristian).

// Se cierra acta 10:00am //

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

3ER PISO (2)

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 4

ACTA DE GENERADAS POR EL HUST

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR: MESA TECNICA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA TERCER PISO (HOSPITALIZACIÓN ADULTO)

FECHA: 16-02-2026 HORA: 09:20AM LUGAR: SALA JUNTAS SUBGERENCIA

PROCESO: _____ RESPONSABLE: _____

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
GERMAN A RODRIGUEZ W	C. URG	3123194648.	
CRISTIAN GOMEZ PACHECO	HUSRT	3138284340	
Fabian Moreno Gonzalez	HUSRT	311 816 53 54	
Santiago Campos R.	HUSRT	3204899[illegible]	
Anderson Febres Reyes Cadiz	HUSRT	3112414049.	
WILMER ROJAS	HUSRT	3166956[illegible]	
Melissa Bermúdez Guarín	HUSRT	3167043361	
Rosalba Gomez Colmenares	Interventoria	3004517774	

ANEXO (4)

Scanned with CamScanner

Código: CA-F-18	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	MESA TÉCNICA				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	COMITÉ DE OBRA TERCER PISO (HOSPITALIZACIÓN ADULTO)				
PROCESO:		RESPONSABLE:			
LUGAR:	SALA JUNTAS SUBGERENCIA	FECHA:	16-02-2026	HORA DE INICIO:	09:00am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a mesa técnica, el arq. Cristian solicita información sobre si para saber si hay alguna duda por parte del contratista con respecto a planimetria y/o proceso constructivo. La idea es realizar estas mesas técnicas en la medida que se requiera para que no se genere ningún retraso.

Ajustes en fachada Oriental → Estos se realizaran en los planos record por parte del contratista.

En la circulación principal que conduce de norte a sur, dejar puerta ventana en el remate del costado sur para poder tener acceso directo a la terraza del volumen donde funciona actualmente salas cx para poder acceder a los equipos de HVAC para su revisión y mantenimiento. (sugiere el Arq. Cristian).

// Se cierra acta 10:00am //

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

3ER PISO (2)

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 5

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

Tunja, 05 de febrero de 2026

IH-004-2026

Señores,
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: Remisión Informe mes de enero 2025

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe Mensual de Actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de 2026, relacionado con el proyecto de construcción del tercer piso destinado a Hospitalización de Adultos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Lo anterior se remite en cumplimiento de lo establecido contractualmente y con el fin de informar el avance técnico, administrativo y de interventoría del proyecto durante el periodo señalado.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

IH-005-2026

Tunja, 02 de febrero de 2026

Recibí: Febrero 2 - 2026
hora: 9:30 am

Señores,
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: Remisión de observaciones técnicas contenidas en el oficio

Por medio de la presente, nos permitimos remitir formalmente el contenido del Oficio No. ACH-001-26 de fecha 26/01/2026, mediante el cual se realizó revisión técnica a los planos y diseños suministrados en la etapa inicial del contrato.

Dicha revisión de los planos y diseños suministrados se identificaron observaciones generales relacionadas con:

- Falta de información en formato editable y debidamente acotado, especialmente en redes eléctricas, lo que limita la validación técnica y la detección de interferencias.
- Ausencia o insuficiencia de planos arquitectónicos actualizados, particularmente en fachadas y en la integración del nuevo nivel con la estructura existente.
- Inconsistencias en la coordinación arquitectónica y estructural, debido a la falta de definición precisa de elementos como pantallas estructurales y buitrones proyectados desde niveles inferiores.
- Incompatibilidad del sistema de Red Contra Incendios (RCI) propuesto frente al sistema tradicional ya ejecutado en los niveles 1 y 2.

Tunja, 27 de febrero de 2026

IH-006-2026

Señores,
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor del contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: Remisión de plano definitivo red HVAC y RCI

Por medio del presente nos permitimos remitir a la Supervisión los planos definitivos del sistema de HVAC (ventilación – extracción) y RCI (Red contra Incendios), correspondiente al proyecto en referencia.

Los documentos adjuntos incorporan los ajustes, revisiones y precisiones técnicas realizadas durante la etapa de revisión, conforme a las especificaciones contractuales, la normatividad vigente aplicable y requerimientos técnicos del proyecto.

La presente remisión se realiza para su conocimiento y para los fines pertinentes dentro del marco de sus competencias, control y seguimiento contractual.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

Gmail CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>

ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO

2 mensajes

Alexis Fabian Moreno Gonzalez <obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co> 9 de febrero de 2026 a las 3:00 p.m.
Para: "consorciointerhospitalizacion@gmail.com" <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>
CC: Victor Manuel Sanchez Vargas <sadmon@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>

ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO, “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

https://drive.google.com/drive/folders/1NlYXWMMb6FnKYPkJjzEGn1eO0qhJKEKo?usp=drive_link

Alexis Fabian Moreno González
Arquitecto
Subgerencia Administrativa y financiera
BX. (57) 7405033 Ext. 2224
Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia
obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co



URHA-002-26 ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO TERCER PISO.pdf
967K

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com> 10 de febrero de 2026 a las 9:20 a.m.
Para: consorcioinfraestructuraach@gmail.com

Buen dia.

Se reenvía link. Suministrado por el HUSRT donde se encuentra información acerca de los diseños del servicio de Hospitalización adulto.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

[Texto citado oculto]

--

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Nit. 902.020.105

URHA-002-26 ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO TERCER PISO.pdf
967K

Gmail CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>

IH-004-2026 REMISION INFROME ENERO 2026 CON ANEXOS OBS

1 mensaje

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com> 17 de febrero de 2026 a las 9:58 a.m.
Para: obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co, sadmon@hospitalsanrafaeltunja.gov.co, melissabermudez513@gmail.com, arkrisg@gmail.com

Buen día.

Adjunto Informe correspondiente al mes de enero 2026.

Se adjunta enlace donde se encuentra la información:

https://drive.google.com/file/d/1p5yauUYOPQyedanEpRb_SlUxEHCG8lO_/view?usp=sharing

Cordialmente,

--

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Nit. 902.020.105

--

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Nit. 902.020.105

Gmail CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>

IH-004-2026 REMISION INFOME ENERO 2026 CON ANEXOS

1 mensaje

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com> 9 de febrero de 2026 a las 10:30 a.m.
Para: sadmon@hospitalsanrafaeltunja.gov.co, obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Buen día.

Adjunto Informe correspondiente al mes de enero 2026.

Se adjunta enlace donde se encuentra la información:

https://drive.google.com/file/d/1SCWiWkpcanMQJ4rVTkYM3LFyT_ylyrup/view?usp=sharing

Cordialmente,
--
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Nit. 902.020.105

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 4

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

Gmail CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>

ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO

2 mensajes

Alexis Fabian Moreno Gonzalez <obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co> 9 de febrero de 2026 a las 3:00 p.m.
Para: "consorciointerhospitalizacion@gmail.com" <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>
CC: Victor Manuel Sanchez Vargas <sadmon@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>

ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO, “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

https://drive.google.com/drive/folders/1NlYXWMMb6FnKYPkJjzEGn1eO0qhJKEKo?usp=drive_link

Alexis Fabian Moreno González
Arquitecto
Subgerencia Administrativa y financiera
BX. (57) 7405033 Ext. 2224
Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia
obrashusrt@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co



URHA-002-26 ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO TERCER PISO.pdf
967K

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com> 10 de febrero de 2026 a las 9:20 a.m.
Para: consorcioinfraestructuraach@gmail.com

Buen dia.

Se reenvía link. Suministrado por el HUSRT donde se encuentra información acerca de los diseños del servicio de Hospitalización adulto.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

[Texto citado oculto]

--

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION
Nit. 902.020.105

URHA-002-26 ENTREGA AJUSTE COMPONENTE TECNICO DISEÑOS PROYECTO TERCER PISO.pdf
967K

Gmail

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION <consorciointerhospitalizacion@gmail.com>

Informe mensual de obra 01 consorcio Infraestructura ACH

1 mensaje

Consorcio Infraestructura ACH <consorcioinfraestructuraach@gmail.com> 6 de febrero de 2026 a las 2:10 p.m.
Para: consorciointerhospitalizacion@gmail.com

Cordial saludo, me permito enviar adjunto informe mensual de obra # 01, correspondiente al mes de Enero del 2026 se incluye el del Área SST
Quedo atento a sus comentarios.

Att
Consorcio infraestructura ACH

2 archivos adjuntos

Informe mensual Enero - 26 ACH.pdf
1476K

INFORME DE GESTIÓN SST Y AMBIENTAL 01.pdf
816K

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 6

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO

AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL, PLACA TRANSITABLE Y FUNDIDA DE CONCRETO

Imagen 1. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 2. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 3. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 4. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 5. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 6. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 7. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 8. Fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 9. Curado de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 10. Amarre de acero - poron



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 11. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 12. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 13. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

Imagen14. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 15. Amarre de acero - poron




Fuente: Elaboración Propia

Imagen 16. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 17. Encofrado

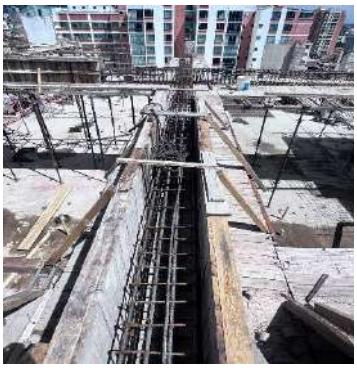

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 18. Encofrado



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 19. Encofrado



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 20. Encofrado



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 21. Encofrado y fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 22. Encofrado y fundida de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 23. Estructura para vigas y placa transitable



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 24. Estructura para vigas y placa transitable



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 25. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 26. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 27. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 28. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 29. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 30. Suministro de concreto



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 31. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 32. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 33. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 34. Desconfrado de elementos




Fuente: Elaboración Propia

Imagen 35. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 36. Desconfrado de elementos

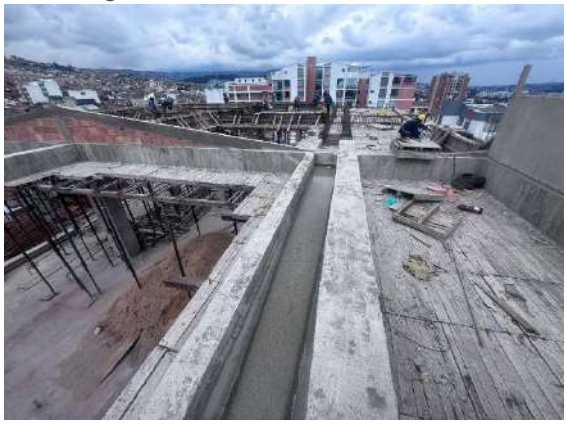


Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO

AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 37. Desconfrado de elementos

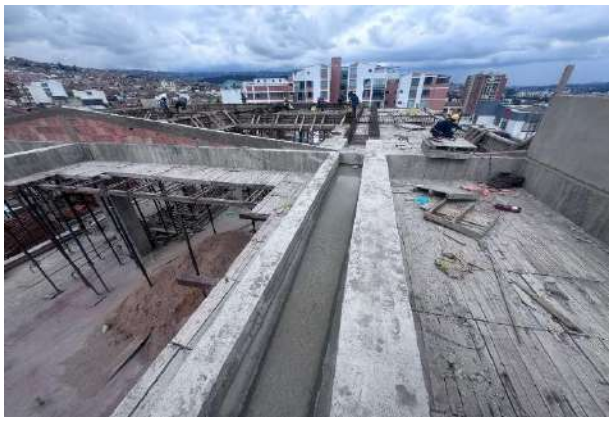

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 38. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 39. Desconfrado de elementos




Fuente: Elaboración Propia

Imagen 40. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 41. Desconfrado de elementos

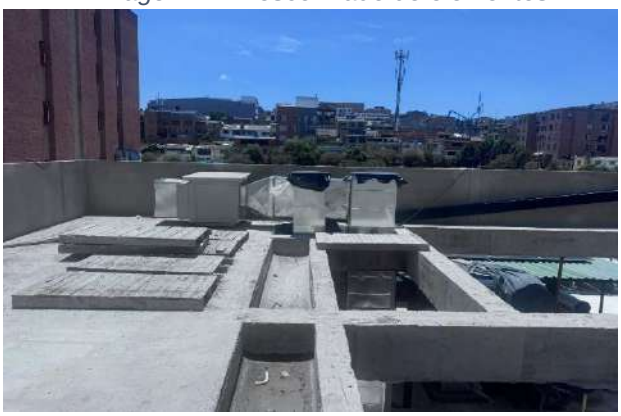

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 42. Desconfrado de elementos



Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL Y PLACA TRANSITABLE.

Imagen 43. Amarre de aceros



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 44. Amarre de acero



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 45. Amarre de aceros



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 46. Fundida de columnas



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 47. Amarre de aceros



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 48. Amarre de acero




Fuente: Elaboración Propia

ANEXO No. 6 REGISTRO FOTOGRAFICO

TORRE DE URGENCIAS - TERCER PISO
MAMPOSTERIA Y ELEMENTROS ESTRUCTURALES CUBIERTA

Imagen 49. Mamposteria y elementos estructurales

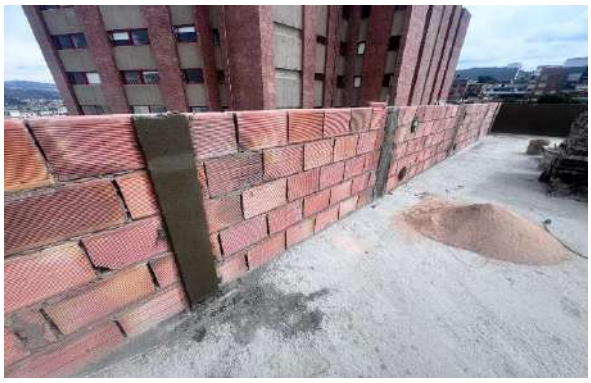

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 50. Mamposteria y elementos estructurales



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 51. Mamposteria y elementos estructurales



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 52. Mamposteria y elementos estructurales



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 53. Mamposteria y elementos estructurales



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 54. Mamposteria y elementos estructurales



Fuente: Elaboración Propia

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

Imagen 55. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 56. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 57. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 58. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 59. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 60. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

Imagen 61. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 62. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 63. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 64. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 65. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia


Imagen 66. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia


TORRE DE URGENCIAS - REMODELACION - SEÑALIZACION

Imagen 67. Estructura metalica

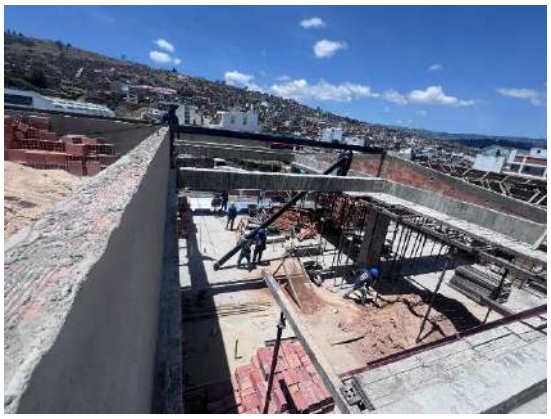

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 68. Estructura metalica

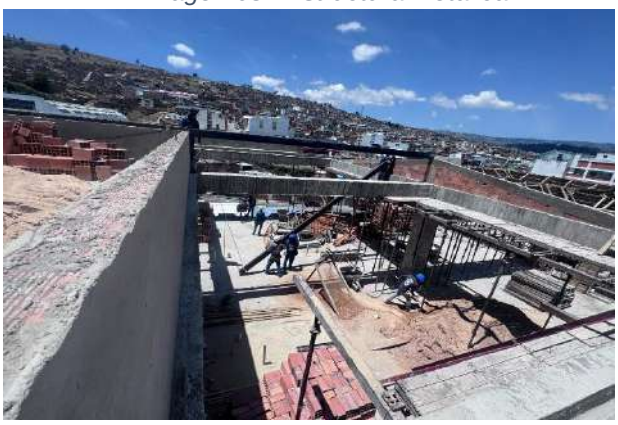

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 69. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 70. Estructura metalica



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 71. Estructura metalica - anclajes



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 72. Suministro e instalacion de pernos



Fuente: Elaboración Propia

PERFORACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y PLUVIAL

Imagen 73. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 74. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 75. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 76. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 77. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 78. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

PERFORACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y PLUVIAL

Imagen 79. Perforacion para instalacion sanitaria



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 80. Perforacion para instalacion sanitaria



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 81. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 82. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 83. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 84. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

PERFORACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y PLUVIAL

Imagen 85. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 86. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 87. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 88. Instalacion de puntos sanitarios



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 165. Instalacion de guardacamillas



Fuente: Elaboración Propia

Imagen 166. Instalacion de señalizacion



Fuente: Elaboración Propia

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 7

INFORME DE OBRA Y SST

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

	INFORME MENSUAL DE OBRA	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.			
CONTRATO DE OBRA	665 DE 2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH			
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT: 820.003.414-4			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACION			
SUPERVISION	HUSRT			
PLAZO	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA INICIO	15/01/2026	
	PRORROGA 1	FECHA TERMINACION	31/08/2026	
VALOR TOTAL	SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($6.747.955.961,54)			
INFORME No:	**2**	DEL 1/02/2026	AL 28/02/2026	
ESTADO DEL TIEMPO		TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES	3	HORAS
PERSONAL	1 Director de obra, 1 Residente de obra - 1 Profesional SST - 1 Maestro general -1 Almacenista - 3 Oficiales - 9 Ayudantes - 1 Operador Carmix - 1 Tecnico electrico - 1 Plomero.			
EQUIPOS EN OBRA	1 Carmix -2 Mezcladoras - 1 Rana - 3 Vibro para concreto - 1 Canguro - 4 Pulidora industrial - 2 Taladro percutor- 1 Planta electrica - 2 Taladro demoledor - 2 Compresor. Camillas y equipo de			
HERRAMIENTA MENOR	Palas - Picas - Palín - Plomada - Palustre - Carretillas - Martillo - Maceta - barras - Seguetas -Boquilleras			
MATERIALES				
Ingresa:	Acero - Cemento - Arena para concreto - Arena de peña - Gravilla - Bloque - Recebo - Aditivos - Recebo comun, formaletas.			
Sale:	Se retira material sobrante excavaciones y demoliciones, chatarra, madera utilizada.			
CONTROL DE CALIDAD				

Se realizan ensayos al concreto mezclado en obra de acuerdo al diseño de mezcla para obtener los 4500 psi que requieren las columnas a fundir segun plano estructural. Se cuenta con diseño de mezcla para el concreto requerido en obra. Se remiten cilindros al laboratorio Lopez Hermanos y SGS Bogotá donde se reciben resultados que se anexan a este informe para las muestras fundidas el presente mes . El concreto utilizado en obra se mezcla con la carmix y se controla dosificacion de agregados, agua y cemento de acuerdo al diseño de mezcla. Se solicitan certificados de calidad de los matariales a los proveedores como el acero. Se verifican y garantizan en campo los correctos procesos constructivos por parte del personal de supervision.





Fotografía 1 y 2. Ensayos concreto columnas piso 3

SST

Se realizan charlas y capacitaciones con el personal relacionadas con inducciones, preoperacionales, ambientales, pausas activas, comites de convivencia, entrega de EPP, concientizacion del buen uso de dotacion, y de cuidado en la ejecucion de labores ejecutadas. Se enfatiza a los trabajadores sobre el cuidado en los trabajos en alturas, se realizan charlas permanentes sobre el correcto uso del arnés y el uso de las lineas de vida. Se realizan actividades de control de calidad en obra.

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**





Fotografía 3 y 4. Capacitaciones y Charlas SST

ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTE MES

AMARRE ACERO PLACA Y VIGAS DE CUBIERTA

Luego de fundir la totalidad de las columnas del bloque se procede a iniciar con el armado de andamios de carga, parales, cerchas, tendido de camillas las cuales conforman la obra falsa para fundida de vigas y placas de cubierta. Luego de esto se procede a verificar lineamientos de vigas, viguetas, viga canal, riostras, etc. las cuales conforman los elementos estructurales de corona o cubierta. Se inicia con amarre de acero de acuerdo al diseño estructural para cada elemento. Se verifican por parte de la supervision las longitudes, diametros, traslapos y de mas controles para verificar calidad en aceros. Se procede a encofrar y testerear para fundida. Se programa la fundida en 2 etapas que comprende fundir un area inicial del Eje A al Eje D y en la siguiente fundida del Eje D hasta el Eje F1, de acuerdo a la cantidad del equipo con el que cuenta la empresa.





Fotografía 5 y 6 Amarre acero vigas





Fotografía 7 y 9 Amarre acero vigas y placa cubierta

FUNDIDA DE PLACA Y VIGAS DE CUBIERTA

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**

Como se indico en la descripcion de anterior item, se amarró acero de vigas y placa entre ejes A al D, Esta area comprende vigas de corona sobre las que se va a apoyar el sistema de cubierta y teja, y placa de cubierta en concreto que se funde monoliticamente, Luego de amarrar acero se encofra y se instala caseton para alijerado de placa, Se utiliza caseton reciclable para esta actividad el cual nos garantiza conformar viguetas, riostras y losa. En esta etapa se utiliza concreto premezclado de 4000 psi, del proveedor Colconcretos y para optimizar el equipo de obra falsa con el que cuenta la empresa se solicita acelerado a 7 dias, para iniciar desmonte de equipo lo antes posible, por lo cual se realizan los ensayos correspondientes al concreto para verificar resistencias y ahi si proceder a retiro de parte del equipo de apoyo. Lo anterior con el fin de ir abriendo espacio en la parte inferior y poder empezar actividades de mamposteria y muros divisorios de las diferntes areas que comprenden este piso. En esta ocacion se funde un aprox de 60 m3. Se toman muestras de acuerdo a la normatividad.





Fotografía 10 y 11. Encofrado y fundida de vigas y placa





Fotografía 12 y 13. Encofrado y fundida de vigas y placa





Fotografía 14 y 15. Encofrado y fundida de vigas y placa

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**




Fotografía 16 y 17 Encofrado y fundida de vigas y placa




Fotografía 18 y 19 Encofrado y fundida de vigas y placa

INSTALACION BAJANTES SANITARIAS

Se procede a realizar replanteo arquitectonico del area, se localizan baños y desagues con el fin de iniciar perforaciones para conectar a red del piso inferior, para lo anterior se utiliza equipo sacanucleos de acuerdo al diametro requerido, estas instalaciones luego se conectaran a la araña inferior que conectara a red de desagues aguas negras.




Fotografía 20 y 21 Perforaciones bajantes sanitarias

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**





Fotografía 22 y 23 Perforaciones bajantes sanitarias

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Luego de fundidad de vigas se procede a iniciar construccion de muros para culatas y áticos, se construye de acuerdo a indicaciones de elementos no estructurales, confinamientos con columnetas y viguetas, grafiles Etc, Se utiliza bloque de arcilla N° 5.





Fotografía 24 y 25 Encamillado vigas





Fotografía 26 y 27 Encamillado vigas

PAÑETES

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA** **28/02/2026**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**FEBRERO**

Se avanza en mamposteria, por lo cual se cuenta con cuadrillas de pañetadores que van detrás de los mamposteros. Se verifican plomos de memposteria pañetes.





Fotografía 28 y 29 Pañetes áticos







Fotografía 30 y 31 Pañetes áticos

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	**INFORME MENSUAL DE OBRA**	**FECHA**
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH	**28/02/2026**
		FEBRERO

OBSERVACIONES

De acuerdo a programacion de obra y teniendo en cuenta el proceso constructivo se evidencia que el plazo contractual requiere sea prorrogado por lo cual se solicita a la entidad contratante autorizar esto todo teniendo en cuanta la justificacion. Las actividades ejecutadas este mes son armado de acero de vigas y placas de cubierta, de aprox el 60 % del area. Se utiliza concreto de 4000 psi, se instala caseton en poliestireno, se utiliza concreto acelerado a 7 dias para obtener resistencia requerida lo antes posible y poder reutilizar el equipo en el siguiente tramo de vigas. Se ingresa personal y se cuenta con apoyo de personal de otra empresa.
- Se solicita programar comites tecnicos de obra semanalmente para aclarar dudas arquitectonicas donde los planos no cuentan con informacion requerida.
- Se presentan lluvias en el area de trabajo. - Se traslada material al piso en construccion mediante pluma - Se inicia coinstruccion de alfajia en ático con lagrimal hacia lado interno de cubierta. Se levantó

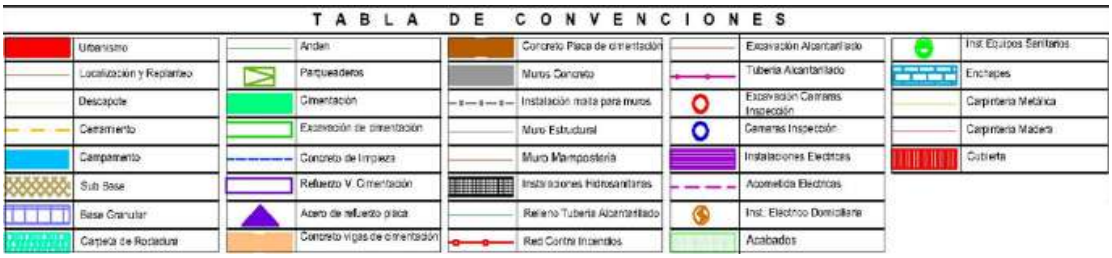

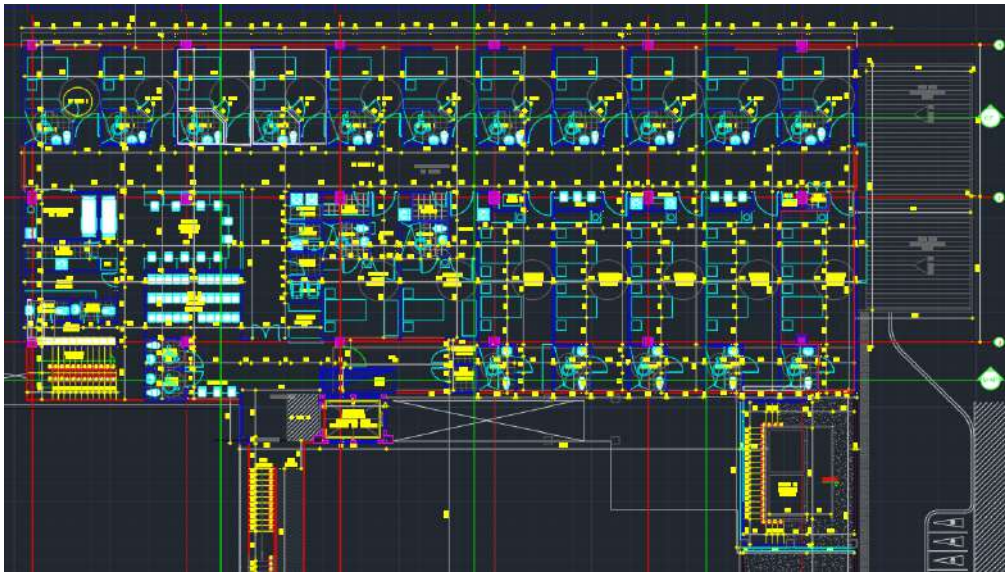

CONSORCIO IACH

INFORME DE GESTIÓN SST Y AMBIENTAL

Informe # 2

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
CONTRATO No. :	665 DE 2025
PRESENTADO POR:	Área HSEQ
RESPONSABLE:	Laura Lorena Suarez Saavedra
CARGO:	Coordinador HSEQ
PERIODO:	01 al 28 de febrero de 2026

Tabla 1. Descripción general informe

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

1. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El control realizado sobre el proceso de afiliación al Sistema de Seguridad Social garantiza que todos los trabajadores cuenten con la protección necesaria en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. Este seguimiento riguroso no solo asegura el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, sino que también fortalece el compromiso institucional con el bienestar, la seguridad y la integridad de su personal. Gracias a este proceso, se promueve un entorno laboral más seguro, justo y conforme a los principios de responsabilidad social. (Ver anexo 1 Planilla SS ACH y Contratistas)

2. POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está diseñado para abarcar a todo el personal vinculado a la organización, incluyendo tanto al personal administrativo y operativo como a proveedores, contratistas y visitantes. A continuación, se detalla el personal que estuvo activo durante el mes de febrero:

INTERVENTORÍA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ESTADO
1	Ricardo Gomez Colorado	Residente interventoría obra	ACTIVO
2	Leidy Johanna Muñoz Zapata	Residente Interventoría SST	ACTIVO
3	Clara maría Rodas Moreno	Director Interventoría	ACTIVO

Tabla 2. Personal interventoría

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Personal operativo:

N°	EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ESTADO
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	7154851	AYUDANTE	ACTIVO
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88273429	AYUDANTE	ACTIVO

Tabla 3. Personal operativo Consorcio Infraestructura ACH

Personal Administrativo:

N°	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ESTADO
3	GERMAN RODRIGUEZ	7184104	RESIDENTE CIVIL	ACTIVO
4	JOSE PALMERA	1049349065	AUX. ADMINISTRATIVO	ACTIVO
5	LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA	1010121910	QHSE	ACTIVO

Tabla 4. Personal administrativo Consorcio Infraestructura ACH

CONTRATISTA:

Como parte del seguimiento y control dentro del marco del proyecto, y en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realiza un registro del personal contratista que participa en su ejecución. A continuación, se relaciona el personal contratista vinculado al proyecto durante el periodo evaluado correspondiente al mes de febrero:

Personal Contratista:

CONTRATISTA	TOTAL
MIGUEL VIASUS	5
CONSORCIO URG SAN RAFAEL	14

Tabla 5. Personal Contratista Consorcio Infraestructura ACH

Personal contratista Miguel Ángel Viasus:

CONTRATISTA MIGUEL ANGEL VIASUS		
CEDULA	**NOMBRE**	**ESTADO**
1049616295	MIGUEL ANGEL VIASUS FRAILE	ACTIVO
1049623749	EDWIN EFRAIN VARGAS GONZALEZ	ACTIVO
1049622887	YAIR JAVIER NUMPAQUE PAIPA	ACTIVO
1082924352	KATERINE MUNEVAR AYALA	ACTIVO
1010048639	EDISON ANDRES VARGAS GONZALEZ	ACTIVO

Tabla 6. Personal Contratista Miguel Viasus

Personal Contratista Consorcio URG San Rafael:

CONTRATISTA CONSORCIO URG SAN RAFAEL		
CEDULA	**NOMBRE**	**ESTADO**
1049657635	JOHN JAIRO BENAVIDES	ACTIVO
7166053	FABRICIANO TORRES RIVERA	ACTIVO
7037276	LUIS YOEL RODRIGUEZ	ACTIVO
80394482	OSWALDO MALDONADO MURCIA	ACTIVO
1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	ACTIVO
1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	ACTIVO
7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	ACTIVO
7161668	NELSON JHOVANY WILCHES	ACTIVO
1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	ACTIVO
18923104	JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	ACTIVO
1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	ACTIVO
1067815402	WALFRAN ENRIQUE ALVEAR	ACTIVO
1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	ACTIVO
1070806365	MANUEL JOSE POLO	ACTIVO

Tabla 7. Personal Contratista Consorcio URG San Rafael

3. REGISTRO DE AUSENTISMO FEBRERO DE 2026

Con el objetivo de realizar un seguimiento efectivo al recurso humano y de fortalecer la gestión del personal en el proyecto, se presenta a continuación el análisis del ausentismo laboral correspondiente a la obra ejecutada por el Consorcio Infraestructura ACH. Este análisis permite identificar las principales causas asociadas a las inasistencias del personal, facilitando la toma

de decisiones orientadas a la mejora continua.

Durante el mes de febrero de 2026, se reportó un total de un evento de ausentismo laboral en la obra, el cual se detalla a continuación:

N	NOMBRE	MOTIVO	DÍAS
1	FREDY RAMON RODRIGUEZ	LICENCIA POR LUTO	5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
		TOTAL	**5 días**

Tabla 8. Registro ausentismo febrero 2026

Aunque el volumen de ausencias se mantiene dentro de los rangos previstos, se mantiene un monitoreo continuo de estas incidencias con el propósito de identificar patrones recurrentes, prevenir impactos en la continuidad operativa y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución del proyecto.

TOTAL	No. DE DIAS
Total, Ausentismos por accidentes de trabajo	0
Total, Ausentismos por enfermedad general	0
Total, Ausentismos licencias	5
Total, días ausentismos en el periodo	5

Tabla 9. Total, registro ausentismo febrero

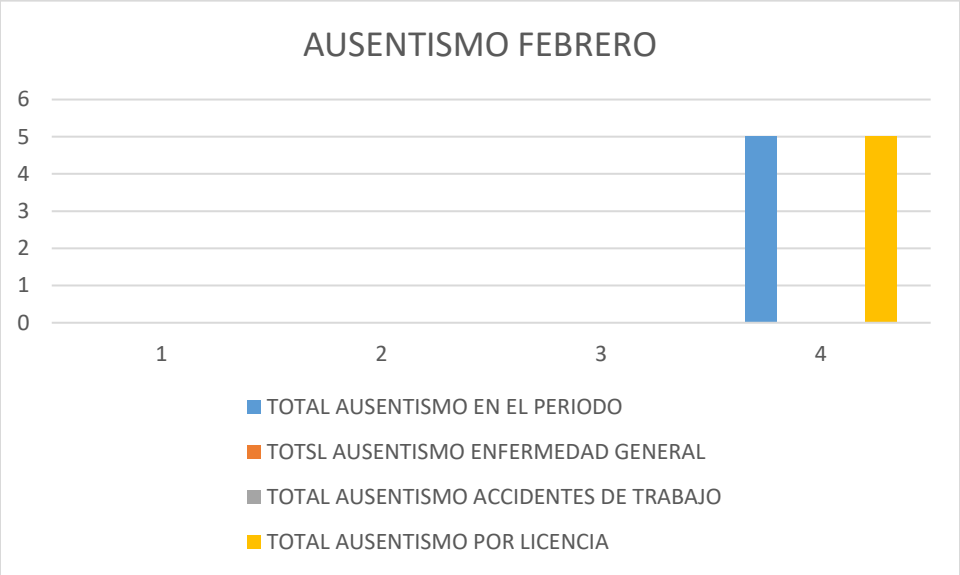


Figura 1. Total, días ausentismo mes de febrero

Durante el mes de febrero un colaborador registró un total de 5 días de ausencia a causa de licencia por luto, lo que representa el 3.33 % de los días laboralmente disponibles según la programación mensual. Si bien este porcentaje refleja un nivel bajo de ausentismo, este ausentismo es debido a causas ajenas al desarrollo cotidiano de la obra.

4. REGISTRO DE INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL

Ingreso de personal Infraestructura ACH mes febrero de 2026

Durante el mes de febrero de 2026, se registra un ingreso por parte del Consorcio Infraestructura ACH. El recurso humano existente continua con el desarrollo de las labores técnicas y operativas en los distintos frentes de trabajo.

INGRESO DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO				
N°	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**
	LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA	1010121910	QHSE	*ACTIVO*

Tabla 10. Registro ingreso de personal a obra

Retiro de personal Consorcio Infraestructura ACH mes febrero de 2026

Durante el mes de febrero de 2026, no se registraron retiros de personal dentro del Consorcio Infraestructura ACH, manteniéndose estable la rotación de colaboradores del equipo de trabajo.

5. REUNIÓN DEL COPASST (VIGIA)

Durante el mes de febrero se realizó el nombramiento del vigía de seguridad cumpliendo con la normatividad vigente. Es de resaltar que, por el numero de trabajadores del consorcio infraestructura ACH, no es posible conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El nombramiento del VIGIA, se realizó el día 03/02/2026 y fue elegido el trabajador SAID FERNANDO LARROTA MADERA



Evidencia fotográfica 1. Fira Nombramiento Vigía

6. REUNIÓN DEL COCOLA

Durante el mes de febrero de 2026 se llevó a cabo la conformación del Comité de Convivencia Laboral, que por el numero de trabajadores solamente es necesario un integrante. Fue designado como miembro del Comité de Convivencia laboral al trabajador JOSE PALMERA.



ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO | ACTA DE CONSTITUCION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | FORMATO Código : F-SST-COL 1 | Versión: 01 Fecha: 03/02/2026 | Página 1 de 1

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día **03** de febrero del 2026, en las instalaciones del **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (CAMPAMENTO DE OBRA)**, siendo las 10:00 AM, se reunieron representantes de la dirección y colaboradores para conformar el comité de convivencia laboral, comprendido para los años 2026 a 2028 dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 3461 de 2025. El periodo de los miembros del comité de convivencia laboral es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del comité de convivencia laboral, así como la capacitación requerida.

Orden del Dia

1. Nombramiento del miembro del comité de convivencia laboral como representantes por parte el empleador y trabajadores.

Desarrollo del Orden del Dia

1. Los representantes de la dirección y de los trabajadores de la empresa nombraron como su representante a: JOSE PALMERA
2. Integrando el comité de convivencia laboral se procedió de acuerdo a la resolución 3461 de 2025 a nombrar una persona, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.
3. Siendo las 10:55 AM, se da lectura al contenido de la presente acta, siendo aprobada en unanimidad en todo su contenido.

Se firma y se da por terminada la reunión.

Jose Palmera

JOSE PALMERA
1.049.349.065

Evidencia fotográfica 2. Acta constitución COCOLA

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO – REUNIONES

Con el propósito de fortalecer la cultura del autocuidado y promover un entorno laboral seguro y saludable, durante el periodo se realizaron dos capacitaciones dirigidas al personal de obra, enfocada en temas de seguridad y bienestar laboral. Las jornadas incluyeron estrategias y prevención de situaciones que afecten el trabajo.

Como evidencia de las actividades, se encuentra anexada las listas de asistencia debidamente diligenciadas por el personal participante. (Ver anexo carpeta, Actividades, capacitaciones).

No.	TEMA	FECHA	NO. DE ASISTENTES	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Cap. Riesgo psicosocial y funciones CCL	11-02-26	4	Equipo SST/ARL	1 HORA
2	Cap. Practicas de trabajo seguro y manejo de extintores	25-02-2026	4	Equipo SST/ARL	1 HORA

Tabla 13. Capacitaciones mes febrero



Evidencia fotográfica 3. Capacitaciones (SG-SST)

Se deja constancia de que no todo el personal subcontratista participó en las capacitaciones programadas, debido a que el horario establecido para su ejecución no coincidía con su jornada laboral. El personal subcontratista cuenta con un horario esporádico y variable, determinado según las necesidades operativas del servicio, por lo que en la fecha y hora en que se llevaron a cabo las capacitaciones no se encontraban prestando funciones.

7. INDUCCIÓN HSE

El proceso de inducción se realiza previamente al inicio de las actividades laborales de todo el personal, sin distinción de su modalidad de vinculación, ya sea empleado directo, asesor independiente, contratista o subcontratista.

Durante esta inducción, se socializan las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el reglamento interno en materia de seguridad, las normas aplicables en obra, así como los peligros y riesgos asociados a las funciones a desempeñar. Se abordan conceptos fundamentales como la diferencia entre peligro y riesgo, las condiciones y actos inseguros, y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y de los Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC). Adicionalmente, se informa al personal acerca de los representantes de los comités, la asignación de responsabilidades y otros aspectos esenciales para garantizar un desempeño seguro en sus labores.

En relación con el componente ambiental, se presentan las normativas vigentes, el manejo correcto de residuos, la ubicación y uso adecuado de los puntos ecológicos, y otros temas clave para la protección del entorno.

Durante el mes de febrero, se registró un ingreso en la obra desarrollada por el Consorcio Infraestructura ACH. La documentación soporte de las inducciones realizadas en el periodo, permanecen debidamente archivadas en la hoja de vida de cada trabajador o en la carpeta correspondiente al proceso de inducción.

8. REINDUCCION HSE

El proceso de reinducción permite reforzar los lineamientos del SG-SST y actualizar al personal sobre los riesgos, procedimientos y responsabilidades que deben asumir en su labor diaria. Gracias a este espacio, se consolidó una cultura de autocuidado cumplimiento normativo y uso adecuado de los elementos de protección, garantizando un mayor control de los riesgos presentes en obra.

Durante el proceso de reinducción del personal se refuerzan las políticas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como el reglamento interno en materia de seguridad y las normativas aplicables en el entorno laboral. Estas sesiones permiten recordar y actualizar al personal sobre los peligros y riesgos asociados a las actividades que desarrollan diariamente, asegurando que continúen aplicando las medidas de prevención de manera adecuada. Durante el mes de febrero no se presentaron reinducciones.

9. ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO Y DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SST

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad comprenden un conjunto de acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, promoviendo hábitos saludables y el mantenimiento de un estado óptimo de salud dentro del entorno laboral del Consorcio Infraestructura ACH.

En el marco de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, se han ejecutado las acciones contempladas en el cronograma de capacitaciones, especialmente aquellas relacionadas con la identificación de peligros y la valoración de riesgos.

Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Pausas activas: Realizadas al inicio de cada jornada, con el objetivo de prevenir trastornos osteomusculares y mejorar el bienestar físico y mental.

Charlas pre-operacionales de 5 minutos: Desarrolladas antes del inicio de labores, enfocadas. Autocuidado- manejo del entorno laboral, charla de protección de los pies, uso de herramientas manuales. Estas actividades tuvieron como finalidad prevenir accidentes y lesiones, fomentar hábitos seguros, fortalecer la conciencia sobre los riesgos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y responsable. Adicionalmente, se llevó a cabo la socialización de las políticas y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).



Evidencia fotográfica 4. Charla y pausas activas



Evidencia fotográfica 5. Charla y pausas activa



Evidencia fotográfica 6. Charla y pausas activas



Evidencia fotográfica 7. Charla y pausas activas

En las fotografías se evidencia a más personal recibiendo pausas activas ya que fueron realizadas en conjunto con el Consorcio URG San Rafael

10. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

El Consorcio Infraestructura ACH ha contratado los servicios de salud ocupacional con la IPS Asociación de Servicios en Salud Ocupacional S.A.S. (ASSOC S.A.S.), entidad encargada de gestionar y archivar el historial clínico del personal vinculado al proyecto.

Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso se encuentran disponibles y están debidamente organizados en las carpetas individuales de documentación de cada trabajador.

Estos exámenes se realizaron conforme a la normatividad vigente, garantizando la evaluación de la aptitud médico-laboral del personal antes del inicio de sus actividades, lo cual contribuye a preservar la salud y seguridad de los colaboradores durante el desarrollo del proyecto.

11. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES

La comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales es un componente clave dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ya que permite que los trabajadores estén debidamente informados sobre su estado de salud y las recomendaciones médicas necesarias para un desempeño seguro de sus funciones.

En este sentido, los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales son comunicados a los trabajadores, ya sea de manera verbal o mediante la entrega formal de una carta que contiene las recomendaciones y/o restricciones médico-laborales pertinentes. Esta práctica garantiza la comprensión y el adecuado cumplimiento de las indicaciones emitidas por el profesional en salud ocupacional.

Además, esta documentación forma parte integral del soporte del SG-SST y se archiva en la hoja de vida de cada trabajador, asegurando la trazabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información para los procesos de seguimiento y control.

De esta manera, se fortalece la gestión preventiva y se promueve un entorno laboral saludable, facilitando un adecuado seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y permitiendo la toma de decisiones oportunas para salvaguardar su bienestar y seguridad.

12. ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE

Adoptar un estilo de vida saludable resulta fundamental para mantener un óptimo estado de salud y una adecuada calidad de vida. En este marco, el Consorcio Infraestructura ACH promueve activamente la prevención de conductas de riesgo mediante la socialización, durante el proceso de inducción, de la Política de Alcohol, Tabaquismo y Drogas (código P-SST-01). Esta política establece lineamientos claros y estrictos para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en

el entorno laboral, contribuyendo así a garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los colaboradores.

13. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por la normativa vigente y las políticas internas del consorcio, se garantiza la reposición oportuna de los Elementos de Protección Personal a cada trabajador, cada vez que estos presentan signos de desgaste o deterioro, asegurando así el mantenimiento de condiciones seguras y la protección integral del personal durante la ejecución de sus labores. (Ver anexo carpeta, EPP)

Al inicio de las labores, se realiza la verificación y entrega correspondiente de los EPP requeridos según la actividad a desempeñar, los cuales incluyen:

- Guantes
- Casco de seguridad
- Tapabocas
- Gafas de protección
- Protectores auditivos

	
Evidencia fotográfica 8. Entrega de EPP	*Evidencia fotográfica 9. Entrega de EPP*

Tabla 14. Evidencia fotográfica, entrega de EPP

14. INSPECCION DE SEGURIDAD

Como parte de las acciones orientadas a la prevención de incidentes y al fortalecimiento de la cultura de seguridad, se desarrollan actividades permanentes de control y verificación de las condiciones de trabajo, así como de las herramientas y equipos empleados en la obra. Estas

acciones permiten garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y proteger la integridad del personal durante el desarrollo de las labores.

En este sentido, se realizan inspecciones pre-operacionales a las herramientas y equipos antes de su utilización, con el propósito de verificar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas que puedan generar riesgos durante la ejecución de las actividades. De esta manera, se asegura que todos los equipos cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa vigente y las políticas internas del consorcio. (Ver anexo carpeta: Pre-operacionales).

Adicionalmente, se efectúan revisiones de seguimiento orientadas a verificar el estado y la operatividad de los Elementos de Protección Personal (EPP) del personal, garantizando que se encuentren en condiciones óptimas para su uso y cumplan con los parámetros de seguridad exigidos. (Ver anexo carpeta: Inspecciones).

No.	DESCRIPCIÓN (INSTALACIONES, EQUIPO, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS)	PERIODICIDAD
1	Inspección pre operacional pulidora	Diario
2	Inspección pre operacional taladro	Diario
3	Inspección pre operacional sierra eléctrica	Cuando se opere
4	Inspección pre operacional tronzadora	Cuando se opere
5	Inspección de arnés, eslingas y línea de vida	Diario
6	Inspección de arnés	Diario
7	Inspección pre operacional CARMIX	Cuando se requiere su manejo

Tabla 16. Periodicidad inspecciones

15. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Con el fin de hacer seguimiento a los eventos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, se realiza un monitoreo de los incidentes y accidentes laborales ocurridos durante la ejecución del proyecto. Esta información permite identificar oportunidades de mejora y fortalecer las estrategias preventivas implementadas.

Durante el mes de febrero no se presentaron accidentes de trabajo en la obra ejecutada por el Consorcio Infraestructura ACH. En el caso que se presente algún accidente de trabajo, Se realiza el procedimiento correspondiente de atención, reporte e investigación del evento, conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el compromiso del equipo de trabajo con la prevención y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

16. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A PELIGROS / RIESGOS IDENTIFICADOS

Se implementan medidas de prevención colectiva en la ejecución de actividades en alturas, tales como la instalación de líneas de vida horizontales y verticales, el montaje de andamios y el uso de escaleras debidamente aseguradas como puntos fijos de acceso a superficies elevadas. Estas acciones están orientadas a la mitigación de los peligros y a la reducción del nivel de riesgo previamente identificado en el análisis de condiciones de trabajo.

De manera complementaria, se realiza la demarcación física de zonas de alto riesgo, con el objetivo de mantener condiciones laborales seguras y prevenir incidentes.

Adicionalmente, ante la detección de desviaciones o condiciones sub estándar durante las inspecciones en campo, se implementan acciones correctivas inmediatas, entre las cuales se destacan:

- Emisión de instrucciones correctivas para la adecuada ejecución de trabajos en alturas.
- Realización de orden, limpieza y mantenimiento en los frentes de trabajo.
- Instalación y actualización de la señalización preventiva e informativa en las distintas áreas de la obra.



Evidencia fotográfica 10. Instalación líneas de vida

17. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

En el desarrollo de sus actividades diarias, los trabajadores implementan diversas medidas de prevención y control orientadas a minimizar los riesgos laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Entre estas acciones se destacan el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP), así como de los Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC) cuando la actividad lo requiere. Asimismo, se evidencia la asistencia activa a las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cumplimiento de los protocolos y normas establecidos, la práctica de higiene postural para la prevención de lesiones musculo esqueléticas, y el uso continuo y el recambio diario del tapabocas, como medida de autocuidado y control higiénico-sanitario.

18. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras y fortalecer la cultura de prevención en el proyecto, el Consorcio Infraestructura ACH implementa procedimientos orientados a la identificación y control de riesgos, en cumplimiento con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Previo al inicio de cada actividad, se realiza la apertura de los permisos de trabajo y la socialización del Análisis de Tareas Seguras (ATS), con el fin de que los trabajadores identifiquen los peligros asociados a sus labores y conozcan las medidas de control necesarias para minimizar los riesgos. (Ver anexo carpeta, ATS). Estas acciones se complementan con la verificación del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el control de condiciones de seguridad en herramientas y equipos, garantizando una ejecución segura de las actividades.

En resumen, la correcta aplicación del ATS y la gestión de permisos de trabajo son prácticas clave para prevenir incidentes y asegurar un entorno de trabajo seguro y controlado.

19. ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

La prevención y atención inmediata ante situaciones de riesgo es fundamental en cualquier obra, con el fin de salvaguardar la integridad del personal y minimizar posibles consecuencias. Por ello, se han dispuesto los siguientes elementos para una respuesta oportuna en caso de accidentes o incidentes: una camilla, dos botiquines de primeros auxilios y ocho extintores de incendios con capacidades de 10 y 20 libras.



Evidencia fotográfica 11. Extintor Multipropósito



Evidencia fotográfica 12. Camilla de emergencia

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

20. SERVICIOS DE HIGIENE – DISPOCISION DE BASURAS

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y promover prácticas sostenibles dentro del proyecto, se han implementado medidas orientadas al manejo adecuado de residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra.

En este sentido, se dispone de un área específica para el acopio de residuos, ubicada en la zona norte del frente de obra. Asimismo, se cuenta con puntos de disposición de residuos ubicados en las oficinas y el almacén, cada uno equipado con contenedores debidamente identificados conforme al código de colores establecido por la normativa ambiental. Esta disposición permite una adecuada clasificación de los residuos desde la fuente, promoviendo su manejo responsable, reciclaje y disposición final.

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la cantidad de residuos generados en la obra, diferenciando entre residuos peligrosos, reciclables, no aprovechables y RCD, tanto en las actividades administrativas como operativas.

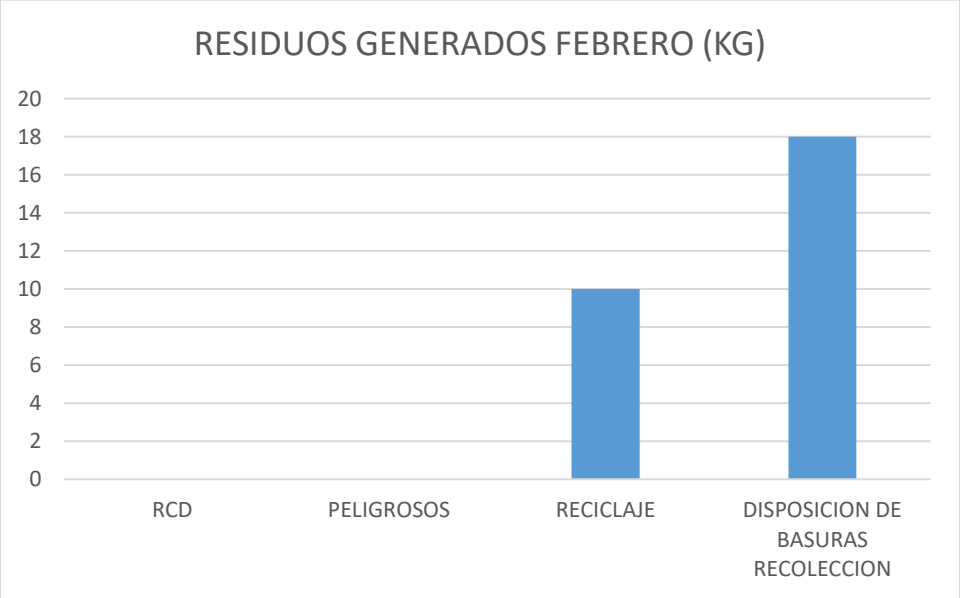


Figura 2. Cantidad de residuos generados mes de febrero

Durante el periodo, se generaron 10 kg de residuos reciclables, 18kg de basura no aprovechable que fue dispuesta de manera correcta con URBASER. Durante el mes de febrero no se generó RCD ni residuos peligrosos.



Evidencia fotográfica 10. Disposición de basuras

El punto de acopio que utilizará el consorcio AHC infraestructura para la disposición final de los residuos generados, será el mismo que utiliza el consorcio URG San Rafael, esto debido a que no hay espacio suficiente en la obra para hacer el montaje de otro.

SERVICIOS SANITARIOS:

Se dispone de cuatro baterías sanitarias destinadas al uso de todo el personal de obra. Estas unidades son sometidas a procesos de limpieza y desinfección, como medida de higiene y parte del protocolo de prevención frente al riesgo biológico.



Evidencia fotográfica 11. Servicios sanitarios

21. MANEJO DE SUSTANCIAS E INSUMOS DE CONSTRUCCION.

Con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad en la obra, se ha implementado una señalización adecuada en las zonas de acopio de materiales y sustancias químicas, conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se dispone de las fichas de datos de seguridad (FDS) correspondientes, accesibles en formato físico y digital, para su consulta oportuna en caso de emergencia o intervención técnica.

	
Evidencia fotográfica 16. Manejo de insumos construcción	*Evidencia fotográfica 17. Manejo de insumos construcción*

	
Evidencia fotográfica 18. Manejo de insumos construcción	*Evidencia fotográfica 19. Manejo de insumos construcción*

	
Evidencia fotográfica 20. Manejo de insumos construcción	*Evidencia fotográfica 21. Manejo de insumos construcción*
	
Evidencia fotográfica 22. Manejo de insumos construcción	*Evidencia fotográfica 23. Manejo de insumos construcción*

22. ANEXOS

ANEXO 1. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

ANEXO 2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANEXO 3. ACTA REUNION COCOLA

ANEXO 4. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS

ANEXO 5. PLANLILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ANEXO 6. ACTA REUNION VIGIA

ANEXO 7. EVIDENCIA ENTREGA EPP

ANEXO 8. INSPECCIONES

ANEXO 9. PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS

ANEXO 10. PREOPERACIONALES

ANEXO 11. INDUCCIONES

ANEXO 12. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

ANEXO 13. RECOMENDACIONES MEDICO OCUPACIONALES

ANEXO 1.

	CONSORCIO ACH	FECHA: 15/01/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 2

NOMBRE DEL EVENTO		CHARLA DE SEGURIDAD DE EXCESO DE CONFIANZA Y PAUSA ACTIVA		
FECHA		09 Febrero 2026	HORA	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO				
TIPO DE EVENTO		Charla (x) Inducción ( ) Curso Taller ( ) Capacitación ( ) Otros ( ) Acta (N° ( )		
N	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	ENTIDAD	FIRMA
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	PPT 7154851	Consorcio ACH	
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88,273,429	Consorcio ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1,049,349,065	Consorcio ACH	
4	German Rodriguez	9`184.104.	Consorcio ACH	

Powered by CamScanner

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO		Cap. Riesgo Psicosocial y Funciones CCL		
FECHA 11/02/2026		FEBRERO 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		LAURA SUAREZ		
TIPO DE EVENTO		**Charla ( )** **Inducción ( )** **Curso Taller ( )** **Capacitación (X)** **Otros ( )** **Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	7154851	CONSORCIO ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88273429	CONSORCIO ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1049349065	CONSORCIO ACH	
4	German Rodriguez	7'184.104.	consorcio ACH	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Powered by CamScanner

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO		Charla seguridad manejo de cargas		
FECHA		FEBRERO 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		LAURA SUAREZ		
TIPO DE EVENTO		**Charla (X) Inducción ( ) Curso Taller ( ) Capacitación ( )** **Otros ( ) Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	7154851	CONSORCIO ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88273429	CONSORCIO ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1049349065	CONSORCIO ACH	
4	Gamon Rodriguez	7'189.104	consorcio ACH	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Powered by CamScanner

	CONSORCIO ACH	FECHA: 15/01/2026 VERSIÓN: 01
	LISTA DE ASISTENCIA	F-SST-A1
	SISTEMA DE GESTION - SST	Página 1 de 2

NOMBRE DEL EVENTO		Cap. Practicas de trabajo seguro y manejo de extintores		
FECHA 25/02/2026		Febrero 2026	**HORA**	7:00AM
RESPONSABLE DEL EVENTO		Laura Suarez		
TIPO DE EVENTO		**Charla ( ) Inducción ( ) Curso Taller ( )** **Capacitación (X) Otros ( ) Acta (N° ( )**		
N	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	FREDDY RAMON RODRIGUEZ	PPT 7154851	Consorcio ACH	Freddy
2	SAID FERNANDO LARROTTA	88,273,429	Consorcio ACH	SAID LARROTTA
3	JOSE PALMERA	1,049,349,065	Consorcio ACH	
4	Carmen Rodriguez	9'184.104	Consorcio ACH	

Powered by CamScanner

ANEXO 2.

ACH INFRAESTRUCTURA	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	FT-SST-114 VERSION 001 SIG-15

INFORMACIÓN GENERAL:				
Obra:	Ciudad: TUNJA	VIGENCIA Desde: 2/02/2026	Hasta:	7/02/2026
Ubicación donde se realiza el trabajo: H.U.S.R.T	Proceso Constructivo: AREA PRODUCTIVA	Descripción de la tarea a realizar: CHARLA DE SEGURIDAD,DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR,INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES,INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR,ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL,DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL, SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO ARMADO DE COLUMNAS, FUNDIDA DE VIGAS Y PLACA TRANSITABLE.		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:				
☐ TRABAJO EN ALTURAS	☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES	☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA	☐ OTRO, CUAL? _____	
☐ TRABAJO EN CALIENTE	☐ IZAJE DE CARGAS	☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar (Manuales, Hidráulicas, Electricas, Mecanicas, Etc.).

Herramienta menor, polichera, taladro, trompadera,

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos	Respetar las normas de seguridad, transitar por areas señalizadas, socializar a equipo de trabajo sobre los riesgos expuestos en las actividades a desarrollar
DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Identificación de puntos criticos y socializacion a equipo de trabajo, casco y botas de seguridad
INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO FISICO	Caidas al mismo y distinto nivel, golpes, machucones, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Señalización y demarcación de las areas de trabajo previo al inicio de las actividades. inspeccion de elementos y herramientas de trabajo, uso de EPPS dentro de la obra
INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO QUIMICO, RIESGO LOCATIVO	Alergias, bacterias, caidas a distinto nivel y mismo nivel	Revision al uso adecuado de los EPP requeridos. Socializar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Golpes, heridas, laceraciones,caidas distinto nivel, tropiezos, lesiones osteomusculares	Uso de los elementos de proteccion personal, inspeccion previa de las labores identificando los peligros en el area. Realizar charla sobre el manejo adecuado de las herramientas e identificar herramientas dañadas
ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, preoperacional de pluma, permiso de trabajo en alturas.
DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, permiso de trabajo en alturas.
SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Cortes, heridas punzantes, lesiones musculares y lumbares,contusiones y fracturas,accidentes incapacitantes	Uso obligatorio de EPP: guantes anticorte, casco, lentes, botas con punta de acero Uso de herramientas en buen estado y con protecciones,Orden y limpieza del área de trabajo,trabajo en equipo para cargas pesadas,señalización del área, permiso de trabajo en alturas.
FUNDIDA PARA VIGAS Y PLACA TRANSITABLE	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Golpes y contusiones,lesiones en manos y dedos,fatiga muscular,fracturas, accidentes incapacitantes	Uso de EPP completo (guantes, casco, lentes, botas),uso de andamios o plataformas estables si aplica,herramientas adecuadas para el amarre, Supervisión constante,Mantener el área libre de obstáculos, Pausas activas para evitar fatiga, permiso de trabajo en alturas.
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	**PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES REQUERIDOS**
ORDEN Y ASEO	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO MECANICO	Resbalones y caidad,golpes o choques,lesiones	Mantener el área de trabajo limpia y libre de obstáculos en todo momento. Usar EPP adecuado durante las labores de aseo (guantes, gafas, tapabocas según corresponda.

EVALUACION DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?	¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, distinguase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles.	☐ Si, procede con la tarea.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:									
NOMBRE DEL EMISOR Y/O AUTORIZANTE									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
GERMAN RODRIGUEZ	7184194	ING AUX RESIDENTE							—
LAURA ORTIZ	1063568123	COORDINADORA HSEQ	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	—

Powered by CamScanner

TRABAJADORES QUE EJECUTARAN LA ACTIVIDAD									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOHN JAIRO BENAVIDES	1040667634	AYUDANTE							—
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	40051344	AYUDANTE	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	—
LUIS YOEL RODRIGUEZ	7937278	AYUDANTE	R	R	R	R	R	R	—
FABRICIANO TORRES RIVERA	71668063	AYUDANTE							—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	1113914794	AYUDANTE							—
JAIRO ESPINOZA RODRIGUEZ	19923104	OFICIAL							—
ANGEL FERNEY PATIÑO	1010117212	AYUDANTE							—
YOLEHAM ANDRES DIAZ	1006418668	AYUDANTE							—
OSCAR DAVID ARSTIZABAL	1065795466	OFICIAL							—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	1067548387	OFICIAL							—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	7198844	OFICIAL							—

Powered by CamScanner

ACH INFRAESTRUCTURA	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	

INFORMACIÓN GENERAL:

Obra:	Ciudad: TUNJA	VIGENCIA Desde: 9/02/2026	Hasta: 14/02/2026
Ubicación desde mi medio al trabajo: H.U.S.R.T	Proceso Constructivo: AREA PRODUCTIVA	Descripción de la tarea a realizar: CHARLA DE SEGURIDAD,DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR,INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES,INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR,ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL,DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL, SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO ARMADO DE COLUMNAS, FUNDICIA DE VIGAS Y PLACA TRANSITABLE.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA ☐ OTRO, CUAL? _____

☐ TRABAJO EN CALIENTE ☐ IZAR DE CARGA ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cualquiera de las herramientas a utilizar (Manuales, Hidráulicas, Electricas, Mecanicas, Etc.)

Taladro, pulidora, extensión, formaleta, martillo, flexómetro, nivel, plomada, cortadora.

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos	Respetar las normas de seguridad, transitar por areas señalizadas, socializar a equipo de trabajo sobre los riesgos expuestos en las actividades a desarrollar
DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Identificación de puntos criticos y socializacion a equipo de trabajo, casco y botas de seguridad
INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO FISICO	Caidas al mismo y distinto nivel, golpes, machucones, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Señalización y demarcación de las areas de trabajo previo al inicio de las actividades. inspeccion de elementos y herramientas de trabajo, uso de EPPS dentro de la obra
INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO QUIMICO, RIESGO LOCATIVO	Alergias, bacterias, caidas a distinto nivel y mismo nivel	Revision al uso adecuado de los EPP requeridos. Socializar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Golpes, heridas, laceraciones,caidas distinto nivel, tropiezos, lesiones osteomusculares	Uso de los elementos de proteccion personal, inspeccion previa de las labores identificando los peligros en el area. Realizar charla sobre el manejo adecuado de las herramientas e identificar herramientas dañadas
ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verificacion de los espacios, uso de EPPS, preoperacional de pluma, permiso de trabajo en alturas.
DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verificacion de los espacios, uso de EPPS, permiso de trabajo en alturas.
SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Cortes, heridas punzantes, lesiones musculares y lumbares,contusiones y fracturas,accidentes incapacitantes	Uso obligatorio de EPP: guantes anticorte, casco, lentes, botas con punta de acero Uso de herramientas en buen estado y con protecciones,Orden y limpieza del área de trabajo,trabajo en equipo para cargas pesadas,señalización del área, permiso de trabajo en alturas.
FUNDICIA PARA VIGAS Y PLACA TRANSITABLE	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Golpes y contusiones,lesiones en manos y dedos,fatiga muscular,fracturas, accidentes incapacitantes	Uso de EPP completo (guantes, casco, lentes, botas),uso de andamios o plataformas estables si aplica,herramientas adecuadas para el amarre, Supervisión constante,Mantener el área libre de obstáculos, Pausas activas para evitar fatiga, permiso de trabajo en alturas.
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ORDEN Y ASEO	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO MECANICO	Resbalones y caidad,golpes o choques,lesiones	Mantener el área de trabajo limpia y libre de obstáculos en todo momento. Usar EPP adecuado durante las labores de aseo (guantes, gafas, tapabocas según corresponda.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, producto a este peligro que ocurra un incidente?	¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, detengase y en presencia con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, tomen medidas.	☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

NOMBRE DEL EMISOR Y/O AUTORIZANTE

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
GERMAN RODRIGUEZ	7184194	SIG AUX RESIDENTE							—
LAURA ORTIZ	1053680123	COORDINADORA HSEQ	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	—

Powered by CamScanner

TRABAJADORES QUE EJECUTARAN LA ACTIVIDAD									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOHN JAIRO BENAVIDES	1049657926	AYUDANTE	John	John	John	John	John	John	—
EYDIN ANDREA MARROQUIN OSTOS	46661344	AYUDANTE	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	—
LUIS YOEL RODRIGUEZ	7937276	AYUDANTE	R	R	R	R	R	R	—
FABRICIANO TORRES RIVERA	7166053	AYUDANTE							—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	1118914784	AYUDANTE							—
JAIRO ESPINOZA RODRIGUEZ	5893104	OFICIAL							—
FERNEY PATIÑO	10101177212	AYUDANTE	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	—
YOLEHAM ANDRES DIAZ	1006410889	AYUDANTE	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	—
OSCAR DAVID ARIZTIZABAL	1006736489	OFICIAL	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	1067548987	OFICIAL							—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	7166044	OFICIAL							—
FREDY RAMON	P.P.T 7164891	AYUDANTE	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	—
SAID LARROTTA	84273429	AYUDANTE	SAID LARROTTA	SAID LARROTTA	SAID LARROTTA	SAID LARROTTA	SAID LARROTTA	SAID LARROTTA	—

Powered by CamScanner

ACH	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	

INFORMACIÓN GENERAL

Obra:	Ciudad: TUNJA	VIGENCIA Desde: 16/02/2026	Hasta: 21/02/2026
Ubicación donde se realiza el trabajo: H.U.S.R.T	Proceso Constructivo: AREA PRODUCTIVA	Descripción de la tarea a realizar: CHARLA DE SEGURIDAD,DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR,INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES,INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR,ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL,DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL, SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO ARMADO DE COLUMNAS, FUNDICA DE VIGAS Y PLACA TRANSITABLE.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES ☐ TRABAJO DE LINEA VIVA ☐ OTRO, CUAL? _____

☐ TRABAJO EN CALIENTE ☐ USO DE GASES ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS _____

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar (Manuales, Hidraulicas, Electricas, Mecanicas, Etc.)

Herramientas menor, polidora, trompadora, taladro.

SECUENCIA OPERADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos	Respetar las normas de seguridad, transitar por areas señalizadas, socializar a equipo de trabajo sobre los riesgos expuestos en las actividades a desarrollar
DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Identificación de puntos criticos y socializacion a equipo de trabajo, casco y botas de seguridad
INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO FISICO	Caidas al mismo y distinto nivel, golpes, machucones, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Señalización y demarcación de las areas de trabajo previo al inicio de las actividades. inspeccion de elementos y herramientas de trabajo, uso de EPPS dentro de la obra
INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO QUIMICO, RIESGO LOCATIVO	Alergias, bacterias, caidas a distinto nivel y mismo nivel	Revision al uso adecuado de los EPP requeridos. Socializar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Golpes, heridas, lacaraciones,caidas distinto nivel, tropiezos, lesiones osteomusculares	Uso de los elementos de proteccion personal, inspeccion previa de las labores identificando los peligros en el area. Realizar charla sobre el manejo adecuado de las herramientas e identificar herramientas dañadas
ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, preoperacional de pluma, permiso de trabajo en alturas.
DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, permiso de trabajo en alturas.
SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Cortes, heridas punzantes, lesiones musculares y lumbares,contusiones y fracturas,accidentes incapacitantes	Uso obligatorio de EPP: guantes anticorte, casco, lentes, botas con punta de acero Uso de herramientas en buen estado y con protecciones,Orden y limpieza del área de trabajo,trabajo en equipo para cargas pesadas,señalización del área, permiso de trabajo en alturas.
FUNDIDA PARA VIGAS Y PLACA TRANSITABLE	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Golpes y contusiones,lesiones en manos y dedos,fatiga muscular,fracturas, accidentes incapacitantes	Uso de EPP completo (guantes, casco, lentes, botas),uso de andamios o plataformas estables si aplica,herramientas adecuadas para el amarre, Supervisión constante,Mantener el área libre de obstáculos, Pausas activas para evitar fatiga, permiso de trabajo en alturas.
SECUENCIA OPERADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ORDEN Y ASEO	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO MECANICO	Resbalones y caidad,golpes o choques,lesiones	Mantener el área de trabajo limpia y libre de obstáculos en todo momento. Usar EPP adecuado durante las labores de aseo (guantes, gafas, tapabocas según corresponda.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible producir o reemplazar (en menos un trabajador?	¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Sí, interrumpir y no proceder con la tarea. Analice con el supervisor responsable el paso a paso, evalúe controles.	☐ Sí, proceda con la tarea.
☐ No, continuar con la tarea con precaución. Implementar los controles establecidos.	☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE DEL EMISOR Y/O AUTORIZANTE

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
GERMAN RODRIGUEZ	7164164	ING AUX RESIDENTE	—	—					—
LAURA ORTIZ	1053880123	COORDINADORA HSEQ	—	—	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	Laura Ortiz	—

Powered by CamScanner

TRABAJADORES QUE EJECUTARAN LA ACTIVIDAD									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOHN JAIRO BENAVIDES	1049957536	AYUDANTE	John	John	John	John			—
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	40561344	AYUDANTE	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	Andrea	—
LUIS YOEL RODRIGUEZ	7937276	AYUDANTE	R	R	R	R	R	R	—
FABRICIANO TORRES RIVERA	7160063	AYUDANTE							—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	1118914794	AYUDANTE							—
JAIRO ESPINOZA RODRIGUEZ	5892314	OFICIAL							—
FERNEY PATIÑO	1019117313	AYUDANTE	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	Ferney	—
YOLEHAM ANDRES DIAZ	1098416998	AYUDANTE	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	—
OSCAR DAVID ARIZTIZABAL	1098796406	OFICIAL	Oszar	Oszar	Oszar	Oszar	Oszar	Oscar	—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	1057545367	OFICIAL	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	7186644	Ayudante							—
FREDY RAMON	P.P.T 7164891	AYUDANTE	—	—	—	—	—	—	—
SAID LARROTTA	84273429	AYUDANTE	SAID LAROTTA	SAID LAROTTA	SAID LAROTTA	SAID LAROTTA	SAID LAROTTA	SAID LAROTTA	—

Powered by CamScanner

ACH	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	FT-SST-44 VERSION 001

INFORMACIÓN GENERAL:

Obra:	Ciudad: TUNJA	VIGENCIA: Desde: 23/02/2026	Hasta: 28/02/2026
Ubicación donde se realiza el trabajo: HUSRT	Proceso Constructivo: AREA PRODUCTIVA	Descripción de la tarea a realizar: CHARLA DE SEGURIDAD,DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR,INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES,INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR,ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL,DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL, SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO ARMADO DE COLUMNAS, FUNDIDA DE VIGAS Y PLACA TRANSITABLE.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES ☐ TRABAJO EN LINEA VIVA ☐ OTRO, CUAL? _____

☐ TRABAJO EN CALIENTE ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS _____

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar (Manuales, Hidraulicas, Electricas, Mecanicas, Etc.)

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos	Respetar las normas de seguridad, transitar por areas señalizadas, socializar a equipo de trabajo sobre los riesgos expuestos en las actividades a desarrollar
DESPLAZAMIENTO INICIO DE LA LABOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Caidas mismo nivel, distinto nivel, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Identificación de puntos criticos y socializacion a equipo de trabajo, casco y botas de seguridad
INSPECCIÓN PARA INICIO DE LABORES	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÀNICO, RIESGO FISICO	Caidas al mismo y distinto nivel, golpes, machucones, tropiezos, esguinse, lesiones varias, ruido	Señalización y demarcación de las areas de trabajo previo al inicio de las actividades. Inspeccion de elementos y herramientas de trabajo, uso de EPPS dentro de la obra
INSPECCIÓN DE EPP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO QUIMICO, RIESGO LOCATIVO	Alergias, bacterias, caidas a distinto nivel y mismo nivel	Revision al uso adecuado de los EPP requeridos. Socializar al personal referente al uso adecuado de los EPP y enfermedades relacionadas con el riesgo.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTA MENOR	RIESGO LOCATIVO, RIESGO MECÀNICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO FISICO	Golpes, heridas, laceraciones,caidas distinto nivel, tropiezos, lesiones osteomusculares	Uso de los elementos de proteccion personal, inspeccion previa de las labores identificando los peligros en el area. Realizar charla sobre el manejo adecuado de las herramientas e identificar herramientas dañadas
ASCENSO Y DESCENSO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, preoperacional de pluma, permiso de trabajo en alturas.
DESCARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL	RIESGO LOCATIVO, RIESGO BIOMECANICO	Lesiones por Manipulacion manual de cargas,golpes, tropezones, caidas de equipo, caidas al mismo y distinto nivel	Uso de herramientas o equipos para evitar sobreesfuerzo, orden y aseo del area, señalizacion para la actividad, verficacion de los espacios, uso de EPPS, permiso de trabajo en alturas.
SUMISTRO INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Cortes, heridas punzantes, lesiones musculares y lumbares,contusiones y fracturas,accidentes incapacitantes	Uso obligatorio de EPP: guantes anticorte, casco, lentes, botas con punta de acero Uso de herramientas en buen estado y con protecciones,Orden y limpieza del área de trabajo,trabajo en equipo para cargas pesadas,señalización del área, permiso de trabajo en alturas.
FUNDIDA PARA VIGAS Y PLACA TRANSITABLE	RIESGO LOCATIVO,RIESGO MECANICO, RIESGO FISICO	Golpes y contusiones,lesiones en manos y dedos,fatiga muscular,fracturas, accidentes incapacitantes	Uso de EPP completo (guantes, casco, lentes, botas),uso de andamios o plataformas estables si aplica,herramientas adecuadas para el amarre, Supervisión constante,Mantener el área libre de obstáculos, Pausas activas para evitar fatiga, permiso de trabajo en alturas.
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGROS EXISTENTES Y/O POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ORDEN Y ASEO	RIESGO BIOLOGICO, RIESGO BIOMECANICO, RIESGO MECANICO	Resbalones y caidad,golpes o choques,lesiones	Mantener el área de trabajo limpia y libre de obstáculos en todo momento. Usar EPP adecuado durante las labores de aseo (guantes, gafas, tapabocas según corresponda.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, justificable o cabe seguir que ocurra un incidente?	¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, detenerse y no proceda con la tarea. Acuerde con el supervisor encargado el plan a poner en marcha controles.	☐ Si, proceda con la tarea
☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

NOMBRE DEL EMISOR Y/O AUTORIZANTE

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
GERMAN RODRIGUEZ	7164104	ING AUX RESIDENTE							
LAURA ORTIZ	1053668123	COORDINADORA HSEQ	laura ortiz	laura ortiz	laura ortiz	laura ortiz	laura ortiz	laura ortiz	

Powered by CamScanner

TRABAJADORES QUE EJECUTARAN LA ACTIVIDAD									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOHN JAIRO BENAVIDES	1098627539	AYUDANTE							—
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	4005'344	AYUDANTE							—
LUIS YOEL RODRIGUEZ	7037276	AYUDANTE							—
FABRICIANO TORRES RIVERA	7109053	AYUDANTE							—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	1118914794	AYUDANTE							—
JAIRO ESPINOZA RODRIGUEZ	19823164	OFICIAL							—
FERNEY PATIÑO	1019117212	AYUDANTE							—
YOLEHAM ANDRES DIAZ	1099413568	AYUDANTE	—						—
OSCAR DAVID ARIZTIZABAL	1058795406	OFICIAL							—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	1047548367	OFICIAL	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	7188544	OFICIAL							—

Powered by CamScanner

ANEXO 3.

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día **03** de febrero del 2026, en las instalaciones del **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (CAMPAMENTO DE OBRA),** siendo las 10:00 AM, se reunieron representantes de la dirección y colaboradores para conformar el comité de convivencia laboral, comprendido para los años 2026 a 2028 dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 3461 de 2025. El periodo de los miembros del comité de convivencia laboral es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del comité de convivencia laboral, así como la capacitación requerida.

Orden del Día

1. Nombramiento del miembro del comité de convivencia laboral como representantes por parte el empleador y trabajadores.

Desarrollo del Orden del Día

1. Los representantes de la dirección y de los trabajadores de la empresa nombraron como su representante a: JOSE PALMERA

2. Integrando el comité de convivencia laboral se procedió de acuerdo a la resolución 3461 de 2025 a nombrar una persona, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.

3. Siendo las 10:55 AM, se da lectura al contenido de la presente acta, siendo aprobada en unanimidad en todo su contenido.

Se firma y se da por terminada la reunión.

José Palmera.

JOSE PALMERA
1.049.349.065

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

ANEXO 4.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 12:45:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83882282

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URG SAN RAFAEL		
Documento	NI901752359	**Dirección**	DG 74D #32 BB - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4883991
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAÑOLA AGUIRRE DIANA DARLENE	**Identificación**	CC 43341527
Total Afiliados	46	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000637359	LESLY DAHIANA ARBELAEZ ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1002709523	STEVEN ALBERTO MOTAVITA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1006415950	YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1010117212	ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1010121720	ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017164101	CONSTANZA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 1049608119	WILLIAM DANILO SANCHEZ AMEZQUITA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 1049655328	NESTOR ANDRES CHAPARRO GRASS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1049657535	JOHN JAIRO BENAVIDES RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1050602788	MAURICIO SALAMANCA CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1050604691	ESTEBAN FERNANDO VARGAS ZAPATA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 66.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.400
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 133.334	$ 21.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 1051066636	LUIS STIVENSON FUQUENE AGUILAR	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1053282088	ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 120.000	$ 19.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 120.000	$ 0	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/03/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83882282** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053588123	LAURA CAMILA ORTIZ AMADO	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.680.000	$ 67.200	6,960	$ 1.680.000	$ 117.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200
CC 1056075701	YEFER VICENTE BERNAL TORRES	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1056075701	YEFER VICENTE BERNAL TORRES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100
CC 1056785406	OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1057545387	FABIAN REINALDO RODRIGUEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1057546954	ALVARO ISIDRO ANGARITA BONILLA	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1067815402	WALFRAN ENRIQUE ALVEAR TORRECILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1070806365	MANUEL JOSE POLO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1073327568	IVAN ANDRES MAHECHA BELTRAN	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1093742377	LUCDWIG ANDRES LARROTTA MADERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1115914794	JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1115915923	RICARDO ANDRES MONROY ROSAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 18923104	JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 32144038	ANDREA PELAEZ TERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 40051344	EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 4249157	JOSE HERNANDO MOTAVITA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 71171727	OMAR ALBERTO BEDOYA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.230.000	$ 356.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.230.000	$ 89.200	6,960	$ 2.230.000	$ 155.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.230.000	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.500
CC 7161668	NELSON GEOVANNY WILCHES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7166053	FABRICIANO TORRES RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7172373	LUIS MIGUEL MEDINA PIÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 133.334	$ 21.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 133.334	$ 21.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 7178516	MAURICIO SIERRA DIAZ	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 7180353	LUIS FERNANDO PULIDO SANTIAGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 7186844	FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ FONSECA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 7305011	JOSE CRISANTO GARCIA CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73375859	JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 74185814	RUBEN DARIO ESPITIA BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 80394482	OSWALDO MALDONADO MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 85444640	ALFREDO MANUEL LUQUE PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 88202999	JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 9675071	PLINIO ALCIDES PIRATOBA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
PT 5274244	JOSFRAN RAFAEL ROJAS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6483717	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/03/2026 **Empresa NI901752359 CONSORCIO URG SAN RAFAEL** **Planilla Nro: 83882282** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 7037276	LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 87.878.449	$ 14.062.900	$ 3.494.900	$ 6.030.100	$ 3.466.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.054.400	$ 0	$ 27.054.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-03-11, 11:37:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 84148120

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

Fecha limite de pago: 2026-03-24

GUARDADA 04/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MIGUEL ANGEL VIASUS FRAILE				
Documento	CC1049616295	**Dirección**	CR 9 #48 - 47		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6045515689		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010048639	VARGAS GONZALEZ EDISON ANDRES	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 758.726	$ 121.400	NUEVA EPS	$ 758.726	$ 30.400	ARL SURA	$ 758.726	$ 52.900	COMFABOY	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100
CC 1049622887	NUMPAQUE PAIPA YAIR JAVIER	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	FAMISANAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	ARL SURA	$ 875.453	$ 61.000	COMFABOY	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1049623749	VARGAS GONZALEZ EDWIN EFRAIN	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 875.453	$ 140.100	NUEVA EPS	$ 875.453	$ 35.100	ARL SURA	$ 875.453	$ 61.000	COMFABOY	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1049649036	GOMEZ CANO JUAN SEBASTIAN	01	00	X															0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 9.400	ARL SURA	$ 233.454	$ 16.300	COMFABOY	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1082924352	MUNIVE AMAYA KATERINE	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	ARL SURA	$ 875.453	$ 61.000	COMFABOY	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.618.539	$ 3.618.539	$ 3.618.539	$ 3.618.539	$ 579.100	$ 0	$ 0	$ 145.100	$ 252.200	$ 145.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.121.500	$ 0	$ 1.121.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 5.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 12:38:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84130516

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH		
Documento	NI902020164	**Dirección**	CR 11 #27 - 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	261938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CELIS BEDOYA LILIANA DEL SOCORRO	**Identificación**	CC 42679338
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010121910	LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA	01	00	X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.456.667	$ 233.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.456.667	$ 58.300	6,960	$ 1.456.667	$ 101.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.456.667	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.100
CC 1049349065	JOSE MIGUEL PALMERA LARIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1049651962	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00	X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 7184104	GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 88273429	SAID FERNANDO LARROTTA MADERA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 7154851	FREDDY RAMON RODRIGUEZ PIAMO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 11.876.049	$ 1.900.400	$ 475.300	$ 826.800	$ 475.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.677.800	$ 0	$ 3.677.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 6.

ACH INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	ACTA DE NOMBRAMIENTO VIGÍA SST	FORMATO Código : F-SST-V1 Versión: 01 Página 1 de 1 Fecha: 03/02/2026

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Acta de nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, se designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a SAID FERNANDO LARROTTA MADERA.

En virtud a lo anterior, el referido actuará como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, periodo durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

La presente se firma el 03/02/2026.

SAID FERNANDO LARROTTA MADERA
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
CC: 88.273.429
Cargo: Ayudante de obra

Powered by CamScanner

ANEXO 7.

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SGI-07
		Versión: 1
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 17/02/2023

Declaro que CONSORCIO ACH Me ha entregado en la fecha indicada los Elementos de Protección Personal relacionados en la presente planilla, los cuales me comprometo a utilizar adecuadamente para el seguro desempeño en las labores asignadas.

Nombre del trabajador: SAID Fernando Larrotta Madera

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NUEVO	REPOSICION	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23-01-2026	Guantes nilon	1 par	X		Laura ortiz	Said Larrotta
23-01-2026	Gafas de seguridad	1 unid	X		laura ortiz	Said Larrotta
23-01-2026	protección inserción	1 unid	X		laura ortiz	Said Larrotta
06-02-26	Guantes nilon	1 par		X	laura ortiz	SAID LARROTTA
06-02-26	Freddy Rodriguez	1 par	X		Laura ortiz	SAID LARROTTA
06-02-26	Casco de seg	1 unid	X		laura ortiz	SAID LARROTTA
10-02-26	Guantes nilon	1 par		X	laura ortiz	SAID LARROTTA
16-02-26	Guantes nilon	1 par	1	X	laura ortiz	SAID LARROTTA
21-02-26	Guantes nitrilo	1 par	1	X	laura ortiz	SAID LARROTTA
26-02-26	Guantes nitrilo	1 par		X	laura ortiz	SAID LARROTTA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SGI-07
		Versión: 1
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 17/02/2023

Declaro que CONSORCIO ACH Me ha entregado en la fecha indicada los Elementos de Protección Personal relacionados en la presente planilla, los cuales me comprometo a utilizar adecuadamente para el seguro desempeño en las labores asignadas.

Nombre del trabajador: Freddy Ramon Rodriguez Piamo

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NUEVO	REPOSICION	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DEL TRABAJADOR
23-01-2026	Guantes nilon	1 par	X		Lauro ortiz	Freddy
23-01-2026	Gafas de seguridad	1 und	X		Lauro ortiz	Freddy
23-01-2026	protección A. inserción	1 und.	X		lauro ortiz.	Freddy
06-02-2026	casco de seg	1 und	X		Lauro ortiz	Freddy
07-02-26	Guantes de nilon	1 und		X	Lauro ortiz	Freddy
11-02-26	Guantes nilon	1 par		X	Lauro ortiz	Freddy
22-02-26	Gafas visila	1 par		X	Lauro Ortiz	Freddy
23-02-26	Guantes ortiz	1 par		X	Lauro Ortiz	Freddy
28-02-26	Guantes nitril	1 par		X	Lauro Ortiz	Freddy

Powered by CamScanner

ANEXO 8.

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Formato
ACH INFRAESTRUCTURA	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION	Codigo: F-SST-EPP1
		Version: 01 Fecha: 05/01/2026 — pagina: 1de 1

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	PROTECCIÓN DE CABEZA Y ROSTRO		P. RESPIRATORIA	P. AUDITIVA	P. MANOS		P. PIES	Dotacion	OBSERVACIONES
			CASCO	GAFAS	MASCARILLAS	TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE NITRILO	BOTAS PUNTERA		
1	FREDY RAMON RODRIGUEZ	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	N/A	Por entrega de dotación Fecha de Fecha
2	SAID FERNANDO LARROTA	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	N/A	Por entrega de dotación Fecha de Fecha
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

Powered by CamScanner


ANEXO 9.

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SST
VERSION 001
PAG 2/4

FECHA:	02-02-2026	FECHA INICIO:	02-02-2026	HORA INICIO:	7:00 am.
PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD E.S.E H.U.S.R.T	FECHA FIN:	07-02-2026	HORA FIN:	4:45 pm.
SOLICITA:	Interventoria.	CARGO:	COORDINADOR	CONSECUTIVO:	
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	OPERATIVA				02

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

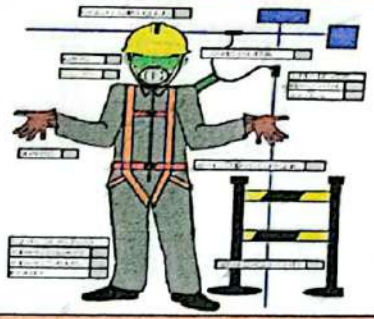

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

¿ que fase a la se encuentra el lugar de trabajo?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Armado de formaleta
Armado de acero.

CALCULOS DE REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

NA

AUTORIZACION DEL PERMISO

COORDINADOR DE ALTURAS: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.	FIRMA: Laura Ortiz. NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz. CARGO: SST obra.
INSPECTOR SST: Encargado de ejecutar mantener y mejorar las actividades relacionadas con SST en el proyecto.	FIRMA: Laura Ortiz. NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz. CARGO: SST obra.
COOR / ENCARGADO: Persona encargada supervisar y dirigir al personal para beneficio del mismo proyecto.	FIRMA: NOMBRE Y APELLIDO: Carmen Nadi. CARGO: Residente.

CIERRE O SUSPENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CIERRE	X	**MOTIVO:** Cierre de Permiso	FIRMA: Laura Ortiz. NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz CARGO: SST de obra.
CANCELACION			

LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal que se registra en este permiso, cuenta con la afiliación vigente a la seguridad social?	√			√			√			√			√			√					
el personal cuenta con certificado de aptitud medica en alturas?	√			√			√			√			√			√					
El personal cuenta con certificado de trabajo en altura vigente?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con procedimiento para realizar la actividad y se socializo al personal?	√			√			√			√			√			√					
¿ se encuentran libre de efectos de sustancias psicoativas que pueden alterar su estado de conciencia ?	√			√			√			√			√			√					
¿el personal en labor se encuentra en buenas condiciones anímicas, físicas y saludables?	√			√			√			√			√			√					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
Se realizo inspección y estan en condiciones de seguridad para su uso, las herramientas, equipos y maquinaria?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con sistema de protección y prevención anticaida?	√			√			√			√			√			√					
La zonas de trabajo estan debidamente señalizadas y delimitadas?	√			√			√			√			√			√					
El área esta libre de elementos o materiales combustibles?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico el armado de los andamios y su resistencia?	√			√			√			√			√			√					
El área de trabajo cuenta con las condiciones de orden y aseo ?	√			√			√			√			√			√					
el personal conoce el plan de respuesta ante emergencias?	√			√			√			√			√			√					
Se han identificado los equipos de emergencias (extintores, botiquines y camillas), su ubicación, así como las vías de evacuación?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico la inspeccion de preoperacional de herramientas?	√			√			√			√			√			√					
Los trabajadores que ejecutan la tarea se encuentran en buenas condiciones de salud ?	√			√			√			√			√			√					
¿en caso de que exista actividades simultaneas se an tomado medidas de prevencion necesarias?	√			√			√			√			√			√					
Hay condiciones climáticas optimas para ejecutar la tarea?	√			√			√			√			√			√					
¿ se realizan inspeccion diaria de equipos de trabajo en alturas ?	√			√			√			√			√			√					

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACION (Marcar con una "X" en SI, NO o en N/A según el caso)	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																										
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7								
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A						
casco con barbuquejo	X			X			X			X			X			X			X								
botas de seguridad	X			X			X			X			X			X			X								
gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X			X								
guantes	X			X			X			X			X			X			X								
protectores auditivos de insercion	X			X			X			X			X			X			X								
Ropa de trabajo	X			X			X			X			X			X			X								
¿se requiere otro elemento de proteccion personal cual?																											
SISTEMAS DE DETENCION y SISTEMAS DE ACCESO																											
¿la linea de vida se encientran libres de nudos o anadiduros?	X			X			X			X			X			X			X								
¿los puntos de anclaje certifican las 5000 lb?	X			X			X			X			X			X			X								
¿ las lineas de vida se encuentran fijadas a un punto de anclaje estructural adecuado	X			X			X			X			X			X			X								
¿Las escaleras estan en buenas condiciones de uso ?	X			X			X			X			X			X			X								
¿los andamios tubular se encuentran en buen estado ?	X			X			X			X			X			X			X								
¿los andamios colgantes se encuentran en buenas condiciones de uso ?	X			X			X			X			X			X			X								
¿las palomeras estan correctamente instaladas ?	X			X			X			X			X			X			X								
OBSERVACIONES																											

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DIA 7
			DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
			FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
JOHN JAIRO BENAVIDES	AYUDANTE	1049657535							
FABRICIANO TORRES RIVERA	AYUDANTE	7166053							
ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	AYUDANTE ENTENDIDO	1053282088							
ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO	AYUDANTE	1010121720							
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	AYUDANTE	1115914794							
RUBEN ESPITIA	OFICIAL	74185814							
JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	AYUDANTE	88202999							
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE	7186844							
JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	OFICIAL	73375859							
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	OFICIAL	1057545387							
JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	OFICIAL	18923104							
OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	OFICIAL	1056785406							
WALFRAN ENRIQUE ALVEAR	OFICIAL	1067815402							
LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	AYUDANTE	7037276							
YEFER VICENTE BERNAL TORRES	OFICIAL	1056075701							
MAURICIO SALAMANCA CALDERON	AYUDANTE	1050602788							
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	AYUDANTE	40051344							
ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	AYUDANTE	1010117212							
YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	AYUDANTE	1006415950							
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	AYUDANTE	P 8483717							
MANUEL JOSE POLO	AYUDANTE	1070806385							
ESTEBAN VARGAS	AYUDANTE	1050604691							
JOSFRAN ROJAS	AYUDANTE	8274244							

NOTA: 1. Se deben suspender actividades en caso de lluvia. 2. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura estar buena condicion fisica y emocionalmente para realizar la actividad 3. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura que su equipo ISA se encuentra en buen estado para su funcionamiento 4. Al firmar el presente permiso el trabajador reconoce los riesgos asociados con el ISA y los respectivos controles para evitar accidentes e incidentes.

OBSERVACIONES


Powered by CamScanner

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SST | VERSION 001 | PAG 1 de 1

FECHA:	09-02-2026	FECHA INICIO:	09-02-2026.	HORA INICIO:	7:00 am
PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD E.S.E H.U.S.R.T.	FECHA FIN:	14-02-2026.	HORA FIN:	4:45 pm
SOLICITA:	Alternativa	CARGO:	COORDINADOR	CONSECUTIVO:	
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	OPERATIVA				00

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

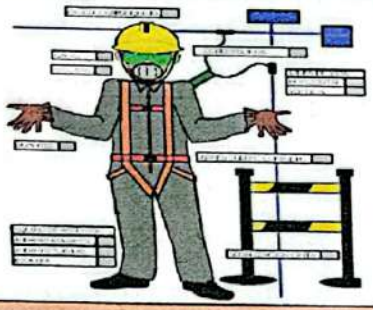

¿ que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Armado de formaleta armado de acero.

CALCULOS DE REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

NA

AUTORIZACION DEL PERMISO

COORDINADOR DE ALTURAS: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.	FIRMA: Laura Ortiz.
	NOMBRE Y APELLIDO: Laura C. Ortiz
	CARGO: COORDINADOR SST.
INSPECTOR SST: Encargado de ejecutar mantener y mejorar las actividades relacionadas con SST en el proyecto.	FIRMA: Laura Ortiz.
	NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz.
	CARGO: SST SST obra
COOR / ENCARGADO: Persona encargada supervizar y dirgir al personal para beneficio del mismo proyecto.	FIRMA:
	NOMBRE Y APELLIDO: Carmen Rodriguez
	CARGO: Residente.

CIERRE O SUSPENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CIERRE	X	MOTIVO: cierre de Permiso
CANCELACION		

FIRMA: Laura Ortiz.
NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz.
CARGO: SST de obra.

LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal que se registra en este permiso, cuenta con la afiliación vigente a la seguridad social?	√			√			√			√			√			√					
el personal cuenta con certificado de aptitud medica en alturas?				√			√			√			√			√					
El personal cuenta con certificado de trabajo en altura vigente?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con procedimiento para realizar la actividad y se socializo al personal?	√			√			√			√			√			√					
¿ se encuentran libre de efectos de sustancias psicoativas que pueden alterar su estado de conciencia ?	√			√			√			√			√			√					
¿el personal en labor se encuentra en buenas condiciones anímicas, físicas y saludables?	√			√			√			√			√			√					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
Se realizo inspección y estan en condiciones de seguridad para su uso, las herramientas, equipos y maquinaria?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con sistema de protección y prevención anticaída?	√			√			√			√			√			√					
La zonas de trabajo estan debidamente señalizadas y delimitadas?	√			√			√			√			√			√					
El área esta libre de elementos o materiales cumbustibles?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico el armado de los andamios y su resistencia?	√			√			√			√			√			√					
El área de trabajo cuenta con las condiciones de orden y aseo ?	√			√			√			√			√			√					
el personal conoce el plan de respuesta ante emergencias?	√			√			√			√			√			√					
Se han identificado los equipos de emergencias (extintores, botiquines y camillas), su ubicación, así como las vías de evacuación?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico la inspeccion de preoperacional de herramientas?	√			√			√			√			√			√					
Los trabajadores que ejecutan la tarea se encuentran en buenas condiciones de salud ?	√			√			√			√			√			√					
¿en caso de que exista actividades simultaneas se an tomado medidas de prevencion necesarias?	√			√			√			√			√			√					
Hay condiciones climáticas optimas para ejecutar la tarea?	√			√			√			√			√			√					
¿ se realizan inspeccion diaria de equipos de trabajo en alturas ?	√			√			√			√			√			√					

Powered by CamScanner

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																										
LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7						
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A				
casco con barbuquejo	√			√			√			√			√			√									
botas de seguridad	√			√			√			√			√			√									
gafas de seguridad	√			√			√			√			√			√									
guantes	√			√			√			√			√			√									
protectores auditivos de inserción	√			√			√			√			√			√									
Ropa de trabajo	√			√			√			√			√			√									
¿se requiere otro elemento de protección personal cual?_____	√			√			√			√			√			√									
SISTEMAS DE DETENCION y SISTEMAS DE ACCESO																										
¿la linea de vida se encientran libres de nudos o anadiduras?	√			√			√			√			√			√									
¿los puntos de anclaje certifican las 5000 lb?	√			√			√			√			√			√									
¿ las líneas de vida se encuentran fijadas a un punto de anclaje estructural adecuado	√			√			√			√			√			√									
¿Las escaleras estan en buenas condiciones de uso ?	√			√			√			√			√			√									
¿los andamios tubular se encuentran en buen estado ?	√			√			√			√			√			√									
¿los andamios colgantes se encuentran en buenas condiciones de uso ?	√			√			√			√			√			√									
¿las palomeras estan correctamente instaladas ?	√			√			√			√			√			√									
OBSERVACIONES																										

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	DÍA 1 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 2 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 3 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 4 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 5 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 6 DD/MM/AA FIRMA	DÍA 7 DD/MM/AA FIRMA
JOHN JAIRO BENAVIDES	AYUDANTE	1049657535							—
FABRICIANO TORRES RIVERA	AYUDANTE	7166053							—
ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	AYUDANTE ENTENDIDO	1053282088	—	—	—	—	—	—	—
ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO	AYUDANTE	1010121720	—	—	—	—	—	—	—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	AYUDANTE	1115914794							—
RUBEN ESPITIA	OFICIAL	74185814	—	—	—	—	—	—	—
JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	AYUDANTE	88202999	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE	7186844							—
JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	OFICIAL	73375859	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	OFICIAL	1057545387							—
JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	OFICIAL	18923104							—
OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	OFICIAL	1056785406							—
WALFRAN ENRIQUE ALVEAR	OFICIAL	1067815402							—
LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	AYUDANTE	7037276							—
YEFER VICENTE BERNAL TORRES	OFICIAL	1056075701	—	—	—	—	—	—	—
MAURICIO SALAMANCA CALDERON	AYUDANTE	1050602788							
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	AYUDANTE	40051344							—
ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	AYUDANTE	1010117212							—
YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	AYUDANTE	1006415950							—
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	AYUDANTE	P 6483717							—
MANUEL JOSE POLO	AYUDANTE	1070806365							—
ESTEBAN VARGAS	AYUDANTE	1050604691							—
JOSFRAN ROJAS	AYUDANTE	5274244							—

NOTA: 1. Se deben suspender actividades en caso de lluvia. 2. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura estar buena condicion fisica y emocionalmente para realizar la actividad 3. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura que su equipo ISA se encuentra en buen estado para su funcionamiento 4. Al firmar el presente permiso el trabajador reconoce los riesgos asociados con el ISA y los respectivos cuidados para evitar accidentes o incidentes.

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SST | VERSION 001 | mar 24

FECHA	27/02/2026	FECHA INICIO:	27/02/2026	HORA INICIO:	7:00 am
PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD E.S.E H.U.S.R.T	FECHA FIN:	20/02/2026	HORA FIN:	4:30 pm.
SOLICITA	Interventoria	CARGO:	COORDINADOR	CONSECUTIVO	
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	OPERATIVA			QQ	

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

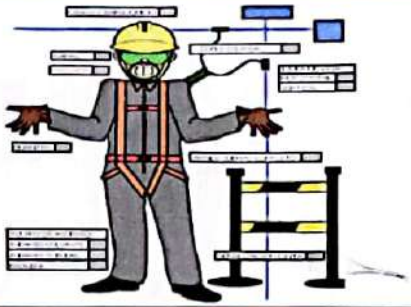

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

¿ que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Armado de Estructura Anclaje de acero.

CALCULOS DE REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

NA

AUTORIZACION DEL PERMISO

COORDINADOR DE ALTURAS: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

FIRMA: Laura Ortiz.
NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz
CARGO: COORDINADOR

INSPECTOR SST: Encargado de ejecutar mantener y mejorar las actividades relacionadas con SST en el proyecto.

FIRMA: Laura Ortiz.
NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz
CARGO: SST Laura Ortiz

COOR / ENCARGADO: Persona encargada supervizar y dirigir al personal para beneficio del mismo proyecto.

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDO: German Rodriguez
CARGO: Residente.

CIERRE O SUSPENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

		MOTIVO:	
CIERRE	X	Cierre de permiso	FIRMA: Laura C. Ortiz.
CANCELACION			NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz.
			CARGO: coordinador SST.

LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1 27/02/26			DIA 2 28/02/26			DIA 3			DIA 4 20/02/26			DIA 5 DD/MM/AA			DIA 6 DD/MM/AA			DIA 7 DD/MM/AA		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal que se registra en este permiso, cuenta con la afiliación vigente a la seguridad social?	✓			✓			✓			✓											
el personal cuenta con certificado de aptitud medica en alturas?	✓			✓			✓			✓											
El personal cuenta con certificado de trabajo en altura vigente?	✓			✓			✓			✓											
Se cuenta con procedimiento para realizar la actividad y se socializo al personal?	✓			✓			✓			✓											
¿ se encuentran libre de efectos de sustancias psicoativas que pueden alterar su estado de conciencia ?	✓			✓			✓			✓											
¿el personal en labor se encuentra en buenas condiciones anímicas,físicas y saludables?	✓			✓			✓			✓											
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
Se realizo inspección y estan en condiciones de seguridad para su uso, las herramientas, equipos y maquinaria?	✓			✓			✓			✓											
Se cuenta con sistema de protección y prevención anticaida?	✓			✓			✓			✓											
La zonas de trabajo estan debidamente señalizadas y delimitadas?	✓			✓			✓			✓											
El área esta libre de elementos o materiales cumbustibles?	✓			✓			✓			✓											
Se verifico el armado de los andamios y su resistencia?	✓			✓			✓			✓											
El área de trabajo cuenta con las condiciones de orden y aseo ?	✓			✓			✓			✓											
el personal conoce el plan de respuesta ante emergencias?	✓			✓			✓			✓											
Se han identificado los equipos de emergencias (extintores, botiquines y camillas), su ubicación, así como las vias de evacuación?	✓			✓			✓			✓											
Se verifico la inspeccion de preoperacional de herramientas?	✓			✓			✓			✓											
Los trabajadores que ejecutan la tarea se encuentran en buenas condiciones de salud ?	✓			✓			✓			✓											
¿en caso de que exista actividades simultaneas se an tomado medidas de prevencion necesarias?	✓			✓			✓			✓											
Hay condiciones climáticas optimas para ejecutar la tarea?	✓			✓			✓			✓											
¿ se realizon inspeccion diaria de equipos de trabajo en alturas ?	✓			✓			✓			✓											

Powered by CamScanner

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
casco con barbuquejo	✓			✓			✓			✓											
botas de seguridad	✓			✓			✓			✓											
gafas de seguridad	✓			✓			✓			✓											
guantes	✓			✓			✓			✓											
protectores auditivos de insercion	✓			✓			✓			✓											
Ropa de trabajo	✓			✓			✓			✓											
¿se requiere otro elemento de proteccion personal cual?		✓			✓			✓			✓										

SISTEMAS DE DETENCION y SISTEMAS DE ACCESO

¿la linea de vida se encientran libres de nudos o anadiduras?	✓			✓			✓			✓											
¿los puntos de anclaje certifican las 5000 lb?			-			✓			✓			✓									
¿ las lineas de vida se encuentran fijadas a un ponto de anclaje estructural adecuado	✓			✓			✓			✓											
¿Las escaleras estan en buenas condiciones de uso ?			✓			✓			✓			✓									
¿los andamios tubular se encuentran en buen estado ?			✓	✓			✓			✓											
¿los andamios colgantes se encuentran en buenas condiciones de uso ?			✓			✓			✓			✓									
¿las palomeras estan corectamente instaladas ?	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
			18/10/02	19/10/02	19/10/02	20/10/02	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
			FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
JOHN JAIRO BENAVIDES	AYUDANTE	1049657535							
FABRICIANO TORRES RIVERA	AYUDANTE	7166053							
ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	AYUDANTE ENTENDIDO	1053282088	—	—	—	—			
ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO	AYUDANTE	1010121729	—	—	—	—			
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	AYUDANTE	1115914794							
RUBEN ESPITIA	OFICIAL	74185814	—	—	—	—			
JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	AYUDANTE	88202999	—	—	—	—			
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE	7186844							
JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	OFICIAL	73375859	—	—	—	—			
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	OFICIAL	1057545387	—	—	—	—			
JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	OFICIAL	18923104							
OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	OFICIAL	1056785406							
WALFRAN ENRIQUE ALVEAR	OFICIAL	1067816402							
LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	AYUDANTE	7037278							
YEFER VICENTE BERNAL TORRES	OFICIAL	1066076701	—	—	—	—			
MAURICIO SALAMANCA CALDERON	AYUDANTE	1050602788	—	—	—	—			
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	AYUDANTE	40051344	—	—	—	—			
ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	AYUDANTE	1010117212	—	—	—	—			
YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	AYUDANTE	1006416950	—	—	—	—			
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	AYUDANTE	P 6483717	—	—	—	—			
MANUEL JOSE POLO	AYUDANTE	1070806365							
ESTEBAN VARGAS	AYUDANTE	1060604691				—			
Joshua Rojas	AYUDANTE	5279294			—	—			

NOTA: 1. Se deben suspender actividades en caso de lluvia 2. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura estar buena condicion fisica y emocionalmente para realizar la actividad 3. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura que su equipo TSA se encuentra en buen estado para su funcionamiento 4. Al firmar el presente permiso el trabajador reconoce los riesgos asociados con el TSA y los respectivos controles para evitar accidentes e incidentes.

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SST			
VERSION 003			
mar-24			

FECHA:	23/02/2026	FECHA INICIO:	23/02/2026	HORA INICIO:	7:40 am
PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD E.S.E H.U.S.R.T	FECHA FIN:	28/02/2026.	HORA FIN:	
SOLICITA:	Interventoria	CARGO:	COORDINADOR	CONSECUTIVO:	
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	OPERATIVA				OQ

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

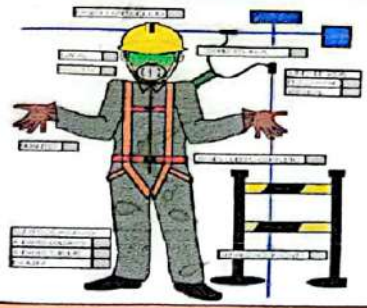

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

¿ que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- Armado de formaleta
- Armado de Acero.

CALCULOS DE REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

NA

AUTORIZACION DEL PERMISO

COORDINADOR DE ALTURAS: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.	FIRMA: Laura Ortiz NOMBRE Y APELLIDO: Laura C. Ortiz. CARGO: COORDINADOR SST.
INSPECTOR SST: Encargado de ejecutar mantener y mejorar las actividades relacionadas con SST en el proyecto.	FIRMA: Laura Ortiz. NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz CARGO: SST SST de obra
COOR / ENCARGADO: Persona encargada supervizar y dirigir al personal para beneficio del mismo proyecto.	FIRMA: NOMBRE Y APELLIDO: Goman Rodriguez CARGO: Residente.

CIERRE O SUSPENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CIERRE	X	MOTIVO:	FIRMA: Laura Ortiz
CANCELACION		CIERRE PERMISO	NOMBRE Y APELLIDO: Laura Ortiz CARGO: SST coordinadora.

LISTA DE VERIFICACION (Marque con un √ en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal que se registra en este permiso, cuenta con la afiliación vigente a la seguridad social?	√			√			√			√			√			√					
el personal cuenta con certificado de aptitud medica en alturas?	√			√			√			√			√			√					
El personal cuenta con certificado de trabajo en altura vigente?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con procedimiento para realizar la actividad y se socializo al personal?	√			√			√			√			√			√					
¿ se encuentran libre de efectos de sustancias psicoativas que pueden alterar su estado de conciencia ?	√			√			√			√			√			√					
¿el personal en labor se encuentra en buenas condiciones animicas,fisicas y saludables?	√			√			√			√			√			√					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
Se realiza inspección y estan en condiciones de seguridad para su uso, las herramientas, equipos y maquinaria?	√			√			√			√			√			√					
Se cuenta con sistema de protección y prevención anticaida?	√			√			√			√			√			√					
La zonas de trabajo estan debidamente señalizadas y delimitadas?	√			√			√			√			√			√					
El área esta libre de elementos o materiales cumbustibles?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico el armado de los andamios y su resistencia?	√			√			√			√			√								
El área de trabajo cuenta con las condiciones de orden y aseo ?	√			√			√			√			√			√					
el personal conoce el plan de respuesta ante emergencias?	√			√			√			√			√			√					
Se han identificado los equipos de emergencias (extintores, botiquines y camillas), su ubicación, así como las vias de evacuación?	√			√			√			√			√			√					
Se verifico la inspeccion de preoperacional de herramientas?	√			√			√			√			√			√					
Los trabajadores que ejecutan la tarea se encuentran en buenas condiciones de salud ?	√			√			√			√			√			√					
¿en caso de que exista actividades simultaneas se an tomado medidas de prevencion necesarias?	√			√			√			√			√			√					
Hay condiciones climáticas optimas para ejecutar la tarea?	√			√			√			√			√			√					
¿ se realizan inspeccion diaria de equipos de trabajo en alturas ?	√			√			√			√			√			√					

Powered by CamScanner

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE VERIFICACION (Marcar con una X en SI, NO o en N/A según el caso)	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
casco con barbuquejo	X			X			X			X			X			X					
botas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
guantes	X			X			X			X			X			X					
protectores auditivos de insercion	X			X			X			X			X			X					
Ropa de trabajo	X			X			X			X			X			X					
¿se requiere otro elemento de proteccion personal cual?		X			X			X			X			X			X				
SISTEMAS DE DETENCION y SISTEMAS DE ACCESO																					
¿la linea de vida se encientran libres de nudos o anadiduras?	X			X			X			X			X								
¿los puntos de anclaje certifican las 5000 lb?		X			X			X			X			X			X				
¿ las líneas de vida se encuentran fijadas a un punto de anclaje estructural adecuado	X			X			X			X			X			X					
¿Las escaleras estan en buenas condiciones de uso ?		X			X			X			X			X			X				
¿los andamios tubular se encuentran en buen estado ?	X			X			X			X			X			X					
¿los andamios colgantes se encuentran en buenas condiciones de uso ?			X			X			X			X			X			X			
¿las palometas estan correctamente instaladas ?	X			X			X			X			X				X				
OBSERVACIONES																					

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
			25/02	26/02	26/02	26/02	27/02	DD/MM/AA	DD/MM/AA
			FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
JOHN JAIRO BENAVIDES	AYUDANTE	1049657535							
FABRICIANO TORRES RIVERA	AYUDANTE	7166053							
ERMILSON ADRIAN VALLEJO CUBIDES	AYUDANTE ENTENDIDO	1053282088	—						
ANDERSON HARBEY TOCARRUNCHO	AYUDANTE	1010121720	—	—	—	—	—	—	—
JOSE AMILKAR DIAZ CORREA	AYUDANTE	1115914794	—					—	—
RUBEN ESPITIA	OFICIAL	74185814	—	—	—	—	—	—	—
JOSE ROBINSON BAUTISTA SANCHEZ	AYUDANTE	88202999	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN EDILBRANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE	7186844						—	—
JORGE LUIS PALMERA MENDEZ	OFICIAL	73375858	—	—	—	—	—	—	—
FABIAN REINALDO RODRIGUEZ	OFICIAL	1057545387	—	—	—	—	—	—	—
JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	OFICIAL	18923104						—	—
OSCAR DAVID ARISTIZABAL CARDENAS	OFICIAL	1056785406						—	—
WALFRAN ENRIQUE ALVEAR	OFICIAL	1067815402						—	—
LUIS YOEL RODRIGUEZ POLON	AYUDANTE	7037276						—	—
YEFER VICENTE BERNAL TORRES	OFICIAL	1056075701	—	—	—	—	—	—	—
MAURICIO SALAMANCA CALDERON	AYUDANTE	1050602788	—	—	—	—	—	—	—
EYEN ANDREA MARROQUIN OSTOS	AYUDANTE	40051344				—	—	—	—
ANGEL FERNEY PATIÑO BARAHONA	AYUDANTE	1010117212			—		—	—	—
YOLEHAN ANDRES DIAZ CORREA	AYUDANTE	1006415950	—					—	—
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ SALAS	AYUDANTE	P 6483717	—	—	—	—	—	—	—
MANUEL JOSE POLO	AYUDANTE	1070806365						—	—
ESTEBAN VARGAS	AYUDANTE	1050604891			—			—	—
Jostin Rojas	Ayudante	5274249						—	—

NOTA: 1. Se deben suspender actividades en caso de lluvia. 2. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura estar buena condicion fisica y emocionalmente para realizar la actividad 3. Al firmar el presente permiso el trabajador asegura que su equipo ISA se encuentra en buen estado para su funcionamiento 4. Al firmar el presente permiso el trabajador reconoce los riesgos asociados con el ISA y los respectivos controles para evidar accidentes e incidentes.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 10.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** SIERRA ELECTRICA

MARCA makita **MODELO** 5007 N **IDENTIFICACION** 05

OPERARIO Ivan Bencardas **SEMANA DEL** 02/02/2026 **AL** 07/02/2026

ITEM	CONCEPTO	02/02		FECHA		04/02		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	/				/									
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/				/									
	* Estado del accesorio portadiscos	/				/									
	* Estado del mango	/				/									
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/				/									
	P	/				/									
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/				/									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	/				/									
	Estado general de la guía de corte	/				/									
	Estado de la plaqueta de identificación	/				/									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]		~		[signature]		~		~		~		~	
	INSPECCIONÓ	Ivan Suarez		~		Ivan Suarez		~		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PULIDORA
MARCA	Dewalt	**MODELO**	E4120-B3	**IDENTIFICACION**	08
OPERARIO	Fabian E. Rodriguez	**SEMANA DEL**	02/02/2026	**AL**	07/02/2026

ITEM	CONCEPTO	02/02		03/02		04/02		05/02		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Fredy		Fredy		Fredy		Fredy		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ACH
INFRAESTRUCTURA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	TRONZADORA
MARCA	DEWALT	**MODELO**	D28730-B3	**IDENTIFICACION**	405
OPERARIO	Said Larrotta	**SEMANA DEL**	02/01/2016	**AL**	07/01/2016

ITEM	CONCEPTO	FECHA		03/02		04/02		05/02		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓							
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓		✓		✓							
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓							
	* Estado del mango			✓		✓		✓							
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduacion profundidad de corte)			✓		✓		✓							
	Estado de la cubierta del disco			✓		✓		✓							
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓		✓		✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora			✓		✓		✓							
	Estado general de la guía de corte			✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Said L		Said L		Said L.		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		—		—		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	TALADRO
MARCA	marita	**MODELO**	4B2470	**IDENTIFICACION**	39
OPERARIO	Freddy Rodriguez	**SEMANA DEL**	02/02/2026	**AL**	07/02/2026

ITEM	CONCEPTO	02/02		05/02		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	* Estado del interruptor de velocidad (Gatillo)	✓		✓											
	* Estado de la carcaza	✓		✓											
	Estado de portabrocas	✓		✓											
	* Estado boton control avance/reversa	✓		✓											
	* Estado boton de bloqueo	✓		✓											
	* Estado selector de modos	✓		✓											
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓											
	Estado del botón del seguro	✓		✓											
	* Estado del mango	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
	Estado de la base de trabajo	✓		✓											
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓											
FIRMA	OPERADOR	Freddy		Freddy		—		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Duque		Laura Duque		—		—		—		—			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

CONSORCIO URG

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliación Urgencias e infrasestrucutura de alta complejidad HSRT			EQUIPO	VIBRADOR DE CONCRETO
MARCA	A. ubros	MODELO	NT	IDENTIFICACION	#6
OPERARIO	Manuel Polo	SEMANA DEL	02-02-26	AL	07-02-26

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		04-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					✓									
	* El Cable de alimentación está en buen estado.					✓									
	* La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.					✓									
	* El cabezote se encuentra en buen estado.					✓									
	* Puntos de apoyo con facilidad de movimiento					✓									
	*Guarda de encendido en buen estado					✓									
	*La palanca de accionamiento sin rupturas y/o fisuras					✓									
	*Los resortes de amortiguación están en buen estado					✓									
	*El equipo no presenta ruidos abirnales y el encendio es perfecto					✓									
	* El motor se encuentra en buen estado.					✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		Manuel		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		Laura Ortiz.		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

CONSORCIO LRG

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO: Ampliación Urgencias e infrasestrucutura de alta complejidad HSRT
EQUIPO: VIBRADOR DE CONCRETO
MARCA: Bosch
MODELO: N/T
IDENTIFICACION: #1
OPERARIO: Oscar Arisitizabal
SEMANA DEL: 02-02-26 AL 08-02-2026

ITEM	CONCEPTO	— B	— M	— B	— M	04-02-26 B	04-02-26 M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M
ESTADO GENERAL	* Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					✓									
	* El Cable de alimentación está en buen estado.					✓									
	* La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.					✓									
	* El cabezote se encuentra en buen estado.					✓									
	* Puntos de apoyo con facilidad de movimiento					✓									
	*Guarda de encendido en buen estado					✓									
	*La palanca de accionamiento sin rupturas y/o fisuras					✓									
	*Los resortes de amortiguación están en buen estado					✓									
	*El equipo no presenta ruidos abirnales y el encendio es perfecto					✓									
	* El motor se encuentra en buen estado.					✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		Oscar		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		Laura Ortiz		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

CONSORCIO URG

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO: Ampliación Urgencias e infrasestrucutura de alta complejidad HSRT
EQUIPO: VIBRADOR DE CONCRETO
MARCA: A. Libros
MODELO: NT
IDENTIFICACION: #5
OPERARIO: Jose Diaz correa
SEMANA DEL: 02-01-2016 AL 07-01-26

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		01-07-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)					✓									
	* El Cable de alimentación está en buen estado.					✓									
	* La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.					✓									
	* El cabezote se encuentra en buen estado.					✓									
	* Puntos de apoyo con facilidad de movimiento					✓									
	*Guarda de encendido en buen estado					✓									
	*La palanca de accionamiento sin rupturas y/o fisuras					✓									
	*Los resortes de amortiguación están en buen estado					✓									
	*El equipo no presenta ruidos abirnales y el encendio es perfecto					✓									
	* El motor se encuentra en buen estado.					✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		[signature]		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		Mario Ortiz		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

CONSORCIO URG

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO: Ampliación Urgencias e infrasestrucutura de alta complejidad HSRT
EQUIPO: VIBRADOR DE CONCRETO
MARCA: Bosch
MODELO: NT
IDENTIFICACION: #01
OPERARIO: Ferney Patiño
SEMANA DEL: 02-02-2026 AL 07-02-2026

ITEM	CONCEPTO	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	06-02-26 B	06-02-26 M	— B	— M	— B	— M
ESTADO GENERAL	* Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)									–					
	* El Cable de alimentación está en buen estado.									–					
	* La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.									–					
	* El cabezote se encuentra en buen estado.									–					
	* Puntos de apoyo con facilidad de movimiento									–					
	*Guarda de encendido en buen estado									–					
	*La palanca de accionamiento sin rupturas y/o fisuras									–					
	*Los resortes de amortiguación están en buen estado									–					
	*El equipo no presenta ruidos abirnales y el encendio es perfecto									–					
	* El motor se encuentra en buen estado.									–					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	–		–		–		–		Ferney Patiño		–		–	
	INSPECCIONÓ	–		–		–		–		LOOYO OTIZ.		–		–	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

CONSORCIO URG



PROYECTO: Ampliación Urgencias e infrasestrucutura de alta complejidad HSRT

EQUIPO: CORTADORA DE LADRILLO

MARCA: WEG MODELO:

IDENTIFICACION: # 01

OPERARIO: Oswaldo Maldonado

SEMANA DEL: 02-02-2026 AL 07-02-26

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		06-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.									✓					
	* Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.									✓					
	* La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.									✓					
	*Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.									✓					
	* El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.									✓					
	*Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.									✓					
	*La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.									✓					
	*Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.									✓					
	*Estado General del Cable Electrico o de Potencia.									✓					
	* Estado General de la Carcasa									✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		—		—		Oswaldo		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		—		—		laura ortiz.		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	—			

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** SIERRA ELECTRICA

MARCA Makita **MODELO** 5007 N **IDENTIFICACION** 05

OPERARIO Jhon Benavides **SEMANA DEL** 09/02/2026 **AL** 14/02/2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA		10/02		11/02		FECHA		13/02		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓				✓					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓		✓				✓					
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓				✓					
	* Estado del mango			✓		✓				✓					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)			✓		✓				✓					
	P			✓		✓				✓					
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓		✓				✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica			✓		✓				✓					
	Estado general de la guía de corte			✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓				✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		[signature]		[signature]		—				—		—	
	INSPECCIONÓ	✓		Lauren Sierra		Laura Sierra		—		Lauren Sierra		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** TALADRO

MARCA Makita **MODELO** HR2470 **IDENTIFICACION** 34

OPERARIO Fredy Rodriguez **SEMANA DEL** 09/02/2016 **AL** 14/02/2016

ITEM	CONCEPTO	09/02		10/02		11/02		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	* Estado del interruptor de velocidad (Gatillo)	✓		✓		✓									
	* Estado de la carcaza	✓		✓		✓									
	Estado de portabrocas	✓		✓		✓									
	* Estado boton control avance/reversa	✓		✓		✓									
	* Estado boton de bloqueo	✓		✓		✓									
	* Estado selector de modos	✓		✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓		✓									
	Estado del botón del seguro	✓		✓		✓									
	* Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓		✓									
FIRMA	OPERADOR	Fredy		Fredy		Fredy		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	Lauren Suarez		Lauren Suarez		Lauren Suarez		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** TRONZADORA

MARCA Dewalt **MODELO** D28730-B3 **IDENTIFICACION** # 05

OPERARIO Said Larrotta **SEMANA DEL** 04/02/2026 **AL** 14/02/2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA		7/02/26		11/02		12/02		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓							
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓		✓		✓							
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓							
	* Estado del mango			✓		✓		✓							
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduacion profundidad de corte)			✓		✓		✓							
	Estado de la cubierta del disco			✓		✓		✓							
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓		✓		✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora			✓		✓		✓							
	Estado general de la guía de corte			✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Said L.		Said L		Said L		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		✓		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PULIDORA
MARCA	DEWALT	**MODELO**	64120-B3	**IDENTIFICACION**	#08
OPERARIO	Fabian E. Rodriguez	**SEMANA DEL**	09/02/2026	**AL**	14/02/2026

ITEM	CONCEPTO	09/02		10/02		11/02		FECHA		13/02		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	✓		✓		✓				✓					
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del mango	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓				✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓				✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓				✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		—				—		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		—		Laura Suarez		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** SIERRA ELECTRICA

MARCA makita **MODELO** HS2470 **IDENTIFICACION** # 39

OPERARIO William Suarez **SEMANA DEL** 16/02/2026 **AL** 21/02/2026

ITEM	CONCEPTO	16/02		FECHA		18/02		19/02		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	/				/		/							
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/				/		/							
	* Estado del accesorio portadiscos	/				/		/							
	* Estado del mango	/				/		/							
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/				/		/							
	P	/				/		/							
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/				/		/							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	/				/		/							
	Estado general de la guía de corte	/				/		/							
	Estado de la plaqueta de identificación	/				/		/							
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]	—			[signature]		[signature]		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	[signature]	—			[signature]		[signature]		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** TRONZADORA

MARCA Dewalt **MODELO** D28730-B3 **IDENTIFICACION** #05

OPERARIO Said Larcotta **SEMANA DEL** 26/01/2026 **AL** 31/01/2026

ITEM	CONCEPTO	26/01		27/01		28/01		29/01		30/01		31/01		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduacion profundidad de corte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Said C		Said C		Said C		Said C		Said C		Said C		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		Laura Suarez		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** TALADRO

MARCA makita **MODELO** HR2470 **IDENTIFICACION** 341

OPERARIO Freddy Rodriguez **SEMANA DEL** 7/10/2016 **AL** 21/10/2016

ITEM	CONCEPTO	FECHA		7/10/16		14/10/16		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓									
	* Estado del interruptor de velocidad (Gatillo)			✓		✓									
	* Estado de la carcaza			✓		✓									
	Estado de portabrocas			✓		✓									
	* Estado boton control avance/reversa			✓		✓									
	* Estado boton de bloqueo			✓		✓									
	* Estado selector de modos			✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓									
	Estado del botón del seguro			✓		✓									
	* Estado del mango			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
	Estado de la base de trabajo			✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓									
FIRMA	OPERADOR	—		Freddy		Freddy		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		Laura Suarez		Laura Suarez		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PULIDORA
MARCA	DEWALT	**MODELO**	DCG720-B3	**IDENTIFICACION**	#08
OPERARIO	Jhon Bermudez	**SEMANA DEL**	16/02/2026	**AL**	21/02/2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA 16/02		FECHA 17/02		FECHA 18/02		FECHA		FECHA 20/02		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	✓		✓		✓				✓					
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del mango	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓				✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓				✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓				✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓				✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		—				—		—	
	INSPECCIONÓ	Lobo Suarez		Lobo Suarez		Lobo Suarez		—		Lobo Suarez		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** TALADRO

MARCA makita **MODELO** HR2470 **IDENTIFICACION** #39

OPERARIO wiliam sanchez **SEMANA DEL** 23/02/2026 **AL** 28/02/26

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		24/02/26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones electricas					/									
	* Estado del interruptor de velocidad (Gatillo)					/									
	* Estado de la carcaza					/									
	Estado de portabrocas					/									
	* Estado boton control avance/reversa					/									
	* Estado boton de bloqueo					/									
	* Estado selector de modos					/									
	Estado del interruptor de acción de martillo					/									
	Estado del botón del seguro					/									
	* Estado del mango					/									
	Estado de la plaqueta de identificación					/									
	Estado de la base de trabajo					/									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base					/									
FIRMA	OPERADOR	—		—		William		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		laura Suarez		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ACH INFRAESTRUCTURA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** SIERRA ELECTRICA 05

MARCA makita **MODELO** 5007N **IDENTIFICACION** #05

OPERARIO Benavides Rios **SEMANA DEL** 23/02/26 **AL** 28/02/26

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		25/02/26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓									
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo					✓									
	* Estado del accesorio portadiscos					✓									
	* Estado del mango					✓									
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduacion profundidad de corte)					✓									
	P					✓									
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)					✓									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica					✓									
	Estado general de la guía de corte					✓									
	Estado de la plaqueta de identificación					✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		[signature]		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	✓		—		Cristian Sucerquia		—		✓		✓		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PULIDORA
MARCA	BEWAH	**MODELO**	E4126-R3	**IDENTIFICACION**	~~#~~ 08
OPERARIO	Benavides Rios	**SEMANA DEL**	23/02/26	**AL**	28/02/26

ITEM	CONCEPTO	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M	25/02/26 B	25/02/26 M	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M	~~FECHA~~ B	~~FECHA~~ M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓									
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓									
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)					✓									
	* Estado de la tuerca de aseguramiento					✓									
	* Estado del mango					✓									
	* Estado del cuerpo (Carcaza)					✓									
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓									
	Estado general de la guía y la guarda					✓									
	Estado de la plaqueta de identificación					✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		—		—		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		Mauricio Suarez		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL



PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PULIDORA 30
MARCA	DEWALT	**MODELO**	525-5HE-24C-2.	**IDENTIFICACION**	# 30.
OPERARIO	Luis Rivera	**SEMANA DEL**	23/02/26	**AL**	28/02/26

ITEM	CONCEPTO	23/02/26		24/02/26		25/02/26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓									
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓									
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)					✓									
	* Estado de la tuerca de aseguramiento					✓									
	* Estado del mango					✓									
	* Estado del cuerpo (Carcaza)					✓									
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓									
	Estado general de la guía y la guarda					✓									
	Estado de la plaqueta de identificación					✓									
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	—		—		Luis Rivera		—		—		—		—	
	INSPECCIONÓ	—		—		Laura Suarez		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

F-HSE-037

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-HT-X41-HT7. **IDENTIFICACION** #22.

OPERARIO Jhon Jairo Benavides **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 189	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 144.	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA ~~~~	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO													—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA xp **MODELO** ANC 354-2024. **IDENTIFICACION**

OPERARIO Fabian Heraldo. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 2228.														
	MARCA xp.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 15	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA xp.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	HA		HA		HA		HA		HA		HA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	/		/		/		/		/		/			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		—	
	INSPECCIONÓ	Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-XH-24-2025 **IDENTIFICACION** # 19.

OPERARIO Estefania Vargas. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 225	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 16	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	
	INSPECCIONÓ	laura Ortiz		laura ortiz		laura Ortiz		laura ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	XP	**MODELO**	LIC2 - MIT - 14 - EM.	**IDENTIFICACION**	# 21.
OPERARIO	Manuel Polo	**SEMANA DEL**	09-02-2026	**AL**	14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 155	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26			
	MARCA XP	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 97	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA			
	MARCA XP	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Hanu		Hanu		Hanu		Hanu		Hanu		Hanu		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** XP-243-TIP. **IDENTIFICACION** #20.

OPERARIO Wolfran Alvear. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 179														
	MARCA XP.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 17														
	MARCA XP.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA ~~FECHA~~	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	/		/		/		/		/		/		\	\
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		\	\
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		\	\
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	wolfran		wolfran		wolfran		wolfran		wolfran		wolfran		—	
	INSPECCIONÓ	laura Ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz		laura ortiz.		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 4102-MT-21Xm. **IDENTIFICACION** # 20

OPERARIO Jorney Patiño **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 361	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 12	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 07-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA ____	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		—	
	INSPECCIONÓ	Iavo Ortiz		Iavo Ortiz		Iavo Ortiz		Iavo Ortiz		Iavo Ortiz		Iavo Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega	**MODELO**	210 cm t x 46 n.	**IDENTIFICACION**	# 25.
OPERARIO	Joel Rodriguez.	**SEMANA DEL**	09-02-2026	**AL**	14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 423.	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA Sosega.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 18	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA YP.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	HA		HA		HA		HA		HA		HA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA ____	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	#A		#A		#A		#A		#A		#A			
	* Estado de los seguros de los ganchos	#A		#A		#A		#A		#A		#A			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	R		R		R		R		R		R		—	
	INSPECCIONÓ	lauro ortiz		lauro ortiz		lauro ortiz		lauro ortiz		lauro ortiz		lauro ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sosega **MODELO** 2354 11-2421. **IDENTIFICACION** # 27.

OPERARIO Jairo Espinosa **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 421	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26			
	MARCA Sosega.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, raiaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 25	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26			
	MARCA XO.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA ———	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO													—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 10106. Nt - X4 - 6m. **IDENTIFICACION** # 15.

OPERARIO Jose Correa. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 181	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 86	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO													—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** V07 XP -6 M1. **IDENTIFICACION** # 18.

OPERARIO Oscar Avisti Zabal **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 180	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 412	09-02-26		10-02-26		11-02-26		12-02-26		13-02-26		14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	H/A		H/A		H/A		H/A		H/A		H/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-HT-XP-EM **IDENTIFICACION** # 17.

OPERARIO fabian edilbrando. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 166	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 107	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	* Estado de los seguros de los ganchos	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** 402-HT-X4-6FT, **IDENTIFICACION** #24.

OPERARIO Andres Diaz. **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26.		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 165														
	MARCA XP.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 425	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	✓A		✓A		✓A		✓A		✓A		✓A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	A		A		A		A		A		A			
	* Estado de los seguros de los ganchos	A		A		A		A		A		A			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Andre P.		Andre P.		Ander b		Ander D		Andres D		Andre P.		—	
	INSPECCIONÓ	Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		Lauro Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT	**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega **MODELO**	XP- 402- RIT-01.	**IDENTIFICACION**	#28.
OPERARIO	Fabricio Torres	**SEMANA DEL**	09-02-2026 **AL**	14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 1127	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO .16.	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO													—	
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Insafe **MODELO** Insafe. **IDENTIFICACION** #09

OPERARIO Jasfran Rojas **SEMANA DEL** 09-02-2026 **AL** 14-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
ARNES	SERIE O CÓDIGO 1804.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA In Safe.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 57	FECHA 09-02-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
	MARCA xD.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 09-10-26		FECHA 10-02-26		FECHA 11-02-26		FECHA 12-02-26		FECHA 13-02-26		FECHA 14-02-26		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	JOSFION		JOSFION		JOSFION		JOSFION		JOSFION		JOSFION			
	INSPECCIONÓ	LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** 402-MT-XA-MT **IDENTIFICACION** # 22.

OPERARIO Jhon Benavides. **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 21-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 189														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, raiaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 144	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			T/A		T/A		T/A		T/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			NA		NA		NA		NA					
	* Estado de los seguros de los ganchos			NA		NA		NA		NA					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-HR-24-2026 **IDENTIFICACION** # 19.

OPERARIO Esteban Vargas **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 21-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 225 MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 18 MARCA XP .	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			T A		T A		T A		T A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	INSPECCIONÓ			1009 Orfiz		1009 Orfiz		1009 Orfiz		1009 Orfiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	XP	**MODELO**	H02-HIT-19-ETL	**IDENTIFICACION**	#21
OPERARIO	Manuel Polo	**SEMANA DEL**	18-02-2026	**AL**	21-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 155														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 97	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26.		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			N A		N A		N A		N A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		—		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			TA		TA		TA		TA					
	* Estado de los seguros de los ganchos			TA		TA		TA		TA					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			Hanul		Hanul		Hanul		Hanul					
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** XP-245-MIP. **IDENTIFICACION** # 20.

OPERARIO Wolfran Alvear. **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 21-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 179														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 17	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			T/A		T/A		T/A		T/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			wolfgan		wolfgan		wolfgan		wolfgan					
	INSPECCIONÓ			laura Ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz		laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega	**MODELO**	210-FIT-X46M.	**IDENTIFICACION**	# 25.
OPERARIO	Joel Rodriguez.	**SEMANA DEL**	16-02-2026	**AL**	22-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO U23	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 18	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			NA		NA		NA		NA					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			R		R		R		R					
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sosega **MODELO** 2354 4-2421. **IDENTIFICACION** # 27.

OPERARIO Jairo Espinosa **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 22-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 421														
	MARCA Sosega														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 25	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			T'A		T'A		T'A		T'A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			NA		NA		NA		NA					
	* Estado de los seguros de los ganchos			NA		NA		NA		NA					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ			laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT	**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	XP. **MODELO** 1006 XT-XP-6M.	**IDENTIFICACION**	# 15.
OPERARIO	Jose Correa. **SEMANA DEL**	16-02-2026 **AL**	21-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 181														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 86	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			TA		TA		TA		TA					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos			N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ			Mauro Ortiz		Laura Ortiz		Mauro Ortiz		Mauro Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** U07 XP-6M1. **IDENTIFICACION** # 18.

OPERARIO Edgar Aristizabal. **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 21-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 180														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 412	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			FA		FA		FA		FA					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			YA		YA		YA		YA					
	* Estado de los seguros de los ganchos			YA		YA		YA		YA					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			OSCAR		OSCAR		OSCAR		OSCAR					
	INSPECCIONÓ			LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ		LAURA ORTIZ					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** 402-MT-XP-TM. **IDENTIFICACION** # 17

OPERARIO Fabian Edilbrando **SEMANA DEL** 16-02-2026 **AL** 21-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 166														
	MARCA XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 1107	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			+A		+A		+A		+A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos			N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			F.R.		F.R.		F.R.		F.R.					
	INSPECCIONÓ			laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT	**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega **MODELO**	XP-402-FIT-01	**IDENTIFICACION**	#28.
OPERARIO	Fabrizzio Torres.	**SEMANA DEL**	16-02-2026. **AL**	22-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 424														
	MARCA Sosega														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 16														
	MARCA Sosega.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		19-02-26		20-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			NA		NA		NA		NA					
	* Estado de los seguros de los ganchos			NA		NA		NA		NA					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ			laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Insafe	**MODELO**	Insafe.	**IDENTIFICACION**	# 09.
OPERARIO	Josfren Rojas	**SEMANA DEL**	16-02-2026	**AL**	21-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 1504.	FECHA		17-02-26		18-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA Insafe.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓									
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓									
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓									
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓									
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 57	FECHA		17-02-26		18-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓									
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			N/A		N/A									
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓									
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓									
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓									

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA		17-02-26		18-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓									
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			N/A		N/A									
	* Estado de los seguros de los ganchos			N/A		N/A									
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			Jasman		Jasman									
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP. **MODELO** 402-FIT-XP-FM1. **IDENTIFICACION** # 20.

OPERARIO Manuel Avila **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 155	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 97	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26.		27-02-26.		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel					
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** XP-245-TIP **IDENTIFICACION** # 20.

OPERARIO Wolfan Ayear. **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 179 **MARCA** XP														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							
		FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 17 **MARCA** XP.														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 402-HT-24 EM. **IDENTIFICACION** #20.

OPERARIO Yerney Patiño **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 361	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, raiaduras, corrosión)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		\	\			\	\	\	\	\	\
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 12	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	NA		NA		\	\	NA		\	\	\	\	\	\
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		\	\	✓		\	\	\	\	\	\

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓				✓							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T/A		T/A				T/A							
	* Estado de los seguros de los ganchos	T/A		T/A				T/A							
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]							
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz				Laura Ortiz							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sosega **MODELO** 210+1T- X16H **IDENTIFICACION** # 25

OPERARIO Jafl Rodriguez **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 423	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 18	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 21-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz.		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA Sofega **MODELO** 2354 4-2421 **IDENTIFICACION** #27.

OPERARIO Jairo espinoza **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 421	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sofega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 25	23-02-26		24-02-26		25-02-26		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA X1P	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz		Lava Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** 10106 MT-X4-6M **IDENTIFICACION** # 15

OPERARIO JOSE CORREA **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 181	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO	23-02-26		24-02-26		25-02-26		FECHA		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	MT		MT		MA		MA		MH					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

F-HSE-037

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	/		/		/		/		/					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz		laura ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA XP **MODELO** Uot xp-6M. **IDENTIFICACION** AH 18.

OPERARIO OSCAR ARISTIZABAL. **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 180	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 412	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA XP.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T°A		T°A		T°A		T°A		T°A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	FA		FA		FA		FA		FA		FA		FA	
	* Estado de los seguros de los ganchos	FA		FA		FA		FA		FA		FA			
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	OSCN		OSCN		OSCN		OSCN		OSCN					
	INSPECCIONÓ	Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz		Lauro Ordiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT **EQUIPO** PROT. CONTRA CAIDA

MARCA X P. **MODELO** 402 - XIT - XP - TM1 **IDENTIFICACION** #1 17.

OPERARIO Fabian edibrando **SEMANA DEL** 23-02-2026 **AL** 28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARNES	SERIE O CÓDIGO 166 MARCA X P														
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO 1107 MARCA X P.	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T'M		T'M		T'M		N/A		T'M					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T'A		T'A		T'A		T'A		T'A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	T'A		T'A		T'A		T'A		T'A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Lcdo Ortiz		Lcdo Ortiz		Lcdo Ortiz		Lcdo ortiz		Lcdo ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	XP	**MODELO**	402-MIF-X4-6M,	**IDENTIFICACION**	
OPERARIO	(Andres) Prof	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO	~~FECHA~~		24026		~~23-02-25~~		25-02-26		27-02-26		~~FECHA~~		~~FECHA~~	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (ruptura en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)			✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)			TA		TA		TA		TA					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)			✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL ____ SERIE (si aplica)	FECHA		24-01-26		25-01-26		26-01-26		27-01-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO			Andres O		Andres O		Andres O		Andres O					
	INSPECCIONÓ			Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Sosega	**MODELO**	XP_402-FIT-01	**IDENTIFICACION**	# 18.
OPERARIO	Fabriciano Torres	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	**SERIE O CÓDIGO** 424	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESLINGAS	**SERIE O CÓDIGO** 16	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA 27-02-26		FECHA		FECHA	
	MARCA Sosega.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	T/A		T/A		T/A		T/A		T/A					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

LINEA DE VIDA	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____ SERIE (si aplica)	23-02-26		24-02-26		25-02-26		26-02-26		27-02-26		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T A		T T		T A		T A		T A					
	* Estado de los seguros de los ganchos	T A		T A		T A		T A		T A					
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO														
	INSPECCIONÓ	Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz		Laura Ortiz					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PROYECTO	Ampliacion infraestructura alta complejidad ampliacion hosp. HUSRT			**EQUIPO**	PROT. CONTRA CAIDA
MARCA	Insafe	**MODELO**	Insafe.	**IDENTIFICACION**	# 09.
OPERARIO	Jaofren Rojas	**SEMANA DEL**	23-02-2026	**AL**	28-02-2026.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	DIA DE LA REVISIÓN Y ESTADO DEL EQUIPO													
ARNES	SERIE O CÓDIGO 1504. MARCA In safe.	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del anillo de gancho trasero (deformaciones)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las hebillas de las correas (deformaciones, rajaduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							
ESLINGAS	SERIE O CÓDIGO S/	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	MARCA xp.	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	* Estado de las correas (rupturas en las fibras)	✓		✓		✓		✓							
	*Estado del absorbedor de impacto (estirado, cubierta rota)	N/A		N/A		N/A		N/A							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los seguros de los ganchos	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de las costuras (desgaste, puntadas rotas, abrasión)	✓		✓		✓		✓							

Powered by CamScanner

	LV VERTICAL _____ LV HORIZONTAL _____	FECHA 23-02-26		FECHA 24-02-26		FECHA 25-02-26.		FECHA 26-02-26		FECHA		FECHA		FECHA	
	SERIE (si aplica)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	* Estado de la la línea de vida (Alambres sueltos, rotos)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado de los ganchos (deformidades, rupturas, fraccionamientos, puntas salidas)	T'H		T'T		T'A		T'A							
	* Estado de los seguros de los ganchos	T'H		T'T		T'A		T'A							
FIRMA	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	JOSFIAN		JOSFIAN		JOSFIAN		JOSFIAN							
	INSPECCIONÓ	LOUD Ort·7		LOUD Ort·7		LOUD Ort·7.		LOUD Ort·7							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ANEXO 11.

INFRAESTRUCTURA CONSORCIO	INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FORMATO	
		Código : F-SST-02	
		Versión: 01 Fecha: 24/01/26	Página 1 de 1

INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026
Nombre del Trabajador: Laura Lorena Suarez
Cedula: 1010122910
Cargo: Coordinadora HSEQ
Encargado de la Inducción: Laura Ortiz

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a la compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Socialización de Políticas
- Socialización de Objetivos
- Socialización de Responsabilidades
- Socialización de Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral
- Socialización de Peligros y Riesgos
- Socialización Matriz IPEVR
- Socialización de Actos y Condiciones inseguras
- Socialización EPP
- Socialización del COPPAST
- Socialización del Comité de Convivencia
- Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Yo, como trabajador del consorcio Infraestructura ACH estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados y socializados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor y el cuidado de mi salud.

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, Procedimientos Generales de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, Las políticas, y demás información pertinente al SG-SST. Por lo tanto me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere que afecte mi salud y condiciones de trabajo.
Duración de la inducción: 1:00 Hora

Firma: Laura Suarez

ANEXO 12.

ASOCIACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
ASSOC S.A.S.

Transversal 9 No. 28A 50 Barrio Maldonado. Tunja, Boyacá - Colombia
Cel. 317 638 6099 - 316 602 9208
Email: assoc.colombiaocupacional@gmail.com

CONCEPTO DE APTITUD



Paciente: LAURA LORENA SUAREZ SAAVEDRA
Identificación: CC 1010121910
Género: F Fecha de Nacimiento: 2000-09-10 Edad: 25 A
Teléfono: 3204591139
Dirección CL 49 C NUM 9A 32
Residencia:
Profesión: PSICOLOGO
Nivel Educativo: Postgrado Grado de Escolaridad: Completa Estado Civil: Soltero(a)
Empresa: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Empresa en misión: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Actividad económica:
EPS: Sanitas S.A. ARL: Sin información AFP: COLPENSIONES

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL REALIZADA
Examen médico ocupacional pre ingreso

Orden No.: 00246006 Fecha apertura: 20260220 07:27:48
Fecha cierre: 20260220 08:36:37
Realizado en: Tunja - Boyacá

Cargo u Oficio: COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 1843 de 2025, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR),AUDIOMETRIA VIA AEREA,EXAMEN OPTOMETRICO

RECOMENDACIONES LABORALES

Higiene postural
Manejo adecuado de cargas
Pausa activas reposo visual
Realizar Pausas activas durante la jornada laboral
Uso de Elementos de Proteccion Personal y para riesgo biológico actual.
Mantener àngulos de confort
Uso de correcciòn visual permanente Y PARA LABORAR

MANEJO POR EPS

Valoración por optometra anual.
seguimiento en eps de patologia de base

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta baja en carbohidratos Y grasas.
Ejercicio fisico 30 minutos de intesidad moderada diarios.

INCLUIR EN PVE

Conservación visual.

RECOMENDACION EN AUDIOMETRIA

Control según PVE.
Reposo auditivo extralaboral.

RECOMENDACION EN OPTOMETRIA

control cada año.
uso de correccion optica permanente.

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO



Firma del medico especialista en Salud Ocupacional
Nombre: EMILCE CARDENAL PIRAZAN
Identificación: CC 40046345
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y RL
Licencia S.O.: 0893 - Exp 11/07/2019 Registro No.: 807



Firma del Paciente
Tipo y No. Id: CC 1010121910

ANEXO 13.

Tunja, 21 de febrero de 2026

Señor

LUARA LORENA SUAREZ SAAVEDRA

COORDINADORA HSEQ

Ciudad

REF: RESULTADO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO

Cordial saludo.

Me permito comunicarle que, según el resultado de su examen de pre-ingreso, con fecha 20/02/2026, usted CUMPLE con las condiciones para desempeñar la labor.

No obstante, el médico ocupacional le recomienda:

- Uso de EPP concorde a la labor
- Higiene postural
- Pausas activas
- Manejo adecuado de cargas
- Uso correctivo visual permante

No siendo más el motivo de la presente, me suscribo.

Atentamente,

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 8

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

Tunja, 6 de marzo de 2026

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS.
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE 2025. ": INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN DE COBERTURA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH** identificado con NIT. 902.020.164-7 cuenta con cobertura para el posterior pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES) correspondiente al mes de febrero 2026.

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

Tunja, 6 de marzo de 2026

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS.
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE DE 2025. ": INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero 2026, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Cordialmente,

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

Tunja, 6 de marzo de 2026

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS.
Supervisor del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. 664 DE DE 2025. ": INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial saludo,

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH para el periodo comprendido entre el 01 de febrero 2026 al 28 de febrero de 2026, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales, Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,

RICARDO GOMEZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN

ELABORÓ: ECRP
APROBÓ: RGC

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 9

CALIDAD DE MATERIALES

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2


Reporte de calidad

1/02/2026 | 28/02/2026 | Planta Sogamoso | Cemento Estructural Max

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4689 cm2/g	1.5 %	117 min	187 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
19.7 MPa	31.9 MPa	37.3 MPa	(Blank) MPa

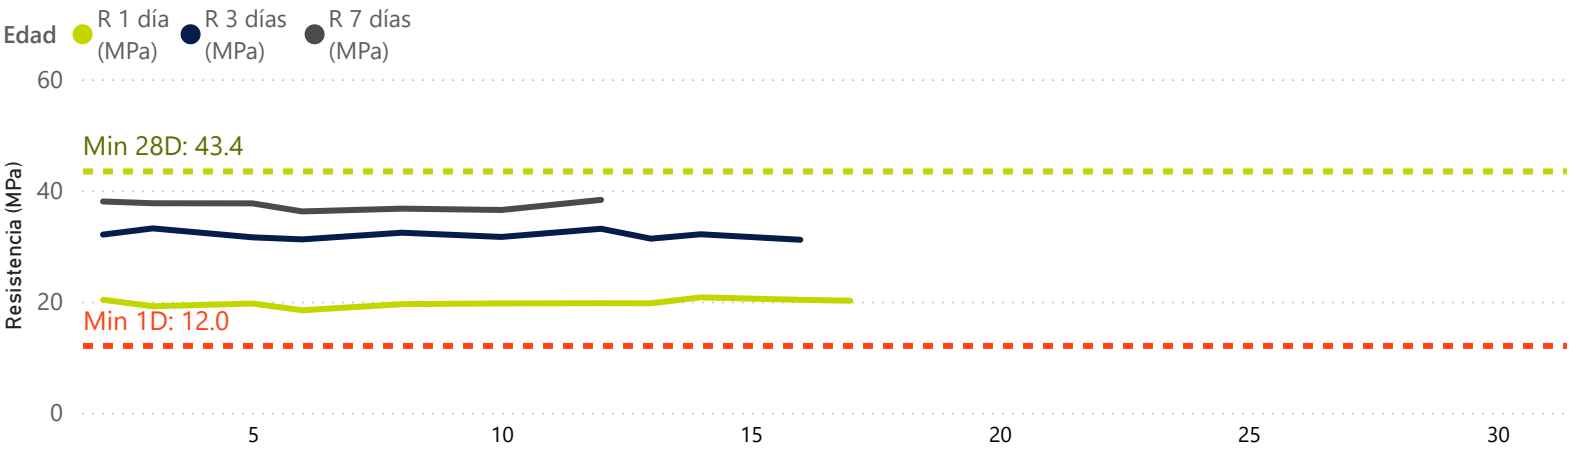

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.


* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
3,07 g/cm3	6,2 %	0,039 %	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases minerológicas (Bogué)

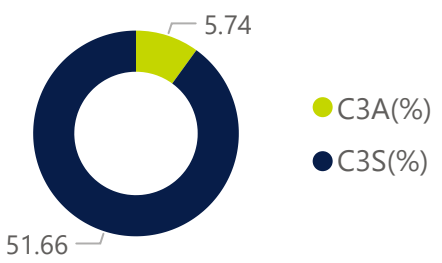

SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO
20.00 %	4.73 %	3.29 %	59.69 %

SO3	Perdidas por ignición	Equivalente alcalino
3.07 %	5.62 %	0.60 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
2/02/2026	4896	1.3	112	180	20.3	32.0	38.0	
3/02/2026	4852	1.3	105	170	19.1	33.2	37.7	
5/02/2026	4692	1.4	131	200	19.6	31.5	37.7	
6/02/2026	4728	1.7	111	180	18.4	31.2	36.2	
8/02/2026	4602	1.6	111	180	19.5	32.4	36.7	
10/02/2026	4739	1.7	121	200	19.7	31.6	36.5	
12/02/2026	4672	1.5	110	190	19.7	33.1	38.3	
13/02/2026	4438	1.7	121	190	19.7	31.3		
14/02/2026	4688	1.6	121	190	20.7	32.1		
16/02/2026	4647	1.9	123	190	20.3	31.1		
17/02/2026	4705	1.5	121	180	20.1			
19/02/2026	4608	1.4	122	190				

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).


Reporte de calidad

1/02/2026 | 28/02/2026 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5175 cm2/g	5.4 %	151 min	258 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
9.2 MPa	18.6 MPa	21.9 MPa	(Blank) MPa

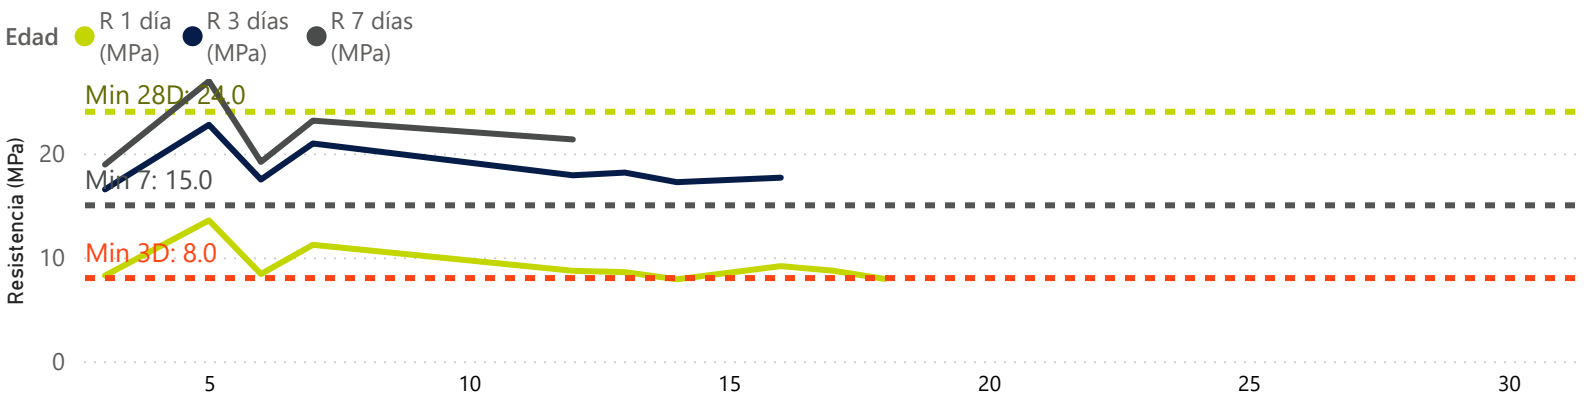


* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2,95 g/cm3	6,1 %	0,064 %	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



Perdidas por ignición

11.52 %

Equivalente alcalino

0.66 %

SO3

2.34 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
3/02/2026	5380	4.9	151	255	8.2	16.5	18.9	
5/02/2026	5128	4.4	149	255	13.6	22.8	27.0	
6/02/2026	5180	5.5	147	255	8.4	17.5	19.2	
7/02/2026	5110	6.3	147	255	11.2	21.0	23.2	
12/02/2026	5247	5.1	152	270	8.7	17.9	21.3	
13/02/2026	5135	5.6	151	255	8.6	18.2		
14/02/2026	5250	4.9	151	255	7.9	17.2		
16/02/2026	4915	6.0	161	270	9.2	17.7		
17/02/2026	5080	4.5	156	255	8.7			
18/02/2026	5320	7.1	140	255	7.9			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

COLCONCRETOS S. A.
NIT. 826.000.089 - 1

Tunja 12 de febrero de 2026

Señores:
CONSORCIO INFRAESTUCTURA ACH
Tunja

REF: INFORME DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Estamos relacionando los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a compresión realizado en nuestro laboratorio, sobre cilindros elaborados y curados de acuerdo a la NTC 550, con seguimiento de asentamiento según NTC 396 y fallados según NTC 673 a la edad especificada

Lugar de suministro: Hospital San Rafael de Tunja-Boyacá.

No.	FECHA	f 'c	EDAD	FECHA	PESO	DENSIDAD	RESISTENCIA		TIPO	RESISTENCIA	% EDAD DADA
MUESTRA	FUNDIDA	Kg./cm^2	DÍAS	FALLA	g	Kg./m^3	MPa	Kgf/cm^2	Fallas	PROM (Kgf/cm^2)	
121	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	3	2026-02-07	3866	2461	23.9	244	2	239	85
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	3	2026-02-07	3809	2425	23.0	234	2		
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3803	2421	30.0	306	2	302	108
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3789	2412	29.4	299	2		
	2026-02-04	28 Mpa GF ACEL 7D	7	2026-02-11	3803	2421	29.5	301	6		

Aclaración de nomenclatura:

28 MPa GF ACEL 7D 280 Kgf./cm^2 Grava Fina Acelerado a 7 Días

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

ING. VICTOR ANDRÉS ROJAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CALIDAD

LÓPEZ HERMANOS S.A.S GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2	28/04/2023
		EL-INF-08	-

Número de ensayo: **145205 (1)**

Solicitado por: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Dirección: DG 74 D 32 B B 25
NIT./C.C.: 902020164-7
Tel.: 3137832867
Obra: TORRE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1)
Orden: 42603
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos de concreto

Muestra tomada por: El cliente
Norma de ensayo: NTC673-2021
Fecha de ingreso muestra: 9/02/2026
Máquina de ensayo: SOILTEST
Certificado de calibración: REM-LF-659

Ref: **N/A-N/A-N/A**
Fecha de moldeo: 4/2/2026
Fecha de rotura : 7/2/2026 0:00 10:34
Edad (días): 3 día (s) 1 hora(s)
f'c (MPa): 28
Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: Vigas y placa
Frente y Localización Vigas y placa de cubierta torre URG
Fecha Informe: 9/2/2026 17:04

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			Tipo de refrendado
						kN	lbf	MPa	psi				
1-145205 (1)	3,7	2,0	99,5	1,000	7776	122,156	27462	15,7	2280	56%	T2	2355	Neopreno
2-145205 (1)	3,93	2,0	102,5	1,000	8252	135,459	30452	16,4	2380	59%	T2	2362	Neopreno
3-145205 (1)	3,72	2,1	99,5	1,000	7776	106,205	23876	13,7	1990	49%	T2	2348	Neopreno
							Promedio:	**15,3 MPa**	**2220 psi**	**55%**			
							Desviación estandar:	**1,4**	**203**				
							Coeficiente de variación:	**9,2%**					

DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: No hay observaciones adicionales

REVISÓ Y APROBÓ
JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S

- Los resultados mostrados en Este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.

- Los resultados de Este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. el laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.

- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente. El ensayo fue realizado en las instalaciones de López Hermanos Tunja.

LÓPEZ HERMANOS S.A.S GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2	28/04/2023
		EL-INF-08	-

Número de ensayo: **145206 (2)**

Solicitado por: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH
Dirección: DG 74 D 32 B B 25
NIT./C.C.: 902020164-7
Tel.: 3137832867
Obra: TORRE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1)
Orden: 42603
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos de concreto

Muestra tomada por: El cliente
Norma de ensayo: NTC673-2021
Fecha de ingreso muestra: 9/02/2026
Máquina de ensayo: SOILTEST
Certificado de calibración: REM-LF-659

Ref: N/A-N/A-N/A
Fecha de moldeo: 4/2/2026
Fecha de rotura : 11/2/2026 11:40
Edad (días): 7 día (s) 2 hora(s)
f'c (MPa): 28
Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: Vigas y placa
Frente y Localización Vigas y placa de cubierta torre URG
Fecha Informe: 12/2/2026 10:43

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			Tipo de refrendado
						kN	lbf	MPa	psi				
1-145206 (2)	3,794	2,0	101,5	1,000	8091	173,258	38950	21,4	3100	76%	T4	2313	Neopreno
2-145206 (2)	3,786	2,0	101,0	1,000	8012	169,623	38133	21,2	3070	76%	T4	2309	Neopreno
3-145206 (2)	3,746	2,0	101,0	1,000	8012	167,101	37566	20,9	3030	75%	T4	2295	Neopreno
							Promedio:	**21,2 MPa**	**3070 psi**	**76%**			
							Desviación estandar:	**0,3**	**35**				
							Coeficiente de variación:	**1,2%**					

DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: No hay observaciones adicionales

REVISÓ Y APROBÓ
JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S
- Los resultados mostrados en Este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
- Los resultados de Este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. el laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente. El ensayo fue realizado en las instalaciones de López Hermanos Tunja.



FOTO 1, CILINDRO 1



FOTO 1, CILINDRO 2



FOTO 1, CILINDRO 3



FOTO 2, CILINDRO 1



FOTO 2, CILINDRO 2



FOTO 2, CILINDRO 3



FOTO 3, CILINDRO 1



FOTO 3, CILINDRO 2



FOTO 3, CILINDRO 3

REVISO Y APROBÓ

JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

-Fin del informe-

LÓPEZ HERMANOS S.A.S GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2	28/04/2023
		EL-INF-08	-

Número de ensayo: **145484 (1)**

Solicitado por: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH

Dirección: DG 74 D 32 B B 25

NIT./C.C.: 902020164-7

Tel.: 3137832867

Obra: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Orden: 42661

Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos de concreto

Muestra tomada por: El cliente

Norma de ensayo: NTC673-2021

Fecha de ingreso muestra: 18/02/2026

Máquina de ensayo: SOILTEST

Certificado de calibración: REM-LF-659

Ref: **N/A-N/A-N/A**

Fecha de moldeo: 4/2/2026

Fecha de rotura : 18/2/2026 13:58

Edad (días): 14 día (s) 4 hora(s)

f'c (MPa): 28

Asentamiento (cm): No reportado

Estructura: Vigas y placa de cubierta

Frente y Localización Vigas y placa de cubierta torre URG

Fecha Informe: 20/2/2026 8:06

Cilindro No.	Peso (Kg)	H/D	Diámetro promedio (mm)	FC	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de Falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información Adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			Tipo de refrendado
						kN	lbf	MPa	psi				
1-145484 (1)	3,806	2,0	101,0	1,000	8012	229,533	51601	28,6	4150	102%	T4	2318	Neopreno
2-145484 (1)	3,788	2,0	100,0	1,000	7854	204,293	45927	26	3770	93%	T5	2368	Neopreno
3-145484 (1)	3,792	2,0	100,0	1,000	7854	224,523	50475	28,6	4150	102%	T2	2363	Neopreno

Promedio: 27,7 MPa 4020 psi 99%

Desviación estandar: 1,5 219

Coeficiente de variación: 5,4%

DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: No hay observaciones adicionales

REVISÓ Y APROBÓ
JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S

- Los resultados mostrados en Este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.

- Los resultados de Este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. el laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.

- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente. El ensayo fue realizado en las instalaciones de López Hermanos Tunja.



FOTO 1, CILINDRO 1



FOTO 1, CILINDRO 2



FOTO 1, CILINDRO 3



FOTO 2, CILINDRO 1



FOTO 2, CILINDRO 2



FOTO 2, CILINDRO 3



FOTO 3, CILINDRO 1



FOTO 3, CILINDRO 2



FOTO 3, CILINDRO 3

REVISO Y APROBÓ

JOHANA CAROLINA CARO
TP. 15202-320655 BYC

-Fin del informe-

CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 9

CALIDAD DE MATERIALES INTERVENTORIA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados

No. BO26016629 Rev. 0

Fecha de Emisión: 2026/03/06

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construcción
Carrera 100 #25C-11 - Bodega 3 - Bogota D.C.,
Colombia
Phone: +57.6.01.6069292

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
CR 25 A 38 D SUR 111
ENVIGADO - ANTIOQUIA, ANTIOQUIA 902020105-2
COLOMBIA

Obra: B_19606 TERCER NIVEL DE LA TORRE DE URGENCIAS

Orden Comercial :	90688-3
Fecha de Recepción :	2026/03/05
Lugar de realización del ensayo :	LABORATORIO
Muestra ID :	BO26016629.001
Identificación de Muestra** :	3
Localización** :	COLUMNAS Y PANTALLA PISO 3
Fecha de Fundida** :	2026/01/19 06:59:00
Tipo del Material** :	Concreto
Edad (días)** :	45
Dimensión** :	4"x8"
Código de Mezcla** :	4500
Resistencia Nominal (MPa)** :	31
Número de Remisión** :	1
Asentamiento (mm)** :	152
Fecha de Rotura :	2026/03/05
Período de Análisis :	2026/03/06 al 2026/03/06
Ensayo Solicitado :	Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.
Método de ensayo :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S



Deivid Stiven Sastre Maldonado
Coordinador Técnico

06032026102100005864 90

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados

No. BO26016629 Rev. 0

Fecha de Emisión: 2026/03/06

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S



Deivid Stiven Sastre Maldonado
Coordinador Técnico

06032026102100005864 90

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

Ensayo de Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673:2021

Especificación Comparativa : --

Item(s) de Ensayo	Unid.	Especificación	001	002
Edad de Falla	Día(s)	-	45	45
Diametro Promedio	mm	-	100.00	99.75
Área de Sección Transversal	mm²	-	7854	7815
Carga Máxima	kN	-	230	200
Tipo de Falla	-	-	2	4
Resistencia a la Compresión	psi	-	4239	3705
Resistencia a la compresión	MPa	-	29.2	25.5
Promedio Resistencia a la compresión	MPa	-	27.4	
Porcentaje Alcanzado	%	-	94.3	82.4
Promedio Porcentaje Alcanzado	%	-	88.3	
Observación	-	-	Ninguna	Ninguna

Nota :

(1) LCM = Limite de Cuantificación **(2) ND =** No Detectado (< LCM) **(3) NA =** No Aplicable **(4) "-" =** No Analizado **(5) "--" =** Análisis en Proceso

(6) (A)=En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(B)=Estos resultados de ensayos no se encuentran acreditados conforme a los requerimientos de ISO/IEC 17025.

(8) ** = Información suministrada por el cliente.

*** Fin de Reporte ***

06032026102100005864 90

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados

No. BO26016630 Rev. 0

Fecha de Emisión: 2026/03/06

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construcción
Carrera 100 #25C-11 - Bodega 3 - Bogota D.C.,
Colombia
Phone: +57.6.01.6069292

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN
CR 25 A 38 D SUR 111
ENVIGADO - ANTIOQUIA, ANTIOQUIA 902020105-2
COLOMBIA

Obra: B_19606 TERCER NIVEL DE LA TORRE DE URGENCIAS

Orden Comercial :	90688-4
Fecha de Recepción :	2026/03/05
Lugar de realización del ensayo :	LABORATORIO
Muestra ID :	BO26016630.001
Identificación de Muestra** :	4
Localización** :	PANTALLA PISO 3
Fecha de Fundida** :	2026/01/22 08:00:00
Tipo del Material** :	Concreto
Edad (días)** :	42
Dimensión** :	4"x8"
Código de Mezcla** :	4500
Resistencia Nominal (MPa)** :	31
Número de Remisión** :	1
Asentamiento (mm)** :	152
Fecha de Rotura :	2026/03/05
Período de Análisis :	2026/03/06 al 2026/03/06
Ensayo Solicitado :	Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.
Método de ensayo :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S



Deivid Stiven Sastre Maldonado
Coordinador Técnico

06032026084100000586458

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

Informe de Resultados

No. BO26016630 Rev. 0

Fecha de Emisión: 2026/03/06

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S



Deivid Stiven Sastre Maldonado
Coordinador Técnico

06032026084100000586458

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

Ensayo de Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673:2021

Especificación Comparativa : --

Item(s) de Ensayo	Unid.	Especificación	001	002
Edad de Falla	Día(s)	-	42	42
Diametro Promedio	mm	-	101.25	100.00
Área de Sección Transversal	mm²	-	8052	7854
Carga Máxima	kN	-	241	251
Tipo de Falla	-	-	4	4
Resistencia a la Compresión	psi	-	4335	4634
Resistencia a la compresión	MPa	-	29.9	32.0
Promedio Resistencia a la compresión	MPa	-	30.9	
Porcentaje Alcanzado	%	-	96.4	103.1
Promedio Porcentaje Alcanzado	%	-	99.7	
Observación	-	-	Ninguna	Ninguna

Nota :

(1) LCM = Limite de Cuantificación **(2) ND =** No Detectado (< LCM) **(3) NA =** No Aplicable **(4) "-" =** No Analizado **(5) "--" =** Análisis en Proceso

(6) (A)=En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(B)=Estos resultados de ensayos no se encuentran acreditados conforme a los requerimientos de ISO/IEC 17025.

(8) ** = Información suministrada por el cliente.

*** Fin de Reporte ***

06032026084100000586458

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída. Los reportes emitidos como consecuencia de ensayos con base en muestras contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de ensayo.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días. Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al material enviado por el cliente tal como se recibió. Cualquier alteración a este documento lo invalida.


CONSORCIO
INTERHOSPITALIZACIÓN

ANEXO 10

PROGRAMACION DE OBRA

DIRECCIÓN: CRA 25A 38D SUR 1111 ENVIGADO – ANTIOQUIA
Email: consorciointerhospitalizacion@gmail.com NIT: 902.020.105-2


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
1		**1**	**AMPLIACIÓN URGENCIAS PISO 3**	**163 días**
2		1.1	INICIO	0 días
3		**2**	**EJECUTAR PRELIMINARES**	**19 días**
4		2.1	RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M	2 días
5		2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	1,5 días
6		2.3	DEMOLICION MUROS LADRILLO E= 0.15 MTS	8 días
7		2.4	DESMONTE VIDRIO	4 días
8		2.5	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	4 días
9		2.6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	8 días
10		2.7	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	4 días
11		2.8	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	6 días
12		2.9	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES LATERALES DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPAS DE SUPERBOARD	8 días
13		2.10	CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA	8 días
14		2.11	MURO DE AISLAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA, INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO CON FRESCASA	6 días
15		**3**	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**	**7 días**
16		3.1	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	7 días
17		**4**	**CONSTRUIR ESTRUCTURA**	**86 días**
18		4.1	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPA (3500 PSI) E= 0.10 MTS	10 días
19		4.2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA 3000 PSI	62 días

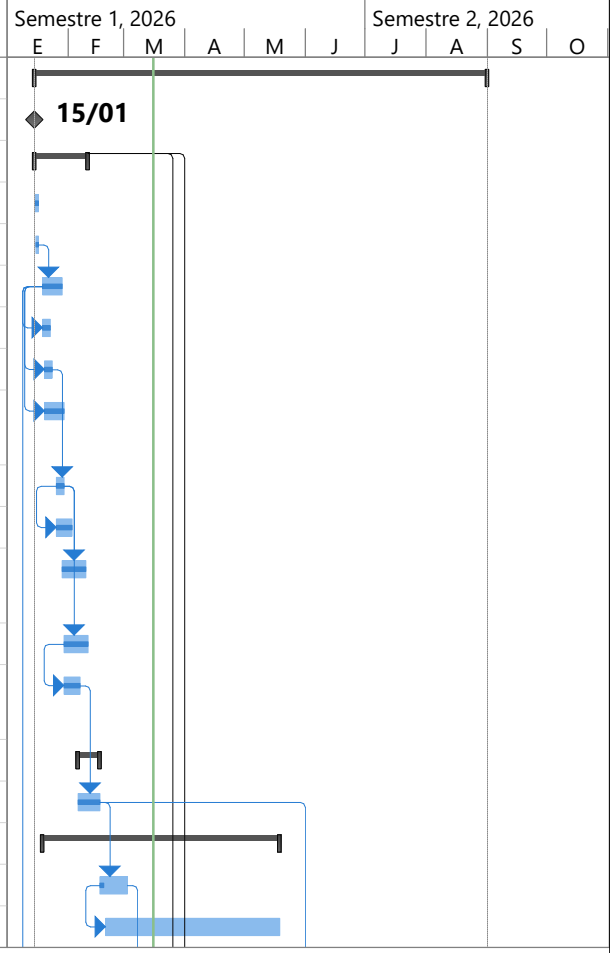

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
20		4.3	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	62 días
21		4.4	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPA	62 días
22		4.5	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	20 días
23		4.6	SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM	42 días
24		4.7	COLUMNAS EN CONCRETO 31 MPA (4500 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA MADERA	22 días
25		4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON EN LONA	4 días
26		4.9	ESCALERA EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI)	30 días
27		4.10	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	24 días
28		4.11	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) PLACA DE ENTREPISO	2 días
29		4.12	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 28MPa - (4000 PSI)	24 días
30		**5**	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**61 días**
31		5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMETARIOS PARA SU CONEXIÓN	10 días
32		5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	12 días
33		5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	16 días
34		5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	14 días
35		5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	16 días
36		5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE	10 días
37		5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO	8 días

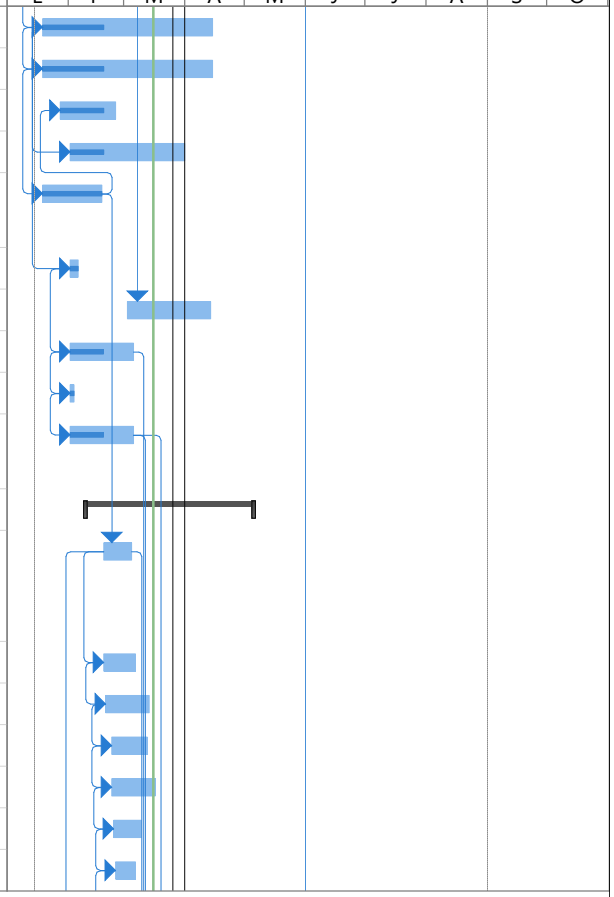

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
38		5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"	12 días
39		5.9	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	16 días
40		5.10	PUNTO HIDRAULICO 3/4"	30 días
41		5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC - P ½" RDE 9	46 días
42		5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11	46 días
43		5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	46 días
44		5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	24 días
45		5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	32 días
46		5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	30 días
47		5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3".	28 días
48		5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	32 días
49		5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	12 días
50		5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	8 días
51		5.21	INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	6 días
52		5.22	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	4 días
53		5.23	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	10 días
54		5.24	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	14 días
55		5.25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	12 días
56		5.26	PUNTO DE DESAGUES D=2"	16 días
57		5.27	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	12 días
58		5.28	REVENTILACION PVC 3"	10 días

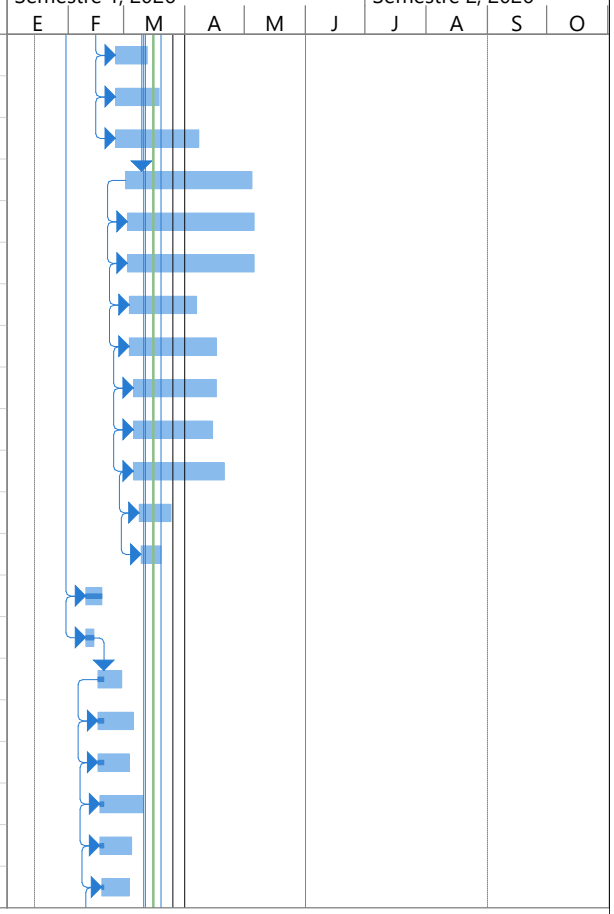

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
59		5.29	SALIDA SANITARIA PVC 3"	12 días
60		5.30	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	16 días
61		5.31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	18 días
62		5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 6``	16 días
63		5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4``	18 días
64		5.34	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	16 días
65		5.35	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	14 días
66		5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	10 días
67		5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	24 días
68		5.38	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	14 días
69		**6**	**EJECUTAR RED CONTRAINCENDIOS**	**80 días**
70		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA -40, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. (INCLUYE ACCESORI	74 días
71		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	70 días
72		6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA SELECTORA MODELO SVM - 20 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM.(INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	44 días

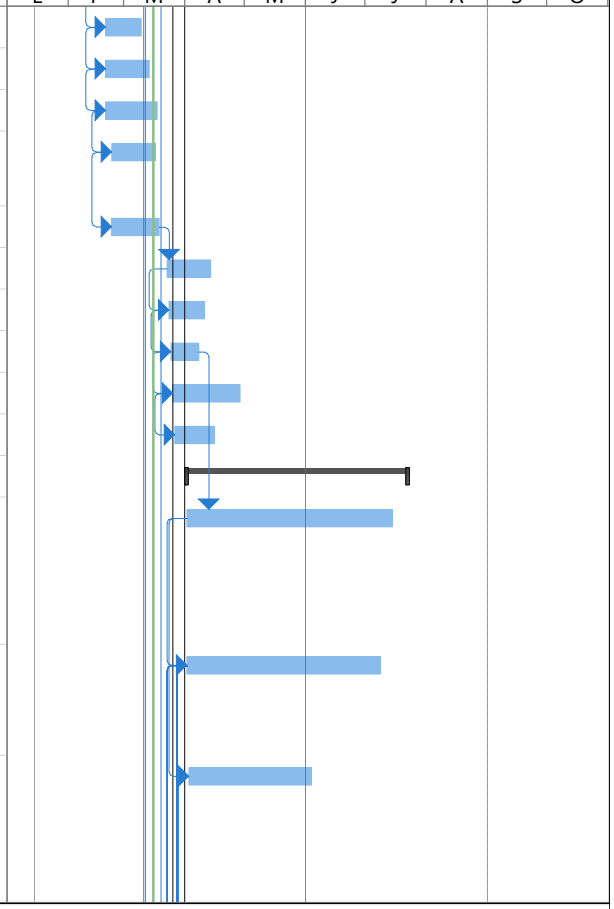

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
73		6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚ	76 días
74		6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚ	40 días
75		6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 4S 1MC 8MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.80, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA HI-FOG A TUBERÍA DE 12 MM+D185:D186	33 días
76		6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG MODELO 2N 1MD 6MC 10RA PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC CON EL CORRESPONDIENTE CONE	35 días
77		6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA HI-FOG CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA HI-FOG CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL	33 días
78		6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALAC	45 días

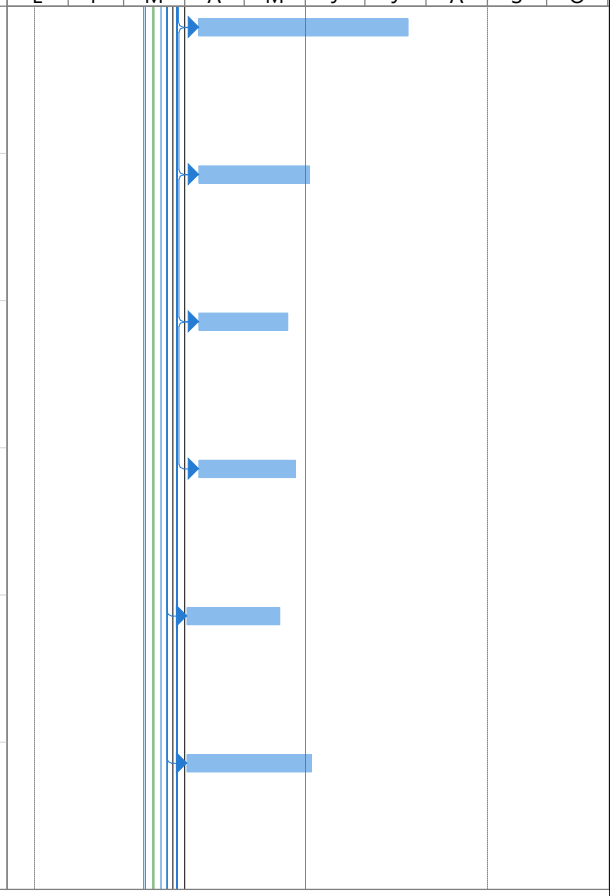

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
79		6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON	48 días
80		6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON	46 días
81		6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON	48 días
82		6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	39 días
83		6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3"	39 días
84		6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	39 días
85		6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	42 días
86		6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	45 días
87		6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	45 días
88		6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	45 días
89		6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3"	45 días

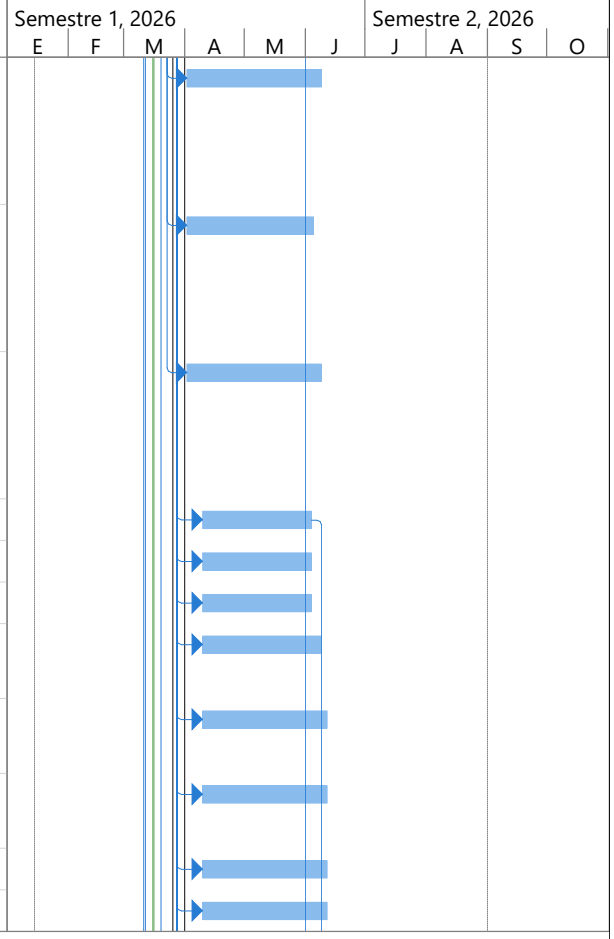

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
90		6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	45 días
91		6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	45 días
92		6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	45 días
93		6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	35 días
94		6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 3"	42 días
95		6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 3"	42 días
96		6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"	42 días
97		6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"	42 días
98		6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLASE I VÁLVULA ANGULAR 2-1/2"	42 días
99		6.30	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2	14 días
100		6.31	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA	31 días
101		6.32	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"	31 días
102		6.33	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"	31 días
103		6.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"	31 días
104		6.35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"	31 días
105		6.36	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"	31 días
106		6.37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"	31 días
107		6.38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"	31 días
108		6.39	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA	31 días
109		6.40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"	31 días
110		6.41	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"	31 días

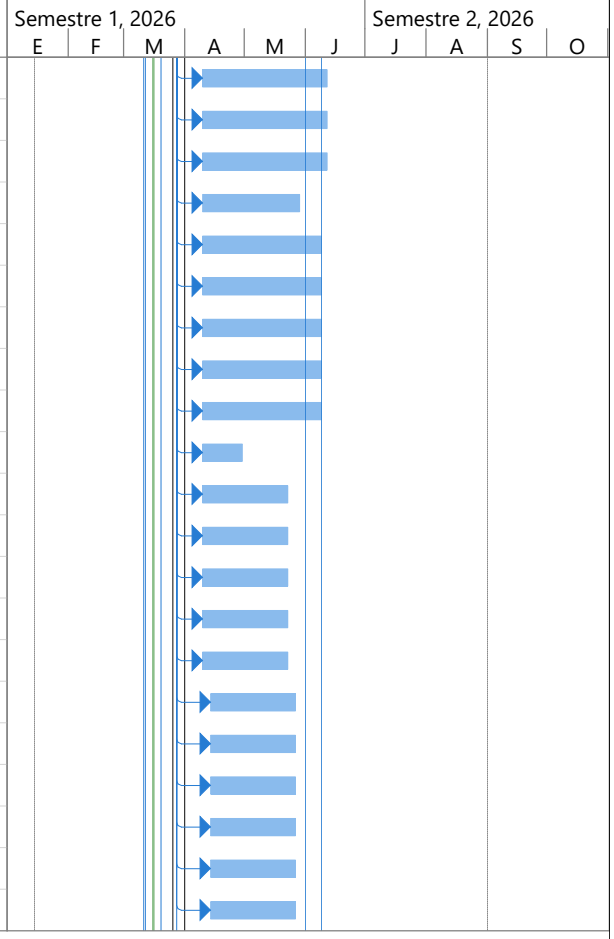

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
111		6.42	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"	31 días
112		**7**	**EJECUTAR RED DE GAS**	**15 días**
113		7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE 1/2	10 días
114		7.2	PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40 (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	14 días
115		7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° cobre 1/2	10 días
116		7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	10 días
117		7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2	10 días
118		7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2	10 días
119		**8**	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**	**48 días**
120		8.1	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV3 - TV4 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	18 días
121		8.2	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV5 - TV6 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	18 días
122		8.3	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV10 3#1/0F+3#1/0N+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	18 días
123		8.4	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL (TGV) HASTA TVS - TV1, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC3 - TC5 2(3#4F+1#4N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
124		8.5	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO HASTA TC10 - TC11 3#4F+1#4 N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días

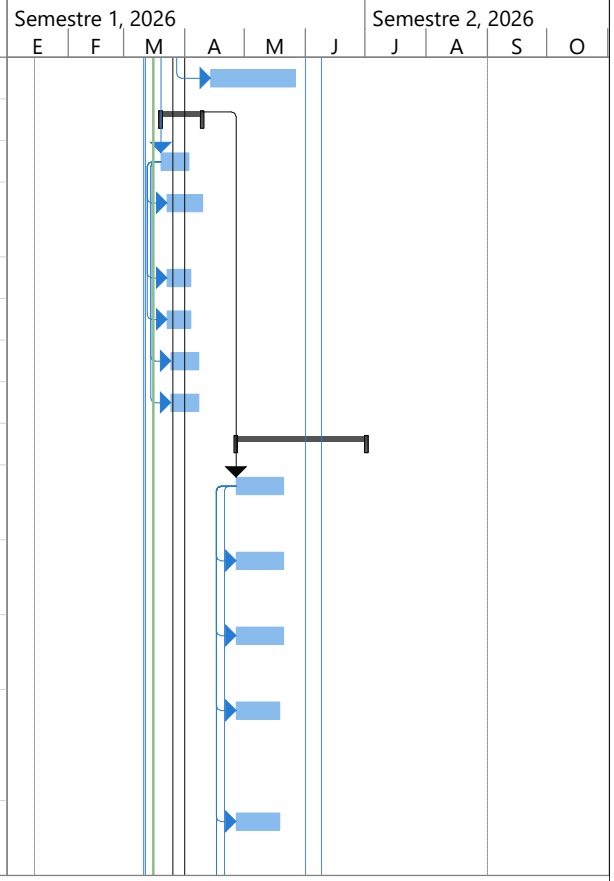

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
125		8.6	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DE EQUIPOS ESPECIALES HASTA TMAM, DESDE TABLERO RAMAL REGULADO (TGR) HASTA TR6 - TR8 - TR11 1#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
126		8.7	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC2 - TC4 3#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
127		8.8	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES (TEE) HASTA TACE1 3#2/0F + 1#2/0N + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
128		8.9	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 2(3#2/0F + 1#2/0N) + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
129		8.10	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL HASTA TV2 - TV9, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC6 , 2(3#2F + 1#2N) + 1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	16 días
130		8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 4" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	18 días
131		8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	16 días
132		8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	18 días
133		8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1 1/2" ; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	26 días
134		8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	26 días

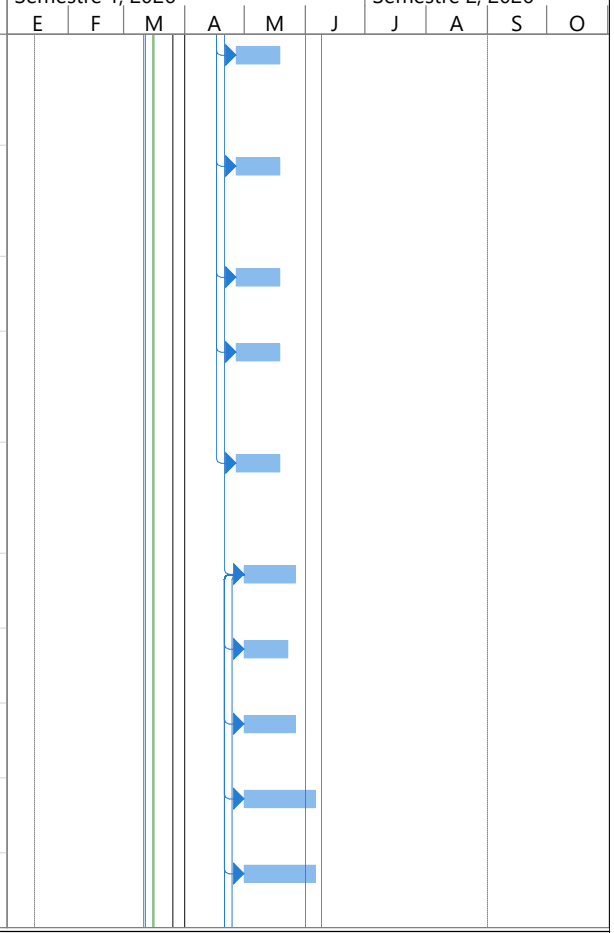

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
135		8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC TIPO PESADO 3"; INCLUYE: TERMINALES PVC TIPO CAMPANA EN CAJAS DE INSPECCIÓN, PEGANTE Y LIMPIADOR PVC, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN EN ZANJA Y CONCRETO.	26 días
136		8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	26 días
137		8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	26 días
138		8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES A 220VCON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	32 días
139		8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	36 días
140		8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 2 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	36 días
141		8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	28 días
142		8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	28 días

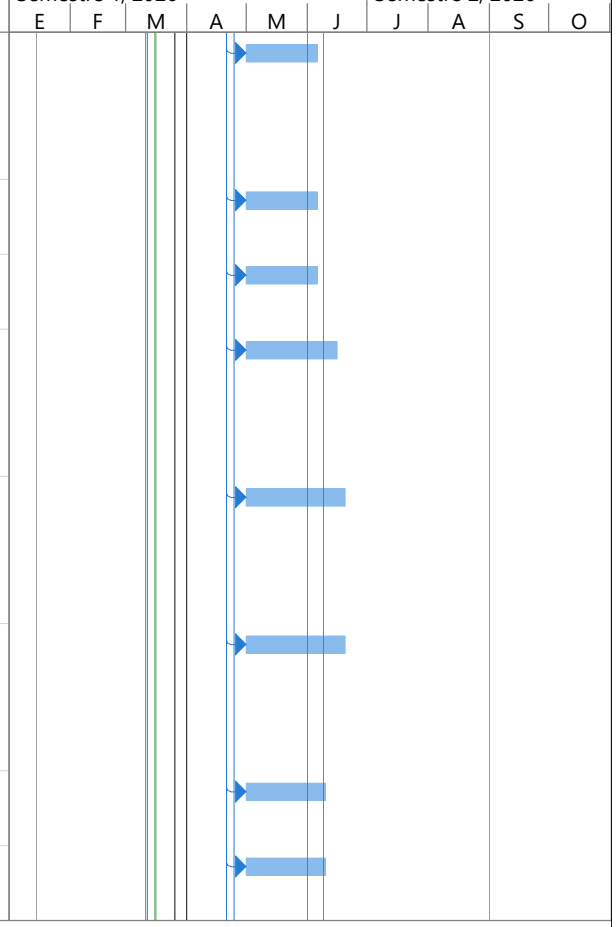

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
143		8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	28 días
144		8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	26 días
145		8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFORMADOR CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	30 días
146		8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	30 días
147		8.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL AA CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	30 días
148		8.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	32 días
149		8.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL REGULADO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	32 días

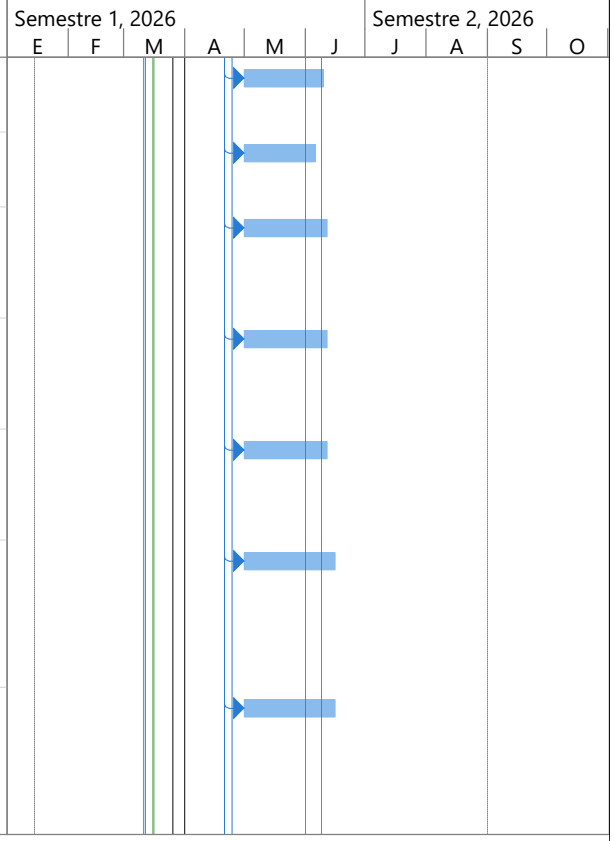

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
150		8.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" , CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO	30 días
151		8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU 4#12, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. . DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	30 días
152		8.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METRO	30 días
153		8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A	30 días
154		8.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO	40 días
155		8.36	SALIDA PARA ILUMINACIÓN GENERAL, 127V; INCLUYE: 5 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, TOMACORRIENTE CON P.T. COLOR BLANCA, TAPA PVC, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESO	42 días

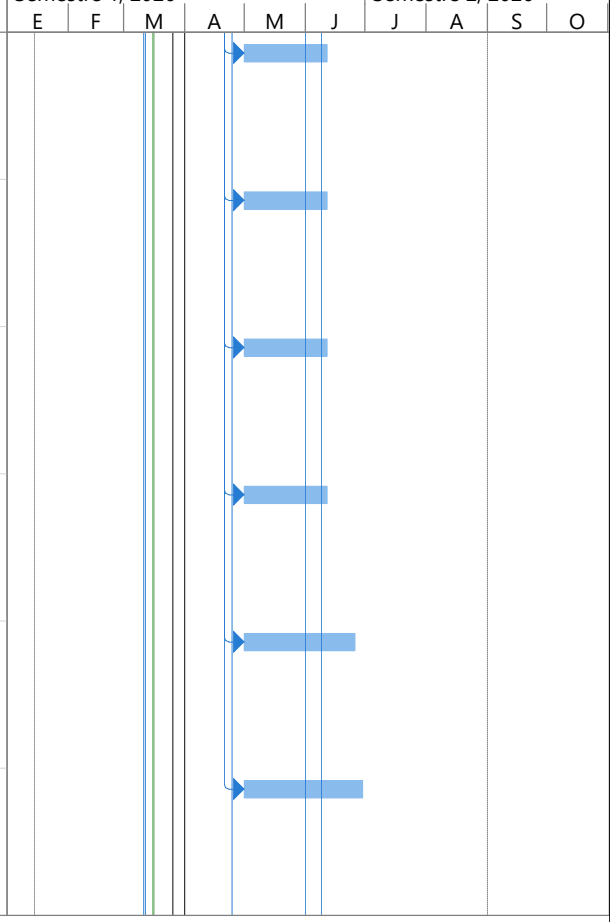

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
156		8.37	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EXIT, 127V; INCLUYE: 4 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 9 METROS	42 días
157		8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 4 METROS.	42 días
158		8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	42 días
159		8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	30 días
160		8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 7 METROS.	30 días
161		8.42	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA, TIPO MICKEY MOUSE; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	40 días
162		8.43	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W DE SOBREPONER, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	40 días

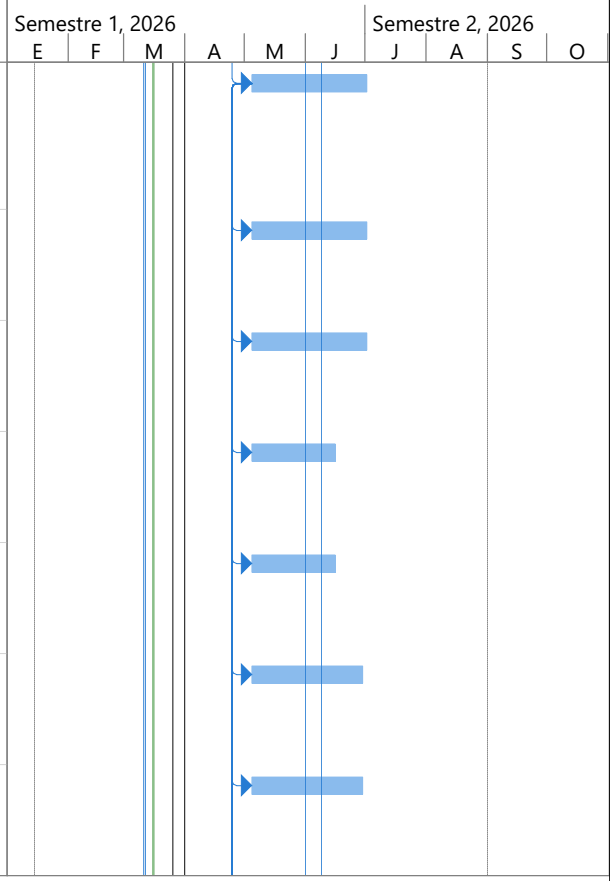

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
163		8.44	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	40 días
164		8.45	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE 31W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	40 días
165		8.46	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE HERMETICO DE 2OW DE SOBREPONER; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	40 días
166		8.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.	13 días
167		8.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON 8MM. INCLUYE SEPARADORES.	21 días
168		8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO N°1/0.	15 días
169		8.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 2,4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDAUDURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN BIMETALICA.	13 días
170		8.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.	10 días
171		8.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.	8 días
172		**9**	**INSTALAR AUTOMATIZACION**	**44 días**
173		9.1	FACE PLATE UNA VENTANA PARA JACK RJ45 CAT 6A PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	44 días

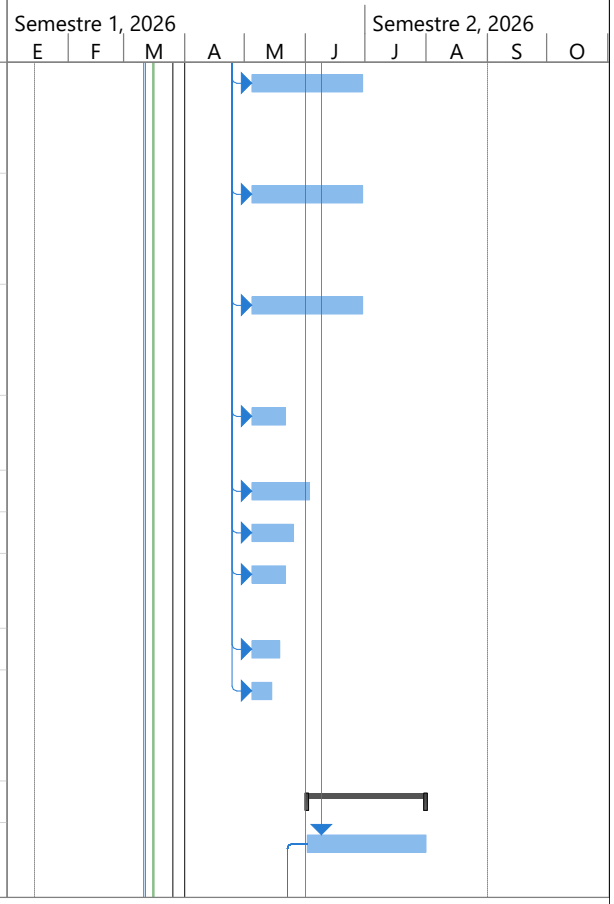

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
174		9.2	GABINETE ANCHO PARA TELECOMUNICACIONES 800 ANCHO, 1000 MM PROFUNDIDAD.PINTURA: NEGRA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. MATERIAL: ACERO AL CARBON UNIDADES RACK: 42 UR	44 días
175		9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CONVENCIONAL. CON LED INDICATIVO	38 días
176		9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION REFORZADA ELECTROZINCADA	24 días
177		9.5	PATCH CORD TERAMAX COBRE, LATIGUILLO, TERA 4 PARES, RJ45, CATEGORÍA 8, S/FTP, T568B, TRENZADO.	32 días
178		9.6	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A (INCLUYE JAKS), BLINDADO , 19", 1RU, INCLUYE BARRA TRASERA PARA ORGANIZACIÓN DE CABLE	32 días
179		9.7	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, AZUL, (3 M) DATOS	32 días
180		9.8	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, GRIS, (3 M) AP	32 días
181		9.9	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, BLANCO, (3 M) CAMARA IP	32 días
182		9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 19" METÁLICO, 2 UR	32 días
183		9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK	21 días
184		9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 50/125 (OM3), EXTERIOR/INTERIOR, LSOH C/PROTECCIÓN PRIMARIA ANTI- ROEDOR DE FIBRA DE VIDRIO	21 días

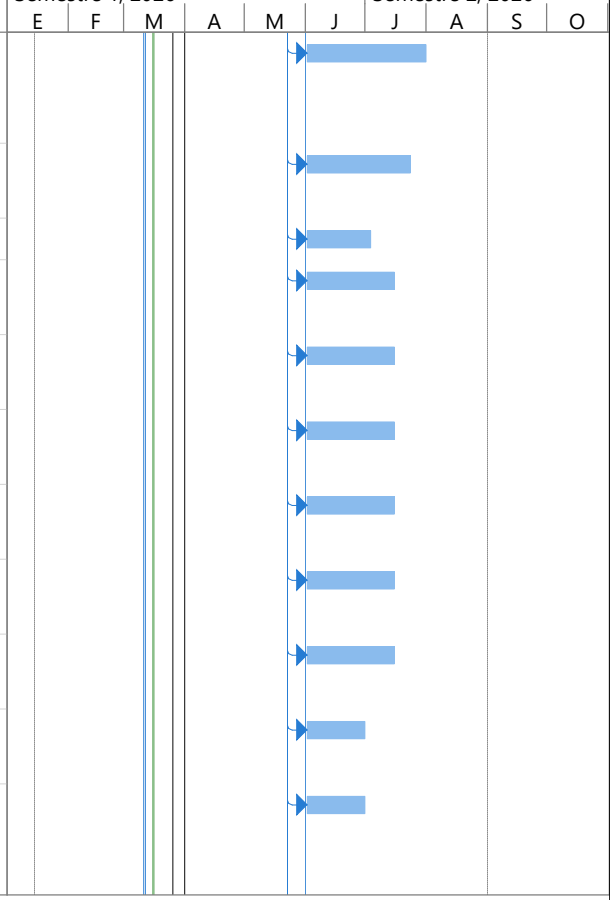

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
185		9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG CCTV ACCES POINT	42 días
186		9.14	PLACA DE PARED FORMATO CT, PARA 1 ADAPTADOR, BLANCA	12 días
187		9.15	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR AZUL, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE DATOS INCLUYE FACE PLATE	21 días
188		9.16	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR NEGRO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE AP INCLUYE FACEPLATE	21 días
189		9.17	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR BLANCO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE CAMARA IP INCLUYE FACE PLATE	21 días
190		9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU 12 SALIDAS	21 días
191		9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	42 días
192		9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO PARA PARLANTES	21 días
193		9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO .	32 días
194		9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA LED 15A 110 CANDELAS	21 días
195		9.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO A30XH SENSOR TÉRMICO ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS.	21 días
196		9.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE BAJA PARA DETECTOR DE HUMO DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LA GAMA A30	21 días

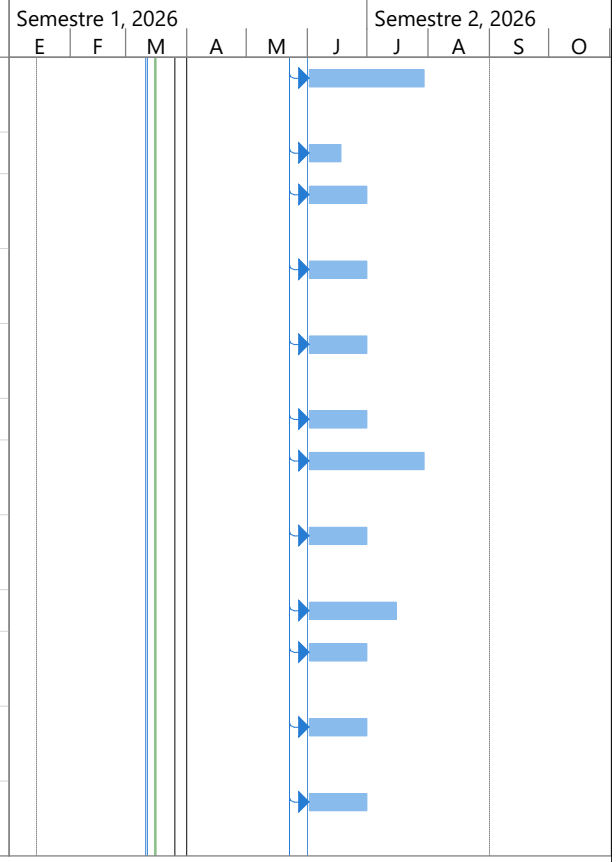

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
197		9.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO, CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 100 MM, ANCHO 1000 MM.	32 días
198		9.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO , CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 60 MM, ANCHO 600 MM.	32 días
199		9.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAIL CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	32 días
200		9.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO PARA EL MONTAJE A TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA	32 días
201		9.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO ACCESORIO PARA PROTEGER LA SALIDA DEL CABLEADO	32 días
202		9.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA METÁLICA ROSCADA 3/8	32 días
203		9.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORNA METÁLICA DE LATÓN PARA LA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	32 días
204		9.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	32 días
205		9.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC TIPO PESADO 3/4	32 días
206		9.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT 1 1/2	32 días
207		9.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 45 GRADOS 1 1/2	32 días
208		9.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL EMT 1 1/2	32 días

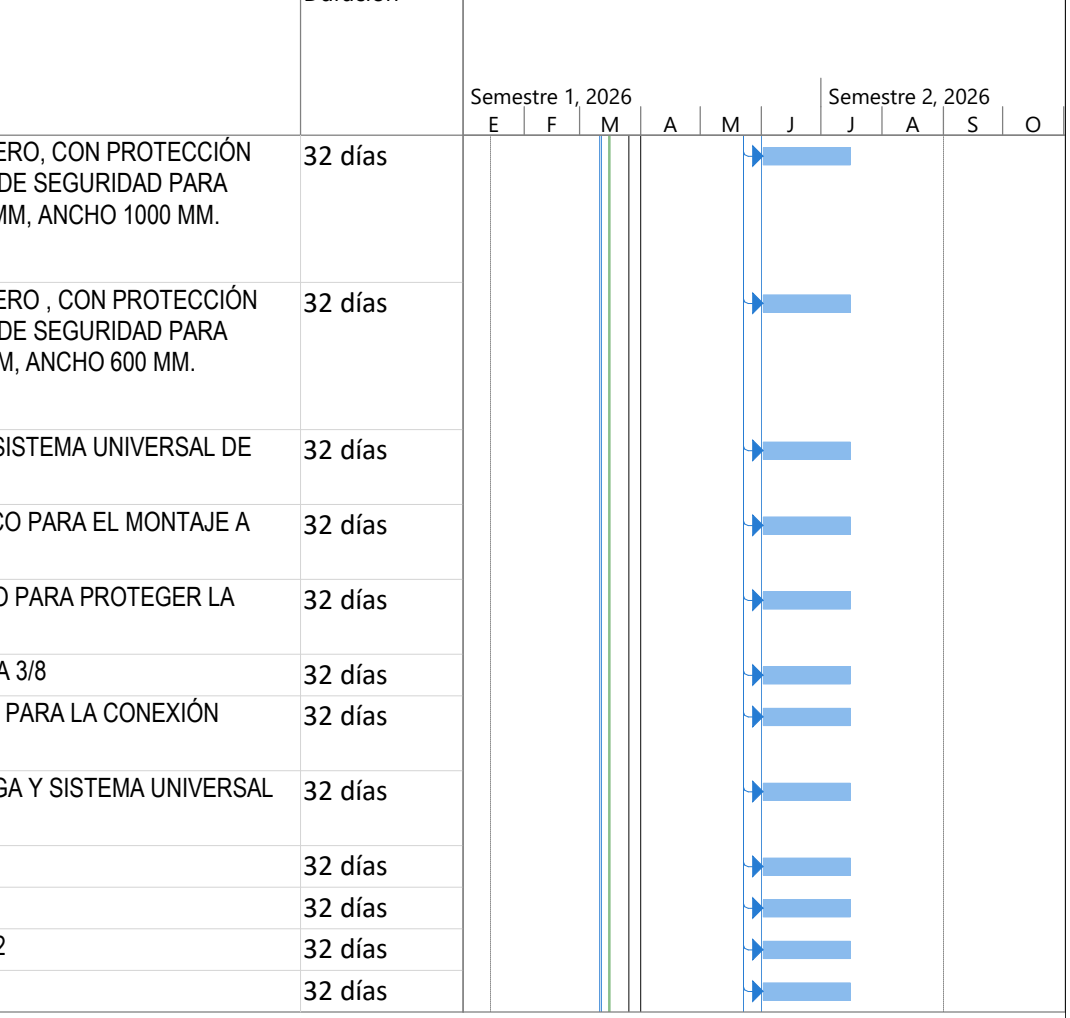

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
209		9.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIO COFEM	32 días
210		**10**	**CONSTRUIR MAMPOSTERIA**	**57 días**
211		10.1	MURO EN BLOQUE Nº5 E=0.12 MTS	56 días
212		10.2	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	20 días
213		10.3	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	32 días
214		10.4	ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC. REFUERZO	36 días
215		10.5	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 MTS	30 días
216		10.6	MURO UNA CARA EN ETERBOARD 10 MM	20 días
217		10.7	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E= 0.10 MTS	15 días
218		**11**	**EJECUTAR PAÑETES**	**62 días**
219		11.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	62 días
220		11.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM	30 días
221		11.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	46 días
222		11.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 HASTA 50CM	38 días
223		11.5	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	53 días
224		11.6	GOTERAS	30 días
225		11.7	PAÑETE LISO MUROS CULATAS 1:5	29 días
226		**12**	**INSTALAR PISOS**	**65 días**
227		12.1	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	15 días
228		12.2	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	25 días
229		12.3	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	40 días

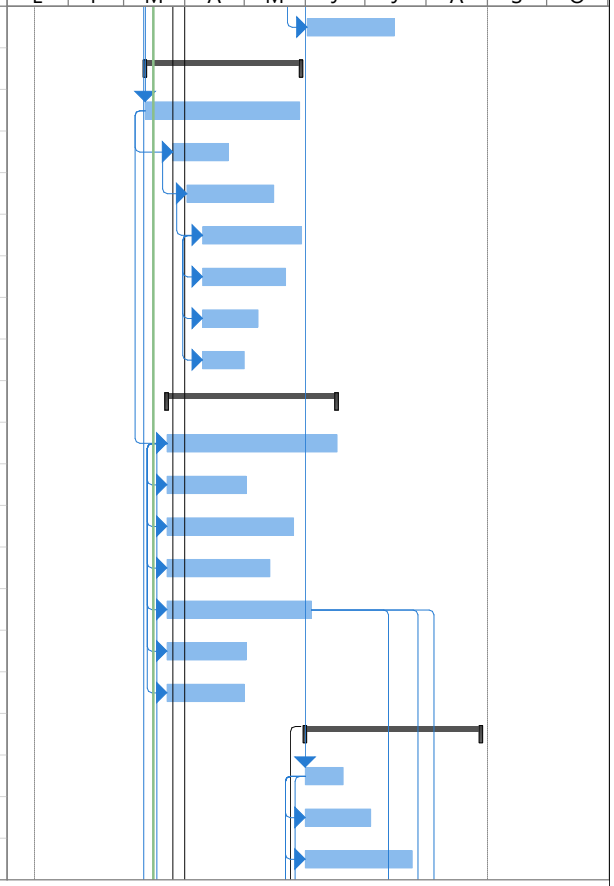

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
230		12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	15 días
231		12.5	SUMINISTRO E INSTALACION, PULIDA, DESTRONQUE BRILLADO Y CRISTALIZADO BALDOSIN EN GRANITO DE MARMOL	55 días
232		12.6	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	23 días
233		12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	23 días
234		12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	14 días
235		12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	42 días
236		**13**	**EJECUTAR URBANISMO**	**21 días**
237		13.1	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	21 días
238		**14**	**INSTALAR ENCHAPES**	**40 días**
239		14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS EN CERAMICA RECTIFICADA DE 30X60	40 días
240		14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	21 días
241		14.3	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION 20*20 ALUMINIO	14 días
242		14.4	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	28 días
243		14.5	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTROS EN PVC 20X20	12 días
244		**15**	**INSTALAR CUBIERTA**	**52 días**
245		15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	45 días
246		15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8MM	21 días
247		15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	15 días
248		15.4	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	21 días

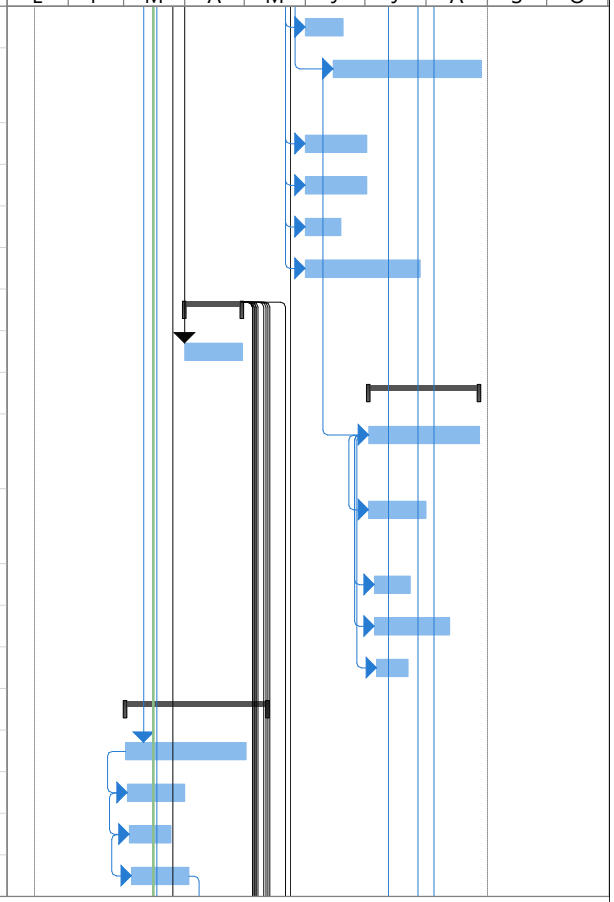

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
249		15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	21 días
250		15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	30 días
251		**16**	**INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA**	**18 días**
252		16.1	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE HOSPITALARIO TIPO CLOSETH CON ENTREPAÑOS EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	18 días
253		16.2	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE BAJO PUESTO DE TRABAJO O ESTACION DE ENFERMERIA DE 75CM DE ALTURA, 60CM DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	13 días
254		16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTABLERADA CON ACABADO MELAMINICO, CANTOS RIGIDOS, INCLUYE MARCO EN MADECOR	13 días
255		16.4	SUMINISTRO E INSTLACION PROTECTOR GUARDACAMILLA DE 15 A 19 CMS CON SISTEMA DE CLIPS EN LAS AREAS DE CIRCULACION, SOPORTE EN ALUMINIO Y PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON JUMPER INTERIOR PARA AMORTIGUAR GOLPES, COLOR A ESCOGER, RESISTENCIA AL IMPACTO EN LA PARTE	13 días
256		**17**	**INSTALAR CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**8 días**
257		17.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	7 días
258		17.2	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	8 días

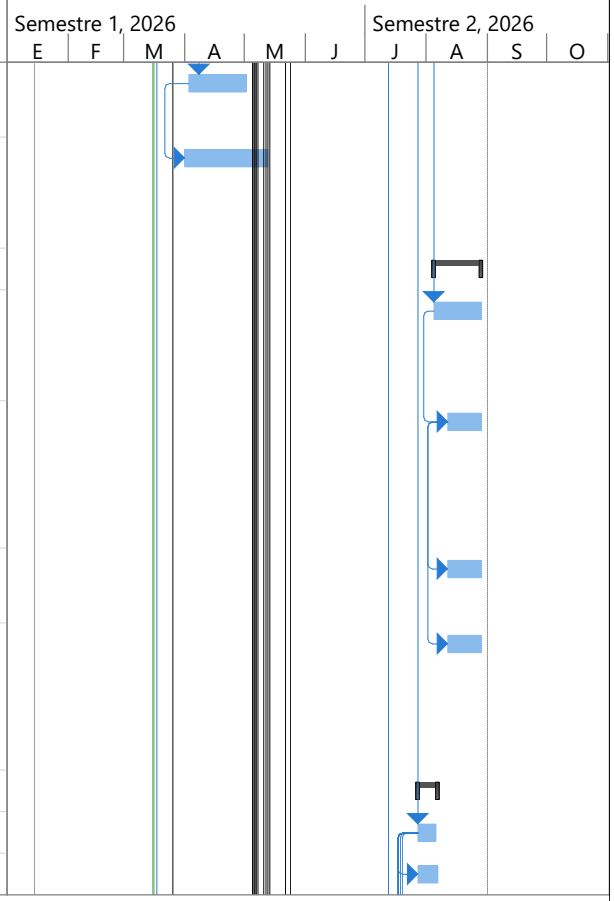

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
259		17.3	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE ANTIÁCIDO CAL 18 DE .60 X .60 (INC. GRIFERÍA MANOS LIBRES Y PULSADOR BRETTER)	8 días
260		17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 REF 304 SATINADO	8 días
261		17.5	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 CAL 18 REF 304	6 días
262		17.6	SUMINSTRO E INSTALACION VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, INCLUYE SALPICADERO DE 10 CM, FALDON DE 50 CM, INCLUYE SISTEMA DE IRRIGACION CON VALVULA TIPO PUSH	4 días
263		17.7	SUMINSTRO E INSTALACION BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 INCLUYE GRIFERIA	6 días
264		17.8	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (DISTANCIA MAYOR A 1 ML)	4 días
265		17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON PASAMANOS Y PARALES DE 2" Y 3 LINEAS DE VARILLA DE ACERO EN 1/2" INLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	8 días
266		**18**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y PVC**	**33 días**
267		18.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	30 días
268		18.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 80CM - 1M	30 días

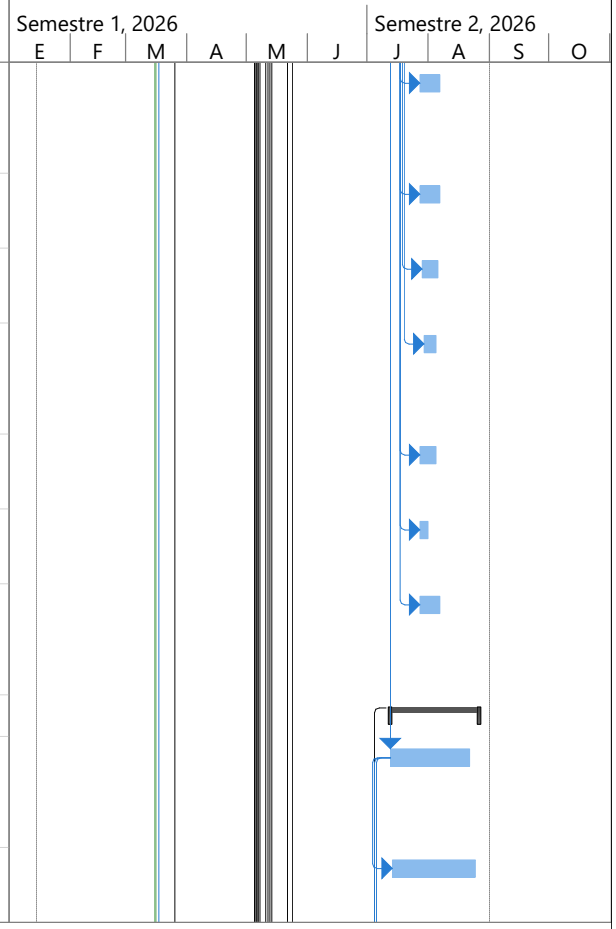

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
269		18.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC PROYECTANTE	30 días
270		18.4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC CORREDIZA	30 días
271		**19**	**INSTALAR CARPINTERIA METALICA**	**56 días**
272		19.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	56 días
273		19.2	IZAJE ESTRUCTURAS METALICAS CON GRUA TELESCOPICA TIPO PH	20 días
274		**20**	**EJECUTAR ESTUCO Y PINTURA**	**42 días**
275		20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	42 días
276		20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO BAJO PLACA	32 días
277		20.3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	32 días
278		20.4	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	32 días
279		20.5	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA EN KORAZA SOBRE FACHADA	37 días
280		20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	32 días
281		20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	24 días
282		20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	24 días
283		20.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	29 días
284		**21**	**INSTALAR CERRADURAS VIDRIOS Y ESPEJOS**	**14 días**
285		21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	8 días

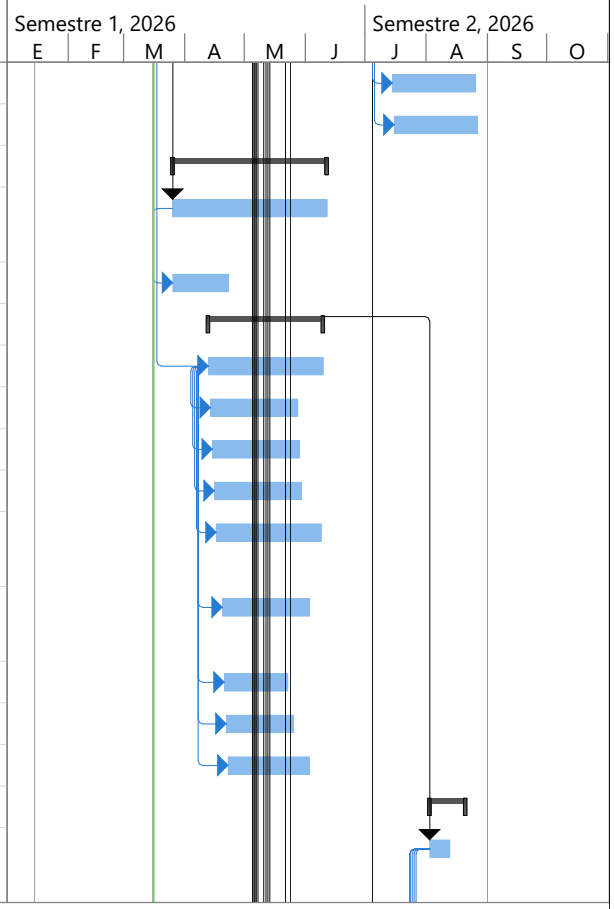

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
286		21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	6 días
287		21.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	10 días
288		21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	12 días
289		21.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	10 días
290		21.6	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE EMERGENCIA	12 días
291		21.7	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 4+4 MM	10 días
292		**22**	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**	**32 días**
293		22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	10 días
294		22.2	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA HOSPITALARIO EN ACERO INOXIDABLE (INC. GRIFERÍA)	12 días
295		22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	10 días
296		22.4	SUMINISTRO E INSTALACION TELEDUCHA C/MANGUERA INLCUYE MEZCADOR MONOCONTROL	14 días
297		22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	10 días
298		22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	15 días
299		22.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	14 días

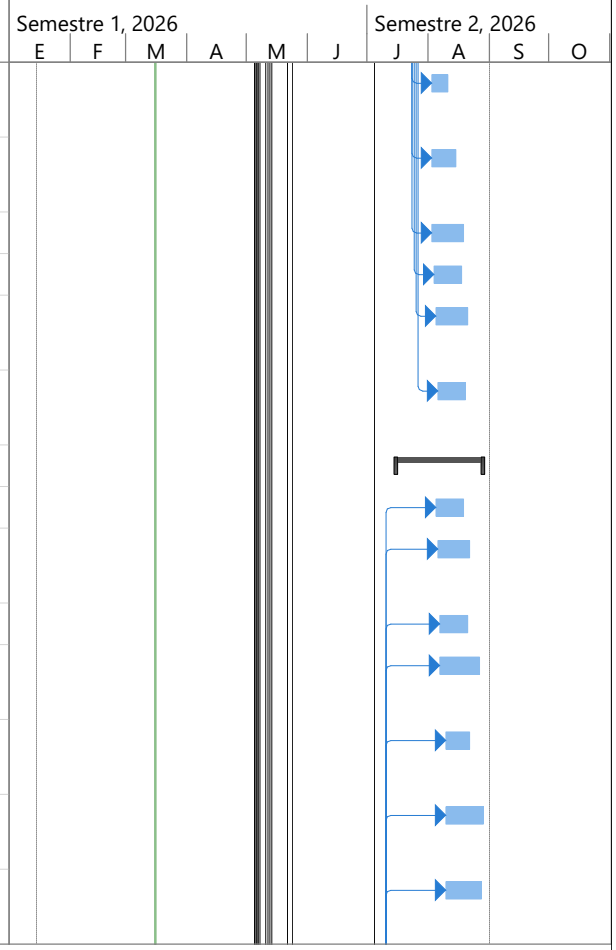

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
300		22.8	SUMINISTRO E INSTALACION TOALLERO	12 días
301		22.9	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO (INCLUYE APARATO SANITARIO, ASIENTO CON TAPA, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS)	8 días
302		22.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAL EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA	10 días
303		22.11	SUMINISTRO ORINAL DE FLUXOMETRO	6 días
304		22.12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	26 días
305		22.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVADO QUIRURGICO CAL. 18	4 días
306		22.14	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLADOR DUCHA	4 días
307		22.15	SUMINISTRO E INSTALACION PLATO DUCHA	4 días
308		22.16	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA DUCHA	12 días
309		22.17	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO PARA DUCHA	12 días
310		22.18	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TELEFONO	14 días
311		**23**	**EJECUTAR VARIOS**	**33 días**
312		23.1	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30X15CM INCLUYE TUBO METALICO GUIA DE MANO A SEÑAL, SEGÚN NTC4596	11 días
313		23.2	ASEO GENERAL ENTREGA	6 días
314		23.3	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA VENTILADA CELOSIA C40	28 días
315		23.4	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA EN PANEL METALICO CORTASOL STRIPSCREEN	24 días

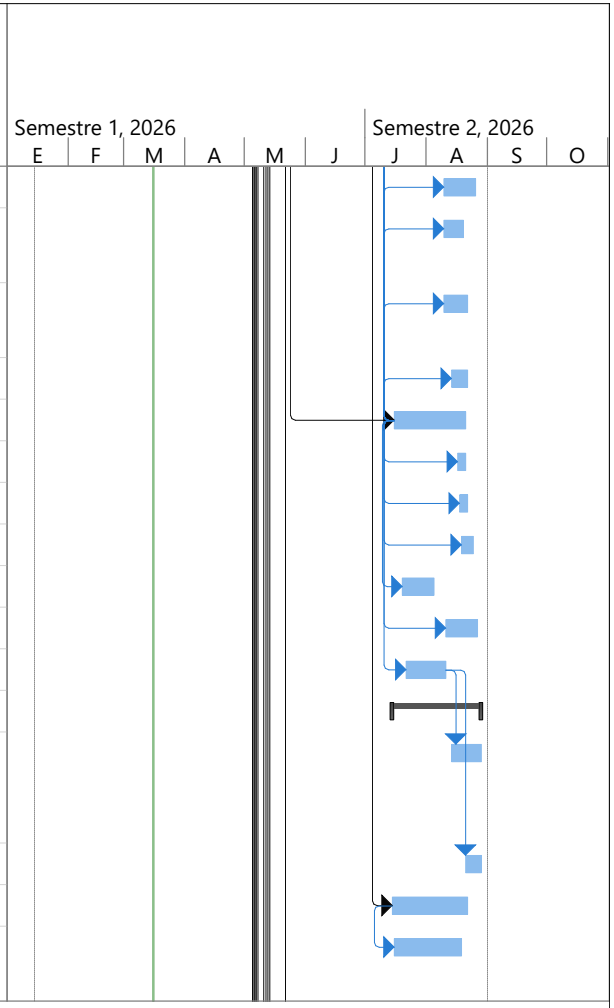

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
316		**24**	**INSTALAR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA Y VENTILACION MECANICA**	**49 días**
317		24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/4 "FLEXIBLE"	44 días
318		24.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	36 días
319		24.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/2 "L"	36 días
320		24.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	36 días
321		24.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/4 "L"	36 días
322		24.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 7/8 "K"	14 días
323		24.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1 1/8 "K"	10 días
324		24.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 24 (0.55MM, 4.69 KG/M2)	8 días
325		24.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 22 (0.70MM, 5.48 KG/M2)	10 días
326		24.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO INTERNO JUMBOLÓN/THERMOLÓN 12 MM	12 días
327		24.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 12"	20 días
328		24.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 6"	14 días
329		24.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIPROPILENO PN16 PRE-AISLADA DE 1 1/2"	18 días
330		24.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 4x4	16 días
331		24.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x4	24 días
332		24.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x6	20 días
333		24.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x6	20 días
334		24.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x8	20 días

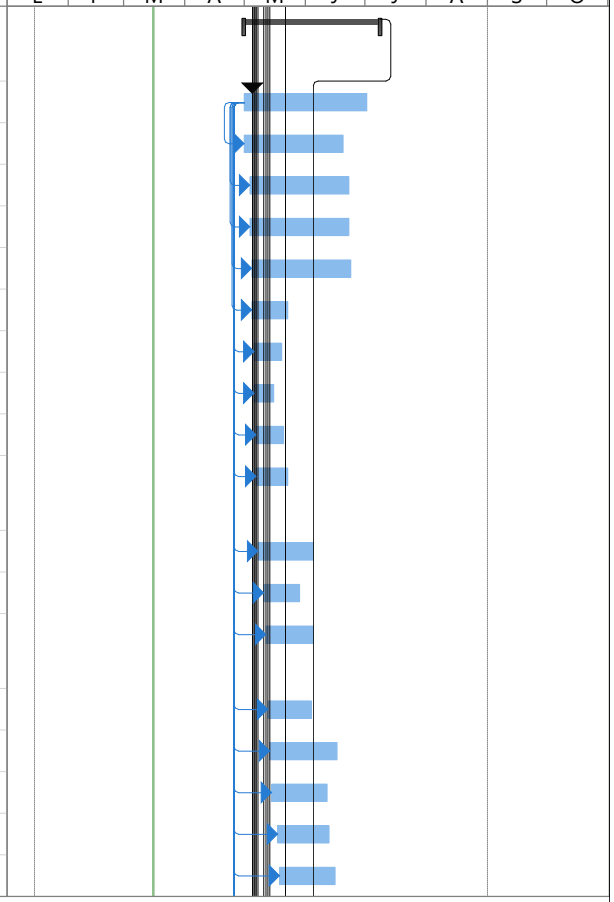

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
335		24.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x8	16 días
336		24.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x10	12 días
337		24.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x10	12 días
338		24.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x12	12 días
339		24.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 4x4	6 días
340		24.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x4	6 días
341		24.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x6	6 días
342		24.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x6	6 días
343		24.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x8	6 días
344		24.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x4"	6 días
345		24.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x8"	7 días
346		24.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10X6"	9 días
347		24.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x10"	8 días
348		24.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 12"x8"	7 días
349		24.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 6x4	6 días
350		24.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 8x6	5 días
351		24.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x5	6 días
352		24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x8	8 días
353		24.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 12x8	9 días
354		24.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 6"x4"	8 días
355		24.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x4"	9 días

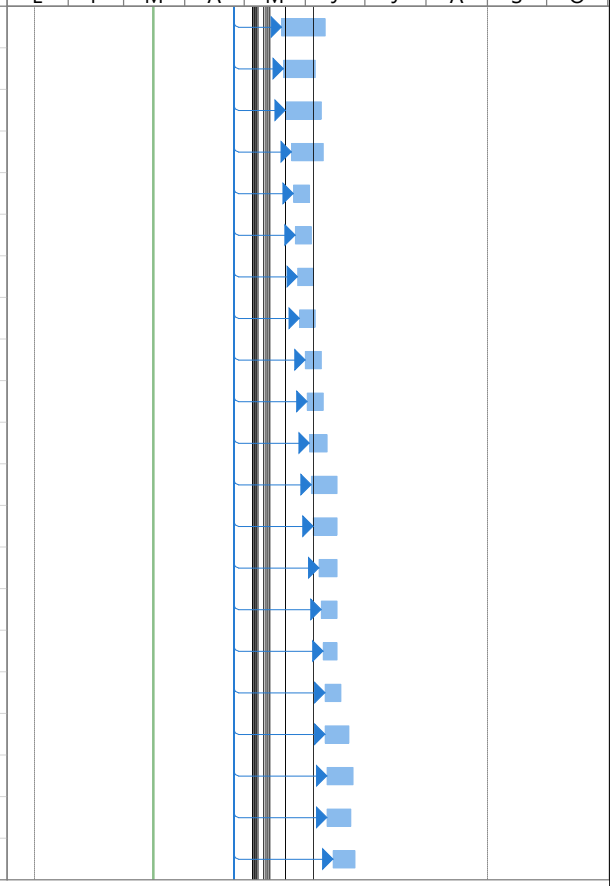

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
356		24.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x8"	8 días
357		24.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x5"	7 días
358		24.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x8"	6 días
359		24.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 14"x10"	9 días
360		24.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO TERMINAL 48"x24"	8 días
361		24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 24"x16"	5 días
362		24.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 8"x14"	8 días
363		24.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 10"x12"	14 días
364		24.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO TEAA 1	13 días
365		**25**	**INSTALAR RED DE GASES MEDICINALES**	**68 días**
366		25.1	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G O2 1/2"-VAC 3/4"	18 días
367		25.2	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 3G O2 1/2"-AIR MED1/2"-VAC 3/4"	22 días
368		25.3	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE SEXTUPLE (1/2" X (1/2"' X 1/2" X 1/2" X 1/2" X 3/4" VALVULA TIPO CUATRO TORNILLO)	43 días
369		25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	41 días
370		25.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	45 días
371		25.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	48 días

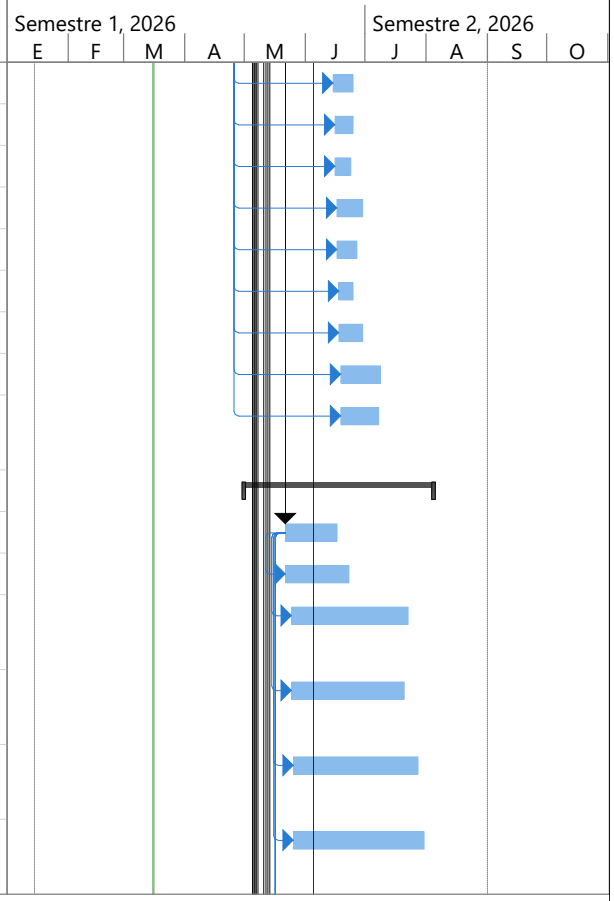

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mo de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
372		25.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 11/2"	50 días
373		25.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	44 días
374		25.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA	37 días
375		25.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA	24 días
376		25.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA	22 días
377		25.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 11/2" RÍGIDA	8 días
378		25.13	SUMINISTO E INSTALACIÓN TUBERÍA 1 1/4"- TIPO MEDICINAL DE ACUERDO A NORMAS	24 días
379		25.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 2" RÍGIDA	8 días
380		25.15	PRUEBAS DE GASES CRUZADOS	24 días
381		25.16	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	22 días
382		25.17	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC O2	22 días
383		25.18	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC VAC	24 días
384		25.19	SUMINISTO E INSTALACIÓN VÁLVULA SENSOR ALARMA	22 días
385		25.20	SUMINISTO E INSTALACIÓN PRESOSTATOS Y VACUOSTATO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS FUENTE A ALARMA MAESTRA	24 días
386		25.21	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIAS	22 días
387		25.22	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1¨	24 días
388		25.23	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1/2¨	24 días
389		25.24	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 1G O2 1/2"-VAC 3/4"	22 días

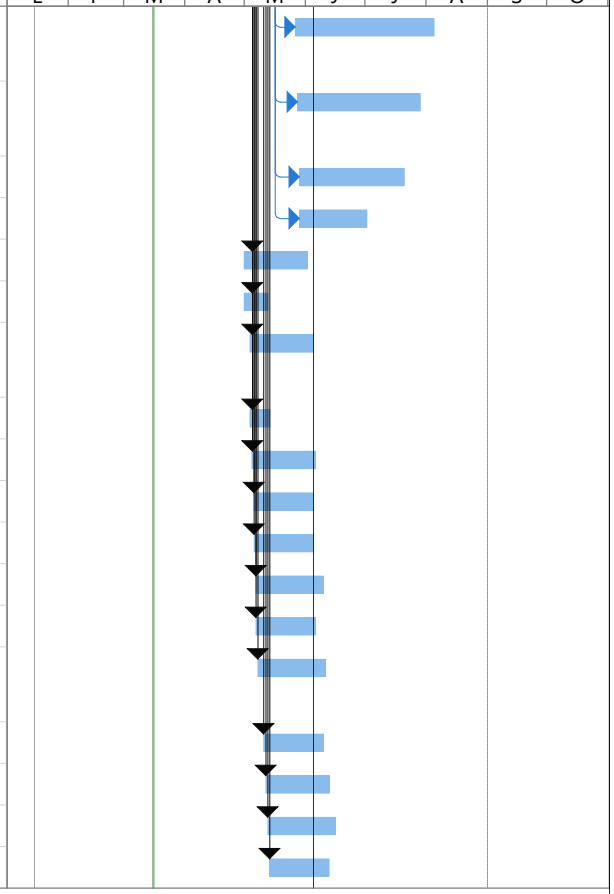

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Mc de tar	Núme de esquer	Nombre de tarea	Duración
390		**26**	**INSTALAR EQUIPOS**	**125 días**
391		26.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE DISTRIBUCION FIBRA OPTICA PARA RACK ODF 24 HILOS FIBRA ÓPTICA.	16 días
392		26.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC DUPLEX 10 G, 50/125 OM3, COLOR AQUA, 3 METROS	18 días
393		26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ 10G LC DUPLEX PARA FIBRA MULTIMODO 300 M	16 días
394		26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADMINISTRABLE L3 STACKING 10/100/IDOOT 24 PUERTOS POE8O2.3AT, 4 PUERTOS 10G SFP+ 370 W	16 días
395		26.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 128CH H.265	14 días
396		26.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 8TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	12 días
397		26.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA PDU UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PDU TIERRA AISLADA 12 SALIDAS NEMA 5-15	10 días
398		26.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS ON-LINE TIPO RACK 3KVA , 2700 VATIOS MONOFASICA 120 VCA	6 días
399		26.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS	10 días
400		26.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 8-CH 1080P H265	6 días
401		26.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 4TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	6 días

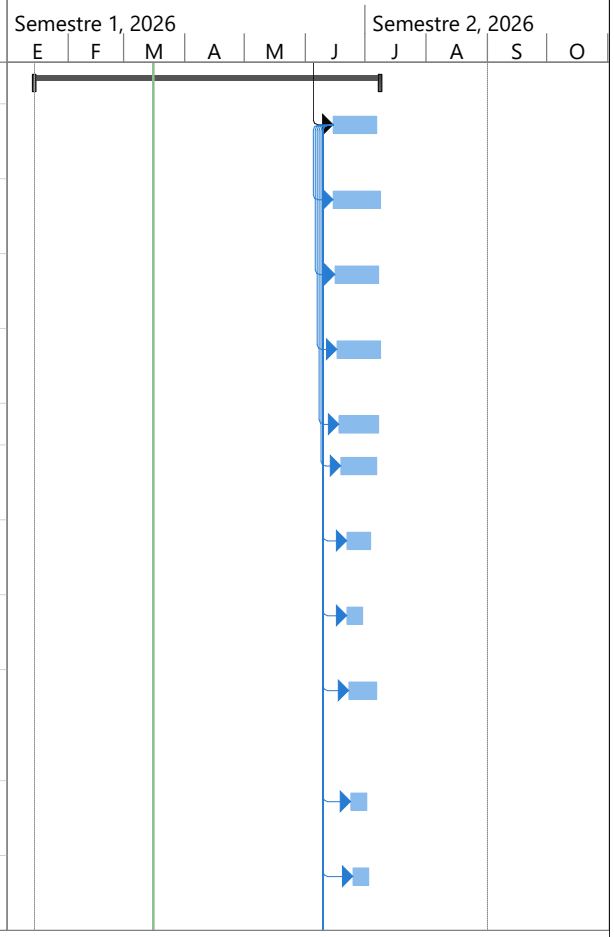

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Mo de tar	Núme de esque	Nombre de tarea	Duración
402		26.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓNCAMARA IP 2MP DOMO H265+ DWDR D/NF2.8 IR30M IP67 IK10 SEMIMETAL HIKVISION	4 días
403		26.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR DE SONIDO AMBIENTAL DE 4 ZONAS | 240W RMS | SISTEMA 70/100V	7 días
404		26.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE PARA TECHO COAXIAL DE 6.5" Y TWEETER DE 1.5", 30W DE POTENCIA RMS TRANSFORMADOR DE LINEA INCLUIDO. ESTE MISMO COLOR BLANCO USO EN INTERIORES.	7 días
405		26.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALDE ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL. 12 ZONAS. 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA,1 SALIDA DE ALARMA.	7 días
406		26.16	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA, TIPO CALDERIN DE ALTO RENDIMIENTO	7 días
407		26.17	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 1" PARA TANQUE,TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL	7 días
408		26.18	FINAL	0 días

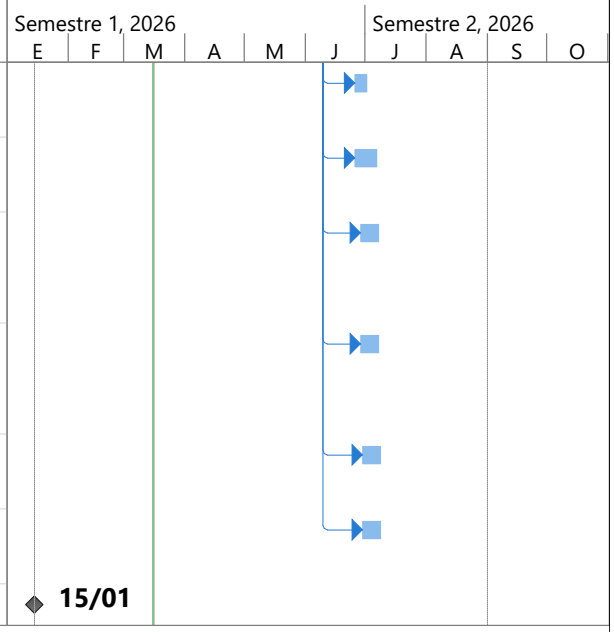

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 16/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
