CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES ☐		VALLEDUPAR - LA MESA ☐		LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON ☐		VALLEDUPAR URBANO ☒		OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Excavacion Mecanica	M3		839		
DESDE:	HASTA:	1,2	Conformacion Calzada Existente	M2		1745,5		
DESDE:	HASTA:	1,3	Transporte material de excavación	M3– Km		10907		
DESDE:	HASTA:	2,1	Subbase Granular	M3		296,3		
DESDE: 9-03-26	HASTA: 14-03-26	3,1	Pavimento de Concreto hidraulico	M3		65,79		
DESDE:	HASTA:	3,2	Corte, Limpiza y Sello de Juntas	ML		9675		
DESDE:	HASTA:	3,3	Acero de Refuerzo	Kg		660		
DESDE:	HASTA:	6,1	Excavacion Mecanica para tuberia	M3		29,4		
DESDE:	HASTA:	6,3	Cama de arena para tuberia.	M3		1,8		
DESDE:	HASTA:	6,4	Relleno de Zanja de alcantarillado	M2		29,4		
DESDE:	HASTA:	6,5	Reposicion de Red de alcantarillado	ML		60		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:
José Castro M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:
Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

GOBERNACIÓN DEL CESAR

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES ☐		VALLEDUPAR - LA MESA ☒		LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON ☐		VALLEDUPAR URBANO ☐		OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Mejoramiento de la subrasante	M2		12035		
DESDE:	HASTA:	2,4	Fresado Pavimento Asfaltico	M2		4896		
DESDE:	HASTA:	3,2	Excavacion sin clasificar	M3		1688		
DESDE: 16-03-26	HASTA: 21-03-26	4,1	Transporte de Materiales	M3-KM		30727,6		
DESDE:	HASTA:	5,2	Terraplen	M3		1075,2		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:
José Castro M.
DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:
Rodrigo Cezón
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	☐	VALLEDUPAR - LA MESA	☐	LA MESA - EL PALMAR ☒
	LA MESA - EL MAMON	☐	VALLEDUPAR URBANO	☐	OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Mejoramiento de la Subrasante	M2		5857		
DESDE: 19-03-26	HASTA: 21-03-26	2,1	Desmonte y Limpieza	Ha		0,58		
DESDE:	HASTA:	3,2	Excavación sin clasificar	M3		1725,6		
DESDE:	HASTA:	4,1	Transporte de Materiales	M3-Km		31405,92		
DESDE:	HASTA:	5,2	Terraplen	M3		440		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:
José Castro M.
DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:
Rodrigo Corzo
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

GOBERNACIÓN DEL CESAR

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	☐	VALLEDUPAR - LA MESA	☐	LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON	☒	VALLEDUPAR URBANO	☐	OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE: 16-03-26	HASTA: 21-03-26	1,1	Mejoramiento de Subrasante			5298,6		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Castro M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

770

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	☐	VALLEDUPAR - LA MESA	☐	LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON	☐	VALLEDUPAR URBANO	☒	OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Excavacion Mecanica	M3		700		
DESDE:	HASTA:	1,2	Conformacion Calzado Existente	M2		1345,5		
DESDE:	HASTA:	1,3	Transporte material de excavación	M3-Km		9100		
DESDE:	HASTA:	2,1	Subbase Granular	M3		386		
DESDE:	HASTA:	3,1	Pavimento concreto hidraulico	M3		62,866		
DESDE:	HASTA:	3,2	Corte, limpiza y sello de Juntas	ML		1059,95		
DESDE:	HASTA:	3,3	Acero de Refuerzo	Kg		586		
DESDE:	HASTA:	6,2	Excavacion Manual acometidas	M3		45,36		
DESDE:	HASTA:	6,3	Cama de Arena instalacion de Tubería	M3		2,16		
DESDE:	HASTA:	6,4	Relleno de Zanja de Alcantarillado	M2		35,28		
DESDE:	HASTA:	6,6	Reposicion red de Alcantarillado	ML		72		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Castro M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerro

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES ☐		VALLEDUPAR - LA MESA ☒		LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON ☐		VALLEDUPAR URBANO ☐		OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Mejoramiento de la Subrasante	M2		2114		
DESDE:	HASTA:	2,1	Desmonte y limpieza	Ha		0,39		
DESDE:	HASTA:	2,4	Fresado pavimento asfaltico	M2		514		
DESDE:	HASTA:	3,2	Excavacion sin clasificar	M3		233,6		
DESDE: 24-03-26	HASTA: 27-03-26	4,1	Transporte de Materiales	M3-KM		4251,52		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Carlos M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.026.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	☐	VALLEDUPAR - LA MESA	☐	LA MESA - EL PALMAR ☒
	LA MESA - EL MAMON	☐	VALLEDUPAR URBANO	☐	OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Mejoramiento de la Subrasante	M2		1478		
DESDE:	HASTA:	2,1	Desmonte y limpieza	Hg		0,2		
DESDE:	HASTA:	3,2	Excavacion sin clasificar	M3		487,6		
DESDE:	HASTA:	4,1	Transporte de materiales	M3-Km		8874,32		
DESDE: 24-03-26	HASTA: 26-03-26	5,2	Terraplen	M3		129		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Carbonell.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

GOBERNACIÓN DEL CESAR

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE

MEMORIA DE CANTIDADES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	☐	VALLEDUPAR - LA MESA	☐	LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON	☒	VALLEDUPAR URBANO	☐	OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE: 24-03-26	HASTA: 28-03-26	1,1	Mejoramiento de la Subrasante	M2		1433,5		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Castro M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC — UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

RECIBO DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACION DEL CESAR

UNION TEMPORAL RED VIAL - CONSORCIO INTERNORTE PC

MEMORIA DE CANTIDADES

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORMACION DEL CONTRATO

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR	SUPERVISOR CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NIT:	902.022.182	CONTRATO DE OBRA N°:	2026 - 04 - 0001
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	902.028.286	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	2026 - 05 - 0004

TRAMO:					
	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES ☐		VALLEDUPAR - LA MESA ☐		LA MESA - EL PALMAR ☐
	LA MESA - EL MAMON ☐		VALLEDUPAR URBANO ☐		OTRO ☐

PERIODO DE EJECUCION		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJEC. ANTERIOR ACTA	EJEC. ACTUAL ACTA	EJEC. ACUMULADO	OBSERVACION
DESDE:	HASTA:	1,1	Excavacion Mecanica	M3		687		
DESDE:	HASTA:	1,2	Conformacion Calzada Existente	M2		1544		
DESDE: 24-03-26	HASTA: 24-03-26	1,3	Transporte de Material deexcavación	M3-Km		8931		
DESDE:	HASTA:	2,1	sub base Granular	M3		377		
DESDE:	HASTA:	6,2	Excavacion Manual Acometidas	M3		16,38		
DESDE:	HASTA:	6,3	Cama de Arena Instalacion de Tuberia	M3		0,78		
DESDE:	HASTA:	6,4	Relleno de Zanjas de Alcantarillado	M2		12,74		
DESDE:	HASTA:	6,6	Reposicion red de Alcantarillado	ML		26		
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							
DESDE:	HASTA:							

OBSERVACIONES GENERALES:

UNION TEMPORAL RED VIAL
Responsable:

José Castro M.

DIRECTOR DE OBRA - UNION TEMPORAL RED VIAL

CONSORCION INTERNORTE PC
Reviso:

Rodrigo Cerón

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERNORTE PC

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

ANEXO 2:
Registro Eventos Climáticos

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DASHBOARD DE CONTROL CLIMÁTICO OPERACIONAL


TRAMO:	C	MES:	MARZO	AÑO:	2026

LA MESA - EL PALMAR

41:15	21:45	11	10	9,1%	-
HORAS DE LLUVIA EN EL PERÍODO	HORAS DE AFECTACIÓN POR LLUVIA	EVENTOS DE LLUVIA	DÍAS AFECTADOS	% AFECTACIÓN DE LLUVIAS EN LE PERÍODO	DÍAS NO REGISTRADOS

FECHA	DÍA	CONDICIÓN DÍA	EVENTOS	HORAS LLUVIA	HORAS AFECTACIÓN	ESTADO OPERACIONAL	INTENSIDAD PREDOMINANTE
01/03/2026	DOMINGO	LLUVIOSO	1	3:45	2:15	AFECTA	MEDIA
02/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	5:45	0:45	AFECTA	MEDIA
03/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
04/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
05/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
06/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
07/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
08/03/2026	DOMINGO	LLUVIOSO	1	4:00	1:00	AFECTA	BAJA
09/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	2:45	3:00	AFECTA	MEDIA
10/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
11/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
12/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
13/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	3:45	2:00	AFECTA	MEDIA
14/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	3:00	3:00	AFECTA	INTENSA
15/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
16/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	3:45	2:30	AFECTA	MEDIA
17/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
18/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
19/03/2026	JUEVES	SECO	1	4:00	0:00	NO AFECTA	MEDIA
20/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
21/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
22/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
23/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	2:00	2:30	AFECTA	MEDIA
24/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:30	1:15	AFECTA	INTENSA
25/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	4:00	3:30	AFECTA	INTENSA
26/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
27/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
28/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
29/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
30/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
31/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---

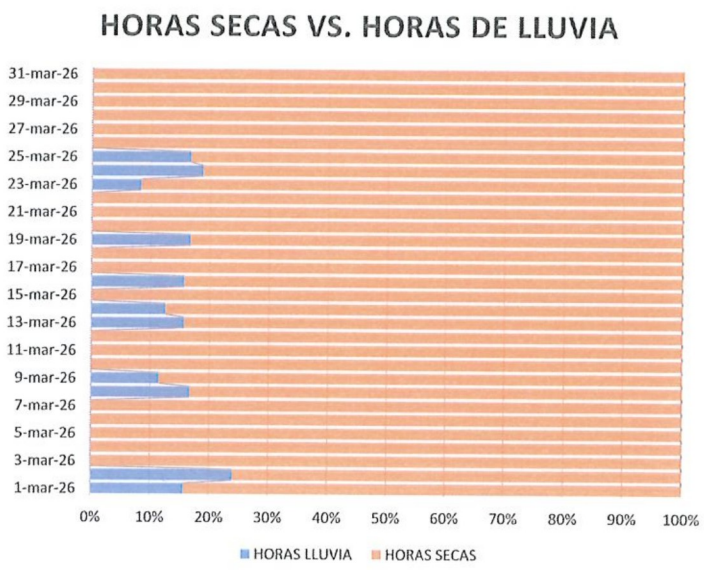

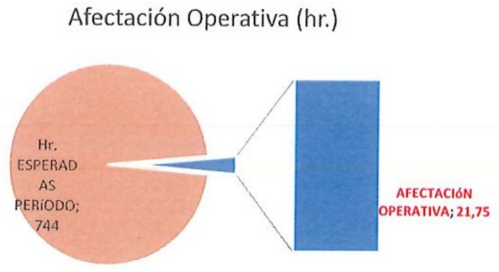

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DASHBOARD DE CONTROL CLIMÁTICO OPERACIONAL


TRAMO:	B	MES:	MARZO	AÑO:	2026

GLORIETA ANILLO VIAL - TRAMACUA - LA MESA

27:00	17:30	7	7	7,3%	-
HORAS DE LLUVIA EN EL PERÍODO	HORAS DE AFECTACIÓN POR LLUVIA	EVENTOS DE LLUVIA	DÍAS AFECTADOS	% AFECTACIÓN DE LLUVIAS EN LE PERÍODO	DÍAS NO REGISTRADOS

FECHA	DÍA	CONDICIÓN DÍA	EVENTOS	HORAS LLUVIA	HORAS AFECTACIÓN	ESTADO OPERACIONAL	INTENSIDAD PREDOMINANTE
01/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
02/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
03/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
04/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	3:00	3:00	AFECTA	MEDIA
05/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
06/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
07/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	3:45	2:30	AFECTA	INTENSA
08/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
09/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
10/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:30	4:15	AFECTA	MEDIA
11/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
12/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
13/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
14/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
15/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
16/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
17/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:00	2:00	AFECTA	MEDIA
18/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
19/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
20/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
21/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
22/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
23/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
24/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
25/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
26/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	4:00	1:00	AFECTA	MEDIA
27/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
28/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
29/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
30/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	3:00	1:00	AFECTA	MEDIA
31/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:45	3:45	AFECTA	MEDIA

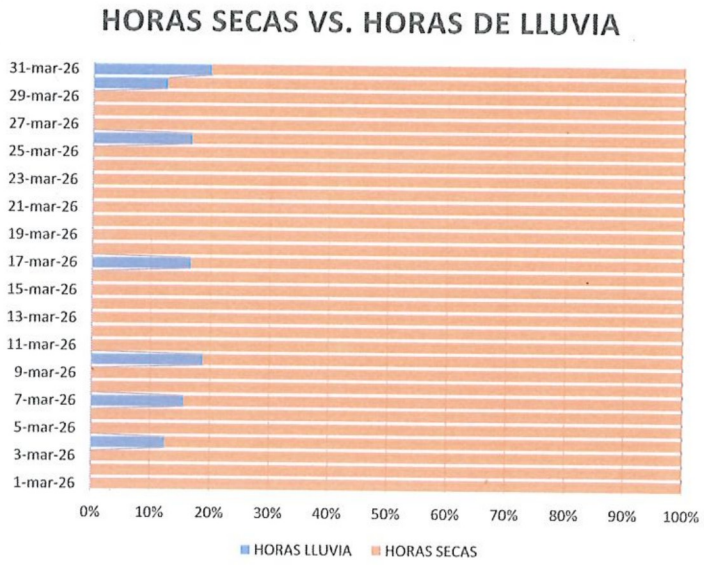

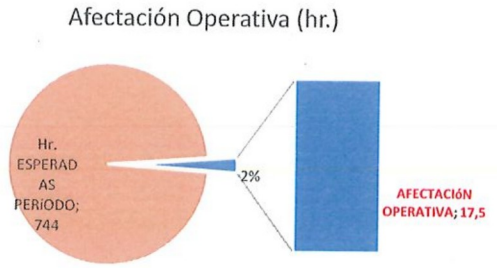

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DASHBOARD DE CONTROL CLIMÁTICO OPERACIONAL


TRAMO:	A	MES:	MARZO	AÑO:	2026

TOCAIMO-NUEVAS FLORES

92:20	47:15	27	22	19,7%	-
HORAS DE LLUVIA EN EL PERÍODO	HORAS DE AFECTACIÓN POR LLUVIA	EVENTOS DE LLUVIA	DÍAS AFECTADOS	% AFECTACIÓN DE LLUVIAS EN LE PERÍODO	DÍAS NO REGISTRADOS

FECHA	DÍA	CONDICIÓN DÍA	EVENTOS	HORAS LLUVIA	HORAS AFECTACIÓN	ESTADO OPERACIONAL	INTENSIDAD PREDOMINANTE
01/03/2026	DOMINGO	LLUVIOSO	1	2:40	3:00	AFECTA	MEDIA
02/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	4:10	3:30	AFECTA	MEDIA
03/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:45	4:00	AFECTA	INTENSA
04/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	4:15	3:00	AFECTA	INTENSA
05/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	4:45	4:00	AFECTA	MEDIA
06/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	3:00	1:30	AFECTA	MEDIA
07/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	4:15	1:15	AFECTA	MEDIA
08/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
09/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	3:45	0:45	AFECTA	BAJA
10/03/2026	MARTES	SECO	1	3:30	0:00	NO AFECTA	BAJA
11/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	4:00	3:15	AFECTA	MEDIA
12/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	3:30	1:00	AFECTA	INTENSA
13/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	4:45	4:00	AFECTA	MEDIA
14/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	2:00	0:30	AFECTA	INTENSA
15/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
16/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	4:00	2:45	AFECTA	MEDIA
17/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	3:30	2:00	AFECTA	MEDIA
18/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	1:15	2:00	AFECTA	INTENSA
19/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	2:00	0:30	AFECTA	INTENSA
20/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	2:45	1:00	AFECTA	MEDIA
21/03/2026	SÁBADO	SECO	1	3:15	0:00	NO AFECTA	INTENSA
22/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
23/03/2026	LUNES	SECO	1	4:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
24/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	1:45	0:45	AFECTA	MEDIA
25/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	1	3:45	0:00	NO AFECTA	MEDIA
26/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	2:30	2:30	AFECTA	MEDIA
27/03/2026	VIERNES	SECO	1	3:00	0:00	NO AFECTA	MEDIA
28/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	4:00	1:00	AFECTA	MEDIA
29/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
30/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	3:15	1:00	AFECTA	MEDIA
31/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:00	4:00	AFECTA	MEDIA

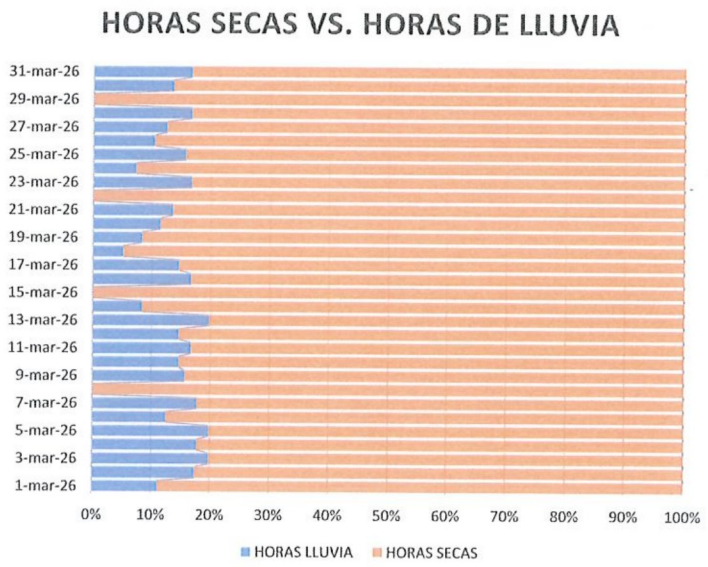

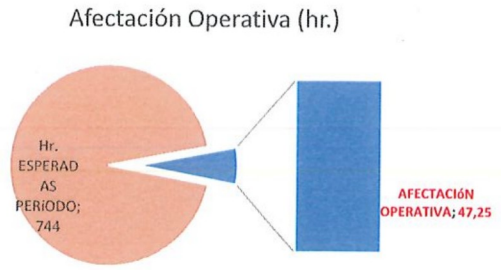

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DASHBOARD DE CONTROL CLIMÁTICO OPERACIONAL


TRAMO:	E	MES:	MARZO	AÑO:	2026

DIFERENTES CALLES Y CARRERAS EN VALLEDUPAR

70:45	14:00	26	9	5,8%	-
HORAS DE LLUVIA EN EL PERÍODO	HORAS DE AFECTACIÓN POR LLUVIA	EVENTOS DE LLUVIA	DÍAS AFECTADOS	% AFECTACIÓN DE LLUVIAS EN LE PERÍODO	DÍAS NO REGISTRADOS

FECHA	DÍA	CONDICIÓN DÍA	EVENTOS	HORAS LLUVIA	HORAS AFECTACIÓN	ESTADO OPERACIONAL	INTENSIDAD PREDOMINANTE
01/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
02/03/2026	LUNES	SECO	1	3:45	0:00	NO AFECTA	BAJA
03/03/2026	MARTES	SECO	1	4:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
04/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	1	3:45	0:00	NO AFECTA	BAJA
05/03/2026	JUEVES	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
06/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	3:15	0:45	AFECTA	MEDIA
07/03/2026	SÁBADO	SECO	1	2:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
08/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
09/03/2026	LUNES	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
10/03/2026	MARTES	SECO	1	3:45	0:00	NO AFECTA	BAJA
11/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	3:45	0:45	AFECTA	MEDIA
12/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	4:00	3:00	AFECTA	MEDIA
13/03/2026	VIERNES	SECO	1	4:30	0:00	NO AFECTA	BAJA
14/03/2026	SÁBADO	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
15/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
16/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	4:00	1:30	AFECTA	MEDIA
17/03/2026	MARTES	SECO	1	3:45	0:00	NO AFECTA	BAJA
18/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
19/03/2026	JUEVES	SECO	1	2:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
20/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	4:00	2:00	AFECTA	MEDIA
21/03/2026	SÁBADO	SECO	1	3:15	0:00	NO AFECTA	BAJA
22/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
23/03/2026	LUNES	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
24/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:00	2:00	AFECTA	MEDIA
25/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	3:15	1:00	AFECTA	MEDIA
26/03/2026	JUEVES	SECO	1	0:00	0:00	NO AFECTA	---
27/03/2026	VIERNES	SECO	1	2:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
28/03/2026	SÁBADO	SECO	1	4:45	0:00	NO AFECTA	BAJA
29/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
30/03/2026	LUNES	LLUVIOSO	1	2:45	1:45	AFECTA	MEDIA
31/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:15	1:15	AFECTA	MEDIA

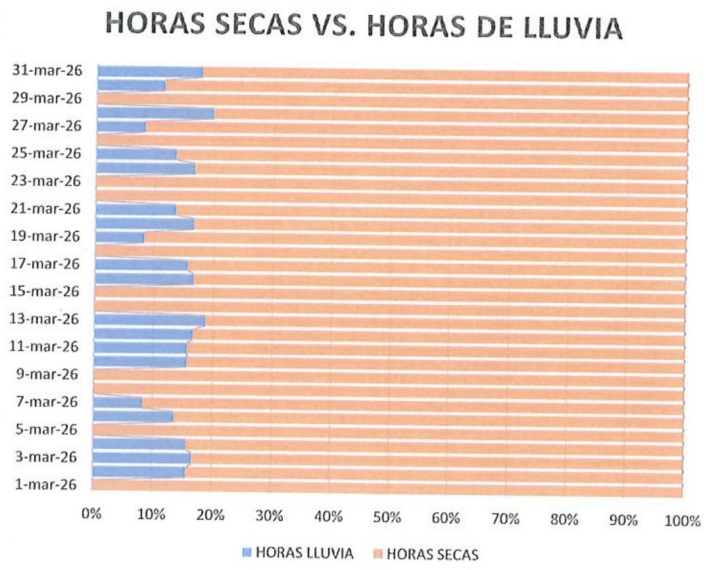

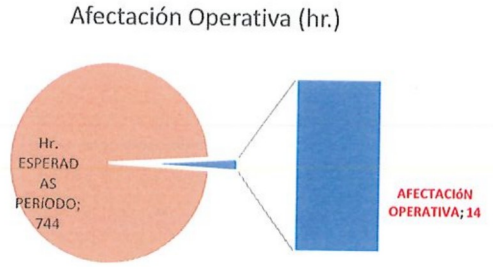

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DASHBOARD DE CONTROL CLIMÁTICO OPERACIONAL


TRAMO:	D	MES:	MARZO	AÑO:	2026

LA MESA - EL MAMON

39:45	18:30	10	8	7,7%	-
HORAS DE LLUVIA EN EL PERÍODO	HORAS DE AFECTACIÓN POR LLUVIA	EVENTOS DE LLUVIA	DÍAS AFECTADOS	% AFECTACIÓN DE LLUVIAS EN LE PERÍODO	DÍAS NO REGISTRADOS

FECHA	DÍA	CONDICIÓN DÍA	EVENTOS	HORAS LLUVIA	HORAS AFECTACIÓN	ESTADO OPERACIONAL	INTENSIDAD PREDOMINANTE
01/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
02/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
03/03/2026	MARTES	LLUVIOSO	1	4:30	2:15	AFECTA	MEDIA
04/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
05/03/2026	JUEVES	LLUVIOSO	1	4:15	4:00	AFECTA	MEDIA
06/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	4:15	5:00	AFECTA	MEDIA
07/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
08/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
09/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
10/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
11/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	4:15	1:30	AFECTA	MEDIA
12/03/2026	JUEVES	SECO	1	4:00	0:00	NO AFECTA	BAJA
13/03/2026	VIERNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
14/03/2026	SÁBADO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
15/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
16/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
17/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
18/03/2026	MIÉRCOLES	LLUVIOSO	1	3:00	1:00	AFECTA	MEDIA
19/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
20/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	3:45	1:15	AFECTA	MEDIA
21/03/2026	SÁBADO	SECO	1	2:15	0:00	NO AFECTA	MEDIA
22/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
23/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
24/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
25/03/2026	MIÉRCOLES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
26/03/2026	JUEVES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
27/03/2026	VIERNES	LLUVIOSO	1	4:30	2:00	AFECTA	MEDIA
28/03/2026	SÁBADO	LLUVIOSO	1	5:00	1:30	AFECTA	MEDIA
29/03/2026	DOMINGO	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
30/03/2026	LUNES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---
31/03/2026	MARTES	SECO	0	0:00	0:00	NO AFECTA	---

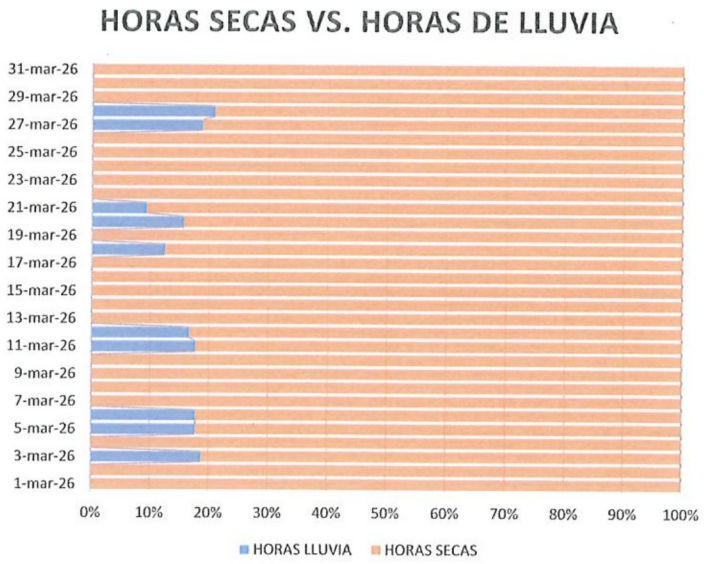

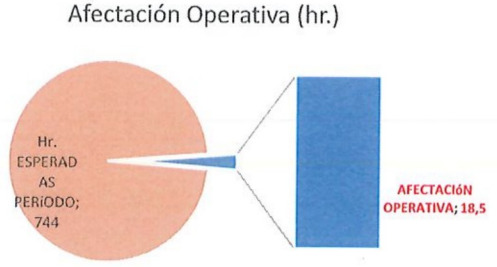

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

ANEXO 3:
Listado de Personal Vinculado y Soporte de Pago de Nomina

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

PERÍODO:	mar-2026	
INICIO:	1-mar-2026	
FIN:	31-mar-2026	
DIAS PERÍODO:	31	

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO

Documento	Apellidos	Nombres	Cargo	Salario	Aux. Transporte	Vr. Salario	Estatus	Ubicación
1104011441	BLANCO BLANCO	RODOLFO	Laboratorista Inspector [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
32869441	FERNANDEZ CASTRO	SAIDA ISABEL	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
15172586	HERNANDEZ ORTEGA	JAIR HENRIQUE	Auxiliar de Residente [contractual])	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
4978862	LLANOS MARTINEZ	IRNE STEFAN	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
1123730357	MORALES	KATHERIN	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
1065831698	OCHOA MORGAN	OSCAR IVAN	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
72302408	ROJAS EALO	ALEX ESTEBAN	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ 2.249.095,00	Activo	LA MESA
1015430048	SARMIENTO DAZA	MARIA DELMAR	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
1065653300	SARMIENTO DAZA	MARIA MARTHA	Residente de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
77005591	SARMIENTO SANTIAGO	ROQUE ANTONIO	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
15173478	SUAREZ QUINONES	ALVARO RAUL JOSE	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	LA MESA
49715697	ARCINIEGAS AMAYA	YULEIKA	Auxiliar social	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	N/A
1007732394	COSTA RAMIREZ	JESUS JOSE	Auxiliar de ingenieria	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	N/A
1065838095	AMAYA SOLANO	DAYANA PAOLA	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
77185647	ANEZ ZULETA	FELIPE ALBERTO	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ 2.249.095,00	Activo	TOCAIMO
17955679	BARRIOS RODRIGUEZ	HERLIN FAVIAN	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
77172261	DIAZ RUIZ	HUGO NELSON	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
1067813333	LOPEZ TORRES	ADDY CECILIA	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
77181555	MARTINEZ ESTRADA	JULIO CESAR	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
1065641986	PEREZ GUTIERREZ	ZARAHY ALEXANDRA	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
77187121	TAPIA ROYERO	ALI ENRIQUE	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ 2.249.095,00	Activo	TOCAIMO
1065844225	URZOLA CORRALES	LUIS MIGUEL	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
15170688	VEGA CASTILLA	YAMIL ANTONIO	Laboratorista Inspector [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TOCAIMO
77030600	BELENO PEREZ	ATENOGENE S	Especialista en estructuras [contractual]	$ 1.755.000,00	$ 249.095,00	$ 2.004.095,00	Activo	TODO EL PROYECTO
1067818402	CALDERON TORRES	JULIO ALFONSO	Auxiliar Administrativo [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TODO EL PROYECTO
1065633725	CARRILLO JIMENEZ	JULIETH ELENA	Contador [contractual]	$ 1.752.000,00	$ 249.095,00	$ 2.001.095,00	Activo	TODO EL PROYECTO
7570243	CASTRO MORALES	JOSE GUILLERMO	Director de Obra [contractual]	$ 2.500.000,00	$ 249.095,00	$ 2.749.095,00	Activo	TODO EL PROYECTO
91536690	CHINCHIA BONETT	ALFREDO ANDRES	Asesor Jurídico [contractual]	$ 1.815.000,00	$ 249.095,00	$ 2.064.095,00	Activo	TODO EL PROYECTO
5230669	FERNANDEZ RODRIGUEZ	WILSON ANTONIO	Especialista hidráulico [contractual]	$ 1.755.000,00	$ 249.095,00	$ 2.004.095,00	Activo	TODO EL PROYECTO
1067816509	NUNEZ GOMEZ	YUTSELLYS BELISA	Auxiliar Administrativo [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TODO EL PROYECTO
73570037	ORTEGA SINNING	EBERTO RAFAEL	Especialista en Vías [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	TODO EL PROYECTO
1067816567	DE LAS AGUAS SILVA	TATIANA PATRICIA	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	VALLEDUPAR
1065592876	GALINDO GAMEZ	JOHAN DAVID	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	VALLEDUPAR
1065806755	HERNANDEZ SIERRA	LARRY ANDREY	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	VALLEDUPAR

23

PERÍODO:	mar-2026	**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**
INICIO:	1-mar-2026	**CONTRATO:** 202604001
FIN:	31-mar-2026	**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
DÍAS PERÍODO:	31	**RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO**

Documento	Apellidos	Nombres	Cargo	Salario	Aux. Transporte	Vr. Salario	Estatus	Ubicación
49723465	SARMIENTO DAZA	MARIA ALEJANDRA	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	VALLEDUPAR
15173472	VILLERO OSPINO	WILSON JUNIOR	Residente de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ 2.000.000,00	Activo	VALLEDUPAR

APROBADO POR:

ING. ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

PERIODO:	mar-2026
INICIO:	1-mar-2026
FIN:	31-mar-2026
DIAS PERIODO:	31

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONTRATO: 202604001

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

RELACIÓN PAGO DE NOMINA

Id.	Apellidos	Nombres	CC.	Cargo	Salario Base	Días laborados	Salario Periodo	Aux. Transporte	Deducciones.	Datos. [Prestamo y otros]	Vr. Salario	Medio de Pago	Recibido
1	BLANCO BLANCO	RODOLFO	1104011441	Laboratorista Inspector [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
2	FERNANDEZ CASTRO	SAIDA ISABEL	32869441	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
3	HERNANDEZ ORTEGA	JAIR HENRIQUE	15172586	Auxiliar de Residente [contractual])	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
4	LLANOS MARTINEZ	IRNE STEFAN	4978862	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
5	MORALES	KATHERIN	1123730357	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
6	OCHOA MORGAN	OSCAR IVAN	1065831698	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
7	ROJAS EALO	ALEX ESTEBAN	72302408	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	31	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.249.095,00	Transferencia bacaria	
8	SARMIENTO DAZA	MARIA DELMAR	1015430048	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
9	SARMIENTO DAZA	MARIA MARTHA	1065653300	Residente de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
10	SARMIENTO SANTIAGO	ROQUE ANTONIO	77005591	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
11	SUAREZ QUINONES	ALVARO RAUL JO	15173478	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
12	ARCINIEGAS AMAYA	YULEIKA	49715697	Auxiliar social	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
13	COSTA RAMIREZ	JESUS JOSE	1007732394	Auxiliar de ingenieria	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
14	AMAYA SOLANO	DAYANA PAOLA	1065838095	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
15	ANEZ ZULETA	FELIPE ALBERTO	77185647	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	31	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.249.095,00	Transferencia bacaria	
16	BARRIOS RODRIGUEZ	HERLIN FAVIAN	17955679	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
17	DIAZ RUIZ	HUGO NELSON	77172261	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	

PERIODO:	mar-2026	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE
INICIO:	1-mar-2026	CONTRATO: 202604001
FIN:	31-mar-2026	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIAS PERIODO:	31	RELACIÓN PAGO DE NOMINA

Id.	Apellidos	Nombres	CC.	Cargo	Salario Basn	Dias laborados	Salario Periodo	Aux. Transporte	Deducciones.	Ocros. Préstamos y otros	Vr. Salario	Medio de Pago	Recibido
18	LOPEZ TORRES	ADDY CECILIA	1067813333	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	ADDY LOPEZ
19	MARTINEZ ESTRADA	JULIO CESAR	77181555	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Julio Cesar Martinez.
20	PEREZ GUTIERREZ	ZARAHY ALEXANDI	1065641986	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Zarahy
21	TAPIA ROYERO	ALI ENRIQUE	77187121	Residente de Obra [contractual]	$ 2.000.000,00	31	$ 2.000.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.249.095,00	Transferencia bacaria	Ali Enrique S.
22	URZOLA CORRALES	LUIS MIGUEL	1065844225	Auxiliar de Residente [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Luis Miguel U.
23	VEGA CASTILLA	YAMIL ANTONIO	15170688	Laboratorista Inspector [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Yamil
24	BELENO PEREZ	ATENOGENE S	77030600	Especialista en estructuras [contractual]	$ 1.755.000,00	31	$ 1.755.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.004.095,00	Transferencia bacaria	Atenogenes Beleno
25	CALDERON TORRES	JULIO ALFONSO	1067818402	Auxiliar Administrativo [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Julio Calderon.
26	CARRILLO JIMENEZ	JULIETH ELENA	1065633725	Contador [contractual]	$ 1.752.000,00	31	$ 1.752.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.001.095,00	Transferencia bacaria	J.C.J.
27	CASTRO MORALES	JOSE GUILLERMO	7570243	Director de Obra [contractual]	$ 2.500.000,00	31	$ 2.500.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.749.095,00	Transferencia bacaria	Jose Castro M.
28	CHINCHIA BONETT	ALFREDO ANDRES	91536690	Asesor Jurídico [contractual]	$ 1.815.000,00	31	$ 1.815.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.064.095,00	Transferencia bacaria	Andres Chinchia.
29	FERNANDEZ RODRIGUEZ	WILSON ANTONIO	5230669	Especialista hidráulico [contractual]	$ 1.755.000,00	31	$ 1.755.000,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.004.095,00	Transferencia bacaria	
30	NUNEZ GOMEZ	YUTSELLYS BELI	1067816509	Auxiliar Administrativo [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Yutsellys N.
31	ORTEGA SINNING	EBERTO RAFAEL	73570037	Especialista en Vias [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
32	DE LAS AGUAS SILVA	TATIANA PATRIC	1067816567	Residente social [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Tatiana.
33	GALINDO GAMEZ	JOHAN DAVID	1065592876	Residente Ambiental [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Johan Galindo G.
34	HERNANDEZ SIERRA	LARRY ANDREY	1065806755	Residente SISO [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	Larry Hernandez

PERIODO:	mar-2026	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE
INICIO:	1-mar-2026	CONTRATO: 202604001
FIN:	31-mar-2026	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIAS PERIODO:	31	RELACIÓN PAGO DE NOMINA

Id.	Apellidos	Nombres	CC.	Cargo	Salario Base	Dias laborados	Salario Periodo	Aux. Transporte	Deducciones.	Datos. [Prestamos y otros]	Vr. Salario	Medio de Pago	Recibido
35	SARMIENTO DAZA	MARIA ALEJANDRA	49723465	Inspector de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
36	VILLERO OSPINO	WILSON JUNIOR	15173472	Residente de Obra [contractual]	$ 1.750.905,00	31	$ 1.750.905,00	$ 249.095,00	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	Transferencia bacaria	
Total					$ 64.602.340,00		$ 64.602.340,00	$ 8.967.420,00			$ 73.569.760,00		

APROBADO POR:

ING. ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

REVISADO POR:

JULIETH ELENA CARRILLO JIMENEZ
CONTADOR
UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

ANEXO 4:
Soportes de Pago de Seguridad Social (PILA)

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902022182
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UT RED VIAL DEL NORTE CESAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	5837148
DIRECCIÓN:	DG 6A # 13B 21	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	001 - VALLEDUPAR
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168508592	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0901319990

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1,400,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,400,200	$ 0	$ 1,400,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,280,000	$ 0	$ 1,280,000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 600,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,200	$ 0	$ 600,200
SUBTOTALES:										$ 3,280,400	$ 0	$ 3,280,400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 80,000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150,100	$ 0	$ 0	$ 150,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 160,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 360,000
SUBTOTALES:													$ 820,200	$ 0	$ 0	$ 820,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,427,000	$ 1,427,000	$ 0	$ 0	$ 1,427,000
SUBTOTALES:									$ 1,427,000	$ 0	$ 0	$ 1,427,000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	10	$ 820,200	$ 0	$ 820,200
SUBTOTALES:			$ 820,200	$ 0	$ 820,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1007732394	COSTA RAMIREZ JESUS JOSE	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																	
2	CC 1015430048	SARMIENTO BAZA MARIA DELMAR	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
3	CC 1065592876	CALDERON JIMENEZ JOHAN DAVID	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
4	CC 1065838095	AMAYA SOLANO DAYANA PAOLA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
5	CC 1065844225	URZOLA TORRALES LUIS MIGUEL	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																	
6	CC 1067813333	LOPEZ TORRES CODY CECILIA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
7	CC 15173472	VILLERO DIFINO WILSON JUNIOR	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
8	CC 49715697	ARCHINEGAS AMAYA YULEIKA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
9	CC 72302408	ROJAS EALO ALEX ESTEBAN	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	
10	CC 7570243	CASTRO MORALES JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 3,000,000	FIJO		SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	NUEVA EPS CM	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 121,900	30	$ 1,750,905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230201-PROTECCION	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000		$ 139,200	30	$ 2,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	30	$ 3,000,000	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3,000,000	$ 120,000	$ 0	$ 120,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,000,000		$ 208,800	30	$ 3,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.347.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902022182
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UT RED VIAL DEL NORTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	DG 6A # 13B 21	TELÉFONO:	5837148
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - VALLEDUPAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1750967417			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	14						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			569428

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.442.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.500	$ 0	$ 3.442.600	$ 33.500	$ 3.476.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.500	$ 0	$ 1.700.000	$ 16.500	$ 1.716.500
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 0	$ 1.401.000	$ 13.600	$ 1.414.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 600.200	$ 5.900	$ 606.100
SUBTOTALES:										$ 7.143.800	$ 69.500	$ 7.213.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAW	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 700	$ 0	$ 70.100	$ 700	$ 0	$ 70.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 640.900	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 640.900	$ 6.300	$ 0	$ 647.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 700	$ 0	$ 70.100	$ 700	$ 0	$ 70.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 863.600	$ 0	$ 8.400	$ 0	$ 863.600	$ 8.400	$ 0	$ 872.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.200	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 212.200	$ 2.100	$ 0	$ 214.300
SUBTOTALES:													$ 1.856.900	$ 18.200	$ 0	$ 1.875.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	26		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.891.700	$ 2.891.700	$ 28.100	$ 0	$ 2.919.800
SUBTOTALES:									$ 2.891.700	$ 28.100	$ 0	$ 2.919.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	26	$ 1.856.900	$ 18.100	$ 1.875.000
SUBTOTALES:			$ 1.856.900	$ 18.100	$ 1.875.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1065633725	CARRILLO JIMENEZ JULIETH ELENA	DEPEND		$ 1.752.000	FIJO			SI																
2	CC 1065641988	PEREZ GUTIERREZ ZARAHY ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
3	CC 1065653300	SARMIENTO DAZA MARIA MARTHA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																
4	CC 1065806755	HERNANDEZ SIERRA LARRY ANDREY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
5	CC 1065831698	OCHOA MORGAN OSCAR IVAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
6	CC 1067816509	NUÑEZ GOMEZ YUTSELLYS MELINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
7	CC 1067816567	DE LAS AGUAS SILVA TATIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
8	CC 1067818402	CALDERON TORRES JULIO ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
9	CC 1104011441	BLANCO BLANCO RODOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
10	CC 1123730357	MORALES KATHERIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
11	CC 15170658	VEGA CASTILLA KAMIL ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.752.000	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.752.000	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.752.000		$ 9.200	30	$ 1.752.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Página Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902022182
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UT RED VIAL DEL NORTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	DG 6A # 13B 21	TELÉFONO:	5837148
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - VALLEDUPAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1750967417	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	569428

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 15172586	HERNANDEZ ORTEGA JAIR HENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 15173478	SUAREZ QUINONES ALVARO RAUL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 17955679	BARROS RODRIGUEZ HERLIN FAVIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 32669441	FERNANDEZ CASTRO SAIDA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 49723465	SARMIENTO DAZA MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 4978562	LLANOS MARTINEZ IRNE STEFAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5230669	FERNANDEZ RODRIGUEZ WILSON ANTONIO	DEPEND		$ 1.755.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.755.000	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.755.000	$ 70.200	$ 0	$ 70.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.755.000		$ 122.200	30	$ 1.755.000	CCF15-COMFACESAR	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 73570037	ORTEGA ARNUNO EBERTO RAFAEL	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF15-COMFACESAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 77005591	SARMIENTO SANTIAGO ROQUE ANTONIO	DEPEND	PENSIONADO ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 77030650	SELENO PEREZ ATENOGENES	DEPEND		$ 1.755.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.755.000	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.755.000	$ 70.200	$ 0	$ 70.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.755.000		$ 122.200	30	$ 1.755.000	CCF15-COMFACESAR	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 77172281	DIAZ RUIZ HUGO NELSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 77181555	MARTINEZ ESTRADA RAUD CESAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC1-DUSAKAWI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 77185647	PAEZ ZULETA FELIPE ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 77187121	TAPIA ROVERO ALI ENRIQUE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 91536690	CHINCHIA BONETT ALFREDO ANDRES	DEPEND		$ 1.815.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.815.000	$ 290.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 72.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.815.000		$ 126.400	30	$ 1.815.000	CCF15-COMFACESAR	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	$ 13.883.200

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

ANEXO 5:
Bitácora de Obra del Periodo Evaluado

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	18


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR		

FECHA: 02- Mayo 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Mejoramiento de la Subrasante involucrando material de sitio.				
2	Desmonte y limpieza				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada				
4	Transporte de materiales procedente de la excavación				
5	Terraplen				
6	Humectación				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS



NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA HITO DE LAS ACTIVIDAD CON LA HORA EXACTA DE PERMITO DE HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoniveladora	(1)	☑	☐	9h
Vibrocompactador	(1)	☑	☐	9h
Retro excavadora oruga	(1)	☑	☐	9h
Pajarita	(1)	☑	☐	9h
Cargotaya de Cintura	(1)	☑	☐	6h
Volqueta	(6)	☐	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra.	1	Controlador de tráfico.	4
Residente Ambiental	1	Ayudante	4
Residente SST	1	Oficial	1
Residente social	1		
Auxiliar de Ingeniería	1		
Inspector de obra	1		
Topografo	1		
Celador.	3		

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con actividades de desmonte y limpieza en sectores con presencia de vegetación y material orgánico permitiendo ampliar las áreas de intervención y garantizar el acceso de la maquinaria. La comisión topográfica realiza replanteo y nivelación de ejes sobre los tramos programados.

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
M. Sarmiento.	CONSORCIO INTERNORTE PC
María Martha Sarmiento Daza	ING. MALORY GUTIERREZ
T.P 25202-336887 CND	TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 19

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
TRAMO:	TRANO VIAL LA MESA - EL PALMAR
CONTRATO N°:	2026040001
FECHA:	03 Mar 2026
ESTADO DEL TIEMPO:	☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO
DURACIÓN LLUVIAS:	0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio				
2	Desmonte y limpieza				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada.				
4	Transporte de materiales procedente de la excavación.				
5	Terraplen.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR CADA ITEM EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoniveladora	(1)	☒	☐	9h
Vibro compactador	(1)	☒	☐	6h
Retro excavadora oruga	(1)	☒	☐	9h
Pajarita	(1)	☒	☐	9h
Carro tanque cisterna	(1)	☒	☐	6h
Volqueta	(6)	☒	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de Obra	1	Ayudante	4
Residente Ambiental	1	Obrero	1
Residente SST	1	Conductor de Trafico	4
Residente social	1		
Auxiliar de Ingenieria	1		
Operario	1		
Jardinero	1		
	3		

OBSERVACIONES

Se inician actividades de mejoramiento de la subrasante utilizando material existente, incluyendo conformación, nivelación y compactación preliminar de la plataforma vial. Se realizaron humectaciones periódicas para facilitar el proceso constructivo y minimizar emisiones de polvo.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	20


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR		

FECHA: 04 - Mayo - 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Desmonte y limpieza				
2	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada				
4	Trasporte de materiales				
5	Tenopkm.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS



NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Volqueta	☑	☐	9h
Vibro compactador	☑	☐	6h
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Bailarina	☑	☐	9h
Cabezote tanque	☑	☐	6h
Motoniveladora	☑	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Cantinero de turno	4
Residente Ambiental	1	Ayudante	4
Residente SST	1	Oficial	1
Residente social	1		
Inspector de obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	3		
Auxiliar de Ingeniería	1		

OBSERVACIONES

Se realizan excavaciones sin clasificar para la conformación de explanación y adecuación de taludes laterales en los sectores priorizados. Se realiza el transporte de material de excavación.

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
M. Sarto.	CONSORCIO INTERNORTE PC
María Martha Sarmiento Daza	ING. MALORY GUTIERREZ
T.P 25202-336887 CND	TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 21

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 05 - Mar - 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
2	Desmonte y limpieza				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada				
4	Terraplen				
5	Trasporte de materiales.				
6	Humectación de carriles.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA HUD DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	11:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Volqueta	(6)	☑	☐	9h
Cargotodo	(1)	☑	☐	6h
Retroexcavadora	(1)	☑	☐	9h
Vibro compactador	(1)	☑	☐	9h
Motoniveladora	(1)	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Controlador de tráfico	4
Residente ambiental	1	Ayudante	4
Residente SST	1	oficial	1
Residente Social	1		
Inspector de obra	1		
Auxiliar de Ingeniería	1		
Topografo	1		
Cadenero	3		

OBSERVACIONES

Se adelantan trabajos de construcción y conformación de terraplen mediante extendido de material incluyendo su compactación. Durante la jornada se mantuvo el acompañamiento permanente de la comisión topográfica para control de niveles, alineamientos y las secciones transversales.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	22

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR		

FECHA: 06 - Mayo - 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: ☐ hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización y replanteo				
2	Desmonte y limpieza				
3	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio				
4	Excavación para ampliación y conformación de cunetas				
5	Terraplen				
6	Transporte de materiales				
7	Actas de vecindad				
8	Humectación de calzadas				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR CADA HORA EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoweldadora	(1)	☑	☐	9h
Libro compactador	(1)	☑	☐	6h
Retroexcavadora	(1)	☑	☐	9h
Palavista	(1)	☑	☐	9h
Carro tanque	(1)	☑	☐	6h
Volqueta	(6)	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Ayudantes	9	Cadeneo	3
Oficiales	1	Auxiliar de Ingeniería	1
Controladores de tráfico	4	Inspector de Obra	1
Residente de Obra	1		
Residente SST	1		
Residente Ambiental	1		
Residente Social	1		
Topografo	1		

OBSERVACIONES

Se llevan a cabo actividades correspondientes al plan de Adaptación de la Guia Ambiental (PAGA) y el Plan de Manejo de Trafico (PMT) garantizando condiciones seguras en la vía en construcción. Se realizo pertifilado y conformación de la subrasante.

POR EL CONTRATISTA:

María Marcha Surmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 23

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 07- May -2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Humectación				
2	Desmonte y limpieza				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada.				
4	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
5	Terraplen				
6	Transporte de materiales				
7	Humectación de la vía.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

SELECCIONE CADA HORA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:20
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Volqueta	(6)	☑	☐	9h
Carrotanque	(1)	☑	☐	6h
Rodillo	(1)	☑	☐	9h
Retro-excavadora	(1)	☑	☐	9h
Vibro compactador	(1)	☑	☐	9h
Motoniveladora	(1)	☑	☐	6h
		☐	☐	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Director de obra	1
Residente SST	1	Ayudante	4
Residente Ambiental	1	Ofitalet	
Auxiliar de Ingeniería	1	Controlador de Tráfico	4
Inspector de obra	1		
Residente Social	1		
Cadenero	3		
Topografo	1		

OBSERVACIONES

Se continuan labores de perfilado y conformación de la subrasante en diferentes sectores de la vía. Paralelamente se efectuaron actividades de limpieza general y retiro de material sobrante. El avance físico se mantiene acorde a la programación general.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	24

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR		

FECHA: 09 - Mar - 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Desmonte y limpieza.				
2	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
3	Excavación para ampliación y conformación de Calzada.				
4	Transporte de Materiales				
5.	Terraplen.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoniveladora	(1)	☑	☐	9h
Vibrocompactador	(1)	☑	☐	6.5
Retroexcavadora oruga	(1)	☑	☐	9h
Rajadora	(1)	☑	☐	9h
Cargotractor Cuteria	(1)	☑	☐	6.5
Volqueta	(6)	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Ayudantes	4	Cauteneo	3
Oficiales	1	Auxiliar de Ingeniería	1
Controllador de Trafico.	4	Inspector de obra	1
Residente de Obra	1		
Residente ambiental	1		
Residente SST	1		
Residente Social	1		
Topografo	1		

OBSERVACIONES

Se ejecutan actividades de mejoramiento de la subrasante utilizando material de sitio mediante conformación, humectación, y compactación mecanico. se hicieron labores de desmonte y limpieza en sectores con presencia de vegetación y material organico.

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
M. Sarto.	CONSORCIO INTERNORTE PC
María Martha Sarmiento Plaza	ING. MALORY GUTIERREZ
T.P 25202-336887 CND	TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 25

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001


TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

FECHA: 10 - Marz - 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	localización, trazado y replanteo.				
2	Desmonte y limpieza.				
3	Mejoramiento de subrasante con material de sitio.				
4	excavación para conformación de calzada y taludes.				
5	Transporte de materiales provenientes de excavaciones				
6	Terraplen.				
7	Retiro de vecindad.				
8	Riego de humectación.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS



NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Paprita	☑	☐	9h
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Motoniveladora	☑	☐	9h
Vibrocompactador	☑	☐	9h
Cisterna	☑	☐	6h
Volquetas	☑	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Oficial	1
Residente social	1	Controladores de tráfico	4
Residente SST	1	Inspector de obra	1
Residente ambiental	1		
Auxiliar de ingeniería	1		
Topógrafo	1		
Cadenero	3		
Ayudante	1		

OBSERVACIONES

Continuan las actividades de excavación sin clasificar para conformar el tramo programado, ampliación de bancas y adecuación de taludes. El material excavado es transportado hacia las zonas de disposición y sectores destinados para conformación de terraplen.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 26

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

FECHA: 11 - Mar - 2026

ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización, trazado y replanteo.				
2	Tizgramento de subrasante con material de sitio.				
3	Transporte de material proveniente de excavaciones.				
4	Terraplen.				
5	Riego de humectación para control material particulado.				
6	Actas de Vecindad.				
7	Excavación para ampliación y conformación de Calzada.				
8.	Reubicación de señalización preventiva de obra.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Patrulla	☑	☐	9h
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Motoniveladora	☑	☐	9h
Compactador	☑	☐	6h
Carrotanque agua	☑	☐	9h
Volqueta	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Oficial	1
Residente social	1	Ayudante	4
Residente SST	1	Contratada de tráfico	
Residente Ambiental	1		
Auxiliar de ingeniería	1		
Inspector de obra	1		
Topógrafo.	1		
Cadenero.	3		

OBSERVACIONES

Se adelantan actividades de conformación y compactación de terraplen en los sectores previamente excavados.
La comisión de topografía realiza control permanente de ejes, niveles y pendientes a lo largo de los tramos.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 27

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR
CONTRATO N°:	2026040001
FECHA:	12 - Mayo - 2026
ESTADO DEL TIEMPO:	☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO
DURACIÓN LLUVIAS:	0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización, trazado y replanteo.				
2	Terraplen.				
3	Mejoramiento de subrasante con material de sitio.				
4	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
5	Riego de humectación para control de material particulado				
6	Excavación para conformación de calzada.				
7	Actas de Vecindad.				
8.	Reubicación de dispositivo de control de tráfico y señalización preventivo de obra.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA HORA EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:40
INICIO DE JORNADA (AM)	9:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Motoniveladora	☑	☐	9h
Motocompactador.	☑	☐	4h
Camioneta de agua	☑	☐	6h
Volqueta	☑	☐	6h
	☐	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Oficial	1
Residente SST	1	Ayudante	4
Residente social	1	Controlador de tráfico.	4
Residente ambiental	1		
Auxiliar de ingeniería	1		
Inspector de obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	3		

OBSERVACIONES

Se da continuidad a las labores de transporte de materiales provenientes de la excavación y adecuación.
Se realizan humectaciones periodicas para el control de particulas

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 28

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 13- Mar-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Desmonte y limpieza.				
2	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
3	Acta de Vecindad				
4	Humectación.				
5.	Terraplén.				
6.	Excavación para ampliación y conformación de Calzada.				
7.	Transporte de material proveniente de excavaciones.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Motoniveladora	☑	☐	9h
Vibrocompactador	☑	☐	6h
Camión cisterna	☑	☐	6h
Volqueta	☑	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Ayudante	4
Residente SST	1	Cadenero	3
Residente Social	1	Controlador de Tráfico.	4
Residente Ambiental	1		
Topografo	1		
Capataz	1		
Auxiliar de Ingeniería	1		
Inspector de obra	1		

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada diligenciando los preoperacionales
Se realiza escarificación de material de sitio
Se hace humectación periodica sobre los frentes activos.
La emisión topografica queda permanentemente supervisando los cortes, ejes, niveles
Se continua con la implementación del PAGA y el PMT.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 29

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

FECHA: 14-May-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Desmonte y limpieza.				
2	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
3	Terraplen.				
4	Excavación para ampliación y conformación de calzada.				
5	Transporte de materiales provenientes de la excavación.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

COLOCAR EN CADA HORA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN PUNTO DE HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Motoniveladora	☑	☐	9h
Vibrocompactador.	☑	☐	9h
Camioneta agua	☑	☐	6h
Volqueta.	☑	☐	6h
	☑	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de Obra	1	Actual	1
Residente SST	1	Ayudante	4
Inspector de Obra	1	Operador de Tanco.	4
Residente Social	1		
Auxiliar de Ingeniería	1		
Gestor Ambiental	1		
Topógrafo	1		
Cadeneros	3		

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada realizando los preoperacionales, se realiza charla de seguridad. Se hace inspección técnica general sobre los frentes y otros del corredor vial. Se verifican condiciones geométricas, estabilidad de taludes y estado de las actividades ejecutadas. Se realizaron labores de organización y limpieza de las áreas aperadas.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

~~ING. MALORY GUTIERREZ~~

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	CONSECUTIVO: 30
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO Nº: 2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR	
FECHA: 16- Mar-2026	ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO	DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Desmonte y limpieza				
2	Terraplen				
3	Transporte de Materiales				
4	Humectación de Cunetas				
5	Mejoramiento de subrasante con material de sitio.				
6.	Excavación para ampliación y conformación de Calzada				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR CADA FILA EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA.	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Pajarita	☑	☐	9h
Retroexcavadora	☑	☐	9h
Vibrocompactada	☑	☐	9h
Motoniveladora	☐	☐	6h
Cumbiadora agua	☐	☐	6h
Volqueta	☑	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1
Residente SST	1
Residente Social	1
Residente Ambiental	1
Inspector de obra	1
Auxiliar de Ingeniería	1
Topógrafo	1
Celadores	3

CARGO	CANT
Oficial	1
Ayudante	4
Controlador de Tráfico	4.

OBSERVACIONES

Se inicia el día con diligenciamiento de los preoperacionales y se dictan charlas de seguridad SST.
Se ejecutan actividades de mejoramiento de la subrasante mediante conformación, humectación y compactación mecánica del suelo.
Se adelantan labores de desmonte y limpieza en sectores con presencia de cobertura vegetal.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
