PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 41 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	41	**DEL**	13/07/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	19/07/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	289 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INTERVENTORIA**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	**RL de interventoria**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	**OBJETO**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00	**VALOR INICIAL**	$ 796,278,922.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18	**VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025**	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82	**VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026**	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 1,154,847,325.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00		
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00		
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,470,367,526.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**PLAZO INICIAL**	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	**PLAZO ADICIONAL No. 01**	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	**PLAZO TOTAL**	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	**FECHA DE INICIACION**	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA**	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.92%	83.92%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	4.19%	83.70%
Valor de la Obra Programada:	$ 57,289,606.00	$ 2,912,158,909.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 125,319,143.00	$ 2,904,662,916.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	82.00%	79.51%	0.39%
Durante el periodo	1.92%	4.19%	
Acumulado actual	83.92%	83.70%	

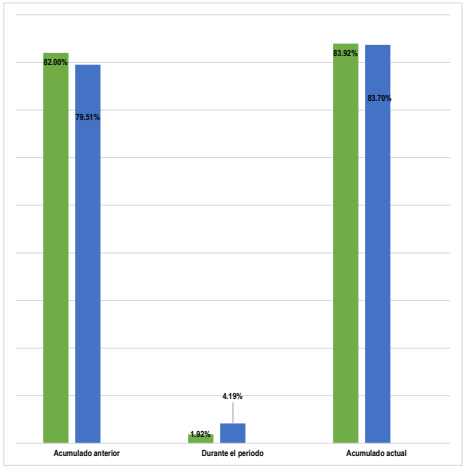

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	11.62%	18.41%	6.79%	42.99%	36.30%	-6.69%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	3.58%	12.56%	8.98%	49.52%	45.38%	-4.14%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	3.95%	10.92%	6.97%	44.62%	59.33%	14.71%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		**6.38%**	**13.96%**	**7.58%**	**45.71%**	**47.00%**	**1.29%**
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		**1.92%**	**4.19%**	**2.27%**	**83.71%**	**84.10%**	**0.39%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	90.00%	-10.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	80.00%	-20.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		**99.44%**	**97.78%**	**-1.67%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,470,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,311,910,106.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,158,457,420.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 2,311,910,106.00	$ 2,311,910,106.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	83.92%	83.70%	0.39%

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	289	1.12

CURVA S

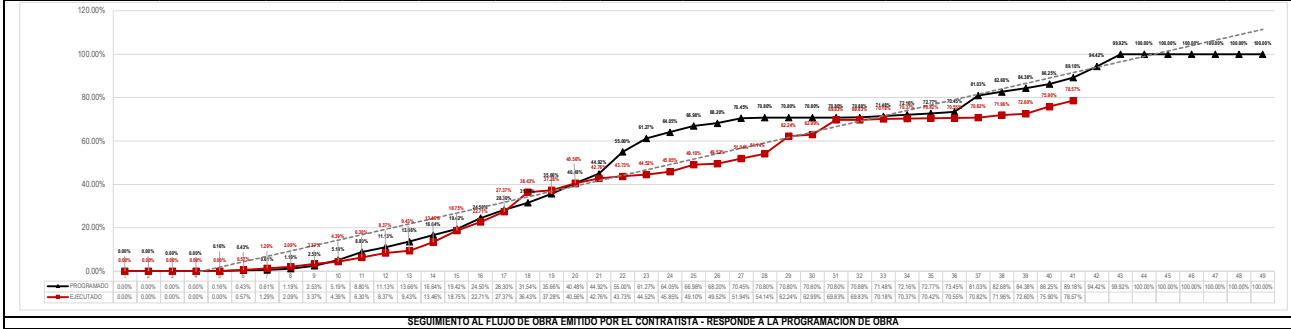

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.16%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.16%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.27%	0.57%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.43%	$ 12,881,406.80	0.57%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.18%	0.73%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.61%	$ 18,169,426.80	1.29%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.58%	0.80%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.19%	$ 35,614,410.07	2.09%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.35%	1.28%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.53%	$ 75,957,856.60	3.37%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.65%	1.01%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.19%	$ 155,402,539.39	4.39%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.61%	1.92%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	8.80%	$ 263,611,736.54	6.30%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.33%	2.07%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	11.13%	$ 333,512,626.34	8.37%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.53%	1.06%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	13.66%	$ 409,469,154.58	9.43%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	2.98%	4.02%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	16.64%	$ 498,681,438.07	13.46%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	2.78%	5.30%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	19.42%	$ 581,905,208.81	18.75%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.08%	3.96%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	24.50%	$ 734,136,918.78	22.71%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	3.81%	4.66%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	28.30%	$ 848,188,520.46	27.37%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.24%	9.06%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	31.54%	$ 945,337,651.75	36.43%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.12%	0.84%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	35.66%	$ 1,068,674,526.58	37.28%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	4.82%	3.28%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	40.48%	$ 1,213,029,177.67	40.56%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.44%	2.20%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	44.92%	$ 1,346,073,308.54	42.76%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.08%	0.97%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	55.00%	$ 1,648,265,376.87	43.73%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.28%	0.79%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	61.27%	$ 1,836,343,283.45	44.52%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	2.78%	1.33%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	64.05%	$ 1,919,621,544.03	45.85%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	2.92%	3.25%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	66.98%	$ 2,007,227,053.26	49.10%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.22%	0.42%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	68.20%	$ 2,043,898,782.28	49.52%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.25%	2.42%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	70.45%	$ 2,111,364,543.83	51.94%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.35%	2.19%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	70.80%	$ 2,121,869,331.70	54.14%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.10%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.24%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.75%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	62.99%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	6.83%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	70.80%	$ 2,121,869,331.70	69.83%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,479,336.01	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,479,336.01	70.88%	$ 2,124,348,667.71	69.83%	$ 2,092,620,415.37
33	SEM 33	14/05/2026	$ 17,777,865.17	0.59%	0.35%	$ 10,486,451.43	$ 7,291,413.74	71.48%	$ 2,142,126,532.88	70.18%	$ 2,103,106,866.80
34	SEM 34	21/05/2026	$ 20,542,992.43	0.69%	0.20%	$ 5,874,529.72	$ 14,668,462.71	72.16%	$ 2,162,669,525.31	70.37%	$ 2,108,981,396.52
35	SEM 35	28/05/2026	$ 18,192,025.83	0.61%	0.05%	$ 1,598,978.52	$ 16,593,047.31	72.77%	$ 2,180,861,551.14	70.42%	$ 2,110,580,375.04
36	SEM 36	4/06/2026	$ 20,455,365.19	0.68%	0.13%	$ 3,781,437.59	$ 16,673,927.60	73.45%	$ 2,201,316,916.33	70.55%	$ 2,114,361,812.63
37	SEM 37	11/06/2026	$ 226,961,395.62	7.57%	0.26%	$ 7,931,674.25	$ 219,029,721.37	81.03%	$ 2,428,278,311.95	70.82%	$ 2,122,293,486.88
38	SEM 38	18/06/2026	$ 49,733,662.64	1.66%	1.14%	$ 34,157,077.65	$ 15,576,584.99	82.68%	$ 2,478,011,974.59	71.96%	$ 2,156,450,564.53
39	SEM 39	25/06/2026	$ 50,887,047.28	1.70%	0.64%	$ 19,295,707.59	$ 31,591,339.69	84.38%	$ 2,528,899,021.87	72.60%	$ 2,175,746,272.12
40	SEM 40	2/07/2026	$ 56,077,346.72	1.87%	3.30%	$ 98,989,618.19	-$ 42,912,271.47	86.25%	$ 2,584,976,368.59	75.90%	$ 2,274,735,890.31
41	SEM 41	9/07/2026	$ 87,796,250.64	2.93%	2.67%	$ 79,872,634.44	$ 7,923,616.20	89.18%	$ 2,672,772,619.23	78.57%	$ 2,354,608,524.75
42	SEM 42	16/07/2026	$ 156,907,292.19	5.24%	0.00%	$ -	$ 156,907,292.19	94.42%	$ 2,829,679,911.42		
43	SEM 43	23/07/2026	$ 164,898,315.62	5.50%	0.00%	$ -	$ 164,898,315.62	99.92%	$ 2,994,578,227.04		
44	SEM 44	30/07/2026	$ 2,355,433.63	0.08%	0.00%	$ -	$ 2,355,433.63	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,996,933,660.67		
			$ 2,996,933,660.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza rampa en area de parqueadero y se inicia con la instalacion de manto

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al desmonte del sistema de pararrayos para la instalación del manto de cubierta. Durante el recorrido de seguimiento, la Interventoría verificó la implementación de la línea de vida como medida de protección para la ejecución de los trabajos en alturas.
No obstante, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPCC, verificando que el personal permanezca debidamente conectado a la línea de vida mediante eslingas y puntos de anclaje certificados durante toda la actividad. Asimismo, se reiteró la importancia de realizar la inspección preoperacional de los equipos para trabajo en alturas, garantizar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado al igual que residuos (volumen bajo), por lo que se recomendó al contratista disponer los residuos y retirar el material al finalizar, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: De acuerdo al comité realizado el dia 17 de julio se definio que no se realizara instalacion de la baranda, por lo que este item debe ser retirado. Se aclara que la losa de primer nivel se destinara para parquear bicicletas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado el contratista efectuo actividades de instalacion de perfileria en 4 y 3 piso, aplicación de pintura en perfiles soporte de la cubierta e instalacion de cubierta en 4 piso

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación y soldadura de estructura metálica en el tercer piso de la edificación. Durante el recorrido de seguimiento, la Interventoría verificó el uso de andamios y escaleras como medios de acceso a la cubierta, constatando que estos se encontraban dispuestos para el desarrollo de las labores.
No obstante, se recomendó al Contratista garantizar que todo el personal que ejecute trabajos en alturas permanezca debidamente anclado mediante el uso de los EPCC, asegurando el empleo correcto de líneas de vida y eslingas. Asimismo, se reiteró la importancia de realizar la inspección preoperacional de andamios, escaleras y equipos de protección, verificar el diligenciamiento y socialización del ATS, garantizar el uso permanente de los EPP y mantener la adecuada señalización y delimitación del área de trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) **Actividad iniciada**
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
•PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
•MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) **Actividad iniciada**
•EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual se evidencia desorden por lo que se debe garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 el ingeniero apoyo a la supervision solicita plan de contingencia, el cual debe ser entregado el dia 18 de julio, este debe incluir items, fechas y plan de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectua labor de instalacion de flanche en zona contigua del tanque

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de flanche en la zona del tanque. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría no se reportaron incidentes ni accidentes asociados a la ejecución de estas labores, evidenciándose el desarrollo de las actividades en condiciones controladas. Sin embargo, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP especialmente durante las actividades de corte con pulidora, asegurando el uso de protección visual, protección facial, guantes de seguridad, protección auditiva y demás elementos requeridos de acuerdo con los riesgos de la labor.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) **falta aplicación de esmalte de acabado final**.
•PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
•PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente pero en parte material de construcción sin acopiar ni señalizar, al igual se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 se informa al contatista que se debe bajar el flotador 40cm del nivel existente. Se aclara que el 2 de agosto se debe entregar la sede.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

(Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero De Nivelacion Tipo Sikafloor y flanches y Reparacion de filtracion)

1. Actividades Tecnicas: Se realizan pruebas en baño segundo piso con el fin de verificar si se presenta filtracion en la ludoteca. No se evidencia ninguna filtracion.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó la prueba de apertura de llaves en las baterías sanitarias con el fin de verificar la posible existencia de filtraciones hacia el área de la ludoteca. Durante el seguimiento, la Interventoría recomendó al Contratista garantizar que el personal encargado de la actividad utilice de manera adecuada y permanente los EPP requeridos, de acuerdo con los riesgos asociados a la labor.
Asimismo, se recomendó mantener condiciones adecuadas de orden y aseo, diligenciar oportunamente el ATS correspondiente y verificar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados sin señalizar, al igual que residuos, por lo que se recomienda disponer y retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La interventoria y la supervision solicitan instalar nuevamente el andamio en obra con el fin de verificar las labores efectuadas en cubierta. De igual manera finalizar labores de pintura del cerramiento y verificar las labores realizadas en cancha. El contratista debe corregir una filtracion de agua, el cual afecta el primer nivel en la zona de la ludoteca.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la ejecución de la canal y el desagüe, actividades que deberán ejecutarse a la mayor brevedad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción, por lo que se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la instalación de bomba; no obstante, aún se están llevando a cabo pruebas de funcionamiento para comprobar su correcta operación y garantizar su adecuado desempeño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades correspondientes al componente de SST debido a que este frente se encuentra en etapa de cierre y próxima a la entrega definitiva.
Durante el desarrollo del proyecto no se registraron accidentes ni incidentes de trabajo, lo que evidencia el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el seguimiento realizado a las condiciones de seguridad por parte del Contratista y la Interventoría. No obstante, se recomienda al Contratista mantener las condiciones de orden y aseo, garantizar la adecuada señalización de las áreas intervenidas y atender oportunamente las observaciones pendientes, con el fin de asegurar que la entrega de la obra se realice en condiciones seguras para la comunidad educativa.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiados, al igual que residuos (volumen bajo) por lo que se recomienda disponer y retirar el material al finalizar, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se debe de instalar una bomba de eyeccion. Desde la SED se solicita incluir dentro de las recomendaciones para la institución la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El frente tiene las siguientes actividades pendientes: instalación de un riel o elemento de fijación en la puerta de acceso al auditorio para evitar su desplazamiento, instalación del vidrio faltante en la misma puerta y ejecución de un sondeo en la poceta ubicada en la parte posterior, debido a que presenta rebose. Lo anterior debe corregirse para el proximo 23 de julio

Nota: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes.

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 41** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Retiro de andamio.



Cerramiento parcial para verificación de humedad en ludoteca



Grietas en muro del baño de segundo piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B

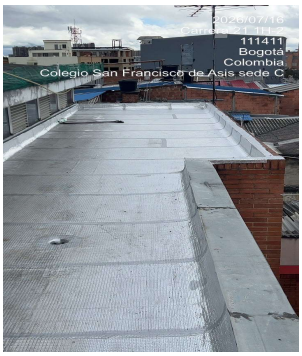

Instalación de manto impermeabilizante.



Instalación de manto impermeabilizante.

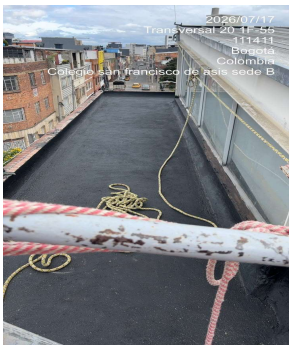

Aplicación de emulsión para adherencia del manto impermeabilizante.



Conformación de rampa en placa

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A




Remates pendientes en filos de perfilería.



Instalación de perfilería en tercer piso.




Instalación de perfilería en tercer piso.

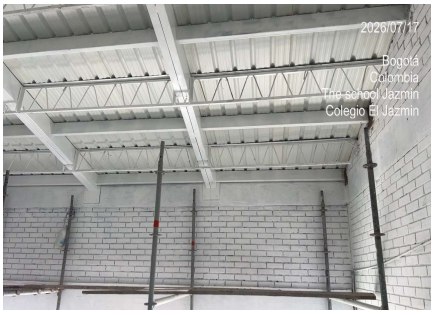

Pintura de cerchas y perfiles en área de cuarto piso.



Instalación de tubería EMT en cuarto piso y parte del tercer piso.

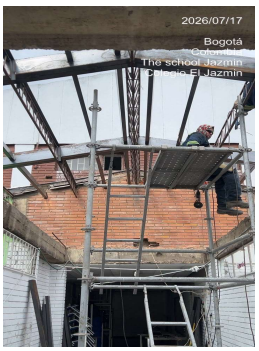

Continúa soldadura de perfilería en tercer piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 274 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

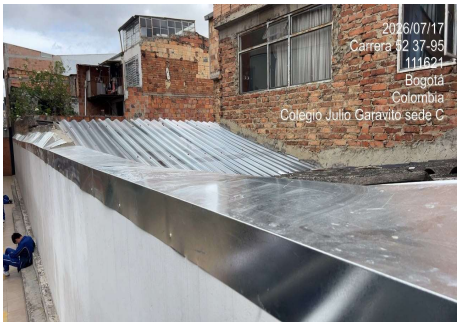

Instalación de flanche



Aplicación de pintura gris en pérgola.

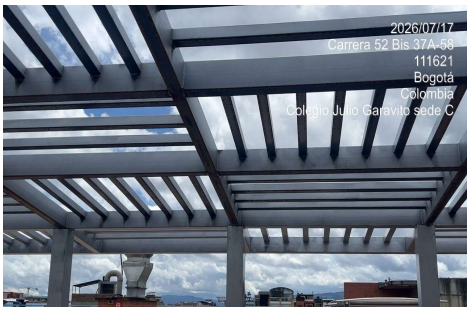

Pendiente: terminaciones de pintura en pérgola e instalación de policarbonato.
