# INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

**CONTRATO DE OBRA** — **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No. 45** — **LOTE COP No.17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N°** | 45 | **DEL** | 10/08/2026 (DD-MM-AA) | **AL** | 16/08/2026 (DD-MM-AA) | **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato** | 317 dias |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°** | CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato) | | | **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°** | CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato) | **LOTE COP** | 17 |

## CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO CAPITAL LM |
| **RL del consorcio** | LUIS MILTON ORTIZ VERGEL |
| **CONTRATO N°** | CO1.PCCNTR.8155343 |
| **OBJETO** | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18" |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 2,220,672,788.00 |
| **AIU** | 35.95% $ 798,331,867.29 |
| **COSTO DIRECTO** | $ 1,422,340,920.71 |
| **OFERTADO** | $ 2,010,399,000.00 |
| **EMERGENCIAS** | $ 100,000,000.00 |
| **VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS** | $ 2,110,399,000.00 |
| **DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS** | $ 110,273,788.00 |
| **Valor Parcial (Inicial + Emergencias)** | $ 210,273,788.00 |
| **Valor adicional No. 1:** | $ 791,000,000.00 |
| **Valor inicial No. 1 emergencias:** | $ 200,000,000.00 |
| **Valor adicional No.1 Obras Contractuales:** | $ 591,000,000.00 |
| **Valor adicional No. 2:** | $ 266,646,703.00 |
| **Valor inicial No. 2 emergencias:** | $ - |
| **Valor adicional No.2 Obras Contractuales:** | $ 266,646,703.00 |
| **Valor adicional No. 3:** | $ |
| **Valor inicial No. 3 emergencias:** | $ 125,000,000.00 |
| **Valor adicional No.3 Obras Contractuales:** | $ - |
| **VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA** | $ 3,403,319,491.00 |
| **VALOR TOTAL EMERGENCIAS** | $ 535,273,788.00 |
| **VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES** | $ 2,868,045,703.00 |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (07) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL No. 01** | TRES (03) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL No. 02** | TRES (03) MESES |
| **PLAZO TOTAL** | TRECE (13) MESES |
| **FECHA DE INICIACION** | 3/10/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 2/05/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2** | 2/09/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3** | 2/11/2026 |

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORIA** | PROBINTEC S.A.S |
| **RL de interventoria** | DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ |
| **CONTRATO N°** | CO1.PCCNTR.8168931 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6 |
| **VALOR INICIAL** | $ 796,278,922.00 |
| **VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025** | $ 139,026,666.00 |
| **VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026** | $ 219,541,737.00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 358,568,403.00 |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (07) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL No. 01** | TRES (03) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL No. 01** | TRES (03) MESES |
| **PLAZO TOTAL** | TRECE (13) MESES |
| **FECHA DE INICIACION** | 3/10/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 2/05/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2** | 2/09/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3** | 2/11/2026 |


## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obra Programada (%)** | 0.00% | 100.00% | **Obra Física Ejecutada (%)** | 0.00% | 100.00% |
| **Valor de la Obra Programada:** | $ - | $ 3,403,319,491.00 | **Valor de la Obra Ejecutada:** | $ - | $ 3,403,319,491.00 |

## GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

**SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA**

| | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **Acumulado anterior** | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| **Durante el periodo** | 0.00% | 0.00% | |
| **Acumulado actual** | 100.00% | 100.00% | |

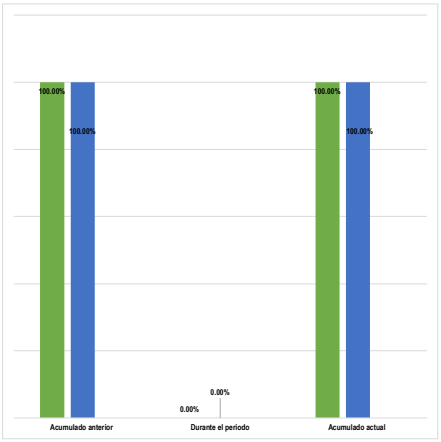


| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRENTES CONTRACTUALES** | | | | | | | | |
| 1074 | ENGATIVA | JUSTO VICTOR CHARRY (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1076 | ENGATIVA | RODOLFO LLINAS (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1029 | ENGATIVA | REPUBLICA DE CHINA (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1048 | ENGATIVA | JOSE ASUNCION SILVA (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1303 | TEUSAQUILLO | MANUELA BELTRAN SEDE B (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1407 | LOS MARTIRES | COLEGIO PANAMERICANO (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1035 | ENGATIVA | MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| ADM | TEUSAQUILLO | OTIC - DATE CENTER | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES** | | | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** |
| **FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02** | | | | | | | | |
| | TEUSAQUILLO | MANUELA BELTRAN SEDE A (IED) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02** | | | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02** | | | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** |

**EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS**

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | ENGATIVA | COLEGIO LAS MERCEDES (IED) - (SILVICULTURAL) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 9,256,247.00 | | |
| 1036 | ENGATIVA | MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 991,679.00 | | |
| 1041 | ENGATIVA | LA PALESTINA - SEDE B (IED) - (SILVICULTURAL) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 991,679.00 | | |
| | ENGATIVA | TABORA - SEDE B (IED) - (SILVICULTURAL) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1037 | ENGATIVA | SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 5,090,511.00 | | |
| 1413 | LOS MARTIRES | SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 33,290,790.00 | | |
| | ENGATIVA | REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 68,942,670.00 | | |
| 1029 | ENGATIVA | REPUBLICA DE CHINA (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 64,750,619.00 | | |
| 1030 | ENGATIVA | MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 34,891,082.00 | | |
| | ENGATIVA | BODEGA ROSA ZARATE | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 5,000,000.00 | | |
| 1044 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ 6,720,000.00 | | |
| 1009 | ENGATIVA | NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 7,142,689.00 | | |
| 1413 | LOS MARTIRES | SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ 10,000,000.00 | | |
| 1057 | ENGATIVA | LA PALESTINA - SEDE B (IED) | 80.00% | 80.00% | 0.00% | $ 43,892,036.00 | | |
| 1045 | ENGATIVA | MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A | 80.00% | 80.00% | 0.00% | $ 13,081,765.00 | | |
| 1074 | ENGATIVA | JUSTO VICTOR CHARRY (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 24,826,095.00 | | |
| | ENGATIVA | JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED) | 88.00% | 88.00% | 0.00% | $ 14,017,130.00 | | |
| | TEUSAQUILLO | MANUELA BELTRAN SEDE B (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 40,860,805.00 | | |
| | TEUSAQUILLO | MANUELA BELTRAN SEDE A (IED) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 2,710,237.02 | | |
| **TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS** | | | **81.47%** | **81.47%** | **0.00%** | **$ 386,456,034.02** | **$ 535,273,788.00** | **$ 148,817,753.98** |

## AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA** | **$ 3,403,319,491.00** |
| **VALOR PARCIAL N°1** | $ 250,462,138.00 |
| **VALOR PARCIAL N°2** | $ 117,739,152.00 |
| **VALOR PARCIAL N°3** | $ 189,500,435.00 |
| **VALOR PARCIAL N°4** | $ 575,032,890.00 |
| **VALOR PARCIAL N°5** | $ 250,546,137.00 |
| **VALOR PARCIAL N°6** | $ 1,183,611,476.00 |
| **VALOR PARCIAL N°7** | $ 251,107,445.00 |
| **TOTAL VALOR FACTURADO** | $ 2,817,999,673.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 585,319,818.00** |

| | VALOR FACTURADO | % DE AVANCE FINANCIERO |
|---|---|---|
| **INDICADOR FINACIERO** | $ 2,817,999,673.00 | 82.80% |
| | **VALOR PENDIENTE POR FACTURAR** | |
| | $ 585,319,818.00 | |


**NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO**

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

| | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO | % RETRASO - / % ADELANTO + |
|---|---|---|---|
| **INDICADOR TECNICO** | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

| | DIAS TOTAL DEL CONTRATO | RETRASO |
|---|---|---|
| **INDICADOR TIEMPO (DIAS)** | 395 | 0.00 |

## CURVA S

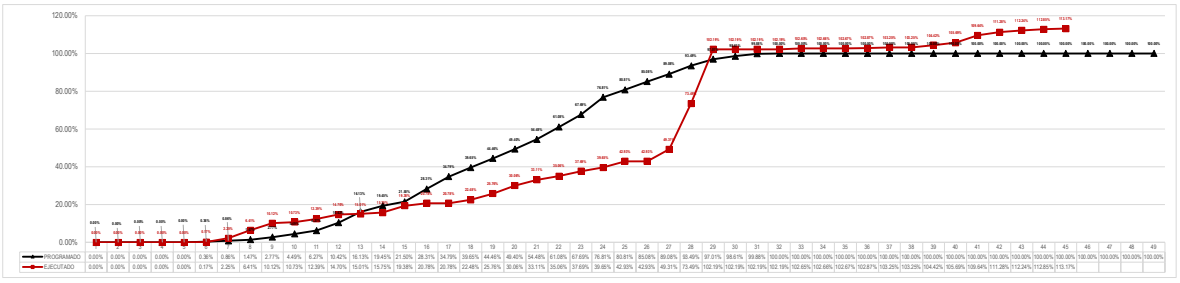


**SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA**

## SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

| INFORME | PROGRAMACION | | | | REAL | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEMANA | FECHA | PROGRAMADO | %PROGRAMADO | AVANCE | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
| 1 | SEM 1 | 12/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 2 | SEM 2 | 19/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 3 | SEM 3 | 26/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 4 | SEM 4 | 2/11/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 5 | SEM 5 | 9/11/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 6 | SEM 6 | 16/11/2025 | $ 7,797,219.11 | 0.36% | 0.17% | $ 3,560,372.37 | $ 4,236,846.74 | 0.36% | $ 7,797,219.11 | 0.17% | $ 3,560,372.37 |
| 7 | SEM 7 | 23/11/2025 | $ 10,669,135.31 | 0.50% | 2.08% | $ 44,679,091.52 | -$ 34,009,956.21 | 0.86% | $ 18,466,354.42 | 2.25% | $ 48,239,463.89 |
| 8 | SEM 8 | 30/11/2025 | $ 12,978,424.89 | 0.60% | 4.16% | $ 89,357,896.32 | -$ 76,379,471.43 | 1.47% | $ 31,444,779.31 | 6.41% | $ 137,597,360.22 |
| 9 | SEM 9 | 7/12/2025 | $ 28,006,979.91 | 1.31% | 3.71% | $ 79,571,334.00 | -$ 51,564,354.09 | 2.77% | $ 59,451,759.22 | 10.12% | $ 217,168,694.22 |
| 10 | SEM 10 | 14/12/2025 | $ 36,812,247.87 | 1.72% | 0.61% | $ 13,022,073.72 | $ 23,790,174.15 | 4.49% | $ 96,264,007.09 | 10.73% | $ 230,190,767.94 |
| 11 | SEM 11 | 21/12/2025 | $ 38,379,452.27 | 1.79% | 1.66% | $ 35,616,011.04 | $ 2,763,441.23 | 6.27% | $ 134,643,459.36 | 12.39% | $ 265,806,778.97 |
| 12 | SEM 12 | 28/12/2025 | $ 88,841,280.63 | 4.14% | 2.31% | $ 49,570,309.20 | $ 39,270,971.43 | 10.42% | $ 223,484,739.99 | 14.70% | $ 315,377,088.18 |
| 13 | SEM 13 | 4/01/2026 | $ 122,594,810.52 | 5.71% | 0.32% | $ 6,783,965.17 | $ 115,810,845.35 | 16.13% | $ 346,079,550.51 | 15.01% | $ 322,161,053.34 |
| 14 | SEM 14 | 11/01/2026 | $ 71,168,804.87 | 3.32% | 0.74% | $ 15,807,113.93 | $ 55,361,690.94 | 19.45% | $ 417,248,355.38 | 15.75% | $ 337,968,167.27 |
| 15 | SEM 15 | 18/01/2026 | $ 44,042,064.93 | 2.05% | 3.63% | $ 77,877,373.89 | -$ 33,835,308.96 | 21.50% | $ 461,290,420.31 | 19.38% | $ 415,845,541.16 |
| 16 | SEM 16 | 25/01/2026 | $ 146,069,718.11 | 6.81% | 1.40% | $ 30,089,741.18 | $ 115,979,976.93 | 28.31% | $ 607,360,138.42 | 20.78% | $ 445,935,282.34 |
| 17 | SEM 17 | 1/02/2026 | $ 139,176,465.48 | 6.49% | 0.00% | $ - | $ 139,176,465.48 | 34.79% | $ 746,536,603.90 | 20.78% | $ 445,935,282.34 |
| 18 | SEM 18 | 8/02/2026 | $ 104,287,650.61 | 4.86% | 1.70% | $ 36,490,712.95 | $ 67,796,937.66 | 39.65% | $ 850,824,254.51 | 22.48% | $ 482,425,995.29 |
| 19 | SEM 19 | 15/02/2026 | $ 103,217,358.77 | 4.81% | 3.28% | $ 70,411,280.31 | $ 32,806,078.46 | 44.46% | $ 954,041,613.28 | 25.76% | $ 552,837,275.61 |
| 20 | SEM 20 | 22/02/2026 | $ 106,018,979.79 | 4.94% | 4.30% | $ 92,230,745.51 | $ 13,788,234.28 | 49.40% | $ 1,060,060,593.07 | 30.06% | $ 645,068,021.12 |
| 21 | SEM 21 | 1/03/2026 | $ 108,890,772.44 | 5.07% | 3.04% | $ 65,324,533.83 | $ 43,566,238.61 | 54.48% | $ 1,168,951,365.51 | 33.11% | $ 710,392,554.94 |
| 22 | SEM 22 | 8/03/2026 | $ 141,591,914.58 | 6.60% | 1.96% | $ 41,952,272.34 | $ 99,639,642.24 | 61.08% | $ 1,310,543,280.09 | 35.06% | $ 752,344,827.28 |
| 23 | SEM 23 | 15/03/2026 | $ 141,821,023 | 6.61% | 2.63% | $ 56,436,113.65 | $ 85,384,908.93 | 67.69% | $ 1,452,364,302.67 | 37.69% | $ 808,780,940.94 |
| 24 | SEM 24 | 22/03/2026 | $ 195,783,357.18 | 9.12% | 1.96% | $ 42,032,589.39 | $ 153,750,767.79 | 76.81% | $ 1,648,147,659.85 | 39.65% | $ 850,813,530.33 |
| 25 | SEM 25 | 29/03/2026 | $ 85,857,460.32 | 4.00% | 3.28% | $ 70,464,825.01 | $ 15,392,635.31 | 80.81% | $ 1,734,005,120.17 | 42.93% | $ 921,278,355.34 |
| 26 | SEM 26 | 5/04/2026 | $ 91,520,588.00 | 4.27% | 0.00% | $ - | $ 91,520,588.00 | 85.08% | $ 1,825,525,708.17 | 42.93% | $ 921,278,355.34 |
| 27 | SEM 27 | 12/04/2026 | $ 85,894,033.40 | 4.00% | 6.37% | $ 136,751,605.45 | -$ 50,857,572.05 | 89.08% | $ 1,911,419,741.57 | 49.31% | $ 1,058,029,960.79 |
| 28 | SEM 28 | 19/04/2026 | $ 94,703,170.29 | 4.41% | 24.18% | $ 518,879,264.72 | -$ 424,176,094.43 | 93.49% | $ 2,006,122,911.86 | 73.49% | $ 1,576,909,225.51 |
| 29 | SEM 29 | 26/04/2026 | $ 75,414,814.61 | 3.51% | 28.70% | $ 615,876,991.66 | -$ 540,462,177.05 | 97.01% | $ 2,081,537,726.47 | 102.19% | $ 2,192,786,217.17 |
| 30 | SEM 30 | 3/05/2026 | $ 34,437,205.81 | 1.60% | 0.00% | $ - | $ 34,437,205.81 | 98.61% | $ 2,115,974,932.28 | 102.19% | $ 2,192,786,217.17 |
| 31 | SEM 31 | 10/05/2026 | $ 27,177,033.39 | 1.27% | 0.00% | $ - | $ 27,177,033.39 | 99.88% | $ 2,143,151,965.67 | 102.19% | $ 2,192,786,217.17 |
| 32 | SEM 32 | 17/05/2026 | $ 2,608,584.00 | 0.12% | 0.00% | $ - | $ 2,608,584.00 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 102.19% | $ 2,192,786,217.17 |
| 33 | SEM 33 | 24/05/2026 | | 0.00% | 0.45% | $ 9,741,992.00 | -$ 9,741,992.00 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 102.65% | $ 2,202,528,209.17 |
| 34 | SEM 34 | 31/05/2026 | | 0.00% | 0.02% | $ 321,872.32 | -$ 321,872.32 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 102.66% | $ 2,202,850,081.49 |
| 35 | SEM 35 | 7/06/2026 | | 0.00% | 0.01% | $ 170,566.46 | -$ 170,566.46 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 102.67% | $ 2,203,020,647.95 |
| 36 | SEM 36 | 14/06/2026 | | 0.00% | 0.20% | $ 4,365,724.96 | -$ 4,365,724.96 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 102.87% | $ 2,207,386,372.91 |
| 37 | SEM 37 | 21/06/2026 | | 0.00% | 0.38% | $ 8,059,922.60 | -$ 8,059,922.60 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 103.25% | $ 2,215,446,295.51 |
| 38 | SEM 38 | 28/06/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 103.25% | $ 2,215,446,295.51 |
| 39 | SEM 39 | 5/07/2026 | | 0.00% | 1.17% | $ 25,190,766.00 | -$ 25,190,766.00 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 104.42% | $ 2,240,637,061.51 |
| 40 | SEM 40 | 12/07/2026 | | 0.00% | 1.27% | $ 27,191,796.29 | -$ 27,191,796.29 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 105.69% | $ 2,267,828,857.80 |
| 41 | SEM 41 | 19/07/2026 | | 0.00% | 3.95% | $ 84,769,332.78 | -$ 84,769,332.78 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 109.64% | $ 2,352,598,190.58 |
| 42 | SEM 42 | 26/07/2026 | | 0.00% | 1.64% | $ 35,107,747.34 | -$ 35,107,747.34 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 111.28% | $ 2,387,705,937.92 |
| 43 | SEM 43 | 2/08/2026 | | 0.00% | 0.97% | $ 20,733,636.67 | -$ 20,733,636.67 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 112.24% | $ 2,408,439,574.59 |
| 44 | SEM 44 | 9/08/2026 | | 0.00% | 0.61% | $ 13,076,063.54 | -$ 13,076,063.54 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 112.85% | $ 2,421,515,638.13 |
| 45 | SEM 45 | 16/08/2026 | | 0.00% | 0.32% | $ 6,880,375.01 | -$ 6,880,375.01 | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | 113.17% | $ 2,428,396,013.14 |
| 46 | SEM 46 | 23/08/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | | |
| 47 | SEM 47 | 30/08/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | | |
| 48 | SEM 48 | 6/09/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | | |
| 49 | SEM 49 | 13/09/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,145,760,549.67 | | |
| | | | $ 2,145,760,549.67 | | | | | | | | |

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A.

**6. Generales:** Se realiza entrega de espacios a la institucion.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y suministro de push.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Se encuentra finalizada

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** En sitio se efectuó un ajuste de filtracion en lavamanos; no obstante, esta intervención no hace parte del alcance

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Queda pendiente la atención en garantía de las mesas de informática que presentan afectaciones.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ

**1. Actividades Tecnicas:** No se han efectuado las reparaciones establecidas en recorrido de obra. Se acuerda realizar un análisis previo de la actividad a ejecutar, con el fin de definir el procedimiento más adecuado y garantizar la uniformidad del acabado.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se evidencia desprendimiento de la pintura del piso. De acuerdo con el recorrido realizado en sitio, se establece la necesidad de efectuar los ajustes y reparaciones correspondientes.
Según lo observado, las afectaciones podrían estar asociadas al desplazamiento de mobiliario por parte de la institución sin la debida protección del piso, lo que habría ocasionado impactos sobre el recubrimiento. Asimismo, se considera que el exceso de humedad generado por las lluvias y por bajantes instaladas por la institucion contribuyó al desprendimiento de la pintura en algunos sectores.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** Se pinta cerramiento contra impacto de cancha. Frente entregado

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la aplicación de pintura mediante pistola de aspersión sobre reja metálica. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de estos, de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.
Asimismo, se evidenció que el cerramiento perimetral se encontraba en adecuadas condiciones, garantizando la correcta delimitación del área de trabajo. Debido al uso de pintura mediante aspersión, se recomendó mantener las medidas de prevención establecidas para la manipulación y aplicación de estos productos, así como garantizar la adecuada ventilación del área cuando corresponda.
Finalmente, se recomendó al contratista realizar jornadas de orden y aseo al finalizar la jornada laboral, efectuando el retiro de residuos, materiales y elementos utilizados durante la actividad, con el fin de mantener condiciones seguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado para la obra, se encuentra material de construcción, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** N/A

# EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **LAS MERCEDES - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **TABORA - SEDE B:** Ficha SAE remitida el 12 de agosto del 2026. Se programara visita en conjunto con el contratista de obra con el fin de atender la emergencia.

**1. Actividades Tecnicas:**

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A

**5. Ambiental:** El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

**6. Generales:** Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

**1. Actividades Tecnicas**: El requerimiento se efectuar en respuesta a la necesidad de reparar el equipo del cuarto frio de refrigeración que estaba dañado y no llegaba a temperatura, ante esto se procede al cambio del compresor y mantenimiento y reubicación de la condensadora. El equipo de congelación se traslada y se reubica en un espacio aislado en la zona de la cocina interna que permita la manipulación del mismo

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

**1. Actividades Tecnicas:** Frente de obra entregado

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de la pérgola. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las labores y se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se efectua la reinstalacion de la pérgola que presentó desprendimiento.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó entrega

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la puerta de acceso al salón. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de seguridad del área intervenida.
Asimismo, se evidenció que en el shut de basuras aún permanece material utilizado durante la ejecución de las actividades, por lo cual se recomendó al contratista realizar el retiro oportuno de dichos materiales y residuos. De igual manera, se reiteró la importancia de dejar las instalaciones de la institución en adecuadas condiciones de orden y aseo al finalizar las actividades, con el fin de evitar condiciones inseguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155343

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C

**1. Actividades Tecnicas:** El alcance de la intervencion es "Instalación de estructura metálica y cubierta en lamina Alveolar con el fin de garantizar el acceso a la biblioteca de la institución, ubicada en el segundo nivel del BLOQUE B."

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente instalacion de una tableta y remate de muro donde se efectuo el arreglo

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta. Se sellará por la parte inferior del flanche, con el fin de evitar generar afectaciones adicionales en el elemento existente.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

**1. Actividades Tecnicas**: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Se ejecutaron labores de excavación para la construcción de la viga, elaboracion de columnas, vigas muro e instalacion de geotextil

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muro en mampostería para cerramiento, fundida de vigas y columnas, así como el retiro de cerramiento en lona. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad del frente de obra.
Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de todo el personal, haciendo especial énfasis en el uso del casco de seguridad, teniendo en cuenta que se ha evidenciado personal ejecutando labores sin este elemento de protección. Se reiteró la importancia de fortalecer la supervisión y el control sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.
De igual manera, se recomendó mantener las áreas de trabajo debidamente delimitadas y señalizadas, así como implementar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las actividades, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencio material de construcción, se realizó la recuperación de la zona verde, al igual que se recomienda una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

**6. Generales:** N/A

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** Queda pendiente la verificación de instalacion de punto de agua en 3 piso por parte del contratista.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realiza intervención en la sede para la conformación de una nueva caja de medición de acueducto, con conexión mediante tubería de 3/4", con el fin de garantizar las condiciones de caudal y presión requeridas para el adecuado funcionamiento de la institución educativa. Lo anterior, debido a que la sede contaba anteriormente con una conexión en tubería de 1/2". La Secretaría realizará los trámites correspondientes ante la Empresa de Acueducto para la anulación del punto de conexión existente y la posterior habilitación y conexión de la nueva caja de medición.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY

**1. Actividades Tecnicas:** EL contratista estructurara un NP con el fin de cobrar las labores ejecutadas.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se estructura el NP linea de vida y puntos de anclaje con el fin de garantizar el acceso a la cubierta y el mantenimiento a la misma; se realiza la instalacion de la escotilla y la puerta de acceso a la escalera de la cubierta y se entrega a la institucion educativa, no se reporta novedad.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Se efectua la demolicion de unos lavamanos existentes y reposicion para lavamanos en policuarzo de color amarillo.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE B

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizo entrega, sin novedad

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Con el fin de garantizar el carácter modular del aula y facilitar su posterior desmonte y reinstalación en otro lugar, se ejecutó un sistema de aislamiento y anclaje de la estructura metálica respecto al piso, permitiendo su desmontaje sin afectar los elementos estructurales. Asimismo, se elevó la estructura para evitar el contacto directo con el terreno y reducir la exposición a humedad y nivel freático, minimizando el riesgo de corrosión y prolongando la vida útil de los elementos metálicos.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155343**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN - SEDE A

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizo entrega, sin novedad

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realizaron actividades de pintura en el cerramiento contra impacto existente en la institución, con el fin de efectuar labores de mantenimiento, mejorar su acabado y garantizar uniformidad en su apariencia

## ANEXOS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

## FIRMAS

**ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

**ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO**
PROFESIONAL SST

**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN**
ESPECIALISTA AMBIENTAL

**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

**ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO**
ESPECIALISTA ELECTRICO

**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS**
ESPECIALISTA HIDRAULICO

**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ**
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Mantenimiento reja metálica electrosoldada de alambre de acero galvanizadode alta seguridad

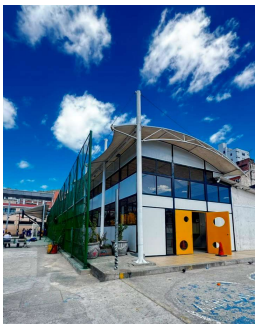

Aseo y limpieza de exteriores

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B**




Retiro de lavamanos



Demolicion de mamposteria y enchape del meson



Instalacion delavamanos en policuarzo color amarillo

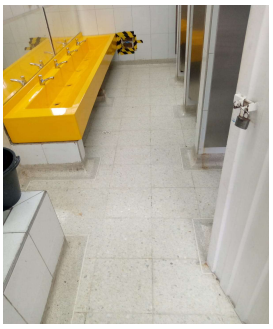

Instalacion delavamanos en policuarzo color amarillo



Instalacion delavamanos en policuarzo color amarillo



Instalacion delavamanos en policuarzo color amarillo

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO LA PALESTINA



Levantamiento de muro en mamposteria



Levantamiento de muro en mamposteria



Armado de acero de columnas y levantamiento de muro en mamposteria



Armado de acero de columnas




Instalación de perfil tubular de 6x6 dr 3mm en cerramiento perimetral de colegio



Acopio de cesped y tierra negra.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

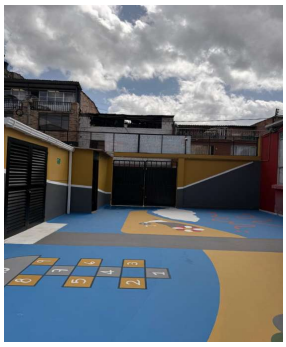

Demarcacion de pintura en placa

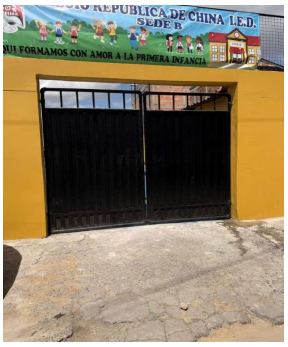


Puerta acceso (pintura y alineacion)

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A



Instalación de bajo puerta



Soporte rígido superior en aluminio atornilla a la hoja de la puerta, y una tira flexiblegoma de neopreno densa

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

## REGISTRO FOTOGRÁFICO REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE B



Remates perimnetrales en cubierta de policarbonato

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

**REGISTRO FOTOGRÁFICO REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A**



Fijación y anclaje de marquesina ligeras en voladizo (cubierta de policarbonato con soportes metálicos)
