PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	8,89%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	4,80%	92,56%
Valor de la Obra programada:	$ 246.071.623,00	$ 3.197.490.795,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 132.884.214,00	$ 2.959.649.481,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	91,11%	87,76%	El contratista se encuentra realizando labores finales con el fin de entregar las sedes contratadas inicialmente
Durante el periodo	8,89%	4,80%	
Acumulado actual	100,00%	94,12%	

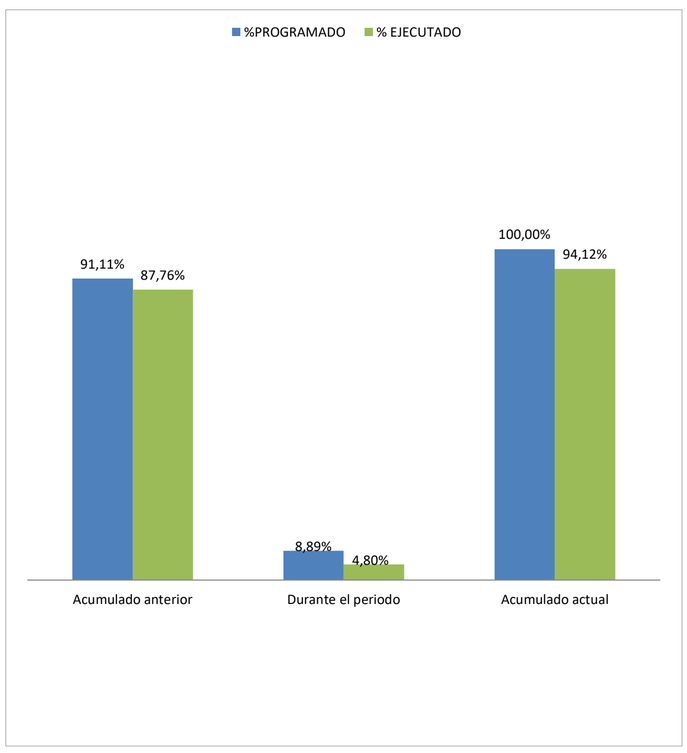

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	1,06%	1,06%	100,00%	100,00%	0,00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	1,42%	10,28%	8,86%	100,00%	85,15%	-14,85%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	9,53%	3,26%	-6,27%	100,00%	100,00%	0,00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	10,09%	6,85%	-3,24%	100,00%	83,03%	-16,97%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	8,86%	6,24%	-2,62%	100,00%	86,00%	-14,00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	12,07%	5,03%	-7,04%	100,00%	95,76%	-4,24%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**6,00%**	**4,67%**	**-1,32%**	**100,00%**	**92,85%**	**-7,15%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	9,76%	0,00%	-9,76%	100,00%	100,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	13,80%	9,85%	-3,95%	100,00%	97,15%	-2,85%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**11,78%**	**4,93%**	**-6,86%**	**100,00%**	**98,58%**	**-1,43%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100,00%	72,45%	-27,55%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100,00%	98,06%	-1,94%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 20.000.000,00		
			100,00%	85,06%		$ 290.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 138.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.308.707.841,00	$ 1.308.707.841,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.888.851.473,00	$ 1.888.851.473,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	100,00%	94,12%	ores finales con el fin de en

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	211	#¡VALOR!

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

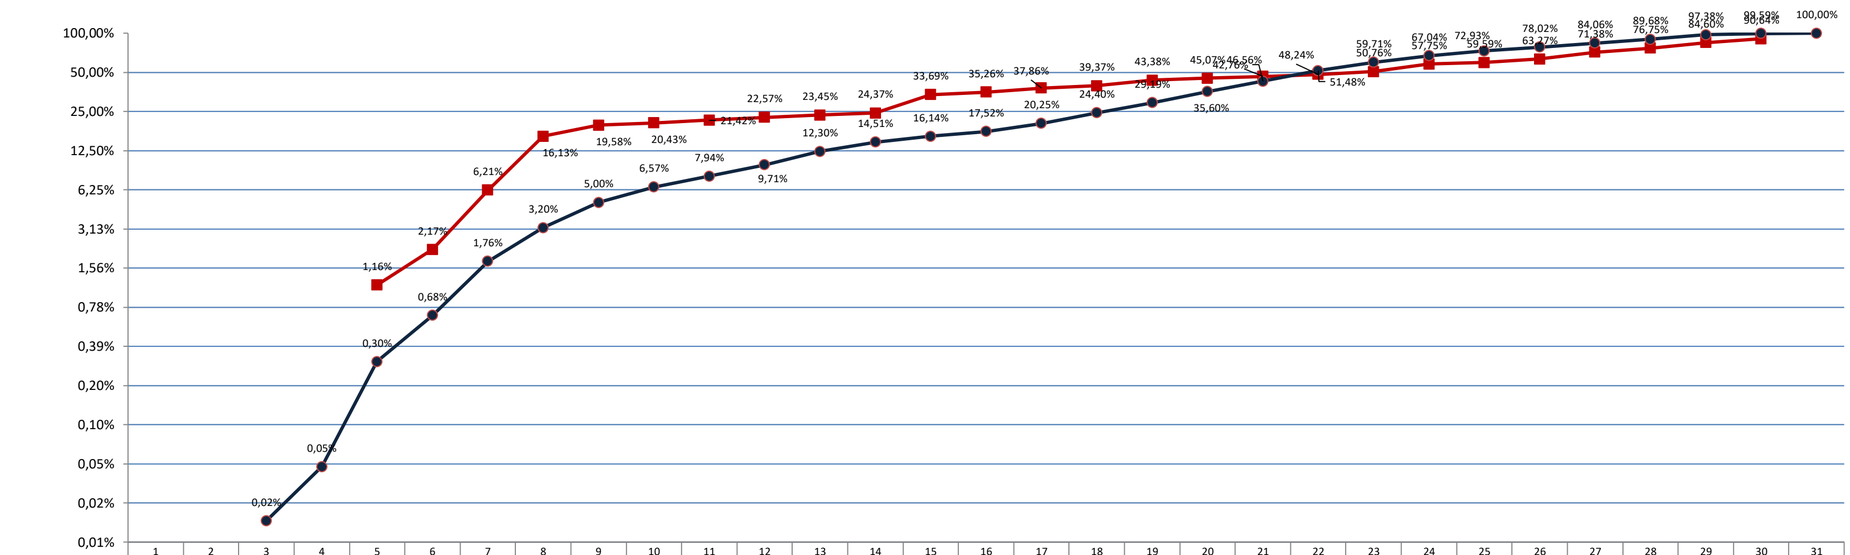

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%	57,75%	59,59%	63,27%	71,38%	76,75%	84,60%	90,64%	
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de pintura en el cerramiento perimetral. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal para la ejecución de las labores. Cabe señalar que, durante este mismo periodo, el colegio contó con programación de entrega, en el marco de la finalización de las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 30 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y retirar adecuadamente todo el material.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, excavacion para carcamo, ensamble de aula modular, trabajo electrico.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de soldadura de ángulos e instalación de parrilla del cárcamo. Así mismo, se verificó al personal con el uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para labores de soldadura. Se recomienda que, en los casos donde se ejecuten trabajos en alturas asociados a estas actividades, el personal implemente de manera adecuada y permanente los EPCC, con el fin de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: 16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
-4.7.7. LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)
2.2.10. RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).
-16.1.2.CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
-16.1.3. BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
-16.1.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)
2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de puerta persiana en el shut de basura y adecuación de la puerta del cerramiento perimetral para el bote de basura almacenada en el shut. Se le recomienda al contratista finalizar detalles de acabados para la entrega final del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de instalación de la bajante de la canal. Cabe señalar que, durante este mismo periodo, el colegio contó con programación de entrega, en el marco de la finalización de las actividades ejecutadas. Durante la ejecución de las actividades no se presentaron accidentes ni incidentes, manteniéndose condiciones seguras en el desarrollo de las labores.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, reportar el retiro de cerramiento perimetral, se acopia y protege adecuadamente el material, se recomendo retirar el material, garantizar jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se estructuro shut, carcamos, excavacion para tuberia e instalacion de cubierta Shut.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencian actividades de excavación en el área destinada para la construcción del cárcamo. Así mismo, se continúa evidenciando personal realizando labores sin el uso de casco y sin la dotación completa, por lo cual se reitera al contratista la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de seguridad y el uso adecuado de los EPP. Se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno del material sobrante, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" NP mantenimiento de puerta NP PINTURA ARTISTICA
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
8.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX
2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.
7.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM
9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
4.9.10.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"
13.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
8.1.2. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
12.2.4. PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.5.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"
12.2.3.PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
7.2.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, gran parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, al igual se evidencia un bajo volumen de residuos sin acopiar ni señalizar por lo que se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, quitar el material de construcción de las zonas verdes, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Durante la reunion realizada en la SED el ingeniero apoyo a la supervision solicito las gradas pintadas y al anden frente a ellas un acabado en escobiado, de igual modo se recomendo que en el shut el superboard quedara dilatado y respecto a NP de mantenimiento de la puerta se dijo que se realizara actividad hasta que este NP este aprobado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de ajuste de adoquín en el área contigua a las canchas. Así mismo, se validó que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas, garantizando control y seguridad en la zona intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 20 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral, no se evidencian residuos, al igual se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de estructura metálica para soporte de cubierta del hall de circulación. Adicional se realizó la entrega de espacio parcial de las baterías sanitarias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de desmonte de cerramiento rígido, así como la subsanación de detalles en una de las zonas del colegio, en el marco de la preparación para su entrega. Por otra parte, se evidenció la instalación de estructura metálica para el refuerzo de la estructura existente de la cubierta del hall, garantizando condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 14,00%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: Las actividades que se mencionan a continuación obedecen a la intervención de la cubierta del hall de circulación:
1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).
16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA).

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta el embalaje de las cubiertas de asbesto, se reporta el retiro de parte de residuos, por lo que se recomienda al contratista realizar la disposición total, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de enchape para muros del shut de basuras. Adicional realizó actividades de instalación de bordillo perimetral en la zona del jardín.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de bordillo, así como la instalación de enchape en los muros del shut. Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado y permanente del casco por parte del personal durante la ejecución de las labores. De igual manera, se sugiere mejorar las condiciones de la polisombra del cerramiento perimetral, debido a que se encuentra deteriorada, con el fin de garantizar un adecuado control del área y mantener condiciones seguras en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 4,24%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra material de construcción y residuos en el frente acopiados, se recomienda realizar la disposicion de estos residuos, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de aplicación de pintura en muro exterior de shut de basuras, adicional realizó el replanteo de red electrica para conexión del shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de pintura en la fachada del shut de basura. Así mismo, se verificó que el cerramiento perimetral se encuentra en buenas condiciones y se validó el uso adecuado de EPP por parte del personal. Se recomienda implementar de manera constante jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado, se realizó la disposición adecuada de los residuos, se recomienda jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 23 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría. Se realizó la entrega final del frente de obra.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento ya que es un lugar cerrado, se evidencia residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de bombas y conexión de tubiería de la red nueva.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de desencofrado de la placa de concreto. Se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, así como realizar el retiro oportuno de los escombros generados, con el fin de mantener condiciones seguras y organizadas en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le recomienda al contratista realizar la entrega del frente.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN** ESPECIALISTA AMBIENTAL		**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	4/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	0 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
2 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	98,94%	100,00%	↑	100,00%	✓	$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	70,80%	81,62%	↑	100,00%	↓	$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	96,74%	100,00%	↑	100,00%	↓	$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	62,67%	72,47%	↑	100,00%	↓	$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	79,76%	86,00%	↑	100,00%	↓	$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	90,73%	95,76%	↑	100,00%	↓	$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	87,30%	97,15%	↑	100,00%	↓	$ 100.000.000																					
							→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						90,84%	↑	#######	↓	$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%	↑	0,00%	↑	$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%	↑	0,00%	↑	$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		96,08%	↑	0,00%	↑	$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%	↑	100%	✓	$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%	→	0%	✓	$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						82,75%	↑	55,56%	↑	$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
9	8	1	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
PROGRAMADO	100,00%		
ATRASO	-9,16%	PLAZO VENCIDO	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

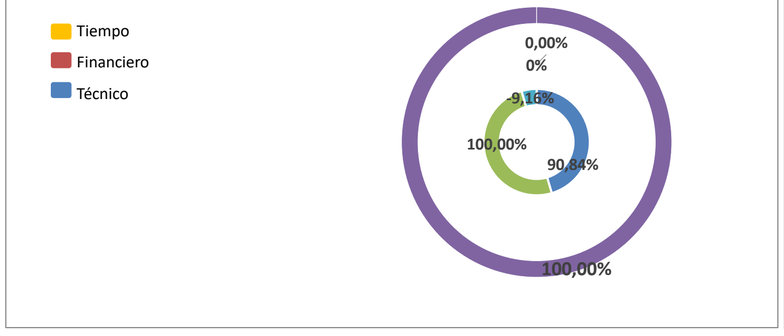

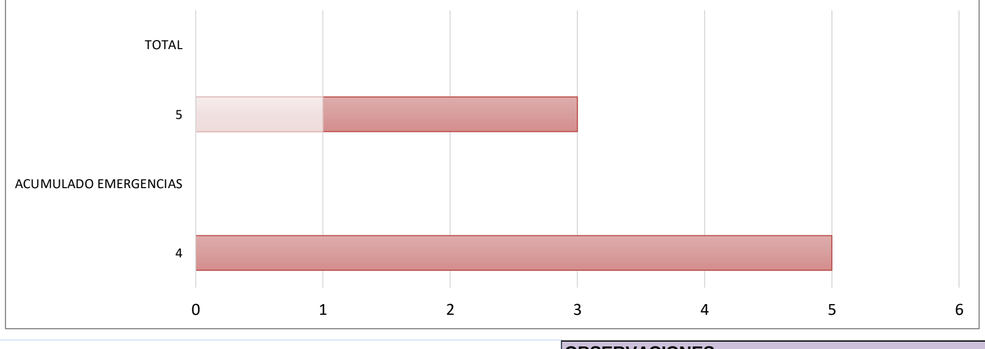

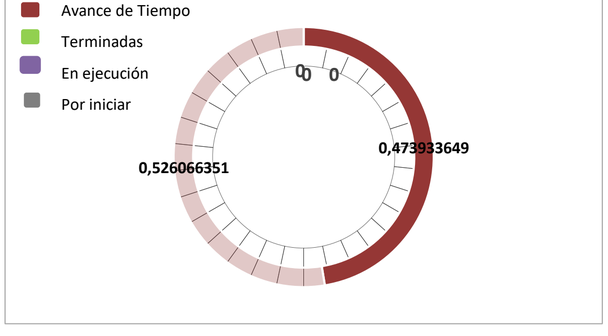

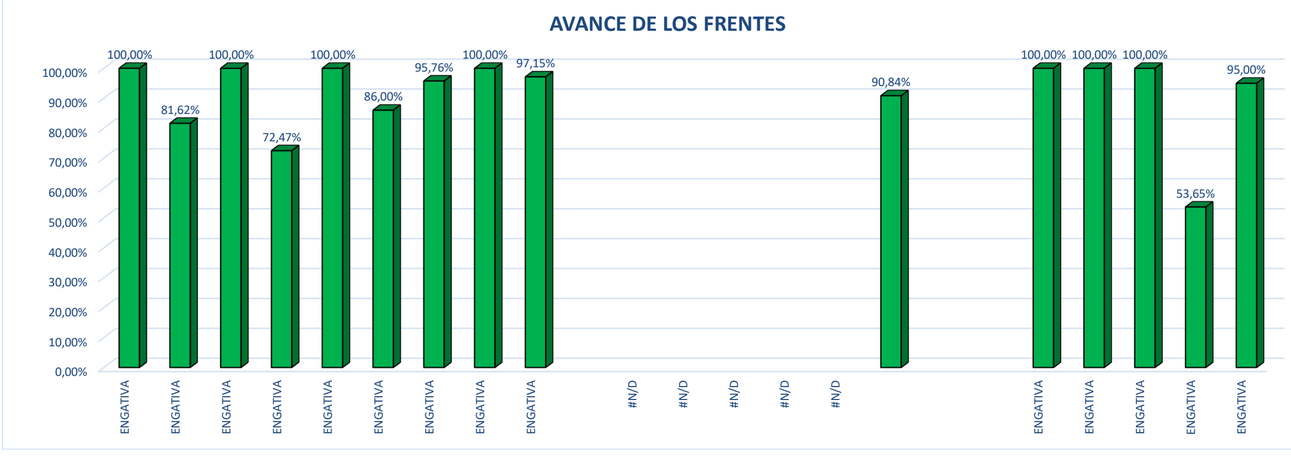

OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A







Desencofrado de carcamo

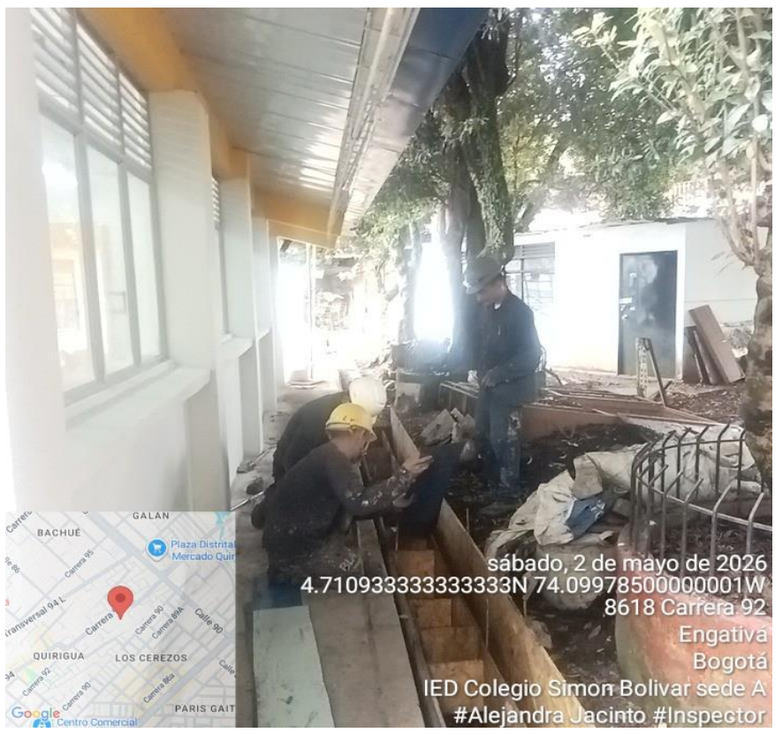


soldadura de angulos

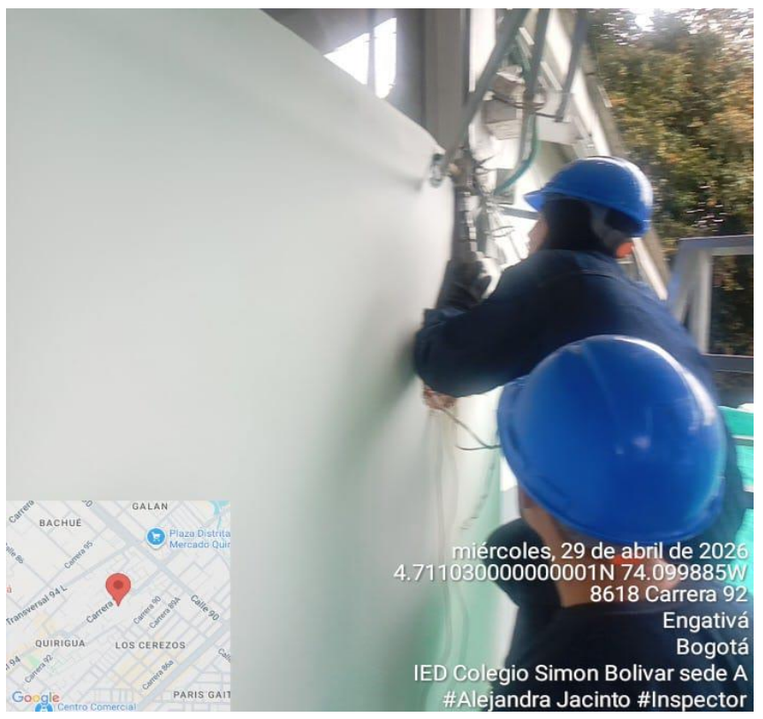

Armado de formaleta para el carcamo

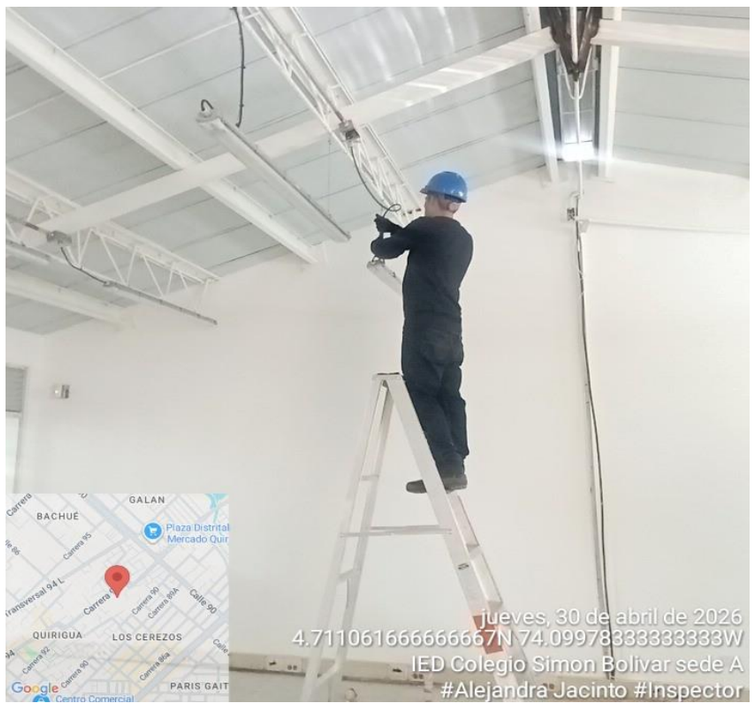

Trabajo electrico en fachada de salones

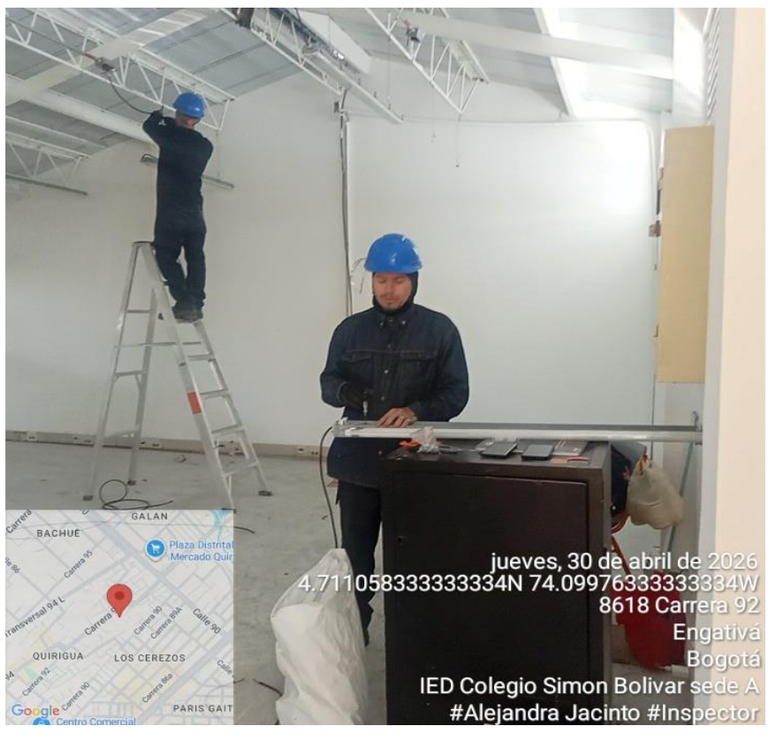

Encauchetado para luminarias

Instalacion de luminarias

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A

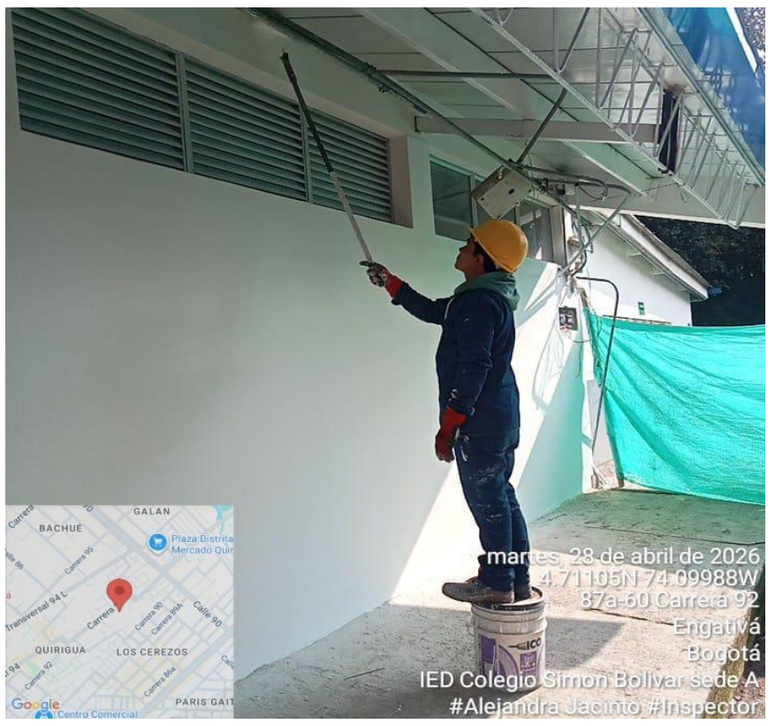


Revoque de muro en la fachada_ color blanco

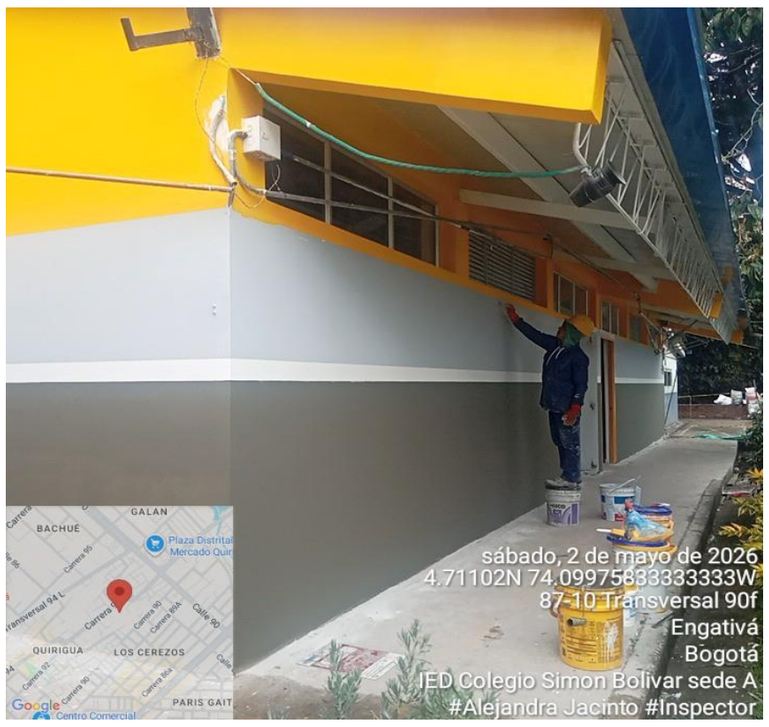

Revoque de fachada con diseño de 3 colores

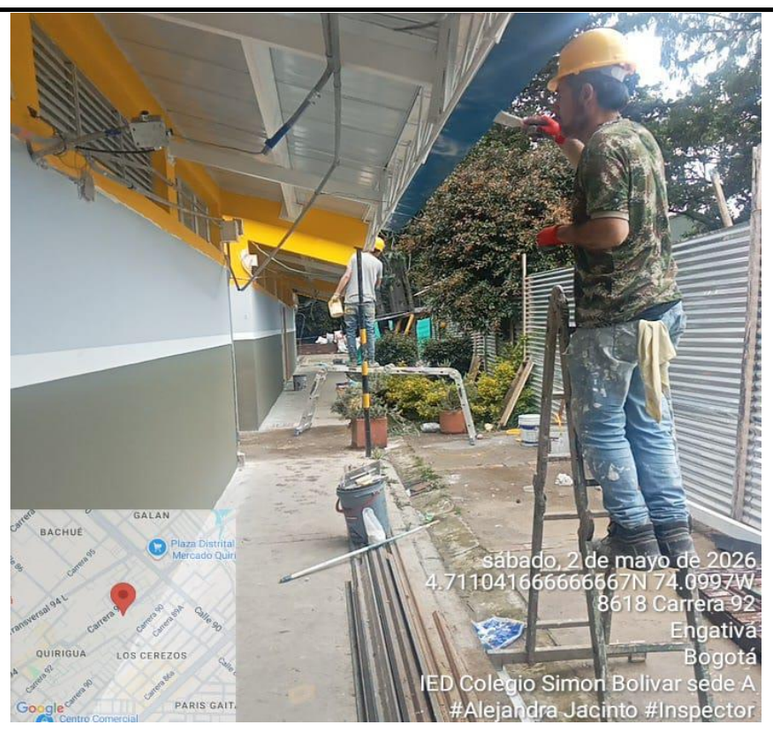

Aplicación de pintura en parales de cubierta

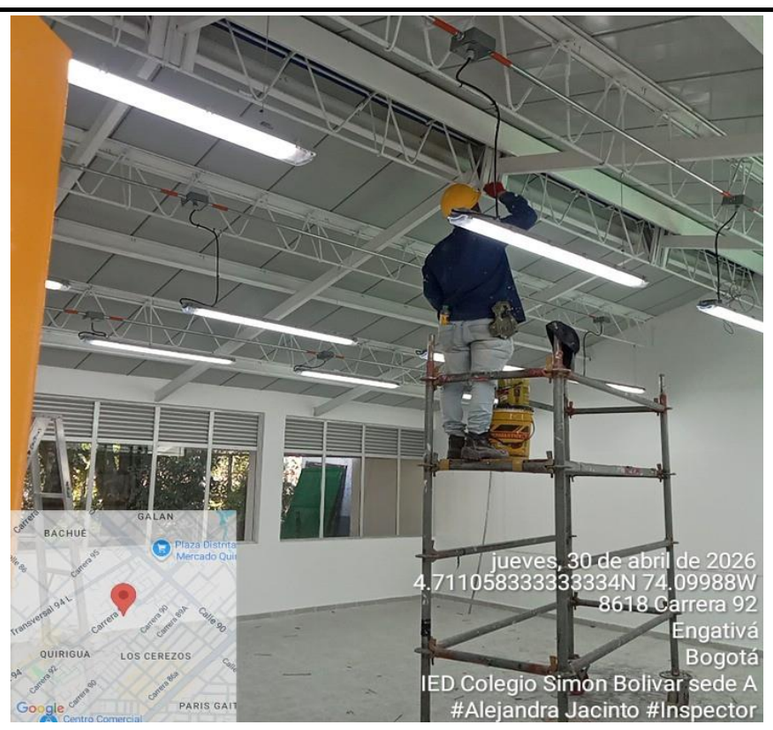

Aplicación de pintura blancha en cerchas



Anclaje de Parales, vigas y viguetas en aula del salon modular

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Subsanación de detalle de acabado.



Subsanación de detalle de acabado.



Subsanación de detalle de acabado.



Instalación de puertas - shut de basuras.



Instalación de puertas - shut de basuras.



Adecuación de cerramiento perimetral

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

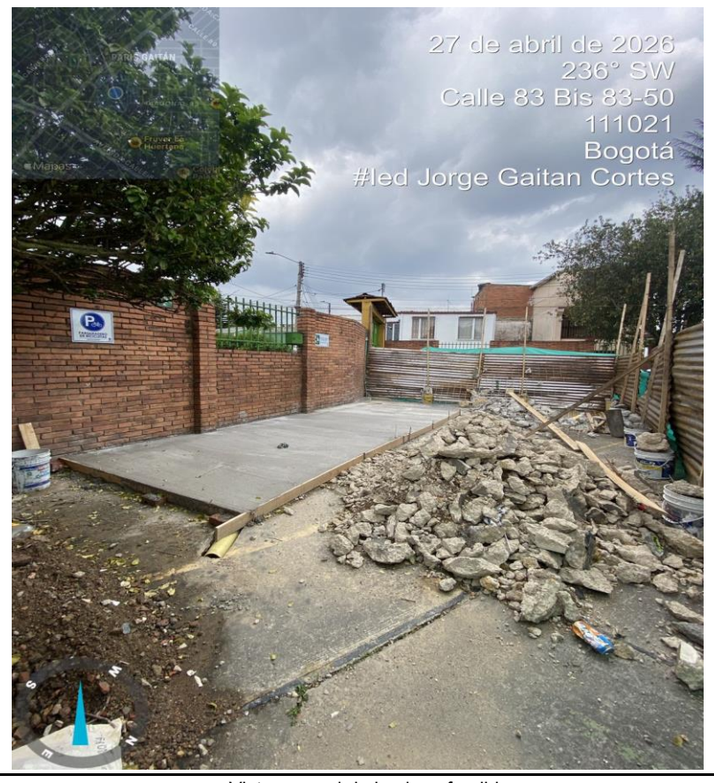


Vista general de la placa fundida.

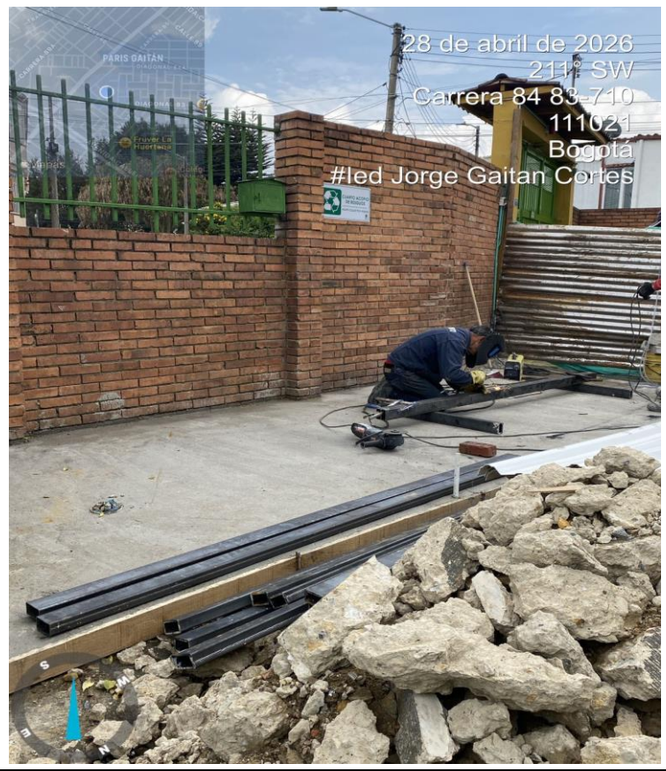

Inicio armado de la estructura.

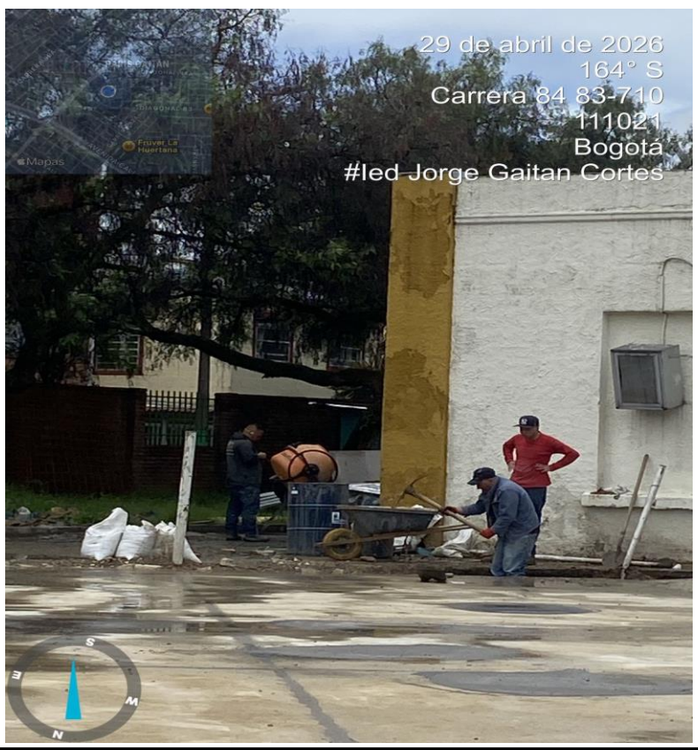

Excavación del cárcamo.

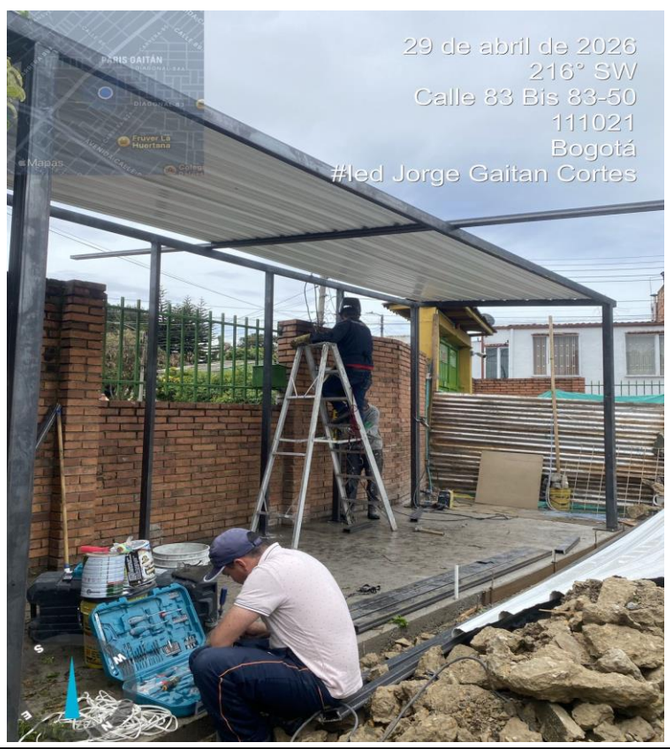

Continuación del armado del shut.



Estructura Shut



Cancha

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de estructura metálica - Cubierta hall de circulación.



Instalación de estructura metálica - Cubierta hall de circulación.



Vista general de entrega de espacios - Baterías sanitarias.



Vista general de entrega de espacios - Baterías sanitarias.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de bordillo - zona de jardín.



Instalación de bordillo - zona de jardín.



Instalación de echape en muros internos del shut de basuras.



Instalación de echape en muros internos del shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 30 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 27/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 211 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A



Instalación de bombas y conexión de tubería nueva.



Instalación de bombas y conexión de tubería nueva.



Instalación de bombas y conexión de tubería nueva.



Instalación de bombas y conexión de tubería nueva.
