PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 36

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	36	DEL	8/06/2026 (DD-MM-AA)	AL	14/06/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	254 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,659,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.30%	86.04%	Obra Física Ejecutada (%)	1.56%	86.67%
Valor de la Obra Programada:	$ 9,008,336.00	$ 3,148,326,877.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 47,190,457.00	$ 3,171,380,210.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	85.74%	85.11%	1.38%
Durante el periodo	0.30%	1.56%	
Acumulado actual	86.04%	86.67%	

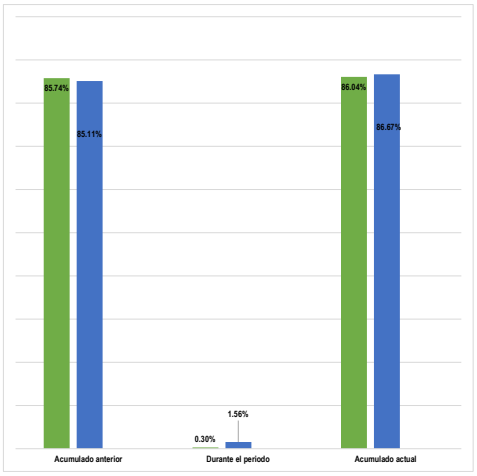

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	1.46%	1.13%	-0.33%	6.24%	1.76%	-4.48%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	1.81%	16.00%	14.19%	7.02%	26.64%	19.62%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			1.64%	8.57%	6.93%	6.63%	14.20%	7.57%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.30%	1.56%	1.26%	83.02%	84.40%	1.38%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 38,193,723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,273,680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,076,835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,913,171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 20,073,306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 150,294,734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 43,248,915.00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	$ 20,000,000.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	98.00%	98.00%	0.00%	$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	30.00%	30.00%	0.00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			62.82%	61.20%	-1.62%	$ 290,732,744.10	$ 628,932,199.00	$ 338,199,454.90

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,659,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 960,277,947.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,849,129,420.00	
SUMAS IGUALES		$ 810,129,849.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 2,849,129,420.00	$ 2,849,129,420.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	86.04%	86.67%	1.38%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	254	3.50

CURVA S

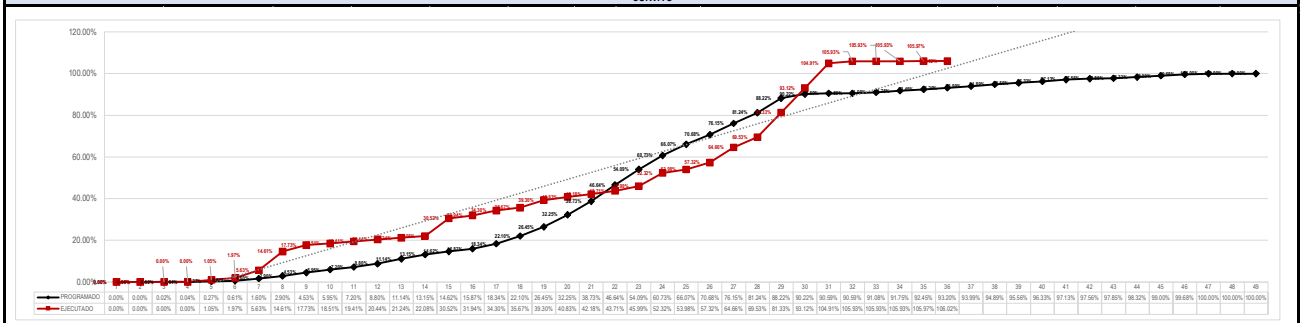

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.05%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.05%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.92%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.97%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.66%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.60%	$ 44,738,268.00	5.63%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.30%	8.98%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.90%	$ 81,229,800.00	14.61%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.63%	3.12%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.53%	$ 126,911,877.00	17.73%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.42%	0.78%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.95%	$ 166,813,337.00	18.51%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.25%	0.90%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.20%	$ 201,714,046.00	19.41%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.60%	1.04%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.80%	$ 246,517,349.00	20.44%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.35%	0.80%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.14%	$ 312,308,281.00	21.24%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	2.01%	0.84%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.15%	$ 368,556,270.00	22.08%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.47%	8.44%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.62%	$ 409,790,998.00	30.52%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.25%	1.43%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.87%	$ 444,749,788.00	31.94%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.47%	2.36%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.34%	$ 514,112,112.00	34.30%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.76%	1.37%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	22.10%	$ 619,454,498.00	35.67%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.35%	3.63%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.45%	$ 741,303,536.00	39.30%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.80%	1.53%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.25%	$ 903,854,742.00	40.83%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.49%	1.35%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.73%	$ 1,085,654,721.00	42.18%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.91%	1.53%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.64%	$ 1,307,288,437.00	43.71%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.45%	2.28%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	54.09%	$ 1,516,035,801.00	45.99%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.64%	6.33%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.73%	$ 1,702,181,070.00	52.32%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.34%	1.67%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	66.07%	$ 1,851,939,157.00	53.98%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.61%	3.33%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.68%	$ 1,981,028,711.00	57.32%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.47%	7.35%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	76.15%	$ 2,134,483,966.00	64.66%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.09%	4.87%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	81.24%	$ 2,277,159,343.00	69.53%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.97%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	88.22%	$ 2,472,598,216.00	81.33%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	2.00%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	90.22%	$ 2,528,746,605.00	93.12%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	90.59%	$ 2,539,196,402.00	104.91%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.02%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	90.59%	$ 2,539,196,402.00	105.93%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,608,738.53	0.49%	0.00%	$ -	$ 13,608,738.53	91.08%	$ 2,552,805,140.53	105.93%	$ 2,969,135,419.29
34	SEM 34	21/05/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.00%	$ -	$ 18,882,607.73	91.75%	$ 2,571,687,748.26	105.93%	$ 2,969,135,419.29
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,478,875.59	0.69%	0.04%	$ 1,203,371.54	$ 18,275,504.05	92.45%	$ 2,591,166,623.85	105.97%	$ 2,970,338,790.83
36	SEM 36	4/06/2026	$ 21,095,476.82	0.75%	0.05%	$ 1,317,497.58	$ 19,777,979.24	93.20%	$ 2,612,262,100.67	106.02%	$ 2,971,656,288.41
37	SEM 37	11/06/2026	$ 22,115,810.19	0.79%	0.00%	$ -	$ 22,115,810.19	93.99%	$ 2,634,377,910.86		$ 2,971,656,288.41
38	SEM 38	18/06/2026	$ 25,176,810.31	0.90%	0.00%	$ -	$ 25,176,810.31	94.89%	$ 2,659,554,721.17		$ 2,971,656,288.41
39	SEM 39	25/06/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.00%	$ -	$ 18,882,607.73	95.56%	$ 2,678,437,328.90		$ 2,971,656,288.41
40	SEM 40	2/07/2026	$ 21,691,744.68	0.77%	0.00%	$ -	$ 21,691,744.68	96.33%	$ 2,700,129,073.58		$ 2,971,656,288.41
41	SEM 41	9/07/2026	$ 22,288,012.53	0.80%	0.00%	$ -	$ 22,288,012.53	97.13%	$ 2,722,417,086.11		$ 2,971,656,288.41
42	SEM 42	16/07/2026	$ 12,164,339.64	0.43%	0.00%	$ -	$ 12,164,339.64	97.56%	$ 2,734,581,425.75		$ 2,971,656,288.41
43	SEM 43	23/07/2026	$ 7,910,803.81	0.28%	0.00%	$ -	$ 7,910,803.81	97.85%	$ 2,742,492,229.56		$ 2,971,656,288.41
44	SEM 44	30/07/2026	$ 13,184,673.01	0.47%	0.00%	$ -	$ 13,184,673.01	98.32%	$ 2,755,676,902.57		$ 2,971,656,288.41
45	SEM 45	6/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.00%	$ 2,774,731,712.64		$ 2,971,656,288.41
46	SEM 46	13/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.68%	$ 2,793,786,522.71		$ 2,971,656,288.41
47	SEM 47	20/08/2026	$ 9,103,339.52	0.32%	0.00%	$ -	$ 9,103,339.52	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,971,656,288.41
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,971,656,288.41
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,971,656,288.41
			$ 2,802,889,862.23								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra en laboresde demolicion y fundida de placa.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placas en el área proyectada para la nueva intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en condiciones adecuadas para la delimitación y protección del frente de obra.
Asimismo, se evidenció que el personal presente en el área de trabajo hacía uso adecuado de los EPP requeridos para la ejecución de las actividades, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras durante el desarrollo de las labores. Se recomienda continuar fortaleciendo las medidas de seguridad, orden y aseo en el frente de obra para prevenir la ocurrencia de incidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia material de construcción y residuos de lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se requiere efectuar mantenimiento a la reja ubicada en la parte posterior de la sede, incluyendo la aplicación de pintura color verde. Adicionalmente, se deberá realizar la instalación de los tanques.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de orden y aseo general, así como el retiro de residuos a lo largo de todo el frente de obra

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se realizan observaciones minimas. La interventoria verificara que las observaciones sean atendidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra finalizando ajuste en las labores de remate en cubierta (bajantes), con el fin de darle garantia al proceso constructivo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones finales

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron actividades demolicion de placa, excavacion y armado de acero para zapatas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placa en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría realizó verificación de las condiciones de seguridad implementadas para el desarrollo de las labores. Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista reforzar las actividades de capacitación y supervisión relacionadas con el uso correcto y permanente de los EPP, garantizando que todo el personal los utilice de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad ejecutada. Asimismo, se solicita mejorar las condiciones del cerramiento perimetral, con el fin de asegurar una adecuada delimitación del frente de obra, restringir el acceso de personal no autorizado y minimizar los riesgos para la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante la excavación se evidenció la presencia de material de ladrillo hasta una profundidad aproximada de 40 cm. Por tal motivo, se solicita concepto estructural respecto a la posibilidad de considerar este material como terreno mejorado para las vigas y limitar las excavaciones adicionales únicamente a las áreas de zapatas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectuo estructuracion para muros e inicio de puesta de laminas de superboard.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al perfilado y retiro de la estructura sobrante del muro demolido en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó la presencia y condiciones adecuadas del cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa. Asimismo, se recomienda al Contratista reforzar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar y residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante la reunión realizada para la SED, se definió la configuración de las fachadas de las aulas, así como la utilización de aluminio color gris en los elementos proyectados. Igualmente, se indicó que las puertas deberán ser similares a las instaladas en las salas de reunión de la Secretaría de Educación y que se debe considerar el uso de las aulas por parte de estudiantes de primaria.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Respecto a la solicitud realizada por la interventoría de esquema de la puerta proyectada, se informo desde la SED que no es requerido el diseño o esquema del mismo. Adicionalmente, respecto al sistema hidráulico, se solicita la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman la red.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se debe desmontar puerta y pintar en electrostatica y montar division en zona del baño. El contratista indica que division en acero se encuentra en produccion

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervision solicita la intervencion en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostatica (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervisión indicó que la ventanería deberá pintarse en color negro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervision y a la institucion educativa

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: En la visita de la entrega de espacios, se solicito al contratista realizar labores en el jardin posterior de las aulas de primera infancia, estas labores ya fueron efectuadas por parte del contratista, la interventoria realizara la respectiva verificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoria programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoria fueron atendidas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Instalacion de puertas de los baños

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La ejecución de las actividades de desmonte de divisiones está sujeta a la aprobación previa del NP correspondiente

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista esta estructurando los esquemas de intervencion estructural en la sede, esta debera ser verificada y aprobada por el equipo de interventoria para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoria esta a la espera que se radique la informacion adicional a esto se realizara inpeccion para evaluar si la mamposteria es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realiza visita de verificacion por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza visita de verificacion con profesional electrico

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante el presente periodo se realizó visita de verificación por parte de las profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista y la Interventoría, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de trabajos en alturas en la cubierta y en el pasillo de la institución educativa.
Durante la inspección se verificaron las condiciones locativas y los sistemas disponibles para la implementación de medidas de protección contra caídas, concluyendo que la infraestructura existente no cuenta con puntos de anclaje certificados que permitan la instalación y uso seguro de líneas de vida para la ejecución de las actividades programadas.
En consecuencia, se recomendó al Contratista evaluar e implementar la instalación de puntos de anclaje certificados, diseñados y ubicados de acuerdo con las condiciones estructurales del sitio y la normatividad vigente aplicable a trabajos en alturas, con el fin de garantizar la protección de los trabajadores y la ejecución segura de las labores previstas en cubierta y demás áreas donde exista riesgo de caída.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se solicita se ajuste el policarbonato en un tramo de la cubierta de la sede, en consecuencia como no se puede acceder de una manera facil al punto, se realizó visita de verificacion por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo de la interventoria de obra y del contratista para efectuar la verificacion de las condiciones y determinar las condiciones del espacio y validar que equipos se necesitan para llevar a cabo la respectiva intervencion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO

1. Actividades Tecnicas: Demoliciones y ejecucion de muro divisorio divisorio liviano

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al perfilado y retiro de la estructura sobrante del muro demolido en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó la presencia y condiciones adecuadas del cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa.
Asimismo, se recomienda al Contratista reforzar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Debido a las actividades de intervención que se ejecutaran en el tercer nivel y con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas que se desarrollan en el espacio, fue necesario implementar una medida de contingencia mediante la adecuación de un espacio en el primer nivel, permitiendo su uso como aula y asegurando el normal desarrollo de las clases durante la ejecución de las obras.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalacion de canaleta



Fundida de placa



Demolición de Mampostería



Instalacion de baranda y aplicación de pintura en la rampa de acceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A

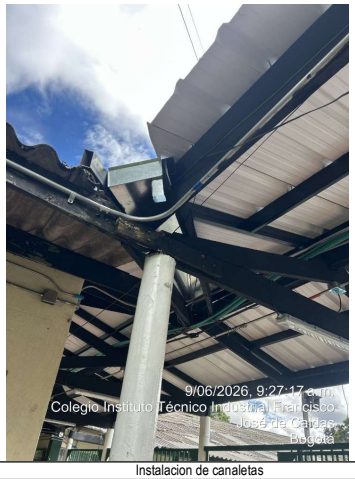

Instalacion de canaletas



Instalacion de canaletas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 36 (Consecutivo) **36** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B

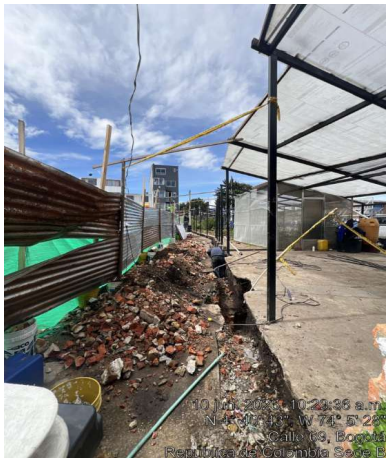

Demolicion de placa y adoquin

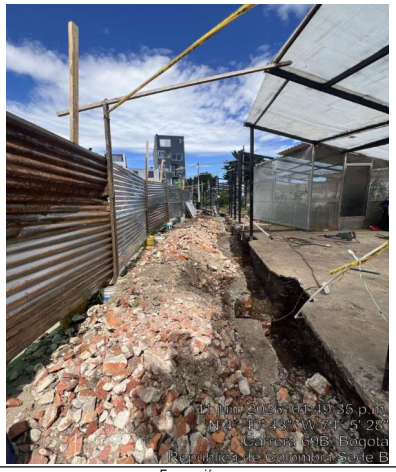

Excavación



Instalacion de tapete



Instalacion de tapete

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 (Consecutivo) **DEL** 8/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 14/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Elaboracion de muro divisor en eterboard de 8mm



Acopio de material de eterboard, fibro termoacustica de vidrio y perfileria metalica.
