PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA INTERVENTORIA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No. 39** LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA N° | 39 | DEL | 29/06/2026 (DD-MM-AA) | AL | 5/07/2026 (DD-MM-AA) | Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato | 275 dias |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato) | | | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N° | CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato) | LOTE COP | 18 |

## CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO 25 | | INTERVENTORIA | PROBINTEC S.A.S |
| RL del consorcio | DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR | | RL de interventoria | DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ |
| CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8155350 | | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8168931 |
| OBJETO | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18" | | OBJETO | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 2,551,797,666.00 | | VALOR INICIAL | $ 796,278,922.00 |
| AIU | 33.17% $ 846,431,285.81 | | VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025 | $ 139,026,666.00 |
| COSTO DIRECTO | $ 1,705,366,380.19 | | VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026 | $ 219,541,737.00 |
| OFERTADO | $ 2,322,865,467.00 | | VALOR TOTAL CONTRATO | $ 1,154,847,325.00 |
| EMERGENCIAS | $ 100,000,000.00 | | | |
| VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS | $ 2,422,865,467.00 | | | |
| DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS | $ 128,932,199.00 | | | |
| Valor Parcial (Inicial + Emergencias) | $ 228,932,199.00 | | | |
| Valor adicional No. 1: | $ 645,761,648.00 | | | |
| Valor inicial No. 1 emergencias: | $ 200,000,000.00 | | | |
| Valor adicional No.1 Obras Contractuales: | $ 445,761,648.00 | | | |
| Valor adicional No. 2: | $ 461,699,955.00 | | | |
| Valor inicial No. 2 emergencias: | $ 200,000,000.00 | | | |
| Valor adicional No.2 Obras Contractuales: | $ 261,699,955.00 | | | |
| VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA | $ 3,659,259,269.00 | | | |
| VALOR TOTAL EMERGENCIAS | $ 628,932,199.00 | | | |
| VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES | $ 3,030,327,070.00 | | | |
| PLAZO INICIAL | SIETE (07) MESES | | PLAZO INICIAL | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 01 | CUATRO (04) MESES | | PLAZO ADICIONAL No. 01 | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO TOTAL | ONCE (11) MESES | | PLAZO TOTAL | ONCE (11) MESES |
| FECHA DE INICIACION | 3/10/2025 | | FECHA DE INICIACION | 3/10/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 2/05/2026 | | FECHA DE VENCIMIENTO | 2/05/2026 |
| FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/09/2026 | | FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/09/2026 |


## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra Proramada (%) | 0.68% | 84.09% | Obra Física Eiecutada (%) | 0.29% | 87.75% |
| Valor de la Obra Programada: | $ 20,743,966.00 | $ 3,077,237,449.00 | Valor de la Obra Ejecutada: | $ 8,732,852.00 | $ 3,210,933,477.00 |

## GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

### SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

| | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 83.41% | 87.46% | 3.66% |
| Durante el periodo | 0.68% | 0.29% | |
| Acumulado actual | 84.09% | 87.75% | |

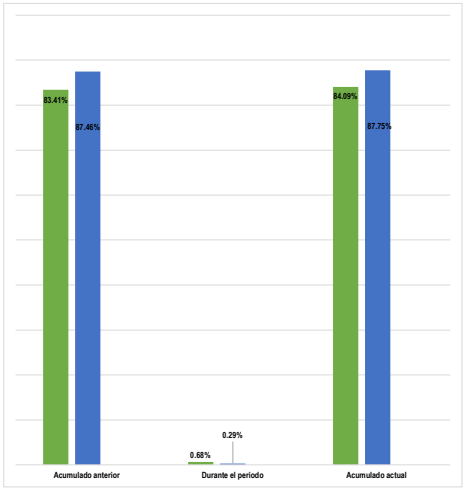


| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRENTES CONTRACTUALES** | | | | | | | | |
| 1078 | ENGATIVA | RODOLFO LLINAS - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1052 | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1019 | ENGATIVA | JORGE GAITAN CORTES - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1008 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES** | | | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** |
| **FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01** | | | | | | | | |
| 1021 | ENGATIVA | ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1079 | ENGATIVA | ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01** | | | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00%** |
| **FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02** | | | | | | | | |
| 1301 | TEUSAQUILLO | TÉCNICO PALERMO - SEDE A | 5.04% | 2.49% | -2.55% | 9.30% | 27.04% | 17.74% |
| 1032 | ENGATIVA | REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B | 2.49% | 0.68% | -1.81% | 15.72% | 38.22% | 22.50% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02** | | | **3.77%** | **1.59%** | **-2.18%** | **12.51%** | **32.63%** | **20.12%** |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02** | | | **0.68%** | **0.29%** | **-0.40%** | **84.09%** | **87.75%** | **3.66%** |

**EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS**

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | ENGATIVA | DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA | 100.00% | 72.45% | -27.55% | $ 38,193,723.00 | | |
| 1057 | ENGATIVA | LA PALESTINA - SEDE B | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 1,273,680.00 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 9,076,835.00 | | |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 2,913,171.00 | | |
| 1025 | ENGATIVA | MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 20,073,306.12 | | |
| 1073 | ENGATIVA | TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 150,294,734.00 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 43,248,915.00 | | |
| 1080 | ENGATIVA | LUICILA RUBIO DE LAVERDE | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 5,658,379.98 | | |
| 1049 | ENGATIVA | JUAN DEL CORRAL - SEDE A | 60.00% | 60.00% | 0.00% | $ 20,000,000.00 | | |
| | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1016 | ENGATIVA | JORGE GAITAN CORTES - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1073 | ENGATIVA | TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1021 | ENGATIVA | ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ - | | |
| | ENGATIVA | SAN JOSE NORTE - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°1: CUBIERTA) | 20.00% | 20.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1073 | ENGATIVA | TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3) | 30.00% | 30.00% | 0.00% | $ - | | |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°2 LIMPIEZA TANQUES) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ - | | |
| **TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS** | | | **71.18%** | **69.56%** | **-1.62%** | **$ 290,732,744.10** | **$ 628,932,199.00** | **$ 338,199,454.90** |

## AVANCE FINANCIERO

| VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA | | $ 3,659,259,269.00 |
|---|---|---|
| VALOR PARCIAL N°1 | $ 401,759,151.00 | |
| VALOR PARCIAL N°2 | $ 392,605,364.00 | |
| VALOR PARCIAL N°3 | $ 419,080,656.00 | |
| VALOR PARCIAL N°4 | $ 335,248,214.00 | |
| VALOR PARCIAL N°5 | $ 340,158,088.00 | |
| VALOR PARCIAL N°6 | $ 960,277,947.00 | |
| TOTAL VALOR FACTURADO | $ 2,849,129,420.00 | |
| SUMAS IGUALES | | $ 810,129,849.00 |


| | VALOR FACTURADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| INDICADOR FINACIERO | $ 2,849,129,420.00 | $ 2,849,129,420.00 |

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

| INDICADOR TECNICO | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO | % RETRASO - % ADELANTO + |
|---|---|---|---|
| | 84.09% | 87.75% | 3.66% |

| INDICADOR TIEMPO | DIAS | RETRASO |
|---|---|---|
| | 275 | 10.06 |

## CURVA S

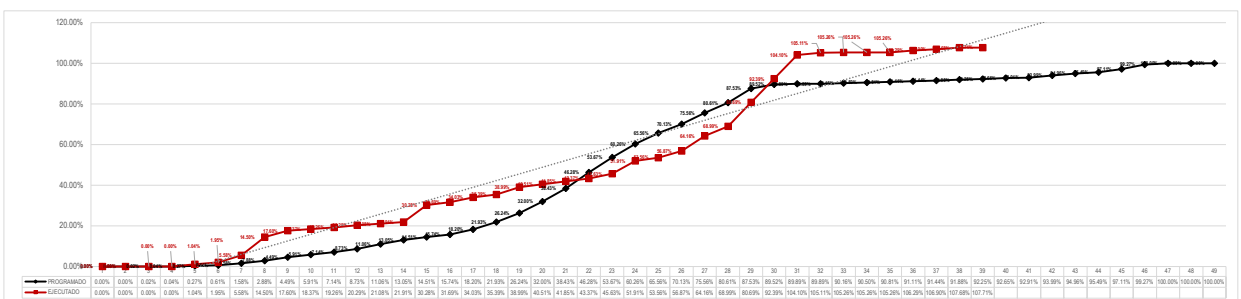


SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

## SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

| INFORME | PROGRAMACION | | | | REAL | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEMANA | FECHA | PROGRAMADO | %PROGRAMADO | AVANCE | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
| 1 | SEM 1 | 3/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 2 | SEM 2 | 9/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 3 | SEM 3 | 16/10/2025 | $ 452,000.00 | 0.02% | 0.00% | $ - | $ 452,000.00 | 0.02% | $ 452,000.00 | 0.00% | $ - |
| 4 | SEM 4 | 23/10/2025 | $ 726,000.00 | 0.03% | 0.00% | $ - | $ 726,000.00 | 0.04% | $ 1,178,000.00 | 0.00% | $ - |
| 5 | SEM 5 | 30/10/2025 | $ 6,389,251.00 | 0.23% | 1.04% | $ 29,416,873.00 | -$ 23,027,622.00 | 0.27% | $ 7,567,251.00 | 1.04% | $ 29,416,873.00 |
| 6 | SEM 6 | 6/11/2025 | $ 9,620,826.00 | 0.34% | 0.91% | $ 25,779,255.00 | -$ 16,158,429.00 | 0.61% | $ 17,188,077.00 | 1.95% | $ 55,196,128.00 |
| 7 | SEM 7 | 13/11/2025 | $ 27,550,191.00 | 0.98% | 3.63% | $ 102,559,453.00 | -$ 75,009,262.00 | 1.58% | $ 44,738,268.00 | 5.58% | $ 157,755,581.00 |
| 8 | SEM 8 | 20/11/2025 | $ 36,491,532.00 | 1.29% | 8.91% | $ 251,731,418.00 | -$ 215,239,886.00 | 2.88% | $ 81,229,800.00 | 14.50% | $ 409,486,999.00 |
| 9 | SEM 9 | 27/11/2025 | $ 45,682,077.00 | 1.62% | 3.10% | $ 87,572,933.00 | -$ 41,890,856.00 | 4.49% | $ 126,911,877.00 | 17.60% | $ 497,059,932.00 |
| 10 | SEM 10 | 4/12/2025 | $ 39,901,460.00 | 1.41% | 0.77% | $ 21,793,589.00 | $ 18,107,871.00 | 5.91% | $ 166,813,337.00 | 18.37% | $ 518,853,521.00 |
| 11 | SEM 11 | 11/12/2025 | $ 34,900,709.00 | 1.24% | 0.89% | $ 25,093,898.00 | $ 9,806,811.00 | 7.14% | $ 201,714,046.00 | 19.26% | $ 543,947,419.00 |
| 12 | SEM 12 | 18/12/2025 | $ 44,803,303.00 | 1.59% | 1.03% | $ 29,099,062.00 | $ 15,704,241.00 | 8.73% | $ 246,517,349.00 | 20.29% | $ 573,046,481.00 |
| 13 | SEM 13 | 25/12/2025 | $ 65,790,932.00 | 2.33% | 0.79% | $ 22,343,565.00 | $ 43,447,367.00 | 11.06% | $ 312,308,281.00 | 21.08% | $ 595,390,046.00 |
| 14 | SEM 14 | 1/01/2026 | $ 56,247,989.00 | 1.99% | 0.83% | $ 23,469,005.00 | $ 32,778,984.00 | 13.05% | $ 368,556,270.00 | 21.91% | $ 618,859,051.00 |
| 15 | SEM 15 | 8/01/2026 | $ 41,234,728.00 | 1.46% | 8.37% | $ 236,488,719.00 | -$ 195,253,991.00 | 14.51% | $ 409,790,998.00 | 30.28% | $ 855,347,770.00 |
| 16 | SEM 16 | 15/01/2026 | $ 34,958,790.00 | 1.24% | 1.41% | $ 39,956,792.00 | -$ 4,998,002.00 | 15.74% | $ 444,749,788.00 | 31.69% | $ 895,304,562.00 |
| 17 | SEM 17 | 22/01/2026 | $ 69,362,324.00 | 2.46% | 2.34% | $ 66,086,806.00 | $ 3,275,518.00 | 18.20% | $ 514,112,112.00 | 34.03% | $ 961,391,368.00 |
| 18 | SEM 18 | 29/01/2026 | $ 105,342,386.00 | 3.73% | 1.36% | $ 38,340,595.00 | $ 67,001,791.00 | 21.93% | $ 619,454,498.00 | 35.39% | $ 999,731,963.00 |
| 19 | SEM 19 | 5/02/2026 | $ 121,849,038.00 | 4.31% | 3.60% | $ 101,726,291.00 | $ 20,122,747.00 | 26.24% | $ 741,303,536.00 | 38.99% | $ 1,101,458,254.00 |
| 20 | SEM 20 | 12/02/2026 | $ 162,551,206 | 5.75% | 1.52% | $ 42,982,940.00 | $ 119,568,266.00 | 32.00% | $ 903,854,742.00 | 40.51% | $ 1,144,441,194.00 |
| 21 | SEM 21 | 19/02/2026 | $ 181,799,979.00 | 6.44% | 1.34% | $ 37,731,200.00 | $ 144,068,779.00 | 38.43% | $ 1,085,654,721.00 | 41.85% | $ 1,182,172,394.00 |
| 22 | SEM 22 | 26/02/2026 | $ 221,633,716 | 7.85% | 1.52% | $ 42,847,295.00 | $ 178,786,421.00 | 46.28% | $ 1,307,288,437.00 | 43.37% | $ 1,225,019,689.00 |
| 23 | SEM 23 | 5/03/2026 | $ 208,747,364 | 7.39% | 2.26% | $ 63,951,186.00 | $ 144,796,178.00 | 53.67% | $ 1,516,035,801.00 | 45.63% | $ 1,288,970,875.00 |
| 24 | SEM 24 | 12/03/2026 | $ 186,145,269 | 6.59% | 6.28% | $ 177,464,542.00 | $ 8,680,727.00 | 60.26% | $ 1,702,181,070.00 | 51.91% | $ 1,466,435,417.00 |
| 25 | SEM 25 | 19/03/2026 | $ 149,758,087 | 5.30% | 1.65% | $ 46,684,366.00 | $ 103,073,721.00 | 65.56% | $ 1,851,939,157.00 | 53.56% | $ 1,513,119,783.00 |
| 26 | SEM 26 | 26/03/2026 | $ 129,089,554 | 4.57% | 3.31% | $ 93,368,732.00 | $ 35,720,822.00 | 70.13% | $ 1,981,028,711.00 | 56.87% | $ 1,606,488,515.00 |
| 27 | SEM 27 | 2/04/2026 | $ 153,455,255 | 5.43% | 7.29% | $ 205,922,820.00 | -$ 52,467,565.00 | 75.56% | $ 2,134,483,966.00 | 64.16% | $ 1,812,411,335.00 |
| 28 | SEM 28 | 9/04/2026 | $ 142,675,377 | 5.05% | 4.83% | $ 136,535,783.00 | $ 6,139,594.00 | 80.61% | $ 2,277,159,343.00 | 68.99% | $ 1,948,947,118.00 |
| 29 | SEM 29 | 16/04/2026 | $ 195,438,873 | 6.92% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 135,109,820.00 | 87.53% | $ 2,472,598,216.00 | 80.69% | $ 2,279,495,811.00 |
| 30 | SEM 30 | 23/04/2026 | $ 56,148,389 | 1.99% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 274,400,304.00 | 89.52% | $ 2,528,746,605.00 | 92.39% | $ 2,610,044,504.00 |
| 31 | SEM 31 | 30/04/2026 | $ 10,449,797 | 0.37% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 320,098,896.00 | 89.89% | $ 2,539,196,402.00 | 104.10% | $ 2,940,593,197.00 |
| 32 | SEM 32 | 7/05/2026 | $ - | 0.00% | 1.01% | $ 28,542,222.29 | -$ 28,542,222.29 | 89.89% | $ 2,539,196,402.00 | 105.11% | $ 2,969,135,419.29 |
| 33 | SEM 33 | 14/05/2026 | $ 7,610,997.19 | 0.27% | 0.15% | $ 4,238,591.80 | $ 3,372,405.39 | 90.16% | $ 2,546,807,399.19 | 105.26% | $ 2,973,374,011.09 |
| 34 | SEM 34 | 21/05/2026 | $ 9,768,829.83 | 0.35% | 0.00% | $ 77,556.48 | $ 9,691,273.35 | 90.50% | $ 2,556,576,229.02 | 105.26% | $ 2,973,451,567.57 |
| 35 | SEM 35 | 28/05/2026 | $ 8,748,496.46 | 0.31% | 0.00% | $ 77,556.48 | $ 8,670,939.98 | 90.81% | $ 2,565,324,725.48 | 105.26% | $ 2,973,529,124.05 |
| 36 | SEM 36 | 4/06/2026 | $ 8,435,451.79 | 0.30% | 1.03% | $ 29,141,324.08 | -$ 20,705,872.29 | 91.11% | $ 2,573,760,177.27 | 106.29% | $ 3,002,670,448.13 |
| 37 | SEM 37 | 11/06/2026 | $ 9,377,523.99 | 0.33% | 0.61% | $ 17,241,348.69 | -$ 7,863,824.70 | 91.44% | $ 2,583,137,701.26 | 106.90% | $ 3,019,911,796.82 |
| 38 | SEM 38 | 18/06/2026 | $ 12,438,524.11 | 0.44% | 0.78% | $ 21,997,978.32 | -$ 9,559,454.21 | 91.88% | $ 2,595,576,225.37 | 107.68% | $ 3,041,909,775.14 |
| 39 | SEM 39 | 25/06/2026 | $ 10,342,404.12 | 0.37% | 0.03% | $ 811,556.67 | $ 9,530,847.45 | 92.25% | $ 2,605,918,629.49 | 107.71% | $ 3,042,721,331.81 |
| 40 | SEM 40 | 2/07/2026 | $ 11,368,920.36 | 0.40% | 0.00% | $ - | $ 11,368,920.36 | 92.65% | $ 2,617,287,549.85 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 41 | SEM 41 | 9/07/2026 | $ 7,414,110.12 | 0.26% | 0.00% | $ - | $ 7,414,110.12 | 92.91% | $ 2,624,701,659.97 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 42 | SEM 42 | 16/07/2026 | $ 30,285,878.89 | 1.07% | 0.00% | $ - | $ 30,285,878.89 | 93.99% | $ 2,654,987,538.86 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 43 | SEM 43 | 23/07/2026 | $ 27,404,109.91 | 0.97% | 0.00% | $ - | $ 27,404,109.91 | 94.96% | $ 2,682,391,648.77 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 44 | SEM 44 | 30/07/2026 | $ 14,952,840.10 | 0.53% | 0.00% | $ - | $ 14,952,840.10 | 95.49% | $ 2,697,344,488.87 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 45 | SEM 45 | 6/08/2026 | $ 45,762,755.02 | 1.62% | 0.00% | $ - | $ 45,762,755.02 | 97.11% | $ 2,743,107,243.89 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 46 | SEM 46 | 13/08/2026 | $ 61,169,408.68 | 2.17% | 0.00% | $ - | $ 61,169,408.68 | 99.27% | $ 2,804,276,652.57 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 47 | SEM 47 | 20/08/2026 | $ 20,603,614.88 | 0.73% | 0.00% | $ - | $ 20,603,614.88 | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 48 | SEM 48 | 27/08/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,042,721,331.81 |
| 49 | SEM 49 | 3/09/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,042,721,331.81 |
| | | | $ 2,824,880,267.45 | | | | | | | | |

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155350**

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **DEL** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 275 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.**
**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista se encuentra en labores de pintura en canal y construccion de placa en concreto

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en los canales, el aplanamiento y nivelación del terreno, así como el alistamiento para la instalación de la malla electrosoldada como parte de las actividades constructivas programadas. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad. Asimismo, se recomienda mantener las condiciones de orden y aseo en el frente de obra y realizar supervisión permanente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para prevenir incidentes y accidentes laborales.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos de lonas (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** N/A.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realizan observaciones minimas.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **DEL** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 275 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se continua con actividades de demolicion de placa, excavacion y armado de acero para zapatas y vigas

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la excavación, instalación de geotextil y fundida de solados en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y realizó inspección a las condiciones de seguridad implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista ajustar y reforzar el cerramiento perimetral, teniendo en cuenta el próximo retorno de los estudiantes a la institución educativa, con el fin de garantizar una adecuada delimitación del área de trabajo, restringir el acceso de personal no autorizado y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.
Asimismo, se reitera la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, verificando que estos sean utilizados de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad y conforme a los procedimientos de SST

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia residuos de excavación (volumen bajo), por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** Se realiza un ajuste al diseño de la viga en cuanto a sus niveles, autorizando la elevación de la parte superior en 10 cm, con el fin de evitar que quede a ras del terreno y minimizar el riesgo de afectaciones por humedad.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que algunos tramos ya contaban con excavación ejecutada, se autoriza la colocación de concreto ciclópeo para la nivelación de la excavación.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se efectuo estructuracion de muros, estucado y aplicación de pintura

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al masillado de muros, retiro de luminarias y aplicación de pintura blanca en las áreas intervenidas. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y realizó seguimiento a las condiciones de SST implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de todo el personal, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad. Asimismo, se recomienda mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de orden y aseo, con el fin de prevenir incidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro durante la ejecución de las actividades.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** En atención al esquema requerido por la SED, se ejecutan las demoliciones correspondientes. Adicionalmente, conforme a lo acordado en comité, se autoriza la instalación de cielo raso en drywall en la biblioteca del tercer piso, con el propósito de conservar la uniformidad del diseño y dar continuidad al acabado del cielo raso.

## EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:**

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa. Se espera una visita de verificacion por parte de la supervision para verificar en conjunto y que el colegio reciba a satisfaccion

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se desmonto puerta para ser pintada en electrostatica. El contratista indica que division de baño en acero se encuentra en produccion

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** La supervision solicita la intervencion en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostatica (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente). Se realizan labores en taller para hacer instalacion de divisiones la proximamente.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervision y a la institucion educativa

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **DEL** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 275 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** La interventoria programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoria fueron atendidas.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE**

**1. Actividades Tecnicas:** Las labores ya se finalizaron

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** la emergencia ya fue atendida

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza la desinstalación de las puertas de los baños del primer piso y la remoción del enchape existente. Asimismo, se realiza el suministro del nuevo enchape para su posterior instalación.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado y residuos sin señalizar ni acopiar, por lo que se recomienda disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B**

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista esta estructurando los esquemas de intervencion estructural en la sede, esta debera ser verificada y aprobada por el equipo de interventoria para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoria esta a la espera que se radique la informacion adicional a esto se realizara inpeccion para evaluar si la mamposteria es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificacion.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realizara la verificacion de la conformacion del muro, esto incluye demolicion de un tramo pequeño de muro, para verificar como esta amarrado al sistema aporticado, esto con el fin de definir el alcance de la intervencion. Estas labores se programan para la siguiente semana.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se realiza visita de verificacion por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza visita de verificacion conjunta con profesionales electricos en respuesta a esto el contratista remitira una propuesta de intervencion para aprobacion de interventoria.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** Se aclara que la ficha SAE se enfoca unicamente en la intervencion de los puntos fijos, en la que se debe cambiar la cubierta traslucida en atencion a las especificaciones claras que se indican en ficha.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Por solicitud del ingeniero apoyo a la supervision se realiza intervención en el tanque de almacenamiento de agua, efectuando las labores de limpieza y desinfección del mismo.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:**

**FIRMAS**

**ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

**ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO**
PROFESIONAL SST

**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN**
ESPECIALISTA AMBIENTAL

**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

**ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO**
ESPECIALISTA ELECTRICO

**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS**
ESPECIALISTA HIDRAULICO

**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ**
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **DEL** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Aplicación de pintura en canal con pistola de pulverización.




Nivelación y compactación de subabase




Armadura de malla electrosoldada de 5mm




Fundida de placa

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **36** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 261 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B




Instalación geotextil




Fundido de concreto pobre




Excavación manual




Alistamiento de zapatas y columnas para fundición

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 39** **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 39 (Consecutivo) **DEL** 29/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 5/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO

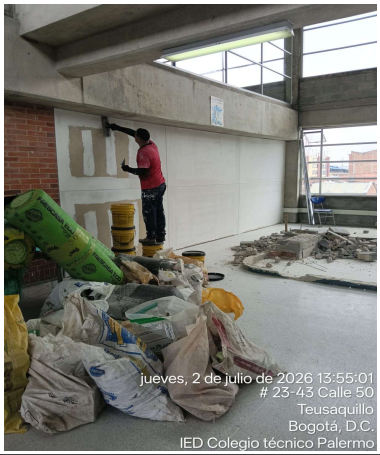



Masillado en miuro de superboard PLANTA 3




Retiro de tuberia de gas PLANTA 1




Aplicación de vinilo blanco tipo 1 PLANTA 1

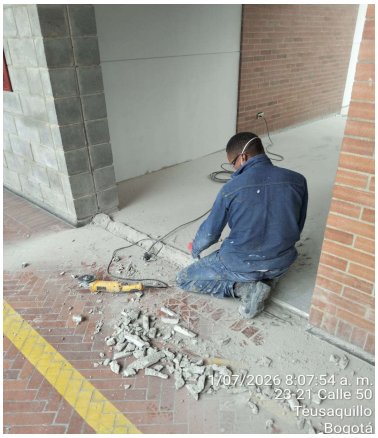


Demolición de cinta con pulidora PLANTA 3




Instalación de bocapuerta en granito
