PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 42: LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	42	DEL	20/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	26/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	296 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18		

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,659,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	2.45%	89.84%	Obra Física Ejecutada (%)	1.47%	93.03%
Valor de la Obra Programada:	$ 74,353,207.00	$ 3,287,611,591.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 44,463,163.00	$ 3,404,109,100.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	87.39%	91.56%	
Durante el periodo	2.45%	1.47%	3.16%
Acumulado actual	89.84%	93.03%	

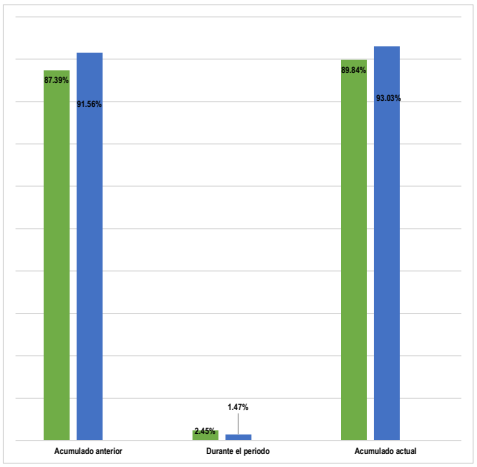

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	18.45%	13.06%	-5.39%	58.93%	77.00%	18.07%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	8.54%	3.08%	-5.46%	30.20%	46.86%	16.66%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			13.50%	8.07%	-5.43%	44.57%	61.93%	17.37%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			2.45%	1.47%	-0.99%	89.92%	93.08%	3.16%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	27.55%	$ 23,556,324.45		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,202,176.36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,970,364.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,347,316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 16,445,268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 126,636,146.95		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 12,894,594.56		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	70.00%	70.00%	0.00%	$ 104,218,947.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,066,280.00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 98,338,906.00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 93,938,430.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	50.00%	50.00%	0.00%	$ 6,823,040.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	55.00%	55.00%	0.00%	$ 123,079,032.60		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			65.00%	63.16%	-1.84%	$ 667,043,161.18	$ 628,932,199.00	-$ 38,110,962.18

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA			$ 3,659,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$	401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$	392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$	419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$	335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$	340,158,088.00	
VALOR PARCIAL N°6	$	960,277,947.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$	2,849,129,420.00	
SUMAS IGUALES			$ 810,129,849.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 2,849,129,420.00	$ 2,849,129,420.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	89.84%	93.03%	3.16%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	296	9.35

CURVA S

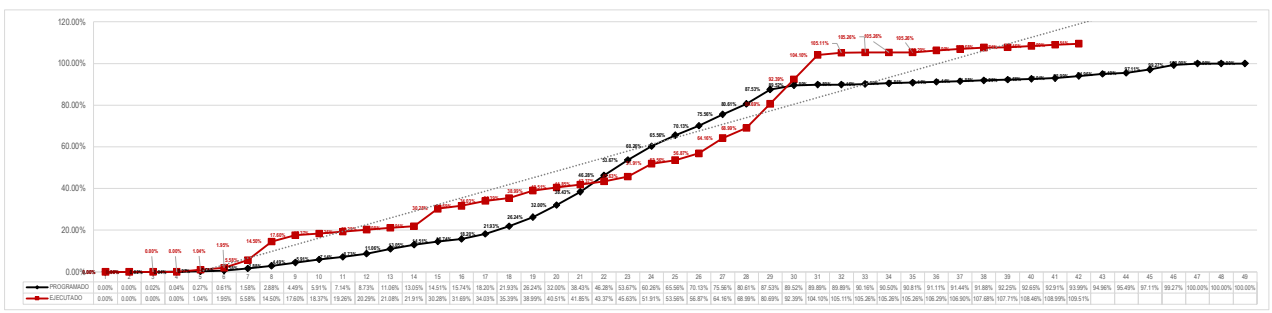

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.04%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.95%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.58%	$ 44,738,268.00	5.58%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.88%	$ 81,229,800.00	14.50%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.49%	$ 126,911,877.00	17.60%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.91%	$ 166,813,337.00	18.37%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.14%	$ 201,714,046.00	19.26%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.73%	$ 246,517,349.00	20.29%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.06%	$ 312,308,281.00	21.08%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.05%	$ 368,556,270.00	21.91%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.51%	$ 409,790,998.00	30.28%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.74%	$ 444,749,788.00	31.69%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.20%	$ 514,112,112.00	34.03%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	21.93%	$ 619,454,498.00	35.39%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.24%	$ 741,303,536.00	38.99%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.75%	1.52%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.00%	$ 903,854,742.00	40.51%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.43%	$ 1,085,654,721.00	41.85%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.85%	1.52%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.28%	$ 1,307,288,437.00	43.37%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.39%	2.26%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	53.67%	$ 1,516,035,801.00	45.63%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.59%	6.28%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.26%	$ 1,702,181,070.00	51.91%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.30%	1.65%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	65.56%	$ 1,851,939,157.00	53.56%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.57%	3.31%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.13%	$ 1,981,028,711.00	56.87%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.43%	7.29%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	75.56%	$ 2,134,483,966.00	64.16%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.05%	4.83%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	80.61%	$ 2,277,159,343.00	68.99%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.92%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	87.53%	$ 2,472,598,216.00	80.69%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	1.99%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	89.52%	$ 2,528,746,605.00	92.39%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	89.89%	$ 2,539,196,402.00	104.10%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.01%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	89.89%	$ 2,539,196,402.00	105.11%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	$ 4,238,591.80	$ 3,372,405.39	90.16%	$ 2,546,807,399.19	105.26%	$ 2,973,374,011.09
34	SEM 34	21/05/2026	$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	$ 77,556.48	$ 9,691,273.35	90.50%	$ 2,556,576,229.02	105.26%	$ 2,973,451,567.57
35	SEM 35	28/05/2026	$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	$ 77,556.48	$ 8,670,939.98	90.81%	$ 2,565,324,725.48	105.26%	$ 2,973,529,124.05
36	SEM 36	4/06/2026	$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	$ 29,141,324.08	-$ 20,705,872.29	91.11%	$ 2,573,760,177.27	106.29%	$ 3,002,670,448.13
37	SEM 37	11/06/2026	$ 9,377,523.99	0.33%	0.61%	$ 17,241,348.69	-$ 7,863,824.70	91.44%	$ 2,583,137,701.26	106.90%	$ 3,019,911,796.82
38	SEM 38	18/06/2026	$ 12,438,524.11	0.44%	0.78%	$ 21,997,978.32	-$ 9,559,454.21	91.88%	$ 2,595,576,225.37	107.68%	$ 3,041,909,775.14
39	SEM 39	25/06/2026	$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	$ 811,556.67	$ 9,530,847.45	92.25%	$ 2,605,918,629.49	107.71%	$ 3,042,721,331.81
40	SEM 40	2/07/2026	$ 11,368,920.36	0.40%	0.75%	$ 21,258,481.25	-$ 9,889,560.89	92.65%	$ 2,617,287,549.85	108.46%	$ 3,063,979,813.06
41	SEM 41	9/07/2026	$ 7,414,110.12	0.26%	0.53%	$ 14,925,591.84	-$ 7,511,481.72	92.91%	$ 2,624,701,659.97	108.99%	$ 3,078,905,404.90
42	SEM 42	16/07/2026	$ 30,285,878.89	1.07%	0.52%	$ 14,732,788.33	$ 15,553,090.56	93.99%	$ 2,654,987,538.86	109.51%	$ 3,093,638,193.23
43	SEM 43	23/07/2026	$ 27,404,109.91	0.97%	0.00%	$ -	$ 27,404,109.91	94.96%	$ 2,682,391,648.77		$ 3,093,638,193.23
44	SEM 44	30/07/2026	$ 14,952,840.10	0.53%	0.00%	$ -	$ 14,952,840.10	95.49%	$ 2,697,344,488.87		$ 3,093,638,193.23
45	SEM 45	6/08/2026	$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	$ -	$ 45,762,755.02	97.11%	$ 2,743,107,243.89		$ 3,093,638,193.23
46	SEM 46	13/08/2026	$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	$ -	$ 61,169,408.68	99.27%	$ 2,804,276,652.57		$ 3,093,638,193.23
47	SEM 47	20/08/2026	$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	$ -	$ 20,603,614.88	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,093,638,193.23
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,093,638,193.23
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,093,638,193.23
			$ 2,824,880,267.45								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el relleno con material PEA y posteriormente la ejecución de la placa. Asimismo, se efectuó el cerramiento del área donde se ejecutará la placa frente al aula modular y se inició la excavación correspondiente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la excavación para la construcción de la placa de piso perimetral de la rampa del salón modular. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó que el frente de obra contaba con cerramiento en lona para la delimitación del área de intervención y que el personal hacía uso adecuado de los EPP requeridos para la ejecución de las labores.
Asimismo, se recomendó al Contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo mediante el retiro oportuno de los materiales y residuos generados durante la excavación, con el fin de mantener condiciones seguras en el frente de trabajo. De igual manera, se reiteró la importancia de conservar la señalización y delimitación del área de intervención y verificar la estabilidad del cerramiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se continua con actividades de demolicion de placa, excavacion, armado de acero para vigas y se inicio con fundida de viga

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se continuó con las actividades de excavación para la construcción del muro y el armado de la viga de cimentación. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de SST implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se reiteró al Contratista la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas. Asimismo, se recomendó mantener la adecuada señalización y delimitación del área de excavación, realizar el diligenciamiento y socialización oportuna del ATS, fortalecer las jornadas de orden y aseo mediante el retiro de materiales y residuos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos de excavación (volumen medio), por lo que se recomienda señalizarlo y acopiarlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizo la entrega de uno de los salones del tercer piso. De igual manera se efectuo la instalación de piso, se continuó con la ejecución de las actividades eléctricas, incluyendo tuberías y acometidas, y se realizó la instalación del cielo raso.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de desmonte de salidas para tomacorriente, cableado de red eléctrica, instalación de lámina de superboard para cielorraso, entre otras labores propias de la ejecución del proyecto. Durante las inspecciones realizadas se verificó el uso adecuado de escaleras para la ejecución de los trabajos y el uso de los EPP por parte del personal. Se recomienda continuar fortaleciendo el cumplimiento de las medidas de seguridad, promoviendo el uso permanente y correcto de los EPP, así como la inspección previa de las escaleras antes de su utilización para prevenir incidentes durante el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
•SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La Supervisión solicita que la tubería quede por debajo del cielo raso. Al respecto, la Interventoría recuerda que esta solución no puede ejecutarse con tubería EMT, dadas las implicaciones en el procedimiento constructivo y los costos asociados. Se considera la tuberia SCH40

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa. Se espera una visita de verificacion por parte de la supervision para verificar en conjunto y que el colegio reciba a satisfaccion

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra pendiente la instalación de la división del baño.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervision y a la institucion educativa. Durante la semana, el contratista, en compañía del especialista hidráulico, realizó la revisión de la conexión al tablero principal e inició las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La supervicion emite ficha para atencion de emergencia silvicultural. El contratista realizó la revisión correspondiente. Se esta a la espera de la ejecución de las actividades.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoria programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoria fueron atendidas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se han ejecutado actividades de pañetado en los baños; sin embargo, se solicita mejorar la calidad de los acabados. De igual manera, se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape que se encuentran fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas. Adicionalmente, se debe realizar la culminación de las actividades pendientes en los baños del primer piso.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades en el frente de obra, donde se identificaron observaciones formuladas por la interventoría, las cuales se encuentran pendientes de subsanación por parte del contratista. Durante las inspecciones realizadas se verificaron las condiciones de orden y aseo del área de trabajo. Asimismo, se recomienda mantener el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y promover condiciones seguras de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, por lo que se requiere mayor cuidado en la ejecución de los acabados. Adicionalmente se evidenció que las divisiones fijas presentan movimiento, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la inspección del frente, evidenciando que la mampostería corresponde principalmente a ladrillo prensado liviano y que presenta algunas dovelas. No obstante, se encuentra pendiente la definición de las actividades a ejecutar, de acuerdo con el análisis de la información recopilada.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas (Volumen bajo), se recomienda realizar jornadas de orden y aseo, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se esta a la espera de radicacion de esquema por parte del contratista

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista informa que durante la próxima semana se iniciará actividad en este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección del mismo por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Fundida de placa



Tratamiento de superficie en cerramiento perimetral de la institución



Excavacion manuel de 20cm de profundiad. Se evidencia cerramiento en lona.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 42 (Consecutivo) **36** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 281 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Armado de viga de cimentación.

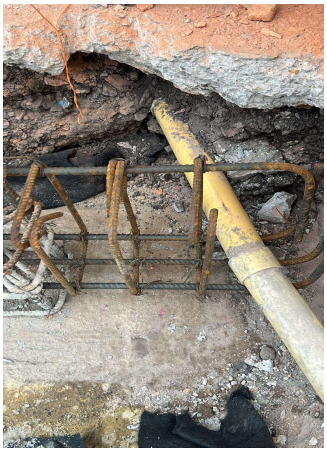

Evidencia de tubo proveniente de cárcamo.



Vaciado de concreto de limpieza.



Instalación de camisa al tubo que sale al cárcamo.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **36** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 281 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B




Instalación de formaleta.



Fundida de viga.



Fundida de viga para muro.

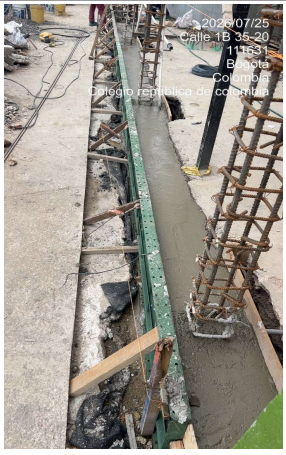

Fundida de viga para muro.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO




Instalacion de laminas de superboard, para el cielo raso. Incluye dilataores y masillado.



Instalacion de tuberia electrica EMT



Aplicación de desmanchador nitrico para limpieza de mamposteria

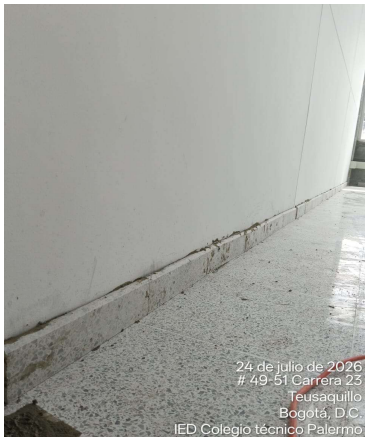

Instalación de guardaescobas



Instalación de piso.
