INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 43

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N° 43 DEL 27/07/2026 (DD-MM-AA) AL 2/08/2026 (DD-MM-AA)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°: CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)

LOTE COP: 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25	INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR	RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00	VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00		
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00		
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00		
Valor adicional No. 3:	$ 310,000,000.00		
Valor inicial No. 3 emergencias:	$		
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ 310,000,000.00		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,969,259,269.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,340,327,070.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/01/2027	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/01/2027


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.60%	90.52%	Obra Física Ejecutada (%)	3.18%	94.23%
Valor de la Obra Programada:	$ 19,890,129.00	$ 3,592,793,069.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 106,283,134.00	$ 3,740,305,178.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	89.92%	91.05%	3.72%
Durante el periodo	0.60%	3.18%	
Acumulado actual	90.52%	94.23%	

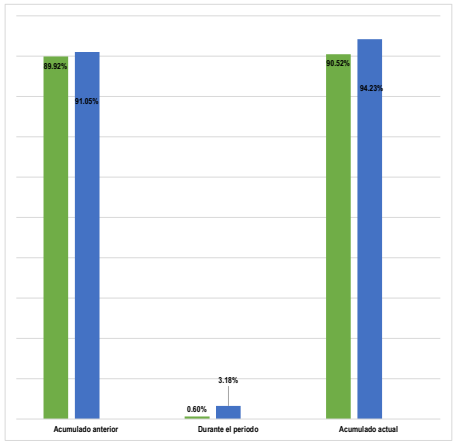

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	5.36%	27.54%	22.18%	64.29%	82.33%	18.04%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	1.19%	7.46%	6.27%	31.39%	54.32%	22.93%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			3.28%	17.50%	14.23%	47.84%	68.33%	20.49%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.60%	3.18%	2.59%	90.52%	94.24%	3.72%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 23,556,324.45		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,202,176.36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,970,364.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,347,316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 16,445,268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 126,636,146.95		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 12,894,594.56		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	70.00%	70.00%	0.00%	$ 104,218,947.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,066,280.00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 98,338,906.00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 93,938,430.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	50.00%	50.00%	0.00%	$ 6,823,040.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	62.00%	62.00%	0.00%	$ 123,079,032.60		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			65.47%	63.63%	-1.84%	$ 667,043,161.18	$ 628,932,199.00	-$ 38,110,962.18

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,969,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 960,277,947.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 267,388,536.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3,116,557,956.00	
SUMAS IGUALES		$ 852,741,313.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 3,116,517,956.00	$ 3,116,517,956.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	90.52%	94.23%	3.72%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	303	11.29

CURVA S

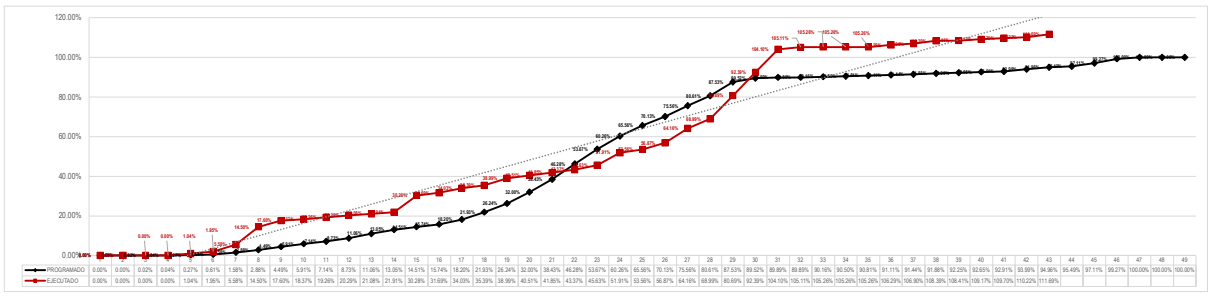

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.04%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.95%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.58%	$ 44,738,268.00	5.58%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.88%	$ 81,229,800.00	14.50%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.49%	$ 126,911,877.00	17.60%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.91%	$ 166,813,337.00	18.37%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.14%	$ 201,714,046.00	19.26%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.73%	$ 246,517,349.00	20.29%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.06%	$ 312,308,281.00	21.08%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.05%	$ 368,556,270.00	21.91%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.51%	$ 409,790,998.00	30.28%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.74%	$ 444,749,788.00	31.69%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.20%	$ 514,112,112.00	34.03%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	21.93%	$ 619,454,498.00	35.39%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.24%	$ 741,303,536.00	38.99%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.75%	1.52%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.00%	$ 903,854,742.00	40.51%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.43%	$ 1,085,654,721.00	41.85%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.85%	1.52%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.28%	$ 1,307,288,437.00	43.37%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.39%	2.26%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	53.67%	$ 1,516,035,801.00	45.63%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.59%	6.28%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.26%	$ 1,702,181,070.00	51.91%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.30%	1.65%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	65.56%	$ 1,851,939,157.00	53.56%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.57%	3.31%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.13%	$ 1,981,028,711.00	56.87%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.43%	7.29%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	75.56%	$ 2,134,483,966.00	64.16%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.05%	4.83%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	80.61%	$ 2,277,159,343.00	68.99%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.92%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	87.53%	$ 2,472,598,216.00	80.69%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	1.99%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	89.52%	$ 2,528,746,605.00	92.39%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	89.89%	$ 2,539,196,402.00	104.10%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.01%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	89.89%	$ 2,539,196,402.00	105.11%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	$ 4,238,591.80	$ 3,372,405.39	90.16%	$ 2,546,807,399.19	105.26%	$ 2,973,374,011.09
34	SEM 34	21/05/2026	$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	$ 77,556.48	$ 9,691,273.35	90.50%	$ 2,556,576,229.02	105.26%	$ 2,973,451,567.57
35	SEM 35	28/05/2026	$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	$ 77,556.48	$ 8,670,939.98	90.81%	$ 2,565,324,725.48	105.26%	$ 2,973,529,124.05
36	SEM 36	4/06/2026	$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	$ 29,141,324.08	-$ 20,705,872.29	91.11%	$ 2,573,760,177.27	106.29%	$ 3,002,670,448.13
37	SEM 37	11/06/2026	$ 9,377,523.99	0.33%	0.61%	$ 17,241,348.69	-$ 7,863,824.70	91.44%	$ 2,583,137,701.26	106.90%	$ 3,019,911,796.82
38	SEM 38	18/06/2026	$ 12,438,524.11	0.44%	1.48%	$ 41,860,283.21	-$ 29,421,759.10	91.88%	$ 2,595,576,225.37	108.39%	$ 3,061,772,080.03
39	SEM 39	25/06/2026	$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	$ 811,556.67	$ 9,530,847.45	92.25%	$ 2,605,918,629.49	108.41%	$ 3,062,583,636.70
40	SEM 40	2/07/2026	$ 11,368,920.36	0.40%	0.75%	$ 21,258,481.25	-$ 9,889,560.89	92.65%	$ 2,617,287,549.85	109.17%	$ 3,083,842,117.95
41	SEM 41	9/07/2026	$ 7,414,110.12	0.26%	0.53%	$ 14,925,591.84	-$ 7,511,481.72	92.91%	$ 2,624,701,659.97	109.70%	$ 3,098,767,709.79
42	SEM 42	16/07/2026	$ 30,285,878.89	1.07%	0.52%	$ 14,732,788.33	$ 15,553,090.56	93.99%	$ 2,654,987,538.86	110.22%	$ 3,113,500,498.12
43	SEM 43	23/07/2026	$ 27,404,109.91	0.97%	1.47%	$ 41,510,630.31	-$ 14,106,520.40	94.96%	$ 2,682,391,648.77	111.69%	$ 3,155,011,128.43
44	SEM 44	30/07/2026	$ 14,952,840.10	0.53%	0.00%	$ -	$ 14,952,840.10	95.49%	$ 2,697,344,488.87		$ 3,155,011,128.43
45	SEM 45	6/08/2026	$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	$ -	$ 45,762,755.02	97.11%	$ 2,743,107,243.89		$ 3,155,011,128.43
46	SEM 46	13/08/2026	$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	$ -	$ 61,169,408.68	99.27%	$ 2,804,276,652.57		$ 3,155,011,128.43
47	SEM 47	20/08/2026	$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	$ -	$ 20,603,614.88	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,155,011,128.43
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,155,011,128.43
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,155,011,128.43
			$ 2,824,880,267.45								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron labores de excavación para la placa ubicada frente al aula modular, relleno con material PEA, instalación de malla electrosoldada y ejecución de la placa. Asimismo, se continúa con las actividades de mantenimiento del cerramiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la excavación para la construcción de la placa ubicada frente al aula modular. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas en el frente de obra.
Asimismo, se evidenciaron labores de limpieza en el área del cerramiento, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de orden y aseo. No obstante, la Interventoría recomendó al contratista realizar el acopio del material en un único lugar debidamente delimitado y señalizado, con el fin de optimizar la organización del área de trabajo y reducir la posibilidad de incidentes o accidentes.
De igual manera, se reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, mantener la correcta señalización de las áreas intervenidas y efectuar el retiro oportuno de los residuos generados durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se llevo a cabo fundida de un tramo de la viga. Asimismo, se realizó la fundida de algunas de las columnas. Adicionalmente, se finalizaron las labores de excavación y se ejecutó el armado del acero de refuerzo y fundida de los solados.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al armado de columnas, el armado de acero en la viga de cimentación y el formaleteado de la viga de cimentación. Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer el uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente durante las actividades de fundida de columnas, debido a los riesgos asociados a la manipulación de materiales, herramientas y equipos.
De igual manera, la Interventoría reiteró la importancia de implementar jornadas de orden y aseo, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales, el retiro oportuno de residuos y la correcta delimitación y señalización del área de trabajo, con el propósito de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes y promover condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia ingreso de material granular y se evidencia RCD, por lo que se recomienda señalizarlo y acopiarlos, disponerlo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutó la instalación de piso, destronque e instalacion de granito. Asimismo, se finalizaron los trabajos eléctricos y se realizaron labores de limpieza y emboquillado de guardascobas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de guarda escobas, la instalación de cinta en granito y el emboquillado de guarda escobas. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las labores y el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas en el frente de trabajo.
Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, especialmente aquellos relacionados con la manipulación de herramientas, materiales y sustancias empleadas en el proceso de instalación y acabado. De igual manera, se reiteró la importancia de mantener las áreas de trabajo en adecuadas condiciones de orden y aseo, realizar el retiro oportuno de los residuos generados y garantizar la correcta señalización y delimitación de las zonas intervenidas, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. Actividad iniciada
•SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS Actividad iniciada
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. Actividad iniciada
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN Actividad iniciada
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS Actividad iniciada
•DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES Actividad iniciada
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA Actividad iniciada

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, retirar todo al terminar las actividades e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante el comité realizado en la presente semana, se programó una visita de verificación de obra para la semana comprendida entre el 10 y el 14 de agosto de 2026.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza la instalación de la división del baño.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó la conexión para la puesta en funcionamiento del sistema. No obstante, una de las bombas fue retirada para trámite de garantía.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La supervicion emite ficha para atencion de emergencia silvicultural. El contratista realizó la revisión correspondiente. Se esta a la espera de la ejecución de las actividades.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se han ejecutado actividades de pañetado en los baños; sin embargo, se solicita mejorar la calidad de los acabados. De igual manera, se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape que se encuentran fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, se identificaron observaciones formuladas por la interventoría, las cuales se encuentran pendientes de subsanación por parte del contratista.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, por lo que se requiere mayor cuidado en la ejecución de los acabados.
Adicionalmente, se evidenció que las divisiones fijas presentan movimiento, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad. Asimismo, se observó que una de las puertas de la división sanitaria no se encontraba instalada y permanecía apoyada sobre el piso. En el mismo baño se evidenció desprendimiento de enchape en algunos sectores, por lo que se requiere efectuar las reparaciones correspondientes y asegurar la correcta instalación de las divisiones, garantizando su estabilidad y funcionamiento. Se programó una visita de verificación para el 3 de agosto a las 2:00 p. m.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista radicó el esquema correspondiente ante la interventoría.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas (Volumen alto), se recomienda realizar jornadas de orden y aseo, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Las labores se programarán una vez se emita la aprobación por parte de la interventoría, la cual informa que durante la presente semana remitirá la respuesta formal al esquema presentado por el contratista de obra el 30 de julio de 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se programó el inicio de las actividades para el próximo 8 de agosto de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista informa que durante la próxima semana se iniciará actividad en este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección del mismo por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO RIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Mantenimiento de reja de cerramiento perimetral



Fraguado de placa



Limpieza y aseo

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **36** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 288 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Fundida de viga de cimentación.



Fundida de solado

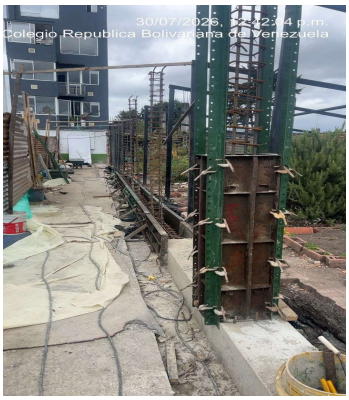

Instalación de formaleta para fundida de columnas.



Fundida de columnas.



Continúa excavación de zapatas para continuación de muro.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Instalacion de cinta en granito



Demolicion de alistado de piso para instalacion de cinta en granito



Instalacion de guardaescobas
