# INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 45

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N° 45 | DEL 10/08/2026 (DD-MM-AA) | AL 16/08/2026 (DD-MM-AA) | Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato) | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N° CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato) | LOTE COP 18

## CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO 25 |
| RL del consorcio | DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR |
| CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8155350 |
| OBJETO | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18" |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 2,551,797,666.00 |
| AIU | 33.17% $ 846,431,285.81 |
| COSTO DIRECTO | $ 1,705,366,380.19 |
| OFERTADO | $ 2,322,865,467.00 |
| EMERGENCIAS | $ 100,000,000.00 |
| VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS | $ 2,422,865,467.00 |
| DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS | $ 128,932,199.00 |
| Valor Parcial (Inicial + Emergencias) | $ 228,932,199.00 |
| Valor adicional No. 1: | $ 645,761,648.00 |
| Valor inicial No. 1 emergencias: | $ 200,000,000.00 |
| Valor adicional No.1 Obras Contractuales: | $ 445,761,648.00 |
| Valor adicional No. 2: | $ 461,699,955.00 |
| Valor inicial No. 2 emergencias: | $ 200,000,000.00 |
| Valor adicional No.2 Obras Contractuales: | $ 261,699,955.00 |
| Valor adicional No. 3: | $ 310,000,000.00 |
| Valor inicial No. 3 emergencias: | $ |
| Valor adicional No.3 Obras Contractuales: | $ 310,000,000.00 |
| VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA | $ 3,969,259,269.00 |
| VALOR TOTAL EMERGENCIAS | $ 628,932,199.00 |
| VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES | $ 3,340,327,070.00 |
| PLAZO INICIAL | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 01 | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 02 | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO TOTAL | QUINCE (15) MESES |
| FECHA DE INICIACION | 3/10/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 2/05/2026 |
| FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/09/2026 |
| FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/01/2027 |

| | |
|---|---|
| INTERVENTORIA | PROBINTEC S.A.S |
| RL de interventoria | DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ |
| CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8168931 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6 |
| VALOR INICIAL | $ 796,278,922.00 |
| VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025 | $ 139,026,666.00 |
| VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026 | $ 219,541,737.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 1,154,847,325.00 |
| PLAZO INICIAL | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 01 | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL No. 01 | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO TOTAL | QUINCE (15) MESES |
| FECHA DE INICIACION | 3/10/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 2/05/2026 |
| FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/09/2026 |
| FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA | 2/01/2027 |


## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra Programada (%) | 0.39% | 97.38% | Obra Física Ejecutada (%) | 0.00% | 97.79% |
| Valor de la Obra Programada: | $ 12,905,809.00 | $ 3,865,120,339.00 | Valor de la Obra Ejecutada: | $ - | $ 3,881,538,639.00 |

## GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

### SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

| | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 96.99% | 97.79% | 0.40% |
| Durante el periodo | 0.39% | 0.00% | |
| Acumulado actual | 97.38% | 97.79% | |

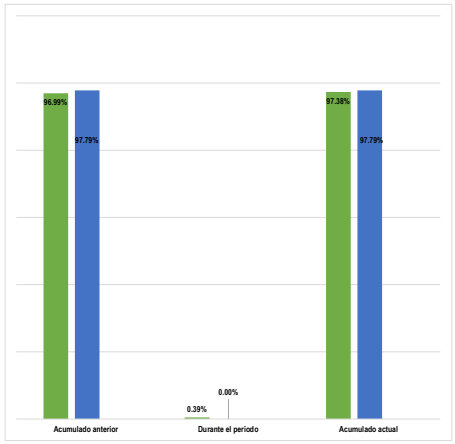


### FRENTES CONTRACTUALES

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | ENGATIVA | RODOLFO LLINAS - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1052 | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1019 | ENGATIVA | JORGE GAITAN CORTES - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1008 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01 | | | | | | |
| 1021 | ENGATIVA | ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1079 | ENGATIVA | ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02 | | | | | | |
| 1301 | TEUSAQUILLO | TÉCNICO PALERMO - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 1032 | ENGATIVA | REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B | 4.25% | 0.00% | -4.25% | 71.20% | 75.65% | 4.45% |
| | | TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02 | 2.13% | 0.00% | -2.13% | 85.60% | 87.83% | 2.23% |
| | | TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02 | 0.39% | 0.00% | -0.39% | 97.38% | 97.79% | 0.40% |

### EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | ENGATIVA | DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA | 100.00% | 72.45% | -27.55% | $ 23,556,324.45 | | |
| 1057 | ENGATIVA | LA PALESTINA - SEDE B | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 1,202,176.36 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 34,970,364.00 | | |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 6,347,316.24 | | |
| 1025 | ENGATIVA | MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 16,445,268.58 | | |
| 1073 | ENGATIVA | TORQUIGUA - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 126,636,146.95 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 12,894,594.56 | | |
| 1080 | ENGATIVA | LUICILA RUBIO DE LAVERDE | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 5,658,378.00 | | |
| 1049 | ENGATIVA | JUAN DEL CORRAL - SEDE A | 75.00% | 75.00% | 0.00% | $ 104,218,947.00 | | |
| | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE B | 35.00% | 35.00% | 0.00% | $ 10,066,280.00 | | |
| 1016 | ENGATIVA | JORGE GAITAN CORTES - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ 98,338,906.00 | | |
| | ENGATIVA | SAN JOSE NORTE - SEDE A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $ 93,938,430.00 | | |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A | 50.00% | 50.00% | 0.00% | $ 6,823,040.00 | | |
| | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE A | 89.00% | 89.00% | 0.00% | $ 123,079,032.60 | | |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL) | 100.00% | 100.00% | 0.00% | $ 2,867,956.44 | | |
| | | TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS | 76.60% | 74.76% | -1.84% | $ 667,043,161.18 | $ 628,932,199.00 | -$ 38,110,962.18 |

## AVANCE FINANCIERO

| VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA | | $ 3,969,259,269.00 |
|---|---|---|
| VALOR PARCIAL N°1 | $ 401,759,151.00 | |
| VALOR PARCIAL N°2 | $ 392,605,364.00 | |
| VALOR PARCIAL N°3 | $ 419,080,656.00 | |
| VALOR PARCIAL N°4 | $ 335,248,214.00 | |
| VALOR PARCIAL N°5 | $ 340,158,088.00 | |
| VALOR PARCIAL N°6 | $ 960,277,947.00 | |
| VALOR PARCIAL N°6 | $ 267,388,536.00 | |
| TOTAL VALOR FACTURADO | $ 3,116,557,956.00 | |
| SUMAS IGUALES | | $ 852,741,313.00 |


| | VALOR FACTURADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| INDICADOR FINACIERO | $ 3,116,517,956.00 | $ 3,116,517,956.00 |

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

| INDICADOR TECNICO | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO | % RETRASO - / % ADELANTO + |
|---|---|---|---|
| | 97.38% | 97.79% | 0.40% |

| INDICADOR TIEMPO | DIAS | RETRASO |
|---|---|---|
| | 317 | 1.28 |

## CURVA S

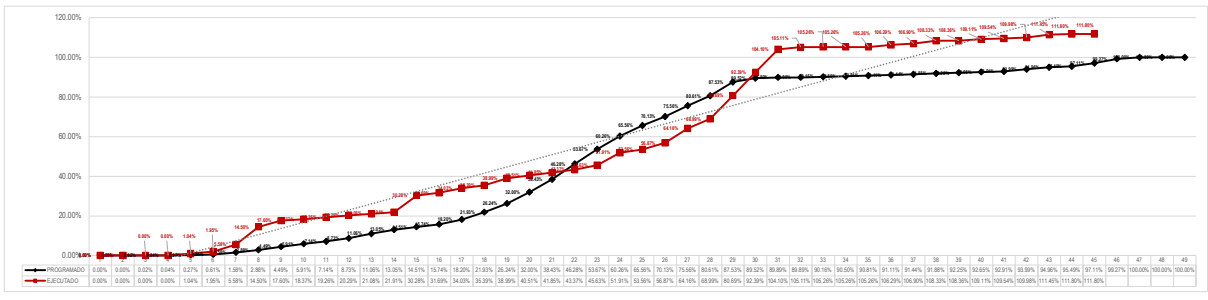


SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

## SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

| INFORME | PROGRAMACION | | | | REAL | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEMANA | FECHA | PROGRAMADO | %PROGRAMADO | AVANCE | EJECUTADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
| 1 | SEM 1 | 3/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 2 | SEM 2 | 9/10/2025 | $ - | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 0.00% | $ - | 0.00% | $ - |
| 3 | SEM 3 | 16/10/2025 | $ 452,000.00 | 0.02% | 0.00% | $ - | $ 452,000.00 | 0.02% | $ 452,000.00 | 0.00% | $ - |
| 4 | SEM 4 | 23/10/2025 | $ 726,000.00 | 0.03% | 0.00% | $ - | $ 726,000.00 | 0.04% | $ 1,178,000.00 | 0.00% | $ - |
| 5 | SEM 5 | 30/10/2025 | $ 6,389,251.00 | 0.23% | 1.04% | $ 29,416,873.00 | -$ 23,027,622.00 | 0.27% | $ 7,567,251.00 | 1.04% | $ 29,416,873.00 |
| 6 | SEM 6 | 6/11/2025 | $ 9,620,826.00 | 0.34% | 0.91% | $ 25,779,255.00 | -$ 16,158,429.00 | 0.61% | $ 17,188,077.00 | 1.95% | $ 55,196,128.00 |
| 7 | SEM 7 | 13/11/2025 | $ 27,550,191.00 | 0.98% | 3.63% | $ 102,559,453.00 | -$ 75,009,262.00 | 1.58% | $ 44,738,268.00 | 5.58% | $ 157,755,581.00 |
| 8 | SEM 8 | 20/11/2025 | $ 36,491,532.00 | 1.29% | 8.91% | $ 251,731,418.00 | -$ 215,239,886.00 | 2.88% | $ 81,229,800.00 | 14.50% | $ 409,486,999.00 |
| 9 | SEM 9 | 27/11/2025 | $ 45,682,077.00 | 1.62% | 3.10% | $ 87,572,933.00 | -$ 41,890,856.00 | 4.49% | $ 126,911,877.00 | 17.60% | $ 497,059,932.00 |
| 10 | SEM 10 | 4/12/2025 | $ 39,901,460.00 | 1.41% | 0.77% | $ 21,793,589.00 | $ 18,107,871.00 | 5.91% | $ 166,813,337.00 | 18.37% | $ 518,853,521.00 |
| 11 | SEM 11 | 11/12/2025 | $ 34,900,709.00 | 1.24% | 0.89% | $ 25,093,898.00 | $ 9,806,811.00 | 7.14% | $ 201,714,046.00 | 19.26% | $ 543,947,419.00 |
| 12 | SEM 12 | 18/12/2025 | $ 44,803,303.00 | 1.59% | 1.03% | $ 29,099,062.00 | $ 15,704,241.00 | 8.73% | $ 246,517,349.00 | 20.29% | $ 573,046,481.00 |
| 13 | SEM 13 | 25/12/2025 | $ 65,790,932.00 | 2.33% | 0.79% | $ 22,343,565.00 | $ 43,447,367.00 | 11.06% | $ 312,308,281.00 | 21.08% | $ 595,390,046.00 |
| 14 | SEM 14 | 1/01/2026 | $ 56,247,989.00 | 1.99% | 0.83% | $ 23,469,005.00 | $ 32,778,984.00 | 13.05% | $ 368,556,270.00 | 21.91% | $ 618,859,051.00 |
| 15 | SEM 15 | 8/01/2026 | $ 41,234,728.00 | 1.46% | 8.37% | $ 236,488,719.00 | -$ 195,253,991.00 | 14.51% | $ 409,790,998.00 | 30.28% | $ 855,347,770.00 |
| 16 | SEM 16 | 15/01/2026 | $ 34,958,790.00 | 1.24% | 1.41% | $ 39,956,792.00 | -$ 4,998,002.00 | 15.74% | $ 444,749,788.00 | 31.69% | $ 895,304,562.00 |
| 17 | SEM 17 | 22/01/2026 | $ 69,362,324.00 | 2.46% | 2.34% | $ 66,086,806.00 | $ 3,275,518.00 | 18.20% | $ 514,112,112.00 | 34.03% | $ 961,391,368.00 |
| 18 | SEM 18 | 29/01/2026 | $ 105,342,386.00 | 3.73% | 1.36% | $ 38,340,595.00 | $ 67,001,791.00 | 21.93% | $ 619,454,498.00 | 35.39% | $ 999,731,963.00 |
| 19 | SEM 19 | 5/02/2026 | $ 121,849,038.00 | 4.31% | 3.60% | $ 101,726,291.00 | $ 20,122,747.00 | 26.24% | $ 741,303,536.00 | 38.99% | $ 1,101,458,254.00 |
| 20 | SEM 20 | 12/02/2026 | $ 162,551,206 | 5.75% | 1.52% | $ 42,982,940.00 | $ 119,568,266.00 | 32.00% | $ 903,854,742.00 | 40.51% | $ 1,144,441,194.00 |
| 21 | SEM 21 | 19/02/2026 | $ 181,799,979.00 | 6.44% | 1.34% | $ 37,731,200.00 | $ 144,068,779.00 | 38.43% | $ 1,085,654,721.00 | 41.85% | $ 1,182,172,394.00 |
| 22 | SEM 22 | 26/02/2026 | $ 221,633,716 | 7.85% | 1.52% | $ 42,847,295.00 | $ 178,786,421.00 | 46.28% | $ 1,307,288,437.00 | 43.37% | $ 1,225,019,689.00 |
| 23 | SEM 23 | 5/03/2026 | $ 208,747,364 | 7.39% | 2.26% | $ 63,951,186.00 | $ 144,796,178.00 | 53.67% | $ 1,516,035,801.00 | 45.63% | $ 1,288,970,875.00 |
| 24 | SEM 24 | 12/03/2026 | $ 186,145,269 | 6.59% | 6.28% | $ 177,464,542.00 | $ 8,680,727.00 | 60.26% | $ 1,702,181,070.00 | 51.91% | $ 1,466,435,417.00 |
| 25 | SEM 25 | 19/03/2026 | $ 149,758,087 | 5.30% | 1.65% | $ 46,684,366.00 | $ 103,073,721.00 | 65.56% | $ 1,851,939,157.00 | 53.56% | $ 1,513,119,783.00 |
| 26 | SEM 26 | 26/03/2026 | $ 129,089,554 | 4.57% | 3.31% | $ 93,368,732.00 | $ 35,720,822.00 | 70.13% | $ 1,981,028,711.00 | 56.87% | $ 1,606,488,515.00 |
| 27 | SEM 27 | 2/04/2026 | $ 153,455,255 | 5.43% | 7.29% | $ 205,922,820.00 | -$ 52,467,565.00 | 75.56% | $ 2,134,483,966.00 | 64.16% | $ 1,812,411,335.00 |
| 28 | SEM 28 | 9/04/2026 | $ 142,675,377 | 5.05% | 4.83% | $ 136,535,783.00 | $ 6,139,594.00 | 80.61% | $ 2,277,159,343.00 | 68.99% | $ 1,948,947,118.00 |
| 29 | SEM 29 | 16/04/2026 | $ 195,438,873 | 6.92% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 135,109,820.00 | 87.53% | $ 2,472,598,216.00 | 80.69% | $ 2,279,495,811.00 |
| 30 | SEM 30 | 23/04/2026 | $ 56,148,389 | 1.99% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 274,400,304.00 | 89.52% | $ 2,528,746,605.00 | 92.39% | $ 2,610,044,504.00 |
| 31 | SEM 31 | 30/04/2026 | $ 10,449,797 | 0.37% | 11.70% | $ 330,548,693.00 | -$ 320,098,896.00 | 89.89% | $ 2,539,196,402.00 | 104.10% | $ 2,940,593,197.00 |
| 32 | SEM 32 | 7/05/2026 | $ - | 0.00% | 1.01% | $ 28,542,222.29 | -$ 28,542,222.29 | 89.89% | $ 2,539,196,402.00 | 105.11% | $ 2,969,135,419.29 |
| 33 | SEM 33 | 14/05/2026 | $ 7,610,997.19 | 0.27% | 0.15% | $ 4,238,766.24 | $ 3,372,230.95 | 90.16% | $ 2,546,807,399.19 | 105.26% | $ 2,973,374,185.53 |
| 34 | SEM 34 | 21/05/2026 | $ 9,768,829.83 | 0.35% | 0.00% | $ 77,556.48 | $ 9,691,273.35 | 90.50% | $ 2,556,576,229.02 | 105.26% | $ 2,973,451,742.01 |
| 35 | SEM 35 | 28/05/2026 | $ 8,748,496.46 | 0.31% | 0.00% | $ 77,556.48 | $ 8,670,939.98 | 90.81% | $ 2,565,324,725.48 | 105.26% | $ 2,973,529,298.49 |
| 36 | SEM 36 | 4/06/2026 | $ 8,435,451.79 | 0.30% | 1.03% | $ 29,141,324.08 | -$ 20,705,872.29 | 91.11% | $ 2,573,760,177.27 | 106.29% | $ 3,002,670,622.57 |
| 37 | SEM 37 | 11/06/2026 | $ 9,377,523.99 | 0.33% | 0.60% | $ 17,088,844.05 | -$ 7,711,320.06 | 91.44% | $ 2,583,137,701.26 | 106.90% | $ 3,019,759,466.62 |
| 38 | SEM 38 | 18/06/2026 | $ 12,438,524.11 | 0.44% | 1.44% | $ 40,567,420.99 | -$ 28,128,896.88 | 91.88% | $ 2,595,576,225.37 | 108.33% | $ 3,060,326,887.61 |
| 39 | SEM 39 | 25/06/2026 | $ 10,342,404.12 | 0.37% | 0.03% | $ 759,662.73 | $ 9,582,741.39 | 92.25% | $ 2,605,918,629.49 | 108.36% | $ 3,061,086,550.34 |
| 40 | SEM 40 | 2/07/2026 | $ 11,368,920.36 | 0.40% | 0.74% | $ 21,019,420.25 | -$ 9,650,499.89 | 92.65% | $ 2,617,287,549.85 | 109.11% | $ 3,082,105,970.59 |
| 41 | SEM 41 | 9/07/2026 | $ 7,414,110.12 | 0.26% | 0.44% | $ 12,298,490.01 | -$ 4,884,379.89 | 92.91% | $ 2,624,701,659.97 | 109.54% | $ 3,094,404,460.60 |
| 42 | SEM 42 | 16/07/2026 | $ 30,285,878.89 | 1.07% | 0.44% | $ 12,458,803.48 | $ 17,827,075.41 | 93.99% | $ 2,654,987,538.86 | 109.98% | $ 3,106,863,264.08 |
| 43 | SEM 43 | 23/07/2026 | $ 27,404,109.91 | 0.97% | 1.47% | $ 41,599,471.97 | -$ 14,195,362.06 | 94.96% | $ 2,682,391,648.77 | 111.45% | $ 3,148,462,736.05 |
| 44 | SEM 44 | 30/07/2026 | $ 14,952,840.10 | 0.53% | 0.35% | $ 9,829,625.97 | $ 5,123,214.13 | 95.49% | $ 2,697,344,488.87 | 111.80% | $ 3,158,292,362.02 |
| 45 | SEM 45 | 6/08/2026 | $ 45,762,755.02 | 1.62% | 0.00% | $ - | $ 45,762,755.02 | 97.11% | $ 2,743,107,243.89 | 111.80% | $ 3,158,292,362.02 |
| 46 | SEM 46 | 13/08/2026 | $ 61,169,408.68 | 2.17% | 0.00% | $ - | $ 61,169,408.68 | 99.27% | $ 2,804,276,652.57 | | $ 3,158,292,362.02 |
| 47 | SEM 47 | 20/08/2026 | $ 20,603,614.88 | 0.73% | 0.00% | $ - | $ 20,603,614.88 | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,158,292,362.02 |
| 48 | SEM 48 | 27/08/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,158,292,362.02 |
| 49 | SEM 49 | 3/09/2026 | | 0.00% | 0.00% | $ - | $ - | 100.00% | $ 2,824,880,267.45 | | $ 3,158,292,362.02 |
| | | | $ 2,824,880,267.45 | | | | | | | | |

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155350**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.**
**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se ejecutaron labores de pintura en el aula de contingencia. De igual manera se realizo la instalacion de estructura metalica de la pergola y desmonde y monte de nuevas puertas

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a trabajos de reforzamiento y confinamiento estructural, mediante la construcción de machones fundidos e integrados a los muros existentes de mampostería. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el frente de obra contaba con cerramiento perimetral en adecuadas condiciones, garantizando la delimitación del área intervenida.
Asimismo, se evidenciaron jornadas de orden y aseo, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras en el área de trabajo. La Interventoría recomendó al contratista continuar fortaleciendo el uso adecuado de los EPP, mantener la correcta señalización y delimitación de las áreas intervenidas y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas para las actividades de reforzamiento estructural, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A
**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.
**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.
**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.
**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se da inicio a la elaboracion de muro

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muro en mampostería. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el uso de andamio para la ejecución de estas labores; sin embargo, se identificó que este no cuenta con los elementos de soporte y condiciones requeridas para garantizar un acceso y posicionamiento seguro, evidenciándose que los trabajadores se apoyan sobre una tabla para alcanzar el nivel de trabajo.
Ante esta condición, la Interventoría recomendó al contratista suspender esta práctica y realizar los ajustes necesarios al sistema de acceso y trabajo, garantizando que el andamio cuente con una plataforma de trabajo adecuada, estable y segura, de acuerdo con las condiciones requeridas para la actividad, evitando el uso de elementos improvisados que puedan generar riesgo de caída.
Asimismo, se reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP y la dotación correspondiente a las actividades ejecutadas, así como fortalecer la supervisión de las condiciones de seguridad del frente de obra, con el fin de prevenir incidentes y accidentes.

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:** •TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS
•SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
•ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos (volumen bajo-medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Frente de obra entregado

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, teniendo en cuenta que el frente de obra se encuentra próximo a la entrega. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST
La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes previo a la entrega, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, retirar todo al terminar las actividades e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** N/A

## EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:**

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A

**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realizó la reposición de la bomba mediante garantía, encontrándose el equipo nuevo en sitio, pendiente de verificación.
**2. Seguridad Social y SST:** N/A
**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** Se realizó acompañamiento al tratamiento silvicultural (poda) al individuo arbóreo, por lo que se solicita el informe final con el debido registro fotográfico junto con el anexo PM04-PR29-F8
**6. Generales:** La supervisión emite ficha para la atención de emergencia silvicultural. El contratista realiza las labores de poda correspondientes.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE**

**1. Actividades Tecnicas:** Las labores ya se finalizaron

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** la emergencia ya fue atendida

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Se han avanzado en actividad de enchape en los baños en respuesta a la solicitud de mejorar la calidad de los acabados. De igual manera, se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape que se encuentran fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al cambio de enchape de muro en el baño de hombres del polideportivo. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad del área intervenida.
Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de los escombros, residuos y demás materiales que aún permanecen en las instalaciones de la institución, con el fin de evitar condiciones inseguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. De igual manera, se reiteró la importancia de mantener las áreas de trabajo organizadas y libres de obstáculos durante la ejecución de las actividades.

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos y material de construcción acopiados, por lo que se recomienda disponer adecuadamente los residuos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, por lo que se requiere mayor cuidado en la ejecución de los acabados.
Adicionalmente, se evidenció que las divisiones fijas presentan movimiento, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:**
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza armado y fundida de columnetas en sala de sistemas

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A

**5. Ambiental:** Se realizó recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los residuos y material de construcción, al igual realizo jornada de orden y aseo e implemento todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental

**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** N/A

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Se realiza verificarion de estado actual y propuesta de intervencion del punto fijo, se socializa entre contratista, supervision e intervbentoria y se aprueba para ser ejecutada los proximos dias

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A**

**1. Actividades Tecnicas:** Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección del mismo por solicitud de la supervision.

**2. Seguridad Social y SST:** N/A

**3. Aspectos de calidad:** N/A
**4. Programación de obra:** N/A
**5. Ambiental:** N/A
**6. Generales:** N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

**FIRMAS**

**ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

**ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO**
PROFESIONAL SST

**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN**
ESPECIALISTA AMBIENTAL

**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

**ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO**
ESPECIALISTA ELECTRICO

**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS**
ESPECIALISTA HIDRAULICO

**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ**
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Soldadura de perfiles metalicos para pergola




Cambio de reja para cerramiento perimetral del colegio




Cambio de marco y resane de vanos en coordinacion y orientacion.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784**

**INFORME SEMANAL No 45** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 45 (Consecutivo) **36** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B




Levantamiento de muro en mamposteria.




Aislamiento estructural en poliestireno expandido




Aplicación de Sikadur, adherente de concreto.
