PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No. 35 — LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	35	DEL	1/06/2026 (DD-MM-AA)	AL	7/06/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	247	dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ		RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097		CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00		VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18		VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82		VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00			
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00			
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00			
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00			
Valor inicial No. 2 emergencias:	$			
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,470,367,526.00			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00			
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025		FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	3.33%	79.58%	Obra Física Ejecutada (%)	0.42%	72.25%
Valor de la Obra Programada:	$ 99,561,258.00	$ 2,761,649,070.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 12,654,571.00	$ 2,507,444,649.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	76.25%	71.83%	-6.48%
Durante el periodo	3.33%	0.42%	
Acumulado actual	79.58%	72.25%	

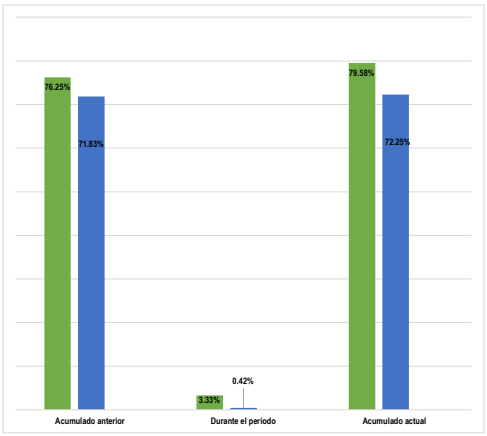

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	98.50%	-1.50%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.79%	-0.21%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	9.75%	0.00%	-9.75%	30.86%	0.00%	-30.86%
	PUENTE ARANDA	EL JASMIN - SEDE A	19.35%	2.47%	-16.88%	38.10%	9.13%	-28.97%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	4.18%	1.76%	-2.42%	13.23%	9.77%	-3.46%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	11.09%	1.41%	-9.68%	27.40%	6.30%	-21.10%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	3.33%	0.42%	-2.91%	78.22%	71.74%	-6.48%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,281,557.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JASMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	94.00%	-6.00%	$ 102,903,305.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 53,124,579.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	95.00%	-5.00%	$ 35,000,000.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	15.00%	20.00%	5.00%	$ 10,000,000.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	10.00%	0.00%	-10.00%	$ 23,700,000.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	60.00%	-40.00%	$ 62,000,000.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°2)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	81.67%	77.93%	-3.73%	$ 341,508,004.00	$ 478,743,193.00	$ 137,235,189.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,470,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,705,578,008.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,764,789,518.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,705,578,008.00	$ 1,705,578,008.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	79.58%	72.25%	-6.48%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	247	-16.00

CURVA S

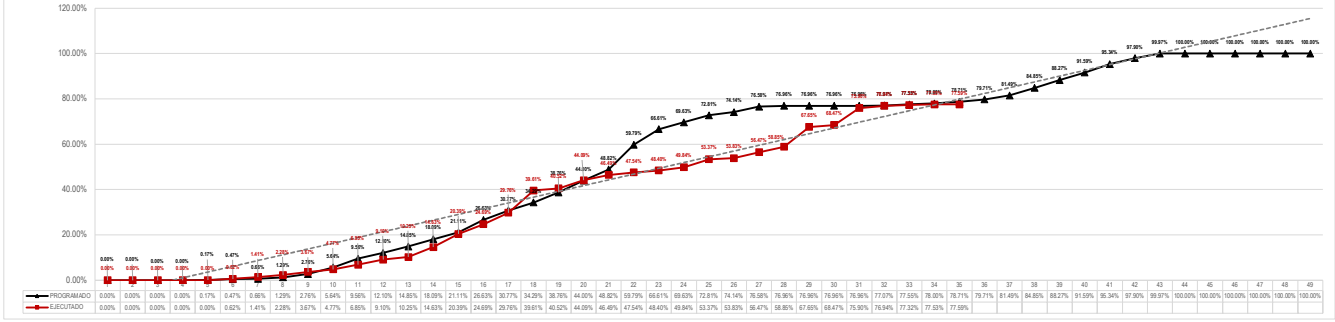

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	13/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	20/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	27/11/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	4/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	11/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	18/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	25/12/2025	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	8/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	15/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	22/01/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	29/01/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	5/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	12/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	19/02/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	26/02/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	5/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	12/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	19/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	26/03/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	2/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	9/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	16/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	23/04/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	30/04/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	21/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	4/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.00%	$ -	$ 27,411,758.80	79.71%	$ 2,197,520,470.72		
37	SEM 37	11/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	0.00%	$ -	$ 49,017,622.18	81.49%	$ 2,246,538,092.90		
38	SEM 38	18/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	0.00%	$ -	$ 92,689,422.33	84.85%	$ 2,339,227,515.23		
39	SEM 39	25/06/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.00%	$ -	$ 94,464,846.21	88.27%	$ 2,433,692,361.44		
40	SEM 40	2/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	0.00%	$ -	$ 91,363,907.55	91.59%	$ 2,525,056,268.99		
41	SEM 41	9/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	0.00%	$ -	$ 103,561,399.66	95.34%	$ 2,628,617,668.65		
42	SEM 42	16/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	0.00%	$ -	$ 70,486,269.07	97.90%	$ 2,699,103,937.72		
43	SEM 43	23/07/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	0.00%	$ -	$ 57,127,153.06	99.97%	$ 2,756,231,090.78		
44	SEM 44	30/07/2026	$ 733,972.09	0.03%	0.00%	$ -	$ 733,972.09	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Una vez finalizadas las labores de instalación del andamio requerido en la sede, se efectuó la verificación en sitio por parte de la directora de interventoría, quien remitió el respectivo reporte sobre el estado del manto y el proceso constructivo al grupo y a la supervisión. Se aclara que las labores ejecutadas no cumplen con los requerimientos mínimos para garantizar la adecuada impermeabilización de la losa; en consecuencia, se mantiene el requerimiento al contratista para que realice los ajustes correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la estabilidad de la obra y la entrega de la intervención a la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra. No obstante, la Interventoría recomienda al Contratista continuar realizando jornadas de orden y aseo en el área de intervención, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y organización, así como prevenir la generación de riesgos

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y muy pocos residuos, parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda retirar adecuadamente todo, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Desde la interventoría se solicita efectuar la verificación de los niveles de la losa, debido a que se evidencian sectores donde se presenta empozamiento de agua, impidiendo su adecuada conducción hacia las bajantes. En este sentido, el ingeniero de apoyo a la supervisión indica la necesidad de ejecutar un mortero de nivelación en toda el área intervenida, garantizando las pendientes requeridas y la correcta evacuación de las aguas lluvias hacia los puntos de desagüe.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra. El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista remitió ficha de especificaciones técnicas de un material PEA certificado. Este cumple con las características necesarias requeridas para usarse como material granular en el subsuelo donde se construirá una losa en concreto. Se efectuó la colocación, nivelación y compactación de subbase en un espesor de 10 centímetros.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de excavación manual en el frente de obra. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el cerramiento instalado se encontraba en condiciones adecuadas para la delimitación y protección del área intervenida. Asimismo, se evidenció que el personal presente hacía uso adecuado de los EPP requeridos para la ejecución de las actividades.
Adicionalmente, se recomienda al Contratista continuar implementando jornadas periódicas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras de trabajo, prevenir incidentes y garantizar la adecuada organización del frente de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizo instalación del cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado, pero sin señalizar al igual que residuos (bajo volumen), por lo que se recomendó al contratista señalizar los acopios, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante comire de obra realizado en la SED el ingeniero apoyo a la supervision menciono la necesidad de ejecutar el CCTV en la sede e indicó que dicha actividad deberá desarrollarse mediante NP, solicitando al contratista avanzar en la presentación del mismo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado, únicamente se realizó una jornada de aseo en la sede; en los demás días no hubo presencia de personal ni ejecución de actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron jornadas de orden y aseo en el frente de obra, con el fin de adecuar las áreas de trabajo y garantizar condiciones apropiadas para la continuidad de las actividades programadas. La Interventoría recomienda al Contratista continuar fortaleciendo y manteniendo estas jornadas de manera permanente, con el propósito de prevenir incidentes, minimizar riesgos asociados a la presencia de materiales y residuos, y conservar condiciones adecuadas de seguridad y organización en el área de intervención.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia material y residuos (volumen medio)sin acopiar adecuadamente y cerca de un individuo arbóreo sin protección, no se ha realizado el embalaje de las tejas de asbesto por lo que se recomendó realizar la debida protección para no generar riesgo en el personal y realizar el retiro de estas en el menor tiempo posible, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: El contratista deberá radicar el ajuste del esquema de cubierta, atendiendo las observaciones emitidas por el calculista de la interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra realizando el suministro de las herramientas y equipos requeridos para la ejecucion de la actividad

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede. A la fecha genera un atraso significativo que afecta de manera significativa los tiempos de la programacion numero 2.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se requiere programar una visita técnica con el proveedor del sistema de impermeabilización de tanques, con el fin de verificar las alternativas y recomendaciones que permitan mejorar la adherencia del material a la superficie del tanque.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Entre las labores ejecutadas en la sede se encuentran las actividades de aseo general, pintura en el hall de circulación y el retiro del cerramiento ubicado en la parte posterior de la edificación.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de retiro de escombros en la zona del jardín, con el fin de mejorar las condiciones de orden y aseo en el área intervenida. Estas labores contribuyen a mantener espacios más seguros y organizados para el desarrollo de las actividades. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría recomendó al personal hacer uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente del casco de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se reporta el retiro total del cerramiento perimetral, se sigue evidenciando material de construcción en el frente, pero se evidencia un volumen bajo en la zona verde por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición total y adecuada, al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La interventoría a la fecha mantiene observaciones respecto a las actividades ejecutadas en la sede, por lo que se solicita el ajuste de la instalación de la gravilla. Adicionalmente, la interventoría aclara que no recibira las dilataciones en bronce efectuadas entre la zona de circulación y la cancha.
Así mismo, el ingeniero de apoyo a la supervisión indicó que se debe efectuar el cambio de la puerta, manteniendo el mismo diseño y modificando únicamente su acabado a color amarillo. Finalmente, se indicó al contratista que el informe correspondiente al CCTV deberá ser entregado el día viernes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizan correcciones y observaciones finales en el proceso de entrega de espacios, establecido entre la institucion educativa, contratista de obra e interventoria

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades durante esta semana en esta sede correspondientes a la emergencia
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra. No obstante, la Interventoría recomienda al Contratista continuar realizando jornadas de orden y aseo en el área de intervención, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y organización, así como prevenir la generación de riesgos
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y muy pocos residuos, parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda retirar adecuadamente todo, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
6. Generales: El contratista debe corregir una filtracion de agua en el baño del segundo piso, el cual afecta el primer nivel en la zona de la ludoteca. Adicionalmente se solicita al contratista efectuar el retiro del cerramiento provisional dispuesto para el desarrollo de las actividades, dado que ya fue instalada la reja definitiva, por lo que dicho elemento temporal ha cumplido su función y no se requiere su permanencia en el área.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se llevó a cabo una jornada de aseo
2. Seguridad Social y SST: La Interventoría recomendó al Contratista realizar la evacuación y disposición adecuada de estos materiales a la mayor brevedad posible, con el fin de prevenir la generación de riesgos para la comunidad educativa y garantizar condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad en las instalaciones.
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se efectuó el retiro del material previamente solicitado. Durante comité realizado en la SED se abordo el tema de daño en el ascensor, por lo que se requiere definir y adelantar las acciones correspondientes para su reparación. Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, a la fecha el contratista no ha iniciado labores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El contratista esta trabajando en conjunto con la sede para intervenir un espacio, finalizar labores y pasar a la siguiente aula
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Para las actividades requeridas para mitigar el impacto acústico entre las aulas, se requiere la presentación del NP correspondiente a la frescasa.
Las actividades podrán ejecutarse hasta el 20 de junio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: A la fecha la supervision, la interventoria estan a la espera de la propuesta y esquema de implantacion para cubrir el hall de circulacion de los baños. La actividad se efectuara como obra prioritaria.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: De acuerdo al comité de obra N18 se programa la actividad catalogada como emergencia para el periodo de vacaciones teniendo en cuenta un punto de intervencion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuo fundida de tapas de caja y cerramiento de cuarto electrico
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de la actividad correspondiente a la fundición de las tapas de la caja. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y recomendó al Contratista continuar implementando jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y organización en el área de intervención.
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen bajo), parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se evidencio reguero de pintura por lo que se recomendo limpiar la zona, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, limpiar la zona verde e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
6. Generales: Se debe de instalar una bomba de eyeccion, sin embargo es un NP que previamente debe ser verificado y aprobado por la supervision y la interventoria. Desde la SED se solicita incluir dentro de las recomendaciones para la institución la periodicidad de mantenimiento de la bomba y de la caja asociada, aclarando que los daños ocasionados por el ingreso de elementos ajenos al sistema o por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: El contratista ejecutó el suministro e instalación del tanque. No obstante, se solicita verificar un goteo evidenciado durante la revisión en sitio, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al cambio del tanque de agua. Se recomienda al Contratista mantener las condiciones de seguridad, así como garantizar el uso adecuado de los EPP por parte del personal involucrado.
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente
6. Generales: El supervisor solicita el desmonte y suministro e instalacion de tanques de almacenamiento de agua potable ubicados al costado nororiental de la institucion

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 35** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Instalación reja perimetral



Andamio para acceso a cubierta

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Excavación manual a 40cm de profundidad



Esparcimiento de Sub base



Compactación de Sub Base



Ingreso y Acopio de Material (Sub Base)



Acopio de material para fundición



Acopio y Protección de material para fundición

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A




Jornada de Orden y Limpieza



Jornada de Orden y Limpieza



Acopio de Residuos

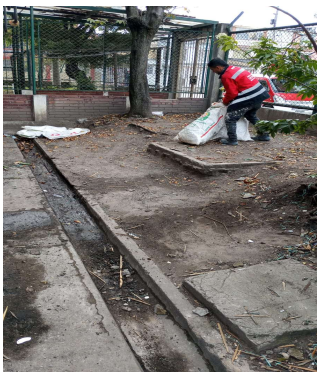

Retiro De Residuos

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE B



Resane de Muros Internos



Instalación Guarda Escoba



Instalación baldosas entrada principal



Destronque y pulido de piso



Aplicado de pintura muros internos



Instalación de tapa caja de inspección

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12.05.2026	Inicio	12:08 p.m.	Fin	01:27 pm	Lugar	Secretaría de Educación Distrital (SED)
Asunto	Comité de obra N°18						
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	12.05.2026	Elaborado por	Residente de interventoría - Natalia Mora La Rota.			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

Entrega de fronteras: 13 de Mayo

- Julio Caravito: 11:00 am
- Marco Antonio: 12:00 pm.

República de Venezuela.

- Cerramiento. Actividades desarrollo maximo 22 de Mayo de 2026.
- Dirección de interventoría. No se realizara el desarrollo de esta actividad hasta que se pueda realizar la revisión de la cubierta por parte de la dirección y residente de interventoría. (Cambio de mardo y pintura de acabado final)
- Apoyo ala supervisión. Se requiere que el dia de la entrega se encuentre el andamio armado y en sitio para acceso a la cubierta.
  Se requiere que por parte de interventoría se encuentre asesor y inspector SST y por parte del contratista se encuentre la residente sst, todo el personal que va a subir debe tener equipo de altura y cursos. de altura.

la merced

- Entrega. Miercoles 20 de Mayo - 10:30 a 11:30 am.
- Instalacion de sistema de iluminacion en el area intervenida, luminarias herméticas.

Villemar - Sede C.

- Cubierta e instalacion de acometida del tanque: Viernes 15 de Mayo maximo
- Apoyo supervision de obra. Solicitara contingencia de la cocina para intervencion.

Antonio Federica

- Baños bateria. Romper placa.
- Inconorizacion aulas. Se va a realizar visita por parte del contratista y interventoria y por parte del apoyo de la supervision se va a gestionar la programacion.

Fresado. ← → Muro en drywall a una sola cara



Van Udon

- Se traslada la actividad de la pergola para el periodo de vacaciones.

Internacional

- NP Bomba. Debe incluir todos los elementos en su totalidad electricos, de la bomba e instalacion.
- Instalacion de bicicleteros → Modulo de 10 con demarcacion. Hablar con la rectora para punto de instalacion.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12.05.2026	Inicio	12:08 pm	Fin	01:27pm.	Lugar	Secretaría de Educación Distrital (SED)
Asunto	Comité de obra N°18						
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		12.05.2026	Elaborado por	Residente de interventoría: Natalia Mora La Rotta.			Próxima Reunión

Jeammin - Sede B

- Apoyo a la supervisión y Interventoría: No realizaron el recibimiento del piso del hall de distribución. Se debe realizar el cambio y se debe recibir en calidad de acuerdo a lo anteriormente visualizado.
- Informe CCTV: Viernes 15 de Mayo de 2026, entrega contratista.


Acta parcial

- Presentación de los frentes en su totalidad memorias de ejecución de actividades.
- <<Compromisos adquiridos>>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12.05.2026	Inicio	12:08 pm.	Fin	01:27 pm	Lugar	Secretaría de Educación Distrital (SED.)
Asunto	Comité de obra N°12						
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	12.05.2026.	Elaborado por	Residente de interventoría: Natalia Mora La Rotta.			Próxima Reunión	

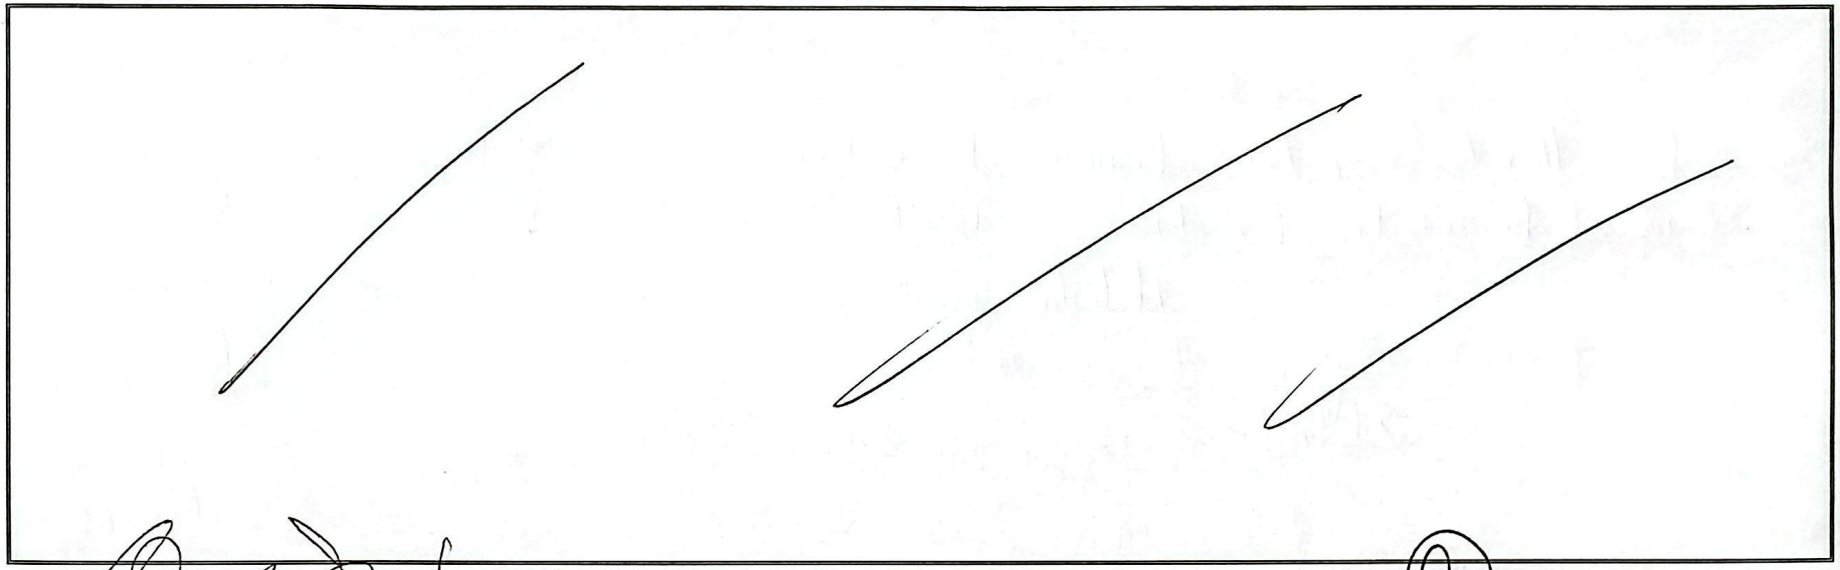

NOMBRE: Hernan Lopez Paez
CARGO: Apoyo a la supervisión

NOMBRE: Diana Rodriguez Rodriguez.
CARGO: Directora de interventoría.

NOMBRE: Natalia Mora La Rotta.
CARGO: Residente de interventoría.

NOMBRE: FRANS COCK
CARGO: DIRECTOR OBRA

NOMBRE: Paola Martinez
CARGO: Residente Interventoria


NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		18/11/2025	**13/04/2026**	**126d**
1	INICIO	18/11/2025	18/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	18/11/2025	13/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**20/11/2025**	**09/03/2026**	**94d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	05/01/2026	08/01/2026	3d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	23/12/2025	25/12/2025	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
3.5	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	23/12/2025	24/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	06/12/2025	09/03/2026	80d
3.7	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	02/01/2026	03/01/2026	2d
3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.9	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	28/11/2025	26/12/2025	24d 2m
3.10	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	27/12/2025	31/12/2025	4d
3.11	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	24/11/2025	02/01/2026	35d
3.12	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	20/11/2025	25/12/2025	31d
3.13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	24/11/2025	03/01/2026	36d
3.14	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	19/02/2026	20/02/2026	1d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/12/2025	01/01/2026	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RE...	08/01/2026	10/01/2026	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE...	03/01/2026	06/01/2026	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	02/01/2026	09/01/2026	6d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/01/2026**	**07/04/2026**	**82d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPE...	02/01/2026	07/04/2026	82d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**20/01/2026**	**8d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	13/01/2026	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	17/01/2026	20/01/2026	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/01/2026**	**09/02/2026**	**15d**
6.1	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	03/02/2026	06/02/2026	3d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	06/02/2026	09/02/2026	2d
6.3	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	31/01/2026	04/02/2026	3d
6.4	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/01/2026	26/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**07/02/2026**	**16d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	29/01/2026	07/02/2026	8d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	20/01/2026	22/01/2026	2d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/03/2026**	**52d 58m**
8.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	24/01/2026	29/01/2026	4d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	26/02/2026	26/03/2026	25d
9	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y T...	29/01/2026	03/02/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**25/02/2026**	**37d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	25/02/2026	37d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	13/02/2026	20/02/2026	6d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/01/2026	15/01/2026	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**15/01/2026**	**19/01/2026**	**3d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	15/01/2026	19/01/2026	3d
11.3	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	17/01/2026	17/01/2026	
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/02/2026**	**28d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/02/2026	11/02/2026	3d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	07/02/2026	12/02/2026	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	10/01/2026	15/01/2026	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	10/01/2026	15/01/2026	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**13/02/2026**	**2d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	11/02/2026	13/02/2026	2d
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**20/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	13/01/2026	16/01/2026	3d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZAD...	17/01/2026	20/01/2026	2d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/03/2026**	**23/03/2026**	**1d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	21/03/2026	23/03/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**20/03/2026**	**83d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	10/03/2026	11/03/2026	1d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	13/12/2025	20/03/2026	83d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	13/12/2025	19/03/2026	82d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	26/12/2025	31/12/2025	4d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	11/03/2026	13/03/2026	2d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**06/03/2026**	**12d**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	20/02/2026	24/02/2026	3d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	02/03/2026	06/03/2026	4d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/02/2026**	**12/03/2026**	**15d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	23/02/2026	03/03/2026	7d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	06/03/2026	09/03/2026	2d
18.3	WIN DE ALUMINIO	06/03/2026	12/03/2026	5d
18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	02/03/2026	05/03/2026	3d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**12/03/2026**	**5d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	06/03/2026	12/03/2026	5d
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**16/03/2026**	**24d 2m**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	16/02/2026	26/02/2026	10d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	11/03/2026	16/03/2026	4d
21	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**26/02/2026**	**6d**
21.1	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20/02/2026	26/02/2026	6d
22	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/03/2026**	**12/03/2026**	**4d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	07/03/2026	12/03/2026	4d
23	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**27/03/2026**	**22d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	21/03/2026	23/03/2026	1d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON F...	24/03/2026	26/03/2026	2d
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	26/03/2026	27/03/2026	1d
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	02/03/2026	04/03/2026	2d
24	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/03/2026**	**30/03/2026**	**3d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	26/03/2026	30/03/2026	3d
24.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	26/03/2026	30/03/2026	3d
25	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**14/03/2026**	**27d**
25.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	11/02/2026	18/02/2026	6d
25.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	11/03/2026	14/03/2026	3d
25.4	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CER...	14/02/2026	18/02/2026	3d
26	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**03/04/2026**	**32d**
26.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	26/02/2026	03/04/2026	32d
26.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	27/02/2026	03/04/2026	31d
26.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	18/03/2026	3d
26.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	26/02/2026	01/04/2026	30d
26.5	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	14/03/2026	19/03/2026	4d
26.6	ENTREGA DE PINTURA DE FACHADAS	28/03/2026	28/03/2026	
27	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/03/2026**	**17/03/2026**	**5d**
27.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	11/03/2026	17/03/2026	5d
28	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**31/03/2026**	**2d**
28.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	28/03/2026	31/03/2026	2d
28.2	ENTREGA DE BAÑOS	31/03/2026	31/03/2026	
29	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/12/2025**	**21/03/2026**	**91d 7h 58m**
29.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	06/01/2026	21/03/2026	64d 2m
29.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	12/03/2026	14/03/2026	2d
29.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	13/12/2025	05/03/2026	71d
29.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	06/12/2025	25/02/2026	69d
29.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	05/12/2025	08/12/2025	2d
29.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	02/01/2026	21/03/2026	68d
29.7	ENTREGA DE CUBIERTA	14/03/2026	14/03/2026	
30	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/11/2025**	**13/04/2026**	**126d**
30.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	18/11/2025	13/04/2026	126d
30.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	03/01/2026	08/01/2026	4d
31	**ITEM NO PREVISTOS**	**18/11/2025**	**01/04/2026**	**116d**
31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	13/12/2025	04/03/2026	69d
31.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALI...	07/03/2026	12/03/2026	4d
31.3	DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE 8MM, INCLUYE MASILLA Y DEMAS EL...	26/02/2026	28/02/2026	3d
31.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES DE SANITARIO 50CM	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.5	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	05/01/2026	06/01/2026	2d
31.6	DESMONTE DE INCRUSTACIONES INCLUYE RETIRO	03/01/2026	05/01/2026	1d
31.7	DESMONTE Y REINTALACION DE TANQUE DE AGUA	18/02/2026	18/03/2026	24d
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA , ACOPLE Y SIFÓN)	26/03/2026	27/03/2026	1d
31.9	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION	18/11/2025	14/01/2026	50d
31.10	DESMONTE E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EXISTENTE, (INCLUYE EL DESMONTE DE LA MALLA ESLABONADA Y DE LAS MA...	24/02/2026	01/04/2026	32d
31.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	18/03/2026	19/03/2026	1d
31.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARG...	19/03/2026	23/03/2026	3d
31.13	ENCORAZADO	20/02/2026	24/02/2026	3d
31.14	FIN	31/03/2026	31/03/2026	

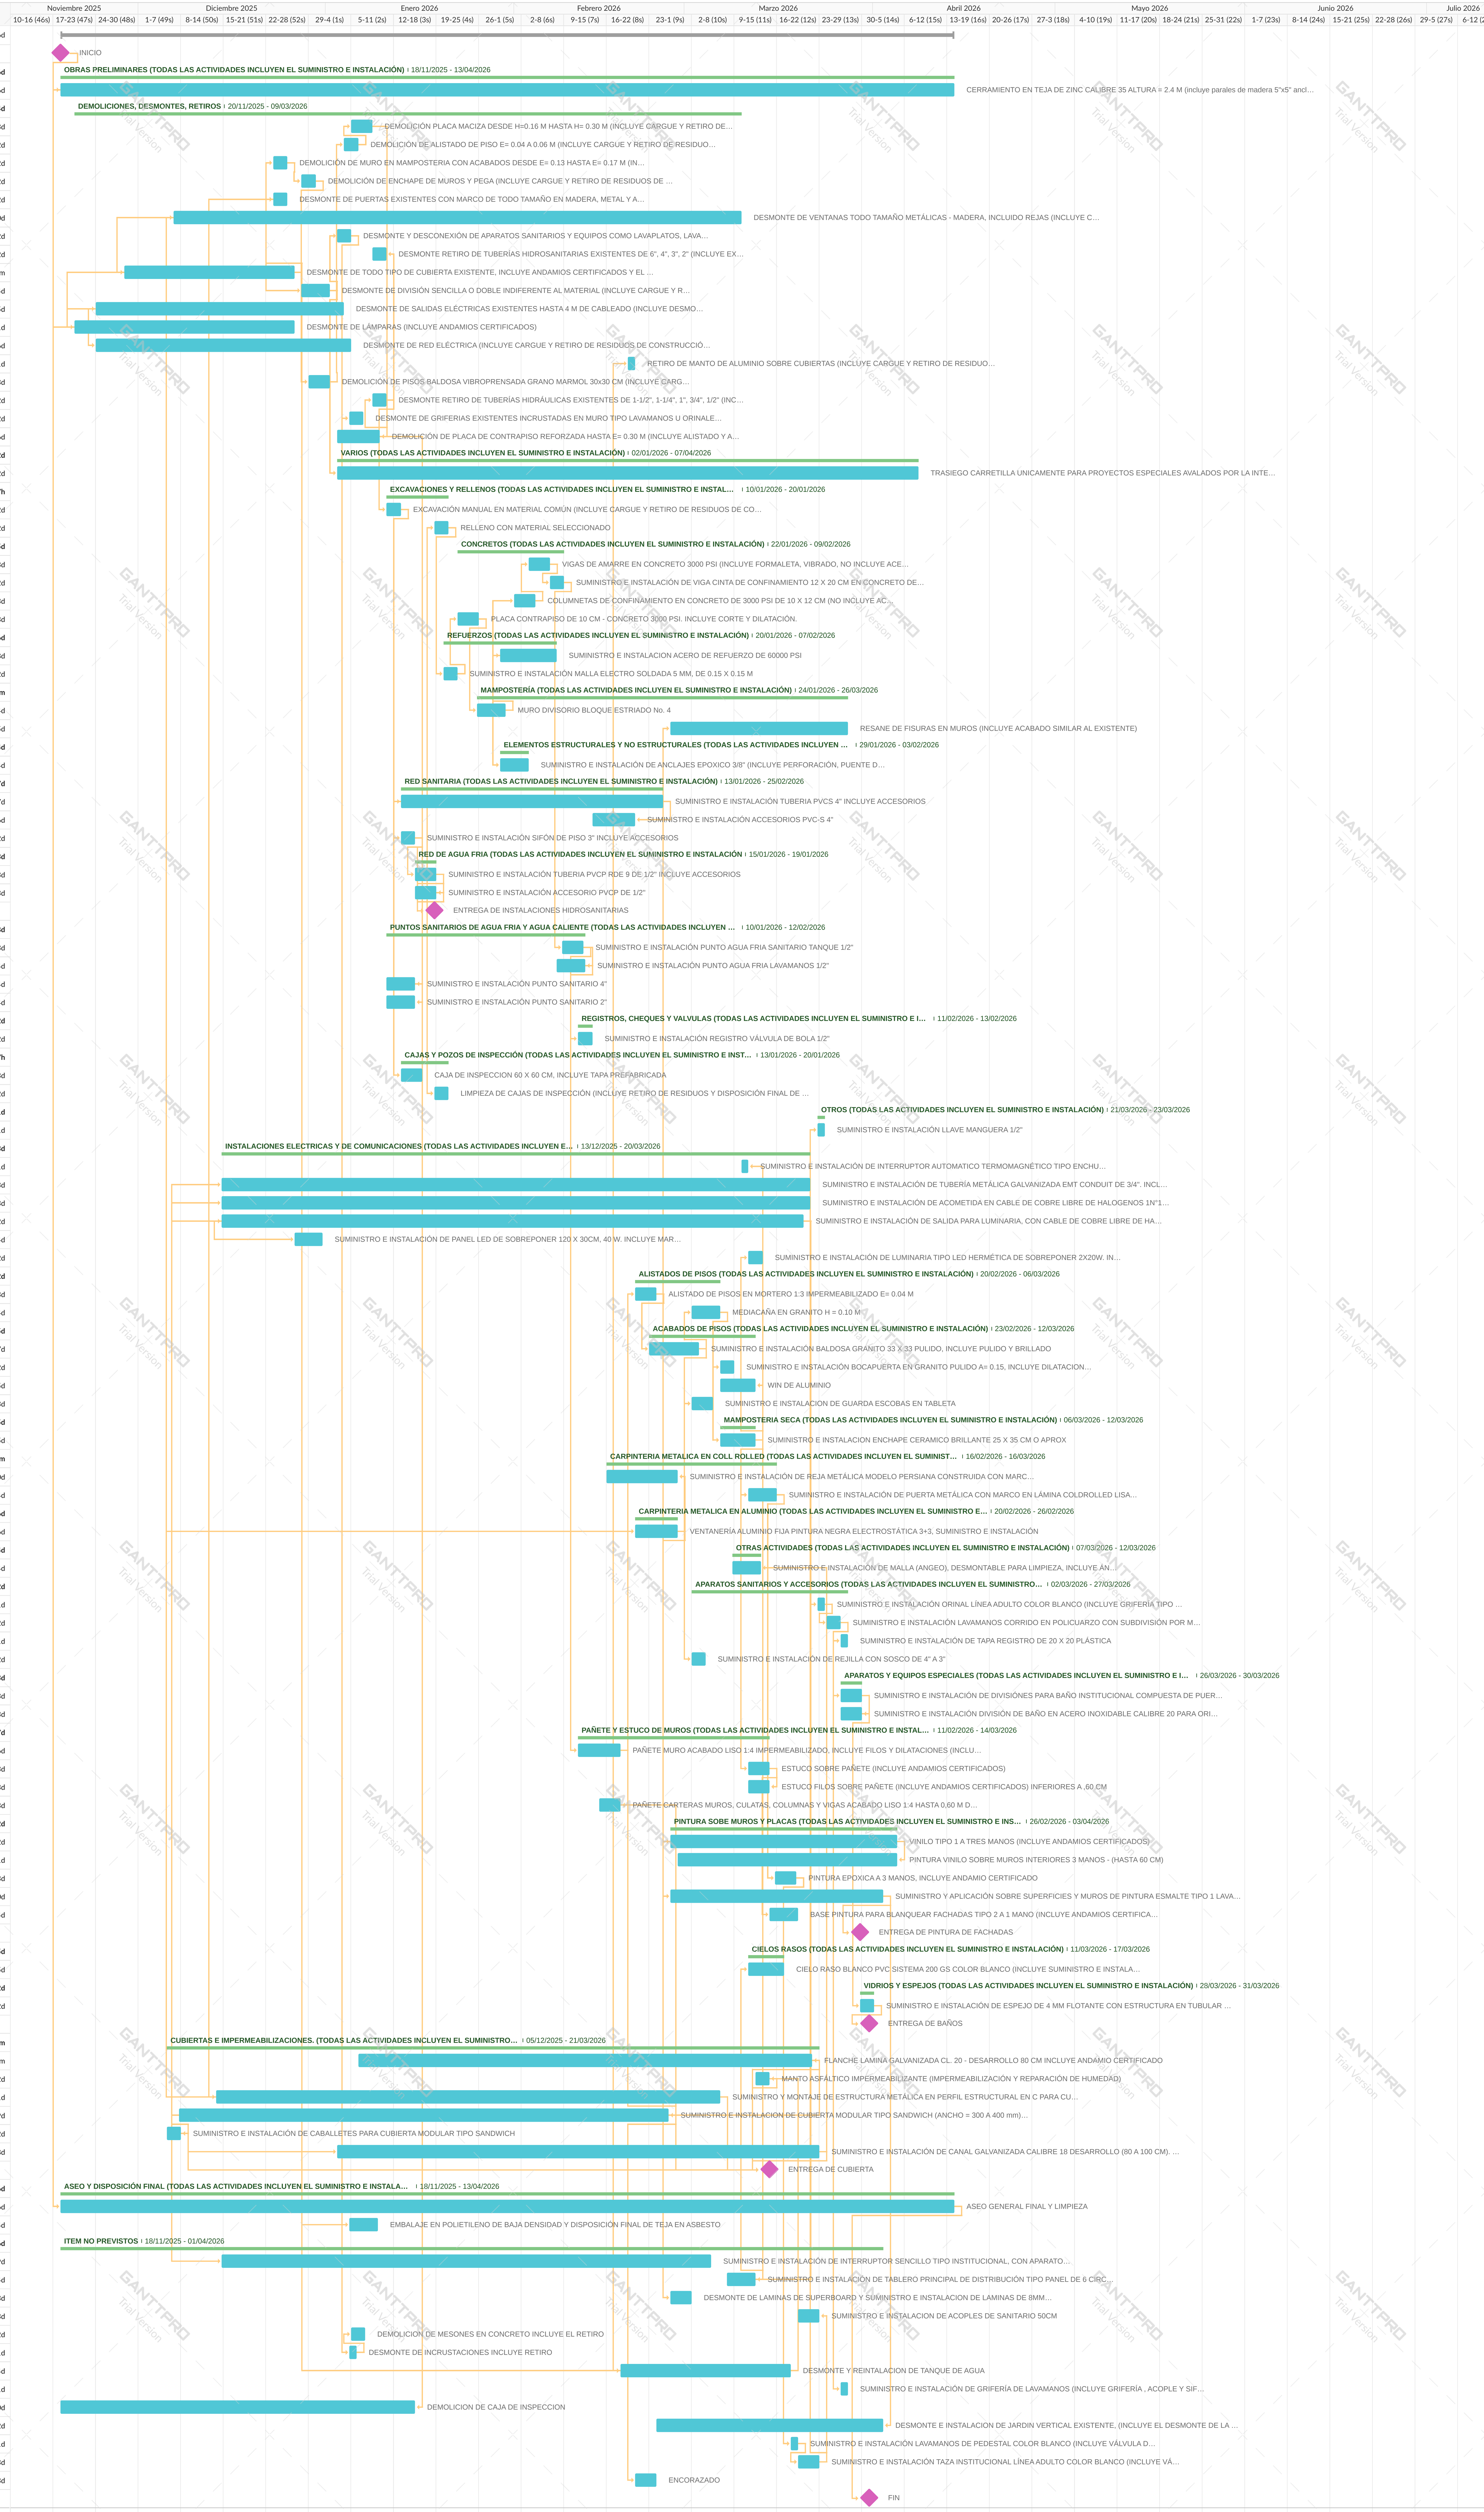

GANTTPRO Trial Version


1073246437 | Programacion Colegio Cultura Popular - Sede C

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		13/11/2025	**24/01/2026**	63d
1	INICIO	13/11/2025	13/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
2.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplaz...	09/12/2025	09/12/2025	1d
2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	13/11/2025	24/01/2026	63d
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de i...	14/11/2025	14/11/2025	1d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**15/11/2025**	**11/12/2025**	**22d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...	11/12/2025	11/12/2025	1d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA M...	18/11/2025	19/11/2025	2d
3.3	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FIN...	03/12/2025	03/12/2025	1d
3.4	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	02/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAM...	01/12/2025	02/12/2025	2d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CAR...	15/11/2025	17/11/2025	1d
4	**MANTENIMIENTOS**	**16/01/2026**	**21/01/2026**	**5d**
4.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, ...	16/01/2026	21/01/2026	5d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	17/01/2026	20/01/2026	3d
5	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/12/2025**	**10/12/2025**	**1d**
5.1	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, C...	10/12/2025	10/12/2025	1d
6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**12/12/2025**	**1d**
6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	12/12/2025	12/12/2025	1d
7	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**18/12/2025**	**4d**
7.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJE...	16/12/2025	17/12/2025	2d
7.2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	16/12/2025	18/12/2025	3d
7.3	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ...	15/12/2025	15/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/12/2025**	**15/12/2025**	**1d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	15/12/2025	15/12/2025	1d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**22/12/2025**	**3d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	19/12/2025	22/12/2025	3d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/12/2025**	**29/12/2025**	**14d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	27/12/2025	29/12/2025	2d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	13/12/2025	15/12/2025	2d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**13/12/2025**	**15/12/2025**	**2d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	13/12/2025	15/12/2025	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	13/12/2025	15/12/2025	2d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**30/12/2025**	**2d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	29/12/2025	30/12/2025	2d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	30/12/2025	30/12/2025	1d
14	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17/01/2026**	**17/01/2026**	**1d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	17/01/2026	17/01/2026	1d
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
15.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	17/01/2026	20/01/2026	3d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	10/01/2026	19/01/2026	8d
15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG ...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	10/01/2026	14/01/2026	4d
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NEC...	17/01/2026	21/01/2026	4d
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	20/01/2026	20/01/2026	1d
16	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**09/01/2026**	**13d**
16.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	29/12/2025	30/12/2025	2d
16.2	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	26/12/2025	27/12/2025	2d
16.3	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	05/01/2026	09/01/2026	5d
17	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/12/2025**	**19/01/2026**	**34d**
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	02/01/2026	09/01/2026	7d
17.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	16/01/2026	19/01/2026	3d
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	10/01/2026	15/01/2026	5d
17.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PAR...	11/12/2025	13/12/2025	3d
18	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**05/01/2026**	**9d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	02/01/2026	05/01/2026	3d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA ...	26/12/2025	29/12/2025	3d
19	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/01/2026**	**12/01/2026**	**2d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISA...	10/01/2026	12/01/2026	2d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON...	10/01/2026	12/01/2026	2d
20	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**1d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	30/12/2025	30/12/2025	1d
21	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**16/01/2026**	**1d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	16/01/2026	16/01/2026	1d
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	16/01/2026	16/01/2026	1d
22	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**08/01/2026**	**17d 7h**
22.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19/12/2025	24/12/2025	5d
22.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.4	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	03/01/2026	08/01/2026	4d
22.5	ENTREGA DE OBRA GRIS	08/01/2026	08/01/2026	
23	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**21/01/2026**	**12d**
23.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	17/01/2026	20/01/2026	3d
23.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	20/01/2026	20/01/2026	1d
23.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17/01/2026	21/01/2026	4d
23.6	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEM...	08/01/2026	09/01/2026	2d
23.7	ENTREGA DE OBRA BLANCA	21/01/2026	21/01/2026	
24	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15/01/2026**	**16/01/2026**	**2d**
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASIL...	15/01/2026	16/01/2026	2d
25	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**22/12/2025**	**21/01/2026**	**27d**
25.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	27/12/2025	27/12/2025	1d
25.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFI...	16/01/2026	21/01/2026	5d
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	22/12/2025	24/12/2025	3d
25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	27/12/2025	30/12/2025	2d
25.5	ENTREGA DE CUBIERTA	21/01/2026	21/01/2026	
26	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/11/2025**	**24/01/2026**	**63d**
26.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	13/11/2025	24/01/2026	63d
26.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	15/01/2026	1d
27	**NO PREVISTOS**	**14/11/2025**	**22/01/2026**	**59d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS PUERTA, BARRAJES DE NEU...	15/01/2026	16/01/2026	2d
27.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE...	10/01/2026	14/01/2026	4d
27.3	DESMONTE Y REINTALACION DE REJA DE CERRAMIENTO	10/12/2025	21/01/2026	36d 2h
27.4	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO	14/11/2025	14/11/2025	1d
27.5	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO	10/12/2025	10/12/2025	1d
27.6	CHAPA DE SEGURIDAD	13/01/2026	13/01/2026	1d
27.7	PUERTA DE REJA EN LA MALLA DE CERRAMIENTO	15/11/2025	15/11/2025	1d
27.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	13/12/2025	19/12/2025	5d
27.9	FIN	22/01/2026	22/01/2026	

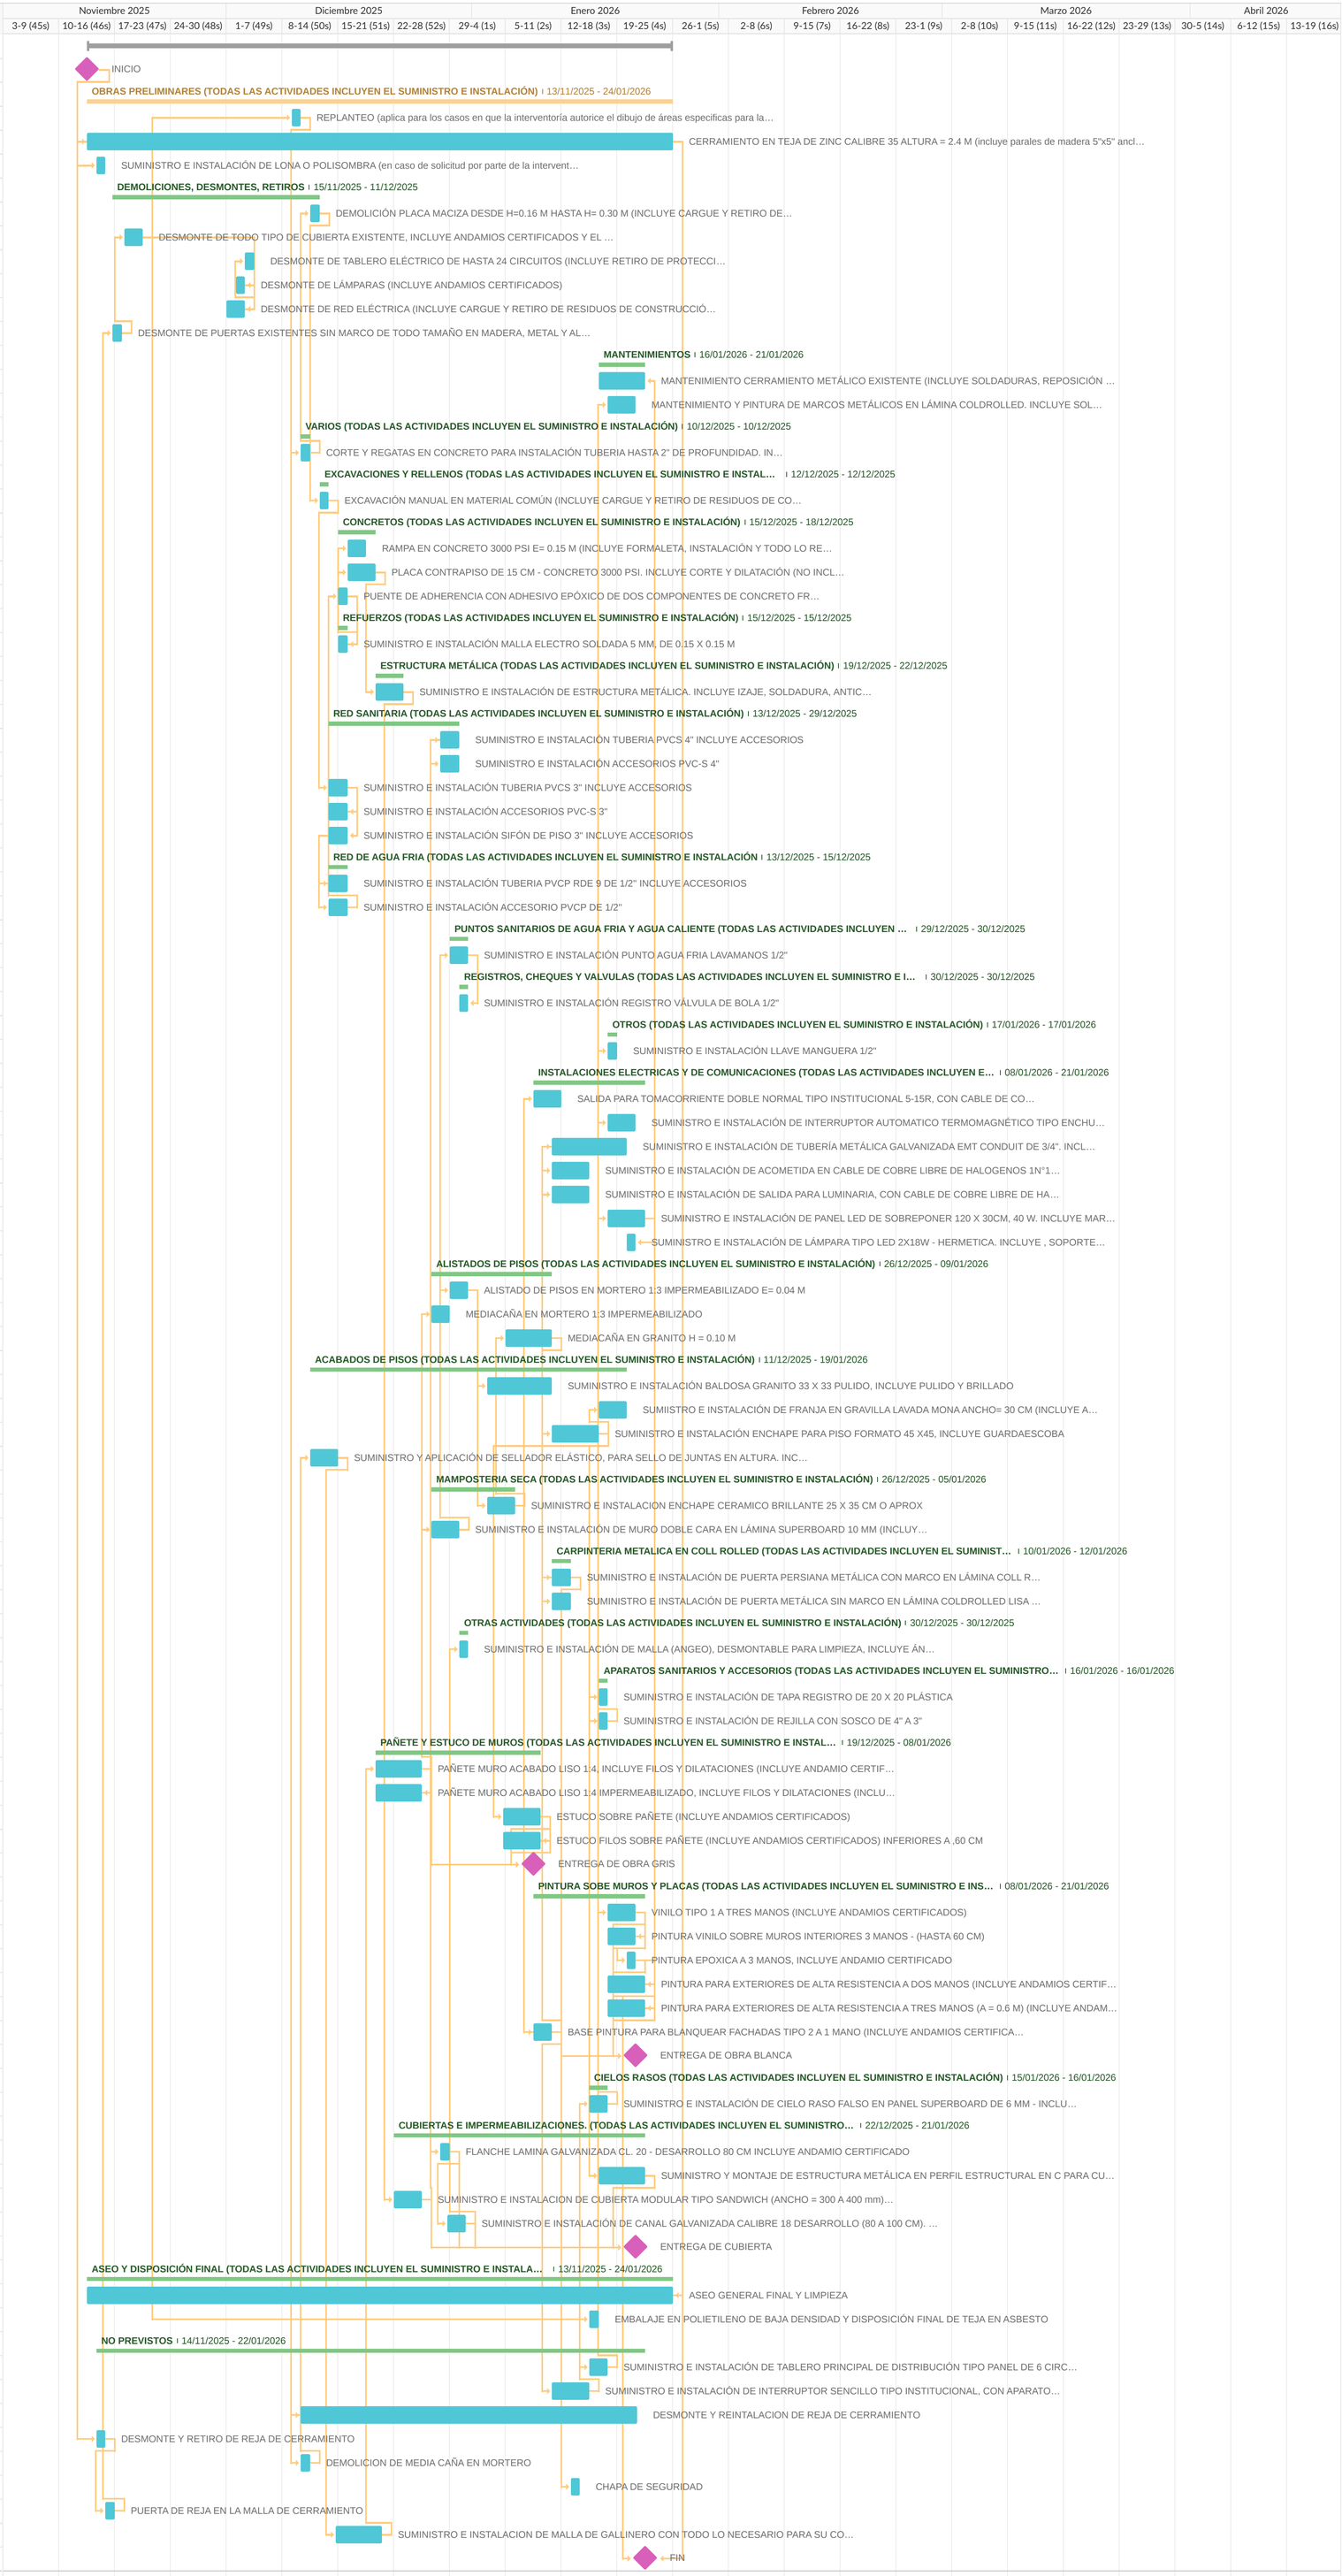


1073246437 | Programacion Colegio El Jazmin - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		21/05/2026	**01/08/2026**	31d 30m
1	**COLEGIO EL JAZMIN - SEDE A**	**21/05/2026**	**01/08/2026**	**31d 30m**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINIST...**	**21/05/2026**	**03/06/2026**	**5d 15h 5m**
1.1.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye par...	21/05/2026	25/05/2026	1d 18h 57m
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicit...	29/05/2026	03/06/2026	2d 30m
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**02/06/2026**	**08/07/2026**	**15d 11h 59m**
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETI...	20/06/2026	04/07/2026	6d 1h 30m
1.2.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMI...	10/06/2026	08/07/2026	12d 3h
1.2.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MAD...	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.2.4	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIA...	02/06/2026	09/06/2026	3d 5h
1.2.5	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLE...	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.2.6	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.2.7	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDU...	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.2.8	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O G...	20/06/2026	26/06/2026	2d 17h 30m
1.3	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINIS...**	**21/05/2026**	**16/07/2026**	**24d 6h**
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJ...	21/05/2026	16/07/2026	24d 6h
1.4	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E IN...**	**21/05/2026**	**07/07/2026**	**20d 5h**
1.4.1	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTI...**	**21/05/2026**	**07/07/2026**	**20d 5h**
1.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8 (INCLUYE P...	21/05/2026	07/07/2026	20d 5h
1.5	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E IN...**	**25/06/2026**	**03/07/2026**	**3d 5h**
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.6	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVI...**	**21/07/2026**	**29/07/2026**	**3d 5h**
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITU...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABL...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TI...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBR...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE ...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30C...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.7	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTR...**	**16/07/2026**	**23/07/2026**	**3d 5h**
1.7.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENT...	16/07/2026	23/07/2026	3d 5h
1.8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUY...**	**21/05/2026**	**22/05/2026**	**8h 30m**
1.9	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SU...**	**25/06/2026**	**29/07/2026**	**14d 8h 20m**
1.9.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL ...**	**25/06/2026**	**29/07/2026**	**14d 8h 20m**
1.9.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FIL...	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.9.1.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.9.1.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) I...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.9.1.4	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO...	03/07/2026	11/07/2026	3d 5h
1.10	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL ...**	**03/07/2026**	**30/07/2026**	**11d 15h 21m**
1.10.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.10.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.10.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0....	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.10.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.10.5	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUY...	03/07/2026	12/07/2026	4d 1h
1.11	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINIS...**	**21/07/2026**	**29/07/2026**	**3d 5h**
1.11.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEME...	21/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.12	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUY...**	**10/07/2026**	**30/07/2026**	**8d 11h 58m**
1.12.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA U...	10/07/2026	29/07/2026	8d 2h
1.13	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMI...**	**19/07/2026**	**31/07/2026**	**5d 5h 30m**
1.13.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	19/07/2026	26/07/2026	3d 5h
1.13.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL ...	19/07/2026	31/07/2026	5d 5h 30m
1.13.3	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES ...	19/07/2026	26/07/2026	3d 5h
1.14	**NO PREVISTOS**	**10/07/2026**	**01/08/2026**	**9d 9h 1m**
1.14.1	LIMPIEZA DE CANALES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SI...	20/07/2026	27/07/2026	2d 17h 30m
1.14.2	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL (INCLUYE RETIR...	24/07/2026	01/08/2026	3d 12h 39m
1.14.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TIPO SI...	23/07/2026	31/07/2026	3d 5h
1.14.4	ENCOROZADO DE CUBIERTAS, INCLUYE PAÑETE LINEAL Y ANDAMIO CE...	10/07/2026	18/07/2026	3d 5h

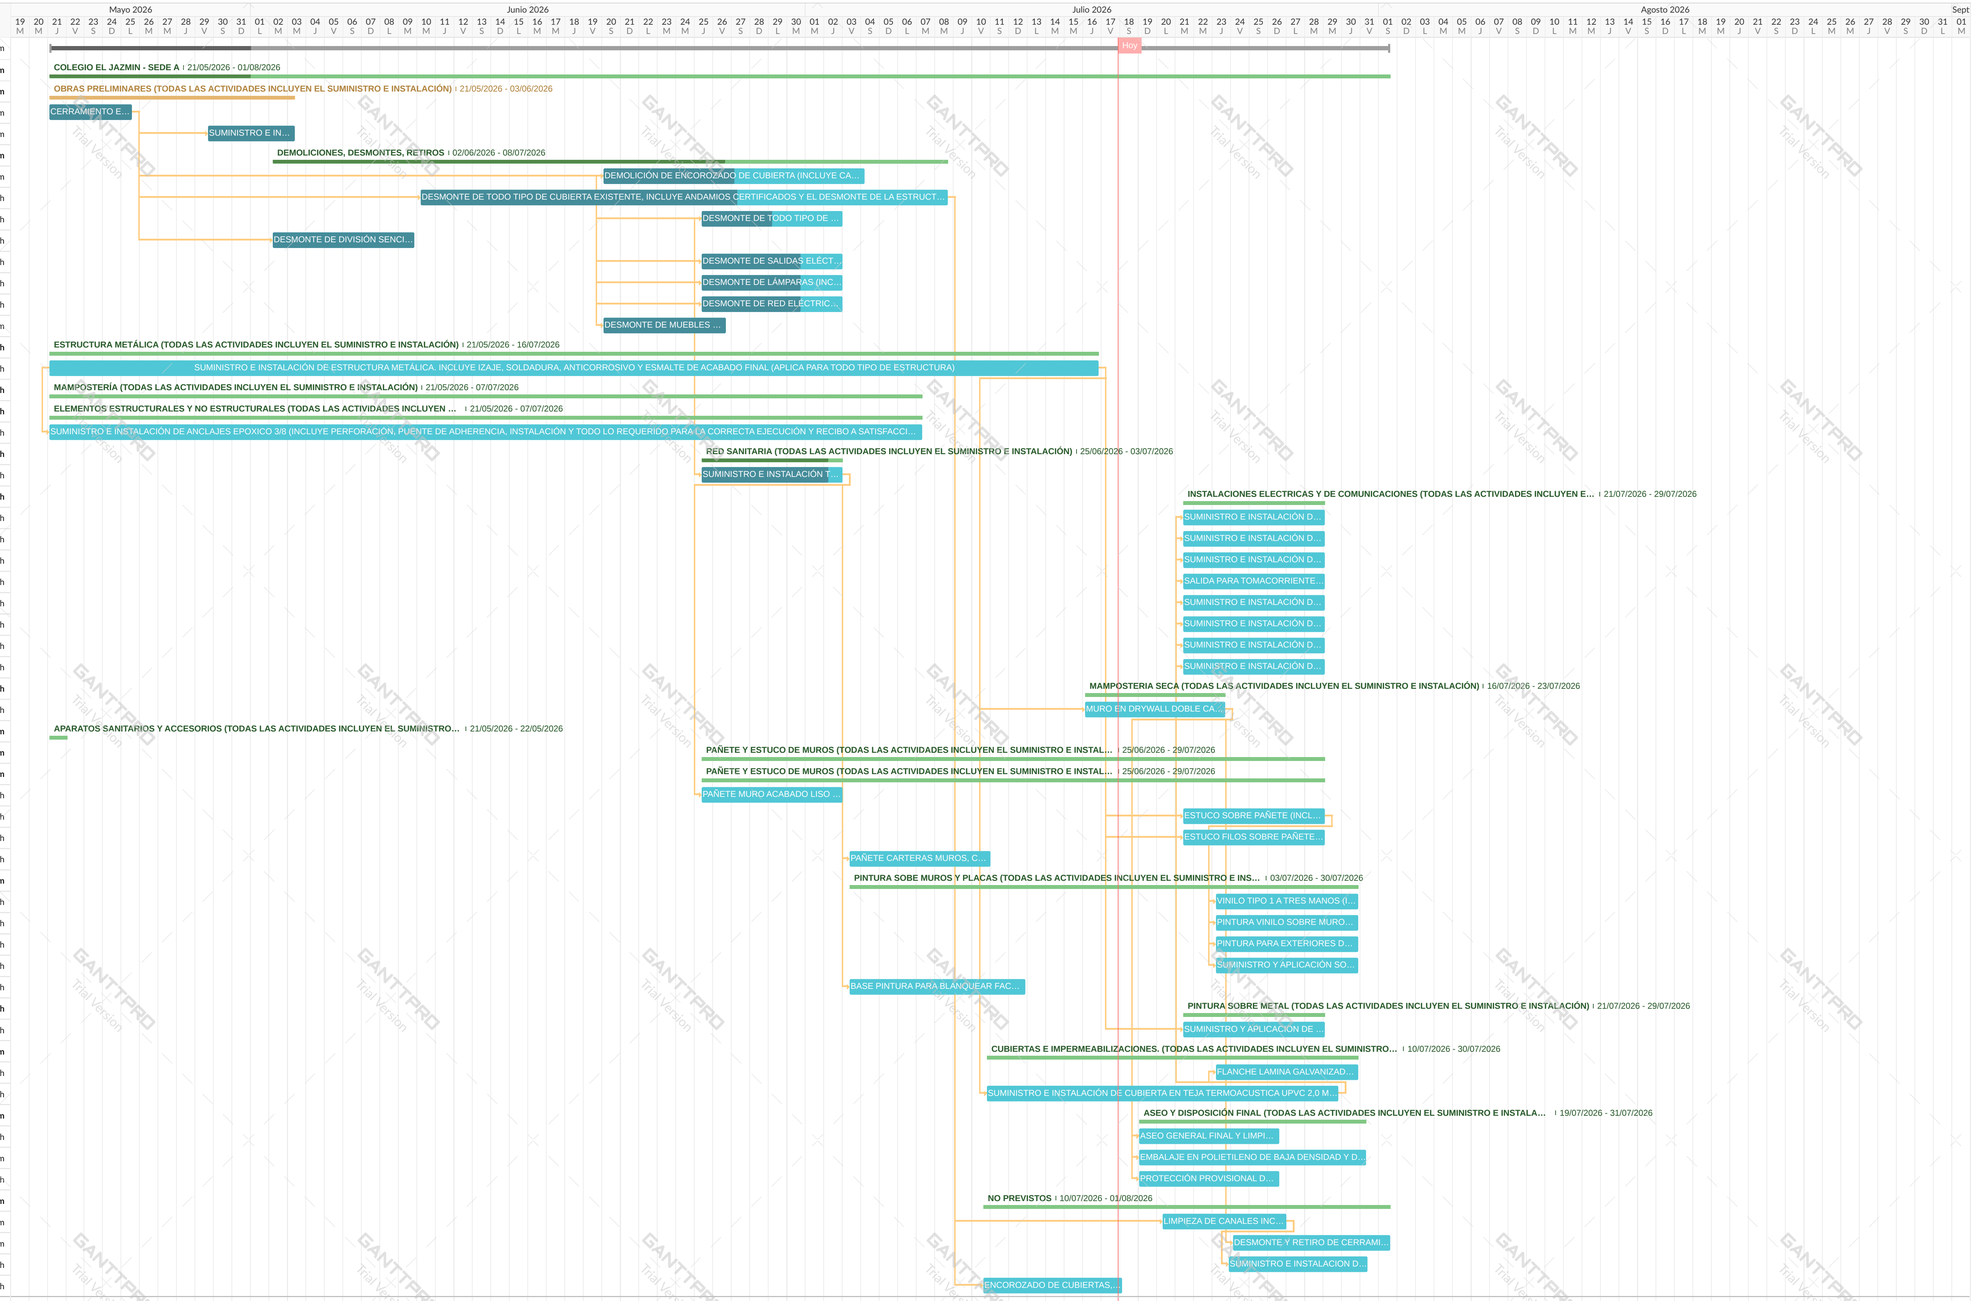


1073246437 | Programacion Colegio Integrado de Fontibon - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**27/02/2026**	98d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	06/11/2025	27/02/2026	98d
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de...	13/11/2025	14/11/2025	2d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**31/01/2026**	**60d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORI...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	26/11/2025	01/12/2025	5d
3.3	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	30/01/2026	31/01/2026	2d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	15/01/2026	16/01/2026	2d
3.5	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/01/2026	14/01/2026	2d
3.6	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.7	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/01/2026	17/01/2026	2d
3.8	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	15/01/2026	17/01/2026	3d
3.9	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	28/01/2026	29/01/2026	2d
4	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**18/12/2025**	**16d**
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	01/12/2025	03/12/2025	3d
4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	16/12/2025	18/12/2025	3d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/12/2025**	**20/01/2026**	**34d**
5.1	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	12/12/2025	16/12/2025	4d
5.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	22/12/2025	26/12/2025	5d
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	19/01/2026	20/01/2026	2d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**19/01/2026**	**40d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	04/12/2025	19/01/2026	40d
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	19/12/2025	22/12/2025	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/01/2026**	**22/01/2026**	**2d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	21/01/2026	22/01/2026	2d
8	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**03/02/2026**	**16d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	27/01/2026	31/01/2026	5d
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	16/01/2026	03/02/2026	16d
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11/02/2026**	**16/02/2026**	**5d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	11/02/2026	13/02/2026	3d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	14/02/2026	16/02/2026	2d
10	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**04/02/2026**	**3d**
10.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	31/01/2026	04/02/2026	3d
11	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/02/2026**	**11/02/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	04/02/2026	11/02/2026	7d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	07/02/2026	11/02/2026	3d
12	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/02/2026**	**19/02/2026**	**3d 6h**
12.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	16/02/2026	18/02/2026	3d
12.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	16/02/2026	19/02/2026	3d 6h
12.3	ENTREGA DE ACABADOS AULA	19/02/2026	19/02/2026	
13	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/01/2026**	**28/01/2026**	**20d**
13.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	21/01/2026	22/01/2026	2d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	23/01/2026	26/01/2026	3d
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	06/01/2026	28/01/2026	20d
13.5	ENTREGA DE CUBIERTA	28/01/2026	28/01/2026	
14	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**27/02/2026**	**98d**
14.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	27/02/2026	98d
14.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	20/01/2026	22/01/2026	3d
15	**NO PREVISTOS**	**15/11/2025**	**19/02/2026**	**82d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	09/02/2026	14/02/2026	5d 1h
15.2	DESMONTE Y RETIRO DE LEONES	21/11/2025	22/11/2025	2d
15.3	DESMONTE DE TAPAS DE SUPERBOARD DE LA CUBIERTA	03/01/2026	06/01/2026	2d
15.4	CORTE DE TEJA	09/01/2026	12/01/2026	3d
15.5	RECORRIDO DE CUBIERTA (INCLUYE SUJECION DE TEJAS Y RESANES A QUE HAYA LUGAR)	29/12/2025	01/01/2026	4d
15.6	APUNTALAMIENTO PARA MURO SEGÚN DISEÑO	15/11/2025	20/11/2025	5d
15.7	PINTURA DE REJA DE TECHO	23/01/2026	27/01/2026	4d
15.8	DESMONTE Y REINSTALACION DE REJA DE TECHO	09/01/2026	16/02/2026	33d
15.9	ENCORAZADO	26/01/2026	27/01/2026	2d
15.10	FIN	19/02/2026	19/02/2026	

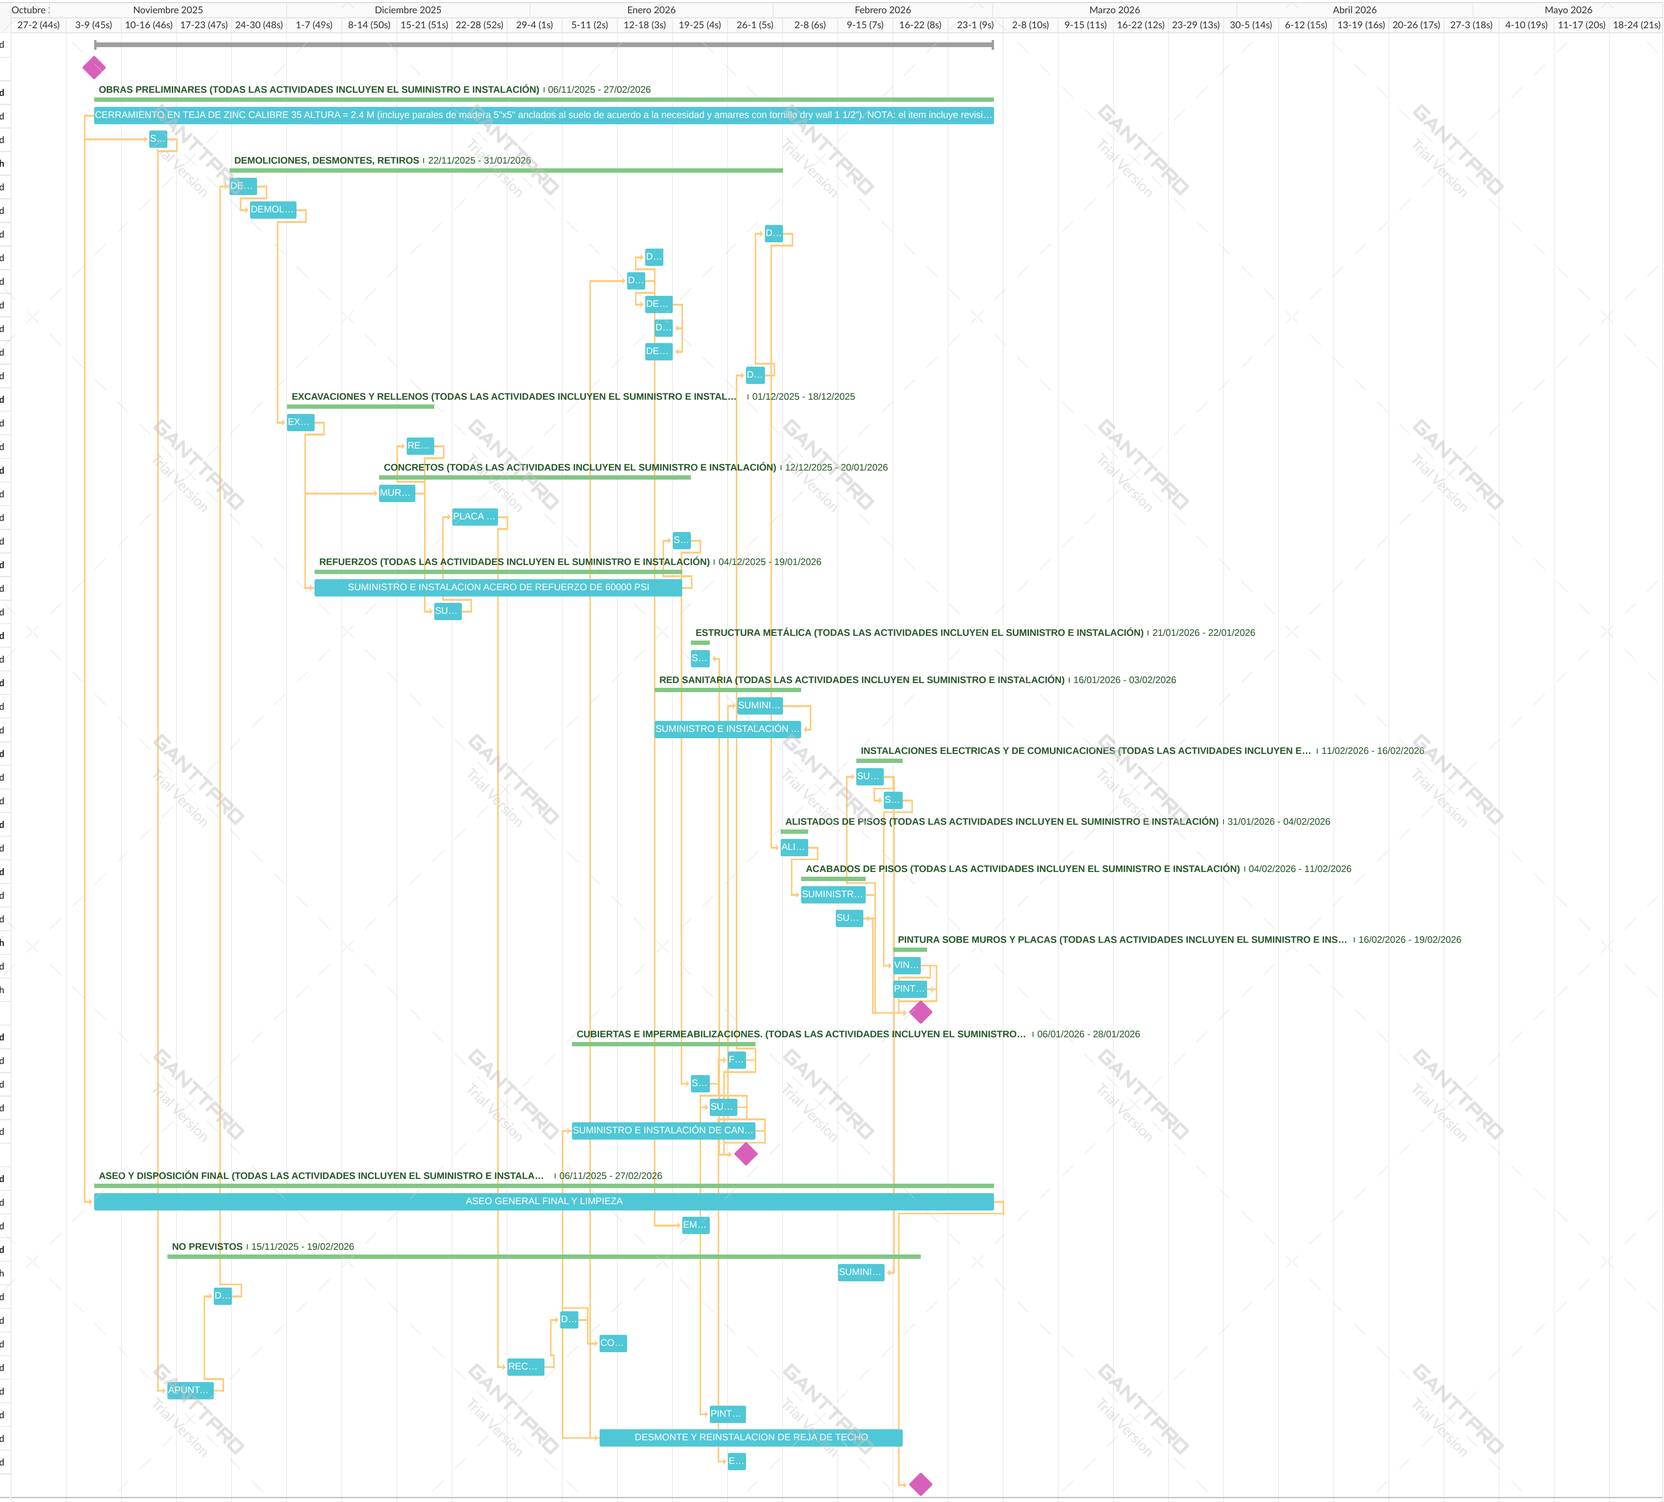


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		21/11/2025	**11/05/2026**	147d
1	INICIO	21/11/2025	21/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	21/11/2025	11/05/2026	147d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22/11/2025**	**04/04/2026**	**114d 1h**
3.1	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	06/03/2026	07/03/2026	2d
3.2	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	20/12/2025	22/12/2025	2d
3.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	22/11/2025	26/11/2025	3d
3.4	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS D...	26/11/2025	28/11/2025	3d
3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	04/04/2026	04/04/2026	1d
3.6	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	13/12/2025	20/12/2025	6d
3.7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.8	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	04/12/2025	05/12/2025	2d
3.9	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ...	07/03/2026	10/03/2026	2d
3.10	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	09/12/2025	11/12/2025	3d
3.11	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	02/12/2025	03/12/2025	2d
3.12	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	09/12/2025	11/12/2025	3d
4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**05/03/2026**	**3d**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	03/03/2026	05/03/2026	3d
5	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/02/2026**	**03/03/2026**	**2d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/02/2026	03/03/2026	2d
6	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/03/2026**	**20/03/2026**	**5d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	16/03/2026	20/03/2026	5d
7	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/02/2026**	**22/04/2026**	**53d**
7.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	20/02/2026	27/02/2026	7d
7.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	20/04/2026	22/04/2026	3d
8	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**28/02/2026**	**3d**
8.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	26/02/2026	28/02/2026	3d
9	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/03/2026**	**01/04/2026**	**4d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	28/03/2026	01/04/2026	4d
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	28/03/2026	01/04/2026	4d
10	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**07/04/2026**	**1d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	07/04/2026	07/04/2026	1d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**23/04/2026**	**14d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	18/04/2026	21/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NE...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N...	07/04/2026	15/04/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	18/04/2026	23/04/2026	4d
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 ...	22/04/2026	22/04/2026	1d
11.7	FIN ACTIVIDADES ELECTRICAS	23/04/2026	23/04/2026	
12	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**09/04/2026**	**2d**
12.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	08/04/2026	09/04/2026	2d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/04/2026**	**18/04/2026**	**5d**
13.1	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	16/04/2026	18/04/2026	3d
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	14/04/2026	15/04/2026	2d
14	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/04/2026**	**14/04/2026**	**9d**
14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	10/04/2026	14/04/2026	4d
14.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	04/04/2026	09/04/2026	5d
15	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/03/2026**	**27/03/2026**	**13d**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	13/03/2026	18/03/2026	5d
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	18/03/2026	23/03/2026	5d
15.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE...	24/03/2026	27/03/2026	4d
16	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/04/2026**	**21/04/2026**	**11d 7h**
16.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	08/04/2026	17/04/2026	9d
16.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/04/2026	21/04/2026	8d
16.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	16/04/2026	20/04/2026	4d
17	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**09/04/2026**	**27/04/2026**	**16d**
17.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	09/04/2026	10/04/2026	2d
17.2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	18/04/2026	20/04/2026	1d
17.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
17.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	23/04/2026	27/04/2026	4d
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**21/04/2026**	**37d**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	21/04/2026	21/04/2026	1d
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	10/03/2026	12/03/2026	3d
19	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10/03/2026**	**11/04/2026**	**28d**
19.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIF...	10/03/2026	21/03/2026	11d
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	25/03/2026	04/04/2026	10d
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS...	07/04/2026	10/04/2026	4d
19.4	FIN DE CUBIERTA	11/04/2026	11/04/2026	
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/11/2025**	**11/05/2026**	**147d**
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	21/11/2025	11/05/2026	147d
20.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	29/12/2025	02/01/2026	5d
21	**NO PREVISTOS**	**06/12/2025**	**27/04/2026**	**121d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BAR...	15/04/2026	18/04/2026	4d
21.2	ESCARIFICIACION	04/04/2026	07/04/2026	2d
21.3	DESMONTE DE REJA DE TECHO	12/12/2025	13/12/2025	2d
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	04/04/2026	16/04/2026	10d
21.5	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.6	DEMOLICION DE MUROS DE SUPERBOARD INCLUYE EL RETIRO	06/12/2025	08/12/2025	2d
21.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA DE .80X2.10 INCLUYE CHAPA	09/04/2026	10/04/2026	2d
21.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TI...	21/04/2026	21/04/2026	1d
21.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL , BRIDA DE ...	20/04/2026	20/04/2026	1d
21.10	ENCOROZADO	21/03/2026	24/03/2026	3d
21.11	PAÑETE LINEAL .HASTA 59 M	27/02/2026	05/03/2026	6d
21.12	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	05/03/2026	10/03/2026	5d
21.13	ENTREGA DE BAÑO	22/04/2026	22/04/2026	
21.14	FIN	27/04/2026	27/04/2026	

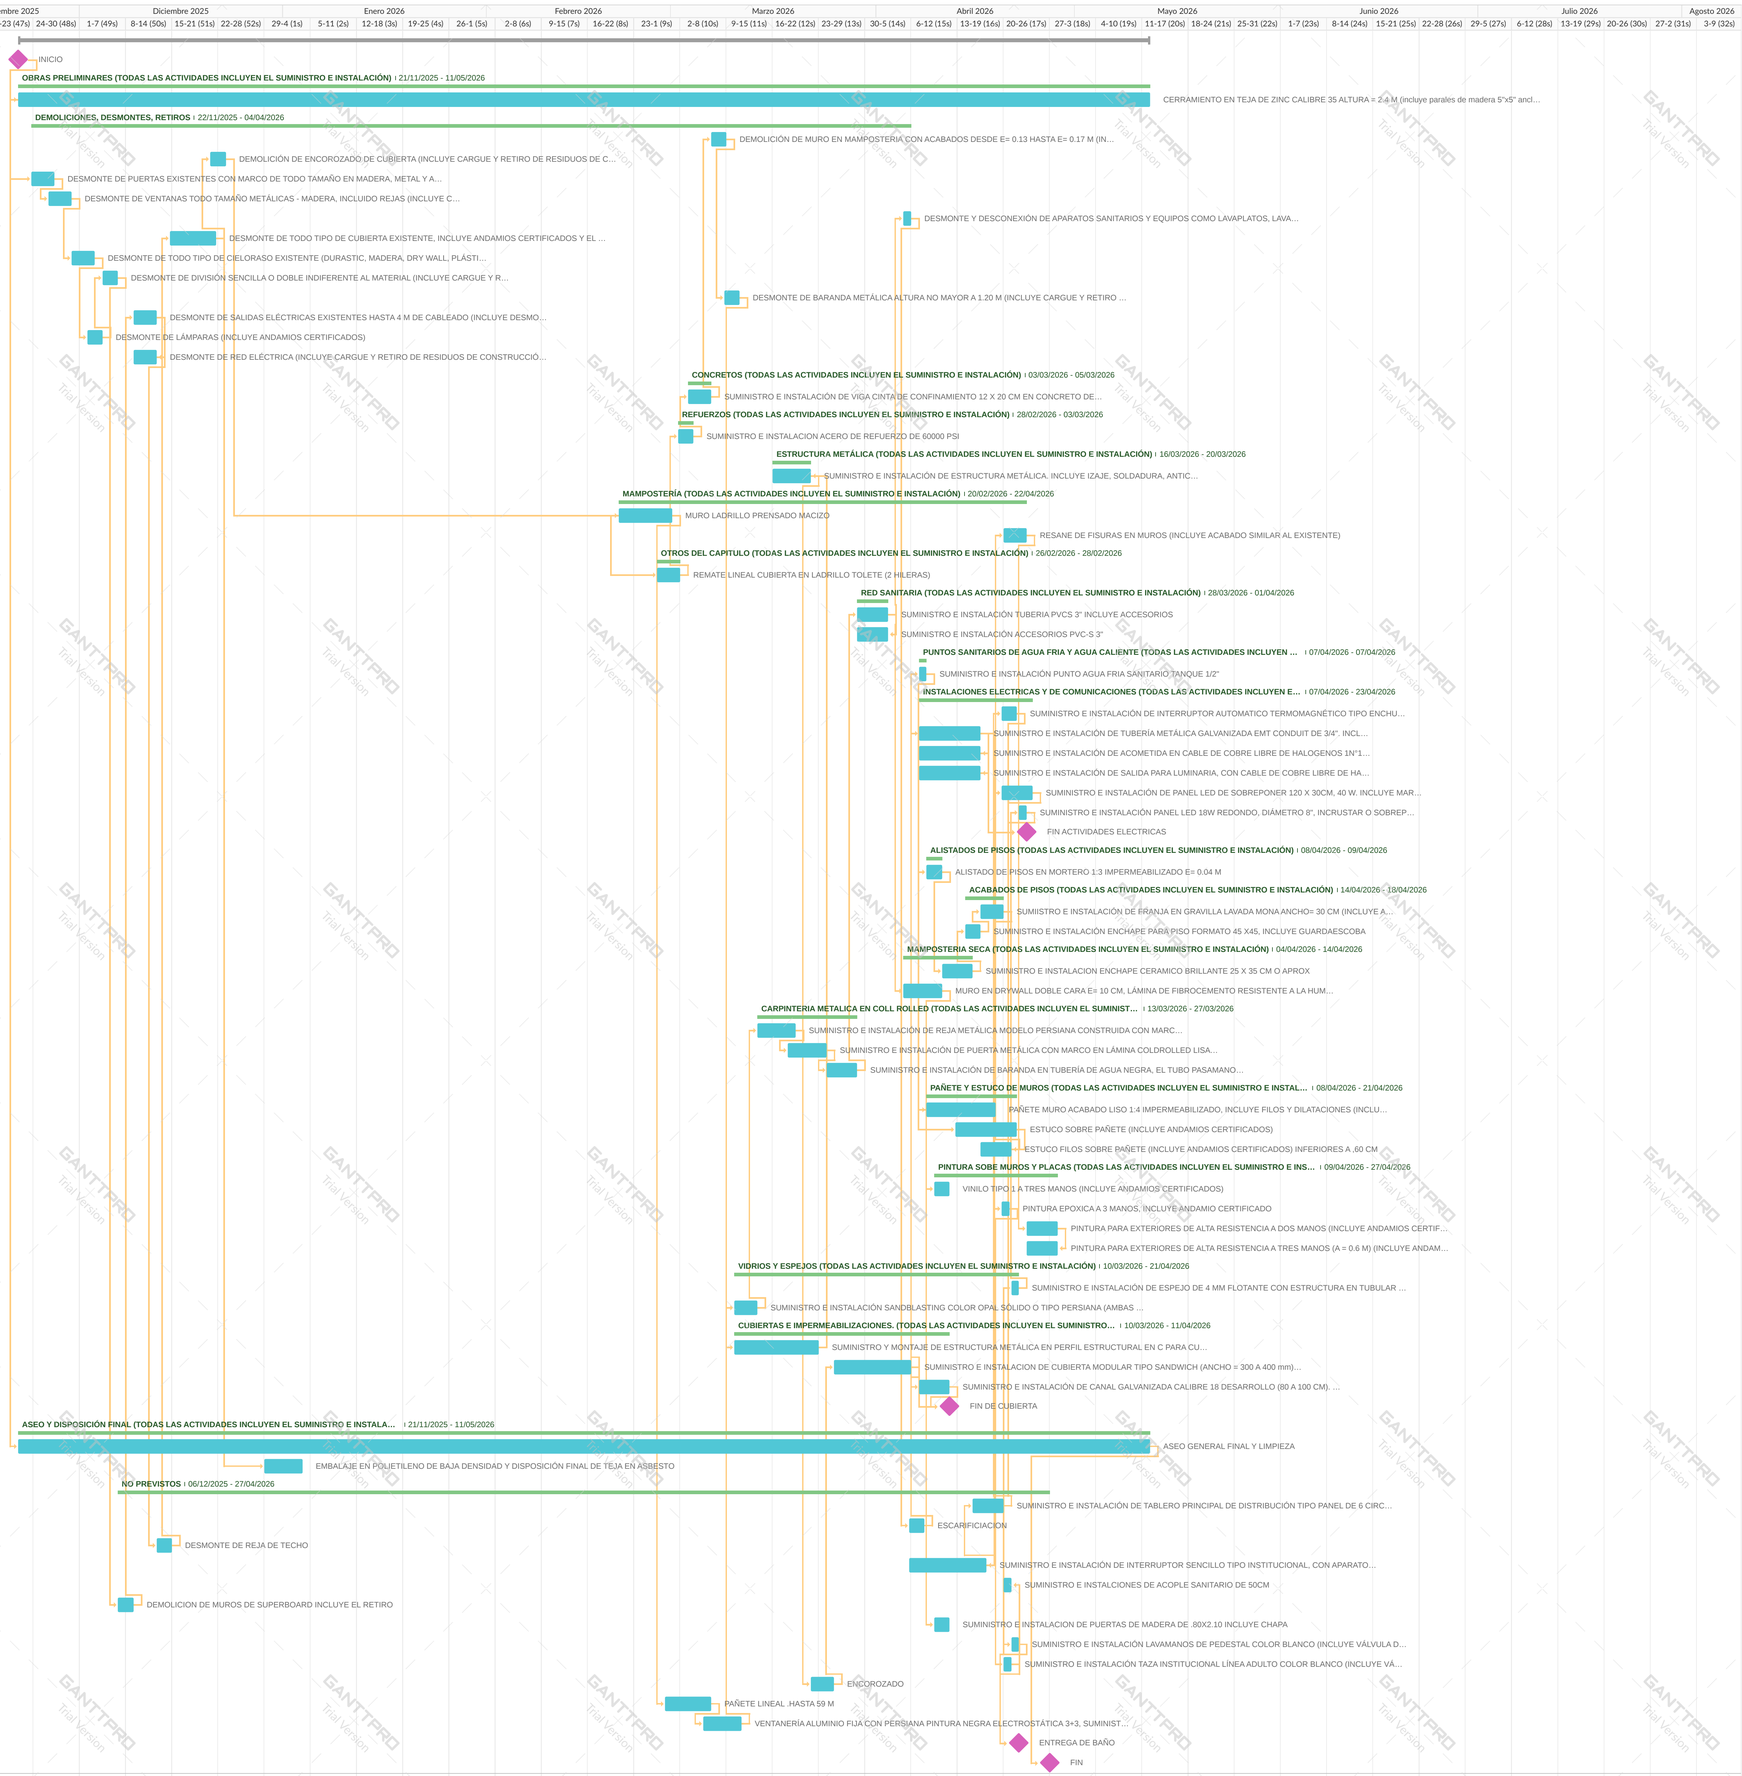


1073246437 | Programacion Colegio Julio Garavito Armero - Sede C

Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
	15/05/2026	**01/08/2026**	33d 12h 26m
1 COLEGIO JULIO GARAVITO - SEDE C	**15/05/2026**	**01/08/2026**	**33d 12h 26m**
1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL...	**19/07/2026**	**26/07/2026**	**3d 5h**
1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en ca...	19/07/2026	26/07/2026	3d 5h
1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	**15/05/2026**	**30/05/2026**	**6d 13h 59m**
1.2.1 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MA...	15/05/2026	22/05/2026	3d 5h
1.2.2 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUY...	23/05/2026	30/05/2026	3d 5h
1.3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E...	**01/06/2026**	**08/06/2026**	**3d 5h**
1.3.1 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESP...	01/06/2026	08/06/2026	3d 5h
1.4 ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN ...	**18/06/2026**	**29/07/2026**	**17d 11h 54m**
1.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. IN...	18/06/2026	29/07/2026	17d 11h 54m
1.5 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, D...	**19/07/2026**	**26/07/2026**	**3d 5h**
1.5.1 REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADE...	**19/07/2026**	**26/07/2026**	**3d 5h**
1.5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCAN...	19/07/2026	26/07/2026	3d 5h
1.6 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCL...	**10/07/2026**	**18/07/2026**	**3d 5h**
1.6.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES IN...	**10/07/2026**	**18/07/2026**	**3d 5h**
1.6.1.1 PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, I...	10/07/2026	18/07/2026	3d 5h
1.7 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDA...	**19/07/2026**	**31/07/2026**	**5d 5h 30m**
1.7.1 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 C,...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.7.2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA PO...	19/07/2026	31/07/2026	5d 5h 30m
1.7.3 TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELAST...	24/07/2026	29/07/2026	2d 30m
1.7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONAT...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.8 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUY...	**10/07/2026**	**01/08/2026**	**9d 6h 58m**
1.8.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	25/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.8.2 PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES E...	10/07/2026	29/07/2026	8d 2h
1.9 NO PREVISTOS	**23/05/2026**	**01/08/2026**	**30d 3h 27m**
1.9.1 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MEMBRANA PVC PLASTIFICD...	25/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.9.2 DESMONTE DE MEMBRANA PVC PLASTIFICDA TIPO SIKAPLA...	23/05/2026	30/05/2026	3d 5h
1.9.3 DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARARAYO INCLUYE ACCES...	19/07/2026	26/07/2026	3d 5h

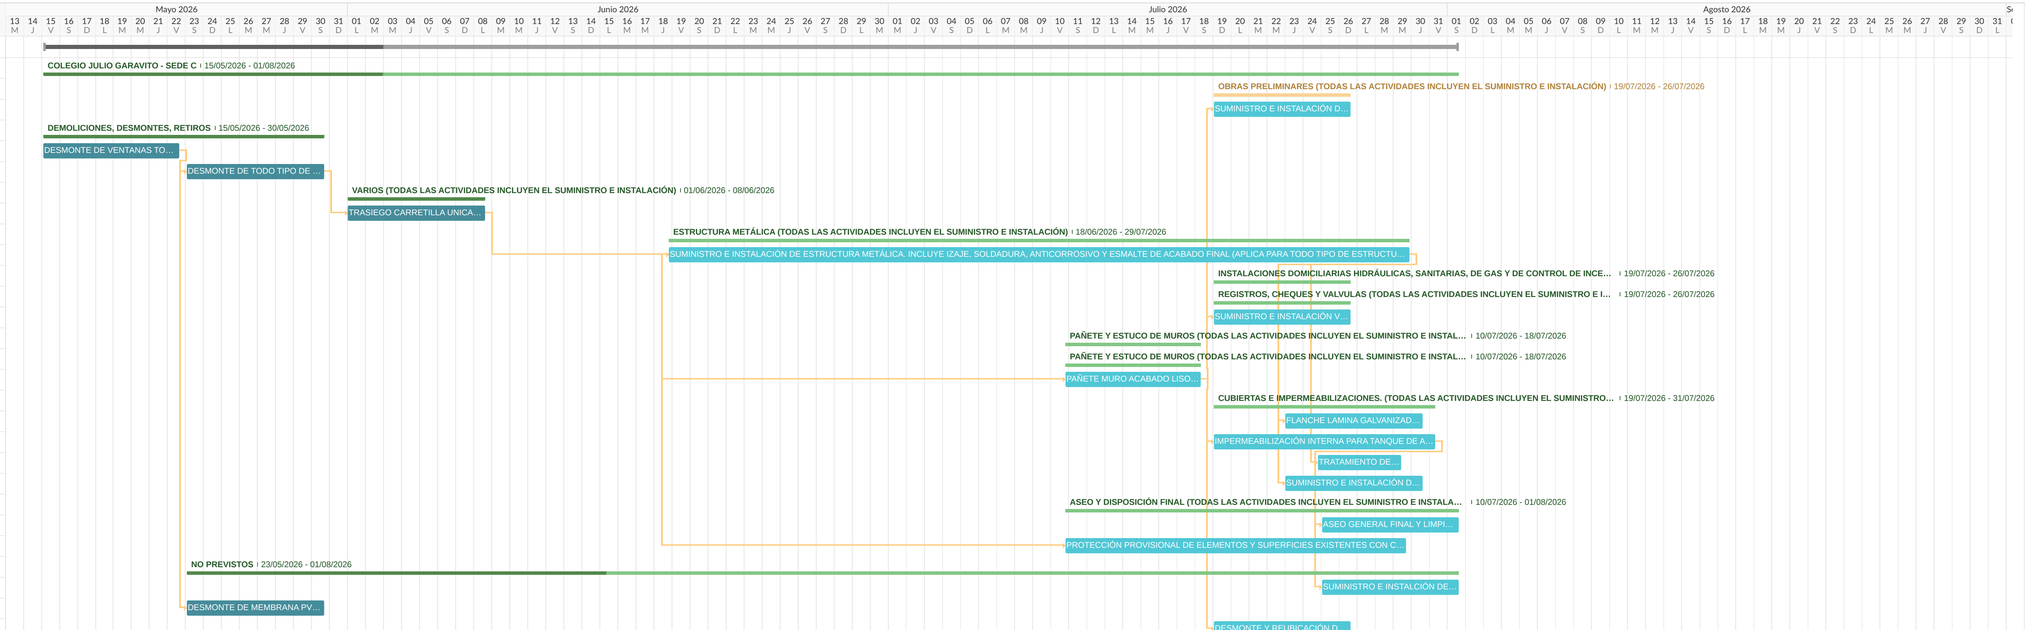


1073246437 | Programacion Colegio Marco Antonio Carreño - Sede B

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		01/12/2025	**25/04/2026**	126d
1	INICIO	01/12/2025	01/12/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**04/12/2025**	**24/04/2026**	**122d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	04/12/2025	24/04/2026	122d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**06/12/2025**	**13/03/2026**	**84d**
3.1	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	09/01/2026	15/01/2026	6d
3.2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	26/12/2025	08/01/2026	12d
3.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFIC...	06/12/2025	10/12/2025	4d
3.4	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	23/12/2025	23/12/2025	1d
3.5	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/12/2025	23/12/2025	5d
3.6	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11/12/2025	18/12/2025	7d
3.7	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	17/12/2025	23/12/2025	6d
3.8	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	12/03/2026	13/03/2026	2d
3.9	FIN DESMONTE DE CUBIERTA	09/01/2026	09/01/2026	
4	**MANTENIMIENTOS**	**10/04/2026**	**16/04/2026**	**6d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	10/04/2026	16/04/2026	6d
4.2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	10/04/2026	16/04/2026	6d
5	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**31/01/2026**	**06/02/2026**	**6d**
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	31/01/2026	06/02/2026	6d
6	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28/01/2026**	**30/01/2026**	**3d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	28/01/2026	30/01/2026	3d
7	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
8	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16/01/2026**	**13/04/2026**	**75d**
8.1	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	16/01/2026	24/01/2026	8d
8.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	09/04/2026	13/04/2026	4d
9	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**28/01/2026**	**4d**
9.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	24/01/2026	28/01/2026	4d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**02/03/2026**	**05/03/2026**	**4d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	02/03/2026	05/03/2026	4d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	03/03/2026	05/03/2026	3d
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/03/2026**	**09/04/2026**	**18d 7h**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	31/03/2026	01/04/2026	2d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	19/03/2026	27/03/2026	8d
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/04/2026	09/04/2026	4d
12	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**13/04/2026**	**115d**
12.1	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTU...	12/03/2026	18/03/2026	6d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	11/04/2026	13/04/2026	2d
12.3	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO D...	01/12/2025	03/12/2025	3d
13	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18/03/2026**	**16/04/2026**	**26d**
13.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/03/2026	19/03/2026	2d
13.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARI...	09/04/2026	16/04/2026	7d
13.3	FIN DE PINTURA	16/04/2026	16/04/2026	
14	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**19/03/2026**	**35d 7h**
14.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	14/03/2026	19/03/2026	4d
14.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	14/03/2026	17/03/2026	3d
14.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	06/02/2026	20/02/2026	13d
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	02/03/2026	12/03/2026	10d
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	12/03/2026	14/03/2026	3d
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TO...	25/02/2026	02/03/2026	5d
14.7	FIN CUBIERTA	19/03/2026	19/03/2026	
15	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**01/12/2025**	**25/04/2026**	**126d**
15.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	01/12/2025	25/04/2026	126d
15.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	15/01/2026	22/01/2026	7d
16	**NO PREVISTOS**	**02/12/2025**	**16/04/2026**	**116d 7h**
16.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO Y REINSTALACION	12/03/2026	17/03/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	20/03/2026	27/03/2026	7d
16.3	PUERTA CON CHAPA PARA CERRAMIENTO	02/12/2025	03/12/2025	2d
16.4	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD	11/04/2026	16/04/2026	4d
16.5	PINTURA REJA CUBIERTA	23/02/2026	24/02/2026	2d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, BA...	28/03/2026	31/03/2026	3d
16.7	ENCORAZADO	19/02/2026	23/02/2026	4d
16.8	FIN	16/04/2026	16/04/2026	

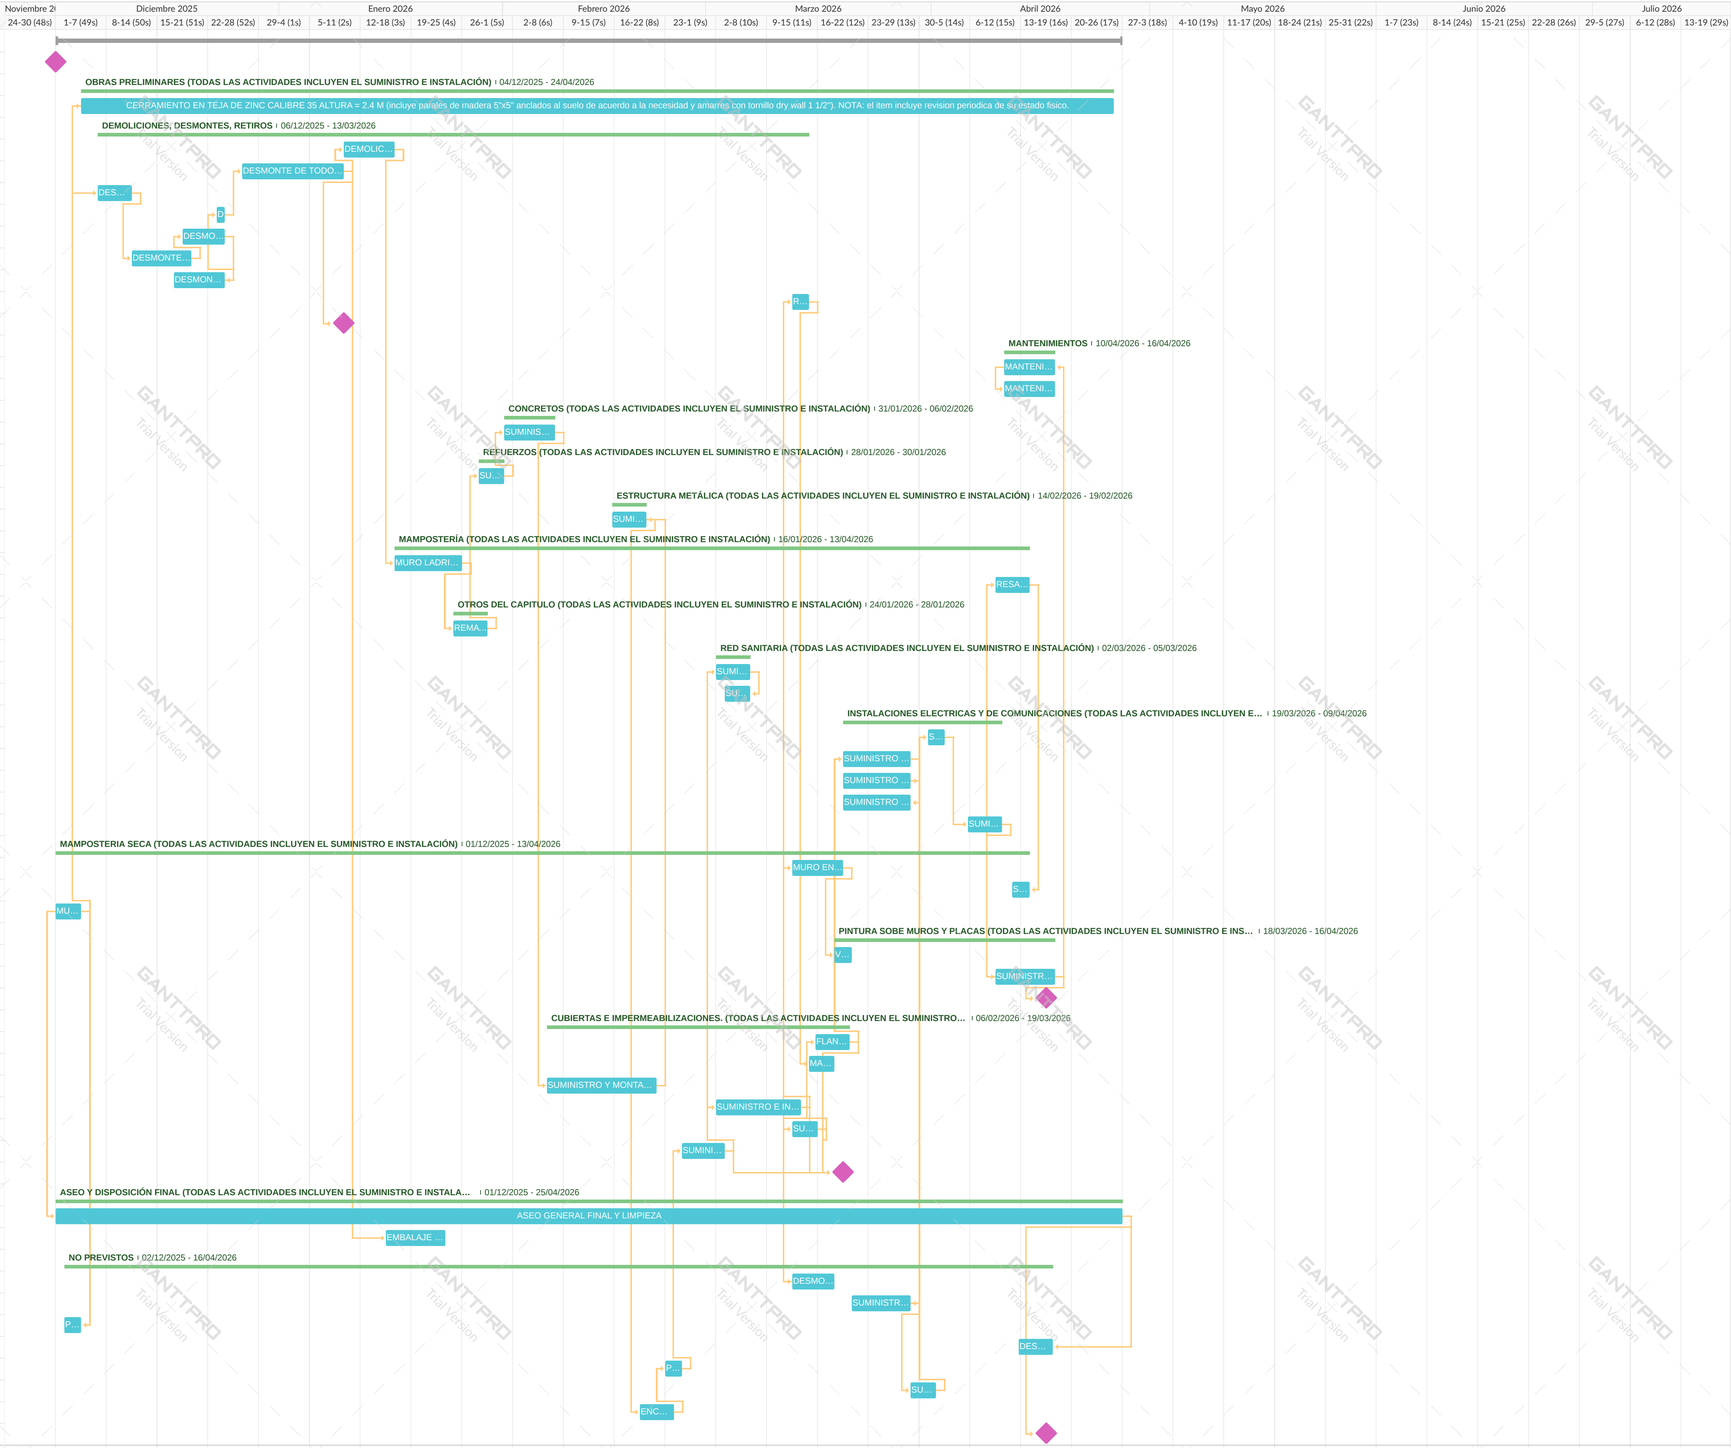


	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		24/11/2025	**18/04/2026**	126d
1	INICIO	24/11/2025	24/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesi...	24/11/2025	18/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**29/11/2025**	**28/01/2026**	**52d**
3.1	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/01/2026	28/01/2026	1d
3.2	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE ...	13/12/2025	17/12/2025	3d
3.3	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AU...	29/11/2025	04/12/2025	5d
4	**MANTENIMIENTOS**	**17/12/2025**	**29/01/2026**	**38d**
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMON...	17/01/2026	29/01/2026	10d
4.2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE M...	17/12/2025	19/12/2025	3d
4.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTI...	16/01/2026	29/01/2026	12d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**19/02/2026**	**4d**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	14/02/2026	19/02/2026	4d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21/02/2026**	**26/02/2026**	**4d**
6.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	21/02/2026	26/02/2026	4d
7	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**20/12/2025**	**1d**
7.1	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	20/12/2025	20/12/2025	1d
8	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**21/02/2026**	**3d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	19/02/2026	21/02/2026	3d
9	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/02/2026**	**27/03/2026**	**26d**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABAD...	26/02/2026	27/03/2026	26d
10	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/01/2026**	**03/02/2026**	**5d**
10.1	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	29/01/2026	03/02/2026	5d
11	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30/03/2026**	**06/04/2026**	**7d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	30/03/2026	03/04/2026	5d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	06/04/2026	06/04/2026	1d
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**12/02/2026**	**1d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PAR...	12/02/2026	12/02/2026	1d
13	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**14/01/2026**	**21d**
13.1	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA...	27/12/2025	07/01/2026	10d
13.2	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE ...	08/01/2026	13/01/2026	5d
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	20/12/2025	25/12/2025	5d
13.4	PINTURA DE CANCHA	14/01/2026	14/01/2026	
14	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/02/2026**	**12/02/2026**	**9d**
14.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	03/02/2026	06/02/2026	4d
14.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	04/02/2026	06/02/2026	3d
14.3	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	12/02/2026	5d
14.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10/02/2026	11/02/2026	2d
14.5	ENTREGA DE PINTURA	12/02/2026	12/02/2026	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/04/2026**	**08/04/2026**	**2d**
15.1	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA...	07/04/2026	08/04/2026	2d
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/12/2025**	**08/04/2026**	**105d 1h**
16.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	08/04/2026	08/04/2026	1d
16.2	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	06/12/2025	13/12/2025	6d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	30/03/2026	04/04/2026	6d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS ...	25/03/2026	30/03/2026	5d
16.5	ENTREGA DE CUBIERTA	13/12/2025	13/12/2025	
16.6	ENTREGA PERGOLA	08/04/2026	08/04/2026	
17	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/11/2025**	**18/04/2026**	**126d**
17.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24/11/2025	18/04/2026	126d
18	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/02/2026**	**10/04/2026**	**50d**
18.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	12/02/2026	10/04/2026	50d
19	**NO PREVISTOS**	**29/11/2025**	**09/04/2026**	**112d**
19.1	MANTENIMIENTO DE REJILLA DE CARCAMO (AJUSTE-ALINEACION-SOLDADURA)	14/01/2026	17/01/2026	4d
19.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTE,	13/12/2025	16/12/2025	2d
19.3	DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUES DE AGUA	29/11/2025	01/12/2025	2d
19.4	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIA	01/12/2025	17/12/2025	15d
19.5	AUTONIVELANTE	04/12/2025	06/12/2025	3d
19.6	FIN	09/04/2026	09/04/2026	

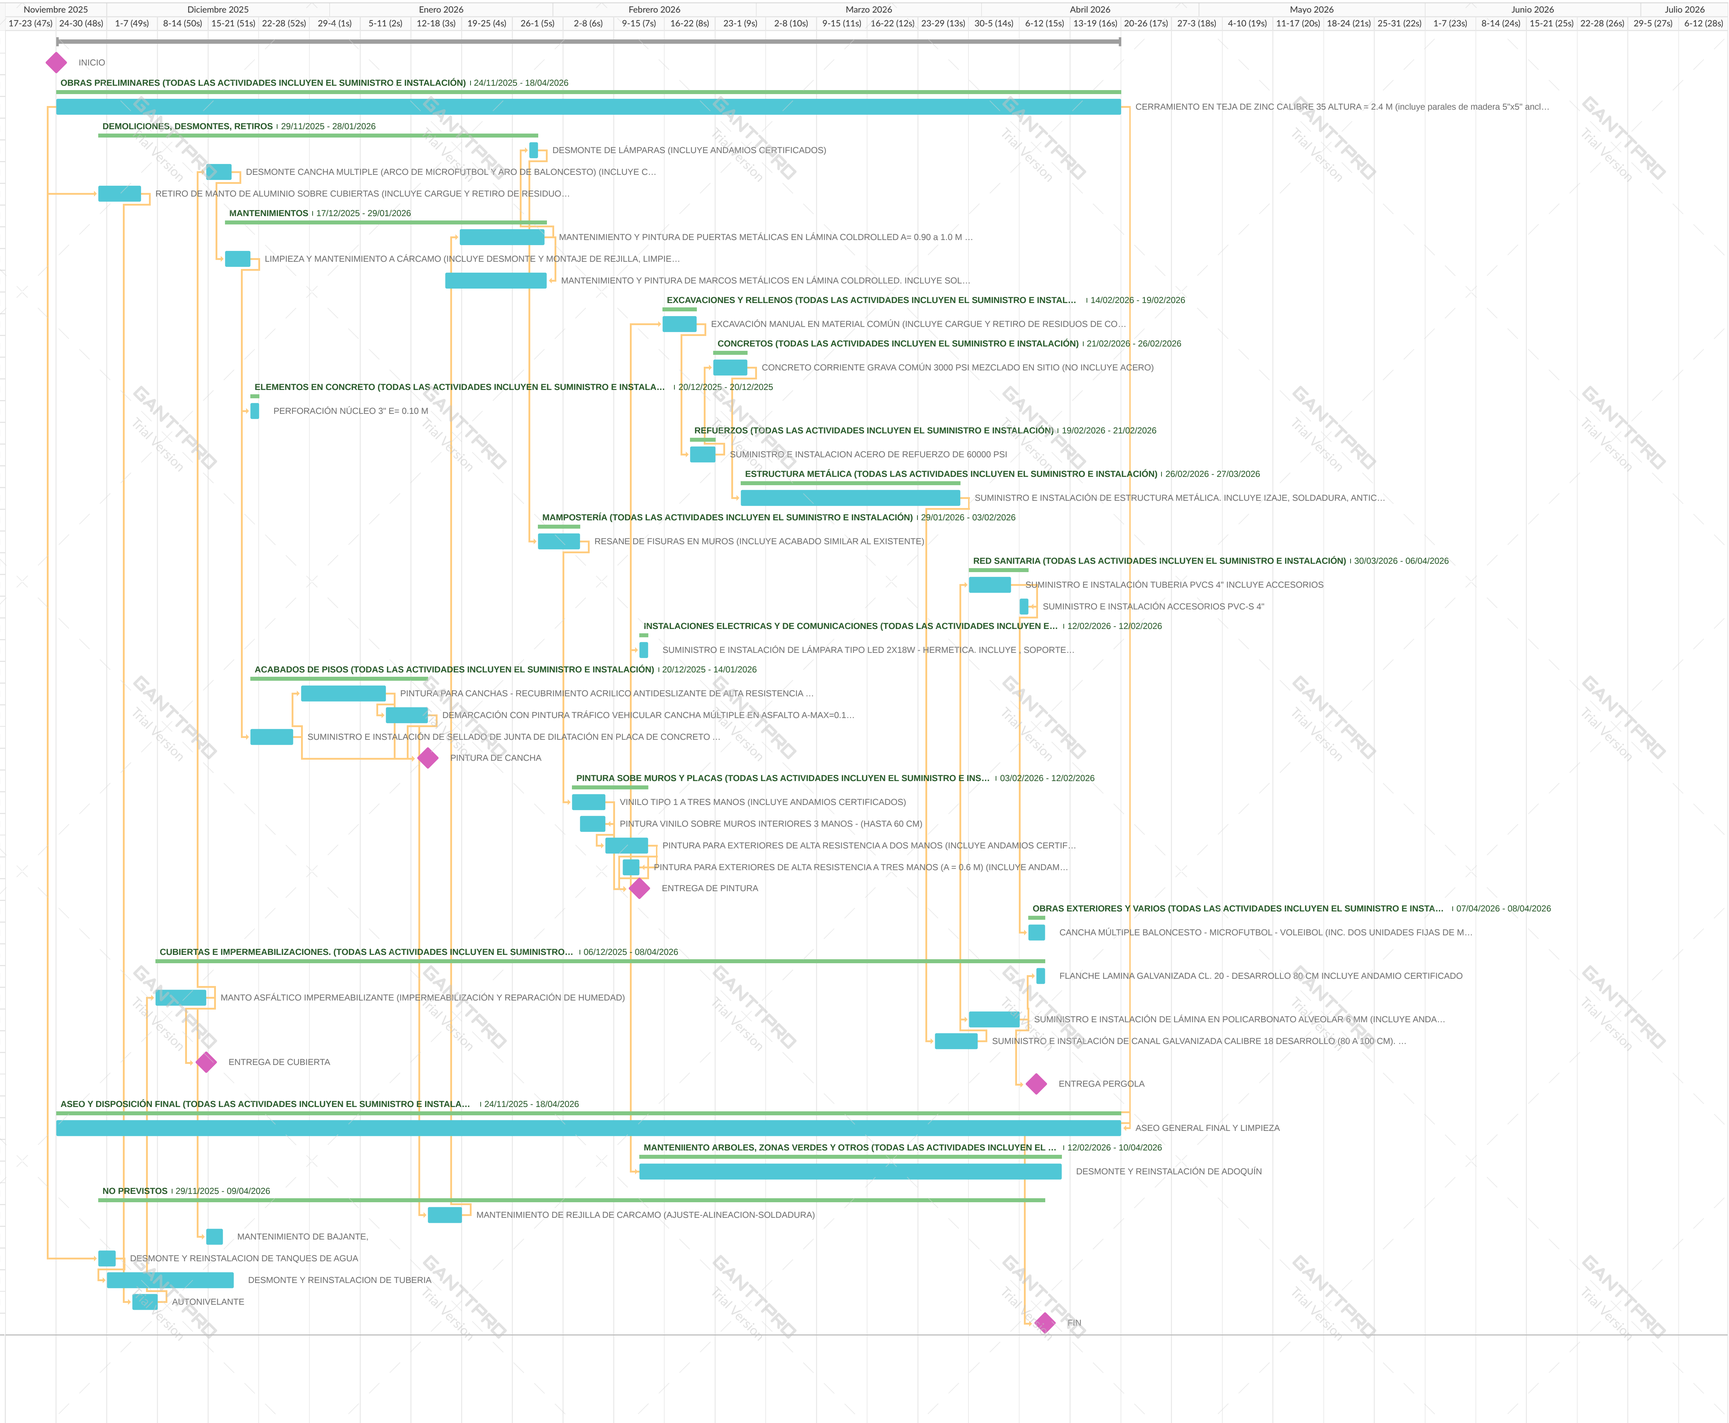


1073246437 | Programacion Colegio San Francisco de Asis - Sede B

Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
	15/05/2026	**01/08/2026**	33d 10h 50m
1 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	**15/05/2026**	**01/08/2026**	**33d 10h 50m**
1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUY...	**15/05/2026**	**16/06/2026**	**13d 14h 56m**
1.1.1 REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría a...	08/06/2026	16/06/2026	3d 5h
1.1.2 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = ...	15/05/2026	23/05/2026	3d 9h 15m
1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA ...	23/05/2026	31/05/2026	3d 5h
1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	**16/06/2026**	**03/07/2026**	**7d 8h 59m**
1.2.1 DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA ...	25/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.2.2 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYO...	16/06/2026	24/06/2026	3d 5h
1.2.3 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (I...	26/06/2026	03/07/2026	3d 5h
1.3 MANTENIMIENTOS	**23/07/2026**	**30/07/2026**	**3d 5h**
1.3.1 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENT...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.3.2 MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0....	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.3.3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE D...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINIS...	**23/07/2026**	**30/07/2026**	**3d 5h**
1.4.1 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTO...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.4.2 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A...	23/07/2026	30/07/2026	3d 5h
1.5 EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES I...	**15/05/2026**	**24/06/2026**	**17d 2h 55m**
1.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUY...	15/05/2026	22/05/2026	3d 5h
1.5.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINIST...	16/06/2026	24/06/2026	3d 5h
1.6 CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SU...	**22/06/2026**	**28/07/2026**	**15d 56m**
1.6.1 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FO...	20/07/2026	28/07/2026	3d 5h
1.6.2 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. I...	22/06/2026	27/06/2026	2d 30m
1.7 ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES IN...	**24/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 5h**
1.7.1 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000...	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.8 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUM...	**16/06/2026**	**14/07/2026**	**12d 3h**
1.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE ...	16/06/2026	14/07/2026	12d 3h
1.8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDAD...	16/06/2026	24/06/2026	3d 5h
1.9 ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLU...	**24/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 5h**
1.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI...	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.10 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINIST...	**04/07/2026**	**01/08/2026**	**11d 20h 57m**
1.10.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLU...	**04/07/2026**	**23/07/2026**	**7d 20h 58m**
1.10.1.1 PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E=...	04/07/2026	18/07/2026	6d 1h 30m
1.10.1.2 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	15/07/2026	23/07/2026	3d 5h
1.10.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLU...	**24/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 5h**
1.10.2.1 PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILIC...	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.10.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA...	24/07/2026	31/07/2026	2d 17h 30m
1.10.3 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INC...	**23/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 17h**
1.10.3.1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS L...	**24/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 5h**
1.10.3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TU...	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.10.3.2 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ...	**23/07/2026**	**31/07/2026**	**3d 5h**
1.10.3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA E...	23/07/2026	31/07/2026	3d 5h
1.11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTI...	**19/07/2026**	**01/08/2026**	**5d 12h 59m**
1.11.1 MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABI...	19/07/2026	01/08/2026	5d 9h 45m
1.11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBON...	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIM...	20/07/2026	28/07/2026	3d 5h
1.12 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES IN...	**24/07/2026**	**01/08/2026**	**3d 5h**
1.12.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24/07/2026	01/08/2026	3d 5h
1.13 NO PREVISTOS	**22/07/2026**	**29/07/2026**	**3d 5h**
1.13.1 DESMONTE Y REINSTALACION DE APANTALLAMIENTO, ...	22/07/2026	29/07/2026	3d 5h
1.13.2 DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL ...	22/07/2026	29/07/2026	3d 5h

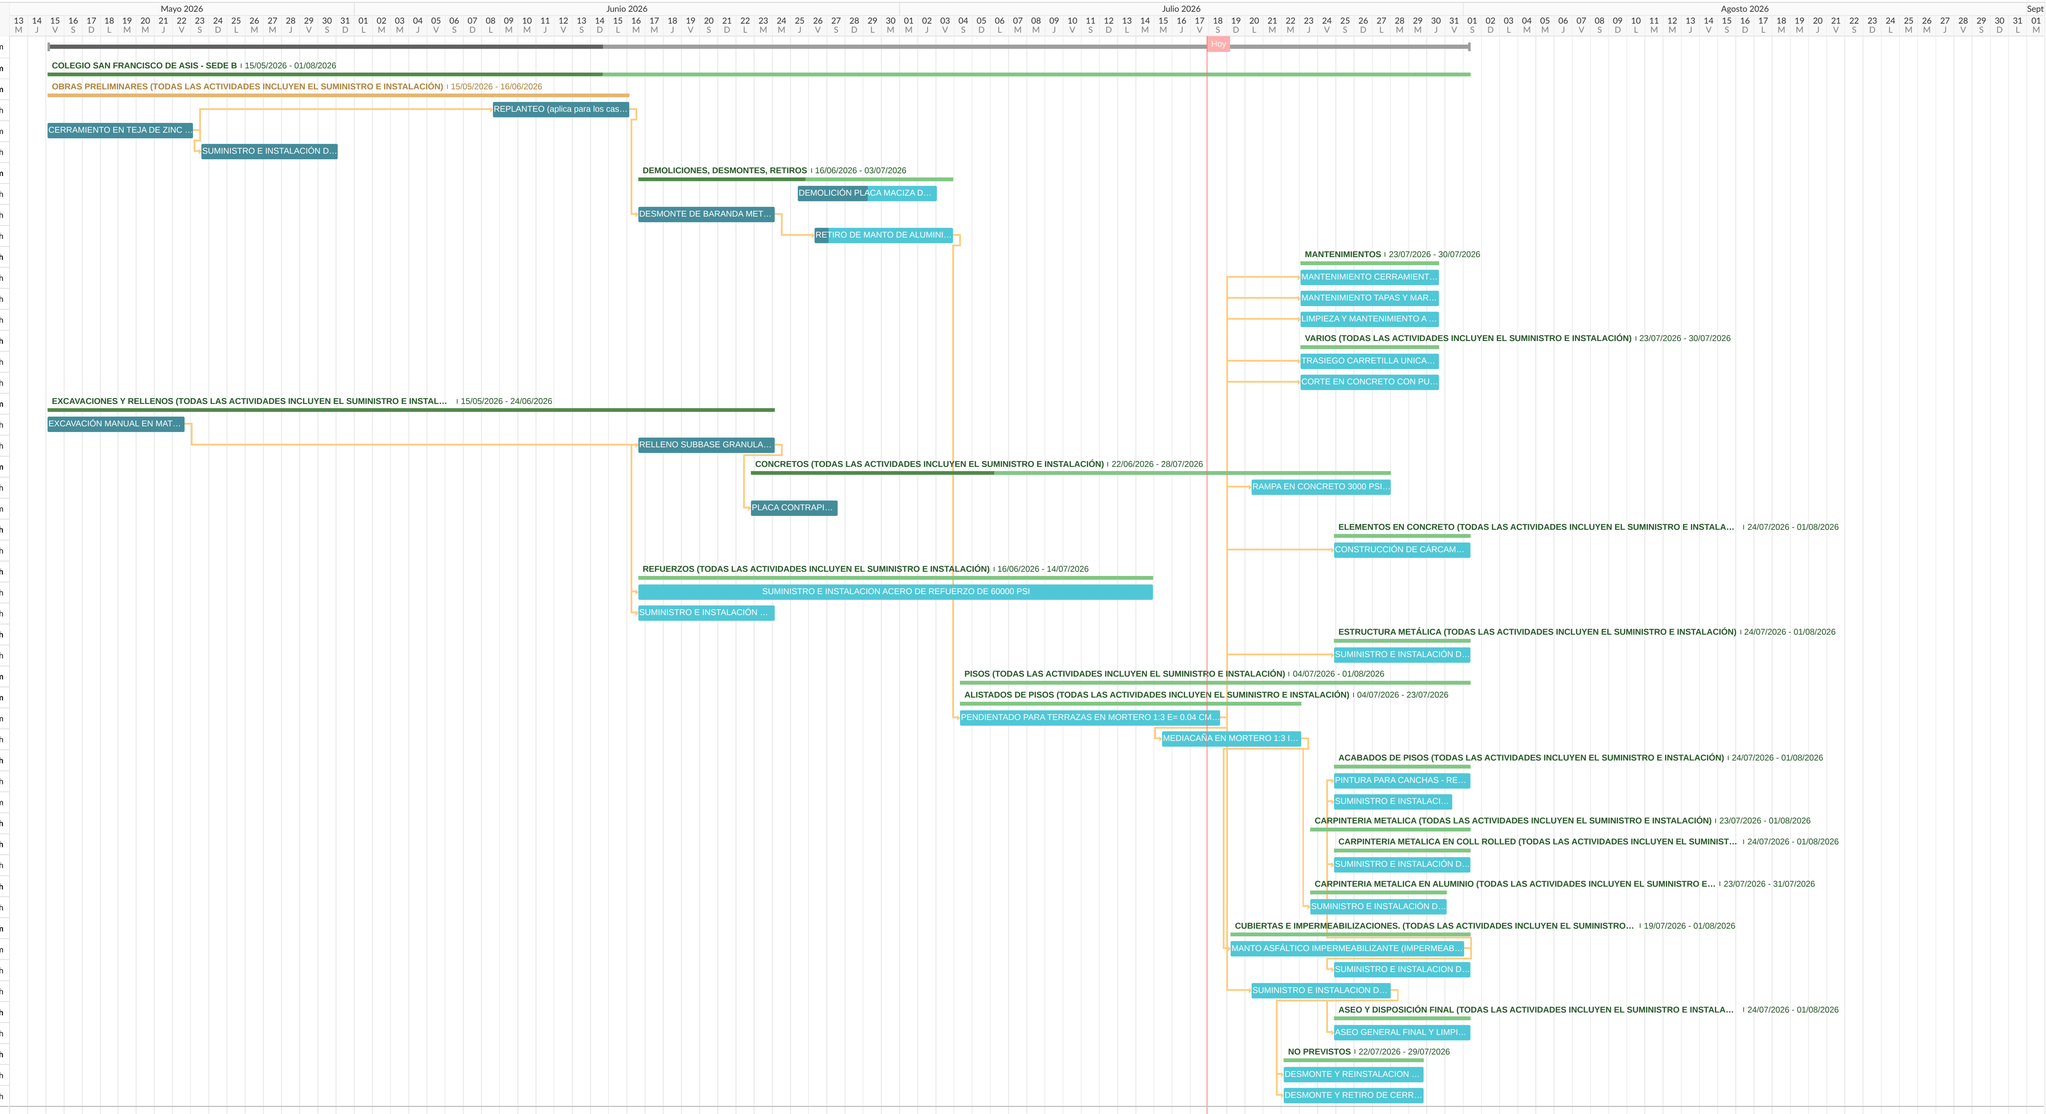

1073246437 | Programacion Colegio Tecnico Internacional - Sede A

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Duración
		06/11/2025	**01/04/2026**	126d
1	INICIO	06/11/2025	06/11/2025	
2	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
2.1	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la neces...	06/11/2025	01/04/2026	126d
3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**08/11/2025**	**19/02/2026**	**89d**
3.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	06/12/2025	12/12/2025	5d
3.2	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS A...	05/12/2025	06/12/2025	2d
3.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RE...	20/11/2025	17/01/2026	51d
3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	24/11/2025	28/11/2025	5d
3.5	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	10/01/2026	14/01/2026	3d
3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE C...	19/01/2026	20/01/2026	2d
3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS ...	15/01/2026	19/01/2026	4d
3.8	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, E...	10/11/2025	11/11/2025	2d
3.9	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA ...	08/01/2026	10/01/2026	3d
3.11	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR...	08/11/2025	10/11/2025	2d
3.12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y A...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.13	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.14	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDA...	18/02/2026	19/02/2026	2d
3.15	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE C...	29/11/2025	02/12/2025	3d
3.16	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y R...	17/12/2025	18/12/2025	2d
3.17	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO D...	12/11/2025	13/11/2025	2d
3.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y ...	13/12/2025	17/12/2025	4d
4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**16/03/2026**	**75d**
4.1	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUP...	19/12/2025	16/03/2026	75d
5	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**30/12/2025**	**9d 7h**
5.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZ...	19/12/2025	20/12/2025	2d
5.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	27/12/2025	30/12/2025	2d
6	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**05/01/2026**	**20/01/2026**	**14d**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUER...	17/01/2026	20/01/2026	3d
6.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	05/01/2026	07/01/2026	3d
7	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**16/01/2026**	**12d**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	15/01/2026	16/01/2026	2d
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	03/01/2026	05/01/2026	2d
8	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24/01/2026**	**26/01/2026**	**2d**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABA...	24/01/2026	26/01/2026	2d
9	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**08/01/2026**	**25/03/2026**	**65d 7h**
9.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	19/01/2026	03/03/2026	37d 2h
9.2	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	08/01/2026	12/01/2026	4d
9.3	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	07/02/2026	25/03/2026	39d
10	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/12/2025**	**09/02/2026**	**45d**
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	20/12/2025	24/12/2025	3d
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	06/02/2026	09/02/2026	3d
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	19/12/2025	24/12/2025	5d
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	19/12/2025	24/12/2025	5d
11	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**24/12/2025**	**29/12/2025**	**5d**
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	24/12/2025	26/12/2025	3d
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	26/12/2025	29/12/2025	3d
12	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/12/2025**	**26/12/2025**	**6d**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	23/12/2025	26/12/2025	4d
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	20/12/2025	24/12/2025	4d
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	20/12/2025	24/12/2025	4d
13	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29/12/2025**	**03/01/2026**	**5d**
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	29/12/2025	31/12/2025	3d
13.2	ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	03/01/2026	03/01/2026	
14	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/12/2025**	**02/01/2026**	**6d 7h**
14.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	26/12/2025	27/12/2025	2d
14.2	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZA...	27/12/2025	02/01/2026	5d
15	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/01/2026**	**07/03/2026**	**54d 1h**
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	07/03/2026	07/03/2026	1d
15.2	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	03/01/2026	05/01/2026	1d
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**27/02/2026**	**35d**
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBR...	19/02/2026	24/02/2026	5d
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	19/02/2026	19/02/2026	1d
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, ...	19/01/2026	22/01/2026	4d
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS N...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1...	14/02/2026	19/02/2026	5d
16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NE...	04/02/2026	07/02/2026	4d
16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS ...	24/02/2026	27/02/2026	4d
17	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/01/2026**	**07/02/2026**	**17d 7h**
17.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
17.2	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	31/01/2026	07/02/2026	6d
18	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**26/01/2026**	**17/03/2026**	**43d 2h**
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	07/02/2026	14/02/2026	7d
18.2	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRET...	14/02/2026	16/02/2026	2d
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	13/03/2026	17/03/2026	3d
18.4	WIN DE ALUMINIO	26/01/2026	31/01/2026	6d
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	12/03/2026	17/03/2026	4d
18.6	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=...	16/02/2026	17/02/2026	2d
19	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23/01/2026**	**14/02/2026**	**19d**
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	23/01/2026	02/02/2026	9d
19.2	ENTREGA DE OBRA BLANCA	14/02/2026	14/02/2026	
20	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/03/2026**	**18/03/2026**	**11d**
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS H...	14/03/2026	18/03/2026	4d
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA C...	06/03/2026	07/03/2026	2d
21	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/02/2026**	**07/02/2026**	**2d**
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLER...	06/02/2026	07/02/2026	2d
22	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14/02/2026**	**09/03/2026**	**20d**
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	2d
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	28/02/2026	03/03/2026	3d
22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON ...	03/03/2026	06/03/2026	4d
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	04/03/2026	06/03/2026	3d
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	07/03/2026	09/03/2026	2d
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	14/02/2026	17/02/2026	3d
23	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**03/03/2026**	**07/03/2026**	**5d**
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXI...	03/03/2026	05/03/2026	3d
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	03/03/2026	07/03/2026	5d
24	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13/01/2026**	**09/02/2026**	**23d 7h**
24.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	13/01/2026	19/01/2026	6d
24.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	22/01/2026	24/01/2026	3d
24.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	31/01/2026	09/02/2026	7d
25	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**07/02/2026**	**05/03/2026**	**22d 1h**
25.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	07/02/2026	16/02/2026	7d
25.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	24/02/2026	27/02/2026	4d
25.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	28/02/2026	05/03/2026	5d
26	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19/02/2026**	**24/02/2026**	**5d**
26.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ...	19/02/2026	24/02/2026	5d
27	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12/03/2026**	**14/03/2026**	**3d**
27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	12/03/2026	14/03/2026	3d
27.2	ENTREGA DE BAÑOS	14/03/2026	14/03/2026	
28	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20/01/2026**	**06/02/2026**	**15d**
28.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTI...	20/01/2026	26/01/2026	6d
28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETA...	29/01/2026	02/02/2026	4d
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	02/02/2026	03/02/2026	2d
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICO...	04/02/2026	05/02/2026	2d
28.5	ENTREGA DE CUBIERTA	06/02/2026	06/02/2026	
29	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**06/11/2025**	**01/04/2026**	**126d**
29.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	06/11/2025	01/04/2026	126d
29.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	17/01/2026	23/01/2026	6d
30	**NO PREVISTOS**	**12/11/2025**	**19/03/2026**	**109d**
30.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO EN PVC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZA...	27/02/2026	09/03/2026	8d
30.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE ...	18/02/2026	24/02/2026	6d
30.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTICO PARA EL ALISTADO DEL PISO	07/03/2026	13/03/2026	5d
30.4	RETIRO DE MUEBLES DE MADERA INCLUYE SU PROTECCION	25/02/2026	27/02/2026	2d
30.5	DEMOLICION Y RETIRO DE MESONES O POCETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	14/11/2025	19/11/2025	5d
30.6	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	12/11/2025	12/11/2025	1d
30.7	DESMONTE Y RETIRO DE ESPEJOS	29/11/2025	03/12/2025	4d
30.8	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	02/12/2025	04/12/2025	3d
30.9	TAPAS DE INSPECCION PARA CIELO DE PVC INCLYE LA PERFORACION, EL MARCO Y LA TAPA EN PVC	19/02/2026	25/02/2026	6d
30.10	SUMINISTRO E INSTALCIONES DE ACOPLE SANITARIO DE 50CM	27/02/2026	03/03/2026	4d
30.11	DESMONTE Y RETIRO DE DOMO	10/01/2026	12/01/2026	1d
30.12	ESCARIFICACION DE MUROS	23/01/2026	31/01/2026	8d
30.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO DE SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (IN...	28/02/2026	02/03/2026	2d
30.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE BRIDA...	28/02/2026	03/03/2026	3d
30.15	VENTANERÍA CON PERSIANA EN ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	07/03/2026	14/03/2026	6d
30.16	ENCOROZADO	26/01/2026	28/01/2026	3d
30.17	PAÑETE LINEAL HASTA LOS .59 M	19/01/2026	22/01/2026	4d
30.18	FIN	19/03/2026	19/03/2026	

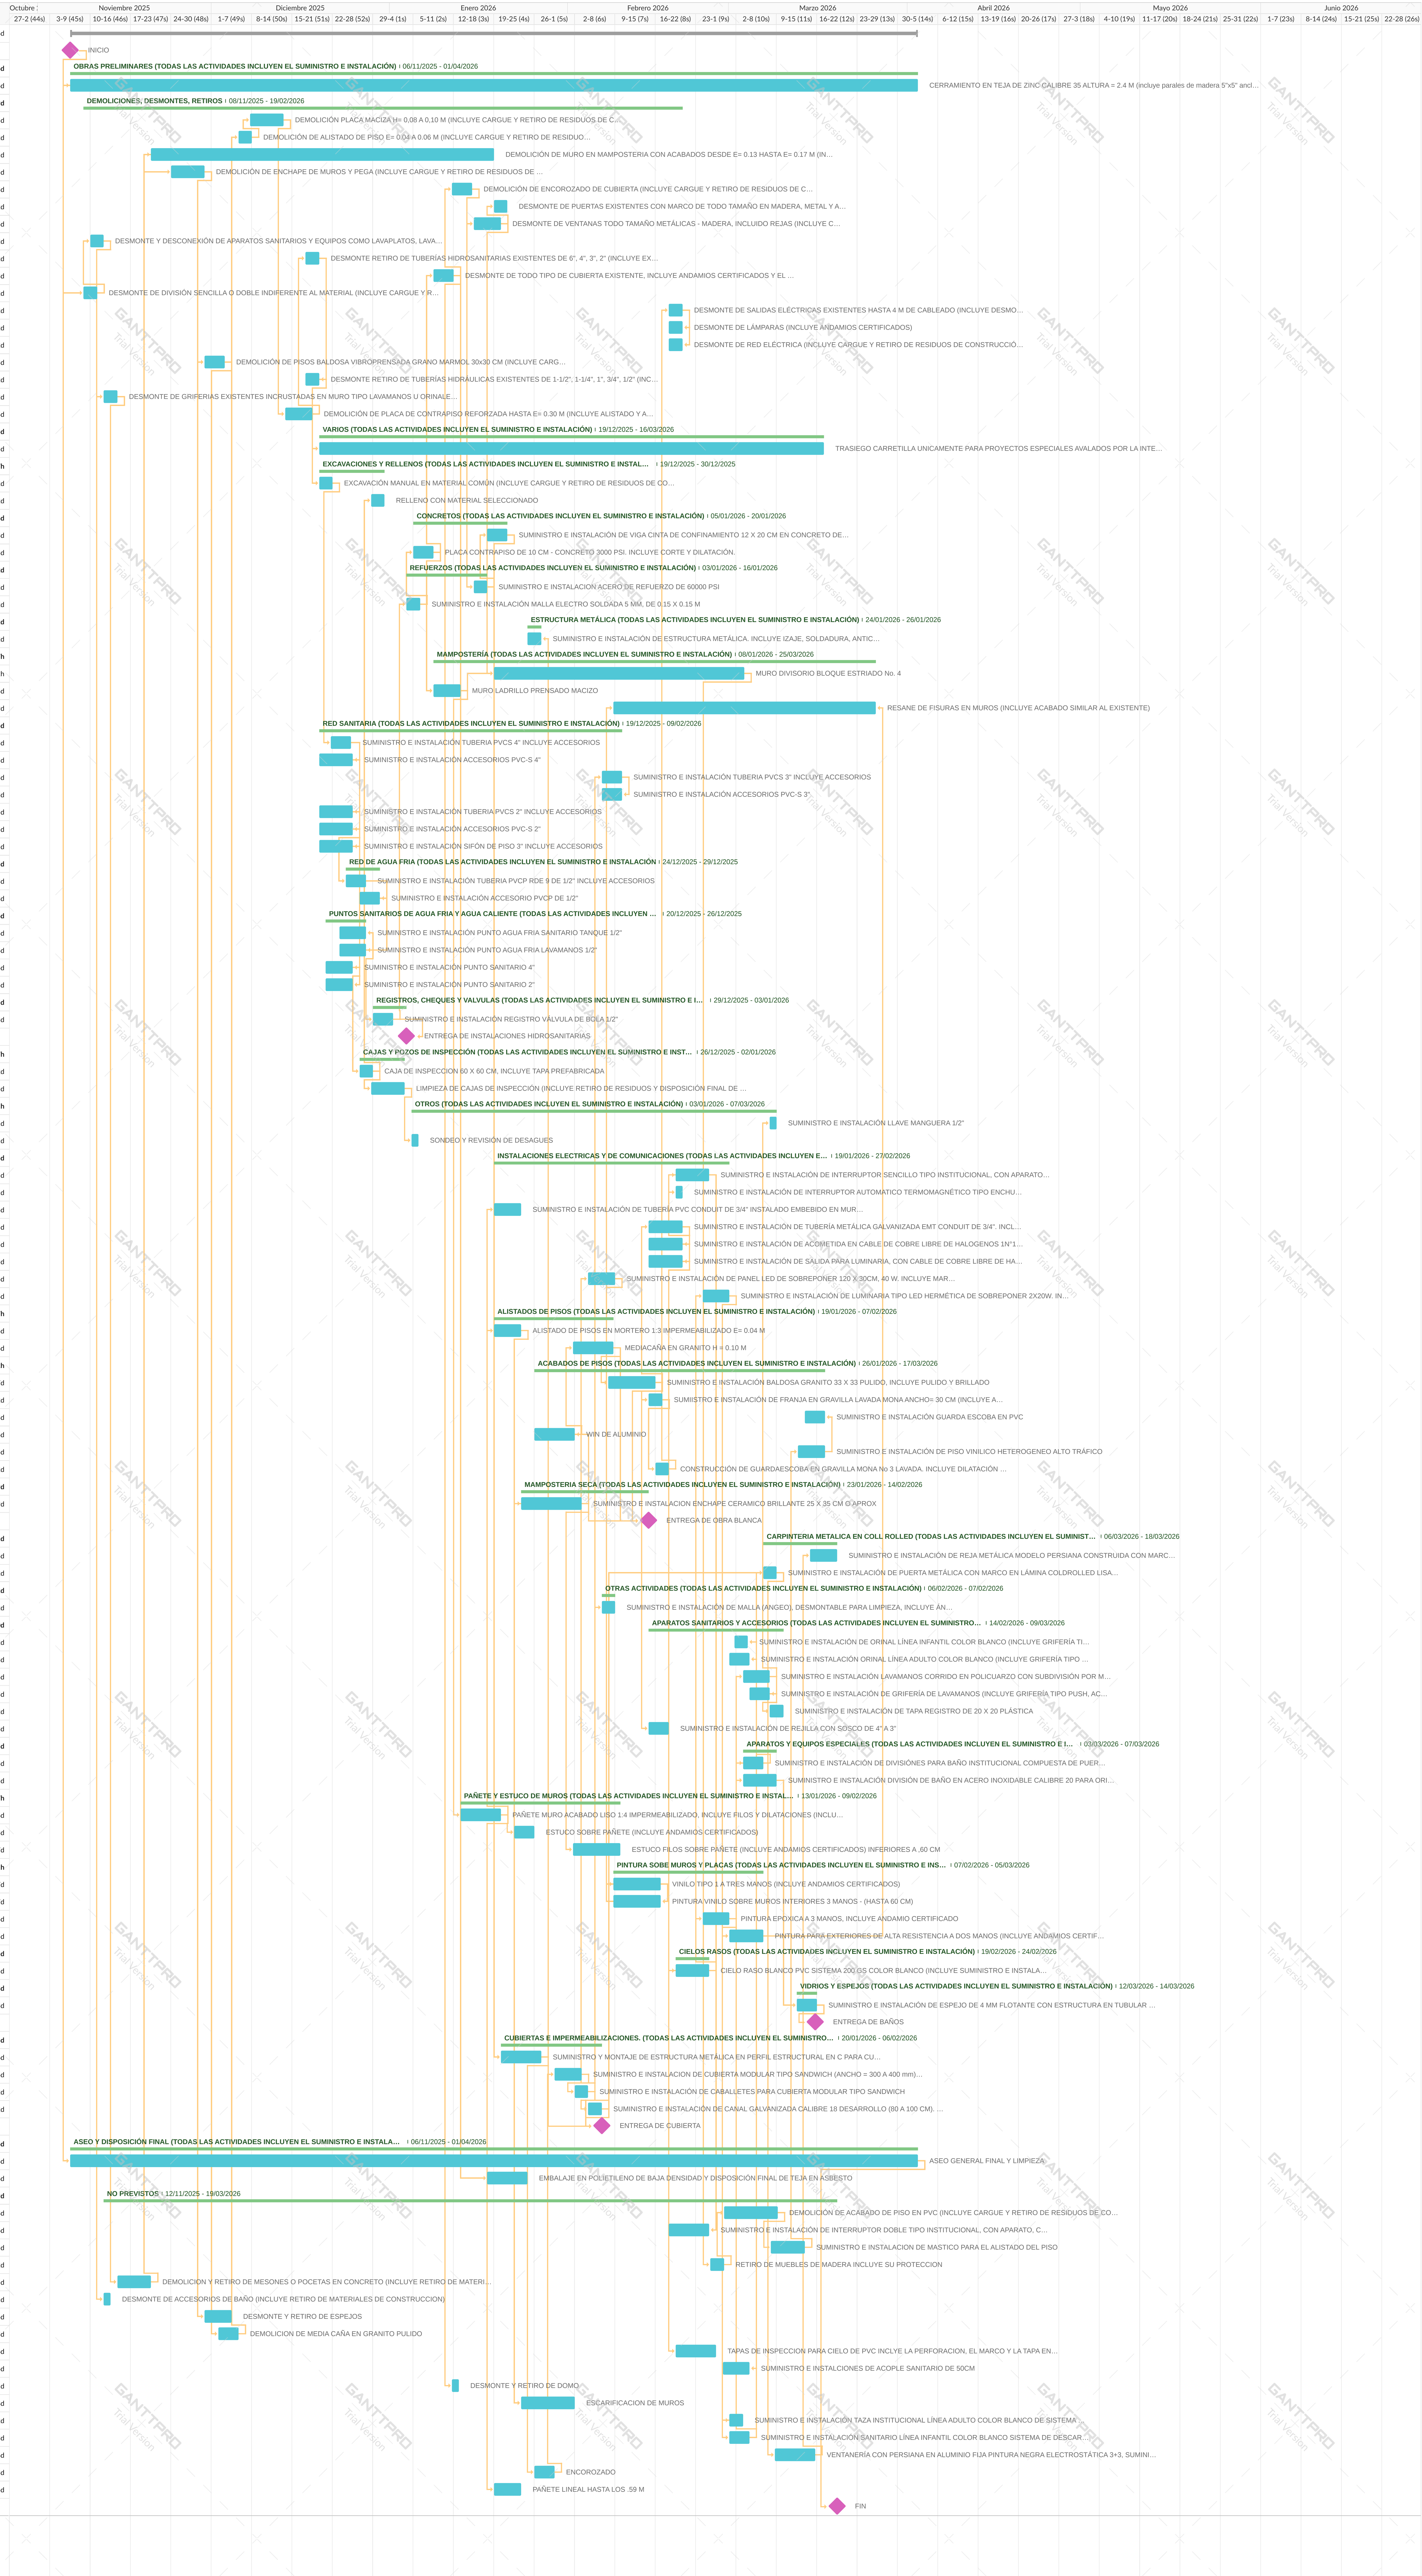


ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO EL JAZMIN - SEDE A

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A

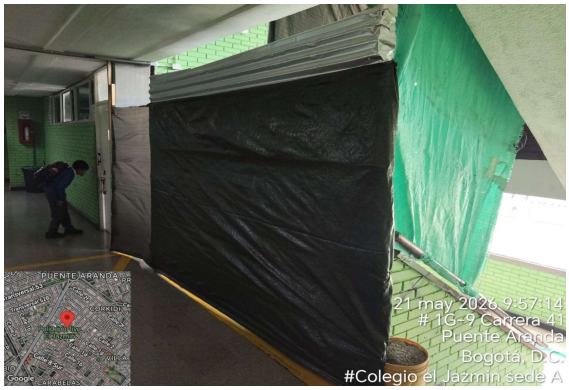


Instalación de cerramiento rigido



Instalacion de cerramiento en lona (caida de escombros)



Desmontaje de muro falso de lamina de mdf

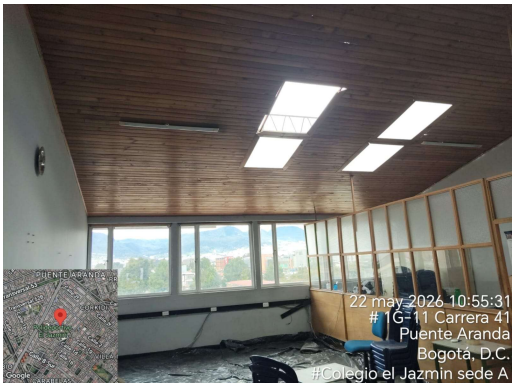

Instalacion de plastico protector en areas a intervenir



Desmonte de cubierta en area a intervenir



Desmnte de cielo raso en madera

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Desmonte de cubierta en asbesto



Acopio de material residual de obra



Retiro de cieloraso en madera

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A




Jornada de Orden y Limpieza



Jornada de Orden y Limpieza



Acopio de Residuos

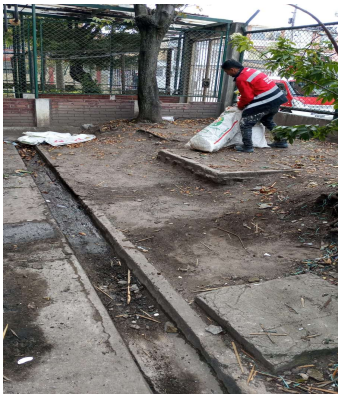

Retiro De Residuos

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE B



Resane de Muros Internos



Instalación Guarda Escoba



Instalación baldosas entrada principal



Destronque y pulido de piso



Aplicado de pintura muros internos



Instalación de tapa caja de inspección

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B
