TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No.	**LUGAR:**	**FECHA:**	**HORA DE INICIO:**	**HORA FINAL:**
103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026	Virtual – Vía Teams	23-07-2026	10:30 a.m.	11:30 am

OBJETO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité Operativo No.50 correspondiente al periodo de junio de 2026 para el proyecto de Centros Digitales – Región B -Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada – Periodo entre el 1 y el 30 de junio de 2026.

ORDEN DEL DÍA
Para el desarrollo de esta acta de comité, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista UT ETB NET Colombia Conectada, se denominará La UT ETB NET y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría. Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma 1. Seguimiento Técnico 2. Seguimiento PQRSD 3. Seguimiento Administrativo y Financiero 4. Seguimiento Jurídico 5. Conclusiones y Observaciones 6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1.	Programar reunión con interventoría, supervisión y operador para validación de los informes fiduciarios del trimestre de octubre a diciembre del 2025	Culminado se realizó reunión el 18 de junio 2026 con el operador, interventoría y la supervisión, se generó acta no 69 que tiene como objeto presentar y socializar el estado de los informes fiduciarios mensuales trimestrales de la UT ETB NET Región B.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Seguimiento Técnico ▪ **Estado del Cronograma** <u>Fase de Planeación</u>

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa.

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
1	Planeación	Informe Detallado de Ingeniería y Operación Plan de Instalación y Puesta en Servicio Plan de Mantenimiento Plan de Calidad	Fecha de corte: 12/03/2024	**100%** CDIG-INTERV2-ETBNET-02023-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02144-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02254-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02004-2023
2		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	1 de julio de 2022	**100%** 08-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00248-2022
3		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	1 de agosto de 2022	**100%** 22-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00357-2022
4		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de diciembre de 2022	**100%** 27-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01907-2022
5		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros Digitales.	31 de julio de 2023	**100%** 16-02-2024 CD-INTV-DIRINFRA-2024-1576 Radicado MinTIC No. 241011915
6	Instalación y Puesta en Servicio	Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	30 de septiembre de 2022	**100%** 21-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01058-2022
7		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	31 de octubre de 2022	**100%** 14-06-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02601-2023
8		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente 773 de los Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1A.	**100%** 07/12/2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00968-2022 (Inicio operación 1dic22)
9		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Un (1) mes contado a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1B.	**100%** 08/06/2023 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02559-2023 (Inicio operación 1jun23)
10		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de marzo de 2023	2.464 Reportados **100%** Interventoría Anterior
11		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 2.	**100%** 15/05/2024 Rad. 241037990 (Inicio operación 1 may 24)
12		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a 2000 Centros Digitales.	31 de octubre de 2023	2.000 Reportados **100%** 26/7/2024 Rad 241071006
12A		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales.	30 de junio de 2024	580 Reportados **100%** 31 /10/2024 Rad 241091919 Alcance 21/11/24 Rad 241098019
13		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente 2.580 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 3.	**100%** 08/11/2024 Rad. 241094237 (Inicio operación 1 Nov 24)

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en diciembre de 2025. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

- Grupo 1A - 11,7%
- Grupo 1B - 11,7%
- Grupo 2 - 37,4%
- Grupo 3 - 30,4%
- Grupo 3A – 8.8%

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 30 de junio de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.3 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 31/03/2031.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

META NO.	FASE	DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CADA UNA DE LAS METAS	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA	AVANCE
14	Operación y Mantenimiento	Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 773 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1A.	Inicio de operación: 01/12/2022 En Ejecución a **jun/26 42,97%**
15		Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 772 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1B..	Inicio de operación: 01/06/2023 En Ejecución a **jun/26 39,34%**
16		Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.464 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 2..	Inicio de operación: 01/05/2024 En Ejecución a **jun/26 31,29%**
17		Operación y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a 2.000 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.000 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3.	Inicio de operación: 01/11/2024 En Ejecución a **jun/26 25,89%**
17A		Operación y mantenimiento del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para 580 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3A.	Inicio de operación 470 CD 01/05/2025 Inicio de operación 33 CD 01/06/2025 Inicio de operación 27 CD 01/07/2025 Inicio de operación 10 CD 01/08/2025 Inicio de operación 9 CD 01/09/2025 Inicio de operación 9 CD 01/10/2025 Inicio de operación 11 CD 01/11/2025 Inicio de operación 4 CD 01/12/2025 Inicio de operación 07 CD 01/01/2026 En Ejecución a **jun/26 19,68%**

1.1. Documentos de Planeación

- *Etapa de Planeación cumplida.*
- ***El contratista UTETB, finalizó en enero de 2026 la etapa de instalación y puesta en servicio.***

GRUPO	META	TOTAL CD	CD APROBADOS INTERVENTORÍA
1A	8	773	773
1B	9	772	772
2	11	2.464	2.464
3	13	2.000	2.000
3A	13A	580	580
TOTAL		6.589	6.589

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha aprobación	Novedad	Estado
Informe Detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	10	CD-INTV-ETBNET-2025-9804 (Radicado MinTIC 261042515 del 24 de abril de 2026)	15/09/2025 (Versión 10)	Respuesta con observaciones para la versión 11 del IDIO proyectada para el 17 de julio de 2026	En trámite
Plan de Instalación y Puesta en Servicio	8	CD-INTV-ETBNET-2025-9384	*21/08/2025 Último Aprobado	Se aprueba versión 8 del Plan de Instalación y Puesta en Servicio con comunicado de radicado 251106098	Cumplido
Plan de Mantenimiento	8	CD-INTV-ETBNET-2025-6454	12/02/2025	Actualización Cronograma Mantenimientos Preventivos Grupos de Operación 1A, 1B, 2, 3 y 3ª CD-ETBNET-INTV-6856-26 27/04/2026 CD-ETBNET-INTV-6896-26 07/05/2026 CD-ETBNET-INTV-7006-26 01/06/2026 CD-ETBNET-INTV-7009-26 27/04/2026 CD-ETBNET-INTV-7028-26 04/06/2026 CD-ETBNET-INTV-7039-26 10/06/2026 CD-ETBNET-INTV-7118-26 26/06/2026	Cumplido
Plan de calidad	4	CD-ETBNET-INTV-3192-24 Radicado MinTIC 261042515	02/10/2024	*último aprobado	Cumplido


No Aplica · Cumplido · En trámite · No cumple

Información con corte al 16/07/2026

1.2. Indicadores & Mantenimientos Preventivos

1.2.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

En la tabla a continuación se muestra el estado y comunicados de aprobación de los indicadores a la fecha:

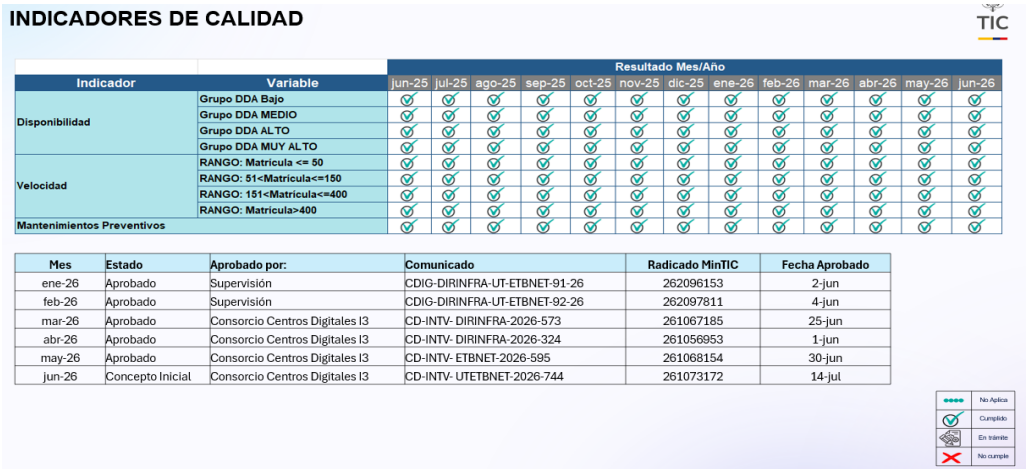

INDICADORES DE CALIDAD

Indicador	Variable	Resultado Mes/Año											
		jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
Disponibilidad	Grupo DDA Bajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grupo DDA MEDIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grupo DDA ALTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grupo DDA MUY ALTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Velocidad	RANGO: Matricula <= 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RANGO: 51<Matricula<=150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RANGO: 151<Matricula<=400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RANGO: Matricula>400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mantenimientos Preventivos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mes	Estado	Aprobado por:	Comunicado	Radicado MinTIC	Fecha Aprobado
ene-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-91-26	262096153	2-jun
feb-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-92-26	262097811	4-jun
mar-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-573	261067185	25-jun
abr-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-324	261056953	1-jun
may-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-595	261068154	30-jun
jun-26	Concepto Inicial	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- UTETBNET-2026-744	261073172	14-jul

No Aplica
Cumplido
En trámite
No cumple

Indicadores mayo:

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de mayo de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261059843 del 05/06/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261062349 del 12/06/2026 con observaciones en 1 CD por mantenimiento Preventivo.

- El contratista subsanó la observación realizada por la Interventoría al Centro Digital ubicado en el Puesto Especial Cerro Pan de Azúcar, ID beneficiario 67904, Bugalagrande, Valle del Cauca
- **La Interventoría emitió el concepto final de cumplimiento de los indicadores el 30 de junio bajo comunicado CD-INTV- ETBNET-2026-595 Radicado MinTIC 261068154**

Indicadores junio:

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de junio de 2026 mediante el comunicado CD-ETBNET-INTV-7154-26 con Rad. MinTIC 261071081 del 07/07/2026. Este es el resultado de la revisión:


INDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo marzo 2026		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoria	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	100.00%	100.00%	Cumple
			95% DDA Medio		99.86%	100.00%	Cumple
			93% DDA Alto		99.46%	100.00%	Cumple
			92% DDA Muy alto		99.87%	100.00%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Matricula >400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		403	403 de 403	Cumple

El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado CD-INTV- UTETBNET-2026-744 con Rad. MinTIC No.261073172 del 14/07/2026 donde los indicadores son APROBADOS.

1.2.2. Mantenimientos Preventivos

Con corte al 30 de Junio de 2026, el avance reportado por grupo es el siguiente:

- **Grupo 1A:** En ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 39.07%
- **Grupo 1B:** Inició la ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 0%
- **Grupo 2:** En ejecución del Preventivo año 3 con un avance del 3.53%
- **Grupo 3:** En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 42.4% de la meta.
- **Grupo 3A:** En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 4.14% de la meta.

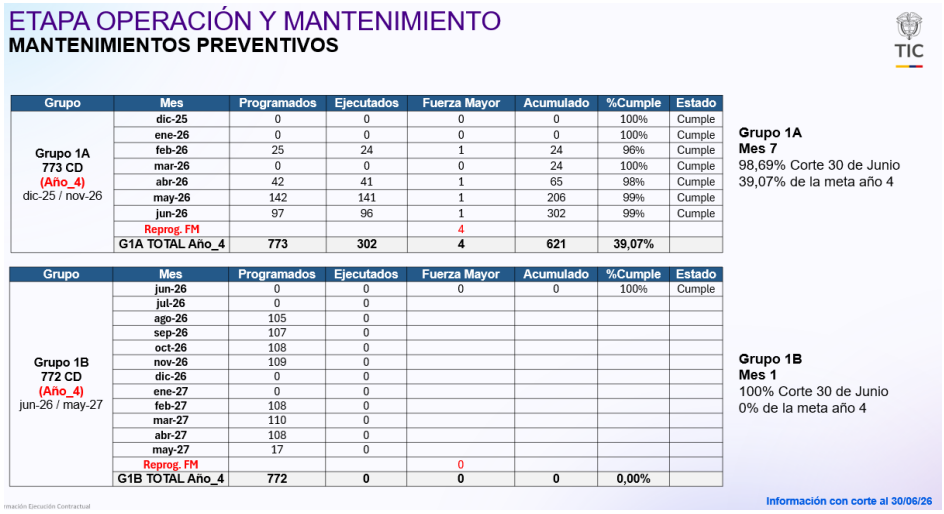

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS


Grupo	Mes	Programados	Ejecutados	Fuerza Mayor	Acumulado	%Cumple	Estado
Grupo 1A 773 CD (Año_4) dic-25 / nov-26	dic-25	0	0	0	0	100%	Cumple
	ene-26	0	0	0	0	100%	Cumple
	feb-26	25	24	1	24	96%	Cumple
	mar-26	0	0	0	24	100%	Cumple
	abr-26	42	41	1	65	98%	Cumple
	may-26	142	141	1	206	99%	Cumple
	jun-26	97	96	1	302	99%	Cumple
	Reprog. FM			4			
	G1A TOTAL Año_4	773	302	4	621	39,07%	

Grupo 1A
Mes 7
98,69% Corte 30 de Junio
39,07% de la meta año 4

Grupo	Mes	Programados	Ejecutados	Fuerza Mayor	Acumulado	%Cumple	Estado
Grupo 1B 772 CD (Año_4) jun-26 / may-27	jun-26	0	0	0	0	100%	Cumple
	jul-26	0	0				
	ago-26	105	0				
	sep-26	107	0				
	oct-26	108	0				
	nov-26	109	0				
	dic-26	0	0				
	ene-27	0	0				
	feb-27	108	0				
	mar-27	110	0				
	abr-27	108	0				
	may-27	17	0				
	Reprog. FM			0			
	G1B TOTAL Año_4	772	0	0	0	0,00%	

Grupo 1B
Mes 1
100% Corte 30 de Junio
0% de la meta año 4

Información con corte al 30/06/26

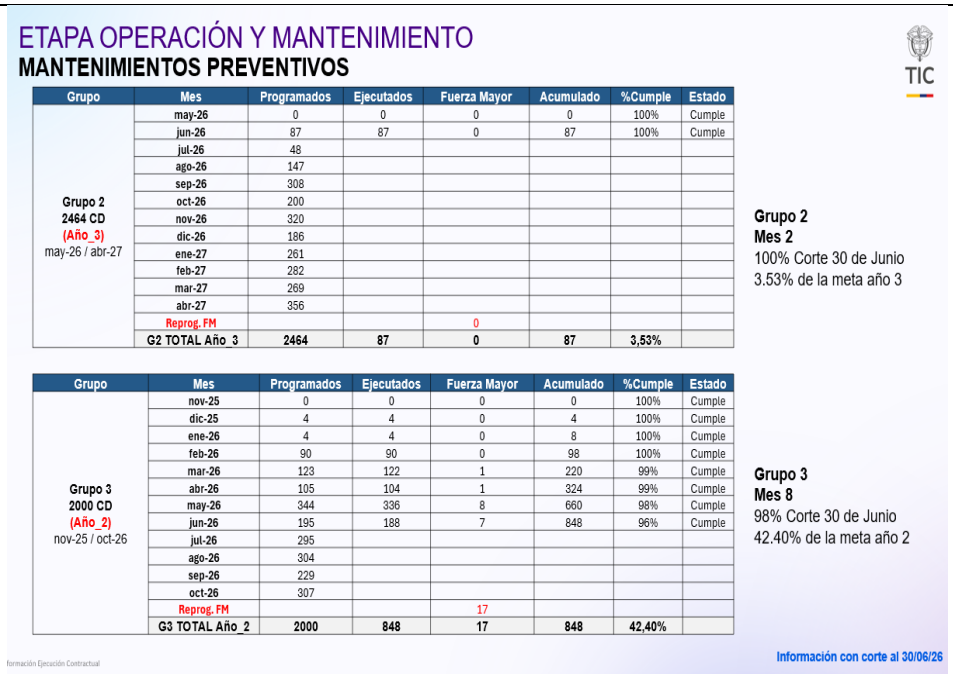

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS


Grupo	Mes	Programados	Ejecutados	Fuerza Mayor	Acumulado	%Cumple	Estado
Grupo 2 2464 CD (Año_3) may-26 / abr-27	may-26	0	0	0	0	100%	Cumple
	jun-26	87	87	0	87	100%	Cumple
	jul-26	48					
	ago-26	147					
	sep-26	308					
	oct-26	200					
	nov-26	320					
	dic-26	186					
	ene-27	261					
	feb-27	282					
	mar-27	269					
	abr-27	356					
	Reprog. FM			0			
	G2 TOTAL Año_3	2464	87	0	87	3,53%	

Grupo 2
Mes 2
100% Corte 30 de Junio
3.53% de la meta año 3

Grupo	Mes	Programados	Ejecutados	Fuerza Mayor	Acumulado	%Cumple	Estado
Grupo 3 2000 CD (Año_2) nov-25 / oct-26	nov-25	0	0	0	0	100%	Cumple
	dic-25	4	4	0	4	100%	Cumple
	ene-26	4	4	0	8	100%	Cumple
	feb-26	90	90	0	98	100%	Cumple
	mar-26	123	122	1	220	99%	Cumple
	abr-26	105	104	1	324	99%	Cumple
	may-26	344	336	8	660	98%	Cumple
	jun-26	195	188	7	848	96%	Cumple
	jul-26	295					
	ago-26	304					
	sep-26	229					
	oct-26	307					
	Reprog. FM			17			
	G3 TOTAL Año_2	2000	848	17	848	42,40%	

Grupo 3
Mes 8
98% Corte 30 de Junio
42.40% de la meta año 2

Información con corte al 30/06/26

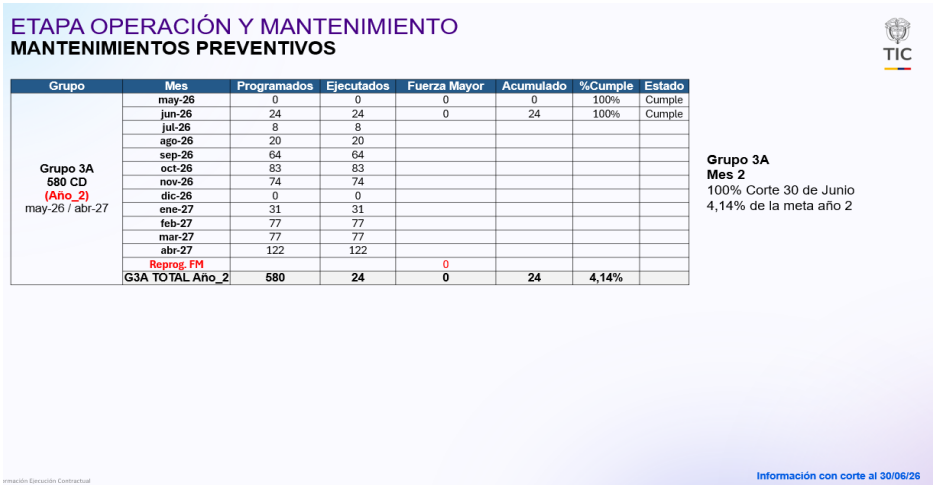

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Grupo	Mes	Programados	Ejecutados	Fuerza Mayor	Acumulado	%Cumple	Estado
Grupo 3A 580 CD (Año_2) may-26 / abr-27	may-26	0	0	0	0	100%	Cumple
	jun-26	24	24	0	24	100%	Cumple
	jul-26	8	8				
	ago-26	20	20				
	sep-26	64	64				
	oct-26	83	83				
	nov-26	74	74				
	dic-26	0	0				
	ene-27	31	31				
	feb-27	77	77				
	mar-27	77	77				
	abr-27	122	122				
	Reprog. FM			0			
	G3A TOTAL Año_2	580	24	0	24	4,14%	

Grupo 3A
Mes 2
100% Corte 30 de Junio
4,14% de la meta año 2

Información con corte al 30/06/26

1.3. Movimientos de Infraestructura

1.3.1. Traslados

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026 la Interventoría emitió concepto de aprobación a 4 estudios de campo, 12 reportes de instalación aprobados y 7 pruebas remotas aprobadas. de los informes de traslados presentados por el contratista.

TRASLADOS	EC Aprobados				RI Aprobados				PR Aprobadas				VA aprobadas				Reversados			
Grupo	TOTAL EC	A-26	M-26	J-26	TOTAL RI	A-26	M-26	J-26	TOTAL PR	A-26	M-26	J-26	TOTAL VA	A-26	M-26	J-26	Total REV	A-26	M-26	J-26
Grupo 1 A	3	0	3	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 1 B	4	1	3	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Grupo 2	14	9	3	0	14	0	3	8	11	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 3	7	3	1	2	7	2	3	1	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 3A	4	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	14	10	4	25	2	7	12	19	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2. Reubicaciones

Durante el periodo del 01 al 30 de junio la UT ETB NET la Interventoría emitió concepto de aprobación de 11 estudios de campo, 3 reportes de instalación aprobados y 4 pruebas remotas aprobadas.


REUBICACIONES	EC Aprobados				RI Aprobados				PR Aprobadas				VA aprobadas			
Grupo	TOTAL EC	A-26	M-26	J-26	TOTAL RI	A-26	M-26	J-26	TOTAL PR	A-26	M-26	J-26	TOTAL VA	A-26	M-26	J-26
Grupo 1 A	9	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 1 B	7	0	6	1	4	0	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0
Grupo 2	12	1	5	3	4	0	2	1	3	0	1	2	0	0	0	0
Grupo 3	9	0	3	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 3A	6	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	43	2	22	11	9	0	4	3	7	1	2	4	0	0	0	0

1.3.3. Reinstalación

Durante el periodo del 01 al 30 de junio la Interventoría aprobó 2 reportes de instalación 6 pruebas remotas:

REINSTALACIONES	EC Aprobados				RI Aprobados				PR Aprobadas				VA aprobadas			
Grupo	TOTAL EC	A-26	M-26	J-26	TOTAL RI	A-26	M-26	J-26	TOTAL PR	A-26	M-26	J-26	TOTAL VA	A-26	M-26	J-26
Grupo 1 A	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Grupo 1 B	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	-	-	-	-
Grupo 2	2	0	0	0	3	0	2	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Grupo 3	6	0	4	0	8	0	4	2	6	0	0	5	-	-	-	-
Grupo 3A	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-
	11	0	7	0	14	0	8	2	10	0	2	6	-	-	-	-

1.3.3.1. Distribución de estados de campo

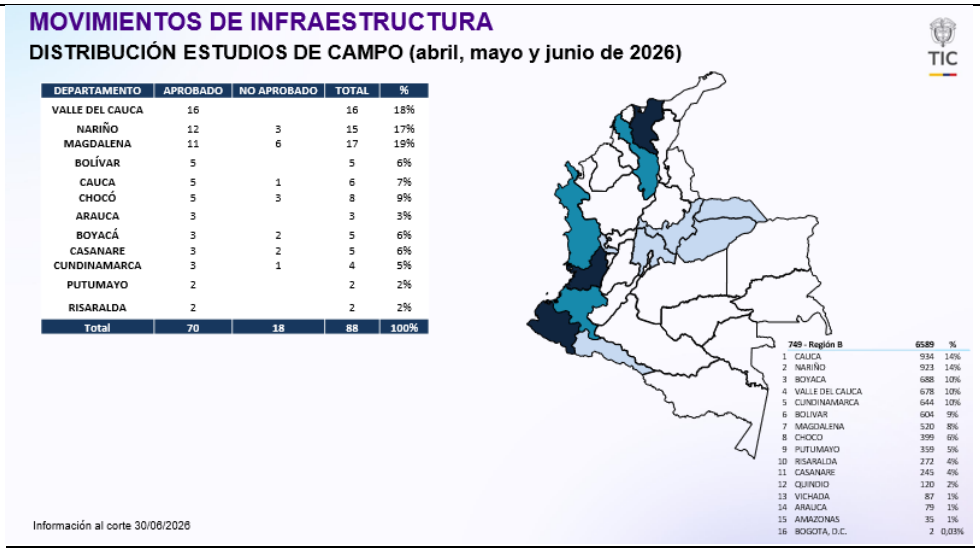

DEPARTAMENTO	APROBADO	NO APROBADO	TOTAL	%
VALLE DEL CAUCA	16		16	18%
NARIÑO	12	3	15	17%
MAGDALENA	11	6	17	19%
BOLÍVAR	5		5	6%
CAUCA	5	1	6	7%
CHOCÓ	5	3	8	9%
ARAUCA	3		3	3%
BOYACÁ	3	2	5	6%
CASANARE	3	2	5	6%
CUNDINAMARCA	3	1	4	5%
PUTUMAYO	2		2	2%
RISARALDA	2		2	2%
Total	70	18	88	100%

749 - Región B	6589	%
1 CAUCA	934	14%
2 NARIÑO	923	14%
3 BOYACA	688	10%
4 VALLE DEL CAUCA	678	10%
5 CUNDINAMARCA	644	10%
6 BOLIVAR	604	9%
7 MAGDALENA	520	8%
8 CHOCO	399	6%
9 PUTUMAYO	359	5%
10 RISARALDA	272	4%
11 CASANARE	245	4%
12 QUINDIO	120	2%
13 VICHADA	87	1%
14 ARAUCA	79	1%
15 AMAZONAS	35	1%
16 BOGOTA, D.C.	2	0,03%

1.3.4. Etapa de operación

El Contratista tiene aprobados durante la etapa de operación 117 Traslados, 42 Reubicaciones y 37 Reinstalaciones (equivalen a 1/3 de traslado bajo el Otrosí No.1).

Bolsa Inicial	Traslados aprobados Interventoría	Reubicaciones aprobadas Interventoría	Reinstalaciones aprobadas Interventoría	Restantes Bolsa	% Avance
988	117	42	37	817	17.3%

El día 06 de mayo 2026 bajo el comunicado CD-ETBNET-INTV-6888-26 con radicado MinTIC No.261046539 recibimos de parte del operador 119 Movimientos de Infraestructura que corresponden a 23 reinstalaciones, 39 reubicaciones y 57 traslados pendientes de concepto de los meses de enero a marzo de 2026.

REINSTALACIONES					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Solicitud de Reinstalación	11	11	7	100%	63,64%
Reportes de Instalación	10	10	6	100%	60,00%
Pruebas Remotas	8	8	6	100%	75,00%
Total	29	29	19	100%	65,52%

REUBICACIONES					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Estudio de Campo	25	25	17	100%	68,00%
Reportes de Instalación	13	0	0	0%	0,00%
Pruebas Remotas	13	0	0	0%	0,00%
Total	51	25	17	49%	33,33%

TRASLADOS					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Estudio de Campo	32	0	0	0%	0,00%
Reportes de Instalación	25	0	0	0%	0,00%
Pruebas Remotas	19	0	0	0%	0,00%
Total	76	0	0	0%	0,00%

- El resultado de la revisión se emite mediante el comunicado CD-INTV- ETBNET-2026-539 con radicado Mintic 9261069626 del 24/06/2026 con el asunto: Técnico – Resultados de revisión documental para 23 CD con solicitud de movimiento de infraestructura.
- El resultado de la revisión se emite mediante el comunicado CD-INTV- ETBNET-2026-630 con radicado Mintic 261069647 del 01/07/2026 con el asunto: Técnico – Resultados de revisión documental para 25 CD con solicitud de movimiento de infraestructura.
- La UT ETB NET responde mediante el comunicado CD-ETBNET-INTV-7152-26 con radicado Mintic 261071356 del 08/07/2026, que las observaciones serán atendidas para cada centro digital en oficios independientes. Así mismo, solicita a la interventoría emitir sus conceptos por cada centro digital, de acuerdo con el envío realizado por la UT.
- El total de traslados se encuentra en revisión documental.

Información con corte al 15/07/26

1.4. Visitas de Calidad



1.5. Seguimiento Sistemas de Gestión

La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificará el sistema gestión de información de manera integral a todos los módulos del sistema de información del Contratista UT ETB NET bajo procedimiento del anexo técnico del contrato de Interventoría No.1282-2026. Numeral 2.3.4.3.

- Con corte al 30 de junio de 2026, la Dirección Técnica, en ejercicio del acceso al sistema de información del Contratista, se encuentra ejecutando la primera revisión trimestral del sistema de gestión, incluyendo el monitoreo de tráfico, usuarios, filtrado de contenido, alarmas y demás componentes. El concepto correspondiente será emitido a más tardar el 24 de julio de 2026.

- Siguiente fecha programada de revisión al sistema de información 08 de octubre de 2026.

- Fecha de visita anual pendiente de programación.

2. Seguimiento PQRSD

La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité

PQRSD Presente interventoría (01 al 30 de junio de 2026)						
CONTRATO DE APORTE No.	OPERADOR	PQRSD				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	EN SEGUIMIENTO OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	ESTADO
749 DE 2022	ETB NET	12	4	6	2	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 al 30 de junio de 2026:

CAUSALES PQRSD UT ETBNET	
CAUSA DE LA PQRSD	CANTIDAD DE PQRSD
FALLA DEL SERVICIO	7
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	3
REUBICACIÓN	1
RENUNCIA	1
TOTAL	12

Seguimiento tickets CCC (Centro de Contacto con el Ciudadano)

Se presentan las cifras de los tickets creados al Operador a través del CCC durante el periodo del 08 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.

Mes	Seguimiento	Solucionado
abr	6	203
may	14	174
jun	18	107
Total general	**38**	**484**

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. Seguimiento Administrativo

3.1.1. Plan de Socialización

CONTRATO DE APORTE No.	PLAN DE SOCIALIZACIÓN				
	ENTREGA	FECHA	ACTIVIDAD/OBSERVACIÓN	RADICADO	ESTADO
749 DE 2022 UT ETB NET	Plan de Socialización V8	17/06/26	A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Socialización, versión No. 8, presenta una actualización integral de su contenido, debido a que corresponde a la etapa de operación y mantenimiento (traslados) de los Centros Digitales. Como parte de esta actualización, se modifican las actividades contempladas en el Plan, eliminando la estrategia de difusión mediante volantes y ajustando el material correspondiente a afiches. Al cierre del presente informe, la versión No. 8 del Plan de Socialización se encuentra en trámite para su revisión y aprobación.	CD-ETBNET-DIRINFRA-561-26 Radicado MinTIC 261063634	

A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Socialización, versión No. 8, presenta una actualización integral de su contenido, debido a que corresponde a la etapa de operación y mantenimiento (traslados) de los Centros Digitales.

Como parte de esta actualización, se modifican las actividades contempladas en el Plan, eliminando la estrategia de difusión mediante volantes y ajustando el material correspondiente a afiches. Al cierre del presente informe, la versión No. 8 del Plan de Socialización se encuentra en trámite para su revisión y aprobación.

Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública)

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Durante el mes de junio de 2026, la Interventoría comunicó al Operador los resultados de la validación de diez (10) reportes correspondientes a procesos de traslado, reubicación, reinstalación e instalación de Centros Digitales.

Como resultado de la revisión, ocho (8) reportes cumplieron con los requisitos contractuales establecidos para los soportes de socialización. Por su parte, dos (2) reportes presentaron observaciones, debido a la ausencia de evidencias como registros fotográficos, señalética, afiches, volantes y actas que permitieran verificar el cumplimiento de las actividades de socialización

3.1.2. Estrategia de difusión

- Presentación de la Estrategia de Difusión de junio 2026 por parte del Contratista mediante comunicado con consecutivo CD-ETBNET-INTV-6981-26, radicado MinTIC No. 261054718 del 25 de mayo de 2026.
- Remisión del consolidado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de las primeras observaciones a la Estrategia de Difusión de mayo 2026 vía correo electrónico el 2 de junio de 2026.
- Mesa de trabajo para presentación de los ajustes realizados por el Contratista a la Interventoría y la Supervisión, en la cual se generaron observaciones adicionales, esta fue documentada mediante Acta No. 45-UT ETB_04062026 del 4 de junio de 2026.
- Emisión de correo por parte del equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría el 9 de junio, informando aprobación de la Estrategia de difusión del mes de junio 2026

CONTRATO DE APORTE No.	ESTRATEGIA DE DIFUSION				
	ENTREGA	FECHA	ACTIVIDAD/OBSERVACIÓN	RADICADO	ESTADO
749 DE 2022 UT ETB NET	Estrategia de difusión de Junio 2026	22/05/2026	Entrega de UT ETB NET de la estrategia de Difusión Junio de 2026.	CD-ETBNET-INTV-6968-26 Radicado MinTIC No. 261053979.	✓
		25/05/2026	Remisión alcance propuesta Estrategia Difusión Junio de 2026.	CD-ETBNET-INTV-6981-26 Radicado MinTIC No. 261054718.	✓
		02/06/2026	Remisión de observaciones por parte de la Interventoría y la Supervisión.	Correo electrónico	✓
		04/06/2026	Mesa de trabajo para la presentación de ajustes al Plan de Socialización. Se generaron observaciones adicionales, registradas en el Acta No. 45-UT ETB_04062026.	Correo electrónico	✓
		09/06/2026	Emisión de correo por parte del equipo de apoyo a la supervisión e Interventoría, informando aprobación de la Estrategia de difusión del mes de Junio 2026.	CD-INTV-ETBNET-2026-501 Radicado MinTIC No. 261064145.	✓
	Estrategia de difusión de Julio 2026	22/06/2026	Entrega de UT ETB NET de la estrategia de Difusión Julio de 2026.	CD-ETBNET-INTV-7093-26 radicado MinTIC No. 261065172.	✓
	Evidencias estrategia de difusión Mayo	06/06/2026	Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión se encuentran en proceso de subsanación por parte del Operador.	En trámite	

Estrategia de difusión de Julio 2026:

A la fecha de corte del presente informe, la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de julio de 2026 se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo de apoyo a la Supervisión del Ministerio TIC y de esta Interventoría, por lo que aún no cuenta con concepto definitivo.

Evidencias estrategia de difusión mayo 2026:

Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión para el mes de mayo de 2026. Se encuentran en proceso de subsanación por parte del Operador.

3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo

A continuación, se presenta el reporte de caracterización del Portal Cautivo por Género, Rango de Edades y por Etnia:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Masculino	38.193	47,49%
	Femenino	40.122	49,88%
	No informa	1.835	2,28%
	LGBTI	391	0,49%
	No Binario	141	0,18%
	Total, general	**80.684**	**100%**

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Menores a 18 años	1.724	2,14%
	Entre 18 y 25 años	34.192	42,38%
	Entre 26 y 45 años	34.203	42,39%
	Entre 46 y 54 años	6.457	8,00%
	Mayores a 55 años	3.564	4,42%
	En Blanco	544	0,67%
	Total, general	**80.684**	**100%**

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Ninguna	33.968	42,10%
	No informa	13.244	16,41%
	Indígena	20.861	25,86%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	11.748	14,56%
	Gitana o Rom	863	1,07%
	Total, general	**80.684**	**100%**

3.2. Seguimiento Financiero

3.2.1. Información General

La siguiente tabla reporta el estado general financiero del contrato de Aporte 749 de 2022 al 30 de Junio de 2026:

Estadísticas generales del Contrato Nº 749 de 2022	
Valor total del contrato	$ 1.072.552.301.475,00
Valor anticipo	$ 70.243.279.599,00
Porcentaje anticipo amortizado	100%

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total desembolsado al Patrimonio Autónomo	$ 451.799.703.012,00	$ 459.162.951.941,00	$ 7.363.248.929,00
Total utilizaciones aprobadas en comité fiduciario	$ 390.710.536.638,70	$ 412.002.748.803,95	$ 21.292.212.165,25
Valor aprobado órdenes de pago	$ 375.777.143.067,40	$ 396.777.268.681,62	$ 21.000.125.614,22
Valor reintegrado a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Saldo por ejecutar	$ 14.933.393.571,30	$ 15.225.480.122,33	$ 292.086.551,03
Total legalizado	$ 275.000.635.170,23	$ 306.894.180.000,12	$ 31.893.544.829,89
Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	42,12%	42,81%	0,69%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	35,04%	36,99%	1,96%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	83,17%	86,41%	3,24%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	96,18%	96,30%	0,13%

3.2.2. Desembolsos

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total desembolsado	$ 451.799.703.012,00	$ 459.162.951.941,00	$ 7.363.248.929,00

Concepto	Valor	%
Total desembolsado (Hasta el 25)	$ 459.162.951.941,00	42,81%
Desembolsos en trámite	$ 77.566.369.492,50	7,23%
Por desembolsar hasta fin del contrato	$ 535.822.980.041,50	49,96%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100,00%**

Desembolsos girados durante el periodo

N°	Requisitos	Valor	Fecha de giro
25	Vigésimo Quinto desembolso Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 38 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 7.363.248.929,00	26/06/2026

Desembolsos en trámite

N°	Requisitos	Valor	Fecha tentativa contractual	Estado
26	Vigésimo Sexto desembolso Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 39 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.690.428.705,00	16/04/2026	Aprobado por la supervisión. Acta de aprobación rad. MinTic 262090295 del 23/05/2026. Documentación entregada a la supervisión para su trámite de giro el 25/05/2026.
27	Vigésimo Séptimo desembolso Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 40 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.690.428.704,00	14/05/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación rad. MinTic 261056370 del 29/05/2026. Documentación entregada a la supervisión para su trámite de giro el 29/05/2026.
28	Vigésimo Octavo desembolso Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 41 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.857.214.951,00	17/06/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación rad. MinTic 261056247 del 29/05/2026. Documentación entregada a la supervisión para su trámite de giro el 29/05/2026.
29	Vigésimo Noveno desembolso Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 12.328.297.132,50	16/07/2026	Aprobado por la interventoría. Acta de aprobación rad. MinTic 261063656 del 17/06/2026. Documentación entregada a la supervisión para su trámite de giro el 17/06/2026.
	TOTAL	**$ 77.566.369.492,50**		

3.2.3. Utilizaciones

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total utilizaciones aprobadas	$ 390.710.536.638,70	$ 412.002.748.803,95	$ 21.292.212.165,25

Concepto	Valor	%
Total aprobadas en comité fiduciario (Hasta el 24B)	$ 412.002.748.803,95	38,41%
Próximas utilizaciones	$ 94.664.016.896,28	8,83%
Utilizaciones hasta fin del contrato	$ 565.885.535.774,77	52,76%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100%**

Utilizaciones aprobadas durante el periodo

N°	Requisitos	Valor	Fecha Aprobación	Radicado aprobación
24A	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con: i) La entrega completa a la interventoría del informe de indicadores de calidad y niveles de servicio del mes 37 contado a partir del inicio de la etapa de operación (del 1 al 31 de diciembre 2025). ii) De los recursos disponibles en el patrimonio autónomo definidos en el Parágrafo Quinto asociados al incremento de velocidad del mes 37, se podrán utilizar de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 37 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 14.257.711.104,00	10/06/2026	261061316
24B	Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con: i) la entrega completa a la interventoría del informe de indicadores de calidad y niveles de servicio del mes 37 contado a partir del inicio de la etapa de operación (del 1 al 31 de diciembre 2025). ii) la aprobación del cumplimiento de cada uno de los indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 37 contados a partir del inicio de la etapa de operación (de 1 al 31 de diciembre 2025).	$ 7.034.501.061,25	10/06/2026	261061317
	TOTAL	$ 21.292.212.165,25		

Utilizaciones en trámite

N°	Requisitos	Valor	Fecha tentativa contractual	Estado
25	Vigésima Quinta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 38 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 7.363.248.928,10	16/04/2026	Indicadores de calidad y niveles de servicio (enero 2026) aprobados por la supervisión. Rad MinTic 262096153 del 02/06/2026 Pendiente programación comité. (Comité realizado el 14/07/2026)
26	Vigésima Sexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 39 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.690.428.705,02	13/05/2026	Indicadores de calidad y niveles de servicio (febrero 2026) aprobados por la supervisión. Rad MinTic 262097811 del 04/06/2026 En trámite giro del desembolso asociado.
27	Vigésima Séptima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 40 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.690.428.704,10	17/06/2026	Indicadores de calidad y niveles de servicio (marzo 2026) aprobados por la interventoría. Rad MinTic 261067185 del 25/06/2026 En trámite giro del desembolso asociado.
28	Vigésima Octava utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 41 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 21.857.214.950,87	16/07/2026	Indicadores de calidad y niveles de servicio (abril 2026) aprobados por la interventoría. Rad MinTic 261056953 del 01/06/2026 En trámite giro del desembolso asociado.
29	Vigésima Novena utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación.	$ 22.062.695.608,19	14/08/2026	Indicadores de calidad y niveles de servicio (mayo 2026) aprobados por la interventoría. Rad MinTic 261068154 del 30/06/2026 En trámite giro del desembolso asociado.
	TOTAL	**$ 94.664.016.896,28**		

3.2.4. Órdenes de pago

Aprobadas durante el periodo:

Aprobadas durante el periodo					
OP	Concepto	Valor total	Fecha aprobación	Radicado aprobación	Estado
181	Reintegro nómina ETB septiembre 2025	$ 21.425.256,00	25/06/2026	261066977	Pagada 30/06/2026
187	Reintegro nómina ETB octubre 2025	$ 20.182.103,00	25/06/2026	261066972	Pagada 30/06/2026
190	Reintegro nómina ETB noviembre 2025	$ 22.046.882,00	25/06/2026	261066956	Pagada 30/06/2026
195	Operación y mantenimiento diciembre 2025	$ 20.936.471.373,22	25/06/2026	261067085	Aprobada
	TOTAL	**$ 21.000.125.614,22**			

3.2.5. Ejecución de Recursos

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	$ 390.710.536.638,70	$ 412.002.748.803,95	$ 21.292.212.165,25
Total ejecutado a través de órdenes de pago	$ 375.777.143.067,40	$ 396.777.268.681,62	$ 21.000.125.614,22
Recursos reintegrados a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor total por ejecutar	$ 14.933.393.571,30	$ 15.225.480.122,33	$ 292.086.551,03
CAPEX por ejecutar (1)	$ 13.810.798.515,24	$ 13.810.798.515,24	$ 0,00
OPEX por ejecutar (2)	$ 1.122.595.056,06	$ 1.414.681.607,09	$ 292.086.551,03
Total pagado por la fiduciaria	$ 375.645.467.459,62	$ 375.740.538.868,62	$ 95.071.409,00
Saldo por pagar por la fiduciaria	$ 131.675.607,78	$ 21.036.729.813,00	$ 20.905.054.205,22

Saldo utilizaciones 8, 9, 10, 12, 13 y 14
Recursos por reintegrar: $2,06. Saldo utilizaciones 21, 22B, 23B y 24B

- **Proporcionalidad de las utilizaciones**

La interventoría informa que el saldo del desplazamiento de recursos al cierre del periodo luego de la aprobación de las utilizaciones 24A y 24B es de $ 39.796.954.208,05.

3.2.6. Legalizaciones

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total legalizado	$ 275.000.635.170,23	$ 306.894.180.000,12	$ 31.893.544.829,89

Concepto	Valor	%
Total desembolsado	$ 459.162.951.941,00	-
Total legalizado (Hasta noviembre 2025)	$ 306.894.180.000,12	66,8%
Legalizaciones en trámite	$ 31.870.448.100,15	6,9%
Saldo por legalizar	**$ 120.398.323.840,73**	**26,2%**

3.2.7. Inventario:

Concepto	Valor total
Actas de bienes suscritas	$ 117.073.485.857,64
Actas de servicio suscritas	$ 9.355.974.220,13
Aporte UT Kit VSAT	$ 1.788.649.657,53
Total actas suscritas	$ 128.218.109.735,30
Actas de bienes en revisión	$ 720.659.945,56
Actas de servicio en revisión	$ 46.804.959.226,41
Total	$ 175.743.728.907,27

3.2.8. Saldos en cuentas del Patrimonio Autónomo

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo final
Fondo Recursos del Fomento (Otros Desembolsos)	Fiduprevisora	FIC	3818	$ 84.136.730.306,88
Recursos de Fomento (Otros Desembolsos)	Banco BBVA	Ahorros	309-053353	$ 0,00
Total administrado en FIC's y cuentas de ahorro recursos de fomento				**$ 84.136.730.306,88**

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo final
Fondo Recursos del Fideicomitente	Fiduprevisora	FIC	5522	**$ 319.859,78**
Recursos del Fideicomitente	Banco BBVA	Ahorros	309-053361	$ 0,00
Total recursos del fideicomitente				**$ 319.859,78**

* Saldos según informe de fiducia de Junio 2026

3.2.9. Rendimientos Financieros

Año	Rendimientos generados	GMF	Rendimientos girados
2022	$ 2.139.035.584,75	$ 8.522.054,00	$ 2.130.513.531,03
2023	$ 9.275.091.287,82	$ 36.952.557,00	$ 9.238.138.732,08
2024	$ 7.630.606.788,08	$ 30.400.823,00	$ 7.600.205.963,54
2025	$ 13.114.315.427,71	$ 52.248.270,00	$ 13.062.067.157,71
2026	$ 4.022.636.466,05	$ 16.026.439,00	$ 4.006.610.027,05
Total	**$ 36.181.685.554,41**	**$ 144.150.143,00**	**$ 36.037.535.411,41**

Mes vigencia 2026	Rendimientos generados cuenta de ahorros	Tasa cuenta de ahorros	Rendimientos generados FIC	Tasa FIC	Total rendimientos generados	GMF	Rendimientos girados	Fecha de giro	Comprobantes
enero	$ 5.545,00	0,01%	$ 469.156.913,65	4,989%	$ 469.162.458,65	$ 1.869.173,00	$ 467.293.285,65	11/02/2026	272, 273
febrero	$ 16.634,00	0,01%	$ 617.897.821,32	7,085%	$ 617.914.455,32	$ 2.461.810,00	$ 615.452.645,32	5/03/2026	542, 543
marzo	$ 0,00	0,00%	$ 965.463.484,52	9,434%	$ 965.463.484,52	$ 3.846.468,00	$ 961.617.016,52	7/04/2026	842
abril	$ 0,00	0,00%	$ 1.005.099.887,99	11,352%	$ 1.005.099.887,99	$ 4.004.382,00	$ 1.001.095.505,99	07/05/2026	Pendiente
mayo	$ 0,00	0,00%	$ 964.996.179,57	10,765%	$ 964.996.179,57	$ 3.844.606,00	$ 961.151.573,57	3/06/2026	Pendiente
junio	$ 0,00	0,00%	$ 714.227.852,19	11,863%	$ 714.227.852,19	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Total	**$ 22.179,00**		**$ 4.022.614.287,05**		**$ 4.022.636.466,05**	**$ 16.026.439,00**	**$ 4.006.610.027,05**		

* Los rendimientos financieros tienen concepto de aprobación hasta julio de 2024. A partir de esa fecha tienen concepto de rechazo dada la controversia sobre las comisiones fiduciarias.

3.2.10. Informes Fiduciarios

Mensuales

Informe	Estado
Junio 2022 a julio 2024	Aprobados
Agosto 2024 a septiembre 2025	Pendientes de aprobación por el tema de comisiones Fiduciarias
Octubre 2025 a febrero 2026	En revisión por parte de la supervisión
Marzo 2026	Alcance recibido 23/06/2026. En revisión de la interventoría
Abril 2026	En revisión de la interventoría. Observaciones enviadas 06/07/2026

Trimestrales

Informe	Estado
Junio 2022 a junio 2024	Aprobados
Julio 2024 a septiembre 2025	Pendientes de aprobación por el tema de comisiones Fiduciarias
Octubre-Diciembre 2025	En revisión por parte de la supervisión
Enero-Marzo 2026	Versión 2 recibida 23/06/2026. En revisión interventoría

Informes radicados durante el periodo

Informe	Radicado	Fecha	Estado
Mayo 2026	261061510	11/06/2026	En revisión de la interventoría. Observaciones enviadas 10/07/2026

3.2.11. Comités Fiduciarios

Realizados durante el periodo

No. Comité	Tipo	Orden del día	Fecha
20	Extraordinario	1. Presentación de la designación Representantes a Comité Fiduciario. 2. Verificación Quórum 3. Estado de Desembolsos 4. Estado de Utilizaciones Aprobadas 5. Órdenes de pago 6. Saldos P.A con corte al 31 de mayo de 2026 y Saldos P.A con corte a 15 de junio de 2026. 7. Aprobación Utilizaciones Vigésima Cuarta A y Vigésima Cuarta B. 8. Citación próximo comité	17/06/2026
21	Ordinario	1. Presentación de la designación Representantes a Comité Fiduciario. 2. Verificación Quórum 3. Estado de Desembolsos al 25 de junio de 2026 4. Estado de Utilizaciones al 25 de junio de 2026 5. Órdenes de pago con corte al 25 de junio de 2026 6. Saldos con corte al 31 de mayo de 2026 y 25 de junio de 2026 7. Presentación del informe trimestral del Fideicomiso con corte octubre-diciembre de 2025 8. Presentación del informe trimestral del Fideicomiso con corte enero-marzo de 2026 9. Proposiciones y varios 10. Citación próximo comité	30/06/2026

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

4. Seguimiento Jurídico

4.1. Informes de Presunto Incumplimiento

A continuación, se presenta el Estado de los IPI generados a la fecha:

IPI No. 8 – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.8 – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 8 de 2025. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 3-1-07004, en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022 suscrito con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Última Actividad	El 17 de junio de 2026, mediante comunicado Radicado MinTIC 262103609 se recibió de la Supervisión el concepto jurídico emitido por la sociedad Benavides & Del Toro Asociados S.A.S., relacionado al pago de comisión fiduciaria y/o gastos de administración del Fondo de Inversión Colectiva.
Estado Actual	**Suspendido**

IPI No. 5 – Cláusula Penal	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.5 – Cláusula Penal. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento por el cumplimiento tardío de las metas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de Centros Digitales correspondientes al Grupo 1B (Meta 9), Grupo 2 (Metas 11 y 16) y, posteriormente, Grupos 3 y 3A (Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A), en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022. A la fecha quedan 31 Centros Digitales del Grupo 3A pendientes de entrada en operación.
Última Actividad	Mediante comunicado con radicado MinTIC No. 252149600 del 09/09/2025, la Supervisión presentó observaciones a la Interventoría respecto de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento remitida por la Interventoría mediante radicado MinTIC 251105060 del 13/08/2025 (actualización con corte al 30/06/2025, Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A).
Estado Actual	**Abierto**

4.2. Gestión de Riesgos

La Interventoría presenta los posibles riesgos a los que está expuesto el Contrato de Aporte 749 de 2022.

- Materialización de riesgos externos asociados a vandalismo y hurtos.
- Bloqueos de vías y condiciones climáticas extremas.
- Aplicación de medidas de mitigación y seguimiento contractual.

4.3. Garantías contractuales

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

El Contrato de Aporte No. 749 de 2022, se encuentra amparado por la Póliza de Cumplimiento No. 3015093 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1008955 cuyo beneficiario es el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES; su estado es el siguiente:

CONTRATISTA	NO. PÓLIZA	ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
UT ETB NET UT COLOMBIA CONECTADA	75682 Anexo 10	Chubb Seguros Colombia S.A.	Garantía única de Cumplimiento	1/11/2025	1/05/2031	$237,007,056,000
UT ETB NET UT COLOMBIA CONECTADA	75682 Anexo 10	Chubb Seguros Colombia S.A.	Prestaciones sociales	1/11/2025	1/05/2033	$49,822,500,000
UT ETB NET UT COLOMBIA CONECTADA	12/69052 Anexo 10	Chubb Seguros Colombia S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	1/11/2024	1/05/2030	$49,822,500.000

Póliza de Cumplimiento No. 75682 expedida Compañía Chubb Seguros Colombia S.A y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 69052 expedida Compañía Chubb Seguros Colombia S.A., debidamente aprobadas por la entidad el 28 de noviembre de 2025.

4.4. Personal con discapacidad

Se validó la certificación de ETB E.S.P. Vigencia del certificado hasta el 19 de julio de 2026. La interventoría remitió requerimiento a con (Rad. Interno SAL-26-006240 y Rad. MINTIC 261055176 de fecha 26 de mayo del 2026.

El operador UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA mediante el Rad. Interno ENT-26-008236 y Rad. MINTIC 261058574 del 6 de junio de 2026, informo el Certificado de personal con discapacidad a la fecha se encuentra vigente y se iniciarán las gestiones pertinentes a fin de obtener la renovación del documento.

Se realizó la presentación del estado contractual del Contrato de Aporte No. 749 de 2022, suscrito ente Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada conformado por (ETB 75%, Skynet 25%) con un plazo de ejecución proyectada hasta el 30 de junio de 2031.

El cual a la fecha cuenta con dos modificaciones contractuales; Otrosí No. 1 suscrito en el año 2024, mediante el cual se realizó ajustes al cronograma, velocidad de transmisión y condiciones de traslados y visitas y otrosí No, 2 suscrito en el año 2022, mediante el cual se modificó el valor contractual, garantías, portal cautivo e indicadores de calidad.
.
En el informe mensual de interventoría correspondiente al periodo de junio de 2026, se constata que la póliza de cumplimiento adquirida con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., y que cuenta con los amparos cumplimiento, prestaciones sociales se encuentra vigente. Asimismo, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suscrita con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., está vigente; ambas coberturas fueron aprobadas desde el 28 de noviembre de 2025

Durante el periodo de junio de 2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales mediante la revisión de los compromisos de confidencialidad, acuerdos suscritos con el personal, y los pagos de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2026. Asimismo, se constató la plena vigencia del certificado de vinculación del personal en condición de discapacidad el cual tiene una vigencia hasta el 19 de julio de 2026. Por último, durante el mes de junio de 2026 no se reportó la materialización de ningún riesgo asociado al contrato.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Respecto a los procesos de presunto incumplimiento, el trámite denominado 'IPI No. 7 relacionado con comisiones fiduciarias' se encuentra actualmente suspendido debido a que mediante comunicado radicado MinTIC 262103609, se recibió de la Supervisión el concepto jurídico emitido por la sociedad Benavides & Del Toro Asociados S.A.S., relacionado al pago de comisión fiduciaria y/o gastos de administración del Fondo de Inversión Colectiva, por lo tanto, la interventoría mediante comunicado SAL-26-008337 Rad. MinTIC 261072828 del 14 del 2026, se requirió al Contratista información para la verificación del cálculo, causación y pago de las comisiones fiduciarias del Patrimonio Autónomo. Por su parte, el proceso 'IPI No. 5' está relacionado con cumplimiento tardío de metas y cláusula penal.

Se realizó el monitoreo continuo de riesgos mediante la mitigación de factores externos como vandalismo, hurtos, bloqueos viales y eventos climáticos. Estas acciones garantizaron la continuidad del servicio de los Centros Digitales y protegieron la infraestructura del proyecto.

5. Conclusiones y Observaciones

- El proyecto presenta cumplimiento total en la Fase de Instalación.
- La Fase de Operación y Mantenimiento avanza conforme a lo programado.
- Se identifican impactos operativos por eventos externos (clima, orden público, energía).
- Los procesos administrativos (difusión, calidad, informes) se encuentran en ejecución o validación.
- La ejecución financiera es consistente con el avance contractual.
- Se mantiene seguimiento a procesos de revisión y aprobación pendientes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Programar mesa de trabajo para revisar la situación de las actas de transferencia presentadas y la metodología para su registro al patrimonio autónomo	Interventoría	31/07/2026
Enviar plan de visitas de agosto 2026 incluyendo movimientos de infraestructura pendientes por visita de aprobación	Interventoría	31/07/2026

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022	*Firmada Electrónicamente*
Alexander García Albornoz	INTERVENTORÍA – Director General	
Jonny Andrés Rodríguez	UT ETB NET – Gerente Integral de Proyecto	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	

Anexos

1. Presentación
2. Listado Asistencia Teams

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838
Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-23 17:34:49
Finalización: 2026-07-24 16:20:45


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Sergio Castro
78077731
scastro@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó




Sandro Salas Muñoz
98378727
ssalas@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Revisó



Sofia Carrillo Castelblanco
52282666
scarrillo@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC

Revisión: Revisó



Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-23 17:34:49

Finalización: 2026-07-24 16:20:45


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó



Catalina González Díaz
1018451322
cgonzalezd@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó



ALDO YESID PRADA FORERO
13511228
aprada@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Juan Manuel De León De Vargas
1003343189
jmdeleon@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó



Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838
Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-23 17:34:49
Finalización: 2026-07-24 16:20:45

Escanee el código para verificación

Firma: UT ETB NET ? Gerente Integral de Proyecto



Jonny Rodriguez
80257556
jonny.rodriguez@sky.net.co
Director de Proyectos
SkyNet de Colombia

Firma: FUTIC - Representante Fondo Único TIC




Edgar Sierra Martinez
1013584667
esierram@mintic.gov.co
Profesional especializado 2028-21
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Andres Fernando Gutierrez Britto
1014243918
afgutierrez@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó



Karenn Cardozo Cruz
1.024.482.236
kcardozo@mintic.gov.co
Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura
Mintic

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838


Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-23 17:34:49

Finalización: 2026-07-24 16:20:45


Escanee el código para verificación

Firma: MINTIC ? Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022?



Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Firma: INTERVENTORÍA ? Director General



Alexander García Albornoz
80020147
directorgeneral.cd@aciproyectos.com
Director General
Consorcio Centros Digitales I3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838
Creación: 2026-07-23 17:34:49
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-24 16:20:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:34:52 Lec.: 2026-07-23 17:35:46 Res.: 2026-07-23 17:35:56 IP Res.: 191.156.185.123 Canal: Email
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:35:57 Lec.: 2026-07-23 17:36:38 Res.: 2026-07-23 17:36:51 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Sandro Salas Muñoz ssalas@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:36:51 Lec.: 2026-07-23 17:38:01 Res.: 2026-07-23 17:38:06 IP Res.: 186.84.21.154 Canal: Email
Revisión	Sergio Castro scastro@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:38:06 Lec.: 2026-07-23 17:38:38 Res.: 2026-07-23 17:38:45 IP Res.: 191.95.49.91 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:38:45 Lec.: 2026-07-23 17:39:21 Res.: 2026-07-23 17:39:31 IP Res.: 186.102.102.157 Canal: Email
Revisión	Juan Manuel De León De Vargas jmdeleon@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:39:31 Lec.: 2026-07-23 17:48:13 Res.: 2026-07-23 17:48:22 IP Res.: 191.95.53.186 Canal: Email
Revisión	ALDO YESID PRADA FORERO aprada@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:48:22 Lec.: 2026-07-23 17:58:13 Res.: 2026-07-23 17:58:16 IP Res.: 191.156.62.148 Canal: Email
Revisión	Catalina González Díaz cgonzalezd@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-07-23 17:58:16 Lec.: 2026-07-23 18:16:14 Res.: 2026-07-23 18:16:21 IP Res.: 179.14.95.247 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-07-23 18:16:21 Lec.: 2026-07-23 18:17:45 Res.: 2026-07-23 18:17:50 IP Res.: 191.107.25.69 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

103-UTETBNET-26-ACO-50-23072026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260723-173449-66ebd9-67990838
Creación: 2026-07-23 17:34:49
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-24 16:20:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Andres Fernando Gutierrez Britto afgutierrez@mintic.gov.co Contratista MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-07-23 18:17:51 Lec.: 2026-07-23 18:19:47 Res.: 2026-07-23 18:19:54 IP Res.: 172.226.172.4 Canal: Email
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-07-23 18:19:54 Lec.: 2026-07-24 08:24:28 Res.: 2026-07-24 08:24:32 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Jonny Rodriguez jonny.rodriguez@sky.net.co Director de Proyectos SkyNet de Colombia	Aprobado	Env.: 2026-07-24 08:24:33 Lec.: 2026-07-24 08:26:03 Res.: 2026-07-24 08:26:17 IP Res.: 181.53.12.75 Canal: Email
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consorcio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-07-24 08:26:17 Lec.: 2026-07-24 14:45:46 Res.: 2026-07-24 14:45:49 IP Res.: 200.118.63.29 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-07-24 14:45:50 Lec.: 2026-07-24 16:20:38 Res.: 2026-07-24 16:20:44 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
