PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervencion

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral, quedan pendientes remates finales

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de reja en el área intervenida. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el uso de andamios como medio de acceso y plataforma de trabajo para la ejecución de las labores, encontrándose acordes con la actividad desarrollada.
Adicionalmente, se recomendó al personal mantener el uso adecuado y permanente de los EPP con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervencion

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAÚLICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Desencofrado y fraguado de viga dintel

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Aplicación de pintura en baranda y bajantes



Instalación de cubierta tipo sandwich

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Demolicion de placa

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No. 35 — **LOTE COP No.17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	35	DEL	1/06/2026 (DD-MM-AA)	AL	7/06/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	247	dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,220,672,788.00
AIU 35.95%	$ 798,331,867.29
COSTO DIRECTO	$ 1,422,340,920.71
OFERTADO	$ 2,109,535,964.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,209,535,964.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 11,136,824.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 111,136,824.00
Valor adicional No. 1:	$ 791,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 266,646,703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 266,646,703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,278,319,491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 311,136,824.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,967,182,667.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 358,568,403.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.13%	91.04%	Obra Fisica Ejecutada (%)	1.01%	91.80%
Valor de la Obra Programada:	$ 3,708,978.00	$ 2,984,418,149.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 29,860,985.00	$ 3,009,378,454.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90.91%	90.79%	
Durante el periodo	0.13%	1.01%	-0.01%
Acumulado actual	91.04%	91.80%	

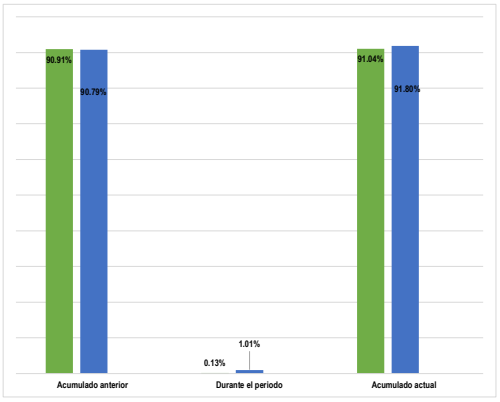

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	1.20%	1.20%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.81%	0.81%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	1.50%	1.50%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	2.45%	2.45%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	1.99%	1.99%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.99%**	**0.99%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	1.25%	1.12%	-0.13%	6.28%	6.15%	-0.13%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIÓN No. 02			**1.25%**	**1.12%**	**-0.13%**	**6.28%**	**6.15%**	**-0.13%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**0.13%**	**1.01%**	**0.88%**	**90.63%**	**90.62%**	**-0.01%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,593,790.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,678.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	88.00%	92.00%	4.00%	$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 86,095,004.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,497,755.70		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**60.23%**	**60.54%**	**0.31%**	**$ 147,469,017.94**	**$ 311,136,824.00**	**$ 163,667,806.06**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,895,038,739.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 1,383,280,752.00	$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
INDICADOR TECNICO	91.04%	91.80%	-0.01%

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	247	-0.03

CURVA S

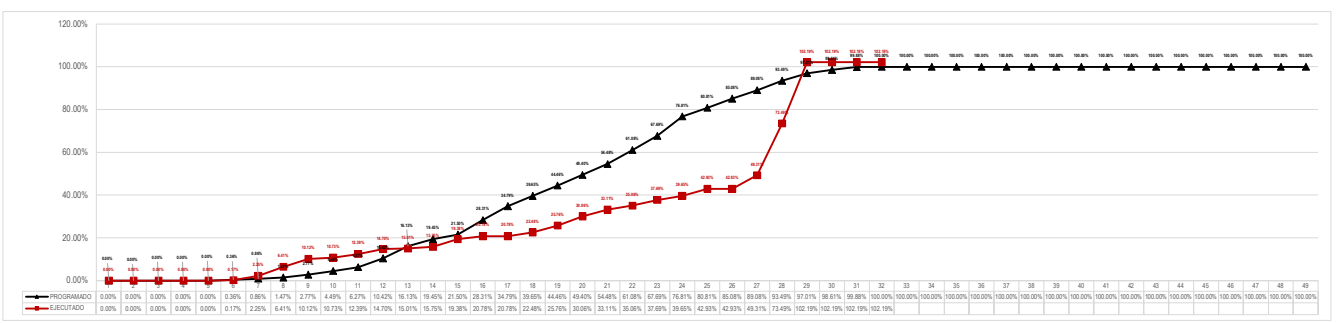

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion. En la entrega de espacios se solicitaron unos ajustes, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades contempladas en el alcance del proyecto. Asimismo, durante el periodo en el que se ejecutaron las labores en obra, no se reportaron ni evidenciaron accidentes o incidentes de trabajo, manteniéndose condiciones adecuadas de seguridad y salud para el personal involucrado en la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se solicita al contratista ajustar marco de puerta que se encuentra suelto, con el fin de permitir el correcto funcionamiento de la misma.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realiza labores de remates de acuerdo con observaciones dadas en la entrega por parte de la supervicion e interventoria

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra relacionadas con afinado en parte posterior de las aulas, pintura y acometida.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe ajustar labores en la instalacion de estructura metalica, remates en los soportes de la estructura de cubierta del segundo nivel con el fin de dar garantia a las labores y/o corregir remates finales

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista se compromete a terminar subsanaciones durante el periodo de vacaciones para no inerferir con actividades academicas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe atenter a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilizacion con manto asfaltico ubicado en la losa del baño de coordinacion

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra realizando ajustes de observaciones de remates solicitadas

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades contempladas en el alcance del proyecto. Asimismo, durante el periodo en el que se ejecutaron las labores en obra, no se reportaron ni evidenciaron accidentes o incidentes de trabajo, manteniéndose condiciones adecuadas de seguridad y salud para el personal involucrado en la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se continua con la actividad de demolicion de placa en concreto

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al avance en la demolición de la placa existente y la excavación de zanja en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoria verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en condiciones adecuadas para la delimitación y protección del frente de obra.
Asimismo, se evidenció que el personal presente hacía uso adecuado de la dotación y de los EPP requeridos para la ejecución de las actividades, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras durante el desarrollo de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda retirar adecuadamente todo, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La interventoria solicita que el contratista remita esquemas para la intervencion del muro , esto en respuesta a las condiciones; el supervisior del contrato solicita visita conjunta en compañia de los estructurales de interventroria de obra para verificar el tema en sitio.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: No se han efectuado labores a la fecha.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista no a efectuado labores a la fecha, durante comité realizado en la SEDel contratista manifiesta ingresa a la sede la proxima semana

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra estructurando un NP en relacion a un humificador industrial requerido en la segunda etapa de la solicitud para la emergencia. El contratista lo remitira el dia martes 9 de junio a la interventoria para revision y verificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron actividades de pintura y trabajos electricos.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a trabajos eléctricos y de pintura en el área intervenida. Asimismo, se verificó la ejecución de jornadas de orden y aseo, incluyendo el retiro de residuos generados durante la obra y el desmonte del cerramiento perimetral instalado para la delimitación del frente de trabajo.
Estas actividades contribuyen a la adecuación final del área intervenida, garantizando mejores condiciones de limpieza, seguridad y organización previo a la culminación de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento perimetral se evidencio la disposición de retiros adecuadamente, al igual se evidencia poco material de construcción por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Durante la reunion realizada en la SED se menciono que debido a que el quiosco se encuentra expuesto al impacto recurrente de balones debido a su ubicación entre las canchas deportivas. Esta condición ha generado afectaciones en las caras de el quiosco que son de superboard, las cuales presentan fisuración y deterioro por impactos repetitivos.
Por lo anterior, la interventoria recomendó evaluar medidas de protección para la intervención. No obstante, se informo que la institución educativa adelantará la reorientación de las canchas para reducir la incidencia directa de los impactos sobre la estructura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Se realizan actividades relacionadas con remate de enchape del shut y pintura de muro interior y exterior

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la totalidad de la fachada y en los muros internos de la edificación. Adicionalmente, se realizaron labores de lavado de pisos, limpieza general y acopio de materiales, con el fin de mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área intervenida.
Durante la visita de seguimiento, la Interventoría recomendó al personal hacer uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente del casco de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral, se evidencia material y residuos acopiados (volumen bajo), por lo que se recomienda realizar la disposición de estos adecuadamente, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: Durante la reunión realizada en la SED, se definió que la reja a instalar sobre el muro será de color negro. Adicionalmente, se acordó que las columnas de soporte de los tanques serán pintadas con franjas alternadas en colores amarillo y negro, dispuestas en diagonal, similares a la demarcación utilizada en los parqueaderos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: Se realizó una inspección en la sede con el fin de evaluar las condiciones existentes y definir las actividades a contemplar. Se realizo verificacion en zona de la fachada para verificar si la filtracion es en la zona interna o externa. Se evidenmcia que posiblemente la filtracion se genera en la parte interna del baño. La reparacion se programa para el proximo sabado 13 de junio del 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista el dia miercoles 10 de junio a las 11:00 a.m. con el fin de determinar el alcance de la intervencion

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista el dia miercoles 10 de junio a la 1:00 p.m.con el fin de determinar el alcance de la intervencion

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Instalacion de enchape de muro faltante en el shut de basuras.

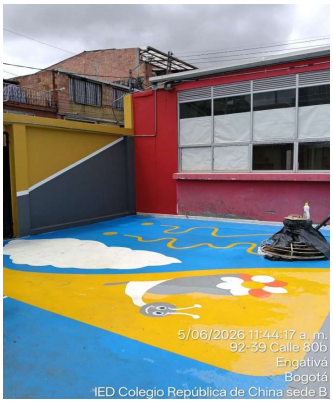

Limpieza y aseo



Aplicación total de pintura de muro interno y fachada.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Demolicion de placa

Ilustración 19. Anotaciones Bitácora OTIC

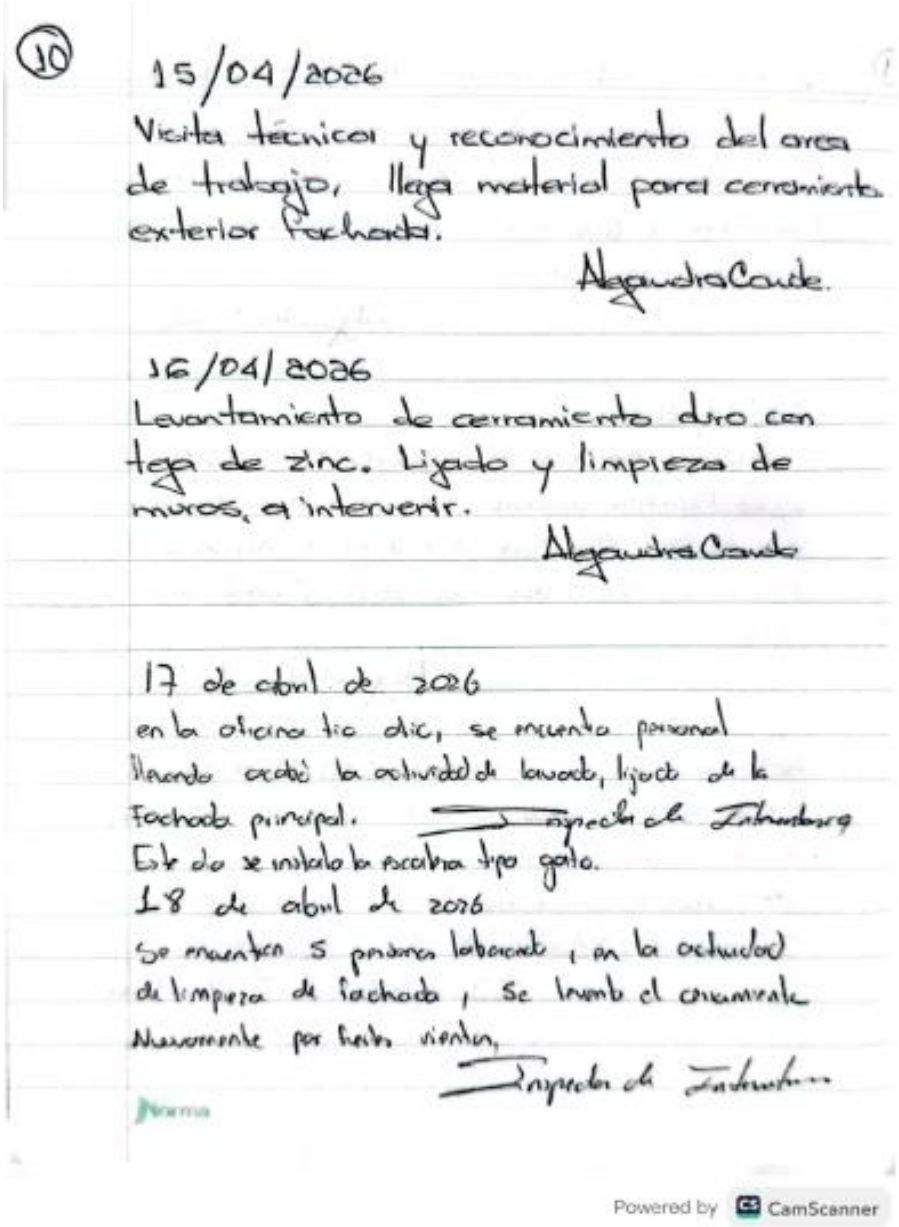

10

15/04/2026

Visita técnica y reconocimiento del area de trabajo, llega material para cerramiento exterior fachada.

Alejandra Conde.

16/04/2026

Levantamiento de cerramiento duro con teja de zinc. Ligado y limpieza de muros, a intervenir.

Alejandra Conde

17 de abril de 2026

en la oficina tic dic, se encuentra personal llevando acabo la actividad de lavado, ligado de la fachada principal. Ingeniero de Intervento


Este dia se instala la escalera tipo gato.

18 de abril de 2026

Se encuentra 5 personas laborando, en la actividad de limpieza de fachada, Se lavan el cerramiento Nuevamente por fuera viento.

Ingeniero de Intervento

Powered by CamScanner

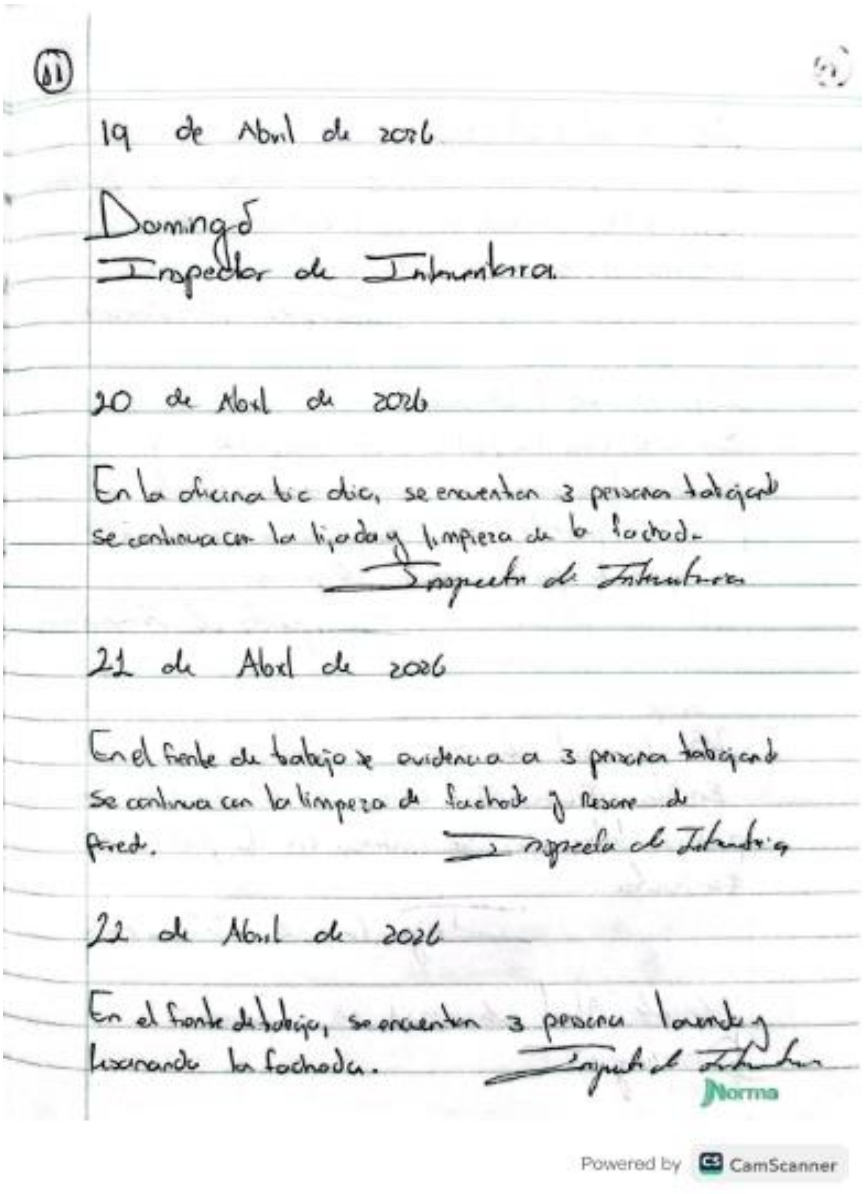

19 de Abril de 2026

Domingo
Inspector de Infraestructura.

20 de Abril de 2026

En la oficina bic dic, se encuentran 3 personas trabajando se continua con la lijada y limpieza de la fachada.
Inspector de Infraestructura

21 de Abril de 2026


En el frente de trabajo se evidencia a 3 personas trabajando se continua con la limpieza de fachada y resane de pared.
Inspector de Infraestructura

22 de Abril de 2026

En el frente de trabajo, se encuentran 3 personas lavando y lijando la fachada.
Inspector de Infraestructura

Norma

Powered by CamScanner

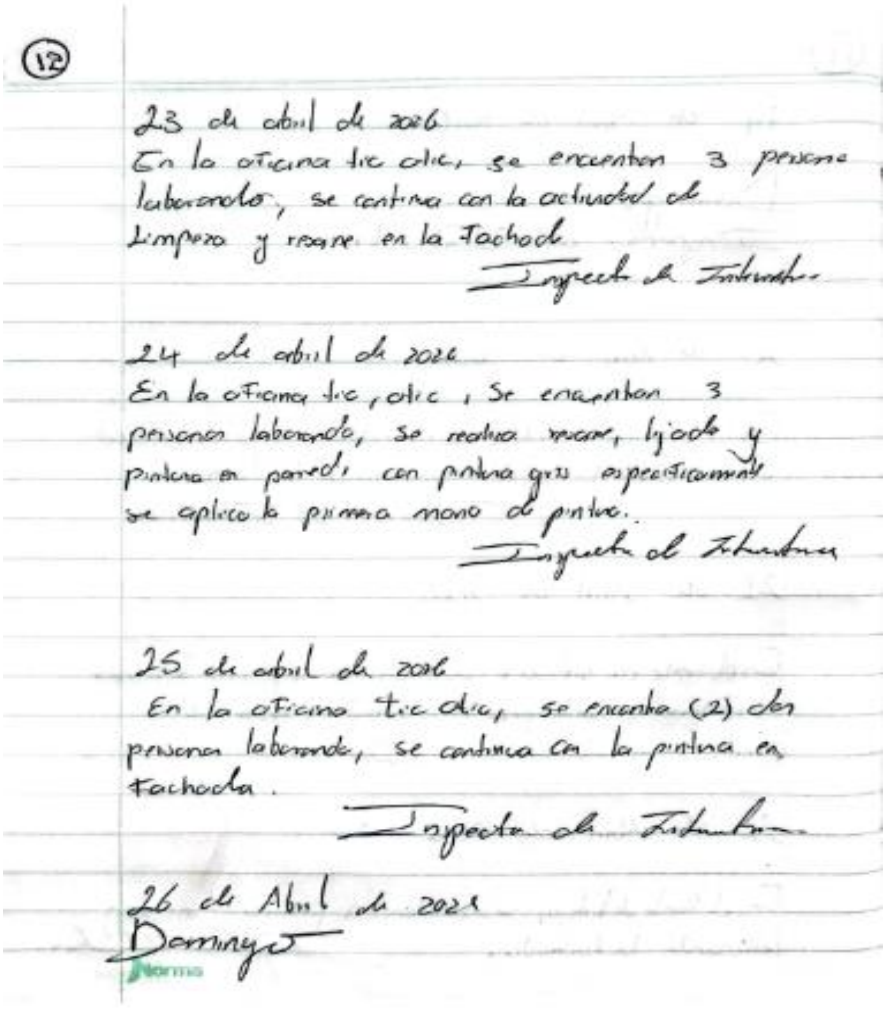

(12)

23 de abril de 2026
En la oficina tic chic, se encuentran 3 personas laborando, se continua con la actividad de limpeza y resane en la fachada

Inspector de Turno

24 de abril de 2026
En la oficina tic, chic, se encuentran 3 personas laborando, se realiza resane, lijado y pintura en pared, con pintura gris especificamente se aplico la primera mano de pintura.


Inspector de Turno

25 de abril de 2026
En la oficina tic chic, se encuentra (2) dos personas laborando, se continua con la pintura en fachada.

Inspector de Turno

26 de Abril de 2026
Domingo

Powered by CamScanner

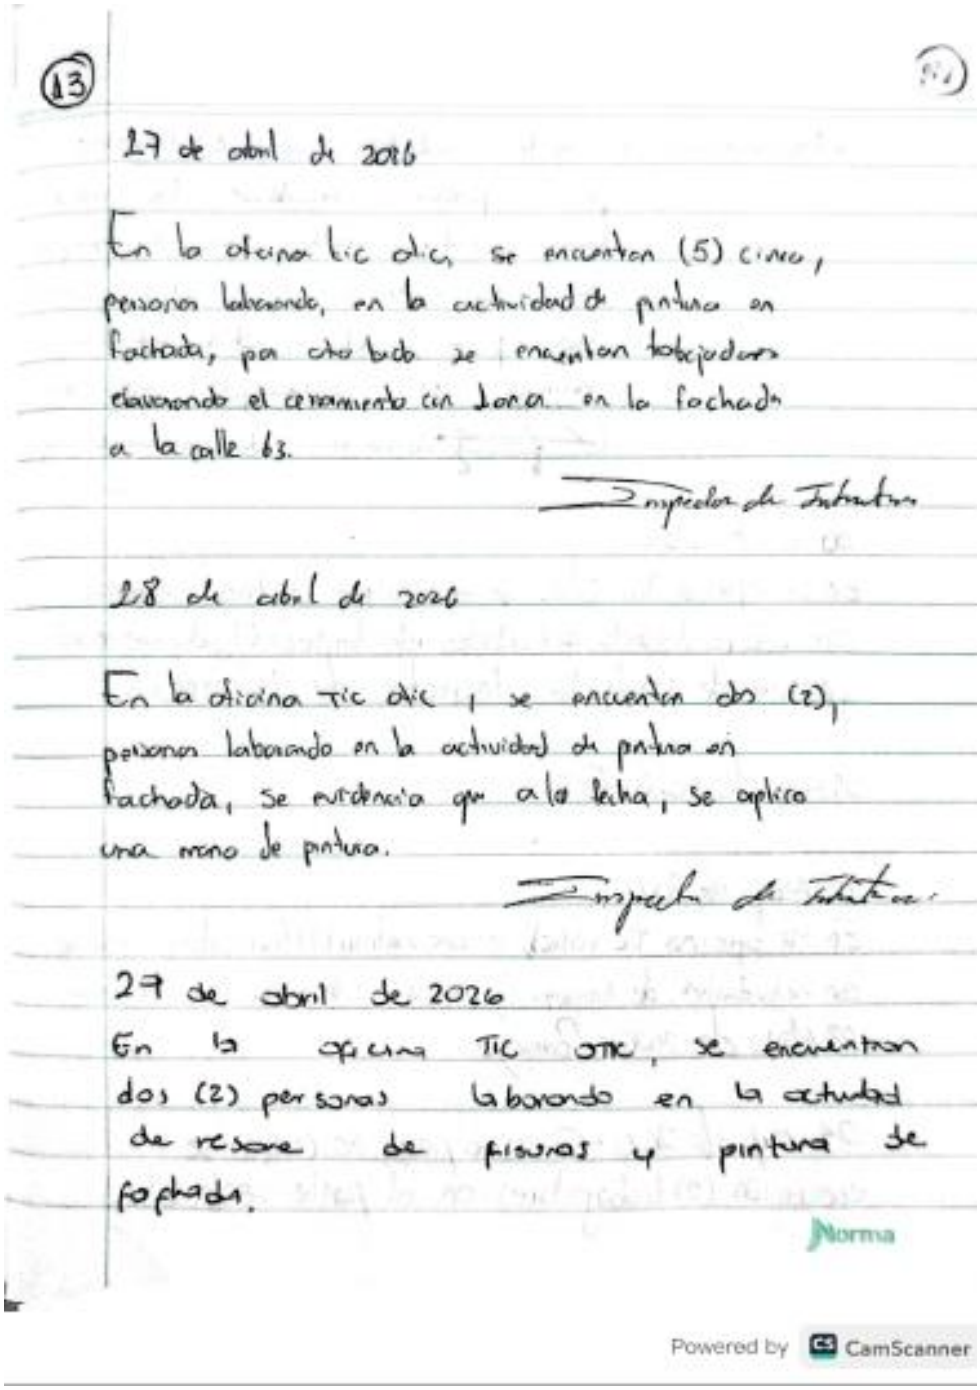

(13)

27 de abril de 2026

En la oficina tic ofic, se encuentran (5) cinco, personas laborando, en la actividad de pintura en fachada, por otro lado se encuentran trabajadores elaborando el cerramiento con lona en la fachada a la calle 63.

Inspector de Interventoría

28 de abril de 2026

En la oficina TIC OFIC, se encuentra dos (2), personas laborando en la actividad de pintura en fachada, se evidencia que a la fecha, se aplica una mano de pintura.


Inspector de Interventoría

27 de abril de 2026

En la oficina TIC OTIC, se encuentran dos (2) personas laborando en la actividad de resane de fisuras y pintura de fachada.

Norma

Powered by CamScanner

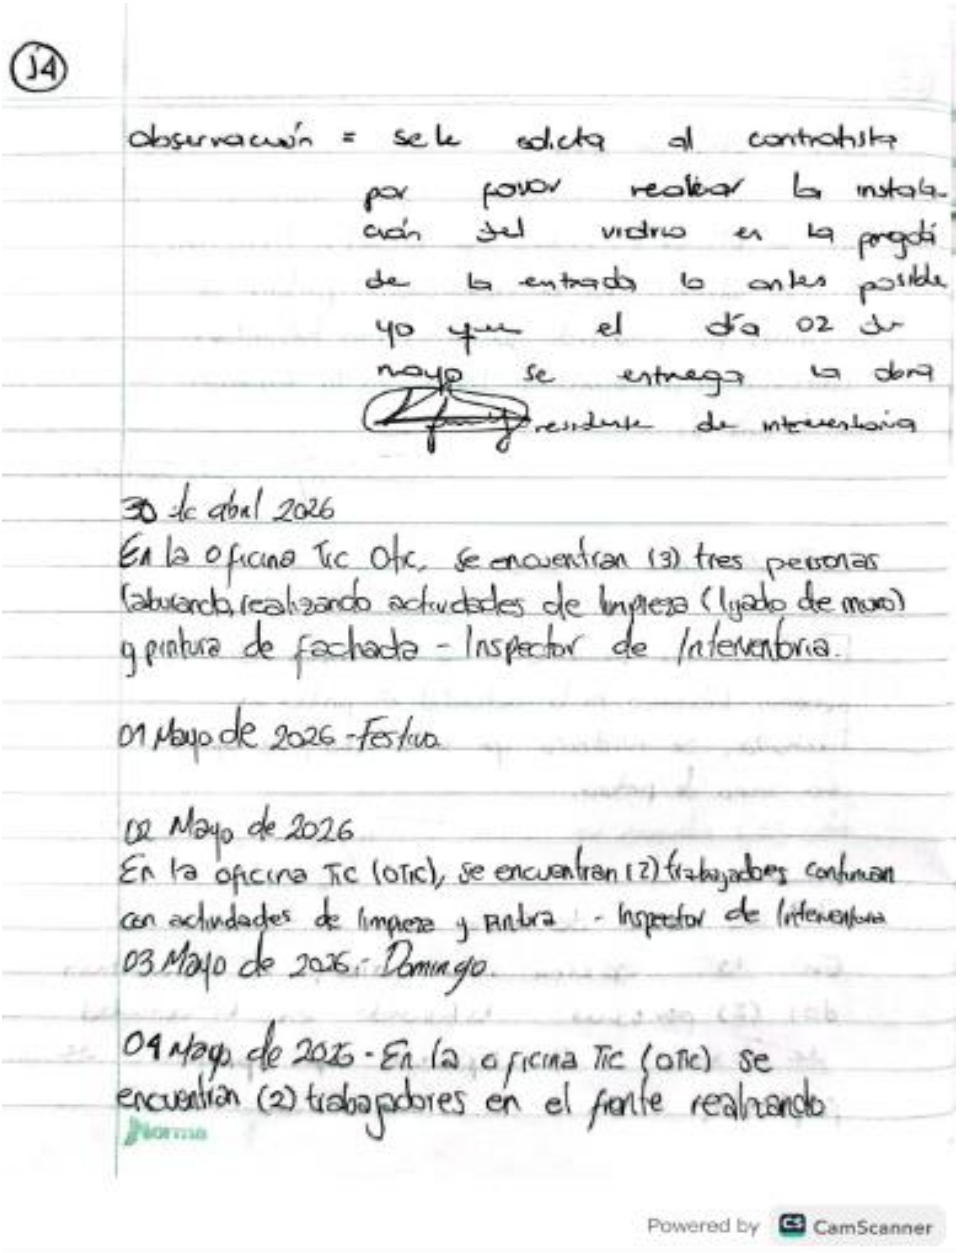

(14)

observación = se le edicta al contratista por favor realizar la instalación del vidrio en la portada de la entrada lo antes posible ya que el día 02 de mayo se entrega la obra

Residente de interventoría

30 de abril 2026
En la oficina Tic Otic, se encuentran (3) tres personas laborando, realizando actividades de limpieza (lijado de muro) y pintura de fachada - Inspector de Interventoría.


01 Mayo de 2026 - Festivo


02 Mayo de 2026
En la oficina Tic (OTIC), se encuentran (2) trabajadores continuan con actividades de limpieza y pintura - Inspector de Interventoria
03 Mayo de 2026: Domingo.

04 Mayo de 2026 - En la oficina Tic (OTIC) se encuentran (2) trabajadores en el frente realizando

Powered by CamScanner

Ilustración 22- Anotación Bitácora I.E.D José Asunción Silva

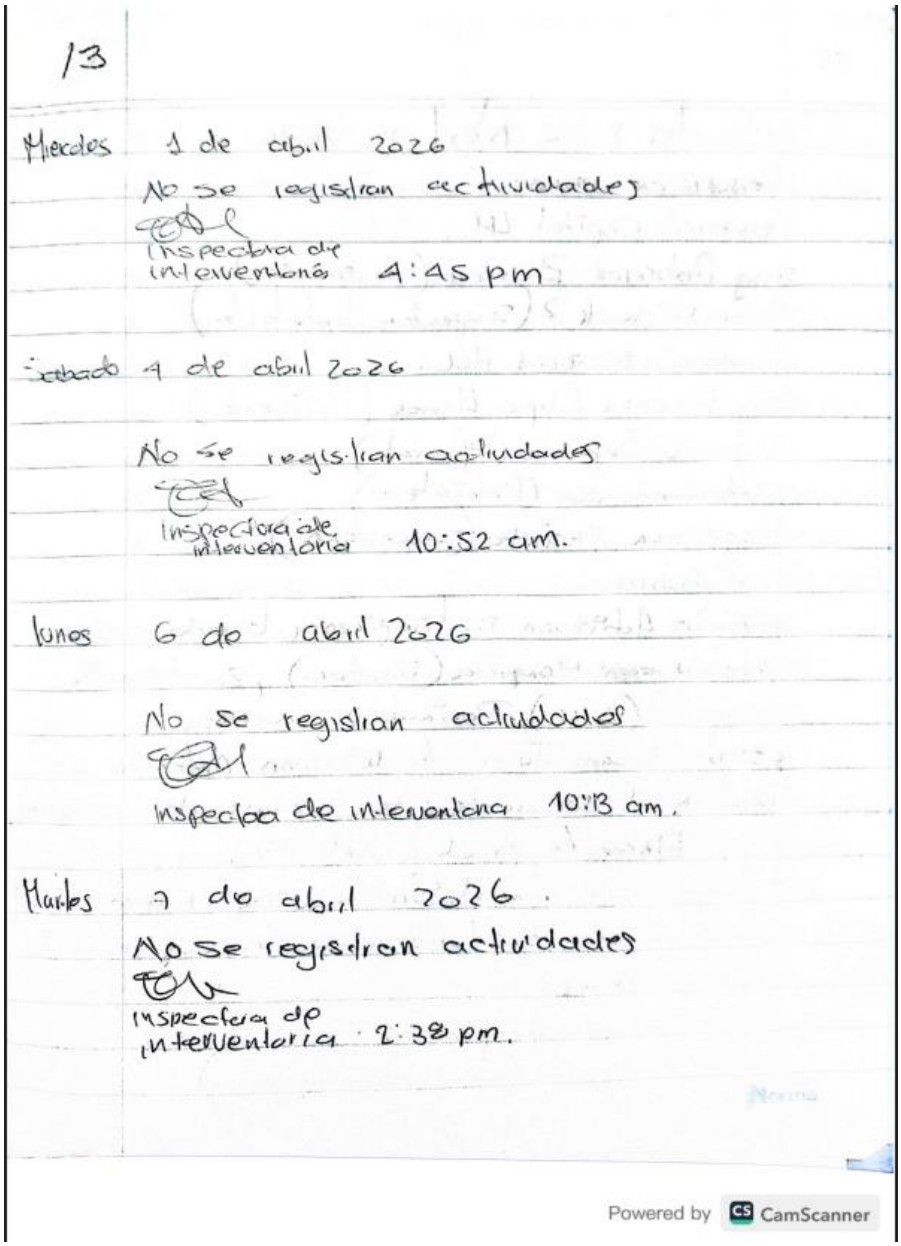

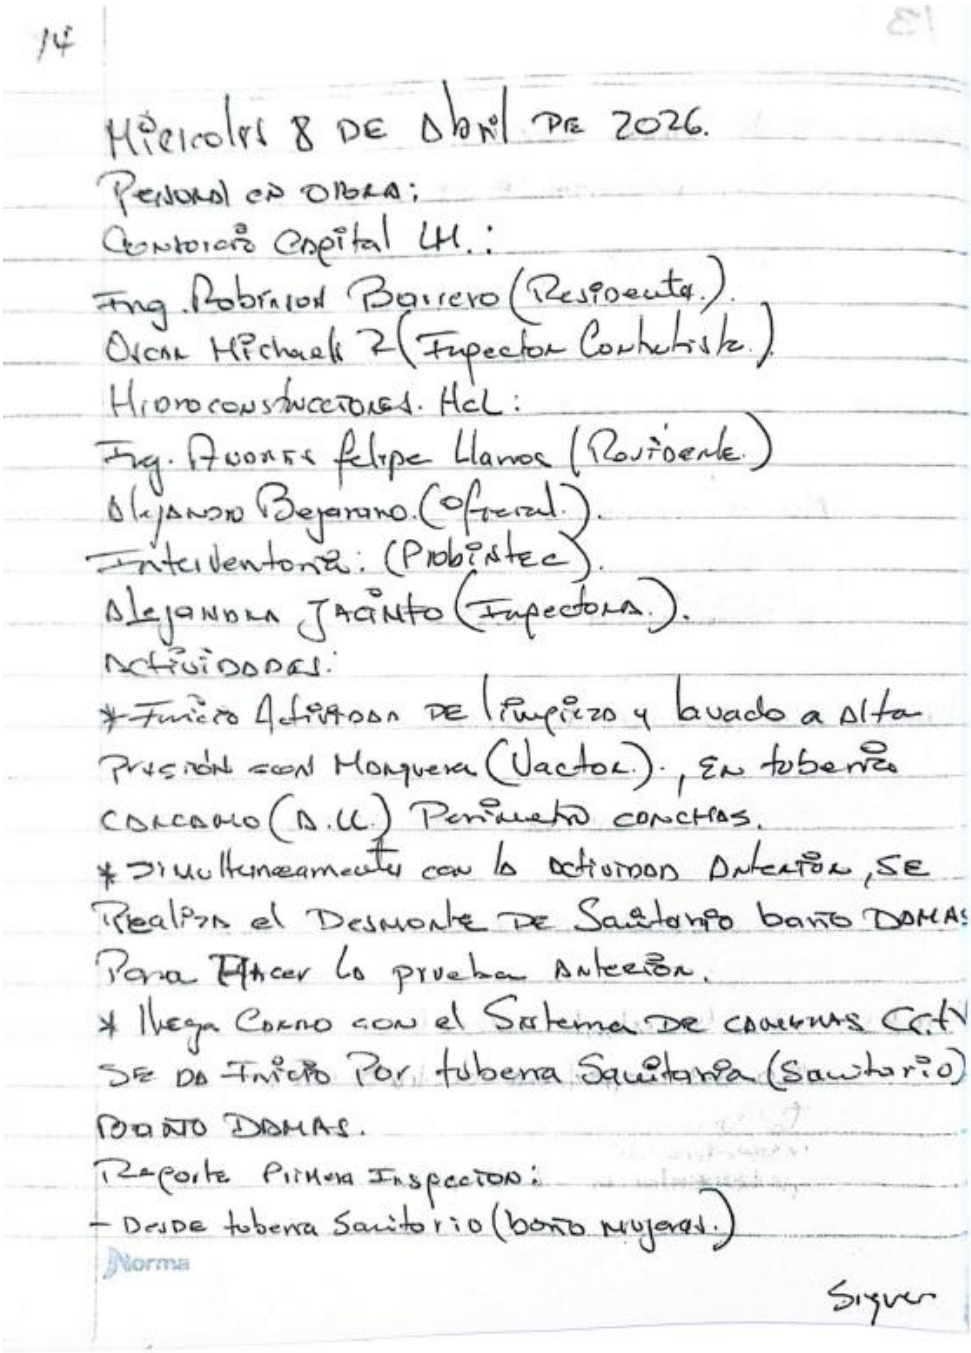

14

Miércoles 8 de Abril de 2026.

Personal en obra:

Contratista Capital LH.:

Ing. Robinson Barrero (Residente).

Oscar Michael Z (Inspector Contratista).

Hidroconstrucciones. HcL:

Ing. Auonte felipe Llanos (Residente)

Alejandro Bejarano. (Oficial).

Interventoría: (Probintec).

Alejandra Jacinto (Inspectora).

Actividades:

* Inicio Actividad de limpieza y lavado a alta presión con Manguera (Vactor)., en tubería Concreto (D.N.) Perimetro conchas.

* Simultaneamente con la actividad Anterior, se Realiza el Desmonte de Sanitario baño Damas Para Hacer la prueba Anterior.


* Luego Como con el Sistema de cámaras CCTV se da Inicio Por tubería Sanitaria (Sanitario) Baño Damas.

Reporte Primera Inspección:

- Desde tubería Sanitario (baño mujeres).

Norma

Siguen

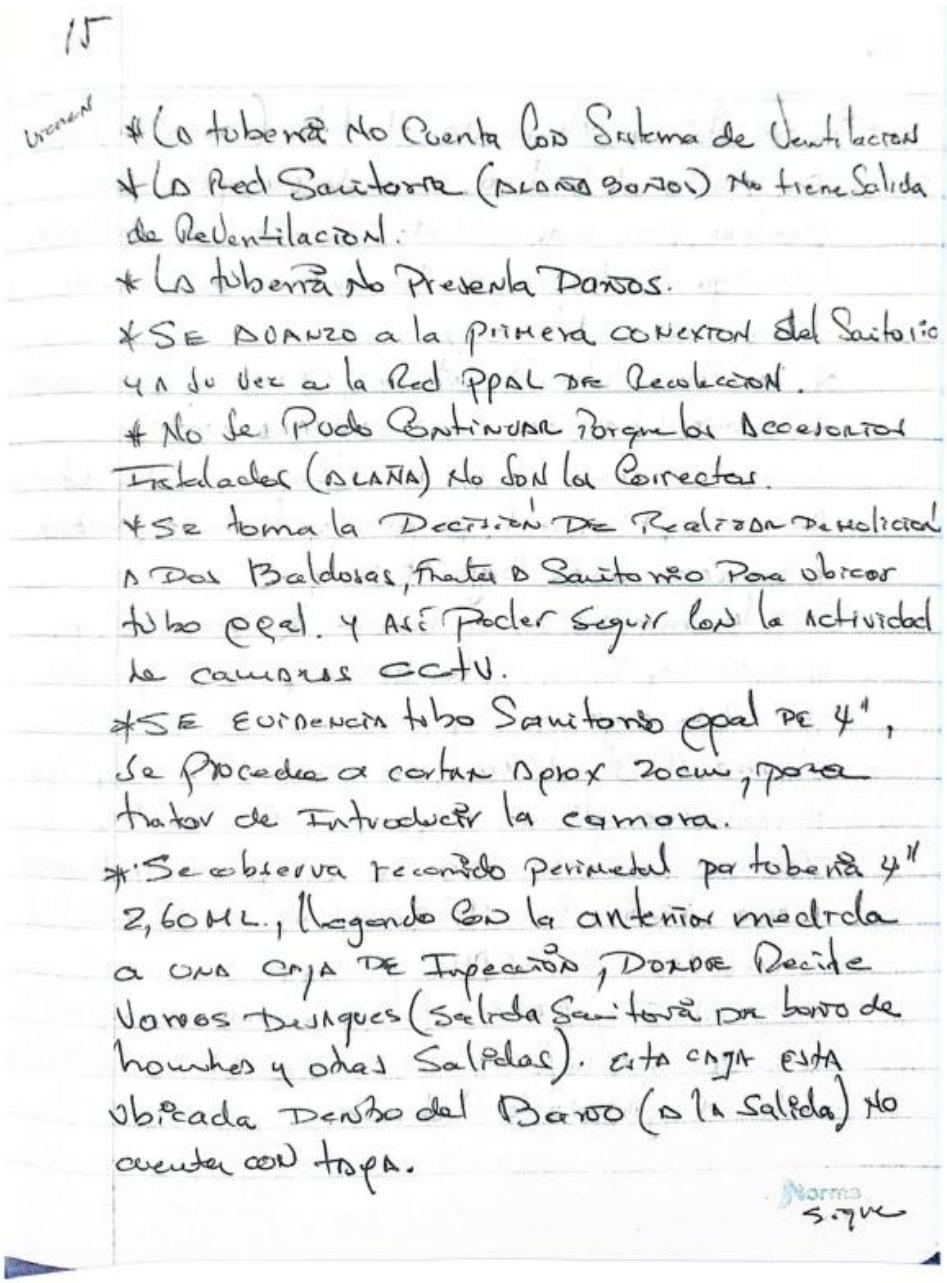


15

Urgente

* La tubería No Cuenta Con Sistema de Ventilacion
* La Red Sanitaria (BLAÑA BAÑO) No tiene Salida de ReVentilacion.
* La tubería No Presenta Daños.
* SE DANZO a la primera conexion del Sanitario y a su vez a la Red PPAL DE Recoleccion.
* No se Pudo Continuar Porque las Accesorios Instalados (BLAÑA) No son los Correctos.
* Se toma la Decision De Realizar Demolicion a Dos Baldosas, Frente a Sanitario Para ubicar tubo ppal. y Así Poder Seguir Con la Actividad de camaras CCTV.
* SE EVIDENCIA tubo Sanitario ppal DE 4", se Procede a cortar Aprox 20cm, para Instalar de Introducir la camara.
* Se observa recorrido perimetral por tubería 4" 2,60 ML., llegando Con la anterior medida a UNA CAJA DE Inspección, DONDE Decide Varios Desagues (Salida Sanitaria DE Baño de hombres y otras Salidas). esta caja esta ubicada Dentro del Baño (a la Salida) No cuenta con tapa.

Norma S.A.

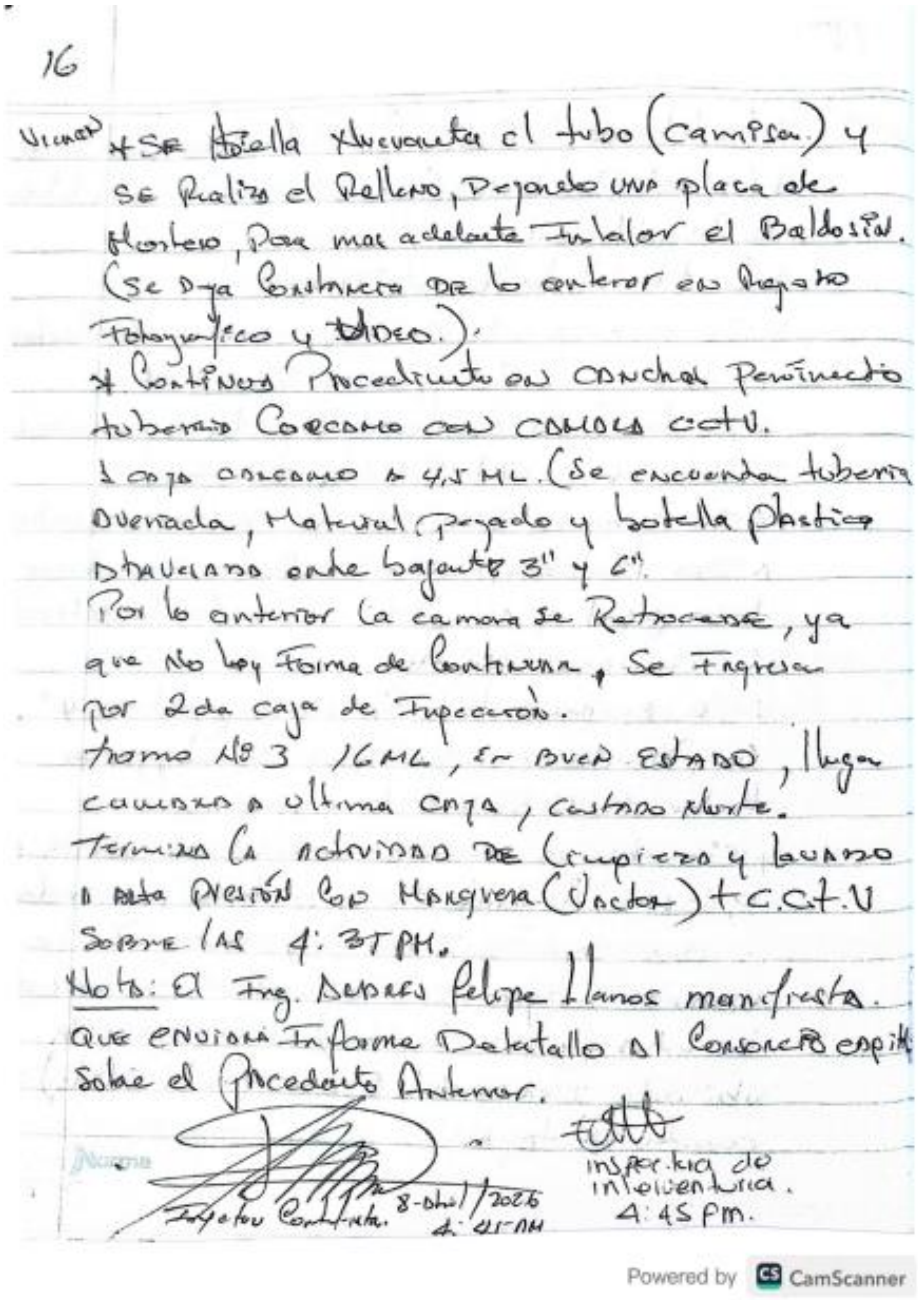

16

Viernes * Se Resella y Recubreta el tubo (camisa) y se Realiza el Relleno, Dejando una placa de Anclaje, Para mas adelante Fundir el Baldosin. (Se Deja Constancia de lo anterior en Registro Fotografico y VIDEO).

* Continua Procedimiento en CONCHA Penetrando tuberia Cortando con CAMARA C.C.T.V.

1 caja cortando a 4,5 ML. (Se encuentra tuberia Quebrada, Material Pegado y botella plastica Atravesando entre bajantes 3" y 6".

Por lo anterior la camara se Retrocede, ya que No hay Forma de Continuar, Se Ingresa por 2da caja de Inspeccion.

Tramo Nº 3 16 ML, En Buen Estado, llega cambiando a ultima caja, costado Norte.


Terminada La actividad de Limpieza y lavado a Alta Presion con Manguera (Vactor) + C.C.T.V Sobre las 4:37 PM.

Nota: El Ing. Residente Felipe Llanos manifiesta. que enviara Informe Detallado al Consorcio espit Sobre el Procedimiento Anterior.

Inspector Contratista. 8-Abril/2026 4:45 AM

Inspectoria de Interventoria. 4:45 PM.

Powered by CamScanner

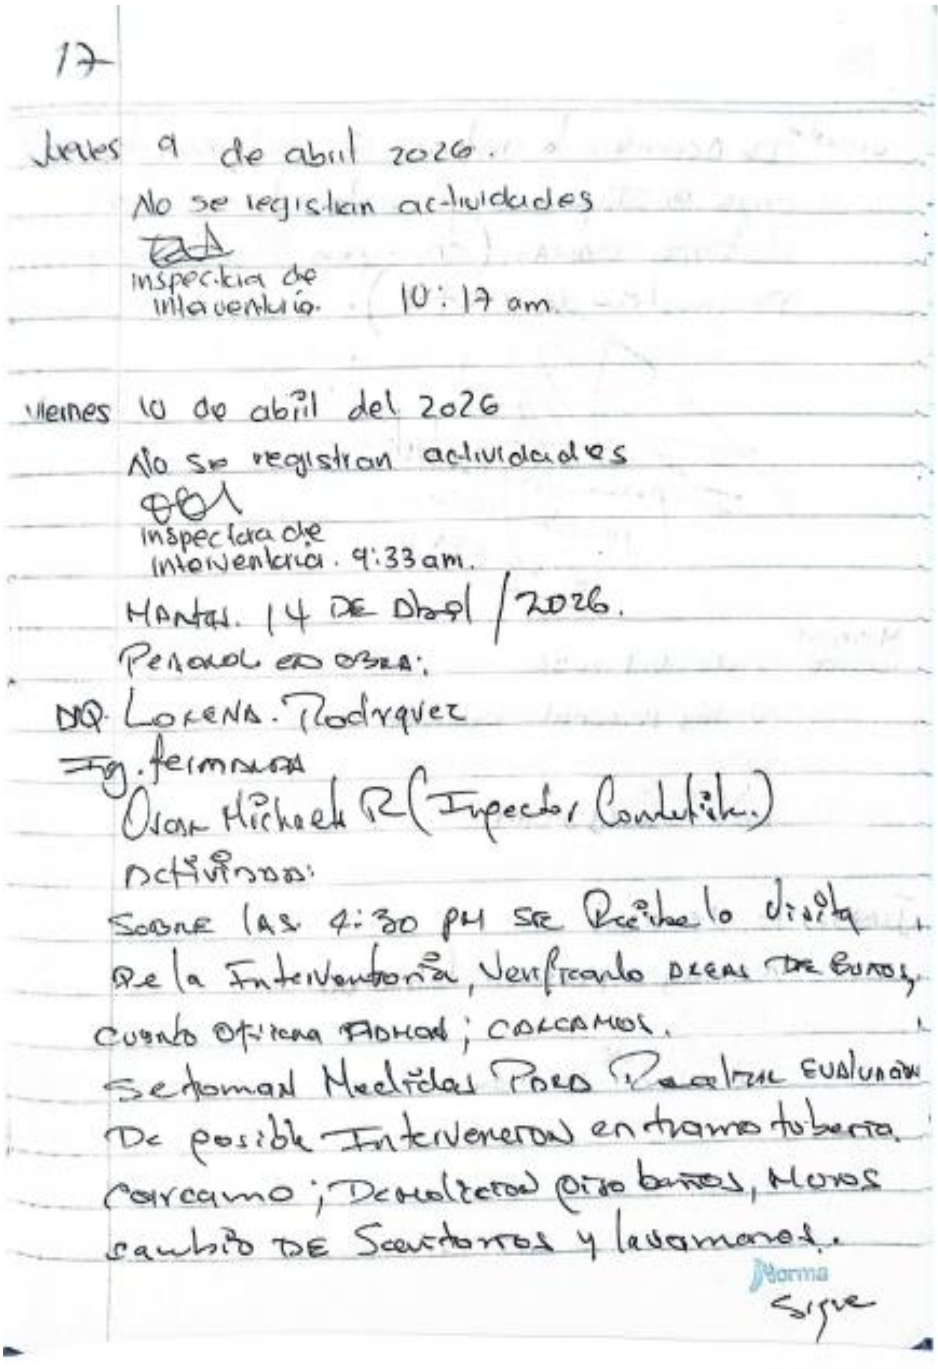

17

Jueves 9 de abril 2026.

No se registran actividades

Inspectora de Interventoría. 10:17 am.

Viernes 10 de abril del 2026

No se registran actividades

Inspectora de interventoría. 9:33 am.

MANTAL. 14 DE Abril / 2026.

PERSONAL EN OBRA:

DQ. LORENA. Rodriguez

Ing. Fernanda


Oscar Michael R (Inspector Contratista.)

ACTIVIDADES:

SOBRE LAS 4:30 PM SE Recibe la visita de la Interventoría, Verificando AREAS DE BAÑOS, CUARTO OFICINA ADMON; CARCAMOS. Se toman Medidas PARA Realizar EVALUACIÓN De posible Intervención en tramo tubería carcamo; Demolición pisos baños, MUROS cambio DE Sanitarios y lavamanos.

Norma

Sigue

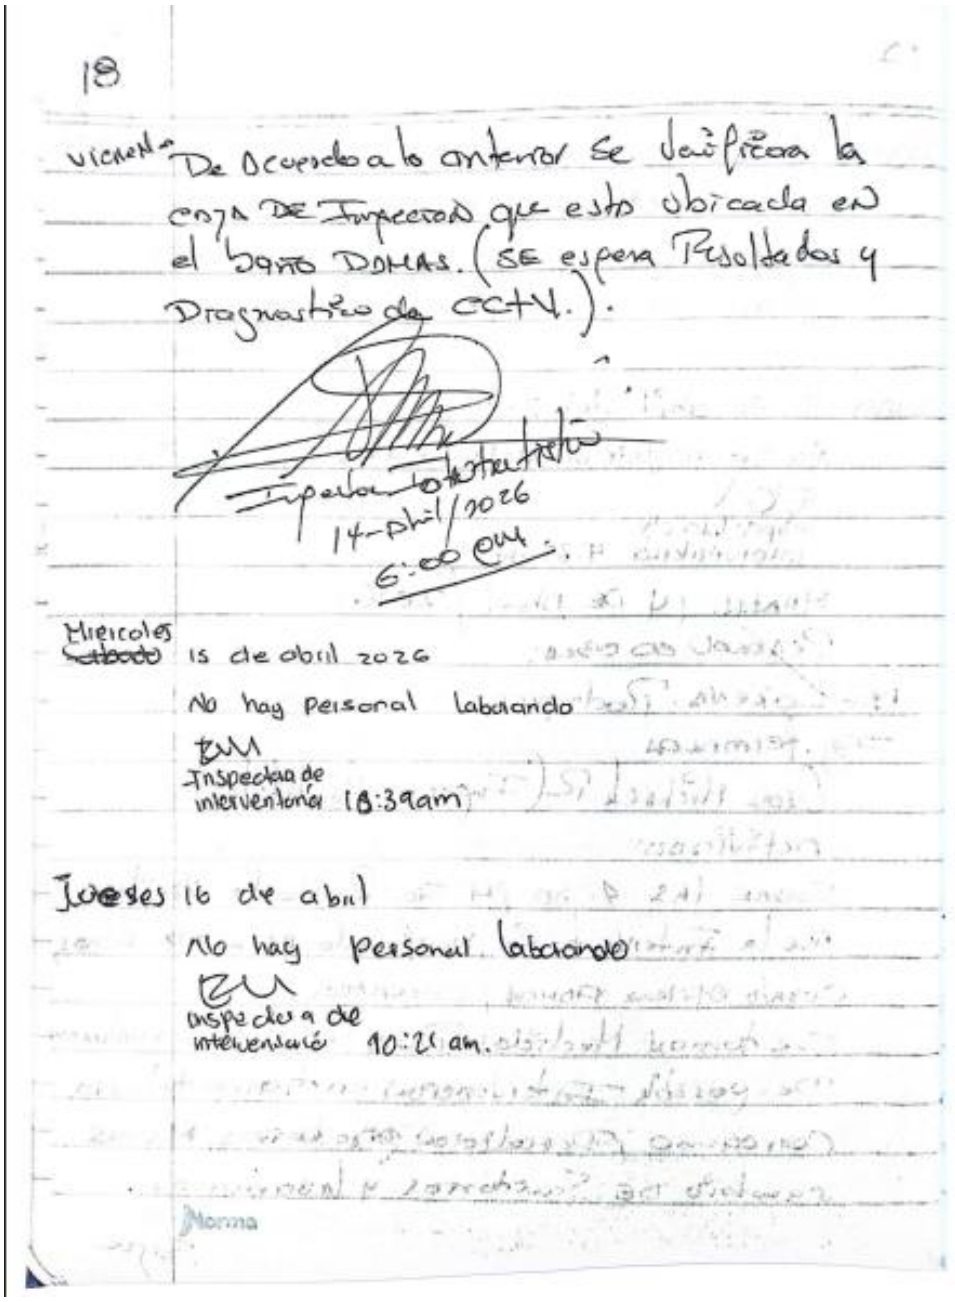

18


viernes De Acuerdo a lo anterior se Justifica la CASA DE Inspección que esta ubicada en el barrio DOMAS. (SE espera Resultados y Diagnostico de CCTV.).

Inspector Interventor
14-Abril/2026
6:00 PM.

Miercoles ~~Sabado~~ 15 de abril 2026
No hay Personal laborando
Inspectora de interventoría 18:39am

Jueves 16 de abril
No hay Personal laborando
Inspectora de interventoría 10:21 am.

Norma

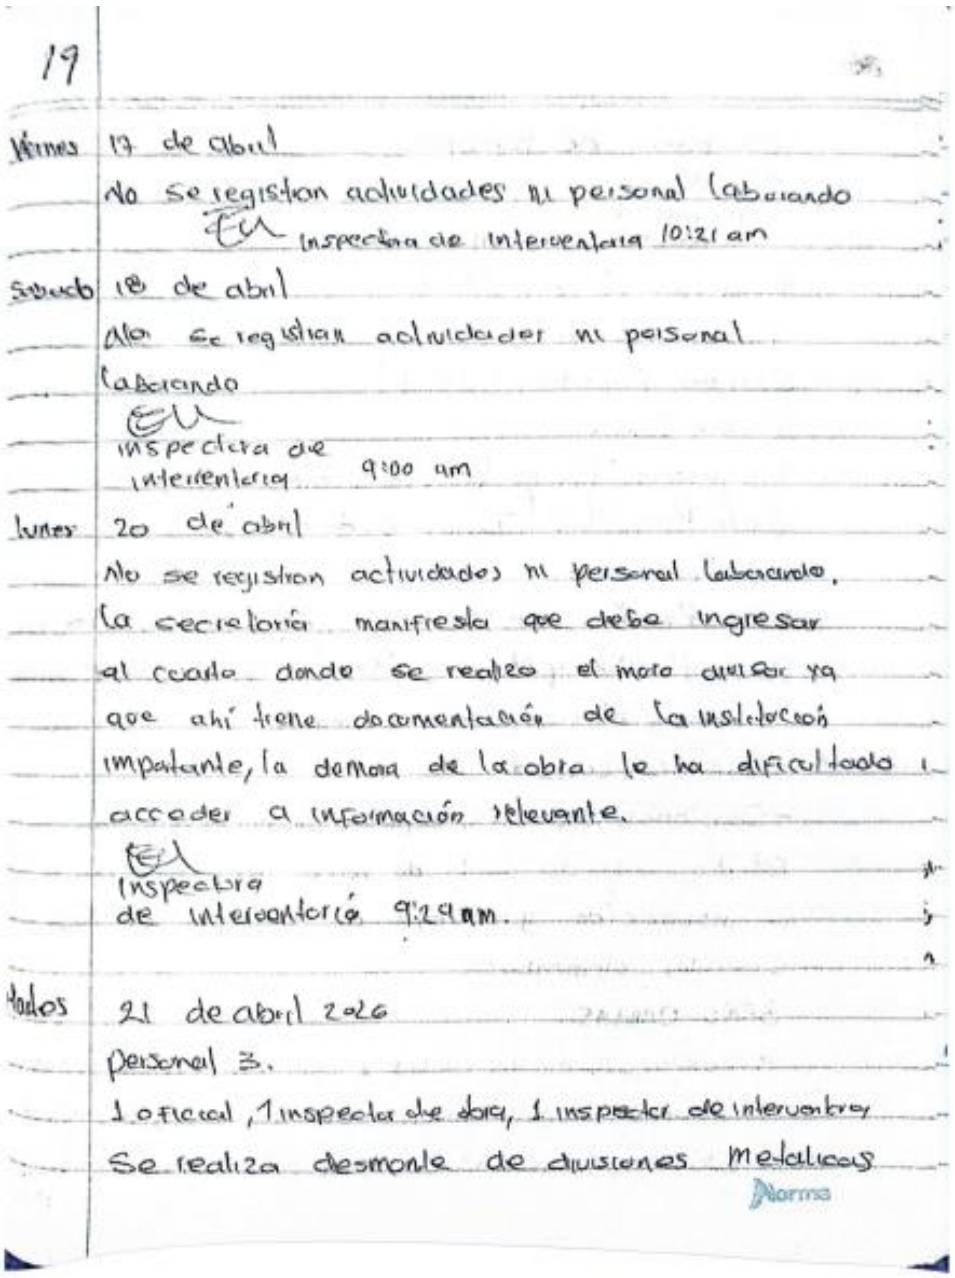

19

Viernes 17 de abril

No se registran actividades ni personal laborando

EV Inspectora de interventoria 10:21 am

Sabado 18 de abril

No se registran actividades ni personal laborando

EV Inspectora de interventoria 9:00 am

lunes 20 de abril

No se registran actividades ni personal laborando. La secretaría manifiesta que debe ingresar al cuarto donde se realizo el mate diesel ya que ahí tiene documentación de la instalación importante, la demora de la obra le ha dificultado acceder a información relevante.

EV Inspectora de interventoría 9:29 am.

Todos 21 de abril 2026

personal 3.

1 oficial, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria

Se realiza desmonte de divisiones metalicas

Norma

20.

En baño de hombres.

EOM

Inspectora de Interventoría 2:52 pm

Miercoles 22 Abril / 2026.

Personal en obra:

Gerber Acosta (Operario)

Personal Técnico:

Shyrlandia Tacoda (Inspectora Interventoría.)

Oscar Richard R (Inspector Contratista.)

Actividades:

*Se realiza acta de elementos a Desmontar en Baño Hombres y Mujeres. (se solicita un lugar donde se puedan almacenar estos elementos)

ACTA DE RECIBO


- Sanitarios, lavamanos, espejos, Divisiones y Vanos.

El día 22 de abril de 2026 se realiza la inspección y entrega al colegio de los siguientes elementos:

BAÑO DAMAS.

- 4 Sanitarios, de los cuales 2 se encuentran rotos en la parte superior interna de los tazas, los otros 2 están en buen estado, 1 de los sanitarios

Forma

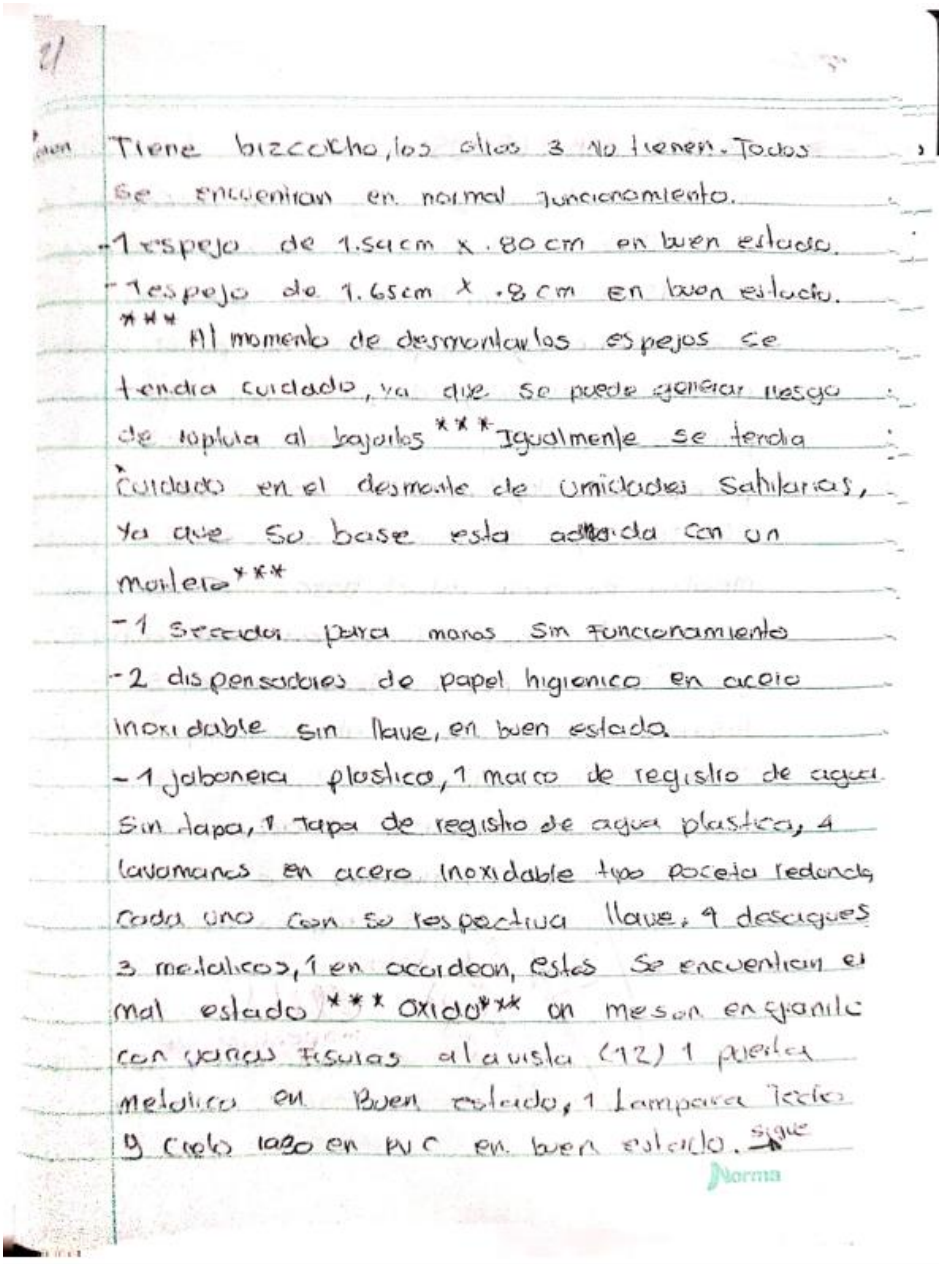


Tiene bizcocho, los ollas 3 no tienen. Todos se encuentran en normal funcionamiento.

- 1 espejo de 1.54cm x .80cm en buen estado.
- 1 espejo de 1.65cm x .8cm en buen estado.

*** Al momento de desmontarlos espejos se tendra cuidado, ya que se puede generar riesgo de ruptura al bajarlos *** Igualmente se tendra cuidado en el desmonte de Unidades Sanitarias, ya que su base esta adherida con un mortero ***

- 1 Secadora para manos Sin funcionamiento
- 2 dispensadores de papel higienico en acero inoxidable sin llave, en buen estado.
- 1 jaboneria plastica, 1 marco de registro de agua sin tapa, 1 tapa de registro de agua plastica, 4 lavamanos en acero inoxidable tipo poceta redonda cada uno con su respectiva llave, 9 desagues 3 metalicos, 1 en acordeon, estos se encuentran en mal estado *** oxido *** en meson en granito con varias fisuras al avista (12) 1 puerta metalica en Buen estado, 1 Lampara Led 9 Cielo raso en PVC en buen estado. sigue

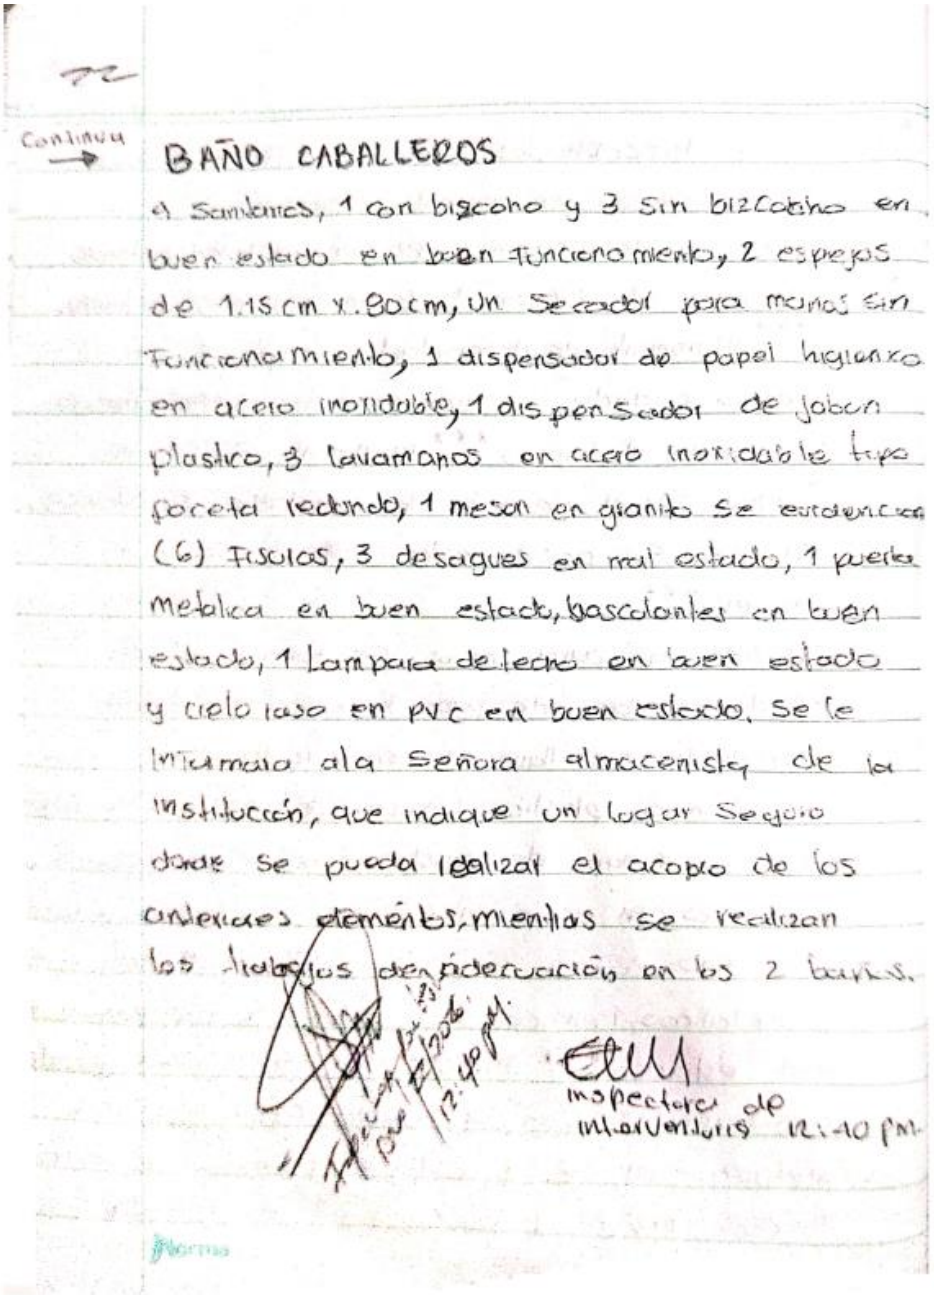


Continua →

BAÑO CABALLEROS

4 Sanitarios, 1 con biscoho y 3 Sin biscoho en buen estado en buen funcionamiento, 2 espejos de 1.15 cm x. 80 cm, un Secador para manos Sin Funcionamiento, 1 dispensador de papel higienico en acero inoxidable, 1 dispensador de jabon plastico, 3 lavamanos en acero inoxidable tipo poceta redondo, 1 meson en granito se evidencian (6) Fisuras, 3 desagues en mal estado, 1 puerta metalica en buen estado, bascolantes en buen estado, 1 Lampara de techo en buen estado y cielo raso en PVC en buen estado. Se le informa a la Señora almacenista de la institucion, que indique un lugar Seguro donde se pueda realizar el acopio de los anteriores elementos, mientras se realizan los trabajos de adecuación en los 2 baños.

Inspectora de Mantenimiento 12:40 pm

Powered by CamScanner

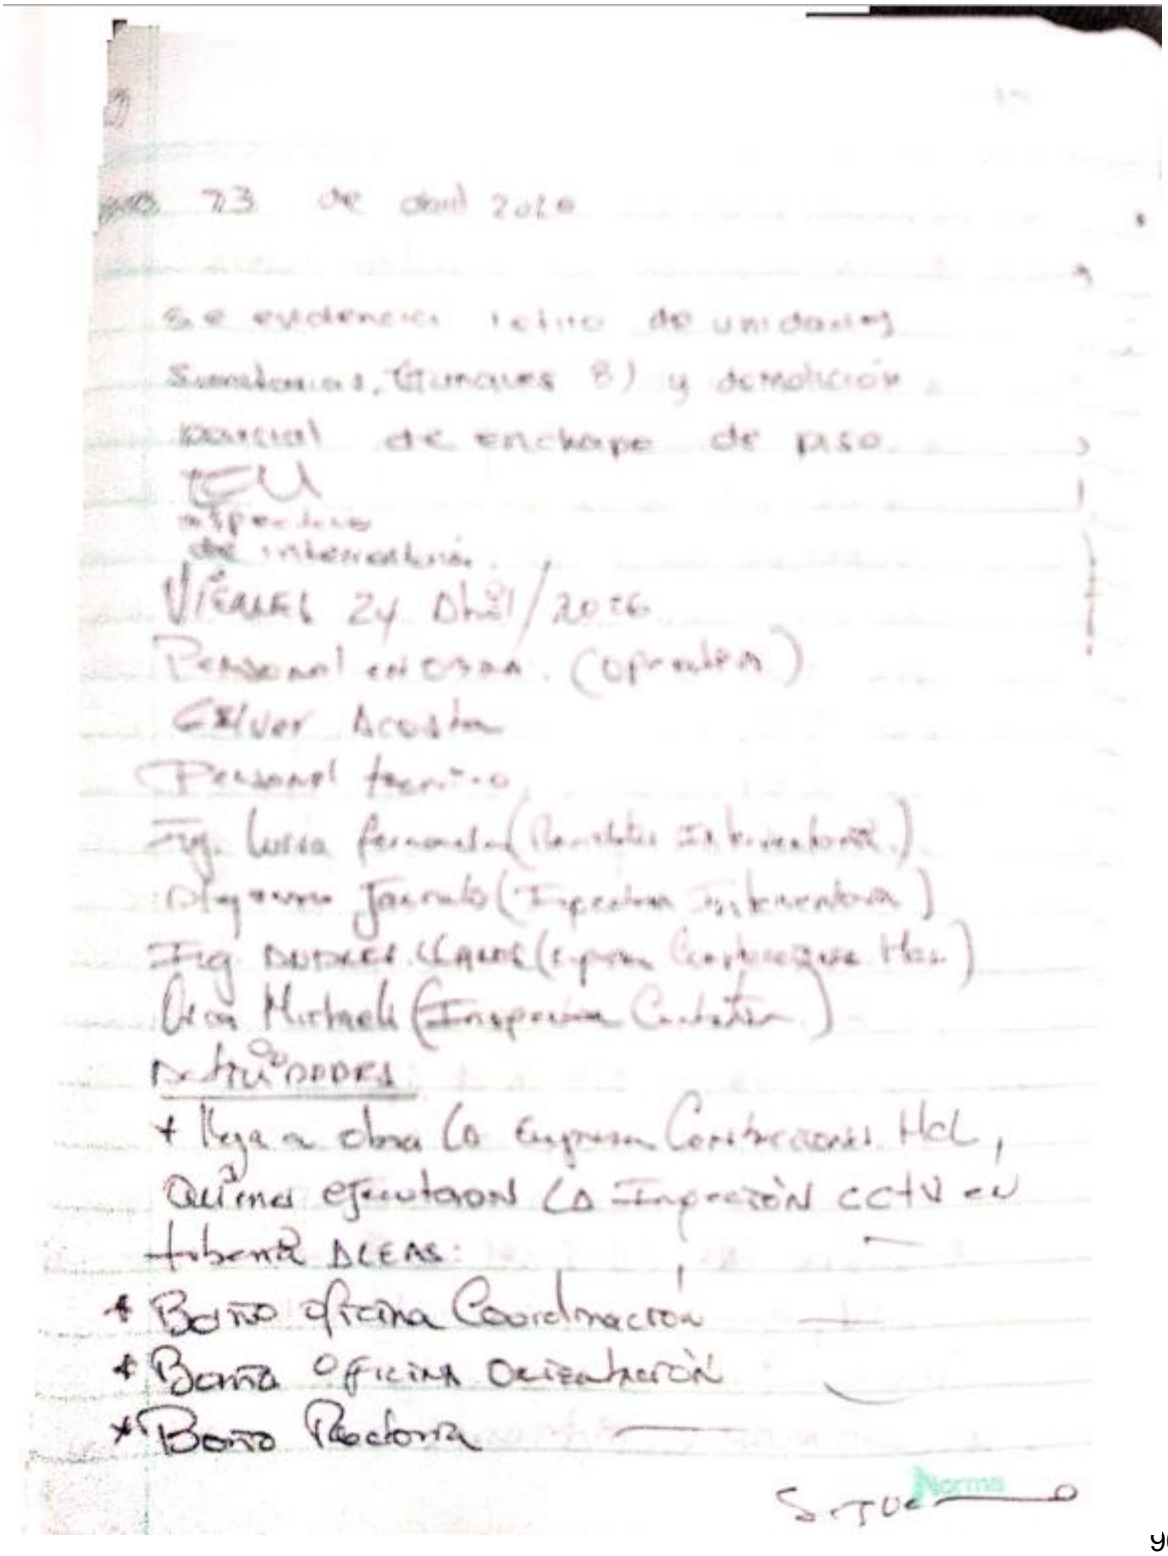


23 de abril 2026

Se evidencia retiro de unidades Sumatorias, Ductores B) y demolición parcial de enchape de paso.

EU
Inspectora de interventoría.
VIGILADO 24 horas/2026
Personal en obra. (Operarios)
Oliver Acosta
Personal técnico
Ing. Lucia Fernandez (Residente Interventoría)
Ing. Alejandro Jaramillo (Inspector Interventoría)
Ing. Daniel Miguel (Ingeniero Contratista Hol)
Arq. Michael (Inspector Contratista)

OBSERVACIONES

+ Llega a obra la Empresa Contratista Hol, quienes ejecutaron la Inspección CCTV en Interior DLEAS:
+ Baño oficina Coordinación
+ Baño oficina Orientación
+ Baño Rectoría

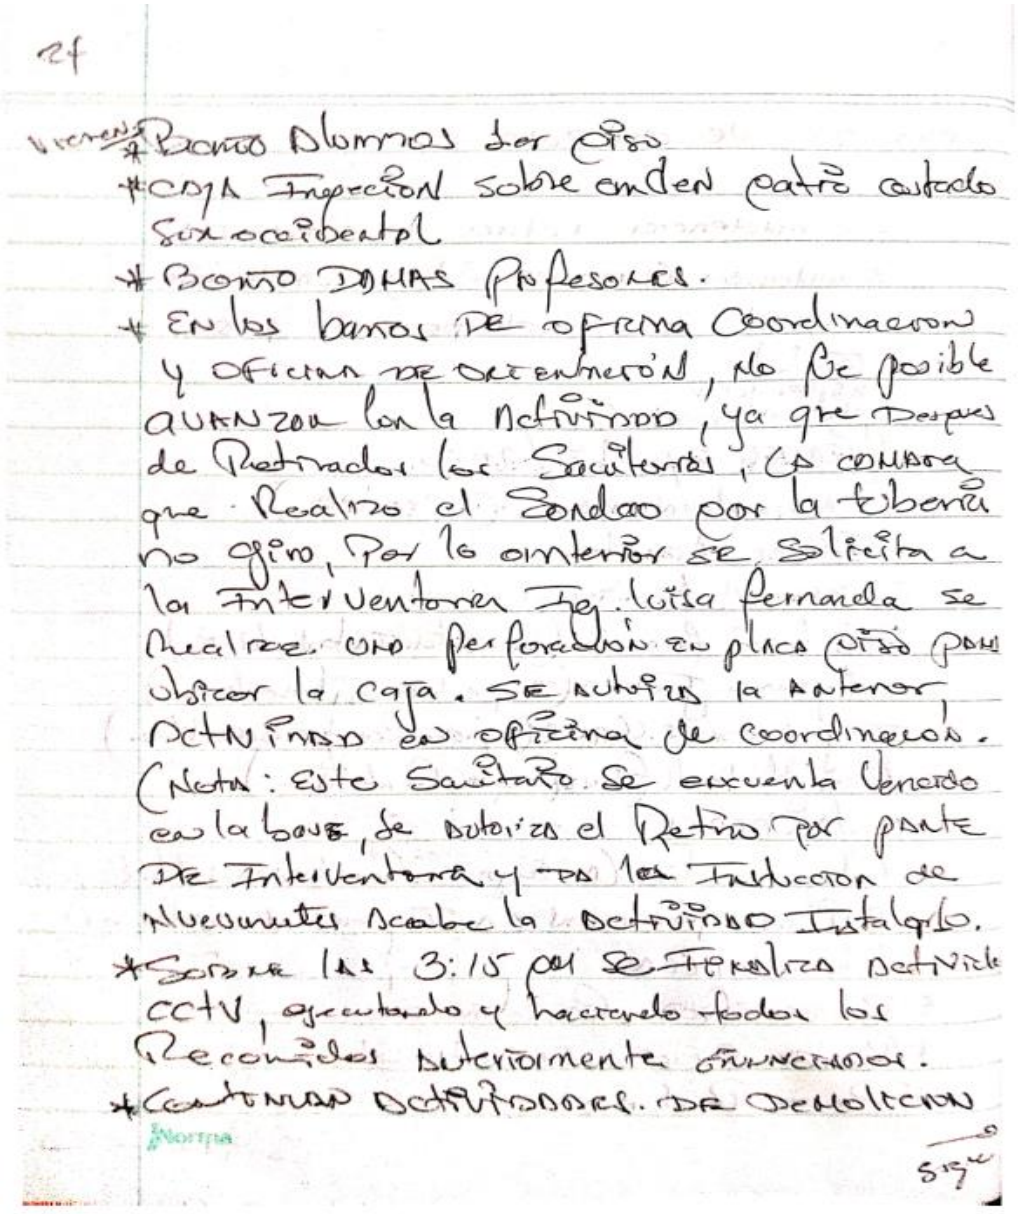


24

viernes * Bonos Domos 1er piso
* Caja Inspección sobre andén patio costado suroccidental
* Bonos Domos Profesores.
* En los baños de oficina Coordinación y oficina de Orientación, No fue posible avanzar con la actividad, ya que después de Retirados los Sanitarios, La columna que Realizo el Sondeo por la tubería no giro, Por lo anterior se Solicita a la Interventora Ing. Luisa Fernanda se Realice una perforación en placa piso para ubicar la caja. Se autoriza la anterior actividad en oficina de coordinación. (Nota: Este Sanitario se encuentra Vencido en la base, de autoriza el Retiro por parte de Interventoría y en las Instalación de nuevamente Acabe la actividad Instalado.
* Sobre las 3:15 pm se Finaliza Actividad CCTV, Aseguramiento y haciendo todas las Recomendaciones anteriormente Mencionadas.
* Continuar actividades de demolición


Norma

Sigue

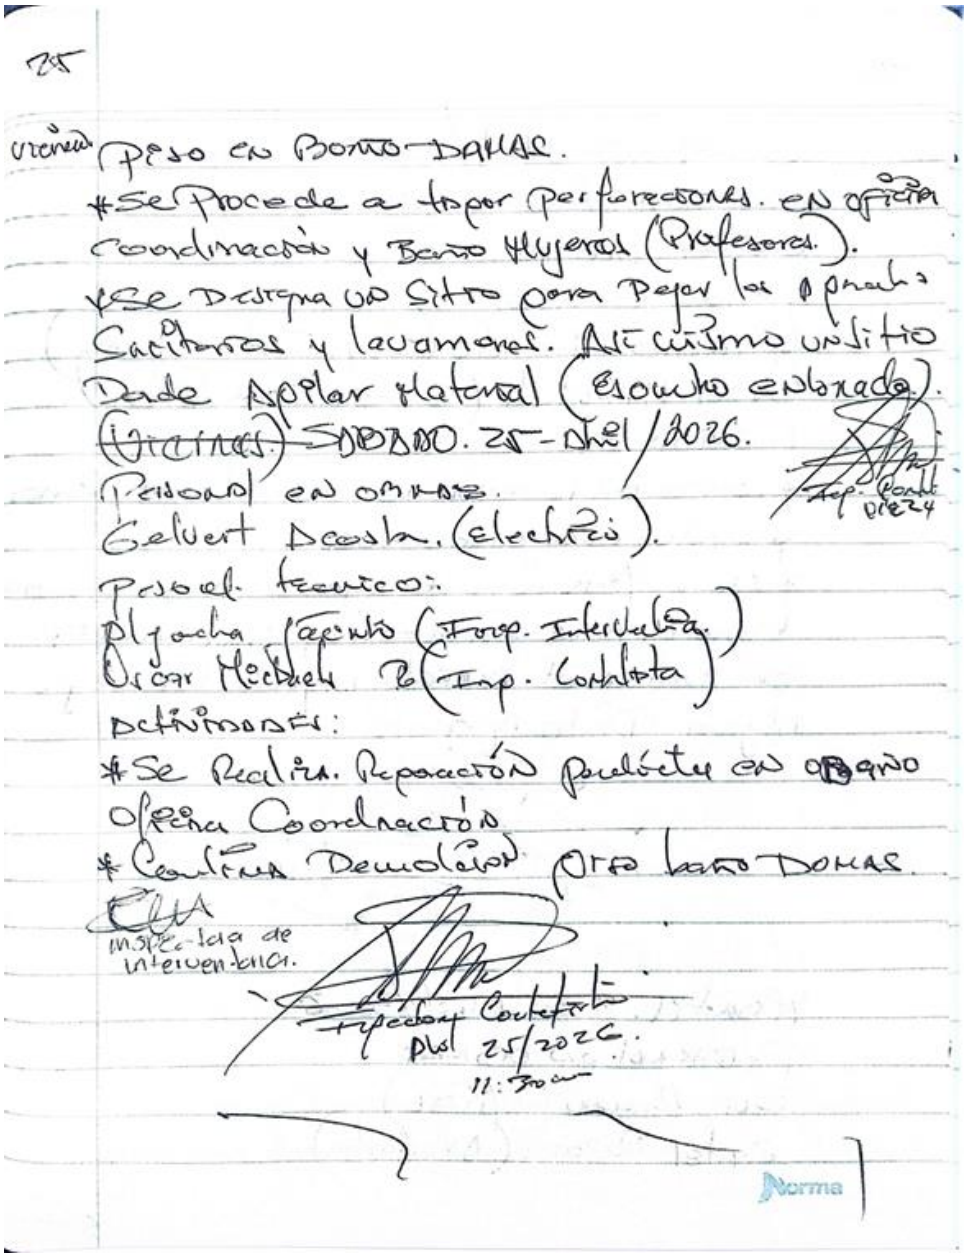

25

Viernes Peso en Bomo-Damas.
*Se Procede a tapar perforaciones. en oficina Coordinación y Baño Mujeres (Profesoras).
*Se Destapa un Sifon para Pegar los aparatos Sanitarios y lavamanos. Asi mismo un Sifon Desde Aplar Natural (Escuela enlozada).
(Viernes) SABADO. 25-Abril/2026.
Personal en obras.
Gelvert Acosta. (electricista).
Personal tecnico:
Alejandra Fagundo (Interventoria)
Oscar Medina (Cont. Contratista)
Actividades:
*Se Realiza. Reparación parcheteo en oficina Coordinación
*Continua Demolición Piso baño Damas.
Ing. Interventoria de Interventoria.
Inspector Contratista
Abril 25/2026.
11:30 am

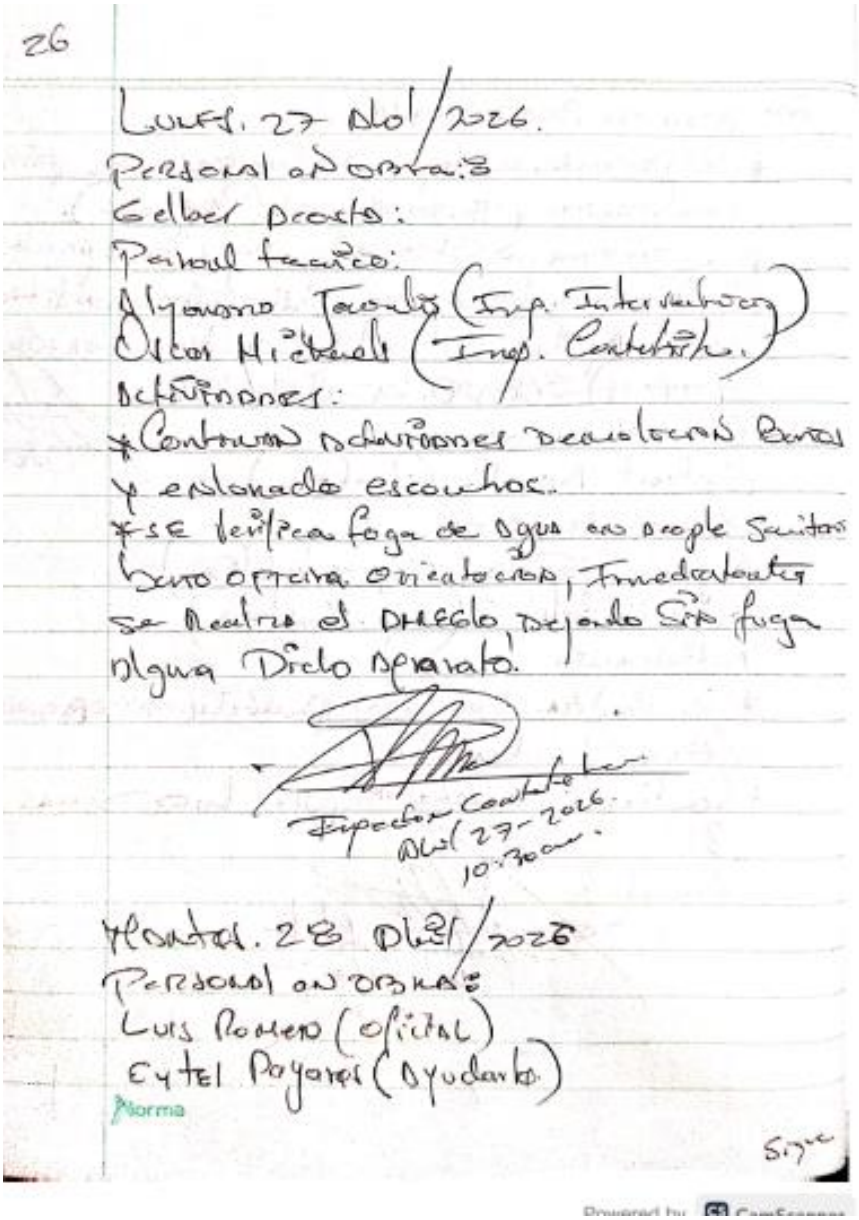

26


Lunes. 27 Abril/2026.
Personal en obra:
Celber Acosta:
Personal técnico:
Alejandro Jacobo (Ing. Interventoria)
Oscar Hichards (Ingº. Contratista.)
Actividades:
*Continuan actividades demoliciones Baños y enchapado escombros.
*Se verifica fuga de agua en grupo Sanitario Zona Oficinas Orientadores, Inmediatamente se Realiza el Arreglo, dejando Sin fuga Alguna Dicho Reparato.

Inspector Contratista
Abril 27-2026.
10:30am.

Martes. 28 Abril/2026
Personal en obra:
Luis Romero (oficial)
Eytel Pajares (Ayudante)

Norma

Sigue

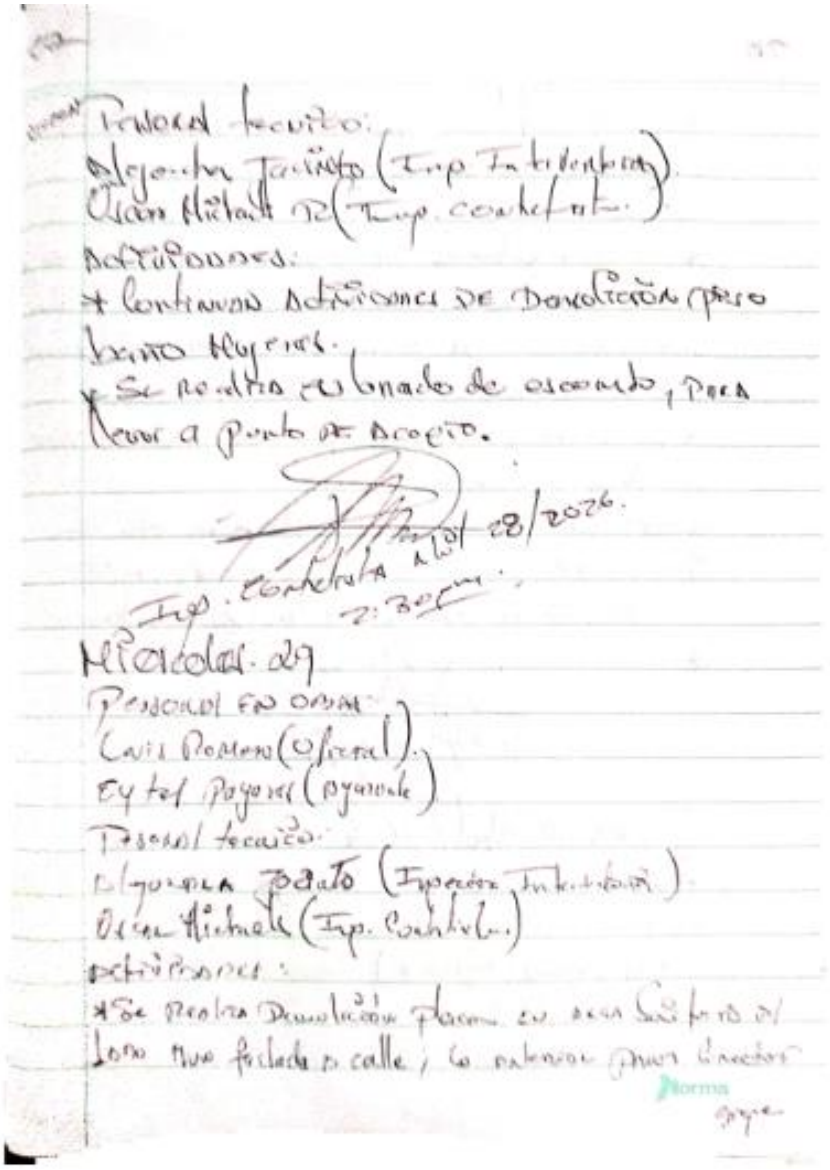


Personal técnico:
Alejandra Tarifa (Ing. Interventoría)
Oscar Richard R (Ing. contratista)
Actividades:
* Continuan Actividades de Demolición (piso
Interno Hombres).
* Se realiza cubrimiento de escombro, para
llevar a punto de Acopio.

28/2026.

Ing. Contratista
Interventoría

Personal en obra:
Luis Romero (Oficial).
Eyder Pajaro (Ayudante)
Personal técnico:
Alejandra Tarifa (Ingeniera Interventoría)
Oscar Richard (Ing. Contratista)
Actividades:
* Se realiza Demolición placa en área Sur frente al
bloque nueva fachada a calle, se retiran puntos

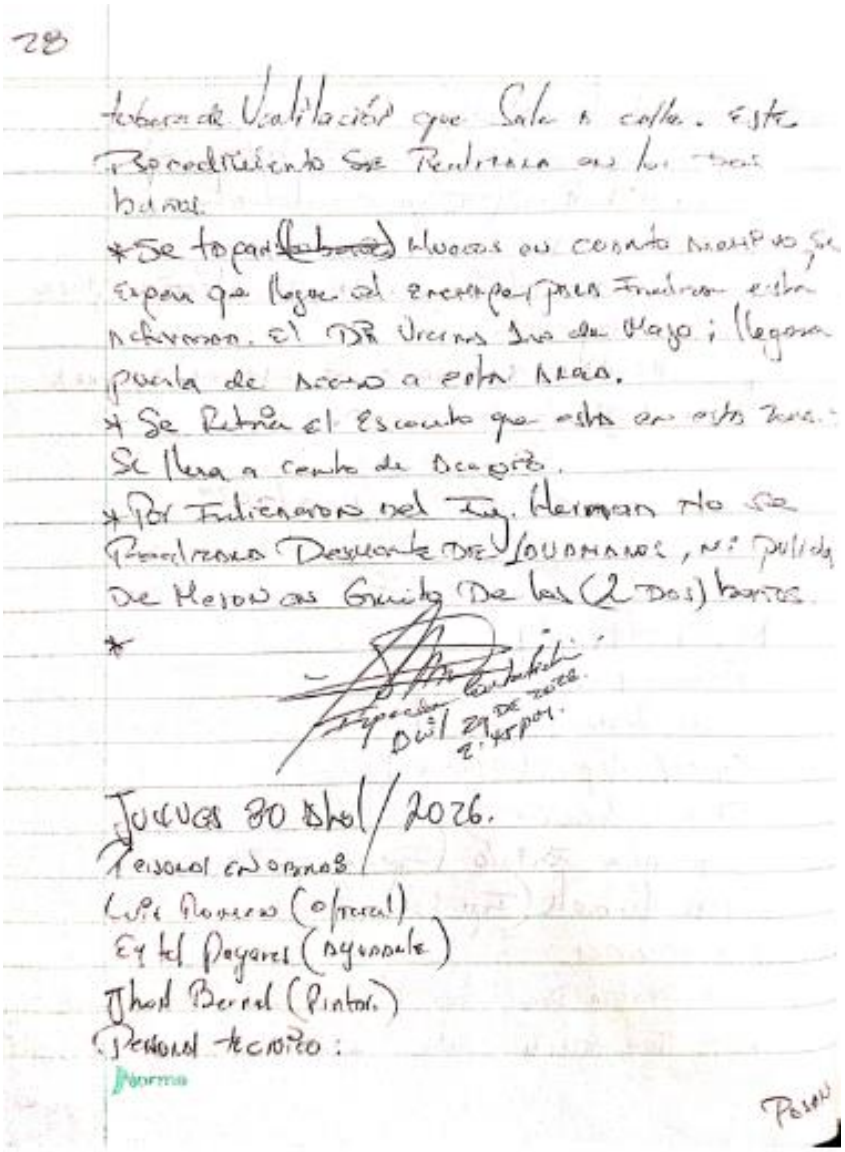

28

Jueves 30 Abril / 2026.

Personal en obras

Luis Romero (Oficial)


Eq. del Pozo (Ayudante)

Jhon Bernal (Pintor)

Personal técnico:

Norma

Pedro

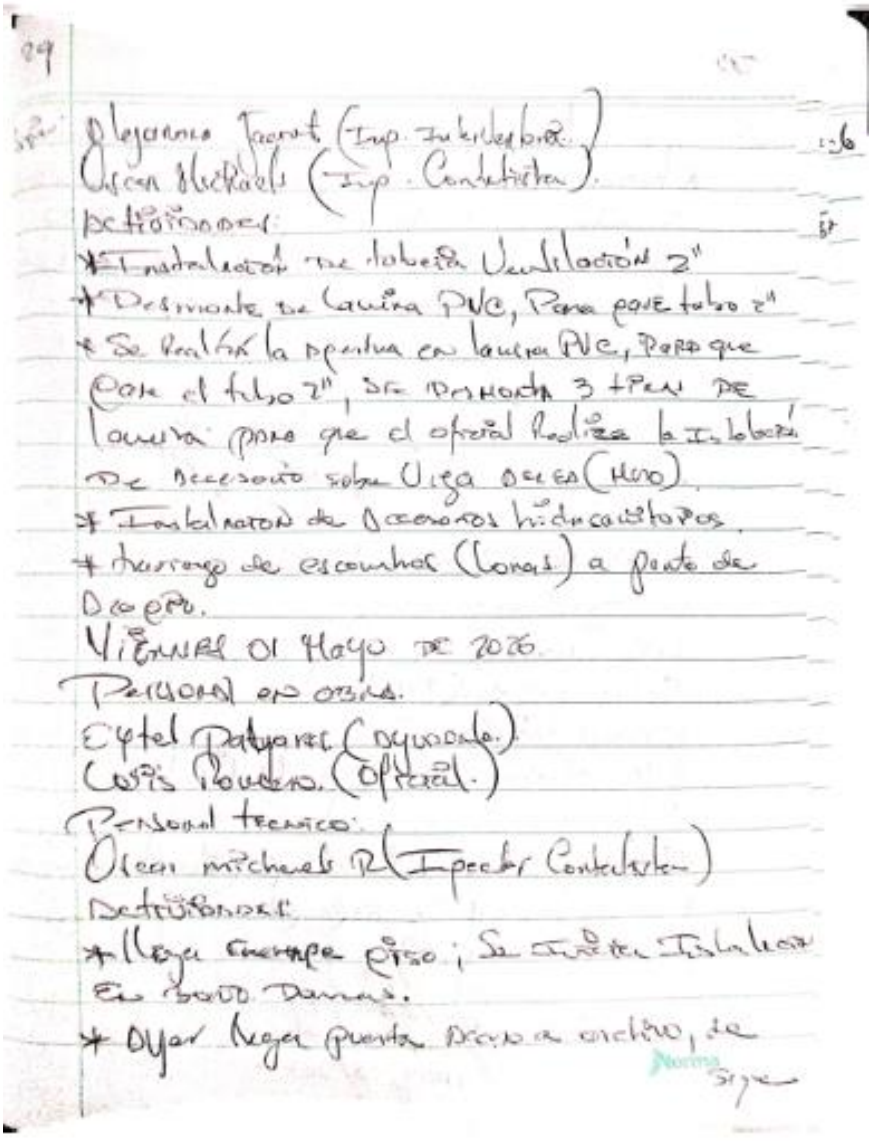

09

Llegamos Jacqueline (Inspectora Interventoría)
Oscar Michaels (Inspector Contratista)
Actividades:
* Instalación de tubería Ventilación 2"
* Desmonte de canina PVC, Para pase tubo 2"
* Se Realizó la apertura en lamina PVC, Para que pase el tubo 2", se desmonta 3 tipos de lamina para que el oficial Realice la Instalación de Accesorio sobre Viga Aerea (Hierro).
* Instalación de Accesorios hidrosanitarios.
* Durante de escombros (Lonas) a punto de Acopio.

VIERNES 01 Mayo DE 2026


Personal en obra.
Ectel Betancourt (Ayudante).
Cristo Rondon. (Oficial).

Personal técnico:
Oscar Michaels R (Inspector Contratista)

Actividades:
* Llega siempre piso; Se evidencia Instalación en todo Damas.
* Oficial Llega puesta Acero a archivo, de

Norma

Siga

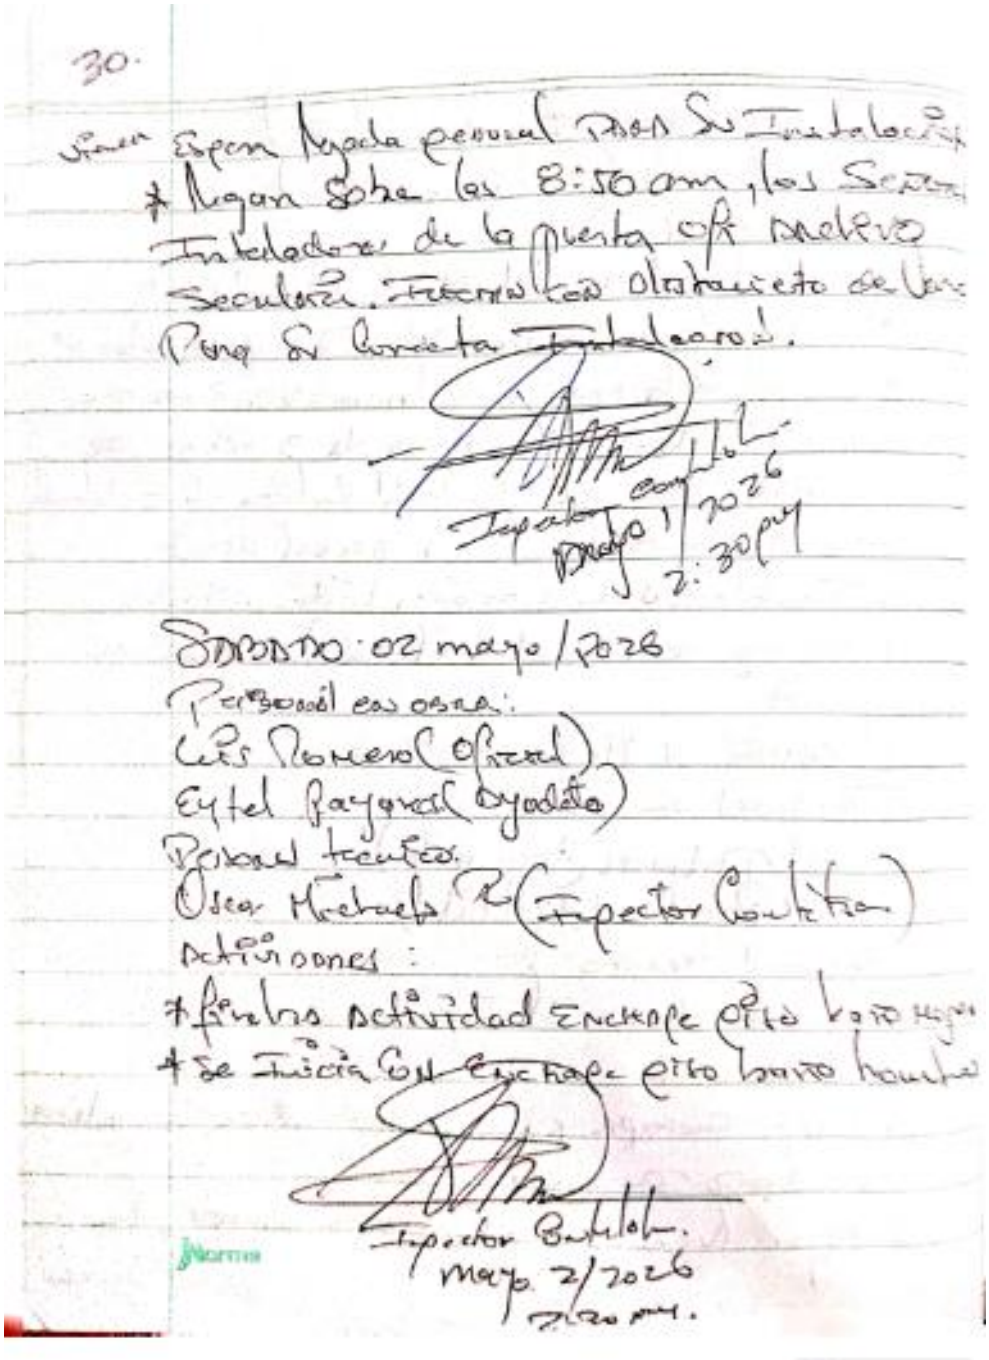

30.


Siendo Especialmente personal para su Instalación
* Hoy son las 8:50 am, los Señores Instaladores de la puerta de metro Secundaria. Técnicos con otro trabajo de Ver Para su Instalación.


Inspector contratista
Mayo 1/2026
2:30 pm


SABADO 02 mayo/2026
Personal en obra:
Luis Romero (Oficial)
Eytel Bayona (Ayudante)
Personal técnico:
Oscar Machuca R (Inspector Contratista)
Actividades:
* Finalizar actividad Enchape piso baño Hombres
* Se Inicia con Enchape piso baño Hombres


Inspector Contratista.
mayo 2/2026
7:20 pm.


Ilustración 26- Anotación Bitácora Justo Victor Charry

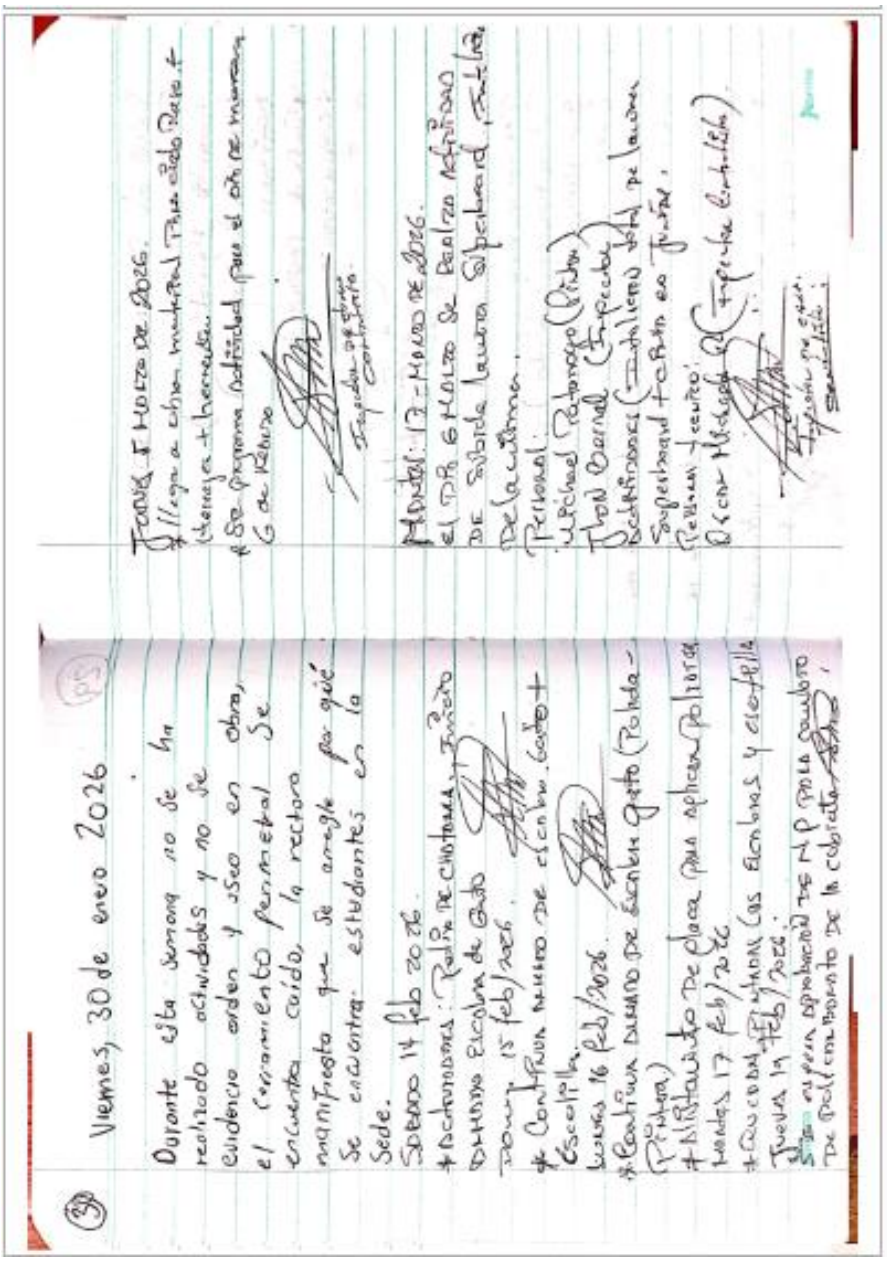

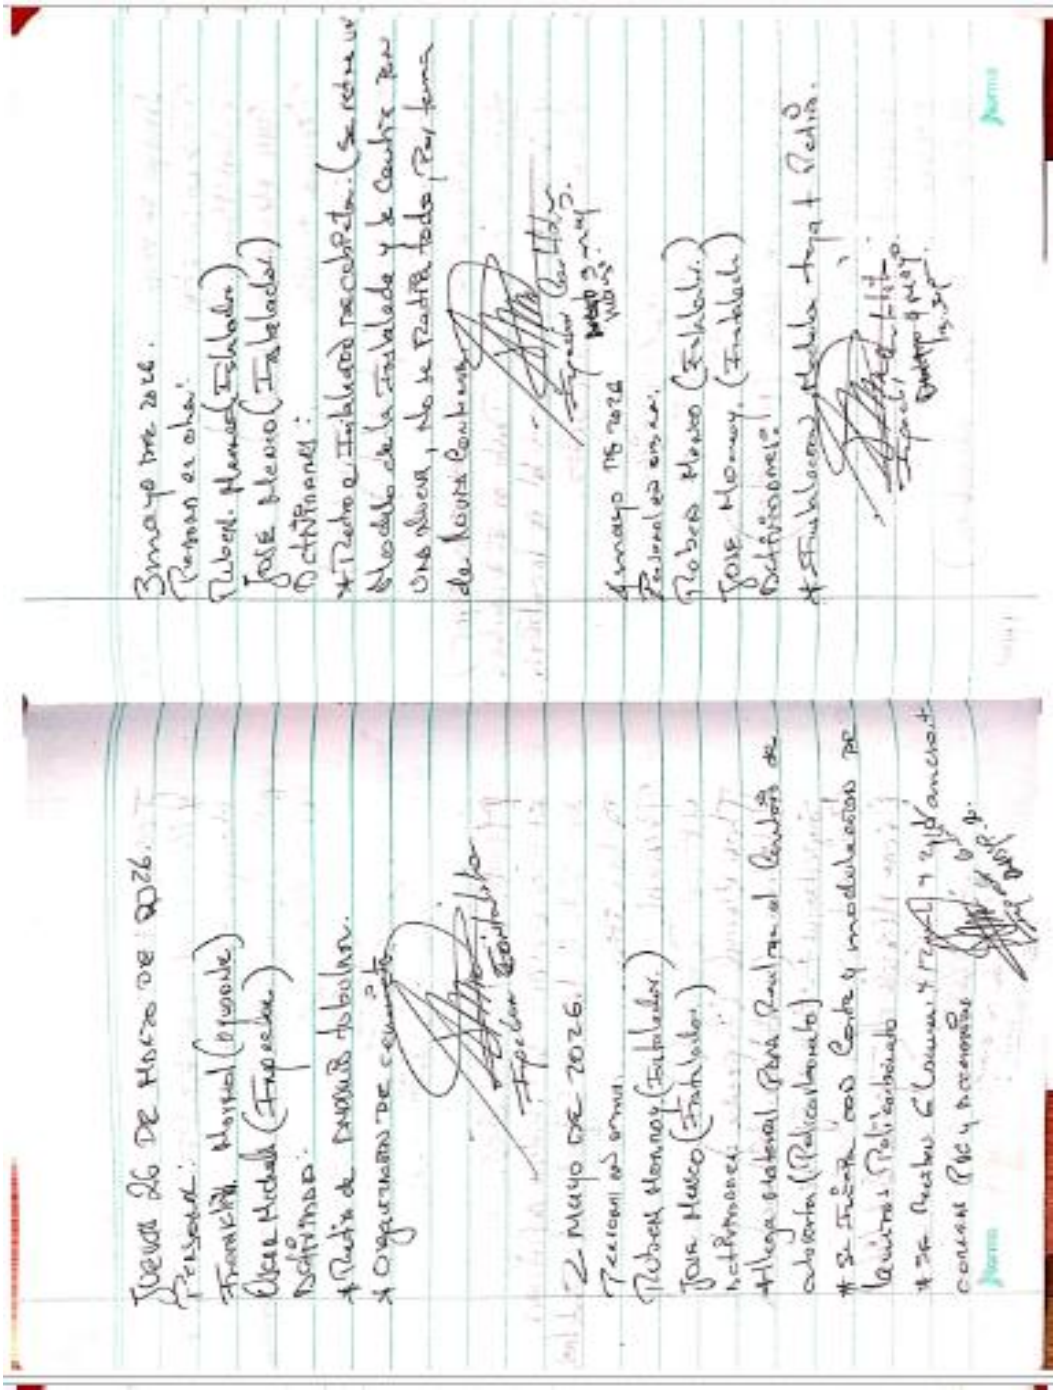

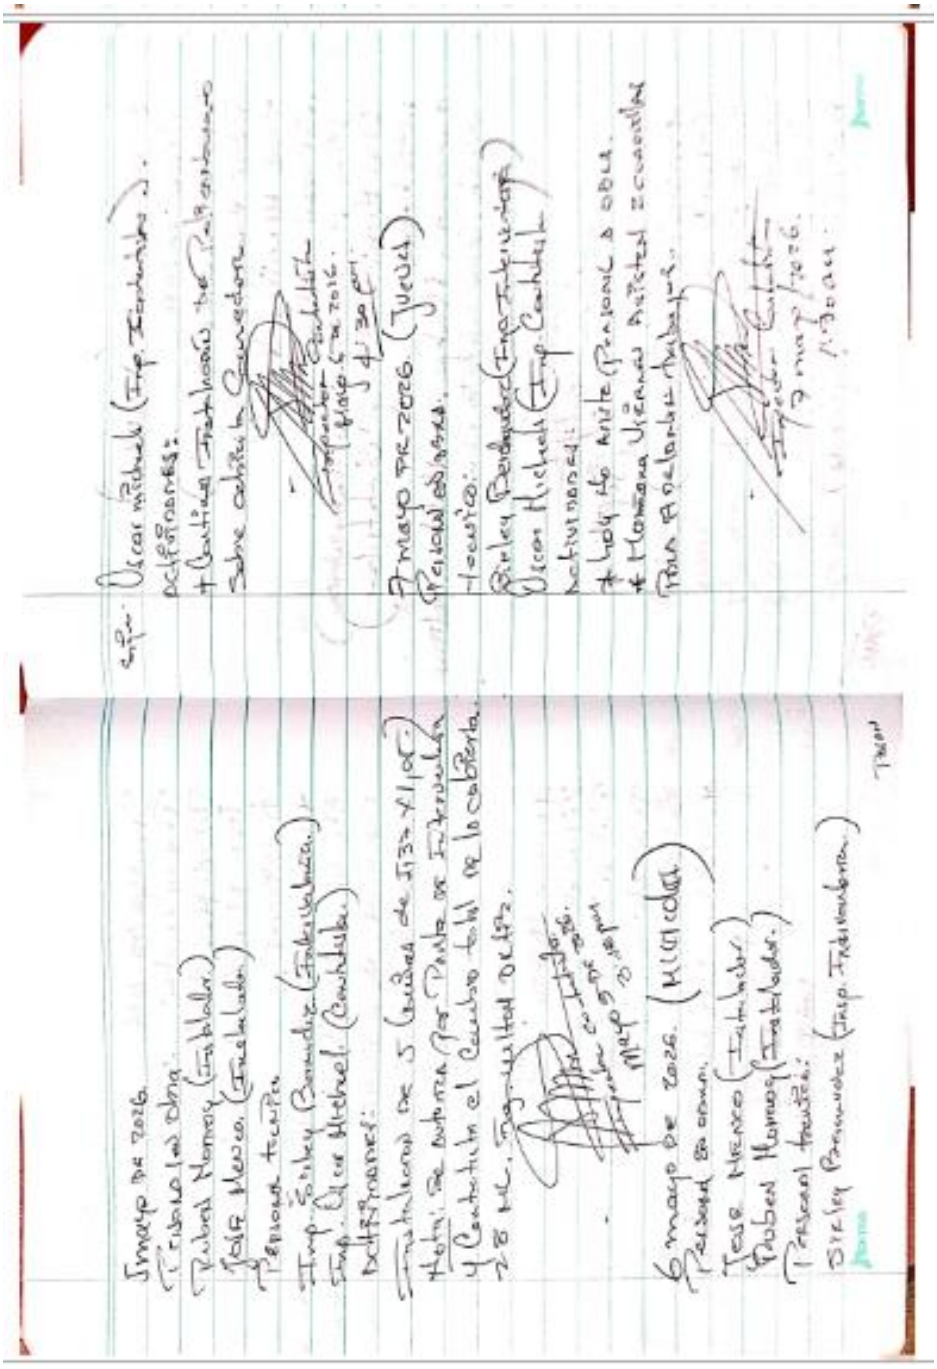

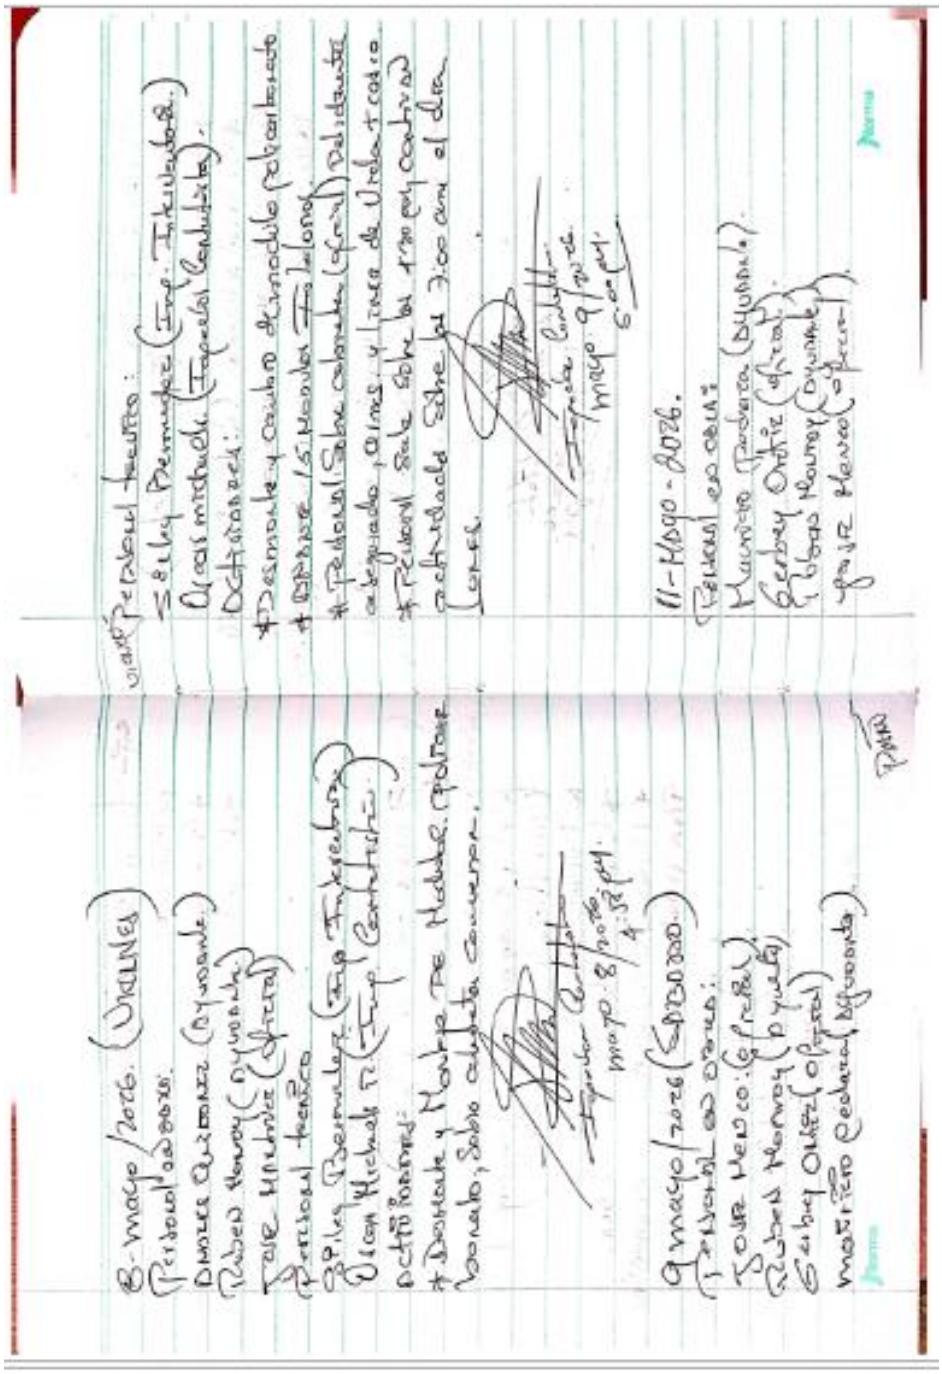


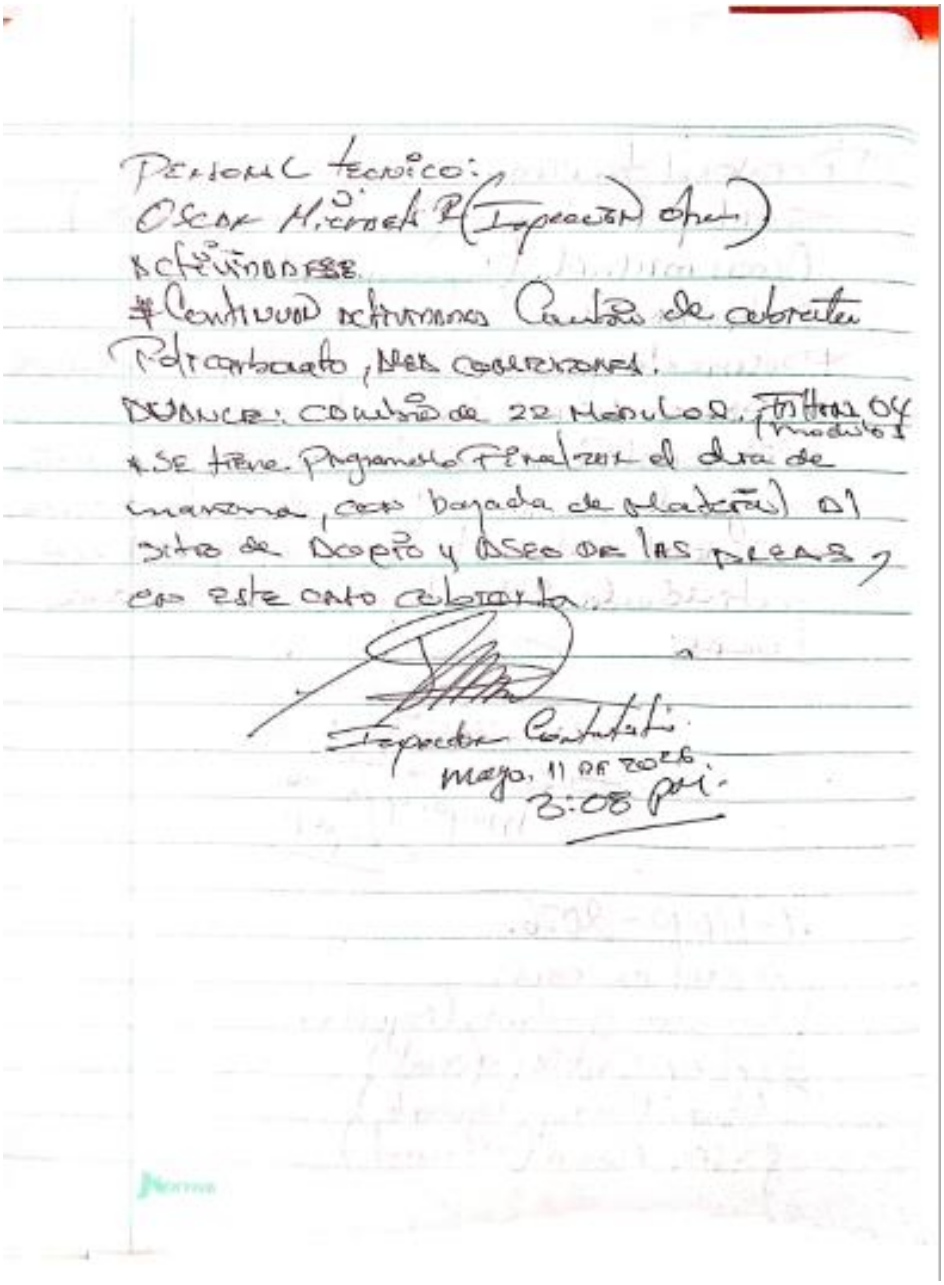

PERSONAL TECNICO:
OSCAR MAURICIO R (Inspección ofic.)
ACTIVIDADES
Continuidad actividades Cambio de cubierta Policarbonato, Mesa cubiertas.
AVANCE: Cubierta de 22 Modulos. Fin Mod 04 Modulo 1
* SE tiene Programado Finalizar el dia de mañana, con bajada de plataforma, Retiro de escombros y Aseo de las áreas y con este acto culminarla.

Inspector Contratista
Mayo, 11 de 2026
3:08 pm.

Ilustración 24 -Anotación Bitácora I.E.D Manuela Beltran Sede B

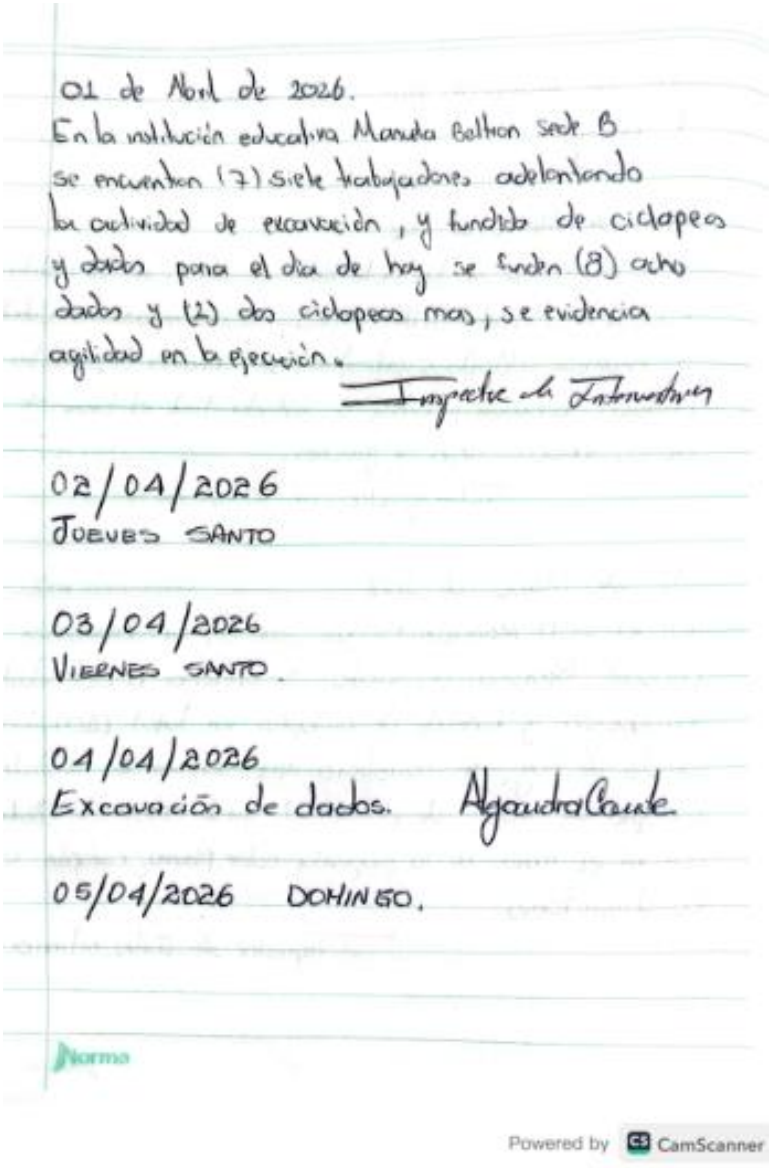

01 de Abril de 2026.
En la institución educativa Manuela Beltran Sede B se encuentran (7) siete trabajadores adelantando la actividad de excavación, y fundida de ciclopeas y dados para el día de hoy se fundan (8) ocho dados y (2) dos ciclopeas mas, se evidencia agilidad en la ejecución.

Ingeniero de Interventoría

02/04/2026
JUEVES SANTO


03/04/2026
VIERNES SANTO.

04/04/2026
Excavación de dados. Alejandra Conde

05/04/2026 DOMINGO.

Norma

Powered by CamScanner

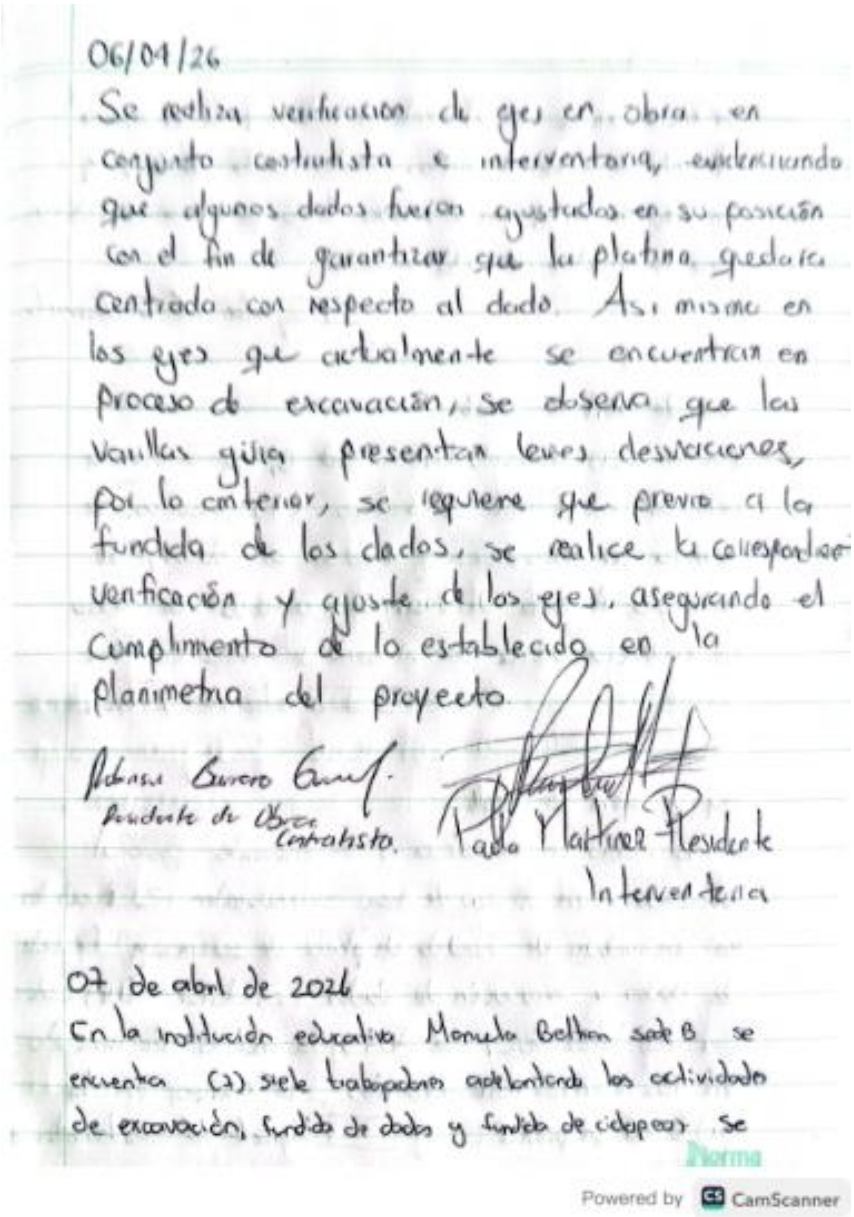

06/04/26

Se realiza verificación de ejes en obra en conjunto constructora e interventoría, evidenciando que algunos dados fueron ajustados en su posición con el fin de garantizar que la platina quedara centrada con respecto al dado. Así mismo en los ejes que actualmente se encuentran en proceso de excavación, se observa que las varillas guía presentan leves desviaciones, por lo anterior, se requiere que previo a la fundida de los dados, se realice la correspondiente verificación y ajuste de los ejes, asegurando el cumplimiento de lo establecido en la planimetría del proyecto.

Residente de Obra Contratista


Pablo Martinez - Residente Interventoría

07 de abril de 2026

En la institución educativa Manuela Beltrán sede B se encuentra (1) siete trabajadores adelantando las actividades de excavación, fundida de dados y fundida de cilindros se

Norma

Powered by CamScanner

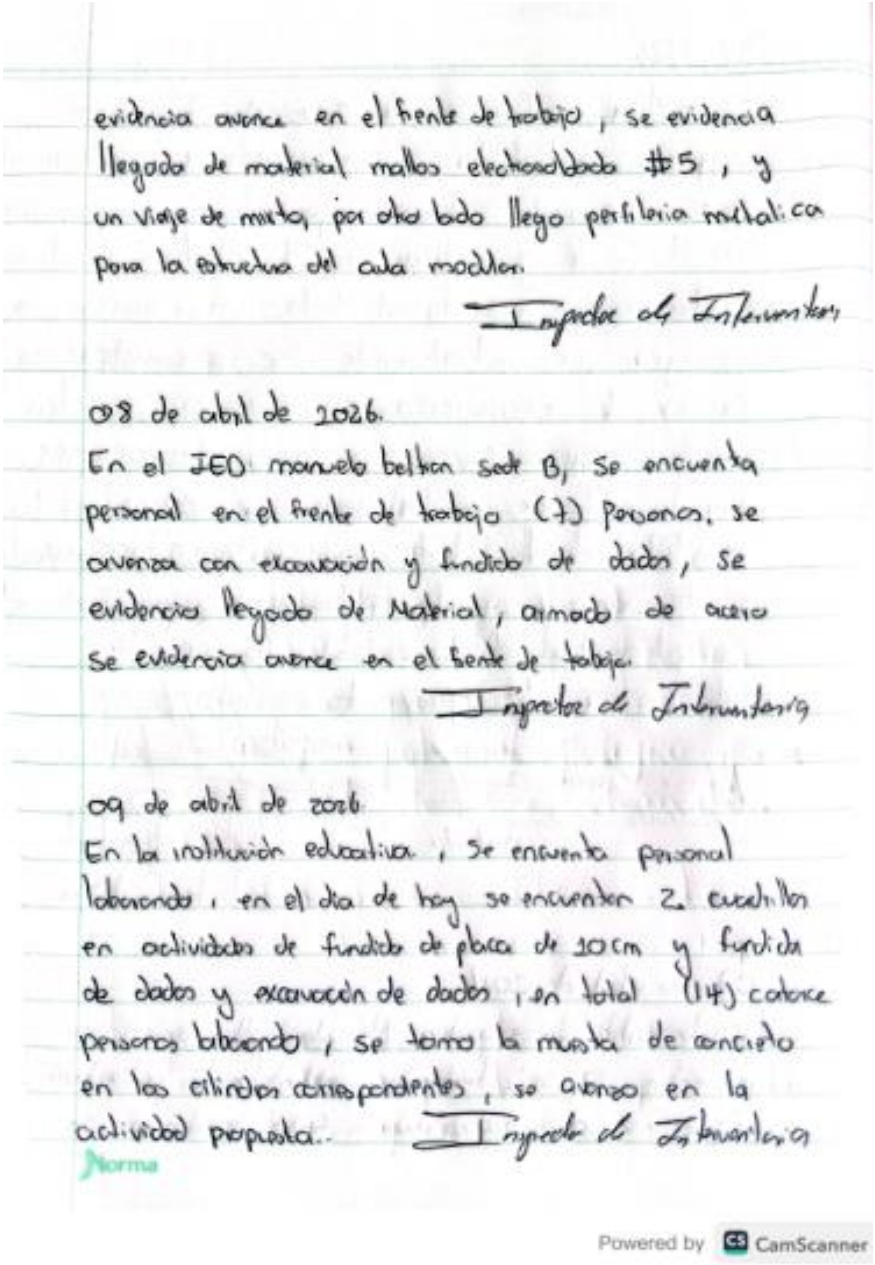

evidencia avance en el frente de trabajo, se evidencia llegada de material mallas electrosoldada #5, y un viaje de mixta, por otro lado llego perfileria metalica para la estructura del aula modular.

Inspector de Interventoria


08 de abril de 2026.
En el IED manuela beltran sede B, se encuentra personal en el frente de trabajo (7) personas, se avanza con excavación y fundido de dados, se evidencia llegada de Material, armado de acero se evidencia avance en el frente de trabajo.

Inspector de Interventoria

09 de abril de 2026
En la institución educativa, se encuentra personal laborando, en el dia de hoy se encuentran 2 excavadoras en actividades de fundida de placa de 10cm y fundida de dados y excavación de dados, en total (14) catorce personas laborando, se toma la muestra de concreto en los cilindros correspondientes, se avanza en la actividad propuesta.. Inspector de Interventoria


Norma

Powered by CamScanner

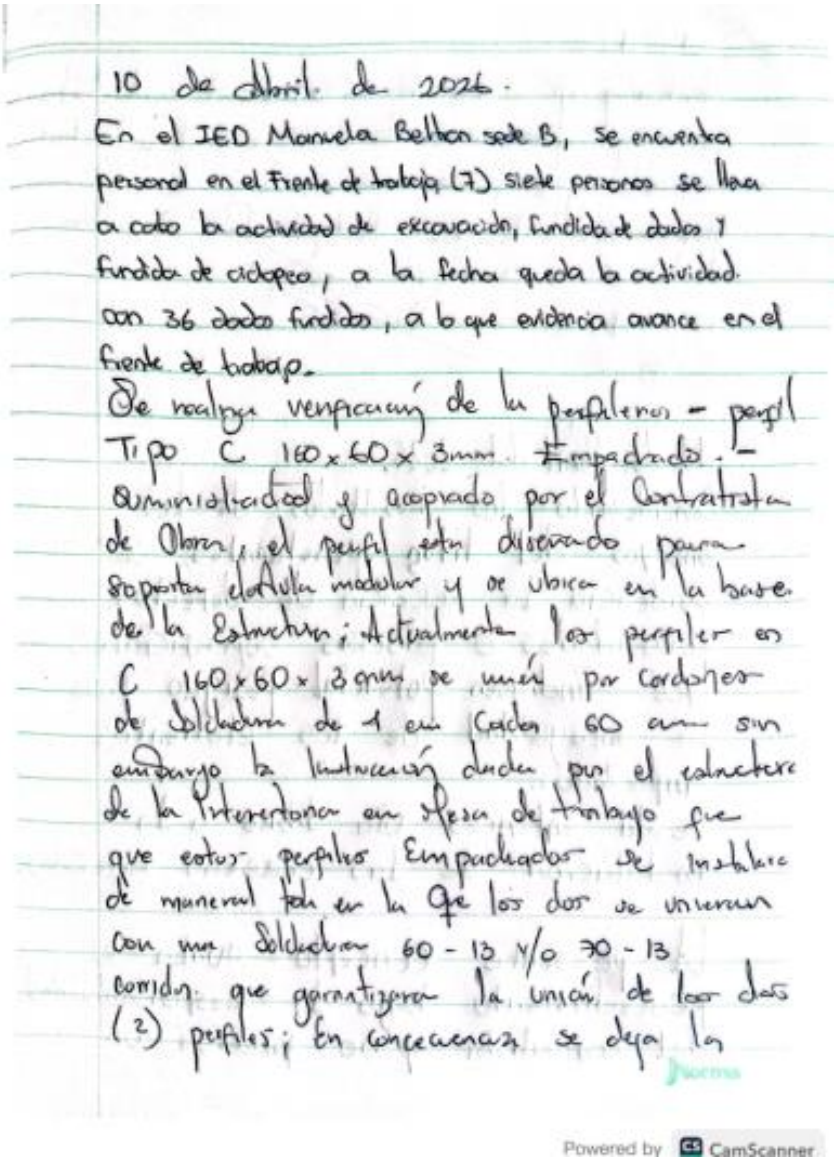

10 de Abril de 2026.
En el IED Manuela Beltran sede B, se encuentra personal en el Frente de trabajo (7) siete personas se llevan a cabo la actividad de excavación, fundida de dados y fundida de ciclopeo, a la fecha queda la actividad con 36 dados fundidos, a lo que evidencia avance en el frente de trabajo.
Se realiza verificación de los perfiles - perfil Tipo C 160 x 60 x 3mm Empacados. - Administrador y acopiado por el Contratista de Obra, el perfil esta diseñado para soportar el Aula modular y se ubica en la base de la Estructura; Actualmente los perfiles en C 160 x 60 x 3 mm se unen por cordones de Soldadura de 1 cm Cada 60 cm sin embargo la Interventoria dicta por el estructura de la Interventoria en Mesa de trabajo que que estos perfiles Empacados se instalen de manera tal en la Q± los dos se unieran con una Soldadura 60 - 13 y/o 70 - 13 cm/m que garantizara la unión de los dos (2) perfiles; En consecuencia se deja la

Powered by CamScanner

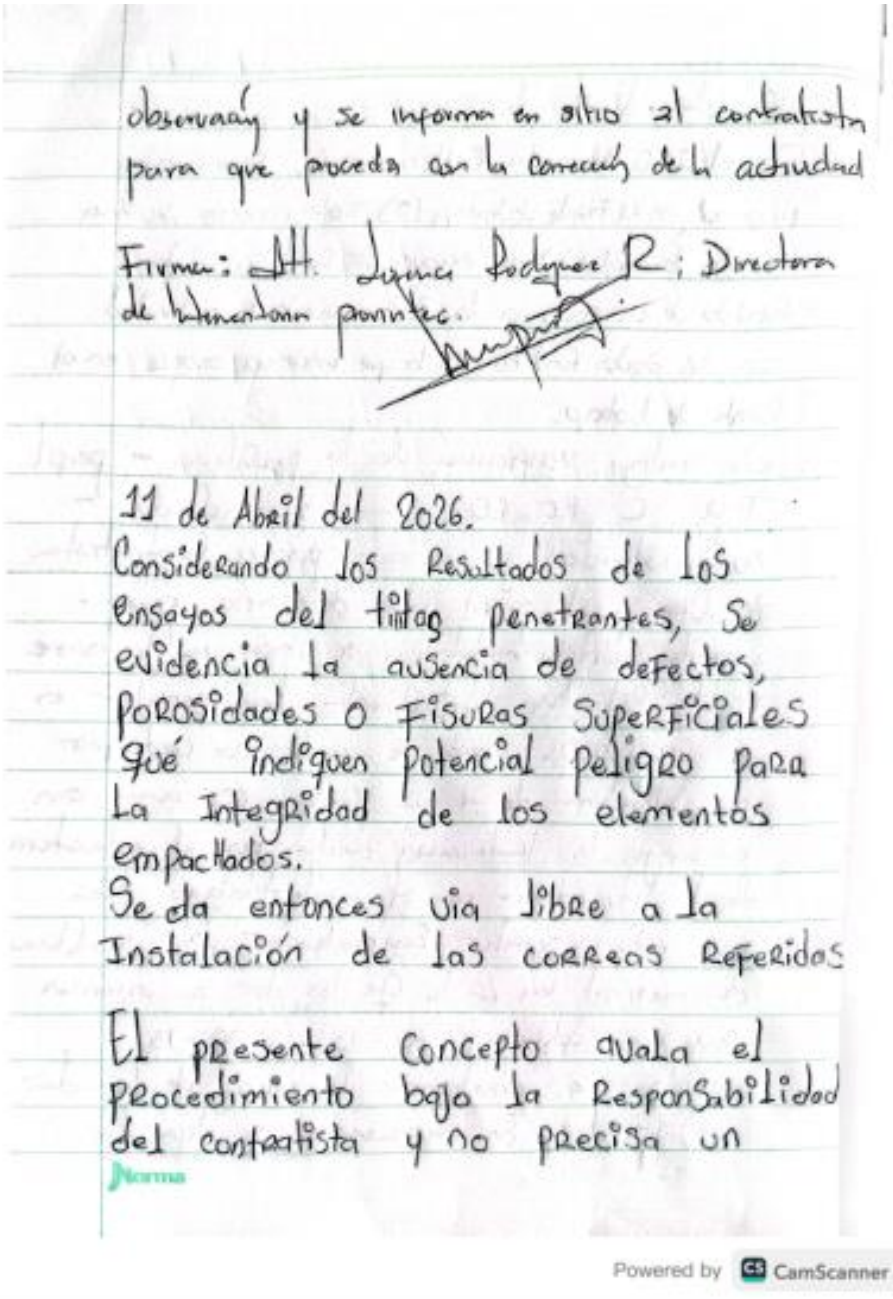

observaciy y se informa en sitio al contratista para que proceda con la corrección de la actividad


Firma: Ing. Jessica Rodriguez R; Directora de Interventoria ponintec.

11 de Abril del 2026.
Considerando los Resultados de los ensayos del tiitag penetrantes, Se evidencia la ausencia de defectos, porosidades o Fisuras superficiales qué indiquen potencial peligro para La Integridad de los elementos empactados.
Se da entonces via libre a la Instalación de las correas Referidas

El presente Concepto avala el procedimiento bajo la Responsabilidad del contratista y no precisa un

Norma

Powered by CamScanner

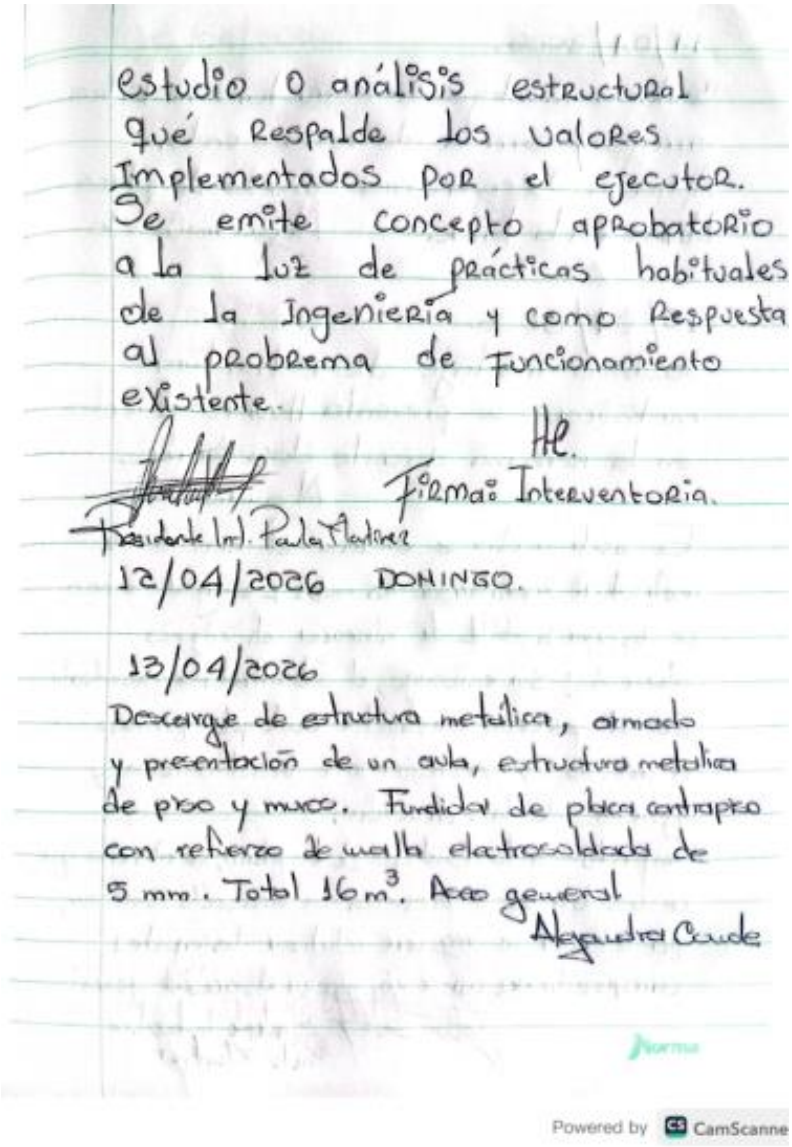

estudio o análisis estructural
que respalde los valores
implementados por el ejecutor.
Se emite concepto aprobatorio
a la luz de prácticas habituales
de la Ingeniería y como respuesta
al probrema de funcionamiento
existente.

Atte.

Firma: Interventoria.

Residente Ing. Paula Martinez


12/04/2026 DOMINGO.

13/04/2026

Descargue de estructura metalica, armado
y presentación de un aula, estructura metalica
de piso y muro. Fundida de placa contrapiso
con refuerzo de malla electrosoldada de
5 mm. Total 16 m^3. Acero general

Alejandra Conde

Powered by CamScanner

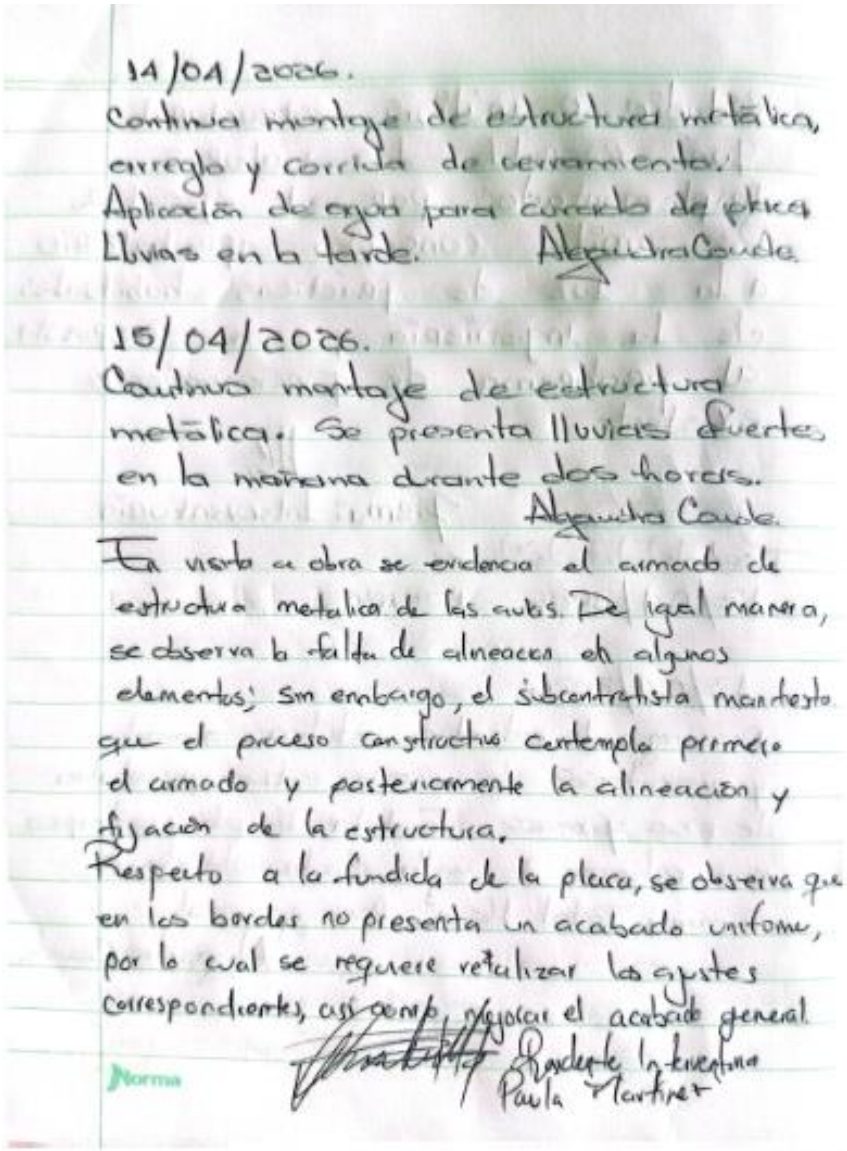

14/04/2026.
Continua montaje de estructura metálica, arreglo y corrida de cerramiento. Aplicación de agua para curado de placa. Lluvias en la tarde. Alejandra Conde.


15/04/2026.
Continua montaje de estructura metálica. Se presenta lluvias fuertes en la mañana durante dos horas. Alejandra Conde.

En visita en obra se evidencia el armado de estructura metalica de las aulas. De igual manera, se observa la falta de alineacion en algunos elementos; sin embargo, el subcontratista manifesto que el proceso constructivo contempla primero el armado y posteriormente la alineacion y fijacion de la estructura.
Respecto a la fundida de la placa, se observa que en los bordes no presenta un acabado uniforme, por lo cual se requiere retalizar los ajustes correspondientes, asi como mejorar el acabado general.

Residente Interventoria
Paula Martinez

Norma

Powered by CamScanner

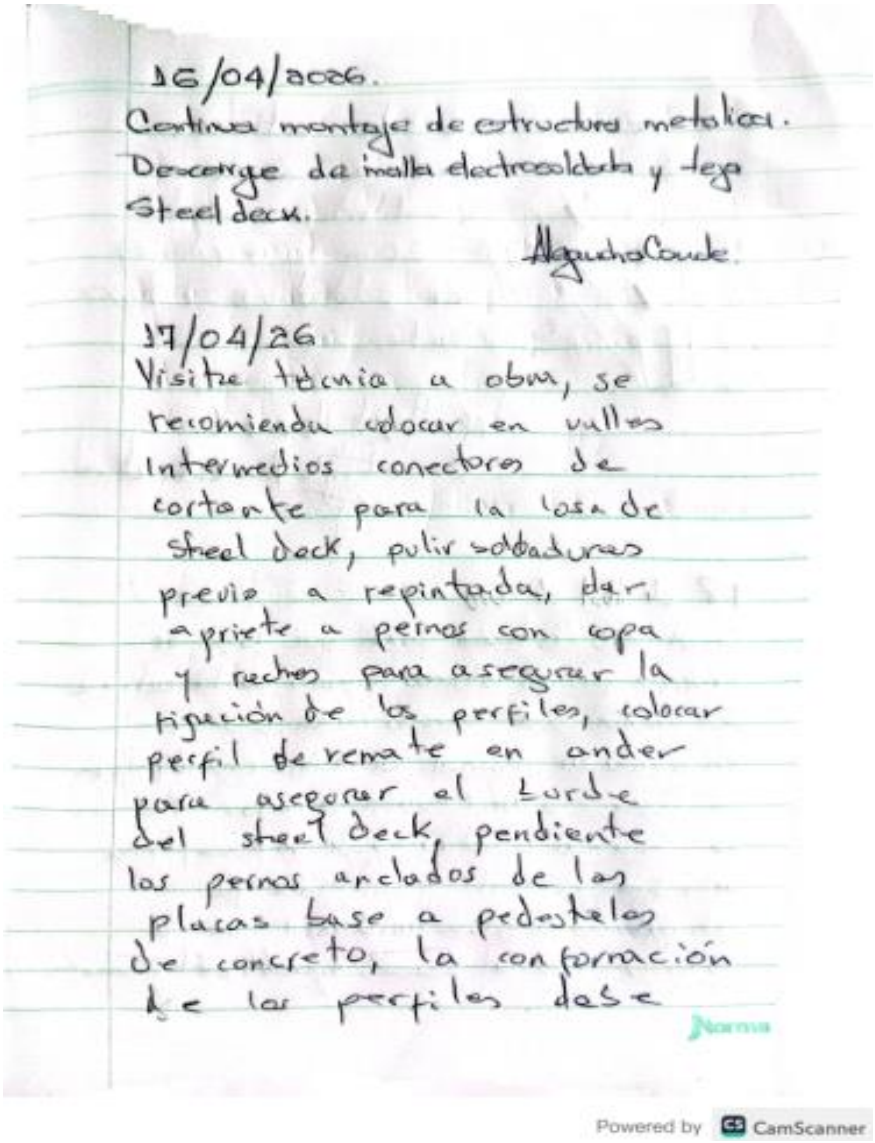

16/04/2026.
Continua montaje de estructura metalica.
Descargue de malla electrosoldada y teja Steel deck.

Alejandra Conde.

17/04/26
Visita técnica a obra, se recomienda colocar en valles intermedios conectores de cortante para la losa de steel deck, pulir soldaduras previo a repintada, dar apriete a pernos con copa y rechos para asegurar la fijación de los perfiles, colocar perfil de remate en ander para asegurar el borde del steel deck, pendiente los pernos anclados de las placas base a pedestales de concreto, la conformación de los perfiles desde

Norma

Powered by CamScanner


ser en forma discontinua
separación de
soldaduras cada
60cm y uniones
en soldadura E70XX
cada 5cm.
60cm
5cm
5cm
Ing. Yesid Ruiz C.
AS. Estructural.
18 de Abril de 2026
En el IED manuela Beltrán sede B, se
evidencia personal laborando y avance de la actividad
de instalación de estructura metálica
En cuanto al personal se trabaja con 6 personas
se hace la verificación de niveles
se hace el respectivo ajuste de tornillos, para
dejar fijo el perfil y así ajustar la
completa la estructura metálica
Inspector de Interventoría
Norma
Powered by CamScanner




19 de Abril 2026
Domingo

20 de Abril de 2026
En el IED Manuela Beltran sede B
se encontro 7 personas laborando en el frente de trabajo.
para las horas de la tarde la actividad que se ejecuta es pintura en pasiflexia metalica.
Inspector de Interventoria

21 de abril de 2026

En la institución educativa Manuela Beltran Sede B, se llevan actividades de pintura en pasiflexia metalica y soldadura de las laminas que reciben la estructura, especificamente hace su función de reforzamiento, donde va la placa de 10 cm y su respectivo sobre paso y machon.
Norma

Powered by CamScanner

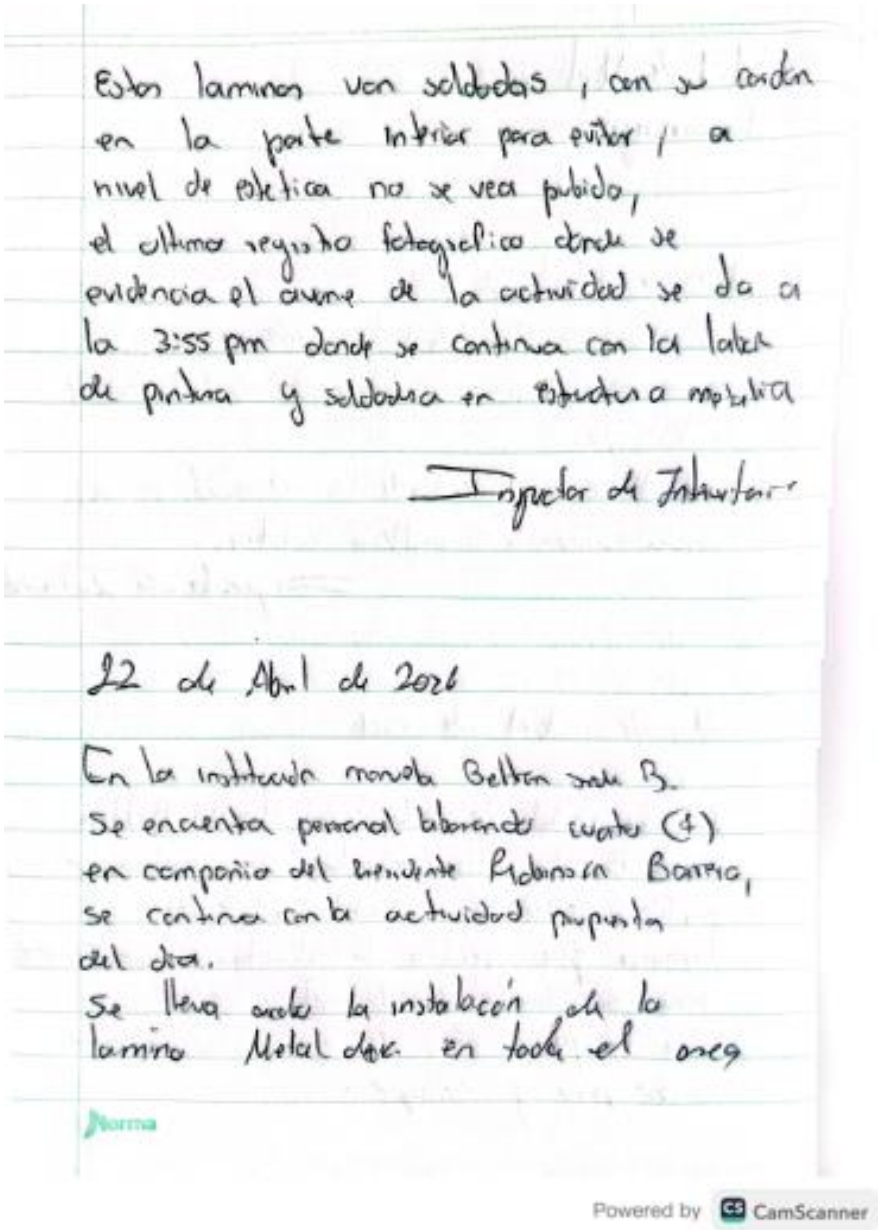

Estas laminas van soldadas, con su cordon en la parte interior para evitar / a nivel de estetica no se vea pulido,
el ultimo registro fotografico donde se evidencia el avance de la actividad se da a la 3:55 pm donde se continua con las labor de pintura y soldadura en estructura metalica


Inspector de Interventoria

12 de Abril de 2026

En la institucion nevada Beltran sede B.
Se encuentra personal laborando cuatro (4) en compañia del Residente Roberto Barrio, se continua con la actividad propuesta del dia.
Se lleva avance la instalacion de la lamina Metaldeck en todo el area

Norma

Powered by CamScanner

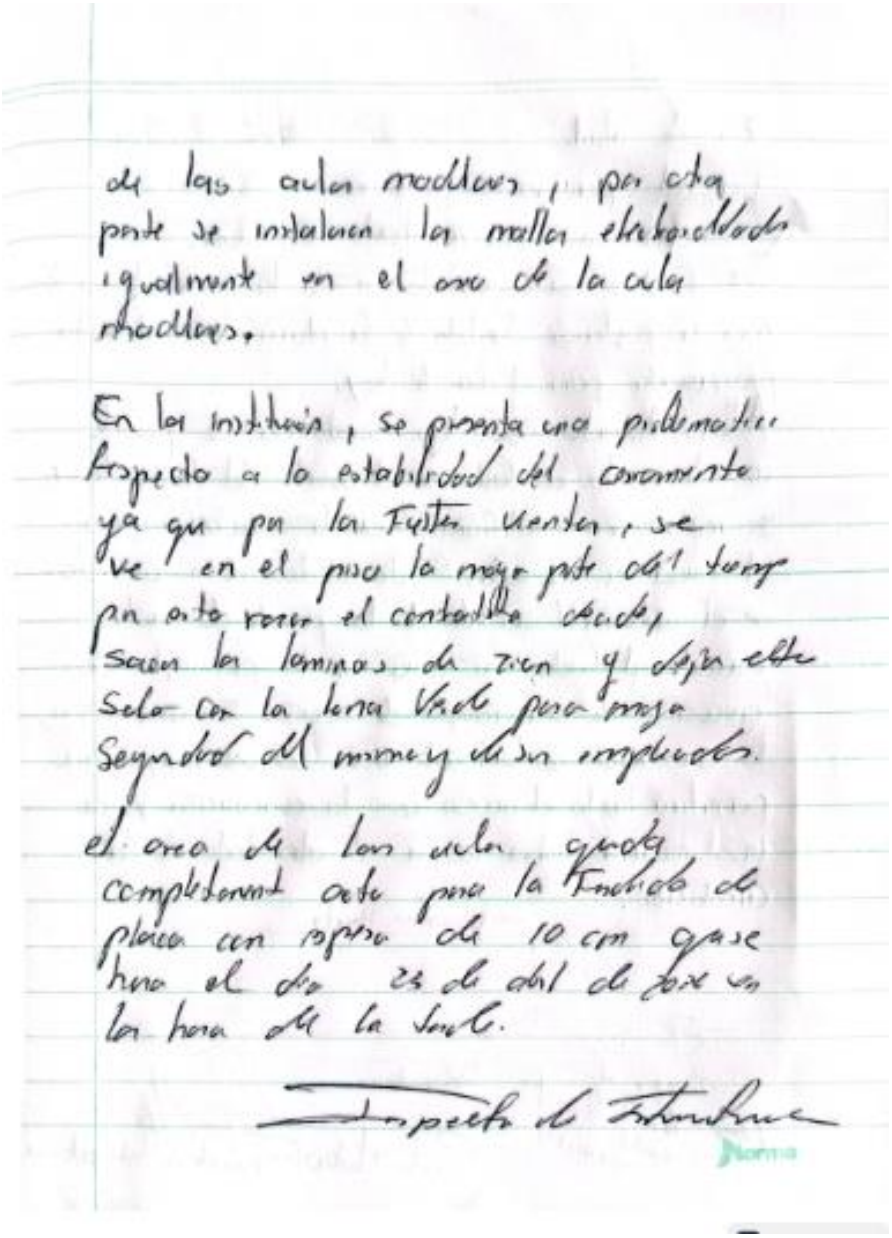


de las aulas modulares, por esta parte se instalaron la malla electrosoldada igualmente en el area de la aula modulares.

En las instalaciones, se presenta una problematica respecto a la estabilidad del cerramiento ya que por la Fuente vecina, se ve en el piso la mayor parte del tiempo por esta razon el contratista debe, sacar las laminas de zinc y dejar este solo con la tierra Vista para mayor Seguridad del menor y de sus empleados.

el area de las aulas queda completamente para la Fundida de placa con espesor de 10 cm quedando el dia 23 de abril de 2026 en la hora de la tarde.


Inspector de Estructuras

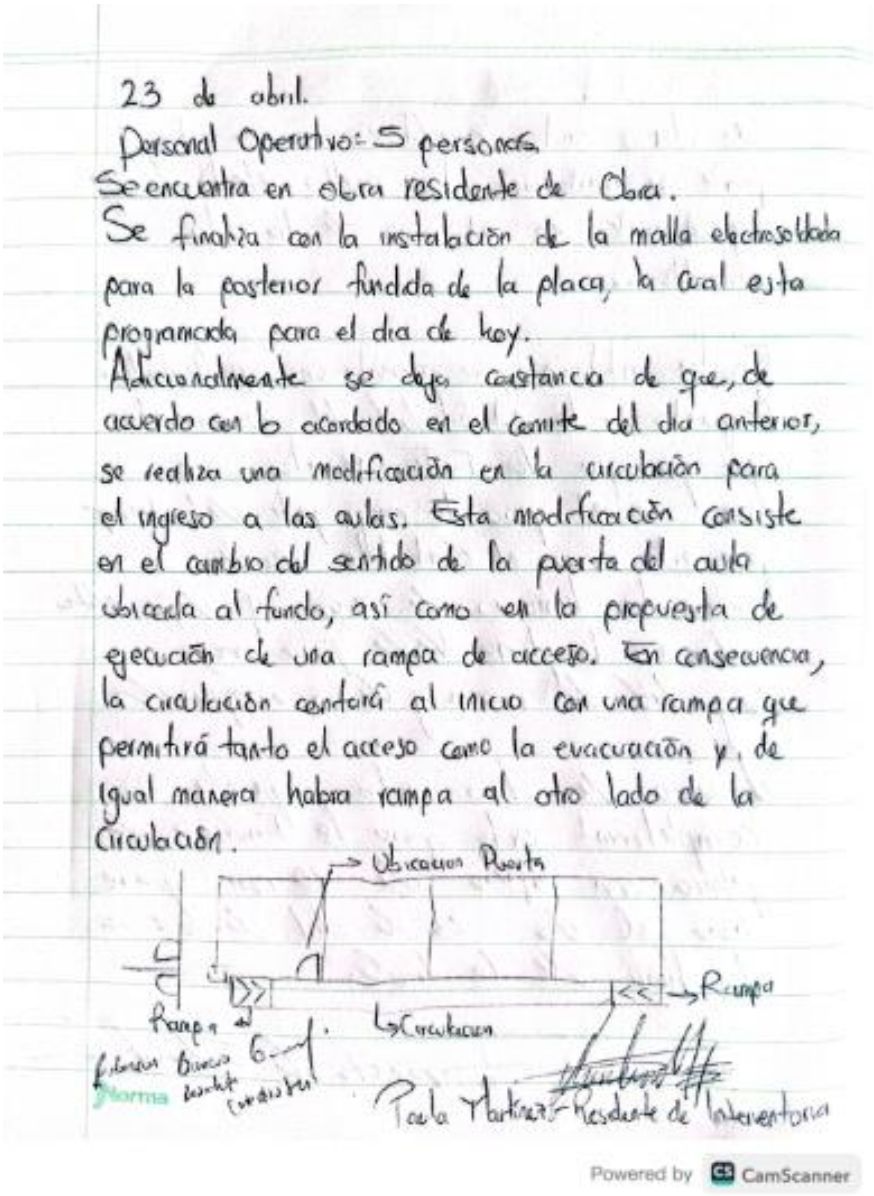

23 de abril.
Personal Operativo: 5 personas.
Se encuentra en obra residente de Obra.
Se finaliza con la instalación de la malla electrosoldada para la posterior fundida de la placa, la cual esta programada para el dia de hoy.
Adicionalmente se deja constancia de que, de acuerdo con lo acordado en el comité del dia anterior, se realiza una modificación en la circulación para el ingreso a las aulas. Esta modificación consiste en el cambio del sentido de la puerta del aula ubicada al fondo, así como en la propuesta de ejecución de una rampa de acceso. En consecuencia, la circulación contará al inicio con una rampa que permitirá tanto el acceso como la evacuación y, de igual manera habra rampa al otro lado de la Circulación.

Paola Martinez - Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

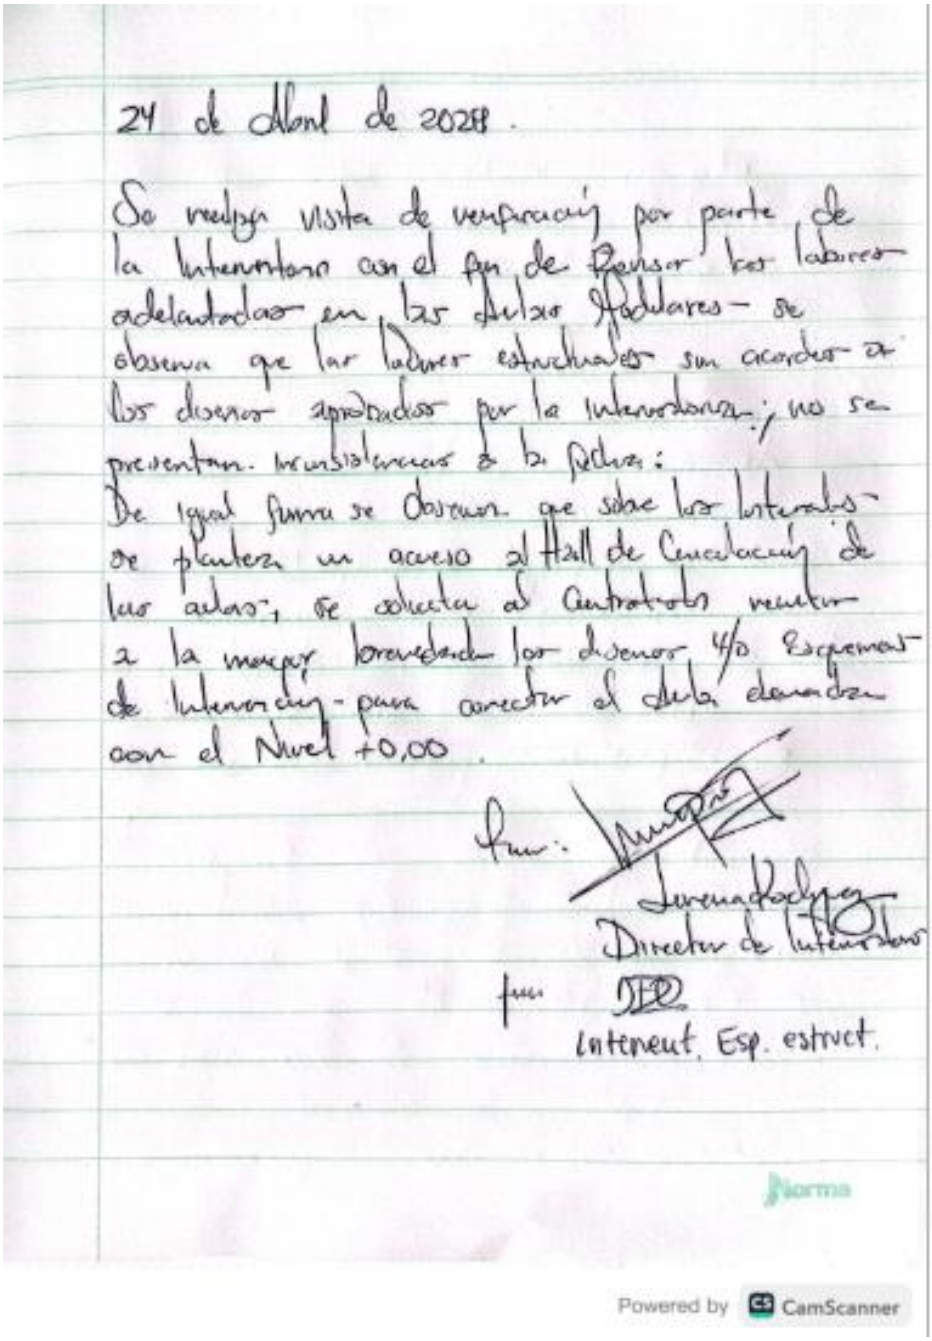

24 de Abril de 2026.


Se realiza visita de verificación por parte de la Interventoría con el fin de revisar las labores adelantadas en las Aulas Modulares – se observa que las labores estructurales son acordes a los diseños aprobados por la Interventoría; no se presentan inconsistencias a la fecha:
De igual forma se observa que sobre los linderos se plantea un acceso al Hall de Circulación de las aulas; se solicita al Contratista remitir a la mayor brevedad los diseños A/D Esquemas de Intervención para acceder al área demandada con el Nivel +0,00.

Atte:
Jurema Rodriguez
Director de Interventoría

Atte:
Interventoría Esp. estruct.

Norma

Powered by CamScanner

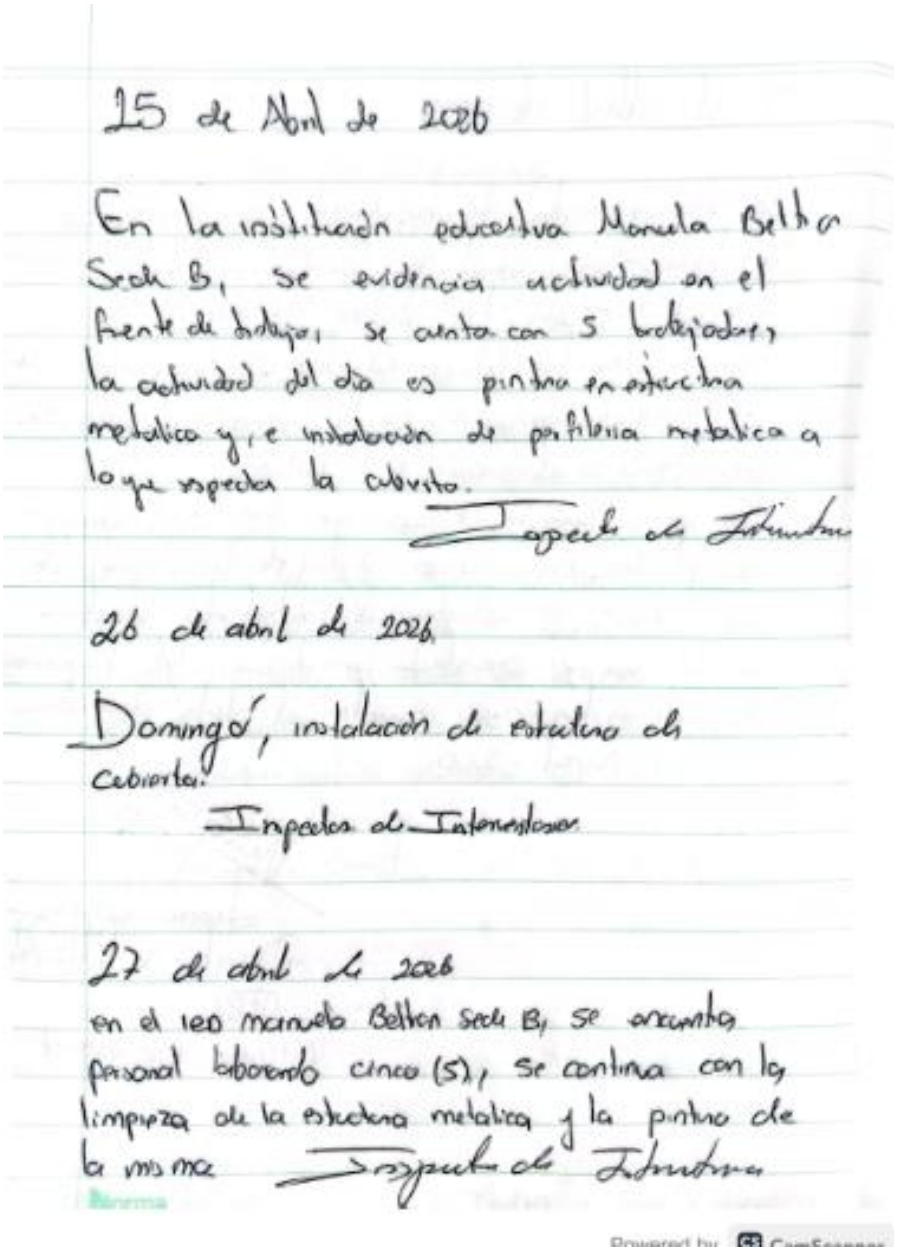

15 de Abril de 2026

En la institución educativa Manuela Beltrán Sede B, se evidencia actividad en el frente de trabajo, se cuenta con 5 trabajadores, la actividad del día es pintura en estructura metálica y, e instalación de perfilería metálica a lo que respecta la cubierta.

Inspector de Interventoría

26 de abril de 2026


Domingo, instalación de estructura de cubierta.

Inspector de Interventoría

27 de abril de 2026

en el ied manuela Beltran sede B, se encuentra personal laborando cinco (5), se continua con la limpieza de la estructura metalica y la pintura de la misma

Inspector de Interventoría

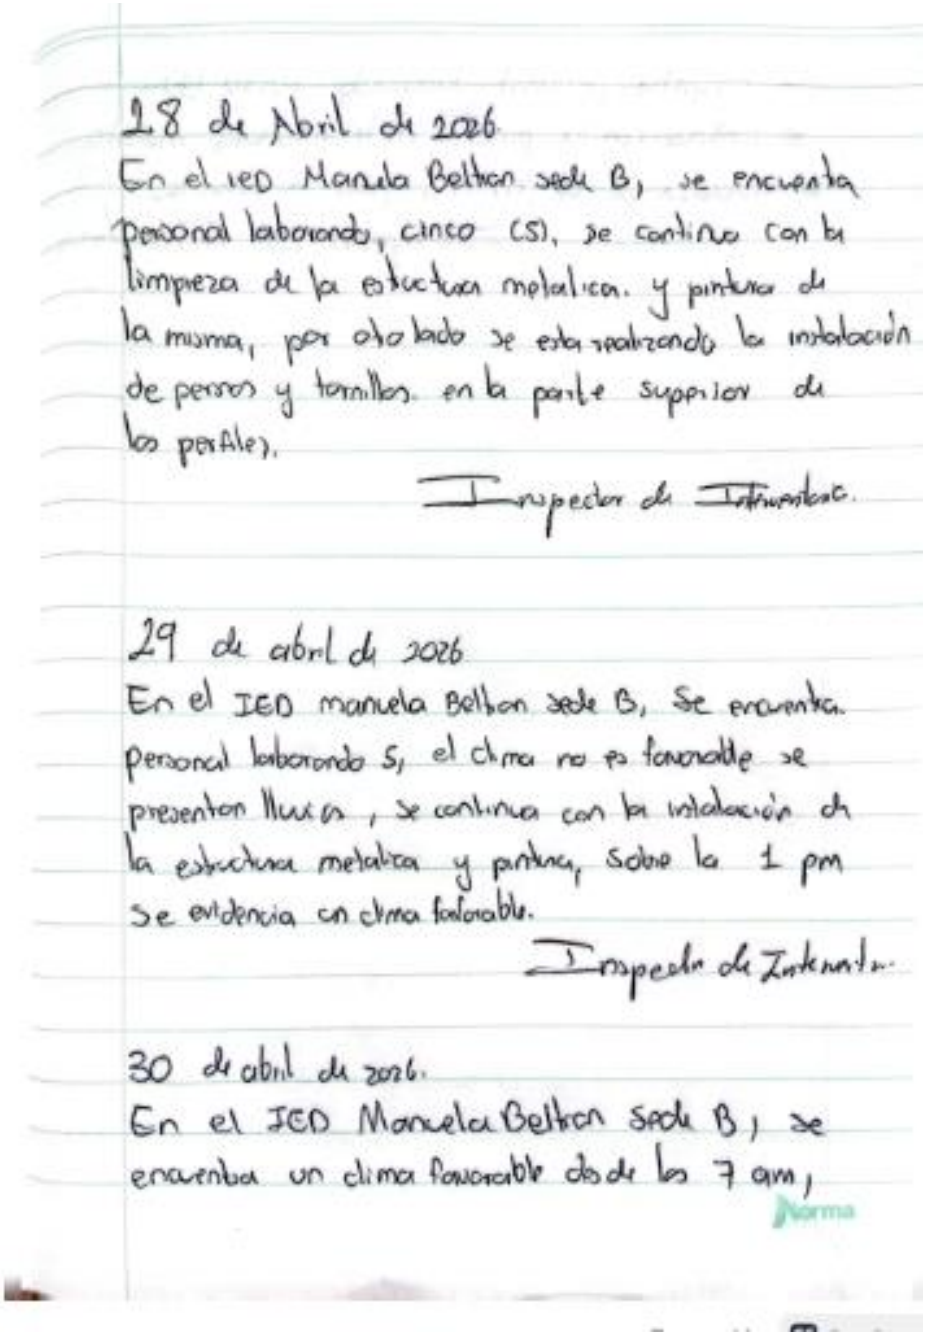


18 de Abril de 2026
En el IED Manuela Beltran sede B, se encuenta personal laborando, cinco (5), se continua con la limpieza de la estructura metalica. y pintura de la misma, por otro lado se esta realizando la instalación de pernos y tornillos. en la parte superior de los perfiles.

Inspector de Interventoria.

29 de abril de 2026
En el IED manuela Beltran sede B, Se encuentra personal laborando 5, el clima no es favorable se presentan lluvias, se continua con la instalación de la estructura metalica y pintura, sobre la 1 pm se evidencia un clima favorable.

Inspector de Interventoria.

30 de abril de 2026.
En el IED Manuela Beltran sede B, se encuentra un clima favorable desde las 7 am,

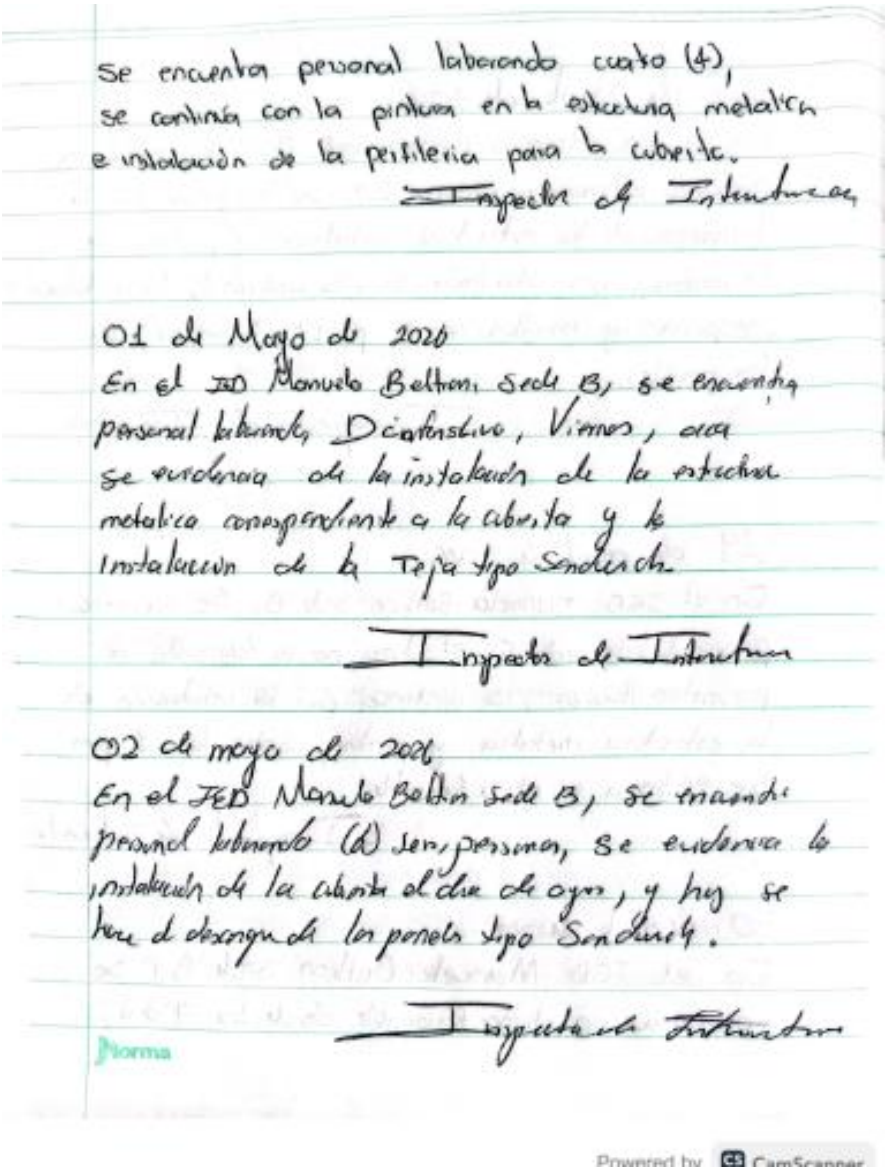

Se encuentra personal laborando cuatro (4), se continúa con la pintura en la estructura metálica e instalación de la perfilería para la cubierta.

Inspector de Estructuras

01 de Mayo de 2026
En el IED Manuela Beltran, Sede B, se encuentra personal laborando Diurnamente, Viernes, aquí se evidencia de la instalación de la estructura metálica correspondiente a la cubierta y la instalación de la Teja tipo Sandwich

Inspector de Estructuras


02 de mayo de 2026
En el IED Manuela Beltran Sede B, se encuentra personal laborando (2) seis personas, se evidencia la instalación de la cubierta el día de ayer, y hoy se hace el descargue de los paneles tipo Sandwich.


Inspector de Estructuras

Norma


Powered by CamScanner

Ilustración 27- Anotación Bitácora Marco Tulio Fernández

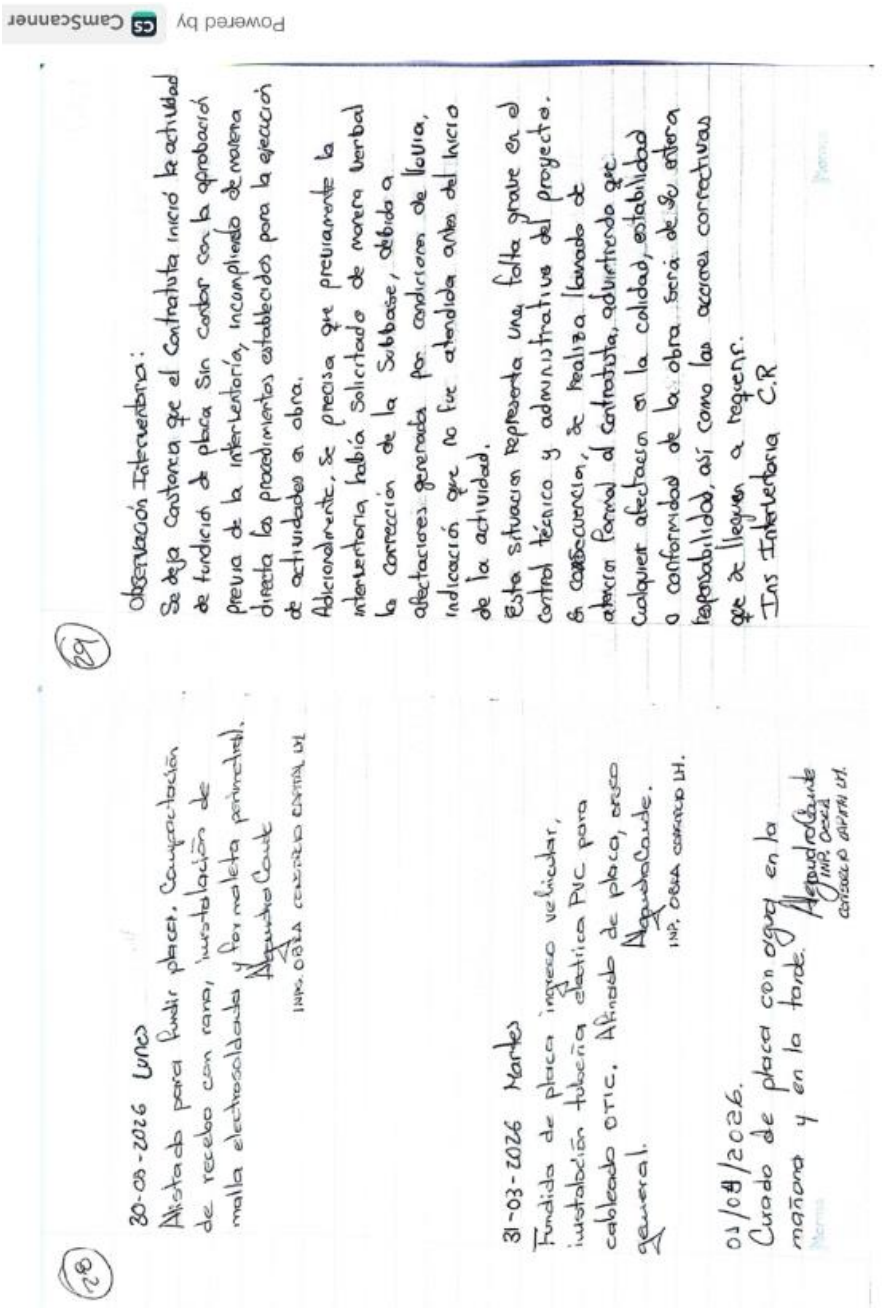

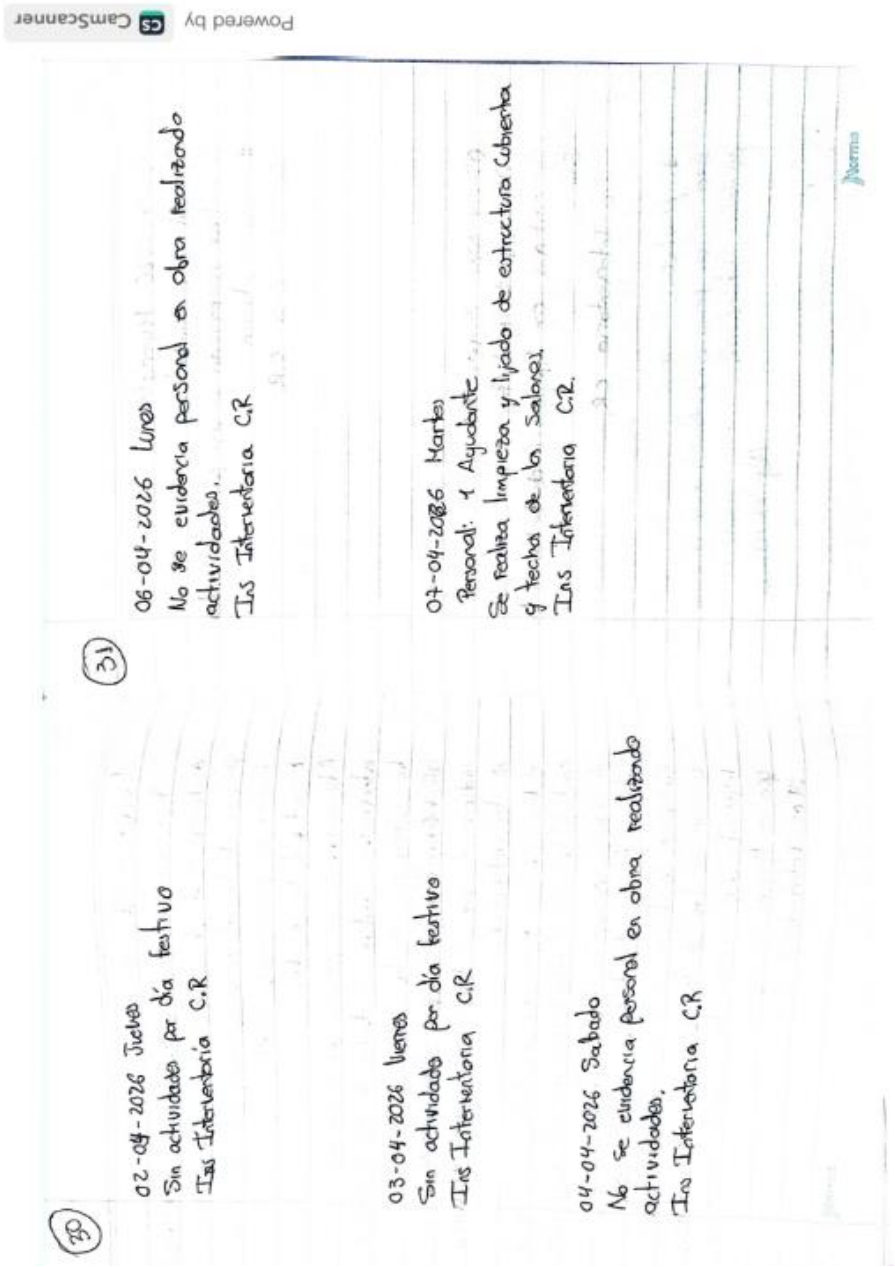
Powered by CamScanner
(30)
02-04-2026 Jueves
Sin actividades por día festivo
Ing Interventoria C.R
03-04-2026 Viernes
Sin actividades por día festivo
Ing Interventoria C.R
04-04-2026 Sabado
No se evidencia personal en obra realizando actividades.
Ing Interventoria C.R
(31)
06-04-2026 Lunes
No se evidencia personal en obra realizando actividades.
Ing Interventoria C.R
07-04-2026 Martes
Personal: 1 Ayudante
Se realiza limpieza y lijado de estructura cubierta y techos de los salones.
Ing Interventoria C.R.

Powered by CamScanner

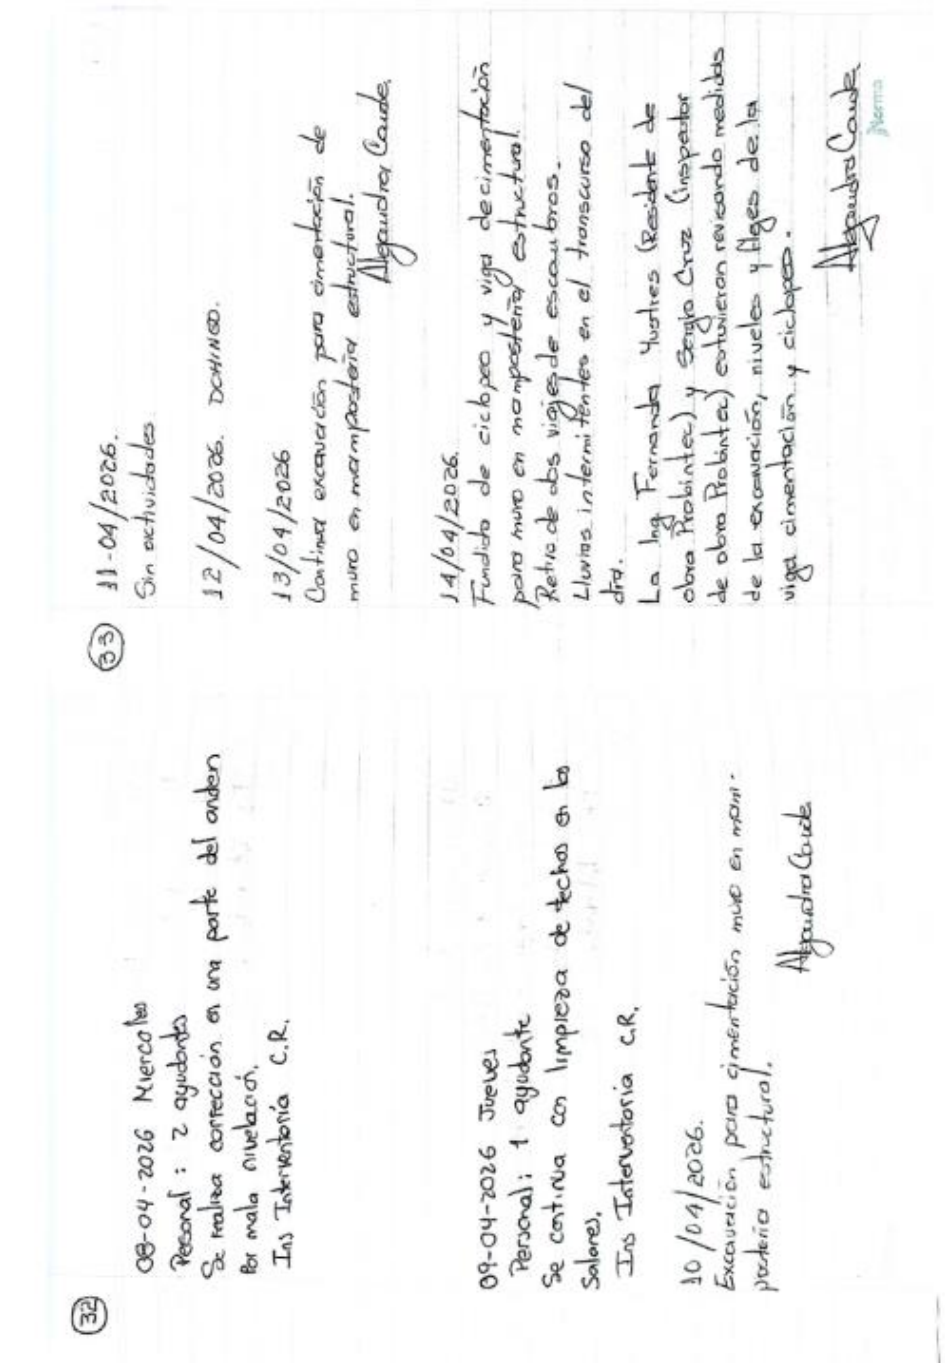

(32)

08-04-2026 Miercoles
Personal: 2 ayudantes
Se realiza corrección en una parte del anden por mala nivelación.
Ins Interventoria C.R.

09-04-2026 Jueves
Personal: 1 ayudante
Se continua con limpieza de techos en la Salones.
Ins Interventoria C.R.

10/04/2026.
Excavación para cimentación muro en mampostería estructural.
Alejandra Conde.

(33)


11-04/2026.
Sin actividades

12/04/2026. DOMINGO.

13/04/2026
Continua excavación para cimentación de muro en mampostería estructural.
Alejandra Conde.

14/04/2026.
Fundido de ciclopeo y viga de cimentación para muro en mampostería estructural.
Retiro de dos viajes de escombros.
Lluvias intermitentes en el transcurso del dia.
La Ing Fernanda Yustes (Residente de obra Probiotec) y Sergio Cruz (Inspector de obra Probiotec) estuvieron revisando medidas de la excavación, niveles y fases de la viga cimentación y ciclopeo.
Alejandra Conde

Powered by CamScanner

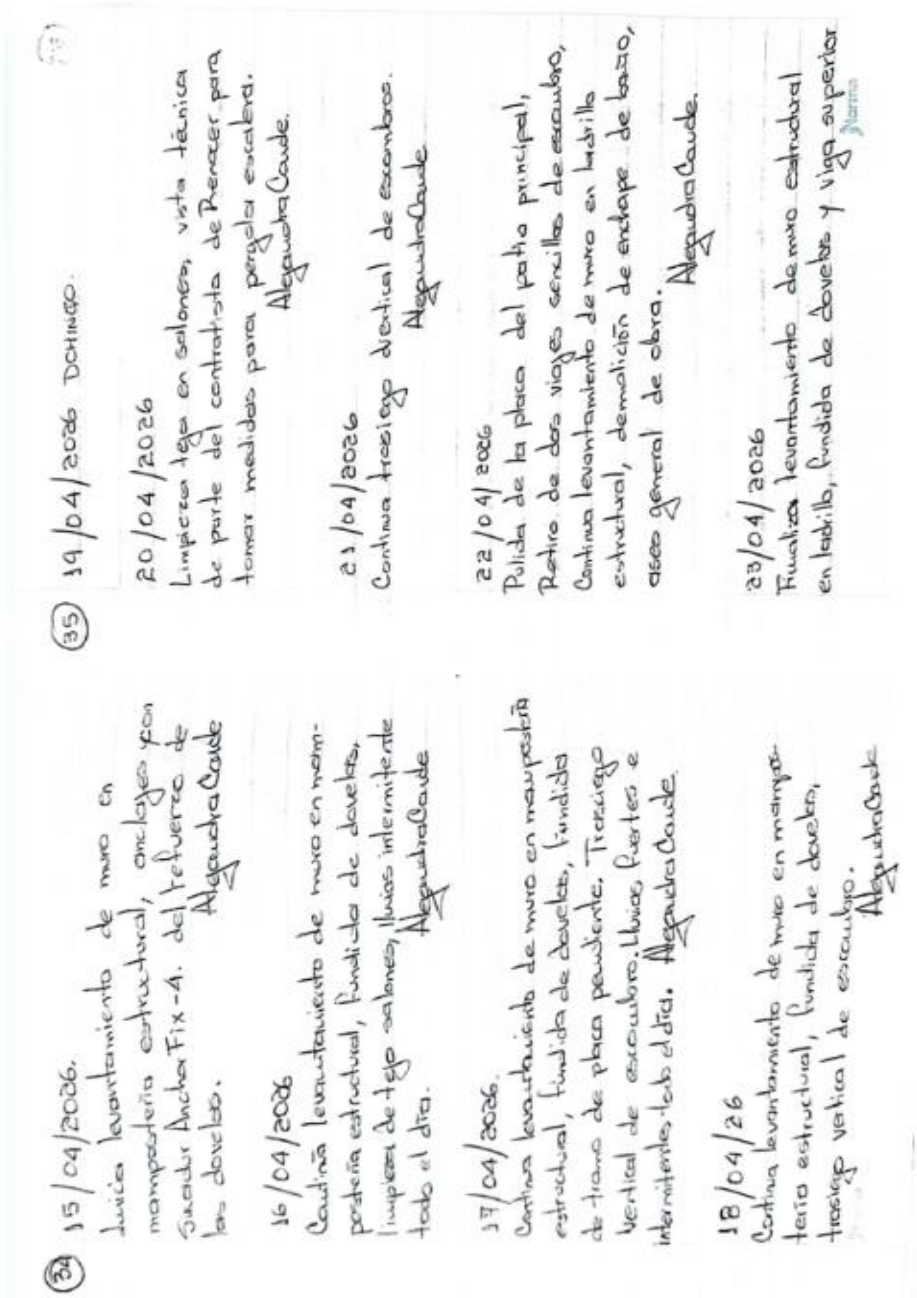

(34)
15/04/2026.
Inicia levantamiento de muro en mampostería estructural, anclajes con Epoxi Anchor Fix-4. del 1ro al 5to de la cubierta.
Alejandra Caude

16/04/2026
Continúa levantamiento de muro en mampostería estructural, Fundidas de dovelas, limpieza de tejo saloneo, lluvias intermitente todo el día.
Alejandra Caude

17/04/2026.
Continua levantamiento de muro en mampostería estructural, fundida de dovelas, fundida de llave de placa pendiente, Traslapo vertical de escalones. Lluvia, fuerte e intermitente, todo el día. Alejandra Caude

18/04/26
Continua levantamiento de muro en mampostería estructural, fundida de dovelas, traslapo vertical de escalones.
Alejandra Caude


(35)
19/04/2026 DOMINGO.

20/04/2026
Limpieza teja en saloneo, visita técnica de parte del contratista de Proteger para tomar medidas para pergola escalera.
Alejandra Caude.

21/04/2026
Continua traslapo vertical de escalones.
Alejandra Caude

22/04/2026
Fundida de la placa del patio principal, Retiro de dos viajes sencillos de escombro, Continua levantamiento de muro en ladrillo estructural, demolición de entrepe de bajo, aseo general de obra.
Alejandra Caude.

23/04/2026
Fundidas levantamiento de muro estructural en ladrillo, fundida de dovelas y viga superior

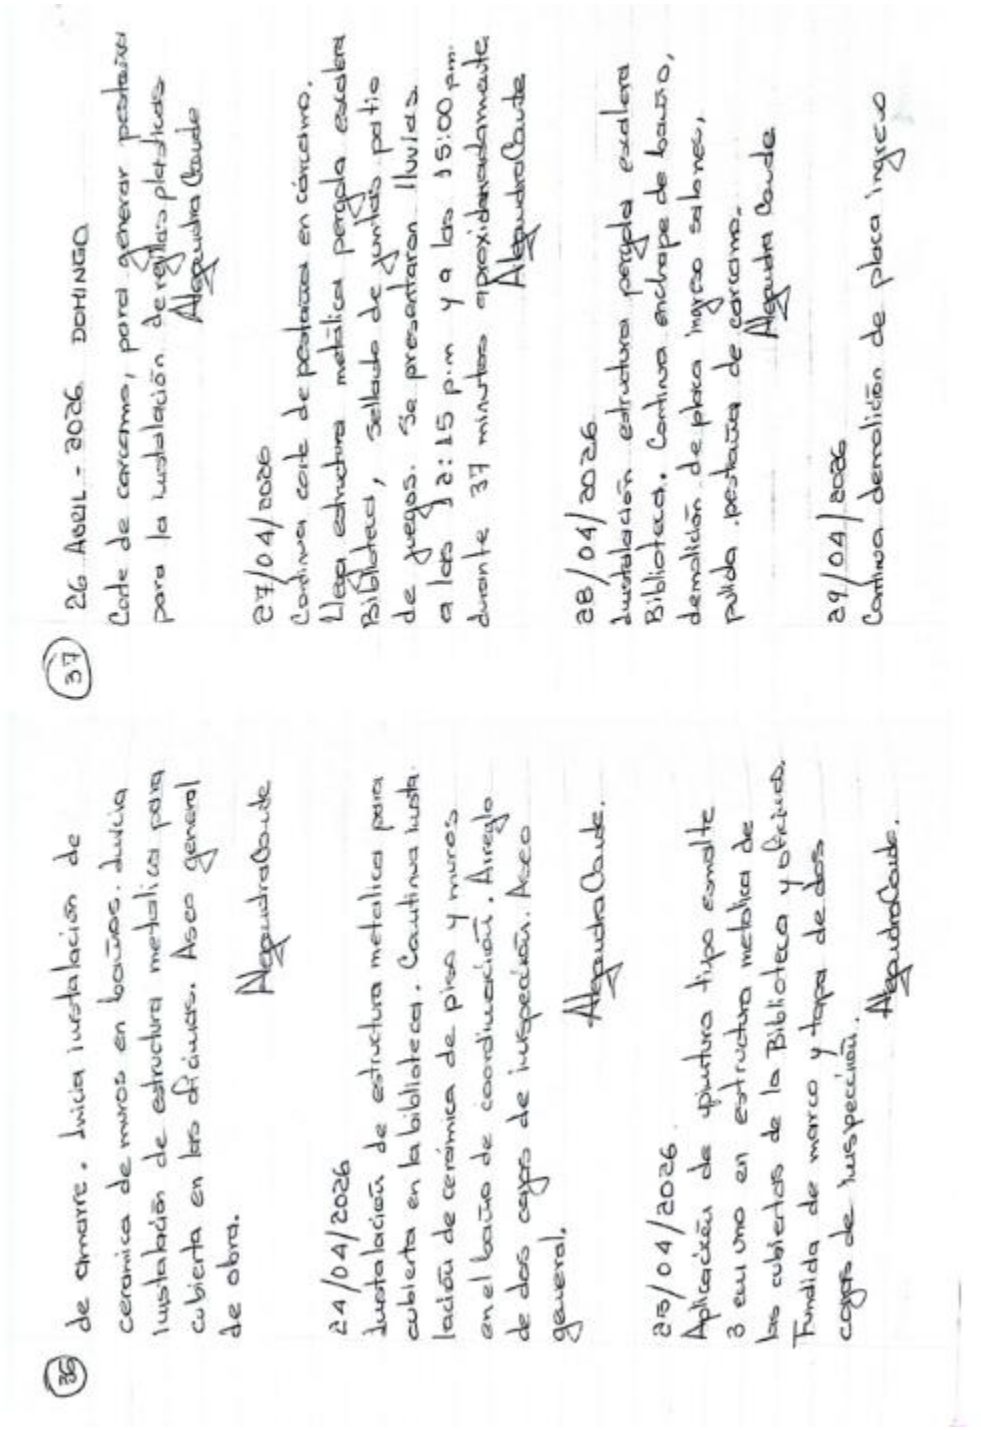

37

26 ABRIL - 2026 DOMINGO

Corte de cerramo, para generar pestañas para la instalación de reglas plexiglass

Alejandra Conde

27/04/2026

Continua corte de pestañas en cerramo.

Llega estructura metálica pergola escalera Biblioteca, Sellado de juntas patio de juegos. Se presentaron lluvias a las 2:15 p.m y a las 15:00 p.m durante 37 minutos aproximadamente

Alejandra Conde

28/04/2026

Instalación estructura pergola escalera Biblioteca. Continua enclape de bases, demolición de placa ingreso salones, pulida pestañas de cerramo.

Alejandra Conde

29/04/2026

Continua demolición de placa ingreso

36

de amarre. Inicia instalación de ceramica de muros en baños. Inicia instalación de estructura metalica para cubierta en las oficinas. Aseo general de obra.

Alejandra Conde

24/04/2026


Instalación de estructura metalica para cubierta en la biblioteca. Continua instalación de ceramica de piso y muros en el baño de coordinación. Arreglo de dos cajas de inspección. Aseo general.

Alejandra Conde.

25/04/2026

Aplicación de pintura tipo esmalte 3 en uno en estructura metalica de las cubiertas de la Biblioteca y oficinas. Fundida de marco y tapa de dos cajas de inspección.

Alejandra Conde.

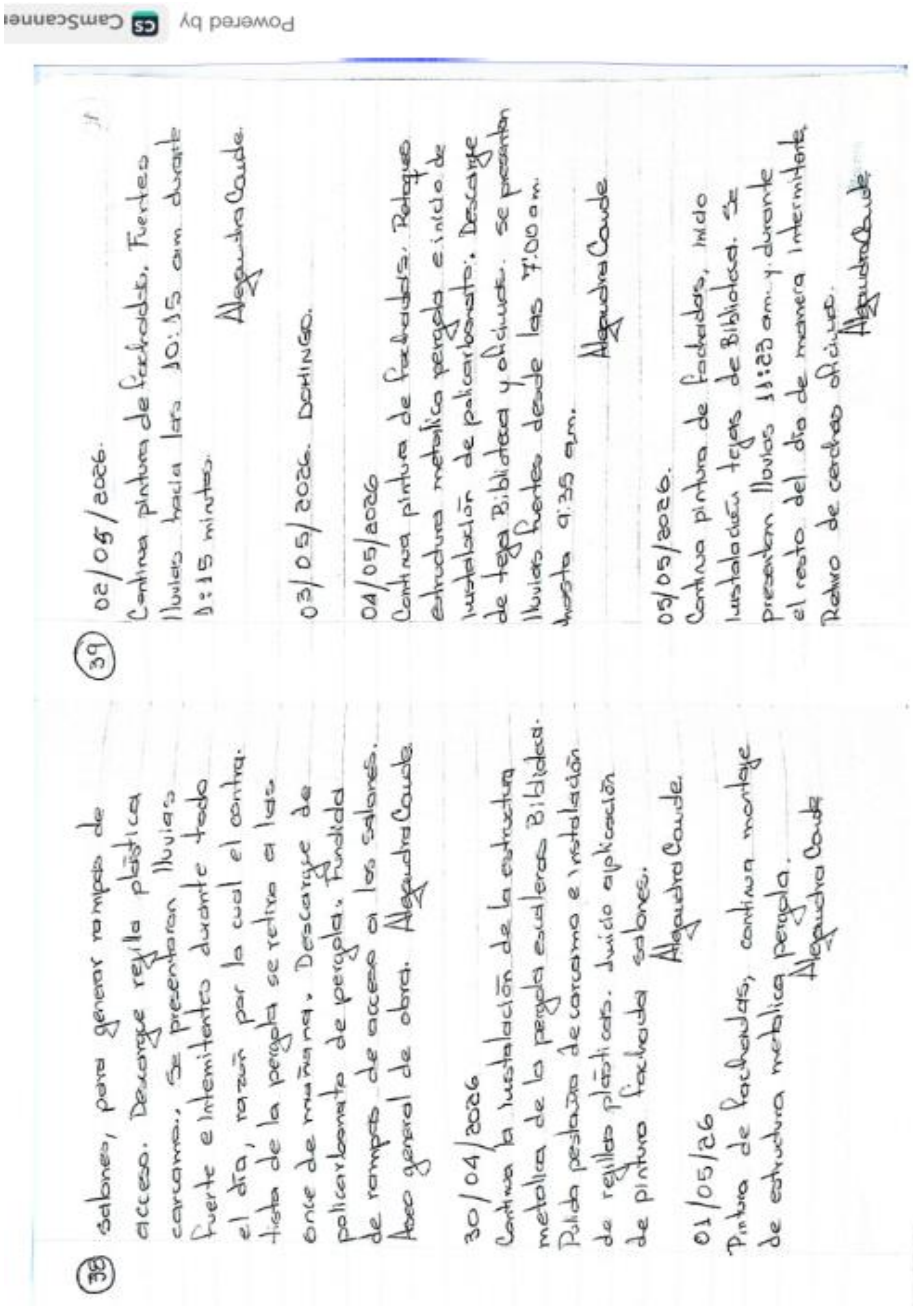

(39) 02/05/2026.
Continua pintura de Fachadas, Fuentes
lluvias hacia las 10:15 am durante
1:15 minutos.
Alejandra Conde.

03/05/2026. DOMINGO.

04/05/2026
Continua pintura de Fachadas, Bloques
estructura metalica pergola e inicio de
instalación de policarbonato. Descargue
de teja Biblioteca y oficinas. se presentan
lluvias fuertes desde las 7:00 a.m.
hasta 9:35 a.m.
Alejandra Conde


05/05/2026.
Continua pintura de Fachadas, inicio
instalación teja de Biblioteca. Se
presentan lluvias 11:25 am. y durante
el resto del dia de manera intermitente.
Retiro de cerdas oficinas.
Alejandra Conde

(38) Salones, para generar rampas de
acceso. Descargue reylla plástica
cercanas., Se presentan lluvias
fuerte e intermitentes durante todo
el dia, razón por la cual el conta-
tista de la pergola se retira a las
once de mañana. Descargue de
policarbonato de pergola. Fundida
de rampas de acceso a los salones.
Aseo general de obra. Alejandra Conde.

30/04/2026
Continua instalación de la estructura
metalica de la pergola escaleras Biblioteca.
Pulida pestañas de cerramo e instalación
de reylles plásticos. Juicio aplicación
de pintura fachada
salones.
Alejandra Conde.

01/05/26
Pintura de Fachadas, continua montaje
de estructura metalica pergola.
Alejandra Conde

Ilustración 23- Anotación Bitácora I,E.D Panamericano

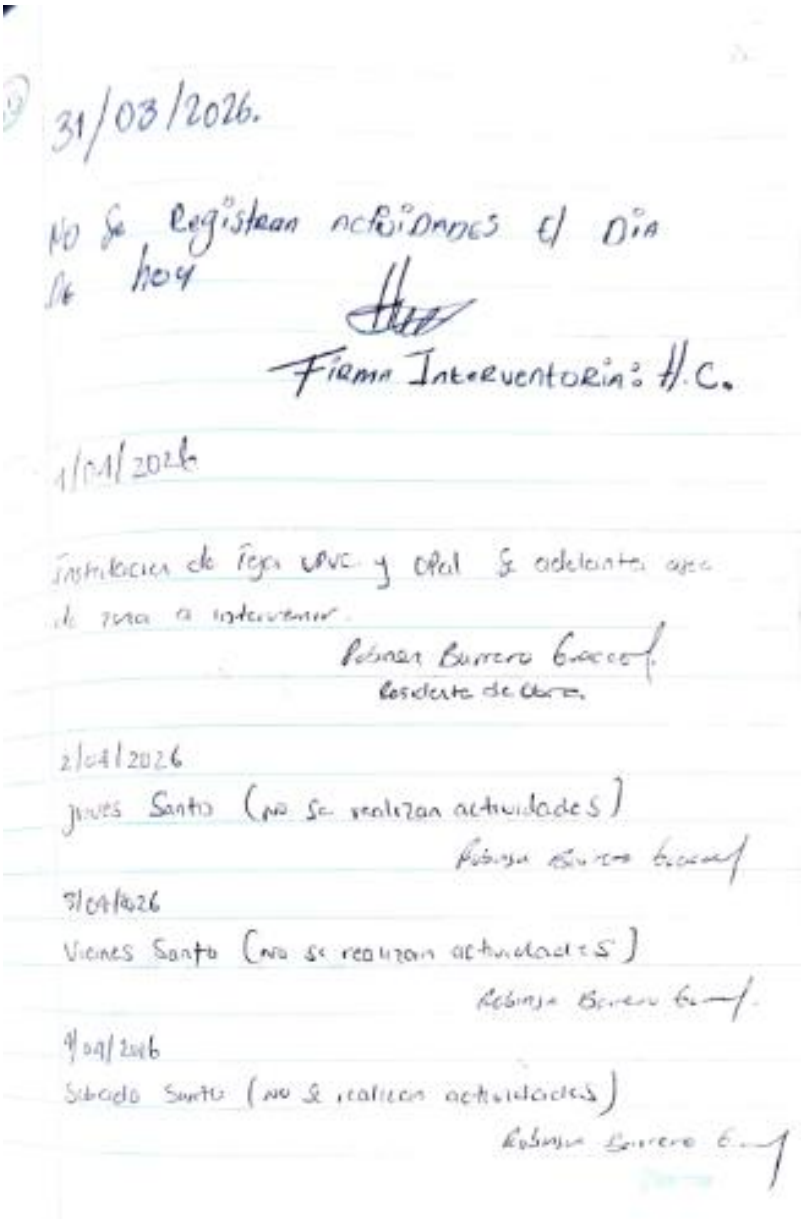

31/03/2026.

No se registran actividades el día de hoy

Firma Interventoría: H.C.

1/04/2026

Instalación de tejas UPVC y Cpal se adelanta obra de zona a intervenir.

Robinson Barrero Garcés.
Residente de obra.

2/04/2026

Jueves Santo (no se realizan actividades)

Robinson Barrero Garcés

3/04/2026


Viernes Santo (no se realizan actividades)

Robinson Barrero G.

4/04/2026

Sábado Santo (no se realizan actividades)

Robinson Barrero G.

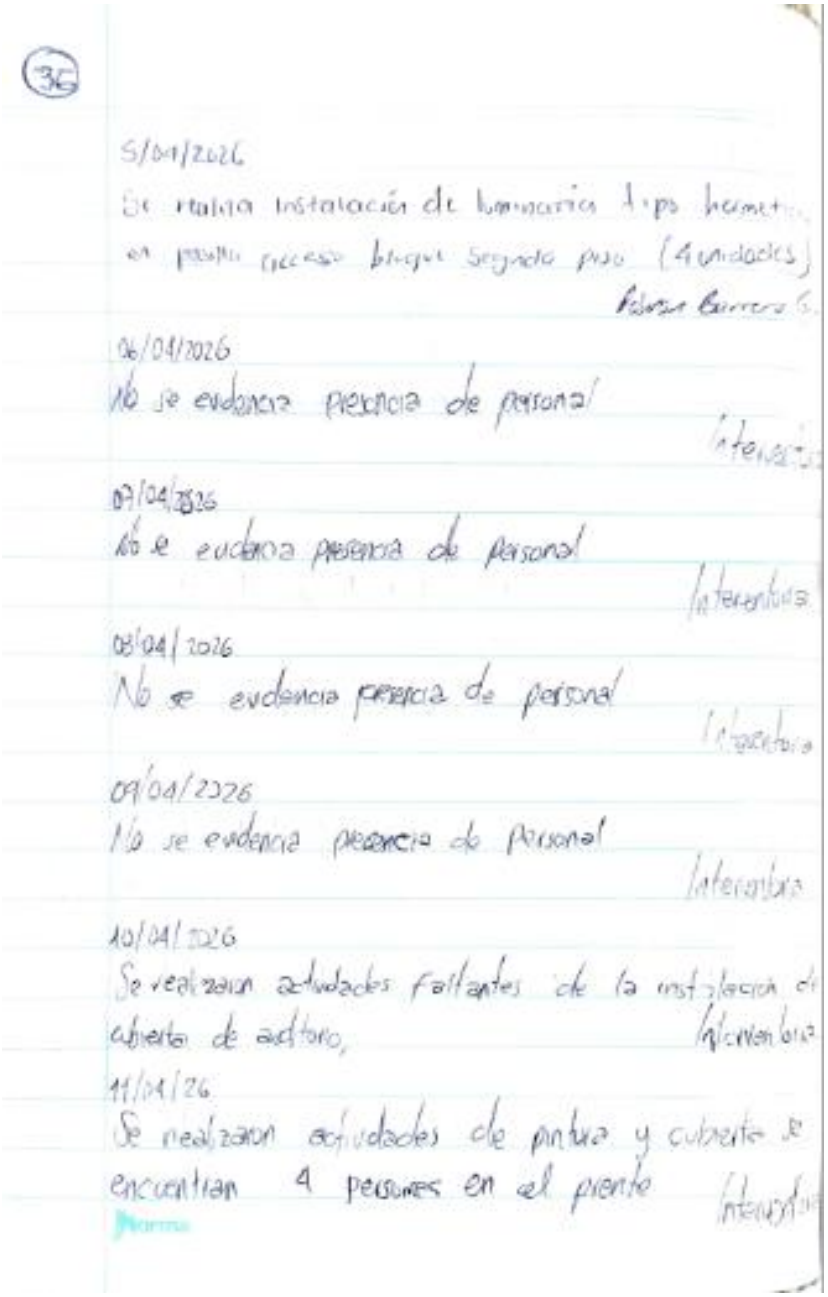

35

5/04/2026
Se realiza instalación de luminaria tipo hermet... en pasillo acceso bloque segundo piso (4 unidades)
Interventoría

06/04/2026
No se evidencia presencia de personal
Interventoría


07/04/2026
No se evidencia presencia de personal
Interventoría

08/04/2026
No se evidencia presencia de personal
Interventoría

09/04/2026
No se evidencia presencia de personal
Interventoría

10/04/2026
Se realizan actividades faltantes de la instalación de cubierta de acetaro,
Interventoría

11/04/26
Se realizan actividades de pintura y cubierta se encuentran 4 personas en el predio
Interventoría

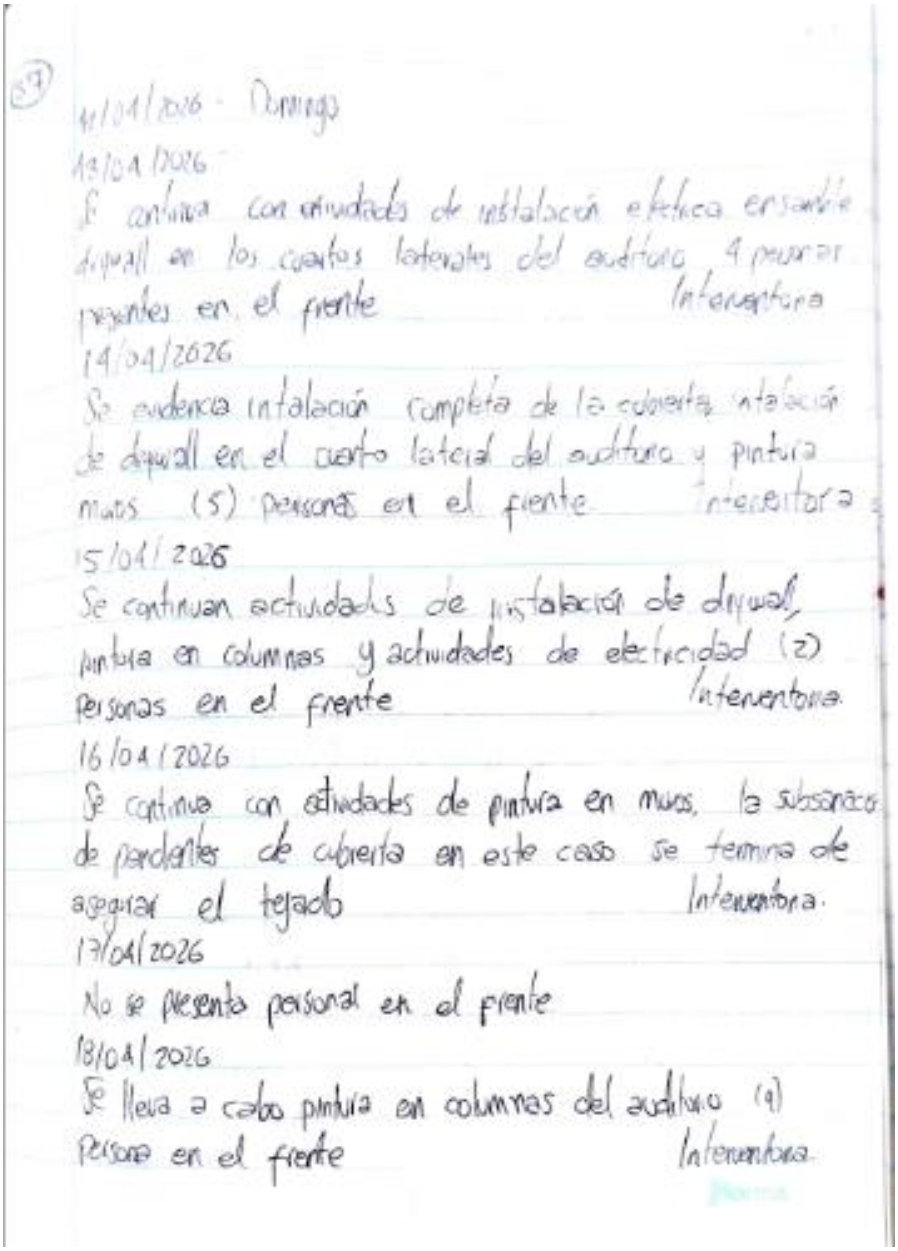

(37)

11/04/2026 - Domingo

13/04/2026

Se continua con actividades de instalación eléctrica en cambio drywall en los costados laterales del auditorio 4 personas presentes en el frente Interventoria

14/04/2026

Se evidencia instalación completa de la cubierta, instalación de drywall en el costado lateral del auditorio y pintura muros (5) personas en el frente Interventora

15/04/2026

Se continuan actividades de instalación de drywall, pintura en columnas y actividades de electricidad (2) personas en el frente Interventoria.

16/04/2026


Se continua con actividades de pintura en muros, la subsanación de pendientes de cubierta en este caso se termina de asegurar el tejado Interventora.

17/04/2026

No se presenta personal en el frente

18/04/2026

Se lleva a cabo pintura en columnas del auditorio (9) Personas en el frente Interventoria.

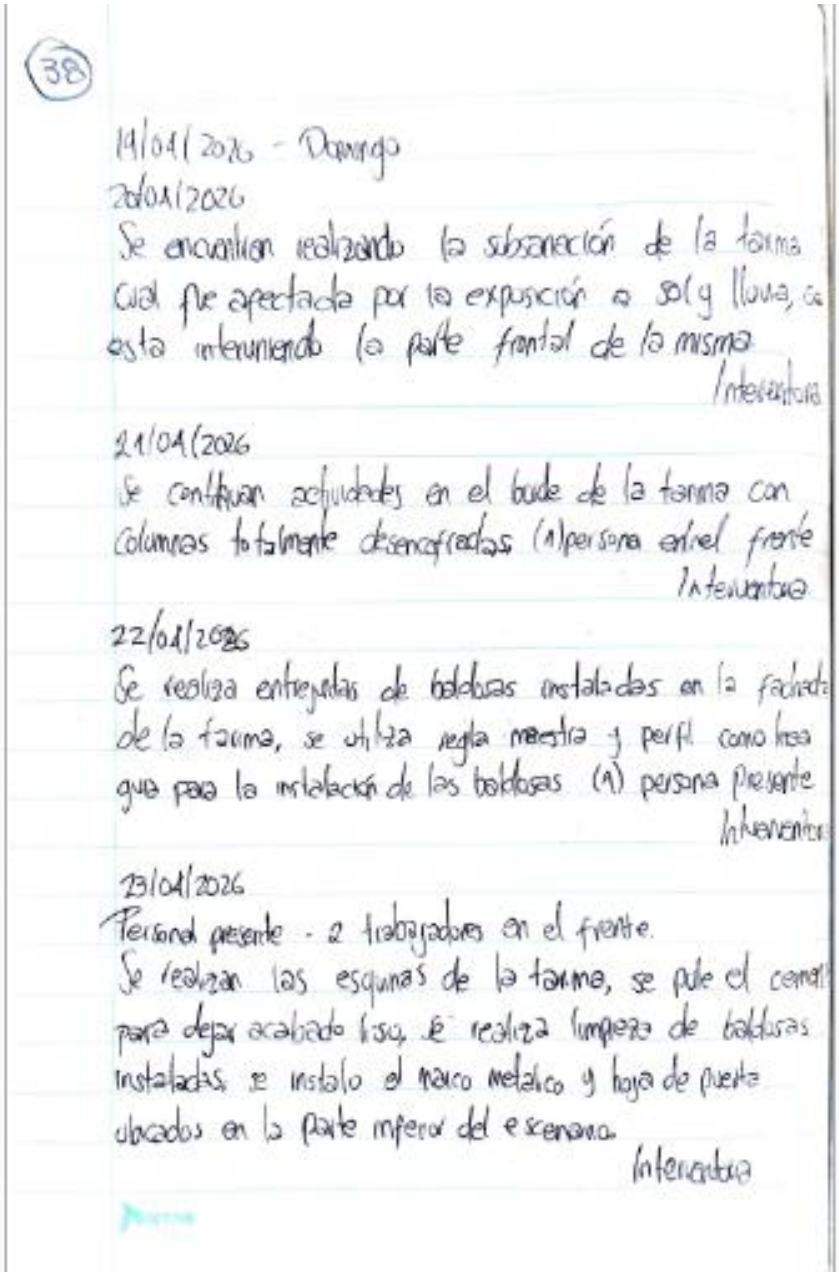

38

19/04/2026 - Domingo

20/04/2026

Se encuentran realizando la subsanación de la tarima cual fue afectada por la exposición a sol y lluvia, se esta interviniendo la parte frontal de la misma

Interventoría

21/04/2026

Se continuan actividades en el borde de la tarima con columnas totalmente desencofradas (1)persona en el frente

Interventoría

22/04/2026

Se realiza entregadas de baldosas instaladas en la fachada de la tarima, se utiliza regla maestra y perfil como hilo guia para la instalación de las baldosas (1) persona presente


Interventoría

23/04/2026

Personal presente - 2 trabajadores en el frente.

Se realizan las esquinas de la tarima, se pule el cemento para dejar acabado liso, se realiza limpieza de baldosas instaladas se instalo el marco metalico y hoja de puerta ubicados en la parte inferior del escenario.

Interventoría

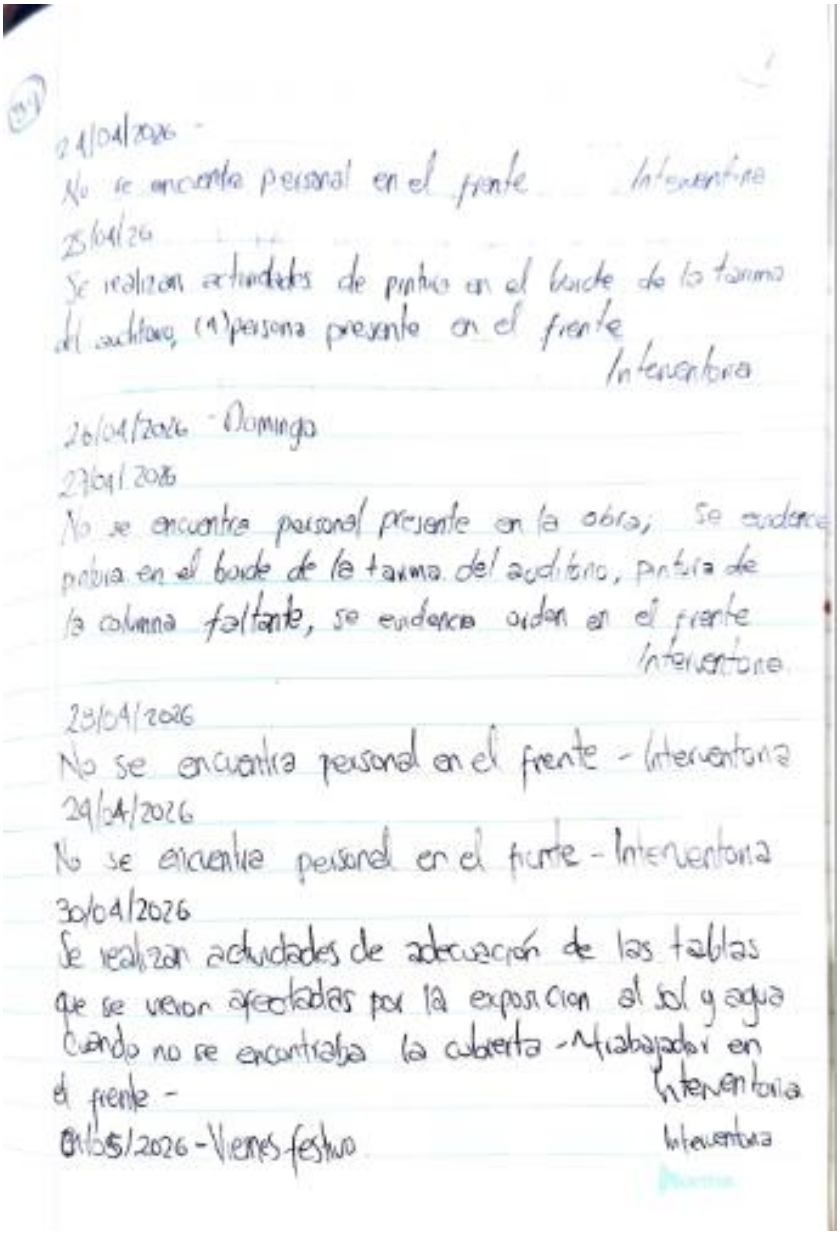

24/04/2026 -
No se encuentra personal en el frente - Interventoria
25/04/26
Se realizan actividades de pintura en el borde de la tarima del auditorio, (1) persona presente en el frente
Interventoria
26/04/2026 - Domingo
27/04/2026
No se encuentra personal presente en la obra; Se evidencia pintura en el borde de la tarima del auditorio, pintura de la columna faltante, se evidencia orden en el frente
Interventoria
28/04/2026
No se encuentra personal en el frente - Interventoria
29/04/2026
No se encuentra personal en el frente - Interventoria
30/04/2026
Se realizan actividades de adecuación de las tablas que se veian afectadas por la exposicion al sol y agua cuando no se encontraba la cubierta - Trabajador en el frente -
Interventoria
01/05/2026 - Viernes festivo
Interventoria



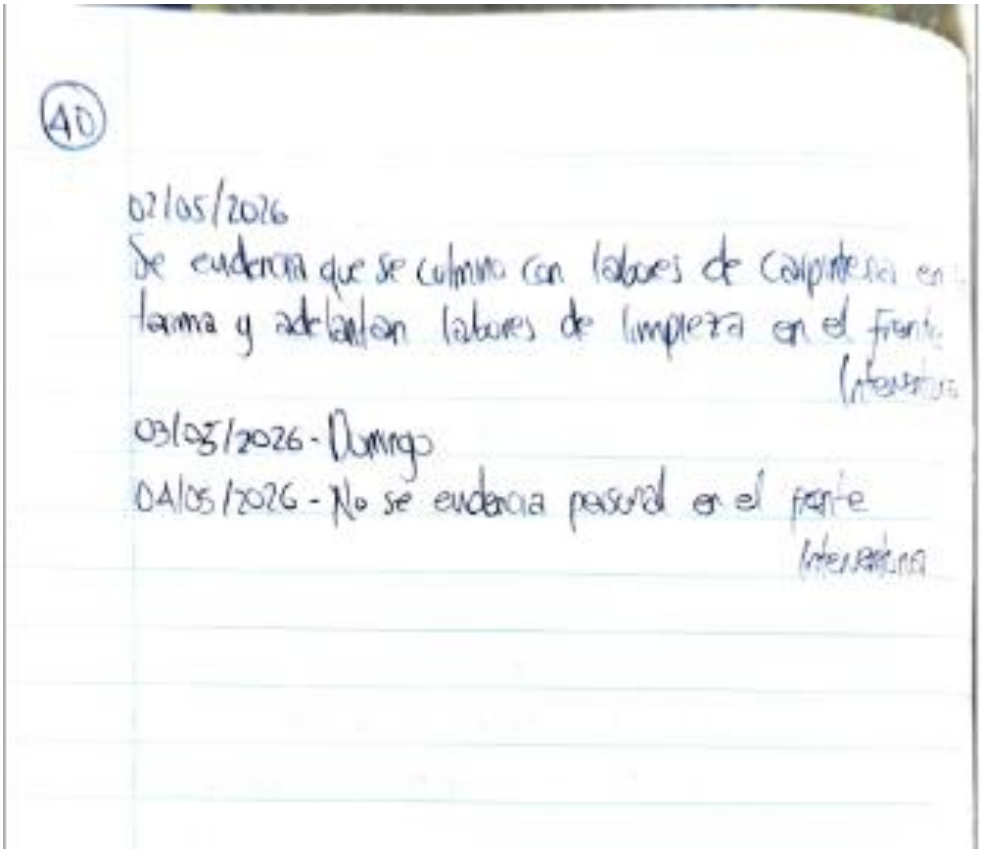

40
02/05/2026
Se evidencia que se culmino con labores de carpinteria en
tarima y adelantan labores de limpieza en el frente
03/05/2026 - Domingo
04/05/2026 - No se evidencia personal en el frente

Ilustración 21. Anotaciones en bitácora de Republica China B.

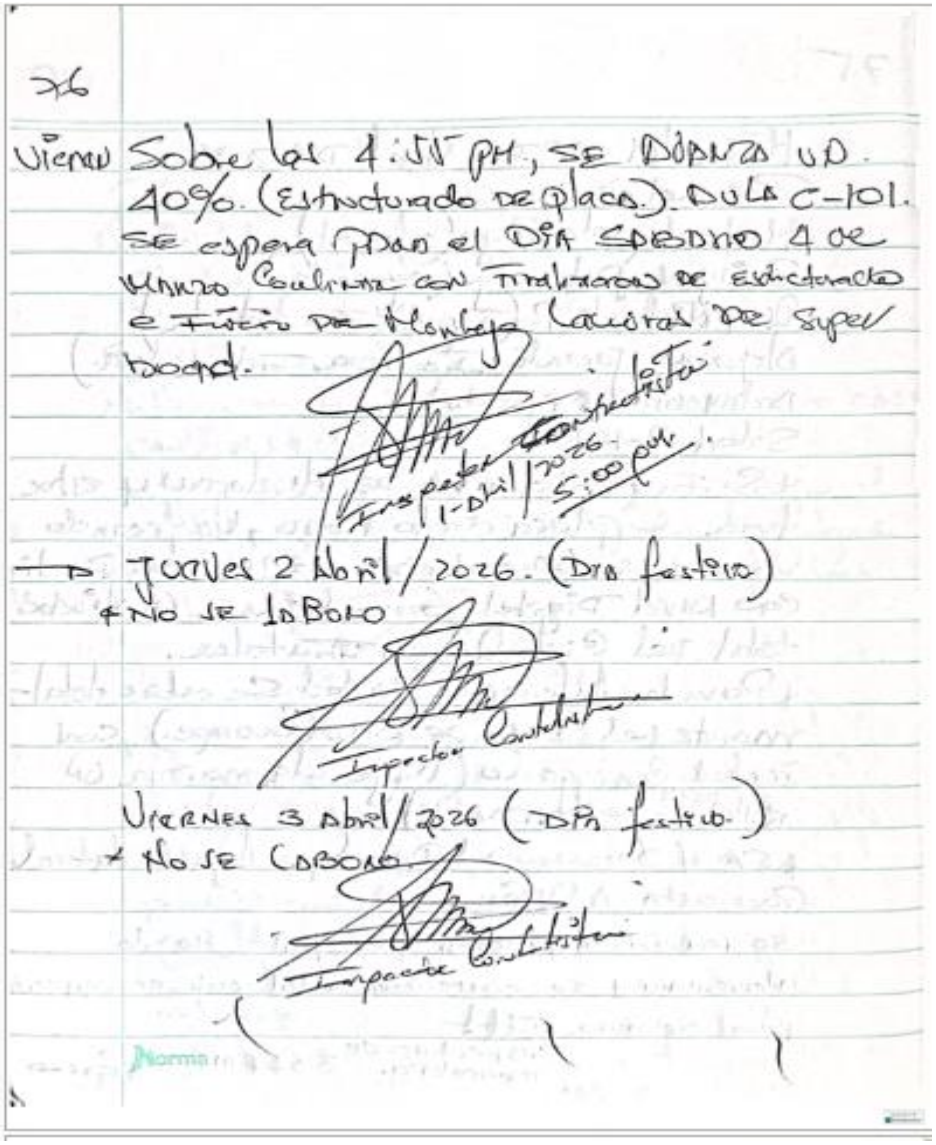

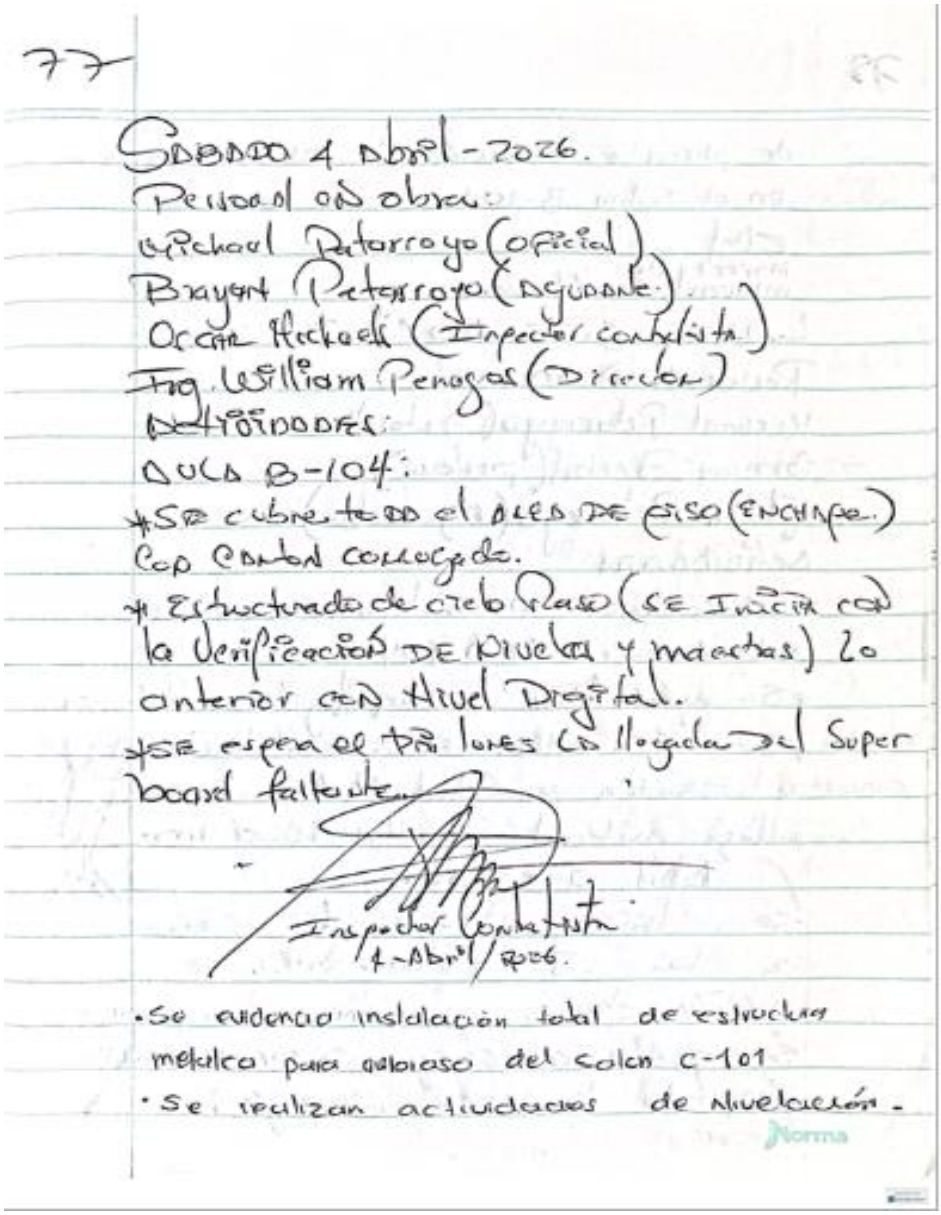

77

SABADO 4 Abril - 2026.

Personal en obra:

Michael Petarroyo (Oficial)

Brayan Petarroyo (Ayudante)

Oscar Hackett (Inspector contratista)

Ing. William Penagos (Director)


ACTIVIDADES:

AULA B-104:

* Se cubre todo el AREA DE PISO (ENCHAPE) con cantos cortados.
* Estructura de cielo raso (SE INICIA con la verificación DE NIVELES y muestras) lo anterior con Nivel Digital.
* SE espera el DIA lunes la llegada del Super board faltante.

Inspector Contratista
4-Abril/2026.

- Se evidencia instalación total de estructura metalica para cielo raso del salon C-101
- Se realizan actividades de Nivelación.

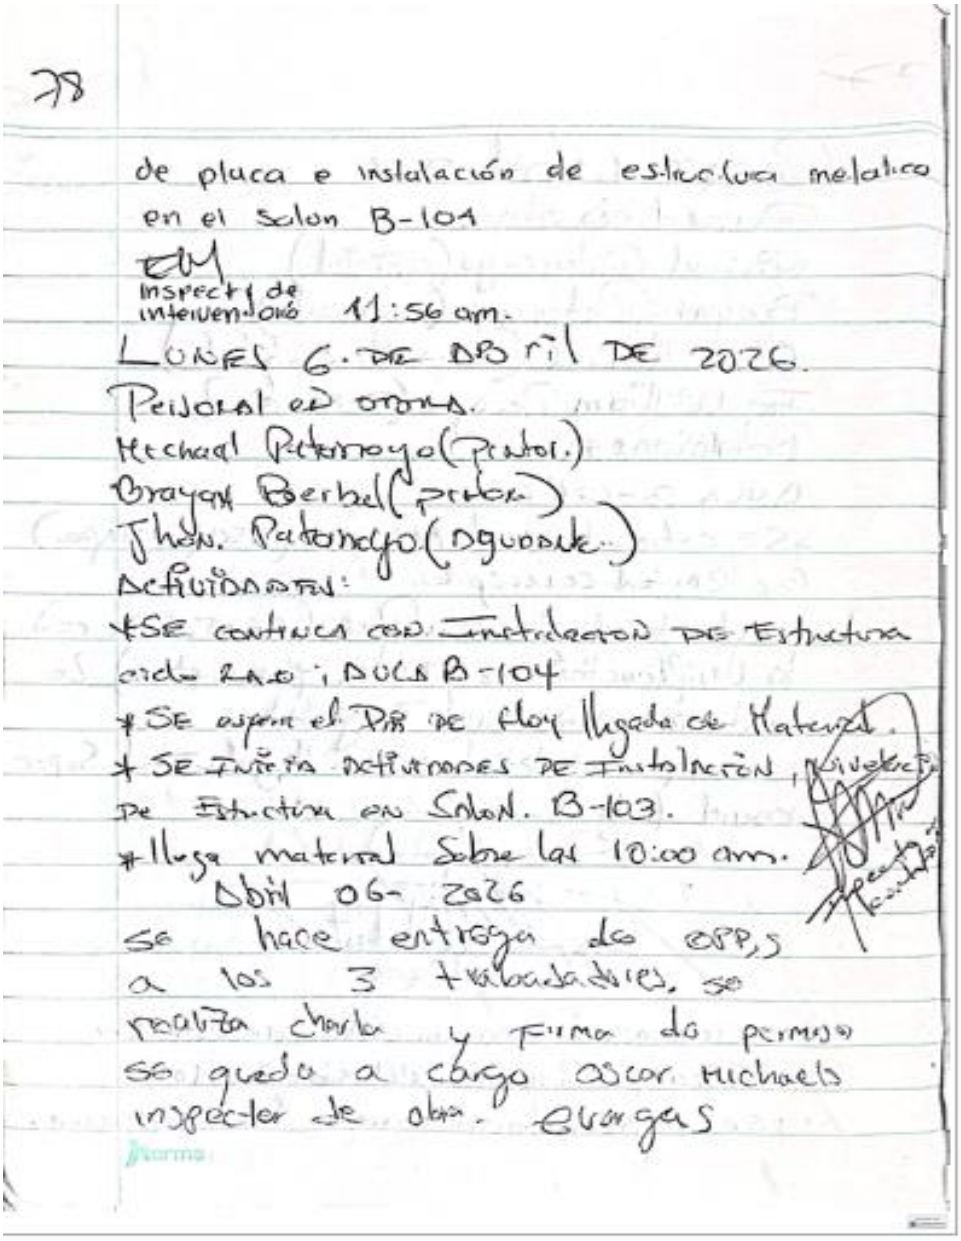

78

de placa e instalación de estructura metalica
en el salon B-104


EM
Inspect / de
intervento ría 11:56 am.

LUNES 6. DE ABRIL DE 2026.

Personal en obra.
Michael Palomeyo (Pintor.)
Brayan Berbel (pintor)
Jhon. Palomeyo (Ayudante.)

ACTIVIDADES:
*SE continua con instalacion de Estructura
en el RAS ; AULA B-104
* SE espera el DIA de Hoy llegada de Material.
* SE INICIA ACTIVIDADES DE Instalacion, Nivelacion
De Estructura en Salon. B-103.
* llega material Sobre las 10:00 am.

Abril 06- 2026
Se hace entrega de EPP,S
a los 3 trabajadores, se
realiza charla y Firma de permiso
se queda a cargo oscar Michael
inspector de obra. Exitosas

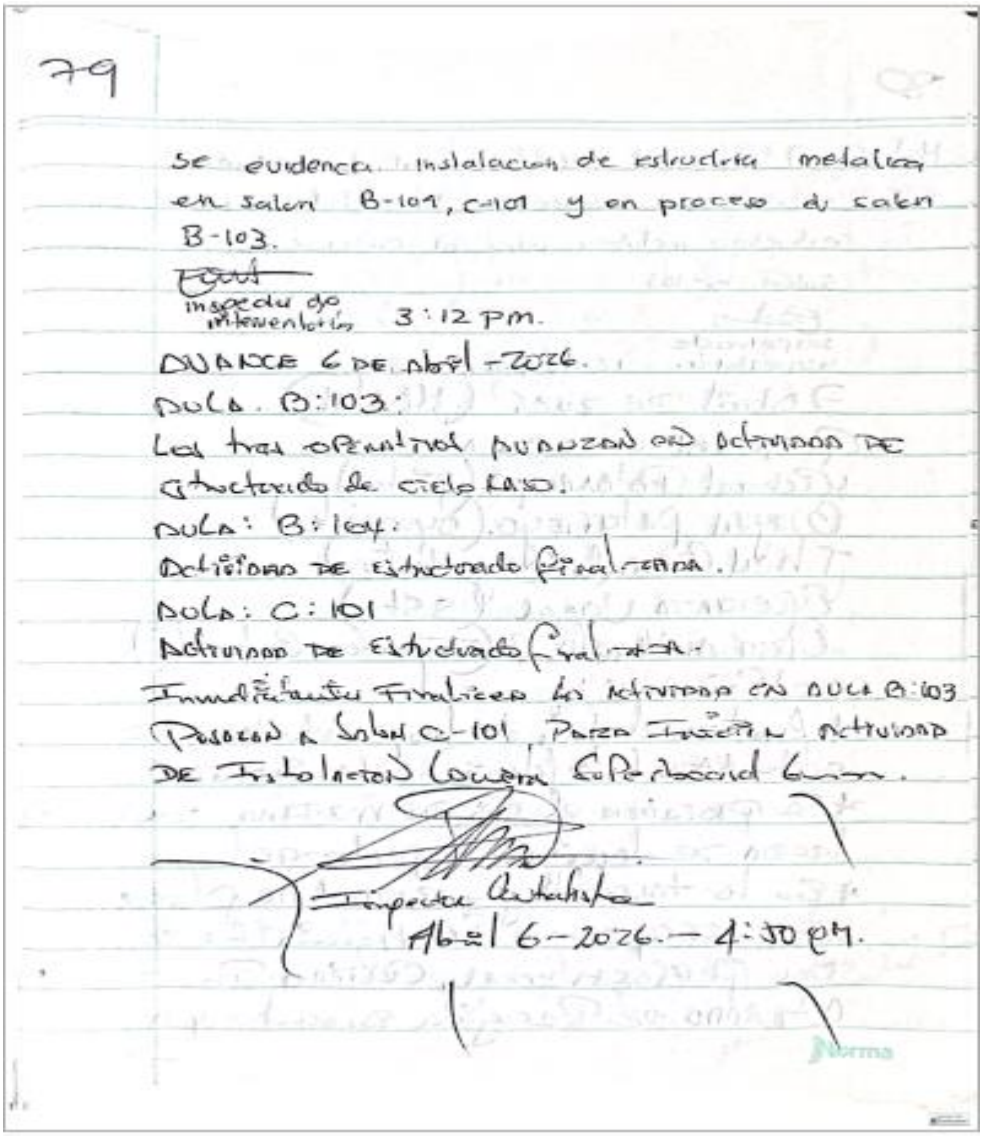

79

Se evidencia instalacion de estructura metalica en salon B-104, C-101 y en proceso de salon B-103.

Inspector de Interventoria 3:12 PM.

AVANCE 6 DE ABRIL - 2026.

AULA: B:103:

Los tres OPERATIVOS AVANZAN EN ACTIVIDADES DE Estructura de cielo RASO.

AULA: B:104.

Actividades de Estructura Final - TERMINADA.


AULA: C:101

Actividad de Estructura final - TERMINADA.

Inmediatamente Finalizan las actividades en AULA B:103 Pasaran a Salon C-101 para Iniciar actividad de Instalacion Lamina Superboard 6mm.

Inspector Contratista

Abril 6-2026. — 4:30 pm.

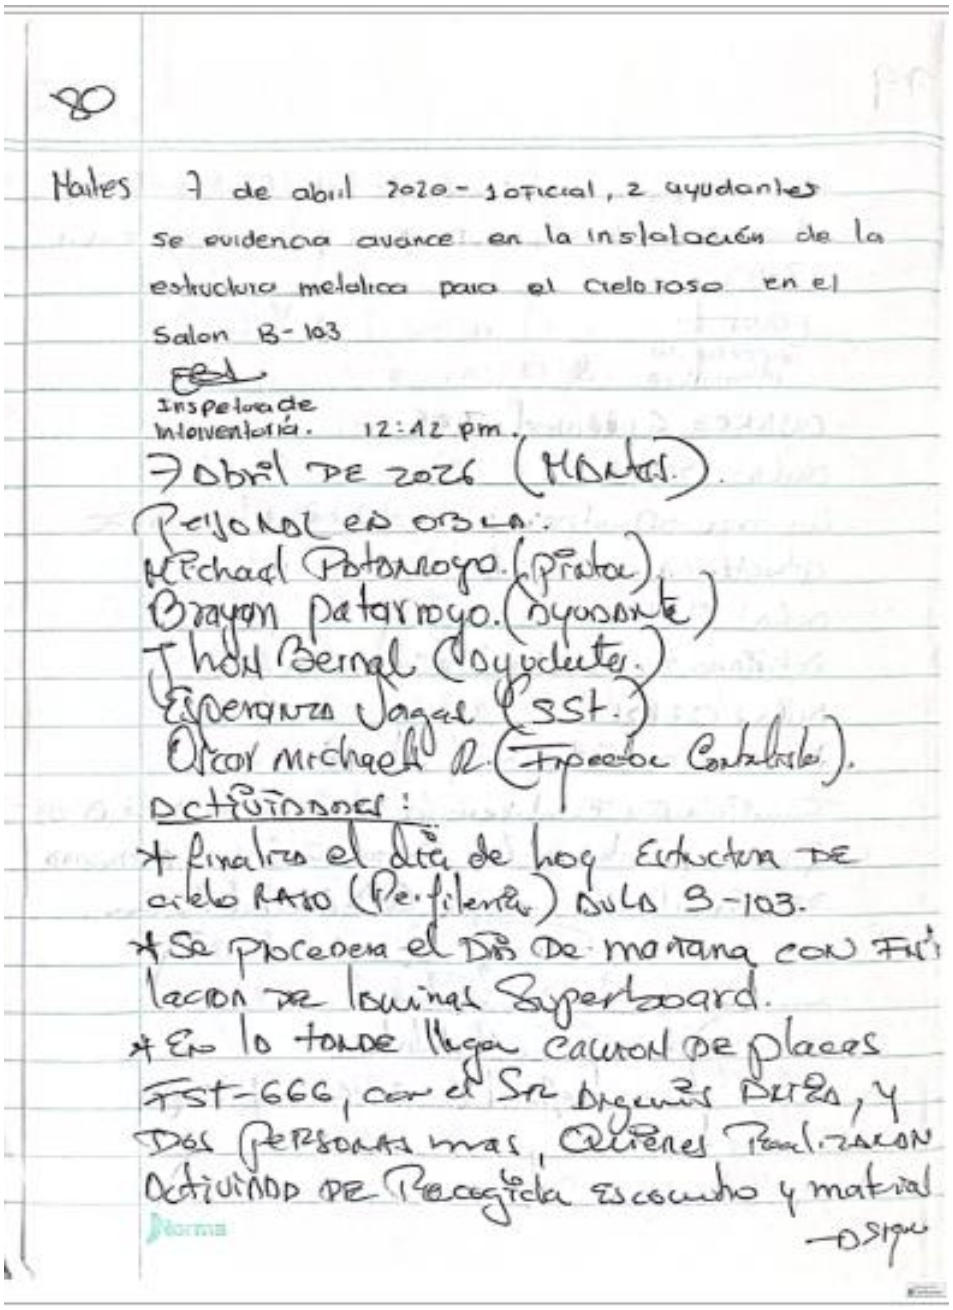


80

Martes 7 de abril 2026 - 1 oficial, 2 ayudantes
Se evidencia avance en la instalación de la estructura metalica para el cielo raso en el Salon B-103

Inspeccion de Interventoría. 12:12 pm.

7 abril DE 2026 (MARTES).
PERSONAL EN OBRA:
Richard Patarroyo. (Pintor)
Brayan patarroyo. (Ayudante)
Thom Bernal (Ayudante.)
Esperanza Jagual (SST.)
Oscar Michael R. (Inspector Contratista).
ACTIVIDADES:
* Finalizo el día de hoy Estructura DE cielo RASO (Perfilería) SALA B-103.
* Se procedera el Dia De mañana con Fijacion de laminas Superboard.
* En lo tarde llega camion de placas FST-666, con el Sr Dagoberto Reyes, y Dos personas mas, quienes realizaron Actividad de Recogida Escombro y material

Sigue

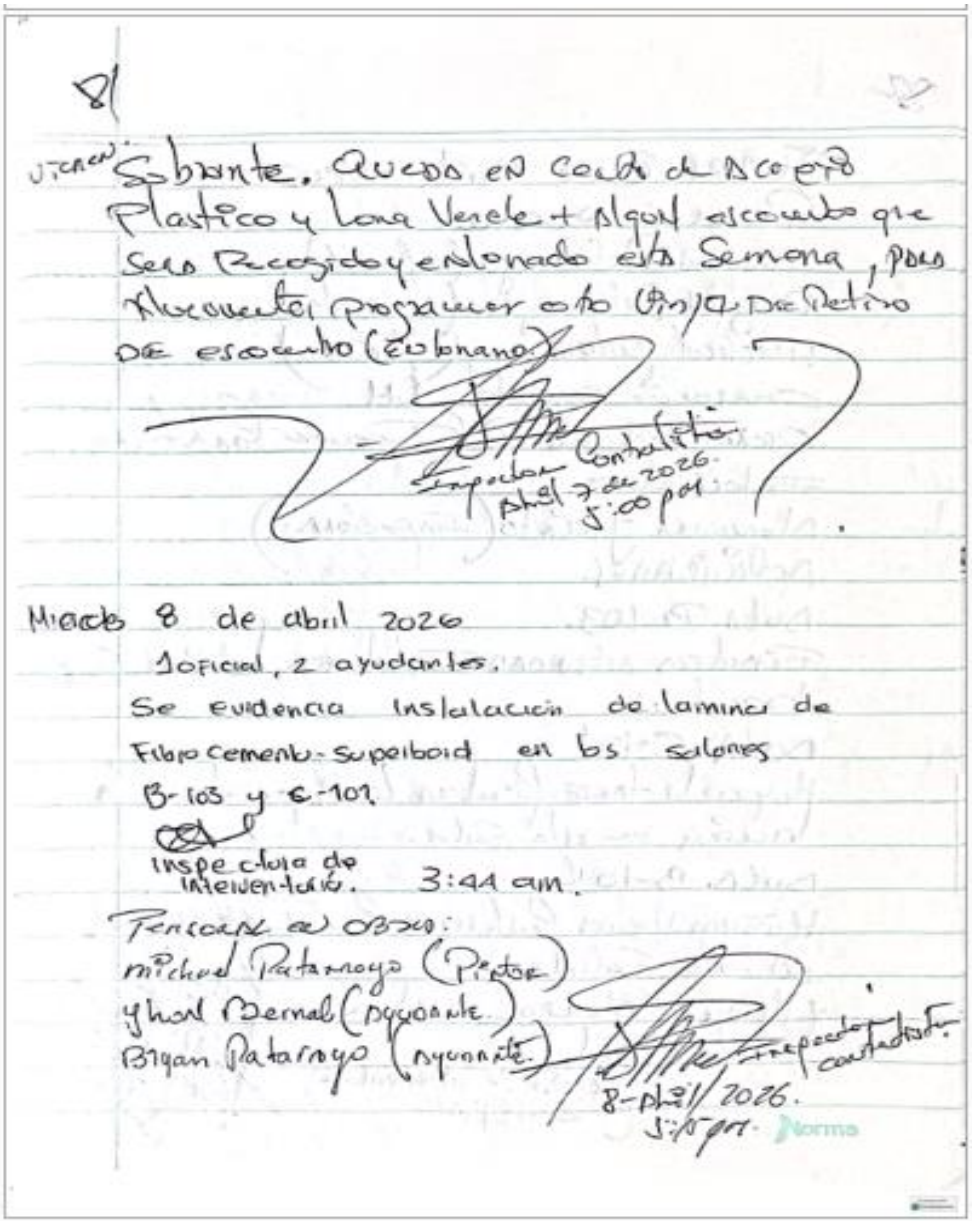

8/

Ubicación: Sobrante, Queda en Cocina de Acopio Plastico y Lona Verde + algun escombro que Seran Recogidos y entonado esta Semana, para Aumentar programar esto (Viaje) De Retiro de escombro (entonado)


Inspector Contratista
Abril 7 de 2026.
5:00 pm

Miercoles 8 de abril 2026
1 oficial, 2 ayudantes.
Se evidencia Instalacion de laminas de Fibrocemento - Superboard en los salones B-103 y B-107.

Inspectoria de Interventoria. 3:44 am.

Personal en Obra:
Michael Patarroyo (Pintor)
Yhon Bernal (ayudante)
Bryan Patarroyo (ayudante)

Inspector contratista
8-Abril/2026.
5:47 pm.

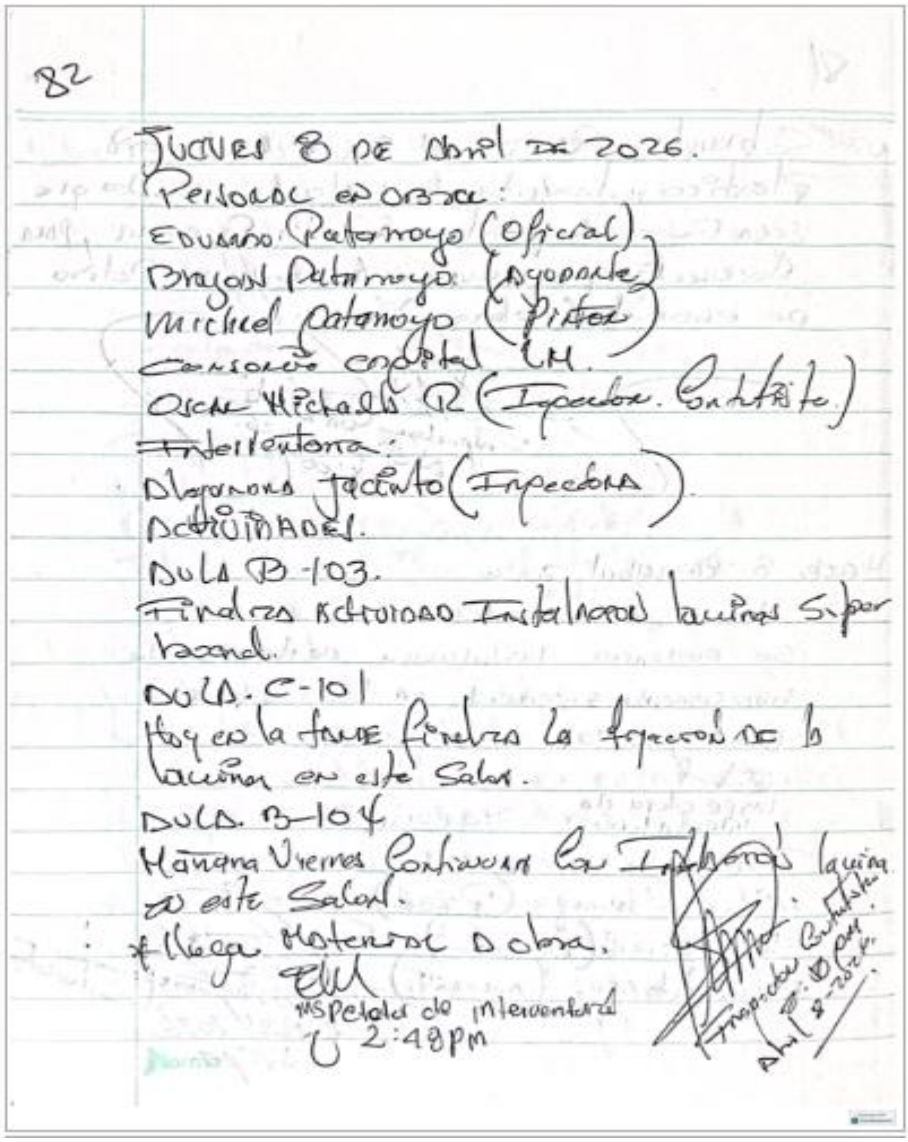


82

JUEVES 8 DE Abril DE 2026.
Personal en obra:
Eduardo Patarroyo (Oficial)
Brayan Patarroyo (Ayudante)
Michael Patarroyo (Pintor)
Carolina Capital LM.
Oscar Richard R (Inspector. Contratista)
~~Interventoria~~:
Alejandra Jacinto (Inspectora)
ACTIVIDADES.
DUCTA B-103.
Finalizo ACTIVIDAD Instalacion lamina Superboard.
DUCTA. C-101
Hoy en la tarde finalizo la instalación de la lamina en este Salon.
DUCTA. B-104
Mañana Viernes Continuare con Instalación lamina en este Salon.
* Llega Materiales a obra.

Inspector Contratista.
C.C. 1.020...
Abril 8-2026.

Inspectora de interventoria
2:48pm

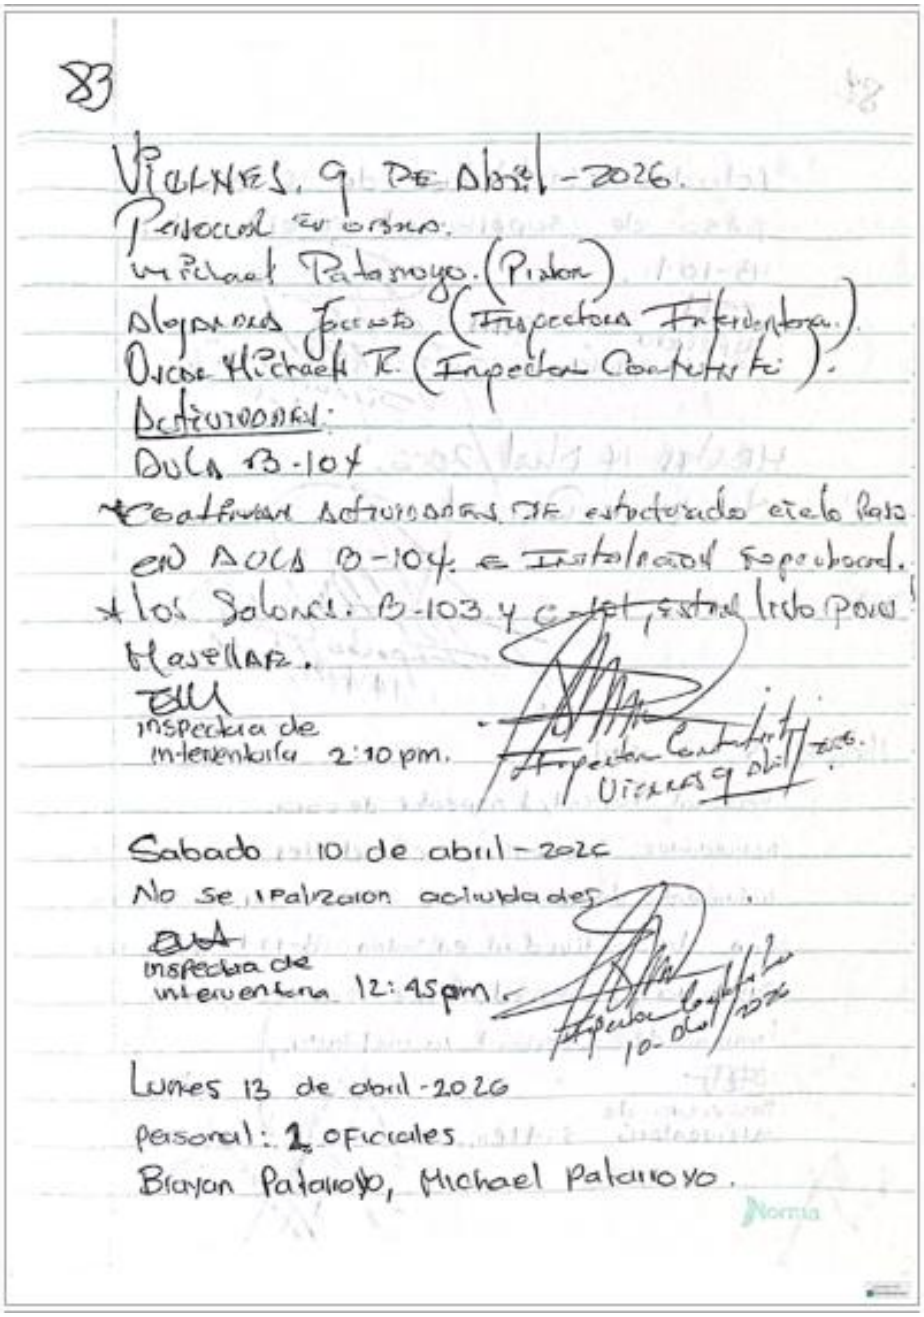


83

VIERNES, 9 DE Abril - 2026.
Personal en obra.
Michael Patarroyo. (Pintor)
Alejandra Forero (Inspectora Interventoría)
Oscar Michael R. (Inspector Contratista).
Actividades:
DUCA B-104
*Continuar actividades de estucado etapa final en DUCA B-104. e Instalación tapacboard.
* los salones B-103 y Cafet, estan listo para!
Resanar.
Inspectora de interventoría 2:10 pm.
Inspector Contratista 2026. Viernes 9 abril

Sabado 10 de abril - 2026
No se realizaron actividades.
Inspectora de interventoría 12:45 pm.
Inspector Contratista 10- abril 2026

Lunes 13 de abril - 2026
personal: 1 oficiales
Brayan Patarroyo, Michael Patarroyo.

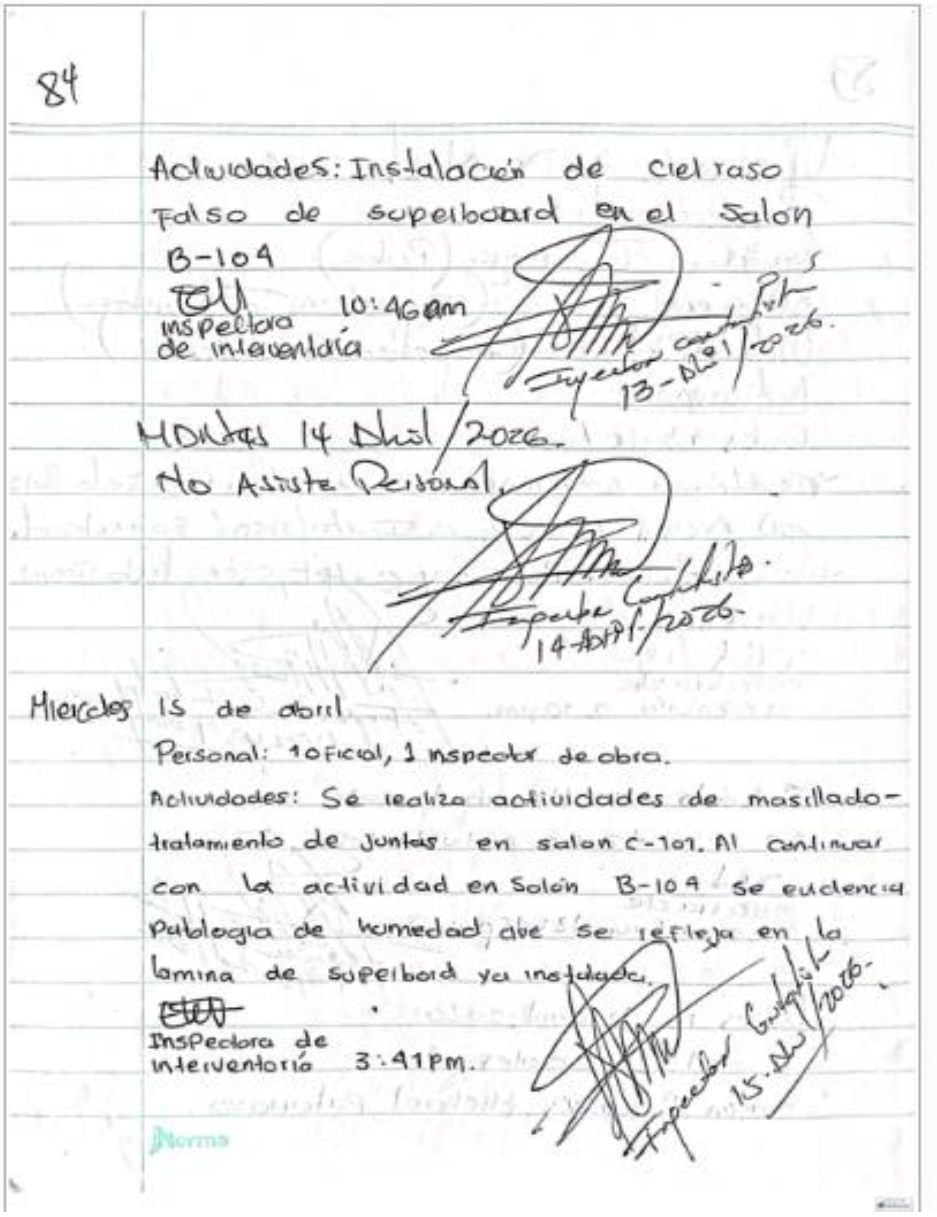

84

Actividades: Instalación de cielraso Falso de superboard en el salon B-109

Inspectora de interventoría 10:46am

Inspector contratista 13-Abril/2026.

MONTAS 14 Abril/2026.

No Asiste Personal.

Inspector Contratista. 14-Abril/2026.


Miercoles 15 de abril

Personal: 1 oficial, 1 inspector de obra.

Actividades: Se realiza actividades de masillado-tratamiento de juntas en salon C-107. Al continuar con la actividad en Salon B-109 se evidencia Patologia de humedad, que se refleja en la lamina de superboard ya instalada.

Inspectora de interventoría 3:41pm.

Inspector Contratista 15-Abril/2026.

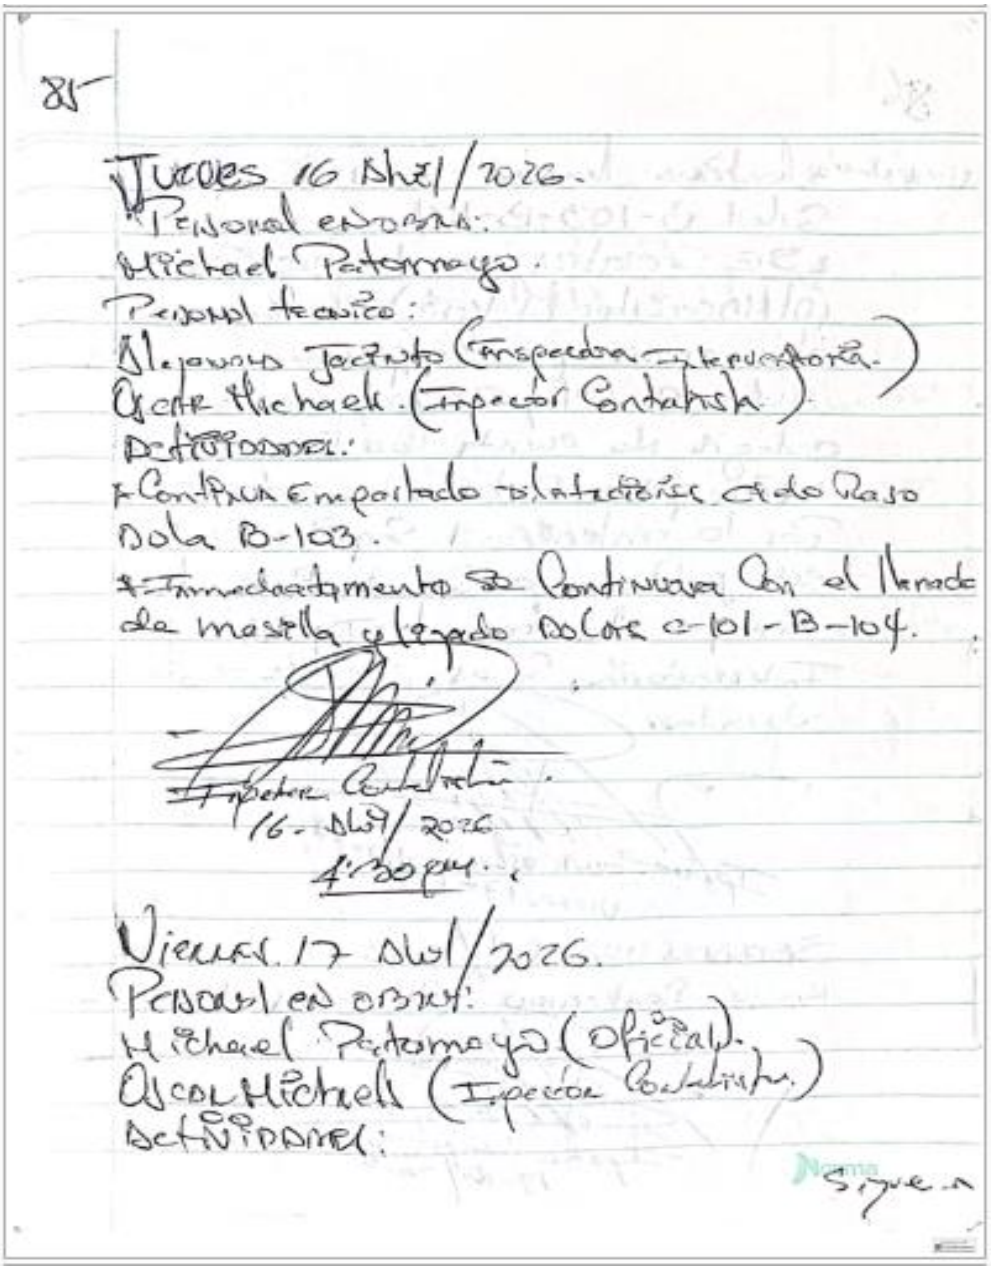


85

JUEVES 16 Abril/2026.
PERSONAL EN OBRA:
Michael Patarroyo.
PERSONAL TECNICO:
Alejandra Jacinto (Inspectora Interventoría.)
Oscar Michaell. (Inspector Contratista)
ACTIVIDADES:
* Continua Empotrado tubería Cielo Raso Aula B-103.
* Inmediatamente se Continuara con el llenado de mastik y lijado Aulas B-101 - B-104.

Inspector Contratista.
16 - Abril/2026
4:30 pm.

VIERNES 17 Abril/2026.
PERSONAL EN OBRA:
Michael Patarroyo (Oficial).
Oscal Michaell (Inspector Contratista.)
ACTIVIDADES:

Sigue...

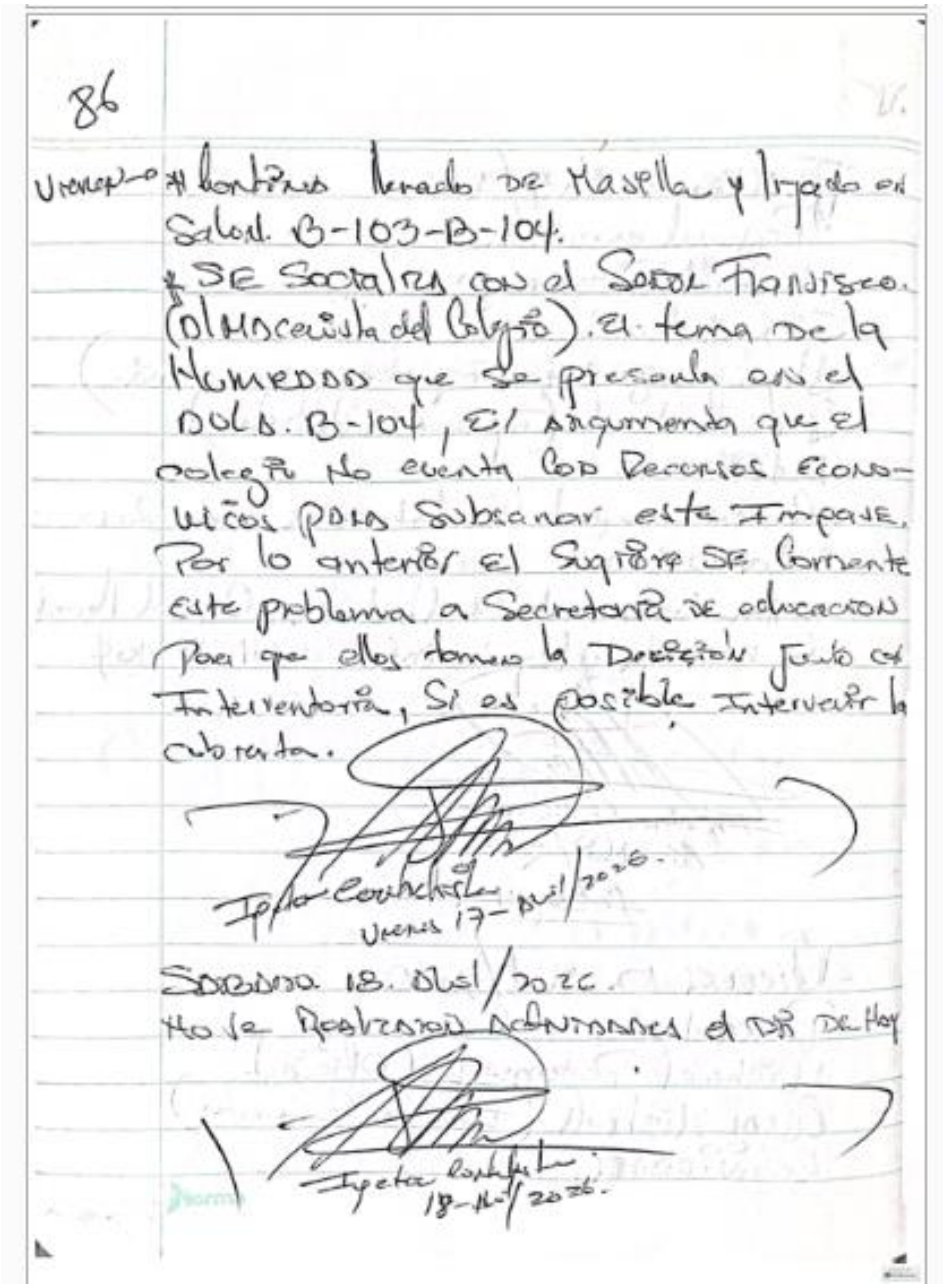

86


Viernes 17 - Abril - Continuan llenado de Hoja de vida y Impacto en Salud. B-103-B-104.

- SE Socializa con el Señor Francisco. (Dl Mascota del Colegio). El tema de la HUMEDAD que se presenta en el BLQ. B-104, El argumenta que el colegio no cuenta con Recursos Económicos para subsanar este Impacto. Por lo anterior el Supervisor SE Comente este problema a Secretaría de educación para que ellos tomen la Decisión junto con Interventoría, Si es posible Intervenir la cubierta.

Ingeniero Residente
Viernes 17 - Abril / 2026.

Sabado 18. Abril / 2026.
No se Realizaron Actividades el Dia de Hoy

Ingeniero Residente
18 - Abril / 2026.

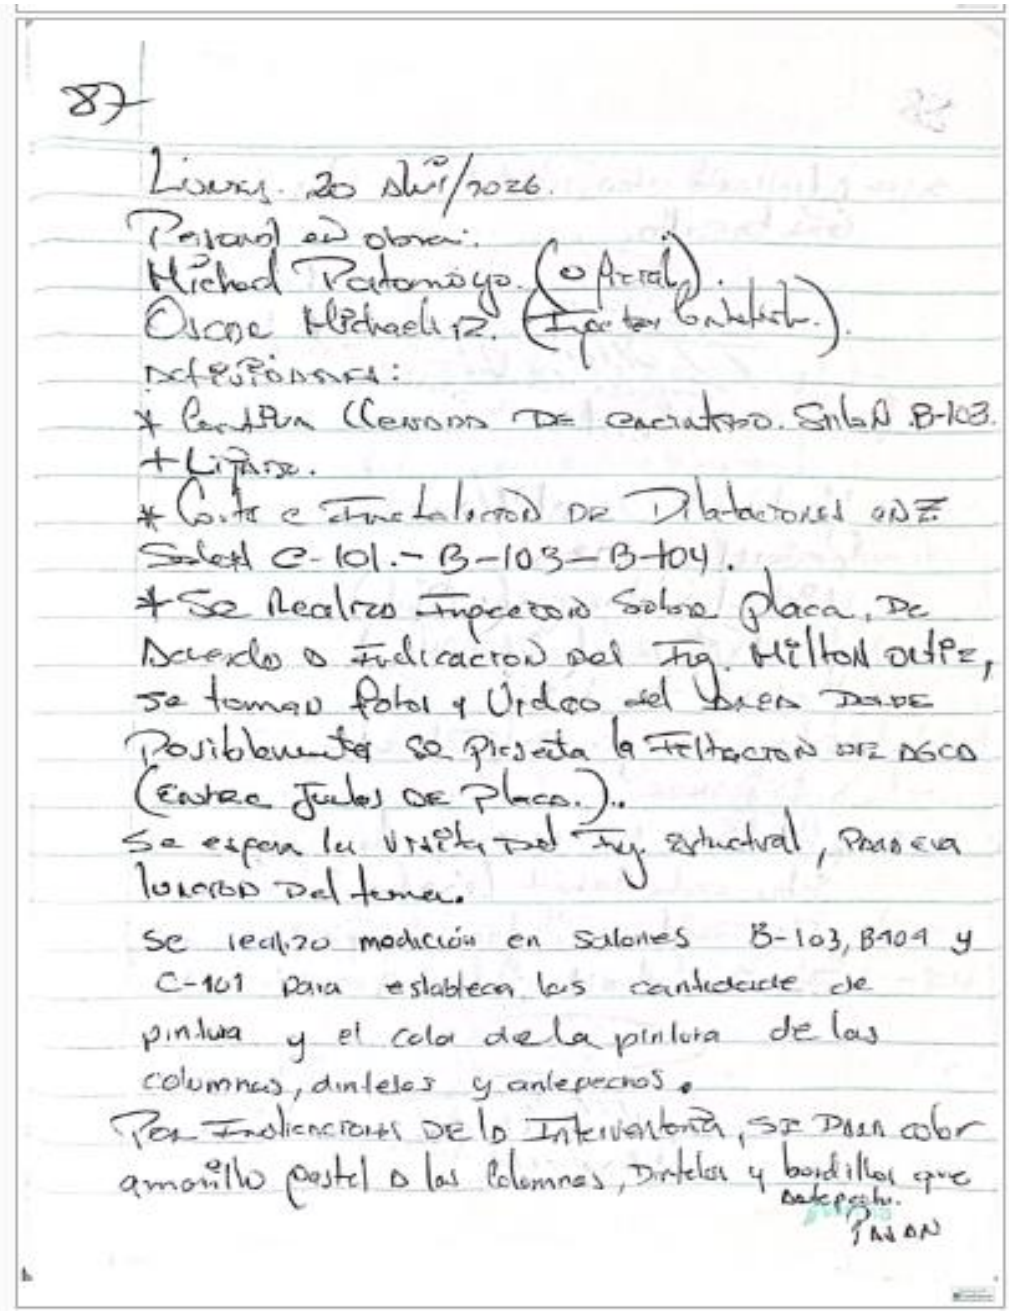


87

Lunes. 20 Abril/2026.

Reunión en obra:
Michael Palomeque. (Oficial).
Oscar Michaelis R. (Inspector Contratista).

ACTIVIDADES:

* Recepción Concreto de Contratista. Salón B-103. + Lizas.
* Corte e Instalación de Dilataciones en Salón C-101. - B-103 - B-104.
* Se Realizo Inspección Sobre placa, De Acuerdo a Indicación del Ing. Milton Ortiz, se toman Fotos y Video del Area Donde Posiblemente se Picara la Filtración en Losa (entre Ejes de Placa.).
Se espera la Visita del Ing. Estructural, Para la Toma del Tema.
Se realizo medición en Salones B-103, B-104 y C-101 para establecer las cantidades de pintura y el color de la pintura de las columnas, dinteles y antepechos.
Por Indicaciones de la Interventoría, se Pasa color amarillo Postel a las Columnas, Dinteles y bordillos que antepechos.

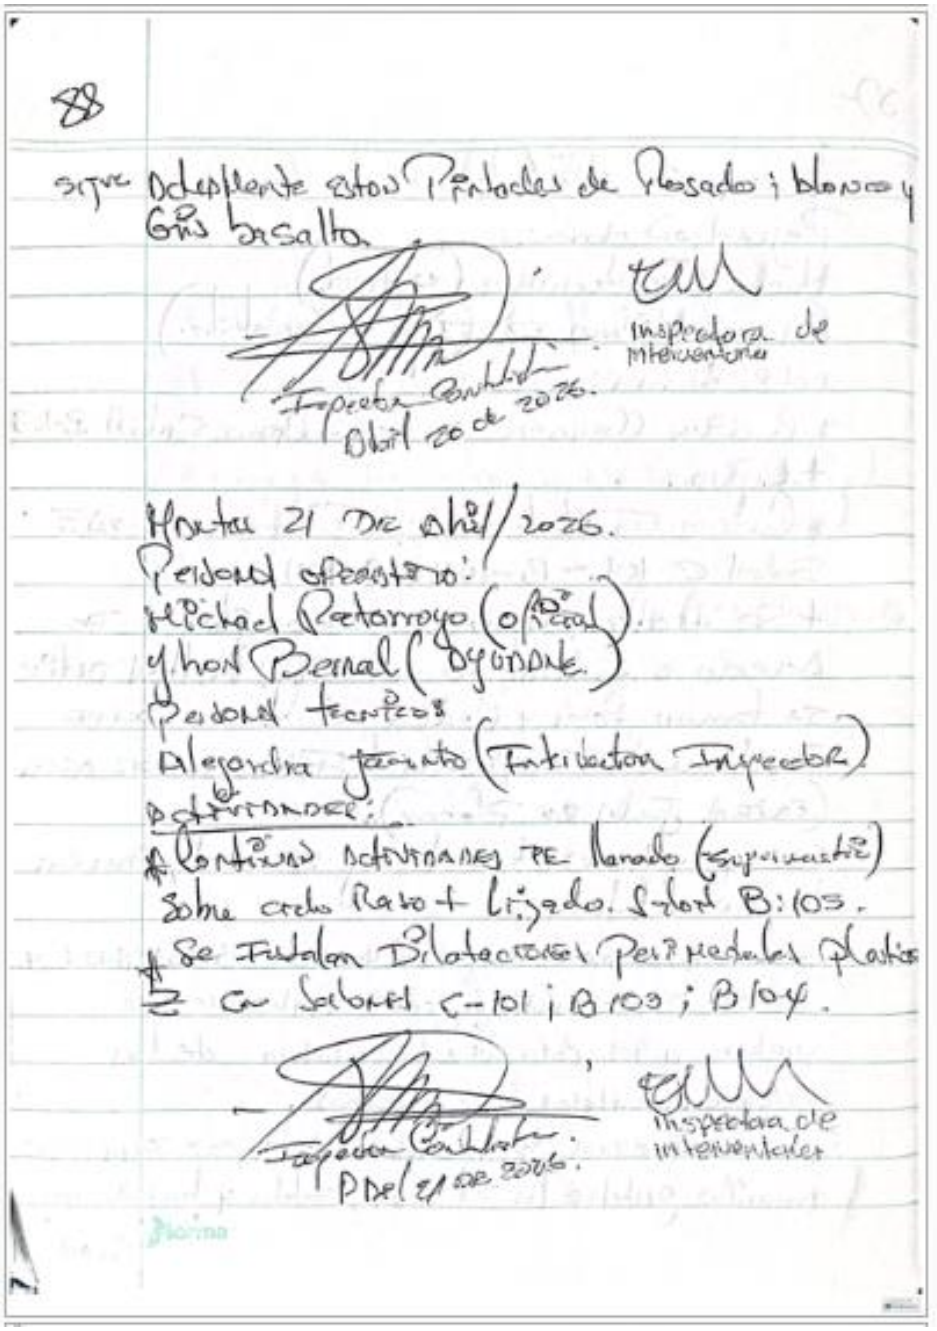

88

Sigue Actualmente estan Pintados de Resanado y blanco y Gris basalto.


Inspectora de Interventoria

Inspector Contratista
Abril 20 de 2026.

Martes 21 Dic abril / 2026.
Personal operativo:
Michael Patarroyo (oficial).
Yhon Bernal (Ayudante)
Personal tecnico:
Alejandra Jaramillo (Practicante Inspector)
Actividades:
* Continua actividades de Resanado (Superficie) Sobre cielo Raso + Lijado. Salon B:103.
* Se Finalan Dilataciones Perimetrales Plastico en Salones C-101 ; B 103 ; B 104.

Inspector Contratista.
Abril 21 de 2026.

Inspectora de Interventoria

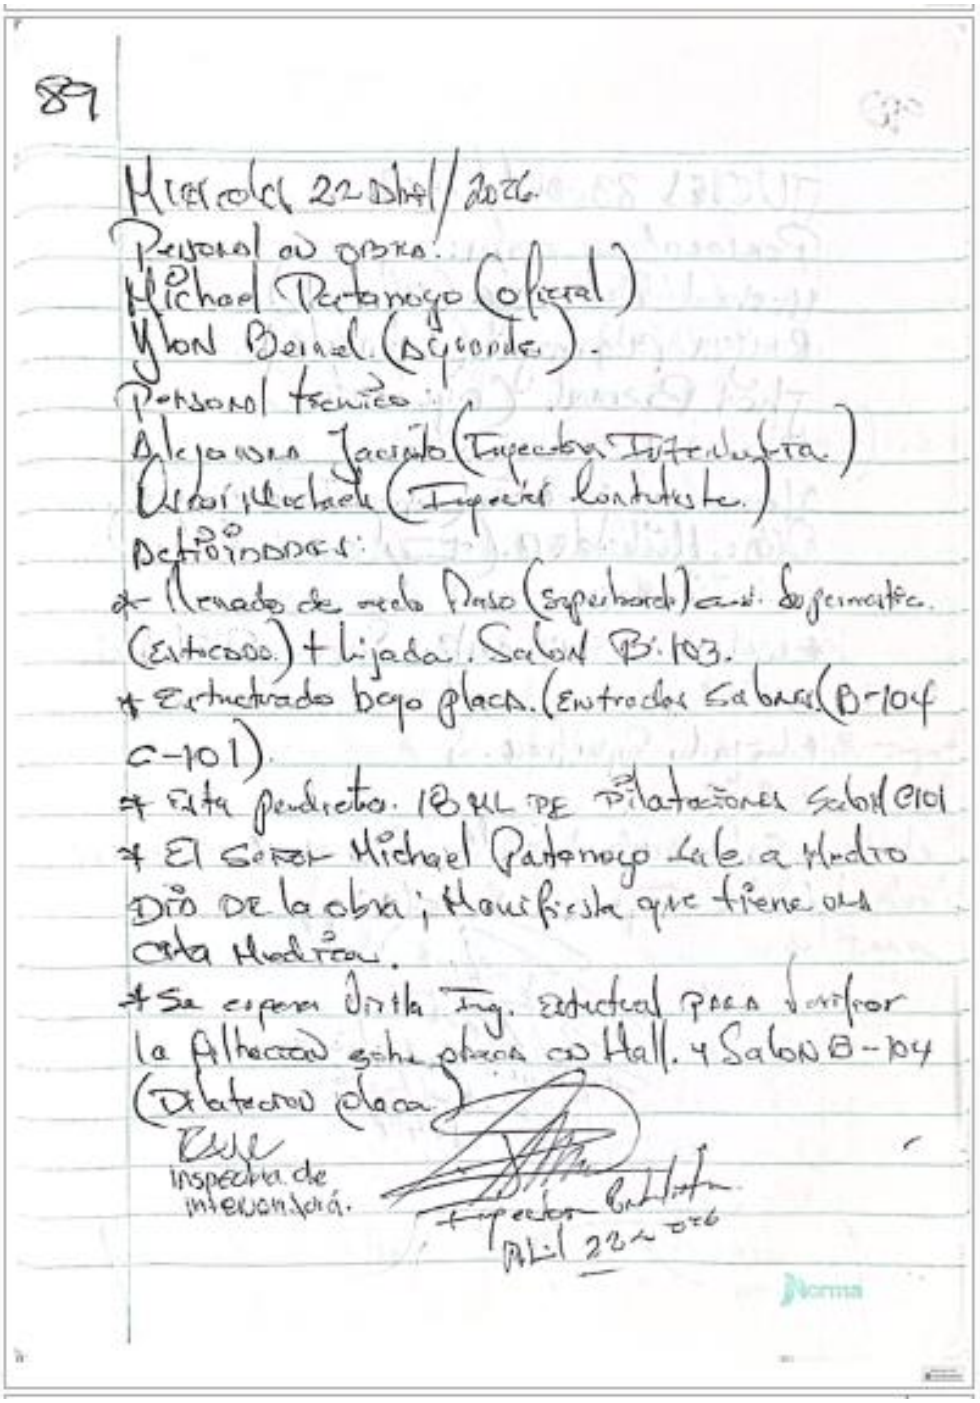

89

Miercoles 22 Abril / 2026.

Personal en obra.

Michael Patarroyo (oficial)

Yhon Bernal (Ayudante).

Personal técnico:

Alejandra Jacinto (Inspectora Interventoría)

Oscar Machado (Ingeniero Residente)


Actividades:

* Llenado de vacio Piso (Superboard) con hojas metálicas. (Entrecaño) + lijada. Salón B-103.
* Estructurado bajo placa. (Entrecaño Salones B-104 C-101).
* Falta pendiente. 18 ML DE Dilataciones Salón C101
* El señor Michael Patarroyo Lale a Medio Día de la obra; Manifiesta que tiene una cita Medica.
* Se espera Visita Ing. Estructural para verificar la Afectación en esta placa en Hall. y Salón B-104 (Dilatación placa)

Inspectora de intervención.

Inspectora


Abril 22 - 2026

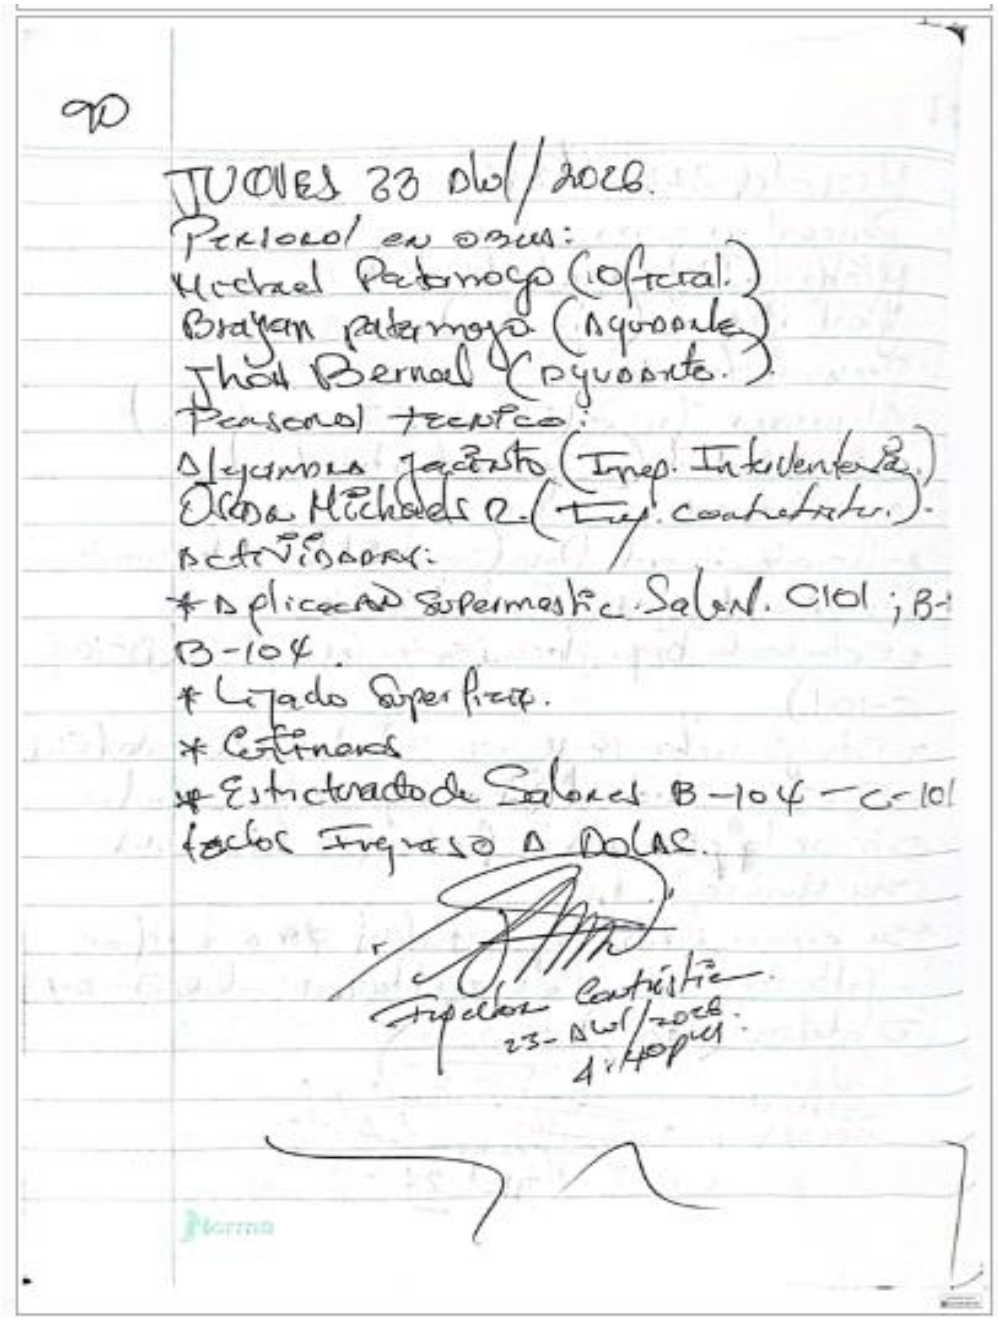

90

JUEVES 23 Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Palomeque (Oficial.)
Brayan palomeque (Ayudante)
Thai Bernal (Ayudante.)
Personal tecnico:
Alejandra Jacinto (Insp. Interventoría.)
Olga Michaels R. (Ing. contratista.)
Actividades:
* Aplicacion Supermastic Salon. C101 ; B-
B-104.
* Lijado Superficie.
* Estucada
* Estructurado de Salones B-104 - C-101
Techos Ingreso a DOLAS.

Inspector Contratista
23-Abril/2026.
4:40pm

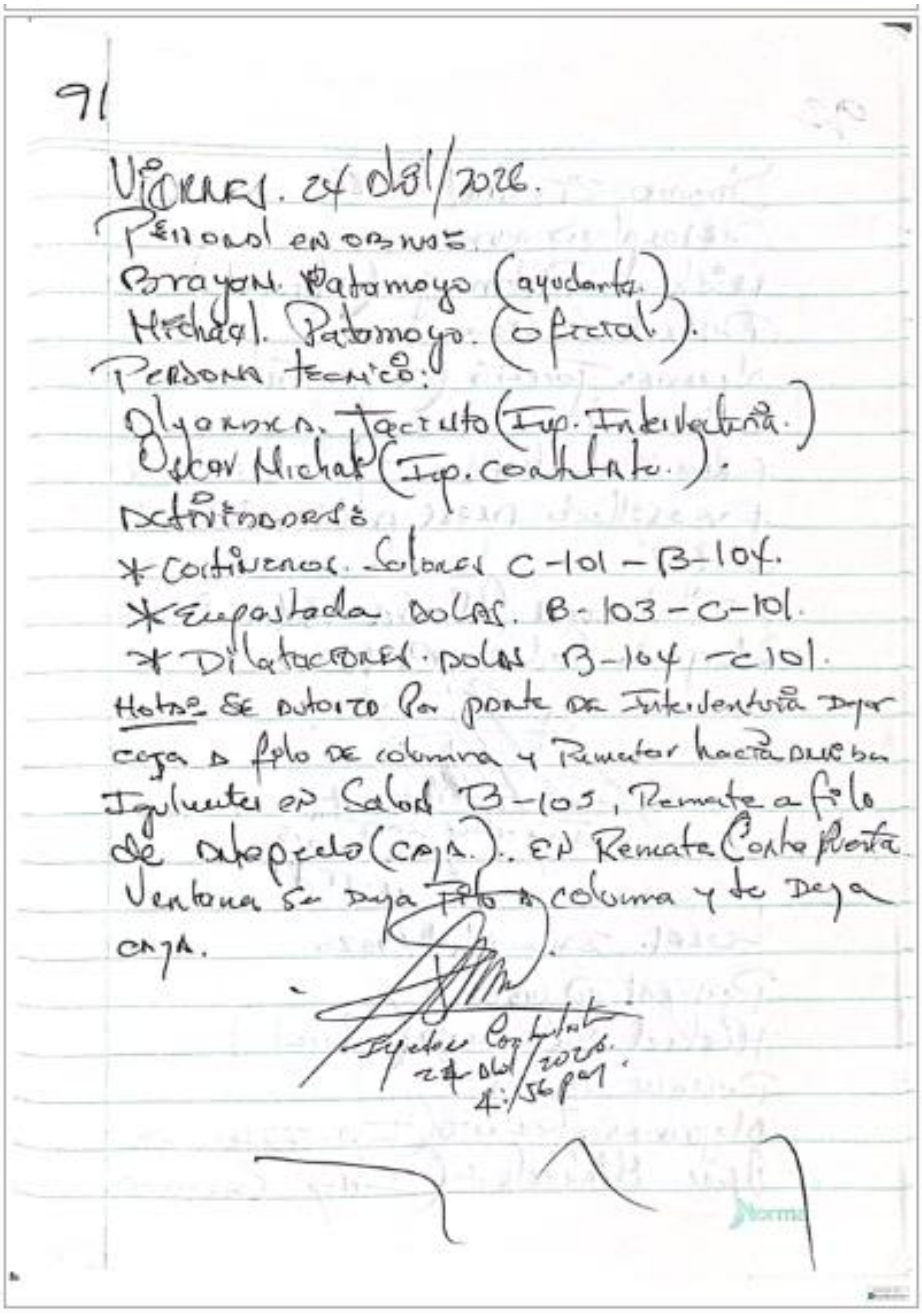

91

VIERNES. 24 Abl/2026.

PERSONAL EN OBRAS:

Brayan. Patamoya (ayudante).

Michael. Patamoya. (oficial).

PERSONA TECNICO:

Alexandra. Jaramillo (Fup. Interventoría.)


Oscar Michat (Fup. contratista).

ACTIVIDADES:

* Continuamos. Soldar C-101 - B-104.
* Empastada. DOLAS. B-103 - C-101.
* Dilataciones. DOLAS B-104 - C101.

Hoy: SE AUTORIZO Por parte de Interventoría Dejar caja a filo de columna y Rematar hacia DENTRO Igualmente en Salon B-103, Remate a filo de antepecho (caja). En Remate Contra fuerte Ventana se Deja Filo a columna y se Deja caja.

Ingeniero Contratista
24 Abl/2026.
4:56 pm.

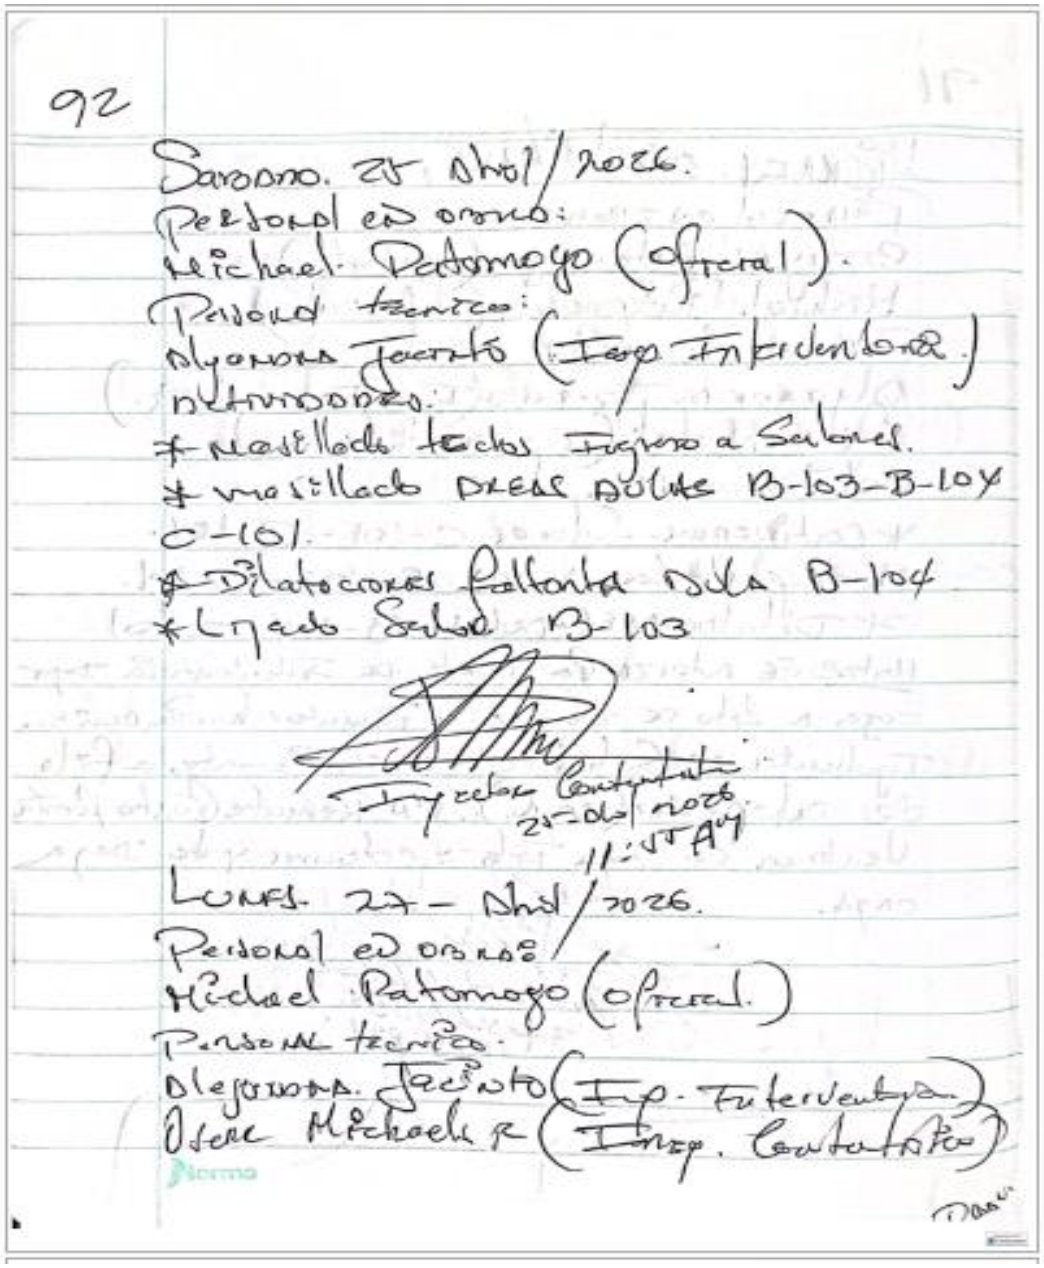


92

Sabado. 25 Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo (oficial).
Personal tecnico:
Alejandra Jacinto (Ing. Interventoria)
Actividades:
* Instalado techos Ingreso a Salones.
* Instalado DRENAJE DUCTOS B-103-B-104
C-101.
* Dilatadores Fachada Ducto B-104
* Ligado Salon B-103

Ingeniero Contratista
25-Abril-2026.
11:47 AM

Lunes. 27 - Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo (oficial.)
Personal tecnico.
Alejandra. Jacinto (Ing. Interventoria)
Oscar Michael R (Ingeniero Contratista)

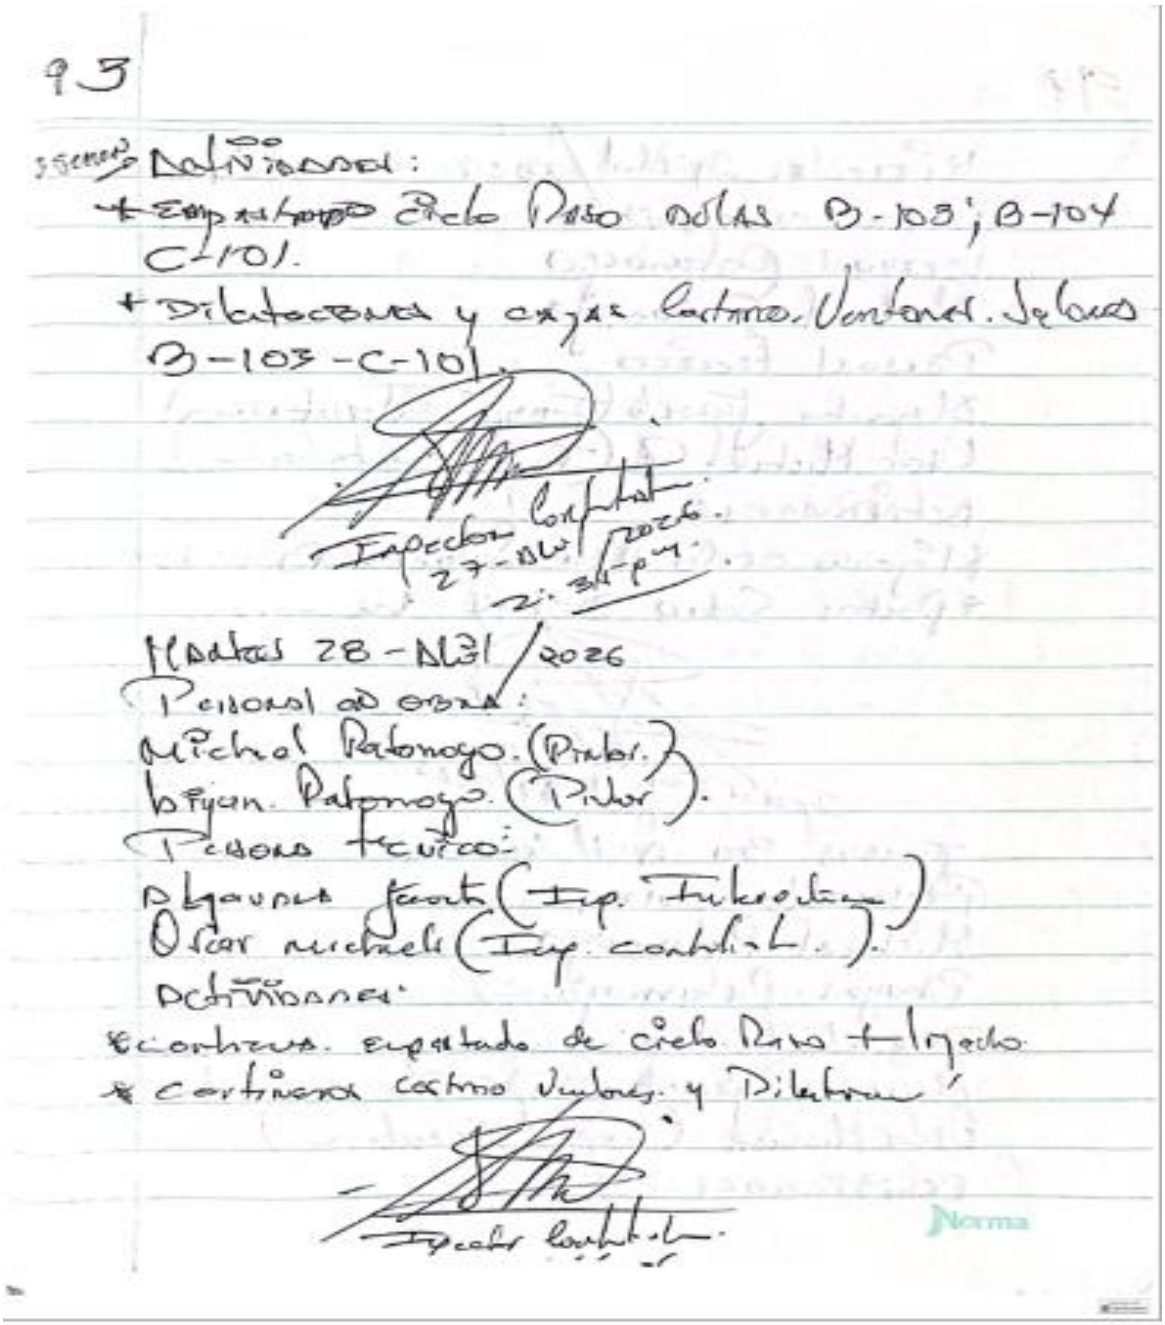

93

Actividades:
+ Empastado Circo Roso Bolas B-103; B-104 C-101.
+ Dilataciones y cajas Cortinas. Ventanas. Jardines B-103 - C-101.

Inspector contratista.
27-ABR/2026.
2:38 p.m.

Fecha 28-ABR/2026
Personal de obra:
Michael Palomeque. (Pintor.)
Bryan Palomeque. (Pintor).
Personal técnico:
Alejandra Jaramillo (Ing. Ambiental)
Oscar Michaeli (Ing. contable.).
Actividades:
Cortinas. empastado de Circo Roso + Ingreso
+ cortinas Cortinas Ventanas. y Dilataciones.

Inspector contratista.

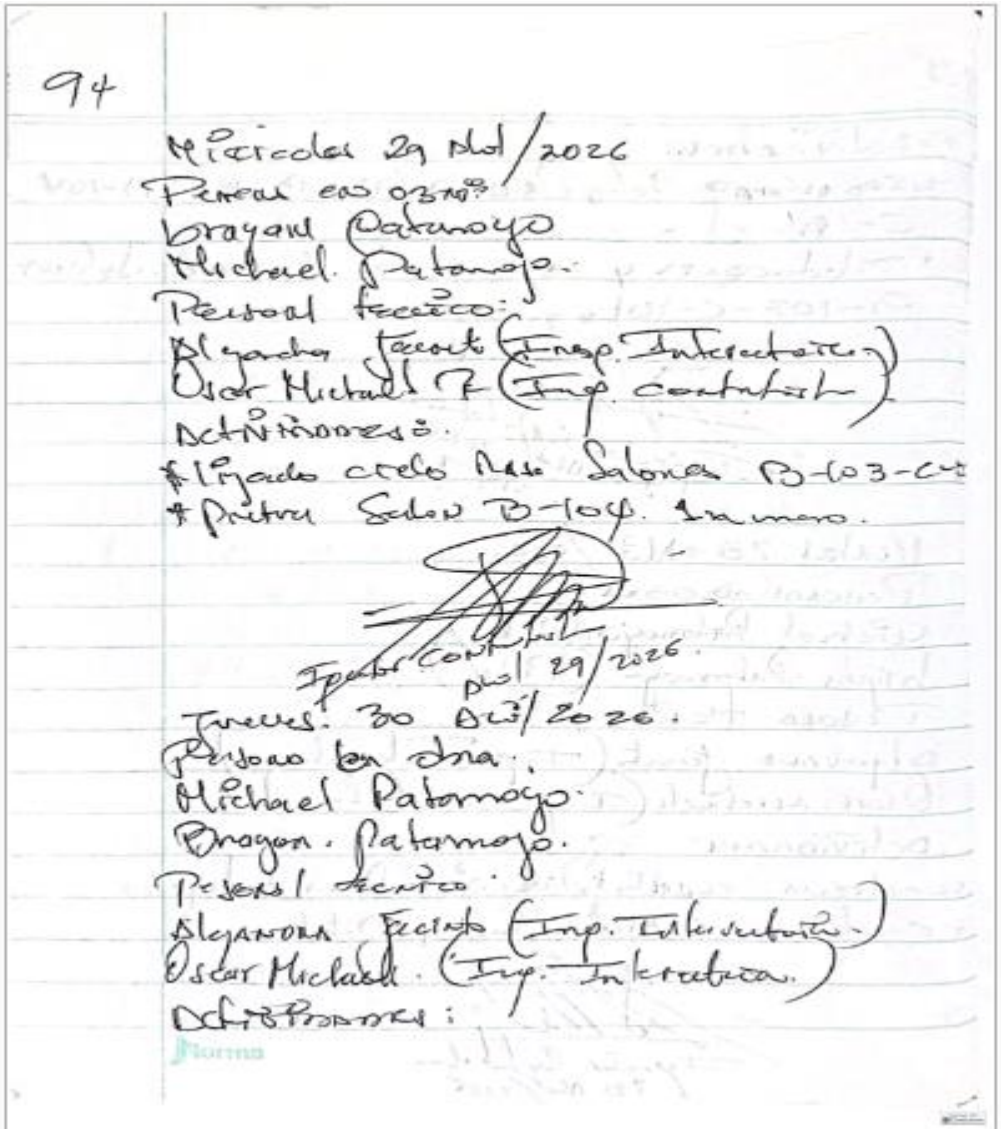



94

Miércoles 29 Abril / 2026
Personal en obra:
Brayan Patarroyo
Michael Patarroyo.
Personal técnico:
Alejandra Fecuto (Ingp. Interventoría)
Oscar Michael F (Ing. contratista)
Actividades:
* Pegado cielo raso Salones B-103-C
* Pintura Salon B-104. 1a mano.

Ingeniero Contratista
Abril 29/2026.

Jueves: 30 Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo.
Brayan. Patarroyo.
Personal técnico.
Alejandra Fecuto (Ingp. Interventoría)
Oscar Michael. (Ing. Interventoría.)
Actividades:

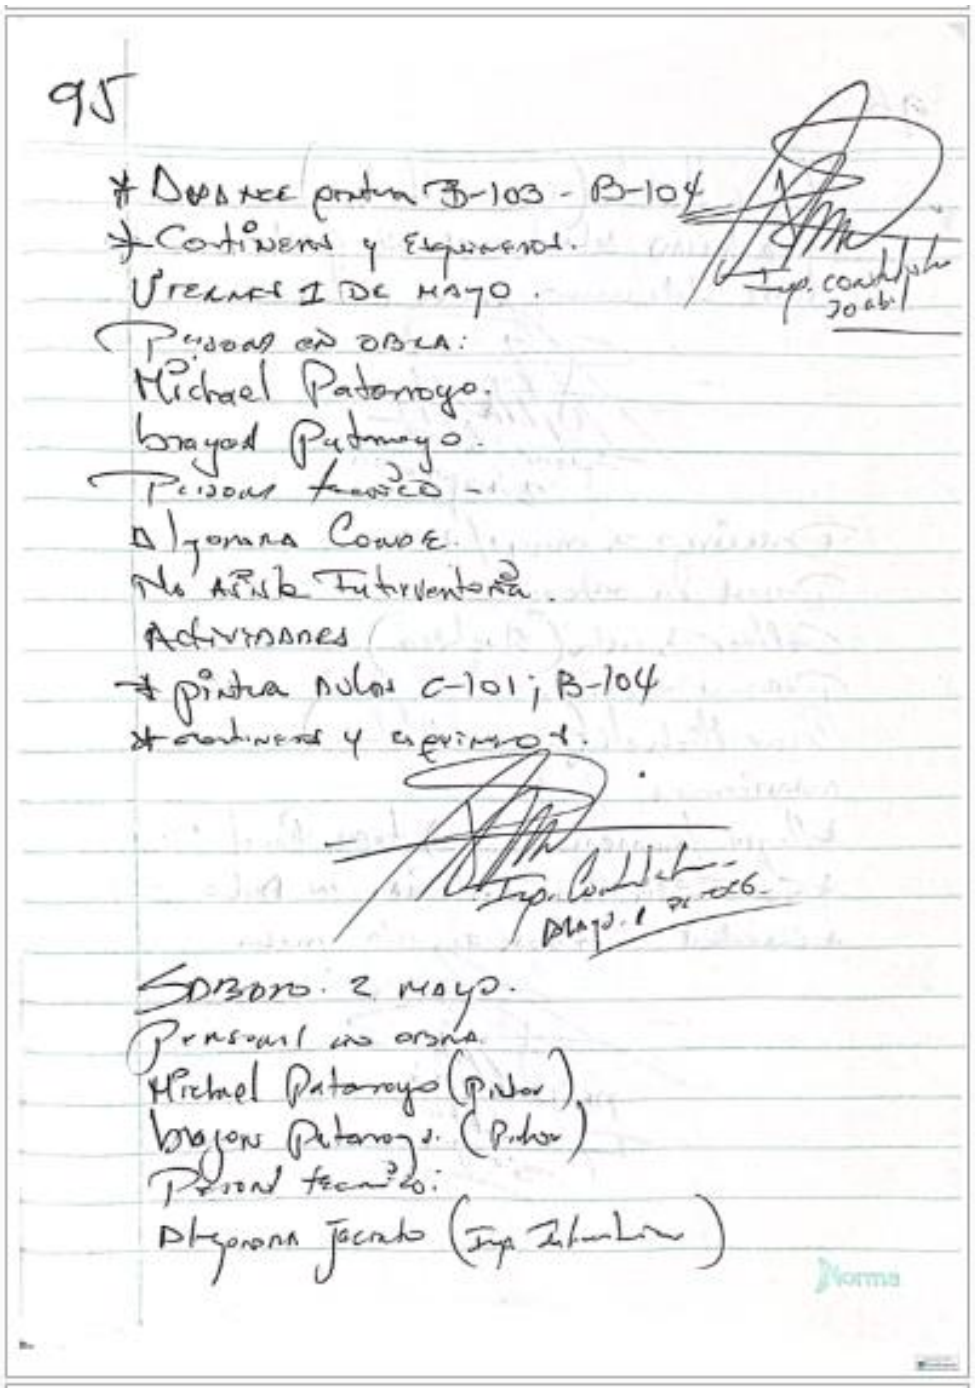
95
* Obra nce pintura B-103 - B-104
* Continuar y Equipamiento.
VIERNES 1 DE MAYO.
Personal en OBRA:
Michael Patarroyo.
Brayan Patarroyo.
Personal técnico -
Alejandra Conde.
No Aplica Interventoría.
Actividades
* pintura Aulas C-101; B-104
* continuar y equipamiento.
Sabado. 2 mayo.
Personal en obra.
Michael Patarroyo (Pintor)
Brayan Patarroyo. (Pintor)
Personal técnico:
Alejandra Jacinto (Ing Interventoría)

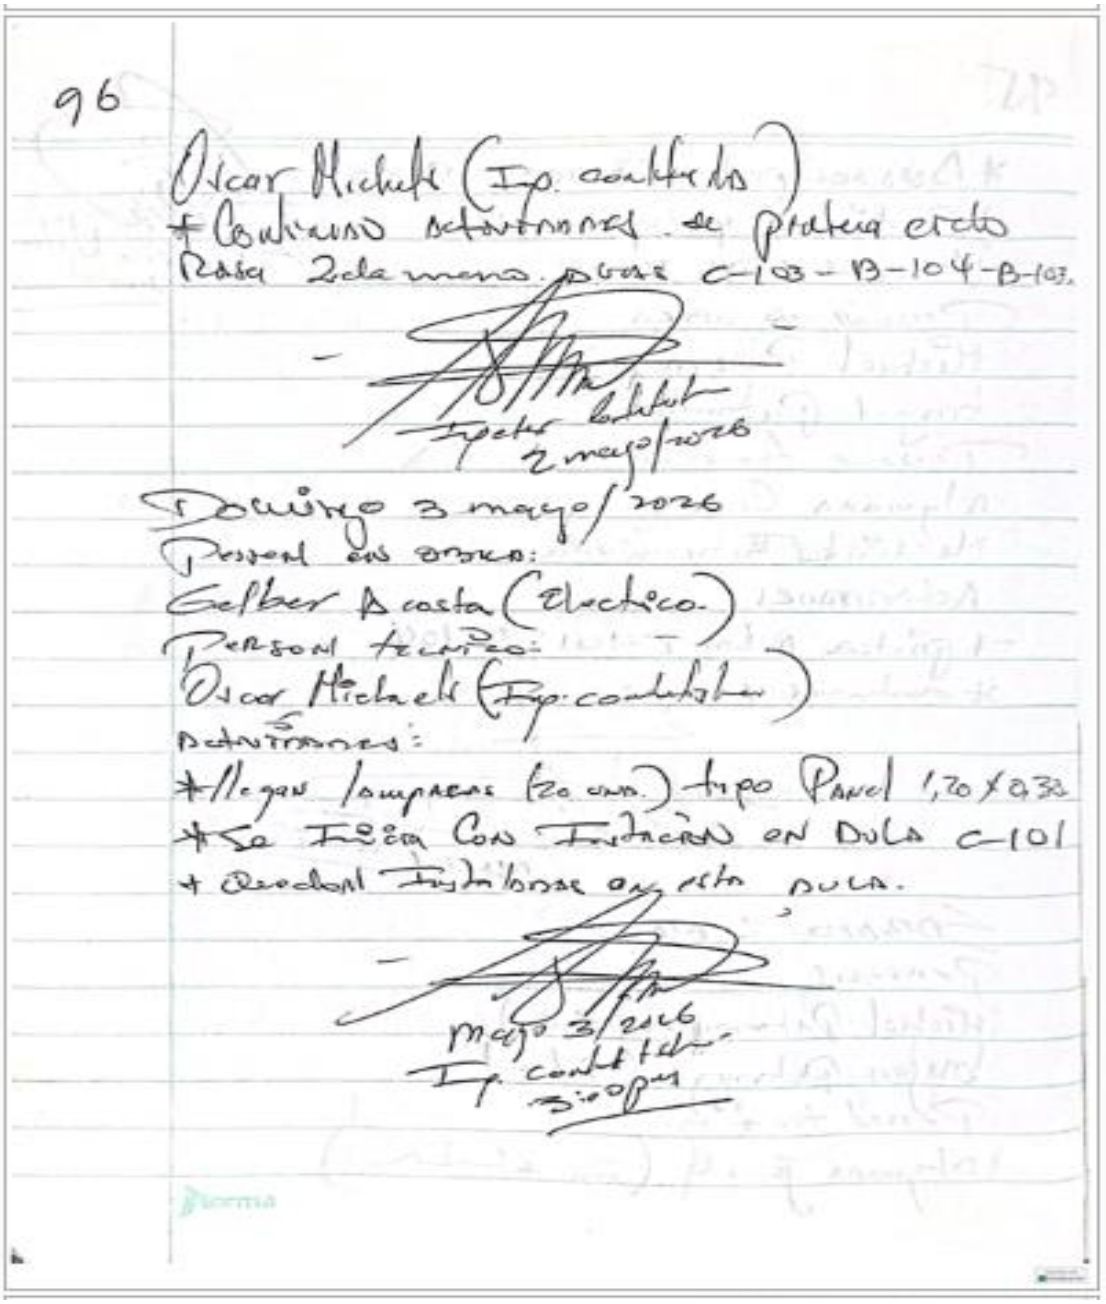


96

Oscar Michelli (Ing. contratista)
+ Continuando actividades de pintura en cielo raso 2da mano. Aulas C-103 - B-104 - B-103.

Ingeniero contratista
2 mayo/2026

Domingo 3 mayo/2026
Personal en obra:
Gelber Acosta (Electrico.)
Personal técnico:
Oscar Michelli (Ing. contratista)
Actividades:
+ Hacer luminarias (20 und.) tipo Panel 1,20 x 0,30
+ Salida Fisica Con Instalación en Dula C-101
+ Cableado Instalación en esta Dula.

Mayo 3/2026
Ing. contratista
3:00 pm

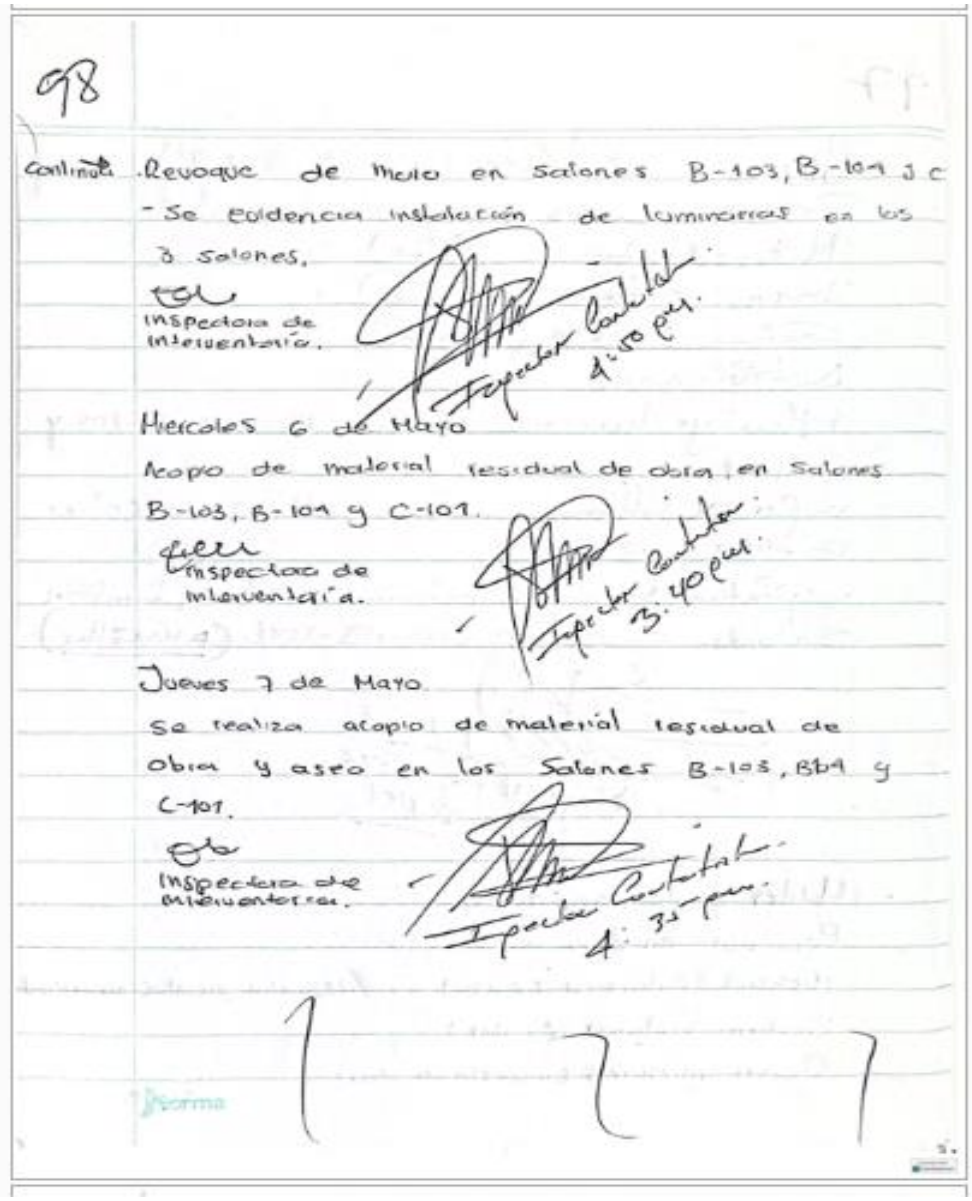

98

continua .Revoque de muro en Salones B-103, B-104 y C-101.
- Se evidencia instalación de luminarias en los 3 salones.

Inspectora de Interventoría.

Inspector Contratista 4:50 pm.

Miercoles 6 de Mayo

Acopio de material residual de obra en Salones B-103, B-104 y C-101.

Inspectora de Interventoría.


Inspector Contratista 3:40 pm.

Jueves 7 de Mayo

Se realiza acopio de material residual de obra y aseo en los Salones B-103, B-104 y C-101.

Inspectora de Interventoría.

Inspector Contratista 4:35 pm.

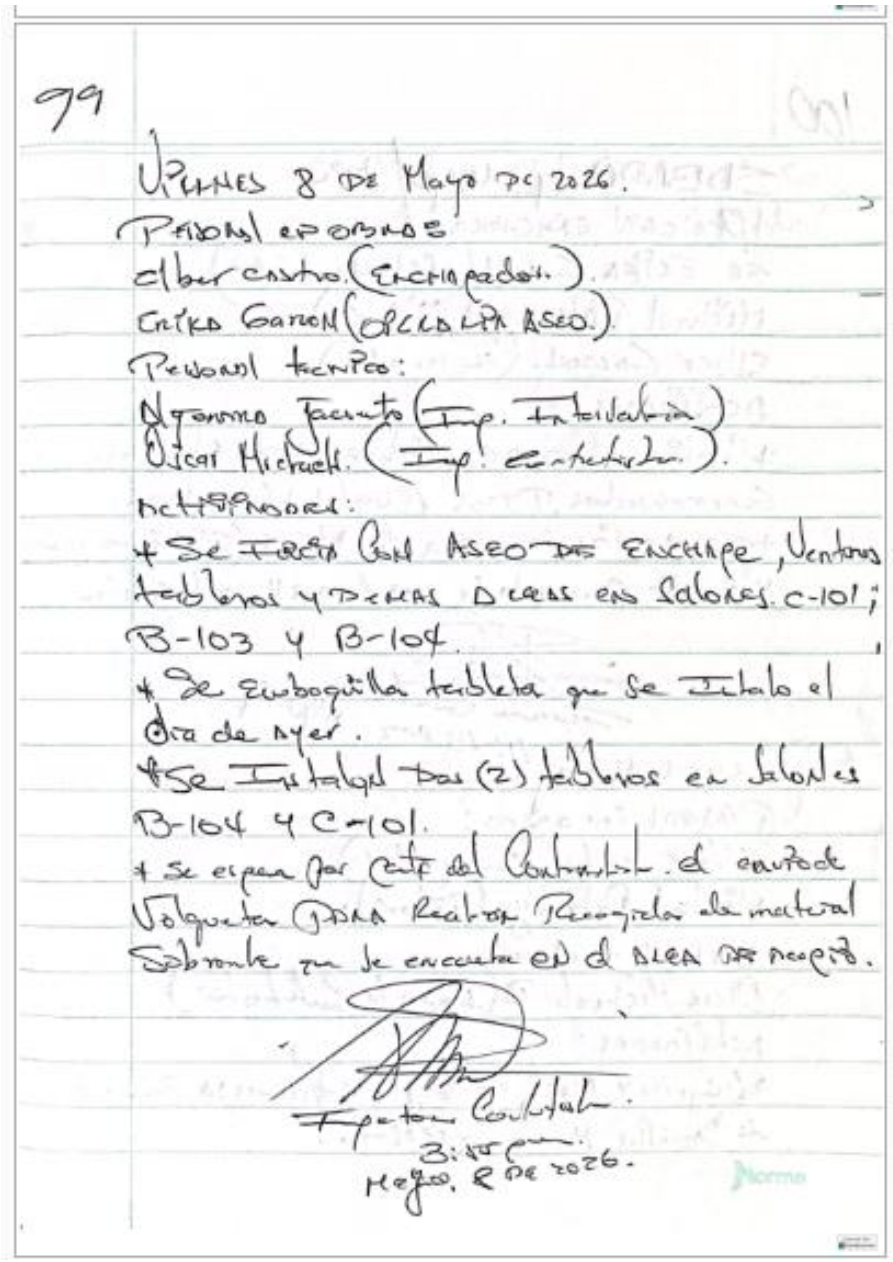

99

VIERNES 8 DE Mayo DE 2026.

PERSONAL EN OBRA:

Alber Castro. (Encharpador.)

Erika Garzon (Oficina ASEO.)

Personal tecnico:

Alejandro Jacinto (Ing. Interventoria)

Oscar Hichuela. (Ing. Contratista.)

ACTIVIDADES:


* Se Fregó con ASEO DE Enchape, Ventanas tableros y demas áreas en Salones C-101; B-103 y B-104.
* Se Embaquilla tableta que se Instalo el dia de Ayer.
* Se Instalaron Dos (2) tableros en Salones B-104 y C-101.
* Se espera por parte del Contratista el envio de Volqueta para Retirar Recogida de material Sobrante que se encuentra en el AREA DE acopio.

Ing. Contratista.

3:15 pm.

Mayo. 8 DE 2026.

Ilustración 25 - Anotación Bitácora I.E.D. Rodolfo Llinas

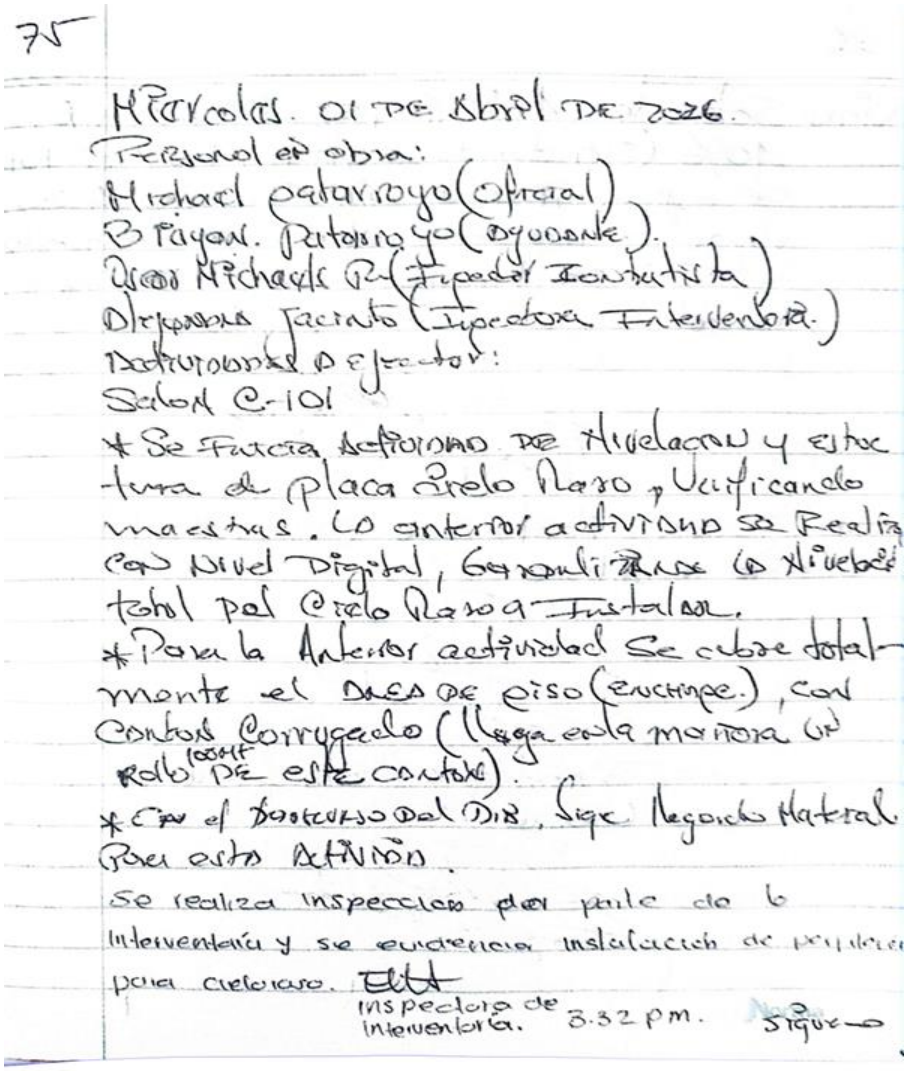
75

Miercoles. 01 DE Abril DE 2026.

Personal en obra:

Richard Patarroyo (Oficial)

B Payan. Patarroyo (Ayudante).

Jhon Richards P. (Tipador Contratista)

Dirgnora Jacinto (Inspectora Interventoría.)

Actividades a ejecutar:

Salon C-101


* Se Fundia Actividad de Nivelacion y Estructura de placa Cielo Raso, Verificando maestras. Lo anterior actividad se Realiza con Nivel Digital, Garantizando Nivelacion total por Cielo Raso a Instalar.


* Para la Anterior actividad Se cubre totalmente el Area de piso (Enchape.), con Cartón Corrugado (Llega esta manera un Rollo con el 100% de este carton).

* Con el Desarrollo del Dia, Sigue Negocio Natural. Para esta Actividad.

Se realiza Inspeccion por parte de la Interventoría y se evidencia instalacion de [illegible] para cielo raso.

Inspectora de Interventoría. 3.32 pm. Sigue

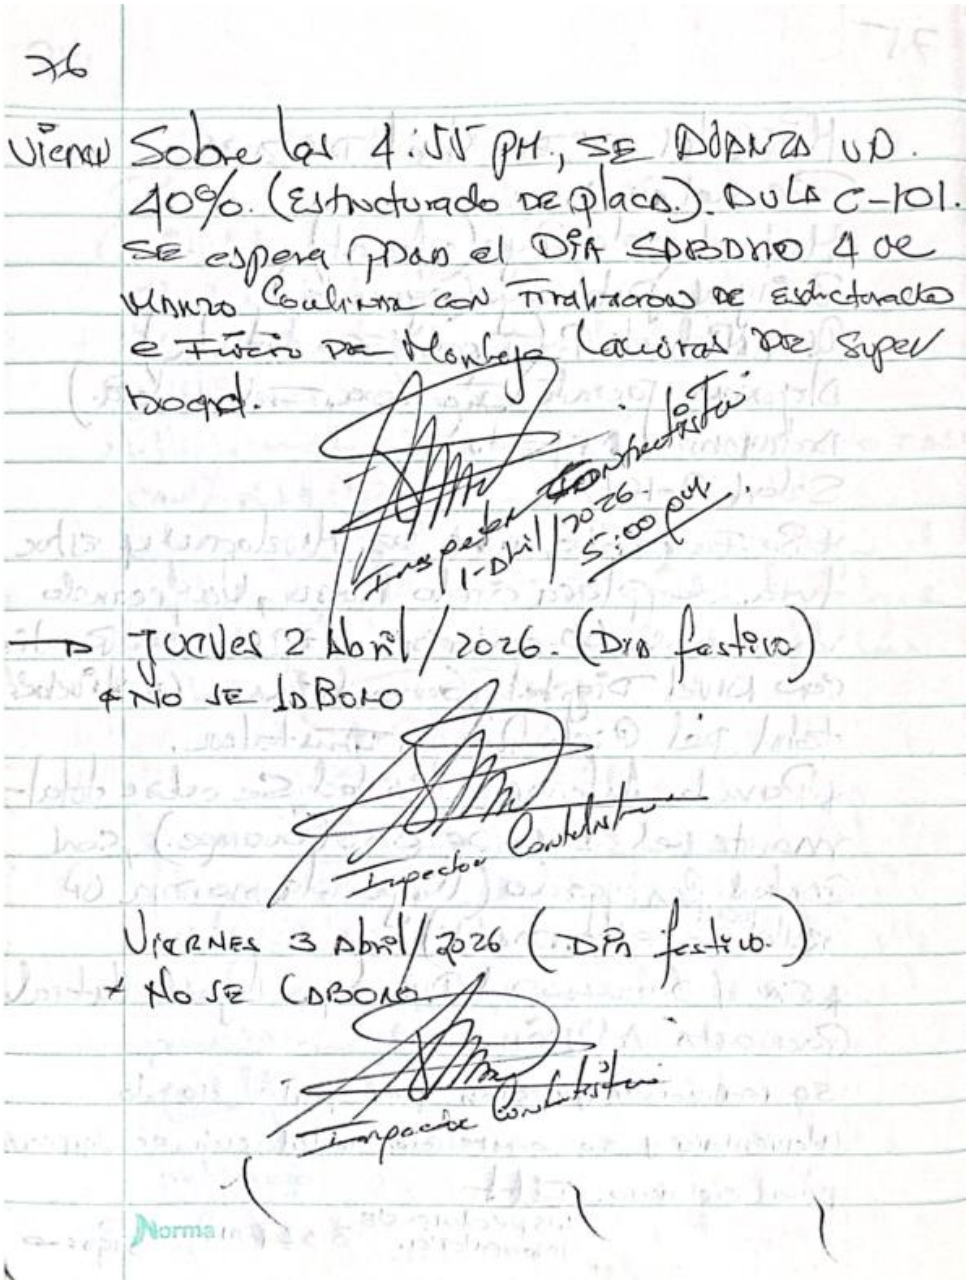
16
Viernes Sobre las 4:30 PM, se DIANTA UD. 40% (Estructurado de placa). DULA C-101. SE espera para el DÍA SABADO 4 de Marzo Cuadrilla con Trabajadores de Estructuras e Fierro de Montaje Cacistas de Superboard.
Inspector Contratista
1-Abril/2026 5:00 pm
JUEVES 2 Abril/2026. (Día festivo)
* NO SE LABORO
Inspector Contratista
VIERNES 3 Abril/2026 (DÍA festivo)
* NO SE LABORO
Inspector Contratista

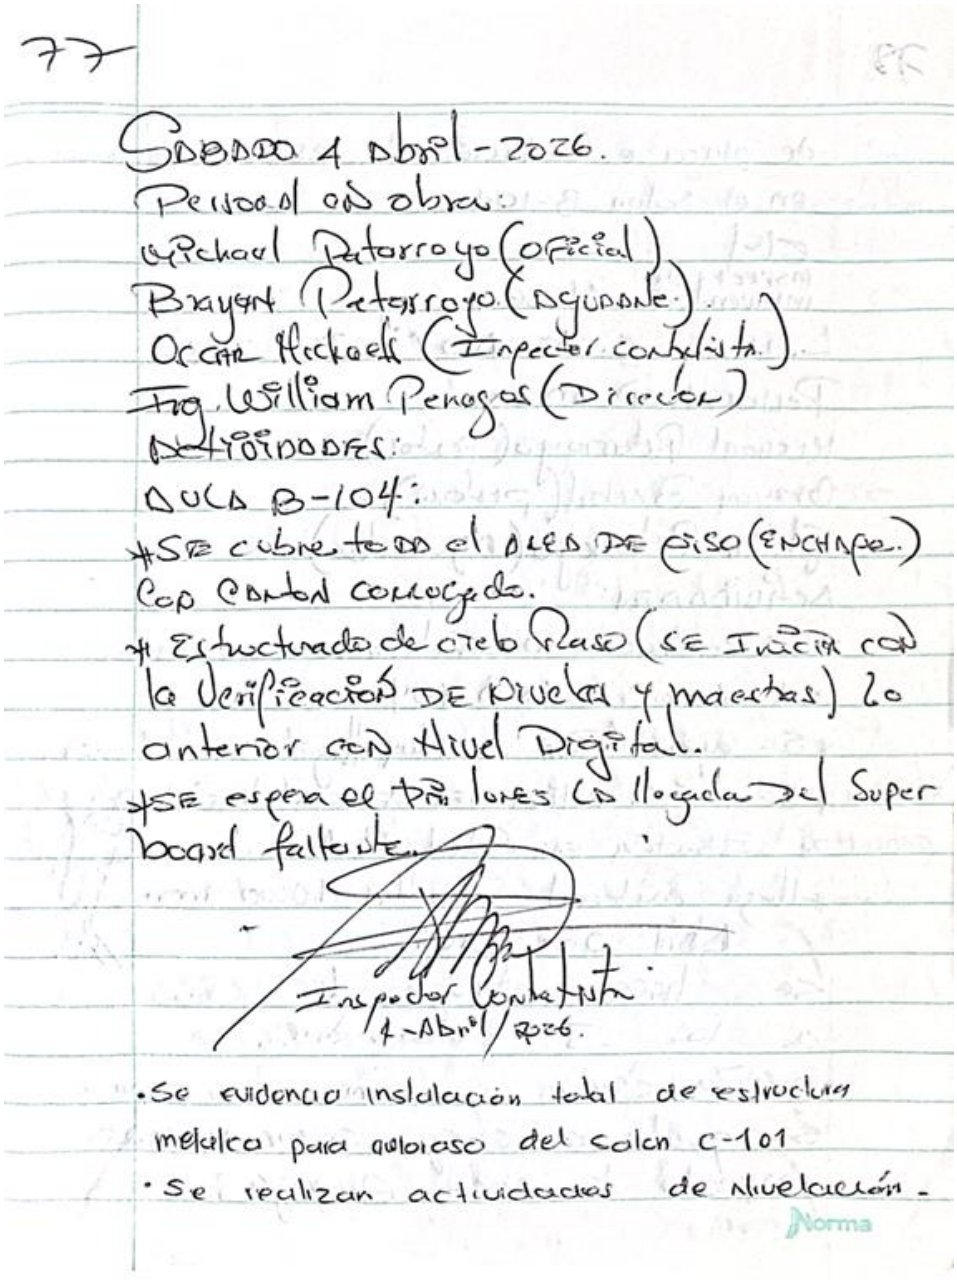

77

Sábado 4 abril - 2026.

Personal en obra:

Michael Petarroyo (oficial)

Brayan Petarroyo (Ayudante)

Oscar Hickeels (Inspector contratista)

Ing. William Penagos (Director)


Actividades:

AULA B-104:

* Se cubre toda el área de piso (enchape) con cantal conocido.
* Estructura de cielo raso (se inicia con la verificación de niveles y muestras) lo anterior con Nivel Digital.
* Se espera el día lunes la llegada del Super board faltante.

Inspector contratista
4-Abril/2026.

- Se evidencia instalación total de estructura metálica para cielo raso del salón C-101
- Se realizan actividades de nivelación.

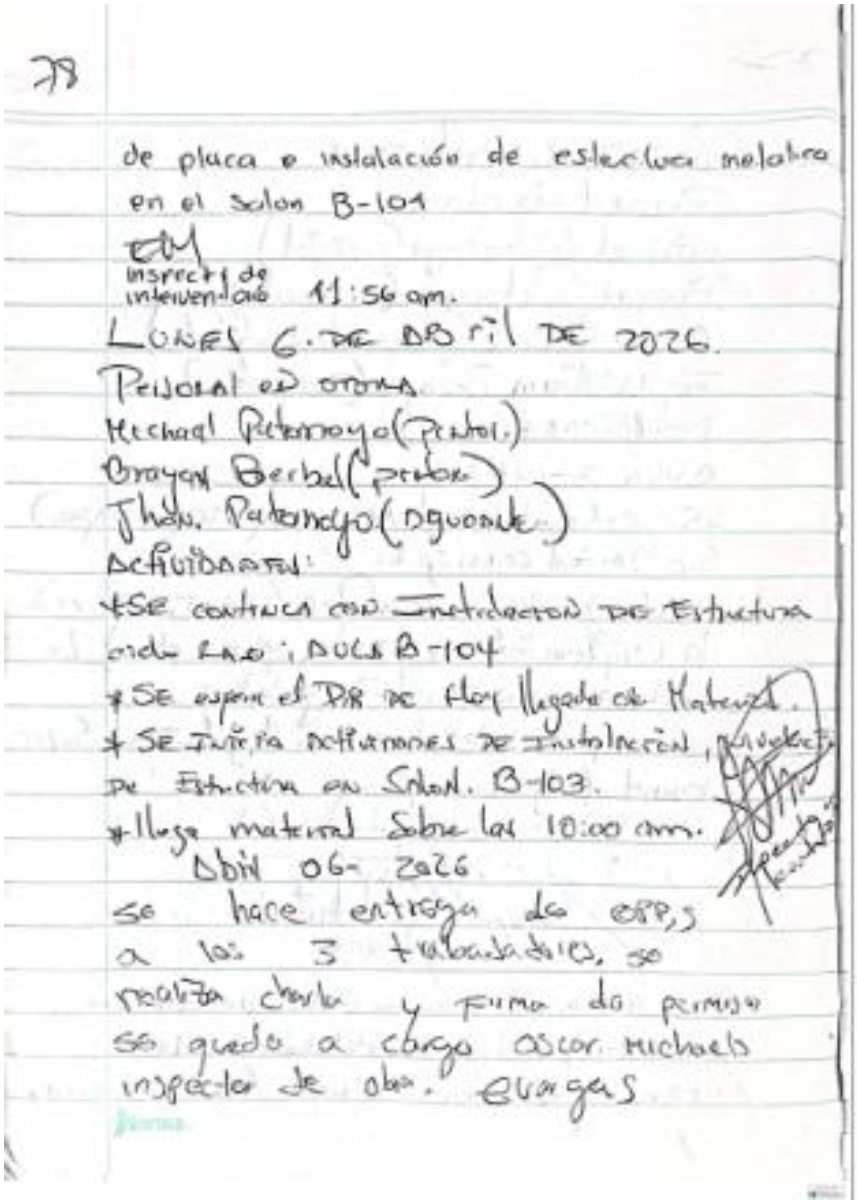

78

de placa e instalación de estructura metalica
en el salon B-104


EM
Inspector de intervent. 11:56 am.

LUNES 6 DE ABRIL DE 2026.

Personal en obra.
Michael Palomeque (Portal.)
Brayan Berbal (portal)
Jhon. Palomeque (Oficial)

Actividades:
*SE continua con instalacion de Estructura
metalica en Aula; Salon B-104
* Se espera el DIR de Hoy llegada de Material.
* SE inicia actividades de instalacion, Soldadura
de Estructura en Salon. B-103.
* Llega material Sobre las 10:00 am.

ABRIL 06- 2026
se hace entrega de EPP,S
a los 3 trabajadores, se
realiza charla y firma de permiso
se queda a cargo oscar michael
inspector de obra. Gracias

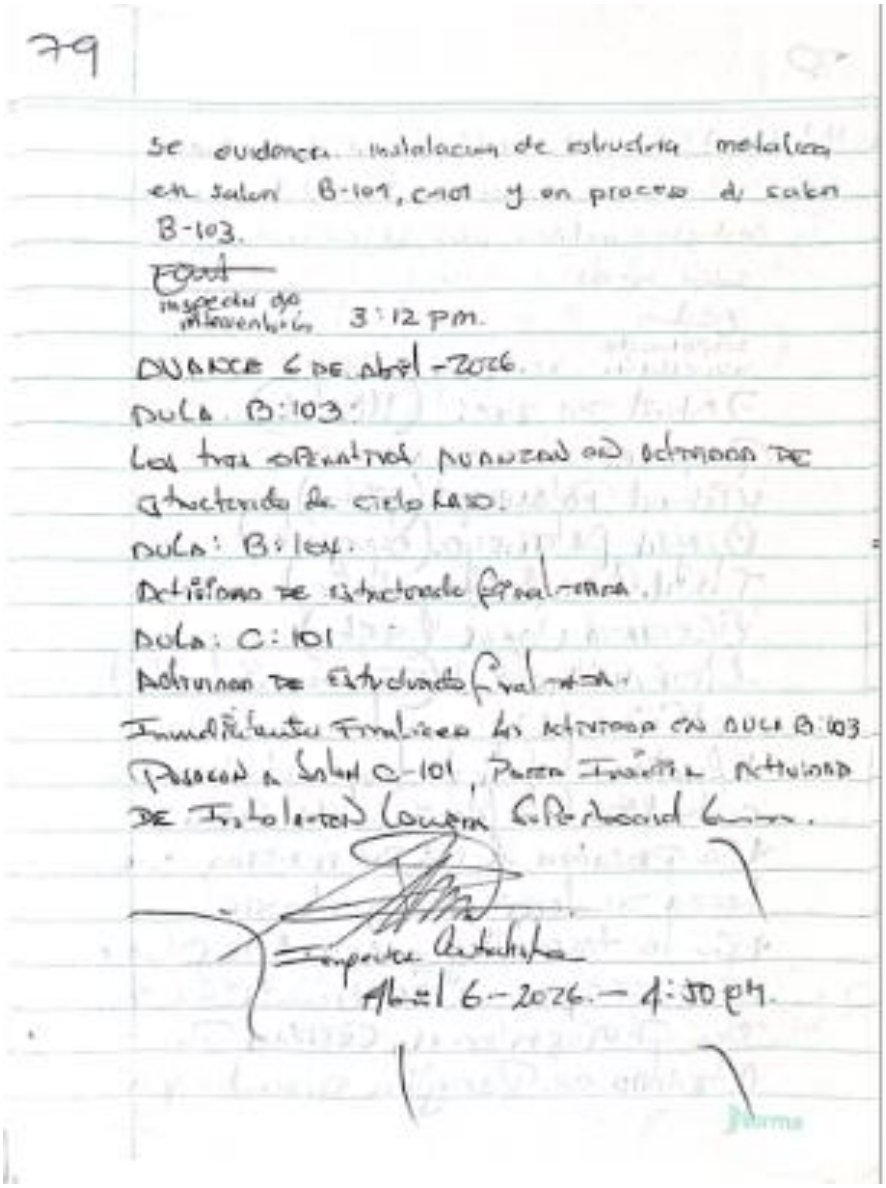

79

Se evidencia instalacion de estructura metalica en salon B-104, C-101 y en proceso de salon B-103.

Inspector de Interventoria 3:12 PM.

DURANTE 6 DE ABRIL - 2026.

AULA B:103:

Las tres operativas adelantan actividades de atornillado de cielo raso.

AULA: B:104.

Actividad de estructura final-terminada.

AULA: C:101


Actividad de Estructura final-terminada.

Inmediatamente finalizadas las actividades en AULA B:103 Pasaron a Salon C-101, Para Iniciar la actividad de Instalacion Lamina Galvanizada.

Firma

Inspector Arquitectura

Abril 6-2026 - 4:30 p.m.

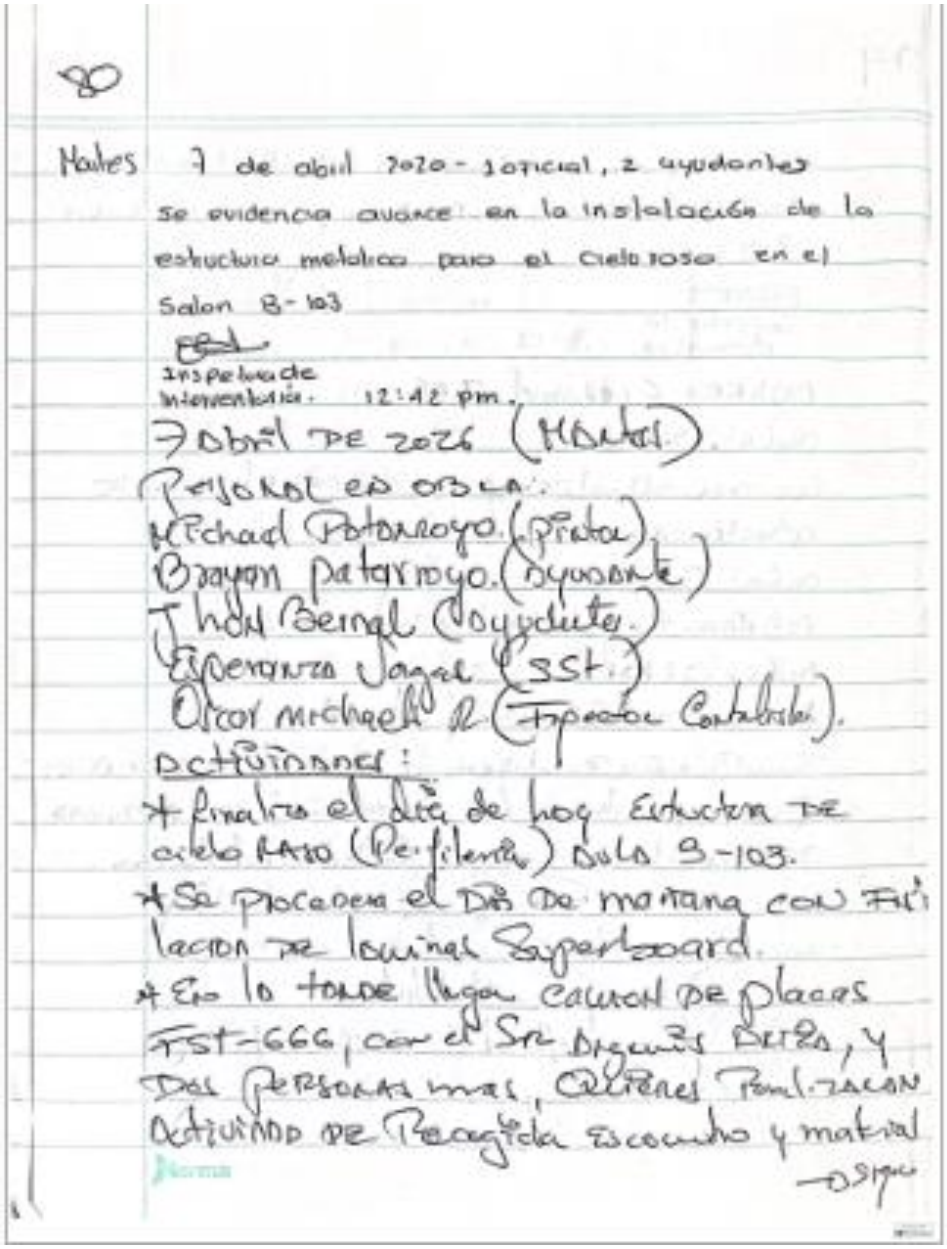

80


Notes 7 de abril 2026 - 1 oficial, 2 ayudantes
Se evidencia avance en la instalación de la estructura metálica para el cielo raso en el Salon B-103

Inspección de Intervención. 12:42 pm.

7 Abril DE 2026 (MARTES)

PERSONAL EN OBRA:
Richard Patarroyo. (Pintor)
Brayan Patarroyo. (Ayudante)
John Bernal (Ayudante)
Esperanza Jagua (SST)
Oscar Michael R (Inspector Contratista)

ACTIVIDADES:
* Finalizo el día de hoy Estructura de cielo raso (Perfilería) Salón B-103.
* Se procedera el Día de mañana con Fijación de laminas Superboard.
* En la tarde llega cantidad de placas FST-666, con el Sr Diguis Reyes, y Dos personas mas, Culminan Actividad de Recogida Escombro y material sobrante.

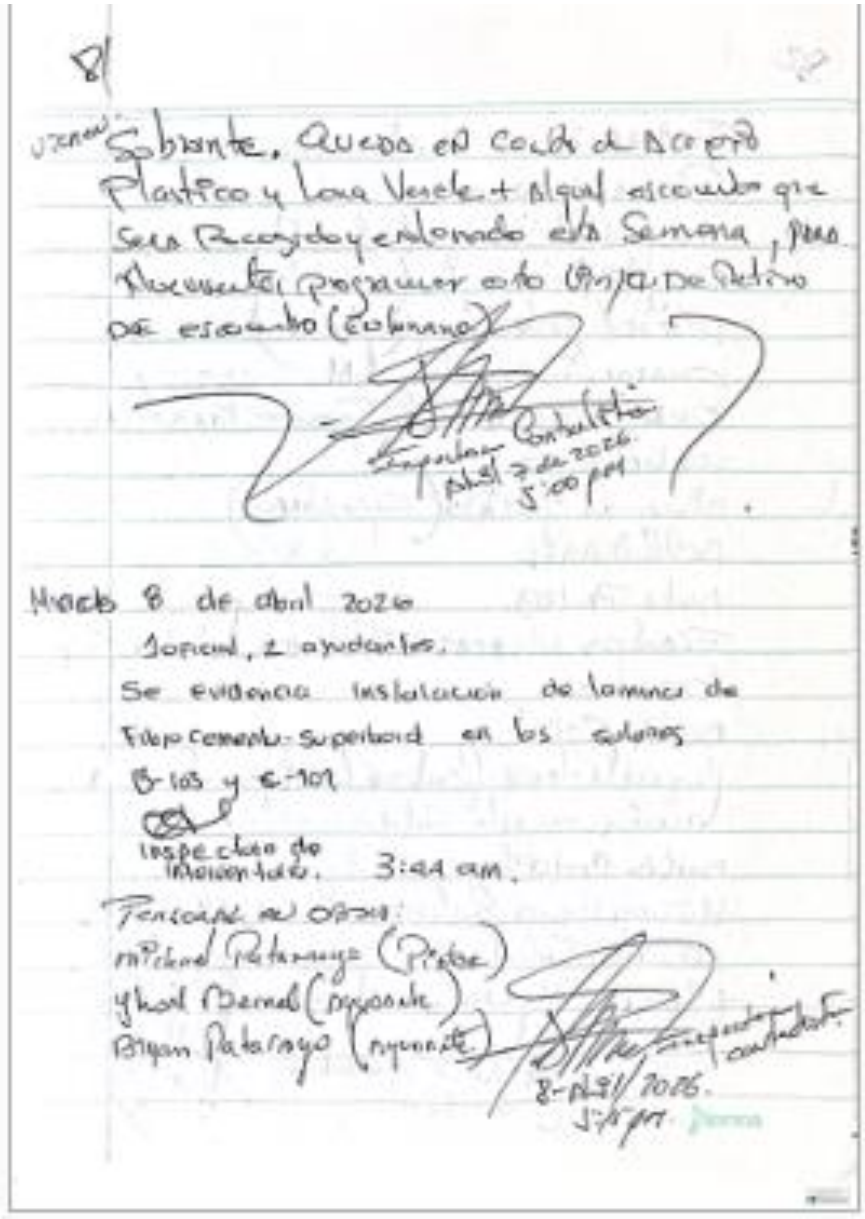

8/

Sobrante, Queda en Cocina de Acopio Plastico y Lona Verde + algo escombro que sera Recogido y entonado esta Semana, para Posteriormente Proceder con Retiro de escombro (Cubierta)


Inspector Contratista
Abril 7 de 2026
5:00 pm

Miercoles 8 de abril 2026
Jornal, 2 ayudantes.
Se evidencia instalacion de laminas de Fibrocemento-Superboard en los salones B-105 y B-107

Inspector de Mantenimiento. 3:44 pm.


Personal de obra:
Miguel Potosaya (Pintor)
Yhoel Bernal (ayudante)
Bryan Potosaya (ayudante)

Inspector contratista
8-Abril/2026.
5:47 pm

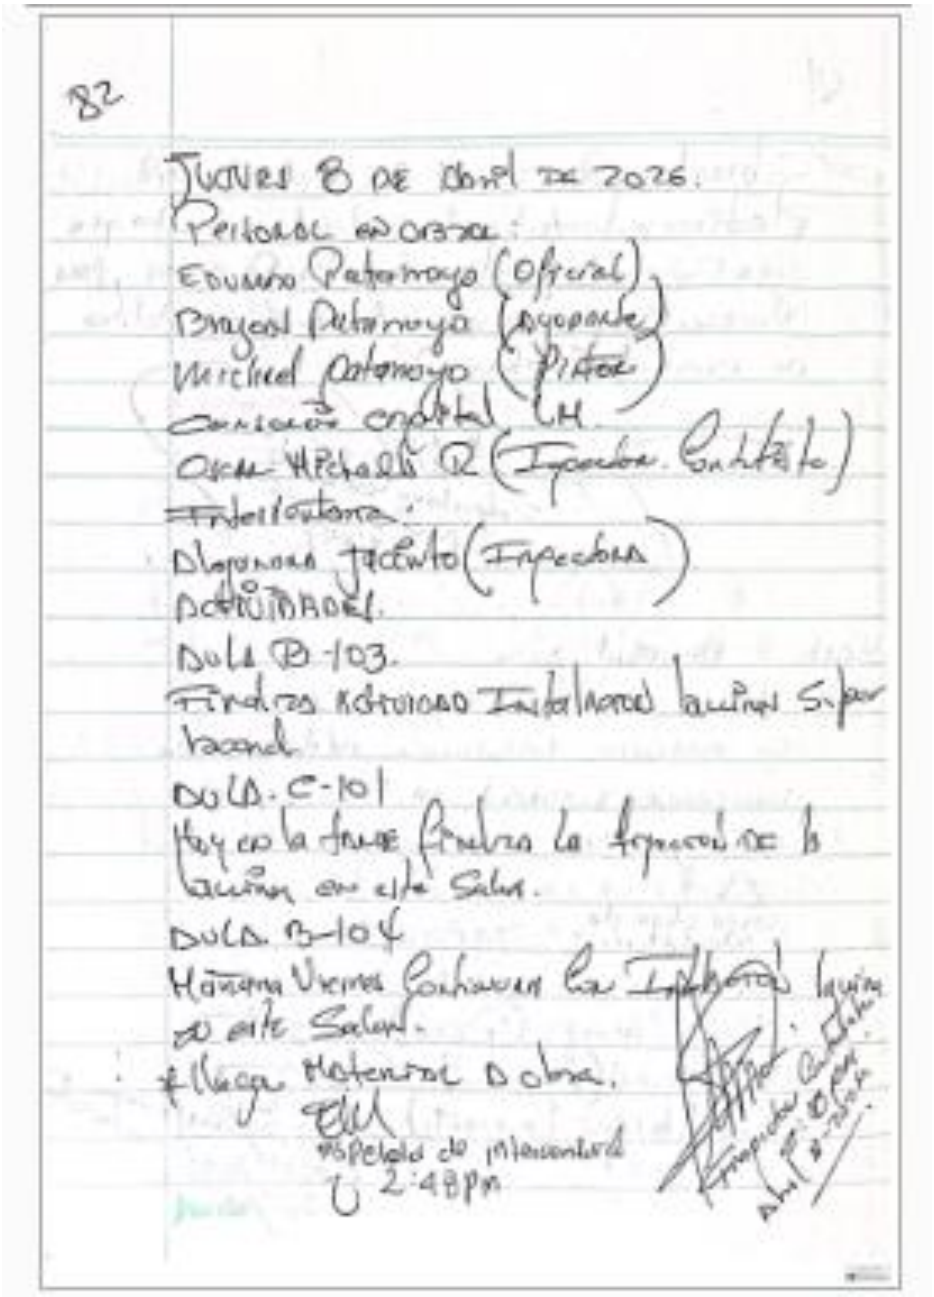

82

JUEVES 8 DE Abril DE 2026.
Personal en obra:
Eduardo Patarroyo (Oficial)
Miguel Patarroyo (Ayudante)
Michael Patarroyo (Pintor)
Carolina Capital (H.
Oscar Michaelle R (Ingeniero Contratista)
Interventoría:
Diagramar Jacinto (Ingeniera)
ACTIVIDADES.
Sala B-103.
Finalizar retoques Instalación lámpara Super Vacant
SALA. C-101
Hoy en la tarde finalizar la instalación de la lámpara en este Salón.
SALA. B-104
Mañana Viernes continuar con Instalación lámpara en este Salón.
Llega Material a obra.
Retirado de mantenimiento
2:48pm

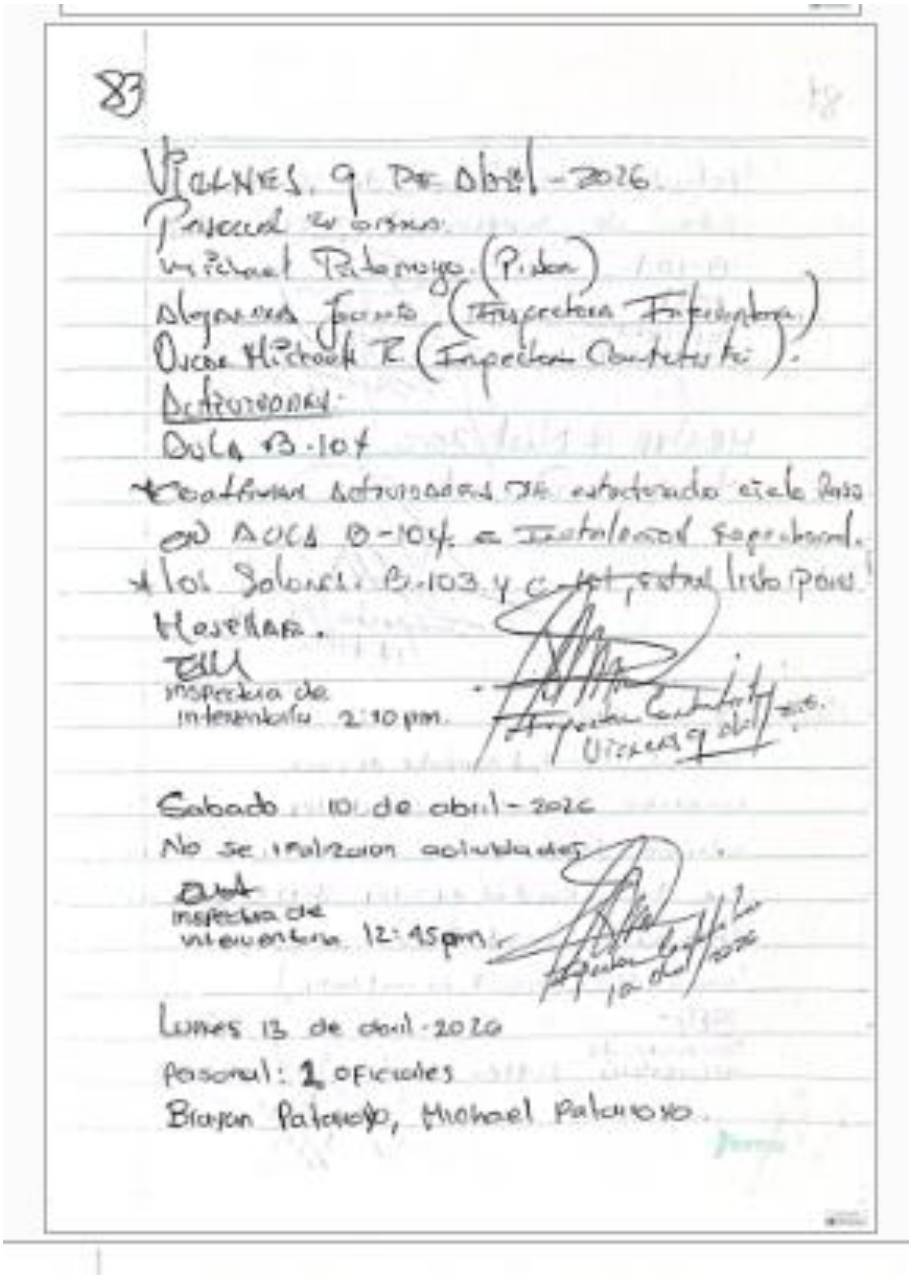


83

VIERNES, 9 DE Abril - 2026.
Personal en obra:
Michael Palomeque. (Pinta)
Alejandra Forero (Interventoría Infraestructura)
Oscar Hitchcock R. (Inspector Contratista).
Actividades:
Ducha B-104
Continuan actividades de estucado cielo raso en DUCHA B-104 en Instalación Hidrosanitaria.
Los Salones B-103 y C-[illegible] total libre para labores.
Inspectora de Interventoría 2:10 pm.
Viernes 9 abril

Sabado 10 de abril - 2026
No se realizan actividades
Inspectora de Interventoría 12:45 pm
10 abril 2026

Lunes 13 de abril - 2026
Personal: 2 oficiales
Brayan Palomeque, Michael Palomeque.

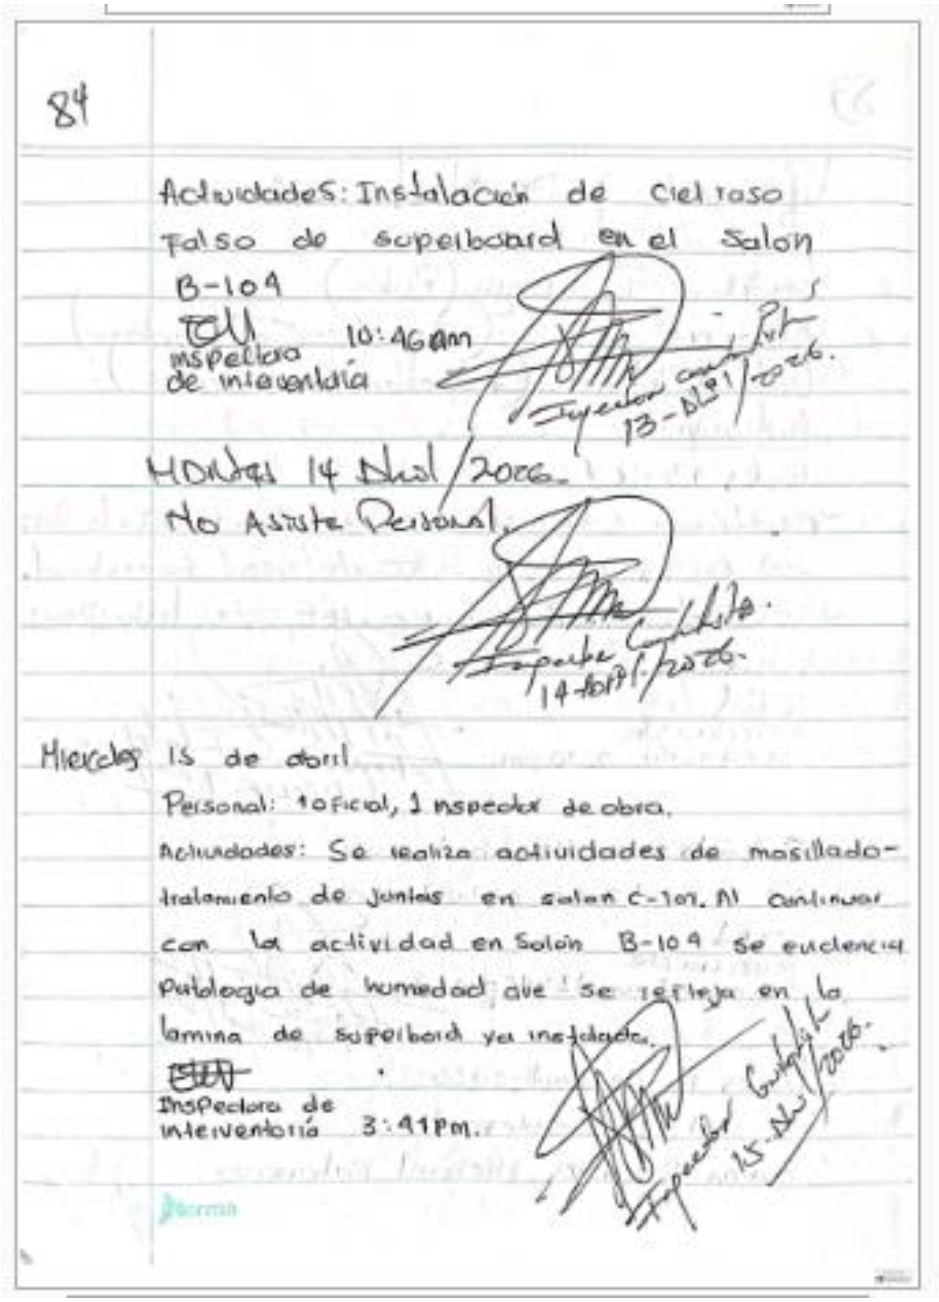

84

Actividades: Instalación de cielraso Falso de superboard en el Salon B-109

Inspectora de interventoría 10:46am

Inspector 13-Abril/2026.

Martes 14 Abril/2026.

No Asiste Personal.

Inspector 14-Abril/2026.


Miercoles 15 de abril

Personal: 1 oficial, 1 inspector de obra.

Actividades: Se realiza actividades de masillado-tratamiento de juntas en salon C-107. Al continuar con la actividad en Salon B-109 se evidencia Patologia de humedad que se refleja en la lamina de superboard ya instalada.

Inspectora de interventoría 3:41PM.

Inspector 15-Abril/2026.

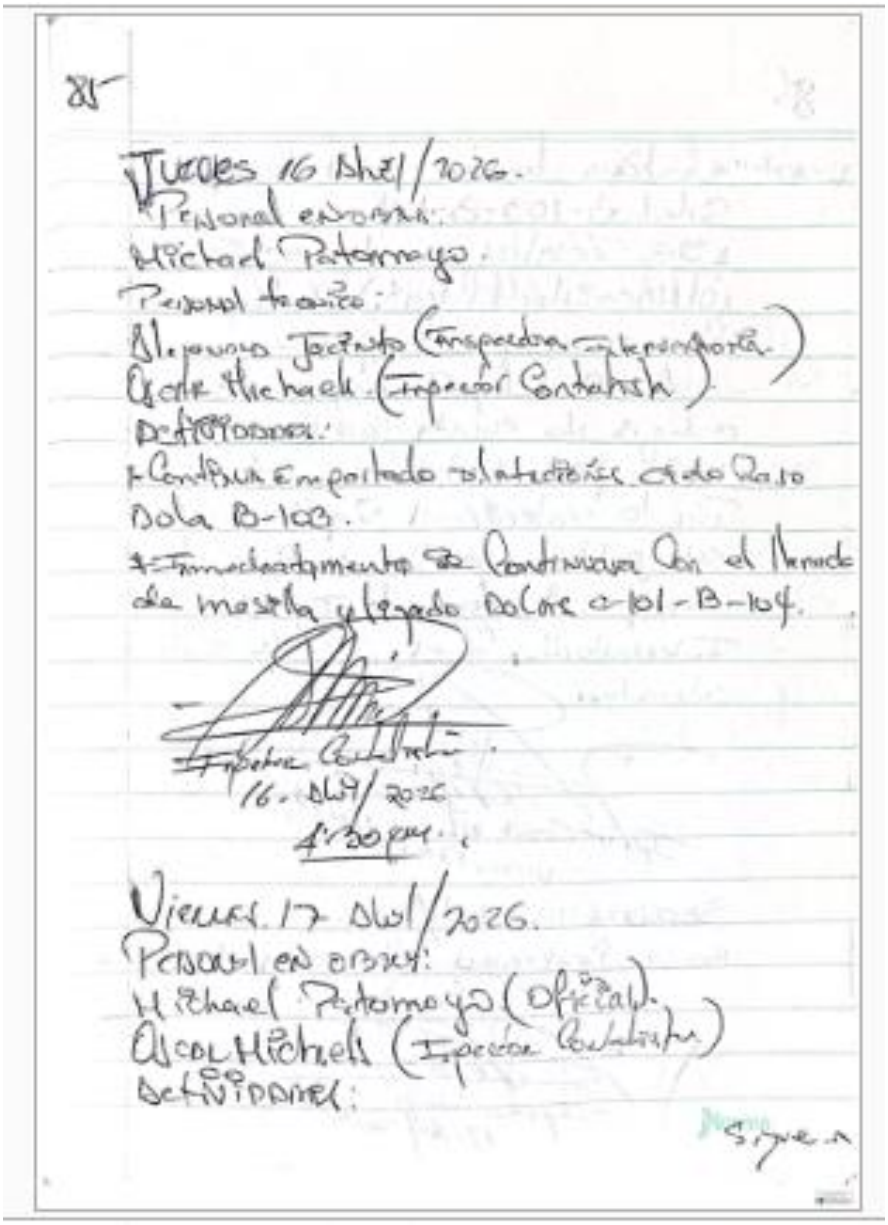


85

JUEVES 16 Abril/2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo.
Personal técnico:
Alejandro Jaramillo (Inspectora - Interventoría)
Oscar Michaels (Inspector Contratista)
Actividades:
- Continua Empalmado de tuberías desde Pozo Bola B-103.
- Inmediatamente se Continuara con el Pozo de maseta y Legado Dolore a-101 - B-104.

Inspector Contratista.
16. Abril/2026
4:30 pm.

VIERNES 17 Abril/2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo (Oficial).
Oscar Michaels (Inspector Contratista)
Actividades:

Firma

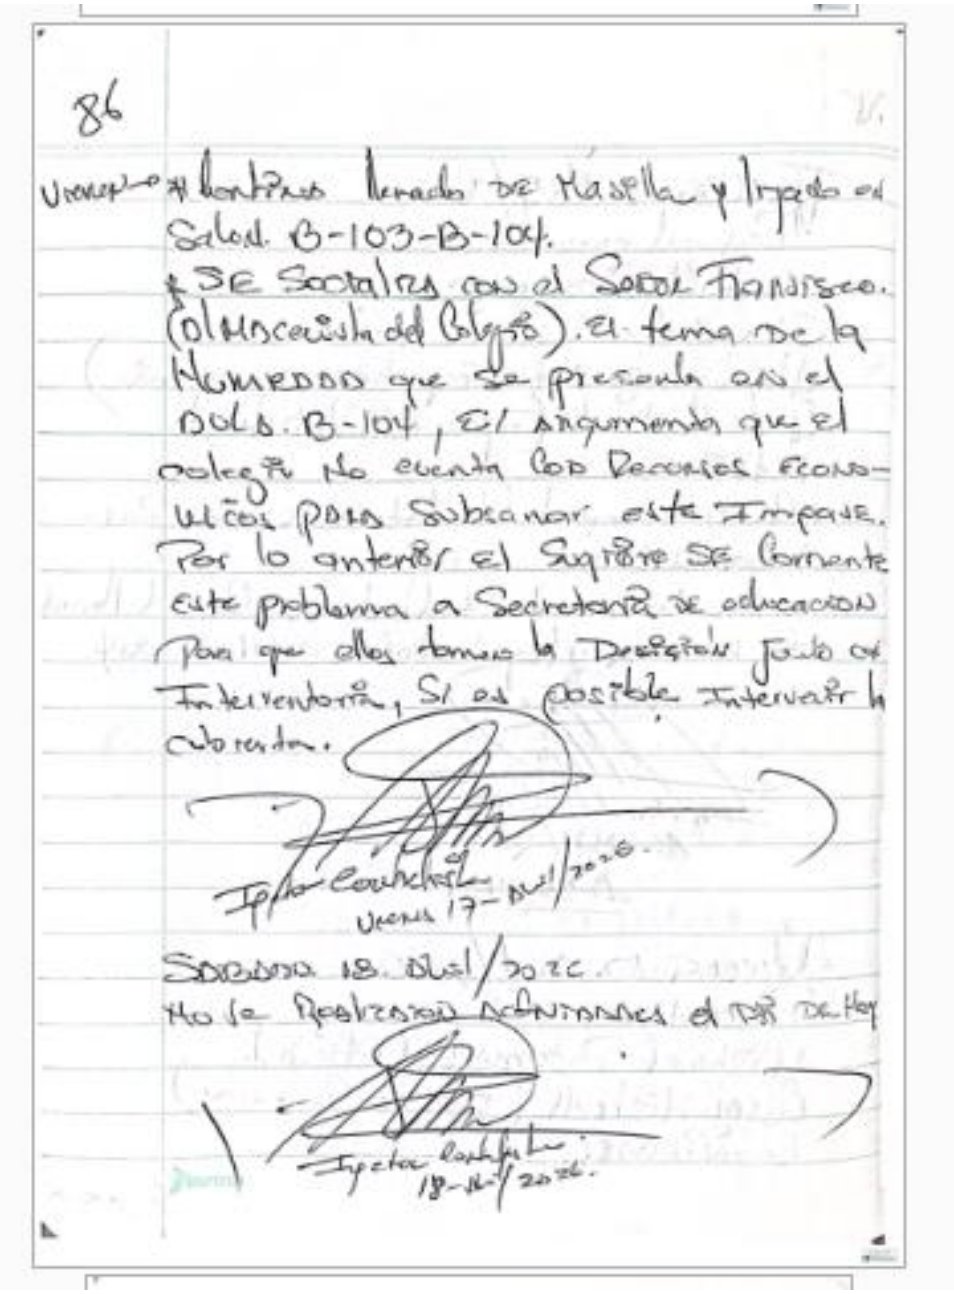


86

Urgente * Contratista Heraclio de Masella y Ingeniero en Salud. B-103-B-104.
* SE Socializa con el Señor Francisco. (Olmacerista del Colegio). El tema de la HUMEDAD que se presenta en el BLQ. B-104, El argumento que el colegio no cuenta con Recursos Económicos para Subsanar este Impacto. Por lo anterior el Supervisor SE Comunica este problema a Secretaría de educación para que ellos tomen la Decisión junto con Interventoría, Si es posible Intervenir la Situación.

Ingeniero Contratista
Urgente 17-Abril/2026.

Sobrante 18. Abril/2026.
No se Realizaron Actividades el día de Hoy

Ingeniero Contratista
18-Abril/2026.

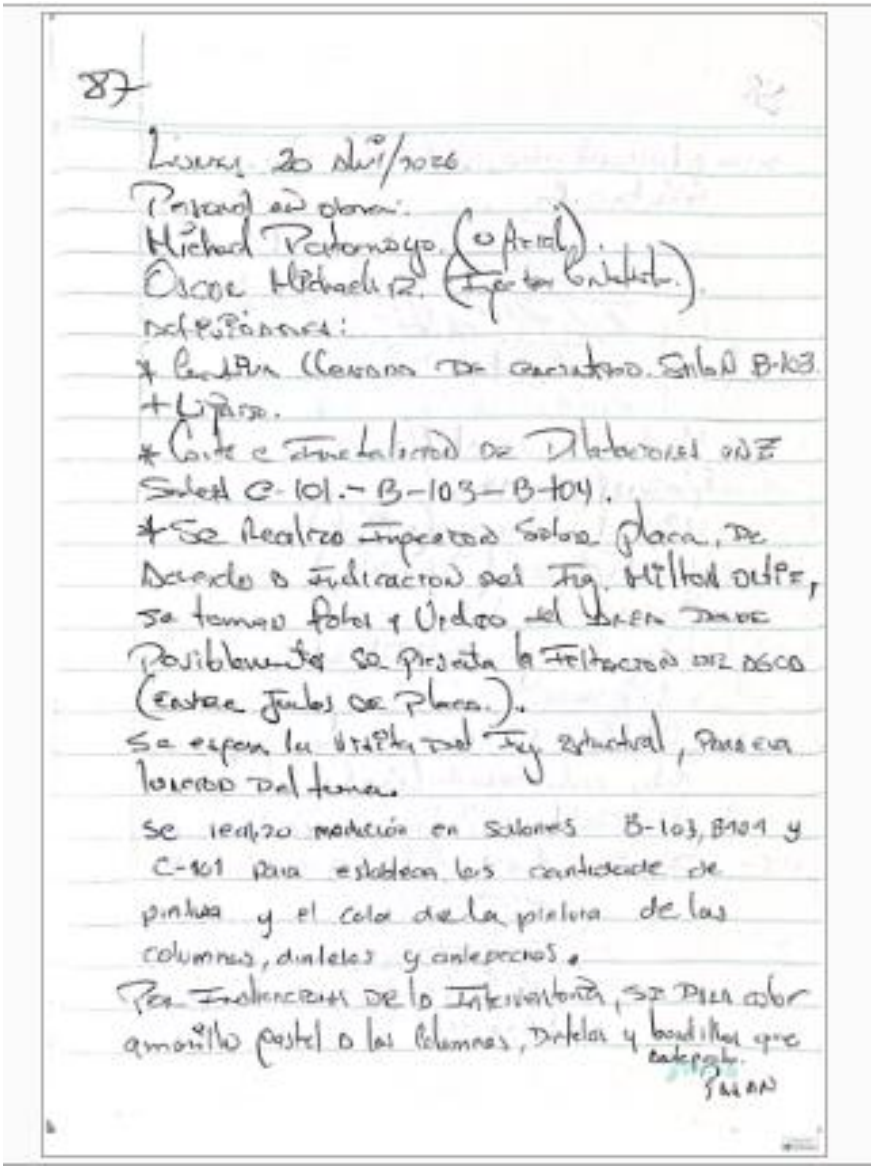

87


Lunes 20 Abril/2026

Presentes en obra:
Richard Patarroyo. (Apoyo).
Oscar Hurtado R. (Interventoría).

Actividades:

* Cubierta (Cerrada De Circulación. Salón B-103 + Lipsa.
* Corte e Impermeabilización De Dilataciones Vías Salón C-101 - B-103 - B-104.
* Se Realizo Inspección Sobre placa, De Acuerdo a Indicación del Ing. Hilton Diaz, se tomaron fotos y Video del Area Para Posibles Soluciones se Proyecta la Filtración por Losa (Entre Juntas de Placa).
Se espera la Visita del Ing Estructural, Para la Solución del tema.
Se realizo medición en Salones B-103, B-104 y C-101 para establecer las cantidades de pintura y el color de la pintura de las columnas, dinteles y cenefas.
Por Indicación de la Interventoría, se pide color amarillo pastel a las Columnas, Dinteles y bordillos que entregaron.

JUAN

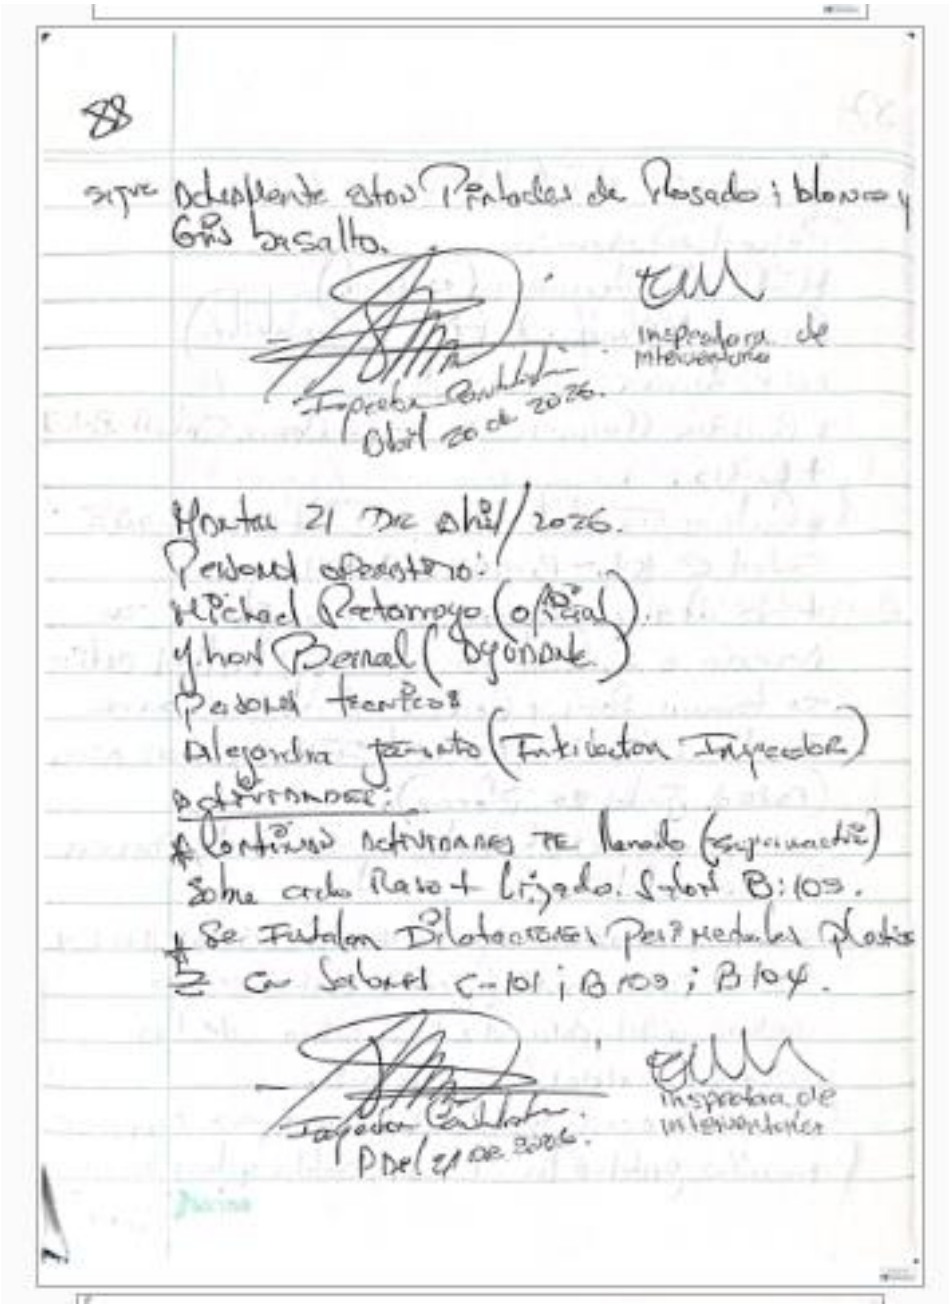

88

Se adelanta obra Portales de Rosado; blanco y Gris Arcilla.

Inspectora de Intervención

Inspector Contratista.
Abril 20 de 2026.

Hoy tal 21 de abril/2026.
Personal operativo:
Michael Restrepo (oficial).
Yhon Bernal (oficial)
Personal técnico:
Alejandra Jaramillo (Residente Interventoría)
Actividades:
* Continua actividades de lijado (segunda mano) sobre cielo Raso + Lijado. Sector B:103.
* Se Instalan Dilataciones en Perfilería de placas en Sobrado C-101; B-103; B-104.

Inspector Contratista.
Abril 21 de 2026.

Inspectora de Intervención



89

Miércoles 22 Abril / 2026

Personal en obra:

Michael Restrepo (Oficial)

Yhon Bernal (Ayudante).

Personal técnico

Alejandra Jaramillo (Inspectora Interventoría)

Oscar Machado (Ingeniero Residente)


Actividades:

* Llenado de vigas Piso (Superboard) con. Deficiente. (Entrecasa) + Viga de Sobre B-103.
* Estructurado bajo placa. (Entrecasa Sobre) (B-104 C-101).
* Esta pendiente. 18 ML DE Dilataciones Sobre C101
* El Señor Michael Restrepo Sale a Medio Día de la obra; Manifiesta que tiene cita Medica.
* Se espera Visita Ing. Estructural para Reforzar la Alteración sobre placa en Hall. y Sobre B-104 (Dilatación placa).

Inspectora de Interventoría.

Ingeniero Residente


Abril 22 de 2026

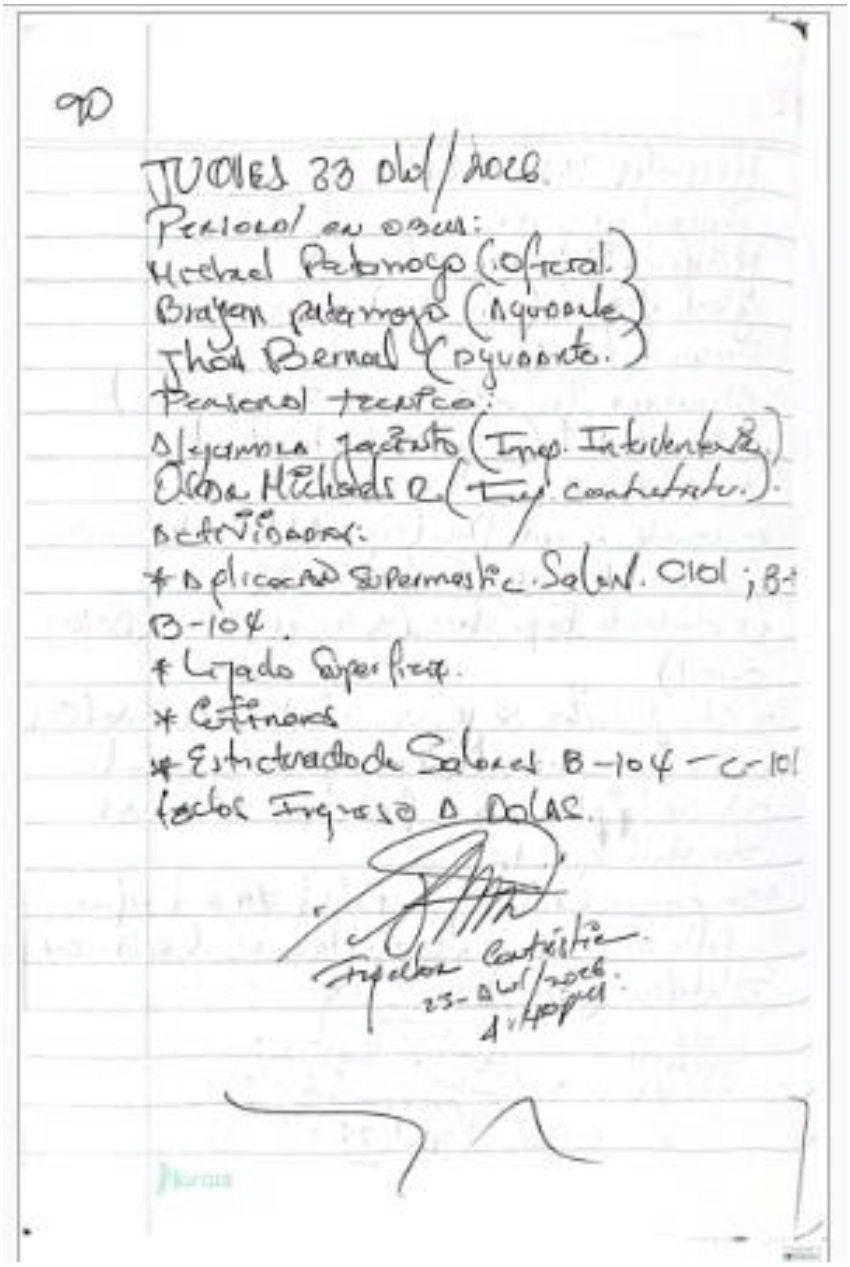

90

JUEVES 23 Abril/2026.
Personal en obra:
Michael Palomeque (Oficial)
Brayan Palomeque (Ayudante)
Jhon Bernal (Ayudante.)
Personal técnico:
Alejandra Tapiero (Ing. Interventoría)
Olga Hurtado R. (Ing. contratista.)
Actividades:
* Aplicación Impermeabilizante Sobre el. C101 ; B-
B-104.
* Lijado superficie.
* Cortinero
* Estructura de Sobre el B-104 - C-101
Fecha Ingreso A DOLAS.

Ingeniero Contratista.
23-Abril/2026.
A. Hoppel.

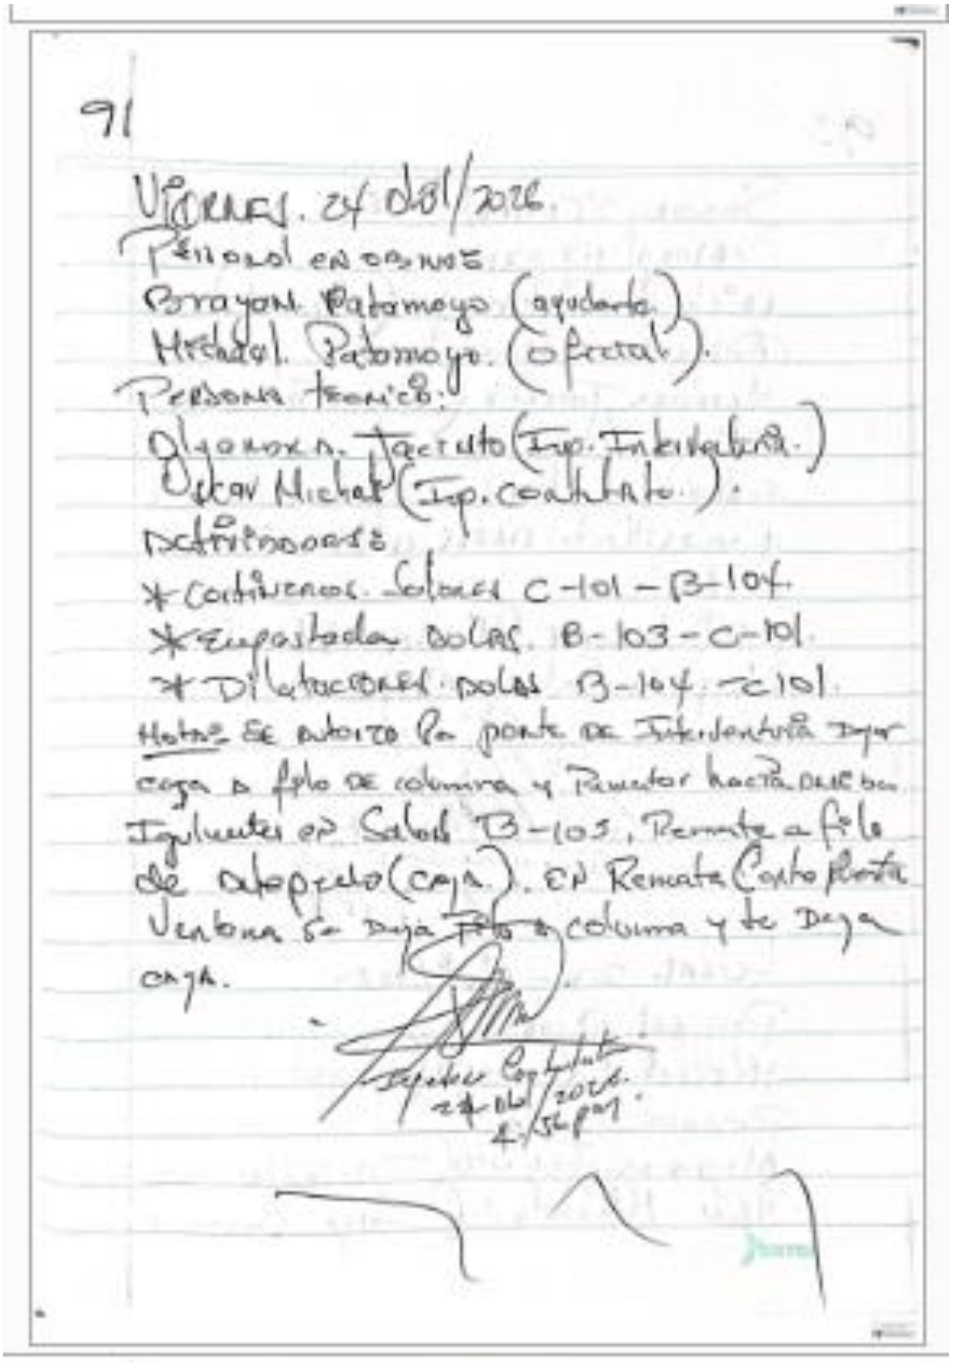

91

VIERNES. 24 del/2026.

PERSONAL EN OBRAS

Yorayan Palomeque (ayudante)

Michael Palomeque. (oficial).

PERSONA TECNICO:

Oleonora Tacuto (Inp. Interventoria.)


Oscar Michael (Inp. contratista).

ACTIVIDADES:

* Continuemos Soldar C-101 - B-104.
* Empastadas DOLAS. B-103 - C-101.
* Dilataciones DOLAS B-104 - C101.

Notas: SE AUTORIZO Por parte de Interventoria Dejar caja a ras de columna y Pasador hacia DALE Sin Inguentes en Salon B-103, Remate a ras de adoquin (caja). En Remate Contra planta Ventana se Deja ras a columna y se Deja caja.

Supervisor Contratista
24 Oct/2026.
4:56 pm.

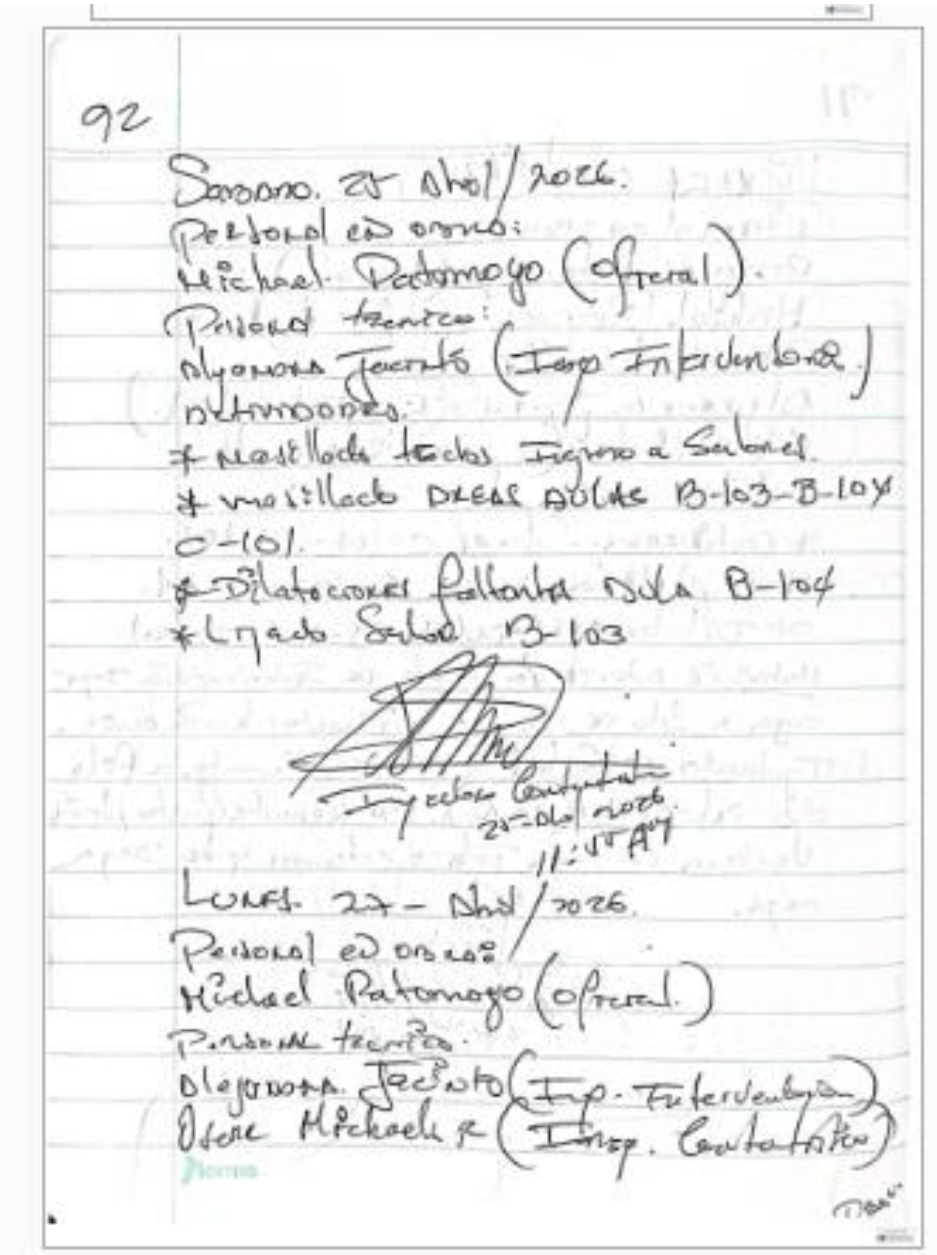


92

Sabado. 25 Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo (oficial).
Personal tecnico:
Alejandra Jacinto (Insp. Interventoria)
Actividades.
* Instalacion techos Ingreso a Salones.
* Instalacion drenes aulas B-103-B-104
C-101.
* Dilataciones Fachada Aula B-104
* Limpieza Salon B-103

Ingeniero Contratista
25-Abril-2026.
11:15 AM

Lunes. 27 - Abril / 2026.
Personal en obra:
Michael Patarroyo (oficial.)
Personal tecnico.
Alejandra Jacinto (Insp. Interventoria)
Oscar Michael R (Insp. Contratista)

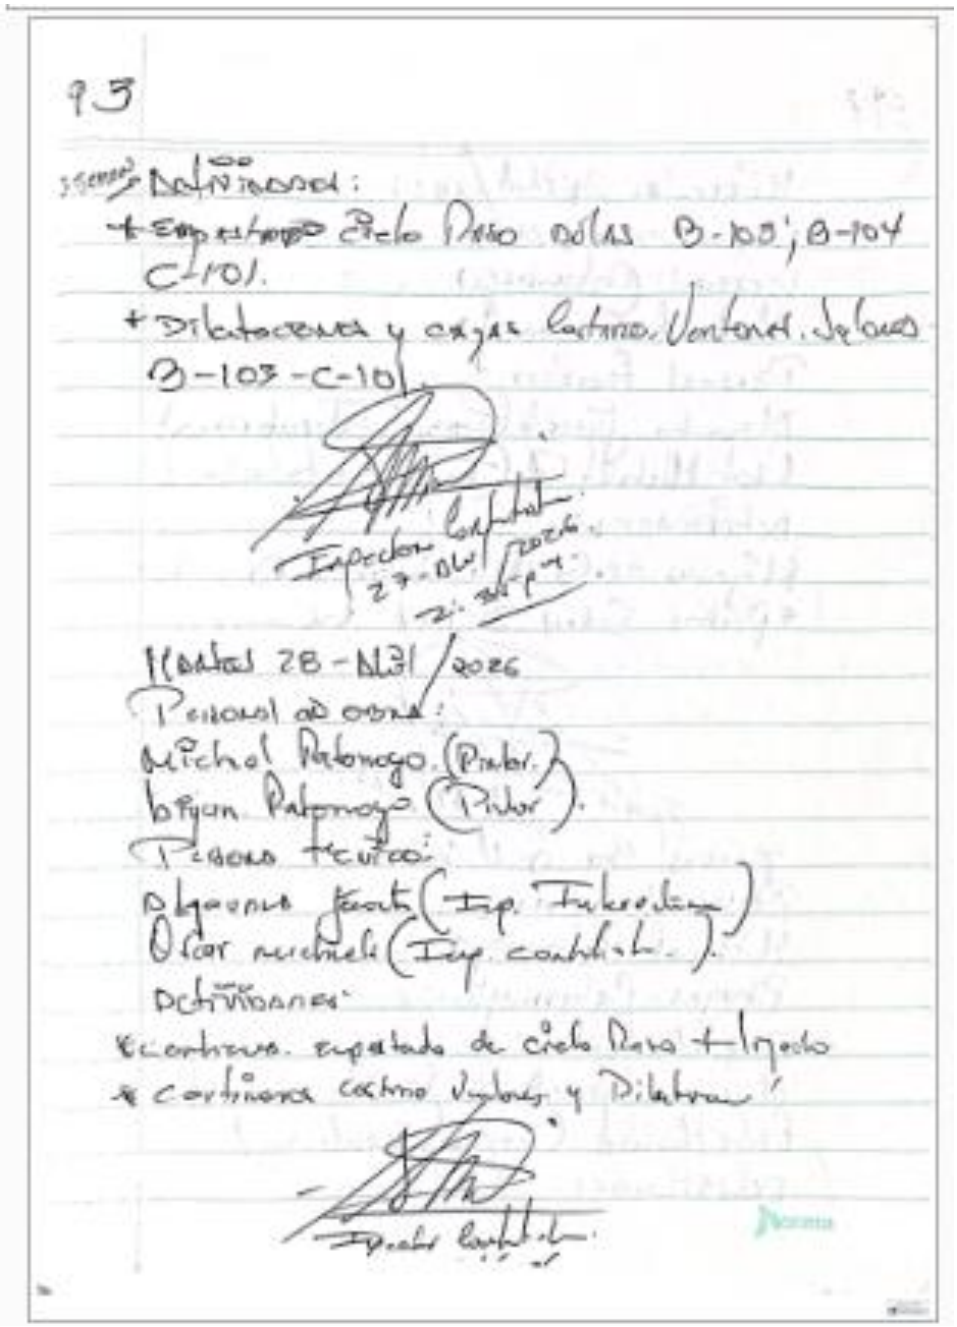

93

Actividades:

+ Continuar con el retiro de cielo raso en el área B-103, B-104 C-101.

+ Continuar con el retiro de cielo raso, ventanas, vidrios B-103 - C-101.

Inspector Contratista

23-ABRIL-2026

2:30 p.m.

Fecha 28-ABRIL/2026

Personal de obra:

Michael Palomeque (Pintor)

Brayan Palomeque (Pintor)

Personal técnico:

Alejandro Jaramillo (Ing. Residente)


Oscar Archbold (Ing. contratista)

Actividades:

Se continua con el retiro de cielo raso + limpieza

Se continua con retiro vidrios y Divisiones

Inspector Contratista

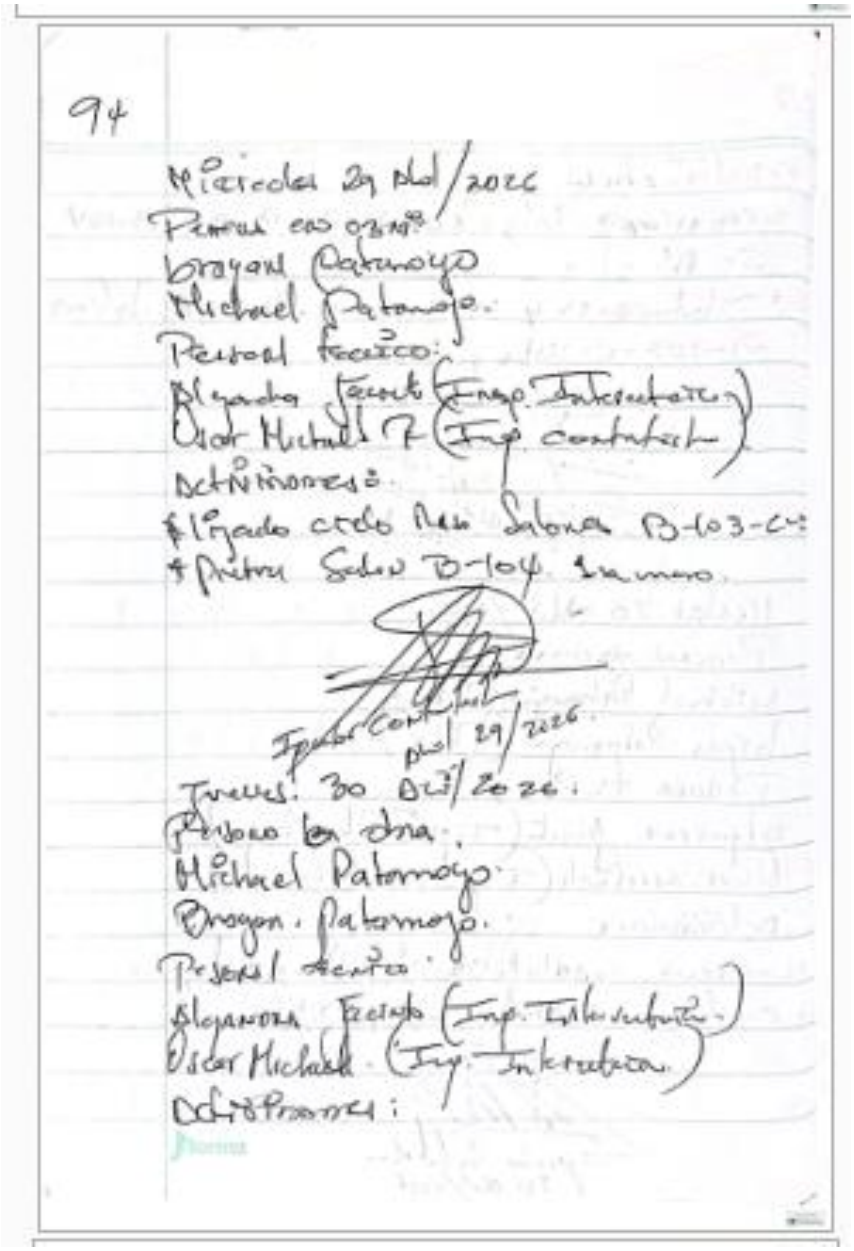


94

Miercoles 29 abril / 2026
Personal en obra:
Brayan Patarroyo
Michael Patarroyo.
Personal tecnico:
Alejandra Fajardo (Ingº Interventoria)
Oscar Michael R (Ingº contratista)
Actividades:
* Pegado ctdo Nva Sabana B-103-C4
* Pintura Sabana B-104 segundo.

Ingeniero Contratista
abril 29/2026.


Jueves 30 Abril/2026.
Personal en obra.
Michael Patarroyo
Brayan. Patarroyo.
Personal tecnico.
Alejandra Fajardo (Ingº Interventoria.)
Oscar Michael (Ingº Interventoria.)
Actividades:

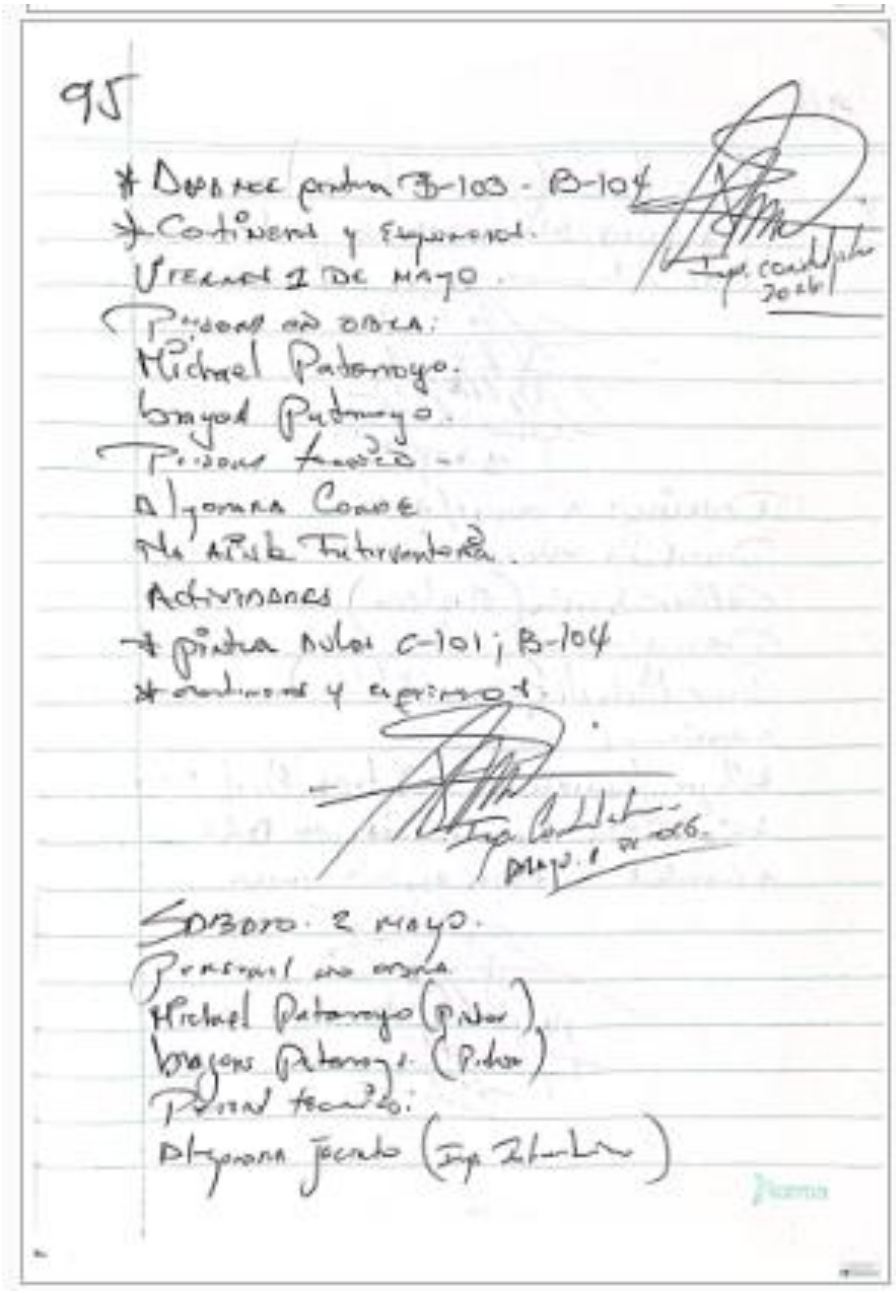

95

* Obra nueva pintura B-103 - B-104
* Continuar y Empezar el.
Viernes 1 DE MAYO.
Personal en OBRA:
Michael Patarroyo.
Brayan Patarroyo.
Personal Técnico:
Alejandra Cortes
Ma Alejandra Interventoría.
Actividades
* pintura Aulas C-101; B-104
* continuar y empezar el.

Sábado. 2 MAYO.
Personal en obra
Michael Patarroyo (Pintor)
Brayan Patarroyo (Pintor)
Personal técnico:
Alejandra Jacinto (Inge Residente)

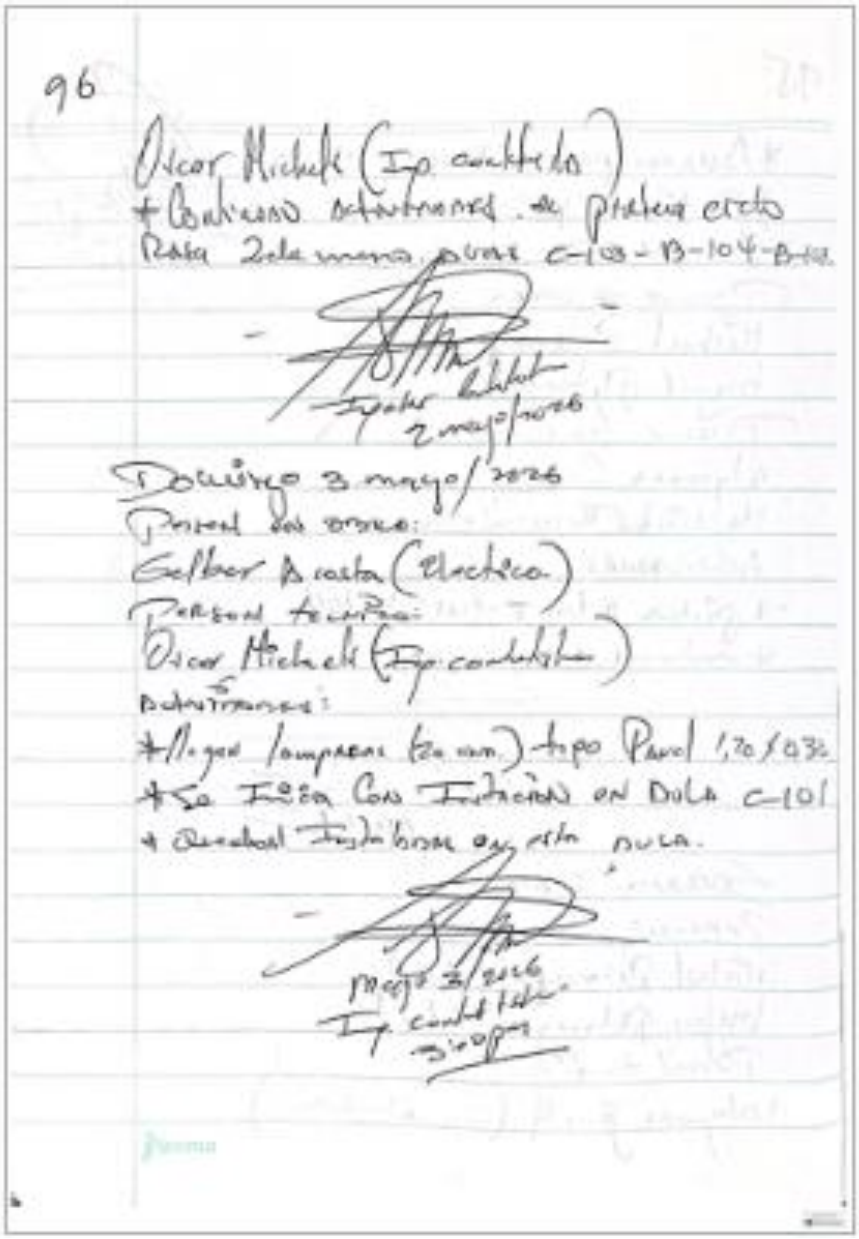
96

Oscar Michelli (Ing. contratista)
+ Cantidad actividades de practicas extra
Para 2 de marzo para C-103 - B-104 - B-102

Ingeniero Residente
2 mayo/2026

Domingo 3 mayo/2026
Personal de obra:
Gelber Acosta (Electrico)
Personal técnico:
Oscar Michelli (Ing. contratista)
Actividades:
+ Mayor (ampliación 60 cm) tipo Panel 1,70 x 0,32
+ 50 Ml en Cota Instalación en Dula C-101
+ Resanado Instalación en esta nula.

Mayo 3/2026
Ing. contratista
Sitio

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Enchape total de piso en el baño de hombres y mujeres



Instalacion de tuberia para ventilacion que da a la calle



Emboquillado de juntas en el baño de hombres y mujeres



Instlacion de puerta y ajustado al vano



Aplicación de pintura en puertas de archivo, baño de hombres y mujeres.



Relleno de excavacion en cuarto de archivo

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Instalacion de enchape de piso en salon de archivo




Fundida de piso en cajas de inspeccion de la cancha multiple

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 17/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A

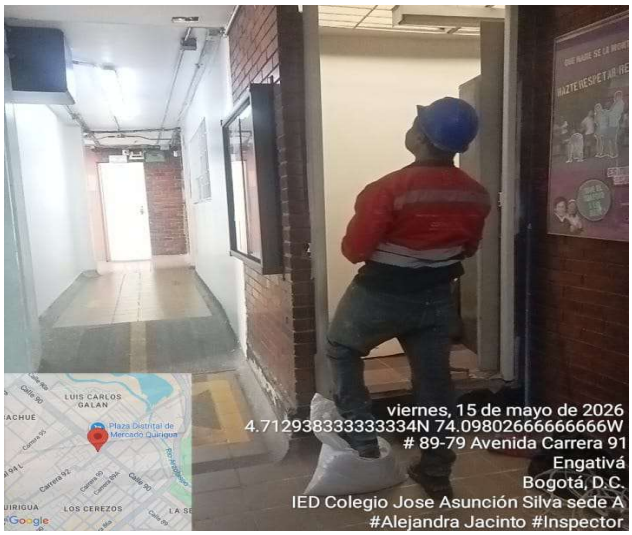

Resane de vanos



Instalacion de unidades sanitarios en baño de hombres y mujeres

ANEXO N° 1.12: RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA


COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY - SEDE A

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO CHARRY SEDE A



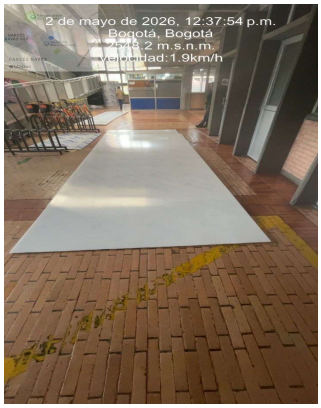


LLEGO MATERIAL PARA DAR INICIO CON LA INSTALACION DE LA CUBIERTA TIPO DOMO.



CUBIERTA DE 28M*6M.




NO SE REGISTRN ACTIVIDADES.

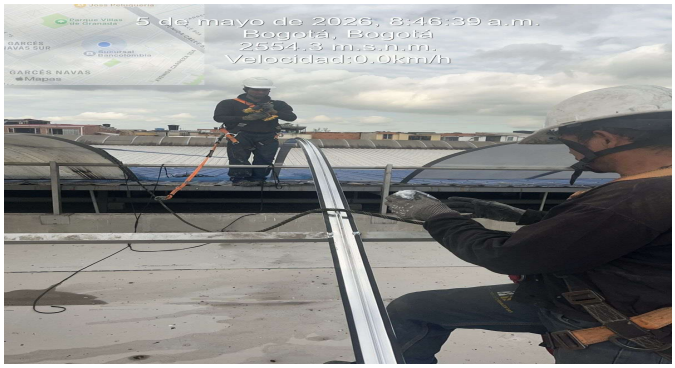

INICIA RETIRO DE LAMINAS EXISTENTES.



MONTAJE DE LAMINAS NUEVAS DE POLICARBONATO CON DIMENCIONES DE 1.5M*5.37M CADA UNA.

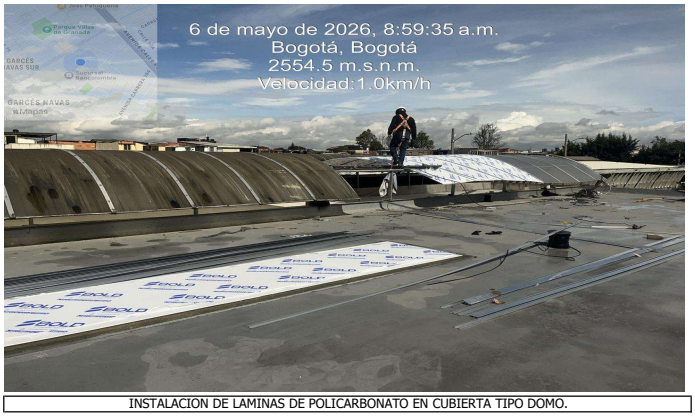

INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA TIPO DOMO.

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO CHARRY SEDE A



NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES.



MONTAJES DE LAMONAS DE POLICARBONATO EN TOTAL METROS LINEALES INSTALADAS EL DIA DE HOY 37,59



REISTALACION DE LAMINAS POLICARBONATO TIPO DOMO.



SE LLEVA EL 80% INSTALADAS DE LAMINAS POLICARBONATO TIPO DOMO EL DIA DE HOY.
