PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 33 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Pintura en muro de fachadas



Red electrica



Pintura en fachadas



Replanteo y trazado de juegos infatiles

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 33 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Aplicación de pintura anticorrosiva en cerramiento perimetral



Aplicación de pintura anticorrosiva en cerramiento perimetral

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 33 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Aplicación de pintura en fachadas e impermeabilizacion de mamposteria



Aplicación de pintura en puertas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 33 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Instalacion de cerramiento



Demolicion de muro

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 34 — LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	34	DEL	25/05/2026 (DD-MM-AA)	AL	31/05/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	240	dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% — $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,659,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.35%	85.35%	Obra Física Ejecutada (%)	0.14%	84.32%
Valor de la Obra Programada:	$ 10,743,887.00	$ 3,123,344,116.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4,104,716.00	$ 3,085,321,086.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	85.00%	84.18%	1.44%
Durante el periodo	0.35%	0.14%	
Acumulado actual	85.35%	84.32%	

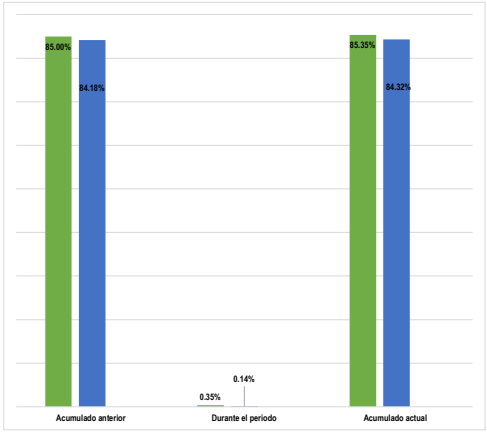

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIÓN No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIÓN No. 01			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIÓN No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	1.64%	1.00%	-0.64%	1.41%	0.19%	-1.22%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.26%	0.49%	-1.77%	5.22%	22.32%	17.10%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIÓN No. 02			**1.95%**	**0.75%**	**-1.21%**	**3.32%**	**11.26%**	**7.94%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICIÓN No. 01 - 02			**0.35%**	**0.14%**	**-0.22%**	**82.42%**	**83.86%**	**1.44%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 38,193,723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,273,680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,076,835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,913,171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 20,073,306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 150,294,734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 43,248,915.00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 20,000,000.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	98.00%	98.00%	0.00%	$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	99.30%	99.30%	0.00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**76.72%**	**74.60%**	**-2.12%**	**$ 290,732,744.10**	**$ 628,932,199.00**	**$ 338,199,454.90**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,659,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,888,851,473.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,770,407,796.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 1,888,851,473.00	$ 1,888,851,473.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
INDICADOR TECNICO	85.35%	84.32%	1.44%

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	240	3.46

CURVA S

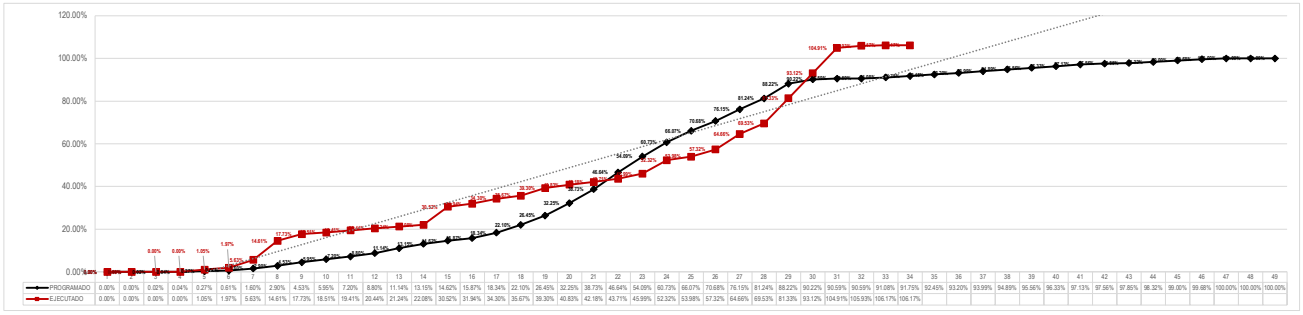

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.05%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.05%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.92%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.97%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.66%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.60%	$ 44,738,268.00	5.63%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.30%	8.98%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.90%	$ 81,229,800.00	14.61%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.63%	3.12%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.53%	$ 126,911,877.00	17.73%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.42%	0.78%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.95%	$ 166,813,337.00	18.51%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.25%	0.90%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.20%	$ 201,714,046.00	19.41%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.60%	1.04%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.80%	$ 246,517,349.00	20.44%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.35%	0.80%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.14%	$ 312,308,281.00	21.24%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	2.01%	0.84%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.15%	$ 368,556,270.00	22.08%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.47%	8.44%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.62%	$ 409,790,998.00	30.52%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.25%	1.43%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.87%	$ 444,749,788.00	31.94%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.47%	2.36%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.34%	$ 514,112,112.00	34.30%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.76%	1.37%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	22.10%	$ 619,454,498.00	35.67%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.35%	3.63%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.45%	$ 741,303,536.00	39.30%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.80%	1.53%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.25%	$ 903,854,742.00	40.83%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.49%	1.35%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.73%	$ 1,085,654,721.00	42.18%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.91%	1.53%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.64%	$ 1,307,288,437.00	43.71%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.45%	2.28%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	54.09%	$ 1,516,035,801.00	45.99%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.64%	6.33%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.73%	$ 1,702,181,070.00	52.32%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.34%	1.67%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	66.07%	$ 1,851,939,157.00	53.98%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.61%	3.33%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.68%	$ 1,981,028,711.00	57.32%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.47%	7.35%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	76.15%	$ 2,134,483,966.00	64.66%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.09%	4.87%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	81.24%	$ 2,277,159,343.00	69.53%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.97%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	88.22%	$ 2,472,598,216.00	81.33%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	2.00%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	90.22%	$ 2,528,746,605.00	93.12%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	90.59%	$ 2,539,196,402.00	104.91%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.02%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	90.59%	$ 2,539,196,402.00	105.93%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,608,738.53	0.49%	0.24%	$ 6,638,172.06	$ 6,970,566.47	91.08%	$ 2,552,805,140.53	106.17%	$ 2,975,773,591.35
34	SEM 34	21/05/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.01%	$ 148,400.64	$ 18,734,207.09	91.75%	$ 2,571,687,748.26	106.17%	$ 2,975,921,991.99
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,478,875.59	0.69%	0.00%	$ -	$ 19,478,875.59	92.45%	$ 2,591,166,623.85		$ 2,975,921,991.99
36	SEM 36	4/06/2026	$ 21,095,476.82	0.75%	0.00%	$ -	$ 21,095,476.82	93.20%	$ 2,612,262,100.67		$ 2,975,921,991.99
37	SEM 37	11/06/2026	$ 22,115,810.19	0.79%	0.00%	$ -	$ 22,115,810.19	93.99%	$ 2,634,377,910.86		$ 2,975,921,991.99
38	SEM 38	18/06/2026	$ 25,176,810.31	0.90%	0.00%	$ -	$ 25,176,810.31	94.89%	$ 2,659,554,721.17		$ 2,975,921,991.99
39	SEM 39	25/06/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.00%	$ -	$ 18,882,607.73	95.56%	$ 2,678,437,328.90		$ 2,975,921,991.99
40	SEM 40	2/07/2026	$ 21,691,744.68	0.77%	0.00%	$ -	$ 21,691,744.68	96.33%	$ 2,700,129,073.58		$ 2,975,921,991.99
41	SEM 41	9/07/2026	$ 22,288,012.53	0.80%	0.00%	$ -	$ 22,288,012.53	97.13%	$ 2,722,417,086.11		$ 2,975,921,991.99
42	SEM 42	16/07/2026	$ 12,164,339.64	0.43%	0.00%	$ -	$ 12,164,339.64	97.56%	$ 2,734,581,425.75		$ 2,975,921,991.99
43	SEM 43	23/07/2026	$ 7,910,803.81	0.28%	0.00%	$ -	$ 7,910,803.81	97.85%	$ 2,742,492,229.56		$ 2,975,921,991.99
44	SEM 44	30/07/2026	$ 13,184,673.01	0.47%	0.00%	$ -	$ 13,184,673.01	98.32%	$ 2,755,676,902.57		$ 2,975,921,991.99
45	SEM 45	6/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.00%	$ 2,774,731,712.64		$ 2,975,921,991.99
46	SEM 46	13/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.68%	$ 2,793,786,522.71		$ 2,975,921,991.99
47	SEM 47	20/08/2026	$ 9,103,339.52	0.32%	0.00%	$ -	$ 9,103,339.52	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,975,921,991.99
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,975,921,991.99
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,975,921,991.99
			$ 2,802,889,862.23								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra en labores para la subsanacion de procesos constructivos efectuados en la rampa y la baranda perimetral (con el fin de que el contratista de garantia a las labores)

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizaron actividades de limpieza y aseo general, resane y tratamiento de superficies de muro en el salón de acopio, así como la instalación de rejilla para el cárcamo. Durante la inspección se verificó la ejecución de las labores programadas; sin embargo, se recomienda al personal hacer uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente durante las actividades que involucren la manipulación de herramientas eléctricas como la pulidora, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes y garantizar condiciones seguras de trabajo

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se realiza entrega de aula modular.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizo entrega de espacios de la sede, actividad que se llevo a cabo entre la supervision, la institucion educativa, la interventoria y constratista de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de orden y aseo general, así como el retiro de residuos a lo largo de todo el frente de obra. Adicionalmente, se realizaron labores de instalación de perfiles en el voladizo de la cubierta, y actividades de remates y acabados que incluyeron pintura y resane en cárcamos, cajas, techos y fachadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, al igual que un volumen medio de residuos sin acopiar ni señalizar, parte de ellos en zona verde por lo que se recomendó dejar limpia estas áreas, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se realizan observaciones minimas, las cuales van a ser atendidas por el contratista en un periodo no mayor a 10 dias. La interventoria verificara que las observaciones sean atendidas. Se realiza entrega de espacios.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra finalizando ajuste en las labores de remate en cubierta (instalacion de caballetes, canales y bajantes), con el fin de darle garantia al proceso constructivo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de teja sobre la estructura metálica de la cubierta, así como labores de desmonte del cerramiento provisional de obra. Se recomienda mantener y reforzar las actividades de orden y aseo general en todas las áreas intervenidas, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la entrega definitiva de la institución educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, pero si material de construcción, se recomienda retirarlo, garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones finales

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra subsano actividades de estuco en cielos, limpieza de mamposteria, pintura en puertas, y muro de fachada. Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado elaboro con normalidad, no se reportan variaciones y/o incidentes con el personal

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra material de construcción, por lo que se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron actividades demolicion de placa y desmonte de adoquin

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la instalación de polisombra sobre el cerramiento en zinc, como medida preventiva para mitigar riesgos y evitar la ocurrencia de incidentes con la comunidad estudiantil. Asimismo, se verificó la instalación de señalización de SST en las áreas de intervención. Se informa que, de acuerdo con la programación de obra, se iniciarán las actividades de excavación manual, por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención y control establecidas para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento en mal estado, se evidencia desorden en el frente, por lo que se recomienda realizar un mantenimiento al cerramiento, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante el desarrollo de las actividades de demolición de muro, se presentaron afectaciones en el parque adyacente al punto intervenido.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra en etapa de desmontes de materiales y equipos

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución. La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendacione y observaciones. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 23 de abril de 2026, de la primera etapa de intervencion, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución. La segunda etapa incluye el desmonte y la reinstalacion de la totalidad de la cubierta de las aulas prefabricadas. Estas labores fueron efectuadas por el contratista de obra; se programa visita para verificar si la segunda etapa fue ejecutada en su totalidad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervision y a la institucion educativa

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: En la visita de la entrega de espacios, se solicito al contratista realizar labores en el jardin posterior de las aulas de primera infancia, estas laboes ya fueron efectuadas por parte del contratista, la interventoria realizara la respectiva verificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoria programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoria fueron atendidas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizo suministro y acopio parcial de material (divisiones de acero inoxidable en los baños), el contratista se encuentra en proceso para dar inicio de actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista esta estructurando los esquemas de intervencion estructural en la sede, esta debera ser verificada y aprobada por el equipo de interventoria para dar inicio a las labores

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programara visita de verificacion en compañía de contratista de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A

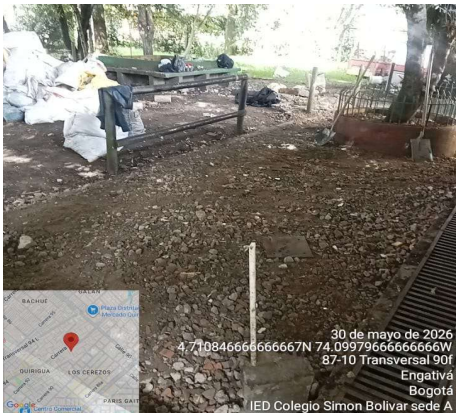

Descapotado de terreno



Rampa para acceso- Aula modular

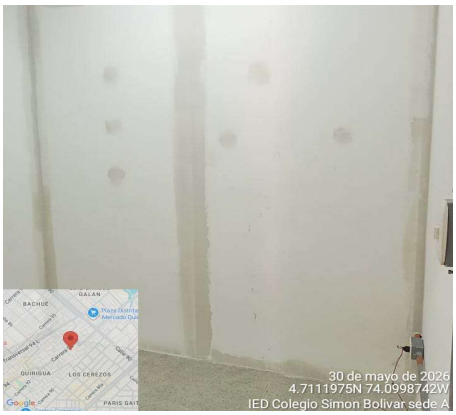

Masillado y tratamiento de juntas en muro divisor

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Pintura en muro de fachadas



Canaletas y bajanates en shut de basuras.



Aplicación de pintura e impermeabilizante en gradas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Refuerzo de cubierta con angulos



Retiro de cerramiento perimetral

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Limpieza y aseo



Fundida de pasos hacia el shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Demolicion de placa y adoquin

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 35 — LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	35	DEL	1/06/2026 (DD-MM-AA)	AL	7/06/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	247 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18		

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18*
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% — $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,659,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.39%	85.74%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0.79%	85.11%
Valor de la Obra Programada:	$ 11,956,018.00	$ 3,137,615,227.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 23,939,584.00	$ 3,114,395,564.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	85.35%	84.32%	1.90%
Durante el periodo	0.39%	0.79%	
Acumulado actual	85.74%	85.11%	

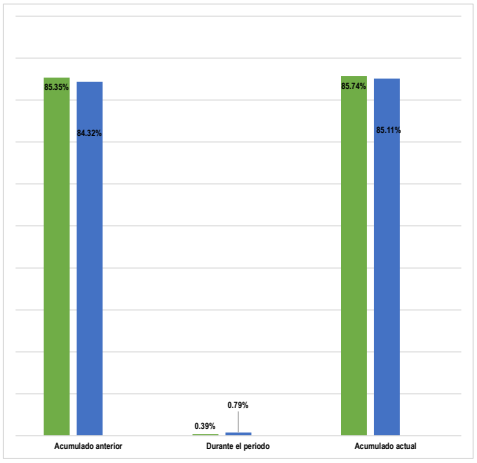

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	1.89%	6.97%	5.08%	2.63%	7.16%	4.53%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.45%	1.72%	-0.73%	7.67%	24.04%	16.37%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			2.17%	4.35%	2.18%	5.15%	15.60%	10.45%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.39%	0.79%	0.40%	82.75%	84.65%	1.90%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 38,193,723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,273,680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,076,835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,913,171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 20,073,306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 150,294,734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 43,248,915.00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	10.00%	10.00%	0.00%	$ 20,000,000.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	98.00%	98.00%	0.00%	$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			63.00%	61.28%	-1.72%	$ 290,732,744.10	$ 628,932,199.00	$ 338,199,454.90

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,659,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,888,851,473.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,770,407,796.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,888,851,473.00	$ 1,888,851,473.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	85.74%	85.11%	1.90%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	247	4.69

CURVA S

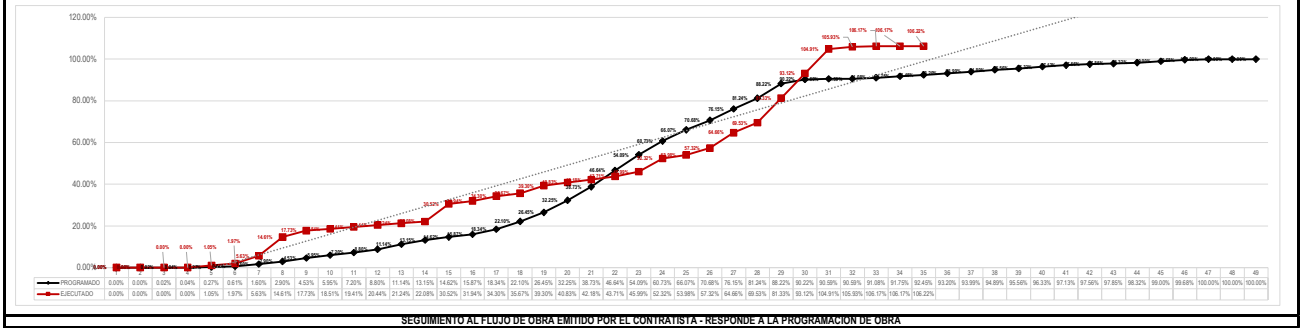

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.05%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.05%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.92%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.97%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.66%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.60%	$ 44,738,268.00	5.63%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.30%	8.98%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.90%	$ 81,229,800.00	14.61%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.63%	3.12%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.53%	$ 126,911,877.00	17.73%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.42%	0.78%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.95%	$ 166,813,337.00	18.51%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.25%	0.90%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.20%	$ 201,714,046.00	19.41%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.60%	1.04%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.80%	$ 246,517,349.00	20.44%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.35%	0.80%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.14%	$ 312,308,281.00	21.24%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	2.01%	0.84%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.15%	$ 368,556,270.00	22.08%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.47%	8.44%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.62%	$ 409,790,998.00	30.52%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.25%	1.43%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.87%	$ 444,749,788.00	31.94%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.47%	2.36%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.34%	$ 514,112,112.00	34.30%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.76%	1.37%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	22.10%	$ 619,454,498.00	35.67%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.35%	3.63%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.45%	$ 741,303,536.00	39.30%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.80%	1.53%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.25%	$ 903,854,742.00	40.83%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.49%	1.35%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.73%	$ 1,085,654,721.00	42.18%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.91%	1.53%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.64%	$ 1,307,288,437.00	43.71%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.45%	2.28%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	54.09%	$ 1,516,035,801.00	45.99%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.64%	6.33%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.73%	$ 1,702,181,070.00	52.32%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.34%	1.67%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	66.07%	$ 1,851,939,157.00	53.98%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.61%	3.33%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.68%	$ 1,981,028,711.00	57.32%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.47%	7.35%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	76.15%	$ 2,134,483,966.00	64.66%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.09%	4.87%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	81.24%	$ 2,277,159,343.00	69.53%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.97%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	88.22%	$ 2,472,598,216.00	81.33%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	2.00%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	90.22%	$ 2,528,746,605.00	93.12%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	90.59%	$ 2,539,196,402.00	104.91%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.02%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	90.59%	$ 2,539,196,402.00	105.93%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 13,608,738.53	0.49%	0.24%	$ 6,638,172.06	$ 6,970,566.47	91.08%	$ 2,552,805,140.53	106.17%	$ 2,975,773,591.35
34	SEM 34	21/05/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.01%	$ 148,400.64	$ 18,734,207.09	91.75%	$ 2,571,687,748.26	106.17%	$ 2,975,921,991.99
35	SEM 35	28/05/2026	$ 19,478,875.59	0.69%	0.04%	$ 1,203,371.54	$ 18,275,504.05	92.45%	$ 2,591,166,623.85	106.22%	$ 2,977,125,363.53
36	SEM 36	4/06/2026	$ 21,095,476.82	0.75%	0.00%	$ -	$ 21,095,476.82	93.20%	$ 2,612,262,100.67		$ 2,977,125,363.53
37	SEM 37	11/06/2026	$ 22,115,810.19	0.79%	0.00%	$ -	$ 22,115,810.19	93.99%	$ 2,634,377,910.86		$ 2,977,125,363.53
38	SEM 38	18/06/2026	$ 25,176,810.31	0.90%	0.00%	$ -	$ 25,176,810.31	94.89%	$ 2,659,554,721.17		$ 2,977,125,363.53
39	SEM 39	25/06/2026	$ 18,882,607.73	0.67%	0.00%	$ -	$ 18,882,607.73	95.56%	$ 2,678,437,328.90		$ 2,977,125,363.53
40	SEM 40	2/07/2026	$ 21,691,744.68	0.77%	0.00%	$ -	$ 21,691,744.68	96.33%	$ 2,700,129,073.58		$ 2,977,125,363.53
41	SEM 41	9/07/2026	$ 22,288,012.53	0.80%	0.00%	$ -	$ 22,288,012.53	97.13%	$ 2,722,417,086.11		$ 2,977,125,363.53
42	SEM 42	16/07/2026	$ 12,164,339.64	0.43%	0.00%	$ -	$ 12,164,339.64	97.56%	$ 2,734,581,425.75		$ 2,977,125,363.53
43	SEM 43	23/07/2026	$ 7,910,803.81	0.28%	0.00%	$ -	$ 7,910,803.81	97.85%	$ 2,742,492,229.56		$ 2,977,125,363.53
44	SEM 44	30/07/2026	$ 13,184,673.01	0.47%	0.00%	$ -	$ 13,184,673.01	98.32%	$ 2,755,676,902.57		$ 2,977,125,363.53
45	SEM 45	6/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.00%	$ 2,774,731,712.64		$ 2,977,125,363.53
46	SEM 46	13/08/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	99.68%	$ 2,793,786,522.71		$ 2,977,125,363.53
47	SEM 47	20/08/2026	$ 9,103,339.52	0.32%	0.00%	$ -	$ 9,103,339.52	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,977,125,363.53
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,977,125,363.53
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.23		$ 2,977,125,363.53
			$ 2,802,889,862.23								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra en labores para la subsanacion de procesos constructivos efectuados en carcamo y placa posterior a las aulas (con el fin de que el contratista de garantia a las labores)

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de limpieza y aseo general en el área de intervención, incluyendo la limpieza de superficies en el cárcamo y demás labores orientadas a mejorar las condiciones de orden y mantenimiento del sitio.
La Interventoría recomienda continuar fortaleciendo y ejecutando de manera permanente las jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras de trabajo, prevenir la acumulación de residuos y garantizar un adecuado estado de las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia material de construcción y residuos de lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se requiere efectuar mantenimiento a la reja ubicada en la parte posterior de la sede, incluyendo la aplicación de pintura color verde. Adicionalmente, se deberá realizar la instalación de los tanques.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de orden y aseo general, así como el retiro de residuos a lo largo de todo el frente de obra

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se realizan observaciones minimas. La interventoria verificara que las observaciones sean atendidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra finalizando ajuste en las labores de remate en cubierta (instalacion de caballetes, canales y bajantes), con el fin de darle garantia al proceso constructivo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones finales

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron actividades demolicion de placa y excavacion

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placa en el área de intervención. Asimismo, se realizó mantenimiento al cerramiento rígido instalado para la delimitación del frente de obra, garantizando su adecuado estado. Durante la visita de seguimiento se verificó el diligenciamiento de los ATS y la realización de charlas de seguridad dirigidas al personal. Se recomienda al Contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad, organización y limpieza en el frente de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante el desarrollo de las actividades de demolición de muro, se presentaron afectaciones en el parque adyacente al punto intervenido.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se efectuo la demolicion de muros y desmonte de ventana

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de muro en un aula ubicada en la tercera planta, así como el retiro de una ventana y labores de limpieza y acopio de material producto de las intervenciones realizadas.
Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en condiciones adecuadas para la delimitación y protección del frente de obra, contribuyendo al control de riesgos y a la seguridad de la comunidad educativa y del personal que ejecuta las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Durante la reunión realizada para la SED, se definió la configuración de las fachadas de las aulas, así como la utilización de aluminio color gris en los elementos proyectados. Igualmente, se indicó que las puertas deberán ser similares a las instaladas en las salas de reunión de la Secretaría de Educación y que se debe considerar el uso de las aulas por parte de estudiantes de primaria.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Respecto a la solicitud realizada por la interventoría de esquema de la puerta proyectada, se informo desde la SED que no es requerido el diseño o esquema del mismo. Adicionalmente, respecto al sistema hidráulico, se solicita la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman la red.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad. Se programa visita de verificacion el dia 9 de junio a las 8:00 a.m. con el fin de evaluar si las observaciones emitidas por la interventoria fueron atentidos para poder recibir la sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se debe desmontar puerta y pintar en electrostatica y montar division en zona del baño

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervision solicita la intervencion en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostatica (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La supervisión indicó que la ventanería deberá pintarse en color negro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoria se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervision y a la institucion educativa

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: En la visita de la entrega de espacios, se solicito al contratista realizar labores en el jardin posterior de las aulas de primera infancia, estas labores ya fueron efectuadas por parte del contratista, la interventoria realizara la respectiva verificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoria programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoria fueron atendidas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Instalacion de puertas de los baños

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al desmonte de las puertas de los baños y a la limpieza del enchape existente en las áreas intervenidas. Se recomienda mantener las condiciones de orden y aseo en el frente de trabajo, así como garantizar el uso adecuado de los EPP por parte del personal que ejecuta las actividades.
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe radicar NP de desmonte de divisiones

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista esta estructurando los esquemas de intervencion estructural en la sede, esta debera ser verificada y aprobada por el equipo de interventoria para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoria esta a la espera que se radique la informacion adicional a esto se realizara inpeccion para evaluar si la mamposteria es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programara visita de verificacion por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede. La informacion se remitira entre el 9 y 13 de junio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programa visita de verificacion para el dia 9 de junio a las 10:00 a.m. entre el contratista y la interventoria (profesional electrico)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se solicita se ajuste el policarbonato en un tramo de la cubierta de la sede, en consecuencia como no se puede acceder de una manera facil al punto, se programa visita de verificacion por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo de la interventoria de obra y del contratista el proximo martes 9 de junio a la 1:00 p.m. para efectuar la verificacion de las condiciones y determinar las condiciones del espacio y validar que equipos se necesitan para llevar a cabo la respectiva intervencion.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GRAJIAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL MOJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Limpieza y acopio de material residual de obra



Limpieza y acopio de material residual de obra



Placa perimetral al carcamo-fraguado



Instalacion de rejilla para el carcamo

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Pintura en muro de fachadas



Canaletas y bajanates en shut de basuras.



Aplicación de pintura e impermeabilizante en gradas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalacion de flanches y caballete en la cubierta.



Aplicación de pintura en parales nuevos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Demolicion de placa y adoquin



Excavación Manual

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 35 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 35 (Consecutivo) **DEL** 1/6/2026 (dd-mm-aa) **AL** 7/6/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Instalacion de cerramiento



Demolición de muro divisor en primera y tercera planta



Desmonte de ventanas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12/05/2026	**Inicio**	9:00 A.M.	**Fin**	9:43 A.M.	**Lugar**	SED.
Asunto	Comité de obra # 18 (lote 18)						
Asistentes	Supervisor, contratista de obra e interventoría				**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y lo definir avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

* El balance se encuentra balanceados y se encuentra en positivos.
* El supervisor sugiere radicar el acta parcial lo más pronto posible para que haya flujo de caja
* El supervisor sugiere iniciar actividades en el colegio técnico de palermo el día Miercoles 13 de mayo de 2026 y en el de Republica de colombia en el transcurso de la semana.
* El supervisor programa la entrega del torgugua el día jueves 14 de mayo de 2026.
* El supervisor programa la entrega de los frentes técnico sede A y sede C para el día martes 19 de mayo de 2026, debido a que el contratista está atendiendo observaciones y subsanaciones dados por la supervisión e interventoría hora 2:30 P.M.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

- <<Compromisos adquiridos>>

* Jorge Gaitan Cortes: El supervisor programa la entrega de este frente para el día miercoles 20 de mayo de 2026. 8:00 A.M.
* Simón Bolivar: El supervisor programa la entrega de este frente para el día viernes 15 de mayo de 2026.
* Abel Rodriguez: El contratista afirma que se estan rematando detalles para la entrega.
* Antonio Villavicencio: El supervisor solicita iniciar actividades de cambio de cubierta en el modulo (fachada) que queda por el lado de la calle.


El ingeniero solicita que la estructura que se utilizo para el aula de contingencia se rectifiquen y se adapten para la conformación de una pergola ubicada en la zona verde contigua al aula de Recetoria (Paralela a la carrera 92. Lo anterior dado desde el Ingeniero apoyo a la supervisión.

* El supervisor recomienda radicar el informe técnico NO. 7 el día miercoles 13 de mayo de 2026.
* El supervisor recomienda radicar el informe semanal NO. 31 el día martes 12 de mayo de 2026.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

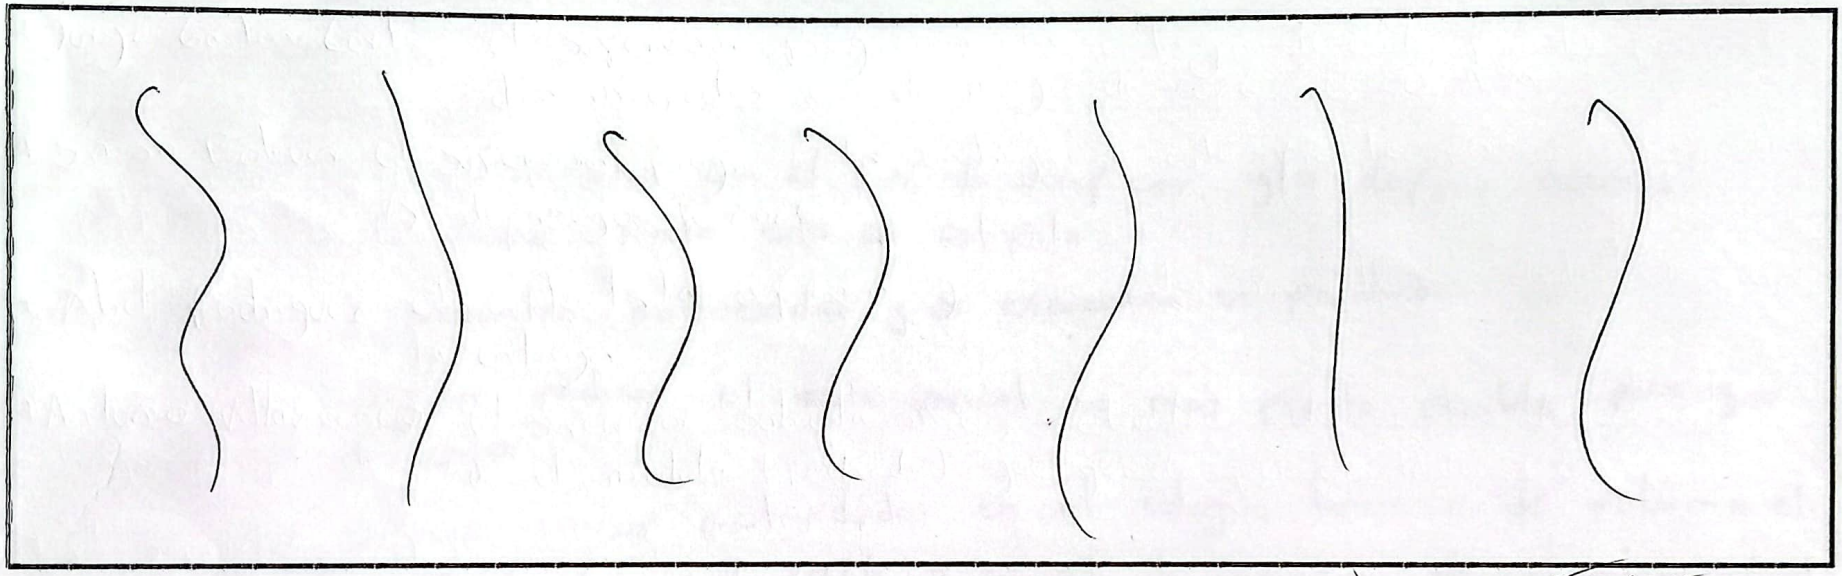

Carlos M. Montenegro

NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Hernan Dario Lopez Perez
CARGO: Apoyo a la Supervisión.

NOMBRE: Lorena Rodriguez Rodriguez
CARGO: Dirección de Intervención.

NOMBRE: Paula Martinez
CARGO: Residente de Interventoria

NOMBRE: Yerley López Poer
CARGO: Res Obra

NOMBRE: Diego A Rey
CARGO: Director Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Viernes 25 de Abril de 2026

Personal de obra: 1 Plomero

Se inicia reintalación de locetas en concreto en zona peatonal.

Powered by CamScanner

Jueves 2 de abril 2026

Sin personal de obra por día Santo

Powered by CamScanner

Viernes 3 de abril de 2026

Sin personal de obra por día santo

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 4 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 ornamentadores
1 Oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de estructura metalica para muro en superboard y se finaliza.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 6 de abril 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante.

Se inicia instalación de estructura en vigueta y omega para muros de superboard.

Powered by CamScanner

Martes 7 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 Oficiales
1 Ayudante

Se continua con actividad de estructura en omega y vigueta para muro en superboard.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 8 de Abril 2026

Personal de Obra : 2 Oficiales
1 Ayudante

Se inicia tapado de muro en lamina de superboard de 8 mm de espesor

Powered by CamScanner

Jueves 9 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante

Se continua con la instalación de lamina en superboard y se inicia masillado de juntas.

Powered by CamScanner

Viernes 10 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de lamina en superboard y masillado de juntas.

Powered by CamScanner

Sabado 11 de Abril de 2026

Personal de Obra: 2 oficiales
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de lamina en superboard y masillado de juntas

Powered by CamScanner

Lunes 13 de abril de 2026

Personal de Obra: 2 Oficiales
1 Ayudante

Se continua con masillado de muros, se culmina instalacrón de laminas.

Powered by CamScanner

Martes 14 de abril de 2026

Personal de Obra:- 2 Oficiales
1 Ayudante

De lijan muros y se inicia actividad de pintura, se aplica esmalte.

Norma

Powered by CamScanner
